
CRONOGRAMA PROYECTO


Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
1		**ADICIONAL OBRA TRAMO CANEY**	**90 días**	**mié 18/03/26**	**lun 15/06/26**		
2		REUNION COMUNA CANEY	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	3	
3		LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	7 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	6	2
4		**CLL 42 83C-80 ORI_TRAMO 1**	**31 días**	**vie 27/03/26**	**dom 26/04/26**		
5		**I - ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**vie 27/03/26**	**sáb 28/03/26**		
6		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	2 días	vie 27/03/26	sáb 28/03/26	8	3
7		**II - DEMOLICIONES**	**3 días**	**dom 29/03/26**	**mar 31/03/26**		
8		CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	1 día	dom 29/03/26	dom 29/03/26	9	6
9		FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	13CC;11	8
10		**III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	**8 días**	**lun 30/03/26**	**lun 6/04/26**		
11		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	6 días	mié 1/04/26	lun 6/04/26	12CC	9
12		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	6 días	mié 1/04/26	lun 6/04/26	15	11CC
13		ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26		9CC
14		**IV - RELLENOS Y BASES**	**9 días**	**mar 7/04/26**	**mié 15/04/26**		
15		ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	16	12
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	7 días	jue 9/04/26	mié 15/04/26	18;21	15
17		**V - PAVIMENTO ASFÁLTICO**	**5 días**	**jue 16/04/26**	**lun 20/04/26**		
18		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	19	16
19		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3"INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	3 días	sáb 18/04/26	lun 20/04/26	23;26;31	18
20		**VI - CONCRETOS**	**3 días**	**jue 16/04/26**	**sáb 18/04/26**		
21		CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	3 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26		16
22		**IX - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**		
23		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, L	2 días	mar 21/04/26	mié 22/04/26	24	19
24		DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULA	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26		23
25		**XI - OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**6 días**	**mar 21/04/26**	**dom 26/04/26**		
26		NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	2 días	mar 21/04/26	mié 22/04/26	27	19
27		NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	28	26
28		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI	2 días	sáb 25/04/26	dom 26/04/26		27
29		**CLL 42 83C-80 ORI_TRAMO 2**	**32 días**	**mar 21/04/26**	**vie 22/05/26**		

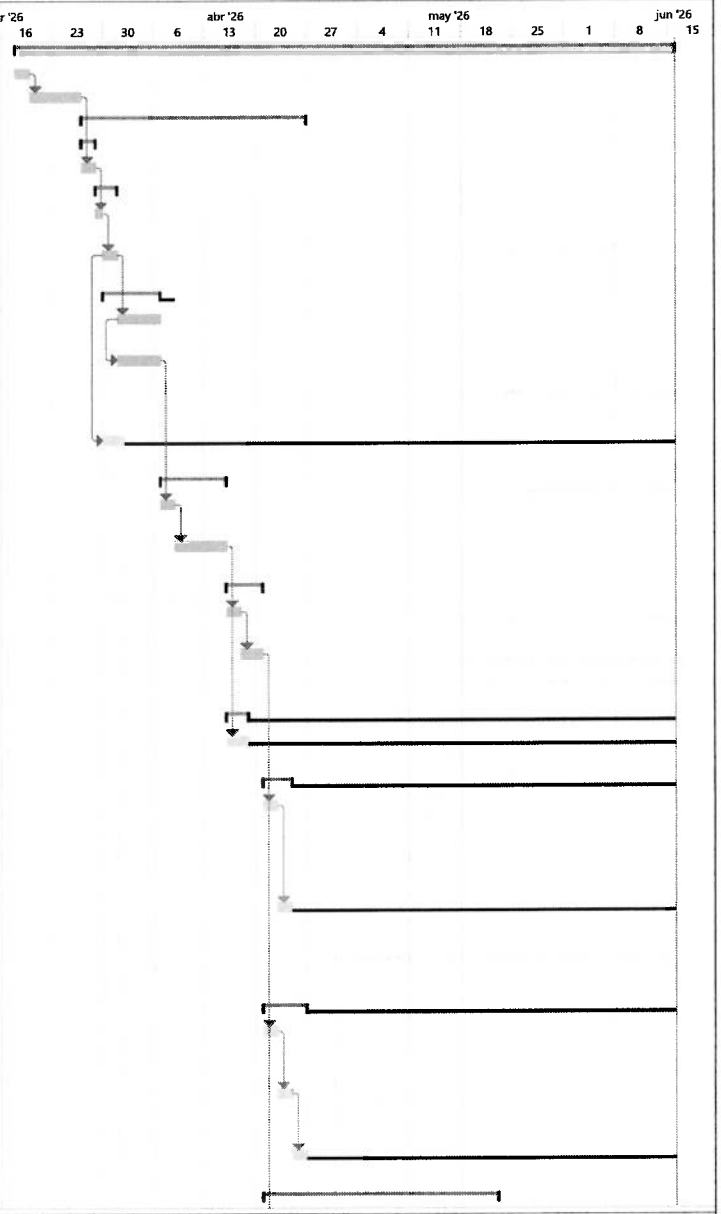

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Progreso manual
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Retrasada	Margen de demora
Resumen	Tarea manual	solo fin	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	División crítica	

CRONOGRAMA PROYECTO


Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
30		**I - ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 21/04/26**	**mié 22/04/26**		
31		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	2 días	mar 21/04/26	mié 22/04/26	33	19
32		**II - DEMOLICIONES**	**5 días**	**jue 23/04/26**	**lun 27/04/26**		
33		CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	34	31
34		FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	3 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	38CC;36	33
35		**III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	**8 días**	**sáb 25/04/26**	**sáb 2/05/26**		
36		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	37CC	34
37		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	5 días	mar 28/04/26	sáb 2/05/26	40	36CC
38		ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA [illegible]	3 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26		34CC
39		**IV - RELLENOS Y BASES**	**9 días**	**dom 3/05/26**	**lun 11/05/26**		
40		ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	2 días	dom 3/05/26	lun 4/05/26	41	37
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	7 días	mar 5/05/26	lun 11/05/26	43;46	40
42		**V - PAVIMENTO ASFÁLTICO**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 16/05/26**		
43		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	44	41
44		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3"INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	3 días	jue 14/05/26	sáb 16/05/26	48;51;56	43
45		**VI - CONCRETOS**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 16/05/26**		
46		CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26		41
47		**IX - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**6 días**	**dom 17/05/26**	**vie 22/05/26**		
48		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, L	3 días	dom 17/05/26	mar 19/05/26	49	44
49		DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULA	3 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26		48
50		**XI - OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**6 días**	**dom 17/05/26**	**vie 22/05/26**		
51		NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	2 días	dom 17/05/26	lun 18/05/26	52	44
52		NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	2 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	53	51
53		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26		52
54		**CLL 42 83-83C OCC**	**30 días**	**dom 17/05/26**	**lun 15/06/26**		
55		**I - ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**dom 17/05/26**	**lun 18/05/26**		
56		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	2 días	dom 17/05/26	lun 18/05/26	58	44
57		**II - DEMOLICIONES**	**5 días**	**mar 19/05/26**	**sáb 23/05/26**		

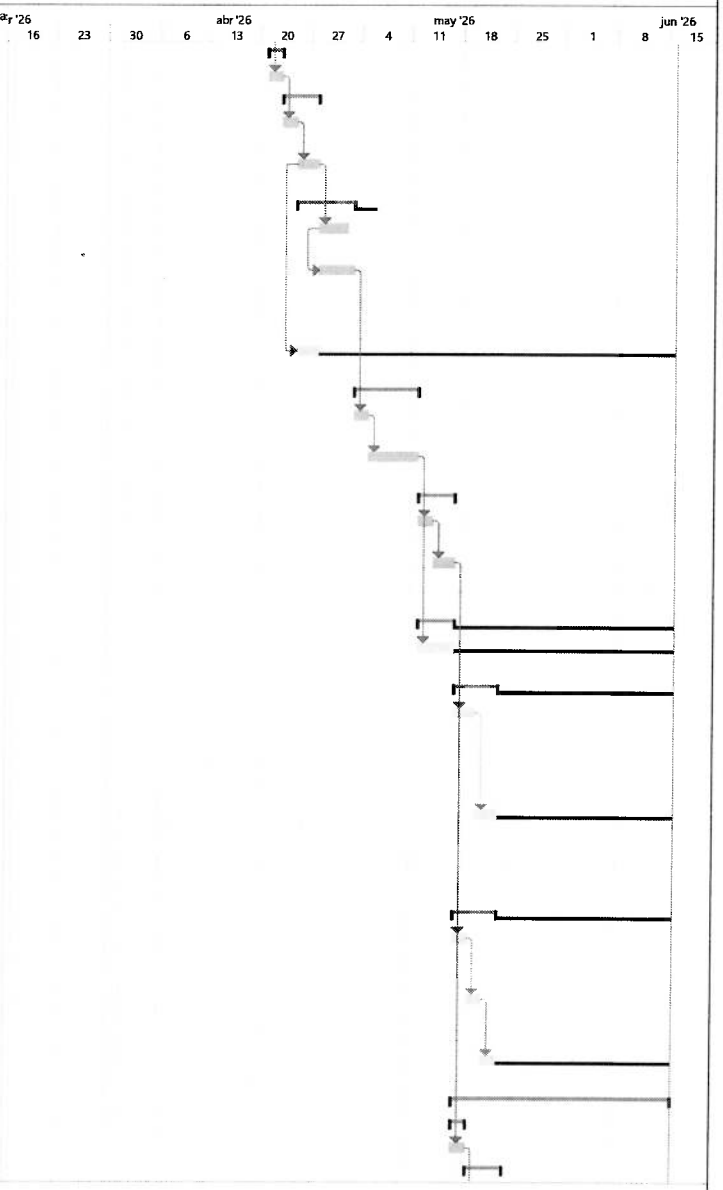

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Retrasada
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

CRONOGRAMA PROYECTO


Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
58		CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	2 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	59	56
59		FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	3 días	jue 21/05/26	sáb 23/05/26	63CC;61	58
60		**III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	**8 días**	**jue 21/05/26**	**jue 28/05/26**		
61		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	5 días	dom 24/05/26	jue 28/05/26	62CC	59
62		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	5 días	dom 24/05/26	jue 28/05/26	65	61CC
63		ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DEFRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD	3 días	jue 21/05/26	sáb 23/05/26		59CC
64		**IV - RELLENOS Y BASES**	**9 días**	**vie 29/05/26**	**sáb 6/06/26**		
65		ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	2 días	vie 29/05/26	sáb 30/05/26	66	62
66		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	7 días	dom 31/05/26	sáb 6/06/26	68;71	65
67		**V - PAVIMENTO ASFÁLTICO**	**5 días**	**dom 7/06/26**	**jue 11/06/26**		
68		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	2 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	69	66
69		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3"INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	3 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26	73;76	68
70		**VI - CONCRETOS**	**3 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**		
71		CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	3 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26		66
72		**IX - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**vie 12/06/26**	**lun 15/06/26**		
73		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, L	2 días	vie 12/06/26	sáb 13/06/26	74	69
74		DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULA	2 días	dom 14/06/26	lun 15/06/26		73
75		**XI - OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**4 días**	**vie 12/06/26**	**lun 15/06/26**		
76		NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	2 días	vie 12/06/26	sáb 13/06/26	77;78	69
77		REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 PSI ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	2 días	dom 14/06/26	lun 15/06/26		76
78		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI	2 días	dom 14/06/26	lun 15/06/26		76

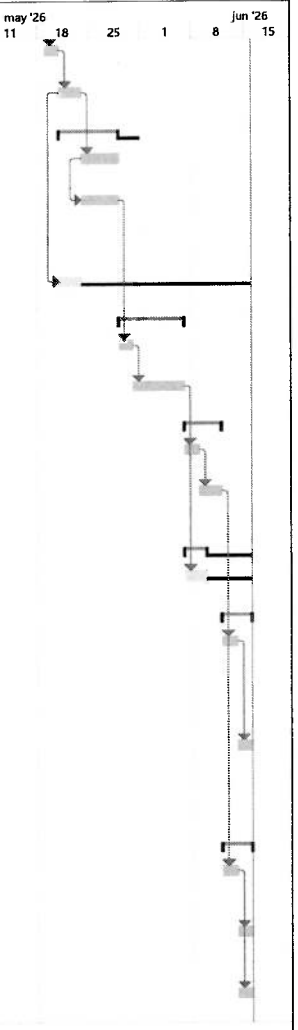

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Retrasada
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

CRONOGRAMA PROYECTO

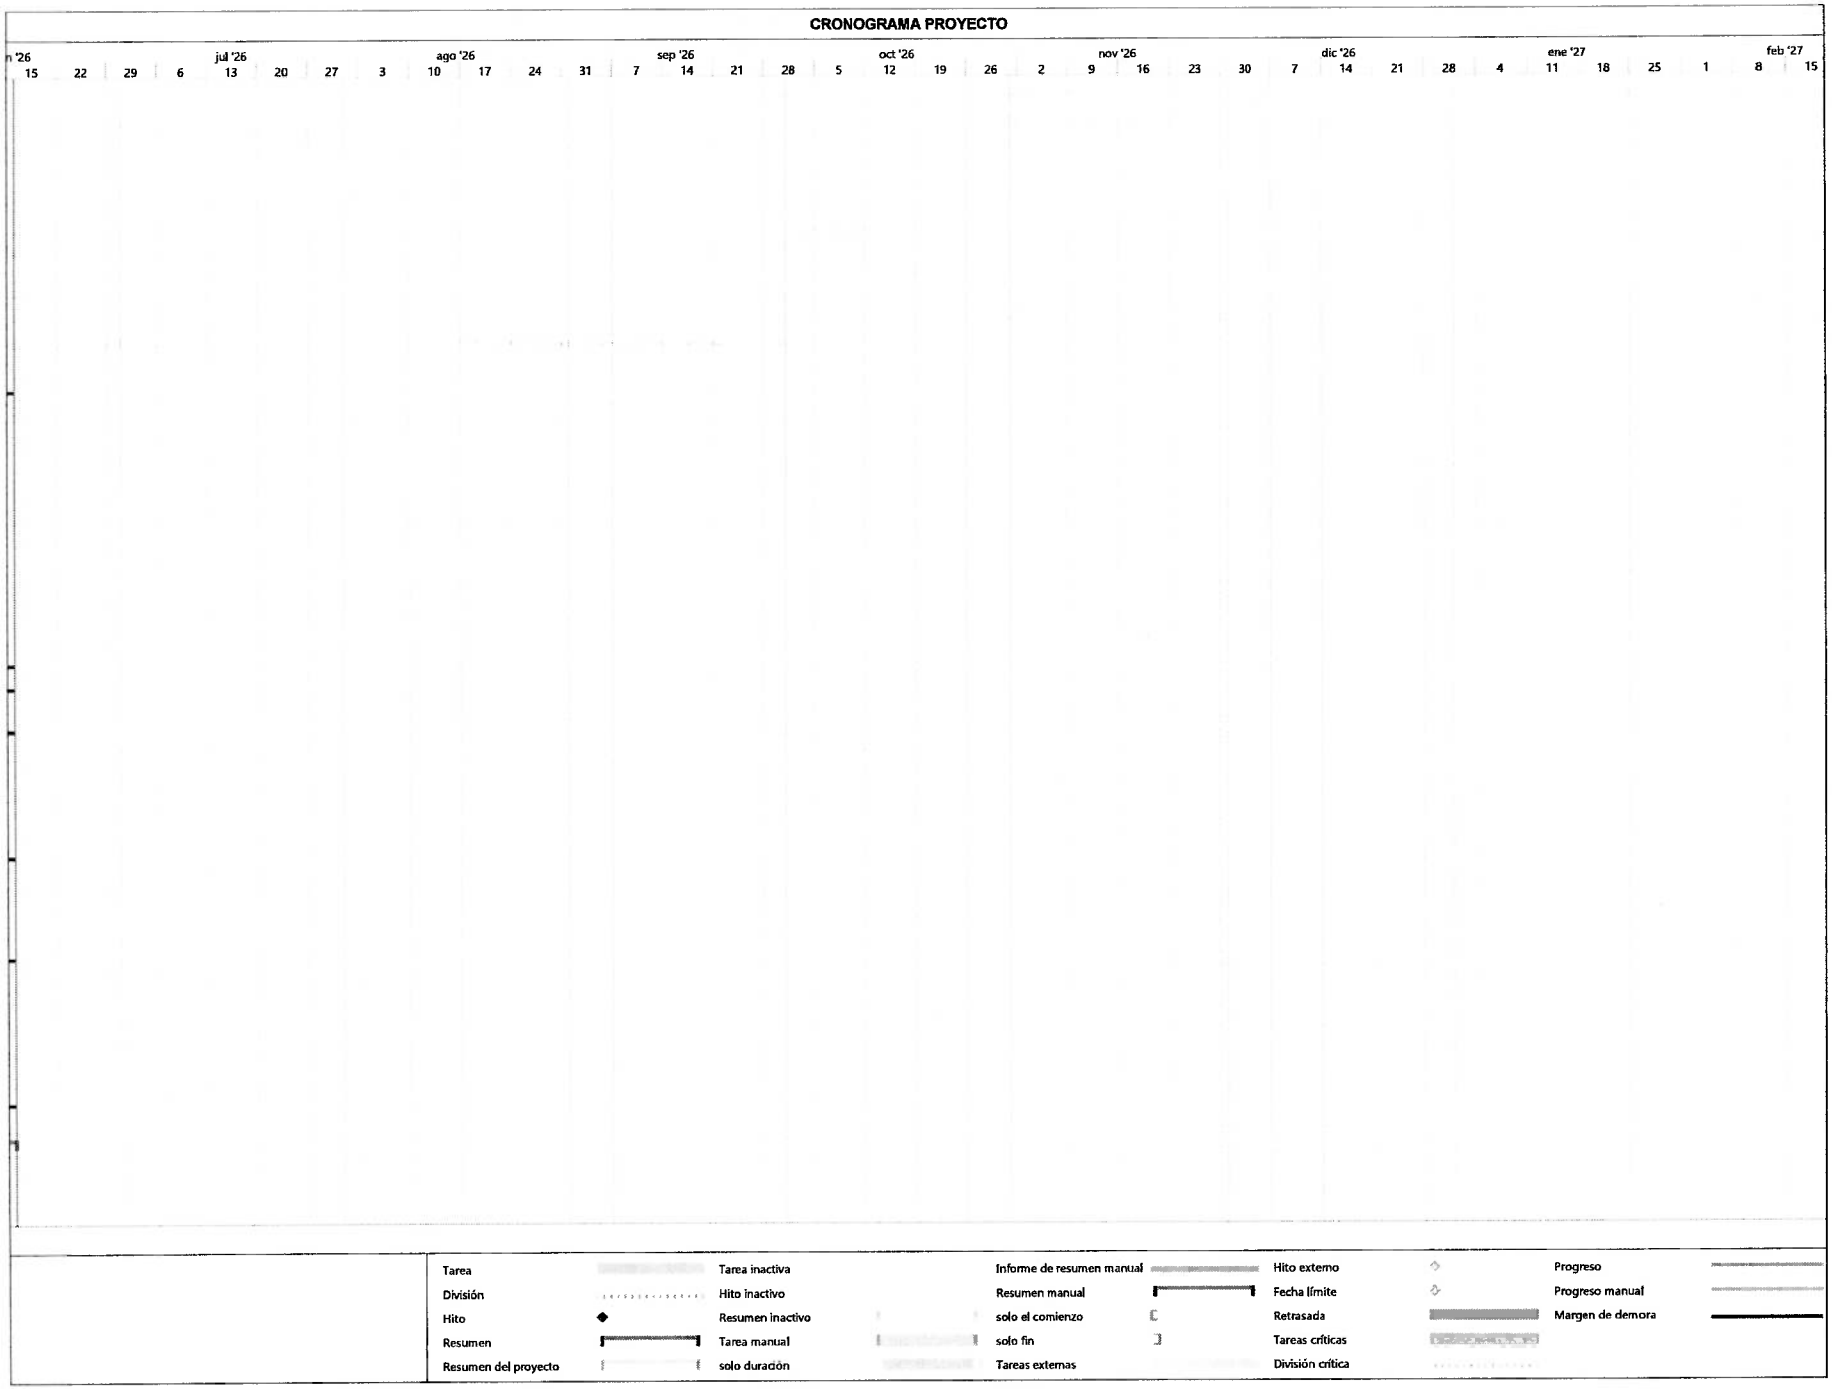


CRONOGRAMA PROYECTO
n '26
jul '26
ago '26
sep '26
oct '26
nov '26
dic '26
ene '27
feb '27
15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Retrasada
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

CRONOGRAMA PROYECTO

