

**Oficio solicitud reemplazo de material**

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, evaluada posteriormente por la interventoria, es importante resaltar que estos detalles son constructivos y en las obras en muchas ocasiones se encuentran condiciones desfavorables lo que conlleva a pensar y replantear muchas de las actividades que se habían considerado, por lo que en este caso teniendo en cuenta que se expresa que se evidenció un suelo con material arcilloso con alta saturación es válido considerar la sugerencia de poner piedra de mayor tamaño en contacto directo con el suelo, para generar mayor superficie de contacto y evitar que al momento de hacer las compactaciones el agregado se entierre y mezcle con el suelo, además teniendo en cuenta el apartado técnico especificado en los diseños por el profesional que realizó los estudios, mediante llamada telefónica se le expresó si podía generar un concepto sobre la propuesta de mantener el espesor de la capa de reemplazo pero contemplando dentro de esta una capa de piedra filtro de 4", a lo que manifestó que son consideraciones técnicas a tomar en campo, por esta razón desde un **concepto técnico se considera viable esta consideración** pero se debe considerar si es necesario el concepto del profesional responsable de los estudios y diseños.

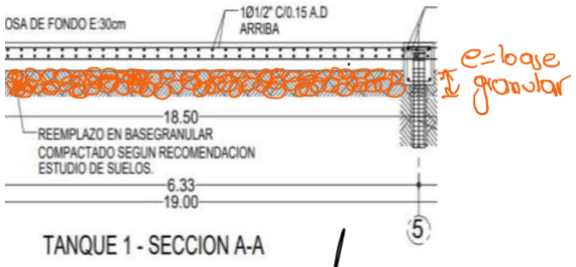


Propuesta estudios y diseños

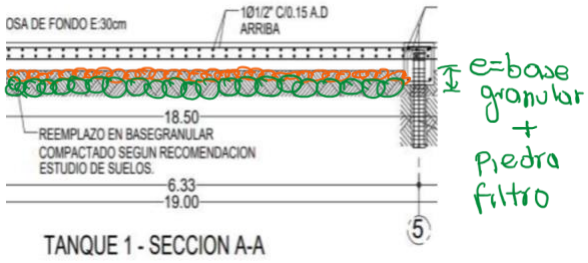


Propuesta técnica contratista

---

SANDRA VERÓNICA DUQUE HENAO
SUBGERENTE TÉCNICA OPERATIVA
