FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	4			
Contrato No.:	LP-026-2024 LOTE 1				
Nombre del supervisor:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro	Otro:
Nombre del contratista:	CONSORCIO VIAS URBANAS BQ				
No. de identificación del contratista:	901.940.706-2				
Objeto del contrato:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX,EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I				
Plazo inicial:	18 MESES				
Plazo según prórroga No. 1:					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	12/05/2025	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	11/11/2026		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Cumplimiento:	Seguros mundial	100102117	12/05/2025	14/03/2027
Anticipo:				
Pago anticipado:				

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Estabilidad de la obra:	Seguros mundial	100102117	11/11/2026	11/11/2031
Salarios y prestaciones:	Seguros mundial	100102117	12/05/2025	11/11/2025
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		**Valor**
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		*$52.085.450.531*
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		*$52.085.450.531*
Porcentaje del anticipo:	%	
Porcentaje del pago anticipado:	%	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		*$ 50.823.272.123*
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		*$1.262.178.412*
Valor a pagar en el presente informe:		***$10.874.290.534***
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		**VUBQ 4**

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. LP-026-2024 LOTE 1 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026

_____

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Cargo: Supervisor
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

MODULO I
INFORME MENSUAL No 9
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

PROYECTO

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I"

ELABORA
CONSORCIO VIAS URBANAS BQ

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 3
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 3
2.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
2.3 ALCANCE DEL CONTRATO 5
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 6
3.1 VIAS NUEVAS – TRAMOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO 6
3.2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 8
3.3 CANTIDADES EJECUTADAS 9
3.4 AVANCE FISICO 10
3.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 10
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 11
5. ANEXOS 14

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el proyecto “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I” este informe contiene los aspectos técnicos, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el contrato NO. LP-026-2024 LOTE 1.

El acta de inicio del contrato fue impartida desde el 01 de mayo del 2025, el presente informe mensual No 9 corresponde al periodo de trabajo entre el 01 al 31 de enero del año 2026.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Este contrato hace parte de la implementación del programa "**Barrios a la Obra – Etapa IX**", una iniciativa estratégica del Distrito de Barranquilla orientada a mejorar la infraestructura vial y las condiciones urbanísticas de los diferentes barrios, y localidades. El objetivo principal de este proyecto es la construcción, reconstrucción, mejoramiento y/o rehabilitación de tramos de vías urbanas, mediante la utilización de pavimento en concreto rígido con su debido urbanismo, garantizando una solución duradera y segura para el tránsito vehicular y peatonal. Además de las vías, el contrato contempla la intervención de canales, box coulvert y otras obras complementarias, necesarias para el adecuado manejo del agua y la sostenibilidad de las obras viales. Estas acciones están dirigidas a mejorar la movilidad urbana, facilitar el acceso a los barrios, reducir tiempos de desplazamiento y contribuir significativamente al desarrollo urbano integral de la ciudad.
El proyecto también incluye actividades de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial perimetral de la ciudad, con el objetivo de incrementar la vida útil de los pavimentos existentes y preservar la inversión pública mediante una gestión eficiente de los recursos de infraestructura.

2.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Número del contrato:	Contrato LP-026-2024 LOTE 1
Objeto del contrato:	**OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULO I**
Contratante:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Contratista de obra:	CONSORCIO VIAS URBANAS BQ
NIT Contratista:	901. 940.706-2
Interventoría:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. N.I.T No.800.091.140-4
Supervisor:	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Valor del Contrato:	CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS $52.033.303.778
Adiciones:	N/A
Valor del Contrato Actualizado:	CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINA Y UN PESOS $52.085.450.531
Plazo:	Dieciocho (18) meses
Fecha de inicio:	01 de mayo de 2025
Fecha de terminación actual del contrato:	
Dirección:	Calle 77B No 57 -141 piso 11
Póliza	CUMPLIMIENTO: BQ-100102117 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: BQ-100028579 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

2.3 ALCANCE DEL CONTRATO


El Consorcio convendrá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-026-2024 LOTE 1, MODULO I, los cuales conforman parte integral del presente contrato. Dentro del alcance del contrato específico para el Módulo I, se incluye lo siguiente:

- **Construcción de vías nuevas**

Este contrato consiste en la construcción de 84 tramos de vías nuevas en las localidades de sur occidente, sur oriente y metropolitana, con una longitud total a intervenir de 15.736 ML, de los cuales se realizará reposición y/o reubicación de redes de acueducto y alcantarillado, los tramos a intervenir están conformados de la siguiente manera:

BARRIO	**No DE TRAMOS VIALES**
VILLA SAN PEDRO ALEJANDRINO	(7) SIETE TRAMOS VIALES
BELLA ARENA	(3) TRES TRAMOS VIALES
BOYACA	(1) UN TRAMO VIAL
BUENOS AIRES	(6) SEIS TRAMOS VIALES
CIUDADELA 20 DE JULIO	(3) TRES TRAMOS VIALES
EL FERRY	(10) DIEZ TRAMOS VIALES
EL MILAGRO	(2) DOS TRAMOS VIALES
JOSE ANTONIO GALAN	(7) SIETE TRAMOS VIALES
LA CHINITA	(18) DIECIOCHO TRAMOS VIALES
LA LUZ	(10) DIEZ TRAMOS VIALES
LA MAGDALENA	(3) TRES TRAMOS VIALES
LAS NIEVES	(7) SIETE TRAMOS VIALES
LAS PALMAS	(4) CUATRO TRAMOS VIALES
SEVILLA REAL-PUERTA DORADA	(1) UN TRAMO VIAL
VILLA SEVILLA	(1) UN TRAMO VIAL
SEVILLA REAL-SINAÍ	(1) UN TRAMO VIAL

A continuación, la estructura tipo de pavimento, según las condiciones de cada tramo;

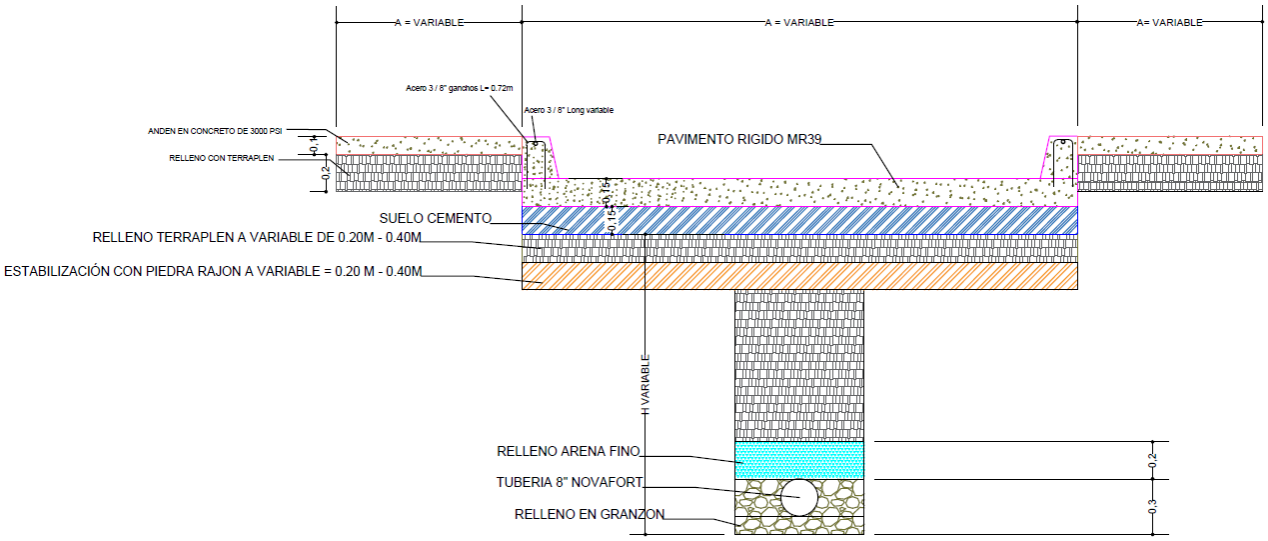

DISEÑO DE VÍA TIPO

Los anchos de vía, andenes y tipo de bordillo, dependerá de las características geométricas de cada tramo vial, así mismo los espesores por si se presenta estabilización de terreno, y las excavaciones de las tuberías que depende de las cotas de los manholes existentes.

- **REPARCHEO DE VIAS**

El reparcheo de las vías consiste en la reposición de losas de concreto que se encuentran en deterioro, localizadas en el suroriente y norte centro histórico de la ciudad, en los barrios, Alboraya, Boyacá, Chiquinquirá, el Campito, El Limón, Jose Antonio Galan, La Magdalena, La Unión, Las Dunas, Las Palmas, Montecristo, Simon Bolivar, Tayrona, con un área total de 7.005 M2, lo cual incluye la reposición de losas mediante la estructura de instalación de concreto fluido de 1.500 PSI en espesor de 15cm y concreto MR-45 acelerado a 3 días en un espesor de losa de 20cm.

- **SELLO DE JUNTAS**

Esta actividad consiste en el sello de juntas y fisuras del pavimento rígido con asfalto, en los tramos viales asignados, la longitud total entregada es de 60.000 ML.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 VIAS NUEVAS – TRAMOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO

Con base a los tramos asignados y priorizados para ejecución por parte de la Entidad Contratante, se han adelantado actividades en los siguientes tramos de vías nuevas:

- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 49, CARRERA 12C ENTRE CALLE 5D Y DIAGONAL 5
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 51, CARRERA 13A ENTRE CALLE 6A Y 6B; CARRERA 13A ENTRE CALLE 7 Y DIAGONAL 5
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 52, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 12C Y 15
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 56, CARRERA 13 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 14, CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 57, CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15
- BARRIO LA MAGDALENA: ITEM 69; CARRERA 7C ENTRE CALLES 36B Y 42 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LA MAGDALENA: ITEM 70; CALLE 38B ENTRE CARRERAS 6B Y 8 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 73, CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 74, CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 75, CARRERA 16A ENTRE CALLES 27A Y 27B (PARQUE EL GUSANITO)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 77, CALLE 22 ENTRE CARRERAS 21B Y 23
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 78, CARRERA 8C ENTRE CALLES 35B Y 38B (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 79, CALLE 35 ENTRE CARRERAS 8 Y 11 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 80, CALLE 35A ENTRE CARRERAS 8 Y 8D (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 81, CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO SEVILLA ITEM No 83, VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 86, CARRERA 12 ENTRE CALLES 12B Y 17
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 89, CARRERA 13 ENTRE CALLES 17 Y 14A
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 90, CARRERA 14 ENTRE CALLES 14A Y 17
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 92, CARRERA 8B ENTRE CALLES 35A Y 35B
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 93, CARRERA 8D ENTRE CALLES 35A Y 35B
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 94, CARRERA 8G ENTRE CALLES 35A Y 35B
- BARRIO MONTECRISTO ITEM No 95, CALLE 50 ENTRE CARRERAS 54 Y 62
- BARRIO TAYRONA ITEM No 101, Carrera 7B1 entre Calles 32 y 34 (RECONSTRUCCIÓN TOTAL)
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 104, CALLE 13 ENTRE CARRERAS 13 Y 15
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 106, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

En la siguiente tabla No1, se relacionan las actividades ejecutadas y el porcentaje de avance en cada uno de los tramos.

ACTIVIDAD	% MEDICIÓN ASIGNADA	OBRAS SEGÚN LISTADO DEL MODULO																													
		49	51	56	57	52	73	74	75	77	78	79	83	80	81	86	88	89	90	92	93	94	95	97	98	99	100	101	103	104
Nivelación y replanteo	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Demolición y/o excavación	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Reposición de tuberias	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	15%	0%	15%
Relleno con material seleccionado	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Suelo cemento	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Concreto MR-39	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%		35%	35%	25%	30%	35%	35%									35%	35%	35%
Concreto MR-45	35%												35%							35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%			
Urbanismo	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	10%	10%

3.2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En la siguiente tabla No 2, se detalla el estado de ejecución de redes que se han intervenido respecto a la actividad de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en las vías nuevas de los tramos mencionados anteriormente.

OBRA No	DIRECCION	LONGITUD EN METROS	BARRIO	LOCALIDAD	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
					ESTADO	¿REQUIERE REPOSICIÓN	ESTADO	¿REQUIERE REPOSICIÓN?
49	CARRERA 12C ENTRE CALLE 5D Y DIAGONAL 5	240	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8" ENTRE DIAG 5 Y CL 7A, INSTALAR PVC 10" ENTRE CL 7A Y 7, INSTALAR PVC 12" Y 8" ENTRE CL 7 Y 5D.	EJECUTADO AL 100%
51	CARRERA 13A ENTRE CALLE 6A Y 6B; CARRERA 13A ENTRE CALLE 7 Y DIAGONAL 5	200	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM - REUBICAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
52	CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 11A CALLE 14 ENTRE CARRERAS 13A Y 15	270	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
53	CALLE 9A ENTRE CARRERAS 10 Y 12A, CARRERA 10 ENTRE CALLES 10 Y DIAGONAL 5	250	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	SI	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
54	CARRERA 10 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 12A	300	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	SI	C EXISTENTE - ACOM C	EJECUTADO AL 100%
55	CARRERA 11 ENTRE CALLES 13 Y 17; CALLE 14 ENTRE LA CARRERA 11 Y ARROYO	250	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	SI	INSTALAR 8" PVC	EJECUTADO AL 100%
56	CARRERA 13 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 14 CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17	450	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
57	CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15	340	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
73	CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION)	160	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
74	CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION)	350	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM - INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
75	CARRERA 16A ENTRE CALLES 27A Y 27B (PARQUE EL GUSANITO)	70	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
77	CALLE 22 ENTRE CARRERAS 21B Y 23	220	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
78	CARRERA 8C ENTRE CALLES 35B Y 38B (RECONSTRUCCION)	240	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8" ENTRE CR35B Y 36B, ODT CR 35A - 35B	EJECUTADO AL 100%
79	CALLE 35 ENTRE CARRERAS 8 Y 11 (RECONSTRUCCION)	150	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
80	CALLE 35A ENTRE CARRERAS 8 Y 8D (RECONSTRUCCION)	200	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	NSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	PVC EXISTENTE	EJECUTADO AL 100%
81	CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCION)	300	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
83	VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL	450	VILLA SEVILLA	METROPOLITANA	INSTALAR PEAD 110 MM - REUBICAR PEAD 110 MM - REUBICAR PEAD 200 MM	N/A	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
86	CARRERA 12 ENTRE CALLES 12B Y 17	290	LA CHINITA	SURORIENTE	INSTALAR 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
89	CARRERA 13 ENTRE CALLES 17 Y 14A	170	LA CHINITA	SURORIENTE	INSTALAR 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
90	CARRERA 14 ENTRE CALLES 14A Y 17	150	LA CHINITA	SURORIENTE	INSTALAR 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%

3.3 CANTIDADES EJECUTADAS

En el anexo No1, se relacionan las cantidades ejecutadas a la fecha sobre el formato de presupuesto contractual.

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

3.4 AVANCE FISICO

En la tabla No.3 se presenta el avance físico de la obra periodo del 01 al 31 de enero de 2026, en el cual refleja el porcentaje programado vs al ejecutado.


MODULO 1	MENSUAL		ACUMULADO	
	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%
PROGRAMADO	$ 3.125.127.031,80	17%	$ 52.085.450.530,00	100%
EJECUTADO	$ 1.680.851.526,00	31%	$ 50.876.866.513,45	99%

3.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo se realizaron ensayo de resistencia a la flexión y tracción del concreto, diseño de suelo cemento con el material a emplear en la estructura de vía tipo. En el anexo No 2 se presentan los resultados del control de calidad.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2026.

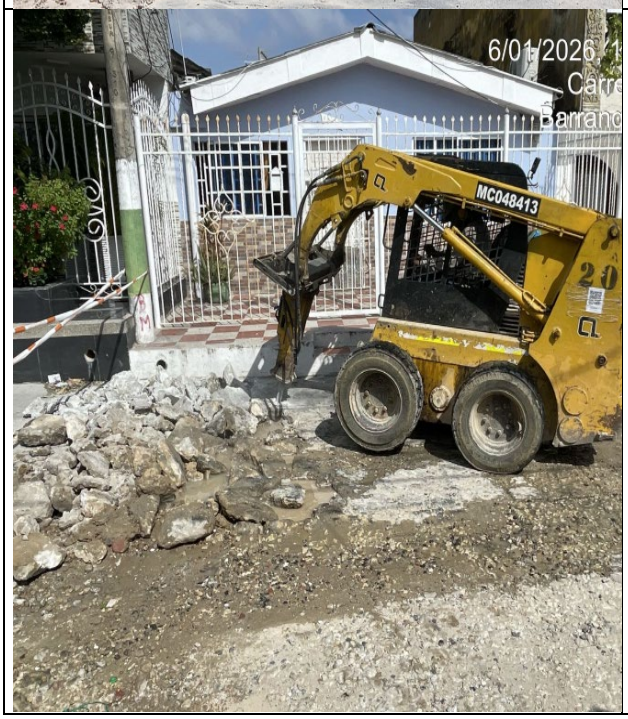DEMOLICIÓN VIAS	
	
	

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

EXCAVACIONES VIAS









Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

INSTALACIÓN DE CONCRETO FLUIDO 1500 PSI	
	
ONCRETO MR-45 Y MR-39	

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2



5. ANEXOS

Se anexan los siguientes documentos correspondientes al informe mensual No. 9

- Anexo No1. Cuadro de cantidades
- Anexo No2. Resultados de laboratorio
- Anexo No3. Correspondencia enviada
- Anexo No4. Correspondencia recibida
- Anexo No5. Bitácora de obra.

MODULO I
INFORME MENSUAL No 10
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

PROYECTO

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I"

ELABORA
CONSORCIO VIAS URBANAS BQ

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 3
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 3
2.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
2.3 ALCANCE DEL CONTRATO 5
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 6
3.1 VIAS NUEVAS – TRAMOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO 6
3.2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 8
3.3 CANTIDADES EJECUTADAS 9
3.4 AVANCE FISICO 10
3.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 10
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 11
5. ANEXOS 14

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el proyecto "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I" este informe contiene los aspectos técnicos, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el contrato NO. LP-026-2024 LOTE 1.

El acta de inicio del contrato fue impartida desde el 01 de mayo del 2025, el presente informe mensual No 10 corresponde al periodo de trabajo entre el 01 al 28 de febrero del año 2026.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Este contrato hace parte de la implementación del programa "**Barrios a la Obra – Etapa IX**", una iniciativa estratégica del Distrito de Barranquilla orientada a mejorar la infraestructura vial y las condiciones urbanísticas de los diferentes barrios, y localidades. El objetivo principal de este proyecto es la construcción, reconstrucción, mejoramiento y/o rehabilitación de tramos de vías urbanas, mediante la utilización de pavimento en concreto rígido con su debido urbanismo, garantizando una solución duradera y segura para el tránsito vehicular y peatonal. Además de las vías, el contrato contempla la intervención de canales, box coulvert y otras obras complementarias, necesarias para el adecuado manejo del agua y la sostenibilidad de las obras viales. Estas acciones están dirigidas a mejorar la movilidad urbana, facilitar el acceso a los barrios, reducir tiempos de desplazamiento y contribuir significativamente al desarrollo urbano integral de la ciudad.
El proyecto también incluye actividades de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial perimetral de la ciudad, con el objetivo de incrementar la vida útil de los pavimentos existentes y preservar la inversión pública mediante una gestión eficiente de los recursos de infraestructura.

2.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Número del contrato:	Contrato LP-026-2024 LOTE 1
Objeto del contrato:	**OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULO I**
Contratante:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Contratista de obra:	CONSORCIO VIAS URBANAS BQ
NIT Contratista:	901. 940.706-2
Interventoría:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. N.I.T No.800.091.140-4
Supervisor:	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Valor del Contrato:	CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS $52.033.303.778
Adiciones:	N/A
Valor del Contrato Actualizado:	CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINA Y UN PESOS $52.085.450.531
Plazo:	Dieciocho (18) meses
Fecha de inicio:	01 de mayo de 2025
Fecha de terminación actual del contrato:	
Dirección:	Calle 77B No 57 -141 piso 11
Póliza	CUMPLIMIENTO: BQ-100102117 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: BQ-100028579 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

2.3 ALCANCE DEL CONTRATO


El Consorcio convendrá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-026-2024 LOTE 1, MODULO I, los cuales conforman parte integral del presente contrato. Dentro del alcance del contrato específico para el Módulo I, se incluye lo siguiente:

- **Construcción de vías nuevas**

Este contrato consiste en la construcción de 84 tramos de vías nuevas en las localidades de sur occidente, sur oriente y metropolitana, con una longitud total a intervenir de 15.736 ML, de los cuales se realizará reposición y/o reubicación de redes de acueducto y alcantarillado, los tramos a intervenir están conformados de la siguiente manera:

BARRIO	**No DE TRAMOS VIALES**
VILLA SAN PEDRO ALEJANDRINO	(7) SIETE TRAMOS VIALES
BELLA ARENA	(3) TRES TRAMOS VIALES
BOYACA	(1) UN TRAMO VIAL
BUENOS AIRES	(6) SEIS TRAMOS VIALES
CIUDADELA 20 DE JULIO	(3) TRES TRAMOS VIALES
EL FERRY	(10) DIEZ TRAMOS VIALES
EL MILAGRO	(2) DOS TRAMOS VIALES
JOSE ANTONIO GALAN	(7) SIETE TRAMOS VIALES
LA CHINITA	(18) DIECIOCHO TRAMOS VIALES
LA LUZ	(10) DIEZ TRAMOS VIALES
LA MAGDALENA	(3) TRES TRAMOS VIALES
LAS NIEVES	(7) SIETE TRAMOS VIALES
LAS PALMAS	(4) CUATRO TRAMOS VIALES
SEVILLA REAL-PUERTA DORADA	(1) UN TRAMO VIAL
VILLA SEVILLA	(1) UN TRAMO VIAL
SEVILLA REAL-SINAÍ	(1) UN TRAMO VIAL

A continuación, la estructura tipo de pavimento, según las condiciones de cada tramo;

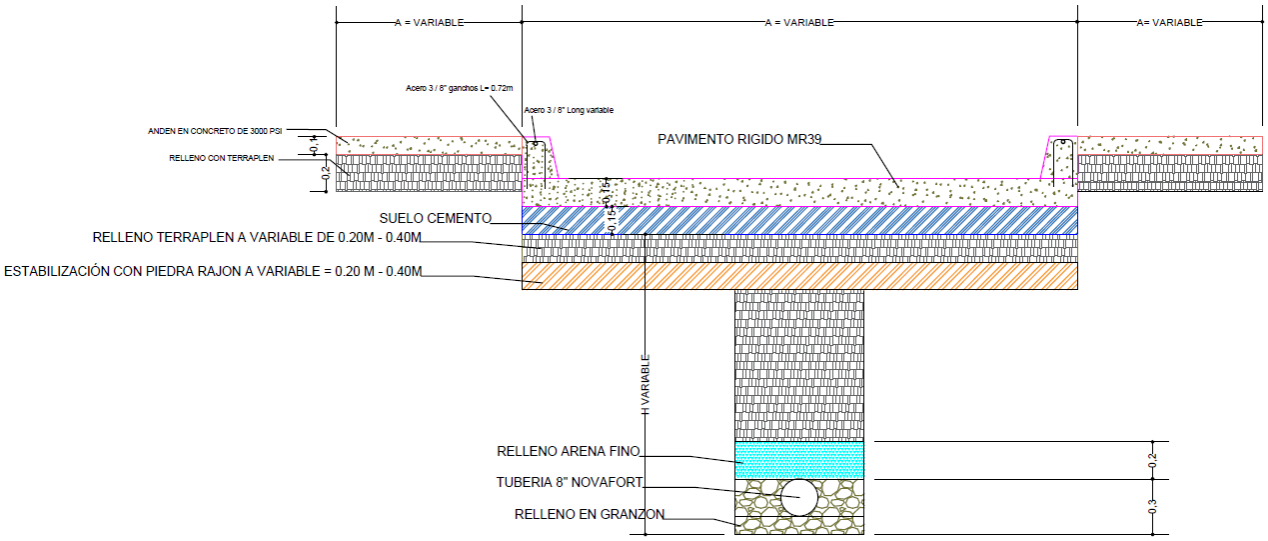

DISEÑO DE VÍA TIPO

Los anchos de vía, andenes y tipo de bordillo, dependerá de las características geométricas de cada tramo vial, así mismo los espesores por si se presenta estabilización de terreno, y las excavaciones de las tuberías que depende de las cotas de los manholes existentes.

- **REPARCHEO DE VIAS**

El reparcheo de las vías consiste en la reposición de losas de concreto que se encuentran en deterioro, localizadas en el suroriente y norte centro histórico de la ciudad, en los barrios, Alboraya, Boyacá, Chiquinquirá, el Campito, El Limón, Jose Antonio Galan, La Magdalena, La Unión, Las Dunas, Las Palmas, Montecristo, Simon Bolivar, Tayrona, con un área total de 7.005 M2, lo cual incluye la reposición de losas mediante la estructura de instalación de concreto fluido de 1.500 PSI en espesor de 15cm y concreto MR-45 acelerado a 3 días en un espesor de losa de 20cm.

- **SELLO DE JUNTAS**

Esta actividad consiste en el sello de juntas y fisuras del pavimento rígido con asfalto, en los tramos viales asignados, la longitud total entregada es de 60.000 ML.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 VIAS NUEVAS – TRAMOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO

Con base a los tramos asignados y priorizados para ejecución por parte de la Entidad Contratante, se han adelantado actividades en los siguientes tramos de vías nuevas:

- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 49, CARRERA 12C ENTRE CALLE 5D Y DIAGONAL 5
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 51, CARRERA 13A ENTRE CALLE 6A Y 6B; CARRERA 13A ENTRE CALLE 7 Y DIAGONAL 5
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 52, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 12C Y 15
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 56, CARRERA 13 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 14, CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 57, CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15
- BARRIO LA MAGDALENA: ITEM 69; CARRERA 7C ENTRE CALLES 36B Y 42 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LA MAGDALENA: ITEM 70; CALLE 38B ENTRE CARRERAS 6B Y 8 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 73, CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 74, CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 75, CARRERA 16A ENTRE CALLES 27A Y 27B (PARQUE EL GUSANITO)
- BARRIO LAS NIEVES: ITEM No 77, CALLE 22 ENTRE CARRERAS 21B Y 23
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 78, CARRERA 8C ENTRE CALLES 35B Y 38B (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 79, CALLE 35 ENTRE CARRERAS 8 Y 11 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 80, CALLE 35A ENTRE CARRERAS 8 Y 8D (RECONSTRUCCION)
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 81, CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCION)
- BARRIO SEVILLA ITEM No 83, VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 86, CARRERA 12 ENTRE CALLES 12B Y 17
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 89, CARRERA 13 ENTRE CALLES 17 Y 14A
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 90, CARRERA 14 ENTRE CALLES 14A Y 17
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 92, CARRERA 8B ENTRE CALLES 35A Y 35B
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 93, CARRERA 8D ENTRE CALLES 35A Y 35B
- BARRIO LAS PALMAS ITEM No 94, CARRERA 8G ENTRE CALLES 35A Y 35B
- BARRIO MONTECRISTO ITEM No 95, CALLE 50 ENTRE CARRERAS 54 Y 62
- BARRIO TAYRONA ITEM No 101, Carrera 7B1 entre Calles 32 y 34 (RECONSTRUCCIÓN TOTAL)
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 104, CALLE 13 ENTRE CARRERAS 13 Y 15
- BARRIO LA CHINITA: ITEM No 106, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

En la siguiente tabla No1, se relacionan las actividades ejecutadas y el porcentaje de avance en cada uno de los tramos.

ACTIVIDAD	% MEDICIÓN ASIGNADA	OBRAS SEGÚN LISTADO DEL MODULO																													
		49	51	56	57	52	73	74	75	77	78	79	83	80	81	86	88	89	90	92	93	94	95	97	98	99	100	101	103	104
Nivelación y replanteo	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Demolición y/o excavación	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Reposición de tuberias	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	15%	0%	15%
Relleno con material seleccionado	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Suelo cemento	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Concreto MR-39	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%		35%	35%	25%	30%	35%	35%									35%	35%	35%
Concreto MR-45	35%												35%							35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%			
Urbanismo	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	10%	10%

3.2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En la siguiente tabla No 2, se detalla el estado de ejecución de redes que se han intervenido respecto a la actividad de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en las vías nuevas de los tramos mencionados anteriormente.

OBRA No	DIRECCION	LONGITUD EN METROS	BARRIO	LOCALIDAD	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
					ESTADO	¿REQUIERE REPOSICIÓN	ESTADO	¿REQUIERE REPOSICIÓN?
49	CARRERA 12C ENTRE CALLE 5D Y DIAGONAL 5	240	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8" ENTRE DIAG 5 Y CL 7A, INSTALAR PVC 10" ENTRE CL 7A Y 7, INSTALAR PVC 12" Y 8" ENTRE CL 7 Y 5D.	EJECUTADO AL 100%
51	CARRERA 13A ENTRE CALLE 6A Y 6B; CARRERA 13A ENTRE CALLE 7 Y DIAGONAL 5	200	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM - REUBICAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
52	CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 11A CALLE 14 ENTRE CARRERAS 13A Y 15	270	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
53	CALLE 9A ENTRE CARRERAS 10 Y 12A, CARRERA 10 ENTRE CALLES 10 Y DIAGONAL 5	250	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	SI	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
54	CARRERA 10 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 12A	300	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	SI	C EXISTENTE - ACOM C	EJECUTADO AL 100%
55	CARRERA 11 ENTRE CALLES 13 Y 17; CALLE 14 ENTRE LA CARRERA 11 Y ARROYO	250	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	SI	INSTALAR 8" PVC	EJECUTADO AL 100%
56	CARRERA 13 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 14 CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17	450	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
57	CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15	340	LA CHINITA	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
73	CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION)	160	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
74	CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION)	350	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM - INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
75	CARRERA 16A ENTRE CALLES 27A Y 27B (PARQUE EL GUSANITO)	70	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 90 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
77	CALLE 22 ENTRE CARRERAS 21B Y 23	220	LAS NIEVES	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
78	CARRERA 8C ENTRE CALLES 35B Y 38B (RECONSTRUCCION)	240	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8" ENTRE CR35B Y 36B, ODT CR 35A - 35B	EJECUTADO AL 100%
79	CALLE 35 ENTRE CARRERAS 8 Y 11 (RECONSTRUCCION)	150	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
80	CALLE 35A ENTRE CARRERAS 8 Y 8D (RECONSTRUCCION)	200	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	NSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	PVC EXISTENTE	EJECUTADO AL 100%
81	CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCION)	300	LAS PALMAS	SUR ORIENTE	INSTALAR PEAD 110 MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
83	VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL	450	VILLA SEVILLA	METROPOLITANA	INSTALAR PEAD 110 MM - REUBICAR PEAD 110 MM - REUBICAR PEAD 200 MM	N/A	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
86	CARRERA 12 ENTRE CALLES 12B Y 17	290	LA CHINITA	SURORIENTE	INSTALAR 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
89	CARRERA 13 ENTRE CALLES 17 Y 14A	170	LA CHINITA	SURORIENTE	INSTALAR 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%
90	CARRERA 14 ENTRE CALLES 14A Y 17	150	LA CHINITA	SURORIENTE	INSTALAR 90MM	EJECUTADO AL 100%	INSTALAR PVC 8"	EJECUTADO AL 100%

3.3 CANTIDADES EJECUTADAS

En el anexo No1, se relacionan las cantidades ejecutadas a la fecha sobre el formato de presupuesto contractual.

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

3.4 AVANCE FISICO

En la tabla No.3 se presenta el avance físico de la obra periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, en el cual refleja el porcentaje programado vs al ejecutado.

MODULO 1	MENSUAL		ACUMULADO	
	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%
PROGRAMADO	$ 1.208.584.016,55	99%	$ 52.085.450.530,00	100%
EJECUTADO	$ 1.040.200.010,00	98%	$ 51.045.250.520,00	99%


3.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD


Durante el periodo se realizaron ensayo de resistencia a la flexión y tracción del concreto, diseño de suelo cemento con el material a emplear en la estructura de vía tipo. En el anexo No 2 se presentan los resultados del control de calidad.


4. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026.

DEMOLICIÓN VIAS

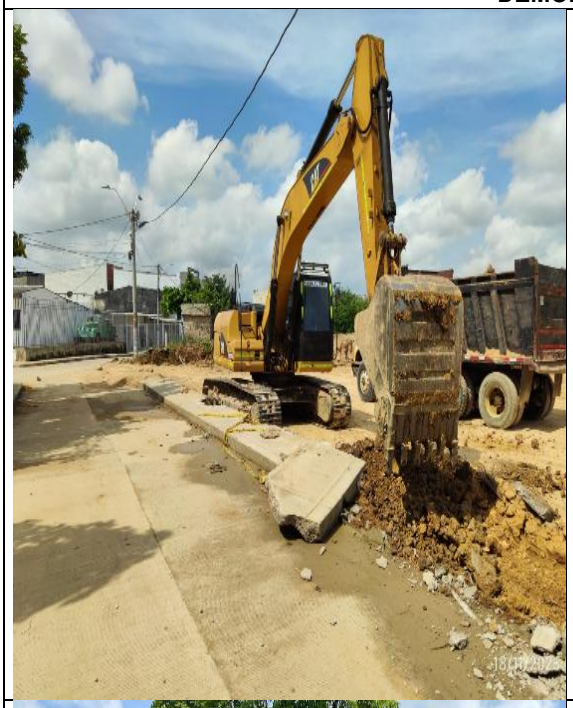

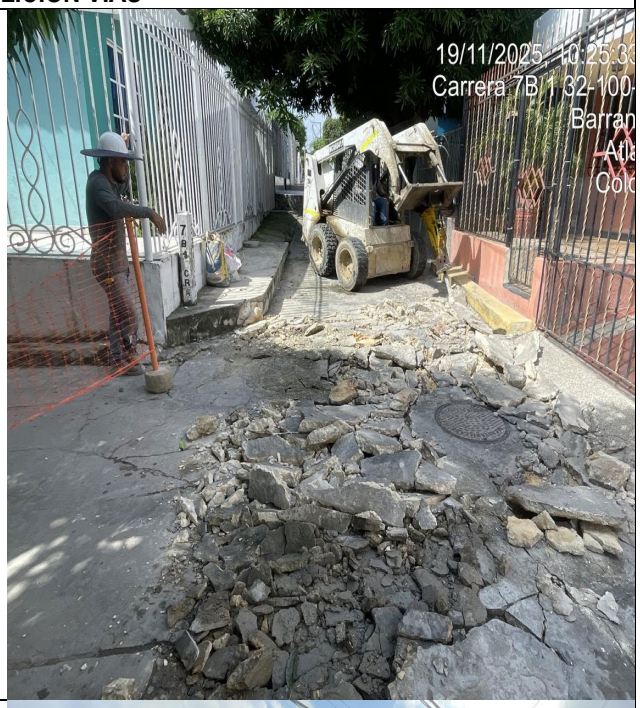

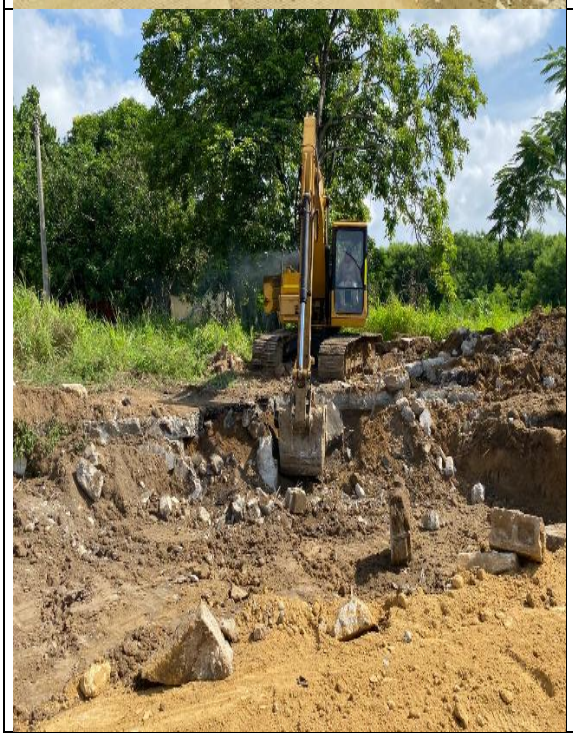



Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

EXCAVACIONES VIAS









Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2

VIAS URBANAS BQ
CONSORCIO

INSTALACIÓN DE CONCRETO FLUIDO 1500 PSI	
	
CONCRETO MR-45 Y MR-39	

Dirección: CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS 1
Teléfonos: (6 0 5) 3 6 8 3 0 1 8 - 320 5371087
Correo de correspondencia: convias.global@gmail.com
Nit: 901940706-2






5. ANEXOS

Se anexan los siguientes documentos correspondientes al informe mensual No. 10

- Anexo No1. Cuadro de cantidades
- Anexo No2. Resultados de laboratorio
- Anexo No3. Correspondencia enviada
- Anexo No4. Correspondencia recibida
- Anexo No5. Bitácora de obra.

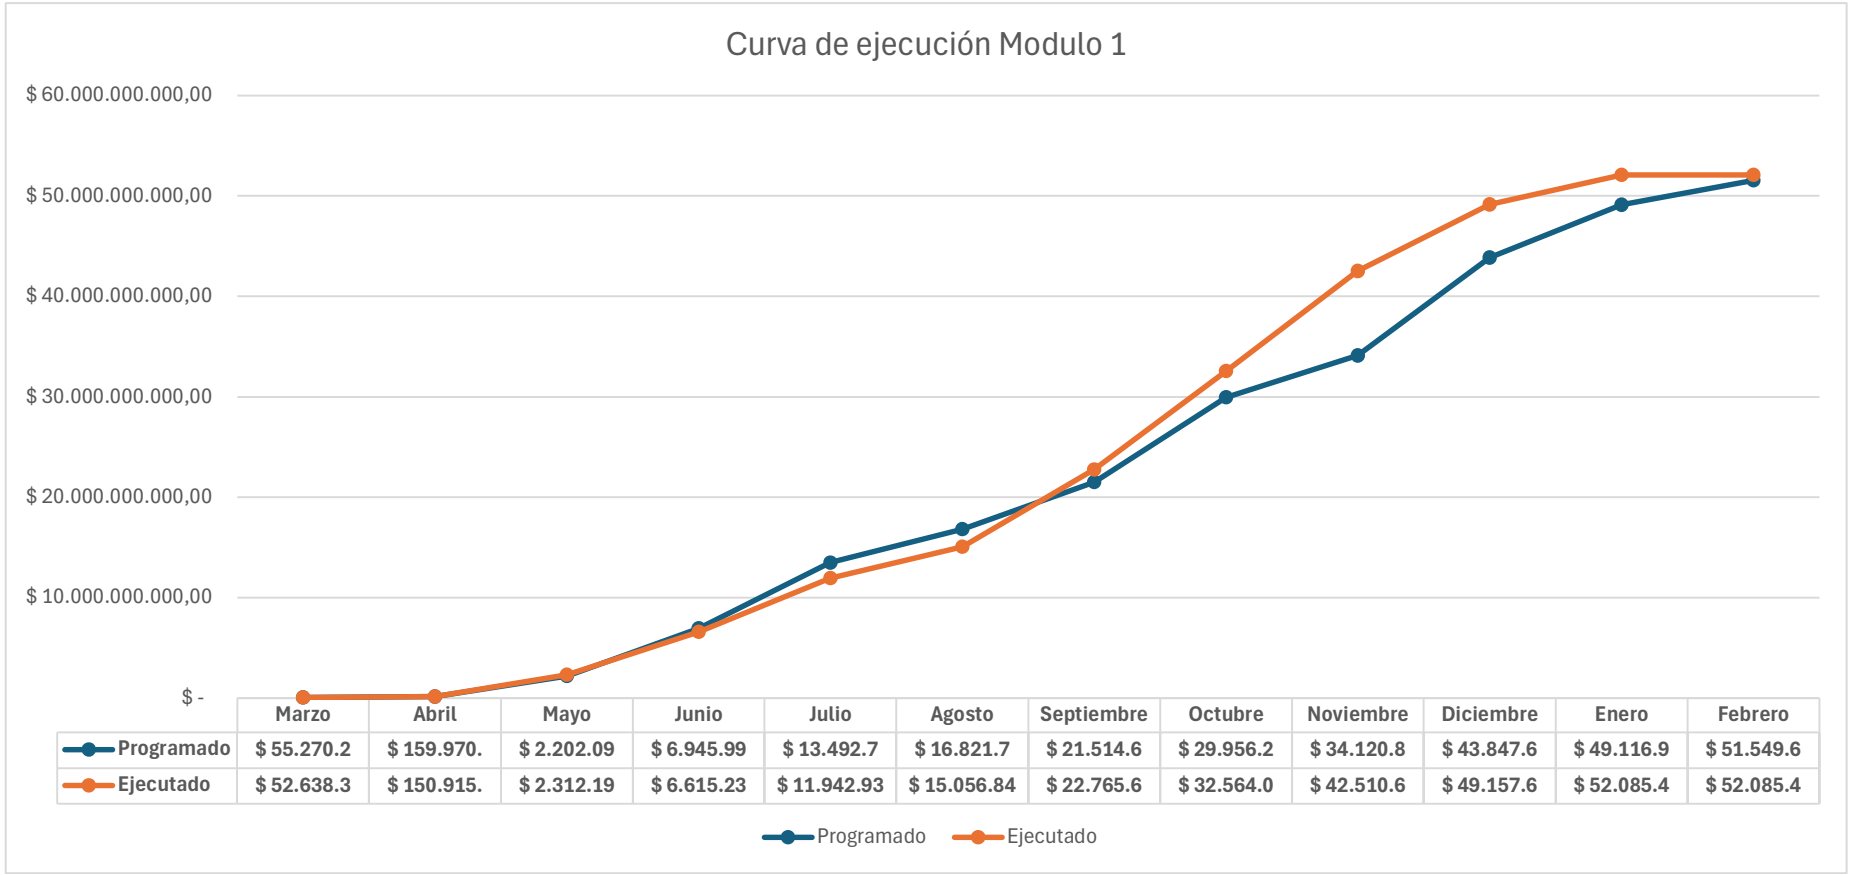

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
Programado	$ 55.270.2	$ 159.970.	$ 2.202.09	$ 6.945.99	$ 13.492.7	$ 16.821.7	$ 21.514.6	$ 29.956.2	$ 34.120.8	$ 43.847.6	$ 49.116.9	$ 51.549.6
Ejecutado	$ 52.638.3	$ 150.915.	$ 2.312.19	$ 6.615.23	$ 11.942.93	$ 15.056.84	$ 22.765.6	$ 32.564.0	$ 42.510.6	$ 49.157.6	$ 52.085.4	$ 52.085.4
