INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 02 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 577.713.381,00 **MES** 01 de diciembre 2025 - 20 enero 2026

ACTA FINAL ☐ 1 de 2 .

CONTRATO No : 08092025-1474 (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1102 DE 2022** INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 2.985.597.695,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.985.597.695,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1	5	200.1.1	E	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0,95	$ 3.766.429,00	$ 3.578.108,00				$ -	0,20	$ 753.286,00
2	5	600.1.1	OA	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	14,00	$ 72.976,00	$ 1.021.664,00			9,80	$ 715.165,00	13,40	$ 977.879,00
3	5	600.2.1	OA	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	14,00	$ 106.168,00	$ 1.486.352,00			9,80	$ 1.040.446,00	13,40	$ 1.422.651,00
4	5	600.2.2	OA	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3	7,00	$ 114.667,00	$ 802.669,00				$ -		$ -
5	5	111,P	OV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO TABLA 18M2	U	1,00	$ 3.213.374,00	$ 3.213.374,00				$ -	1,00	$ 3.213.374,00
				CAPITULO 2. OBRAS GEOTECNICAS								$ -		
6	6	621.1.1P	OA	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1M (incluye excavación en roca, bajo agua manual)	m	52,00	$ 5.024.927,00	$ 261.296.204,00			52,00	$ 261.296.204,00	52,00	$ 261.296.204,00
7	5	104.P	OV	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 9	m2	410,35	$ 401.363,00	$ 164.699.307,00				$ -		$ -
8	5	105.P	OV	Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 8	m2	398,58	$ 400.166,00	$ 159.498.164,00				$ -		$ -
9	5	106.P	OV	Sumunistro e instalacion de perno 1" con rosca para anclaje de malla (Incluye perforacion)	m2	448,00	$ 265.945,00	$ 119.143.360,00				$ -		$ -
10	5	107.P	OV	Suminstro e instalacion de manto permanente para el control de la erosion	m2	808,93	$ 63.465,00	$ 51.338.742,00				$ -		$ -
				CAPITULO 3. ESTRUCTURA PUENTE								$ -		
11	6	630.1.3.1	OA	TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	61,77	$ 820.945,00	$ 50.709.773,00				$ -		$ -
12	4	640.1	OA	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	13.097,31	$ 8.014,00	$ 104.961.842,00			3.848,10	$ 30.838.673,00	5.348,30	$ 42.861.276,00
13	5	101.P	OA	FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	54.568,26	$ 18.981,00	$ 1.035.760.143,00			14.953,00	$ 283.822.893,00	38.952,90	$ 739.364.995,00
14	5	102.P	OA	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)	kg	54.568,26	$ 16.591,00	$ 905.342.002,00				$ -		$ -
15	5	103.P	OA	Suministro e instalacion de lamina steel deck 2" cal. 18	m2	182,16	$ 143.401,00	$ 26.121.926,00				$ -		$ -
16	8	108.P	OA	Suministro e instalacion de neopreno tipo 1 de 360X360X112 mm, dureza 60, platinas 560X560X25 mm (9 capas neopreno 8 mm, 10 capas platina 3 mm, recubrimiento 5 mm)	m2	4,00	$ 5.588.830,00	$ 22.355.320,00				$ -		$ -
17	8	109.P	OA	Prueba de carga (Incluye volquetas, material cargado, transporte, equipos de medicion y personal de topografia)	m2	1,00	$ 10.467.478,00	$ 10.467.478,00				$ -		$ -
				CAPITULO 4. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								$ -		
18	8	710.1.1	SCT	Señal vertical de transito tipo sr, sp y/o si, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo iv (75x75 cm)	U	14,00	$ 1.165.331,00	$ 16.314.634,00				$ -		$ -
19	8	110.P	SCT	Reductor de velocidad 100X35X50 mm (Incluye reductor, elementos de anclaje, equipos y mano de obra)	U	7,72	$ 362.940,00	$ 2.801.897,00				$ -		$ -
				VALOR TOTAL				**$ 2.940.912.959,00**				**$ 577.713.381,00**		**$ 1.049.889.665,00**
*	**PGIO**							$ 44.684.736,00						
*														
*	**VALOR TOTAL**							**$ 2.985.597.695,00**				**$ 577.713.381,00**		**$ 1.049.889.665,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 34,00%
Utilidad 5,00%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 588.182.592,00	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 115.542.676,00	20,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 209.977.933,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 378.204.659,00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 1.755.611,00		$ 1.755.611
CAPITULO 2. OBRAS GEOTECNICAS	$ 261.296.204,00		$ 261.296.204
CAPITULO 3. ESTRUCTURA PUENTE	$ 314.661.566,00		$ 314.661.566
CAPITULO 4. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ -		$ -
PGIO	$ -		$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 577.713.381,00**	**$ -**	**$ 577.713.381**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 753.286
SB	$ -	$ -
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ 577.713.381	$ 1.045.923.005
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ 3.213.374
T	$ -	$ -
TOTAL	**$ 577.713.381**	**$ 1.049.889.665**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11104	$ -	$ -
11401	$ -	$ -
14101	$ 1.755.611	$ 6.367.190
14102	$ 261.296.204	$ 261.296.204
14103	$ 314.661.566	$ 782.226.271
		$ -
		$ -
		$ -
TOTAL	**$ 577.713.381**	**$ 1.049.889.665**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 577.713.381,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 462.170.705,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 462.170.705 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Se deja constancia que mediante comunicado del 29 de octubre de 2025 con código **DSI 1702 con asunto– ACLARACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ÍTEMS 108.P Y 109.P**, la Gobernación de Caldas aclara la unidad de medida para los ítems 108.P y 109.P corresponde a UND y no a m2 como aparece en la presente acta

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 171037-0598598 VLL

Firma:
Nombre:JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-239732CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. 2 (MEMORIAS DE CÁLCULO)

CONTRATO No. 08092025-1474

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
INTERVENTOR CONSORCIO GINPRO INV 199/22

No.	2	ítem	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNIDAD:	m3

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A 15 DE ENERO 2026

Registro fotográfico	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
	7,00	1,60	1,75	50%	9,80	9,80	EXCAVACION PARA VIGA CABEZAL TUNEL 8
					0,00	9,80	
					0,00	9,80	
					0,00	9,80	
					0,00	9,80	

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. 2 (MEMORIAS DE CÁLCULO)

CONTRATO No. 08092025-1474

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
INTERVENTOR CONSORCIO GINPRO INV 199/22

No.	3	ítem	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	UNIDAD:	m3

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A 15 DE ENERO 2026

Registro fotográfico	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
	7,00	1,60	1,75	50,00%	9,80	9,80	EXCAVACION PARA VIGA CABEZAL TUNEL 8
					0,00	9,80	
					0,00	9,80	
					0,00	9,80	
					0,00	9,80	

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. 2 (MEMORIAS DE CÁLCULO)

CONTRATO No. 08092025-1474

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
INTERVENTOR CONSORCIO GINPRO INV 199/22

No.	6	ítem	621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1M (incluye excavación en roca, bajo agua manual)	UNIDAD:	m

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A 15 DE ENERO 2026

Registro fotográfico





VACIADO DE CAISSONS 1 Y 2





VACIADO DE CAISSONS 3 Y 4

Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad		Área	
13,00			2	26,00	26,00	TUNEL 8
13,00			2	26,00	52,00	TUNEL 9

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. 2 (MEMORIAS DE CÁLCULO)

CONTRATO No. 08092025-1474

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
INTERVENTOR CONSORCIO GINPRO INV 199/22

No.	12	ítem	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	UNIDAD:	kg

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A 15 DE ENERO 2026

Registro fotográfico










Medidas					Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
Longitud	Cantidad	Diametro	Peso	Unidad			
15,70	10,00	7/8"	2,930	2,00	920,02	920,02	LONGITUDINAL TRAMO COMPLETO CAISSONS 2 y 4
9,90	10,00	7/8"	2,930	2,00	580,14	1.500,16	LONGITUDINAL TRAMO SUPERIOR CAISSON 2 y 4
2,83	162,00	1/2"	0,973	4,00	1.784,33	3.284,49	ESPIRAL SENCILLA DESDE FONDO HASTA 11M DE CAISSON CADA 7,5CM. CAISSONS 1, 2, 3, 4
2,83	32,00	1/2"	0,973	4,00	352,46	3.636,95	ESPIRAL SENCILLA ENTRE 11 Y 13M DE CAISSON CADA 7,0CM. CAISSONS 1, 2, 3, 4
4,24	2,00	1/2"	0,973	4,00	33,00	3.669,95	1,5 VUELTAS ADICIONALES DE ESPIRAL EN LOS EXTREMOS DEL CAISSON. CAISSONS 1, 2, 3, 4
0,88	52,00	1/2"	0,973	4,00	178,10	3.848,05	GANCHOS Y TRASLAPOS POR CAMBIO DE ESPIRAL. CAISSONS 1, 2, 3, 4
TOTAL ACTA NRO. 1					***3.848,10***		


WILSON ALBERTO OBANDO QUINTERO
Residente de obra

EDISON JAIVER DÍAZ NAVARRO
Residente de Interventoria

RECOMENDACION DE ACERO EN ESPIRAL

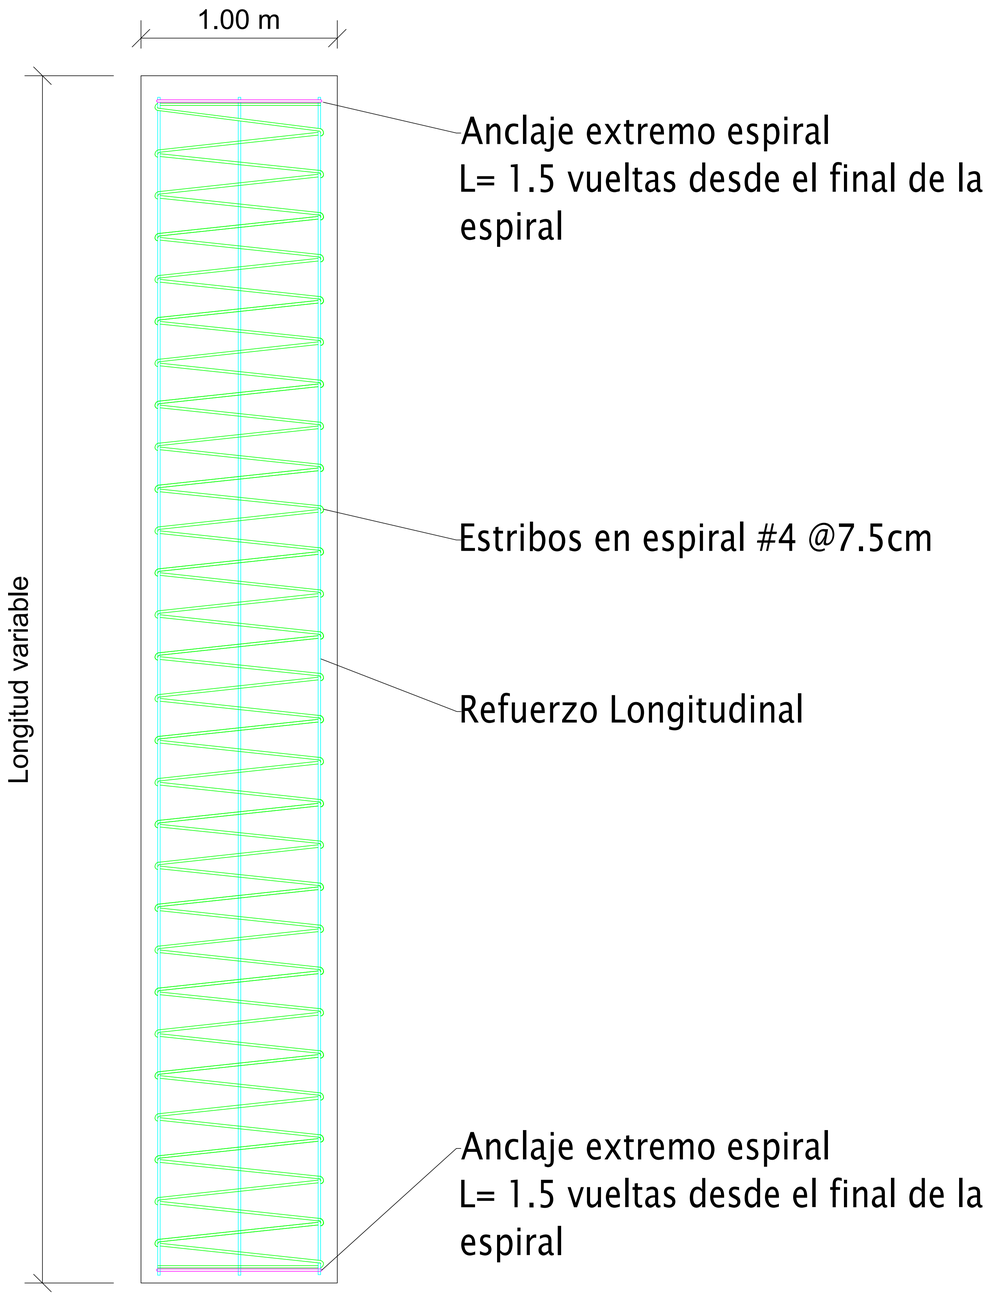


DETALLE ANCLAJE EN LOS EXTREMOS DE LA ESPIRAL

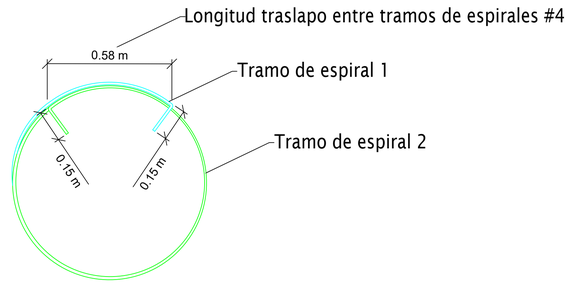

DETALLE TRASLAPO ESPIRALES

DISTRIBUCIÓN DE ACERO LONGITUDINAL

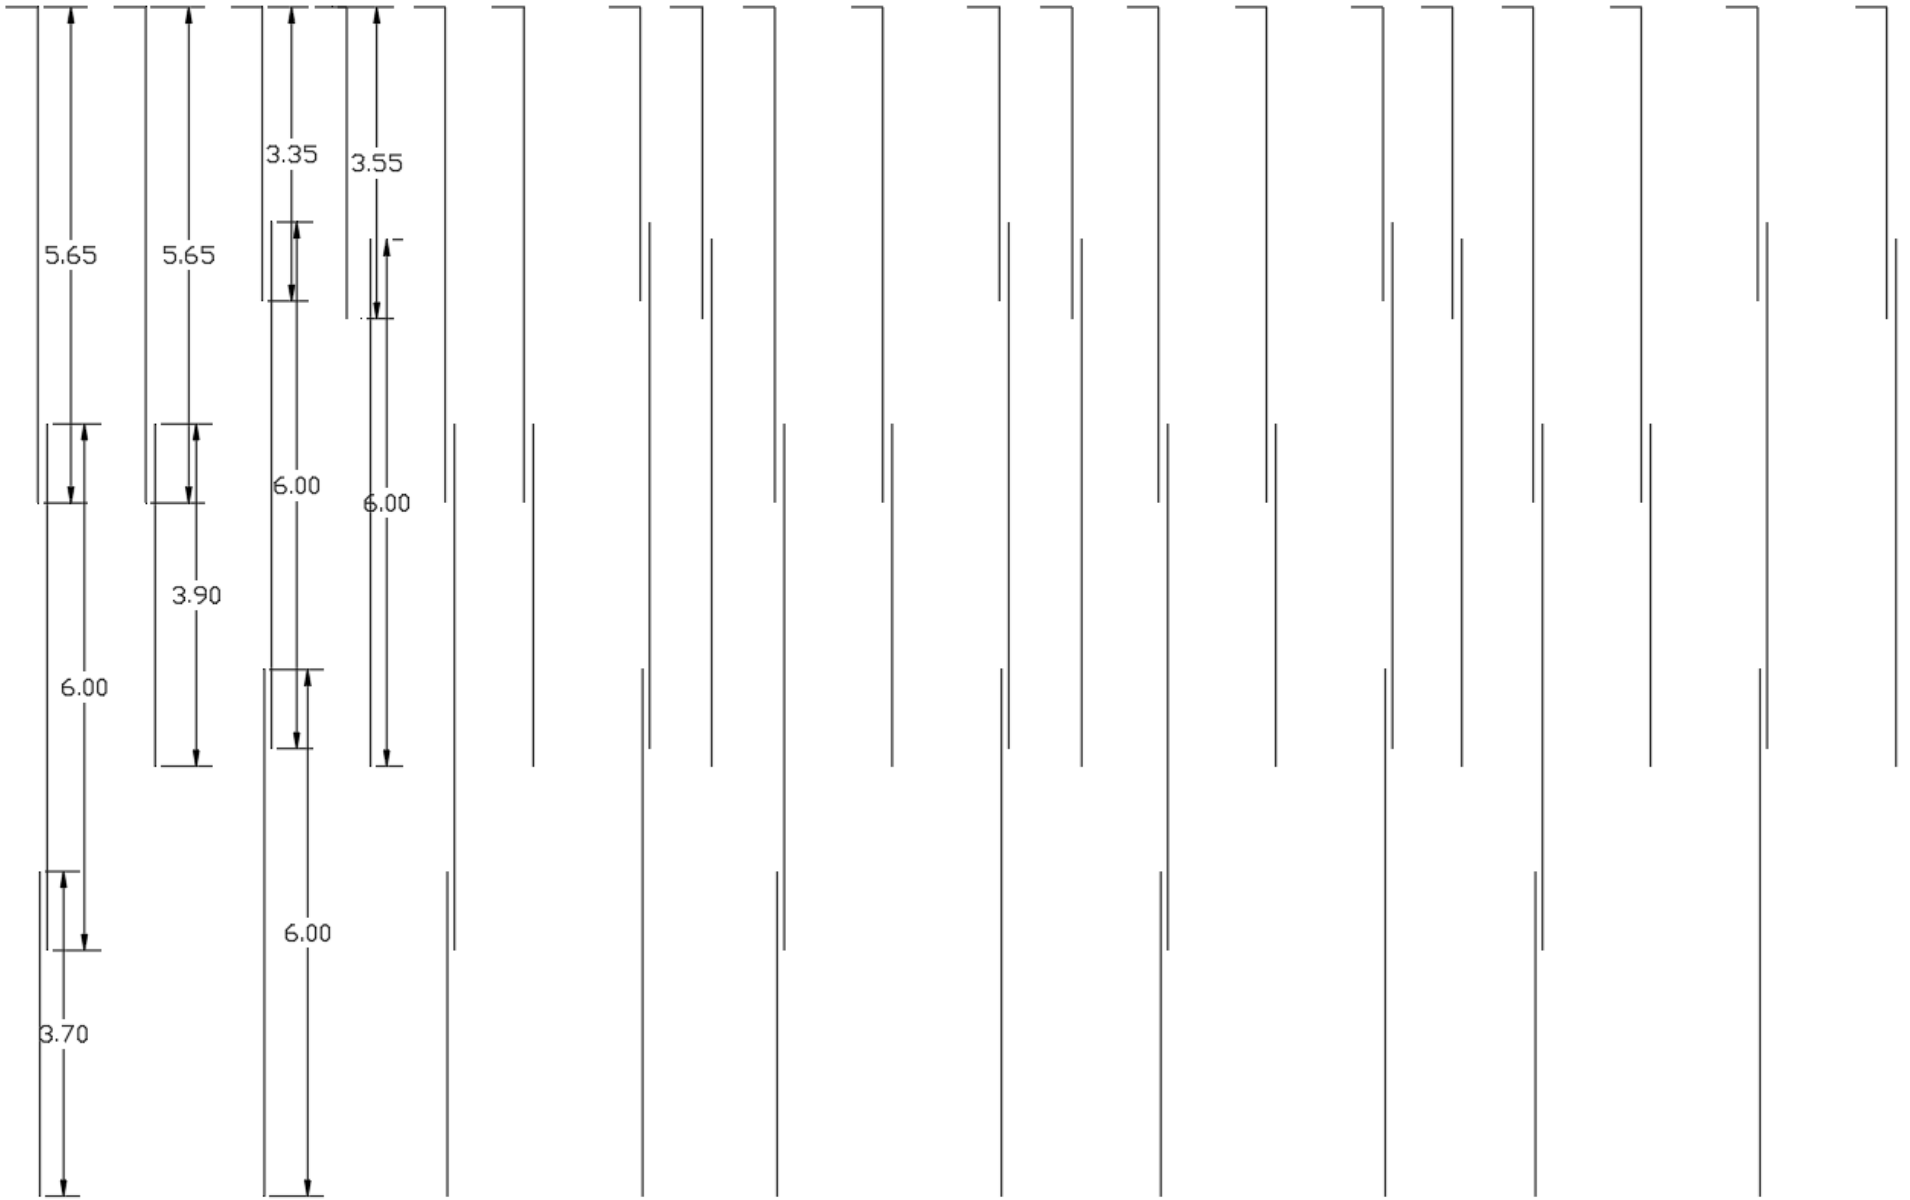

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. 2 (MEMORIAS DE CÁLCULO)

CONTRATO No. 08092025-1474

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ. LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
INTERVENTOR CONSORCIO GINPRO INV 199/22

No.	**13**	**ítem**	**101.P**	**FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalación, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra)**	**UNIDAD:**	**kg**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A 15 DE ENERO 2026

Registro fotográfico	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Cantidad**	**Peso**	**Unidad**			
AVANCE EN FABRICACIÓN							
	3,300	22,00	32,78		2.379,83	2.379,83	(2) VERTICAL - TUBO DE 100X150X8MM ASTM A-500 Gr.C
	2,43	44,00	12,20		1.301,74	3.681,57	(7) PUNTAL - ANGULO L4X5/16 ASTM A-572 Gr.50
	5,37	8,00	12,20		524,11	4.205,68	(8) CONTRAVIENTOS - L4x5/16
	7,54	16,00	12,20		1.471,81	5.677,49	(9) CONTRAVIENTOS - L4x5/16
	5,54	4,00	12,20		270,35	5.947,84	(10) CONTRAVIENTOS - L4x5/16

AVANCE EN ARMADO DE ESTRUCTURA




AVANCE EN ARMADO DE ESTRUCTURA

AVANCE EN CORTE TUBO DE 15X100X8MM




PRUEBAS DE TINTAS

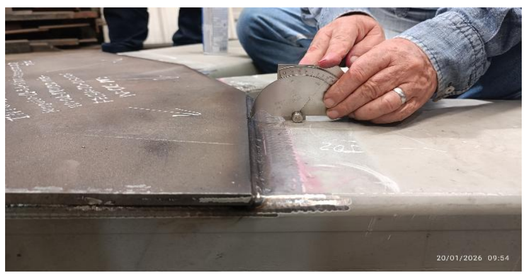

CHEQUEO ESPESORES DE SOLDADURA



ELEMENTOS L4X5/16



CANTIDAD PARA COBRO						
	5,00%	5.947,84		297,39	297,39	GESTION ADMINISTRATIVA
	85,00%	5.947,84		5.055,66	5.353,05	AVANCE EN FABRICACIÓN
	40,00%	23.999,90		9.599,96	14.953,01	AJUSTE A ESTRUCTURA PAGADA EN ACTA No. 1

NOTA: la actividad "Fabricación y suministro de la estructura metálica del Puente" es el 100%, discriminados así:
1. Gestión administrativa (Planos de taller y compra de materiales) 5%
2. Fabricación 85%
3. Limpieza y acabado 5%
4. Transporte 5%

TOTAL ACTA NRO. 1										***14.953,00***	

WILSON ALBERTO OBANDO QUINTERO
Residente de obra

EDISON JAIVER DÍAZ NAVARRO
Residente de Interventoria
