CONSORCIO OBRAS GRL

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL NIT. 902.021.128-6 consorcioobrasgrl@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ C.C. 86.039.315
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($823.366.756,00)
PLAZO INICIAL CONTRATO:	3 MESES 18 DÍAS
SUPERVISIÓN:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2025

DESCRIPCIÓN DE PÓLIZAS

Mediante la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA se han expedido las pólizas correspondientes al Contrato No. 103-13-09-005 DE 2025.
Las pólizas adquiridas por el CONSORCIO OBRAS GRL como contratista de la obra, son de Responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento del contrato, estabilidad y calidad de la obra, pago de salarios y prestaciones sociales las cuales se encuentran vigentes y se relacionan en las siguientes tablas:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO DE PÓLIZA:
TOMADOR: CONSORCIO OBRAS GRL
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ

PÓLIZAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA (ANEXO 0)

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
620-47-994000059577			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2025	30/04/2026	$82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	31/12/2025	31/12/2028	$ 41.168.338,00

CONSORCIO OBRAS GRL

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	31/12/2025	30/04/2026	$82.336.676,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
620-47-994000014263			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
BIENES BAJO CUIDADOS TENENCIA Y CONTROL	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
RCE PATRONAL	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
620-47-994000059577			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/01/2026	06/06/2026	$82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	23/01/2026	06/02/2029	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	23/01/2026	06/06/2026	$82.336.676,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
620-47-994000014263			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00

CONSORCIO OBRAS GRL

PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
BIENES BAJO CUIDADOS TENENCIA Y CONTROL	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
RCE PATRONAL	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00

JUSTIFICACIÓN A LA MODIFICATORIA NO. 001 DEL CONTRATO DE OBRA

En mi calidad de Contratista de obra del contrato que se relaciona en el asunto, me permito poner a su consideración para que se analice y se de viabilidad a la presente solicitud de Modificación No. 001, de mayores y menores cantidades e ítems no previstos del proyecto, teniendo de presente las siguientes consideraciones:

Primero: Que el proyecto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META", está a punto de iniciar en su totalidad las actividades.

Segundo: Se evidencian la falta de varios ítems necesarios para poder dar inicio a las labores de obra.

Tercero: Al realizar visita y verificación de medidas en campo se generan algunos cambios en las cantidades necesarias para ejecutar el contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior existe la necesidad de realizar una MODIFICACIÓN No. 001 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS al proyecto de obra en mención, con el fin de empezar con las actividades previstas y así dar cumplimiento al objeto contractual.

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEI	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARI	CANT	VALOR	CANT.
1	COMPLEJO DEPORTIVO						
1.1	CAFETERIA Y BAÑOS						
1.1.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 537.435,17	1,00	$ 537.435,00	2,00
1.1.4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10,00	$ 109.702,93	14,12	$ 1.549.005,00	24,12
1.1.5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188,00	$ 25.009,16	260,56	$ 6.516.386,00	448,56
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 1.1.1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U		$ 925.176,19	1,00	$ 925.176,00	1,00
NP 1.1.2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 166.562,20	3,20	$ 532.999,00	3,20
NP 1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA	U		$ 501.600,00	2,00	$ 1.003.200,00	2,00
Subtotal							
1.2	CANCHA TENIS						
1.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183,64	$ 6.629,22	410,50	$ 2.721.293,00	594,14
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221,63	$ 18.228,40	140,89	$ 2.568.200,00	362,52
1.2.5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625,00	$ 7.703,99	199,10	$ 1.533.865,00	824,10
1.2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800,00	$ 63.704,80	24,10	$ 1.535.286,00	824,10
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 1.2.1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M		$ 8.547,80	716,63	$ 6.125.608,00	716,63
Subtotal							
1.3	SALON ADMINISTRATIVO						
1.3.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALDA)	M2	260,00	$ 12.008,92	147,30	$ 1.768.914,00	407,30
1.3.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110,00	$ 14.429,63	103,62	$ 1.495.198,00	213,62
Subtotal							
1.4	CANCHA MICROFUTBOL						
Subtotal							
Costo Subtotal							
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA						
2.05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16,10	$ 37.661,48	2,47	$ 93.113,00	18,57
2.06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196,96	$ 6.629,22	148,82	$ 986.560,00	345,78
2.07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19,20	$ 14.429,63	16,96	$ 244.726,00	36,16
2.08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112,96	$ 18.228,40	188,19	$ 3.430.403,00	301,15
2.09	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	84,00	$ 35.613,11	0,60	$ 21.368,00	84,60
2.13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,00	$ 13.667,53	52,72	$ 720.552,00	252,72
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 2.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52	336,40	$ 1.338.039,00	336,40
NP 2.02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00	96,00	$ 3.247.008,00	96,00

Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52	336,40	$ 1.338.039,00	336,40
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00	96,00	$ 3.247.008,00	96,00
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL		$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00
NP 2,04	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML		$ 442.511,01	1,80	$ 796.520,00	1,80
Subtotal							
3	**POLIDEPORTIVO LA LAGUNA**						
3,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2	M2	83,76	$ 18.228,40	51,37	$ 936.393,00	135,13
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 3,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.629,22	135,13	$ 895.806,00	135,13
NP 3,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN	PTO		$ 100.000,00	5,00	$ 500.000,00	5,00
Subtotal							
4	**POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ**						
4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75,60	$ 14.429,63	19,21	$ 277.193,00	94,81
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52	338,60	$ 1.346.790,00	338,60
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00	72,00	$ 2.435.256,00	72,00
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMINTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.816,76	14,04	$ 1.036.387,00	14,04
Subtotal							
5	**POLIDEPORTIVO PRADO**						
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2	M2	154,44	$ 18.228,40	13,51	$ 246.266,00	167,95
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O	M2	72,00	$ 35.613,11	52,24	$ 1.860.429,00	124,24
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15,00	$ 3.852,00	6,42	$ 24.730,00	21,42
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52	318,00	$ 1.264.853,00	318,00
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.629,22	312,96	$ 2.074.680,00	312,96
NP 5,03	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E	M		$ 27.056,94	60,00	$ 1.623.417,00	60,00
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS	M2		$ 73.816,76	15,36	$ 1.133.825,00	15,36

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52	352,20	$ 1.400.884,00	352,20
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA	PTO		$ 100.000,00	3,00	$ 300.000,00	3,00
Subtotal							
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA						
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40,00	$ 6.884,99	177,43	$ 1.221.603,00	217,43
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28,80	$ 15.018,52	17,40	$ 261.322,00	46,20
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40,00	$ 37.282,10	28,85	$ 1.075.589,00	68,85
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 4.130,99	377,69	$ 1.560.232,00	377,69
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2		$ 18.314,49	78,00	$ 1.428.530,00	78,00
NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00	98,00	$ 3.314.654,00	98,00
NP 7,05	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL		$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00
NP 7,06	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.816,76	3,78	$ 279.027,00	3,78
NP 7,07	SUMISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA	ML		$ 72.004,56	42,00	$ 3.024.192,00	42,00
NP 7,08	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2		$ 63.807,49	24,00	$ 1.531.380,00	24,00
Subtotal							
8	POLIDEPORTIVO RUMAPO						
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40,00	$ 6.884,99	334,98	$ 2.306.332,00	374,98
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28,80	$ 15.018,52	7,24	$ 108.734,00	36,04
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 18.863,31	123,54	$ 2.330.374,00	255,78
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40,00	$ 37.282,10	43,16	$ 1.609.096,00	83,16
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 4.130,99	344,38	$ 1.422.629,00	344,38
NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.816,76	8,64	$ 637.777,00	8,64
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA	PTO		$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00	8
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION	PTO		$ 100.000,00	12,00	$ 1.200.000,00	12
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2		$ 18.314,49	76,80	$ 1.406.553,00	76,8

Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN	PTO		$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00	8
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA	PTO		$ 100.000,00	12,00	$ 1.200.000,00	12
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA	M2		$ 18.314,49	76,80	$ 1.406.553,00	76,8
Subtotal							
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA						
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	7,28	$ 31.475,72	0,72	$ 22.663,00	8,00
9,06	ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,91	$ 1.882.201,91	0,09	$ 169.398,00	1,00
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO	M2	3,80	$ 140.058,21	26,80	$ 3.753.560,00	30,60
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313,50	$ 8.199,41	60,84	$ 498.852,00	374,34
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2	M2	19,88	$ 18.228,40	25,42	$ 463.366,00	45,30
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 9,0	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.629,22	45,30	$ 300.304,00	45,30
NP 9,0	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52	271,55	$ 1.080.037,00	271,55
Subtotal							
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C						
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158,88	$ 12.008,92	86,52	$ 1.039.012,00	245,40
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2	M2	303,28	$ 18.228,40	27,94	$ 509.302,00	331,22
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN	M2	214,80	$ 122.759,51	3,18	$ 390.375,00	217,98
10,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62,48	$ 6.629,22	497,84	$ 3.300.289,00	560,32
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53,00	$ 109.702,93	11,00	$ 1.206.732,00	64,00
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10,96	$ 15.702,54	74,66	$ 1.172.351,00	85,62
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M		$ 3.977,52	349,47	$ 1.390.025,00	349,47
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M		$ 8.547,80	57,10	$ 488.079,00	57,10
Subtotal							
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE						
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80,00	$ 6.629,22	469,96	$ 3.115.467,00	549,96
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39,60	$ 14.429,63	1,44	$ 20.779,00	41,04
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2	M2	101,76	$ 18.228,40	312,37	$ 5.694.006,00	414,13
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M		$ 3.977,52	416,42	$ 1.656.321,00	416,42
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN	PTO		$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00	8,00
NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M		$ 33.823,00	108,00	$ 3.652.884,00	108,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,1,3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció a través de verificación en campo que la cantidad a instalar es mayor, debido a que en sitio hacen falta 2 lavamanos.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	1,00	1,00	2,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,1,4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que el área a enchapar es mayor a la contractual

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	10,00	14,12	24,12

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,1,5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la cantidad de cerchas a pintar es mayor a la contractual

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	188,00	260,56	448,56

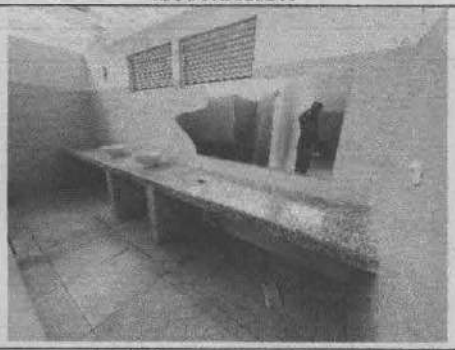
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 1,1,1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	

JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en campo el deterioro de las instalaciones y la necesidad de instalar un orinal.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	0,00	1,00	1,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 1,1,2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en campo el deterioro de las instalaciones y la necesidad de instalar un espejo.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	3,20	3,20

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA	

JUSTIFICACIÓN: Se evidencia en campo la necesidad de instalar rejas en los baños para la seguridad y el cuidado de las instalaciones.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	0,00	2,00	2,00

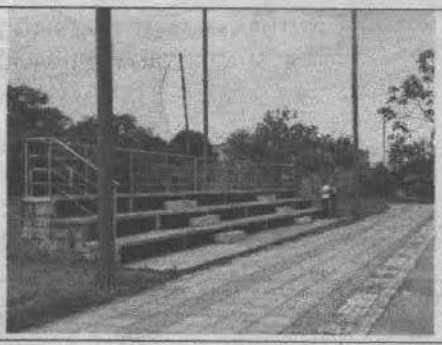
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron las medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	183,64	410,50	594,14

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,2,4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron las medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	221,63	140,89	362,52

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,2,5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	625,00	199,10	824,10

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,2,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	

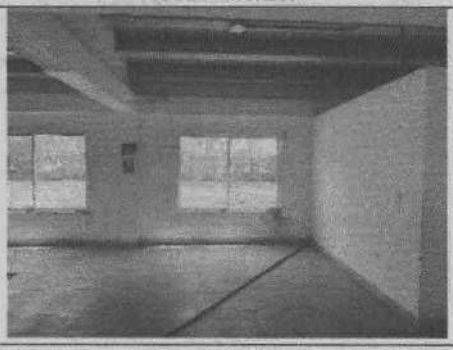
JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	800,00	24,10	824,10

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 1,2,1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la pintura para el cerramiento de la pista de patinaje

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	0,00	716,63	716,63

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,3,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	260,00	147,30	407,30

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,3,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	110,00	103,62	213,62

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron las medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	16,10	2,47	18,57

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	196,96	148,82	345,78

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	19,20	16,96	36,16

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	112,96	188,19	301,15

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,09	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	84,00	0,60	84,60

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	200,00	52,72	252,72

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	336,40	336,40

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se incluye con el fin de contemplar la pintura para las columnas metálicas en mal estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	96,00	96,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	

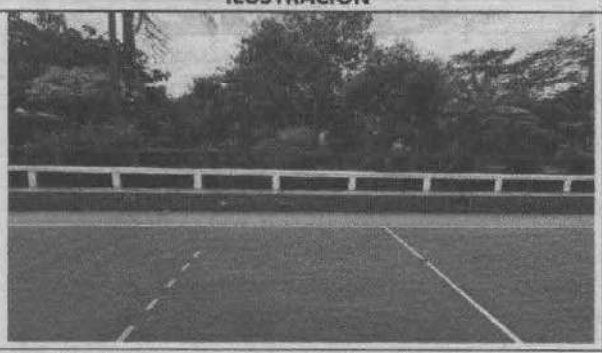
JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el refuerzo de la cubierta deteriorada.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
GL	0,00	1,00	1,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 2,04	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la demolición de la placa en concreto para la construcción del cárcamo

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	1,80	1,80

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
3,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

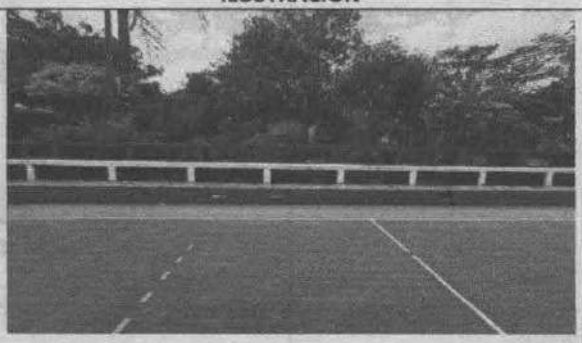
JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	83,76	51,37	135,13

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN

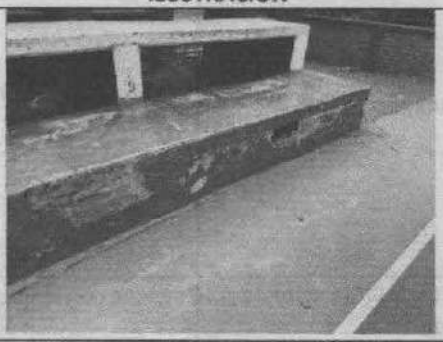
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 3,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se incluye este item con el fin de contemplar el lavado de las superficies previamente a ser pintadas

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	135,13	135,13

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 3,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.	

JUSTIFICACIÓN: Se incluye este item con el fin de contemplar los resanes en las graderías que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
PTO	0,00	5,00	5,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	75,60	19,21	94,81

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com
