CONSORCIO OBRAS GRL

	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 1,2,1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	716,63	$	6.125.608,00
Subtotal					$	86.736.311,00
1,3	SALON ADMINISTRATIVO					
1,3,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	407,30	$	4.891.232,00
1,3,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	213,62	$	3.082.457,00
Subtotal					$	7.973.689,00
1,4	CANCHA MICROFUTBOL					
1,4,1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	$ 47.617,53	200,00	$	9.523.506,00
Subtotal					$	9.523.506,00
Costo Subtotal					$	126.029.301,00
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA					
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	$ 3.541,38	17,76	$	62.895,00
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	$ 69.335,94	2,66	$	184.434,00
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	$ 651.959,27	0,89	$	580.244,00
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	$ 743.888,71	2,66	$	1.978.744,00
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 37.661,46	18,57	$	699.462,00
2,06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	345,78	$	2.292.250,00
2,07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	36,16	$	521.775,00
2,08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	301,15	$	5.489.484,00
2,09	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	84,60	$	3.012.869,00
2,10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
2,11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
2,12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 374.980,93	8,00	$	2.999.847,00
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	$ 13.667,53	252,72	$	3.454.058,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	8,00	$	7.039.192,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	336,40	$	1.338.039,00
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	96,00	$	3.247.008,00
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL	$ 1.000.000,00	1,00	$	1.000.000,00
NP 2,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML	$ 442.511,01	1,80	$	796.520,00
Subtotal					$	**67.246.588,00**
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA					
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	U	$ 1.446.818,47	2,00	$	2.893.637,00
3,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	135,13	$	2.463.204,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 3,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	135,13	$	895.806,00
NP 3,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	5,00	$	500.000,00
Subtotal					$	**6.752.647,00**
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ					
4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	372,76	$	2.471.107,00
4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	94,81	$	1.368.073,00
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	253,55	$	4.621.812,00
4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	0,00	$	-
4,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
4,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	8,00	$	5.501.502,00
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
4,08	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	$ 177.734,62	50,00	$	8.886.731,00
4,09	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 27.056,94	72,00	$	1.948.100,00
4,1	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 6.394,07	18,00	$	115.093,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 102.172,31	18,00	$	1.839.102,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	338,60	$	1.346.790,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	72,00	$	2.435.256,00
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	14,04	$	1.036.387,00
Subtotal					$	34.644.686,00
5	POLIDEPORTIVO PRADO					
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	20,77	$	299.703,00
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	167,95	$	3.061.460,00
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	124,24	$	4.424.573,00
5,04	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	0,00	$	-
5,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	0,00	$	-
5,07	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	$ 681.520,42	1,00	$	681.520,00
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	$ 3.852,00	21,42	$	82.510,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	318,00	$	1.264.853,00
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	312,96	$	2.074.680,00
NP 5,03	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 27.056,94	60,00	$	1.623.417,00
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	15,36	$	1.133.825,00
Subtotal					$	17.721.274,00
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA					
6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	354,25	$	2.348.400,00
6,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	55,33	$	798.391,00
6,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	161,32	$	2.940.606,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	68,80	$	2.450.182,00
6,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
6,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	8,00	$	5.501.502,00
6,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
6,08	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	$ 13.667,53	246,24	$	3.365.493,00
6,09	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	352,20	$	1.400.884,00
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	3,00	$	300.000,00
NP 6,03	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.882.201,91	0,00	$	-
Subtotal					$	**53.415.023,00**
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA					
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.884,99	217,43	$	1.497.002,00
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 15.018,52	46,20	$	693.856,00
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.863,31	102,38	$	1.931.226,00
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 37.282,10	68,85	$	2.566.873,00
7,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.359.260,60	1,00	$	1.359.261,00
7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 731.621,32	1,00	$	731.621,00
7,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 16.713.374,90	2,00	$	33.426.750,00
7,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 924.191,93	0,00	$	-
7,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA	M2	$ 6.438,19	0,00	$	-

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO					
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 105.336,91	10,00	$	1.053.369,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 129.839,65	0,00	$	-
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 4.130,99	377,69	$	1.560.232,00
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	$ 18.314,49	78,00	$	1.428.530,00
NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	98,00	$	3.314.654,00
NP 7,04	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL	$ 1.000.000,00	1,00	$	1.000.000,00
NP 7,05	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	3,78	$	279.027,00
NP 7,06	SUMIISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA	ML	$ 72.004,56	42,00	$	3.024.192,00
NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	$ 63.807,49	24,00	$	1.531.380,00
Subtotal					$	55.397.973,00
8	POLIDEPORTIVO HUMAPO					
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.884,99	374,98	$	2.581.732,00
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 15.018,52	36,04	$	541.268,00
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.863,31	255,78	$	4.824.858,00
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 37.282,10	83,16	$	3.100.380,00
8,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.359.260,60	1,00	$	1.359.261,00
8,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 731.621,32	0,00	$	-
8,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 16.713.374,90	2,00	$	33.426.750,00
8,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 924.191,93	0,00	$	-

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

8,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 6.438,19	0,00	$	-
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 105.336,91	0,00	$	-
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 129.839,65	88,00	$	11.425.889,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 4.130,99	344,38	$	1.422.629,00
NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	8,64	$	637.777,00
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8	$	800.000,00
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION	PTO	$ 100.000,00	12	$	1.200.000,00
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2	$ 18.314,49	76,8	$	1.406.553,00
Subtotal					$	**62.727.097,00**
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA					
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	$ 3.541,38	16,00	$	56.662,00
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	$ 31.475,72	8,00	$	251.806,00
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	$ 701.543,17	6,40	$	4.489.876,00
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.043.239,51	2,00	$	2.086.479,00
9,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.403.792,39	1,36	$	1.909.158,00
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.882.201,91	1,00	$	1.882.202,00
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	$ 140.058,21	30,60	$	4.285.781,00
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.199,41	374,34	$	3.069.367,00
9,09	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.199,41	246,09	$	2.017.793,00
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	45,30	$	825.747,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

9,11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 122.759,51	160,00	$	19.641.522,00
9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	45,30	$	300.304,00
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	271,55	$	1.080.097,00
Subtotal					$	**74.446.561,00**
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C					
10,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	$ 82.833,34	1,00	$	82.833,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	$ 713.382,09	2,00	$	1.426.764,00
10,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	$ 56.592,58	4,82	$	272.776,00
10,04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 37.661,46	2,41	$	90.764,00
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	245,40	$	2.946.988,00
10,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	449,04	$	6.479.480,00
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	331,22	$	6.037.612,00
10,08	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	$ 122.759,51	217,98	$	26.759.119,00
10,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	560,32	$	3.714.483,00
10,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	$ 537.435,17	1,00	$	537.435,00
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	$ 109.702,93	64,00	$	7.020.988,00
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	$ 15.702,54	85,62	$	1.344.451,00
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA	U	$ 15.617.415,88	0,00	$	-

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN					
10,15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 1.171.628,59	2,00	$	2.343.257,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	349,47	$	1.390.025,00
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	57,10	$	488.079,00
Subtotal					**$**	**62.249.989,00**
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE					
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	549,96	$	3.645.804,00
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	41,04	$	592.192,00
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	414,13	$	7.548.929,00
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	94,79	$	3.375.767,00
11,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	0,00	$	-
11,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	0,00	$	-
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	416,42	$	1.656.321,00
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8,00	$	800.000,00
NP 11,03	PINTURA PARA COLUMNA METALICA	M	$ 33.823,00	108,00	$	3.652.884,00
Subtotal					**$**	**53.821.664,00**
				COSTO DIRECTO	**$**	**614.452.803,00**
				ADMINISTRACION 28%	**$**	**172.046.784,84**
				IMPREVISTOS 1%	**$**	**6.144.528,03**
				UTILIDAD 5%	**$**	**30.722.640,15**
				AIU %	**$**	**208.913.953,02**
				COSTO TOTAL	**$**	**823.366.756,00**

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL:	**$ 823.366.756,00**
MODIFICACIONES (+)	$ 160.671.872,00
MODIFICACIONES (-)	$ 160.671.872,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	**$ 823.366.756,00**

CONCLUSIONES

En mi calidad de Contratista de obra del contrato que se relaciona en el asunto, me permito poner a su consideración para que se analice y se de viabilidad a la presente solicitud de modificación No. 001, de mayores y menores cantidades e ítems no previstos del proyecto, teniendo de presente todas las consideraciones previamente enunciadas.

Cabe resaltar que existe la necesidad de realizar una MODIFICACIÓN No. 001 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES al proyecto de obra en mención, lo cual no corresponde a una situación atribuible a mi responsabilidad como contratista, por el contrario, es completamente ajena.

ING. ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS GRL

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

INFORME N° 01
PERIODO DEL *23,01,26* ***AL*** *16,02,2026*
FECHA DE PRESETANCION: *17/02/2026*
MODIFICATORIA No. 01

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*OBRA*			
CONTRATO N° :	*103.13.09.005-2025*			
OBJETO CONTRATO :	*ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META*			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($823.366.756,00)*			
CONTRATISTA:	*CONSORCIO OBRAS GRL*			
CORREO ELECTRONICO:	*consorcioobrasgrl@gmail.com*			
FECHA DE INICIACIÓN:	*23 – 01 – 2026*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*0*	***Meses***	*1*	***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*23 – 01 – 2026*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*NO APLICA*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*NO APLICA*			
CORREO ELECTRONICO:	*NO APLICA*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN FONSECA CRUZ*			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*31/12/2025*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° 01:				*23 -01 -2026*
TIEMPO:	***03***	***Meses***	***18***	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*23 -05 -2026*
SUSPENSIÓN N° 01:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
REINICIO N° XX:				*N/A*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :				*N/A*
MODIFICACIÓN N°XX:				*N/A*
VALOR MODIFICADO:				*N/A*
FECHA ADICIONAL N° XX:				*N/A*
VALOR ADICIONAL :				*N/A*
VALOR ACTUALIZADO :				*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:				*23/05/2026*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	***PUERTO LÓPEZ***	***VEREDA:***	• ***Humapo*** • ***La Victoria***
CORREGIMIENTO:	*NO APLICA*	***BARRIO:***	• ***Policarpa*** • ***Julio Flores*** • ***La Laguna*** • ***Clemente Naranjo*** • ***Villa Suiza*** • ***Juana Sofía*** • ***El Prado*** • ***El C.I.C*** • ***Complejo Deportivo***
COORDENADAS:			


MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023



Grafica Avance Físico

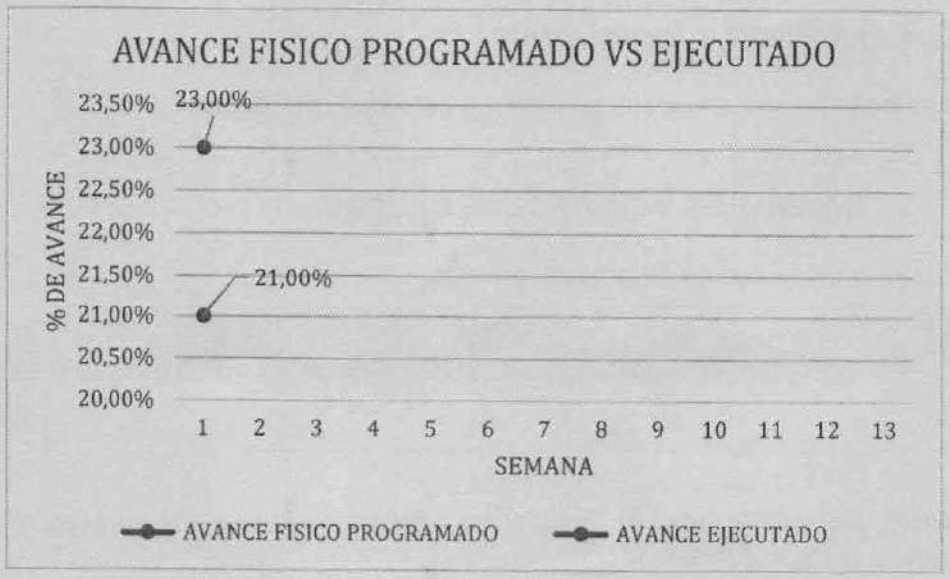

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

1. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
-	-	-	-	-

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
COMITÉ No. 01	23/01/2026	Prorroga No. 01 al contrato obra.
COMITÉ No. 02	09/02/2026	Modificatoria No. 01 al contrato obra.

Nota :

A. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

A la fecha no se han ejecutado ninguna actividad contractual.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
N/A	N/A	N/A

Nota : *Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	**N/A**	**N/A**

Nota : *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	**N/A**	**N/A**

Nota : *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

- *A la fecha no se ha contratado personal de obra para el inicio de actividades.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:						
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	*TIEMPO (MESES / DIAS)*	*JUSTIFICACIÓN*
-	-	-

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	*VALOR ($)*	*JUSTIFICACIÓN*
-	-	-

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	*VALOR ACTUALIZADO ($)*	*JUSTIFICACIÓN*
-	-	-

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. ACTA DE VISITA PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- ***N/A.***

3. ACTA DE SOCIALIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- ***N/A.***

4. ACTA DE VISITA PREVIA A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

- ***N/A.***

5. ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

- ***N/A.***

6. GARANTIAS:

<Describa las pólizas actualizadas de acuerdo a cada uno de los actos administrativos celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***620 47 994000059577***
ANEXO N°	***0***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***620 74 994000014263***
ANEXO N°	***0***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*09/01/2026*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*003*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***Aseguradora Solidaria de Colombia***

GARANTIAS	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
	DESDE	*HASTA*	
CUMPLIMIENTO	31/12/2025	30/04/2026	$ 82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/12/2025	31/12/2028	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	-	-	$ 82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	31/12/2025	30/04/2026	$ 82.336.676,00
RCE	31/12/2025	31/01/2026	$ 350,000,000.00

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
01996	*31/10/2025*	*03.2.3.43.4302.1604-9*	*$ 150.620.767,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 127.149.540,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 281.360.549,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 121.237.535,97*
