		03.2.3.43.4302.1604-10	*$ 189.722.206,03*

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
02857	*31/12/2025*	*03.2.3.43.4302.1604-9*	*$ 150.620.767,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 127.149.540,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 281.360.549,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 121.237.535,97*
		03.2.3.43.4302.1604-10	*$ 142.998.364,03*

PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1.1	CAFETERIA Y BAÑOS				
1.1.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230.00	$ 16,091.95	$ 3,701,149.00
1.1.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.00	$ 19,335.70	$ 4,060,497.00
1.1.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	$ 720,163.13	$ 720,163.00
1.1.4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10.00	$ 147,001.93	$ 1,470,019.00
1.1.5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188.00	$ 33,512.27	$ 6,300,307.00
Subtotal					$ 16.252.135,00
1.2	CANCHA TENIS				
1.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183.64	$ 8,883.15	$ 1,631,302.00
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177.30	$ 92,490.43	$ 16,398,553.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	4.00	$ 913,237.36	$ 3,652,949.00
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221.63	$ 24,426.06	$ 5,413,548.00
1.2.5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625.00	$ 10,323.35	$ 6,452,094.00
1.2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800.00	$ 85,364.43	$ 68,291,544.00
Subtotal					$ 101.839.990,00
1.3	PLAZOLETAS INTERIORES				
1.3.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	260.00	$ 16,091.95	$ 4,183,907.00
1.3.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110.00	$ 19,335.70	$ 2,126,927.00
Subtotal					$ 6.310.834,00
1.4	CANCHA MICROFUTBOL				
1.4.1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	200.00	$ 63,807.49	$ 12,761,498.00
Subtotal					$ 12.761.498,00
COSTO SUBTOTAL					$ 137.164.457,00
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA				
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21.60	$ 4,745.45	$ 102,502.00
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3.24	$ 92,910.16	$ 301,029.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

2.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	1.08	$ 873,625.42	$ 943,515.00
2.4	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6.00	$ 996,810.87	$ 5,980,865.00
2.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16.10	$ 50,466.36	$ 812,508.00
2.6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196.96	$ 8,883.15	$ 1,749,625.00
2.7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19.20	$ 19,335.70	$ 371,245.00
2.8	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112.96	$ 24,426.06	$ 2,759,168.00
2.9	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	84.00	$ 47,721.57	$ 4,008,612.00
2.10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
2.11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
2.12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 502,474.45	$ 4,019,796.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

2.13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	200.00	$ 18,314.49	$ 3,662,898.00
2.14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	8.00	$ 1,179,064.64	$ 9,432,517.00
Subtotal					$ 77.760.968,00
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	M2	2.00	$ 1,938,736.75	$ 3,877,474.00
3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83.76	$ 24,426.06	$ 2,045,927.00
Subtotal					$ 5.923.401,00
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ				
4.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395.64	$ 8,883.15	$ 3,514,529.00
4.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75.60	$ 19,335.70	$ 1,461,779.00
4.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320.64	$ 24,426.06	$ 7,831,972.00
4.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78.00	$ 47,721.57	$ 3,722,282.00
4.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
4.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
4.7	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
4.8	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE	M	50.00	$ 238,164.39	$ 11,908,220.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	PINTURA Y ANTICORROSIVOS				
4.9	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	72.00	$ 36,256.30	$ 2,610,454.00
4.10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,568.05	$ 154,225.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 136,910.89	$ 2,464,396.00
Subtotal					$ 45.160.011,00
5	POLIDEPORTIVO PRADO				
5.1	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31.20	$ 19,335.70	$ 603,274.00
5.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	154.44	$ 24,426.06	$ 3,772,361.00
5.3	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	72.00	$ 47,721.57	$ 3,435,953.00
5.4	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
5.5	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
5.6	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
5.7	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	1.00	$ 913,237.36	$ 913,237.00
5.9	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15.00	$ 5,161.68	$ 77,425.00
Subtotal					$ 62.149.079,00
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA				
6.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	158.64	$ 8,883.15	$ 1,409,223.00
6.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	48.80	$ 19,335.70	$ 943,582.00
6.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 24,426.06	$ 3,230,102.00
6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	32.40	$ 47,721.57	$ 1,546,179.00
6.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
6.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
6.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
6.8	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	144.00	$ 18,314.49	$ 2,637,287.00
6.9	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
Subtotal					$ 63.113.202,00
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA				
7.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	$ 9,225.88	$ 369,035.00
7.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	$ 20,124.82	$ 579,595.00
7.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 25,276.84	$ 3,342,609.00
7.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	$ 49,958.02	$ 1,998,321.00
7.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,821,409.20	$ 1,821,409.00
7.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 980,372.57	$ 7,842,981.00
7.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS.	U	2.00	$ 22,395,922.36	$ 44,791,845.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
7.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4.00	$ 1,238,417.18	$ 4,953,669.00
7.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,627.17	$ 155,289.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 141,151.46	$ 2,540,726.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24.00	$ 173,985.13	$ 4,175,643.00
Subtotal					$ 72.571.122,00
8	POLIDEPORTIVO HUMAPO				
8.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	$ 9,225.88	$ 369,035.00
8.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	$ 20,124.82	$ 579,595.00
8.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 25,276.84	$ 3,342,609.00
8.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	$ 49,958.02	$ 1,998,321.00
8.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,821,409.20	$ 1,821,409.00
8.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 980,372.57	$ 7,842,981.00
8.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA	U	2.00	$ 22,395,922.36	$ 44,791,845.00

	EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
8.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8.00	$ 1,238,417.18	$ 9,907,337.00
8.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,627.17	$ 155,289.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 141,151.46	$ 2,540,726.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	88.00	$ 173,985.13	$ 15,310,691.00
Subtotal					$ 88.659.838,00
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA				
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18.20	$ 4,745.45	$ 86,367.00
9.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	7.28	$ 42,177.47	$ 307,052.00
9.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7.28	$ 940,067.85	$ 6,843,694.00
9.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.28	$ 1,397,940.94	$ 3,187,305.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

9.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.36	$ 1,881,081.80	$ 2,558,271.00
9.6	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.91	$ 2,522,150.56	$ 2,295,157.00
9.7	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	3.80	$ 187,678.00	$ 713,176.00
9.8	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313.50	$ 10,987.21	$ 3,444,490.00
9.9	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	246.09	$ 10,987.21	$ 2,703,843.00
9.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	19.88	$ 24,426.06	$ 485,590.00
9.11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176.00	$ 164,497.75	$ 28,951,604.00
9.13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

Subtotal					$ 95.193.237,00
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C				
10.1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	1.00	$ 110,996.67	$ 110,997.00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2.00	$ 955,932.00	$ 1,911,864.00
10.3	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4.82	$ 75,834.06	$ 365,520.00
10.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.41	$ 50,466.36	$ 121,624.00
10.5	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158.88	$ 16,091.95	$ 2,556,689.00
10.6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	449.04	$ 19,335.70	$ 8,682,503.00
10.7	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	303.28	$ 24,426.06	$ 7,407,935.00
10.8	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	214.80	$ 164,497.75	$ 35,334,117.00
10.10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62.48	$ 8,883.15	$ 555,019.00
10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	$ 720,163.13	$ 720,163.00
10.12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53.00	$ 147,001.93	$ 7,791,102.00
10.13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10.96	$ 21,041.40	$ 230,614.00
10.14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
10.15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 1,569,982.31	$ 3,139,965.00
Subtotal					$ 112.544.800,00
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE				
11.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80.00	$ 8,883.15	$ 710,652.00
11.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39.60	$ 19,335.70	$ 765,694.00
11.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	101.76	$ 24,426.06	$ 2,485,596.00
11.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108.00	$ 47,721.57	$ 5,153,930.00
11.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
11.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10.00	$ 921,501.56	$ 9,215,016.00
11.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
11.8	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1.00	$ 1,179,064.64	$ 1,179,065.00
Subtotal					$ 63.126.641,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 823.366.756,00


PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *23/01/2026 AL 16/02/2026*

Avance físico ejecutado 21,00 % y avance financiero ejecutado 0,00 %

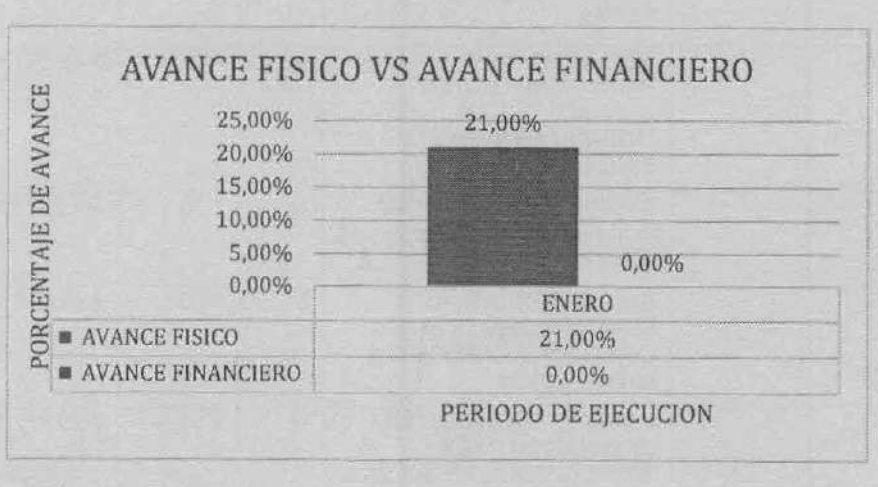

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra, remitir como anexo al presente informe cuando aplique.*

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS


Durante el periodo del presente informe no se presentaron problemas para le ejecución del contrato.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A la fecha del presente informe, el contrato de obra presenta un ***avance fisico del veintiuno por ciento (21%)****, cumpliendo con las obligaciones contractuales.*

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA.

LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET

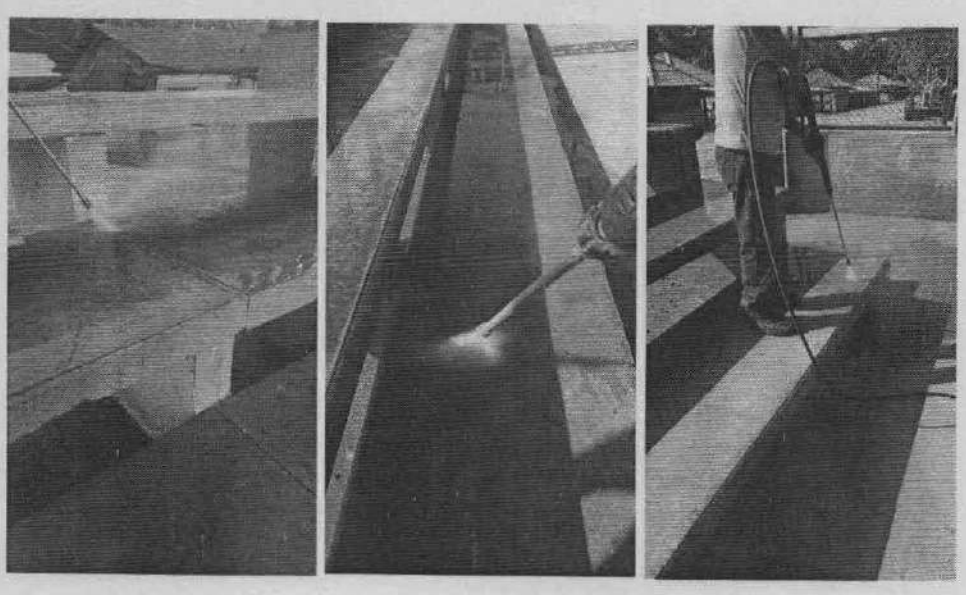


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA




PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS

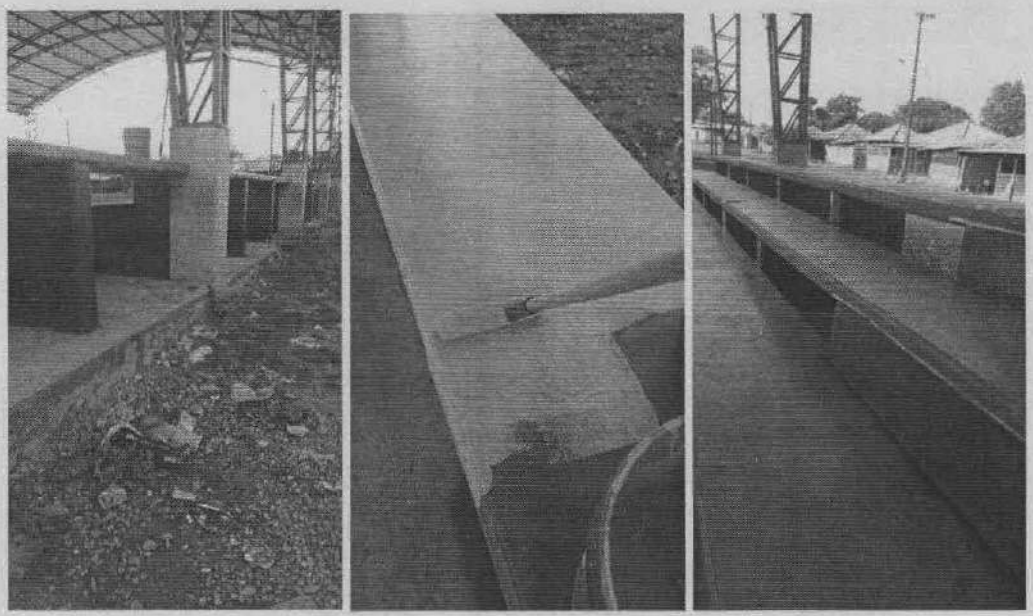

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

ITEMS	*ACTIVIDAD*
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)

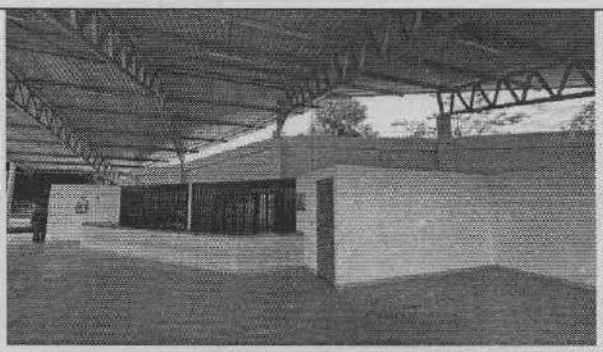

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	230,00	63,75	166,25

ITEMS	*ACTIVIDAD*
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS



OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	210,00	43,75	166,25

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
