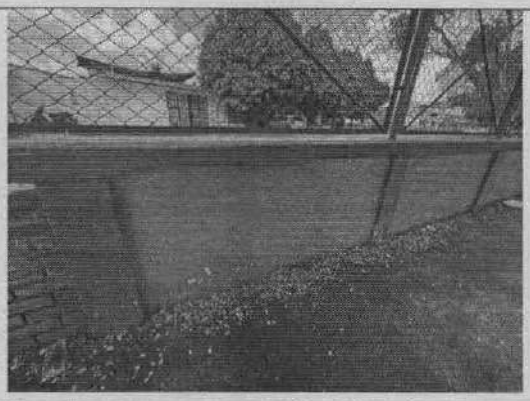
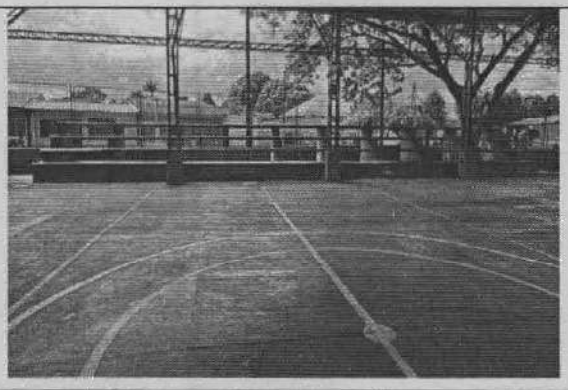
ITEMS	ACTIVIDAD
4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	75,60	19,21	94,81

ITEMS	ACTIVIDAD
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	320,64	67,09	253,55

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

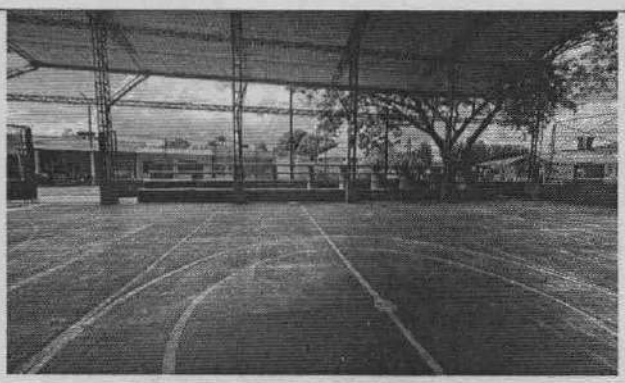
ITEMS	ACTIVIDAD
4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR



OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no era necesario realizar esta actividad debido a que los muros de cerramiento.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	78,00	78,00	0,00

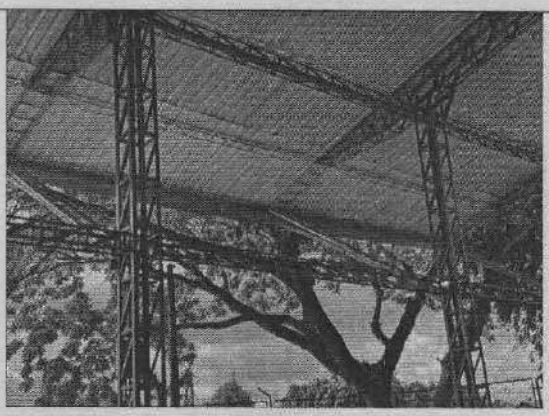
ITEMS	ACTIVIDAD
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET



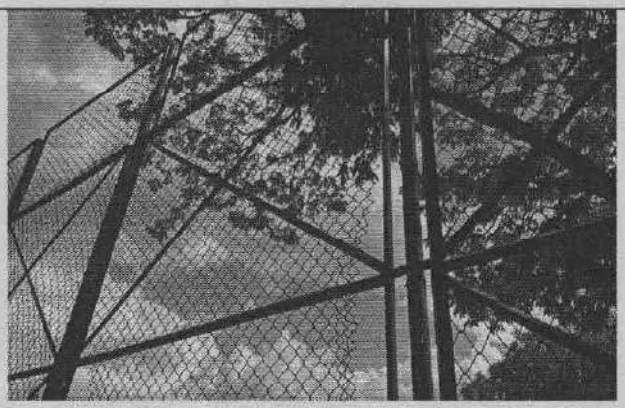
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir esta actividad previa a la pintada de las graderias.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
ML	0,00	338,60	338,60

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura de la estructura de la cubierta, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

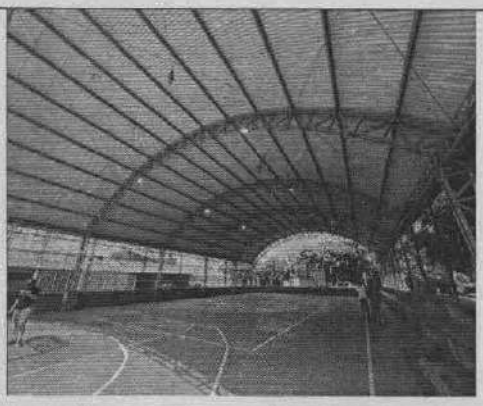
UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	72,00	72,00

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunod modulos de la malla de cerramiento, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	14,04	14,04

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

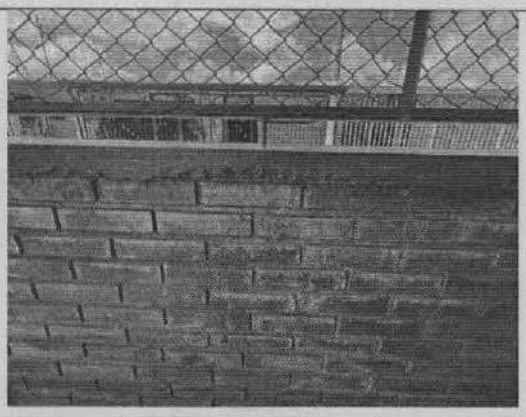
ITEMS	ACTIVIDAD
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	31,20	10,43	20,77

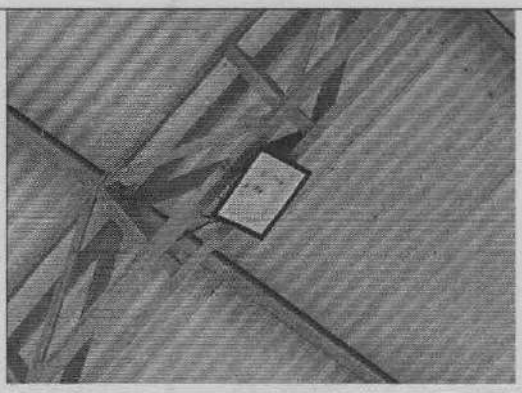
ITEMS	ACTIVIDAD
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	154,44	13,51	167,95

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	72,00	52,24	124,24

ITEMS	ACTIVIDAD
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no era necesario realizar esta actividad debido a que los reflectores estan en buen estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
U	8,00	8,00	0,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

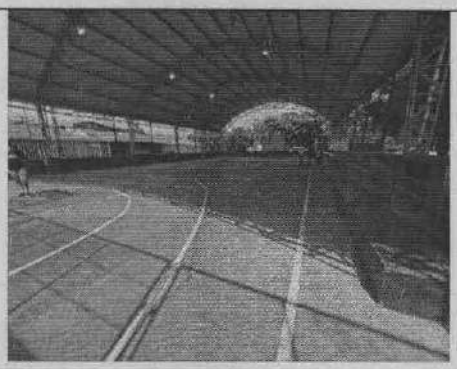
ITEMS	ACTIVIDAD
5,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no era necesario realizar esta actividad debido a que las canchas multiples se escuentran en buen estado

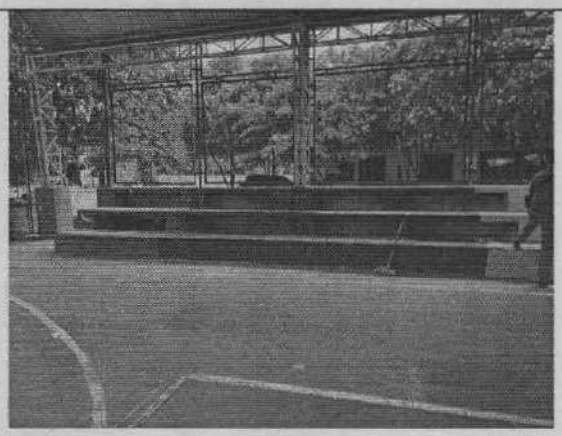
UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
U	2,00	2,00	0,00

ITEMS	ACTIVIDAD
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	15,00	6,42	21,42

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

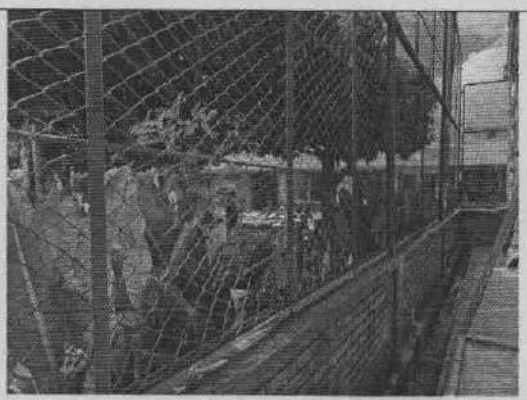
ITEMS	ACTIVIDAD			
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir el lavado por metro lineal de la demarcacion de la cancha.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
ML		0,00	318,00	318,00

ITEMS	ACTIVIDAD			
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir el lavado por metro cuadrado para la graderia.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
M2		0,00	312,96	312,96

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

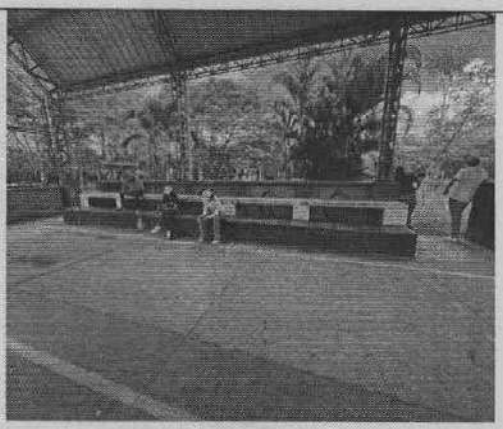
ITEMS	ACTIVIDAD
NP 5,03	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la tuveria para las bajantes de aguas lluvia.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M	0,00	60,00	60,00

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunos modulos en malla de cerramiento, po lo cual es neceario incluir esta actividad.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	15,36	15,36

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

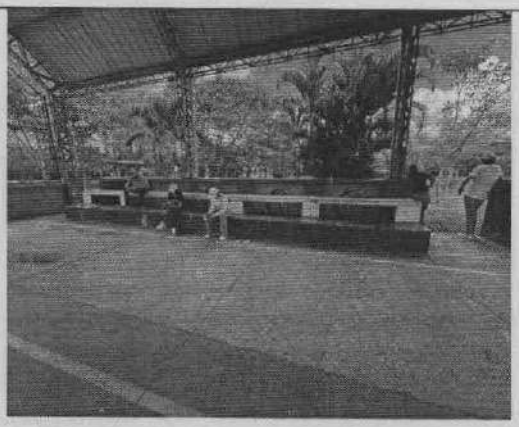
UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	158,64	195,61	354,25

ITEMS	ACTIVIDAD
6,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	48,80	6,53	55,33

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

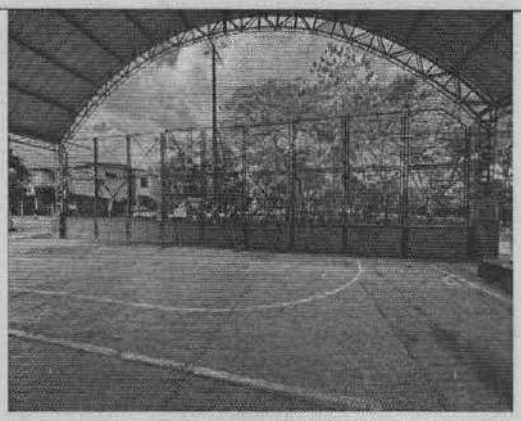
ITEMS	ACTIVIDAD
6,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	132,24	29,08	161,32

ITEMS	ACTIVIDAD
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	32,40	36,40	68,80

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
6,08	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

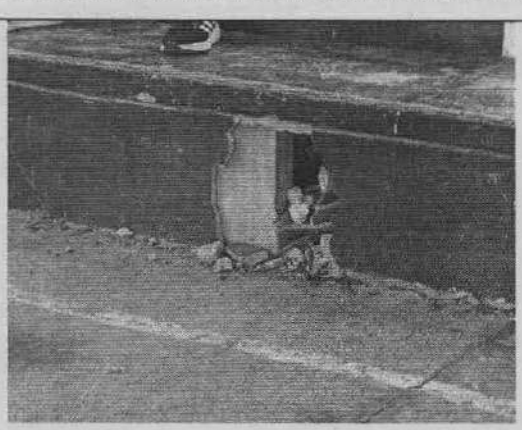
UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	144,00	102,24	246,24

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha.

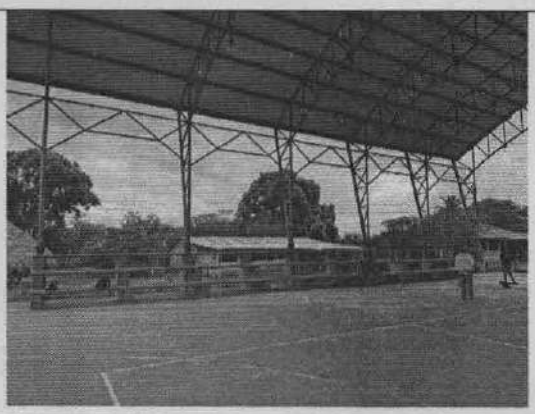
UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
ML	0,00	352,20	352,20

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas, po lo cual es necesario incluir esta actividad.

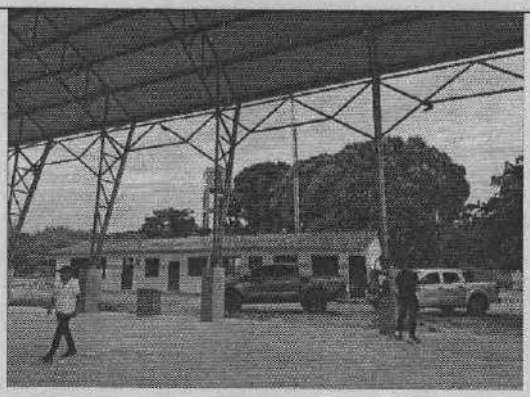
UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
PTO	0,00	3,00	3,00

ITEMS	ACTIVIDAD
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro cuadrado para las graderias.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	40,00	177,43	217,43

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

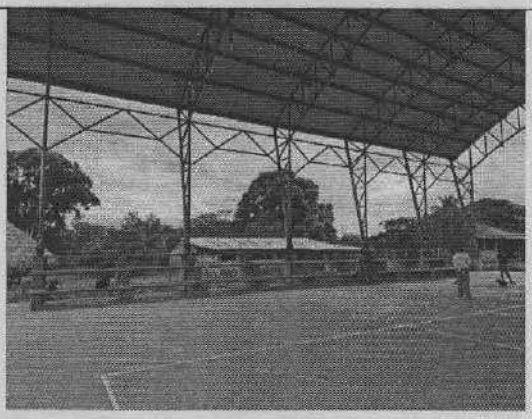
ITEMS	ACTIVIDAD
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS



OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	28,80	17,40	46,20

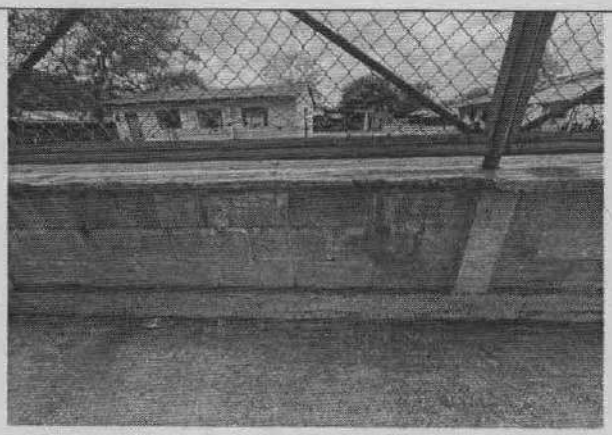
ITEMS	ACTIVIDAD
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS



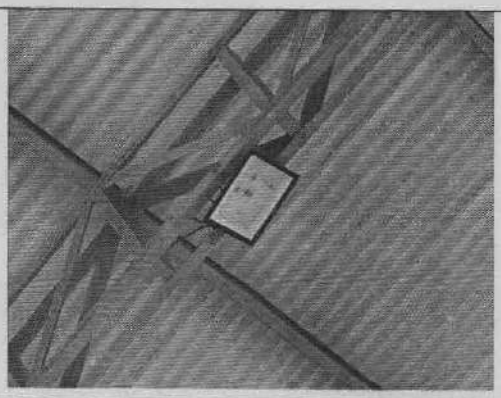
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	132,24	29,86	102,38

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	40,00	28,85	68,85

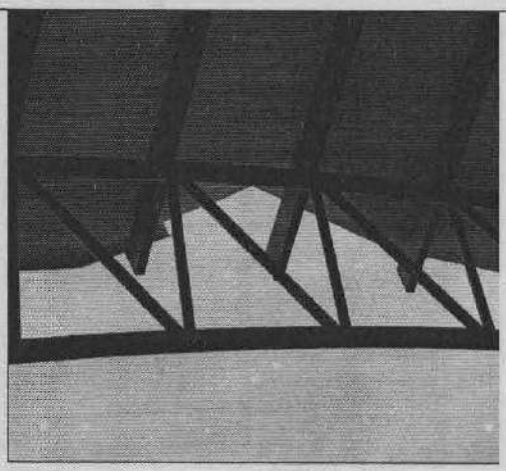
ITEMS	ACTIVIDAD
7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
U	8,00	7,00	1,00

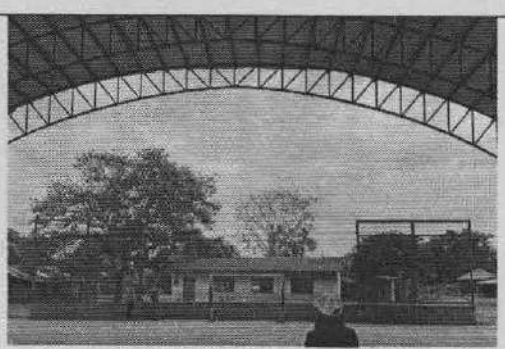
ITEMS	ACTIVIDAD			
7,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no era necesario relizar esta actividad ya que la estructura metalica de la cuberta se encuentra en buen estado.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**DISMINUYE (-)**	**CANTIDAD FINAL**
M		4,00	4,00	0,00

ITEMS	ACTIVIDAD			
7,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no era necesario relizar esta actividad ya que la cubierta se encuentra en buen estado			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**DISMINUYE (-)**	**CANTIDAD FINAL**
M2		18,00	18,00	0,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	18,00	8,00	10,00

ITEMS	ACTIVIDAD
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo el gobernador del resguardo realizo la solicitud de no instalar los modulos en malla, por lo cual no se realizara esta actividad.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	24,00	24,00	0,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
