I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **513 de 2025**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN __X__** **INTERVENTORÍA _____**

CONTRATISTA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

FECHA DE SUSCRIPCION: 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO: 22 de enero de 2026.

PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

SUSPENSION N° 1: N/A

REINICIO N° 1: N/A

FECHA DE TERMINACION: 21 de mayo de 2026.

FECHA DEL INFORME: 25 de marzo de 2026.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 16 de enero de 2026 se suscribe el contrato de obra No.114 de 2026, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025.
- El 31 de diciembre de 2025 se suscribe el contrato de consultoría No.513 de 2025, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 22 de enero de 2026 se firma el acta de inicio de los contratos No.114 de 2026 y No.513 de 2025.
    - En las primeras semanas se realizaron las visitas de diagnóstico, para determinar que se cumplan con los requisitos y las especificaciones técnicas para la construcción de cada beneficio.

- Mediante comité técnico se realizaron cambios de beneficiarios de acuerdo a las visitas de diagnóstico realizadas en campo.
- El 25 de marzo de 2026, se hizo entrega del **primer informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 22 de enero al 28 de febrero de 2026, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 22 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>GENERALIDADES</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>49,50%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>100.00</td><td>49,50</td><td>49,50%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>50%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>M3</td><td>3,20</td><td>1,60</td><td>50.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>50%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>M3</td><td>3,20</td><td>1,60</td><td>50.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.
TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE</td><td>50%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS
TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts
NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>2,00</td><td>50.00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts
NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS

PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores
8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
Nota: El contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>INFERIORES interiores
8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td>
<td>50%</td>
<td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>2,00</td><td>50.00%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td>
<td>50%</td>
<td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>2,00</td><td>50.00%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.7</td>
<td>SUMINISTRO ES</td>
<td>50%</td>
<td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA.</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td>UND</td><td>32.00</td><td>16,00</td><td>50.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>50%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>4.00</td><td>2,00</td><td>50.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>50%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>32,00</td><td>16,00</td><td>50,00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>M3</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>M3</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES
8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES
PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN
3 CURVAS DE 0.75
3 TUBOS RECTOS DE 0.25
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES
8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES
PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN
3 CURVAS DE 0.75
3 TUBOS RECTOS DE 0.25
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td>UND</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>UND</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>UND</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.7</td>
<td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td>UND</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna
Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>24.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en poli sombra negra al 80% anti uv</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>M2</td><td>52.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>M3</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC PRESIÓN BLANCA 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.3</td><td>INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC PRESIÓN BLANCA 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3,71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3,71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE,</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).		
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÁMETRO; 1,1 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	**0%**	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA, INCLUYE CLIP PARA POLISOMBRA Y SOGA DE AMARRE	**0%**	

	CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÁMETRO; 1,1 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	4.00	0,00	0%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA, INCLUYE CLIP PARA POLISOMBRA Y SOGA DE AMARRE	UND	4.00	0,00	0%

<table>
<tr><td>3.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>2.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>32.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td colspan="3">SISTEMA SÉPTICO ARD</td></tr>
<tr><td>4.1.1</td><td>REPLANTEO Y NIVELACIÓN LOCALIZACIÓN,</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>M2</td><td>16.00</td><td>4,00</td><td>25%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.1.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>M3</td><td>26,80</td><td>6,70</td><td>25%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>M2</td><td>56,80</td><td>14,20</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>KG</td><td>200,00</td><td>50,00</td><td>25%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.1.5</td><td>TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1.5</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>M2</td><td>16,00</td><td>4,00</td><td>25%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4.1.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.1.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16,00	4,00	25%

4.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	4,00	1,00	25%

4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	2,80	0,70	25%

4.1.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.1.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	4,00	1,00	25%

4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	24,00	6,00	25%

4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	**0%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UND	4.00	0,00	0%

4.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**		
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	2,56	0,64	25%

4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	3,49	0,87	25%

4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	4,00	1,00	25%

4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4.00	1,00	25%

4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	24,00	6,00	25%

4.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**		
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0,64	0,16	25%

4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**24,74%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,38	0,10	24,74%

4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	4.00	1,00	25%

4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4.00	1,00	25%

4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del ítem 4.2.5.	**25%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del ítem 4.2.5.	ML	24.00	6,00	25%

4.4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**

<table>
<tr><td>4.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>18,53%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>M2</td><td>36.00</td><td>6,67</td><td>18,53%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.4.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>3,00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA</td><td>ML</td><td>32.00</td><td>8,00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm</td><td>M3</td><td>2.00</td><td>0,50</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm</td><td>M3</td><td>2.00</td><td>0,50</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4.6</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIAL</td><td>25%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>4.00</td><td>1,00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4.7</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIAL</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>24.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL</td><td>25%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>48.00</td><td>12.00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>9,63%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>M3</td><td>8.00</td><td>0,77</td><td>9,63%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>5.3</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA</td>
<td>24,50%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.3</td><td>CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA</td><td>M3</td><td>2.00</td><td>0,49</td><td>24,50%</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>5.4</td>
<td>PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS</td>
<td>24,77%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.4</td><td>PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS</td><td>M2</td><td>44.00</td><td>10,90</td><td>24,77%</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>5.5</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)</td>
<td>25%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)</td><td>KG</td><td>75,20</td><td>18,80</td><td>25%</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>5.6</td>
<td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td>
<td>25%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.6</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>M2</td><td>37,60</td><td>9,40</td><td>25%</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>5.7</td>
<td>CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.</td>
<td>26,25%</td>
<td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.7</td><td>CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.</td><td>M3</td><td>0,80</td><td>0,21</td><td>26,25%</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>5.8</td>
<td>SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS. (INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).</td>
<td>23,10%</td>
<td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.8</td><td>SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS. (INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).</td><td>KG</td><td>112,00</td><td>25,87</td><td>23,10%</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>5.9</td>
<td>SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS. (INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM</td>
<td>19,25%</td>
<td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.9</td><td>SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS. (INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM</td><td>KG</td><td>72.00</td><td>13,86</td><td>19,25%</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>5.10</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS.
Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento.
Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibidos perfiles superpuestos.</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS.
Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento.
Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibidos perfiles superpuestos.</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>1,00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.11</td><td>SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34</td><td>25%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.11</td><td>SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34</td><td>M2</td><td>43,20</td><td>10,80</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.12</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>25%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>4.00</td><td>1,00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>25%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>32.00</td><td>8.00</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BIODIGESTORES ANAÉROBIOS DE DOBLE CAPA DE FLUJO CONTINUO CON CUBIERTA EN PLÁSTICO AGOLENE CALIBRE 6 RESISTENTE A RAYOS UV CON ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN TUBO PVC 1/2" PRESIÓN</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td colspan="3">SISTEMAS SEPTICOS ARD</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>120.00</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL</td><td>M3</td><td>12,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>6.3</td><td>CONSTRUCCIÓN BIODIGESTOR DOBLE CAPA DE 8 METROS DE LONGITUD UTIL, EN BOLSA TUBULAR DÍAMETRO 2 METROS, INCLUYE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA CARGUE Y SALIDA DE EFLUENTE, Y TUBERÍA DE 1/2 PULGADA PARA SUMINITRO DE BIOGAS AL QUEMADOR</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,3</td><td>CONSTRUCCIÓN BIODIGESTOR DOBLE CAPA DE 8 METROS DE LONGITUD UTIL, EN BOLSA TUBULAR DÍAMETRO 2 METROS, INCLUYE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA CARGUE Y SALIDA DE EFLUENTE, Y TUBERÍA DE 1/2 PULGADA PARA SUMINITRO DE BIOGAS AL QUEMADOR</td><td>UND</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4</td><td>CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SULFUROS (H2S) EN PVC</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,4</td><td>CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SULFUROS (H2S) EN PVC</td><td>UND</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.5</td><td>ESTRUCTURA TUBULAR PARA CUBIERTA EB TUBO DE PVC DE RIEGO A PRESIÓNY ZÓCALO EN MADERA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA PARA AJUSTE DE LA CUBIERTA</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,5</td><td>ESTRUCTURA TUBULAR PARA CUBIERTA EB TUBO DE PVC DE RIEGO A PRESIÓNY ZÓCALO EN MADERA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA PARA AJUSTE DE LA CUBIERTA</td><td>UND</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CALIBRE 6 DE 6 METROS DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV.</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CALIBRE 6 DE 6 METROS DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV.</td><td>UND</td><td>3.00</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.7</td><td>CAJA EN LADRILLO TOLETE 0,07 X0,12X 0,24, INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES 0,80 X0,80 X0,6 DEPROFUNDIDAD</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,7</td><td>CAJA EN LADRILLO TOLETE 0,07 X0,12X 0,24, INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES 0,80 X0,80 X0,6 DEPROFUNDIDAD</td><td>UND</td><td>6.00</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.9</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MATERIALES</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,9</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.10</td><td>TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,10</td><td>TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>18.00</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td colspan="3">ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corporación aporta el vinilo</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>7.1.1</td><td>DEMOLICIÓN DE PAÑETE O REVOQUE</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.1.1</td><td>DEMOLICIÓN DE PAÑETE O REVOQUE</td><td>M2</td><td>48,00</td><td>48,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.1.2</td><td>PAÑETE DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.1.2</td><td>PAÑETE DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS</td><td>M2</td><td>48.00</td><td>48,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.1.3</td><td>APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.1.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>M2</td><td>48.00</td><td>48,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.1.4</td><td>MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura</td><td>95,65%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.1.4</td><td>MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura</td><td>M2</td><td>822.00</td><td>786,21</td><td>95,65%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td colspan="3">ENCHAPES Y PISOS</td></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td>GUARDAESCOBA EN GRES O CERÁMICA</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td>GUARDAESCOBA EN GRES O CERÁMICA</td><td>ML</td><td>64,56</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.2.2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TIPO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.2.2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TIPO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA</td><td>M2</td><td>30.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.3</td><td colspan="3">CARPINTERIA EN MADERA</td></tr>
<tr><td>7.3.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBLERADA CON ACABADO MELÁMINICO</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.3.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBLERADA CON ACABADO MELÁMINICO</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.3.2</td><td>APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.3.2</td><td>APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)</td><td>M2</td><td>98,14</td><td>98,14</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.3.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMA MADERA</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.3.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMA MADERA</td><td>UND</td><td>6.00</td><td>6,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.4</td><td colspan="3">CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO</td></tr>
<tr><td>7.4.1</td><td>LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>M2</td><td>4.00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

7.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	6,70	6,70	100%

7.4.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,20	14,20	100%

7.4.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	KG	50.00	5 0,00	100%

7.4.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4.00	4,00	100%

7.4.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4.00	4,00	100%

7.4.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	1.00	1,00	100%

7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,70	0,70	100%

7.4.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.4.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE	M2	1.00	1,00	100%

<table>
<tr><td></td><td>REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT</td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4.10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.4.10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA</td><td>ML</td><td>6.00</td><td>6,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4.11</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO</td><td>0%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.4.11</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5</td><td colspan="3">TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80</td></tr>
<tr><td>7.5.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.5.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>M2</td><td>0,64</td><td>0,64</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.5.2</td><td>EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M</td><td>M3</td><td>0,87</td><td>087</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5.3</td><td>TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.5.3</td><td>TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.5.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5.5</td><td>SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2”
Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.5.5</td><td>SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2” Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.</td><td>ML</td><td>6.00</td><td>6,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.6</td><td colspan="3">CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60</td></tr>
<tr><td>7.6.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>100%</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.6.1</td><td>LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN</td><td>M2</td><td>0.16</td><td>0,16</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,22	0,22	100%

7.6.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.6.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	1.00	1,00	100%

7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	1,00	100%

7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del ítem 7.5.5.	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del ítem 7.5.5.	ML	6.00	6,00	100%

7.7	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**		
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.00	9,00	100%

7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3.00	3,00	100%

7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA DE INFILTRACION.	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA DE INFILTRACION.	ML	8.00	8,00	100%

7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0,50	0,50	100%

7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	**100%**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	UND	0,50	0,50	100%

<table>
<tr><td>7.7.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.7.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>4.00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>LOGÍSTICOS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bitácora o libro de obra: Llevar con el contratista una bitácora de obra, en donde se registran diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Exigir las firmas de las personas directamente implicadas en la ejecución de la obra. El libro de bitácora debe estar disponible el 100% del tiempo de ejecución en el sitio de obra para ser consultado por la supervisión o personal del proyecto cuenca río las Ceibas y deberá dar apertura al libro de bitácora con la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.</td><td>45,46%</td><td>La interventoría lleva con el contratista una bitácora, registrando diariamente los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de las actividades de obra, la cual se firma por parte de las personas directamente implicadas en la ejecución de la obra. Se encuentra disponible en el sitio de obra para ser consultado por la supervisión o el personal del proyecto.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mediciones de obra: Efectuar las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con las unidades de medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo planos de referencia. La Interventoría revisará el formato diligenciado por el Contratista en donde se registrará diariamente la ejecución de la obra. Aprobará las actividades ejecutadas y el contenido del formato elaborando actas de corte de obra.</td><td>45,46%</td><td>La interventoría realizó las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados en el periodo informado, de acuerdo con las medidas establecidas en las especificaciones técnicas y los planos del contrato, para dar aprobación a las actividades ejecutadas.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Comité de obra: Programar una reunión de Comité de Obra semanal con el contratista, el supervisor del contrato y demás personal que intervenga en la ejecución de los trabajos. Se llevarán actas de Comité de los puntos tratados, los problemas que se hayan presentado y las soluciones adoptadas.</td><td>45,46%</td><td>La Interventoría en cumplimiento de sus funciones, realizó comités técnicos con la participación del ente contratante y el contratista, para tratar los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales y jurídicos del contrato de obra No.490 de 2024, los mismos son anexados en los informes mensuales de interventoría</td></tr>
</table>

4	Inspección de obra: Evaluar e inspeccionar los trabajos ejecutados por el contratista con la programación presentada por el mismo. Controlar y vigilar la correcta construcción de cada una de las actividades que componen el contrato.	**45,46%**	La interventoría evaluó e inspeccionó los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo a la programación presentada, supervisando la correcta construcción de las actividades.
5	Suministros: Ejercer control permanente de los suministros de los diferentes materiales de construcción que se requieran para ejecutar las obras; y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el contratista, que no cumpla con las especificaciones técnicas y los planos, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos adecuados.	**45,46%**	La interventoría ejerció control permanente de los suministros de los diferentes materiales utilizados por el contratista para la ejecución de la obra, las cuales cumplieron con las especificaciones técnicas y los planos.
6	Control de calidad de los materiales: Exigir al contratista el suministro de las muestras de los materiales a utilizar antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas. Así mismo solicitar los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y las necesarias y convenientes de acuerdo al desarrollo de la obra.	**45,46%**	La interventoría exigió al contratista de obra el suministro de muestras de los materiales a utilizar y los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas, de acuerdo al desarrollo del contrato; durante el periodo informado no se ejecutaron actividades que requirieran de dichos ensayos y/o pruebas.
7	Realizar los siguientes informes en donde se consignará el avance de la obra de acuerdo a la programación y ejecución del contrato, atrasos en tiempo, costos, observaciones generales, cuadros comparativos, gráficos, fotografías, anexos, etc.: 1) Informe mensual, 2) Informe final.	**45,46%**	La interventoría realizó informes semanales y mensuales consignando allí el avance del contrato y exigió al contratista de obra la entrega de un informe mensual, detallando cada actividad realizada con su respectivo registro fotográfico.
	ADMINISTRATIVOS		
1	Exigir al contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en las reglas de	**45,46%**	La interventoría verificó que el contratista de obra entregara los Análisis de Precios Unitarios de las actividades, los cuales son la base para la aprobación y fijación de actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del contrato.

	participación, los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del proyecto.		
2	Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así mismo se exigirá la afiliación a la EPS y ARP de la totalidad del personal que intervenga en la obra. Se verificará el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.	**45,46%**	La interventoría durante el desarrollo del contrato, verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación de los mismos; además, que estuvieran afiliados a la EPS y ARL todo el personal que ha intervenido en la obra, cumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales, etc.
3	Mensualmente solicitar copia de los pagos al sistema integrado de seguridad social al ejecutor del contrato de obra y verificar las planillas del personal propuesto por el ejecutor del contrato de obra.	**45,46%**	La interventoría solicitó mensualmente copia de los pagos de seguridad social del personal en obra
4	Programar y coordinar por lo menos una reunión mensual con el contratista y con la CAM, para evaluar el desarrollo del contrato y se llevará un estricto control de las actas de las reuniones, las cuales serán entregadas en los informes periódicos que se entreguen.	**45,46%**	La Interventoría coordinó las reuniones entre las partes, para evaluar el desarrollo del contrato de obra No.490 de 2024.
5	Elaborar, revisar y suscribir las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato como son: Actas de iniciación de los trabajos, actas de reuniones que se celebren en la obra o en las instalaciones de la entidad, actas de suspensiones, de terminación, de recibo final y liquidación de obra, las cuales deberán ser firmadas por la entidad, la interventoría y el contratista, según el caso.	**45,46%**	La interventoría elaboró, revisó y suscribió las actas de inicio de obra e interventoría; además, los documentos necesarios para la ejecución del contrato, como: actas de comité técnico y/o reuniones. A la fecha no se han suscrito actas de suspensión y reinicio.
6	Revisar las solicitudes de adición y/o prórroga del plazo	**45,46%**	El contratista de obra no ha solicitado prórrogas.

	de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y se emitirá un concepto técnico al respecto a la entidad. Así mismo, elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el Representante legal, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.		
7	Revisar la vigencia de las pólizas del contrato y, cuando sea necesario ampliarlas en plazo, requerir al efecto al contratista antes del vencimiento, en un tiempo no menor de cinco (5) días hábiles, para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes.	**45,46%**	La interventoría revisó la vigencia de las pólizas del contrato de acuerdo a la actualización según la fecha de inicio del contrato.
8	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los trabajos y elaborar las respectivas actas a que haya lugar.	**45,46%**	La Interventoría atendió las reuniones citadas por la CAM, en desarrollo del contrato de obra No.490 de 2024.
9	Exigir y controlar la permanencia en los frentes de obra, del residente de obra y demás profesionales del contratista de acuerdo al % de dedicación exigido en el Pliego de Condiciones.	**45,46%**	La interventoría exigió al contratista la permanencia en los frentes de obra del residente y demás profesionales de acuerdo al porcentaje de dedicación exigido en el pliego de condiciones.
10	Mantener actualizado la carpeta del contrato, verificando documentos precontractuales y contractuales aportados en desarrollo del contrato objeto de interventoría, y deberá adelantar la foliación de los mismos conforme a las normas de archivo de la Corporación.	**45,46%**	La interventoría mantuvo la carpeta del contrato actualizada.
11	Permanecer en la obra en horas nocturnas, festivos y domingos programados o en horas no laborales comúnmente, y se exigirá la presencia del residente del contratista, así como de todos los profesionales que se requieran en la ejecución de dichos trabajos conforme a la	**45,46%**	La interventoría mantuvo su personal en el tiempo requerido y dedicación de cada profesional en obra.

	dedicación mensual.		
12	Exigir al contratista el estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial y bioseguridad, con el fin salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de las obras.	**45,46%**	La interventoría exigió al contratista de obra el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para todas las actividades ejecutadas por los trabajadores en obra, los cuales garantizaron la integridad física de los mismos.
13	Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos parciales o definitivos del contrato. Efectuar los requerimientos a que haya lugar al contratista.	**45,46%**	La interventoría mediante los informes semanales realizó las evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma presentado por el contratista, con el fin de ir previendo los posibles incumplimientos y así tomar las acciones a las que haya lugar.
14	Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitirlo a la entidad para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes.	**45,46%**	A la fecha no se ha efectuado la liquidación del contrato.
15	Revisar y aprobar las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que intervendrán en el contrato y/o cuando se requiera nuevo personal.	**45,46%**	La interventoría realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que han intervenido en la ejecución del contrato; a la fecha no se ha requerido nuevo personal.
16	En los casos en que amerite, ordenar la suspensión temporal de la respectiva ejecución hasta tanto no se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción de la interventoría y/o de la CAM, cuando el contratista utilice procedimientos inaceptables u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para el contratista o para la entidad o terceros.	**45,46%**	A la fecha la interventoría no ha ordenado la suspensión temporal de la ejecución del contrato, debido a que no se han presentado situaciones inaceptables en donde el contratista de obra haya realizado procedimientos u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para la entidad o terceros.
17	Exigir al contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.	**45,46%**	La interventoría ha verificado que el contratista de obra haya realizado los procedimientos y utilizado los equipos acordes a los requerimientos para la correcta ejecución de las actividades y que garanticen la seguridad y calidad de la obra.

18	Exigir verificadas e implementadas las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista, a su costo, las realice correctamente sin derecho a remuneración adicional, las obras de acuerdo con las especificaciones, técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato.	**45,46%**	La interventoría verificó que el contratista de obra a la fecha ha ejecutado las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de referencia; por lo tanto, no fue necesario la exigencia de medidas correctivas.
19	Verificar que el contratista mantenga a tiempo, durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta técnica.	**45,46%**	La interventoría verificó que el contratista de obra mantuviera el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecido en la propuesta técnica durante el periodo informado.
20	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el correcto desarrollo de los trabajos; todas las instrucciones que impartan al contratista serán por escrito y con copia a la CAM.	**45,46%**	La interventoría impartió al contratista de obra por escrito las instrucciones, órdenes y autorizaciones requeridas para el correcto desarrollo de las actividades, con conocimiento del supervisor de la CAM.
	TÉCNICOS		
1	Vigilar que las obras se ejecuten técnicamente y se verificará el cumplimiento de las condiciones generales y específicas técnicas para la correcta ejecución de las obras, se evitará entrabamientos con el contratista de obra y se colaborará en la solución de problemas surgidos en el desarrollo del mismo a fin de cumplir a satisfacción la ejecución del contrato.	**45,46%**	La interventoría vigiló que la obra se está ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato.
2	Coordinar y asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato	**45,46%**	La Interventoría coordinó y asistió a todas las reuniones, para tratar los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales y jurídicos del contrato de obra No.490 de 2024, los mismos son anexados en los informes mensuales de interventoría.
3	Verificar y aprobar la localización de los trabajos y verificar que la implantación de proyecto realizada por el contratista sea la correcta.	**45,46%**	La interventoría verificó y aprobó la localización e implantación de las obras realizados por el contratista, corroborando que fuera la correcta, de acuerdo a las condiciones encontradas en el terreno.
4	Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato y, a partir de la información suministrada, presentará un informe a la entidad sobre los	**45,46%**	La interventoría verificó las cantidades de obras establecidas en el contrato y ha presentado en los informes semanales y mensuales los aspectos ambientales que han repercutido en el normal desarrollo del contrato.

	aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones del mismo.		
5	Consolidar, verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las mediciones de los cortes de obra.	**45,46%**	La interventoría consolidó, verificó y aprobó las cantidades de obra ejecutadas en el período comprendido desde el 30 de diciembre de 2024 al 30 de abril de 2025.
6	Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En caso de identificación de cambio de especificaciones coordinar reunión extraordinaria con el contratista y la entidad, a fin de exigir que se cumpla con las especificaciones, de lo cual se realizará la respectiva acta.	**45,46%**	La interventoría verificó que el contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la CAM.
7	Verificar y garantizar que, en la ejecución de las obras, el contratista cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.	**45,46%**	La interventoría verificó que el contratista de obra en la ejecución de las actividades cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad y estabilidad.
8	Realizar los controles de las actividades programadas, así como recomendar los ajustes a que haya lugar en forma oportuna.	**45,46%**	La interventoría realizó los controles de las actividades programadas y recomendó los ajustes necesarios de manera oportuna para la correcta ejecución de la obra.
9	Exigir que la totalidad del personal del contratista, mantenga durante el tiempo de ejecución de los trabajos la dotación adecuada para la labor desempeñada, esto es, botas, casco, overol con el nombre de la empresa contratista en la espalda, monogafas y todos los elementos de seguridad industrial y bioseguridad necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar.	**45,46%**	La interventoría exigió al contratista de obra la permanencia del personal durante el tiempo ejecutado, con su respectiva dotación y elementos de protección personal.
	FINANCIEROS		
1	Revisar y aprobar las solicitudes de pago realizadas por el contratista.	**45,46%**	La interventoría revisó y aprobó la solicitud de pago realizada por el contratista para el primer pago que se anexa en el presente informe, mediante acta parcial No.1

2	Presentar un balance económico de ejecución del contrato, así como la concertación de cantidades para la liquidación final para efectos de la liquidación del contrato.	**45,46%**	Mediante los informes mensuales de interventoría se presenta en balance económico de ejecución del contrato. A la fecha el contrato se encuentra en ejecución y no se ha liquidado.
3	Efectuar el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial, vinculación del personal contratista a los sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades; así mismo que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación, en los términos de ley.	**45,46%**	La interventoría efectuó el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, verificando el cumplimiento del contratista de obra en cuanto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la vinculación de su personal al sistema de seguridad social integral y el pago oportuno de la misma.
4	Efectuar un control detallado de inversión en el contrato.	**45,46%**	La interventoría realizó control detallado de inversión del contrato.
5	Realizar mensualmente, en el respectivo informe, un análisis del avance financiero de las obras, a fin de prever con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la CAM tome para asegurar el flujo de fondos del contrato.	**45,46%**	La interventoría mediante los informes mensuales se realizó el análisis del avance financiero de la obra.
	JURÍDICOS		
1	Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.	**45,46%**	La interventoría verificó el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista de obra.
2	En general, asesorar, apoyar y mantener informada a la CAM, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo	**45,46%**	La interventoría asesoró, apoyó y mantuvo informada a la CAM, sobre todos los asuntos jurídicos en el desarrollo de la obra, con el fin de resolver aspectos jurídicos respecto a la ejecución del contrato.

	de las obras objeto del Contrato, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Subdirección que hará el seguimiento al contrato de Interventoría.		
	GENERALES		
1	Cumplir oportunamente el objeto contractual, no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, según la disposición del artículo 1603 del Código Civil y artículo 863 y 871 del Código de Comercio.	**45,46%**	
2	Cumplir el objeto del Contrato, realizando seguimiento permanente en la ejecución y entrega de la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, las especificaciones de construcción con sujeción a los precios unitarios estipulados.	**45,46%**	La interventoría cumplió con el objeto del contrato.
3	Como requisito para la suscripción del acta de inicio deberá presentar la afiliación del personal empleado para la ejecución del contrato (el personal propuesto como equipo técnico) al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales);	**45,46%**	La interventoría presentó afiliación del personal propuesto a la seguridad social.
4	Mantener indemne a la CAM de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	**45,46%**	La interventoría mantuvo a la CAM indemne de cualquier reclamación de terceras personas.
5	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño	**45,46%**	La interventoría responde civil y penalmente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales

	o perjuicio a la CAM o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.		
6	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	**45,46%**	La interventoría asumió los pagos generados por legalización del contrato y demás obligaciones
7	Notificar a la CAM en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	**45,46%**	La interventoría no ha realizado ninguna cesión de contrato
8	Notificar a la CAM cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	**45,46%**	La interventoría ha informado a la CAM de todas las circunstancias que han afectado el contrato.
9	Presentar los documentos que le solicite el supervisor y/o supervisor.	**45,46%**	La interventoría ha presentado la documentación requerida por el supervisor.
10	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	**45,46%**	La interventoría ha mantenido las condiciones exigidas en el contrato durante la ejecución del mismo.
11	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Supervisor.	**45,46%**	La interventoría presentó la documentación requerida por el supervisor para el acta de inicio firmada el 22 de enero de 2026.
12	El Contratista velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las	**45,46%**	La interventoría veló por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras

	directrices dicten las entidades competentes.		
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental y el seguimiento a la ejecución del contrato de obra cuyo objeto consiste en "EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA.", conforme a las condiciones técnicas establecidas en el contrato de obra por la Corporación.	**45,46%**	La interventoría cumplió con el objeto del contrato.
2	Realizar la interventoría a las obras a ejecutar	**45,46%**	La interventoría supervisó las actividades ejecutadas en el periodo por el contratista de obra
3	Entregar al contratista un acta de recibo de cada obra o ítem construida a satisfacción, conforme a los formatos entregados por la Corporación;	**45,46%**	La interventoría exigió al contratista la entrega de un acta de recibo de cada obra ejecutada a conformidad de los beneficiarios. Anexo 1
4	Realizar las visitas necesarias de campo durante la ejecución del contrato, a cada uno de los sitios donde se ejecutarán las obras, actividades y/o inversiones. De cada visita se deberán tomar registros fotográficos y coordenadas geográficas para su localización exacta, y presentar informes, de conformidad con el formato que se acuerde con la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM al inicio del contrato;	**45,46%**	La interventoría realizó visitas de campo a cada beneficiario, durante la ejecución del contrato y se tomó registro de cada visita realizada.

5	Evaluar los informes presentados por el ejecutor del contrato objeto de esta interventoría, verificar la documentación anexa y emitir para el caso el respectivo concepto de la interventoría, para el recibo o no de las actividades y obras, así como sus respectivos desembolsos;	**45,46%**	La interventoría revisó y evaluó los informes presentados por el contratista de obra, el cual debe contener la información pertinente a las actividades realizadas en el periodo.
6	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista para con la CAM, e informar oportunamente y por escrito a la CAM cualquier anormalidad;	**45,46%**	La interventoría vigilo el cumplimiento de las obligaciones del contratista con la CAM.
7	Proyectar y suscribir actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo final y liquidación del contrato, cuya interventoría le haya sido asignada;	**45,46%**	La interventoría suscribió actas de inicio del proyecto el día 22 de enero de 2026.
8	Proyectar solicitudes de desembolso del contrato objeto de esta interventoría, conforme a las actas parciales de recibo generadas, para lo cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y que se haya realizado el cargue de la información requerida para cada pago en el secop II y emitir un concepto de que se puede adelantar el pago por parte de la supervisión;	**45,46%**	La interventoría proyectó solicitud de desembolso del contratista de obra, conforme acta parcial No.1, la cual se cargó la información en el Secop II. Anexo 2
9	Realizar al contratista del contrato objeto de interventoría la solicitud de actualización de pólizas si a ello hubiere lugar;		La interventoría solicito al contratista al contratista de obra mantener las pólizas actualizadas
10	Verificar conforme a los requisitos de Ley, los documentos técnicos y jurídicos que soportan las solicitudes de desembolso presentada por el contratista;	**45,46%**	La interventoría revisó y aprobó la documentación técnica presentada por el contratista de obra para desembolso del acta
	OBLIGACONES DE INFORMACION		
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la CAM, el Supervisor o de los organismos de control.	**45,46%**	La interventoría atendió y resolvió las observaciones realizadas por la CAM.
2	Presentar informes técnicos, administrativos, contables, jurídicos y financieros de avance de la ejecución física mensuales y final del contrato	**45,46%**	La interventoría presentó informes mensuales con avances financieros y físicos de la obra.

	objeto de interventoría, conforme a presentación de informes del contrato de obra. Dichos informes estarán soportados con los Informes de ejecución física y financiera, actas parciales, finales, de liquidación, informes de interventoría, desembolsos autorizados, comprobantes de egreso, órdenes de pago, registros fotográficos, registros presupuestales, entre otros; ejecutados por el contrato objeto de esta interventoría		
3	Diligenciar el formato F-CAM-066 que será requisito previo para la liquidación del contrato, la cual se debe presentar en medio físico y magnético.	**45,46%**	La interventoría previa a la liquidación del contrato presentará el formato F-CAM-066.
4	Presentar los informes conforme lo requiera la Corporación, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Supervisión.	**45,46%**	La interventoría presento los informes, de acuerdo a lo requerido por la entidad
5	Elaborar y presentar las actas de necesarias de acuerdo con los porcentajes de ejecución.	**45,46%**	La interventoría elaboró y presentó acta de acuerdo al porcentaje ejecutado.
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II.	**45,46%**	La interventoría publicó en la plataforma Secop II la totalidad de documentos generados en la ejecución del contrato.
	OBLIGACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
1	Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta profesional vigente;	**45,46%**	Los profesionales propuestos cuentan con tarjeta profesional vigente
2	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP), según el caso.	**45,46%**	La interventoría dio estricto y oportuno cumplimiento al pago al sistema integral de seguridad social del personal.

3	Dar cumplimiento a la normatividad vigente con respecto al Sistema de Riesgos laborales y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST en cumplimiento de la Resolución No. 312 de 2019 y suministrar a la CAM la información y documentación que ésta solicite en cumplimiento de la normatividad vigente.	**45,46%**	La interventoría dio cumplimiento a los distintos sistemas de gestión.
4	Disponer de los elementos de seguridad industrial y de bioseguridad que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato;	**45,46%**	La interventoría dispuso de los elementos de seguridad industrial y bioseguridad que se requirieron en las actividades contractuales.
5	Adoptar la política “Cero Papel” y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	**45,46%**	La interventoría adopto la política de la CAM de cero papel y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos.
6	No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	**45,46%**	La interventoría no contrato ningún menor de edad en la ejecución del contrato.
	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL REQUERIDO		
1	Vincular y mantener en la ejecución de las actividades, la totalidad del personal requerido y propuesto para tal fin.	**45,46%**	La interventoría mantuvo la totalidad del personal propuesto durante la ejecución del contrato
2	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y;	**45,46%**	La interventoría cumplió con las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.

	dotación de calzado y vestido de labor.		
3	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.	**45,46%**	La interventoría asumió el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal ocupado en el contrato.
4	Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación Familiar (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2.007 Art. 23 cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.	**45,46%**	La interventoría cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral de todo el personal.
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la CAM, por causa o con ocasión del contratante.	**45,46%**	No se han presentado reclamaciones de ningún tipo.
	Promedio de % Cumplimiento	**45,46%**	Según Acta de recibo parcial No.1 de interventoría. Anexo 3

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	**SECADEROS DE CAFÉ**										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100.00	$ 1,505,036.40	0.29%	49.50	$ 744,993.00	0.14%	50.50	$ 760,043.00	0.15%
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3.20	$ 192,381.00	0.04%	1.60	$ 96,191.00	0.02%	1.60	$ 96,190.00	0.02%
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3.20	$ 4,258,015.00	0.83%	1.60	$ 2,129,008.00	0.41%	1.60	$ 2,129,007.00	0.41%
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON	UND	4.00	$ 39,764,866.00	7.71%	2.00	$ 19,882,433.00	3.86%	2.00	$ 19,882,433.00	3.86%
1.5	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2	UND	4.00	$ 19,658,621.00	3.81%	2.00	$ 9,829,311.00	1.91%	2.00	$ 9,829,310.00	1.91%
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS	UND	4.00	$ 10,335,357.00	2.00%	2.00	$ 5,167,679.00	1.00%	2.00	$ 5,167,678.00	1.00%
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA	UND	32.00	$ 36,668,647.00	7.11%	16.00	$ 18,334,323.61	3.56%	16.00	$ 18,334,323.00	3.56%
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	$ 7,260,060.00	1.41%	2.00	$ 3,630,030.00	0.70%	2.00	$ 3,630,030.00	0.70%
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32.00	$ 4,169,678.00	0.81%	16.00	$ 2,084,839.00	0.40%	16.00	$ 2,084,839.00	0.40%
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO**			$ -							
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	75.00	$ 1,128,777.30	0.22%	75.00	$ 1,128,777.30	0.22%	0.00	$ -	0.00%
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	2.40	$ 144,286.00	0.03%	2.40	$ 144,286.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	2.40	$ 3,193,514.00	0.62%	2.40	$ 3,193,514.00	0.62%	0.00	$ -	0.00%
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA	UND	3.00	$ 30,660,082.00	5.94%	3.00	$ 30,660,082.00	5.94%	0.00	$ -	0.00%
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE	UND	3.00	$ 14,743,966.00	2.86%	3.00	$ 14,743,966.00	2.86%	0.00	$ -	0.00%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS	UND	3.00	$ 7,751,518.00	1.50%	3.00	$ 7,751,518.00	1.50%	0.00	$ -	0.00%
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA	UND	24.00	$ 27,501,485.00	5.33%	24.00	$ 27,501,485.00	5.33%	0.00	$ -	0.00%
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3.00	$ 5,445,045.00	1.06%	3.00	$ 5,445,045.00	1.06%	0.00	$ -	0.00%
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	24.00	$ 3,127,258.00	0.61%	0.00	$ -	0.00%	24.00	$ 3,127,258.00	0.61%
3	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS,**			$ -							
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	52.00	$ 782,619.00	0.15%	0.00	$ -	0.00%	52.00	$ 782,619.00	0.15%
3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	2.00	$ 120,238.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%	2.00	$ 120,238.00	0.02%
3.3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN	UND	4.00	$ 5,005,084.00	0.97%	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 5,005,084.00	0.97%
3.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3,71	UND	4.00	$ 19,483,235.00	3.78%	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 19,483,235.00	3.78%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA	UND	4.00	$ 22,217,529.00	4.31%	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 22,217,529.00	4.31%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y	UND	4.00	$ 3,484,260.00	0.68%	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 3,484,260.00	0.68%
3.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2.00	$ 3,630,030.00	0.70%	0.00	$ -	0.00%	2.00	$ 3,630,030.00	0.70%
3.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32.00	$ 4,169,678.00	0.81%	0.00	$ -	0.00%	32.00	$ 4,169,678.00	0.81%

4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN**			$ -								
4.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**			$ -								
4.1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	16.00	$ 240,806.00	0.05%	4.00	$ 60,201.50	0.01%	12.00	$ 180,604.50	0.04%
4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	26.80	$ 1,611,188.13	0.31%	6.70	$ 402,797.03	0.08%	20.10	$ 1,208,391.10	0.23%
4.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	56.80	$ 13,538,003.00	2.63%	14.20	$ 3,384,500.75	0.66%	42.60	$ 10,153,502.25	1.97%
4.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	200.00	$ 5,898,722.00	1.14%	50.00	$ 1,474,680.50	0.29%	150.00	$ 4,424,041.50	0.86%
4.1.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16.00	$ 3,129,094.00	0.61%	4.00	$ 782,273.50	0.15%	12.00	$ 2,346,820.50	0.46%
4.1.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16.00	$ 3,381,202.00	0.66%	4.00	$ 845,300.50	0.16%	12.00	$ 2,535,901.50	0.49%
4.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	4.00	$ 2,796,950.00	0.54%	1.00	$ 699,237.50	0.14%	3.00	$ 2,097,712.50	0.41%
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	2.80	$ 1,965,751.00	0.38%	0.70	$ 491,437.75	0.10%	2.10	$ 1,474,313.25	0.29%
4.1.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO	M2	4.00	$ 1,062,817.00	0.21%	1.00	$ 265,704.25	0.05%	3.00	$ 797,112.75	0.15%
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	24.00	$ 1,519,019.00	0.29%	6.00	$ 379,754.75	0.07%	18.00	$ 1,139,264.25	0.22%
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO	UND	4.00	$ 1,487,264.00	0.29%	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 1,487,264.00	0.29%
4.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**			$ -							
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	2.56	$ 38,529.00	0.01%	0.64	$ 9,632.25	0.00%	1.92	$ 28,896.75	0.01%
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	3.49	$ 209,690.43	0.04%	0.87	$ 52,302.37	0.01%	2.62	$ 157,388.06	0.03%
4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	4.00	$ 4,932,039.00	0.96%	1.00	$ 1,233,009.75	0.24%	3.00	$ 3,699,029.25	0.72%
4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4.00	$ 788,378.00	0.15%	1.00	$ 197,094.50	0.04%	3.00	$ 591,283.50	0.11%
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"	ML	24.00	$ 1,220,054.00	0.24%	6.00	$ 305,013.50	0.06%	18.00	$ 915,040.50	0.18%
4.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**			$ -							
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.64	$ 9,632.00	0.00%	0.16	$ 2,408.00	0.00%	0.48	$ 7,224.00	0.00%
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	0.38	$ 23,086.00	0.00%	0.10	$ 5,711.38	0.00%	0.29	$ 17,374.62	0.00%
4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	4.00	$ 3,956,400.00	0.77%	1.00	$ 989,100.00	0.19%	3.00	$ 2,967,300.00	0.58%
4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4.00	$ 788,378.00	0.15%	1.00	$ 197,094.50	0.04%	3.00	$ 591,283.50	0.11%
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE SANITARIA DE 2"	ML	24.00	$ 1,220,054.00	0.24%	6.00	$ 305,013.50	0.06%	18.00	$ 915,040.50	0.18%
4.4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE**			$ -							
4.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	36.00	$ 541,813.00	0.11%	6.67	$ 100,385.91	0.02%	29.33	$ 441,427.09	0.09%
4.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	12.00	$ 721,428.00	0.14%	3.00	$ 180,357.00	0.03%	9.00	$ 541,071.00	0.10%
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	Ml	32.00	$ 1,604,877.00	0.31%	8.00	$ 401,219.25	0.08%	24.00	$ 1,203,657.75	0.23%
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	2.00	$ 1,139,863.00	0.22%	0.50	$ 284,965.75	0.06%	1.50	$ 854,897.25	0.17%
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	UND	2.00	$ 1,113,309.00	0.22%	0.50	$ 278,327.25	0.05%	1.50	$ 834,981.75	0.16%
4.4.6	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	$ 7,260,060.00	1.41%	1.00	$ 1,815,015.00	0.35%	3.00	$ 5,445,045.00	1.06%
4.4.7	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	24.00	$ 3,127,258.00	0.61%	0.00	$ -	0.00%	24.00	$ 3,127,258.00	0.61%

5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL**			$ -							
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	48.00	$ 722,417.00	0.14%	12.00	$ 180,604.25	0.04%	36.00	$ 541,812.75	0.11%
5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	8.00	$ 480,952.00	0.09%	0.77	$ 46,291.63	0.01%	7.23	$ 434,660.37	0.08%
5.3	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	M3	2.00	$ 2,661,262.00	0.52%	0.49	$ 652,009.19	0.13%	1.51	$ 2,009,252.81	0.39%
5.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	M2	44.00	$ 8,483,239.00	1.64%	10.90	$ 2,101,529.66	0.41%	33.10	$ 6,381,709.34	1.24%
5.5	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	Kg	75.20	$ 1,602,299.00	0.31%	18.80	$ 400,574.75	0.08%	56.40	$ 1,201,724.25	0.23%
5.6	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	37.60	$ 8,961,728.00	1.74%	9.40	$ 2,240,432.00	0.43%	28.20	$ 6,721,296.00	1.30%
5.7	CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.	M3	0.80	$ 1,296,956.00	0.25%	0.21	$ 340,450.95	0.07%	0.59	$ 956,505.05	0.19%
5.8	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA	KG	112.00	$ 3,303,284.00	0.64%	25.87	$ 762,999.62	0.15%	86.13	$ 2,540,284.38	0.49%
5.9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	KG	72.00	$ 1,536,158.00	0.30%	13.86	$ 295,710.42	0.06%	58.14	$ 1,240,447.59	0.24%
5.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS.	UND	4.00	$ 17,777,687.00	3.45%	1.00	$ 4,444,421.75	0.86%	3.00	$ 13,333,265.25	2.59%
5.11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34	M2	43.20	$ 3,138,451.00	0.61%	10.80	$ 784,612.75	0.15%	32.40	$ 2,353,838.25	0.46%
5.12	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	$ 7,260,060.00	1.41%	1.00	$ 1,815,015.00	0.35%	3.00	$ 5,445,045.00	1.06%
5.13	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32.00	$ 4,169,678.00	0.81%	8.00	$ 1,042,419.50	0.20%	24.00	$ 3,127,258.50	0.61%
6	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BIODIGESTORES ANAÉROBIOS DE DOBLE CAPA DE FLUJO CONTINUO**			$ -							
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	120.00	$ 1,806,044.00	0.35%	0.00	$ -	0.00%	120.00	$ 1,806,044.00	0.35%
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	12.00	$ 721,428.00	0.14%	0.00	$ -	0.00%	12.00	$ 721,428.00	0.14%
6.3	CONSTRUCCIÓN BIODIGESTOR DOBLE CAPA DE 8 METROS DE LONGITUD UTIL, EN BOLSA TUBULAR	Unidad	3.00	$ 13,082,011.00	2.54%	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 13,082,011.00	2.54%
6.4	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SULFUROS (H2S) EN PVC	Unidad	3.00	$ 741,277.00	0.14%	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 741,277.00	0.14%
6.5	ESTRUCTURA TUBULAR PARA CUBIERTA EB TUBO DE PVC DE RIEGO A PRESIÓNY ZÓCALO EN MADERA EN LA	Unidad	3.00	$ 2,425,962.00	0.47%	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 2,425,962.00	0.47%
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CALIBRE 6 DE 6 METROS DE ANCHO	Unidad	3.00	$ 2,938,278.00	0.57%	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 2,938,278.00	0.57%
6.7	CAJA EN LADRILLO TOLETE 0,07 X0,12X 0,24, INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES 0,80 X0,80	Unidad	6.00	$ 6,366,142.00	1.23%	0.00	$ -	0.00%	6.00	$ 6,366,142.00	1.23%
6.9	TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MATERIALES	Viaje	3.00	$ 5,445,045.00	1.06%	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 5,445,045.00	1.06%
6.1	TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES	Viaje	18.00	$ 2,345,444.00	0.45%	0.00	$ -	0.00%	18.00	$ 2,345,444.00	0.45%

7.5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**			$ -								
7.5.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.64	$ 9,632.00	0.00%	0.64	$ 9,632.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
7.5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	0.87	$ 52,423.00	0.01%	0.87	$ 52,423.00	0.01%	0.00	$ -	0.00%
7.5.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE	UND	1.00	$ 1,233,010.00	0.24%	1.00	$ 1,233,010.00	0.24%	0.00	$ -	0.00%
7.5.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	$ 197,095.00	0.04%	1.00	$ 197,095.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%
7.5.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2"	ML	6.00	$ 305,013.00	0.06%	6.00	$ 305,013.00	0.06%	0.00	$ -	0.00%
7.6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**			$ -								
7.6.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.16	$ 2,408.00	0.00%	0.16	$ 2,408.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	0.22	$ 12,985.00	0.00%	0.22	$ 12,985.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
7.6.3	CAJA DE INSPECCION DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0.10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE	UND	1.00	$ 989,100.00	0.19%	1.00	$ 989,100.00	0.19%	0.00	$ -	0.00%
7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	$ 197,095.00	0.04%	1.00	$ 197,095.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2"	ML	6.00	$ 305,013.00	0.06%	6.00	$ 305,013.00	0.06%	0.00	$ -	0.00%
7.7	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE**			$ -								
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.00	$ 135,453.28	0.03%	9.00	$ 135,453.28	0.03%	0.00	$ -	0.00%
7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	M3	3.00	$ 180,357.00	0.03%	3.00	$ 180,357.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA	MI	8.00	$ 401,219.00	0.08%	8.00	$ 401,219.00	0.08%	0.00	$ -	0.00%
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	0.50	$ 284,966.00	0.06%	0.50	$ 284,966.00	0.06%	0.00	$ -	0.00%
7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0.50	$ 278,327.00	0.05%	0.50	$ 278,327.00	0.05%	0.00	$ -	0.00%
7.7.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	$ 7,260,060.00	1.41%	4.00	$ 7,260,060.00	1.41%	0.00	$ -	0.00%
B	**Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.**	TALLER	16.00	$ 15,708,000.00	3.05%	0.00	$ -	0.00%	16.00	$ 15,708,000.00	3.05%
	VALOR TOTAL			**$ 515,733,326.54**	**100.00%**		**$ 234,476,600.02**	**45.46%**		**$ 281,256,726.52**	**54.54%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Construcción de infraestructura rural como estrategia de reconversión de sectores productivos a la adaptación al cambio climático y mantenimiento de infraestructura institucional en el predio la colonia.	$ 515.733.326,54	$ 234.476.600,02	$ 281.256.726,52	**45,46%**	En el presente período ejecutó por encima del porcentaje de la reprogramación establecida para el contrato, ejecutando un porcentaje equivalente al **45,46%** vs el **12,80%** del programado; teniendo en cuenta que el contratista aumentó la mano de obra. El contratista está cumpliendo el alcance y las especificaciones técnicas del contrato.

INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA					EJECUCIÓN INTERVENTORÍA				
No.	**DESCRIPCIÓN CONTRATO OBRA**	**VALOR INICIAL CONTRATO**	**VALOR ADICIÓN CONTRATO**	**VALOR FINAL CONTRATO**	**ACTA No.**	**COSTO PRESENTE ACTA**	**PORCENTAJE PRESENTE ACTA**	**COSTO ACUMULADO**	**PORCENTAJE ACUMULADO**
114-2026	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA.	$ 515,733,326.54	$ -	$ 515,733,326.54	1	$ 20,475,184.00	45.46%	$ 20,475,184.00	45.46%
VALOR TOTAL OBRAS PARA REALIZAR INTERVENTORIA		**$ 515,733,326.54**	**$ -**	**$ 515,733,326.54**		**$ 20,475,184.00**	**45.46%**	**$ 20,475,184.00**	**45.46%**
	COSTO INTERVENTORIA	$ 45,040,000.00				$ 20,475,184.00		$ 20,475,184.00	
	IVA - 19%	$ 8,557,600.00				$ 3,890,284.96		$ 3,890,284.96	
	TOTAL COSTO INTERVENTORIA	**$ 53,597,600.00**				**$ 24,365,468.96**		**$ 24,365,468.96**	
	PORCENTAJE COSTO INTERVENTORIA SOBRE VALOR CONTRATO	10.39%							
VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA:		**VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTA**							

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública cuyo objeto es "construcción de obras civiles de equipamiento rural y el mantenimiento infraestructura de equipamiento institucional en el proceso de implementación del POMCA rio Loro, rio Las Ceibas y otros directos al Magdalena".	$53.597.600,00	$24.365.468,96	$29.232.131,04	**45,46%**	La ejecución de las actividades se realizó según lo establecido en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	4.5
Cantidad entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La interventoría ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, recibiendo a satisfacción un total de 1 sistemas sépticos de aguas residuales domésticas; 3 secaderos de cacao; 2 secaderos de café; 1 compostera y parte del mantenimiento a las instalaciones en La Colonia; correspondientes al 45,46% de las actividades ejecutadas en el contrato de obra. En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, así: PAGOS PARCIALES: En el mismo porcentaje en el que se realicen los pagos parciales del contrato objeto de interventoría hasta un 80% del valor del contrato de Interventoría.*

PAGO FINAL: El veinte por ciento (20%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminado y liquidado el contrato de obra objeto de interventoría...", el Supervisor considera conveniente adelantar el trámite para el primer pago correspondiente a **$24.365.468,96** M/cte., según acta de recibo parcial No.1 de interventoría, que comprende el período de ejecución desde el 22 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$24.365.468,96
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR	**$24.365.468,96**

Atentamente,

Vo. Bo. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor contrato No.513 de 2025.

ANEXO 1
ACTAS DE RECIBO INDIVIDUAL

BENEFICIARIOS SISTEMAS SÉPTICOS ARD (1)

No.	VEREDA	BENEFICIARIO	CÉDULA
1	Platanillal	Serafín Aya	12.547.625

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
27/02/2026	HUILA		NEIVA	PLATANILLAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
SERAFIN AYA	12.547.625

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN, actuando en representación del Consorcio infraestructura rural 2025, Nit.902.021.671-4, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales. Así mismo, se deja expresa constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el beneficiario, no existiendo reclamaciones pendientes derivadas de la ejecución contractual a la fecha de suscripción del presente documento.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M,	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	50,00
TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4,00
PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,70
PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	6,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UNIDAD	1,00
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIELACION	M2	0,64
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,87
TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLA EN GENERAL	UNIDAD	1,00
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0,16
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,10
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UNIDAD	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 4.2.5.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIELACION	M2	6,67
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M,	M3	3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0,50

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: SERAFIN AYA
Cédula: 12.547.625


Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584


ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025


OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

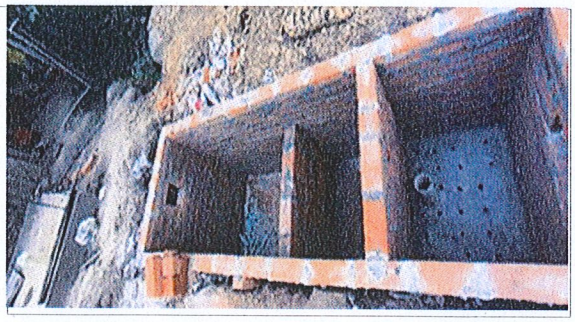

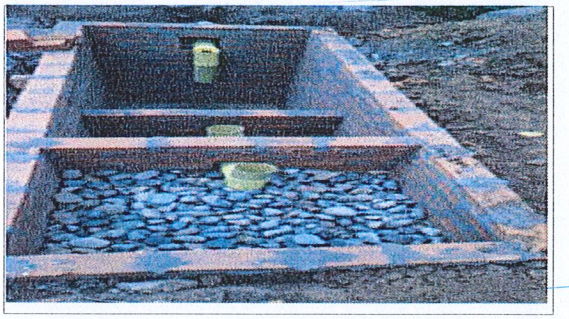

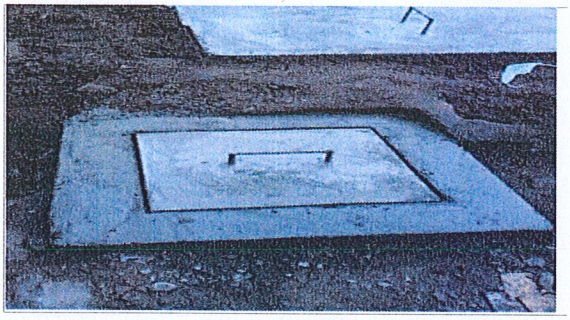

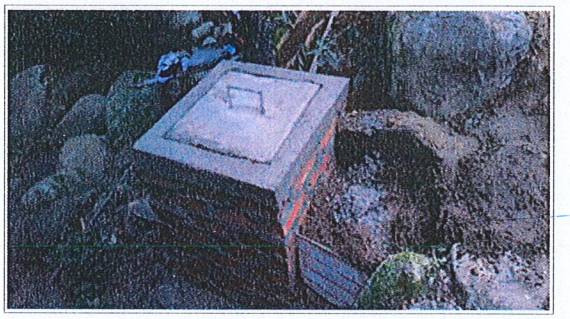

BENEFICIARIOS SECADEROS DE CAFE (2)

No.	VEREDA	BENEFICIARIO	CÉDULA
1	La Plata	Albéniz González	26.542.704
2	Pueblo Nuevo	Ernesto Alarcón	12.126.213

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
25/02/2026	HUILA		NEIVA	LA PLATA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LUZ ALBENIS GONZALES VEGA	26.542.704

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN, actuando en representación del Consorcio infraestructura rural 2025, Nit.902.021.671-4, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales. Así mismo, se deja expresa constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el beneficiario, no existiendo reclamaciones pendientes derivadas de la ejecución contractual a la fecha de suscripción del presente documento.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	0,80
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS. TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio infraestructura rural 2025

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

Luz Albenis Gonzalez V.

Nombre: LUZ ALBENIS GONZALES VEGA
Cédula: 55.169.722


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584


ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025


OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

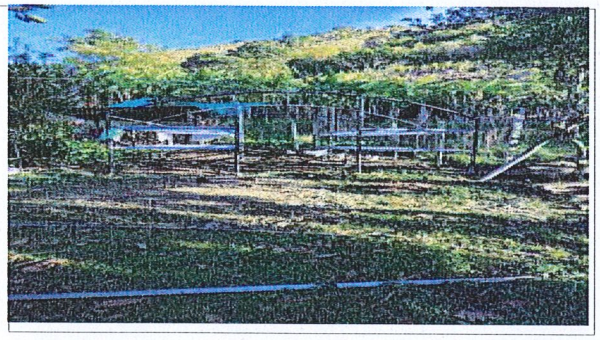



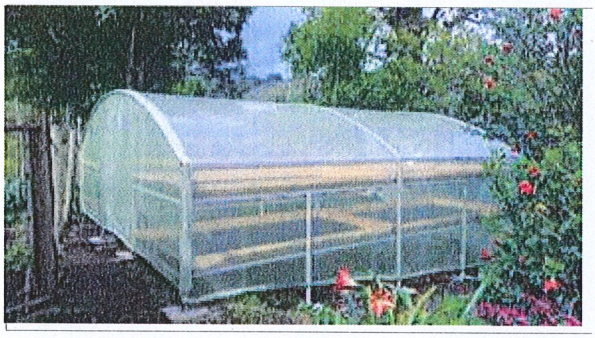

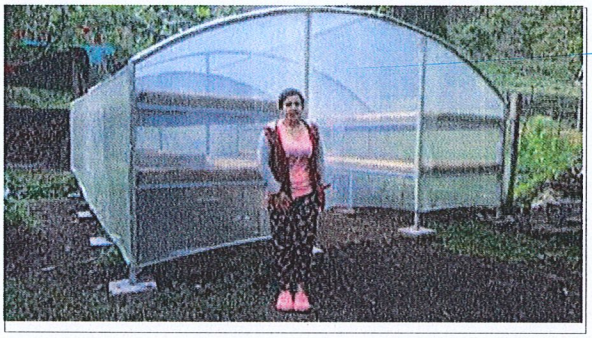

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
25/02/2026	HUILA		NEIVA	PUEBLO NUEVO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ERNESTO ALARCON SILVA	12.126.213

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN, actuando en representación del Consorcio infraestructura rural 2025, Nit.902.021.671-4, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales. Así mismo, se deja expresa constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el beneficiario, no existiendo reclamaciones pendientes derivadas de la ejecución contractual a la fecha de suscripción del presente documento.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	0,80
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS. TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio infraestructura rural 2025

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

E A.S

Nombre: ERNESTO ALARCON SILVA
Cédula: 12.126.213


Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584


ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

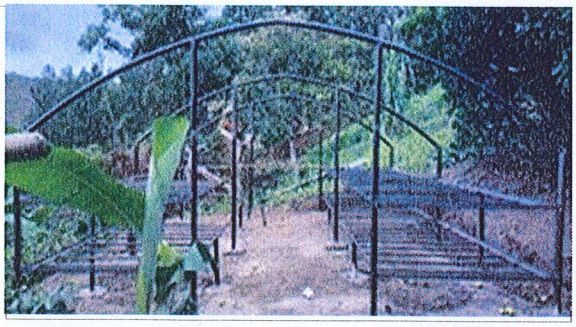

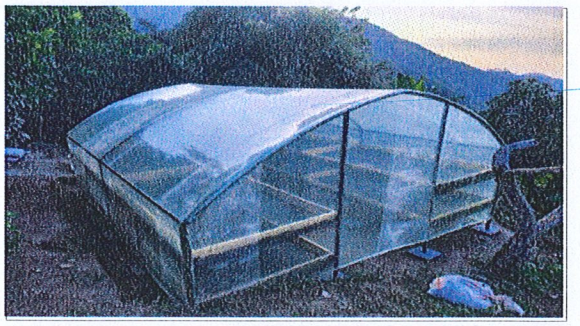

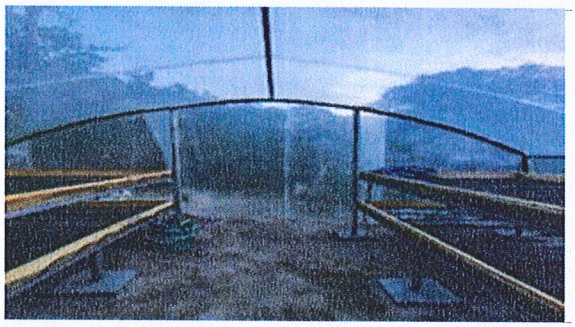



BENEFICIARIOS SECADEROS DE CACAO (3)

No.	VEREDA	BENEFICIARIO	CÉDULA
1	Los Medios	Ilcia María Guevara	26.554.556
2	La Honda	Manuel Gómez Calderón	83.228.406
3	Alto Guadual	Jorge Mosquera García	4.932.538

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CACAO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
24/02/26	HUILA		RIVERA	ALTO GUADUAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	R.L OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JORGE MOSQUERA GARCIA	4.932.538

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO, actuando en representación del Consorcio Infraestructura Rural 2025, Nit.902.021.671-4 contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	25,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CACAO, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SENTIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio Infraestructura Rural 2025

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

JORGE MOSQUERA
Nombre: JORGE MOSQUERA
Cédula: 4.932.538


Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025


OBRA: SECADERO DE CACAO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

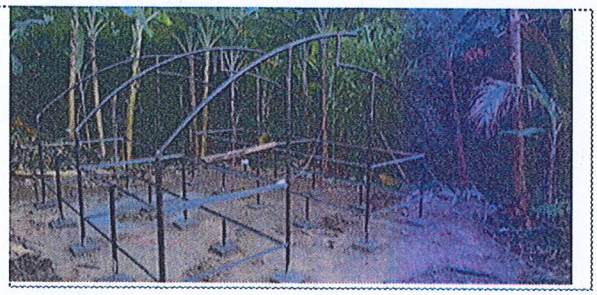

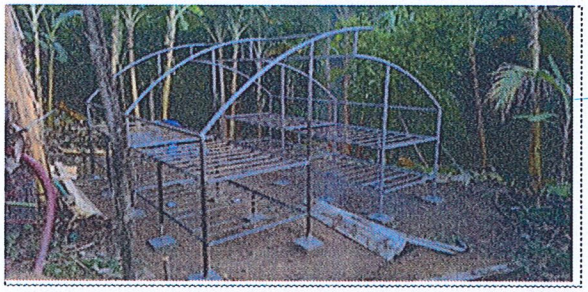



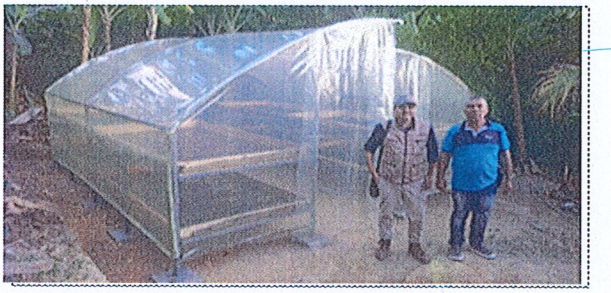

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CACAO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
24/02/26	HUILA		RIVERA	LOS MEDIOS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ILCIA MARIA GUEVARA	26.554.556

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO, actuando en representación del Consorcio Infraestructura Rural 2025, Nit.902.021.671-4 contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	25,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M. ACARREO HORIZONTAL	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CACAO, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SENTIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLASTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio Infraestructura rural 2025

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Interventoria:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

ILCIA MARIA G

Nombre: ILCIA MARIA GUEVARA
Cédula: 26.554.556

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584


ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025


OBRA: SECADERO DE CACAO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA





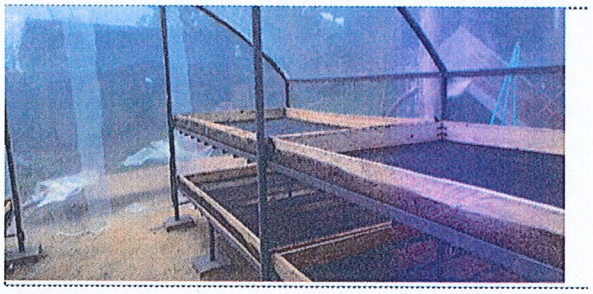

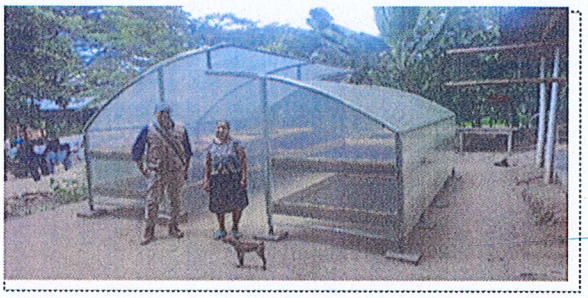

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CACAO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
24/02/26	HUILA		RIVERA	ALTO GUADUAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	R.L OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JORGE MOSQUERA GARCIA	4.932.538

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO, actuando en representación del Consorcio Infraestructura Rural 2025, Nit.902.021.671-4 contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	25,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CACAO, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SENTIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio Infraestructura Rural 2025

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

x JORGE MOSQUERA

Nombre: JORGE MOSQUERA
Cédula: 4.932.538

Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA: SECADERO DE CACAO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



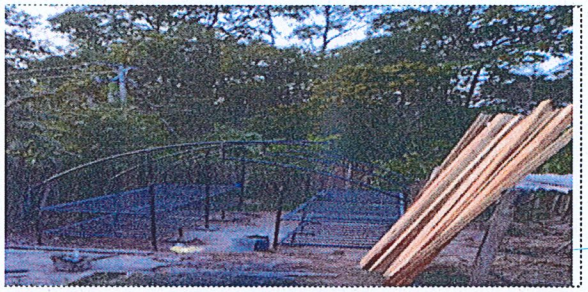





BENEFICIARIOS COMPOSTERA (1)

No.	VEREDA	BENEFICIARIO	CÉDULA
1	Los Cauchos	Ernesto Alarcón Silva	12.126.213

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025

OBRA:COMPOSTERA

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
27/02/2026	HUILA		NEIVA	PUEBLO NUEVO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ERNESTO ALARCON SILVA	12.126.216

En Neiva - Huila, se reunieron OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN, actuando en representación del Consorcio infraestructura rural 2025, Nit.902.021.671-4, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales. Así mismo, se deja expresa constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el beneficiario, no existiendo reclamaciones pendientes derivadas de la ejecución contractual a la fecha de suscripción del presente documento.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	12,00
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2,00
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,50
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE	M2	11,00
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	KG	18,80
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	9,40
CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.	M3	0,21
N DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARM/	KG	28,00
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	KG	18,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS. Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento. Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibido perfiles superpuestos.	Unidad	1,00
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34	M2	10,80

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio infraestructura rural 2025

Nombre (RL): OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

E A.S

Nombre: ERNESTO ALARCON SILVA
Cédula: 12.126.216


Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584


ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 114 DE 2025


OBRA:COMPOSTERA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

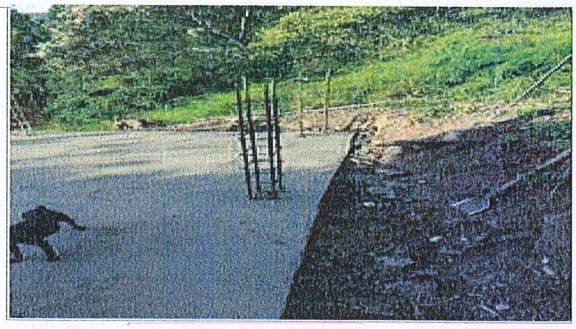

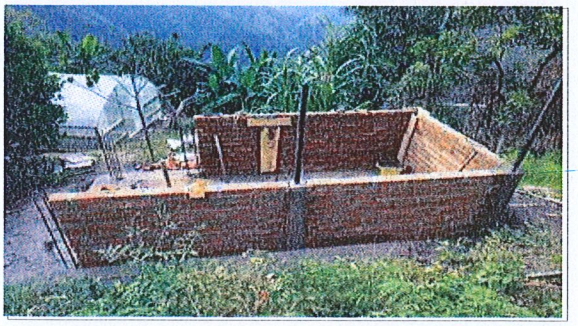

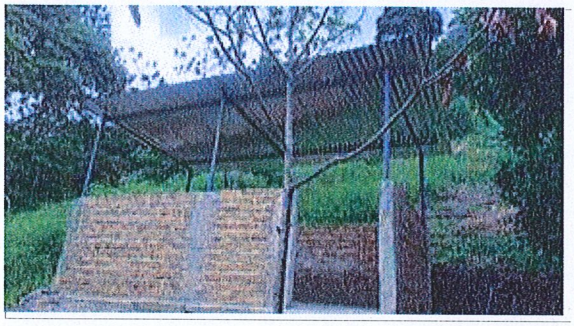

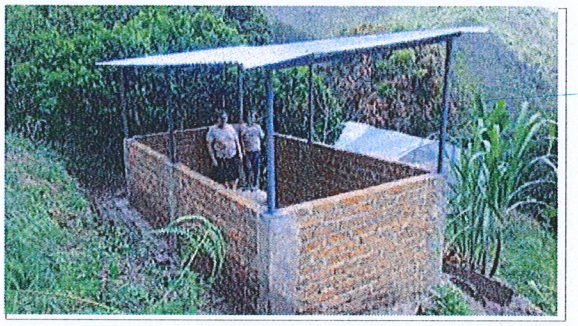

ANEXO 2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
ACTA DE OBRA No.1

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 114**	**AÑO:**	**2026**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**		
	NIT y/o CC:	**902.021.671-4**		
	DIRECCIÓN:	**Calle 146 # 7 – 45 B/Las Acacias**	**TEL:**	**321976420**
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN**		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2026000007** del **16/01/2026** **2026000121** del **16/01/2026**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 515.733.326,54**			
	Valor en Letras: QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 0,00		
VALOR TOTAL	**$ 515.733.326,54**			
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		

FECHA INICIO	22 de enero de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de mayo de 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	24/03/2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 22/01/2026 al 28/02/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025** R.L OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**22/01/2026**	**-**	**$ 515.733.326,54**	**$ 515.733.326,54**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	-	**$ 515.733.326,54**
ANTICIPO	N/A	-		**$ 515.733.326,54**
VALOR EJECUTADO	28/02/2026	$ 234.476.600,02	-	**$ 281.256.726,52**
AMORTIZACION ANTICIPO		-		
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$ 234.476.600,02	-	**$ 281.256.726,52**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción las actividades realizadas en el municipio de Neiva: Un (1) sistemas sépticos de aguas residuales domésticas; Tres (3) secaderos de cacao; Dos (2) secaderos de café; Una (1) compostera y parte de los arreglos en el predio La Colonia; de acuerdo a las cantidades establecidas en el acta parcial No.1 anexa.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $ 234.476.600,02, conforme al Acta de Recibo Parcial 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO: *LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra hasta un 80% del valor total del contrato, para*

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

cada pago parcial EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de ejecución física, con registro fotográfico de las actividades ejecutadas, al igual deberá anexar acta de recibo de la obra firmada por el beneficiario y la interventoría técnica, si hay lugar a ello. Previo al último pago se requerirá la suscripción del acta de liquidación..."; por tanto, se autoriza el primer pago correspondiente al **45,46%**, la suma a pagar será de **$ 234.476.600,02** del valor del contrato ejecutado.

1. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	-
Oportunidad En Entrega	-
Cantidad Entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
Contratista de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	22/01/2026
R. LEGAL	OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	
VALOR OBRA:	$ 515,733,326.54	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68,352,127.00	FECHA REINICIACIÓN No.1:	
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -		N/A
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 515,733,326.54	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68,352,130.00		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	$ -	**PLAZO ADICIONAL:**	$ -	PLAZO ADICIONAL:	N/A
				FECHA TERMINACION:	22/05/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	CUATRO (4) MESES	PERIODO:	22/01/2026 a 28/02/2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 28/02/2026

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACUMULADO			SALDO
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**															
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100.0	11,676.00	$ 1,167,600.00	100.00	$ 1,167,600.00	49.50	$ 577,962.00		$ -	49.50	$ 577,962.00	49.50%	50.50	$ 589,638.00
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3.2	46,640.00	$ 149,248.00	3.20	$ 149,248.00	1.60	$ 74,624.00		$ -	1.60	$ 74,624.00	50.00%	1.60	$ 74,624.00
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3.2	1,032,296.00	$ 3,303,347.20	3.20	$ 3,303,347.20	1.60	$ 1,651,673.60		$ -	1.60	$ 1,651,673.60	50.00%	1.60	$ 1,651,673.60
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS. TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: el. contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	4.0	7,712,348.00	$ 30,849,392.00	4.00	$ 30,849,392.00	2.00	$ 15,424,696.00		$ -	2.00	$ 15,424,696.00	50.00%	2.00	$ 15,424,696.00
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	4.0	3,812,766.00	$ 15,251,064.00	4.00	$ 15,251,064.00	2.00	$ 7,625,532.00		$ -	2.00	$ 7,625,532.00	50.00%	2.00	$ 7,625,532.00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	4.0	2,004,530.00	$ 8,018,120.00	4.00	$ 8,018,120.00	2.00	$ 4,009,060.00		$ -	2.00	$ 4,009,060.00	50.00%	2.00	$ 4,009,060.00
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	UND	32.0	888,980.00	$ 28,447,360.00	32.00	$ 28,447,360.00	16.00	$ 14,223,680.00		$ -	16.00	$ 14,223,680.00	50.00%	16.00	$ 14,223,680.00
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.0	1,408,080	$ 5,632,320.00	4.00	$ 5,632,320.00	2.00	$ 2,816,160.00		$ -	2.00	$ 2,816,160.00	50.00%	2.00	$ 2,816,160.00
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32.0	101,088	$ 3,234,816.00	32.00	$ 3,234,816.00	16.00	$ 1,617,408.00		$ -	16.00	$ 1,617,408.00	50.00%	16.00	$ 1,617,408.00
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**															
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	75.0	11,676.00	$ 875,700.00	75.00	$ 875,700.00	75.00	$ 875,700.00		$ -	75.00	$ 875,700.00	100.00%	0.00	$ -
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2.4	46,640.00	$ 111,936.00	2.40	$ 111,936.00	2.40	$ 111,936.00		$ -	2.40	$ 111,936.00	100.00%	0.00	$ -
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	2.4	1,032,297.00	$ 2,477,512.80	2.40	$ 2,477,512.80	2.40	$ 2,477,512.80		$ -	2.40	$ 2,477,512.80	100.00%	0.00	$ -

	OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	22/01/2026	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
	R. LEGAL	OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	R. LEGAL	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:		
	VALOR OBRA:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA:	$ 68,352,127.00	FECHA REINICIACIÓN No.1:		
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	VALOR INTERVENTORÍA ADICION:	$ -		N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:	$ 68,352,130.00			
	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	FECHA: 28/02/2026
	PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	N/A	
					FECHA TERMINACION:	22/05/2026	
	PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PERIODO:	22/01/2026 a 28/02/2026	

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA								
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACUMULADO			SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	3.0	7,928,648.00	$ 23,785,944.00	3.00	$ 23,785,944.00	3.00	$ 23,785,944.00		$ -	3.00	$ 23,785,944.00	100.00%	0.00	$ -
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	3.0	3,812,766.00	$ 11,438,298.00	3.00	$ 11,438,298.00	3.00	$ 11,438,298.00		$ -	3.00	$ 11,438,298.00	100.00%	0.00	$ -
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	3.0	2,004,530.00	$ 6,013,590.00	3.00	$ 6,013,590.00	3.00	$ 6,013,590.00		$ -	3.00	$ 6,013,590.00	100.00%	0.00	$ -
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	UND	24.0	888,980.00	$ 21,335,520.00	24.00	$ 21,335,520.00	24.00	$ 21,335,520.00		$ -	24.00	$ 21,335,520.00	100.00%	0.00	$ -
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3.0	1,408,080	$ 4,224,240.00	3.00	$ 4,224,240.00	3.00	$ 4,224,240.00		$ -	3.00	$ 4,224,240.00	100.00%	0.00	$ -
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	24.0	101,088	$ 2,426,112.00	24.00	$ 2,426,112.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	24.00	$ 2,426,112.00
3	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv															
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	52.0	11,676.0	$ 607,152.00	52.00	$ 607,152.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	52.00	$ 607,152.00
3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2.0	46,640.0	$ 93,280.00	2.00	$ 93,280.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	2.00	$ 93,280.00
3.3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC PRESIÓN BLANCA 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	4.0	970,730.0	$ 3,882,920.00	4.00	$ 3,882,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -		4.00	$ 3,882,920.00
3.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3,71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).	UND	4.0	3,778,750.0	$ 15,115,000.00	4.00	$ 15,115,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 15,115,000.00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	22/01/2026
R. LEGAL	OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	R. LEGAL	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	
VALOR OBRA:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA:	$ 68,352,127.00	FECHA REINICIACIÓN No.1:	
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	VALOR INTERVENTORÍA ADICION:	$ -		N/A
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:	$ 68,352,130.00		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	N/A
				FECHA TERMINACION:	22/05/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PERIODO:	22/01/2026 a 28/02/2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 28/02/2026

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA								
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACUMULADO			SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÁMETRO; 1,1 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	4.0	4,309,063.0	$ 17,236,252.00	4.00	$ 17,236,252.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 17,236,252.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA, INCLUYE CLIP PARA POLISOMBRA Y SOGA DE AMARRE	UND	4.0	675,768.0	$ 2,703,072.00	4.00	$ 2,703,072.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 2,703,072.00
3.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2.0	1,408,080.0	$ 2,816,160.00	2.00	$ 2,816,160.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	2.00	$ 2,816,160.00
3.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32.0	101,088.0	$ 3,234,816.00	32.00	$ 3,234,816.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	32.00	$ 3,234,816.00
4	CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS															
4.1	SISTEMA SÉPTICO ARD															
4.1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	16.0	11,676.00	$ 186,816.00	16.00	$ 186,816.00	4.00	$ 46,704.00		$ -	4.00	$ 46,704.00	25.00%	12.00	$ 140,112.00
4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	26.8	46,640.00	$ 1,249,952.00	26.80	$ 1,249,952.00	6.70	$ 312,488.00		$ -	6.70	$ 312,488.00	25.00%	20.10	$ 937,464.00
4.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	56.80	184,907.00	$ 10,502,717.60	56.80	$ 10,502,717.60	14.20	$ 2,625,679.40		$ -	14.20	$ 2,625,679.40	25.00%	42.60	$ 7,877,038.20
4.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	200.0	22,881.00	$ 4,576,200.00	200.00	$ 4,576,200.00	50.00	$ 1,144,050.00		$ -	50.00	$ 1,144,050.00	25.00%	150.00	$ 3,432,150.00
4.1.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16.0	151,721.00	$ 2,427,536.00	16.00	$ 2,427,536.00	4.00	$ 606,884.00		$ -	4.00	$ 606,884.00	25.00%	12.00	$ 1,820,652.00
4.1.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16.0	163,945.00	$ 2,623,120.00	16.00	$ 2,623,120.00	4.00	$ 655,780.00		$ -	4.00	$ 655,780.00	25.00%	12.00	$ 1,967,340.00
4.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UN	4.0	542,465.00	$ 2,169,860.00	4.00	$ 2,169,860.00	1.00	$ 542,465.00		$ -	1.00	$ 542,465.00	25.00%	3.00	$ 1,627,395.00
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	2.8	544,650.00	$ 1,525,020.00	2.80	$ 1,525,020.00	0.70	$ 381,255.00		$ -	0.70	$ 381,255.00	25.00%	2.10	$ 1,143,765.00
4.1.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	4.0	206,132.00	$ 824,528.00	4.00	$ 824,528.00	1.00	$ 206,132.00		$ -	1.00	$ 206,132.00	25.00%	3.00	$ 618,396.00
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	24.0	49,102.00	$ 1,178,448.00	24.00	$ 1,178,448.00	6.00	$ 294,612.00		$ -	6.00	$ 294,612.00	25.00%	18.00	$ 883,836.00
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UNIDAD	4.0	288,453.00	$ 1,153,812.00	4.00	$ 1,153,812.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 1,153,812.00
4.2	CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80															
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	2.56	11,676.00	$ 29,890.56	2.56	$ 29,890.56	0.64	$ 7,472.64		$ -	0.64	$ 7,472.64	25.00%	1.92	$ 22,417.92
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	3.5	46,639.00	$ 162,676.83	3.49	$ 162,676.83	0.87	$ 40,575.93		$ -	0.87	$ 40,575.93	24.94%	2.62	$ 122,100.90
4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	4.0	956,563.00	$ 3,826,252.00	4.00	$ 3,826,252.00	1.00	$ 956,563.00		$ -	1.00	$ 956,563.00	25.00%	3.00	$ 2,869,689.00
4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4.0	152,905.00	$ 611,620.00	4.00	$ 611,620.00	1.00	$ 152,905.00		$ -	1.00	$ 152,905.00	25.00%	3.00	$ 458,715.00
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	24.0	39,438.00	$ 946,512.00	24.00	$ 946,512.00	6.00	$ 236,628.00		$ -	6.00	$ 236,628.00	25.00%	18.00	$ 709,884.00
4.3	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60															
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.64	11,676.00	$ 7,472.64	0.64	$ 7,472.64	0.16	$ 1,868.16		$ -	0.16	$ 1,868.16	25.00%	0.48	$ 5,604.48
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0.38	46,640.00	$ 17,909.76	0.38	$ 17,909.76	0.095	$ 4,430.80		$ -	0.095	$ 4,430.80	24.74%	0.29	$ 13,478.96
4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0.10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	4	767,339.00	$ 3,069,356.00	4.00	$ 3,069,356.00	1.00	$ 767,339.00		$ -	1.00	$ 767,339.00	25.00%	3.00	$ 2,302,017.00
4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4	152,905.00	$ 611,620.00	4.00	$ 611,620.00	1.00	$ 152,905.00		$ -	1.00	$ 152,905.00	25.00%	3.00	$ 458,715.00

		OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA																
		CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			FECHA DE INICIO:	22/01/2026			ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1							
		R. LEGAL	OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN			R. LEGAL	N.A			FECHA SUSPENSION No.1:											
		VALOR OBRA:	$ 515,733,326.54			VALOR INTERVENTORÍA:	$ 68,352,127.00			FECHA REINICIACIÓN No.1:											
		VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -			VALOR INTERVENTORÍA ADICION:	$ -				N/A										
		VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 515,733,326.54			VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:	$ 68,352,130.00														
		PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES			PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES			FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A										
		PLAZO ADICIONAL:	$ -			PLAZO ADICIONAL:	$ -			PLAZO ADICIONAL:	N/A										
										FECHA TERMINACION:	22/05/2026			FECHA: 28/02/2026							
		PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES			PERIODO:	22/01/2026 a 28/02/2026										
		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR		ACTA PARCIAL NO. 1			ACTA PARCIAL NO. 2		ACUMULADO			SALDO			
										CANT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR		
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del ítem 4.2.5.	ML	24	39,438.00	$ 946,512.00		24.00	$ 946,512.00		6.00	$ 236,628.00			$ -	6.00	$ 236,628.00	25.00%	18.00	$ 709,884.00		
4.4	FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.																				
4.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	36.0	11,676.00	$ 420,336.00		36.00	$ 420,336.00		6.67	$ 77,879.00			$ -	6.67	$ 77,879.00	18.53%	29.33	$ 342,457.00		
4.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	12.0	46,640.00	$ 559,680.00		12.00	$ 559,680.00		3.00	$ 139,920.00			$ -	3.00	$ 139,920.00	25.00%	9.00	$ 419,760.00		
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	MI	32.0	38,908.00	$ 1,245,056.00		32.00	$ 1,245,056.00		8.00	$ 311,264.00			$ -	8.00	$ 311,264.00	25.00%	24.00	$ 933,792.00		
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	2.0	442,150.00	$ 884,300.00		2.00	$ 884,300.00		0.50	$ 221,075.00			$ -	0.50	$ 221,075.00	25.00%	1.50	$ 663,225.00		
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	UND	2.0	431,850.00	$ 863,700.00		2.00	$ 863,700.00		0.50	$ 215,925.00				0.50	$ 215,925.00	25.00%	1.50	$ 647,775.00		
4.4.6	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.0	1,408,080.00	$ 5,632,320.00		4.00	$ 5,632,320.00		1.00	$ 1,408,080.00			$ -	1.00	$ 1,408,080.00	25.00%	3.00	$ 4,224,240.00		
4.4.7	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	24.0	101,088.00	$ 2,426,112.00		24.00	$ 2,426,112.00		0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	24.00	$ 2,426,112.00		
5	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.																				
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	48.00	11,676.00	$ 560,448.00		48.00	$ 560,448.00		12.00	$ 140,112.00			$ -	12.00	$ 140,112.00	25.00%	36.00	$ 420,336.00		
5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	8.00	46,640.00	$ 373,120.00		8.00	$ 373,120.00		0.77	$ 35,912.80			$ -	0.77	$ 35,912.80	9.63%	7.23	$ 337,207.20		
5.3	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	M3	2.00	1,032,297.00	$ 2,064,594.00		2.00	$ 2,064,594.00		0.49	$ 505,826.00			$ -	0.49	$ 505,826.00	24.50%	1.51	$ 1,558,768.00		
5.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	M2	44.00	149,574.00	$ 6,581,256.00		44.00	$ 6,581,256.00		10.90	$ 1,630,357.00			$ -	10.90	$ 1,630,357.00	24.77%	33.10	$ 4,950,899.00		
5.5	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	Kg	75.20	16,530.00	$ 1,243,056.00		75.20	$ 1,243,056.00		18.80	$ 310,764.00			$ -	18.80	$ 310,764.00	25.00%	56.40	$ 932,292.00		
5.6	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	37.60	184,906.00	$ 6,952,465.60		37.60	$ 6,952,465.60		9.40	$ 1,738,116.40			$ -	9.40	$ 1,738,116.40	25.00%	28.20	$ 5,214,349.20		
5.7	CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.	M3	0.80	1,257,715.00	$ 1,006,172.00		0.80	$ 1,006,172.00		0.21	$ 264,120.00			$ -	0.21	$ 264,120.00	26.25%	0.59	$ 742,052.00		
5.8	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).	KG	112.00	22,881.00	$ 2,562,672.00		112.00	$ 2,562,672.00		25.87	$ 591,931.47			$ -	25.87	$ 591,931.47	23.10%	86.13	$ 1,970,740.53		
5.9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	KG	72.00	16,552.00	$ 1,191,744.00		72.00	$ 1,191,744.00		13.86	$ 229,410.72			$ -	13.86	$ 229,410.72	19.25%	58.14	$ 962,333.28		
5.10	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS. Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento. Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibido perfiles superpuestos.	UND	4.00	3,447,961.00	$ 13,791,844.00		4.00	$ 13,791,844.00		1.00	$ 3,447,961.00			$ -	1.00	$ 3,447,961.00	25.00%	3.00	$ 10,343,883.00		
5.11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34	M2	43.20	56,361.00	$ 2,434,795.20		43.20	$ 2,434,795.20		10.80	$ 608,698.80			$ -	10.80	$ 608,698.80	25.00%	32.40	$ 1,826,096.40		
5.12	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	1,408,080.00	$ 5,632,320.00		4.00	$ 5,632,320.00		1.00	$ 1,408,080.00			$ -	1.00	$ 1,408,080.00	25.00%	3.00	$ 4,224,240.00		
5.13	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32.00	101,088.00	$ 3,234,816.00		32.00	$ 3,234,816.00		8.00	$ 808,704.00			$ -	8.00	$ 808,704.00	25.00%	24.00	$ 2,426,112.00		
6	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BIODIGESTORES ANAÉROBIOS DE DOBLE CAPA DE FLUJO CONTINUO CON CUBIERTA EN PLÁSTICO AGOLENE CALIBRE 6 RESISTENTE A RAYOS UV CON ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN TUBO PVC 1/2" PRESIÓN																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	120.00	11,676.00	$ 1,401,120.00		120.00	$ 1,401,120.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	120.00	$ 1,401,120.00		
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	12.00	46,640.00	$ 559,680.00		12.00	$ 559,680.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	12.00	$ 559,680.00		
6.3	CONSTRUCCIÓN BIODIGESTOR DOBLE CAPA DE 8 METROS DE LONGITUD UTIL, EN BOLSA TUBULAR DÍAMETRO 2 METROS, INCLUYE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA CARGUE Y SALIDA DE EFLUENTE, Y TUBERÍA DE 1/2 PULGADA PARA SUMINITRO DE BIOGAS AL QUEMADOR	Unidad	3.00	3,382,987.00	$ 10,148,961.00		3.00	$ 10,148,961.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 10,148,961.00		
6.4	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SULFUROS (H2S) EN PVC	Unidad	3.00	191,693.00	$ 575,079.00		3.00	$ 575,079.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 575,079.00		
6.5	ESTRUCTURA TUBULAR PARA CUBIERTA EB TUBO DE PVC DE RIEGO A PRESIÓNY ZÓCALO EN MADERA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA PARA AJUSTE DE LA CUBIERTA	Unidad	3.00	627,350.00	$ 1,882,050.00		3.00	$ 1,882,050.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 1,882,050.00		
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CALIBRE 6 DE 6 METROS DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV.	Unidad	3.00	759,834.00	$ 2,279,502.00		3.00	$ 2,279,502.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 2,279,502.00		
6.7	CAJA EN LADRILLO TOLETE 0,07 X0,12X 0,24, INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES 0,60 X0,60 X0,6 DEPROFUNDIDAD	Unidad	6.00	823,137.00	$ 4,938,822.00		6.00	$ 4,938,822.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	6.00	$ 4,938,822.00		
6.9	TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MATERIALES	Viaje	3.00	1,408,080.00	$ 4,224,240.00		3.00	$ 4,224,240.00			$ -			$ -	0.00	$ -	0.00%	3.00	$ 4,224,240.00		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	22/01/2026
R. LEGAL	OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	R. LEGAL	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	
VALOR OBRA:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA:	$ 68,352,127.00	FECHA REINICIACIÓN No.1:	
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	VALOR INTERVENTORÍA ADICION:	$ -		N/A
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:	$ 68,352,130.00		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	N/A
				FECHA TERMINACIÓN:	22/05/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PERIODO:	22/01/2026 a 28/02/2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 28/02/2026

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA								
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACUMULADO			SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
6.10	TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES	Viaje	18.00	101,088.00	$ 1,819,584.00	18.00	$ 1,819,584.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	18.00	$ 1,819,584.00
7	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA															
7.1	ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo															
7.1.1	DEMOLICIÓN DE PAÑETE O REVOQUE	M2	48.00	26,376.00	$ 1,266,048.00	48.00	$ 1,266,048.00	48.00	$ 1,266,048.00		$ -	48.00	$ 1,266,048.00	100.00%	0.00	$ -
7.1.2	PAÑETE DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	48.00	69,248.00	$ 3,323,904.00	48.00	$ 3,323,904.00	48.00	$ 3,323,904.00		$ -	48.00	$ 3,323,904.00	100.00%	0.00	$ -
7.1.3	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO	M2	48.00	17,948.00	$ 861,504.00	48.00	$ 861,504.00	48.00	$ 861,504.00		$ -	48.00	$ 861,504.00	100.00%	0.00	$ -
7.1.4	MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura	M2	822.00	20,010.00	$ 16,448,220.00	822.00	$ 16,448,220.00	786.21	$ 15,732,062.00		$ -	786.21	$ 15,732,062.00	95.65%	35.79	$ 716,158.00
7.2	ENCHAPES Y PISOS															
7.2.1	GUARDAESCOBA EN GRES O CERÁMICA	ML	64.56	31,725.00	$ 2,048,094.09	64.56	$ 2,048,094.09	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	64.56	$ 2,048,094.09
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TIPO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	30.00	117,266.00	$ 3,517,980.00	30.00	$ 3,517,980.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	30.00	$ 3,517,980.00
7.3	CARPINTERIA EN MADERA															
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBLERADA CON ACABADO MELÁMINICO	UND	1.00	623,330.00	$ 623,330.00	1.00	$ 623,330.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	1.00	$ 623,330.00
7.3.2	APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)	M2	98.14	22,265.00	$ 2,185,087.10	98.14	$ 2,185,087.10	98.14	$ 2,185,087.10		$ -	98.14	$ 2,185,087.10	100.00%	0.00	$ -
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMA MADERA	UND	6.00	130,250.00	$ 781,500.00	6.00	$ 781,500.00	6.00	$ 781,500.00		$ -	6.00	$ 781,500.00	100.00%	0.00	$ -
7.4	CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO															
7.4.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION	M2	4.00	11,676.00	$ 46,704.00	4.00	$ 46,704.00	4.00	$ 46,704.00		$ -	4.00	$ 46,704.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	6.70	46,640.00	$ 312,488.00	6.70	$ 312,488.00	6.70	$ 312,488.00		$ -	6.70	$ 312,488.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.20	184,906.00	$ 2,625,665.20	14.20	$ 2,625,665.20	14.20	$ 2,625,665.20		$ -	14.20	$ 2,625,665.20	100.00%	0.00	$ -
7.4.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	Kg	50.00	22,881.00	$ 1,144,050.00	50.00	$ 1,144,050.00	50.00	$ 1,144,050.00		$ -	50.00	$ 1,144,050.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4.00	151,721.00	$ 606,884.00	4.00	$ 606,884.00	4.00	$ 606,884.00		$ -	4.00	$ 606,884.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4.00	163,945.00	$ 655,780.00	4.00	$ 655,780.00	4.00	$ 655,780.00		$ -	4.00	$ 655,780.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UN	1.00	542,465.00	$ 542,465.00	1.00	$ 542,465.00	1.00	$ 542,465.00		$ -	1.00	$ 542,465.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.70	544,650.00	$ 381,255.00	0.70	$ 381,255.00	0.70	$ 381,255.00		$ -	0.70	$ 381,255.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00	206,132.00	$ 206,132.00	1.00	$ 206,132.00	1.00	$ 206,132.00		$ -	1.00	$ 206,132.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	6.00	49,102.00	$ 294,612.00	6.00	$ 294,612.00	6.00	$ 294,612.00		$ -	6.00	$ 294,612.00	100.00%	0.00	$ -
7.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UNIDAD	1.00	288,453.00	$ 288,453.00	1.00	$ 288,453.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%	1.00	$ 288,453.00
7.5	TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80															
7.5.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.64	11,676.00	$ 7,472.64	0.64	$ 7,472.64	0.64	$ 7,472.64		$ -	0.64	$ 7,472.64	100.00%	0.00	$ -
7.5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0.87	46,639.00	$ 40,669.21	0.87	$ 40,669.21	0.872	$ 40,669.21		$ -	0.872	$ 40,669.21	100.00%	0.00	$ -
7.5.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	1.00	956,563.00	$ 956,563.00	1.00	$ 956,563.00	1.00	$ 956,563.00		$ -	1.00	$ 956,563.00	100.00%	0.00	$ -
7.5.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	152,905.00	$ 152,905.00	1.00	$ 152,905.00	1.00	$ 152,905.00		$ -	1.00	$ 152,905.00	100.00%	0.00	$ -
7.5.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	6.00	39,438.00	$ 236,628.00	6.00	$ 236,628.00	6.00	$ 236,628.00		$ -	6.00	$ 236,628.00	100.00%	0.00	$ -
7.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60															
7.6.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.16	11,675.00	$ 1,868.00	0.16	$ 1,868.00	0.16	$ 1,868.00		$ -	0.16	$ 1,868.00	100.00%	0.00	$ -
7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0.216	46,638.00	$ 10,073.81	0.216	$ 10,073.81	0.216	$ 10,073.81		$ -	0.216	$ 10,073.81	100.00%	0.000	$ -
7.6.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	1.00	767,339.00	$ 767,339.00	1.00	$ 767,339.00	1.00	$ 767,339.00		$ -	1.00	$ 767,339.00	100.00%	0.00	$ -
7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	152,905.00	$ 152,905.00	1.00	$ 152,905.00	1.00	$ 152,905.00		$ -	1.00	$ 152,905.00	100.00%	0.00	$ -
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 7.5.5.	ML	6.00	39,438.00	$ 236,628.00	6.00	$ 236,628.00	6.00	$ 236,628.00		$ -	6.00	$ 236,628.00	100.00%	0.00	$ -

	OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA					
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	22/01/2026	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
	R. LEGAL	OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	R. LEGAL	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:		
	VALOR OBRA:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA:	$ 68,352,127.00	FECHA REINICIACIÓN No.1:		
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	VALOR INTERVENTORÍA ADICION:	$ -		N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 515,733,326.54	VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:	$ 68,352,130.00			
	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	
	PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL:	N/A	FECHA: 28/02/2026
					FECHA TERMINACIÓN:	22/05/2026	
	PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (4) MESES	PERIODO:	22/01/2026 a 28/02/2026	

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA								
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACUMULADO			SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
7.7	FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.															
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.00	11,676.00	$ 105,084.00	9.00	$ 105,084.00	9.00	$ 105,084.00		$ -	9.00	$ 105,084.00	100.00%	0.00	$ -
7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3.00	46,640.00	$ 139,920.00	3.00	$ 139,920.00	3.00	$ 139,920.00		$ -	3.00	$ 139,920.00	100.00%	0.00	$ -
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA DE INFILTRACION.	MI	8.00	38,908.00	$ 311,264.00	8.00	$ 311,264.00	8.00	$ 311,264.00		$ -	8.00	$ 311,264.00	100.00%	0.00	$ -
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0.50	442,150.00	$ 221,075.00	0.50	$ 221,075.00	0.50	$ 221,075.00		$ -	0.50	$ 221,075.00	100.00%	0.00	$ -
7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0.50	431,850.00	$ 215,925.00	0.50	$ 215,925.00	0.50	$ 215,925.00		$ -	0.50	$ 215,925.00	100.00%	0.00	$ -
7.7.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	1,408,080.00	$ 5,632,320.00	4.00	$ 5,632,320.00	4.00	$ 5,632,320.00		$ -	4.00	$ 5,632,320.00	100.00%	0.00	$ -
					$ 387,917,243.24	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 387,917,243.24	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 181,905,818.48	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ -	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 181,905,818.48	46.89%	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 206,011,424.76
				ADMINISTRACION 12% =	$ 46,550,069.19	ADMINISTRACION 12% =	$ 46,550,069.19	ADMINISTRACION 12% =	$ 21,828,698.22	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ 21,828,698.22		ADMINISTRACION 12% =	$ 24,721,370.97
				IMPREVISTOS 5% =	$ 19,395,862.16	IMPREVISTOS 5% =	$ 19,395,862.16	IMPREVISTOS 5% =	$ 9,095,290.92	IMPREVISTOS 5% =	$ -	IMPREVISTOS 5% =	$ 9,095,290.92		IMPREVISTOS 5% =	$ 10,300,571.24
				UTILIDAD 10% =	$ 38,791,724.32	UTILIDAD 10% =	$ 38,791,724.32	UTILIDAD 10% =	$ 18,190,581.85	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ 18,190,581.85		UTILIDAD 10% =	$ 20,601,142.48
				IVA % sobre utilidad 19% =	$ 7,370,427.62	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 7,370,427.62	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3,456,210.55	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3,456,210.55		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3,914,217.07
					$ 112,108,083.30	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 112,108,083.30	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 52,570,781.54	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ -	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 52,570,781.54		TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 59,537,301.76
	TOTAL COSTOS EQUIPAMENTO RURAL (Directos + Indirectos)				$ 500,025,326.54	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 500,025,326.54	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 234,476,600.02	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ -	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 234,476,600.02		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 265,548,726.52
B	SENCIBILIZACION SOCIAL COMUNITARIO															
	Talleres de sencibilizacion social comunitario	TALLER	16	$ 825,000.00	$ 13,200,000.00	16.00	$ 13,200,000.00		$ -			0.00	$ -		16.00	$ 13,200,000.00
				IVA % sobre utilidad 19% =	$ 2,508,000.00		$ 2,508,000.00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -			IVA % sobre utilidad 19% =	$ -		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 2,508,000.00
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENCIBILIZACION					$ 15,708,000.00		$ 15,708,000.00		$ -				$ -			$ 15,708,000.00
	TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION				$ 515,733,326.54		$ 515,733,326.54		$ 234,476,600.02		$ -		$ 234,476,600.02	45.46%		$ 281,256,726.52
						VALOR TOTAL A PAGAR	$ 515,733,326.54	VALOR TOTAL A PAGAR	$ 234,476,600.02		$ -	VALOR ACUMULADO	$ 234,476,600.02	45.46%	VALOR POR EJECUTAR	$ 281,256,726.52

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 234,476,600.02

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

Ing. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
SUPERVISOR

MEMORIAS ACTAS DE OBRA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
1,1	Luz Albenis González Vega	5,50	4,50		24,75	1,00	**24,75**
	Ernesto Alarcon Silva	5,50	4,50		24,75	1,00	**24,75**
					0,00		**0,00**
					0,00		**0,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**49,50**

TOTAL	**49,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**49,50**







OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,2	Luz Albenis González Vega	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	Ernesto Alarcon Silva	0,35	0,30	0,3	0,04	20,00	**0,80**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,60**

TOTAL	**1,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,60**







OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,3	Luz Albenis González Vega	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	Ernesto Alarcon Silva	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,60**

TOTAL	**1,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,60**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS. TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,4	Luz Albenis González Vega					1,00	**1,00**
	Ernesto Alarcon Silva					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**2,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**2,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**'CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,5	Luz Albenis González Vega					1,00	**1,00**
	Ernesto Alarcon Silva					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**2,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**2,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,6	Luz Albenis González Vega					1,00	**1,00**
	Ernesto Alarcon Silva					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**2,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**2,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR Luz Albenis González Vega					1,00	**1,00**
	TRANSPORTE AUTOMOTORErnesto Alarcon Silva					1,00	**1,00**
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**2,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**2,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN**
		FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
		FECHA DE REINICIO 2: N/A	
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A	**FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1**
		FECHA DE REINICIO 3: N/A	
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A	**28/02/2026**
		FECHA DE REINICIO 4: N/A	
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,7	Luz Albenis González Vega					8	**8,00**
	Ernesto Alarcon Silva					8	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**16,00**

TOTAL	**16,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**16,00**



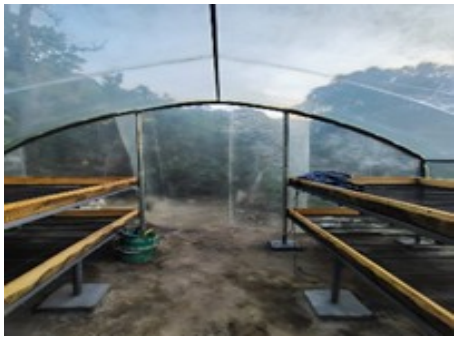

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL NO. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,9	TRANSPORTE MULAR Luz Albenis					8,00	**8,00**
	TRANSPORTE MULAR Ernesto Alarcon					8,00	**8,00**
						TOTAL	**16,00**









TOTAL	**16,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**16,00**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
2,1	Manuel Gomez Calderon	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	Jorge Mosquera Garcia	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	Ilcia Maria Guevara	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
						TOTAL	**75,00**

TOTAL	**75,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**75,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**'CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,2	Maanuel Gomez Calderon	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	Jorge Mosquera Garcia	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	Ilcia Maria Guevara	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
							0,00
						TOTAL	**2,40**

TOTAL	**2,40**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**2,40**



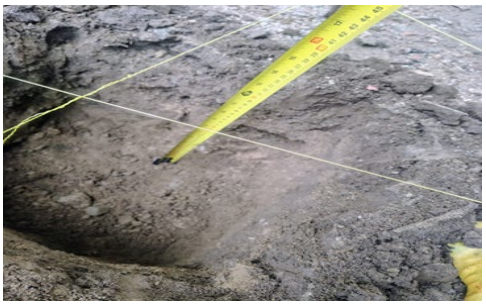

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,3	Manuel Gomez Calderon	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	Jorge Mosquera Garcia	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	Ilcia Maria Guevara	0,35	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
						TOTAL	**2,40**

TOTAL	**2,40**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**2,40**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,4	Maanuel Gomez Calderon					1,00	**1,00**
	Jorge Mosquera Garcia					1,00	**1,00**
	Ilcia Maria Guevara					1,00	**1,00**
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,5	Maanuel Gomez Calderon					1,00	**1,00**
	Jorge Mosquera Garcia					1,00	**1,00**
	Ilcia Maria Guevara					1,00	**1,00**
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,6	Maanuel Gomez Calderon					1,00	**1,00**
	Jorge Mosquera Garcia					1,00	**1,00**
	Ilcia Maria Guevara					1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,7	Maanuel Gomez Calderon					8,00	**8,00**
	Jorge Mosquera Garcia					8,00	**8,00**
	Ilcia Maria Guevara					8,00	**8,00**
							0,00
						TOTAL	**24,00**

TOTAL	**24,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**24,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR Manuel Gómez Calderon					1,00	**1,00**
	TRANSPORTE AUTOMOTOR Jorge Mosquera García					1,00	**1,00**
	TRANSPORTE AUTOMOTOR Ilcia María Guevara					1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.1.1	SERAFIN AYA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						TOTAL	**4,00**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
4.1.2	SERAFIN AYA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**6,70**

TOTAL	**6,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,70**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.1.3	SERAFIN AYA	9,42		1,40	13,19	1,00	**13,19**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					TOTAL		**14,20**

TOTAL	**14,20**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,20**

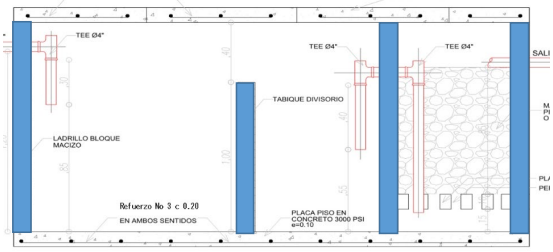



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**Kg**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
4.1.4	SERAFIN AYA				50,00	1,00	**50,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**50,00**





TOTAL	**50,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**50,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.1.5	SERAFIN AYA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**4,00**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**



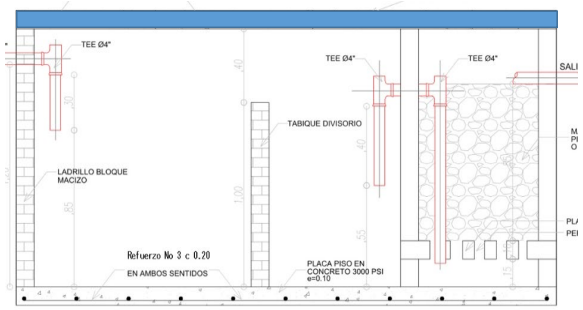

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.1.6	SERAFIN AYA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**4,00**





TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**UN**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.1.7	SERAFIN AYA					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**





TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
4.1.8	SERAFIN AYA	1,00	0,83	0,84	0,70	1,00	**0,70**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,70**





TOTAL	**0,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,70**

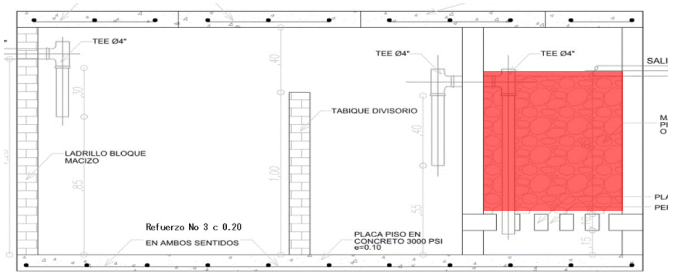

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.1.9	SERAFIN AYA	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



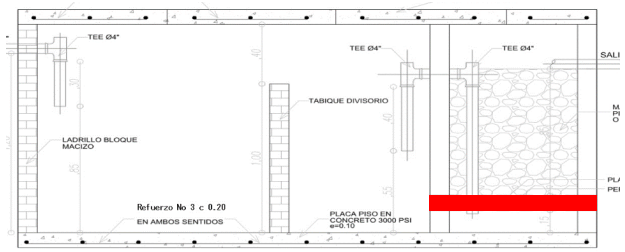

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN**
		FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
		FECHA DE REINICIO 2: N/A	
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A	**FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1**
		FECHA DE REINICIO 3: N/A	
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A	**28/02/2026**
		FECHA DE REINICIO 4: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515,733,326.54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 515,733,326.54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.1.10	SERAFIN AYA	6.00				1.00	**6.00**
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
						TOTAL	**6.00**



TOTAL	**6.00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6.00**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.2.1	SERAFIN AYA	0,80	0,80		0,64	1,00	**0,64**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,64**

TOTAL	**0,64**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,64**

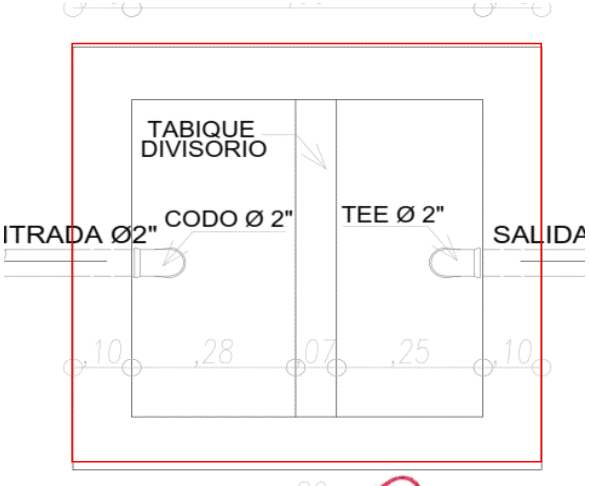

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
4.2.2	SERAFIN AYA	1,00	1,00	0,87	0,87	1,00	**0,87**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,87**



TOTAL	**0,87**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,87**

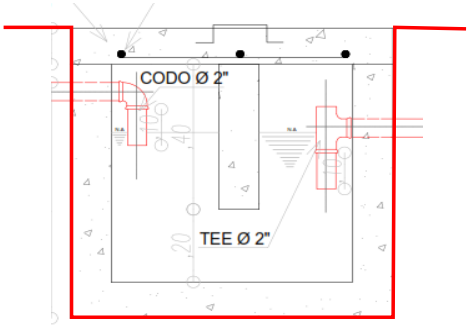

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.2.3	SERAFIN AYA					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**



TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**

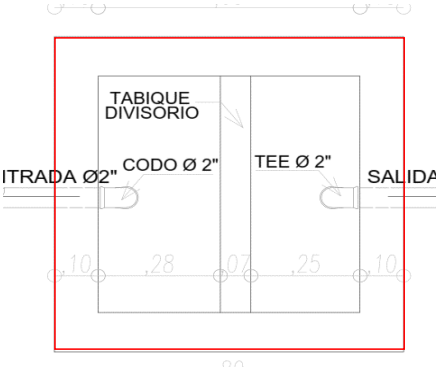

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**UND**


ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.2.4	SRAFIN AYA					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**







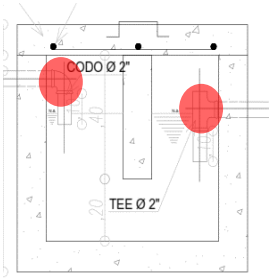

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.2.5	SERAFIN AYA					6,00	**6,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**6,00**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,00**





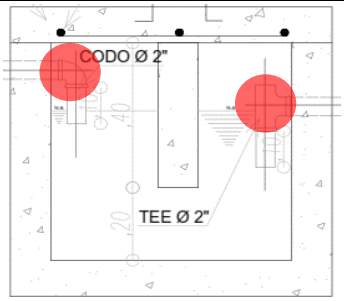

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.3.1	SERAFIN AYFA	0,40	0,40		0,16	1,00	**0,16**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,16**



TOTAL	**0,16**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,16**

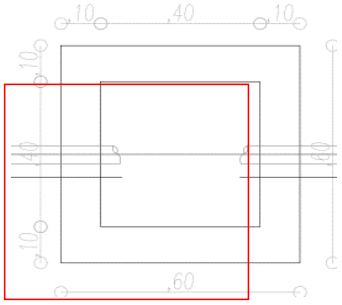

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
4.3.2	SERAFIN AYA	0,46	0,45	0,46	0,095	1,00	**0,095**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,095**



TOTAL	**0,095**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,095**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.3.3	SERAFIN AYA					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**



TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.3.4	SERAFIN AYA					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**



TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 4.2.5.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.3.5	SERAFIN AYA	6,00				1,00	**6,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**6,00**



TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,00**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.4.1	LECHO FFILTRANTE	8,72	0,60		5,23	1,00	**5,23**
	FOSA DE INFILTRACION	1,20	1,20		1,44	1,00	**1,44**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**6,67**



TOTAL	**6,67**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,67**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
4.4.2	EXCAVACION LECHO FILTRANTE	8,00	0,50	0,50	2,00	1,00	**2,00**
	FOSA DE INFILTRACION	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





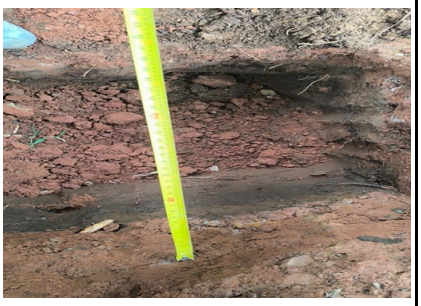

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	**MI**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.4.3	SERAFIN AYA	8,00				1,00	**8,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
						1,00	**0,00**
					TOTAL		**8,00**



TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,00**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.4.4	SERAFIN AYA	1,00	1,00	0,5	0,50	1,00	**0,50**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,50**



TOTAL	**0,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,50**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.4.5		1,00	1,00	0,5	0,50	1,00	**0,50**
						TOTAL	**0,50**



TOTAL	**0,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,50**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.6	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
4.4.6	TRANSPORTE AUTOMOTOR					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**



TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
5,1	LUIS ERNESTO ALARCON	4,80	2,50		12,00	1,00	**12,00**
							0,00
						TOTAL	**12,00**



TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**12,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
5,2	LUIS ERNESTO ALARCON	0,45	0,45	0,55	0,11	7,00	**0,77**
						TOTAL	**0,77**

TOTAL	**0,77**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,77**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,3	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
5,3	LUIS ERNESTO ALARCON	0,40	0,40	0,42	0,07	7,00	**0,49**
							0,00
						TOTAL	**0,49**

TOTAL	**0,49**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,49**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,4	LUIS ERNESTO ALARCON	4,45	2,45		10,90	1,00	**10,90**
							0,00
						TOTAL	**10,90**

TOTAL	**10,90**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**10,90**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,5	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
5,5	LUIS ERNESTO ALARCON	4,41	2,41	1,77	18,80	1,00	**18,80**
						TOTAL	**18,80**

TOTAL	**18,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,80**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,6	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,6	LUIS ERNESTO ALARCON	1,60	1,00		1,60	2,00	3,20
		3,56	1,00		3,56	1,00	3,56
		1,78	1,00		1,78	1,00	1,78
		0,86	1,00		0,86	1,00	0,86
						TOTAL	**9,40**

TOTAL	**9,40**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**9,40**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,7	CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
5,7	LUIS ERNESTO ALARCON	0,17	0,17	1	0,03	7,00	**0,21**
							0,00
						TOTAL	**0,21**

TOTAL	**0,21**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,21**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,8	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
5,8	LUIS ERNESTO ALARCON	1,65		0,56	0,92	28,00	**25,87**
						TOTAL	**25,87**

TOTAL	**25,87**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**25,87**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO (KG)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
5,9	LUIS ERNESTO ALARCON	0,66		0,25	0,17	84,00	**13,86**
						TOTAL	**13,86**

TOTAL	**13,86**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**13,86**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,10	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS. Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento. Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibido perfiles superpuestos.	**UNIDAD**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,1	LUIS ERNESTO ALARCON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
5,11	LUIS ERNESTO ALARCON	4,50	2,40		10,80	1,00	**10,80**
						TOTAL	**10,80**

TOTAL	**10,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**10,80**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,12	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,12	TRANSPORTE AUTOMOTOR					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,13	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,13	TRANSPORTE MULAR					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,00**







DEYANIS GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,1	**ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo**	
7.1.1	DEMOLICIÓN DE PAÑETE O REVOQUE	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7.1.1	MURO EXTERIOR	5,50		2,08	11,44	1,00	**11,44**
	MURO EXTERIOR	4,00		1,8	7,20	1,00	**7,20**
	PASILLO INTERNO	24,00		0,6	14,40	1,00	**14,40**
	ROS EXTERIORES AUDITORIO REPTIL	24,90		0,6	14,94	1,00	14,94
						TOTAL	**48,00**

TOTAL	**48,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**48,00**







OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,1	**ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo**	
7.1.2	PAÑETE DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7.1.2	MURO EXTERIOR	5,50		2,08	11,44	1,00	**11,44**
	MURO EXTERIOR	4,00		1,8	7,20	1,00	**7,20**
	PASILLO INTERNO	24,00		0,6	14,40	1,00	**14,40**
	MUROS EXTERIORES AUDITORIO REPTILES	24,90		0,6	14,94	1,00	**14,94**
						TOTAL	**48,00**

TOTAL	**48,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**48,00**









OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,1	**ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo**	
7.1.3	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
7.1.3	MUROS EXTERIORES AUDITORIO REPTILES	29,60		0,6	17,76	1,00	**17,76**
	PASILLO INTERNO	22,00		0,6	13,20	1,00	**13,20**
	FACHADA PRINCIPAL	28,42		0,6	17,05	1,00	**17,05**
						TOTAL	**48,00**

TOTAL	**48,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**48,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,1	**ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo**	
7.1.4	MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7.1.4	MURO FACHADA	9,60		3,6	34,56	1,00	**34,56**
	DESCONTAR VENTANA	-0,54		1,58	-0,85	4,00	**-3,40**
	MURO FACHADA	19,05		2,53	48,20	1,00	**48,20**
	DESCONTAR VENTANA	-1,34		1,11	-1,49	1,00	**-1,49**
	DESCONTAR VENTANA	-0,98		1,57	-1,54	1,00	**-1,54**
	DESCUENTO PUERTA	-2,13		1,9	-4,05	1,00	**-4,05**
	DESCUENTO VENTANA	-2,34		0,55	-1,29	1,00	**-1,29**
	DESCUENTO VENTANA	-2,40		1,58	-3,79	2,00	**-7,58**
	MURO LATERAL	5,10		2,53	12,90	1,00	**12,90**
	PASILLO	18,90		2,53	47,82	1,00	**47,82**
	DESCUENTO PUERTA	-1,20		2,14	-2,57	1,00	**-2,57**
	DESCUENTO PUERTA	-1,51		2,14	-3,23	1,00	**-3,23**
	DESCUENTOS COLUMNETAS MADERA	-0,20		2,17	-0,43	3,00	**-1,29**
	DESCUENTO PUERTA	-0,90		2,14	-1,93	1,00	**-1,93**
	DESCUENTO PUERTA	-1,19		2,14	-2,55	1,00	**-2,55**
	DESCUENTO PUERTA	-1,36		2,14	-2,91	1,00	**-2,91**
	MURO PASILLO	6,80		5,4	36,72	1,00	**36,72**
	DESCUENTO PUERTA	-0,85		2,14	-1,82	1,00	**-1,82**
	DESCUENTO PUERTA	-0,60		2,14	-1,28	1,00	**-1,28**
	DESCUENTO PUERTA	-0,65		2,14	-1,39	1,00	**-1,39**
	DESCUENTO COLIMNETA MADERA	-0,20		2,17	-0,43	2,00	**-0,86**
	DESCUENTO PUERTA	-0,90		2,14	-1,93	1,00	**-1,93**
	AUDITORIO ENTRADA PRINCIPAL	8,95		2,53	22,64	1,00	**22,64**
	DESCUENTO VENTANA	-2,40		1,58	-3,79	2,00	**-7,58**
	AUDITORIO ENTRADA PRINCIPAL	5,00		2,53	12,65	2,00	**25,30**
	AUDITORIO ENTRADA PRINCIPAL	8,95		2,53	22,64	1,00	**22,64**
	DESCONTAR PUERTA	-1,20		2,14	-2,57	1,00	**-2,57**
	DESCONTAR PUERTA	-1,35		2,14	-2,89	1,00	**-2,89**
	DESCUENTO COLUMNETA MADERA	-0,20		2,17	-0,43	2,00	**-0,86**
	DESCUENTO VENTANA	-0,70		2,12	-1,48	1,00	**-1,48**
	CUANRTO ENTRE AUDITORIO Y ENTRADA PRINCIAPL	8,26		2,53	20,90	1,00	**20,90**
	DESCUENTO VENTANA	-0,54		2,38	-1,29	1,00	**-1,29**
	DESCUENTO PUERTA	-0,70		2,12	-1,48	2,00	**-2,96**
	ENTRADA PRINCIPAL	18,26		2,53	46,20	1,00	**46,20**
	DESCUENTO PUERTA	-1,50		2,14	-3,21	1,00	**-3,21**
	DESCUENTO PUERTA	-1,90		2,14	-4,07	1,00	**-4,07**
	DESCUENTO VENTANA	-1,02		1,58	-1,61	1,00	**-1,61**
	DESCUENTO PUERTA	-0,70		2,12	-1,48	1,00	**-1,48**
	AUDITORIO 2 REPTILES	29,26		2,53	74,03	2,00	**148,06**
	DESCUENTO PUERTA	-1,18		2,14	-2,53	1,00	**-2,53**
	DESCUENTO PUERTA	-1,40		2,14	-3,00	2,00	**-6,00**
	DESCUENTO PUERTA	-0,80		2,14	-1,71	1,00	**-1,71**
	DESCUENTO VENTANA	-1,35		1,2	-1,62	1,00	**-1,62**
	AUDITORIO 2 REPTILES	3,50		2,83	9,91	2,00	**19,82**
	DESCUENTO PUERTA	-0,68		2,14	-1,46	2,00	**-2,92**
	CUARTO ASEO	10,74		2,53	27,17	1,00	**27,17**
	DESCUENTO VENTANA	-1,33		1,11	-1,48	1,00	**-1,48**
	DESCUENTO PUERTA	-1,22		2,14	-2,61	1,00	**-2,61**
	CUARTO ASEO	5,74		2,53	14,52	2,00	**29,04**
	DESCUENTO PUERTA	-0,88		2,14	-1,88	1,00	**-1,88**
	CUARTO ASEO	5,00		4,28	21,40	1,00	**21,40**
	DORMITORIO 1	12,15		3,6	43,74	1,00	**43,74**

	DESCUENTO PUERTA	-0,85		2,14	-1,82	1,00	**-1,82**
	DESCUENTO PUERTA	-0,53		1,6	-0,85	2,00	**-1,70**
	DORMITORIO 1	6,29		2,53	15,91	1,00	**15,91**
	DORMITORIO 1	5,40		1,8	9,72	1,00	**9,72**
	DORMITORIO 2	8,94		2,53	22,62	1,00	**22,62**
	DORMITORIO 3	4,84		3,6	17,42	1,00	**17,42**
	DESCONTAR VENTANA	-0,55		1,58	-0,87	2,00	**-1,74**
	DORMITORIO 3	12,84		3,6	46,22	1,00	**46,22**
	DESCUENTO VENTANA	-1,30		1,45	-1,89	1,00	**-1,89**
	DESCUENTO PUERTA	-0,94		2,14	-2,01	1,00	**-2,01**
	DORMITORIO 3	8,35		2,53	21,13	1,00	**21,13**
	DORMITORIO 3	2,32		1,45	3,36	1,00	**3,36**
	DORMITORIO 3	0,50		2,32	1,16	1,00	**1,16**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	5,40		4,6	24,84	1,00	**24,84**
	DESCUENTO PUERTA	-0,85		2,14	-1,82	1,00	**-1,82**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	5,75		3,35	19,26	1,00	**19,26**
	DESCUENTO VENTANA	-1,32		1,59	-2,10	1,00	**-2,10**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	6,36		3,45	21,94	1,00	**21,94**
	DESCUENTO VENTANA	-1,23		1,45	-1,78	1,00	**-1,78**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	10,55		3,45	36,40	2,00	**72,80**
	DESCUENTO VENTANA	-1,32		1,59	-2,10	1,00	**-2,10**
	DESCUENTO COLUMNETA MADERA	-0,30		2,7	-0,81	1,00	**-0,81**
	DESCUENTO VENTANA	-0,53		1,59	-0,84	1,00	**-0,84**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	10,55		1,25	13,19	1,00	**13,19**
						TOTAL	**786,21**







TOTAL	**786,21**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**786,21**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,3	**CARPINTERIA EN MADERA**	
7.3.2	APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.3.2	VENTANA FACHADA PRINCIPAL	1,58		0,5340	0,84	10,00	**8,40**
	VENTANA FACHADA PRINCIPAL	2,40		1,58	3,79	4,00	**15,16**
	VENTANA FACHADA PRINCIPAL	2,34		0,53	1,24	4,00	**4,96**
	VENTANA MURO LATERAL	1,58		0,98	1,55	2,00	**3,10**
	VENTANA AUDITORIO 1	1,34		1,12	1,50	2,00	**3,00**
	VENTANA AUDITORIO 2	1,34		1,2	1,61	2,00	**3,22**
	VENTANA DORMITORIO	1,58		1,33	2,10	4,00	**8,40**
	PUERTA PRINCIPAL	1,90		2,14	4,07	2,00	**8,14**
	PUERTA ENTRDA AUDITORIO	1,50		2,14	3,21	2,00	**6,42**
	PUERTA BAÑO	0,68		2,14	1,46	4,00	**5,84**
	PUERTA AUDITORIO	1,18		2,14	2,53	4,00	**10,12**
	PUERTA AUDITORIO	1,20		2,14	2,57	2,00	**5,14**
	PUERTA BAÑO 1	0,84		2,14	1,8	2,00	**3,60**
	PUERTA BAÑO 2	0,60		2,14	1,28	4,00	**5,12**
	PUERTA ASEO	0,88		2,14	1,88	4,00	**7,52**
						TOTAL	**98,14**





TOTAL	**98,14**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**98,14**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,3	**CARPINTERIA EN MADERA**	
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMA MADERA	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.3.3						6,00	**6,00**
							0,00
						TOTAL	**6,00**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,00**



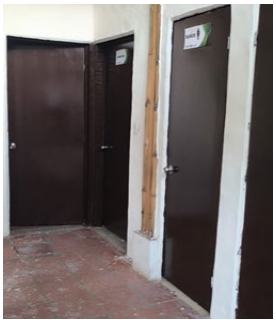



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.1		3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
							0,00
						TOTAL	**4,00**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.4.2		3,30	1,30	1,562	6,70	1,00	**6,70**
							0,00
						TOTAL	**6,70**

TOTAL	**6,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,70**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.3		9,42		1,4	13,19	1,00	**13,19**
		1,00		1	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**14,20**

TOTAL	**14,20**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,20**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	**Kg**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO(KG)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
7.4.4	COLONIA	6,00		0,56	3,36	14,88	**50,00**
							0,00
						TOTAL	**50,00**

TOTAL	**50,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**50,00**







OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.5		3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
							0,00
						TOTAL	**4,00**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**







OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.6		3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
							0,00
						TOTAL	**4,00**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**UN**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.4.7	COLONIA					1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**

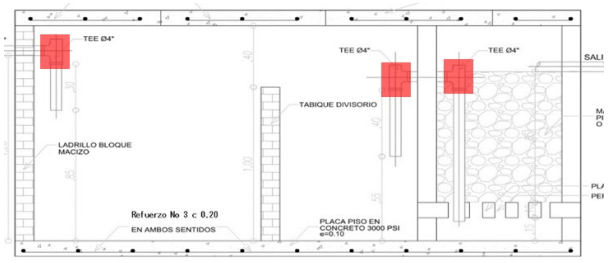



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.8		1,00	0,82	0,85	0,70	1,00	**0,70**
							0,00
						TOTAL	**0,70**

TOTAL	**0,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,70**

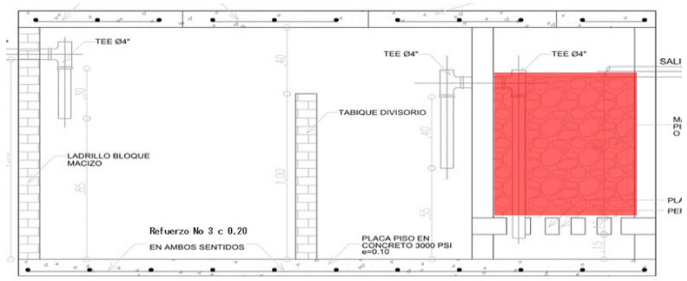



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.9		1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO**	
7.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.10		6,00				1,00	**6,00**
							0,00
						TOTAL	**6,00**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
7.5.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.5.1		0,80	0,80		0,64	1,00	**0,64**
							0,00
						TOTAL	**0,64**

TOTAL	**0,64**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,64**

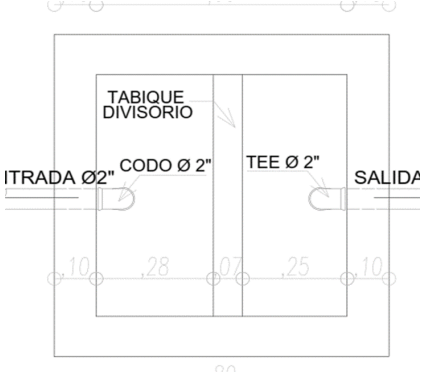



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
7.5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.5.2		1,00	1,00	0,872	0,87	1,00	**0,872**
							0,00
					TOTAL		**0,872**

TOTAL	**0,872**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,872**

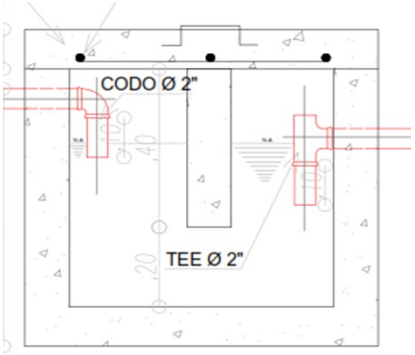



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
7.5.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.5.3	TRAMPA DE GRASAS					1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
7.5.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.5.4						1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**

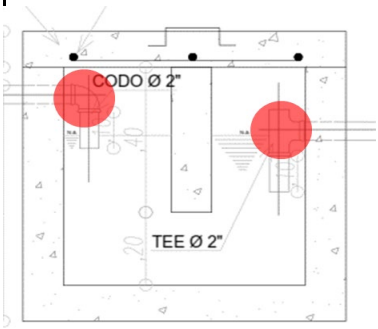





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
7.5.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.5.5		6,00				1,00	**6,00**
							0,00
						TOTAL	**6,00**



TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
7.6.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.6.1		0,40	0,40		0,16	1,00	**0,16**
							0,00
						TOTAL	**0,16**

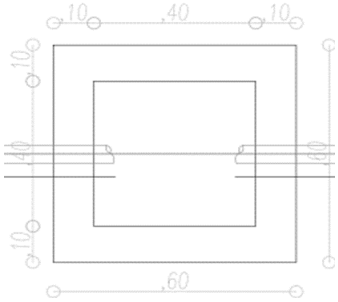

TOTAL	**0,16**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,16**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.6.2		0,60	0,60	0,6	0,216	1,00	**0,216**
							0,00
						TOTAL	**0,216**



TOTAL	**0,216**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,216**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
7.6.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.6.3						1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**





TOTAL	1,00
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	1,00



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
7.6.4						1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

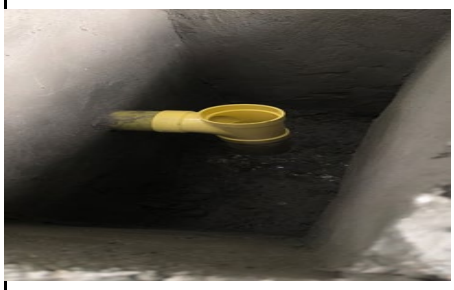

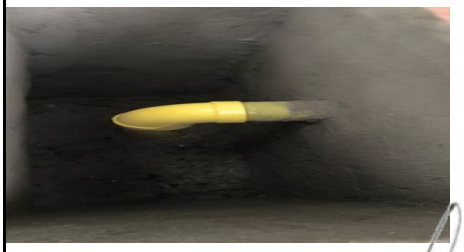

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 7.5.5.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
7.6.5		6,00				1,00	**6,00**
							0,00
						TOTAL	**6,00**



TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.7.1	TUBERIA LECHO FILTRANTE	8,00	1,00		8,00	1,00	**8,00**
	FOSA INFILTRACION	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
					0,00	1,00	**0,00**
					0,00	1,00	**0,00**
					0,00	1,00	**0,00**
							0,00
						TOTAL	**9,00**



TOTAL	**9,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**9,00**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL M3)
7.7.2	EXCAVACION TUBERIA LECHO FILTRANTE	8,00	0,50	0,5	2,00	1,00	**2,00**
	FOSA INFILTRACION	1,00	1,00	1	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**3,00**



TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CAM CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA DE INFILTRACION.	**MI**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
7.7.3	COLONIA					8,00	**8,00**
							0,00
						TOTAL	**8,00**



TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.7.4	FOSA INFILTRACION	1,00	1,00	0,5	0,50	1,00	**0,50**
							0,00
						TOTAL	**0,50**



TOTAL	**0,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,50**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	**ME**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.7.5	FOSA INFILTRACION	1,00	1,00	0,5	0,50	1,00	**0,50**
							0,00
						TOTAL	**0,50**



TOTAL	**0,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,50**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA DE RECIBO ACTA PARCIL No. 1** **28/02/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7.7.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7.7.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR COLONIA					4,00	**4,00**
							0,00
						TOTAL	**4,00**





TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ANEXO 3
ACTA RECIBO PARCIAL INTERVENTORÍA No.1
ACTA DE INTERVENTORÍA No.1

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**	**Nº: 513**	**AÑO:**	**2025**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
	NIT y/o CC:	**79.142.300**		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 8 C No.34 – 05 Los Molinos**	**TEL:**	**608 8757000**
	CIUDAD:	**NEIVA - HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA”.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2025000048 del 31/12/2025**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 53.597.600,00**			
	Valor en Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 0,00		
VALOR TOTAL	**$ 53.597.600,00**			
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**			

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A	
FECHA INICIO	22 de enero de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de mayo de 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	24/03/2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 22/02/2026 al 28/02/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:		
	EN CALIDAD DE:		

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**22/01/2025**	**-**	**$ 53.597.600,00**	**$ 53.597.600,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	-	**$ 53.597.600,00**
VALOR EJECUTADO	28/02/2026	$ 24.365.468,96	-	**$ 29.232.131,04**
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$ 24.365.468,96	-	**$ 29.232.131,04**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades en el período del 22 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026 objeto del contrato.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $ 24.365.468,96, conforme al Acta de recibo parcial No.1 de interventoría; la Supervisión en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, así: PAGOS PARCIALES: En el mismo porcentaje en el que se realicen los pagos parciales del contrato objeto de interventoría hasta un 80% del valor del contrato de Interventoría. PAGO FINAL: El veinte por ciento (20%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminado y liquidado el contrato de obra objeto de interventoría…"*; por tanto, se autoriza el primer pago por la suma de **$ 24.365.468,96** correspondientes al **45,46%** del valor del contrato ejecutado.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1 de Interventoría.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	-
Oportunidad En Entrega	-
Cantidad Entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Coordinador Proyecto Ceibas
Supervisor contrato No.513 de 2025

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

CONTRATO No.	513 de 2025	VALOR INICIAL:	$ 53,597,600
VALOR:	$ 53,597,600	ADICIÓN:	$ -
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES — PLAZO ADICIONAL: 0	VALOR FINAL:	$ 53,597,600
OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".	FECHA INICIO:	22 de enero de 2026
		FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	N/A
		FECHA REINICIO 1:	N/A
INTERVENTOR-CONTRATISTA	CARLOS ARTUTO QUIZA CAMACHO - Nit. 79.142.300-1	FECHA TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026
SUPERVISOR:	Ing. JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 24,365,468.96

Ingenieria & Construcción

ACTA DE INTERVENTORÍA

PARCIAL PARCIAL 1

FECHA: 25 de marzo de 2026

PERIODO: ENERO 22 A 28 DE FEBRERO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA					EJECUCIÓN OBRA					EJECUCIÓN INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN CONTRATO OBRA	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN CONTRATO	VALOR FINAL CONTRATO	ACTA No.	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO	COSTO PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA	COSTO ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
114-2026	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA.	$ 515,733,326.54	$ -	$ 515,733,326.54	1	$ 234,476,600.02	45.46%	$ 234,476,600.02	45.46%	$ 20,475,184.00	45.46%	$ 20,475,184.00	45.46%
VALOR TOTAL OBRAS PARA REALIZAR INTERVENTORIA		**$ 515,733,326.54**	**$ -**	**$ 515,733,326.54**				**$ 234,476,600.02**	**45.46%**	**$ 20,475,184.00**	**45.46%**	**$ 20,475,184.00**	**45.46%**
	COSTO INTERVENTORIA	$ 45,040,000.00								$ 20,475,184.00		$ 20,475,184.00	
	IVA - 19%	$ 8,557,600.00								$ 3,890,284.96		$ 3,890,284.96	
	TOTAL COSTO INTERVENTORIA	**$ 53,597,600.00**								**$ 24,365,468.96**		**$ 24,365,468.96**	
	PORCENTAJE COSTO INTERVENTORIA SOBRE VALOR CONTRATO	10.39%											

VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA C.
Interventor

Ing. JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ
Supervisor
