SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VEHICULOS

SST-FR-04	1/02/2025

SEMANA DEL 29 AL 30 MES DIC AÑO 2025
MARCA: TOYOTA HILUX
PLACA: CAJ026.

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Jose Javier Garcia
CEDULA	1104263949
NUMERO DE LICENCIA	1002882363
DATOS DEL VEHICULO	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	2026/04/11
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TECNOMECÁNICA	N/A
LICENCIA DE TRÁNSITO	1002882363

CALIFIQUE: B: BUENO M: MALO - N/A: NO APLICA

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	1. Luces altas	✓			✓																	
	2. Luces bajas	✓			✓																	
	3. Direccionales delanteras	✓			✓																	
	4. Direccionales traseras	✓			✓																	
	5. Luces de stop	✓			✓																	
	6. Luces de retroceso	✓			✓																	
	7. Luces de parqueo	✓			✓																	
	8. Alarma de retroceso	✓			✓																	
LLANTAS	1. Estado de llantas delanteras	✓			✓																	
	2. Estado de llantas traseras	✓			✓																	
	3. Llanta de repuesto	✓			✓																	
	4. Profundidad del labrado	✓			✓																	
	5. Sin abultamiento o cortaduras	✓			✓																	
MECANICO	1. Estado del motor	✓			✓																	
	2. Ruidos en el motor	✓			✓																	
	3. Nivel Aceite motor	✓			✓																	
	4. Nivel de aceite hidráulico	✓			✓																	
	5. Nivel agua sistema refrigeración	✓			✓																	
	6. Estado de filtros del sistema mecánico.	✓			✓																	
	7. Nivel de combustible	✓			✓																	
	8. Estado de correas y guardas de protección	✓			✓																	
BATERIA	1. Estado de la bateria	✓			✓																	
HIDRAULICO	1. Estado de mangueras	✓			✓																	
	2. Estado de acoples	✓			✓																	
	3. Estado de filtros del sistema hidráulico.	✓			✓																	
	4. Compuertas y tapas	✓			✓																	
	5. Estado de empaques (compuerta trasera y tapas.)	✓			✓																	
	6. Fugas del sistema hidráulico	✓			✓																	
GENERAL	1. Golpes y rayones	✓			✓																	
	2. Bomper delantero	✓			✓																	
	3. Bomper trasero	✓			✓																	
	4. Guardabarros delanteros	✓			✓																	
	5. Guardabarros traseros	✓			✓																	
	6. Puertas delanteras	✓			✓																	
	7. Puertas traseras	✓			✓																	
	8. Fugas sistema aire de frenos	✓			✓																	
	9. Pito o alarma de retroceso	✓			✓																	
	10. Techo	✓			✓																	
	11. Platón y puerta de platón	✓			✓																	
	12. Pintura general	✓			✓																	
	13. Asientos delanteros y traseros	✓			✓																	
	14. Cinturon de seguridad	✓			✓																	
	15. vidrios	✓			✓																	
	16. Tapetes	✓			✓																	
	17. Filtro del aire acondicionado	✓			✓																	
	18. Kit de carretera	✓			✓																	
	19. Gato Hidraulico	✓			✓																	
	20. Rines	✓			✓																	
	21. Tapas de los rines	✓			✓																	
	22. Espejo central	✓			✓																	
	23. Espejos laterales	✓			✓																	

PLANILLAS DE SEGURIDAD CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901370978
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N 270 OFICINA 405	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6002294370	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2663029720

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 303.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.800	$ 0	$ 303.800
230301	230301-PORVENIR	13	$ 2.099.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.099.500	$ 0	$ 2.099.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 783.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.800	$ 0	$ 783.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.008.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.008.000	$ 0	$ 1.008.000
SUBTOTALES:										$ 4.195.100	$ 0	$ 4.195.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 69.400
EPS041	NUEVA EPS CM	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 342.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 299.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.500	$ 0	$ 0	$ 299.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 338.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.500	$ 0	$ 0	$ 338.500
SUBTOTALES:													$ 1.049.400	$ 0	$ 0	$ 1.049.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.825.400	$ 1.825.400	$ 0	$ 0	$ 1.825.400
SUBTOTALES:									$ 1.825.400	$ 0	$ 0	$ 1.825.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	24	$ 1.049.400	$ 0	$ 1.049.400
SUBTOTALES:			$ 1.049.400	$ 0	$ 1.049.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1023882525	GIRALDO ORTIZ JUAN JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
2	CC 1005718608	SANCHEZ OCAMPO JUAN CAMILO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI	28															
3	CC 1006932234	SANCHEZ SANCHEZ BENJAMIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
4	CC 1007701398	SALVEDRA MORENO YAMITH ESNEIDER	DEPEND		$ 1.638.000	FIJO		SI	28															
5	CC 1013155556	PELAEZ LEON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	28															
6	CC 1077666705	ROJAS FONSECA ROBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
7	CC 1192933109	GARCIA MARTINEZ JAMES IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
8	CC 1192993099	VERGARA MUÑOZ JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
9	CC 1105301165	JARAMILLO FRANCO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
10	CC 1106301611	MARTINEZ CRISTIAN CAMELO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
11	CC 1121844	TAPIA ROMAN ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	28															
12	CC 1423855	TEZANO RODRIGUEZ ELIAS ALBERTO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI	10															

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	28	$ 1.533.334	$ 245.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.400	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.533.334	$ 61.400	$ 0	$ 61.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.533.334		$ 107.100	28	$ 1.533.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	28	$ 1.292.000	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 206.800	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.292.000	$ 51.700	$ 0	$ 51.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.292.000		$ 90.000	28	$ 1.292.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	28	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.000.000		$ 69.600	28	$ 1.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	231001-COLFONDOS	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	250301-PORVENIR	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25-14 COLPENSIONES	28	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	28	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 949.000		$ 66.100	28	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	230301-PORVENIR	10	$ 566.667	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.700	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 22.700	14-11 - ARL SURA	10	$ 566.667		$ 39.500	10	$ 566.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901976978
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N 270 OFICINA 405	TELÉFONO:	2537743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6002294370	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2083023720

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
13	CC 79493339	BARRERO ACUNA LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI		20														
14	CC 65814456	RAMOS FAJARDO MARIA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
15	CC 65816440	CALDERON ESCOBAR LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
16	CC 79974835	BALAGUERA JIMENEZ YOHANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
17	CC 80016997	LUNDAS DIAZ SIMSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
18	CC 80142451	CARDENAS CARDENAS ALDINEBER	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI		20														
19	CC 93062372	BERNAL MEDELLIN JHON DIEGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
20	CC 93062402	QUICENO ESCOBAR VICENTE ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
21	CC 93083941	ROCHA LOZANO ANDZAR	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO		SI		20														
22	CC 93087024	CARRILLO MARIN JOSE JAVIER	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI		20														
23	CC 93416682	PUERTAS MUNOZ AURELIO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI		20														
24	CC 93416848	LOTERO RIOS GILBERTO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI		20														

Nº	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
	PENSIÓN									SALUD								ARP				CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	230201-PROTECCION	20	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 2.000.000		139.200	$20	2.000.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	230201-PROTECCION	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	230201-PROTECCION	20	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.000.000		$ 69.600	20	$ 1.000.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	25-14-COLPENSIONES	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	25-14-COLPENSIONES	20	$ 1.733.334	$ 277.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.400	EPS017-FAMISANAR	20	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 69.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.733.334		$ 120.700	$20	1.733.334	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	25-14-COLPENSIONES	20	$ 1.533.334	$ 245.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.400	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.533.334	$ 61.400	$ 0	$ 61.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.533.334		$ 106.800	$20	1.533.334	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	230301-PORVENIR	20	$ 1.133.334	$ 181.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 181.400	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.133.334	$ 45.400	$ 0	$ 45.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.133.334		$ 78.900	20	$ 1.133.334	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	25-14-COLPENSIONES	20	$ 1.133.334	$ 181.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 181.400	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.133.334	$ 45.400	$ 0	$ 45.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.133.334		$ 78.900	20	$ 1.133.334	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.119.300

Planilla Pagada
Planilla Pagada

146

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELEFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2031 - PERSONAL APLICACION ASFALTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6002318784	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2062897512

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.608.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.608.100	$ 0	$ 1.608.100
230301	230301-PORVENIR	16	$ 2.589.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.589.800	$ 0	$ 2.589.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 317.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.400	$ 0	$ 317.400
SUBTOTALES:										$ 4.515.300	$ 0	$ 4.515.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 74.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 36.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 316.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.000	$ 0	$ 0	$ 316.000
EPS041	NUEVA EPS CM	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700	$ 0	$ 0	$ 278.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 423.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.900	$ 0	$ 0	$ 423.900
SUBTOTALES:													$ 1.129.400	$ 0	$ 0	$ 1.129.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.965.000	$ 1.965.000	$ 0	$ 0	$ 1.965.000
SUBTOTALES:									$ 1.965.000	$ 0	$ 0	$ 1.965.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	24	$ 1.129.400	$ 0	$ 1.129.400
SUBTOTALES:			$ 1.129.400	$ 0	$ 1.129.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA/O EXTERIOR	TERCERA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1032194404	CARDENAS PEÑATO JORDAN MANUEL	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI		20														
2	CC 1005851794	CEPEDES RODRIGUEZ LEON LEANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
3	CC 1025530221	CUELLOS ARIAS JOHAN DANIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
4	CC 1038815316	ARENAS ENCISO JOSE ERNEY	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO		SI	03	20														
5	CC 1063161277	ARGUMEDO TAPIA JEFERSON	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI	04	P-20														
6	CC 1074805517	NARANJO JARAMILLO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
7	CC 1104705630	AVILA QUINTERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
8	CC 1106782235	ZAMUDIO DAZMAN SHAYAN STEVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
9	CC 1106784062	RAMIREZ LEAL DANIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
10	CC 1106[illegible]	MARTINEZ MORA NORMAN LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
11	CC 1110553147	PINEDA ROMAN RAFAEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI	16	20														
12	CC 1110539630	CASTELLANOS VARON WILMER EDUARDO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI	16	20														

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	20	$ 1.466.667	$ 234.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.700	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 58.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.466.667		$ 102.100	20	$ 1.466.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	19	$ 1.108.334	$ 177.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.400	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 1.108.334	$ 44.400	$ 0	$ 44.400	14-11 - ARL SURA	19	$ 1.108.334		$ 77.200	19	$ 1.108.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION	27	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.980.000		$ 137.900	27	$ 1.980.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25-14 COLPENSIONES	5	$ 316.667	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 50.700	NUEVA EPS CM	5	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 12.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 316.667		$ 22.100	5	$ 316.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	230301-PORVENIR	5	$ 366.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 14.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 366.667		$ 25.600	5	$ 366.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2-70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2031 - PERSONAL APLICACION ASFALTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5002318784	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2062667512

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERSONA TRIBUTARIA	IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCI	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1111042584	HERNANDEZ SERRATO BRAYAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	25	$ 949.000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1127849376	CARDENAS HERAZO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI	20																230201-PROTECCION	20	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 2.400.000		$ 167.100	20	$ 2.400.000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1122555756	CARDENAS HERAZO YOHYIS JOSE	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	20																230201-PROTECCION	20	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 2.000.000		$ 139.200	20	$ 2.000.000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1130492957	GONZALEZ TACUMA RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	25	$ 949.000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1234630149	ROJAS RUBIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 1.666.667	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.700	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 66.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.666.667		$ 116.100	20	$ 1.666.667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 14256312	SANDOVAL POLANIA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI	20																230201-PROTECCION	20	$ 1.866.667	$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.700	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 74.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.866.667		$ 130.000	20	$ 1.866.667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 93238554	FIERRO PALOMA LUIS NOSCNDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02	20															230201-PROTECCION	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS017-FAMISANAR	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550		$ 62.800	19	$ 901.550	CCF48-CONFATO LIMA	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 93238562	JARAMILLO RESTREPO LEONEL DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02	20															230201-PROTECCION	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550		$ 62.800	19	$ 901.550	CCF48-CONFATO LIMA	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 93420354	MUÑOZ QUINTERO CESAR WILLIAM	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 1.133.334	$ 181.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 181.400	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.133.334	$ 45.400	$ 0	$ 45.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.133.334		$ 78.900	20	$ 1.133.334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 93459878	TOVAR BARROS JOHN JAIRO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	20																25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.666.667	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.700	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 66.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.666.667		$ 116.100	20	$ 1.666.667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	PT 6157421	CARCIS MARTINEZ JUNIOR VALENTIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	23	$ 949.000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	PT 6157888	PEREZ MUARES ERICK DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	23	$ 949.000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.739.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

148

INFORME CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONTRATO:

CONTRATO NO. 2329 DEL 29 DE MAYO DE 2025

Objeto: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA".

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 04

PERIODO: 01 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IBAGUÉ, DICIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3. GENERALIDADES 4
4. PROCESO CONSTRUCTIVO 5
5. ALCANCE DEL PROYECTO. 5
5.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR 5
6. PARAMETROS DE DISEÑO 8
7. GARANTÍAS DEL CONTRATO 10
8. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO – Anexo 0 11
10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 11
11. PERSONAL Y EQUIPOS 11
12. ANÁLISIS FINANCIERO 14
13. CONCLUSIONES 14

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

1. INTRODUCCIÓN.

el presente informe recopila información general y especifica de la obra de la pavimentación de la primera etapa de vías urbanas del municipio de fresno Tolima.

La obra se ejecuta en el marco del contrato 2329 suscrito entre la GOBERNACION DEL TOLIMA y el CONSORCIO VIAS FRESNO 2025. El objeto del contrato es **"CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA".** Donde se realiza la construcción de 9 vías urbanas incluyendo el parque principal en el municipio de fresno Tolima, las cuales se le realizara la reposición de acueducto y alcantarillado.

.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	2329 DEL 29 DE MAYO DE 2025
CONVENIO No.	NO APLICA
ORDEN DE COMPRA No.	NO APLICA
OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 – R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT/CC:	NIT 901.947.461-5
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 5.393.272.795,32)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP:	1215 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SIAF 12425 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SPGR
RP:	10975 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 SIAF 27725 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 SPGR
FECHA LEGALIZACIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE JULIO DE 2026
FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ORDEN DE COMPRA:	NO APLICA

Fecha Acta de Inicio: 15 de septiembre de 2025

3. GENERALIDADES

Con el proyecto se pretende realizar la demolición de 9 calles en el municipio de fresno Tolima posterior a esto se realizara reposición de acueducto alcantarillas y andenes y urbanismos de los andenes del parque, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra la demolición de las calles existente puesto que estas se encuentran con un gran deterioro, y estas se realizaran con pavimento rígido tipo MR-40 con todos los estándares requeridos por la entidad contratante. Teniendo en cuenta el amplio alcance del proyecto, la gestión de recursos, el entorno donde se desarrolla, la integralidad de este, el manejo y disposición del recurso humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta.

A continuación, se localiza la zona de la obra y la distribución del segmento vial del proyecto en general:

3.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

lustración 1-1 Localización general del proyecto



Fuente: 1 Elaboración propia a partir de Google earth

ID	CALLE	MUNICIPIO	BARRIO	LONGITUD (ML)	M2
1	CLL 3 CR 7 - 8	FRESNO	CENTRO	92.13	521.67
2	CLL 3 CR 8 - 9	FRESNO	CENTRO	81.00	494.21
3	CRA 4 CLL 3 - 4	FRESNO	ABUNDANCIA	79.59	498.00
4	CRA 5 CLL6 - 7	FRESNO	SOR JULIA	98.74	623.43
5	CRA 5 CLL 3 - 4	FRESNO	CENTRO	86.40	446.46
6	CRA 7	FRESNO	PARQUE	72.76	808.35
7	CLL 4	FRESNO		70.06	667.08
8	CR 6	FRESNO		63.38	510.38
9	CLL 3	FRESNO		84.32	821.50
		TOTAL		728.38	5391.08

A continuación, se presenta en forma resumida la descripción de los aspectos Técnicos, Administrativos y Financieros del desarrollo de las obras, y el estado actual del proyecto.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proyecto desarrolla en el municipio de fresno en el departamento del Tolima, tiene un lapso estimado de ejecución de 10 meses, el plazo establecido para la ejecución del contrato. La obra será realizada por personal capacitado y competente para llevar a cabo las diversas tareas necesarias, las cuales se llevarán a cabo siguiendo los más altos estándares constructivos y cumpliendo meticulosamente con todas las especificaciones técnicas del proyecto.

5. ALCANCE DEL PROYECTO.

5.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5391.10
2	EXPLANACION Y CAJEO (INCLUYE CARGUE)	M3	3103.80
3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÀQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1886.30
4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	912.00
5	ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M	M3	527.20
6	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	808.70
7	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	115.10
	EXCAVACIONES		
6	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1146.6
8	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 M	M3	527.2
	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		
10	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	5391.1
11	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1779.1
12	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1053.3
	PAVIMENTOS HIDRAULICOS		
14	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1080.1
15	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	1626
16	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	123.4
	CONCRETOS		
17	ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	196.4
	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1456.8
18	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	124.1
	ACERO		
19	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	5713
20	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	11117.2
	FILTROS Y DRENAJES		
21	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	6155.2

Página 1

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

	ALCANTARILLADO		
22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	751.1
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	479.2
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	674.6
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	751.1
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	154
	ACUEDUCTO		
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	135
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	154
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	154
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	653.6
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	88
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	66
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	154
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	366.6
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	393
55	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	18
56	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	12
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	UND	4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	UND	3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	UND	2
	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO PVC DE 3"	UND	8
58	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO PVC DE 6"	UND	6
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO		
59	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION EXISTENTES	UND	19
	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	19
60	PAÑETE INTERIOR (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO)	ML	34.2
61	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO)	ML	21.8
62	CONO DE REDUCCIÓN H=065M	UND	19
63	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	85.5
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	19
65	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	154
66	SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	UND	2
67	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE REJILLA METALICA H=1.00M ANCHO=0.36 CM	ML	6.1

	OBRAS ADICIONALES A LA VIA		
68	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	1456.8
69	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	1456.8
70	CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	140.6
71	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	140.6
74	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	2413.5
75	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	DIA	18
79	LOSETA PREFABRICADA PARA ANDEN	M2	871.6
	TRANSPORTE		
92	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	360393.8
93	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	59405.5

6. PARAMETROS DE DISEÑO

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PAVIMENTO A UTILIZAR

Para la ejecución del proyecto se tienen previstas 2 estructuras de pavimento entregadas por la entidad contratante la cual se divide en dos grupos el primero es relacionado a las calles del parque principal y la calle 3 de la cra 7 a cra 9 y el segundo grupo se refiere a las calles de los barrios sor julia abundancia y centro las cuales a continuación se presenta un esquema de cada estructura a utilizar

Grupo 1

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 800.000 EE 8,20$_{Ton}$
- CBR (diseño): 1.0%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.2
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana

METODO AASHTO-93
Grupo 1
NT2 (800.000 NEE $_{8,20Ton}$)





Grupo 2

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 732.000 EE $8{,}20_{Ton}$
- CBR (diseño): 2.7%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.7
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana



7. GARANTÍAS DEL CONTRATO

En atención a lo estipulado en la en Contrato, se constituyeron a favor de la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA las siguientes pólizas de Garantía:

8. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO – Anexo 0

Póliza de Seguro de Cumplimiento No. I-100046692
Fecha de Expedición: 04/08/2025

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. I-100011962
Fecha de Expedición: 04/08/2025

Modificación: Garantías Iniciales Del Contrato

MODIFICACIÓN – Anexo 2

Póliza de Seguro de Cumplimiento No. I-100046692
Fecha de Expedición: 07/10/2025

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. I-100011962
Fecha de Expedición: 07/10/2025

Modificación: Actualización según Acta de Inicio del 15/09/2025

9. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A La fecha del presente informe se han venido realizando las afiliaciones de todo el personal al Sistema de Seguridad Social y se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de ley.

Con el fin de evidenciar lo anterior se anexan los respectivos soportes de pago del mes de **DICEMBRE DE 2025.**

10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo objeto de análisis se adelantaron de manera simultánea labores de intervención en dos frentes viales. En primer lugar, se culminaron las actividades correspondientes a la carrera 5 entre las calles 3 y 4, ejecutando las obras de terminación consistentes en la instalación de tapas de inspección, así como la aplicación de sellantes y conformación de juntas, acciones necesarias para

garantizar la adecuada funcionalidad de la estructura del pavimento y permitir la apertura definitiva de la vía al tránsito vehicular.

De manera paralela, en el frente correspondiente a la carrera 4 entre las calles 3 y 4, se finalizaron las conexiones domiciliarias de los sistemas de acueducto y alcantarillado, junto con la ejecución del cajeo requerido para la posterior colocación del afirmado, elemento fundamental dentro de la conformación de la estructura del pavimento proyectado.

Adicionalmente, en el sector del parque se concluyeron los detalles finales de los andenes en tableta prefabricada correspondientes a las tres calles intervenidas hasta la fecha, quedando pendiente la ejecución de estas actividades en la calle 3, conforme a la programación establecida.

Todas las actividades descritas fueron ejecutadas dando estricto cumplimiento a los estándares de calidad, las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo, y las medidas de gestión y protección ambiental, de acuerdo con la normativa técnica vigente y las obligaciones contractuales asumidas, garantizando en todo momento la seguridad del personal vinculado al proyecto y la preservación del entorno intervenido.

Con base en la consolidación de los avances físicos y financieros registrados a la fecha de corte del presente informe, se estima que el porcentaje global de ejecución del proyecto asciende aproximadamente al 60 %, en concordancia con lo establecido en las condiciones contractuales vigentes.

11. PERSONAL Y EQUIPOS

En el presente período del mes de mayo el contratista empleó el personal que se relaciona a continuación:

Correspondiente al mes de diciembre:

OCUPACION	CANTIDAD
Director de obra / especialista en vías	1
Residente de obra	2
Especialista en hidráulica / ambiental	1
Coordinadora SISO	1
Auxiliar SISO	1
Ing. Auxiliar Ambiental	1
Topógrafo	2
Operador de maquinaria	3
Conductor de volqueta	2
Maestro General	1
Maestro de Obra	1
Almacenista	1
Oficial	4
Ayudante de obra	20
Controladora Vial	3
Vigilante	1
TOTAL	44

Fuente: Informe Siso-Ambiental

Nota: el personal cuenta con toda la dotación y elementos de protección requeridos para el tipo de trabajo que se viene realizando. Lo anterior validado por la interventoría.

Los equipos utilizados en desarrollo de las obras en este período fueron los siguientes:

Tabla. Maquinaria, Vehículos y Volquetas que apoyan las actividades del Contrato.

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA / PLACA	OPERADOR
Retroexcavadora de Llantas	Hyundai	H940C	Yamith Schneider Saavedra Moreno
Excavadora Sobre Oruga	Volvo	EC1400L	Juan Camilo Sánchez
Motoniveladora	Caterpillar	120H	John Jairo Castañeda
Vibro compactador	Ingersoll rand	CD100C	John Jairo Castañeda
Volqueta Sencilla	Chevrolet Kodiak	TBL046	José Adán Rodríguez Calderón
Compresor	Ingersoll rand	2018	Robinson Briñez

Fuente: Informe Siso-Ambiental

Nota: Toda la maquinaria y equipos utilizados cuentan con su respectivo manual de operación, hoja de vida y formato de mantenimiento correctivo y preventivo y preoperacional semanal. Así como cada operario de este, presenta su certificación o convalidación de aptitud del cargo.

12. ANÁLISIS FINANCIERO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 5,393,272,795.32	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5,393,272,795.32	
VALOR ACTA PARCIAL #1		$ 2,030,798,405.21
VALOR ACTA PARCIAL #2		$ 871,594,859.85
VALOR ACUMULADO EN ACTAS		$ 2,902,393,265.06
SALDO POR COBRAR		$ 2,490,879,530.26
SUMAS IGUALES	**$ 5,393,272,795.32**	**$ 4,521,677,935.47**

13. CONCLUSIONES

a. Se ha cumplido con la afiliación del personal contratado al sistema de seguridad social, cumpliendo todo lo relacionado a seguridad industrial y todos los requerimientos de ley.
b. Las actividades del Contrato se han desarrollado dentro del plazo establecido en el mismo, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas y acogiéndonos estrictamente al diseño entregado por la gobernación del Tolima.

Atentamente,


CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Rep. Legal Ing. RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
Contratista

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN DE REDES

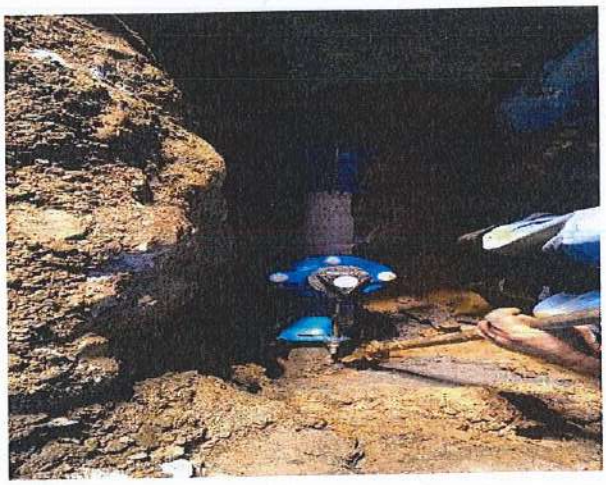











CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

INSTALACIÓN DE REDES














INSTALACIÓN RECEBO



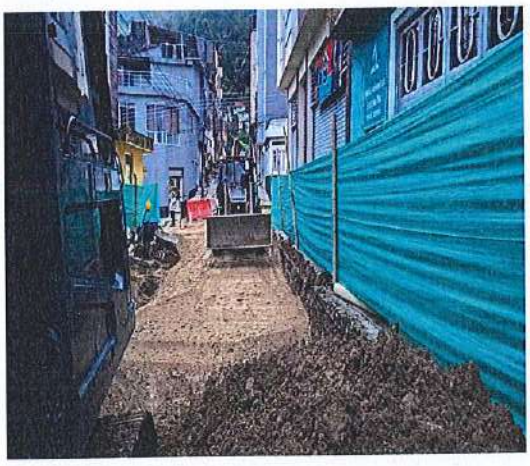










CONSTRUCCIÓN VÍA






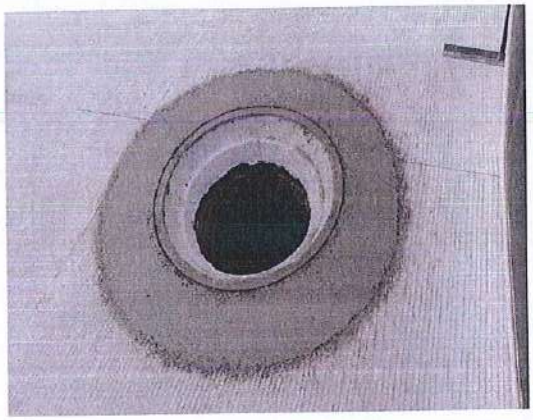





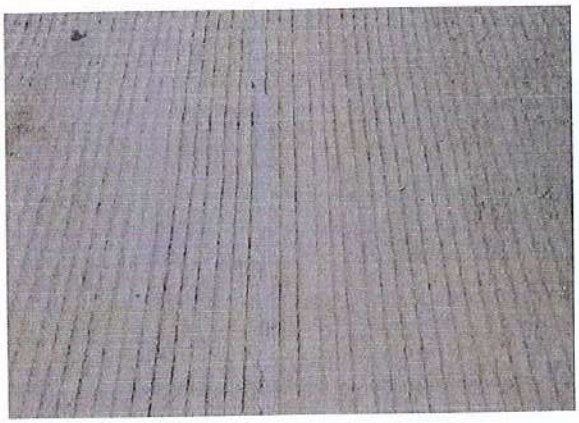

ANDENES













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	VERSIÓN	1
	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST. Periodo comprendido entre el 1 al 30 de Diciembre de 2025	Fecha	05/01/2026
		Hoja No.	1 de 75



ENTREGADO POR:	ING. LUIS FERNANDO URREGO HOYOS	
	DIRECTOR DE OBRA	
	ING. DIEGO REYES	ING JAIME ORTIGOZA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
	ING. JORGE ALBERTO RAMOS	
	PROFESIONAL AMBIENTAL	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.	4
2.	OBJETIVOS.	5
2.1	Objetivo General.	5
2.2	Objetivos Específicos.	5
3.	SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL	6
3.1	PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO.	6
3.1.1	Subprograma 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental y Social	6
3.1.2	Subprograma 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.	7
3.1.3	Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales.	8
3.2	PROGRAMA 2. MANEJOACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.	9
3.2.1	Subprograma 1. Manejo Integral De Materiales De Construcción.	9
3.2.2	Subprograma 3. Señalización Para El Manejo Ambiental En Frentes De Obra Y Sitios Temporales.	13
3.2.3	Subprograma 4: Manejo Integral De Los Residuos Generados En Las Actividades De Construcción Y Demolición (RCD) Y Lodos.	16
3.2.4	Subprograma 2.5: Seguimiento Y Control Al Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Convencionales Y Especiales.	19
3.3	PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y Atmosférica.	20
3.3.1	Subprograma 3.1: Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.	20
3.3.2	Subprograma 3.2: Seguimiento Y Control Al Manejo De Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.	21
3.4	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	22
3.4.1	Subprograma 3: seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles	22
3.5	Programa 5. Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos.	22
3.5.1	Subprograma 5.1: Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.	22
3.5.2	Subprograma 5.3: Seguimiento, Control Y Monitoreo Al Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos.	23
4.	PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.	26
4.1	Programa 6: Desarrollo Local.	26
4.1.1	Subprograma 6.1: Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial.	26
4.2	PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.	28
4.2.1	Subprograma 1: Infraestructura De Predios Y Servicios Públicos	28
4.3	PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL	29
4.3.1	Subprograma 1. Atención A La Comunidad.	29
4.3.2	Subprograma 2. Información Y Divulgación.	31
4.3.3	Subprograma 3: Cultura Vial Y Participación Comunitaria	32
4.3.4	Subprograma 4: Inclusión Social Con Perspectiva De Género Y De Transversalización	33

4.4 OTRAS ACTIVIDADES 34
5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 35
5.1 PROGRAMA DE INSPECCIONES ¡Error! Marcador no
5.2 PERMISOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. ¡Error! Marcador no
5.3 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA ¡Error! Marcador no
5.4 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD. ¡Error! Marcador no
5.4.1 Capacitación SST ¡Error! Marcador no
5.5 CHARLAS DE SEGURIDAD ¡Error! Marcador no
5.6 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ¡Error! Marcador no
5.7 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ¡Error! Marcador no
5.8 SEÑALIZACIÓN ¡Error! Marcador no
5.9 iNVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL. ¡Error! Marcador no
5.10 VERIFICACIÓN DE PERSONAL EN OBRA ¡Error! Marcador no
5.11 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y CONSULTA ¡Error! Marcador no
5.12 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ¡Error! Marcador no
5.13 PLAN DE EMERGENCIAS ¡Error! Marcador no
ANEXOS ¡Error! Marcador no

1. INTRODUCCIÓN.

El programa de adaptación a la guía Ambiental - PAGA es una herramienta básica e importante en el contexto del desarrollo de los proyectos lineales, en este caso las acciones propuestas para la fase en el mejoramiento y rehabilitación del tramo y las condiciones ambientales del sector en donde se ejecuta el proyecto; de este modo, el PAGA, propone una serie de proyectos, programas y acciones a seguir puesto que con la ejecución de las actividades de obra existió la probabilidad de presentarse alteraciones sobre los componentes y elementos ambientales; es por ello que se formularon acciones puntuales a seguir para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos generados a partir de la ejecución del proyecto y así poder garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del mismo.

El estado actual de las vías se debe a diversas circunstancias, dentro de las cuales son causantes la falta de mantenimiento de las mismas, sumado al estado de las redes de alcantarillado y acueducto que tienen muchos años y ya se encuentran deterioradas.

El proyecto en su desarrollo ha implicado la ejecución de obras de infraestructura de tipo ingenieril, como la demolición, colocación de material granular, mejoramiento y construcción de pozos, instalación de sardineles y mejoramiento de andenes entre otros. Así mismo, y paralelo a estos procesos la política del Contratista, propenderá por desarrollar el potencial humano a partir de las actividades propias de su trabajo para cumplir día a día con los objetivos propuestos en el contrato.

Mediante la presentación del PAGA, se iniciara las obras de construcción y rehabilitación de las vias asignadas se requirió conocer las características ecológicas de la zona, el grado de intervención de los mismos las características del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o restauración, todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

A continuación, se presenta el informe de las actividades que se llevaron a cabo en el periodo del presente informe, en el área Ambiental - Social - SST del contrato No. 2329 de 2025 con el fin de dar cumplimiento a los parámetros de las tres áreas.

2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL.

Describir de manera detallada la gestión ejecutada desde los componentes Ambiental – Social - SST realizadas en el periodo del presente informe, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el Contrato De Obra No. 2329 de 2025. Cuyo Objeto: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA"

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Realizar un informe detallado de las actividades en materia de gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas en el frente de obra, durante el periodo del presente Informe.
- ✓ Realizar seguimiento y control en el cumplimiento de los parámetros ambientales planteados para el proyecto.
- ✓ Realizar seguimiento y control a los programas de la gestión social planteada en el proyecto.
- ✓ Realizar seguimiento y control a las acciones implementadas dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO.

Con el objetivo de garantizar la planificación para el adecuado desarrollo del proceso constructivo del Contrato 2329 de 2025, el cual se ejecuta en el Municipio de Fresno, se vincularon profesionales idóneos, con experiencia y capacidad para llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades civiles y de los programas de gestión Ambiental - Social - Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.1.1 Subprograma 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental y Social

La empresa CONSORCIO VIAS FRESNO 2025, tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento y normal desarrollo de cada una de las actividades programadas en cuanto a la gestión Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual conto con el apoyo del área civil para ejecutar PAGA. Todas las actividades se desarrollaron bajo los lineamientos de la normatividad vigente en cuanto a la implementación de obras de infraestructura vial.

Para efectos de comunicación y una mejor trazabilidad en las acciones del proyecto, se focaliza en un solo correo electrónico como también número de contacto, lo anterior principalmente para el caso del director de obra, residente y especialistas. En las siguientes tablas se relaciona el grupo de profesionales, que con sus conocimientos y acciones permiten la culminación exitosa de este periodo del proyecto:

Tabla. Conformación Grupo de gestión Ambiental (PAGA).

CARGO	NOMBRE	CORREO	CONTACTO
Director de Obra Especialista en Pavimentos	Ing. Luis Fernando Urrego H.	Consorcioviasfresno2025 @gmail.com	321 4344165
Residente de Obra	Ing. Diego Reyes		
Residente de Obra	Ing Jaime Ortigoza		
Topógrafo	Luis Eduardo Barrera		
Especialista Hidráulico y Ambiental	Jorge Alberto Ramos		

GRUPO DE APOYO EN CAMPO			
CARGO	NOMBRE	CORREO	CONTACTO
Coordinadora SST	Gloria Astrid López	glopezsalud@yahoo.es	3124886337
Auxiliar SST	Luis Fernando Peláez		3219426127
Profesional Ambiental	Angela Johana Vanegas	areaambiental.ro@gmail.com	3124458304

Desarrollo del Indicador
Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo. Vinculación = (No. Profesionales Vinculados / Equipo Mínimo Profesionales) x 100 Vinculación = (8/8) *100 = 100%

Los Profesionales antes mencionados han sido los encargados de direccionar las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe, en donde ejecutaron las siguientes funciones:

- ✓ Ejecución de Charlas 5, 10 y 15 minutos al personal de obra, áreas Ambiental - Social - SST.
- ✓ Inducción del personal en las áreas Ambiental, Social y SST.
- ✓ Brigadas de orden y aseo por todo el sector de obra.
- ✓ Disposición final de residuos sólidos.
- ✓ Gestión ante los diferentes propietarios de predios ubicados en el Área de Influencia Directa del proyecto, para los permisos de obra según la intervención si se requiere.
- ✓ Atención a la comunidad en el punto de Atención al usuario y/o vías intervenidas
- ✓ Entrega de Dotación y EEP.
- ✓ Divulgación de ATS.
- ✓ Demarcación y señalización de áreas de trabajo.
- ✓ Entrega de dotación y Elementos de Protección Personal
- ✓ Inspecciones de maquinaria y equipos.
- ✓ Inspecciones de EPP.
- ✓ Inspecciones de Equipos de Emergencia.
- ✓ Elaboración de informe mensual de las áreas Ambiental, Social y SST.

3.1.2 Subprograma 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.

Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de charlas al personal de Obra, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a los colaboradores en obra en diversos temas de interés para el proyecto, lo cual se encuentra relacionado en las siguientes tablas:

Tabla. Relación Inducción Área Ambiental.

CONSORCIO VIASFRESNO 2025				
No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
NA PARA EL PERIODO				

PAVETOL				
No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
NA PARA EL PERIODO				


Desarrollo del Indicador
Taller Inducción = (Asistentes a reunión / Personal nuevo vinculado) x 100
Taller Inducción = (-/-) * 100 = -%

Tabla. Capacitación Ambiental.

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Aspectos e Impactos Ambientales	10/12/2025	30	27

Desarrollo del Indicador
Capacitaciones = (Asistentes a reunión/Trabajadores del proyecto) X 100
Capacitación = (27/44) * 100 = 61%



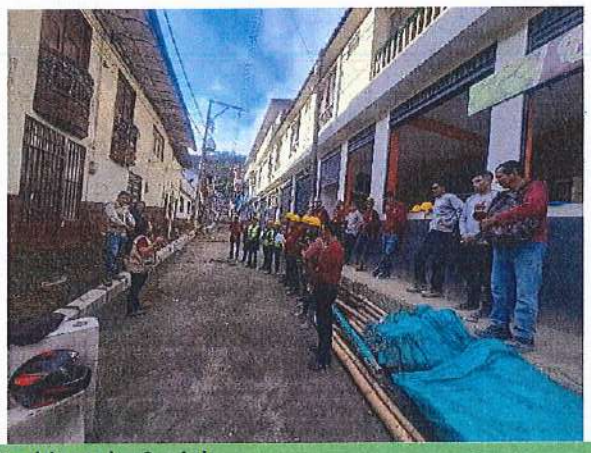

Capacitacion Área Ambiental y Social

Tabla. Charlas Área Ambiental.

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Manejo de Materiales de Construcción	12/12/2025	10 min	18
Cambios Climáticos	15/12/2025	10 min	23
Medio ambiente	17/12/2025	10 min	20
Manejo de la Señalización	19/12/2025	10 min	17

Desarrollo del Indicador
Charlas Ambiental = (No. de Charlas Realizadas en el periodo/No. Total, de Charlas programadas en el periodo) X 100
DI = (4/20) *100 = 20%

El registro de asistencia de la Inducción y charlas del área Ambiental que se relacionó en los cuadros anteriores se adjunta en los anexos del Área Ambiental

3.1.3 Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales.

Teniendo en cuenta las características del proyecto y el espacio donde se ejecuta la obra, se realizaron las siguientes solicitudes:

Tabla. Cumplimiento de Requisitos Legales para el Contrato 2329 de 2025.

Recurso	Demanda	Descripción del tipo de demanda		
Agua	Agua Superficial	Requiere permiso	NO	Para el suministro de agua se realizará mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Corfresno, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.
	Vertimientos	Requiere permiso	NO	Se cuenta con campamento principal en el Barrio Sor Julia donde se hace el empleo de la batería sanitaria, la cual se encuentran conectada a un sistema de alcantarillado.
	Ocupación de Cauce	Requiere permiso	NO	No se requiere permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta que se realizara el mejoramiento de vías urbanas ya establecidas.
Suelo	Materiales de Construcción	Requiere permiso	NO	El suministro de materiales de construcción será por un tercero que corresponde a Triturados y Vías La Caima S.A.S. empresa que cuenta con la documentación en regla, RUCOM-2023110926168, titulo minero 0518-73 Auto-0144 de 24/03/2017, Licencia Ambiental mediante Resolución 914 del 3 de Mayo de 996
	Manejo y Disposición de RCD	Requiere permiso	NO	Para el manejo de disposición de RCD se ubicó un predio asignado por la alcaldía municipal, predio denominado el Espejo 1, ubicado en la vereda El Espejo de propiedad del señor Alexander-
	Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Requiere permiso	NO	Los residuos sólidos serán entregados a la empresa de servicios públicos del municipio de Fresno para su disposición final.
Flora	Aprovechamiento Forestal	Requiere permiso	NO	No se requiere, el componente arbóreo no se verá afectado.
Arqueológico	Plan de Arqueología Preventiva	Requiere permiso	NO	De acuerdo al Decreto número 138 de 2019 del 06 de febrero del año en curso del Ministerio de Cultura por el cual se modifica la parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en el Título V Programa de Arqueología Preventiva en el Articulo 2.6.5.2 en el ámbito de aplicación establece que el programa de Arqueología Preventiva deberá formularse y desarrollarse en todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes.

Desarrollo del Indicador

Autorizaciones y/o permisos para el proyecto

Autoriza = (Autoriza y permisos tramitados/ Autoriza y permisos requerimientos) X 100

Autoriza = (0/0) *100 = 0%

3.2 PROGRAMA 2. MANEJOACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

3.2.1 Subprograma 1. Manejo Integral De Materiales De Construcción.

MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIALES PÉTREOS. El suministro de material granular fue realizando mediante solicitud directa al proveedor de acuerdo al requerimiento de la obra, dicho material fue trasladado desde el patio de almacenamiento de Triturados y Vías La Caima S.A.S ubicado en KM 2 Vía Alvarado – Venadillo, hasta el frente de obra mediante vehículos tipo volquetas sencilla y/o dobles de propiedad del contratista y conductores del municipio, las cuales salen de la planta

debidamente carpadas. El material es descargado y extendido directamente en la obra, no se cuenta con punto de almacenamiento debido al poco espacio con el que se cuenta

Relación volúmenes de material granular requerido en obra

FECHA	TIPO DE MATERIAL				
	ARENA (m3)	RECEBO (m3)	GRAVA ((m3)	AFIRMADO (m3)	BASE(m3)
15/09/2025 a 30/09/2025	8,106	14,331	203,262	0	0
01/10/2025 a 31/10/2025	68,914	100	524,278	1243,79	500,23
1/11/2025 A 30/11/2025	17,46	333,939	0	164,68	18,88
1/12/2025 A 30/12/2025	67,46	383,939	50	214,68	68,88
TOTAL, ACUMULADO (m3)	**161,94**	**832,209**	**777,54**	**1623,15**	**587,99**

Desarrollo del Indicado

(Volúmenes de materiales de construcción utilizados en el periodo (m3) / Volúmenes de materiales requeridos para el proyecto (m3)) X 100

Arena = (67.46 /67.46) *100 = 100 %

Recebo = (832,209/832,209) *100 = 100 %

Grava = (777,54/777,54) *100 = 100 %

Afirmado = (1623,15/1623,15) *100 = 100 %

Base = (587,99/587,99) *100 = 100%

Desarrollo del Indicador

Autorizaciones y/o permisos de explotación y comercialización de los materiales requeridos (AP)

AP = (AP tramitados en periodo / AP requeridos en periodo) x 100

AP = (0 / 0) x 100 = 0%





Manejo de Material Granular

Teniendo en cuenta que son calles urbanas del municipio de Fresno las cuales son muy angostas, en obra no se cuenta con puntos de almacenamiento para material granular, dicho material que es solicitado a diario es descargado en el punto asignado y de una extendido.

Desarrollo del Indicado
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales AM = Lugares almacenamiento adecuados utilizados / Total lugares almacenamiento utilizados) x100 CD = (0/0) *100= 0%

MEDIDAS DE MANEJO PARA CONCRETO. Para el pedido del presente informe se llevó a cabo actividades en obra donde se empleó concreto, estas se relacionan a continuación:

Para la instalación de concreto de la fundida de la placa, se realiza mediante concreto premezclado el cual es desechado en mixer desde la planta de Concretol ubicada en Carrera 14 #42-316 Zona Industrial Caracolí, Honda – Tolima hasta el punto de obra en el municipio de Fresno con una distancia de 55 km.

Relación volúmenes de Concreto mr40 requerido en obra

CONCRETE MR 40		
MES	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD ACUMULADO
Octubre	439,81	439,81
Noviembre	449,25	449,25
Diciembre	0	0
ACUMULADO		889,06



Almacenamiento de Cemento






Manejo del Concreto

MEDIDAS DE MANEJO PARA PREFABRICADOS: Todo el suministro tal como la tubería, madera, formaletas, acero entre otros, que son requeridos para la ejecución en el proceso constructivo del proyecto, son suministrados por proveedores debidamente legalizados de acuerdo a normatividad vigente, como también con el cumplimiento en los estándares de calidad de dichos materiales.

Los insumos o materiales se almacenaron de manera adecuada con el objetivo de evitar su deterioro, cuando algún elemento y/o material es requerido en obra se ubican en sitios que no afecten el normal desarrollo del proceso constructivo, como también mitigar el riesgo de incidente y/o accidentes de los trabajadores en obra.

- Acero, se ubica sobre estructuras de madera para evitar el contacto directo con el suelo y la humedad del mismo, como también la afectación o contaminación del suelo.

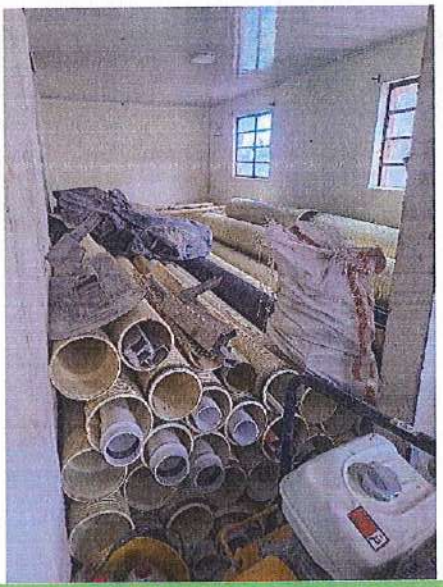

Almacenamiento de Tuberia

Desarrollo del Indicador
CSA = (Personas que asisten a capacitación / Total de personas) x100
CSA = (18 / 47) x100 = 38%

3.2.2 Subprograma 3. Señalización Para El Manejo Ambiental En Frentes De Obra Y Sitios Temporales.

El Contratista a diario con el apoyo del área SST, realizan recorridos de obra con el objetivo de verificar que la señalización instalada se encuentre ubicada de manera adecuada, como también el cerramiento perimetral y demarcación con cinta peligro en áreas donde se requería dicha actividad.

TIPO DE SEÑAL	MEDIDA	CANTIDAD	ESTADO		OBSERVACION
			B	M	
Valla	Ud.	1	X		
Pasacalles	Ud.	3	X		
Valla de Piso	Ud.	5	X		
Cerramiento Perimetral - Calles	ML	763.6	X		Instalación y Mantenimiento
Prohibido el Ingreso a personal no Autorizado	Ud.	2	X		
Conos	Ud.	1	X		
Maletines	Ud.	6	X		
Delineadores	Ud.	2	X		
Obreros en la Vía	Ud.	2	X		
Vía Cerrada	Ud.	2	X		
Inicio de Obra	Ud.	1	X		
Fin de Obra	Ud.	1	X		
Maquinaria en Obra	Ud.	2	X		
Auxiliar de Transito	Ud.	2	X		
Entrada y Salida de Volquetas	Ud.	1	X		
Punto Ecológico	Ud.	1	X		
Camilla	Ud.	1	X		
Botiquín	Ud.	1	X		
Kit Antiderrame	Ud.	1	X		

Desarrollo del Indicador
Señalización y demarcación propuesta
S y D = (Señalización y demarcación Instalada / Señalización y demarcación propuesta) x 100
Señales = (35/40) * 100 = 87%
Cerramiento Perimetral = (763.6/763.6) * 100 = 100%



Instalación Valla Informativa de Obra









Vallas De piso





Cerramiento Perimetral Cra 6







Cerramiento Perimetral Cra 5 Calle 3-4



Demarcación Área de Trabajo

3.2.3 Subprograma 4: Manejo Integral De Los Residuos Generados En Las Actividades De Construcción Y Demolición (RCD) Y Lodos.

Para el manejo y disposición final del material producto de las excavaciones propias de las actividades para el avance del proceso constructivo, con anterioridad se realizó verificación de áreas en el AID para la disposición final de dichos residuos, para lo cual fue asignado un predio por parte de la alcaldía municipal para nivelaciones topográficas, para el caso específico de este informe se cuenta con un predio:

- Predio asignado por la alcaldía municipal, denominado el Espejo 1, ubicado en la vereda El Espejo de propiedad del señor Alexander. Con quien se firmó actas de autorización para las actividades de disposición de residuos productos de las demoliciones y excavaciones de la obra, como compromisos adquiridos por parte del contratista se tiene la nivelación del terreno posterior a la disposición.

MATERIAL DE EXCAVACIÓN		
MES	CANTIDAD (m^3)	VOLUMEN ACUMULADO (m^3)
23/10/2025 a 31/10/2025	150	150
1/11/2025 a 30/11/2025	1522	1672
1/12/2025 a 30/12/2025	0	0
TOTAL, ACUMULADO (m^3)		**1672**

MATERIAL DE DEMOLICIÓN		
MES	CANTIDAD (m3)	VOLUMEN ACUMULADO (m3)
23/10/2025 a 31/10/2025	150	150
1/11/2025 A 30/11/2025	375	525
1/12/2025 a 30/12/2025	0	0
TOTAL, ACUMULADO (m^3)		**525**

No se generó solicitud ante la entidad ambiental competente para zonas de disposición de materiales producto de las demoliciones y excavaciones de obra, esto principalmente por los tiempos cortos del contrato y los trámites ante la entidad ambiental componente son muy demorados. Como también el volumen de material de excavación puede aportar a residentes del sector en nivelaciones topográficas.

Desarrollo Indicador
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD) AERCD = (Autorizaciones RCD tramitados en periodo/Autorizaciones RCD requeridos en periodo) x100S D = (0/0) * 100 = 0 %


Desarrollo Indicador
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM) APDM = (Predios utilizados para disposición en período/Autorizaciones propietarios en período) x 100 APDM = (1/1) * 100 = 100 %







Carpado de Volquetas

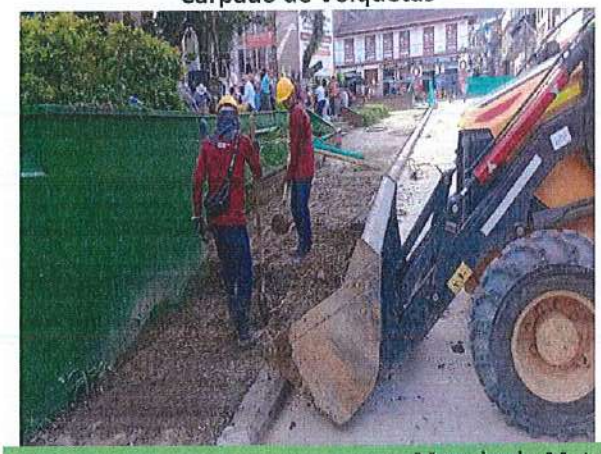



Manejo de Material de Excavación





Carpado de Volquetas

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS SOBRANTES O ESCOMBROS. El material de excavación no se almacena en el área de la obra, es cargado y traslado de manera inmediata a la zona de disposición asignada, de esta manera se evita el almacenamiento de dicho material en el sector de obra, lo anterior con el propósito de no generar un impacto visual desagradable a los usuarios de la vía en el sector específico y/o dispersión de material particulado los cuales pueden llegar a generar contaminación ambiental.

TRANSPORTE DE LOS SOBRANTES O RESIDUOS SÓLIDOS. El traslado de material sobrante se realiza con el apoyo de volquetas sencillas y/o doble con volcos en buenas condiciones con el fin de que no se genere perdida de material ni escurrimiento de líquidos si es el caso, esta actividad se ejecuta desde el punto de obra hasta la zona de disposición.

Desarrollo del Indicado
Quejas y reclamos por parte de la comunidad
Cero quejas para el periodo

3.2.4 Subprograma 2.5: Seguimiento Y Control Al Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Convencionales Y Especiales.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Para dar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados por los residentes del sector, visitantes, trabajadores y por la misma obra, se disponen en bolsas de colores según la norma o fibras para la recolección de residuos.


Las brigadas de orden y aseo se realizan de manera constante por el sector de obra, haciendo recolección de residuos sólidos principalmente, lo anterior se realiza con el objetivo de mantener un área de trabajo aseada y ordenada, que permita el tránsito de vehículos personas con total normalidad sin ningún riesgo de incidente y/o accidente normal por las áreas aledañas a la obra, como también un aspecto visual agradable para quienes transitan por el sector. De esta manera se mitiga la contaminación ambiental evitando que estos residuos por efecto de las lluvias se desplacen y caigan sen los sumideros o alcantarillas que se encuentren en las vías contiguas generando taponamientos.

Dichos residuos se entregan a a la empresa de servicios públicos del municipio para su respectiva disposición final.







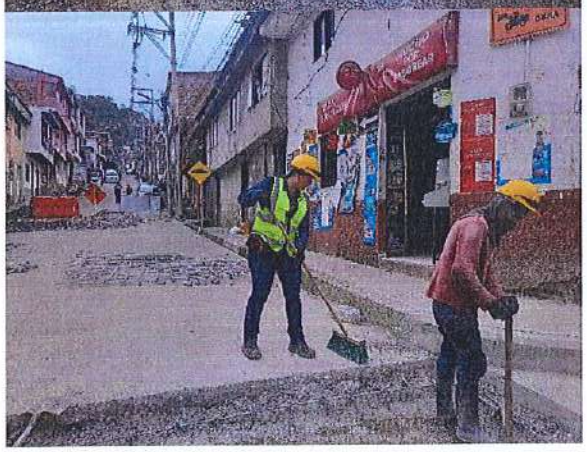





Brigadas de Orden y Aseo

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Para el periodo del presente informe no se generaron residuos peligrosos. Cuando se realice mantenimiento de maquinaria en sitio se cuenta con canecas de 55 galones donde se depositará el aceite quemado y los filtros inservibles, al tener estas canecas llenas se realizará la gestión con la empresa ASEIN, que cuenta con sede administrativa en la ciudad de Ibagué Calle 57 # 6b - 18 (Manzana G Casa 22) Barrio Limonar. Empresa que será la encarga de la disposición final de los residuos peligrosos que se generen. El procedimiento de recolección se realiza una vez se tenga volumen considerable se rotula y se hace programación de recolección y/o de entrega. Por el momento se almacena el aceite Usado.

Desarrollo Indicador
Autorizaciones de las empresas de recolección de residuos peligrosos AERespel AERespel = (Generación de ResPel en período/Empresas Autorizadas ResPel en período) x 100 AERespel = (0/0) * 100 = 0%

3.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y ATMOSFÉRICA.

3.3.1 Subprograma 3.1: Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.

En obra se cuenta con pacas de agua en bolsa para la hidratación del personal que apoya las actividades constructivas, agua que es apta para el consumo humano. Esta es refrigerada y posteriormente almacenada en nevera tipo hicopor en el almacén principal y/o directamente en el punto de obra.

Para el suministro de agua se realizará mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Corfresno, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.

En el siguiente indicador se indican las medidas que se aplican en cuanto al suministro de agua, de la siguiente manera:

Medida Implementada	Número Medidas
Suministro de agua Personal	1
Humectación Terreno	1

Desarrollo del Indicador
Manejo de aguas superficiales
((Número de medidas implementadas / Número de medidas programadas) X 100
CD = (2/2)*100= 100%

3.3.2 Subprograma 3.2: Seguimiento Y Control Al Manejo De Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES. Se cuenta con un campamento principal en el Barrio Sor Julia donde se hace el empleo de la batería sanitaria, la cual se encuentran conectada a un sistema de alcantarillado. Como compromisos adquiridos por el contratista y trabajadores está el adecuado uso de esta y mantener el área aseada y ordenada.

Relación Propietarios Unidades Sanitarias Seleccionadas

PROPIETARIO	UBICACIÓN	USO
Gina Marcela Betancourt	Campamento / Barrio Sor Julia	Mixto





Unidad Sanitaria Personal de Obra

Desarrollo Indicador
Permisos de vertimientos (Pvertim) Pvertim = (Permiso de Vertimiento vigente / Permiso de vertimientos requerido) x 100 Pvertim = (0/0) * 100 = 0 %

3.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

3.4.1 Subprograma 3: seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles

Son las unidades ambientales específicas biológicas, características físicas, estructuras y procesos proveen a la sociedad de bienes y servicios vitales. Así las cosas, los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país y son tres (3): paramos, humedales y bosques.

Por lo anteriormente expuesto, en el área de influencia directa del proyecto no se cuenta con un ecosistema sensible. En el desarrollo de las actividades constructivas se realiza concientización al personal para un adecuado manejo de materiales y el cuidado del medio ambiente, esto con el objetivo principal de recalcar la importancia de todo tipo de ecosistemas.

Desarrollo del Indicador
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores (CSA) *CSA* = ((Trabajadores que asisten a capacitación/ Total de trabajadores) X 100 CD = (27/44) *100= 61%

3.5 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

3.5.1 Subprograma 5.1: Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.

En obra se cuenta con 2 campamentos espacio que cuenta con un área aproximada 10 m^2 de ocupación cada uno, con una bodega principal de manera rectangular donde se almacenan las herramientas, equipos menores, dotación y EPP, Equipos de Emergencias, como también el espacio para atención a la comunidad.

Infraestructuras correspondientes a las señoras María Nancy Urrego y Gina Marcela Betancourt.



Campamentos en Obra

Para la vivienda del personal, se cuenta con 3 campamentos en el municipio de Fresno, dichas residencias que cuentan con sistema de acueducto, conexión al alcantarillado cada vivienda cuenta con 1 batería sanitaria, red de energía, se cuenta con red de gas domiciliario y no se prepara alimentación en estos campamentos.

Relación Propietarios Campamentos Personal

PROPIETARIO	UBICACIÓN	RECIDENTES	CAPACIDAD ALBERGUE
Nancy Pérez	Calle 7 No 7-33	Topógrafos	2
Jaime Arango	Calle 1C No 9A-04	Campamento Personal obra - Operadores	5
Sandra Castaño	Cra 5 No. 6-45	Campamento Personal obra Maestro, Oficiales, Ayudantes	6

3.5.2 Subprograma 5.3: Seguimiento, Control Y Monitoreo Al Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos.

Con el objetivo de llevar a cabo las actividades constructivas se contó con maquinaria amarilla y vehículos, los cuales cuentan con la documentación correspondiente en regla. En la siguiente tabla se relaciona el equipo con el que se contó en obra para el periodo del presente informe.

Tabla. Maquinaria, Vehículos y Volquetas que apoyan las actividades del Contrato.

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA / PLACA	OPERADOR
Retroexcabadora de Llantas	Hyundai	H940C	Yamith Esneider Saavedra Moreno
Excavadora Sobre Oruga	Volvo	EC1400L	Juan Camilo Sánchez
Motoniveladora	Caterpillar	120H	John Jairo Castañeda
Vibrocompactador	Ingersoll radd	CD100C	John Jairo Castañeda
Volqueta Sencilla	Chevrolet Kodiak	TBL046	José Adán Rodríguez Calderón
Compresor	Ingersoll radd	2018	Robinson Briñez

ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. Para el abastecimiento de combustible se emplea Camioneta de Estacas, Chevrolet Dimax de placa ICL610, en la cual se transportan 3 canecas metálicas de 55 galones, el abastecimiento de combustible se da mediante un sistema de taqueo con bomba eléctrica para llevar un mayor control y evitas los derrames de combustible. Este vehículo cuenta con la documentación legal vigente y además cuenta con el equipo de emergencia para el control de incendios.

El colaborador encargado del transporte y manipulación del combustible es el señor Guillermo Alexander Ortigoza Leal, quien cuenta con el respectivo certificado emitido el 13 de Marzo de 2023. Se anexa certificado



Almacenamiento de Combustible









Inspección Kit Antiderrames

4. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

4.1 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

4.1.1 Subprograma 6.1: Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial.

Durante el tiempo de ejecución del contrato el consorcio ha generado un total de 59 Empleos, para periodo del presente informe, el Contratista ha empleado un total de 44 colaboradores directos y 15 indirectos, de las cuales el 34% (16 personas) corresponden a mano de obra calificada y el 66% (29 personas) corresponde a mano de obra no calificada.

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra no calificado de la región que ha sido contratado para la ejecución de las actividades de obra:

Tabla. Personal de Obra No Calificada en el Contrato 2329 de 2025.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025							
No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PROCEDENCIA
1	Aldineber Cárdenas Cárdenas	80.142.451	Almacenista	Administrativo	29/08/2025		Ibagué
2	Aurelio Puertas Muñoz	93.416.082	Vigilante	Operativo	5/09/2025		Fresno
3	Robinson Briñez Diaz	14.136.568	Oficial de Obra	Operativo	30/08/2025		Ibagué
4	Luis Alberto Lozano Rodríguez	14.239.870	Oficial de Obra	Operativo	10/09/2025		Ibagué
5	Alejandra Tapia Román	1.121.844.831	Controladora de Trafico	Operativo	8/08/2025		Fresno
6	María Del Pilar Ramos Fajardo	65.814.456	Controladora de Trafico	Operativo	29/08/2025		Fresno
7	Luz Adriana Calderón Escobar	65.816.440	Controladora de Trafico	Operativo	7/09/2025		Fresno
8	Roberto Rojas Fonseca	1.077.966.705	Ayudante de Obra	Operativo	8/08/2025		Fresno
9	Jhon Deiro Bernal Medellín	93.062.072	Ayudante de Obra	Operativo	8/08/2025		Fresno
10	Simeón Luengas Diaz	80.010.397	Ayudante de Obra	Operativo	8/08/2025		Fresno
11	Vicente Antonio Quiceno Escobar	93.062.402	Ayudante de Obra	Operativo	8/08/2025		Fresno
12	Jepherson Villegas Molina	1.109.297.236	Ayudante de Obra	Operativo	5/09/2025		Fresno
13	Yohany Balaguera Jiménez	79.874.895	Ayudante de Obra	Operativo	4/09/2025		Fresno
14	Juan David Vergara Muñoz	1.109.299.309	Ayudante de Obra	Operativo	4/09/2025		Fresno
15	James Iván García	1.109.293.109	Ayudante de Obra	Operativo	16/09/2025		Fresno
16	Cristian Camilo Martínez	1.109.301.613	Ayudante de Obra	Operativo	17/09/2025		Fresno
17	Benjamín Sánchez Sánchez	1.006.023.224	Ayudante de Obra	Operativo	17/09/2025		Fresno
18	Juan José Ortiz	1.002.866.252	Ayudante de Obra	Operativo	17/09/2025		Fresno
19	Gilberto Lotero Ríos	93.416.846	Ayudante de obra	Operativo	29/09/2025		Fresno
20	Andris Felipe Jaramillo Franco	1.109.301.165	Ayudante de obra	Operativo	14/10/2025		Fresno

PAVETOL							
No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PROCEDENCIA
21	Yoryis José Cárdenas Herazo	1.127.955.792	Oficial	Operativo	1/08/2025		Ibagué
22	Jhon Jairo Tovar Barrios	93.456.878	Oficial	Operativo	14/10/2025		Ibagué
23	Johan Daniel Arias Cubillos	1.025.530.221	Ayudante de obra	Operativo	14/10/2025		Ibagué
24	Junior Valentín Carlo M	X6157421	Ayudante de obra	Operativo	14/10/2025		Fresno
25	Juvenal Antonio Cuadros M	1.052.080.754	Ayudante de obra	Operativo	14/10/2025		Ibagué
26	Erick Darío Pérez Mijares	6.157.686	Ayudante de obra	Operativo	14/10/2025		Ibagué
27	Yorman Leonardo Mesa Martínez	1.109.291.518	Ayudante de obra	Operativo	8/11/2025		Fresno
28	Cesar William Muñoz Quintero	93.420.354	Ayudante de obra	Operativo	13/11/2025		Fresno
29	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	1.074.809.517	Ayudante de obra	Operativo	13//11/2025		Fresno

OBRA CONTRATO 2329-2025	Generación De Empleo								
	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025								
	MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			Reinsertados	Desplazados	Total, Empleo
	Local	Externa	Sub Total	Local	Externa	Sub total			
	1	14	15	20	9	29	0	0	44

Desarrollo del Indicador

Verificación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región

Vinculación = (MO de la región contratada/ Total MO proyecto) x 100

Vinculación = (21/44) x 100 = 48%

Desarrollo del Indicador

Validación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región y perteneciente a grupos vulnerables (mujeres, víctimas, discapacitados, entre otros)

Vinculación = (MO perteneciente a grupos vulnerables/ Total personal proyecto de la región) x 100

N/A para el periodo

Desarrollo del Indicador

Contratación Personal AID

((No. Mano de Obra No Calificada Local/ No. Mano de Obra No Calificada en el Proyecto) X 100

DI = (20/29) x 100 = 69%

Tabla. Relación de Personal en Obra

OCUPACION	CANTIDAD
Director de obra / especialista en vías	1
Residente de obra	1
Especialista en hidráulica / ambiental	1
Coordinadora SISO	1
Auxiliar SISO	1
Ing. Auxiliar Ambiental	1
Topógrafo	2

OCUPACION	CANTIDAD
Operador de maquinaria	3
Conductor de volqueta	2
Maestro General	1
Maestro de Obra	1
Almacenista	1
Oficial	4
Ayudante de obra	20
Controladora Vial	3
Vigilante	1
TOTAL	44

4.2 PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4.2.1 Subprograma 1: Infraestructura De Predios Y Servicios Públicos

✓ **Levantamiento De Actas De Vecindad.**

INICIO. En el periodo del presente informe no se realizó levantamiento de actas de vecindad del sector objeto de intervención, estas se levantaron antes de iniciar las actividades constructivas.

FECHA	CALLE	BARRIO	No. DE ACTAS DE VECINDAD
01/09/02025	Cra 5 Calle 6-7	Sor Julia	21
01/09/2025	Cra 5 Calle 3-4	Centro	11
02/09/2025	Calle 7 entre CRA 3-4	Parque	5
17/09/2025	Calle 4 entre cras 6-7	Parque	9
30/09/2025	Calle 6	Parque	6
TOTAL, ACTAS			52
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

Desarrollo del Indicador

Verificación del registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente aledaña a áreas de intervención.

Acta Vecindad = (Acta de vecindad elaborada / Construcciones aledañas) x100

Acta Vecindad = (52/52) *100= 100 %

CIERRE. En el periodo del presente informe no se realizó levantamiento de actas de vecindad del sector objeto de intervención, estas actas se levantarán una vez se finalice el proceso constructivo.

Desarrollo del Indicador

Levantamiento de Actas de Vecindad de Cierre.

((Total de Actas De Vecindad Cerradas/Total de Actas de Vecindad levantadas) X 100

CD = (0/0) *100 = 0 %

Para el perdido del presente informe no se reportó ninguna novedad de afectación en alguna vivienda que se encuentran ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Desarrollo del Indicador
Validación de las medidas mediante las cuales se subsanaron las afectaciones a la infraestructura y servicios públicos. Afectaciones = (Afectación subsanada / Afectación realizada) x100 = N/A para el periodo

4.3 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

4.3.1 Subprograma 1. Atención A La Comunidad.

Para la atención a la comunidad en general el contratista está presto en campo a recibir todas las peticiones quejas y/o reclamos que se generen, en el horario de atención de martes, miércoles y Jueves de 10:00 am a 4:00 pm; como también se cuenta con la línea de atención al usuario (3124886337 - 3124458304), con la disposición de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, donde la comunidad en general y la de los sectores más distantes del Proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.

El Punto de atención se encuentra ubicado en el área de influencia directa del proyecto en el barrio Sor Julia en el predio de la Sra Gina Marcela Betancourt se puede detallar de manera directa el punto de atención. En la misma área se encuentra ubicado el campamento principal, en donde se cuenta con el equipamiento para recibir a la comunidad que tenga alguna inquietud.




Ubicación Punto de Atención al Usuario

✓ **Buzón de sugerencias:**

Para una mejor comunicación con la comunidad del área de influencia directa y de los sectores más apartados del proyecto, se procedió a la instalación de 1 buzón, ubicado en el Barrio Sor Julia donde se encuentra ubicado el campamento de obra, el buzón se encuentra en un punto visible para la comunidad en general.



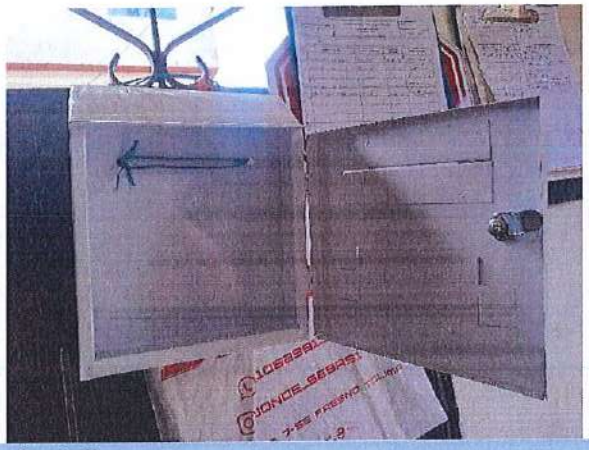

Buzón Barrio Sor Julia

✓ **Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad**

Durante el desarrollo del avance constructivo en el programa de atención a la comunidad y a través del punto S.A.U., no se recepcionaron manifestaciones ciudadanas por la comunidad del área de influencia directa del proyecto durante el periodo del presente informe.

Consolidación de PQRS PROYECTO MES A MES.

PERIODO	No	FECHA	NOMBRE PETICIONARIO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO /VEREDA /BARRIO	QUEJA O SOLICITUD	TELÉFONO	RESPUESTA	ESTADO
1	0	Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	0	Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	0	Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	0	Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Para este periodo no se recepcionarón manifestaciones ciudadanas por parte de la comunidad del AID.									

Consolidado de P.Q.R.S proyecto

QUEJAS	ACUMULADAS	PRESENTE PERIODO	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	0	0	N/A
CERRADAS	0	0	N/A
ABIERTA	0	0	N/A
EN TRAMITE	0	0	N/A
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

Desarrollo del Indicador

Seguimiento y control en la gestión para el cierre de PQRS.

Cierre PQRS = (PQRS cerradas/ PQRS presentadas) x 100

Cierre PQRS = (0/0) * 100 = 0%

4.3.2 Subprograma 2. Información Y Divulgación.

✓ **Realización de reuniones informativas.** Con el objetivo de tener una mayor comunicación con la comunidad en general y tengan pleno conocimiento de los procesos que se ejecutan en cada una de las vías a intervenir, se llevó a cabo reunión de socialización donde se ha contado con la asistencia de funcionarios de la Gobernación, Alcaldía Municipal, Comunidad, Interventoría y contratista. (Ver Anexo 3. Acciones De Divulgación – Reuniones)

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA			
No.	FECHA	CALLE	No. ASISTENTE
1	17/12/2025	Cra 4 Cll 3-4	17
2	18/12/2025	Calle 3 entre 6-7	14
3	18/12/2025	Calle 3 entre 7-8 y 8-9	18
4	18/12/2025	Calle 3 entre 6-7 (Discotecas)	11

Desarrollo del Indicador

Verificación de cumplimiento del mínimo requerido de reuniones con comunidades y autoridades locales.

Reuniones = (Reuniones celebradas / Reuniones requeridas) x 100

CD = (9/9)*100 = 100%

✓ **Realización de Reuniones Veeduría y/o Comité de Participación.** Por parte de la Alcaldía municipal y la comunidad se realizó la constitución el día 20/10/2025 y la respectiva inscripción de la veeduría ciudadana para el contrato el día 25/10/2025. Dicha constitución se llevó a cabo con personas líderes y se mantendrá comunicación constante para que tengan conocimiento de las actividades que se ejecutan y los avances de obra, como también aclarar todas las inquietudes que tengan la comunidad y sean expresadas por los integrantes de la veeduría.

Por parte de la Alcaldía se recibe la resolución No. 068 de 25/10/2025. Por medio del cual se realiza el registro e inscripción de la "veeduría ciudadana pavimentación de la primera etapa de vías urbanas del municipio de Fresno"

El día 10 de Diciembre se llevó a cabo reunión con la veeduría donde se comunica el avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar. Como también se aclaran las dudas e inquietudes que la comunidad han expresado.



Reunión De Veeduría

ACCIONES DE DIVULGACIÓN.

Elaboración y Distribución de Piezas de Comunicación

- ✓ **Distribución de Volantes:** Para el periodo del presente informe NO se realizó distribución de volantes informativos a la comunidad.

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	No. PIEZAS ENTREGADAS
N/A para el periodo		
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.		

Desarrollo del Indicador
Revisión de los comprobantes y registros de entrega de elementos resultantes de la estrategia pública de divulgación.
Estrategia de divulgación pública = (Número de elementos de divulgación implementados / Número de elementos de divulgación proyectados) x 100
Estrategia de divulgación pública = (- / -) x 100 = -%

- ✓ **Cartas Personalizadas:** Para el periodo del presente informe NO se realizó distribución de volantes informativos a la comunidad.

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	ENTIDAD
N/A para el periodo		
Fuente: Consorcio Vías Fresno 2025		

4.3.3 Subprograma 3: Cultura Vial Y Participación Comunitaria

Se llevará a cabo taller de concientización a los participantes de la veeduría una vez esta esté conformada y registrada, en cuanto a que es la seguridad vial, importancia de seguridad vial, puntos a tener en cuenta como conductores y como peatones.

Desarrollo del Indicador
Verificación de las estrategias de apropiación del proyecto implementadas mediante procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, población en general, líderes del AD y con el comité de Participación comunitaria con enfoque de género, diferencial y de derechos. Estrategias = (Estrategias implementadas / Estrategias proyectadas) x 100 Estrategias = (0 / 2) x 100 = 0%

Desarrollo del Indicador
Validación de la promoción de espacios para la participación y control social a través de la conformación del Comité de Participación Comunitaria y/o las posibles veedurías ciudadanas conformadas en el marco del proyecto Acercamientos = (Reuniones realizadas/ Reuniones convocadas) x 100 Acercamientos = (0 / 0) x 100 = 0%

Desarrollo del Indicador
Cumplimiento de compromisos Acercamientos = (Compromisos cerrados / Compromisos establecidos) x 100 Acercamientos = (0 / 0) x 100 = 100%

4.3.4 Subprograma 4: Inclusión Social Con Perspectiva De Género Y De Transversalización

Para la contratación de personal para el contrato de las personas interesadas en hacer parte del proyecto, la recepción de hojas de vida se realizó por medio de la alcaldía municipal, presidentes de JAC las hojas de vida de la comunidad en general sin ningún tipo de discriminación, el personal que si en algún momento no ingresa a laboral es por algún tipo de restricción que se presente en el examen de ingreso, como también se puede presentar la deserción del personal por circunstancias meramente personales.

A la fecha se cuenta con 3 madres cabeza de familia quien expresa que no tiene ninguna dificultad de laborar y dar cumplimiento al horario laboral asignado, teniendo en cuenta que tiene quien cuide de sus respectivos hijos mientras la jornada laboral.

De acuerdo a las hojas de vida de cada trabajador y la inducción realizada al personal de ingreso no se ha identificado personales pertenecientes a grupos vulnerable

Desarrollo del Indicador
Verificación de horarios laborales flexibles y alianzas orientadas a madres y padres cabeza de familia, madres lactantes, entre otros grupos poblacionales. Flexibilización = (Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización / Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto) x 100 Flexibilización = (3/3) x 100

Desarrollo del Indicador
Validación de alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género. Capacitaciones = (Número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso / Número total de trabajadores del proyecto) x 100 N/A para el pedido del informe

Desarrollo del Indicador
Revisión laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región y perteneciente a grupos vulnerables (mujeres, víctimas, discapacitados, entre otros). Vinculación = (MO perteneciente a grupos Vulnerables / Total personal proyecto de la región) x 100 N/A para el periodo del informe

4.4 OTRAS ACTIVIDADES

- **Capacitación y Charlas.** Dentro de las actividades que se desarrollan en el área social, para el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de charlas al personal de Obra, con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de obra en diversos temas de interés para el proyecto, se realizó de manera constante concientización al personal de obra en temas tales como:

Tabla. Relación Inducción Área Social.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025				
No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
NA para el periodo				

PAVETOL				
No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
NA para el periodo				

Tabla. Capacitación Social.


TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Resolución De Conflictos	10/12/2025	30	27

- **COMPARTIR NVIDEÑO**

El día 10 de Diciembre se llevó a cabo por todos los frentes de obra activos un compartir navideño para todos los colaboradores del proyecto, en el cual se les brindo un sincero agradecimiento por el sentido de pertenencia y dedicación que tienen para cada una de las actividades que ejecutan





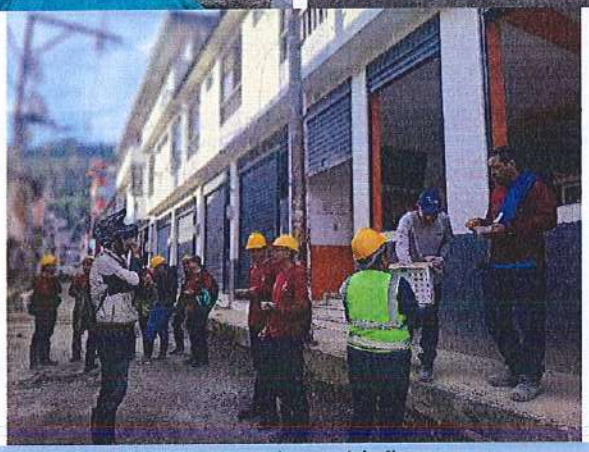

Compartir Navideño

1. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana y de acuerdo a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual le permite enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para asegurar un ambiente laboral seguro e incentivar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, hacia una mejora continua los procesos operacionales.

La organización establece un plan de trabajo anual teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas detallados.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los periodos comprendidos entre el 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025.

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador.

Actividades realizadas.

- Inspecciones ejecutadas durante el periodo
  Ver anexo 1
- Permiso de Trabajo análisis seguro
  Ver anexo 2
- Certificación de la ARL de no accidentes durante el periodo
  Ver anexo 3

1.1 PROGRAMA DE INSPECCIONES


Durante el periodo del presente informe se realizaron inspecciones por observación directa, en caso de encontrar una situación subestándar el trabajador debe de informar la condición de manera inmediata al profesional SST, para realizar el correctivo respectivo. Las inspecciones de maquinaria, son realizadas a diario y registrado en preoperacionales.

A continuación, se indican las inspecciones ejecutadas y la periodicidad de estas.

TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
Inspección pre-operacional herramientas	Trabajador	Semanal
Inspección pre-operacional de vehículo y/o maquinaria	Residente SST	Semanal
Inspección de orden y aseo	Residente SST	Mensual
Inspección de EPP	Residente SST	Mensual
Inspección de Equipos de Emergencia	Residente SST	Mensual
Inspección Campamento	Residente SST	Semanal


Anexo 1. *Registro de Inspecciones.*




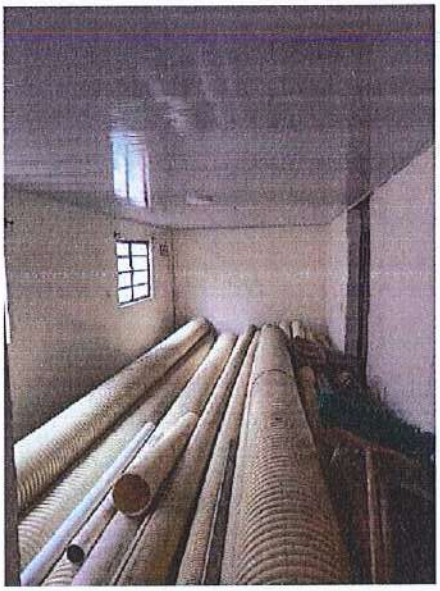




FOTOS. INSPECCIÓN CAMPAMENTO

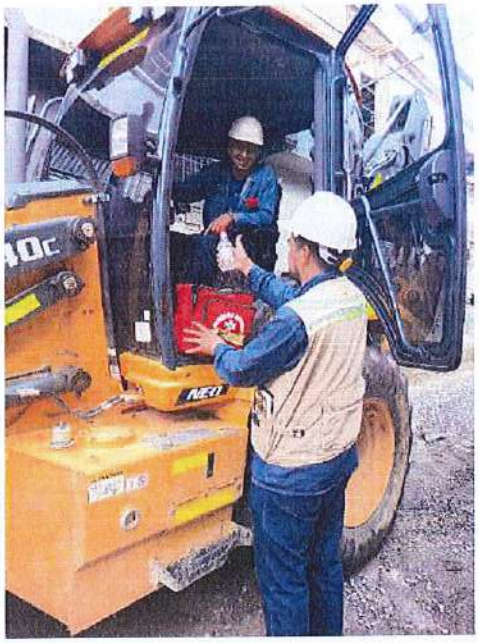

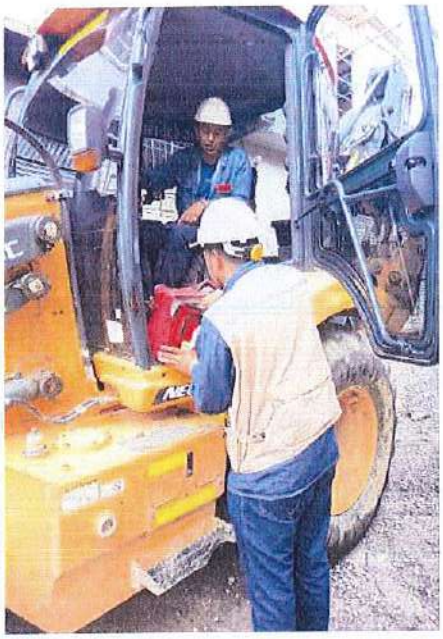



FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA

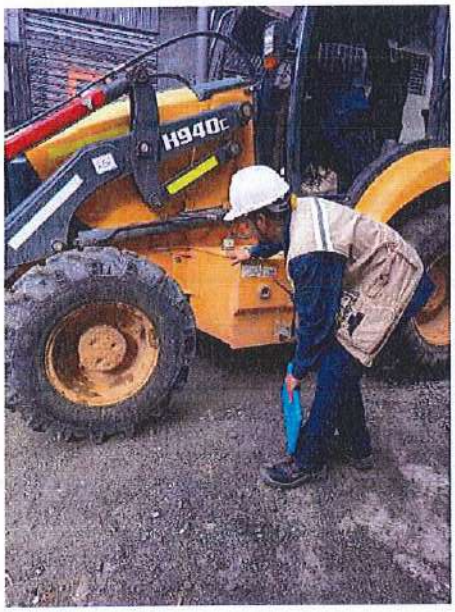





FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA






FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR








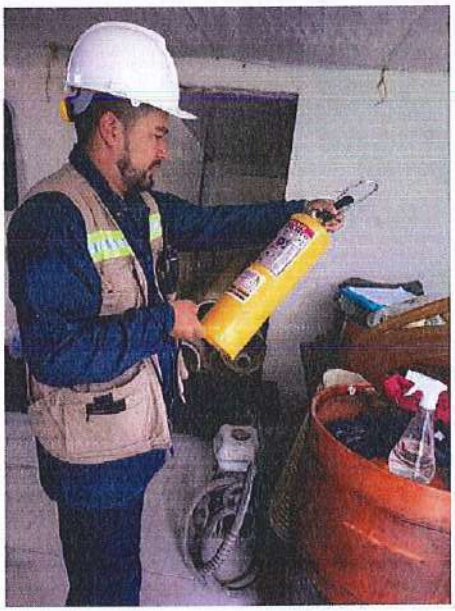

FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA EXTINTORES



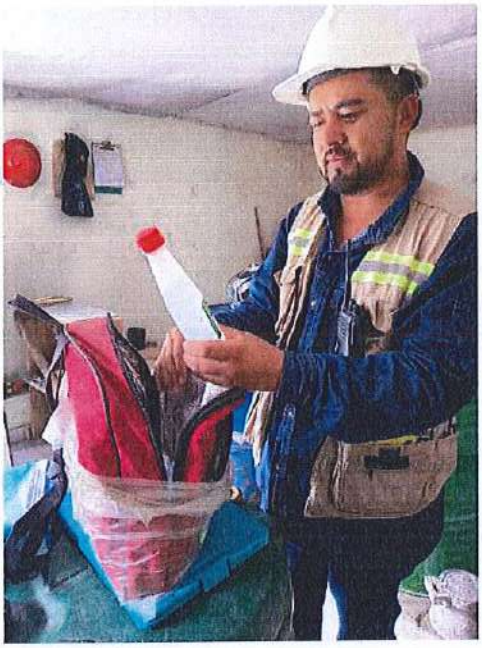





FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA BOTIQUINES












FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA CAMILLA

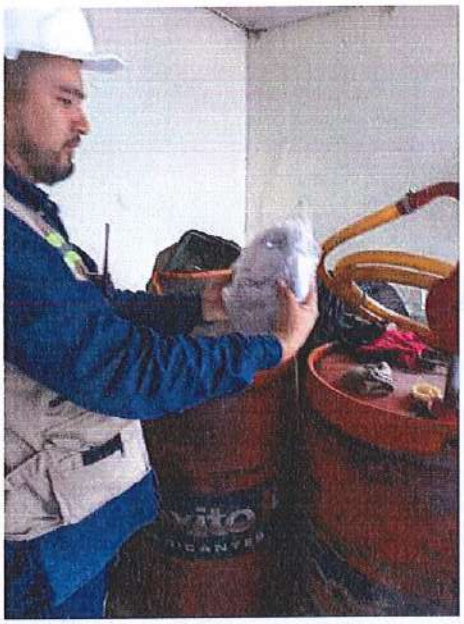

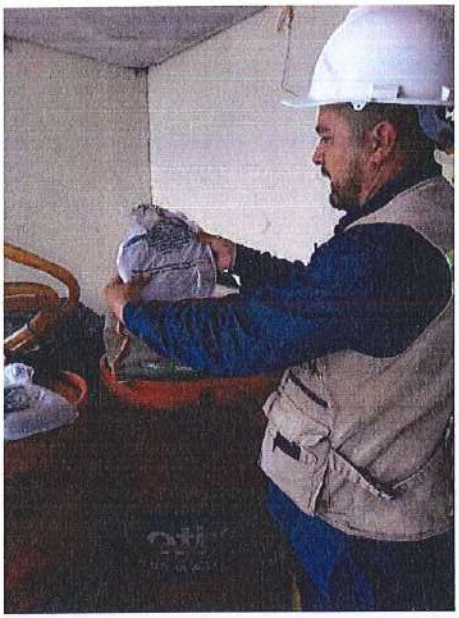




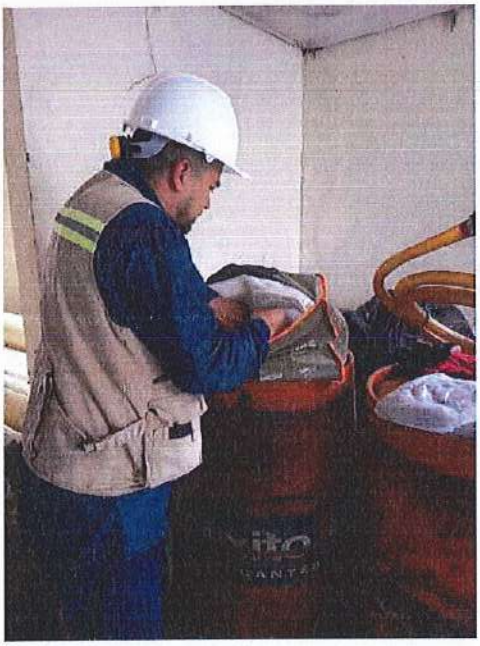

FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA KID DERRAME



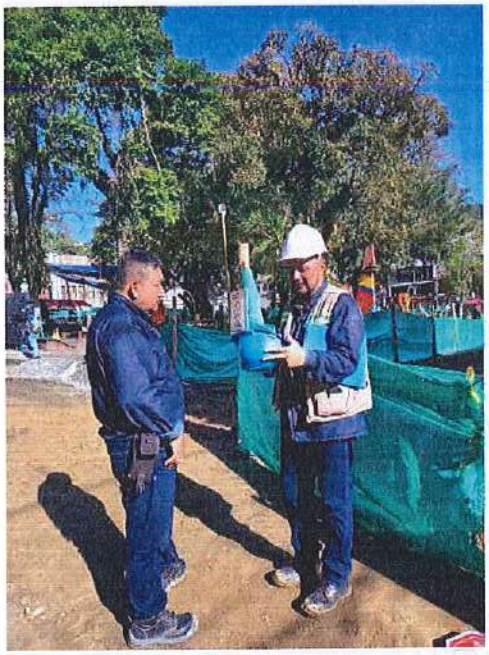

FOTOS INSPECCIONES DE EPP









FOTOS INSPECCIONES DE EPP

1.2 PERMISOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"

El análisis de trabajo seguro es un proceso sistemático que consiste en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, previo al inicio de la ejecución de la labor y en la cual se establecen los controles que permita mitigar los riesgos, en la actividad de elaboración del ATS participan todos los trabajadores que ejecutaran la actividad. El análisis de trabajo seguro, permite generar unas condiciones de trabajo adecuadas para la ejecución de las actividades de forma segura.

Todas las actividades ejecución cuentan con la identificación de peligros y valoración de riesgos, lo cual se encuentra documentado y publicado en el punto de trabajo, como también fue divulgado a los trabajadores que desarrollaron la actividad. Para el diligenciamiento del ATS deben participar todos los involucrados en la actividad.

Para el periodo del presente informe se realizaron los siguientes ATS: 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025.


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	NUMERO
TOPÓGRAFO Y CADENERO	3
OPERADORES DE MAQUINARIA	3
CONTROLADORA DE TRAFICO	3
ALMACENISTA	3
EXCAVACION MANUAL	3
EXCAVACION MAQUINARIA	1
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	1
CAJEO DE PAVIMENTO EXISTENTE	2
INSTALACION DE BASE GRANULAR Y/O CEREO	2
FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO	3
DEMOLICION	1
LEVANTAMIENTO DE MURO	1
CORTE Y ENDERZADO DE HIERRO	3


PERMISOS DE TRABAJO

Para la empresa se definen como trabajo de alto riesgo, aquellos con potencial de causar accidentes con consecuencias graves o fatales los cuales deben ser controlados por medio del Permiso de Trabajo

para garantizar que se tomen todas las medidas de control y se identifiquen todos los riesgos potenciales. El trabajo de Alto Riesgo definido por la empresa para el periodo del presente informe es:

Anexo 2. Análisis Seguro de Trabajo

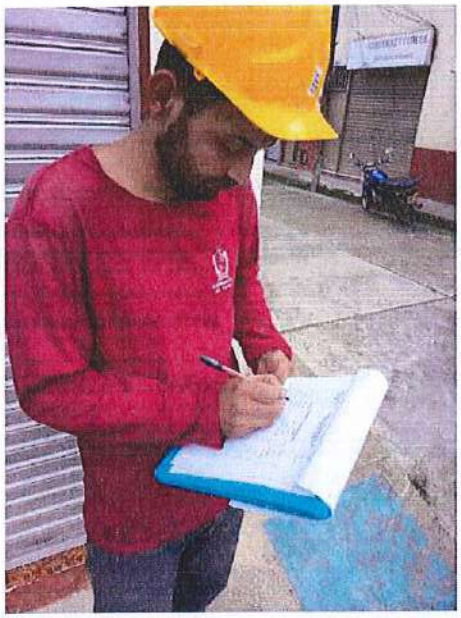


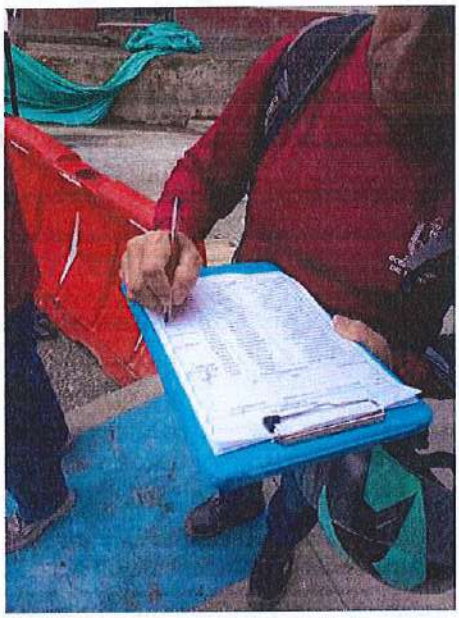







FOTOS. DIVULGACIÓN Y FIRMA DE ATS Y PREOPERACIONALES

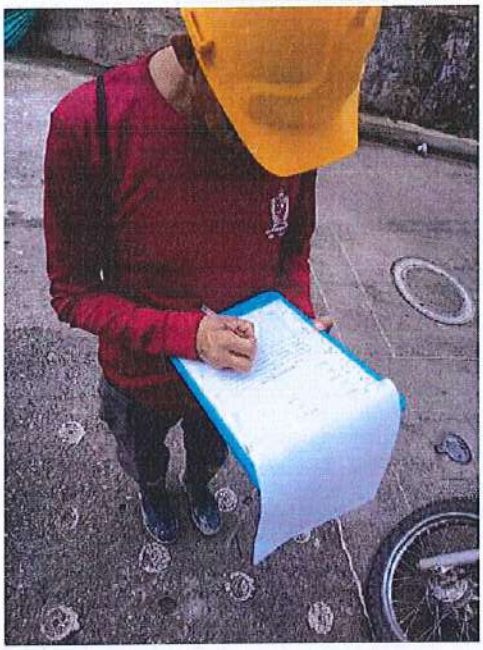

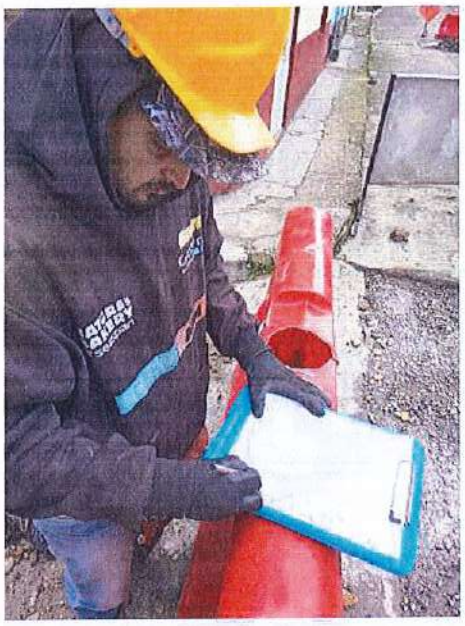

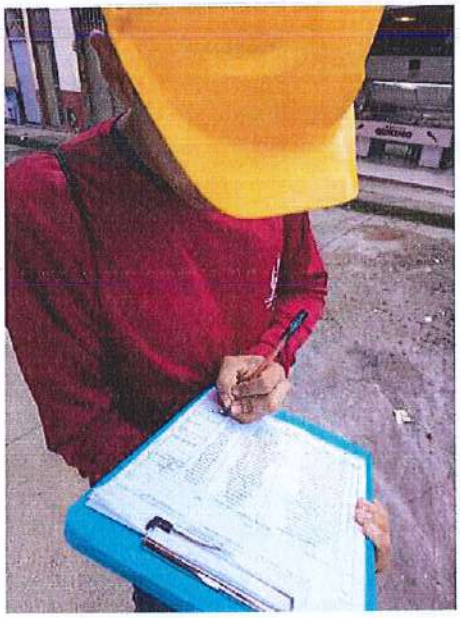



FOTOS. DIVULGACIÓN Y FIRMA DE ATS Y PREOPERACIONALES

1.3 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Con el objetivo de promover la actividad física, como habito de vida saludable, adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral, de los colaboradores del proyecto.

Por lo anterior se llevaron a cabo jornadas de pausas activas y jornada de hábitos y vida saludables.

Actividades realizadas

- Documentación completa del Personal

  Ver anexo 4. Hojas De Vida Con Todos Los Soportes

- Inducción al Personal: La inducción es un requisito de cumplimiento obligatorio para cada colaborador y/o trabajador.

MEDICINA PREVENTIVA

Al ingresar el colaborador se realiza la entrega de la primera dotación la cual consta de: 2 camisas, 2 pantalones y botas de seguridad, esta va acompañada de los elementos de protección como casco, gafas, tapa bocas, tapa oídos, guantes y capuchón.

La inducción es un requisito de cumplimiento obligatorio para cada colaborador y/o trabajador que ingresa, proceso que se realiza previo al inicio de sus labores en las instalaciones, terrenos y proyectos de las empresas; es también requisito para el inicio de labores de todo el personal que desarrolla labores de representación de la empresa y de los contratistas.

A continuación, se da a conocer el temario de la inducción y reinducción:

TEMAS TRATADOS

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa RICARDO ORTIGOZA GONZÁLEZ.

- ✓ Reglamento Interno de Trabajo
- ✓ Política SG – SST
- ✓ Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- ✓ Objetivos y metas SG – SST
- ✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- ✓ Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- ✓ Funcionamiento del COPASST
- ✓ Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- ✓ Funcionamiento del plan de emergencias
- ✓ Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que con lleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Ver anexo 5 Formato De Inducción

A continuación, se registran las inducciones que se realizaron durante el periodo del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025. Del presente informe:

INDUCCION Y REINDUCCION		
NUMERO DE PERSONAS NUEVAS	NUMERO DE PERSONAS NUEVAS	EMPRESA
0	0	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
0	0	PAVETOL









FOTOS 89 Y 90. INDUCCIÓN PERSONAL

Se presenta la relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por el Consorcio Vías Fresno 2025 el presente informe del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025						
No	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA DE SALIDA
1	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	Director de Obra	Profesional	4/06/2025	
2	DIEGO ALEJANDRO REYES AFANADOR	1.152.686.000	Residente de obra	Profesional	15/04/2025	
3	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	Especialista en Pavimento	Profesional	15/04/2025	
4	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	79.893.182	profesional Ambiental	Profesional	4/06/2025	
5	JUAN DAVID MOYA	3.192.972	Especialista en Geotecnia	Administrativo	4/06/2025	
6	ANGELA JOHANA VANEGAS	28.554.915	Ing. Auxiliar Ambiental	Administrativo	4/06/2025	
7	GLORIA ASTRID LOPEZ SÁNCHEZ	65.753.684	Coord. sst	Profesional	29/08/2025	
8	LUIS ENRIQUE GARAY MORENO	14.241.018	Topógrafo	Profesional	29/08/2025	20/12/2025
9	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	19.493.330	Topógrafo	Profesional	29/08/2025	20/12/2025
10	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	1.010.155.509	Auxiliar sst	Profesional	9/09/2025	20/12/2025
11	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	80.142.451	Almacenista	Administrativo	29/08/2025	20/12/2025
12	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	93.387.024	Maestro de obra	Administrativo	8/08/2025	20/12/2025
13	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	73.374.130	Oficial de obra	Operativo	8/08/2025	01/10/2025
14	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	14.239.870	Oficial de obra	Operativo	10/09/2025	20/12/2025
15	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	14.136.568	Oficial de obra	Operativo	30/08/2025	20/12/2025
16	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	1.007.701.398	Operador de Maquinaria	Operativo	30/08/2025	20/12/2025
17	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	1.005.718.608	Operador de Maquinaria	Operativo	30/08/2025	20/12/2025
18	JHON JAIRO CASTAÑEDA	1.2119.612	Operador de Maquinaria	Operativo	30/08/2025	20/12/2025
19	ROBERTO ROJAS FONSECA	1.077.966.705	Ayudante de obra	Operativo	8/08/2025	20/12/2025
20	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	1.109.299.309	Ayudante de obra	Operativo	4/09/2025	20/12/2025
21	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	1.109.297.236	Ayudante de obra	Operativo	5/09/2025	20/12/2025
22	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	79.874.895	Ayudante de obra	Operativo	4/09/2025	20/12/2025
23	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	93.062.072	Ayudante de obra	Operativo	8/08/2025	20/12/2025
24	SIMEON LUENGAS DIAZ	80.010.397	Ayudante de obra	Operativo	8/08/2025	20/12/2025
25	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	93.062.402	Ayudante de obra	Operativo	4/08/2025	20/12/2025
26	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	1.121.844.831	Controladora de Trafico	Operativo	29/08/2025	20/12/2025
27	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	65.816.440	Controladora de Trafico	Operativo	7/09/2025	20/12/2025
28	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	65.814.357	Controladora de Trafico	Operativo	4/09/2025	15/11/2025
29	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	65.814.456	Controladora de Trafico	Operativo	29/08/2025	20/12/2025
30	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	93.416.082	Vigilante	Operativo	5/09/2025	20/12/2025
31	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	1.109.301.613	Ayudante de obra	Operativo	17/09/2025	20/12/2025
32	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	1.006.023.224	Ayudante de obra	Operativo	17/09/2025	20/12/2025
33	JAMES IVAN GARCIA MARTINEZ	1.109.293.109	Ayudante de obra	Operativo	16/09/2025	20/12/2025
34	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	1.002.866.252	Ayudante de obra	Operativo	17/09/2025	20/12/2025
35	ANDRES FLIPE JARAMILLO FRANCO	1.109.301.165	Ayudante de obra	Operativo	14/10/2025	20/12/2025
36	IRIS ESTAFNNY LOPEZ CORREA	1.109.293.195	Ayudante de obra	Operativo	02/10/2025	15/11/2025
37	GILBERTO LOTERO RIOS	93.416.846	Controladora de Trafico	Operativo	29/09/2025	20/12/2025
38	ANCIZAR ROCHA LOZANO	93.083.941	Operador de Maquinaria	Operativo	12/11/2025	20/12/2025

Se presenta la relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por Sub-Contratista del Consorcio Vías Fresno 2025 el presente informe del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025.

PAVETOL						
No	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA DE SALIDA
1	JUAN CARLOS CARDENAS HERAZO	1.127.949.376	MAESTRO DE OBRA	Operativo	02/07/2025	20/12/2025
2	YORYIS JOSE CARDENAS HERAZO	1.127.955.792	OFICIAL	Operativo	1/08/2025	20/12/2025
3	JHON JAIRO TOVAR BARRIOS	93.456.878	OFICIAL	Operativo	14/10/2025	20/12/2025
4	JOHAN DANIEL ARIAS CUBILLOS	1.025.530.221	AYUDANTE	Operativo	14/10/2025	20/12/2025
5	JUNIOR VALENTIN CARLO MARTINEZ	X6157421	AYUDANTE	Operativo	14/10/2025	20/12/2025
6	JUEVENAL ANTONIO CUADRIS MANJARRES	1.052.080.754	AYUDANTE	Operativo	14/10/2025	23/10/2025
7	IVAN ANDRES PATIÑO	1.110.573.896	AYUDANTE	Operativo	14/10/2025	15/11/2025
8	ERICK DARIO PEREZ MIJARES	6157686	AYUDANTE	Operativo	14/10/2025	20/12/2025
9	YORMAN LEONARDO MESA MARTINEZ	1.109.291.518	AYUDANTE	Operativo	08/11/2025	20/12/2025
10	CESAR WILLIAM MUÑOZ QUINTERO	93.420.354	OFICIAL	Operativo	13/11/2025	20/12/2025
11	JUAN ESTEBAN NARANJO JARAMILLO	1.074.809.517	AYUDANTE	Operativo	13/11/2025	20/12/2025
12	LUIS FERNANDO ROJAS RUBIO	1.234.639.149	OFICIAL	Operativo	08/11/2025	20/12/2025

1.4 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD.

1.4.1 CAPACITACIÓN SST

Tiene como propositito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar la salud, el autocuidado y prevenir la enfermedad y los riesgos. Sin embargo, más allá de esto, se busca estimular el interés de todos sobre los beneficios de aplicar el sistema de gestión, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de los empleados para identificar y reportar factores de riesgos presentes en su labor.

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	PERSONAL PROGRAMADO	PERSONAL CAPACITADO	TIEMPO CAPACITACION
01/12/2025	IMPORTANCIA DE CONTROLADOR EN ACTIVIDADES ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	24	15	40MM
12/12/2025	MANEJO ADECUADO VOCABULARIO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO	24	19	40MM
16/12/2025	HIGIENE POSTURAL EN EL PUNTO DE TRABAJO	24	20	60MM

Anexo 6 Registro de Capacitación
Anexo 8 Exámenes médicos N/A









FOTOS. CAPACITACIÓN SST


1.4.2 CHARLAS DE SEGURIDAD

Charlas de seguridad del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025.

FECHA	TEMA DE CHARLA
1/12/2025	INTRODUCCION A LOS PELIGROS EN OBRAS VIALES
2/12/2025	PELIGROS POR MAQUINARIA PESADA
3/12/2025	RIESGO POR TRANSITO VEHICULAR EXTERNO
4/12/2025	TERRENOS INESTABLES Y SOCAVACIONES
5/12/2025	RIESGO POR TRABAJO EN COLATE
7/12/2025	RUIDOS Y UBICACIONES
9/12/2025	RIESGO QUIMICO
10/12/2025	EXPOSICIÓN AL POLVO Y MATERIAL ARTICULADO
11/12/2025	PELIGROS POR MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS
12/12/2025	RIESGO EN EXCAVACION Y ZANJAS
14/12/2025	CONDICIONESCLIMATICAS ADVERSAS
15/12/2025	SEÑALIZACION VIAL EN OBRA
16/12/2025	CONTROL DE TRAFICO INTERNO
17/12/2025	USO CORRECTO DE EPP EN OBRA
18/12/2025	PROCEDIMIENTO SEGURO DE EXCAVACÓN Y RELLENO
19/12/2025	GESTION DEL RIESGO EN TRABAJOS EN ALTURAS EN VIAS
20/12/2025	PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN OBRAS VIALES

Anexo 7. Registro de Asistencia charlas



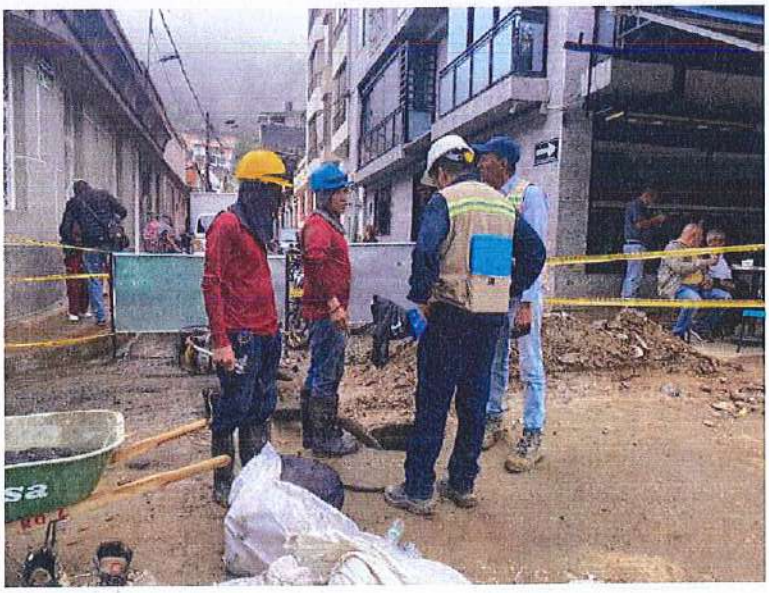

FOTOS 97 Y 98. CHARLAS DE SEGURIDAD

- Exámenes Médicos

  Ver anexo 8. Exámenes Médicos

- Ausentismo laboral

  Ver anexo 9. Ausentismo laboral N/A

- Seguridad social


  Ver anexo 10 seguridad social

1.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Con el objetivo de promover la actividad física, como habito de vida saludable, adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral, de los colaboradores del proyecto.

Por lo anterior se llevaron a cabo jornadas de pausas activas y jornada de hábitos y vida saludables.




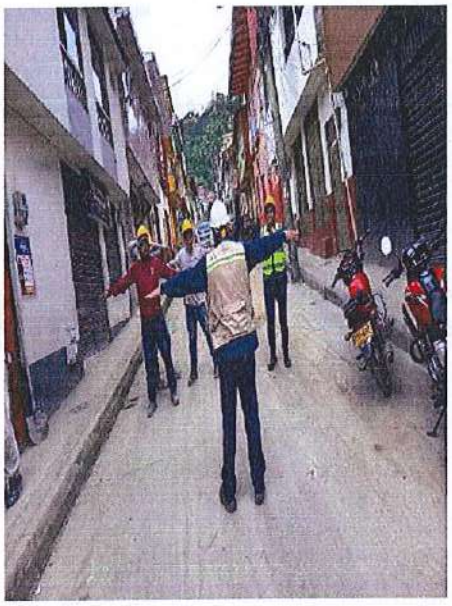



FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE



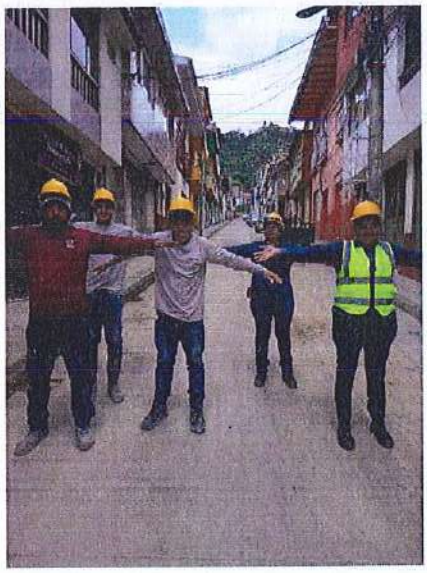


FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

1.6 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Al ingresar el colaborador se realiza la entrega de la primera dotación la cual consta de: 2 camisas, 2 pantalones y botas de seguridad, esta va acompañada del elemento de protección como casco, gafas, tapa bocas, tapa oídos, guantes y capuchón.

Identificar y solventar en La empresa Ricardo Ortigoza la necesidad de protección personal para el control de los riesgos en los que la eliminación, sustitución, control de ingeniería y controles administrativos no son suficientes o no son posibles, mediante el suministro, uso y reposición de elementos de protección personal (EPP). Establecer los parámetros para la identificación, selección, control, mantenimiento entrega, uso y disposición de los elementos de protección personal (EPP).

En el ***Anexo 11*** se deja constancia de los soportes de entrega de Dotación y EPPP

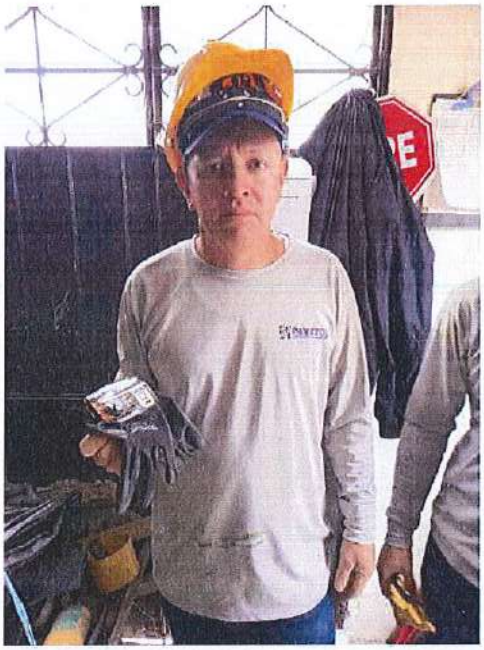









FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN





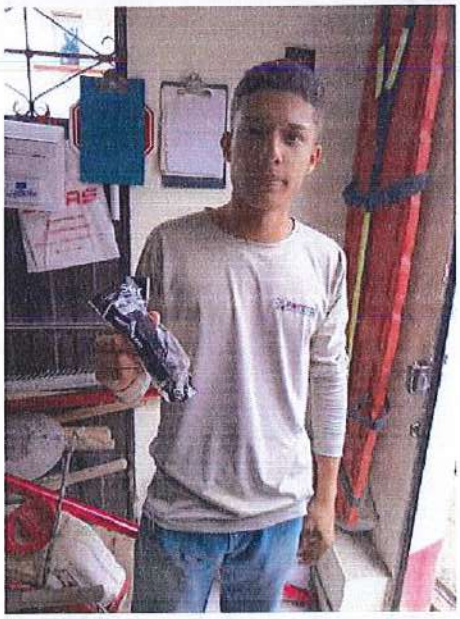

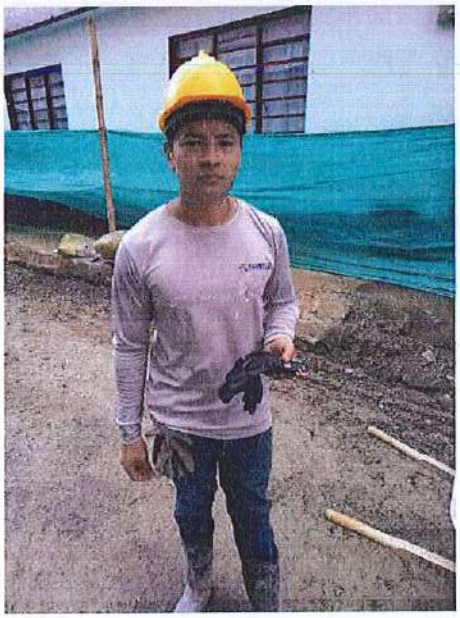

FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN







FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN

1.7 SEÑALIZACIÓN

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan:

- ✓ Atraer la atención de quien la observa.
- ✓ Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad.
- ✓ Informar sobre la conducta a seguir.
- ✓ Ser clara y de interpretación única.
- ✓ Debe ser fácil de recordar.

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto preventivo; la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos:

- ✓ Cuando no es posible eliminar el riesgo
- ✓ Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.)
- ✓ Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección

Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de seguridad y protección personal.






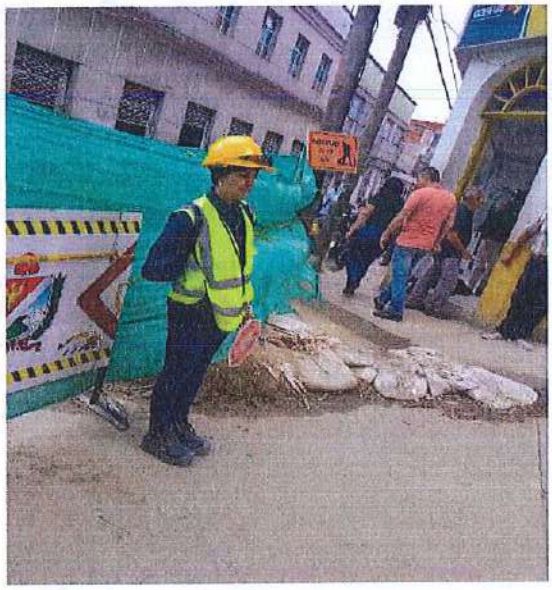


FOTO 14. PUNTO DE CONTROL VIAL.








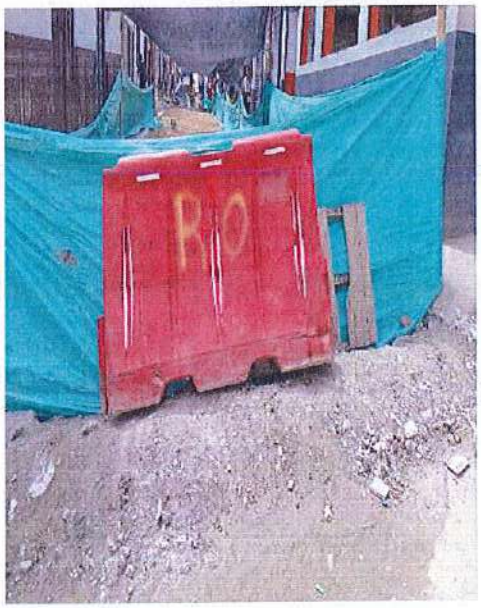

FOTOS. SEÑALIZACIÓN EN OBRA

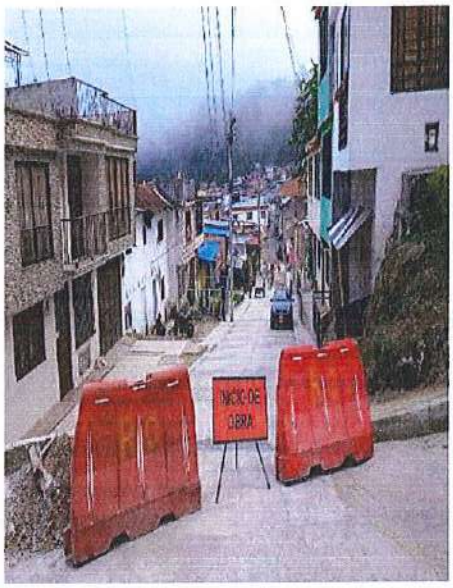





FOTOS. SEÑALIZACIÓN EN OBRA

1.8 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL.

El reporte, investigación y análisis de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que se llegasen a presentaren el proyecto, con el fin de identificar las causas básicas e inmediatas y demás

hechos o situaciones que lo han generado, para implementar las acciones correctivas encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar futuros eventos del mismo tipo dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1401 de 2007 y a la resolución 2851 del 2015.

ACCIDENTE DE TRABAJO. Accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

FECHA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	ESTADO DE LA INVESTIGACION
NA	NA.	NA

INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente

FECHA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	ESTADO DE LA INVESTIGACION
NA	NA.	NA

1.9 VERIFICACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

Todos los días se verifico y actualizo el personal que se encuentra activo en obra. Con el fin de llevar un registro controlado, ya que en caso de emergencia podamos identificar y hacer un reconocimiento exacto del número de trabajadores.

1.10 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y CONSULTA

Se hizo reconocimiento a los trabajadores que durante el primer trimestre en desarrollo del proyecto se destacaron por su buen desempeño y compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

1.11 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1989, la Resolución 1401 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 del 2015, se llevó a cabo las actividades que se deben cumplir para la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST; desde la convocatoria para elección, designación del presidente y secretario del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y su puesta en marcha del comité para el periodo comprendido desde de duración del proyecto.

De la misma manera se procedió al cumplimiento de la Ley 1010 de 2006, Ley 1562 de 2012, la Resolución 652 de 2012 y la Resolución 1356 de 2012 para la conformación del Comité de Convivencia Laboral.

Según la Resolución 2646 de 2008, se hace como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos sicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

Anexo 12. Actas de Reunión del COPASST





FOTOS 129. REUNIÓN DEL COPASST

1.1 PLAN DE EMERGENCIAS

Se actualiza el plan de emergencias y se lleva a cabo la instalación de la señalización indicada de acuerdo al plan en el proyecto.

PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Sistema de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objetivo la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.







FOTOS IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA

Actividades realizadas


- Ninguna

Orden y aseo





FOTOS 129. ORDEN Y ASEO

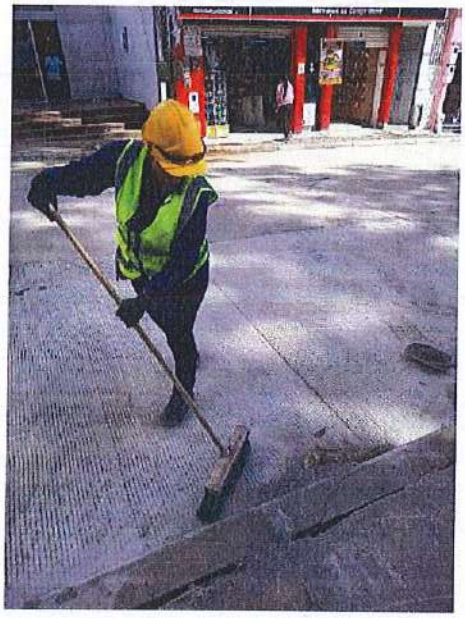





FOTOS. ORDEN Y ASEO

ANEXOS
