IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-224-2012 - ELECTRIFICACION VEREDAS ALEJANDRIA, LA LAGUNA, LA LIBERTAD Y SANTA RITA

Objeto:

ELECTRIFICACION VEREDAS ALEJANDRIA, LA LAGUNA, LA LIBERTAD Y SANTA RITA

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Faer
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

Días:	0
Desde:	31 de diciembre de 2014
Hasta:	31 de diciembre de 2014

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	109
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	109
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	109

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio
Cesar, El Copey
Tipo Origen
Municipal

Latitud	10,1505556
Longitud	-73,965
Dirección	
Cesar - El Copey	

VALORES DEL PROYECTO

Valor global	$ 1.693.701.906,00
Valor del proyecto	$ 1.693.701.906,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	$ 1.693.701.906,00
Valor por ejecutar	$ 0,00

AVANCE DEL PROYECTO

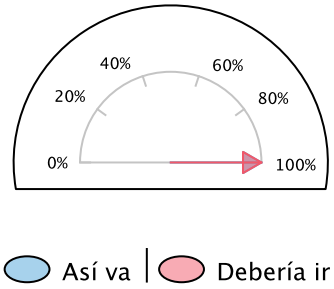

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Número Contrato:	GGC-224-2012
Contrato:	GGC-224-2012
Objeto del Contrato:	AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER.
Fecha Inicio:	28/12/2012
Fecha Fin:	27/12/2032
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	$ 9.866.476.543,00
Valor asociado:	$ 1.693.701.906,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

TIPO DE CONTRATO: COOPERACION	
Número Contrato:	GGC-517-2020
Contrato:	GGC-517-2020
Objeto del Contrato:	TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Fecha Inicio:	1/10/2020
Fecha Fin:	30/09/2040
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	$ 0,00
Valor asociado:	$ 0,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

EJECUTADO

Fecha	%Total

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
