IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-223-2012 - CONSTRUCCION LINEA 34.5 KV FUNDACION-FLORES DE MARIA 54 KM, DE LA SUBESTACION FLORES DE MARIA 5 MVA

Objeto:

"CONSTRUCCION LINEA 34.5 KV FUNDACION-FLORES DE MARIA 54 KM, DE LA SUBESTACION FLORES DE MARIA 5 MVA"

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Faer
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

Días:	733
Desde:	28 de diciembre de 2012
Hasta:	31 de diciembre de 2014

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	1586
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	1586
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	1586

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio
Magdalena, Sabanas de San Angel
Tipo Origen
Municipal

Latitud	10,0321716
Longitud	-74,2154575
Dirección	
Magdalena - Sabanas De San Angel	

VALORES DEL PROYECTO

Valor global	$ 7.000.112.490,00
Valor del proyecto	$ 7.000.112.490,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	$ 700.011.249,00
Valor por ejecutar	$ 6.300.101.241,00

AVANCE DEL PROYECTO

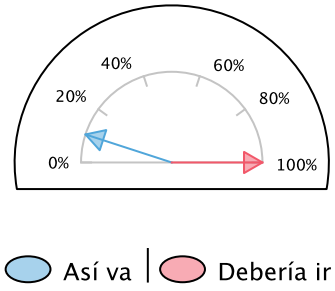

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Número Contrato:	GGC-223-2012
Contrato:	GGC-223-2012
Objeto del Contrato:	AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER
Fecha Inicio:	28/12/2012
Fecha Fin:	27/12/2032
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	$ 13.972.099.317,00
Valor asociado:	$ 7.000.112.490,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

EJECUTADO		PROGRAMACION INICIAL	
Fecha	%Total	Fecha	%Total
