IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GSA-161-2012 - CONSTRUCCION DE LA LINEA 34,5KV RIO SINU-CANALETE Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION CANALETE

Objeto:

CONSTRUCCION DE LA LINEA 34,5KV RIO SINU-CANALETE Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION CANALETE

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Faer
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

Días:	790
Desde:	1 de noviembre de 2012
Hasta:	31 de diciembre de 2014

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	3499
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	3499
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	3499

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio
Córdoba, Canalete
Tipo Origen
Municipal

Latitud	8,6761111
Longitud	-76,2041667
Dirección	
Córdoba - Canalete	

VALORES DEL PROYECTO

Valor global	$ 5.601.185.795,00
Valor del proyecto	$ 5.601.185.795,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	$ 5.601.185.795,00
Valor por ejecutar	$ 0,00

AVANCE DEL PROYECTO

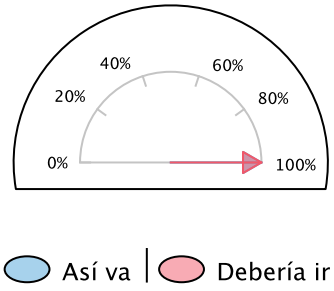

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Número Contrato:	GSA-161-2012
Contrato:	GSA-161-2012
Objeto del Contrato:	AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE RED.
Fecha Inicio:	1/11/2012
Fecha Fin:	24/10/2032
Duración (Días):	7297
Valor contrato:	$ 18.202.901.239,00
Valor asociado:	$ 5.601.185.795,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

EJECUTADO

Fecha	%Total

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
