IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ZARAGOZA, NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL, BETANIA, DOS QUEBRADAS, REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGU

Objeto:

1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ZARAGOZA, NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL, BETANIA, DOS QUEBRADAS, REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGUI, LA CONCHA, CONCEPCIO

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Fazni
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

Días:	706
Desde:	23 de enero de 2014
Hasta:	30 de diciembre de 2015

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	2034
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	2034
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	2034

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio
Cauca, López de Micay
Tipo Origen
Municipal

Latitud	2,959325
Longitud	-77,2423628
Dirección	
Cauca - López de Micay	

VALORES DEL PROYECTO

Valor global	$ 7.933.000.257,00
Valor del proyecto	$ 7.933.000.257,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	$ 7.933.000.257,00
Valor por ejecutar	$ 0,00

AVANCE DEL PROYECTO

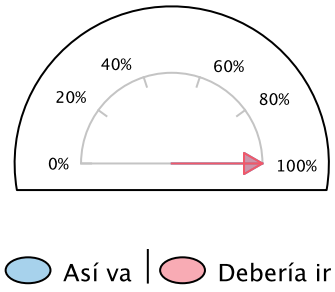

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	
Número Contrato:	GGC-199-2013
Contrato:	GGC-199-2013
Objeto del Contrato:	AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS- ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA ENERGIZACIÓN DE ZONAS NO INTERCONECTADAS- FAZNI.
Fecha Inicio:	23/12/2013
Fecha Fin:	31/07/2014
Duración (Días):	220
Valor contrato:	$ 9.698.611.167,00
Valor asociado:	$ 7.933.000.257,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

EJECUTADO

Fecha	%Total

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
