CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER



INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 04
PERIODO DE EJECUCIÓN:
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATISTA
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
2026

1. INTRODUCCIÓN

Los sectores ribereños y de ladera de Floridablanca presentan alta susceptibilidad a la erosión, socavación y movimientos en masa, debido a las características geológicas del terreno, la presencia de materiales poco consolidados y la expansión urbana hacia zonas frágiles. Estas condiciones han generado afectaciones en taludes, deterioro de la infraestructura y riesgo continuo para la comunidad.

En cumplimiento de la Acción Popular 2020-00080-00, el municipio ha priorizado intervenciones para la mitigación del riesgo en puntos críticos. En el sector Lagos II, la margen derecha del rio Frio evidencia procesos de socavación que comprometen la estabilidad del cauce, por lo que se proyecta la construcción de estructuras en gaviones para controlar la erosión y recuperar el borde ribereño. De manera complementaria, en el barrio Los Arrayanes se implementará una pantalla con anclajes activos destinada a estabilizar el talud y prevenir desplazamientos del terreno.

Asimismo, se atenderán los sectores criticos de Santa Ana, Prados del Sur y aledaños, donde la erosión ha debilitado taludes cercanos a vías principales, generando riesgo de desprendimientos que afectan la movilidad y la seguridad vial. En esta zona se ejecutará una pantalla pasiva de anclajes para reforzar el talud y garantizar la protección del corredor vial.

Estas obras buscan reducir los riesgos asociados a la erosión y la inestabilidad de taludes, mejorar la seguridad de la población y contribuir a la consolidación de áreas urbanas vulnerables, en concordancia con los lineamientos de gestión del riesgo y el compromiso institucional del municipio.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1. Objetivos específicos 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3.1. Frente Lagos II 5
3.2. Frente Arrayanes 6
3.3. Frente Santa Ana 7
3.4. Frente Prados del Sur 8
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 9
4.1. Información general del contrato 9
4.2. Relación de actas del contratista 10
4.3. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto 10
4.4. Cuadro de control de pólizas 10
5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA 11
5.1. Relación de personal en obra 11
5.2. Relación de equipo utilizado. 15
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 19
6.1. Actividades de tipo técnico frente LAGOS II 19
6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra. 20
6.1.2. Excavación mecánica bajo agua 21
6.1.3. Excavación en roca bajo agua 22
6.1.4. Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000 m 23
6.1.5. Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de río 24
6.1.6. Suministro y colocación de concreto ciclópeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi y colocación de acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 25
6.1.7. Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm 26
6.1.8. Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00 27
6.1.9. Cantidades de obra ejecutadas 28

6.2. Actividades de tipo técnico Frente ARRAYANES 30
6.2.1. Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes 31
6.2.2. Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m 32
6.2.3. Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 20,00m 33
6.2.4. Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración 34
6.2.5. Cantidades de obra ejecutadas 35

6.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 37
6.3.1. Relación de actas. 37
6.3.2. Bitácora de obra 37
6.3.3. Afiliación seguridad social 37
6.3.4. Seguimiento y control 37

6.4. Actividades tipo financiero 38
6.4.1. Variaciones financieras 38
6.4.2. Relación de pagos efectuados 38

6.5. Actividades de aseguramiento de la calidad 38

6.6. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST) 38

6.7. Actividades componente socioambiental 39

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 40

8. ANEXOS. 41

2. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra, consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 210.16224.6, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", durante el periodo establecido entre el 1 y 28 de febrero de 2026.

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo, técnico y climatológico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.

2.1. Objetivos específicos


- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.
- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y económico del contrato.
- Mostrar el avance financiero del proyecto en relación con lo programado en el plan inicial, evidenciando la ejecución presupuestal.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato contempla cuatro frentes de obra, correspondientes a los sectores de Lagos II, Arrayanes, Santa Ana y Prados del Sur. A continuación, se presenta la ubicación específica de cada uno de ellos.


3.1. Frente Lagos II

Este frente de obra se localiza en el Barrio Lagos II, en el municipio de Floridablanca, Santander, específicamente sobre la calle 48 entre las carreras 5 y 6. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°04'00.9"N, 73°05'44.5"W.

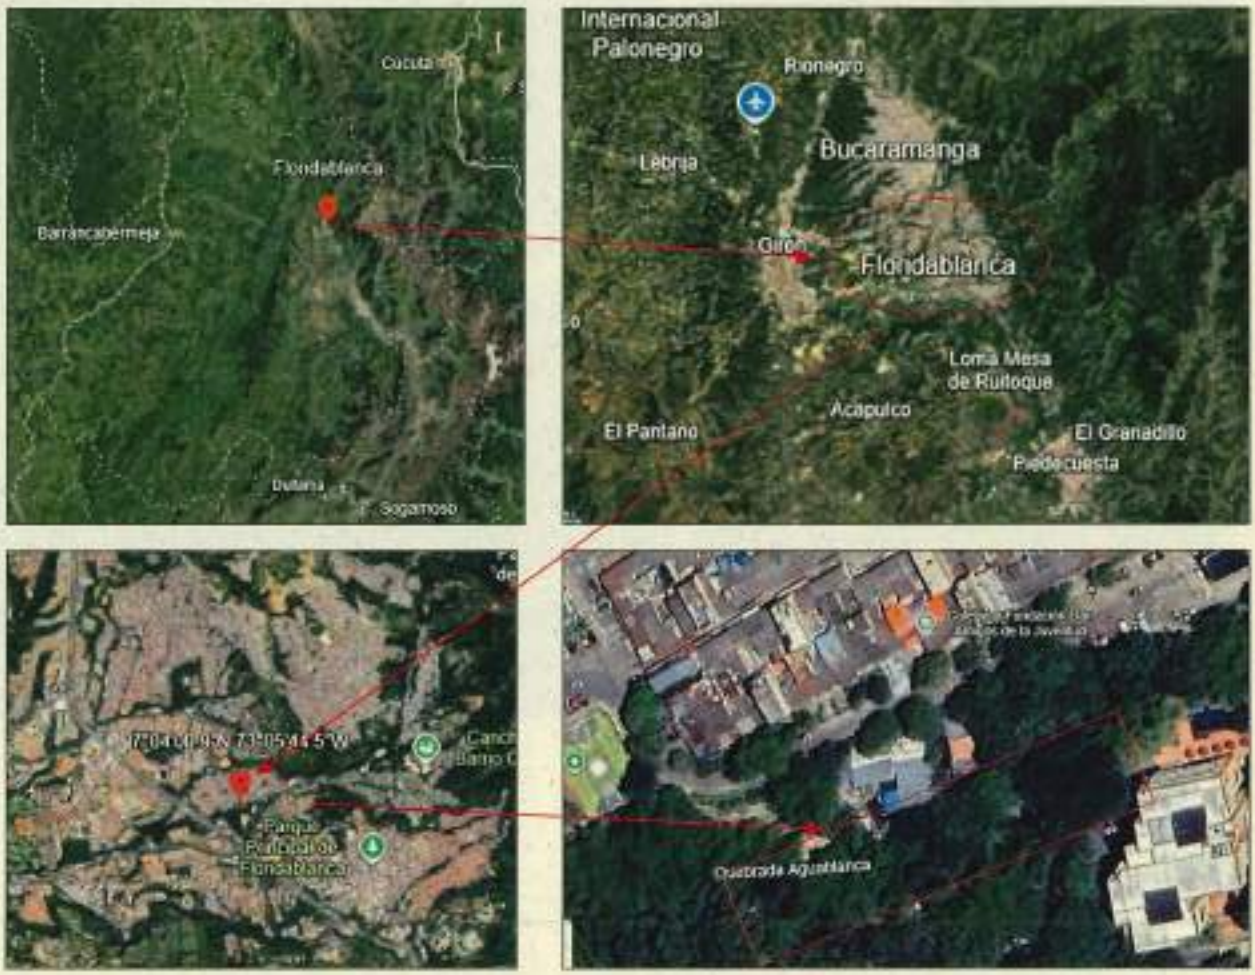

3.2. Frente Arrayanes

Este frente de obra se encuentra en el Barrio Arrayanes, en el municipio de Floridablanca, Santander, sobre la calle 103 entre las carreras 54 y 55. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°05'42.1"N, 73°05'28.6"W.

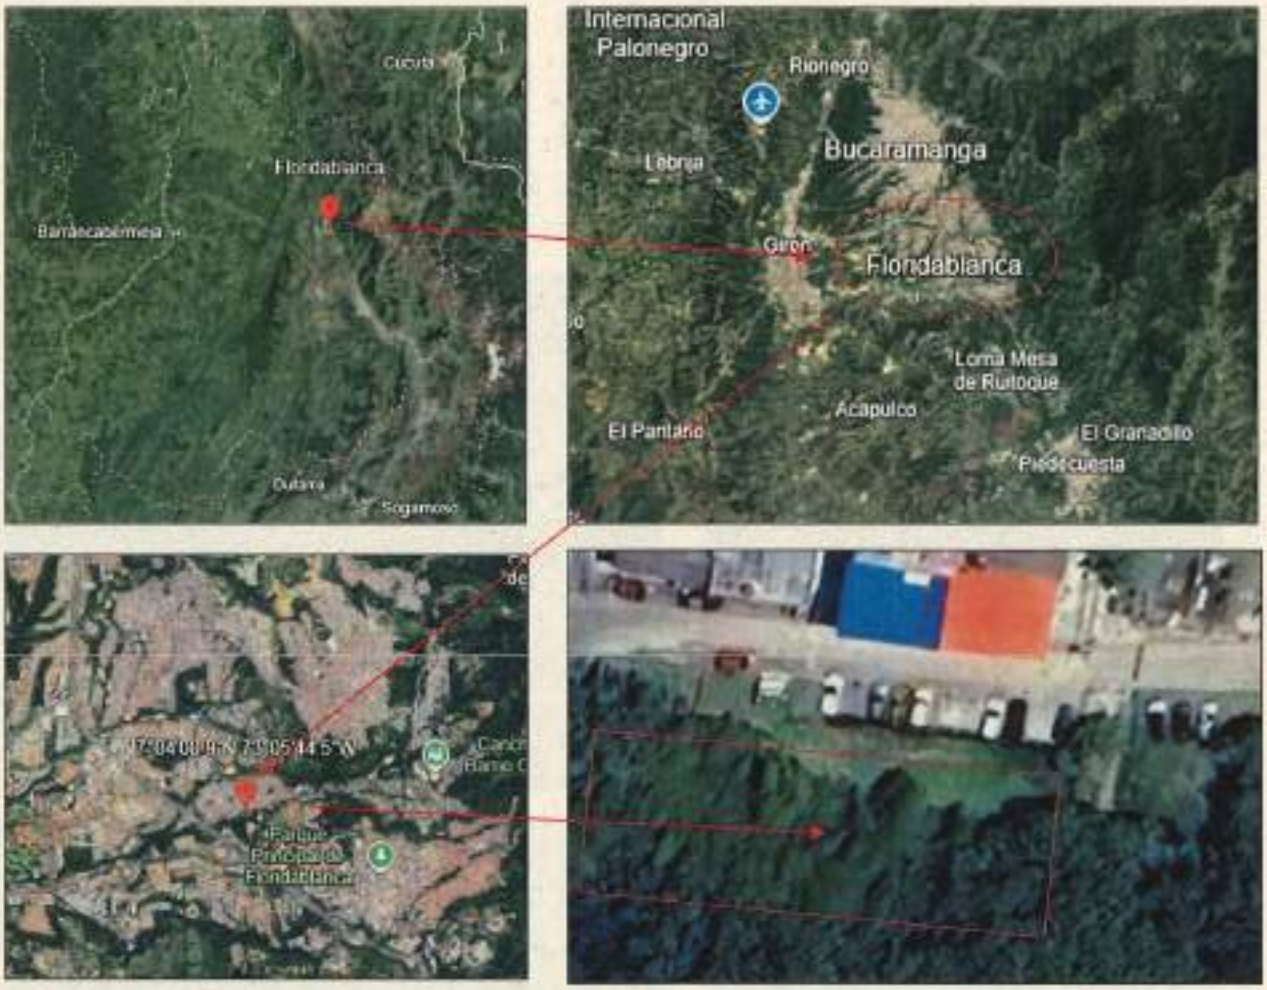


3.3. Frente Santa Ana

Este frente de obra se localiza en el Barrio Santa Ana, en el municipio de Floridablanca, Santander, aproximadamente sobre la calle 11 con carrera 5. La ubicación corresponde a las coordenadas 7°04'48.1"N, 73°05'52.9"W.



3.4. Frente Prados del Sur

Este frente de obra se encuentra en el Barrio Prados del Sur, en el municipio de Floridablanca, Santander, específicamente en el sector de la carrera 43 con calle 46. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°04'42.8"N, 73°05'46.5"W.

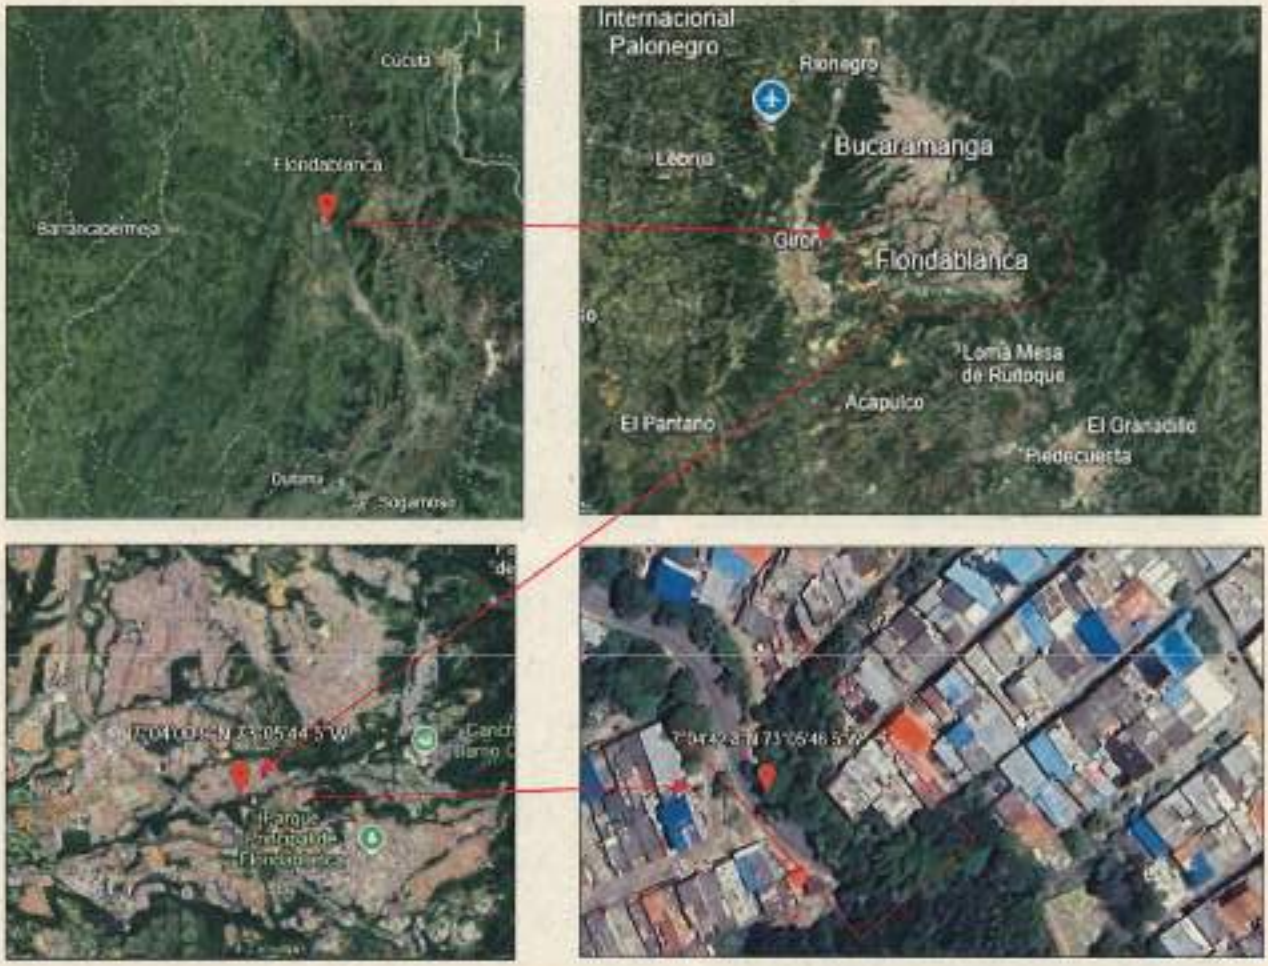

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. Información general del contrato

Para contextualizar el alcance del proyecto y las responsabilidades contractuales asumidas; a continuación, se presenta la información general del contrato de obra. Esta sección consolida los datos esenciales relacionados con la identificación del contrato, su objeto, la entidad contratante y el contratista, proporcionando un marco claro sobre el alcance técnico del contrato, el recurso económico asignado y la temporalidad de este.

Tabla 1. Información contractual.

Información General del Contrato de Obra	
Contrato De Obra	210.16224.6
Objeto Del Contrato	Construcción de obras para el control de la erosión y mitigación del riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, así como el control de la erosión y socavación de la margen derecha aguas abajo del rio frio en el sector Lagos II, en cumplimiento de la acción popular con radicado 2020-00080 00, para la consolidación de los mismos, municipio de Floridablanca departamento de Santander.
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional para la Defensa De La Meseta de Bucaramanga, CDMB.
Contratista	Consorcio Estabilización Floridablanca.
Representante Legal	Edgar Leonardo Gómez.
Nit Contratista	901.982.775-0
Interventoría	Unión Temporal Inter Pantallas 2025
Representante Legal	Néstor Javier Jácome Ortiz
Supervisor	Subdirector De Gestión Del Riesgo Y Seguridad Territorial.
Valor Inversión Total	$20.976.440.913,06
Plazo Ejecución Inicial	Doce (12) Meses
Departamento	Santander
Municipio	Floridablanca
Barrio	Lagos II, Arrayanes, Prados del Sur y Santa Ana,
Fecha de Inicio	15 octubre 2025
Fecha de Terminación	14 de octubre de 2026

4.2. Relación de actas del contratista

La siguiente tabla evidencia las actas administrativas del contrato, así como la fecha de constitución, las observaciones y el valor si así lo especifica.

Tabla 2. Actas a la fecha.

Relación De Actas			
Acta	**Fecha**	**Observaciones**	**Valor**
Inicio	15/10/2025		N/A

4.3. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto

Durante este periodo no se realizan modificaciones.

4.4. Cuadro de control de pólizas

Nombre de la aseguradora: Equidad Seguros

Tabla 3. Cuadro de control de pólizas N° 210.16224.6.

N.º de la Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
AB002678	Cumplimiento del contrato.	15-10-2025	15-02-2027
AB002678	Estabilidad y calidad de la obra.	15-10-20225	15-10-2031
AB002678	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15-10-2025	15-02-2029
AB002682	Predios Labores y Operaciones.	15-10-2025	15-02-2026

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

5.1. Relación de personal en obra

Los profesionales relacionados en la tabla a continuación corresponden al personal mínimo exigido en el pliego de condiciones, según los perfiles y especialidades requeridos para la correcta ejecución del contrato, así como los profesionales adicionales para el fortalecimiento de la ejecución.

Tabla 4. Personal profesional.

#	Nombre	Cédula	Cargo	Dedicación
1.	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director De Obra	40%
2.	Johanna Marcela Padierna Castiblanco	1.098.682.052	Residente De Obra	100%
3.	María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	40%
4.	Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesor Ambiental	40%
5.	Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional Siso 1	40%
6.	Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	
7.	Mayra Alejandra Quintero Delgado	1.095.831.315	Residente Auxiliar De Obra	100%
8.	Oscar Yesid Blanco Estupiñán	1.098.690.238	Residente Auxiliar De Obra	100%
9.	Sandra Bermúdez Cala	63.553.613	Profesional ambiental	
10.	María Alejandra Sánchez Murcia	1.075.256.800	Profesional Siso 2	

El siguiente personal corresponde al equipo operativo asignado en campo, encargado de ejecutar las actividades constructivas, de apoyo y control directamente en los frentes de obra.

Tabla 5. Personal Asignado Lagos II.

No	Nombre	Cargo	Empresa
1.	Helmer Caballero	Oficial de obra	INFRACORP (Consorciado)

2.	Jhonathan Villamizar	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
3.	Freddy Leonardo Manrique	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
4.	Emiro Monares Cuadros	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
5.	Luis Ernesto Bermúdez	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
6.	Juan José Martínez	Almacenista	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
7.	Rivera Villalobos Huver David	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
8.	Cardenas Mantilla John Jairo	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
9.	Galvis Duran Diego Alejandro	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
10.	Cardenas Mantilla Duvan Jesid	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
11.	Suarez Manrique Juan Pablo	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
12.	Cardenas John Rene	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
13.	Cardenas Lizarazo Jose Dario	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)

Tabla 6. Personal Frente Arrayanes-Santa Ana.

No	Nombre	Cargo	Empresa

1.	Jhonatan Medina	Operador de perforación II	INFRACORP (Consorciado)
2.	Alexander Prada	Oficial de obra	INFRACORP (Consorciado)
3.	Jolman García	Ayudante de perforación II	INFRACORP (Consorciado)
4.	Olguer Sepúlveda	Operador de inyección	INFRACORP (Consorciado)
5.	Kilian Enrique Pertuz Jiménez	Ayudante de perforación II	CONAINCO (Consorciado)
6.	Jireh Lizarazo	Operador de perforación I	CONAINCO (Consorciado)
7.	Elias Reatiga Riatiga	Ayudante de perforación I	CONAINCO (Consorciado)
8.	Carlos Arturo Moliner Jiménez	Ayudante de perforación II	CONAINCO (Consorciado)
9.	Leonardo Andrés Duarte Rojas	Almacenista	CONAINCO (Consorciado)
10.	José Alirio Valencia Tarazona	Oficial de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
11.	Camilo Javier Dávila	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
12.	Ivan Darío Castilla romero	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
13.	Wilson Méndez	Ayudante de obra.	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
14.	Ronny Texiel Vivas	Ayudante de obra.	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
15.	Jose Nelson Silva Romero	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

16.	Eduar Alonso Reatiga Gonzalez	Almacenista	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
17.	Mathius Santiago Pertuz	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
18.	Jorge Leonardo Herrera	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
19.	Fabián Alberto Ramirez	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
20.	Carlos Andrés Ramirez	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
21.	Andrés Fernando Cuellar	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

5.2. Relación de equipo utilizado.

Tabla 7. Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

Equipo		
Ítem	Maquinaria / equipo	Registro fotográfico
1	Volquetas	

		 
2	Retroexcavadoras	

		
3	Unidad de perforación neumática	
4	Compresor	

		
5	Unidad de inyección	

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Con referencia al contrato No. 210.16224.6, se evidenciará técnica y visualmente cada una de las actividades desarrolladas durante el periodo de este informe para el control de la erosión y mitigación del riesgo en el barrio Arrayanes, así como el control de la erosión y socavación de la margen derecha aguas abajo del rio frio en el sector Lagos II.

6.1. Actividades de tipo técnico frente LAGOS II



Vista general Lagos II

6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra.

Durante el periodo de este informe se realizaron trabajos constantes de topografía para el levantamiento de toda la zona a intervenir, con el fin de conocer el estado actual de la geomorfología del terreno y el direccionamiento de la retroexcavadora para la remoción del material deslizado buscando la homogenización del margen derecho del Río Frío.



Levantamiento, replanteo y mediciones

6.1.2. Excavación mecánica bajo agua

Se realizaron actividades de excavación y remoción de material granular ubicado al margen derecho del río Frío que representaba un riesgo para la estabilidad de la zona. El trabajo de la retroexcavadora fue guiado constantemente por el equipo de topografía, para así lograr el alineamiento propuesto en el diseño.



Excavación mecánica bajo agua

6.1.3. Excavación en roca bajo agua

Se realizó excavación y remoción de material rocoso presente en el área. Para el desarrollo de la actividad se emplea retroexcavadora equipada con martillo hidráulico.
Este material producto de excavación fue cargado y transportado en volquetas hasta el sitio de disposición final autorizado.





Excavación con acarreo libre en roca

6.1.4. Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000 m

Se realizó el cargue y retiro del material producto de las actividades de descapote, excavación y demolición. Incluye el retiro y disposición de material vegetal, suelo, residuos y basuras encontrados en el área a intervenir, así como material rocoso y elementos de demolición.



Sobreacarreos de material

6.1.5. Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de río

Se realizó la conformación del Jarillón usando material granular con el propósito de contener temporalmente el flujo de agua en el sector intervenido, permitiendo la correcta ejecución de las actividades de suministro y colocación de concreto y solado.



Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de rio.

6.1.6. Suministro y colocación de concreto ciclópeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi y colocación de acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2

Durante el periodo reportado se ejecutó la construcción del dentellón de cimentación mediante el suministro y colocación de concreto ciclópeo, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El dentellón se construye con una sección de 1,00 m de ancho y 3,00 m de profundidad, proporcionando anclaje y estabilidad a la estructura de gaviones, lo que permite reducir riesgos de socavación y garantizar el adecuado desempeño estructural frente a las solicitaciones hidráulicas del cauce. De manera complementaria, se realizó la instalación del acero mejorando su comportamiento estructural y capacidad resistente.



Suministro y colocación de concreto ciclópeo y acero de refuerzo.

6.1.7. Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm

Se realizó la conformación del solado con espesor de 10 cm, con previa limpieza y excavación. El concreto fue vertido y nivelado hasta alcanzar el espesor especificado, generando una base uniforme y estable para los gaviones.



Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm

6.1.8. Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00

Se están ejecutando actividades correspondientes al armado de gaviones tipo cuerpo con dimensiones de 2,00 m de longitud, 1,00 m de ancho y 1,00 m de altura, los cuales conforman la estructura principal de protección del margen intervenido. Estos elementos se disponen de acuerdo con la sección típica del diseño, que contempla una sección transversal aproximada de 15 m², garantizando la estabilidad y el adecuado confinamiento del material pétreo de relleno. El proceso incluye la correcta alineación, amarre y conformación de las canastillas metálicas previo a su llenado, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la obra.



Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00m

6.1.9. Cantidades de obra ejecutadas

A continuación, se presenta la relación de cantidades de obra ejecutadas a la fecha, correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco del contrato. La información consignada refleja el avance físico del proyecto con base en los registros de campo, controles de obra y mediciones realizadas durante el periodo reportado.

Las cantidades relacionadas permiten evidenciar el progreso de las diferentes actividades ejecutadas en los frentes de trabajo, de acuerdo con las condiciones técnicas y operativas presentadas durante la ejecución.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS 3 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2023-00060-00								
CONDICIONES CONTRACTUALES						INFORME 4. (1 AL 28 FEB)	CANTIDADES ACUMULADA	
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANTIDAD	% AVANCE
	SECCION PRIMERA							
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	5,00	$ 11.089.695,00	$ 58.448.075,00	1,00	0,55	91,00%
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00 m x 2,80 m)	Und	1,00	$ 2.088.664,00	$ 2.688.664,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	$ 5.500,00	$ 8.628.704,00	0,00	1568,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	992,00	$ 87.997,00	$ 91.159.624,00	0,00	691,85	99,96%
				Subtotal	$ 184.025.467,00		Subtotal	94,00%
	SECCION SEGUNDA							
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	4461,00	$ 50.475,00	$ 224.722.875,00	0,00	4460,50	99,99%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	496,00	$ 92.037,00	$ 45.642.552,00	0,00	495,70	99,80%
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	2974,00	$ 70.741,00	$ 210.383.734,00	525,98	1380,00	46,40%
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	331,00	$ 118.261,00	$ 39.127.491,00	85,90	183,80	55,53%
2.02	Terraplenes y Rellenos							
2.02.03	Suministro, conformación y compactación de rellenos estructurales	m3	6331,63	$ 148.145,00	$ 937.999.326,35	0,00	0,00	0,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	152684,80	$ 4.024,00	$ 614.400.416,00	11364,14	120635,10	78,94%
2.05	Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de río	m3	1809,00	$ 70.305,00	$ 127.144.555,00	648,00	909,00	50,25%
				Subtotal	$ 2.199.668.829,35		Subtotal	42,67%
	SECCION TERCERA							
5.00	Concretos							
5.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclopeo 40% rajon de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	588,00	$ 724.270,00	$ 425.879.760,00	216,00	288,00	48,98%
5.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	157,00	$ 1.292.606,00	$ 202.939.142,00	0,00	0,00	0,00%
5.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado de 10cm	m2	588,00	$ 96.922,00	$ 56.990.136,00	216,00	288,00	48,98%
				Subtotal	$ 685.809.038,00		Subtotal	14,49%
	SECCION CUARTA							
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2	kg	1521,00	$ 12.308,00	$ 18.560.889,00	558,72	744,96	48,98%
				Subtotal	$ 18.560.889,00		Subtotal	48,98%
	SECCION SEXTA							
6.00	Varios							
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	204,00	$ 263.974,00	$ 53.850.696,00	0,00	0,00	0,00%
6.06	Filtro con tela							
6.06.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejida para filtros	m2	1176,00	$ 28.158,00	$ 33.120.848,00	0,00	0,00	0,00%
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	2940,00	$ 404.577,00	$ 1.177.696.380,00	900,00	900,00	30,61%
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	49,00	$ 14.662,00	$ 718.438,00	0,00	0,00	0,00%
				Subtotal	$ 1.265.426.362,00		Subtotal	28,49%

A continuación, se presenta la gráfica comparativa entre el avance físico ejecutado y el avance programado del proyecto, con el fin de evidenciar el comportamiento del desarrollo de las actividades frente a la programación establecida.

Durante el mes de febrero se evidencia una mejora en el comportamiento del avance físico ejecutado frente al programado en el frente **Lagos II**, observándose una reducción del desfase registrado en el periodo anterior. Mientras que en enero el incremento en el régimen de lluvias generó limitaciones operativas que afectaron el rendimiento, durante febrero las condiciones climáticas fueron más favorables, permitiendo una mayor continuidad en las actividades constructivas y un incremento en los niveles de ejecución. Como resultado, se logró disminuir parcialmente el atraso acumulado, manteniendo una tendencia positiva orientada a la recuperación progresiva del cronograma establecido.

Para mayor detalle sobre el análisis del comportamiento del cronograma y las condiciones que incidieron en el desarrollo de las actividades, se recomienda consultar los anexos correspondientes al informe de plan de gerencia del proyecto. Asimismo, en la bitácora de obra se encuentra el registro detallado de los días en los cuales las actividades se vieron afectadas por las condiciones climáticas y operativas presentadas.



6.2. Actividades de tipo técnico Frente ARRAYANES



Foto general frente Arrayanes

6.2.1. Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes

Se llevó a cabo el llenado e inyección de los anclajes utilizando lechada cementicia preparada de acuerdo con los parámetros de diseño. El proceso incluyó el control de mezclado, colocación y registro de volúmenes inyectados, asegurando la continuidad del proceso constructivo.



Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes

6.2.2. Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m

Una vez hechas las perforaciones se realizó el suministro, posicionamiento e instalación de tres cables de acero de 1/2" de diámetro y 20 m de longitud, destinados a la conformación de los anclajes. Los torones cuentan con una longitud mayor para hacer el tensionamiento después del concreto lanzado. Los torones son recubiertos con manguera con el fin de no perder sus propiedades físico-mecánicas en contacto con el suelo.





Suministro de anclajes

6.2.3. Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 20,00m

Se ejecutaron perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 mediante equipo de perforación neumático operado en condición descolgada, a 20m de profundidad, mediante movimiento de percusión y rotación. La ubicación de las perforaciones fue dada por la comisión topográfica en atención a los parámetros de espaciamiento establecidos en el diseño.



Ejecución de perforación de 20m

6.2.4. Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

Se instaló el jacket de respaldo para el revestimiento de las perforaciones horizontales destinadas a anclajes y drenes de penetración. La actividad incluyó el posicionamiento del tubo de protección y los ajustes necesarios para permitir la correcta colocación de los elementos estructurales e hidráulicos previstos. Esta actividad se realizará, buscando se garantice la geometría de la perforación, evitando desmoronamientos internos por presencia de humedad y materiales con poca cohesión.



Jacket de revestimiento de perforación horizontal en anclajes

6.2.5. Cantidades de obra ejecutadas

A continuación, se presenta la relación de cantidades de obra ejecutadas a la fecha, correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco del contrato. La información consignada refleja el avance físico del proyecto con base en los registros de campo, controles de obra y mediciones realizadas durante el periodo reportado.

Las cantidades relacionadas permiten evidenciar el progreso de las diferentes actividades ejecutadas en los frentes de trabajo, de acuerdo con las condiciones técnicas y operativas presentadas durante la ejecución.

CONDICIONES CONTRACTUALES						INFORME 6. (1 FEB AL 28	CANTIDADES NORMALIZADA
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANTIDAD
	SECCIÓN PRELIMINAR						
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	$ 11.099.595,00	$ 24.379.990,00	0,00	2,00
1.03	Vallas y señales preventivas						
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5.00m x 2.40m)	und	1,00	$ 1.488.454,00	$ 1.488.454,00	0,00	1,00
1.04	Cerramiento y Cinchas	m2	1980,00	$ 5.505,00	$ 5.994.240,00	0,00	1.950,00
1.05	Retiro de tuberías y accesorios	m3	414,99	$ 97.387,00	$ 56.181.955,80	0,00	415,32
1.06	Perfilado y manejo del relleno de talud	m3	1181,24	$ 182.597,00	$ 265.989.845,94	0,00	1.555,40
				Subtotal	$ 354.040.485,74		Subtotal
	SECCIÓN EXCAVACIÓN						
2.01	Excavación a cielo abierto en taludes						
2.01.A	Excavación con maquinaria						
2.01.A.02	Excavación con maquinaria en material granular a cualquier profundidad	m3	3383,89	$ 36.371,00	$ 134.455.218,75	0,00	3957,00
2.01.A.03	Excavación con maquinaria en roca a cualquier profundidad	m3	167,17	$ 92.357,00	$ 15.390.981,89	0,00	84,51
2.02.A.04	Excavación a mano con material libre descargado para cuyeo	m3	48,09	$ 105.876,00	$ 17.455.443,84	0,00	0,00
2.03	Adecuamientos para acceso en trabajo maquinaria de 1.000.00 m	m3-km	84745,60	$ 4.654,00	$ 394.476.534,40	0,00	82748,18
2.04	Distribución y conformación del material de corte en el sitio	m3	1047,79	$ 1.716,00	$ 1.797.870,24	0,00	1065,16
				Subtotal	$ 1.047.749.545,24		Subtotal
	SECCIÓN TRINCHOS						
3.00	Concretos						
3.01	Suministro y colocación de concreto de 4000 psi con resistencia inicial para cuyeos	m3	48,00	$ 1.869.381,00	$ 75.850.998,00	0,00	0,00
3.02	Suministro y colocación de concreto hidráulico con resistencia inicial de mínimo 3 MPa	m3	1980,00	$ 281.707,00	$ 539.155.440,00	0,00	0,00
3.03	Llenado de trincheras con bolsacreto permitido para anclajes	m3	173,00	$ 2.167.305,00	$ 374.878.065,00	85,00	215,00
				Subtotal	$ 987.884.503,24		Subtotal
	SECCIÓN CUNETAS						
4.00	Aceros						
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo Fy 4200 kg / cm2	kg	19911,60	$ 11.299,00	$ 149.899.988,04	0,00	0,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes						
4.02.02	Suministro e instalación de 8 anclajes Ø=1/2" de L=10m	und	160,00	$ 891.145,00	$ 307.469.039,00	90,00	222,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	160,00	$ 87.761,00	$ 14.421.543,00	0,00	0,00
4.04	Suministro y colocación						
4.04.01	Malla electrosoldada 4.0mm y abertura de 0.15m x 0.15m	m2	1980,00	$ 81.388,00	$ 51.326.640,00	0,00	0,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	160,00	$ 80.370,00	$ 28.781.850,00	0,00	0,00
4.06	Suministro e instalación de pasacables con 9 agujeros ciclópeo para cuña de Ø=3/4"	und	160,00	$ 159.477,00	$ 50.054.263,00	0,00	0,00
4.07	Suministro e instalación de tit de cuña de Ø=3/4" para anclaje	und	160,00	$ 97.403,00	$ 30.600.955,00	0,00	0,00
				Subtotal	$ 641.130.278,04		Subtotal
	SECCIÓN AGUAS						
5.00	Perforaciones horizontales						
5.02	Obtura de abatimiento para perforación horizontal para viviendas frontales (tubo ranurado PVC ranurado Ø=2") para drenes de 0.00m a 15.00m	m	125,00	$ 457.668,00	$ 101.842.500,00	0,00	0,00
5.02.A	Obtura de abatimiento para perforación horizontal para viviendas frontales (tubo ranurado PVC ranurado Ø=2") para drenes mayores a 15.00m	m	75,00	$ 609.558,00	$ 48.245.892,00	0,00	0,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes menores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m	m	2175,00	$ 441.897,00	$ 1.286.951.217,00	1850,00	3439,09
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m	m	1737,00	$ 469.300,00	$ 669.985.525,00	650,00	1158,09
5.04	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes o drenes de penetración	m	7100,00	$ 265.774,00	$ 1.516.224.850,00	1850,00	4600,00
				Subtotal	$ 3.707.450.984,00		Subtotal
6	SECCIÓN VARIA						
6.00	Varios						
6.02	Cunetas (ancho = 1m; e=10cm)	m	330,00	$ 580.848,00	$ 38.695.728,00	0,00	0,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2.50m	m	38,00	$ 268.873,00	$ 7.859.268,00	0,00	0,00
6.05	Retiro de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del tramo de la estructura amortiguadora	m	435,00	$ 75.908,00	$ 32.946.240,00	0,00	0,00
				Subtotal	$ 80.501.236,00		Subtotal

En el frente Arrayanes, durante el mes de enero se presentó una disminución en el rendimiento de las actividades asociadas a la ejecución de anclajes, debido a la presencia de estratos correspondientes a rellenos antrópicos con alta incidencia de elementos metálicos, lo cual generó interferencias en los procesos de perforación y afectó los rendimientos inicialmente previstos. No obstante, durante el mes de febrero se evidencia una mejora significativa en el avance ejecutado, resultado de la implementación de medidas operativas orientadas a optimizar los tiempos de perforación y la organización de los frentes de trabajo. Si bien continúan presentándose las mismas condiciones del subsuelo, las acciones adoptadas han permitido incrementar el ritmo de ejecución y reducir progresivamente el desfase frente a la programación establecida.



6.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.3.1. Relación de actas.

- Acta de inicio del contrato de obra pública No.210.16224.6 fecha 15 de octubre de 2025.

Los trabajos del contrato de obra No. 210.16224.6 se iniciaron el día quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025), según consta en el acta de inicio del contrato. El contrato fija un plazo de doce (12) meses, fijado el día 14 de octubre del 2026 como fecha de entrega de los trabajos.

6.3.2. Bitácora de obra

El contratista lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe diariamente cada una de las actividades realizadas, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados en obra, al igual el clima durante el día y su noche anterior. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto.

6.3.3. Afiliación seguridad social

Es compromiso del contratista y una de sus actividades administrativas, mantener a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra bajo el sistema de seguridad social, como lo indica el contrato. Para esto el contratista reunió la documentación necesaria de cada uno de los empleados, para tramitar ante la respectiva EPS y mantener actualizada, la información y pagos para su afiliación. El personal que se encuentra vinculado se encuentra afiliado al sistema de seguridad social bajo la razón social INFRACORP S.A.S, DESIC S.A.S, CONAINCO S.A.S Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA.

6.3.4. Seguimiento y control

Se lleva a cabo por parte del contratista un control, análisis y seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron durante este periodo de tiempo. Así mismo, se mantiene una comunicación permanente con la comunidad y con la interventoría **UNION TEMPORAL INTERPANTALLAS 2025** a través de su Residente y director de Interventoría; brindando información

de interés acorde a cada ente y se gestionan sus requerimientos, mediante correos electrónicos y reuniones en las instalaciones tanto de los contratistas como de la interventoria.

6.4. Actividades tipo financiero

6.4.1. Variaciones financieras

- Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026 no hubo variaciones financieras.

6.4.2. Relación de pagos efectuados

- Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2025 no se realizaron pagos por parte de la entidad.

6.5. Actividades de aseguramiento de la calidad

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra.

6.6. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal empleado en obra y brindando elementos específicos según las actividades a desarrollar, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista fueron:

- Capacitación del personal
- Vinculación al sistema de seguridad social del personal que ingresa, bajo Consorcio Estabilización Floridablanca.
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.
- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.

Ver anexo informe mensual de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

6.7. Actividades componente socioambiental

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades de gestión social, consistentes en la realización de visitas de vecindad el viernes 13 de febrero en los sectores Altos de Florida, Prados del Sur y Portal de Santa Ana. Estas jornadas tuvieron como propósito socializar aspectos relacionados con la ejecución del proyecto, resolver inquietudes de la comunidad y fortalecer los canales de comunicación con los residentes del área de influencia directa, contribuyendo a la adecuada articulación entre la obra y el entorno social.





Actas de vecindad obras Prados del sur y Santa Ana.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En conclusión, durante el periodo evaluado se implementaron medidas operativas orientadas a mejorar el rendimiento de los frentes de trabajo y avanzar en la recuperación progresiva del desfase presentado en la programación. Estas acciones han permitido evidenciar mejoras en los niveles de ejecución y una mayor continuidad en las actividades constructivas.

Por otra parte, se continúa a la espera de la aprobación del Programa de Manejo de Tránsito (PMT) para dar inicio formal a las intervenciones en los frentes de Prados del Sur y Santa Ana. No obstante, en dichos sectores se han adelantado actividades preliminares necesarias para la futura ejecución de la obra, tales como la adecuación de campamentos y labores operativas que, aunque no corresponden a ítems medibles para cobro, resultan indispensables para garantizar condiciones adecuadas de inicio y desarrollo de los trabajos.

Edgar Leonardo Gómez Roncancio.

Director de obra

Consorcio Estabilización Floridablanca

8. ANEXOS.

- Anexo No. 1: Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Anexo No. 2: Informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental.
- Anexo No. 3: Informe de gestión de proyectos.
- Anexo No. 4: Aseguramiento de la calidad.
- Anexo No. 5: Bitácoras de obra.
- Anexo No. 6: Estado del tiempo.
- Anexo No. 7: Oficios y correspondencia.
- Anexo No. 8. Planos.

Anexo No. 1: Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

INFORME SST N° 04

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

CONSORCIO
ESTABILIZACIÓN
FLORIDABLANCA

Melissa Donado Arias

ELABORADO POR:
CLARA MELISSA DONADO ARIAS
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FLORIDABLANCA DE 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO 9
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 12
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 12
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12
7. PROCESOS DE FORMACIÓN 13
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 13
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 14
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 14
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"** en el periodo comprendido entre el **01 al 28 de febrero de 2026;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
NIT	901982775-0
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
CONTRATO	210.16224.6
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"**
DIRECCIÓN	Carrera 39 N° 51 – 31, Apto 2405
TELÉFONO	3012765665
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026							
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	No Cotiza
Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesora ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No Cotiza
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	No Cotiza
Juan José Martínez	1.005.338.626	Almacenista	18/11/2025	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir	Comfenalco
Ángel Ramon Medina	1.239.700	Auxiliar de perforación	10/11/2025	Axa Colpatria	Salud mia	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					5		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S.							

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	N/A
Jireh Lizarazo Navas	1.099.940.291	Operador de perforación	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
Kilian Enrique Pertuz Jiménez	1.002.237.235	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Elías Reatiga Riatiga	91.459.128	Ayudante de perforación I	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Cajasan
Carlos Arturo Moliner Jiménez	91.530.925	Ayudante de perforación II	18/11/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
Leonardo Andrés Duarte Rojas	1.095.839.883	Ayudante de obra	10/11/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					6		

DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Jonathan García Sánchez	91.185.774	Operador de maquinaria	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Maria Alejandra Sanchez	1.075.256.800	Profesional sst 2	15/10/2025	Axa Colpatria	Nuev a EPS	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					2		

CONTRATISTA: INFRACORP S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SISO	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Sandra Bermúdez	63.553.613	Profesional ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Ecopetrol	Porvenir	Comfenalco

Fabián Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Colpensiones	Comfenalco
Johanna Marcela Padierna Castiblanco	1.098.682.052	Ingeniero residente	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Olger Sepúlveda Parra	1.098.640.002	Operador de inyección	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Samuel Reatiga Riatiga	91.459.307	Maestro	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Jonathan Villamizar	1.234.339.663	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Freddy Manrique Estupiñán	13.516.255	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Jhonatan Medina Florez	1.095.831.892	Operador de perforación	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Colpensiones	Comfenalco
Edinson David Navarro Florez	1.007.731.661	Ayudante de perforación 2	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Porvenir	Comfenalco
Annel Edgardo Hernández Escobar	5.338.041	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Alexander Prada Jerez	13.537.319	Oficial de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	Comfenalco
Jolman Jerónimo García Vargas	1.101.019.874	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Protección	Comfenalco
Helmer Caballero Jaimes	91.458.433	Oficial de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir	Comfenalco
Hugo Alfredo Diaz Ortega	1.099.371.577	Almacenista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Emiro Monares Cuadros	13.542.493	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Luis Ernesto Bermúdez Pereira	88.203.988	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Jose Alirio Valencia	5.778.254	Oficial de obra	04/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco

Darwin Feria Otalora	73.592.121	Operador de perforación	12/11/2025	Axa Colpatria	Mutual Ser	Colfondos	Comfenalco
Angel Ramon Medina	1.239.700	Auxiliar de perforación	10/11/2025	Axa Colpatria	Salud mia	Porvenir	Comfenalco
Juan José Martínez	1.005.338.626	Almacenista	18/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					25		
SUBCONTRATISTA – PEÑARANDA & RAMIREZ							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Duván Jesid Cárdenas Mantilla	1.100.896.238	Oficial	05/01/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
John Jairo Cardenas Mantilla	1.095.936.735	Oficial	05/01/2026	Sura	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Jhon Rene Cardenas	91.464.275	Ayudante	05/01/2026	Sura	Nueva Eps	Porvenir	Cajasan
Diego Alejandro Galvis	1.098.506.084	Ayudante	05/01/2026	Sura	Coos alud	Porvenir	Cajasan
Huver David Rivera Villalobos	1.048.271.660	Ayudante	05/01/2026	Sura	Sanitas	Protección	Cajasan
Juan Pablo Suarez Manrique	13.861.583	Ayudante	05/01/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					6		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**44**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

A continuación, se presenta el personal que ingresó en el periodo que corresponde al presente informe.

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026			
CONTRATISTA: ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Mathius Santiago Pertuz Jiménez	1.048.283.845	Ayudante de obra	02/02/2026
Jorge Leonardo Herrera Reyes	1.095.835.301	Ayudante de obra	02/02/2026
Fabian Alberto Ramírez Florez	1.098.718.865	Ayudante de obra	02/02/2026
Carlos Andrés Ramírez Florez	1.098.767.443	Ayudante de obra	02/02/2026
Andrés Fernando Cuellar Hernández	1.098.649.173	Ayudante de obra	02/02/2026
Eduar Alonso Reatiga González	1.101.597.448	Almacenista	09/02/2026

Conforme a los lineamientos del sistema de Seguridad y salud en el trabajo del proyecto se desarrollan inducciones al personal que presenta novedad de ingreso y las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social, las cuales se encuentra soportadas.

Ver anexo No 2. Novedades de ingreso

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, no se presentaron novedades de retiro.

PERSONAL ROTATIVO

Para el desarrollo de actividades propias del proyecto, es necesario contar con el personal de actividades puntuales. Cabe destacar que este personal hace presencia de manera rotativa en los frentes de obra ya que la actividad no es rutinaria.

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENCIA DE SOAT	RTM	FECHA VIGENCIA RTM	CONDUCTOR
PFK979	34330739200	20/08/2026	183336093	09/08/2026	Miguel Ángel Ortiz
TTW843	430800728916300 0	31/10/2026	185644110	11/29/2026	Ruben Mantilla
WFD114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026	Luis Eduardo Rodriguez

Ver anexo No 3. Documentos personales rotativo

Tabla No 4. Documentos de maquinaria

Clase	Marca	Modelo	N° Serie	Motor	Operador	Fecha actividades
Excavadora	Doosan	2018	DHKCEBACAJ002061 7	DB58TIS31003EN	Duncan Buitrago	Del 01 al 28 de febrero
Excavadora	Doosan	2015	CEBAA-006876	DLO6CC424373E 00	Jhonatan Sánchez	Del 01 al 28 de febrero

Ver anexo No 4. Documentos maquinaria y volquetas

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

Durante el periodo que cubre este informe, las actividades se focalizaron en el inicio operativo del proyecto, específicamente en el ingreso y contratación de personal. Por este motivo, la gestión de los comités no se activó; su inicio está previsto para el mes siguiente.

Ver anexo No 5. Acta de conformación copasst
Ver anexo No 5.1. Acta de conformación cocola

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual

y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizarán inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 6. Registros de Elementos de protección Personal y Dotación.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	FECHA	TEMA
1	04/02/2026	Caídas de alturas trabajo en taludes
2	11//02/2026	Caídas de rocas y material suelto
3	18/02/2025	Trabajo seguro con maquinaria

Ver anexo No 7. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	27/02/2025
Inspección de botiquín y camilla Lagos	27/02/2025
Inspección de botiquín y camilla Arrayanes	27/02/2025
Inspección locativa de obra lagos	27/02/2025
Inspección locativa de obra Arrayanes	27/02/2025
Inspección de extintores Lagos	27/02/2025
Inspección de extintores Arrayanes	27/02/2025

Ver anexo No 8. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas a diferente nivel (trabajo en alturas)	-Diligenciamiento y verificación del permiso de trabajo en alturas - Uso obligatorio de arnés, líneas de vida y conectores certificados - Inspección previa de equipos de protección contra caídas	Del 01 al 28 de febrero 2026

Ver anexo No 10. Medidas preventivas.

Ver anexo No 9. Registro Fotográfico.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

	CONSOLIDADO MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Código	GH-F-41
		Fecha	26/7/2021
		Versión	1
		Página __ de __

Periodo Año 2026

Nº	MES	Nº AT			Nº TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS LABRAD	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		AI	EI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	IU
1	ENERO	0	0	0	46	0	0	34	0	5312	ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FEBRERO	0	0	0	44	0	0	34	0	5016	FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0	0	0	90	0	0	42	0	10328	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia



Imagen 2. Tasa de accidentalidad


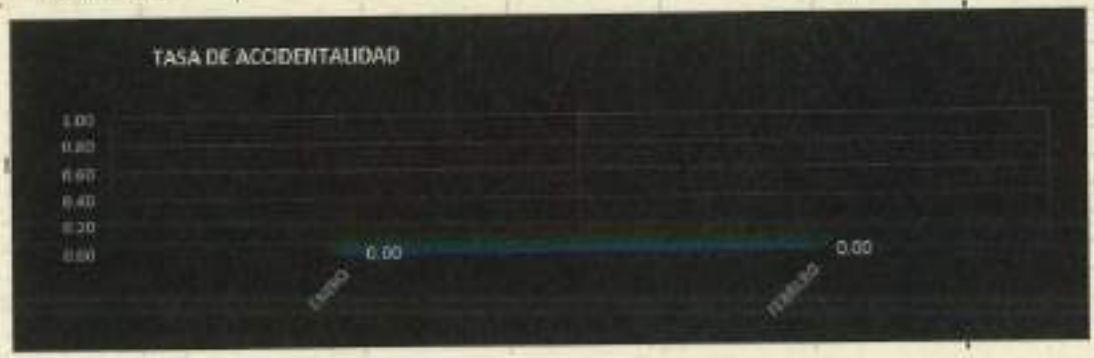


Imagen 3. Número de trabajadores mensual



Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo

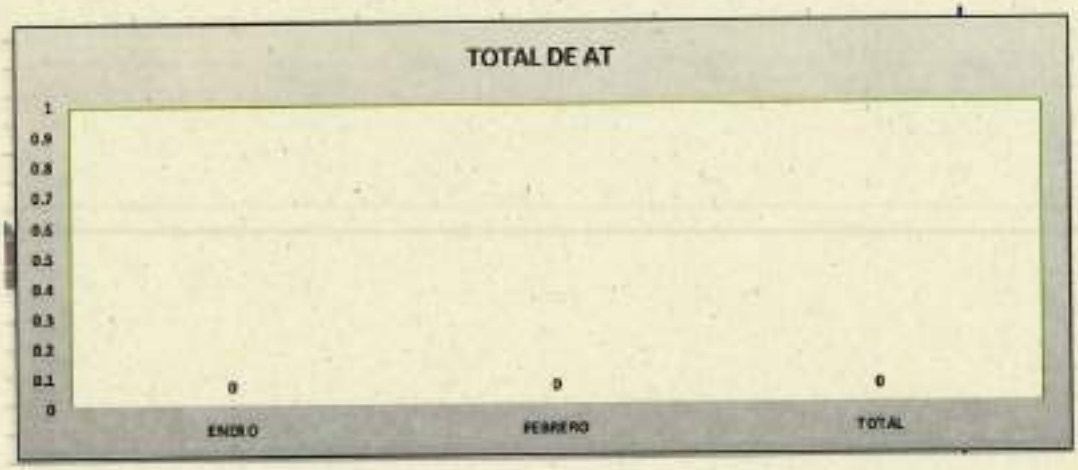

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:31:53 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla:** 1060129793

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	DIAS	IBC	Días	Aporte	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mi Educación	Total
CC 1065710557	ANGIE LICETH HOLGUIN PINO	59	39															0	0	0	30	0	(SALAR) HINCHUIA AFP	$ 0	$ 0	(SALUD) HINCHUIA EPS	$ 0	$ 0	0.000	$ 1.300.000	$ 121.800	(NIVLCC) HINCHUIA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.800
CC 1098818026	JOHANA PAOLA ESPINOZA BADILLO	59	39															0	0	0	30	0	(SALAR) HINCHUIA AFP	$ 0	$ 0	(SALUD) HINCHUIA EPS	$ 0	$ 0	0.000	$ 1.300.000	$ 121.800	(NIVLCC) HINCHUIA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.800
CC 91098979	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	39															0	0	0	30	0	(SALAR) HINCHUIA AFP	$ 0	$ 0	(SALUD) HINCHUIA EPS	$ 0	$ 0	0.000	$ 1.300.000	$ 121.800	(NIVLCC) HINCHUIA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Subsidio a Pagar) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.282.719	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.708	$ 0	$ 366.708

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540377 - Medellín: 604 5146093 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6545444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618559 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLIZI

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:31:18 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1000121086

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372
Total Afiliados	14	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días SAL	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Ajuste Pensión	Administradora	IBC Salud	Ajuste Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Ajuste Riesgos	Administradora	IBC Caja	Ajuste Caja	Ajuste SENA	Ajuste ICBF	ESAP	Ajuste Mineducación	Total
CC 1005295217	JAN SARID CASTILLA ROMERO	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.356.000	$ 217.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.356.000	$ 70.000	0,00%	$ 1.356.000	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.356.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.800
CC 1005298635	JUAN JOSE MARTINEZ MEJIA	01	00							X		X							0	30	30	30	(230114) COLPENSIONES	$ 2.596.316	$ 333.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.664.016	$ 93.000	0,00%	$ 2.596.316	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.596.316	$ 93.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500
CC 1049000940	MATHIUS SANTIAGO FORTUZ JIMENEZ	01	00	X								X							0	30	30	30	(230114) COLPENSIONES	$ 1.827.879	$ 281.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.911.979	$ 70.000	0,00%	$ 1.827.879	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.827.879	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.300
CC 1067307547	JOSE NELSON SILVA ROMERO	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.356.000	$ 217.800	(EPS042) SALUD TOTAL EPS	$ 1.356.000	$ 70.000	0,00%	$ 1.356.000	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.356.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.800
CC 1067308479	CAMILO JAVIER DAVILA TORRES	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.356.000	$ 217.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.740.700	$ 71.300	0,00%	$ 1.356.000	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.356.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.800
CC 1068702869	JEHAN ANDRES AVENDAÑO HERNANDEZ	03	00	X	X														0	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS042) SALUD VIDA EPS042	$ 116.727	$ 6.700	0,00%	$ 116.727	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.727	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.100
CC 1068705919	JORGE LEONARDO HERRERA REYES	04	00	X								X							0	29	29	29	(230201) PORVENIR	$ 1.311.818	$ 209.100	(EPS042) SALUD VIDA EPS042	$ 1.311.818	$ 75.300	0,00%	$ 1.311.818	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.311.818	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 1068706172	ANDRES FERNANDO GUILLOT HERNANDEZ	01	00	X								X							0	29	29	29	(230201) PORVENIR	$ 1.267.313	$ 195.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.671.413	$ 70.000	0,00%	$ 1.267.313	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.267.313	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.600
CC 1069718855	FABIAN ALBERTO RAMIREZ FLOREZ	01	00	X								X							0	30	30	30	(230105) PORVENIR	$ 1.695.540	$ 270.300	(EPS030) EPS SANITAS	$ 1.832.140	$ 87.000	0,00%	$ 1.695.540	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.695.540	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.300
CC 1069761443	CARLOS ANDRES RAMIREZ FLOREZ	01	00	X								X							0	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.311.333	$ 330.200	(EPS030) SALUD VIDA EPS S.A.	$ 1.311.333	$ 72.000	0,00%	$ 1.311.333	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.311.333	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.200
CC 1091651446	EDGAR ALONSO PINTOR GONZALEZ	01	00	X								X							0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.405.710	$ 216.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.425.710	$ 87.100	0,00%	$ 1.405.710	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.405.710	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.710
CC 37162241	JOSE ALBERTO VALENCIA TARAZONA	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.311.000	$ 202.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.010.600	$ 93.700	0,00%	$ 1.311.000	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.010.600	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.000
CC 91161020	WILSON ANDRES PEÑA	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 261.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.700.000	$ 70.100	0,00%	$ 1.700.000	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.700.000	$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 942.000
PT 3024028	EDWAY TOBIEL YARA PEÑA	01	00									X							0	27	27	27	(230-14) COLPENSIONES	$ 1.703.141	$ 272.500	(EPS042) EPS S.A. COOBALUD	$ 1.735.141	$ 65.000	0,00%	$ 1.703.141	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.703.141	$ 118.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.500
PT 3024028	EDWAY TOBIEL YARA PEÑA	01	00									X							0	3	3	3	(230-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 21.300	(EPS042) EPS S.A. COOBALUD	$ 175.091	$ 0	0,00%	$ 175.091	$ 10.000	(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5560377 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945464 - Pereira: 606 3402952 - Barranquilla: 605 3610950 - Resto del País: 018000 371 371 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Cesantías Intereses, Licencias, Saldos a Favor) SPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.080.515	$ 24.080.515	$ 24.080.515	$ 23.891.424	$ 3.864.400	$ 956.400	$ 1.683.700	$ 956.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.420.900	$ 0	$ 7.420.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-11, 09:45:25 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1066206254

Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	Dirección	CRA 35 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días PENS	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total	$ 926.300
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																		1	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.505	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.505	$ 216.800	0.522	$ 1.750.505	$ 9.200	(CCF33) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.505	$ 1.750.505	$ 1.750.505	$ 0	$ 280.000	$ 216.800	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.300	$ 0	$ 506.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440934 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5148888 - Bucaramanga: 607 9438800 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 911 911 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6004470877**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		93694499	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 D NO 54 - 24	TELÉFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	[illegible]	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
NÚMERO PLANILLA:		[illegible]	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	[illegible] AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	[illegible] AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		[illegible]	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
SUBTOTAL(ES)										[illegible]	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	EPS SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTAL(ES)													[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES	PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO											
	CC [illegible]	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	[illegible]		[illegible]		NO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	[illegible]

SALUD: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
EPS SANITAS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	[illegible]			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7229402		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1901	BUCARAMANGA-SANTANDER	6974385	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	1346222424	95012770049	I	2026/03/11	2026/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,029,880

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7229402	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO									X									23-003	30	215,889,626	52,791,400	01-010	30	215,889,626	31,966,300		0	215,889,626	3,029,880	14-2	30	215,889,626	3,887,100	4	215,889,626	52,791,400	No	93,674,800
Total	Afiliados(1)																						215,889,626	52,791,400			215,889,626	31,966,300			215,889,626	3,029,880			215,889,626	3,887,100		215,889,626	52,791,400		93,674,800

2026/03/16 10:38 AM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72054701		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	134823414	95013710149	1	2026/03/17	2026/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,074,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,701,400	$0	$0	$2,701,400
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$2,701,400	$0	$0	$2,701,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,100	$0	$0	$387,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$387,100	$0	$0	$387,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,986,300	$0	$0	$1,986,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,986,300	$0	$0	$1,986,300
TOTAL				1	$5,074,800	$0	$0	$5,074,800

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:31:18 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1080121095

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372
Total Afiliados	14	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Monitoria	Total
CC 1005239017	[illegible]	01	00													X																								(26/04) POSITIVA	$ 1.660.000	$ 317.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.660.000	$ 79.500	0.522	$ 1.660.000	$ 8.600	(CCF01) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.660.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.100
CC 1005238830	[illegible]	01	00													X	X																								(25-14) COLPENSIONES	$ 2.094.319	$ 355.700	(EP3037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.094.319	$ 83.800	0.522	$ 2.094.319	$ 10.900	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.094.319	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.200
CC 1040039840	[illegible]	03	39	X												X																								(25-14) COLPENSIONES	$ 1.551.870	$ 263.600	(EP3037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.551.870	$ 72.500	0.522	$ 1.551.870	$ 8.100	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.551.870	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1097257041	[illegible]	01	00													X																								(23001) PROTECCION	$ 1.660.000	$ 317.900	(EP3002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.660.000	$ 79.500	0.522	$ 1.660.000	$ 8.600	(CCF05) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.660.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.400
CC 1067501175	[illegible]	01	00													X																								(23001) PORVENIR	$ 1.766.700	$ 335.700	(EPS020) NUEVA EPS S.A.	$ 1.766.700	$ 71.300	0.522	$ 1.766.700	$ 9.200	(CCF05) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.766.700	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.200
CC 1005752880	[illegible]	01	00	X	X																																			(23001) PREVISORA	$ 116.727	$ 19.700	(EPS039) SALUD MIA EPS S.A.	$ 116.727	$ 4.700	0.522	$ 116.727	$ 600	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.727	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.300
CC 1005405361	[illegible]	01	00	X												X																								(23001) PORVENIR	$ 1.551.870	$ 263.600	(EPS032) EPS S.O.S COOSALUD	$ 1.551.870	$ 72.500	0.522	$ 1.551.870	$ 8.100	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.551.870	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1098699172	[illegible]	01	00	X												X																								(23001) PORVENIR	$ 1.551.870	$ 263.600	(EP3037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.551.870	$ 72.500	0.522	$ 1.551.870	$ 8.100	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.551.870	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1098678660	[illegible]	01	00	X												X																								(23001) PORVENIR	$ 1.660.542	$ 316.900	(EP3001) EPS SANITAS	$ 1.660.542	$ 77.500	0.522	$ 1.660.542	$ 8.700	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.660.542	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.400
CC 1098678443	[illegible]	01	00	X												X																								(23001) PREVISORA	$ 1.551.870	$ 263.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.551.870	$ 72.500	0.522	$ 1.551.870	$ 8.100	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.551.870	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1101697548	[illegible]	01	00	X												X																								(23001) PORVENIR	$ 1.425.719	$ 272.100	(EP3017) FAMISANAR EPS	$ 1.425.719	$ 66.600	0.522	$ 1.425.719	$ 7.400	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.425.719	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.000
CC 91775574	[illegible]	01	00													X																								(23001) PORVENIR	$ 2.010.029	$ 383.700	(EP3037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.010.029	$ 93.900	0.522	$ 2.010.029	$ 10.500	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.010.029	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.300
CC 91160928	[illegible]	01	00													X																								(23001) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 334.200	(EP3037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.000	$ 81.700	0.522	$ 1.750.000	$ 9.100	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.000	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.200
CC 1098678660	[illegible]	01	00													X																								(23001) PORVENIR	$ 1.660.542	$ 316.900	(EP3001) EPS SANITAS	$ 1.660.542	$ 77.500	0.522	$ 1.660.542	$ 8.700	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.660.542	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.400
CC 91160928	[illegible]	01	00													X																								(23001) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 334.200	(EP3037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.000	$ 81.700	0.522	$ 1.750.000	$ 9.100	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.000	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.200
PT 3384000	[illegible]	01	00													X																								(23-14) COLPENSIONES	$ 175.891	$ 31.100	(EPS034) EPS-S COOSALUD	$ 175.891	$ 8.200	0.522	$ 175.891	$ 900	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.900
PT 3384000	[illegible]	01	00														X																								(25-14) COLPENSIONES	$ 175.891	$ 31.100	(EPS034) EPS-S COOSALUD	$ 175.891	$ 8.200	0.522	$ 175.891	$ 900	(CCF02) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4660034 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140669 - Bucaramanga: 607 6436600 - Cartagena: 605 6665444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 911 911 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.066.515	$ 24.066.515	$ 24.066.515	$ 23.661.424	$ 3.844.480	$ 866.400	$ 1.683.705	$ 866.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.420.900	$ 0	$ 7.420.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:23:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1080166343

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		
Total Afiliados	21	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET.P	TDE	TAE	TDP	TAP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	Días APO	Días IBC	Días ADC	Días IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1005057080	RUAN ENRIQUE PORTUZ JIMENEZ	01	00									X							30	30	30	30	(240501) PROTECCION	$ 2.388.720	$ 330.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.388.720	$ 330.000				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.388.720	$ 302.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.100
CC 1005057249	MARIA DANIELA PEREZ RANGEL	01	00																30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 2.388.720	$ 285.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.388.720	$ 330.000				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.388.720	$ 302.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.000
CC 1005462513	HELVI ALBERTO MARIN PUENTES	01	00										X						30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 1.458.000	$ 233.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.458.000	$ 59.400				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.458.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.500
CC 1005462513	HELVI ALBERTO MARIN PUENTES	02	00										X						0	0	0	0	(240501) PORVENIR	$ 291.810	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.810	$ 11.700				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.500
CC 1094264401	FELIPE ORLANDO ROJAS ALVAREZ	01	00	X															30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS045) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.700
CC 1095810191	MARTIN ALEJANDRO QUINTERO DELGADO	01	00									X							30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 3.888.888	$ 622.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.888.888	$ 157.300				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.888.888	$ 226.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.041.500
CC 1095810191	LEONARDO ANDRES DUARTE ROJAS	01	00									X							30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 1.458.183	$ 233.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.458.183	$ 59.000				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.458.183	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.700
CC 1098863238	KEVIN YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00									X							30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 4.857.200	$ 780.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.857.200	$ 195.500				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.857.200	$ 283.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.258.500
CC 1098764036	ELIANA MELISSA DOMINGUEZ ARIAS	01	00																30	30	30	30	(240501) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200
CC 1098870930	JHON FREDDY BURGOS SERRANO	01	00	X															30	30	30	30	(240501) PROTECCION	$ 2.208.900	$ 353.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.335.500	$ 93.900				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.335.500	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.200
CC 1098781540	LUIS ALFONSO GUAREZ CARREÑO	01	00								X	X							30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.943.183	$ 311.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.943.183	$ 77.900				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.943.183	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.100
CC 1098781708	ARNOLD GIOVANNY BURGOS SERRANO	01	00	X															30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS034) SPS-O CROSNLUD	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200
CC 1099966391	JOHN LEONARDO HIVIAS	01	00								X	X							30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 1.458.183	$ 233.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.458.183	$ 58.400				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.458.183	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.600
CC 1102831529	EDUARDO JOSE BUITRON VARGAS	01	00	X															30	30	30	30	(240501) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200
CC 72254372	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	01	00								X								30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 3.675.000	$ 1.102.500	(EPS034) EPS SURA	$ 3.675.000	$ 315.200				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.675.000	$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.100
CC 91152897	MARCO TULIO GARNICA CORDERO	01	00	X															30	30	30	30	(280-AF) PENSIONES AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000
CC 91153156	HERMES HERNANDEZ AGUILAR	01	00	X															30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS050) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200
CC 91364452	ALONSO CAPACHO LIZARAZO	01	00	X															30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100				(CCF50) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 6489634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6428000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3618830 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/03/2026

Empresa NI901173035
CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS

Planilla Nro: 1080165343

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: marzo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Min Educación		
CC 51668128	ALBA NELLY [illegible]	01	00									X												[illegible]	$ 1.240.671	$ 213.600	[illegible]	$ 1.240.671	$ 79.000	0.522	$ 1.644.971	$ 128.400	[illegible]	$ 1.645.971	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 560.000
CC 51668399	[illegible]	01	00	X																				[illegible]	$ 2.000.000	$ 373.700	[illegible]	$ 2.100.000	$ 93.500	0.522	$ 2.205.000	$ 183.750	[illegible]	$ 2.210.000	$ 159.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 730.000
79.915.993	CARLOS ARTURO MOLINER JIMENEZ	01	00									X												[illegible]	$ 2.218.519	$ 323.000	[illegible]	$ 2.218.519	$ 93.500	0.522	$ 2.218.519	$ 140.000	[illegible]	$ 2.218.519	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 629.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 49.625.460	$ 51.978.399	$ 51.978.399	$ 52.736.173	$ 7.973.800	$ 2.054.000	$ 3.063.000	$ 2.043.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.341.000	$ 0	$ 15.341.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146969 - Bucaramanga: 607 6439888 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3018850 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INTERCOOP SAS	B - MAYOR DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7NA 72 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900830	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	119450138	95816616061	E	2026/03/10	2026/03/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,363,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		In	Ce	Sa	Su	Vs	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Cod	Cod						Config	Días	IBC	Aporte	Config	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Config	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (20 Afiliados)																									$60,309,226	$9,771,600			$62,211,517	$2,489,100			$60,603,031	$2,417,200			$62,211,517	$3,619,800				$18,297,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																									$8,409,306	$1,349,600			$18,168,114	$726,600			$8,458,392	$337,700			$18,168,114	$553,300			$0	$2,965,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																									$8,409,306	$1,349,600			$18,168,114	$726,600			$8,458,392	$337,700			$18,168,114	$553,300			$0	$2,965,200
1	CC	91879916	ACERO ROJAS JUAN CESAR																					0	$0	$0	$0	4600 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	$5,250			$0	$0	N	$110,450
2	CC	1098761915	DIAZ ARIZA MARIA CATALINA	X																				23030 1	19	$2,214,667	$354,700	5P003 1	19	$2,214,667	$88,700	CCF40	19	$2,214,667	$88,700	14-4	19	$2,214,667	$6,650	0.0125	$71,600	19	$0	$0	N	$609,750
3	CC	1098881676	RAMIREZ LOZADA DIANA MILENA									X												23030 1	30	$2,500,000	$400,000	5P003 1	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$7,500	0.0125	$313,500	30	$0	$0	N	$613,500
4	CC	1098723994	BARRERA HERNANDEZ HARRY MATEO									X												25-14	30	$2,000,000	$320,000	5P003 0	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$6,000	0.0125	$250,000	30	$0	$0	N	$490,000
5	CC	1098829432	TORRES PINZON MICHELLE MARIA	X																				23030 1	29	$1,692,542	$270,900	5P003 0	29	$1,692,542	$67,800	CCF40	29	$844,272	$33,900	14-4	29	$1,692,542	$5,100	0.0125	$58,900	29	$0	$0	N	$551,000

Planilla Resumen

aportes en línea

No.	Tipo	Documento	Nombre	Novedades	Cód.	Días	IBC	Valor	EPS	Días	IBC	Valor	CCF	Días	IBC	Valor	ARL	Días	IBC	Tarifa	Valor	Días				Total
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (21 Afiliados)							$52,151,013	$8,436,000			$52,151,003	$2,081,100			$52,314,639	$2,089,300			$52,151,013		$3,624,795		$0	$0		$16,230,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (21 Afiliados)							$52,151,013	$8,436,000			$52,151,003	$2,081,100			$52,314,639	$2,089,300			$52,151,013		$3,612,700		$0	$0		$16,230,900
6	CC	1897'1600	ARGÜELLES MARTINEZ JHAM		230301	30	$1,750,905	$280,100	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.9600	$121,900	30	$0	$0	30	$540,200
7	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WELLINTON	X X	23-14	30	$2,370,682	$379,400	EPS037	30	$2,370,682	$94,900	CCF40	30	$2,370,682	$94,900	14-4	30	$2,370,682	6.9600	$165,000	30	$0	$0	30	$734,200
8	CC	88201988	BERMUDEZ PEREIRA LUIS ERNESTO	X	230301	30	$1,914,000	$306,300	EPS044	30	$1,914,000	$76,600	CCF40	30	$1,914,000	$76,600	14-4	30	$1,914,000	6.9600	$133,300	30	$0	$0	30	$592,800
9	CC	63552610	BERMUDEZ CALA SANDRA YELIMA		230301	30	$2,506,582	$401,100	MIN001	30	$2,506,582	$100,300	CCF40	30	$2,506,582	$100,300	14-4	30	$2,506,582	6.9600	$174,500	30	$0	$0	30	$776,200
10	CC	1098606090	BUSTOS PARADA HECTOR DANILO		23-14	30	$1,750,905	$280,200	ESS024	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.9600	$121,900	30	$0	$0	30	$542,300
11	CC	91468633	CABALLERO JAIMES HELMER	X	230301	30	$1,979,716	$316,800	EPS037	30	$1,979,716	$79,200	CCF40	30	$1,979,716	$79,200	14-4	30	$1,979,716	6.9600	$137,800	30	$0	$0	30	$613,000
12	CC	1098691028	CAÑARES CORDERO ANGIE ANGELICA	X	221001	29	$2,900,000	$464,000	EPS005	29	$2,900,000	$116,000	CCF40	29	$2,900,000	$116,000	14-4	29	$2,900,000	6.9600	$201,900	29	$0	$0	30	$897,900
13	CC	1098371571	DIAZ ORTEGA HUGO ALFREDO	X X	230301	30	$2,256,250	$361,000	EPS005	30	$2,256,250	$90,300	CCF40	30	$2,256,250	$90,300	14-4	30	$2,256,250	6.9600	$157,100	30	$0	$0	30	$698,700
14	CC	1098584404	DORADO ARIAS CLARA MELISSA		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS044	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.9600	$121,900	30	$0	$0	30	$542,300
15	CC	1098593609	GARCIA VARGAS JOHAN EDGARDO	X	230301	30	$2,025,877	$324,200	EPS002	30	$2,025,877	$81,100	CCF40	30	$2,025,877	$81,100	14-4	30	$2,025,877	6.9600	$141,100	30	$0	$0	30	$627,500
16	CC	13378259	MANRIQUE ESTUPIÑAN FREDY LEONARDO	X	230301	30	$1,949,871	$312,000	EPS002	30	$1,949,871	$78,000	CCF40	30	$1,949,871	$78,000	14-4	30	$1,949,871	6.9600	$135,800	30	$0	$0	30	$603,800
17	CC	1095827892	MEDINA FLOREZ JHONATAN	X	23-14	30	$1,949,871	$312,000	EPS002	30	$1,949,871	$78,000	CCF40	30	$1,949,871	$78,000	14-4	30	$1,949,871	6.9600	$135,800	30	$0	$0	30	$603,800
18	CC	37843495	MONARES OLMEDOS ONEIDA	X	23-14	30	$1,999,613	$320,000	EPS002	30	$1,999,613	$80,000	CCF40	30	$1,999,613	$80,000	14-4	30	$1,999,613	6.9600	$139,200	30	$0	$0	30	$619,200
19	CC	1098682312	PABON MARTINEZ DANILO ANDREY	X	230001	28	$1,634,178	$261,000	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF40	28	$1,814,524	$72,600	14-4	28	$1,634,178	6.9600	$113,800	28	$0	$0	30	$513,800
20	CC	1098682312	PABON MARTINEZ DANILO ANDREY	X	230001	2	$116,727	$14,100	EPS005	2	$116,727	$0	CCF40	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	0.0000	$0	2	$0	$0	0	$14,100
21	CC	1098682052	PARDINA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	X	23-14	30	$8,540,000	$1,400,100	EPS005	30	$8,540,000	$341,600	CCF40	30	$8,540,000	$341,600	14-4	30	$8,550,000	6.9600	$595,000	30	$0	$0	0	$2,794,300
22	CC	13507319	PINILLA JERRY ALEXANDER	X	221001	30	$1,984,491	$317,600	EPS002	30	$1,984,491	$79,400	CCF40	30	$1,984,491	$79,400	14-4	30	$1,984,491	6.9600	$138,200	30	$0	$0	31	$614,600
23	CC	1098701234	RESTREPO GARCIA MICHAEL JOSEPH		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.9600	$121,900	30	$0	$0	30	$542,300
24	CC	1098716447	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES	X	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.9600	$278,400	30	$0	$0	30	$1,238,400
25	CC	1098640000	SEPULVEDA PARRA OLGER	X X	230301	30	$2,275,418	$364,000	EPS005	30	$2,271,418	$91,000	CCF40	30	$2,271,418	$91,000	14-4	30	$2,275,418	6.9600	$158,300	30	$0	$0	31	$704,300
26	CC	1123087663	VILLAMIZAR ARDILA JONATHAN	X	230301	30	$2,025,877	$324,200	EPS002	30	$2,025,877	$81,100	CCF40	30	$2,025,877	$81,100	14-4	30	$2,025,877	6.9600	$141,100	30	$0	$0	31	$627,500
27	CC	1098673915	ZAMBRANO LIZARAZO FABIAN LEONARDO	X	23-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS044	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	6.9600	$188,000	30	$0	$0	31	$836,000
Total			Afiliados(393)				$68,560,231	$9,771,600			$62,311,135	$2,486,700			$60,653,391	$2,427,000			$62,311,137		$3,606,000		$0	$0		$16,062,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$9,771,600	$0	$0	$9,771,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$781,600	$0	$0	$781,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,498,800	$0	$0	$3,498,800
PORVENIR	230001	800,224,808	8	8	$2,748,200	$0	$0	$2,748,200
PROTECCION	230001	800,229,739	0	8	$2,743,000	$0	$0	$2,743,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,676,000	$0	$0	$3,676,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$3,676,000	$0	$0	$3,676,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,427,000	$0	$0	$2,427,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	26	$2,427,000	$0	$0	$2,427,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				26	$2,488,700	$0	$0	$2,488,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$108,000	$0	$0	$108,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC34	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$327,900	$0	$0	$327,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$79,200	$0	$0	$79,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$170,400	$0	$0	$170,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$405,500	$0	$0	$405,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$76,600	$0	$0	$76,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$563,600	$0	$0	$563,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$637,400	$0	$0	$637,400
TOTAL				26	$18,363,300	$0	$0	$18,363,300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:20:49 AM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 10801866341

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		
Documento	NI900688241	**Dirección**	CL 74A #22 - 31 OF 101 ED SAN FELIPE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3045466736
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700657
Total Afiliados	29	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días APO	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Bienestar	Total
CC 1040037150	DARLIN MARTIN CRUZ REY	01	00																	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.000	EPS041	$ 1.750.905	$ 70.100	0.000	$ 1.750.905	$ 14.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1020140624	ARLEY JESUS CANTE MENDOZA	01	00	X																27	30	27	27	(25-10) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.000	EPS037	$ 1.575.815	$ 63.100	0.000	$ 1.575.815	$ 12.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1007539883	KAROL YULIANA CELIS CUEVAS	01	00							X										30	30	30	30	(25-10) PORVENIR	$ 2.345.455	$ 471.000	EPS010	$ 2.345.455	$ 111.000	0.000	$ 2.345.455	$ 205.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.345.455	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1020803871	ALEXANDRA CARDENAS MANTILLA	01	00							X		X								30	30	30	30	(25-20) PROTECCION	$ 2.170.000	$ 340.000	EPS041	$ 2.170.000	$ 97.000	0.000	$ 2.170.000	$ 121.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.170.000	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1007784788	JULIAN ANDRES PALACIO CARDOZO	01	00							X		X								30	30	30	30	(25-10) PORVENIR	$ 2.243.835	$ 385.700	EPS005	$ 2.243.835	$ 99.800	0.000	$ 2.243.835	$ 195.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.243.835	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1014248844	ANGIE JULIANNE SANCHEZ SILVA	01	00							X										30	30	30	30	(25-20) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	EPS037	$ 3.000.000	$ 133.000	0.000	$ 3.000.000	$ 312.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.000.000	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1020736025	BADILLO RINCON GOMEZ	01	00																	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 220.000	EPS002	$ 1.400.000	$ 59.500	0.000	$ 1.400.000	$ 151.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.400.000	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1020736025	BADILLO RINCON GOMEZ	01	00										L							3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 261.818	$ 40.700	EPS002	$ 261.818	$ 11.100	0.000	$ 261.818	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 261.818	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098661987	CATERINE SELENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00							X										30	30	30	30	(25-20) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 483.000	EPS010	$ 2.300.000	$ 100.300	0.522	$ 2.300.000	$ 13.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.300.000	$ 100.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098662298	CRISTIAN DAVID FLAVIO ESTUPIÑAN	01	00	X																28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.350.840	$ 270.000	EPS037	$ 1.350.840	$ 57.800	0.000	$ 1.350.840	$ 117.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.350.840	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098661918	CAMILO ANDRES RUEDA CADENA	01	00							X										30	30	30	30	(25-20) PROTECCION	$ 4.200.000	$ 672.000	EPS005	$ 4.200.000	$ 168.000	0.522	$ 4.200.000	$ 22.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098672078	MICHAEL GIUSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00																	30	30	30	30	(25-20) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS005	$ 1.750.905	$ 70.100	0.000	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098672181	CARMEN JACKTA ALVARINO POLO	01	00																	30	30	30	30	(25-10) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS010	$ 1.750.905	$ 70.100	0.000	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098702426	RUBEN DAVID DELGADO PALACIO	01	00							X		X								30	30	30	30	(25-20) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	EPS037	$ 3.500.000	$ 156.000	0.000	$ 3.500.000	$ 175.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098704231	DIANA MELISSA TARAZONA RAMIREZ	01	00							X										27	27	27	27	(25-20) PORVENIR	$ 2.250.000	$ 360.000	EPS046	$ 2.250.000	$ 90.000	0.000	$ 2.250.000	$ 189.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098704231	DIANA MELISSA TARAZONA RAMIREZ	01	00										X							3	3	3	3	(25-20) PORVENIR	$ 150.000	$ 25.700	EPS046	$ 150.000	$ 6.000	0.000	$ 150.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 150.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098704231	DIANA MD. ISA TARAZONA RAMIREZ	01	00										X							1	1	1	1	(25-20) PORVENIR	$ 83.334	$ 13.400	EPS046	$ 83.334	$ 3.400	0.000	$ 83.334	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098706284	ANGIE DANIELA MARTES [illegible]	01	00							X										30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 570.000	EPS037	$ 3.800.000	$ 144.000	0.000	$ 3.800.000	$ 350.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.800.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098802099	JORGE BRITO MENDEZ	01	00							X		X								30	30	30	30	(25-20) PROTECCION	$ 2.390.532	$ 376.700	EPS002	$ 2.390.532	$ 94.700	0.000	$ 2.390.532	$ 184.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.390.532	$ 94.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Línea de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4445534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146660 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/03/2026 | Empresa NI900688241 DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | Planilla Nro: 1089186341 | Periodo Cotización: febrero de 2026 | Periodo Servicio: marzo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Días Cotizados	Novedades	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	230301 PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS037 NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	230301 PORVENIR	$ 116.727	[illegible]	EPS037 NUEVA EPS S.A.	$ 116.727	$ 0	0,000	[illegible]	$ 0	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	231001 COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	EPS002 SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	230301 PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS037 NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	25-14 COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS037 NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	25-14 COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS005 EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	231001 COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	EPS002 SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	SIN-AFI NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	230301 PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS002 SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	SIN-AFI NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	25-14 COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS010 EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	230201 PROTECCION	[illegible]	[illegible]	EPS002 SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	230301 PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS010 EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	30	[illegible]	230301 PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS002 SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF68 COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 65.275.194	$ 69.601.914	$ 69.601.914	$ 66.609.733	$ 15.606.900	$ 2.780.800	$ 4.084.600	$ 2.723.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.212.000	$ 0	$ 20.212.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4449934 - Cali: 602 5940877 - Medellín: 604 5149869 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255253-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de san juan 2	3185388886	rsuhtapalma@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – tarifa de 200	ASOMFLOR	IMPACORP	SANTANDER	BUCARAMANGA		N

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DMA/REAL)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DMA/REAL)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
		5139/2885	16/02/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$10,447,758	$3,889,108	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	58.400	0		0		0	3	200	0	58.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.100	0		0		0	3	200	0	80.300	1
EPS041	HUDIA E.P.S. S.A. MEV	900156264-2	232.700	0		0		0	3	900	0	233.600	4
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	60.700	0		0		0	3	200	0	60.900	1
EPSC24	EPS-S Colsalud	900226715-3	68.400	0		0		0	3	200	0	68.600	2

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229739-4	1.906.200	0	0	0	0	3	3.000	0	1.909.200	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800256796-0	868.300				868.300	3	1.700	870.000			0.000	870.000	9

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cajasan	890300108-1	498.900	3	1.000	499.900	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
ESAL				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICBF, LMA, ESAP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	480.200	606.200
Pensión	1	1.905.200	1.909.200
Riesgos Laborales	1	868.300	870.000
CCF	1	498.900	499.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.881.300	3.889.108

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255353-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -72b-34 villa de don juan 2	3165366080	maringo84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	6 – mayor de 200	LAGOS	CONSORCIO	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		5425574	09/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$12,153,570	$3,787,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	280,900	0		0		0	0	0	0	280,900	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.	900156264-2	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
ESSG24	EPS-S Coosalud	900226715-3	140,200	0		0		0	0	0	0	140,200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900336836-9	1,946,300	0	0	0	0	0	0		1,946,300	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Base Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800251440-6	948,900				948,900	0	0	948,900			8,400	948,900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF80	Colsubsidio	860000184-1	487,000	0	0	487,000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	487,000	487,000
Pensión	1	1,946,300	1,946,300
Riesgos Laborales	1	948,900	948,900
CCF	1	487,000	487,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3,787,400	3,787,400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	901353293-3	PERAMANGA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13a -13a-34 villas de don juan 2	3165388388	martinpb84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	LASOS	CONSORCIO	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64243745	09/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$12.163.570	$3.797.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estudio	Extranjero sin cédula de extranjería	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días	Cotización	IBC AFP	Días	Cotización	Valor total de Aportes	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Empleador	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización	Clase ARL	IBC ARL	Días	Centro de Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1065771600	RIVERA VILLALOBOS HUBER DAVID	X	X		X															30	1.755.606	1.755.606	30	1.755.606	351.100	263.400	87.700	0	0	EPS041	1.755.606	30	351.100	14-11	1.755.606	30	5	421.300	CCF08	1.755.606	30	75.100	0	0	0	0	0
2	CC 1065647135	CARDENAS BONILLA JOAN JAIRO	X	X		X															30	1.755.606	1.755.606	30	1.755.606	351.100	263.400	87.700	0	0	EPS036	1.755.606	30	351.100	14-11	1.755.606	30	5	421.300	CCF08	1.755.606	30	75.100	0	0	0	0	0
3	CC 1005900084	GALVIS DURAN DIEGO ALEJANDRO	X	X		X															30	1.755.606	1.755.606	30	1.755.606	351.100	263.400	87.700	0	0	EPS037	1.755.606	30	351.100	14-11	1.755.606	30	5	421.300	CCF08	1.755.606	30	75.100	0	0	0	0	0
4	CC 1100965258	CARDENAS PANTILLA DEIVIN JESID	X	X		X															30	2.631.012	2.631.012	30	2.631.012	561.400	421.050	140.350	0	0	EPS031	2.631.012	30	561.400	14-11	2.631.012	30	5	673.600	CCF08	2.631.012	30	112.400	0	0	0	0	0
5	CC 1.095.951	SUAREZ MANRIQUE JUAN ANGEL	X	X		X															30	1.755.606	1.755.606	30	1.755.606	351.100	263.400	87.700	0	0	EPS041	1.755.606	30	351.100	14-11	1.755.606	30	5	421.300	CCF08	1.755.606	30	75.100	0	0	0	0	0
6	CC 91080579	CARDENAS JOHN JAIRO	X	X		X															30	1.755.606	1.755.606	30	1.755.606	351.100	263.400	87.700	0	0	EPS037	1.755.606	30	351.100	14-11	1.755.606	30	5	421.300	CCF08	1.755.606	30	75.100	0	0	0	0	0
7	CC 91148778	SARDINAS LEMUS LUIS DARIO	X	X		X															30	975.453	975.453	15	146.318	0	0	0	0	0	EPS037	975.453	15	32.515	14-11	975.453	15	5	61.000	CCF10	975.453	15	28.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO N° 2. DOCUMENTOS DE INGRESO

UNISALUD IPS
NIT: 900349424-3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



Nº 4.823

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cédula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
PERTUZ JIMENEZ MATHIUS SANTIAGO	MASCULINO	19 AÑOS 2 MESES 12 DÍAS	CC Tipo	1048283845 Número

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL: SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	.....	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	DEJAR DE FUMAR
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HÁBITOS SALUDABLES
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(s) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(s) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 72162284 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R. M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
Y1677E1K4823

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: PERTUZ JIMENEZ MATHIUS SANTIAGO

CC: 1048283845

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9046270 correspondiente a la empresa Consorcio Estabilizacion Floridablanca.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
MATHIUS SANTIAGO PERTUZ JIMENEZ	C.C.	1.048.263.845	02/02/2026	RIESGO V	6.960	PRINCIPAL

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el sábado 31 de enero de 2026 a las 11:56:14 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/02/2026, el empleador CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA identificado con NIT número 901982775 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9899435	02/02/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1048283845	MATHIUSSANTIAGO PERTUZ JIMENEZ	1750905	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2026-02-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MATHIUS SANTIAGO PERTUZ JIMENEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1048283845**, se encuentra afiliado/a desde **30/10/2025** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de febrero de 2026.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

CERTIFICACIÓN

Fecha: 17/02/2026

Nombre: MATHIUS SANTIAGO PERTUZ JIMENEZ
Identificación: 1048283845
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**, NIT 901982775, desde el 02 de febrero del 2026 con fecha de vinculación laboral del 02 de febrero del 2026. Y no cuenta con grupo familiar a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida González Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE	**Mathius Santiago Pertuz Jimenez**	TIPO DE ID	**Cédula de Ciudadanía**	N° ID	**1.048.283.845**
DIRECCIÓN	**Mz 2 Cs 12 B Brr Asomiflor, Floridablanca**		TELEFONO	**3215427993**	
CARGO	**Ayudante de Obra**		PROYECTO	**CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**	
TIPO DE CONTRATO	**Obra o labor Contratada**	ARL	**AXA COLPATRIA**		
JEFE INMEDIATO	**Oscar Andres Sanchez Jeres**		FECHA	**2026-02-02**	

ETAPA INDUCCIÓN x REINDUCCIÓN

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLITICAS SIG













5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO



15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

He recibido a satisfacción la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipulados por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Quien Realiza la inducción

Firma del Trabajador

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Mathius Santiago Ramos Jimenez
Número de Documento	1.048.283.045
Email	mathiusramosjimenez@gmail.com
Fecha	17/03/2026 a las 11:32
IP	181.95.34.78
Token	48e8345dadcf6ae042 1ab8a1e329ed5

Esta QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF previo al cierre de las firmantes.

UNISALUD IPS
NIT: 900349424-3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 4.822

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN				TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador: SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
HERRERA REYES JORGE LEONARDO	MASCULINO	28 AÑOS 6 MESES 1 DÍAS	CC (Tipo)	1095835301 (Número)

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
COOSALUD	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO — PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 72162294 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R. M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
M1677S1Y4822

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: HERRERA REYES JORGE LEONARDO

CC: 1095835301

Software para el sector salud - www.bkfile.com.co

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9046270 correspondiente a la empresa Consorcio Estabilizacion Floridablanca.

Nombre	T. I	Número de identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JORGE LEONARDO HERRERA REYES	C.C.	1,095,835,301	02/02/2026	RIESGO V	6.960	PRINCIPAL

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de Internet www.axacolpatria.co, el sábado 31 de enero de 2026 a las 11:52:23 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512520 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicado	Fecha de Radicado

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE (Use los instructivos que se encuentran antes del formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Usuario: A. Afiliado ☐ B. Reporte de novedades ☒
2. Tipo de afiliación: A. Individual ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ — Cotizante o Cabeza de familia ☒ — Beneficiario o afiliado adicional ☐ — D. Otro ☐
3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Pensionado: SI ☐ NO ☐
5. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cónyuge ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐
6. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
7. Código (lo registra en la EPS)

II. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique a afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres: Herrera (Primer apellido) | Reyes (Segundo apellido) | Jorge (Primer nombre) | Leonardo (Segundo nombre)
9. Tipo de documento de identidad: CC
10. Número del documento de identidad: 1.095.836.301
11. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☒
12. Sexo identificación: I ☐ NB ☐ Otro ☐ F ☐ M ☒
13. Nacionalidad:
14. Lugar de nacimiento: País | Departamento | Municipio
15. Fecha de nacimiento:

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos particulares)

16. Etnia:
17. Cultura Sorda:
18. Discapacidad: SI ☐ NO ☐ — Categoría de discapacidad:
19. Tiene cuidador (a): SI ☐ NO ☐
20. Clasificación SISBEN: Nivel | Grupo
21. Grupo de población especial:
22. Administradora de Riesgos Laborales – ARL: Axa Colpatria
23. Administradora de Pensiones: Porvenir
24. Cuenta Bancaria de cotizante – No.: 1.790.905
25. Tarifa Contribución Solidaria:
26. Residencia: Dirección: cl 45 # 3-32 | Teléfono Fijo: | Teléfono celular: 3171823846 | Correo electrónico: Jorge.leoreyes27@gmail.com
Departamento: Santander | Municipio / Distrito: Floridablanca | Centro Poblado: Lagos II | Zona: Urbana ☒ Rural ☐ | Estrato: | Predio: Dispersa ☐ Rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
(Para todos los efectos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. Apellidos y nombres: Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
28. Tipo de documento de identidad | 29. Número del documento de identidad | 30. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☐ | 31. Sexo identificación: I ☐ NB ☐ Otro ☐ F ☐ M ☐ | 32. Nacionalidad | 33. Lugar de nacimiento: País | Departamento | Municipio | 34. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres: Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
B1
B2
B3
B4
B5

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico: Femenino	Masculino	40. Sexo identificación: F	M	T	NB	Otro	Cual	41. Lugar de nacimiento: País	Departamento	Municipio	42. Fecha de nacimiento
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Pertenencia étnica	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene cuidador: SI	NO	48. Clasificación SISBEN: Nivel	Grupo	49. Discapacidad: SI	NO	Categoría de discapacidad	50. Condición de cotizante: SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/ Distrito	Dirección Municipal	Zona: Nombre Poblado	Zona: Estrato	Zona: Rural	Teléfono Fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (lo registra por la EPS)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Ocupación	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | 54. Código (lo registra por la EPS)

C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA AUTORIZADA, DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social: Cons. Estab Floridablanca
56. Tipo de documento de identificación: NIT
57. Número del documento de identificación: 901.982.775
58. Tipo de aportante o pagador de cotizantes (lo registra por la EPS)
59. Dirección: Cra 39 # 51-31
Teléfono Fijo o Celular: 3176133309
Correo electrónico: floridablanca@gmail.com
Firma autorizada: Sader
Huella: D/4d

II. REPORTE DE NOVEDADES

10. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identificación.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la vinculación en la EPS.
  Código ☐
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero Código ☐
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- ☐ 11. Inactivación EPS reporte al país.
- ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 15. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 30. Reporte de Fallecimiento del Cotizante o Cabeza de Familia.
- ☐ 31. Reporte del cobrable de prestación al Cotizante.
- ☐ 32. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- ☐ 33. Reporte de la calidad de Pensionado.
- ☐ 40. Ingreso a Cotización Solidaria.
- ☐ 41. Retiro de Cotización Solidaria.

III. DATOS ACTIVIDAD QUE ORIGINA REPORTE DE LA NOVEDAD

21. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	23. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☐	24. Sexo identificación: F ☐ M ☐ T ☐ NR ☐ Otro ☐ Cual	25. Fecha de nacimiento

26. EPS a trasladar	28. Fecha de inicidad	27. Afiliado de traslado Código	29. Caja de Compensación Familiar a Pagador de Pensiones
	02/02/2026		

IV. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 60. Declaramos la dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron la entrega de los documentos que acreditan los condición de beneficiarios.
- ☐ 72. Declaración de no incorporación del cónyuge, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en otra Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☐ 73. Autorización para que la EPS utilice y almacene datos y copia de la tarjeta oficial del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- ☐ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular suministrado.
- ☐ 77. Aceptación de las condiciones para acceder a la Cotización Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- ☐ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las cartas en Corresponsales Solidaria, según la vigencia del Estado vigente.

V. COTIZACIÓN SOLIDARIA

70. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte las personas de su grupo familiar que no tuvo cargo del pago de la Cotización Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

VI. FIRMAS

Jorge Herrera

31. Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

Edgar Gomez

32. Apoderado o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

VII. ANEXOS

- ☐ 80. Anexo copia del documento de identidad

Cantidad de documentos de identidad anexos:	CN	RC	TI	CC	RE	CE	CD	SC	PT

- ☐ 81. Copia del soporte de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.5.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- ☐ 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 95. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes, en la que conste la calidad de beneficiario e ordenen la afiliación de oficio.

Total Anexos ☐

VIII. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

33. Identificación de la entidad territorial: Código del municipio	Código del departamento	34. Nombre de la Institución

IX. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

35. Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	38. Firma del funcionario

36. Fecha de radicación	37. Fecha de validación

Observaciones

Recuerda que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VI del formulario

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JORGE LEONARDO HERRERA REYES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.095.835.301**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

CERTIFICACIÓN

Fecha: 17/02/2026

Nombre: JORGE LEONARDO HERRERA REYES
Identificación: 1095835301
Categoría: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente empleador **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**, NIT 901982775, desde el 02 de febrero del 2 con fecha de vinculación laboral del 02 de febrero del 2026. Y en su grupo familiar tiene como personas a cargo

RELACIÓN BENEFICIARIOS				
TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARENTESCO	CATEGO
CC	1005322402	TORRES URIBE IVON STEFFANY	Cónyuge o compañera permanente	A
RC	1239090312	HERRERA TORRES SAMUEL DAVID	HIJO	A

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co
Avenida González Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000
Bucaramanga, Santander
Carrera
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

UNISALUD IPS
NIT: 900349424-3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



N° 4.825

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:
SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
RAMIREZ FLOREZ FABIAN ALBERTO	MASCULINO	33 AÑOS 10 MESES 24 DÍAS	CC Tipo	1098718885 Número

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
SANITAS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 72162284 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R.M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
K1677Q1W4825

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: RAMIREZ FLOREZ FABIAN ALBERTO

CC: 1098718885

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9046270 correspondiente a la empresa Consorcio Estabilizacion Floridablanca.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
FABIAN ALBERTO RAMIREZ FLOREZ	C.C.	1,098,718,865	02/02/2026	RIESGO V	6.960	PRINCIPAL

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de Internet www.axacolpatria.co, el sábado 31 de enero de 2026 a las 11:43:33 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512020 ó en Bogotá 4235757.

Gmail NOMINAS O41 <nominas2023o41@gmail.com>

CERTIFICADO DE RADICACION EPS SANITAS CC - 1098718865

1 mensaje

Afiliaciones EPS Sanitas <operaciones@epssanitas.notify-it.com> 5 de febrero de 2026 a las 10:29 a.m.
Para: nominas2023o41@gmail.com

Asunto : **CERTIFICADO DE RADICACION**

Señores :

Nos permitimos **CERTIFICAR** el recibido de la novedad para :

TIPO	DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	IBC	NIT
CC	1098718865	RAMIREZ	FLOREZ	FABIAN	ALBERTO	2026-02-02		1750905	901982775

Enviado para tramite de novedad web radicada el 2026-02-05 con numero de radicado : **7700785** la cual se encuentra en validacion.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones
EPS SANITAS

Usted ha recibido este correo porque se encuentra registrado como miembro de alguno de nuestros clientes en notificalo.com.

Para ***darse de baja*** del recibo de este tipo de correos, por favor haga clic aqui.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FABIAN ALBERTO RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.718.865**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 5 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

CERTIFICACIÓN

Fecha: 17/02/2026

Nombre: FABIAN ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
Identificación: 1098718865
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**, NIT 901962775, desde el 02 de febrero del 2026 con fecha de vinculación laboral del 02 de febrero del 2026. Y no cuenta con grupo familiar a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida Gonzalez Valencia 52 - 59
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

UNISALUD IPS
NIT: 900349424-3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

Nº 4.821

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 (DÍA)	01 (MES)	2026 (AÑO)	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) (Ciudad)	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:
SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
CUELLAR HERNANDEZ ANDRES FERNANDO	MASCULINO	37 AÑOS 11 MESES 26 DÍAS	CC (Tipo)	1098649173 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE VISUAL	HACER DEPORTE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 72162294 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R. M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
C1677I1O4821

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: CUELLAR HERNANDEZ ANDRES FERNANDO

CC: 1098649173

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9046270 correspondiente a la empresa Consorcio Estabilizacion Floridablanca.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
ANDRES FERNANDO CUELLAR HERNANDEZ	C.C.	1,098,649,173	02/02/2026	RIESGO V	6.960	PRINCIPAL

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el sábado 31 de enero de 2026 a las 11:48:26 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

nueva eps

CERTIFICA

El(La) Señor(a) ANDRES FERNANDO CUELLAR HERNANDEZ identificado(a) con CC 1098649173 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**04/01/2014**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**U.T. FOSCAL-ESCANOGRAFIA S.A-FLORIDABLANCA-TR2**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 12 días del mes de febrero del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANDRES FERNANDO CUELLAR HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.649.173**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 4 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

CERTIFICACIÓN

Fecha: 17/02/2026

Nombre: ANDRES FERNANDO CUELLAR HERNANDEZ
Identificación: 1098649173
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**, NIT 901982775, desde el 02 de febrero del 2026 con fecha de vinculación laboral del 02 de febrero del 2026. Y no cuenta con grupo familiar a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida González Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

UNISALUD IPS
NIT: 900349424 - 3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



N° 5.037

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACION DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	02 MES	2026 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:
SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
REATIGA GONZALEZ EDUAR ALONSO	MASCULINO	34 AÑOS 0 MESES 0 DÍAS	CC (Tipo)	1110197448 (Número)

Cargo
ALMACENISTA

EPS	AFP	ARL
FAMISANAR	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO — PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEMUSCULAR	✓
COLESTEROL TOTAL	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	SVE CARDIOVASCULAR	HACER DEPORTE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Dr. Víctor R. Ramírez M. MÉDICO - ESP. SALUD OCUPACIONAL R.M. 1104 LIC. S.O. 3941

Nombre: CC: 72182294 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R. M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
K1677Q1W5037

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: REATIGA GONZALEZ EDUAR ALONSO

CC: 1110197448

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9046270 correspondiente a la empresa Consorcio Estabilizacion Floridablanca.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
EDUAR ALONSO REATIGA GONZALEZ	C.C.	1,101,597,448	09/02/2026	RIESGO V	6.960	PRINCIPAL

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

Famisanar
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9012665738
9012665738

No. Radicado EPS: 30283561

Fecha de Radicación: 10 02 2026

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código
A. Traslado [ ] B. Novedad [X]	A. Individual [ ] Cotizante o cabeza de familia [X] Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Conyuge [ ] C. Hijo(a) [ ] D. Padres [ ]	A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [X]	SI [ ] NO [ ]	A. Cotizante [X] B. Cónyuge [ ] C. Beneficiario [ ] D. Cabeza de familia [ ] E. Afiliado adicional [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a cargo de la EPS)

II. AFILIACIÓN - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: REATIGA	Segundo Apellido: GONZALEZ	Primer Nombre: EDUAR	Segundo Nombre: ALONSO

9. Tipo de documento de identidad	10. Número de documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	1101597448	Femenino [ ] Masculino [X]	F [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
				06 02 1992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBEN	20. Clasificación SISBEN	21. Grupo de población especial
		SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [ ]	Nivel: Grupo:	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA		$1.900.000	

26. Residencia			
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
Departamento / Distrito: Municipio / Distrito:	Localidad / Comuna:	Cabecera Municipal [ ] Rural Disperso [ ] Centro Poblado [ ] Resto Rural [ ] Zona:	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
				Femenino / Masculino	F NB Otro Cual	País / Departamento / Municipio	D D M M A A A A
01							
02							
03							
04							
05							

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBEN SI / NO	48. Clasificación SISBEN Nivel / Grupo	49. Discapacidad SI / NO / Categoría discapacidad	50. Incapacidad permanente SI / NO
01								
02								
03								
04								
05								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabecera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (si aplica para EPS)
01									
02									
03									
04									
05									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
01			
02			
03			
04			
05			

55. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
01		
02		
03		
04		
05		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

56. Nombre o razón social	58. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	59. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO ESTABILIZACION	NT	901982775	

60. Ubicación				
CARRERA 39 51 31 AP 2405	30127656	Teléfono	Correo electrónico	BUCARAMANGA (Municipio / Distrito)	SANTANDER (Departamento)

VI. REPORTE DE NOVEDADES

61. Tipo de Novedad: 1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Inscripción EPS cabeza de familia [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Movilidad A. Régimen Contributivo [X] 15. Régimen Subsidiado [ ]
16. Traslado A Mismo Régimen [ ] 17. Diferente Régimen [ ] 18. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia [ ] 19. Reporte del Estado de protección al cesante [ ]
20. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 21. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 22. Ingreso a Contribución Solidaria [ ] 23. Retiro de Contribución Solidaria [ ]

VII. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

24. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] Otra [ ] Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Ibión de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	09 02 2026	Código	

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

IX. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

XI. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional. 81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Pilas

X. ANEXOS

82. Anexa copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] TOTAL ANEXOS [ ]

83. Copia del Acta de incapacidad permanente emitida por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numerales 4 y 5 del artículo 2.1.7.2 del Decreto 780 de 2016. [ ]
90. Certificado de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de los tribunales competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del departamento	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	96. Firma del funcionario

98. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	CARGO: ALMACENISTA

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VIII del formulario.

Comfenalco SANTANDER
Un proyecto para ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado Nº:
Fecha de creación : 11/02/2026 08:25:22 AM
Fecha de radicación : 11/02/2026 08:25:00 AM
ITD_20260211080[illegible]_1101597448

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901982775 0	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Sucursal	Agencia
PRI - CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.101.597.448	2019/03/26	SANTANDER	SAN ANDRES	1992/02/06

Nombres y apellidos			
EDUAR	ALONSO	REATIGA	GONZALEZ

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	CR 58 CL 10 MANZ C CASA 30	PORTAL DE JERICO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
FLORIDABLANCA	SANTANDER	URBANA		3143734026

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
REATIGAEDUAR@GMAIL.COM	MEDIA (10° A 11°)

3. INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/02/09	

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	1,900,000		1,900,000

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
FLORIDABLANCA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cual Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M/F o HE	Parentesco	¿Estudiante? Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NR) No reporta

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Nieto(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida Gonzalez Valencia No. 52-65 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607-6579800, para que en ejercicio, ejecutarse, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, son consciente que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS, y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos son sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco bastardee los de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la Afiliación en Comfenalco Santander.

Sellar trabajador:
Conservar esta copia como soporte del trámite de radicación de su novedad.

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA
Firma del empleador

Número documento empleador 901982775

EDUAR ALONSO REATIGA GONZALEZ
Firma del trabajador

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

CERTIFICACIÓN

Fecha: 02/03/2026

Nombre: EDUAR ALONSO REATIGA GONZALEZ
Identificación: 1101597448
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**, NIT 901982775, desde el 11 de febrero del 2026 con fecha de vinculación laboral del 09 de febrero del 2026. Y no cuenta con grupo familiar a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida González Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX 607 657 7000

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680020

Vigilado Supersubsidio

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91186107		ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 42 23	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1809000682	94998153	I	2026/03/03	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	1	$991,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0
1	CC	91186107	ORTIZ MIGUEL	03-04	30	$1,800,000	$288,000	Ophoto	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	Ne 11	30	$1,800,000	$78,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0

2026/03/04 03:47 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91186407		ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 4E 53	BUCARAMANGA-SANTANDER	6935050	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000682	9699815703	I	2026/03/03	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	1	$591,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$200	$0	$288,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$288,000	$200	$0	$288,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,300	$100	$0	$78,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,300	$100	$0	$78,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$200	$0	$225,200
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$225,000	$200	$0	$225,200
TOTAL				1	$591,300	$500	$0	$591,800

2026/03/04 03:47 PM

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-05, 02:51:26 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080181608

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202603

PAGADA 2026-03-05 14:46:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONEXION SEGURA SAS				
Documento	NI 901460651	**Dirección**	CL 28 #19 - 22 BARRIO ALARCON		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3007630672		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	RAMIREZ CORTES LUZ MARINA	**Identificación**	CC 40375327		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91237509		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ CASTILLO LUIS EDUARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]		F	$ 1.750.905	230301		16%	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	4	4.350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	[illegible]	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD MIA EPS046	ARL SURA	CAJASAN	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098636705	RUBEN DARIO MANTILLA ACEROS		CL 4A SUR 21 27 P 3	3223468865	rdmatur1505@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	GIRÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		99994808	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$1,280,997	$307,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.580	0		0		0	0	0	0	160.580	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	205.500	0	0	0	0	0	0		205.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800256706-5	55.980				55.980	0	0	55.980			500	55.980	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Cooperativa Confiar	860001679-7	51.400	0	0	51.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
25.700	0	0	25.700	1
ICBF				
38.600	0	0	38.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICBF, SENA, ESAP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	160.580	160.580
Pensión	1	205.500	205.500
Riesgos Laborales	1	55.980	55.980
CCF	1	51.400	51.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	38.600	38.600
MEN	0	0	0
SENA	1	25.700	25.700
TOTALES	6	537.660	537.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	GENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098869705	RUBEN CARDO MANTILLA ACEROS		CL 4A SUR 21 27 P 3	3223468880	rdmatu1505@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Dependiente			SANTANDER	GIRÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD VPT
		[illegible]	[illegible]	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$1,283,997	$837,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero sin cédula	Actividad Alto Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Otra	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Obligado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC CPS	Días	Cotización Vol / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC [illegible]	MUÑOZ MUÑOZ EDINSON ALEXANDER	1	X			X															25-14	1,283,997	22	205,500	0	0	0	0	EPS021	1,283,997	22	190,500	14-01	1,283,997	22	4	30,800	CCF140	1,283,997	22	51,400	1,283,997	25,700	30,800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO N° 04. MAQUINARIA Y VOLQUETAS



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX140LC

SERIE:
CEBAA-006876

MOTOR:
DL06C424373E00

MODELO:
2015

MQ-002
EXCAVADORA
DX140LC

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 16# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

15/09/2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 9983

No. DE REGISTRO MC031935	MARCA DOOSAN	LINEA DX140LC	AÑO MODELO 2015
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE EXCAVADORA		No. SERIE CSBAA-006976
COLOR(ES) NARANJA	No. MOTOR DL08C424973E00		RODAJE CRUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14000 Kg	2775 mm	2590 mm	7690 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.840.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-02-2016	10-02-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352015000189045	08/06/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000002438

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2015**

Espacio reservado para la DIAN (antes de imprimir este formulario en cumplimiento del numeral 4)

4. Número de formulario

352015000183045-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890047657 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: FRACO DIDACOL S A S

23. Dirección: AV EL DORADO 78 20 | 24. Teléfono: 4238500 | 25. Cód. Admón.: 35 | 26. Cód. Ope: 11 | 27. Cód. Ciudad Holdejo: 001

Declarante

31. Número de Identificación Tributaria (NIT): 835000086 | 32. DV: 7 | 33. Razón social del declarante exterior: AGENCIA DE ADUANAS NHORA GARCIA DIAZGRANADOS COMPAÑIA LTDA N | 37. Tipo usuario: 28 | 38. Cód. usuario: 479

39. Número documento de identificación: 56732549 | 40. Apellidos y nombre: MIRANDA MINOTA LIMBANIA

41. Clase declarante	42. Tipo declaración	43. Cód.	44. No. Formulario anterior	45. Año - Mes - Día	46. Cód. Admón.	47. Declaración de Exportación	48. Año - Mes - Día	49. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

50. Cód. lugar ingreso de las mercancías	51. Cód. Depósito	52. Manifiesto de carga	53. Año - Mes - Día	54. Documento de transporte	55. Año - Mes - Día
BUN	997	No. 907000027	2015 - 06 - 06	No. KR1632101	2015 - 04 - 22

56. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 57. Ciudad: INCHEON | 58. Cód.País Exterior: 190

59. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJOONG-RO,DONG-GU, INCHEON,KOREA | 60. E-mail: yuri1.lee@doosan.com

61. No. de factura	62. Año - Mes - Día	63. Cód. país comprador/d'a	64. Cód. Moda Transporte	65. Código de Aduana	66. Cód. Depósito	67. Empresa transportadora	68. Tasa de cambio $ cop
IXB2915049270	2015 - 04 - 29	190	1	472	11	NAVES S.A.	2,549.97

S

69. Subpartida arancelaria	70. Cód. Complementación	71. Cód. Departamento	72. Cód. Modalidad	73. No. cuotas o meses	74. Valor cuota USD	75. Periodicidad del pago de la cuota	76. Cód. país de origen	77. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C235	XX	XXXX	XX	190	XXX

78. Forma de pago de la importación	79. Tipo de importación	80. Cód. país compra	81. Peso bruto kgs. cons.	82. Peso neto kgs. cons.	83. Código unidad	84. No. bultos	85. Suplementos	86. Cód. unidad mercantil	87. Cantidad cons.
02	01	190	28,000.00	28,000.00	PC	2	1	U	2.00

88. Valor FOB USD	89. Valor Flete USD	90. Valor Seguro USD	91. Valor Otros Gastos USD	92. Gastos no Base Seguros y otros gastos USD	93. Ajuste valor USD	94. Valor Aduana USD	95. Código régimen o tipo de	96. Número
164,674.00	13,492.70	33.30	0.00	13,526.00	0.00	188,200.00	X	XXXXXXXXXX

97. Cod. cláusu	98. Año	99. Pregrama No.	100. Cód. Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	428,904,954	0	0	0
IVA	16.00	428,904,954	68,625,000	0	0
Ad-valorem	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Surtax	0	0	0	0	
Recaro	0	0	0	0	
		Total	68,625,000		0

101. Observaciones de la mercancía: Para la declaración de importación a utilizar por los importadores, importadores de mercancías en viajeros, envíos y menajes de viajeros en viajeros, declarar el importe en este recuadro.

DO. 5486-8-15. MR. MORNING POST. PEDIDO. D015007-D015008. ARANCEL 0% DECONFORMIDAD CON EL DECRETO 1755 DE AGOSTO 13 DE 2015 . PRODUCTO: ENCAVADORA MARCA: DOOSAN, SIN REFERENCIA, MODELO: DX140LC, CON MOTOR MARCA DOOSAN, DIESEL, MODELO D10CU, BUCK 0.6 C .6M, BRAZO DE 2.5M, CUCHARON DE 0.6 M3, ZAPATAS DE 600MM, AÑO DE FABRICACION. 2.015, USO: PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CANT ETERAS Y MINERIA DESTINO: IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION CON AUTORIZACION, CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA S U NORMAL FUNCIONAMIENTO.SERIAL, CEBAR-006876, MOTOR. DL06G4243730D0, CHASIS. DHXCEBAAN90006876. COLOR. NARANJA. SERIAL, CEBA A-006944, MOTOR. DL06C5254210D0, CHASIS. DHXCEBAAKP0006944. COLOR. NARANJA. INFORMACION SEGÚN RECONOCIMI(continua al respaldo)

102. Valor pagos anticipados: 0	103. Recibo oficial de pago anticipo No.: XXXXXXXXXXXXXX	104. Fecha: XXXX XX XX
105. Espacio exclusivo para la DIAN - Aduana aforo Cuando se ignora Levante automático de hay declaración posterior	106. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	107. No. Autoadhesivo declaración 3520150001830 45 108. Fecha: 2015 06 06

109. Levante No. 352015001152080	110. Fecha 2015 - 06 - 06	Firma funcionario responsable	112. Nombre Limbania Miranda Minota C.C. 56.732.549 BTURA	111. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 0191101050878B
Fecha presentación 2015-06-06 14:39:00
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2015-06-06 15:40:29

20150619778459

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352015000183045-2
Subpartida : 8429520000

Continuación Declaración de Importación (Incluya marcas, accesorios y otros)

DATOS EN ETIQUETA DEL MOTOR DE LAS EXCAVADORAS,MARCA : DOOSAN,MODEL : D10GC,SERIALES NO : 424973 / 529421,OPTION : [illegible]
DATOS EN PLAQUETA DEL MOTOR DE LA EXCAVADORA,MARCA : DOOSAN, DOOSAN INFRACORE,DUTY DIESEL MODEL : D10GC,ENGINE DISPLACEMENT : [illegible]
,89 / 5,890L CH3 - COMPRESSION RATIO : 17,4:1POWER RATING : 74 KW / (100 PS) / 1850 RPM,INJECTION TIME : BTDC 20 - TDC [illegible]
,VALVE CLEARANCE : INTAKE / EXHAUST = 0.3 / 0.4 MM (COLD),ENGINE RPM - LOW IDLE SPEED / HIGH IDLE SPEED : 900 / 1950 [illegible]
RPM,DIESEL ENGINE : 950209-03575,EC TYPE APPROVAL NO : e4*97/68EA*2002/88*0143*01,DATOS EN PLAQUETA DE LA CUCHARA DE LA EXCAVADO
RA,MARCA : DOOSAN,MODEL : S2H14N1000,DOOSAN NO : 230104-01862A ,SERIALES : DN15C167 / DN15C270 ,CAPACITY M3/YD3 : 0.60 / 0.76,W
IDTH MM / INCH : 1000.00 / 39.37,WEIGHT KG / LB : 510.32 / 1125.05,DOOSAN INFRACORE CO LTD / 7-11, BUKSU-DONG, DONG-GU, INCHEO
, KOREA / MADE IN KOREA, PART NO : 950204-04791,DATOS PRINCIPALES EN LAS EXCAVADORASNUMERO EN EL MECANISMO DEL BRAZO : DHKCEBAAKP
2006876, DHKCEBAAKP0006944,NUMERO EN LA CUCHARA : DN15C167 06, DN15C270 06[illegible]

352015000183045-2

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Financiera

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)


IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-12-2024	03-12-2024	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	882024000025643	01/04/2024





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000006911

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 141608

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC710601	DEVELON	DX140LCA	2024
TIPO DE MAQUINARIA	**CLASE**	**No. SERIE**
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DXCC1PCUKR0020427
COLOR(ES)	**No. MOTOR**	**RODAJE**
NARANJA	DB58TIS350275E00	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14570 Kg	3065 mm	2690 mm	7590 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSORCIO CAUCE

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.555.581

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TS	MODELO
4308007289163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68[2]	
8,77	
HASTA	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]**Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2]**Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque sus tarifas no tengan la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o al Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios físicos, como electrónicos, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que esa procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3467505, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg(PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
99951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA





|T03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTW843

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2018

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89951806

NRO. CHASIS: LVBDHPES4JN005111

VIN: LVBDHPES4JN005111

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 05 26	2025 06 01	2026 05 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 713, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, suministre y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

WFQ116 | FOTON | BJ3122DEPPA-G2 | 2017

3.700 | AZUL | PÚBLICO

VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 5050

M | LVBDHPES3HV000030

LVBDHPES3HV000030 | N | LVBDHPES3HV000030 | N

MAQUIOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | INT. 900385507



141

322016000999112 | 10/05/2016 | 2

28/05/2016 | 31/05/2016

STRIA MORAL TTONTTE GIRON

LT02003929796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182369796

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/07/09

Fecha de vencimiento: 2026/07/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AUK191

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1978

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: 469GM2U0958160

NRO. CHASIS: AJF75U47735

VIN:

LÍNEA: F 750

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS C. ROJAS Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



SOAT

PREVISORA
SEGUROS

2025-02-19 | 2025-03-02 | 2025-03-01

	AUCTIT	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	3800	1979

2	FORD	FIJATON

	APT5947716		4.00

ROJAS QUINTERO, LUIS CARLOS		CC		LETRAS

ACTIVA	4	6843	0	UNO

323	1	$ 106301	$ 2100	$ 127950

263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68	
6,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

*Para los vigentes tarifas 109, 110, 120, 140, 160, 711, *112, 331, 720, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2044 de 2022.
*Para los demás tarifas se utilizan el (3).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023060668

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
AUK191	FORD	F 750	1978

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.800	AZUL	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NUMERO DE MOTOR
469GM2U0958160

REG N

VIN ******

NUMERO DE SERIE
AJF75U47735

REG N

NUMERO DE CHASIS
AJF75U47735

REG N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROJAS QUINTERO LUIS CARLOS

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1095930444

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
2030090

I/E
I

FECHA IMPORT.
08/09/1991

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
19/10/1993

FECHA EXP. LIC. TTO.
02/06/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STARIA TTO Y MOVILIDAD DEL MCPIO DE LEBRIJA

LT02006536599

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GYA607	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8200	**NRO. MOTOR:**	468TM2U422502
NRO. CHASIS:	CV112S32	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JAIME LIZARAZO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



Conexión: RUNT 2.0 SAS | Nit 901581597 6 | Colombia | | línea de atención nacional 01 8000 930981 | www.runt.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163868771

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-CIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/11

Fecha de vencimiento: 2026/09/11

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO MES DIA)	VIGENCIA DESDE (AÑO MES DIA) LAS 24 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL (AÑO MES DIA)
2025-02-21	2025-02-22	2026-02-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
10573000156580	GYA607	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	8200	1982

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LINEA VEHICULO: LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468TM2U422502	CV112532		8.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LIZARAZO SILVA, JAIME	3187343530	CC	91239679	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1277600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13	1 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68	2
8.77	
180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Todo usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre el SOAT, las autoridades de tránsito no le pueden exhibir en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Está atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas considerables, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el pago por todos los gastos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el único ante la aseguradora o el Fosyga se debe realizar la facturación prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A., informa que los datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encuentra a disposición a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDeDatos.jsp y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDeDatos.jsp a su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para alguna de las finalidades dadas, a través de la dirección de correo electrónico protecciondedatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente los principales fundamentos para las que estos tratamos sus datos personales así cuando SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. entre ellas para la ejecución de la póliza y vinculación como oferente; ejecución de contratos que celebre SEGUROS DEL ESTADO con sus terceros encargados, contratar y prevenir fraudes, tenedor de archivo, la financiación del tenedores o la financiación de la prestación de ayudas de destrucción masiva; elaborar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a personas, cuerpo y vecinos; enviar información objetiva e información financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionados con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comercialización, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que SEGUROS DEL ESTADO tenga convenio o alianza comercial; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de SEGUROS DEL ESTADO como aquellas administradas a través de Encuentra.co y/o CompraYaa Tenemos y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de SEGUROS DEL ESTADO y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos:
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,111, 112, 121, 122, 131, 132, 910, 920,930.
Decreto 3260 de 2004.
2 Para las demás tarifas en unidad en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005502253

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GYA607	CHEVROLET	SIN LINEA	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.200	VERDE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	8000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
468TM2U422502	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
1GBG6D1F6CV112532	N	CV112532	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
LIZARAZO SILVA JAIME	C.C 91239679

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
0048	I	21/07/1982	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1982	05/06/2013	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT01003209262

Escaneado con CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 12:00 PM DEL
2025 8 9	2025 8 10	2026 8 9

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/HP	MODELO
3430739200	PKF979	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1981

PASAJEROS	MARCA	CAPACIDAD
3	CHEVROLET	

LÍNEA VEHÍCULO	
C 70 189	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CARROCERÍA
21424425	CM004720	CM004720	9

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	No./Núm. DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No./# DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD/RESIDENCIA TOMADOR
ORTIZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL	3163615927	CC	91186107	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTO	No./NÚM. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	55763896	3430739200	GIRON

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	RUNT/ADRES	TOTAL A PAGAR
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00	$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS Y PRESTACIONES	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/75141286/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Tenlo habemos dicho

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicho información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183336093

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031084291

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PKF979	CHEVROLET	C 70 189	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	ORO TOLEDANO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
21424425	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM004720	N	CM004720	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	C.C. 91186107

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
06/03/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO

LT08000124572

Powered by CamScanner

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GYA607	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8200	**NRO. MOTOR:**	468TM2U422502
NRO. CHASIS:	CV112532	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JAIME LIZARAZO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

COA
SUPERCAR LA CENTRAL
3182528362 - 3182528511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Concesión: RUNT 2.0 SAS / Nit 901168197-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 330 863 / www.runt.gov.co

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183668771

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	COA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	**No. de Certificado de Acreditacion:**	20-OIN-011
Fecha de expedición:	2025/09/11	**Fecha de vencimiento:**	2026/09/11

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025-02-21	2025-02-22	2026-02-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KW/TON	MODELO
10573000156580	GYA607	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	8200	1992

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
466TM2U422502	CV112532		8.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LIZARAZO SILVA, JAIME	3187343630	CC	91239679	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDOS	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR:

$ 1277600

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8.77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se le pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el FUNT.
•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•El alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 185 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A., informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de los siguientes www.segurosdelestado.com/pqr/politicaDeDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pqr/PoliticaDeDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para alguna de las finalidades antes, a través de la dirección de correo electrónico protecciondedatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por parte de SEGUROS DEL ESTADO S.A y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. como es para la emisión de la póliza y renovación, ejecución del contrato que celebre SEGUROS DEL ESTADO con sus terceros encargados, controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, determinar y liquidar pagos de siniestros así como cumplir el objeto post-contractual, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de compañías con las que SEGUROS DEL ESTADO tenga convenio o alianzas comerciales, en los casos que EXPRESAMENTE así lo autorice en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de SEGUROS DEL ESTADO como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tercetos y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de SEGUROS DEL ESTADO y sus subsidiarias.

Topes de cobertura gastos médicos:
• Para los siguientes tarifas: 900, 910, 120, 140, 150, 711, 713, 720, 722, 731, 733, 910, 916,920.
Decreto 3644 de 2003.
• Para los demás tarifas se cobran en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005502253

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GYA607	CHEVROLET	SIN LINEA	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.200	VERDE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KPS
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	8000

NÚMERO DE MOTOR
468TM2U422502

REG VIN
N ******

NÚMERO DE SERIE
1GBG6D1F6CV112532

REG NÚMERO DE CHASIS
N CV112532

REG
N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LIZARAZO SILVA JAIME

IDENTIFICACIÓN
C.C 91239679

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
0048

VE FECHA IMP DIT.
I 21/07/1982

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
01/01/1982

FECHA EXP. LIC. TTO
05/06/2013

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LTO1003209262

Escaneado con CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		HASTA LAS 24 HORAS DEL
2025 8 9	2025 8 10		2026 8 9

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE	MODELO
3430739200	PKF979	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1981

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	
	LÍNEA VEHÍCULO: C 70 189	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD KGS.
21424425	CM004720	CM004720	9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORTIZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL	3163615927	CC	91186107	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	55763896	3430739200	GIRON

TARIFA	VALOR SMLV	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADOS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentre registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201373/76141288/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyat lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o estadísticos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No 183336093

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031084291

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PKF979	CHEVROLET	C 70 189	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	ORO TOLEDANO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
21424425	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM004720	N	CM004720	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	C.C. 91186107

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
06/03/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO

LT08000124572

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180247339

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/15

Fecha de vencimiento: 2026/03/15

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2025 01 25	2025 01 26	2026 01 25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1060109148601	OSJ917	VOLQUETA	OFICIAL	6000	1984

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	
C-70-189	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M457313L86GBDO	CM457313	CM457313	7

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3168081070	NT	890201222	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
38077	1060	38077	1060109148601	BUCARAMANGA-SANTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2544 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza, las tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 120 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere abogado ni tramites.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
De igual forma he sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035901988

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OSJ917	CHEVROLET	C-70-189	1984

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.300	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
362GM2U091900	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	CM457313	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ GERARDO	C.C. 91183485

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
180

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
30519

VE
I

FECHA IMPORT.
04/09/1984

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
01/01/19)5

FECHA EXP. LIC TTO.
29/08/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO E TRÁNSITO

DIR TTC /TTE BUCARAMANGA



LT07003335276

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
180

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
30519

VE
I

FECHA IMPORT.
04/09/1984

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
01/01/19 35

FECHA EXP. LIC TTO.
29/08/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO E TRÁNSITO

DIR TTC /TTE BUCARAMANGA



LT07003335276

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	FLORIDABLANCA
OPERADOR	MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO	ESTANDARIZACION FLORIDABLANCA

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	23	24	25	26	27	28	
HOROMETRO	2563.2	2571.8	2579.0	2586.3	2593.1	2600.0	
COMBUSTIBLE	✓	60	✓	✓	60	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	LCARGA	✓	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	27-feb-2026.
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	N° INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
IGNACIO A BECERRA O	1065662221	74	DX 140	BUCARAMANGA

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	FEBRERO			MZ	BOTO
			23	24	25	26	27	28
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores de la cabina y de las luces indicadoras y de seguimiento en la medida de contar.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar ajuste de cabina de maquina.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio y retrovisor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (fluidos, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de pasadores y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar cinturones y arneses de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de extinción de incendios (Fuego libre)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el manejo de posicionamiento (Parada de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, combustible, corriente).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el grafitos de combustible y el drenaje de agua, lugar sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y niveles del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y cucharon frontal.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro.		✓		✓		✓	
29	Verificar estado de bidigón							
30	Inspeccionar el ventilador del motor							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar el radiá antipolvo, aceite del refrigerante de aceite y el tanque combustible.							
33	Verificar estado de llantas.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación							
36	Verificar el estado general del balde (Dujos, pasadores, dientes, esquineros)							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya placas flojas, pisadas o dañadas (rotas, rajadas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple tener observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	GUAYABA BLANCA
OPERADOR	MAURICIO A. BECERRA O.
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN GUAYABA BLANCA

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	16	17	18	19	20	21	
HOROMETRO	25231	25356	25464	25480	25536	25627	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	[signature]
FECHA	16-FEB-2026.
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Versión	
		Vigente	
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	N° INTERNO	PLACA	UBICACIÓN
HAMILTON A BECERRA O	1006566221	24	DX 440	CONSOLIDADA

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES: FEBRERO — DÍA: 16	17	18	19	20	21
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas: de la cabina y de las luces indicadoras y de seguridad en la cabina del operario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de cabina de maquinaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado cinta reflectiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de implementos (Kit de derrames)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de extintor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de cabinas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar cabinetes y tornillo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Constatar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar alta-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Constatar el sistema de extinción de alta o baja filtro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el manejo de radiocomunicación (Plano de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras estructurales en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de las indicadores (Hidráulico, refrigerante, kurometro combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Constatar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Constatar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Constatar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Constatar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Constatar el sistema refrigerante y adicionar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Constatar el nivel de aceite del diferencial de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y fuerza del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la prueba en vacío y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de bateria(s)						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor esta gratas, desgaste y la tension correcta						
32	Limpiar la malla antipolvo situada del refrigerante de aceite y el radiador enfriador(a)						
33	Verificar estado de bocina						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Constatar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general del motor (fugas, pasadores, rientes, engranajes)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya grietas fisuras, gastadas o deterior (rieles, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	FLORIDABLANCA
OPERADOR	MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	9	10	11	12	13	14	
HOROMETRO	24785	24863	24960	25034	25110	25200	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	✓	✓	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	09-02-2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA		CARGO	OBRA ACTUAL
NATICIO A BECERRA O	1063562721	7A	DX 170	FONTIBÓN MC4

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: FEBRERO 9	10	11	12	13	2026 14
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y sus requerimientos de la dotación de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de estado de neumáticos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar cinturón sobre pantalones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar cinturón de encapsulamiento (Kevlar, plomillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar resistencia y agarre de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar pito alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confirmar el estado de extintores de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el estado del sistema antiincendio (Presión de temperatura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o achicaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todas las interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, horómetro, cinturón)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el estado refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verifica el funcionamiento de todos los mandos de alcance orientar del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engrase pasadores de pluma, brazo y acoplamiento frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arranque el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape (debe ir gastado en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verifica el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engrase el rodamiento de Giro	✓		✓		✓	
Verificar estado de tornillos						
Inspeccionar el ventilador del motor						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
Limpiar la malla amperio interna del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
Verifica estado de batería						
Verificar estado de los cilindros						
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
Verificar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, dientes, escuchetas)						
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no tenga grietas flojas, pernos o cuñetes (rellas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Si Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Si Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si se cumple favor observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACIÓN: PLANTA MONTAÑA
OPERADOR: JAIRO A. BOCANEGRA O
PROYECTO: ESTABILIZACIÓN PLANTA MONTAÑA (CAGUAS)

REPORTE DE HORIMETROS Y CONSUMOS

FECHA	2	3	4	5	6		
HORIMETRO	2144.0	2145.0	2159.0	2162.1	2177.0		
COMBUSTIBLE	✓	✓	60	✓	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	2 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	02-FEBRERO-2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

MODELO A. [illegible] 0	1000[illegible]	71	DX 40	HORIZONTAL

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	2	3 FEBRERO	4	5	6	2023
Verificar el funcionamiento de todas las luces delanteras, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad de la cabina de control	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de espejos de retrovisión.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de limpiaparabrisas (Plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de extintor.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar nivel acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de pasamanos y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado y aseo de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del telescopio.	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape sobre la pasilla en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar el corona de Giro	✓		✓		✓	
Verificar estado de bateria(s).						
Inspeccionar el ventilador del motor.						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
Verificar estado de bateria.						
Verificar estado de los cilindros.						
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Verificar el estado general del tanque (bujes, pasadores, dientes, escarificador).						
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pletas flojas, perdidas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Lagos 2
OPERADOR: Pedro Beltrego Ramirez
PROYECTO: Lagos

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	
HOROMETRO	75557	75556	75562	75563	75573	75580	
COMBUSTIBLE	bo	no	no	no	no	bo	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

Le hace mantenimiento de aceite de motor
ex ta trabajando con martillo

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE MAQUINARIA	CÉDULA	N° INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
NOMBRE DEL OPERADOR				
Pedro A. Hugo Ramirez	9753704	35	225	Lagos 2

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES 05	06	07	08	09	AÑO 2026 10
Verificar la funcionalidad de bocina en todos sentidos, de la misma a todas luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de espejos de la cabina de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de luces (delanteras, traseras, direccionales)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los vidrios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar que cuente con cuña	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de pitos y pitadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar asegurado y estado de cinturón	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el correcto funcionamiento del circuito de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar cinturones de retención	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el estado de extintor de aire (Limpieza filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el estado de extintor químico (Fecha de recarga)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (instrucción, refrigerante, horómetro, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el estado de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del cojinete de la rotación de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar funcionamiento de todos los medios de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Probar pasadores de pluma, mástil y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante el inicio en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Probar el sistema de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar sistema de carburación						
Inspeccionar el ventilador del motor						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, rasgados y la tensión correcta						
Limpiar la malla amplificadora del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
Verificar sistema de frenos						
Verificar estado de los ahorcados						
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
Verificar el estado general del cable (fuga, pasadores, diámetro, esquineros)						
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, pasadores defectuosos, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Y se cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	BASE	
Ducan Quintero Ramirez	91357094	35	225	La

INSPECCION

MES: 01 — AÑO: 17 — 20

CRITERIO DE CONTROL	13	14	15	16	17
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de espejos retrovisores.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de pulsadores y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar bocinas y sonido de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓
Confirmar el correcto funcionamiento del extintor de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar pito alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras diferenciadas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro combustible).	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del compartivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y avance del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha, y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar el cojinete de Giro.	✓		✓		✓
Verificar estado de bateria.					
Inspeccionar el ventilador del motor.					
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
Limpiar la malla antipolvo, delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.					
Verificar estado de bateria.					
Verificar estado de los cilindros.					
Comprobar el nivel de aceite del motor de traslación.					
Verificar el estado general del bastidor (rajos, pasadores, dientes, soldaduras).					
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o dañadas (cadenas, sapatas, rodillos, guías).					

CRITERIOS DE INSPECCION

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Lagos 2
OPERADOR: Pucon Destrago Ramirez
PROYECTO: Lagos 2

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	73/07	74/07	75/07	76/07	77/07		
HOROMETRO	75587	75595	75604	75677	75679		
COMBUSTIBLE	no	bo	no	bo	no		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

Se trabaja con martillo

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO No.	MARCA	AÑO
Oscar Alfredo Ramírez	1732204	33	225	Lovol 2024

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: 07 DÍA: 19	20	21	22	AÑO: 23
Verificar el funcionamiento de todos los luces encendidas y en seguimiento en la cabina de mando)	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de niveles (aceite, refrigerante, líquido de frenos)	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar cabina acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de pasamanos y pedales	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar escaleras y acceso de la cabina	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar pitos de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de las indicadores (Hidráulico, refrigerante, luces de cabina).	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobar el sistema de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del sistema de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los frenos de alarma y bocina del brazo	✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el sistema de escape	✓		✓		✓
Engrasar el soporte de Cilin.					
Verificar estado de bateria					
Inspeccionar el ventilador del motor					
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta					
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intercooler					
Verificar estado de bateria					
Verificar ajuste de los conectores					
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación					
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, enganches)					
Balancear el balde (verificar si tiene fugas, grietas o soldaduras)					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Logos 2
OPERADOR: Duvan Buitrago Ramirez
PROYECTO: Logos 2

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	01/19	01/20	01/21	01/22	01/23			
HOROMETRO	75623	75651	75638	75646	75653			
COMBUSTIBLE	no	bo	no	no	bo			
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no			
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no			
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no			
GRASA	si	si	si	si	si			
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no			
OTRO	no	no	no	no	no			

OBSERVACIONES

Setrobaza con martillo

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	



INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	# INTERNO	AÑO	HORAS
Oscar Buitrago Ramirez	93352594	35	225	44995.2

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES					
		DIA	26	27	28	29	30	31
1	Realizar el diligenciamiento de todas las listas anexadas, de la hoja de vida de las máquinas y/o programa de la semana de turno		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de cabina de maquina		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado de cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de herramientas (llaves, alicates)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de extintor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Aplicar grasa estructural		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de pasadores y pestaña		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar accesorios y tornillos de orugas		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar el estado de las luces		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Comprobar el sistema de alarma de reversa (Pitico)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el montaje de extintor, botiquin (Kit de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar y hay pintura o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los limpiadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (hidraulicos, refrigerante, combustible, cambio)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y vaciar el exceso de agua, segun sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del cojinetes de reduccion de giro		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todas las luces de alcance y reversa del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape		✓		✓		✓	
28	Engrasar el cojinete de Giro							
29	Verificar estado de bocinas							
30	Inspeccionar el ventilador del motor							
31	Revisar la correa del ventilador del motor este ajustada, alineada y la tensión correcta.							
32	Controlar la nivel y estado correcto del refrigerante de aceite y el radiador mantenido							
33	Verificar estado de baterías							
34	Verificar estado de los silenciosos							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del balde (fisuras, posibles roturas, desgaste, etc)							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas (pernos, tuercas, bielas, cadenas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Lagos 2
OPERADOR: Arcen Beltran Ramirez
PROYECTO: Lagos 2

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	07/26	07/27	07/28	07/29	07/30	07/31	
HOROMETRO	75660	75669	75676	75684	75691	75699	
COMBUSTIBLE	no	no	bo	no	no	bo	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

ANEXO 06.
ACTA DE COPASST

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA					Mensual	x
28	02	2026	Campamento	08:00 am	10:00 am	03	Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL		Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Incidentes y accidentes de trabajo / Quejas de acoso Laboral / Eventos que involucran el comité 4. Otros 5. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	
Leonardo Andrés Duarte Rojas	
Invitados	**Firmas**
María Alejandra Sánchez	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se da inicio a la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta Se realiza la revisión de la acta anterior y se verifica el grado de cumplimiento de los compromisos pactados: -- Se realiza charlas de acuerdo a los temas planteados al plan de capacitaciones -- Se realiza inspección de elementos de emergencia (extintores, camilla y botiquín) -- Se realiza seguimiento a la inspección de EPP de los trabajadores 3. Seguimiento al plan de formación Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a los miembros del COPASST y a todo el personal en:

- Orden y aseo en el lugar de trabajo
- Técnicas de evacuación y rescate
- Inspecciones de seguridad

5. Inspecciones de lugares de trabajo

Se evidencia la participación del comité en las inspecciones de seguridad: inspección de oficina, inspección locativa de planta, inspección preoperacional de herramienta, inspección de botiquines se evidencia faltantes de elementos, camillas bien, inspección de extintores.

6. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de septiembre NO se presentaron accidentes de trabajo.

7. Ausentismo

En el mes de febrero no se presentó caso de ausentismo ni días de incapacidad.

8. Visitas, auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores No se presentaron.

9. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

Durante el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de los trabajadores en materia de SST, ni se encuentra en proceso ningún proceso entre la empresa y los colaboradores.

10. Propuestas: Simulacro

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento e implementación del plan de capacitaciones para el año 2026	COPASST	febrero 2026
Revisión e inspección de elementos de emergencia (botiquín, camilla y extintor)	COPASST	febrero 2026

Fecha próxima reunión: marzo 2026

Firma presidente

Firma secretario

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	8:00 am	10:00 am	03	Mensual	x
28	02	2026					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité 4. Casos no Resueltos 5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Edgar Leonardo Gómez	
Andrés Leonardo Duarte	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

3. Quejas de Acoso Laboral:
Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:
En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros
Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacito a los miembros del COCOLA y a todo el personal en:

- Cambio en la Confidencialidad según la nueva normatividad Resolución 3461 de 2025

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Febrero 2026

Fecha próxima reunión: marzo 2026

Edgar Leonardo Gómez
Presidente

Andrés Leonardo Duarte
secretario

ANEXO N° 6
CAPACITACIONES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

OBRA: Contacto Estabilización Floridablanca.

TEMA DE CAPACITACIÓN: Cartas de atures Trabajo en Tolerancia

LUGAR: Campamento FECHA: 04 Feb/2026

CAPACITADOR: Melissa Donado. DURACIÓN: 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Ayarrago R	97357094	operador	
2	Yuseth Colorados	1100896238	oficial	Oscar C.
3	MAURICIO A BECERRA O	1063562221	OPERARIO	
4	Huver David Rivera V	1048271660	ayudante	Huver R.
5	DIEGO ALEJANDRO GALVIS	1098506084	ayudante	DIEGO
6	[illegible]	1005778616	Almacenista	
7	[illegible]	88283988	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

- Uso de elementos de seguridad cuando aplique.
- No Trabajar solo en frentes Aislados.

CAPACITADOR

Melissa Donado

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

OBRA: Condado estabilización Floridablanca

TEMA DE CAPACITACIÓN: Caidas de rocas y Material suelto.

LUGAR: Campamento FECHA: 11 Feb 2026.

CAPACITADOR: Melissa Donado DURACIÓN: 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andrey Duarte R	1095838883	Almacenista	
2	Jhon Higuera	1094 976 741	operador	
3	Wilson mendez.	91160320	Ayudante	Wilson
4	Elias Reatiga	91059128	ayudante.	
5	Camilo Andres Bautista	1067030176	ayudante	
6	Jonathan Villamizar	1239839663	Auxiliar	
7	Fabio Ramirez Florez	1098318855	Op	
8	Mathias Prieto	1048 761 845	Op	
9	Jose E Ruiz.	88203988	Op	
10	Edwar Rodriguez	99095A4408	Almacenista	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

- Precaución desprendimiento de piedras
- Delimitar zona de exclusión

CAPACITADOR

Melissa Donado

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

OBRA: Consorcio Estabilización Floridablanca

TEMA DE CAPACITACIÓN: Trabajo Seguro con Maquinaria

LUGAR: Campamento FECHA: 18 Feb/2026

CAPACITADOR: Melissa Dorado. DURACIÓN: 30 Min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Jhaleic	1099940291	op	
2	Jonathan Villamizar	1239339688	Ayudante	Jonathan
3	Elias Arciniega	91459128	ayudante	
4	Wilson mendez p	91160390	AYUDANTE	wilson
5	Camilo Aguilar Dañobeite	1061030176	Ayudante	
6	Andy Donte Reyes	[illegible]	Almacenista	
7	Edwin Ramirez Plata	1098[illegible]805	Ay	
8	Matias Perez	1[illegible]8304	Ay	
9	Luis E B[illegible]	88203988	AY	
10	Edwin Rodriguez	1094592498	Almacenista	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

Buenas Prácticas= - Mantener distancias de seguridad

→ solo operadores autorizados

→ Revisar estabilidad del terreno antes de ingresar

CAPACITADOR

Melissa Dorado.

FIRMA

ANEXO N° 5 . REGISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN	Código	RH-F-77
		Fecha	25/07/2025
		Versión	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	**Mathius Santiago Pertuz Jimenez**	TIPO DE ID	**Cédula de Ciudadanía**	N° ID	**1.048.283.845**
CARGO	**Ayudante de Obra**		PROYECTO	**CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**	

II. COMPROMISOS DEL TRABAJADOR (A)

1. Declaro que he recibido a satisfacción y en su totalidad todos los elementos de dotación asignados por el empleador. Asi mismo Manifiesto que los elementos entregados se encuentran en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales vigentes en materia laboral.

2. Me comprometo a utilizar la dotación de manera correcta y responsable, exclusivamente durante el desarrollo de mis funciones laborales.

3. El deterioro por mal uso es su responsabilidad, por tanto, deberá cuidar y mantener limpias las prendas entregadas.

4. Está prohibido vender, prestar o regalar los elementos de dotación, ya que son propiedad del empleador y entregados solo para el cumplimiento de las labores.

5. No se deben alterar o personalizar los elementos entregados (como cortar, teñir, pintar, etc.) sin autorización expresa del empleador.

6. NO utilizar la dotación para las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de la organización, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

7. En caso de presentar perdida o daño, deberá reportar al área de gestión humana para realizar el cambio.

III. REGISTRO DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTEGA		
		DIA	MES	AÑO
CAMISA DE JEAN	02	2026-02-02		
PANTALON JEAN	02	2026-02-02		
BOTAS DE SEGURIDAD	1	2026-02-02		

IV. DATOS PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
VANESSA PARADA	1.098.725.994	Auxiliar de Gestión Humana

V. OBSERVACIONES

Este documento se firma en señal de conformidad y para que quede constancia del cumplimiento de la entrega de la dotación empresarial correspondiente, se expide a los **2026-02-02** y sustituye cualquier documento previo sobre el mismo asunto.

Quien entrega:

VANESSA PARADA
Auxiliar de Gestión Humana
Contacto: **nominas2023o41@gmail.com**

Celular: **3171613309**

**Si requiere validar la información aca registrada por favor contacte con el area de gestión humana.*

Quien recibe:

AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA. Las Partes declaran que el presente documento será firmado electrónicamente a través de la aplicación BUK; así mismo, declaran que la aplicación BUK provee un mecanismo de firma electrónica confiable que garantiza el cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la legislación vigente, autenticidad, integridad y no repudio. Así las cosas, el trabajador: a) Acepta dar su consentimiento a través de una firma electrónica para obligarse frente a las condiciones contenidas en el presente Contrato. b) Reconoce que en los términos del Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma manuscrita. C) Entiende que la firma electrónica usada para este documento, es apropiada y confiable en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, o normas que las deroguen, modifiquen o adicionen, para los fines propio de su uso. d) Garantiza a LA EMPRESA que mantiene, custodia y controla los datos de creación de la firma, y garantiza la confidalidad de la contraseña que debe crear, conforme a lo requerido por el sistema, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso de terceras personas a dicha información. e) Las Partes aceptan que el documento firmado electrónicamente por cada una de las Partes y remitido a la otra Parte mediante correo electrónico es válido, vinculante y autentico.

Proyectó:YVPH **Revisó:ALVG**	**Tel: 3171613309** **CL 41 #27-63, Sotomayor** **Bucramanga – Santander**

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Mathius Santiago Pertuz Jimenez
Número de Documento	1.048.283.845
Email	mathewspertu@gmail.com
Fecha	31/01/2026 a las 09:17
IP	191.110.74.229
Token	54fd77093231ba56557e85ffbe4091d2

Este QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF enviado al correo de los firmantes.

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN	Código	RH-F-77
		Fecha	25/07/2025
		Versión	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	**Jorge Leonardo Herrera Reyes**	TIPO DE ID	**Cédula de Ciudadanía**	N° ID	**1.095.835.301**
CARGO	**Ayudante de Obra**		PROYECTO	**CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**	

II. COMPROMISOS DEL TRABAJADOR (A)

1. Declaro que he recibido a satisfacción y en su totalidad todos los elementos de dotación asignados por el empleadór. Así mismo Manifiesto que los elementos entregados se encuentran en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales vigentes en materia laboral.

2. Me comprometo a utilizar la dotación de manera correcta y responsable, exclusivamente durante el desarrollo de mis funciones laborales.

3. El deterioro por mal uso es su responsabilidad, por tanto, deberá cuidar y mantener limpias las prendas entregadas.

4. Está prohibido vender, prestar o regalar los elementos de dotación, ya que son propiedad del empleador y entregados solo para el cumplimiento de las labores.

5. No se deben alterar o personalizar los elementos entregados (como cortar, teñir, pintar, etc.) sin autorización expresa del empleador.

6. NO utilizar la dotación para las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de la organización, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

7. En caso de presentar perdida o daño, deberá reportar al área de gestión humana para realizar el cambio.

III. REGISTRO DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTEGA		
		DIA	MES	AÑO
CAMISA DE JEAN	02	2026-02-02		
PANTALON JEAN	02	2026-02-02		
BOTAS DE SEGURIDAD	1	2026-02-02		

IV. DATOS PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
VANESSA PARADA	1.098.725.994	Auxiliar de Gestión Humana

V. OBSERVACIONES

Este documento se firma en señal de conformidad y para que quede constancia del cumplimiento de la entrega de la dotación empresarial correspondiente, se expide a los **2026-02-02** y sustituye cualquier documento previo sobre el mismo asunto.

Quien entrega:

VANESSA PARADA
Auxiliar de Gestión Humana
Contacto: **nominas2023o41@gmail.com**

Celular: **3171613309**

**Si requiere validar la información aca registrada por favor contacte con el area de gestión humana.*

Quien recibe:

AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes declaran que el presente documento será firmado electrónicamente a través de la aplicación BUK; así mismo, declaran que la aplicación BUK provee un mecanismo de firma electrónica confiable que garantiza el cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la legislación vigente, autenticidad, integridad y no repudio. Así las cosas, el trabajador: a) Acepta dar su consentimiento a través de una firma electrónica para obligarse frente a las condiciones contenidas en el presente Contrato. b) Reconoce que en los términos del Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma manuscrita. c) Entiende que la firma electrónica usada para este documento, es apropiada y confiable en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, o normas que las deroguen, modifiquen o adicionen, para los fines propio de su uso. d) Garantiza a LA EMPRESA que mantiene, custodia y controla los datos de creación de la firma, y garantiza la confidencialidad de la contraseña que debe crear, conforme a lo requerido por el sistema, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso de terceras personas a dicha información. e) Las Partes aceptan que el documento firmado electrónicamente por cada una de las Partes y remitido a la otra Parte mediante correo electrónico es válido, vinculante y auténtico.

Proyectó:YVPH **Revisó:ALVG**	**Tel: 3171613309** **Cl. 41 #27-63, Sotomayor** **Bucramanga – Santander**

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jorge Leonardo Herrera Reyes
Número de Documento	1.095.835.301
Email	jorge.leoreyes27@gmail.com
Fecha	31/01/2026 a las 09:28
IP	191.110.74.229
Token	c0129b6be6247903189f4a32a941ca17

Este QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF enviado al correo de los firmantes.

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN	Código	RH-F-77
		Fecha	25/07/2025
		Versión	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	**Fabian Alberto Ramirez Florez**	TIPO DE ID	**Cédula de Ciudadanía**	N° ID	**1.098.718.865**
CARGO	**Ayudante de Obra**		PROYECTO	**CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**	

II. COMPROMISOS DEL TRABAJADOR (A)

1. Declaro que he recibido a satisfacción y en su totalidad todos los elementos de dotación asignados por el empleador. Asi mismo Manifiesto que los elementos entregados se encuentran en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales vigentes en materia laboral.

2. Me comprometo a utilizar la dotación de manera correcta y responsable, exclusivamente durante el desarrollo de mis funciones laborales.

3. El deterioro por mal uso es su responsabilidad, por tanto, deberá cuidar y mantener limpias las prendas entregadas.

4. Está prohibido vender, prestar o regalar los elementos de dotación, ya que son propiedad del empleador y entregados solo para el cumplimiento de las labores.

5. No se deben alterar o personalizar los elementos entregados (como cortar, teñir, pintar, etc.) sin autorización expresa del empleador.

6. NO utilizar la dotación para las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de la organización, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

7. En caso de presentar perdida o daño, deberá reportar al área de gestión humana para realizar el cambio.

III. REGISTRO DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTEGA		
		DIA	MES	AÑO
CAMISA DE JEAN	02	2026-02-02		
PANTALON JEAN	02	2026-02-02		
BOTAS DE SEGURIDAD	1	2026-02-02		

IV. DATOS PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
VANESSA PARADA	1.098.725.994	Auxiliar de Gestión Humana

V. OBSERVACIONES

Este documento se firma en señal de conformidad y para que quede constancia del cumplimiento de la entrega de la dotación empresarial correspondiente, se expide a los **2026-02-02** y sustituye cualquier documento previo sobre el mismo asunto.

Quien entrega:

VANESSA PARADA
Auxiliar de Gestión Humana
Contacto: **nominas2023o41@gmail.com**

Celular: **3171613309**

**Si requiere validar la información aca registrada por favor contacte con el area de gestión humana.*

Quien recibe:

AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes declaran que el presente documento será firmado electrónicamente a través de la aplicación BUK; así mismo, declaran que la aplicación BUK provee un mecanismo de firma electrónica confiable que garantiza el cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la legislación vigente, autenticidad, integridad y no repudio. Así las cosas, el trabajador: a) Acepta dar su consentimiento a través de una firma electrónica para obligarse frente a las condiciones contenidas en el presente Contrato. b) Reconoce que en los términos del Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma manuscrita. c) Entiende que la firma electrónica usada para este documento, es apropiada y confiable en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, o normas que las deroguen, modifiquen o adicionen, para los fines propio de su uso. d) Garantiza a LA EMPRESA que mantiene, custodia y controla los datos de creación de la firma, y garantiza la confidencialidad de la contraseña que debe crear, conforme a lo requerido por el sistema, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso de terceras personas a dicha información. e) Las Partes aceptan que el documento firmado electrónicamente por cada una de las Partes y remitido a la otra Parte mediante correo electrónico es válido, vinculante y auténtico.

Proyectó:YVPH **Revisó:ALVG**	**Tel: 3171613309** **Cl. 41 #27-63, Sotomayor** **Bucramanga – Santander**

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Fabian Alberto Ramirez Florez
Número de Documento	1.098.718.865
Email	bianfalokomix@gmail.com
Fecha	31/01/2026 a las 09:48
IP	191.110.74.229
Token	fbdb600cd2824Ocb3fb898Be1d7927c1

Este QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF enviado al correo de los firmantes.

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN	Código	RH-F-77
		Fecha	25/07/2025
		Versión	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	**Carlos Andres Ramirez Florez**	TIPO DE ID	**Cédula de Ciudadanía**	N° ID	**1.098.767.443**
CARGO	**Ayudante de Obra**		PROYECTO	**CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**	

II. COMPROMISOS DEL TRABAJADOR (A)

1. Declaro que he recibido a satisfacción y en su totalidad todos los elementos de dotación asignados por el empleador. Asi mismo Manifiesto que los elementos entregados se encuentran en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales vigentes en materia laboral.

2. Me comprometo a utilizar la dotación de manera correcta y responsable, exclusivamente durante el desarrollo de mis funciones laborales.

3. El deterioro por mal uso es su responsabilidad, por tanto, deberá cuidar y mantener limpias las prendas entregadas.

4. Está prohibido vender, prestar o regalar los elementos de dotación, ya que son propiedad del empleador y entregados solo para el cumplimiento de las labores.

5. No se deben alterar o personalizar los elementos entregados (como cortar, teñir, pintar, etc.) sin autorización expresa del empleador.

6. NO utilizar la dotación para las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de la organización, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

7. En caso de presentar perdida o daño, deberá reportar al área de gestión humana para realizar el cambio.

III. REGISTRO DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTEGA		
		DIA	MES	AÑO
CAMISA DE JEAN	02	2026-02-02		
PANTALON JEAN	02	2026-02-02		
BOTAS DE SEGURIDAD	1	2026-02-02		

IV. DATOS PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
VANESSA PARADA	1.098.725.994	Auxiliar de Gestión Humana

V. OBSERVACIONES

Este documento se firma en señal de conformidad y para que quede constancia del cumplimiento de la entrega de la dotación empresarial correspondiente, se expide a los **2026-02-02** y sustituye cualquier documento previo sobre el mismo asunto.

Quien entrega:

VANESSA PARADA
Auxiliar de Gestión Humana
Contacto: **nominas2023o41@gmail.com**

Celular: **3171613309**

**Si requiere validar la información aca registrada por favor contacte con el area de gestión humana.*

Quien recibe:

AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes declaran que el presente documento será firmado electrónicamente a través de la aplicación BUK, así mismo, declaran que la aplicación BUK provee un mecanismo de firma electrónica confiable que garantiza el cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la legislación vigente, autenticidad, integridad y no repudio. Así las cosas, el trabajador: a) Acepta dar su consentimiento a través de una firma electrónica para obligarse frente a las condiciones contenidas en el presente Contrato. b) Reconoce que en los términos del Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma manuscrita. c) Entiende que la firma electrónica usada para este documento, es apropiada y confiable en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, o normas que las deroguen, modifiquen o adicionen, para los fines propio de su uso. d) Garantiza a LA EMPRESA que mantiene, custodia y controla los datos de creación de la firma, y garantiza la confiabilidad de la contraseña que debe crear, conforme a lo requerido por el sistema, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso de terceras personas a dicha información. e) Las Partes aceptan que el documento firmado electrónicamente por cada una de las Partes y remitido a la otra Parte mediante correo electrónico es válido, vinculante y auténtico.

Proyectó:YVPH **Revisó:ALVG**	**Tel: 3171613309** **CL 41 #27-63, Sotomayor** **Bucramanga – Santander**

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Carlos Andres Ramirez Florez
Número de Documento	1.098.767.443
Email	boyfit300@gmail.com
Fecha	31/01/2026 a las 09:59
IP	191.110.74.229
Token	dfc13f1596ca914228a0e90d914186a9

Este QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF enviado al correo de los firmantes.

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN	Código	RH-F-77
		Fecha	25/07/2025
		Versión	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	**Eduar Alonso Reatiga Gonzalez**	TIPO DE ID	**Cédula de Ciudadanía**	N° ID	**1.101.597.448**
CARGO	**Almacenista**		PROYECTO	**CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**	

II. COMPROMISOS DEL TRABAJADOR (A)

1. Declaro que he recibido a satisfacción y en su totalidad todos los elementos de dotación asignados por el empleador. Asi mismo Manifiesto que los elementos entregados se encuentran en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales vigentes en materia laboral.

2. Me comprometo a utilizar la dotación de manera correcta y responsable, exclusivamente durante el desarrollo de mis funciones laborales.

3. El deterioro por mal uso es su responsabilidad, por tanto, deberá cuidar y mantener limpias las prendas entregadas.

4. Está prohibido vender, prestar o regalar los elementos de dotación, ya que son propiedad del empleador y entregados solo para el cumplimiento de las labores.

5. No se deben alterar o personalizar los elementos entregados (como cortar, teñir, pintar, etc.) sin autorización expresa del empleador.

6. NO utilizar la dotación para las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de la organización, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

7. En caso de presentar perdida o daño, deberá reportar al área de gestión humana para realizar el cambio.

III. REGISTRO DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTEGA		
		DIA	MES	AÑO
CAMISA DE JEAN	02	2026-02-09		
PANTALON JEAN	02	2026-02-09		
BOTAS DE SEGURIDAD	1	2026-02-09		

IV. DATOS PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
VANESSA PARADA	1.098.725.994	Auxiliar de Gestión Humana

V. OBSERVACIONES

Este documento se firma en señal de conformidad y para que quede constancia del cumplimiento de la entrega de la dotación empresarial correspondiente, se expide a los **2026-02-09** y sustituye cualquier documento previo sobre el mismo asunto.

Quien entrega:

VANESSA PARADA
Auxiliar de Gestión Humana
Contacto: **nominas2023o41@gmail.com**

Celular: **3171613309**

**Si requiere validar la información aca registrada por favor contacte con el area de gestión humana.*

Quien recibe:

AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes declaran que el presente documento será firmado electrónicamente a través de la aplicación BUK; así mismo, declaran que la aplicación BUK provee un mecanismo de firma electrónica confiable que garantiza el cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la legislación vigente, autenticidad, integridad y no repudio. Así las cosas, el trabajador: a) Acepta dar su consentimiento a través de una firma electrónica para obligarse frente a las condiciones contenidas en el presente Contrato. b) Reconoce que en los términos del Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma manuscrita. c) Entiende que la firma electrónica usada para este documento, es apropiada y confiable en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, o normas que las deroguen, modifiquen o adicionen, para los fines propio de su uso. d) Garantiza a LA EMPRESA que mantiene, custodia y controla los datos de creación de la firma, y garantiza la confiabilidad de la contraseña que debe crear, conforme a lo requerido por el sistema, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso de terceras personas a dicha información. e) Las Partes aceptan que el documento firmado electrónicamente por cada una de las Partes y remitido a la otra Parte mediante correo electrónico es válido, vinculante y autentico.

Proyectó:YVPH **Revisó:ALVG**	**Tel: 3171613309** **Cl. 41 #27-63, Sotomayor** **Bucramanga – Santander**

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Eduar Alonso Realiga Gonzalez
Número de Documento	1.101.597.448
Email	realigaeduar@gmail.com
Fecha	06/02/2026 a las 16:57
IP	191.156.191.71
Token	570aab7f0c852ba297b61fe459c73a71

Este QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF enviado al correo de los firmantes.

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	01/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Andrés Cuellar	CÉDULA	1098649173	CARGO	Ayudante de obra
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Arcoyares 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	10	03	26	Andrés Cuellar	

Powered by CamScanner

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Andrés Duarte R.	CÉDULA	1095839883	CARGO	Almacenista
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Altoyorbe2

II. INSTRUCCIONES

Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.

El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad

NO utilizar los EPP s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes nitrilo	1	27	11	25	Andrés Duarte R.	
Gafas Negras	1	27	11	25	Andrés Duarte R.	
Guantes vaqueta	1	12	12	25	Andrés Duarte R.	
Tapa Bocas	1	12	12	25	Andrés Duarte R.	
Guantes nitrilo	1	28	01	26	Andrés Duarte R.	
Tapa Bocas	1	25	01	26	Andrés Duarte R.	

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	9/10/2020
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Camilo Davila	CÉDULA	1069030176	CARGO	Ayudante de obra
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Arrayanes 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	23	01	26		
Gafas Negras	1	23	01	26		
Tapa Bocas	1	23	01	26		
Guantes Vaqueta	1	08	02	26		
Tapa oidos incoloro	1	10	02	26		
Gafas Vaqueta	1	10	02	26		
Tapa Bocas	1	18	02	26		
Tapa Bocas	1	19	02	26		
Tapa Bocas	1	20	02	26		
Tapa Bocas	1	23	02	26		
Guantes Vaqueta	1	05	03	26		
Tapa oidos de copa	1	17	03	26		

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Elias Realiza	ID	91 459 120	CARGO	A. Perforación
PROYECTO	Est. Floridablanca 2				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante vaqueta	1	25	11	25	Elias Realiza	Auxiliar
Gafas Negras	1	25	11	25	Elias Realiza	Auxiliar
Tapa Bocas	1	15	12	25	. Elias Realiza	Auxiliar
Tapa oidos copa	1	15	12	25	. Elias Realiza	Auxiliar
Guante vaqueta	1	16	12	25	. Elias Realiza	Auxiliar
Guante vaqueta	1	16	01	26	. Elias Realiza	Auxiliar
Guante vaqueta	1	28	01	26	. Elias Realiza	Auxiliar
Guante vaqueta	1	02	02	26	Elias Realiza	Auxiliar
Gafas Negras	1	13	02	26	Elias Realiza	Auxiliar
Guante vaqueta	1	20	02	26	Elias Realiza	Auxiliar
Guantes nitrilo	1	04	03	26	Elias Realiza	Auxiliar

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Fabian Ramirez	CÉDULA		CARGO	Ayudante de obra
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Arboretas 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco Amarillo	1	03	02	26		Ayudante
Guarda cloqueta	1	03	02	26		Ayudante
Gafas Claras	1	03	02	26		Ayudante
Tapa Bocas	1	09	02	26		Ayudante
Guantes Vaqueta	1	10	02	26		Ayudante
Tapa Bocas	1	18	02	26		Ayudante
Tapa Bocas	1	19	02	26		Ayudante
Tapa Bocas	1	20	02	26		Ayudante
Tapa Bocas	1	23	02	26		Ayudante
Tapa Bocas	1	24	02	26		Ayudante

Powered by CamScanner

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	6/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jonatan villamizar	CÉDULA		CARGO	A. Perforación
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aragones 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafa claras	1	23	02	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	23	02	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	09	03	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	10	03	26	Jonatan	

Powered by CamScanner

INFRACORP	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jireth Lizarazo	CÉDULA	1099940291	CARGO	Operador
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Mayores

II. INSTRUCCIONES

Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.

El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.

NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará proceso disciplinario.

En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

cepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	29	11	25		Operador
Gafas Negras	1	29	11	25		Operador
Guantes Cosido	1	09	12	25		Operador
Tapa oídos inserción	1	15	12	25		Operador
Tapa oídos copa	1	18	12	25		Operador
Guantes Nitrilo	1	19	01	26		Operador
Tapa Boca	1	19	01	26		Operador
Tapa Boca	1	20	01	26		Operador
Guantes Nitrilo	1	17	02	26		Operador
Tapa Boca	1	17	02	26		Operador
Tapa Boca	1	23	02	26		Operador
Guantes Nitrilo	1	24	02	26		Operador
Guantes Nitrilo	1	17	03	26		Operador

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	9/10/2020
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jolman García	CÉDULA		CARGO	A. Perforación
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aitayores 2

II. INSTRUCCIONES

Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL

El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.

. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará proceso disciplinario.

. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsible de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

cepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	16	01	26	Jolman G V	Aduntof
Tapa Bocas	1	17	01	26	Jolman G V	Aduntof
Gafas Anglos	1	20	02	26	Jolman G V	Aduntof
Tapa Bocas	1	20	02	26	Jolman G V	Aduntof
Tapa Bocas	1	23	02	26	Jolman G V	Aduntof

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SSE-F-17
Fecha	9/10/2020
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Matrica Perez	CÉDULA		CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Anayaes

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	05	03	26		

Powered by CamScanner

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	olger Sepulveda	CÉDULA		CARGO	Operador Inyección
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Anoyarez L

II. INSTRUCCIONES

Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.

El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.

NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará n proceso disciplinario.

En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

cepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	16	01	26		
Tapa Bocas	1	16	01	26		
Tapa Bocas	1	17	01	26		
Gafas Acros	1	18	02	26		
Guantes Nitrilo	1	18	02	26		

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	9/10/2020
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Wilson mendez	CÉDULA		CARGO	Ayudante obra
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Antioquia 2.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco Amarillo	1	15	12	25	. Wilson	Ayudante
Guantes Vaqueta	1	15	12	25	. Wilson	Ayudante
Gafas Negras	1	15	12	25	. Wilson	Ayudante
Camiso Talla S Y M	2	17	12	25	. Wilson	Ayudante
Pantalon Talla 30	2	17	12	25	. Wilson	Ayudante
Bota punta Acero talla 37	1	17	12	25	. Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	19	12	25	Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	16	01	26	. Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	19	01	26	. Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	19	01	26	. Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	20	01	26	. Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	23	02	26	. Wilson	Ayudante
Tapa Boca	1	24	02	26	. Wilson	Ayudante
Guantes vaqueta	1	14	03	26	. Wilson	Ayudante
Guantes Nitrilo	1	17	03	26	. Wilson	Ayudante

Powered by CamScanner

ANEXO N° 7
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Comercializadora Floridablanca — INSPECCIONADO POR: Andrés Duarte R

FRENTE: Amoyaco 2 — FECHA: 23-02-26 a 28-02-26

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] — Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Cinceles	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Excesiones	Mango	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estaco general	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Picas	Cabo	8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 16")	Mango	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo	Cabo - filo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Guaya, polanca, carcasa, manijon	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Andrés Duarte R

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigía

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Estabilización Floridablanca — INSPECCIONADO POR: Andrés Duarte L

FRENTE: Anexos 2 — FECHA: 16/Feb/26 o 21/Feb/26

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [1] NO [ ] — Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carelas para esmerilar	Acetato, tafilete	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Cinceles	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parascles	Estado general	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Picas	Cabo	8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pernos (9", 12", 18")	Mango	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, switho, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Andrés Duarte L

FIRMA: Andrés

V.B. del Copasst y/o Vigia: _____

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Estabiliza Floridablanca — INSPECCIONADO POR: Andr. Duck R

FRENTE: Arroyones 2 — FECHA: 09-Feb-26 a 14/Feb/26

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [x] NO [ ] — Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	/		/		/		/		/		/			
Barras	Estado general	4	/		/		/		/		/		/			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	NA	NP		NP		NP		NP		NP		NP			
Cinceles	Estado general	7	/		/		/		/		/		/			
Cinta métrica	Estado general	1	/		/		/		/		/		/			
Destornilladores	Mango, punta	2	/		/		/		/		/		/			
Extensiones	Mango	NA	NP		NP		NP		NP		NP		NP			
Limas	Mango, estado general	2	/		/		/		/		/		/			
Llaves Expansivas	Estado general	2	/		/		/		/		/		/			
Machetes con funda	Mango	4	/		/		/		/		/		/			
Martillos de uña	Mango	2	/		/		/		/		/		/			
Palas	Cabo, hoja	7	/		/		/		/		/		/			
Paladragas	Cabo, cavadora	4	/		/		/		/		/		/			
Parasoles	Estado general	ND	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
Picas	Cabo	8	/		/		/		/		/		/			
Pomas (9", 12", 16")	Mango	5	/		/		/		/		/		/			
Extensiones electricas	Clavija, conector	1	/		/		/		/		/		/			
Tijeras industriales	Estado general	1	/		/		/		/		/		/			
Serruchos	Mango, hoja, marco	2	/		-/		/		/		/		/			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	3	/		/		/		/		/		/			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	1	/		/		/		/		/		/			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	/		/		/		/		/		/			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	/		/		/		/		/		/			
Juego de Llaves	Estado general	1	/		/		/		/		/		/			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	/		/		/		/		/		/			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	/		/		/		/		/		/			
Hachas	Cabo - filo	2	/		/		/		/		/		/			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	3	/		/		/		/		/		/			

NOMBRE ALMACENISTA: Andr. Duck R

FIRMA: Andr R

V.B. del Copasst y/o Vigía: _____

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Floridablanca — INSPECCIONADO POR: Andrés Duarte R

FRENTE: Alcantarillado 2 — FECHA: 02/02/26 a 07/02/26

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] Periodicidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Cinceles	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uño	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parascles	Estado general	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Picas	Cabo	8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Puridora Grande	Cable, swiltc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Cota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA: Andrés Duarte R

FIRMA: Aduarte

V.B. del Copasst y/o Vigía: _____

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Código	SST-F-14
Fecha	15/5/2025
Versión	4
Página ___ de ___	

Inspección realizada por:

Nombre: Consorcio Est. Floridablanca | Fecha inspección: 27 Feb/26 | Próxima inspección: NOV/26

Cargo: SST - Melissa Donado | Lugar: Confinero | Firma: Melissa Donado.

Ubicación del botiquín: Corporativo. | Ubicación de la camilla: Confinero. Logos.

V.B. Copasst: | V.B. Brigadas de emergencia:

Botiquines a revisar

Elementos	Medida	Cantidad requerida	Cantidad existente	Fecha vencimiento	Estado B	Estado R	Estado M	Estado NA	Acción Correctiva - Preventiva	Fecha Propuesta	Fecha ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	12/2026	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	N/A	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	1	N/A	✓							
Gasa Simple	Unidad	20	1	N/A	✓							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	15	15	N/A	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	3	N/A	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	2	N/A	✓							
Apósito oculos	Unidad	3	1	N/A	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	09/26	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	12/26	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	1	2	10/26	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	3	09/28	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	3	3	NA	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	10	10	N/A	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica o aluminio, con una inclinación ajustable de hasta cuatro posiciones, con cinco tipos para sujeción y barandas.

Descripción	Estado B	R	M	NA	Observaciones
Inclinación (Sitio de ubicación con facil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias

-

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
		Fecha	19/5/2025
		Versión	4
		Página ___ de ___	

Inspección realizada por:

Nombre: Melissa Donado.	Fecha inspección: 21 - 02/26.	Próxima inspección: MAR/26	
Cargo: SST	Lugar: COMPOMETO.	Firma: Melissa D.	
Ubicación del botiquín: COMPOMETO.	Ubicación de la camilla: COMPOMETO ARRIENDO		
V.B. Copasst: Andrea Doctre.	V.B. Brigadas de emergencia:		

Elementos	Parámetros a revisar								Plan de acción			
	Unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad Encontrada	Fecha vencimiento	Integridad empaque				Acción Correctiva Preventiva	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
					B	R	M	NA				
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	N/A	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	N/A	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	8	N/A	✓							
Venda Limpia	Unidad	20	20	N/A	✓							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	10	N/A	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	N/A	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	1	N/A	✓							
Apósito acular	Unidad	3	3	N/A	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	1	NOV/27	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	AGO/27	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirúrgico)	Frasco	1	1	N.A	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N. A	✓							
Inmovilizador bilateral con cabezales	Unidad	1	1	N. A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N. A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N. A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	2	NOV/26	✓							
Silbato de emergencia	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	10	N/A	✓							
Cuellos	Unidad	10	10	N/A	✓							
Sobre de Rehidratación Oral	Sobre	1	2	02-27	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	20	5	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	3	3	N/A	✓							
Guantes de retiro / latex	Unidad	20	10	N/A	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Mascarilla o Protector Facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1		N/A								

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe estar ubicada en un lugar de acceso rápido y disponible. Los ganchos de fijación y las correas deben estar en buen estado y funcionales.

Descripción	Estado				Observaciones
	B	R	M	NA	
Ubicación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores i de miembro inferior y superior	✓				
Conclusiones y Sugerencias:					

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
		Fecha	19/5/2025
		Versión	4
		Página __ de __	

Nombre: Melissa Rondon	Fecha Inspección: 28 Feb 2026	Próxima Inspección: Mar 26	
Cargo: SST	Lugar: Campamento	Firma: Melissa Rondon / SENA ANG.	
Ubicación del botiquín: Campamento	Ubicación de la camilla: Campamento		
V.B. Copasst:	V.B. Brigadas de emergencia:		

Elemento	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cantidad existente	Fecha Vencimiento	Estado del elemento B	R	M	NA	Acción Correctiva requerida	Fecha Programada	Fecha Ejecutada	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	12/2026	✓							
Tensiómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	N/A	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	1	N/A	✓							
Gasa Limpia	Unidad	10	1	N/A	✓							
Aplicadores s/o copitos	Unidad	20	15	N/A	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	3	N/A	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	2	N/A	✓							
Apósito ocular	Unidad	1	0	N/A	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Yodopovidona Esparto	Frasco	1	1	28 Ag 27	✓							
Clorhexidina (Gluta Cuinarglos)	Frasco	1	1	20 Sep 26	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml á 500 ml	Bolsa	1	2	10/26	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	3	10/27	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	3	3	N/A	✓							
Guantes de látex / Nitrilo	Unidad	20	20	N/A	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Venda elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

Descripción	B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpia y libre de óxido)	✓				
Juego de inmovilización (quitar de miembros inferiores y superior	✓				
Conclusiones y Sugerencias:					

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/8/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra	Consorcio Estabilización Floridablanca.	Fecha:	28 Feb 2026.
Área Inspeccionada:	Almacen — obra	V.B. Copasst:	

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓							
En la área se cuenta con puntos ecológicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓							
Se aplica un programa de reciclaje y protección al medio ambiente	✓							
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓							
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓							
Las baterías sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓							
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS								
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓							
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓							
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓							
Se cuenta con MEDEVAC	✓							
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓							
BOTIQUÍN								
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓							
Se cuenta con camilla en el área	✓							
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓							

OBSERVACIONES: Anotaciones

Responsable de la inspección: Melissa Donado — Cargo: SST

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/8/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra	Consorcio Estabilización Floridablanca.	Fecha:	28 Feb/2026.
Área Inspeccionada:	Almacen/obra	V.B. Copasst:	

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No es utilizado en alguna de las sedes.

Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓								
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓								
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓								
El arrume de productos es el recomendado	✓								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓								
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓								
Los pisos estan libres de obstaculos	✓								
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓								
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	✓								
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓								
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓								
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓								
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓								
Las herramientas, maquinaria y equipos están operativos para su uso	✓								
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓								
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓								

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/8/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra	Consorcio Estabilización Glaxodobladero					Fecha:	25-02/26.		
Área Inspeccionada :	Almacen- obra.					V.B. Copasst:			
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓								
En la área se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓								
Se mantienen aseos altivos el orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periodicas al personal sobre el orden y aseo	✓								
Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓								
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓								
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓								
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓								
[illegible]									
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓								
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓								
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓								
Se cuenta con MEDEVAC	✓								
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓								
[illegible]									
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓								
Se cuenta con camilla en el área	✓								
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓								

OBSERVACIONES: Cargo SST

Melissa Posada

Responsable de la Inspección: Cargo:

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Página ___ de ___	

Frente de Obra		Fecha:	
Área inspeccionada :		V.B. Copasst:	

Marque según criterio:	Br Bueno Rr Regular Mr Malo NAn No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No es utilizado en alguna de las áreas.

Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente									
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.									
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.									
El arrume de productos es el recomendado									
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo									
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios									
Los pisos estan libres de obstaculos									
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas									
Los senderos son seguros y libres de obstaculos									
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas									
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido									
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias									
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con									
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos									
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso									
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas									
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)									

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	1ST-F-18
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Página ___ de ___	

Frente de Obra	Consorcio Estabilización Floridablanca.					Fecha:	25-02/26.		
Área inspeccionada:	Almacen - obra.					V.B. Copasst:			
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓								
En la área se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓								
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓								
Se aplica un programa de reciclaje y protección al medio ambiente	✓								
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓								
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓								
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓								
[illegible]									
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓								
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓								
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓								
Se cuenta con MEDEVAC	✓								
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓								
[illegible]									
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓								
Se cuenta con camilla en el área	✓								
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓								

OBSERVACIONES: Sitio Aseo.

Melissa Rondon — SST

Responsable de la Inspección: Cargo:

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/8/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra:	Mejoramiento Estabilización Floridablanca	Fecha:	25-02/26.
Área Inspeccionada:	Almacen - obra.	V.B. Copasst:	

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el item a revisar NO presente algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los items inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los items inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No es utilizado en alguno de los casos.

	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
ALMACENAMIENTO						
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓					
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓					
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas	✓					
El arrume de productos es el recomendado	✓					
ESCALERAS						
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓					
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓					
Los pisos estan libres de obstaculos	✓					
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓					
Los senderos son seguras y libres de obstaculos	✓					
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓					
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓					
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓					
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓					
MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS						
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓					
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso	✓					
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓					
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓					
OTROS						

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/5/2021
		Versión	2
		Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Dorado Firma: Melissa Dorado CARGO: SST.

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Estabilización Floridablanca

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Andrés Duarte. CARGO: Almacenista

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
NOMBRE	CARGO		Casco		Protección auditiva		Protección ocular		Protección respiratoria		Botas		Guantes		Ropa		Arnés		Línea		Eslinga		
			U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	A	E	U	E	
Jhonatan Villamizar	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Freddy Manrique	Ayud obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Emiro Moreno	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Luis Bermudez	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Juan Jose Martinez	Almacenista	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Hover Rivera	Ayud obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Julio Cordero	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Diego Eglus	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Duvan Cordero	Ayud obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Juan Pablo Sierra	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
John cordero	Ayud. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Homer Caballero	Of. obra	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Jonathan Medina	Operador	27-02/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/5/2021
		Versión	1
		Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Borgo Firma: Melissa Borgo CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Estabilización Plataforma

Vo Bo COPASST (Nombre y Firma): Andres Ruore CARGO: Almacenista

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se ajusta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protección auditiva		Protección ocular		Protección respiratoria		Botas		Guantes		Overol		Arnés		Bota		Gafas		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Alejandro Rada	OF. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Johan Garcia	AY. de Perforación	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Olger Sepúlveda	Operador de inyección	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Kilian Reyes	Ayudante Perforo II	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Jireh Ingroso	Operador Perforo I	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Elias Restrepo	Ayudante Perforo. I	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Carlos Molner	Ayudante Perforo I	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Andres Ruore	Almacenista	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/		OK
Jose Valencia	OF obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Camilo Davila	Ay. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Juan Castillo	Ay. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Wilson Mendez	Ay. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Ronny Urian	Ay. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/6/2021
		Versión	2
		Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melisa Dorado Firma: Melisa Dorado CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Contrato estabilización Floridablanca.

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Andres Duarte. CARGO: Alm Comités

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protección auditiva		Protección visual		Protección respiratoria		Overol		Guantes		Botas		Arnés		Gafas		Línea de vida		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Jose Silva	Ay. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/	/	/	/	OK
Edwar Restrepo	Ay. obra	27-2/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	R	/	/	/	/	OK

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Pagina ___ de ___	

FECHA: 27 Febrero | 2016. PROYECTO: Cargreo Estabilizadores

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Dorado. Floridablanca.

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: _____

No. Interno	Tipo de Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Ultima recarga	Fecha de ordeno mantenimiento	Soporte	Señalización	Acceso	Manómetro	Seguridad	Manguera	Boquilla	Pintura	Tarjeta	Sello	Observaciones
1	Multiprop.	Almacen	10lb	Oct/25	oct/26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok	✓	ok

OBSERVACIONES:

Este Arc.

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Pagina	de

FECHA: 26 Febrero 2026. PROYECTO: Contrato estabilización

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Donado Floridablanca.

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: _____

No. Extintor	Capacidad Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Anillos	Pasadores	Boquilla	Manguera	Etiqueta	Tarjeta	Sellos	Observaciones
1	MULTI PROPOSITO	Almacen	10lb	Nov/25	Nov/26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓		OK

OBSERVACIONES:

Logos II

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/8/2023
		Versión	2
		Pagina __ de __	

FECHA: 25 Feb 2026 PROYECTO: Convoco Estabilización

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Donado · Floridablanca – Arrayanes.

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: Andres Duarte.


No.	Descripción Agente Extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Fecha	Señalización	Acceso	Visibilidad	Mantenimiento	Presión	Precinto	Manguera	Boquilla	Cilindro	Tubería	Manija	Observaciones
1	Multipro.	Almacen 101b	04/25	04/26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	OK	

OBSERVACIONES:
Arrayanes.

ANEXO N° 9
REGISTRO FOTOGRAFICO

	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CAPACITACIONES SST

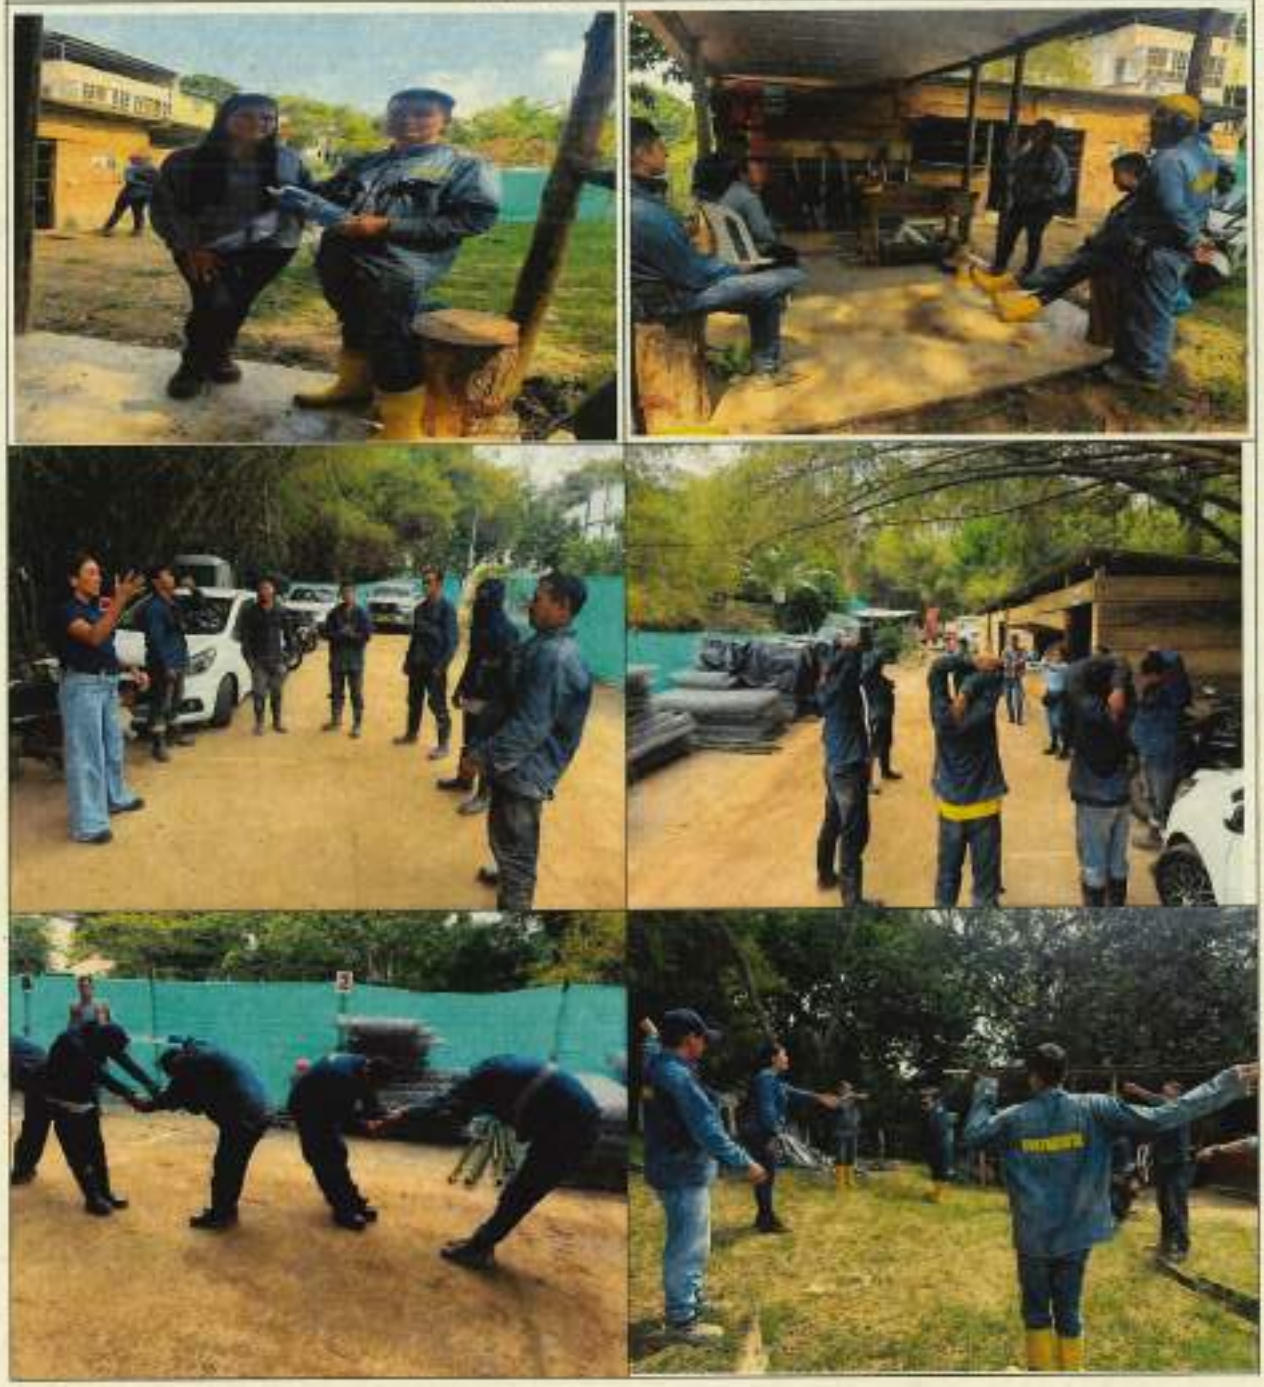

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO






SEÑALIZACIÓN




INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO









ELEMENTOS DE EMERGENCIA





INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





TRABAJO EN ALTURAS









ANEXO N° 7
MEDIDAS PREVENTIVAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

3. FECHA DE INICIO Y HORA	02	02	26	AÑO	4. LUGAR DE TRABAJO	Aeropuerto L.	
5. TERMINACIÓN DE LA TAREA	07	02	26	AÑO	6. ALTURA DE TRABAJO	22 mts	7. CONTRATISTA

8. PERSONAL AUTORIZADO Y ADIESTRAMIENTO

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	CURSO DE ALTURAS ACTUAL	CURSO DE ALTURAS ANTERIOR	EXAMEN MÉDICO ACTUAL
1	Jinh Lizcano	1098990291	operador	✓	✓	
2	Elias Lodoño		A. Perforador	✓	✓	
3	Camilo Davila	1067090176	Ayudante	✓	✓	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

9. AUTORIZACIÓN DIARIA DE TRABAJO

FECHAS	02/02/26	03/02/26	04/02/26	05/02/26	06/02/26	07/02/26	
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	Elias						

10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES

	CHEQUEO (✓ / ✗)	
	✓	✗
Capacitación en seguridad en alturas		
Certificados de aptitud médica y vigentes		
Inspección de arnés y elementos de anclaje	✓	
Verificación de anclajes		
Uso de línea de vida		
Protección contra caídas de objetos		
Plan de rescate		
Otro:		

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco	✓
Gafas	
Protección auditiva	
Guantes	✓
Botas de seguridad	✓
Arnés de cuerpo completo	✓
Eslinga con absorbedor	✓
Línea de vida	✓
Conector	✓
Otros:	

12. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro	
Pistola de impacto	
Amoladora	
Esmeril	
Soldadura	
Compresor	✓
Pulidora	
Pistola de pintura	
Extensiones eléctricas	✓
Andamios	
Escaleras	
Otros:	

13. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

Autorizo el presente trabajo en altura bajo las condiciones establecidas en el presente permiso y declaro haber verificado todos los requisitos de seguridad.

14. AUTORIZACIÓN DE SUPERVISOR DE ÁREA Y PERSONAL AUTORIZADO

Nombre del Supervisor: _____ Firma: _____

Nombre del Trabajador Autorizado: Elias Lodoño Firma: _____

15. CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



16. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN ALTURAS


CASCO BARBUQUEJO	✓	CUADRO DE CARGA	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	N	CUADRO DE PROTECCIÓN	✓
GAFAS PANORÁMICAS	NA	GUANTES DE CARNAZA	✓
PARA BUSCO DE CORTE	✓	GUANTES DE CAUCHO	✓
PARA BUSCO ANTIDESLIZ	✓	GUANTES DE CUERO	✓
PARA BUSCO DE CAUCHO	✓	CARETA	NA
BOTAS	✓	PETACA DE AGUA	NA

17. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN ALTURAS

ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS EXPANSIBLE	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS PARA RESCATE	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	NA	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

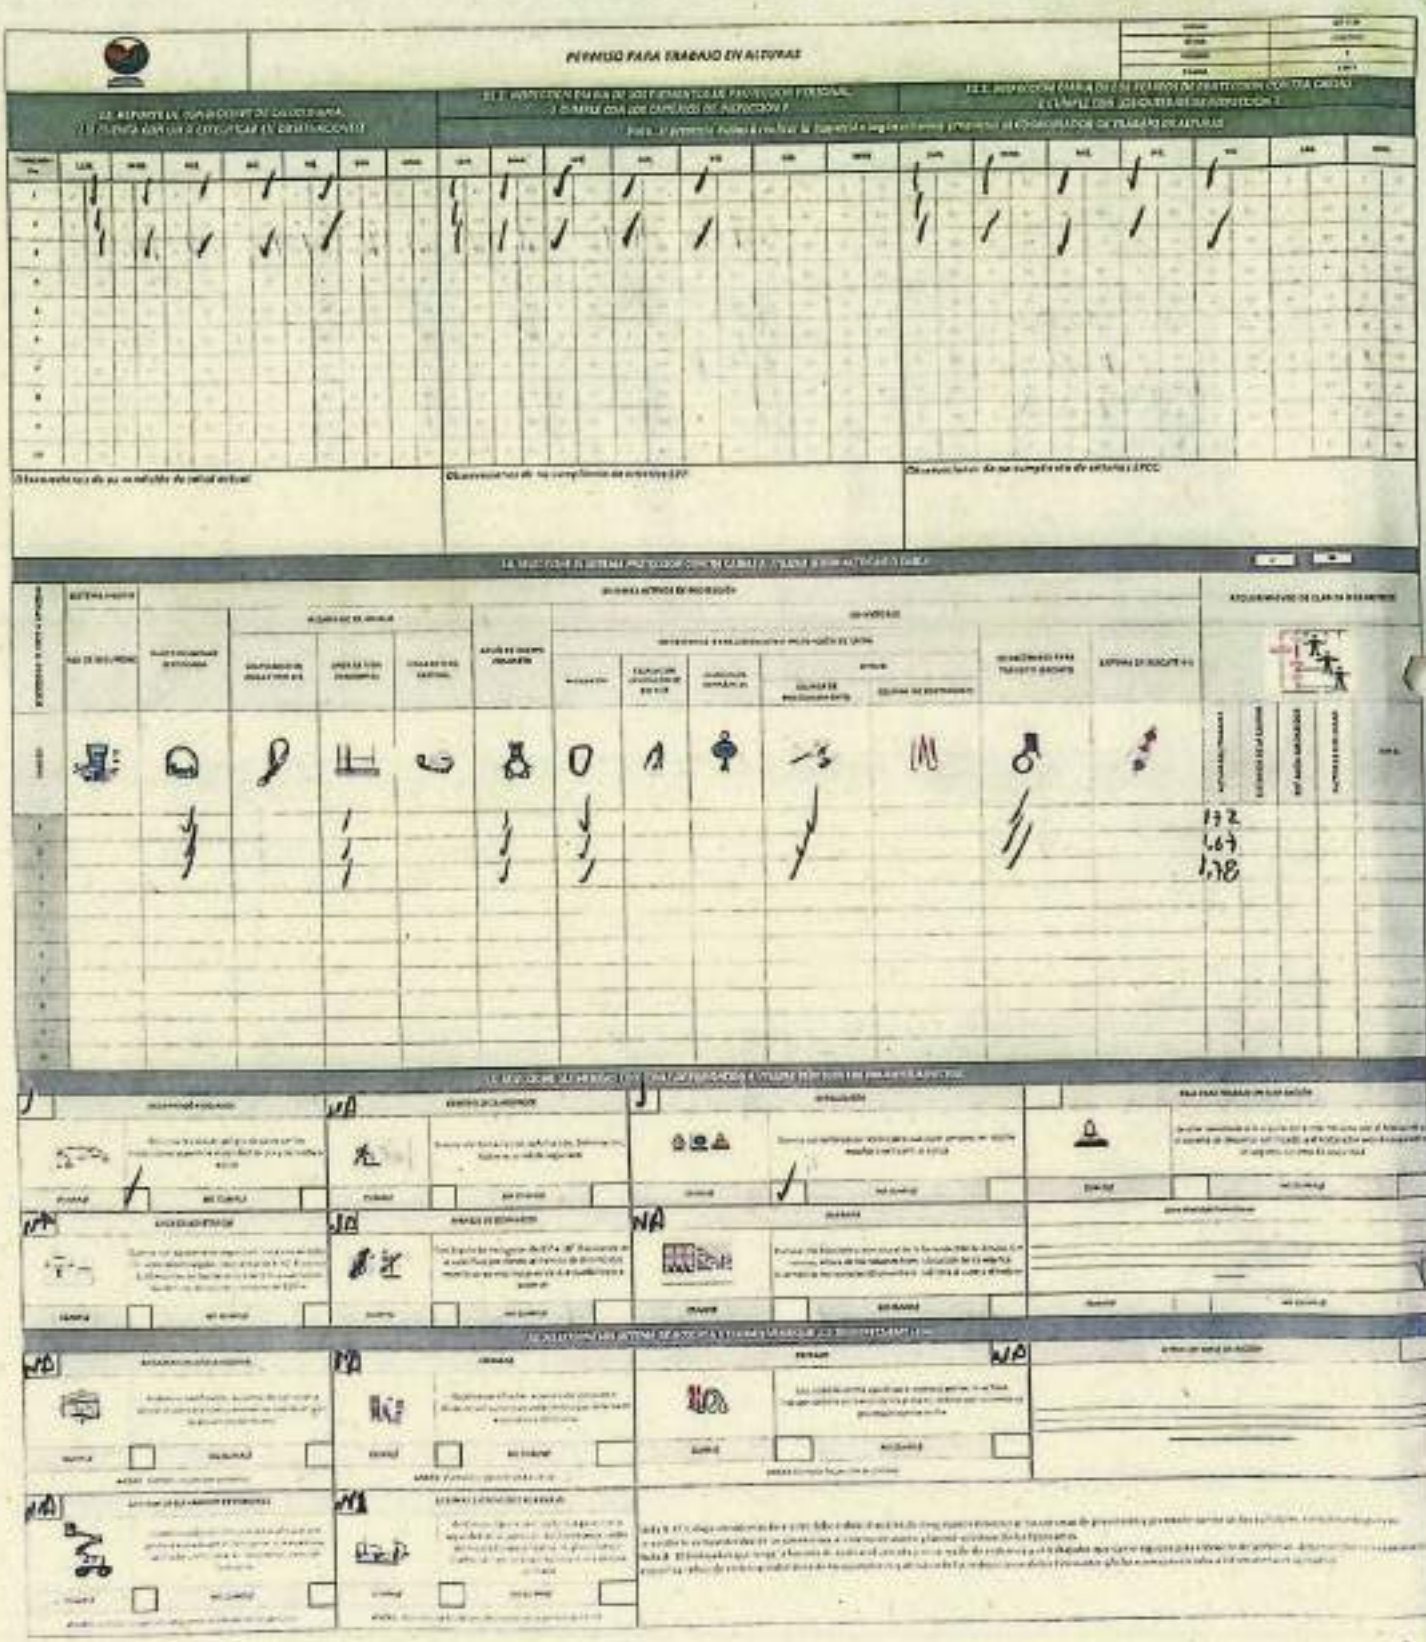

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	• melisa D.	melisa D	Melisa D.	Melisa D	Melisa D	
	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	
	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	

	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	
	Duarte	Duarte	Duarte	Duarte	Duarte	
	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/8/2023
		VERSION:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Floridablanca	Ciudad:	Floridablanca
Frente de obra:	Arenosa 6		
Fecha de inicio :	02-Feb-26	Fecha de finalización:	07-Feb 26
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación, Tillor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (bialeta mano de angel y martillo de fondo		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforacion	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, lesiones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP. 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecanico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspeccion general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, lesiones, caidas al mismo nivel	1. Estar alerta a lascondiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Atender la señalización. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus complementos	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, lesiones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4 Verificar puntos de anclajes. 5.Diligenciar revisión de permisos necesarios. 6 Trabajar en equipo. 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecanico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección preoperacional de maquinaria, equipos y herramientas (Compresor de aire)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, lesiones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Atender la señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantener condiciones de orden y aseo. 5. Uso adecuado de EPI. 6. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Condiciones de seguridad: Eléctrico (Energía eléctrica)	Golpes por contacto con el cuerpo	

Powered by CamScanner

Salud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo 9. Pausas activas y estiramiento 10 Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (lamero irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar alerto a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público), fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias. 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado. 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jirch Lizarazo	1099940291	
Camilo Dari	1067030176	

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

3. FECHA DE INICIO Y HORA	09	02	26	HORA
4. TERMINACIÓN DE LA TAREA	14	02	26	HORA

5. CENTRO DE TRABAJO: Arroyanos 2

6. ACTIVIDAD: 22 mts

7. TIPO DE ACTIVIDAD: TRABAJO EN ALTURAS (TA)

8. PERSONAL ENTRENADO Y AUTORIZADO

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	EXAMEN MEDICO DE ALTURAS	CURSO DE ALTURAS ENTRENADO	AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL
1	Jireh Liceno	1099946	Operador	1	1	1
2	Camilo Davila	2.91 1006 30 196	Ayudante	1	1	1
3	Elias Restrepo		Ayudante	1	1	1

	09/02/26	10/02/26	11/02/26	12/02/26	13/02/26	14/02/26	
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1							
2							
3				Elias	Elias		

9. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A TRABAJO EN ALTURAS

	Demarcación de seguridad del área	
	Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	
	Capacitación del personal en el procedimiento de trabajo	
1	Inspección del arnés	1
	Inspección de la línea de vida	
	Inspección de la eslinga	
	Otros	

10. EQUIPOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD A UTILIZAR

10.1 HERRAMIENTAS

Pico		Martillo de bola	
Pala		Cuña	
Machete		Cabrias	
Pulidora		Extintor	
Taladro		Hidrolavadora	
Llave de tubo		Otro	
Serrucho		Taladro	
Llave expansible		Otros	
Palanca de hierro			

10.2 EQUIPOS DE SEGURIDAD


Eslingas en Y		Arnés de cuerpo completo	
Eslingas		Línea de vida horizontal	
Línea de vida vertical		Línea de vida	
Tensor		Otros	
Conectores			
Cuerda			
Anclajes de protección			
Eslingas Absorbedor			

11. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA

Se deben identificar todos los riesgos asociados a la tarea y definir las medidas de control para cada uno de ellos

12. ¿SE HA REALIZADO EVALUACIÓN DE SALUD, CONDICIÓN ACTUAL O ENFERMEDAD?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL

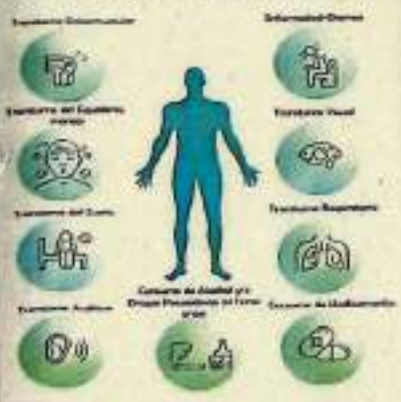

13. ¿SE HA REALIZADO EVALUACIÓN DE SALUD, CONDICIÓN ACTUAL O ENFERMEDAD?

	✓	NA
CASCO BARBUQUEJO	✓	
GAFAS SEGURIDAD	✓	
BANDA TRANSPARENTE		NA
GUANTES DE CARNAZA	✓	
GUANTES DE NITRILO	✓	
BOTAS INDUSTRIALES	✓	
BOTAS PANTANERAS	✓	
MASCARA		NA
OTROS		NA


14. ¿SE HA REALIZADO EVALUACIÓN DE SALUD, CONDICIÓN ACTUAL O ENFERMEDAD?

	✓	NA
ARNES DE SEGURIDAD	✓	
ANCLAJE PORTÁTIL		NA
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		NA
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		NA
ESLINGA EN Y DE DOBLE ANCHO		NA
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		NA
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		NA
ESLINGA ABSORBEDOR		NA

	✓	NA
PUNTO DE ANCLAJE	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
ARNÉS	✓	
NAVAJA	✓	
DISPOSITIVOS DE TRABAJO		NA
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		NA
Otros		

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

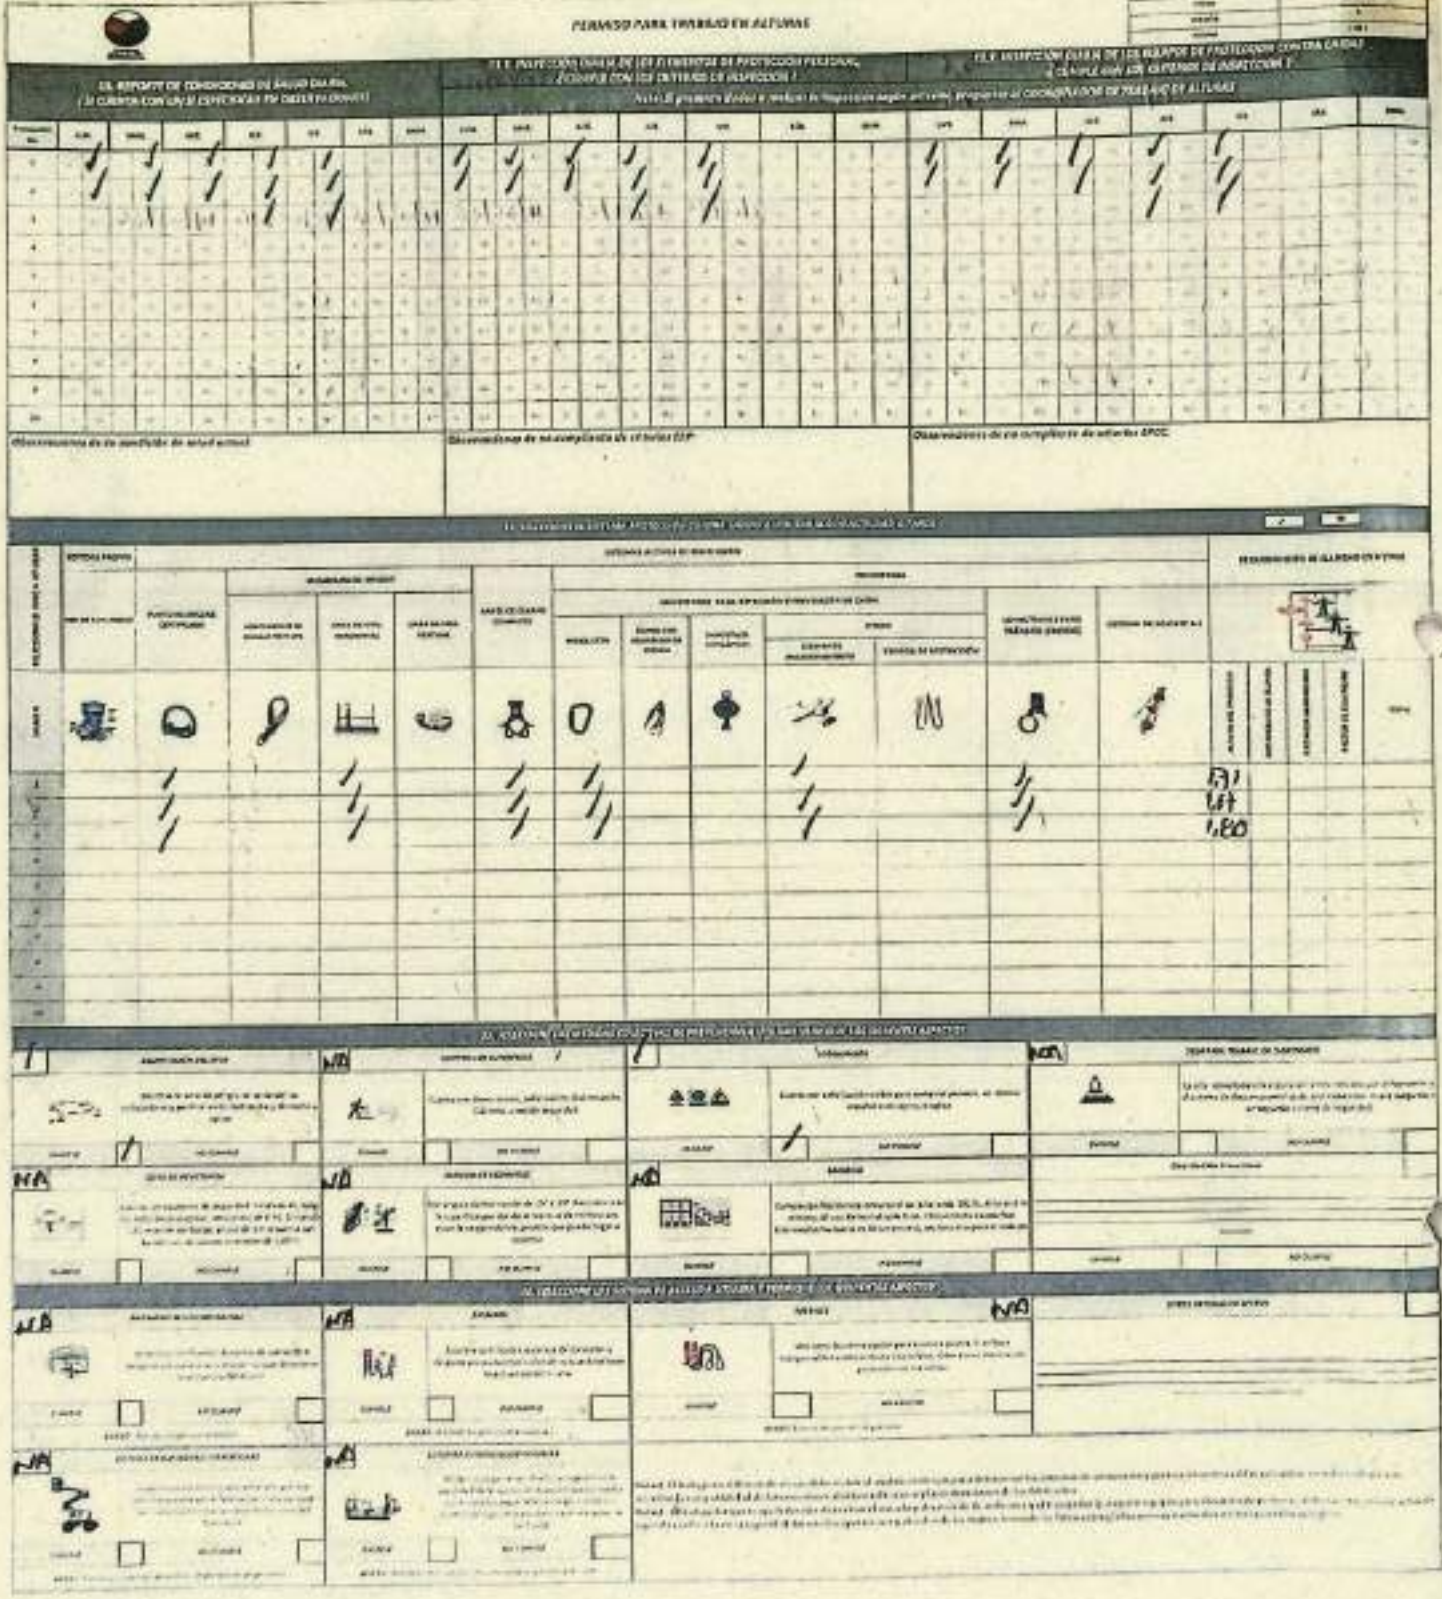

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. VALIDACIÓN APTO DEL PERSONAL DE TRABAJO

1.1. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO

Firma						
Nombre						
Firma						
Firma						

1.2. PARA LA COORDINACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 ARTÍCULO 16 NUMERAL 16.1 LITERAL A

Nombre	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	
Firma	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	Melisa D	
Hora	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	

1.3. PARA EL ASCENSO, DESCENSO Y/O TRABAJO EN ALTURAS

Nombre	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R	Andrés Duarte R
Firma	Duarte	Duarte	Duarte	Duarte	Duarte	Duarte
Hora	7:30 a.m	7:20 a.m	7:30 a.m	7:20 a.m	7:30 a.m	7:20 a.m

1.4. PARA EL RESCATE DE ALTURAS

Nombre						
Firma						
Hora						

2. CALIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

2.1. PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 ARTÍCULO 16 NUMERAL 16.1 LITERAL A

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CURSO	CARGO

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, ELIMINACIÓN, CONTROL Y SALVAMENTO EN ALTURAS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

4. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

5. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/8/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES				
Empresa:	Consorcio Floridablanca		Ciudad:	Floridablanca
Frente de obra:	Arroyano 2			
Fecha de inicio :	09-Feb-26	Fecha de finalización:		14-Feb-26
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD			
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES			
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación, Tiller, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo.			
Elementos de Protección Personal requeridos	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas			

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, estabilización y anclaje de torre de perforación y sus complementos	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 8. Mantener condiciones de orden y aseo 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Perforación, instalación de anclajes, tensión y lechadeo de la torre	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1 Inspección del área de trabajo 2 Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Atender la señalización y recomendaciones de seguridad 4 Mantener condiciones de orden y aseo 5 Uso adecuado de EPI 6 Inducción al cargo y capacitación
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	

Powered by CamScanner

salud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES		
Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Lizarazo	1099 940 791	
Camilo Daza	1066030196	
Elias Realpe	Elias Realpe 1234339663	
Jonathan Villamizar		Jonathan.

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)		
Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)		
Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Fecha de inicio y hora	16	02	26	7:30
Terminación de la tarea	21	02	26	12:00

Centro de trabajo: Astorgas II


Altura aproximada: 22 mts

No.	Nombre y apellido	Cargo				16/02/26	17/02/26	18/02/26	19/02/26	20/02/26	21/02/26
1	Joseh Lorenzo	Operador	/	/	/	[firma] Elias	[firma] Elias	[firma] Elías	[firma] Elías	[firma] Elías	
2	Elias Rodrigo	A. Perforación II	/	/	/						
3	Jonathan Silva	A. Perforación II	/	/	/			Jonathan	Jonathan	Jonathan	
4	Camilo Dávila	Ayudante	/	/	/	[firma]	[firma]	[firma] Pepe	[firma] Salmon	[firma] Tovar	
5	Salmon García	A. Perforación II	/	/	/						



Checklist entries marked: / , / , NA, / , / , / , NA, NA, NA, / , NA, NA, / , / , / , / , NA, /

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

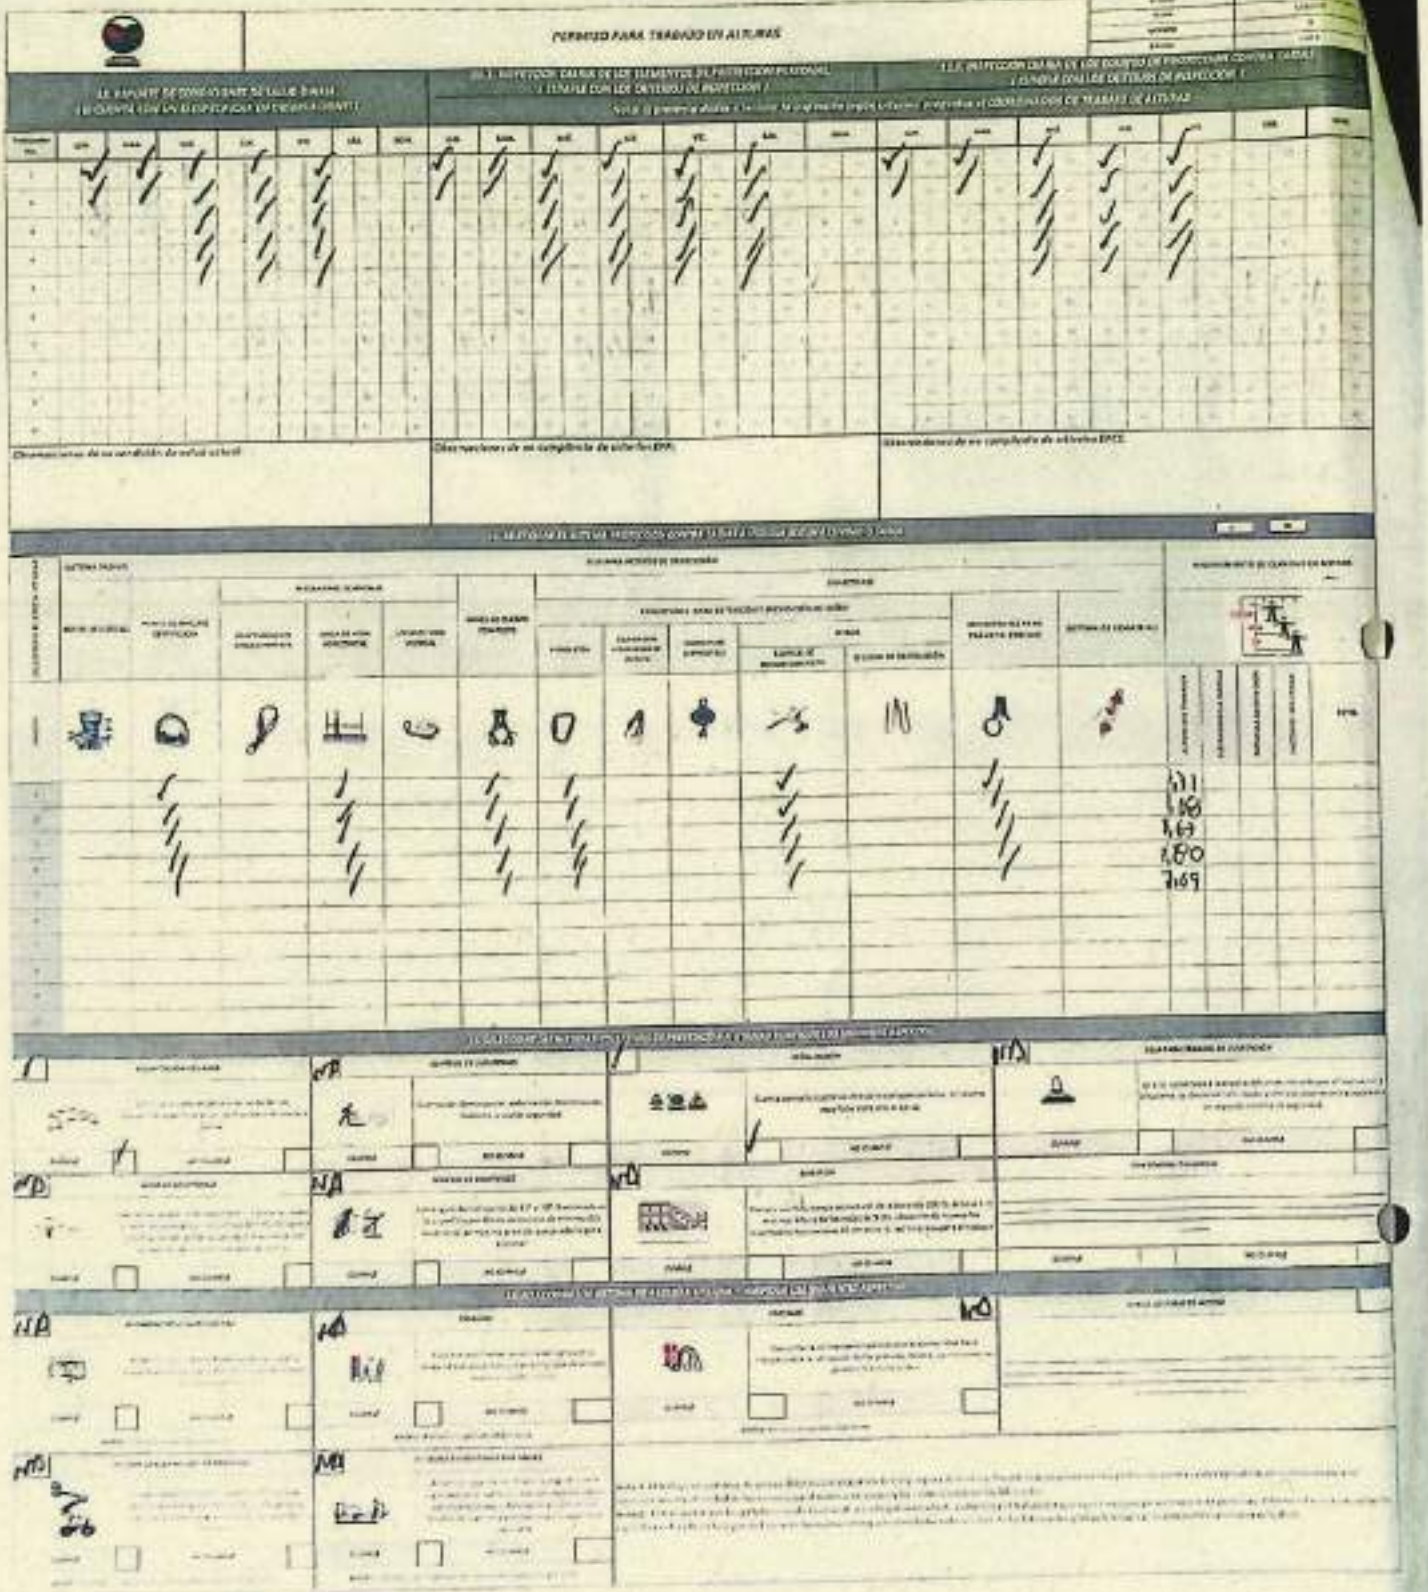

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D
	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D
	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m

	Andr. Duck	Andr. Duck 2	Andr. Duck	Andr. Duck 2	Andr. Duck 12	Andr. Duck 12
	Andr	Andr	Andr	Andr	Andr	Andr
	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CODIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/8/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Estabilizacion Floridablanca	Ciudad:	Floridablanca
Frente de obra:	Arregones 2		
Fecha de inicio:	16-Feb-26	Fecha de finalización:	21/Feb/26
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8 Tubería de perforación, Tiflor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caidas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus complementos	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 10. Realizar pausas activas 11. Uso adecuado de EPCC y EPI 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección preoperacional de maquinaria, equipos y herramientas, verificación de la tarea	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	1.Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender la señalización y recomendaciones de seguridad 4. Mantener orden en el sitio y aseo 5. Uso adecuado de EPI 6. Inducción al cargo y capacitación
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	

Powered by CamScanner

Salud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jireh Lizarazo	1099 940 901	
Elias Restrepo	91459 128	
Camilo Davila	1061030176	
Jonaton Villamizar		Jonaton

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/8/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Estabilizador Floridablanca	Ciudad:	Floridablanca
Frente de obra:	Anclajes 2		
Fecha de inicio:	18/Feb/26	Fecha de finalización:	21/Feb/26
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	LLENADO DE ANCLAJES		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Pala, canecas, mangueras, gallineta, bomba Cemento, agua, plastol		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas, insumos y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3 Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánicos: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Atender la señalización. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológicos: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Traslado de cemento al área definida	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas, esfuerzo	Lesiones osteomusculares	
	Químicos: material particulado, polvos orgánicos e inorgánicos, sustancias químicas (cemento, plastol)	Afectación respiratoria, visual y dermica: irritación, quemaduras	
	Biológicos: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Preparación de mezcla y [illegible]	Químicos: sustancias químicas (cemento, aditivo) material particulado, polvos orgánicos e inorgánicos	Afectación respiratoria, visual y dermica: irritación, quemaduras	1. Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantener condiciones de orden y aseo 5. Uso adecuado de EPI 6. Inducción al cargo y capacitación
	Biológicos: picaduras, mordeduras	Lesiones osteomusculares	
	Biomecánicos: manipulación manual de cargas, esfuerzo	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: locativo, mecánico (superficies irregulares, golpes y heridas)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Condiciones de seguridad: locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	

Powered by CamScanner

Llenado de los anclajes	Químico: sustancias químicas (cemento, aditivo) material particulado, polvos orgánicos e inorgánicos	Afectación respiratoria, visual Y dérmica, Irritación, quemaduras	1 Inspección maquinarias, equipos y herramientas 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Atender a señalización y recomendaciones de seguridad 4. Rotulación, manipulación y almacenamiento seguro de sustancias químicas 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI y EPCC 7. Inducción al cargo y capacitación. 8. Disponibilidad de hojas de seguridad y fichas técnicas 9. Personal idóneo para trabajo seguro en altura
	Condiciones de seguridad: mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos y fluidos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Físico: Ruido (intermitente)	Dolor de cabeza, estrés, hipoacusia	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
Lavado de maquinaria, herramientas y equipos	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	1 Inspección del área de trabajo 2 Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3 Reporte de actos y condiciones inseguras 4 Verificar puntos de anclajes 5 Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario 6 Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 7 Mantener áreas en orden y aseo 8 Pausas activas 10 Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 11 Uso adecuado de EPCC y EPI. 12 Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13 Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Químico: sustancias químicas (cemento, aditivo)	Afectación respiratoria visual y dérmica, irritación, quemaduras	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	1 Estar atento a las condiciones del entorno 2 Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Atender a señalización 4 Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad 5 Mantener condiciones de orden y aseo 6 Uso adecuado de EPI. 7 Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenomenos naturales (sismos, derrumbes); radiaciones no ionizantes

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES		
Nombres y Apellidos	No. De Identificación	Firma
olger sepulveda	1098640002	
Jonaton Villamizar	1123437663	Jonathan
Jaimes Farfan	1101014944	Jaimes

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)		
Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)		
Nombres y Apellidos	No. De Identificación	Firma

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. FECHA DE INICIO Y HORA	23	02	26	7:30	3. CENTRO DE TRABAJO	Arrayanes 2	
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	28	02	26	12:00m	4. ALTURA APROBADA	22 mts	5. EXCLUSIVO

6. PERSONAL AUTORIZADO Y REQUISITOS MÍNIMOS

7. FIRMA DEL EJECUTOR Y TRABAJADORES AUTORIZADOS EN TA

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTITUD PARA EL TRABAJO	ENTRENAMIENTO REQUERIDO	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL	FECHAS DEL TRABAJO 23/02/26	24/02/26	25/02/26	26/02/26	27/02/26	28/02/26	
							FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	SÁBADO	DOMINGO
1	Yiseth Lizarazo		Operador	✓	✓	✓							
2	Elias Restrepo		A. Perforación I	✓	✓	✓	Elias	Elias	Elias	Elias	Elias		
3	Jolman Cocia		A. perforación II	✓	✓	✓	Jolman						
4	Justin Villamizar		P. Perforación	✓	✓	✓							
5	Camila Davila		Ayudante	✓	✓	✓							
6	Jonathon V.		Ayudante				Jonaton	Jonaton	Jonathon	Jonathon			
7	Wilson Ariel		Ayudante						Wilson	Wilson	Wilson		
8													
9													
10													

8. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

		9. TRABAJO AUTORIZADO SI	NO
	Declaración de aceptación de salud		
	Certificado de salud ocupacional (examen)		
	Transporte de herramientas de puntas de acero		
✓	Herramientas de mano	✓	
✓	Herramientas de potencia		
	Comunicación y sistema de rescate		
	Equipo contra caídas		
	Otros		

9. ELEMENTOS Y APARATOS QUE DEBEN ESTAR EN EL SITIO DE TRABAJO PARA LA TAREA AUTORIZADA

9.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pick	Pinza de 18 libras		
Pala	Cincel		
Azadón	Pinza		
Palustre	Hacha		
Machete	Martillo		
Caja de Cebo	Lija		
Barreno	Taqueo		
Otra especifica	Cuña		
Pica de 6 libras	Lupa		

9.2. EQUIPO DE APOYO

Compresor	✓	Arnés especifico	
Unidad hidráulica	✓	Eslingas	
Hora de perforación	✓	Arnés de pecho	✓
Barras de extensión	✓		
Martillo de perforación	✓		
Cinturones	✓	Otros	
Cuñas	✓		
Varillas de perforación	✓		
Maquina hidráulica	✓		

10. DESCRIBA LA FORMA EN QUE SE REALIZA LA TAREA

11. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA

11.1. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD
PRESENTE ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN SER VERIFICADAS ANTES DE INICIAR LA TAREA

	✓	NA
CARGA SUSPENDIDA		
LÍNEAS CONTRA		
CAÍDA CONSIDERABLE		NA
PUNTOS DE ANCLAJE		
SISTEMA DE ATRAPAMIENTO		
SISTEMA DE ILUMINACIÓN		
SISTEMA DE ALARMA		
SISTEMA DE COMUNICACIÓN		
SISTEMA DE EVACUACIÓN		
SISTEMA DE RESCATE		
SISTEMA DE ATRAPAMIENTO		
SISTEMA DE ILUMINACIÓN		
SISTEMA DE ALARMA		
SISTEMA DE COMUNICACIÓN		
SISTEMA DE EVACUACIÓN		
SISTEMA DE RESCATE		

11.3. CONDICIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PERSONALES DE LA TAREA A REALIZAR

	✓	NA
PUNTO DE ANCLAJE		
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO		
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		NA
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		NA
ESLINGAS Y APLICACIONES		NA
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		NA
ESLINGA DE RETENCIÓN		NA
ESLINGA DE RESCATE		NA
ESLINGA DE ANCLAJE		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		NA
ESLINGA DE RETENCIÓN		NA
ESLINGA DE RESCATE		NA
ESLINGA DE ANCLAJE		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		NA
ESLINGA DE RETENCIÓN		NA
ESLINGA DE RESCATE		NA

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Observaciones de no verificación de salud actual

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC

191
169
1.70
1.09
1.80
1.60

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D
	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D	Melisu D

	Andy Monte R	Andy Monte R	Andy Monte R	Andy Monte R	Andy Monte R	Andy Monte R
	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres
	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m	7:30 a.m

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/8/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Floridablanca	Ciudad:	
Frente de obra:	Anclajes 2		
Fecha de inicio :	23-2-26	Fecha de Finalización:	28-02-26
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación. Tillor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (Inaleta mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caidas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?
Excavación		Caliente		

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus componentes	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6 Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras 10. Realizar pausas activas 11. Uso adecuado de EPCC y EPI 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Powered by CamScanner

Salud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10. Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Sirley Lizarazo	1099 940 201	
Camilo Davila	1061030176	
Elias Rodriguez	91459128	Elias
Jonatan Villamizar	1234734667	Jonathan
Wilson Mendez	91160320	Wilson

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

Anexo No. 2: Informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental.

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORADO POR:
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

FLORIDABLANCA

01 AL 28 DE FEBRERO

2026

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA** durante la ejecución de las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por movimientos en masa mediante la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander; teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción, el cual establece el Plan de Acción Socio Ambiental para proyectos que no requieren licenciamiento Ambiental.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de

la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación, corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución con la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander; con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.
- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander, se busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 28 de Febrero de 2026, dando inicio a los frentes correspondientes a los barrios arrayanes y lagos 2; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

FRENTE DE OBRA LAGOS 2

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Excavación mecánica bajo agua
- ✓ Excavación en Roca bajo agua
- ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m
- ✓ Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de río

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander; con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.
- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander, se busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 28 de Febrero de 2025, dando inicio a los frentes correspondientes a los barrios arrayanes y lagos 2; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

FRENTE DE OBRA LAGOS 2

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Excavación mecánica bajo agua
- ✓ Excavación en Roca bajo agua
- ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m
- ✓ Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de río

- ✓ Suministro y colocación de Concreto ciclopeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi
- ✓ Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm
- ✓ Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2
- ✓ Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00: 900m3

FRENTE DE OBRA ARRAYANES

- ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- ✓ Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- ✓ Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- ✓ Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- ✓ Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

FRENTE DE OBRA SANTA ANA

- ✓ Inicio Adecuación Areas de Campamento

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander, Santander. Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS	PASA -01
OBJETIVO	
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.	

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra:

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas.
- Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales.
- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros.
- Minimizar las necesidades de transporte de residuos.
- Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil.
- Reducir costos financieros.
- Optimizar la administración de materiales.
- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

- ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2025, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
6.5 Kg	2.0 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Floridablanca; esta empresa es responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco,

único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
En el periodo relacionado se generaron **2.0 Kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a una empresa legalmente constituida para realizar el aprovechamiento de este tipo de residuos, promoviendo así la economía circular y reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios. Este proceso facilita la reincorporación de los materiales reciclables en la cadena productiva, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad y al cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Manejo de material sobrante y RCD
Igualmente, durante el periodo de ejecución relacionado se realizaron actividades de excavación mecánica y en roca bajo agua, las cuales generaron **812 m3** de material sobrante (granular y roca) ; dicho material fue trasladado al sitio de disposición final Escombrera El Cairo (INVERNOTA S.A.S.); la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021. (ver Anexo No 2. Certificado de Disposición Final).

Así mismo, los vehículos destinados al transporte de material sobrante son llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 1257 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones.

Activades de Capacitación:
En el periodo relacionado se brindó capacitación al personal de los frentes de obra en los temas "Prevención de criaderos de zancudos y control de aguas estancadas en obra" (ver anexo No 3. Registro de Asistencia a Capacitación).





Puntos Ecológicos





Jornadas Periódicas de Orden y Aseo





Retiro de materiales para disposición final





Actividades de Capacitación Personal de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos												
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final												
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final												

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

6.5 Kg / 6.5 Kg *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma
La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.							PASA - 02
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

BENEFICIOS

A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera:

- Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado.
- Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles.
- Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante el periodo del 01 al 28 de Febrero de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Excavación mecánica bajo agua
- ✓ Excavación en Roca bajo agua
- ✓ Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m
- ✓ Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de río
- ✓ Suministro y colocación de Concreto ciclopeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi
- ✓ Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm
- ✓ Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2
- ✓ Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00: 900m3
- ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- ✓ Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- ✓ Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- ✓ Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- ✓ Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

Para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas:

- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.
- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.
- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los domingos y feriados.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.
- Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta el retiro de basuras y escombros. (Ver anexo No 4. Documentos de volquetas).

RELACION DE VEHÍCULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
TTW843	4308007289163000	31/10/2026	185644110	11/29/2026
PFK 979	34330739200	20/08/2026	183336093	09/08/2026
WFD114	9310013958602	31/05/2026	183883995	12/09/2026





Cerramiento Perimetral y materiales protegidos para control de emisiones y material particulado

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manejo adecuado de material de construcción												
Mantenimiento de vehículos y maquinaria												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

2 / 2 * 100 = 100%

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

3 / 3 * 100 = 100%

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios
- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. Manejo de materiales de construcción: El **Consorcio Estabilización Floridablanca** asegura que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños. El **Consorcio Estabilización Floridablanca** cuenta con la empresa Agremax S.A.S como proveedor autorizado para distribuir estos materiales. **Medidas aplicadas para el manejo de concreto** • El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo. • El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.							

- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohibe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.
- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.
- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

Teniendo en cuenta las actividades del periodo relacionado, se manejaron las siguientes cantidades de materiales pétreos:

MATERIALES	CANTIDADES USADAS
Cemento	400 bultos
Piedra Bolo	1200 m3





Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identificación y obtención de los materiales de construcción												
Transporte y disposición de materiales												
Medidas de manejo para concretos												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100

8/ 8 * 100 = 100%

2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100

Cemento (bultos) **400 / 400 * 100 = 100%** **Piedra Bolo (m3)** **1200 m3 / 1200 m3 * 100 = 100%**
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción. La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.							

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que, en caso de presentar derrames accidentales, será recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.

- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.



Suministro y colocación de concreto de 2000 psi



Excavaciones Mecánicas



Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00: 900m3



Ejecución perforación horizontal

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCION											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA
Indicador
• Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos. • Cumplir con los requerimientos ambientales
Descripción del Indicador
• Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales
Indicador de calificación
• Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100 **7 / 7 * 100 = 100%**
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos						PASA-05
OBJETIVO						
Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.						
TIPO DE MEDIDA						
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación
BENEFICIOS						
En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo: • Reducir el consumo • Prevenir la contaminación. • Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía. • Recircular aguas grises. • Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos. • Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.						
ACCIONES A EJECUTAR						
Para el periodo de ejecución del 01 al 28 de Febrero de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:						

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento; dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.
- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.
- Inicialmente se cuenta con dos unidades sanitarias portátiles para cada frente de obra (Arrayanes y Lagos II) en cada área destinada a los campamentos, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores. (ver Anexo No 5 Mantenimientos Unidad Sanitaria)
- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.
- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos





Unidades Sanitarias Portátiles frentes de Obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Transporte adecuado de ACPM												
Tanqueo de maquinaria con ACPM												
Aplicación del plan de contingencia												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Indicador
Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto
Descripción del Indicador
• Indicador servicio de baños. • Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.
Indicador de calificación
• No de US utilizadas/ No de US requeridas*100 2 / 2 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Para el periodo de ejecución del 01 al 28 de diciembre, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa: • Se realiza la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.							

- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.
- Se prohíbe el uso y porte de armas de fuego dentro de la obra.
- Se prohíbe la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre.

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.
- A partir de las condiciones identificadas en el área de Influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

Actividades de Aprovechamiento Forestal

Durante el periodo de informe relacionado se dio inicio a las actividades de intervención forestal autorizadas para el proyecto, conforme a lo establecido en el Acta No. 002 del 29 de octubre de 2025, mediante la cual se autorizó la intervención de un total de veintinueve (29) individuos arbóreos.

En este sentido, y de acuerdo con la planificación y dinámica de ejecución de las actividades constructivas, el Consorcio Estabilización Floridablanca procedió inicialmente con la intervención de cinco (5) individuos arbóreos, dando cumplimiento a las recomendaciones técnicas y lineamientos establecidos por la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Las actividades de aprovechamiento forestal se ejecutaron siguiendo las medidas de manejo ambiental establecidas, incluyendo la verificación previa de los individuos autorizados, la delimitación del área de intervención, la implementación de medidas de seguridad durante el proceso de tala y el manejo adecuado del material vegetal resultante.

La intervención de los individuos arbóreos restantes se realizará de manera progresiva, en función del avance de las actividades técnicas del proyecto y de las necesidades constructivas, procurando intervenir únicamente aquellos individuos estrictamente necesarios para el desarrollo de la obra.

De esta manera, las actividades se desarrollan conforme a los diseños técnicos del proyecto, la programación de obra y el compromiso ambiental asumido por el Consorcio Estabilización

Floridablanca, garantizando que la intervención forestal se realice de forma controlada, responsable y en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.





Actividades de Intervención Forestal





Actividades de Intervención Forestal

Implementación de medidas de protección para individuo arbóreo existente

Durante el periodo reportado, y como parte de las medidas de manejo ambiental implementadas en el proyecto, se realizó la construcción de un alcorque en concreto alrededor de un individuo arbóreo correspondiente a la especie guayacán rosado, ubicado en la parte superior del área de intervención del talud. Esta actividad se ejecutó con el propósito de proteger el sistema radicular del individuo, considerando su proximidad a las zonas donde se desarrollan las actividades constructivas. Es importante precisar que este árbol no se encuentra incluido dentro del permiso de intervención forestal otorgado para el proyecto, por lo cual no se efectuó ningún tipo de tala, poda o afectación al individuo

arbóreo. La construcción del alcorque se realizó únicamente como medida preventiva de protección y estabilización del suelo circundante, con el fin de minimizar posibles impactos derivados de la ejecución de la obra y contribuir a la conservación y permanencia del individuo arbóreo dentro del área del proyecto.





medidas de protección para individuo arbóreo existente





medidas de protección para individuo arbóreo existente

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural												
Manejo de la vegetación que permanecerá												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

8 / 8 * 100 = 100%

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

5 / 29 * 100 = 17 %

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de Indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							

El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo del 01 al 28 de Febrero de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

- Se mantiene la señalización requerida en las áreas del frente de obra.
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental





Señalización áreas de Campamento temporal





Señalización áreas de Campamento temporal

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Por parte del Interventor Ambiental
Indicador
Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.
Descripción del Indicador
Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.
Indicador de calificación
• # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar **2 / 2 * 100 = 100%** • # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados. **2 / 2 * 100 = 100%**
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.	PASA-08
OBJETIVO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.	
TIPO DE MEDIDA	

Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo del 01 al 28 de Febrero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Las áreas de campamentos de los frentes de obra cuentan con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y contará con señalización informativa y preventiva.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente.

- Los residuos sólidos generados en la instalación temporal son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos convencionales" y posteriormente son entregados a al operador del servicio de aseo del municipio.

- En el periodo relacionado se da inicio a la adecuación de lás áreas de campamento temporal del frente de obra Santa Ana para dar inicio en el próximd periodo a las actividades técnicas.





Áreas de Campamento y almacén temporal





Áreas de Campamento temporal frentes de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalación de infraestructura temporal												
Desmantelamiento de las instalaciones temporales												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100 **NO APLICA**
- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

4 / 4 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.9 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

3.9.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	**PGS-6.1-15**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Instalación de la oficina de atención a la comunidad Ubicar y adecuar la valla informativa de la obra en los diferentes frentes, se organiza la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de obras, con volante informativo que incluye número telefónico correo electrónico, donde se recibe, atiende y brinda respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexo de registro fotográfico y volante informativo) Se entrega el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al barrio Lagos II y Arrayanes II. (ver anexo de entrega de volante a la comunidad de Prados del Sur y Santa Ana) Se invita a las comunidades residentes en los barrios Santa Ana y Prados del Sur, a la reunión informativa de inicio de obras, desarrollada el martes 20 de enero de 2026, en el salón parroquial Santo Nombre de Jesús del barrio Prados del Sur, a las 6:40 p.m. (ver anexo de volante de invitación a las comunidades de influencia directa de la obra)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias											
EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD	X	X	X	X								

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

3.9.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-16**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la intervención a realizar, los datos especificos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Información a la comunidad El proyecto de intervención a desarrollar cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico. (ver anexo de registro fotográfico) La información se entrega a los actores sociales del proyecto, inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse. Se replica información del volante informativo de atención a la comunidad para conocimiento de los residentes en el área de influencia directa de la obra de mitigación y consolidación para el control de la erosión y se informa a la comunidad de Prados del Sur, Portal de Santa Ana y Altos de La Florida la elaboración de las actas de vecindad de inicio en este sector de obras, para su conocimiento y atención a lugar. (ver anexo de volante informativo) **Atención a la comunidad en PQRS** Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto de intervención a efectuar, los interesados, pueden acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, conforme las comunidades lo requieran, en la oficina de atención a la comunidad, en el horario de lunes a viernes.	
LUGAR DE APLICACIÓN	

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de intervención a desarrollar
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD 1	X		X	X								
ACTIVIDAD 2	X		X	X								
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X								

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

3.9.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar. Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Levantamiento de actas de vecindad El Contratista realiza 34 actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social	

o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor.
El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad de inicio desarrolladas por la obra de intervención a efectuar, para los casos de personas que no colaboran con la elaboración del documento, el Contratista realiza la actividad con un testigo.
Para la actividad de elaboración de las nueve actas de vecindad de inicio en los sectores de Prados del Sur, Portal de Santa Ana y Altos de La Florida, se entrega volante informativo a los residentes para su conocimiento y fines pertinentes. (volante informativo)

BARRIO	Número de actas de vecindad de inicio	Porcentaje
Lagos II	16	47%
Arrayanes II	9	26%
Prados del Sur	5	15%
Altos de La Florida	2	6%
Portal de Santa Ana	2	6%
TOTAL	**34**	**100%**

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.
Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.
Actas de compromiso.
Durante el presente periodo de obras no se ha requerido realizar esta actividad.

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD 1		X	X	X								
ACTIVIDAD 2		X	X	X								
ACTIVIDAD 3		X	X	X								

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:

Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra 34 / número de actas de vecindad realizadas 34 * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados 34 / número de actas de vecindad realizadas 34 * 100 = 100%	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

3.9.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	PGS-6.4-18
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se está construyendo una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, en áreas de ronda de río y espacio público, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

3.9.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria	PGS-6.5-19
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada.	

Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar. En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de intervención a efectuar, reciben formación el viernes 13 de febrero en temas de cultura vial. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD	X	X	X	X								

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de intervención a realizar
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales.

3.9.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).	
ACCIONES DESARROLLADAS	
El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal. A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en la oficina de empleo de Floridablanca o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se postulan los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador en caso de requerirse de estas acciones.	

Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y consolidación para el control de la erosión, el viernes 13 de febrero recibieron formación en temas varios de fortalecimiento del valor de la colaboración y oficina de atención a la comunidad, para mejorar dentro del grupo familiar, social, empresarial y laboral. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Bucaramanga y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD 1	X											
ACTIVIDAD 2	X											
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X								
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X								
ACTIVIDAD 5	X	X	X	X								

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 9 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 12 * 100 = 75%	Mano de obra del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra local 9 / registro en planillas de pago de seguridad social 9 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

3.9.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	PGS-6.7-21
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Conforme se está desarrollando una construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, este proyecto no aplica, conforme no cuenta con rubro presupuestal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

3.9.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	PGS-6.8-22
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

3.9.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	PGS-6.9-23
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	
ACCIONES A EJECUTAR	

Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a intervenir son áreas de ronda de río, de espacio público y propiedad del municipio de Floridablanca.
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	Código:	SST-F-98
	Fecha:	27/07/2021
	Versión:	1

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TIPO DE RESIDUO :

LUGAR: Arrayanes - Lagos II

ORDINARIO X RECICLAJE _____

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
6/02/2026		X	1,7	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Floridablanca, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
13/02/2026		X	1,9	
20/02/2026		X	1,9	
27/02/2026			2,0	
TOTAL			6,5	

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TIPO DE RESIDUO :

LUGAR: Arrayanes - Lagos II

ORDINARIO _____ RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
27/02/2026		X	2,0	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			2,0	

Revisó: Sandra Bermudez
Cargo: Ing. Ambiental
Firma:

ANEXO No 2. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

RCD
INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	
NIT	901.982.775 - 0	
DIRECCION DOMICILIO	CARRERA 39 # 51-31 APTO 2405	
TELEFONO CONTACTO	301 2765665	
DIRECCION ELECTRONICA	cons.estab.floridablanca@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	BARRIO ARRAYANES Y LAGOS II	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS EN MATERIAL GRANULAR Y ROCOSO, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	1258	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		1258

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **CUATRO** días (04) días del mes de **FEBRERO de 2026.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

invernota.rcd@gmail.com
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BG 16 TEL: 607-6159848

ANEXO No 3. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RHF-38
	Fecha	31/10/2022
	Versión	3
	Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Estabilizacion Floridablanca

TEMA DE CAPACITACION Prevencion accidentes de trabajos y control de plan estaticos

LUGAR Puente de Dora FECHA 13 Febrero 2026

CAPACITADOR Sandra Bermudez C. DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Camilo Javier Sabogal	1067030316	Ayudante	
2	Elias Rojas	91059128	ayudante	
3	Andres Pedro R.	1095809883	Almacenista	
4	Luis	1099990241	oficial	
5	Wilson Mendez	91078220	Ayudante	Wilson
6	Diego Galvis	1098506811	Ayudante	Diego
7	Huver Rivero	1098271660	ayudante	Huver R
8	Juan José Cardenas	1100876135	oficial	
9	Oscar Ortega R	91757696	oficial	
10	Mauricio A Bermudez	1067052221	Operador	
11	Juan Jose Mateus	1005346116	Almacenista	
12		88205188	Ayudante	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO No 4. DOCUMENTOS DE VOLQUETAS

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 24 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NATIOS	MODELO
4308007289183000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHICULO	
BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS.	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68[2]	
8,77	
HASTA	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se la pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Cosentimiento de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se compruebe que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual consiento y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 8-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487600, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951805	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900845507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000436854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRANSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



T03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTW843

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2018

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89951806

NRO. CHASIS: LVBDHPES4JN005111

VIN: LVBDHPES4JN005111

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 05 26	2025 06 01	2026 05 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ESTAMPILLA	CÓD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PROTECTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 320, 120, 140, 160, 712, 712, 721, 722, 731, 733, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarte una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para salud, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza, no tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ninguna prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y suporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamos y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que realizará sus datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFO116
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA: 3.700
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD TON/PAS: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 85936243
ANEX: N
VIN: LVBDHPES3HH000390
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3HH000390
REC: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3HH000390
RDO: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT. 900492507



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 562918000146112
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD:
FOLIOS: 141
No. FECHA EXPED.: 1 10/05/2018
PUESTOS: 2
FECHA MATRÍCULA: 28/05/2018
FECHA ENT. LIC. TRÁ.: 31/05/2018
FECHA VENCIMIENTO:
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TIOYTTE GIRON

LT02003920795

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFD114	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89806243
NRO. CHASIS:	LVBDHPES3HN005000	**VIN:**	LVBDHPES3HN005000
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031084291

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PKF979	CHEVROLET	C 70 189	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	ORO TOLEDANO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
21424425	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM004720	N	CM004720	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	C.C. 91186107

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
06/03/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO

LT08000124572

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183336093

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

Powered by CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2025 8 9	2025 8 10	2026 8 9

No. DE POLIZA	PLACA No	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE	MODELO
3430739200	PKF979	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1981

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
3	CHEVROLET	

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. VIN	CONFIGURACION
C 70 189	CM004720	CM004720	9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORTIZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL	3163615927	CC	91186107	GIRON

CODIGO ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICION	CLAVE PRODUCTO	No. PRELIMINAR	CIUDAD EXPEDICION
1306	26	55763896	3430739200	GIRON

RATA	VALOR SOAT	CONTRIBUCION FONSAT	VALOR RUNT
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL PAGADO

$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

DISTRIBUCION VICTIMAS	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹ 701,68²	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. GASTOS FUNERARIOS	750	

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documentos/42281273/76141288/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 192 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fosyga le debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en solo último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgaen en el futuro, así como novedades, alteración y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

ANEXO No 5 MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE

15846

Cliente: Cons Estabilizacion

Ubicación: Arrayanes Campo: 2

Hora de Inicio: 12:50 Hora Final: 1:00

Fecha: 4-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	11	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Andrés Duque D Firma:

Nombre Operador MASSI: TREDDY Firma:

cc

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

IMPRESO POR IDENTIDAD 310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15870

Cliente: Cons Estabilizacion

Ubicación: Arrayanes Campo:

Hora de Inicio: 3:00 Hora Final: 3:15

Fecha: 7-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Julian Padilla C. C. Firma:

Nombre Operador MASSI: Freddy C. C. Firma:

IMPRESO POR: IDENTICAD 6310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15891

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: cigüeñal 2 Campo: _____

Hora de Inicio: 12:25 Hora Final: 12 35

Fecha: 11 octubre 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	E		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrés Duarte R

C.C.

Firma: [signature]

Nombre Operador MASSI: [illegible]

C.C.

Firma: _____

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 20 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15956

Cliente: [illegible]

Ubicación: [illegible] Campo: _____

Hora de Inicio: 9:55 Hora Final: 9:25

Fecha: 24 febrero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	7
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	16		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: [illegible] Firma: [signature]

Nombre Operador MASSI: [illegible] Firma: _____

C.C.

IMPRESO POR IDENTIDAD 3170 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15972

Cliente: Condicio estab. Zacion

Ubicación: Guatiquara 2 Campo: _____

Hora de Inicio: 4:50 Hora Final: 5:00

Fecha: 17 febrero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____

CC

Nombre Operador MASSI: Sebastian Firma: _____

CC

IMPRESO POR: CENTIQUAD 1310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

16101

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: cristalina 1 Campo:

Hora de Inicio: 7:40 Hora Final: 7:55

Fecha: 23 (ebje c 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	7
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	7	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Andre Duque R Firma:

C. C.

Nombre Operador MASSI: Firma:

C. C.

IDENTIDAD 6 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

16115

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Suc. Ticoral 2 Campo: _____

Hora de Inicio: 17:46 Hora Final: 17:50

Fecha: 15 febrero 2016

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrés Duque R. Firma: _____

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

C.C.

IMPRESO POR: IDENTDAC 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - VO1

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

16160

Cliente: Consestabilisacion

Ubicación: Girardot Campo: _____

Hora de Inicio: 2:25 Hora Final: 3:35

Fecha: 27 - FEB - 26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
7	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrés Duque D. Firma: _____

C.C

Nombre Operador MASSI: Freddy Firma: _____

C.C

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15840

Cliente: Cons Estabilizacion
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: 2'40 Hora Final: 2 55
Fecha: 3-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma:

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15860

Cliente:
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha:

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma:

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15915

Cliente: Cons Estabilizacion
Ubicación: Lagos 2-2 Campo:
Hora de Inicio: 2:05 Hora Final: 2:15
Fecha: 10-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma:

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01
FO15

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15942

Cliente: Cons Estabilizacion
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: 2:10 Hora Final: 2:20
Fecha: 13-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma:

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01
FO1

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
16025

Cliente: Cons Estabilización
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: 2:00 Hora Final: 2:10
Fecha: 17-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	3	1	

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: Sierra

C.C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
16046

Cliente: Cons Estabilización
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: 3:00 Hora Final: 3:10
Fecha: 20-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	3	1	

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:

C.C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
16077

Cliente: Cons Estabilización
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: 1:00 Hora Final: 1:10
Fecha: 21-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	3	1	

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: Sierra

C.C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
16154

Cliente: Cons Estabilización
Ubicación: Lagos 2 Campo:
Hora de Inicio: 12:55 Hora Final: 1:10
Fecha: 27-FEB-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	3	1	

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: Sierra

C.C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Gir
FO19 - V0

ANEXO No 6 GESTIÓN SOCIAL

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra del Consorcio Estabilización Floridablanca en el sector de Lagos II



Valla informativa de la obra del Consorcio Estabilización Floridablanca en el sector de Arrayanes II



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad en el campamento de obras del barrio Lagos II



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad en el campamento de obras del barrio Arrayanes II



Capacitación con los colaboradores de la obra sobre fortalecimiento de valores en el barrio Arrayanes II



Actividad de elaboración de las actas de vecindad de inicio en el barrio Prados del Sur



Actividad de elaboración de actas de vecindad de inicio en el barrio Portal de Santa Ana de Floridablanca



Ellaboración de actas de vecindad de inicio en el barrio Altos de La Florida de Floridablanca

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO LAGOS II, ARRAYANES II Y PORTAL DE SANTA ANA DE FLORIDABLANCA

Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y el Consorcio Estabilización Floridablanca

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de la obra de control a la erosión en el barrio Lagos II

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio Estabilización Floridablanca.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

Tel: 3008070277

Correo electrónico: estabilizacionesinfra.corp@gmail.com

Volante: 05

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y el Consorcio Estabilización Floridablanca

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL A LA EROSIÓN EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de la obra de control a la erosión, barrio Los Arrayanes - Floridablanca

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio Estabilización Floridablanca.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
Tel: 3008070277
Correo electrónico: estabilizacionfloridablanca@gmail.com

Volante: 03

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y el Consorcio Estabilización Floridablanca

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL A LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA Y PRADOS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de la obra de control a la erosión, barrios Prados del Sur y Santa Ana de Floridablanca

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio Estabilización Floridablanca.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
Tel: 3008070277
Correo electrónico: estabilizacionfloridablanca@gmail.com

ANEXO 3. VOLANTE INFORMATIVO PARA REALIZAR LAS ACTAS DE VECINDAD DE INICIO EN LOS BARRIOS PRADOS DEL SUR, PORTAL DE SANTA ANA Y ALTOS DE LA FLORIDA DE FLORIDABLANCA

Volante 04

INFORMACIÓN DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y el Consorcio Estabilización Floridablanca

Informa a la comunidad y residentes del área de influencia directa de los sectores Prados del Sur, Portal de Santa Ana y Altos de Floridablanca, en desarrollo del proyecto denominado **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER**, que durante los días viernes 13 y sábado 14 de febrero del presente año, se estarán efectuando las actas de vecindad de inicio en cada uno de los predios o inmuebles ubicados en zona aferente a la obra en proceso constructivo.

Esta actividad consiste en realizar el registro fotográfico interno y externo de las viviendas ubicadas en zona de injerencia directa de la obra, con el fin de conocer el estado actual del predio, antes de iniciar la obra. Si el Consorcio Estabilización Floridablanca causa averías a las viviendas, está en la obligación de realizar los arreglos requeridos, siempre y cuando sea consecuencia de la obra a construir. Agradecemos su colaboración en el desarrollo de esta actividad.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

Tel: 3008070277

Correo electrónico: estabilizacionenfloorp@gmail.com

ANEXO 4. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS LAGOS II Y ARRAYANES II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

BARRIO	Número de actas de vecindad de inicio	Porcentaje
Lagos II	16	47%
Arrayanes II	9	26%
Prados del Sur	5	15%
Altos de La Florida	2	6%
Portal de Santa Ana	2	6%
TOTAL	**34**	**100%**

BARRIO LAGOS II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	CARLOS ARTURO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 1	Lagos II	91.262.617	3022830340
2	CARLOS ARTURO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 2	Lagos II	91.262.617	3022830340
3	LUIS ÁNGEL SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 3	Lagos II	1.095.818.100	3002851559
4	MARÍA CELINA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 4	Lagos II	37.830.791	3165464486
5	JOSEFINA CARREÑO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 5	Lagos II	28.023.198	3144513009
6	LUZ MAGALY CARREÑO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 6	Lagos II	63.504.167	3227106436
7	ÓSCAR CARREÑO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 7	Lagos II	13.543.785	3132714080
8	MARY ELVIRA CÁCERES	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 8	Lagos II	63.494.850	3102714381
9	CARLOS ARTURO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 9	Lagos II	91.262.617	3022830340
10	BETSY SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 11	Lagos II	1.098.634.505	3015251743
11	RUBÉN DARÍO SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 12	Lagos II	1.095.788.088	3142966894
12	JONATHAN SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 13	Lagos II	1.095.803.787	3152303200
13	LIBIA JANETH OSORIO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 14	Lagos II	63.497.531	3153242652
14	JAIRO DÍAZ	Calle 48 No. 5 – 73 Gallinero	Lagos II	13.848.537	3123560007
15	LUZ KARIME CRISTANCHO CALDERÓN	Calle 43 No. 5 - 47	Lagos II	37.728.113	3153242652
16	FANNY DÍAZ DE VELÁSQUEZ	Áreas de entorno y vías lindantes a la obra	Lagos II	22.991.659	3112625230

BARRIO ARRAYANES II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ISOLINA REYES GONZÁLEZ	Calle 103 No. 102 – 64 Piso 1	Arrayanes II	1.192.905.350	3182549834
2	MARISOL HERNÁNDEZ SEVILLA	Cra 55 No. 102 – 64 Piso 3	Arrayanes II	63.329.269	3112452032
3	JULIÁN MANTILLA ACEROS	Cra 54 A No. 102 - 46	Arrayanes II	91.292.349	3163553114
4	ELÍZABETH FONTECHA VARGAS	Cra 53 A No. 102 - 32	Arrayanes II	63.322.089	3194910068

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
5	SEBASTIÁN LEÓN	Carrera 54 No. 102 No. 47 - piso 1	Arrayanes II	1.005.150.827	3167668008
6	KAROL YULIANA CELIS	Cra 54 A No. 102 - 65	Arrayanes II	1.047.539.883	3152611437
7	KAROL YULIANA CELIS	Cra 54 No. 102 - 47	Arrayanes II	1.047.539.883	3152611437
8	DORIS CHANAGÁ CARVAJAL	Áreas de entorno y vías de Arrayanes II	Arrayanes II	63.360.628	3157605754

BARRIO PRADOS DEL SUR

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	LEILA GUEPENDO SILVA	CALLE 146 A No. 43 A - 08	Prados del Sur	51752377	3142995108
2	DANIEL DELGADO	CALLE 146 B No. 43 A - 03	Prados del Sur	1005799184	3007136356
3	GONZALO MORENO	CALLE 146 B No. 43 A - 03	Prados del Sur	91208590	3154523062
4	GONZALO MORENO	CALLE 146 B No. 43 A - 03	Prados del Sur	91208590	3154523062
5	LUZ DARY MOGOLLÓN	CALLE 146 B No. 43 A - 04	Prados del Sur	63490902	3157428060

PORTAL DE SANTA ANA

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	NANCY ACUÑA BARRAGAN	CRA 43 No. 143 A - 17 TORRE B	Portal de Santa Ana	63341930	3134159097
2	BERTHA VILLALOBOS SOLANO	CRA 43 A No. 143-02	Portal de Santa Ana	63432255	3178637000

ALTOS DE LA FLORIDA

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	HELIO NIÑO	CALLE 146 A No. 43 A - 03	Altos de la Florida	91450876	3182149306
2	ANA OLIVA MORENO	CALLE 146 A No. 43 A - 15	Altos de la Florida	63325751	3125105891

ANEXO 5. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN – PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	FREDDY MANRIQUE ESTUPIÑAN	13.516.255	27/07/1979	San Joaquin - Santander	Barrio ASOHELECHALES -	3506835516	Ayudante de obra
2	ELÍAS REÁTIGA RIATIGA	91.459.128	5/12/1963	San Andrés - Santander	Barrio Villa Leonor - Floridablanca	3024643280	Ayudante de obra
3	ANDRÉS LEONARDO DUARTE ROJAS	1.095.839.663	12/12/1996	Concepción - Santander	Barrio Portal de Santa Ana- Floridablanca	3203976136	Almacenista
4	LUIS ERNESTO BERMUDEZ PEREIRA	88.205.988	31/07/1972	San Andrés - Santander	Barrio ASOMIFLOR - Floridablanca	3112278271	Ayudante de obra
5	KILIAN ENRIQUE PERTUZ JIMÉNEZ	1.002.237.235	8/06/2002	Malambo - Atlántico	Barrio Páramo - Floridablanca	3045638308	Ayudante de obra
6	JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MEJÍA	1.095.338.626	12/04/2000	Bucaramanga - Santander	Barrio La Trinidad - Floridablanca	3238900875	Almacenista
7	MAURICIO BECERRA ORTIZ	1.053.562.221	9/07/1990	La Gloria - Cesar	Barrio Versalles - Floridablanca	3142634366	Operador
9	JHONATHAN VILLAMIZAR URBINA	1.234.339.663	4/09/1998	Arboletes - Norte de Santander	Barrio Bucarica - Floridablanca	3187462926	Ayudante de obra
9	EDUAR ALONSO REÁTIGA GONZÁLEZ	1.101.597.448	5/02/1992	San Andres - Santander	Portales de Jericó - La Cumbre - Floridablanca	3143734004	Almacenista

ANEXO 6. REGISTRO DE ASISTENCIA EN TEMAS FORMATIVOS CON LOS COLABORADORES DEL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA.

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA 210.16224.6: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 210.16224.6"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Estabilización Floridablanca		FECHA:	13/02/2026
CAPACITADOR:	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilson mendez	91260990	Ayudante	Wilson
2	Andre Duarte Reyes	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
5	ELIOS REALPE	91459128	AYUDANTE	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	ayuda	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	Operador	[illegible]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Anexo No. 3: Informe de gestión de proyectos.



INFORME 4 - SEGUIMIENTO PROGRAMA GERENCIA PROYECTOS

Proyecto: "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II

ELABORÓ
Consorcio Estabilización Floridablanca
Ing. Esp. gerencia de Proyectos

INFORME SEGUIMIENTO 4 DE 01/02/2026 A 28/02/2026

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA – NIT. 901.982.775-0

BUCARAMANGA – SANTANDER

Tabla de contenido

Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Gestión del Alcance del Proyecto 3
Alcance Ejecutado Acta Corte 3
Revisión de Estabilidad De Alcance 8
Cambios identificados 8
Gestión del Tiempo Del Proyecto 8
Plan de Gestión del Tiempo 8
Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma 8
Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma 9
Proceso de control del Schedule (Cronograma) 9
Procedimiento de Cambios en Cronograma 9
Línea Base Control del Tiempo 10
Hitos 10
Causas de Atraso / Adelanto 12
Medición Línea Base 13
Proyecciones sobre indicadores obtenidos 14
Cambios identificados 15
Reprogramaciones Realizadas 15
Compromisos Adquiridos 15
Gestión de Costos del Proyecto 16
Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado 16
Procesos de Gestión de Costos 16
Sistema Gestión de costo 16
Sistema de Control de Costos 17
Proyecciones sobre indicadores obtenidos 17

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Sistema de Control de Cambios de Costos 18
Línea Base Presupuesto 18
Presupuesto Inicial del Proyecto 18
Línea Base de costo actualizada 26
Cambios identificados 26
Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado 27
Revisión de Estabilidad Valor 28
Inclusión de Cambios en presupuesto (Actas Modificatorias) 29
Compromisos Adquiridos 29

SGP-12 Seguimiento Programa Gerencia Proyectos

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Introducción

Se ha comprobado que la aplicación de los procesos de dirección de proyectos de la Guía del PMBOK® Sexta Edición 2017 (Project Management Body of Knowledge) aumentan la probabilidad de éxito de los proyectos por esta razón, se hace indispensable que la empresa quiera adoptar y aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos para el cumplimiento efectivo de los objetivos del mismo.

El Presente documento contiene el informe de **seguimiento #4** al programa de gerencia de proyectos implementado y actualizado dentro del proyecto, y recopila desde cada una de las áreas de conocimientos, métricas, indicadores, desviaciones y trazabilidad del proyecto que describe cómo ha trascurrido su ejecución desde los lineamientos del Estándar de la guía del PMBOK® Sexta Edición 2017.

Objetivo General

El objetivo general de este seguimiento es gerencialmente y alineados con las buenas prácticas del PMI, revisar y realizar seguimiento al estado del programa de gerencia de proyectos implementados dentro del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER", recopilar los datos concernientes a la ejecución, procesarlos y establecer indicadores y estado en general tanto del proyecto como del programa de gerencia implementado.

Objetivos Específicos

Realizar seguimiento específico a cada una de las áreas del conocimiento contenidas en el programa para la gerencia de proyectos diseñado y actualizado para el proyecto en específico, actualización y control a indicadores provenientes de datos procesados del proyecto, y su respectiva comparación con los planes vigentes y las líneas base correspondientes.

Gestión del Alcance del Proyecto

Alcance Ejecutado Acta Corte

Avance en Ejecución: a la fecha 36,46% $ 2.635.943.827,81

Alcance Ejecutado Actual:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE

FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00				
ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD LINEA BASE	CANTIDAD EJECUTADA
	SECCIÓN PRIMERA			
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	5,00	4,55
1.03	Vallas y señales especiales			
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	1,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	1568,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	392,00	391,85
	SECCIÓN SEGUNDA			
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes			
2.01.A	Excavación con acarreo libre			
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	4461,00	4460,50
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	496,00	495,20
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	2974,00	1380,00
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	331,00	183,80
2.02	Terraplenes y Rellenos			
2.02.03	Suministro, conformación y compactación de rellenos estructurales	m3	6331,63	0,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	152684,00	120535,10
2.05	Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de rio	m3	1809,00	909,00
	SECCIÓN TERCERA			
3.00	Concretos			
3.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclópeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	588,00	288,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	157,00	0,00
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	588,00	288,00
	SECCION CUARTA			
4.00	Aceros			
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	1521,00	744,96
	SECCIÓN SEXTA			
6.00	Varios			
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	204,00	0,00
6.05	Filtro con tela			
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m2	1176,00	0,00
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	2940,00	900,00
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	49,00	0,00

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD LINEA BASE	CANTIDAD EJECUTADA
	SECCION PRIMERA			
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	2,00
1.03	Vallas y señales especiales			
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	1,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1380,00	1380,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	414,00	413,12
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1334,34	1333,80
	SECCION SEGUNDA			

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

2.01	Excavación a tajo abierto en taludes			
2.01.A	Excavación con acarreo libre			
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2668,69	2667,49
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	667,17	665,13
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	69,00	0,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	34743,10	32038,18
2.04	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	1067,70	1065,26
	SECCION TERCERA			
3.00	Concretos			
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	69,00	0,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m2	1380,00	0,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	173,00	76,00
	SECCION CUARTA			
4.00	Aceros			
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	13911,00	0,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes			
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	345,00	152,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	345,00	0,00
4.04	Suministro y colocación			
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	1380,00	0,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	345,00	0,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	345,00	0,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	345,00	0,00
	SECCION QUINTA			
5.00	Perforaciones horizontales			
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	225,00	0,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	75,00	0,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	5175,00	2280,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1725,00	760,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	7200,00	3040,00
	SECCION SEXTA			
6.00	Varios			
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	133,00	0,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	29,00	0,00
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	435,00	0,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Revisión de Estabilidad De Alcance

Alcance del Objeto

El alcance ejecutado se alinea en ejecución y objetivo de cumplir con el objeto del contrato, no se han surtido nuevos cambios contractuales que afecten o pongan en riesgo la obtención del fin último para el cual se ejecuta el contrato, ni para el contratante ni para el contratista, se han visto impactado en modificaciones de tipo técnico, de tiempo y de costo, pero estas no varían ni presentan desviación en el alcance del objeto contractual.

Alcance del Producto

El proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER" no ha sufrido modificaciones en disminución o ampliación de su alcance, es decir no ha sido eliminado ni adicionado ningún tramo que no fuera concebido dentro del objeto del contrato.

Cambios identificados

Sin cambios hasta corte informe.

Gestión del Tiempo Del Proyecto

Plan de Gestión del Tiempo

Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma

Nombre	Cargo	Ubicación
Edgar Leonardo Gómez Roncancio.	Representante Legal	Oficina Contratista
Juan Carlos Rincón Lozano.	Gerente de Proyecto	Oficina Contratista
Juan Carlos Reyes Novia.	Director General CDMB	CDMB
Carlos Días Barrera.	Representante Cliente	CDMB
Carlos Andrés Jaimes Suarez.	Director Interventoría	Oficina Interventoria Proyecto
Nestor Javier Jacome Ortiz.	RL Interventoría	Oficina Interventoria Proyecto

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma
En Escala de Aprobación.

Cargo	Integrante
Director de Proyecto	Contratista
Director Interventoría	Interventoria
Supervisor Proyecto	Contratante

Proceso de control del Schedule (Cronograma)

Dentro del presente proyecto se plantea realizar monitoreo y control calendarizado, a nivel de tiempo este se estableció para cada 15 días realizar monitoreo y cada 30 días realizar control con el corte de cantidades y presupuesto (Acta de obra) conjuntamente el seguimiento de control de costos. A continuación, se presentan las fechas de hitos de control y su distribución en programación.

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto	
Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente	Accidentes de trabajo.
Desastres naturales.	Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.
Huelgas y problemas de orden público	Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Atrasos ocasionados por los sub-contratistas.	Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

Cómo los cambios al Cronograma serán Administrados	
Designación de Responsabilidades	
Planificación	Ing Residente del proyecto / VoBo Gerente Proyecto
Ejecución	Ing Residente del Proyecto / VoBo Director Proyecto
Seguimiento y Control	Planeador / Director Proyecto

Procedimiento de Cambios en Cronograma

Provenientes de Subcontratistas o resultantes de atraso de proveedores

- Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser presentadas por el representante del subcontratista
- Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera instancia, si fuese un cambio "viable" según el plan de gestión del alcance (No debe pasar del 5% del cronograma del proyecto).
- Las solicitudes de cambio de cronograma se comenzarán a revisar los sábados de cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La solicitud de cambio será aprobada en su momento con la firma del Director de Proyecto.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto, se procederá de la siguiente manera

- La Oficina de Proyectos luego de evaluar la causa de demora en el cronograma debido a un inconveniente, informará el Director del Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma.
- El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluarán la situación para determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente manera:
- Si la solicitud de cambio del cronograma afecta el alcance del proyecto o sobrepasa los límites de atraso en el cronograma establecidos entonces se deberá presentar una solicitud a interventoría en donde se informe de manera clara y detallada de la situación.
- La Interventoria, dentro de sus procedimientos, deberá tener un tiempo fijo estipulado para la aprobación de la solicitud de cambio en el cronograma y posteriormente presentar la solicitud a la Secretaria de Infraestructura del municipio.
- La Supervisión, dentro de sus procedimientos, también deberá contar con un tiempo estipulado pronunciarse acerca de los cambios de cronograma y adiciones en tiempo de ser necesarias, todo el procedimiento anterior será objeto de informe que soporta la solicitud de extensión de tiempo.

Línea Base Control del Tiempo

A continuación, se presentan las fechas de control, junto con los hitos que se revisaron en la ejecución y las mediciones esperadas realizadas en las fechas hitos de medición a la programación y los respectivos porcentajes % de avance (en tiempo) Sobre las actividades programadas para cada fecha de control.

Hitos

Hitos del Proyecto

Nombre de tarea	Duración	Comienzo
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00	323 días	mié 15/10/25
INICIO	0 días	Mié 15/10/2025
SECCIÓN PRIMERA	150 días	mié 15/10/25

INICIO SECCIÓN PRIMERA	0 días	mié 15/10/25
FIN SECCIÓN PRIMERA	0 días	jue 5/03/26
SECCIÓN SEGUNDA	220 días	dom 16/11/25
INICIO SECCIÓN SEGUNDA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN SEGUNDA	0 días	jue 11/06/26
SECCIÓN TERCERA	240 días	mié 26/11/25
INICIO SECCIÓN TERCERA	0 días	mié 26/11/25
FIN SECCIÓN TERCERA	0 días	vie 10/07/26
SECCIÓN CUARTA	150 días	mié 26/11/25
INICIO SECCIÓN CUARTA	0 días	mié 26/11/25
FIN SECCIÓN CUARTA	0 días	jue 16/04/26
SECCION SEXTA	248 días	mié 24/12/25
INICIO SECCIÓN SEXTA	0 días	mié 24/12/25
FIN SECCIÓN SEXTA	0 días	vie 14/08/26
FIN	0 días	vie 14/08/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS SECTORES CRITICOS DEL BARRIO SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ALEDAÑOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		jue 15/01/26
INICIO		**jue 15/01/26**
SECCION PRIMERA	**90 días**	**jue 15/01/26**
INICIO SECCIÓN PRIMERA	0 días	jue 15/01/26
FIN SECCIÓN PRIMERA	0 días	jue 9/04/26
SECCION SEGUNDA	**50 días**	**jue 12/02/26**
INICIO SECCIÓN SEGUNDA	0 días	jue 12/02/26
FIN SECCIÓN SEGUNDA	0 días	mar 31/03/26
SECCION TERCERA	**180 días**	**jue 12/03/26**
INICIO SECCIÓN TERCERA	0 días	jue 12/03/26
FIN SECCIÓN TERCERA	0 días	vie 28/08/26
SECCION CUARTA	**210 días**	**jue 12/03/26**
INICIO SECCIÓN CUARTA	0 días	jue 12/03/26
FIN SECCIÓN CUARTA	0 días	sáb 26/09/26
SECCION QUINTA	**180 días**	**jue 12/03/26**
INICIO SECCIÓN QUINTA	0 días	jue 12/03/26
FIN SECCIÓN QUINTA	0 días	vie 28/08/26
SECCION SEXTA	**30 días**	**mié 16/09/26**
INICIO SECCIÓN SEXTA	0 días	mié 16/09/26

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

FIN SECCIÓN SEXTA	0 días	mié 14/10/26
FIN	0 días	mié 14/10/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		mié 15/10/25
SECCIÓN PRIMERA	60 días	mié 15/10/25
INICIO SECCIÓN PRIMERA	0 días	mié 15/10/25
FIN SECCIÓN PRIMERA	0 días	mié 15/12/25
SECCIÓN SEGUNDA	125 días	dom 2/11/25
INICIO SECCIÓN SEGUNDA	0 días	dom 2/11/25
FIN SECCIÓN SEGUNDA	0 días	sáb 28/02/26
SECCIÓN TERCERA	137 días	dom 16/11/25
INICIO SECCIÓN TERCERA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN TERCERA	0 días	mié 25/03/26
SECCIÓN CUARTA	150 días	dom 16/11/25
INICIO SECCIÓN CUARTA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN CUARTA	0 días	mar 07/04/26
SECCIÓN QUINTA	90 días	dom 16/11/25
INICIO SECCIÓN QUINTA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN QUINTA	0 días	lun 09/02/26
SECCION SEXTA	115 días	vie 26/12/25
INICIO SECCIÓN SEXTA	0 días	vie 26/12/25
FIN SECCIÓN SEXTA	0 días	lun 13/04/26
FIN	0 días	lun 13/04/26

Causas de Atraso / Adelanto

Para la fecha se toman datos de cantidades ejecutadas correspondientes al 36,46%, mientras el esperado es de 53,64% en el presupuesto general; evidenciándose un desfase en la ejecución. Esta situación ha estado influenciada principalmente por factores externos

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

y condiciones propias de la obra, entre los que se destacan el incremento en el nivel del río Frío debido al régimen de lluvias registrado en periodos anteriores, lo cual generó restricciones operativas temporales y afectaciones en zonas intervenidas. Asimismo, en el frente Arrayanes se presentaron menores rendimientos en las labores de perforación como consecuencia de la presencia de rellenos antrópicos con alta incidencia de elementos metálicos, que dificultaron los procesos constructivos inicialmente previstos.

Adicionalmente, el inicio de actividades en los frentes de Prados del Sur y Santa Ana continúa condicionado a la aprobación del Programa de Manejo de Tránsito (PMT); no obstante, se han adelantado actividades preliminares necesarias para su futura intervención. Frente a este panorama, la dirección del proyecto ha venido implementando medidas de reorganización de frentes, optimización de recursos y ajustes en la secuencia constructiva, orientadas a mejorar los indicadores de desempeño y propender por la recuperación progresiva del cronograma contractual.

Medición Línea Base

Se plantea comparación mensual con el 36,46% de avance en tiempo (por actividad) según lo expuesto en las hojas de ruta de medición anteriormente presentadas, la evaluación del SPI, de lo realmente ejecutado Vs lo planeado, este puede ser evaluado tanto actividad por actividad como en las actividades resumen (Capítulos) y el proyecto completo.

Los resultados deben ser interpretados como se presenta a continuación:

SPI - Schedule Performance Index. Es un índice que compara el EV (Valor Ganado), es decir lo avanzado, contra el PV (Valor Planeado) lo que se tenía pensado avanzar a un momento dado.

- Si el SPI es igual a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando al ritmo previsto durante el presupuesto.
- Si el SPI es mayor a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando a un ritmo mayor al previsto en el presupuesto.
- Si el SPI es menor a 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que el previsto.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Procesos de Gestión de Tiempo	*Valor Actual*
EV- Valor Ganado	$7.647.693.015,98
PV - Valor Planeado	$11.252.211.376,97

SPI ACTUAL: 55,60%– Ritmo financiero menor al previsto.

Dados los resultados obtenidos se requiere reforzar los frentes de obra establecidos, debido a que la diferencia entre los valores planeados respecto a los valores ejecutados ha venido ampliándose, lo cual podría generar un eventual retraso en la entrega. Con el refuerzo en los frentes de trabajo e inicio de los frentes se espera cumplir con el plazo contractual, así como con el presupuesto actualizado.

Proyecciones sobre indicadores obtenidos

- Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t). Pronostica la duración del proyecto. Se recomienda obtenerla a partir de un análisis de la red del proyecto, aunque también se podría obtener un estimado aproximado de la duración final usando el SPI, en caso de que la tendencia continúe: EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI
- Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt). VACt = Duración de la PMB – EACt

Procesos de Gestión de Costos	*Valor Actual*
BAC - Presupuesto a Completamiento	**$ 20.976.440.913,07**
EV- Valor Ganado	**$7.647.693.015,98**
PV - Valor Planeado	**$11.252.211.376,97**

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	$ 0,00
Variación de Tiempo	SV=EV-PV	-$ 3.604.518.360,99
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1,00
Índice Desempeño Tiempo	SPI=EV/PV	68%
Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t).	EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI	17,66 Meses

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Tiempo Faltante (Time to Complete)	TTC=EACt-Tiempo transcurrido	14,11 Meses
Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt).	VACt = Duración de la PMB – EACt	-5,656 Meses

El análisis de Valor Ganado del periodo evidencia que el proyecto mantiene un adecuado control presupuestal, presentando una variación de costo nula (CPI = 1,00), lo que indica coherencia entre el valor ejecutado y los recursos invertidos. No obstante, en términos de programación se observa una variación negativa en tiempo (SPI = 0,68), reflejando un desfase frente a la línea base establecida. De acuerdo con la proyección actual la duración estimada del proyecto supera la inicialmente programada, situación atribuible principalmente a restricciones operativas y condiciones externas presentadas durante el periodo. Se han planteado acciones de reorganización y optimización de frentes de trabajo con el fin de mejorar el rendimiento y recuperar progresivamente el atraso identificado.

Cambios identificados

En cuanto a los cambios identificados en tiempo:

- No se presentan cambios en cronograma

Reprogramaciones Realizadas

- No se han realizado reprogramaciones

Compromisos Adquiridos

- Con el fin de recuperar progresivamente el desfase presentado, la dirección del proyecto se compromete a implementar un plan de optimización del cronograma que contemple la intensificación de actividades en los frentes activos, el aprovechamiento de jornadas con condiciones climáticas favorables y la programación de trabajos en horarios extendidos cuando sea necesario. Asimismo, se fortalecerán los procesos constructivos en el frente Arrayanes mediante ajustes operativos que permitan mejorar los rendimientos frente a las condiciones del subsuelo identificadas.
- Se realizará seguimiento mensual a los indicadores de desempeño con el propósito de verificar la efectividad de las medidas adoptadas y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Gestión de Costos del Proyecto

Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Modo: Quien/Cómo/Cuando/Donde*
Variación de Costo	CV=EV-AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPi=(BAC-EV)/(EAC-AC)	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión

Procesos de Gestión de Costos

Procesos de Gestión de Costos	*Descripción*
AC-Costo Actual	Departamento Contable / Cuentas de Control / Mensual / Formato AC
EV-Valor Ganado	Ejecución (Residente/Director) / Mediciones de Avance o Actas de Corte / Mensual / Formato EV - Presupuesto
Gestión Compras	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras
Gestión Logística	Departamento de Transportes / Cuenta Control Transportes / Mensual / Revisión fletes vs presupuesto
Gestión Recurso Humano	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras

Sistema Gestión de costo

- Gestión de tiempos en campo / Medición y toma de datos de rendimientos en las actividades claves
- Gestión de tiempos en Oficina / Recopilación y procesamiento de datos recibidos para informes de tiempo
- Gestión de tiempos administrativos / Procesamiento de tiempos de contratación, compras.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Sistema de Control de Costos

- Gestión de costos en campo / Mediciones de avance o cortes de obra / Control de compras y consumos por actividad
- Gestión de costos en oficina / Alimentación de avance para estimación de EV / Recepción y procesamiento de datos del departamento contable para cálculo de AC / Elaboración de informes con información procesada y estimaciones realizadas con fórmulas de EV
- Gestión de Costos Administrativos / Evaluación de compras, contrataciones, costos administrativos

Procesos de Gestión de Costos	*Valor Actual*
AC- Costo Actual	**$7.647.693.015,98**
EV- Valor Ganado	**$7.647.693.015,98**
PV - Valor Planeado	**$11.252.211.376,97**
Gestión Compras	1.0
Gestión Logística	1.0
Gestión Recurso Humano	1.0

Proyecciones sobre indicadores obtenidos

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ 13.328.747.897,08
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 20.976.440.913,07
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPi=(BAC-EV)/(EAC-AC)	1.0

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Sistema de Control de Cambios de Costos

- Para mantener la integridad de la línea base se debe establecer como requisito la Solicitud formal externa o interna de cambio, evaluación por el equipo del proyecto, estimación y presupuesto definitivo del mismo para aprobación conjunta con patrocinador y actualización de línea base.

Línea Base Presupuesto

Presupuesto Inicial del Proyecto

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SECCIÓN PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	5,00	$ 11.689.695,00	$ 58.448.475,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.688.664,00	$ 2.688.664,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	$ 5.503,00	$ 8.628.704,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	392,00	$ 87.397,00	$ 34.259.624,00
				Subtotal	$ 104.025.467,00
	SECCIÓN SEGUNDA				
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	4461,00	$ 50.375,00	$ 224.722.875,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	496,00	$ 92.017,00	$ 45.640.432,00
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	2974,00	$ 70.741,00	$ 210.383.734,00
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	331,00	$ 118.361,00	$ 39.177.491,00
2.02	Terraplenes y Rellenos				

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

2.02.03	Suministro, conformación y compactación de rellenos estructurales	m3	6331,63	$ 148.145,00	$ 937.999.326,35
2.03	Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	152684,00	$ 4.024,00	$ 614.400.416,00
2.05	Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de rio	m3	1809,00	$ 70.395,00	$ 127.344.555,00
				Subtotal	$ 2.199.668.829,35
	SECCIÓN TERCERA				
3.00	Concretos				
3.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclópeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	588,00	$ 724.270,00	$ 425.870.760,00
3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	157,00	$ 1.292.606,00	$ 202.939.142,00
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	588,00	$ 96.922,00	$ 56.990.136,00
				Subtotal	$ 685.800.038,00
	SECCIÓN CUARTA				
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	1521,00	$ 12.209,00	$ 18.569.889,00
				Subtotal	$ 18.569.889,00
	SECCIÓN SEXTA				
6.00	Varios				
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	204,00	$ 263.974,00	$ 53.850.696,00
6.05	Filtro con tela				
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m2	1176,00	$ 28.198,00	$ 33.160.848,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	2940,00	$ 400.577,00	$ 1.177.696.380,00
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	49,00	$ 14.662,00	$ 718.438,00
				Subtotal	$ 1.265.426.362,00
	Valor Costos directos				$ 4.273.490.585,35
	Administración:			24%	$ 1.025.637.740,48
	Imprevistos			1%	$ 42.734.905,85
	Utilidades:			5%	$ 213.674.529,27
	A.I.U.:			30%	$ 1.282.047.175,60
	I.V.A.			19%	$ 40.598.160,56
	VALOR TOTAL OBRA				$ 5.596.135.921,51

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS SECTORES CRITICOS DEL BARRIO SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ALEDAÑOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
-	SECCION PRIMERA	-	-		-
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	$ 11.689.695,00	$ 23.379.390,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.688.664,00	$ 2.688.664,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

1.04	Desmonte y limpieza	m2	2583,00	$ 5.503,00	$ 14.214.249,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	645,75	$ 87.397,00	$ 56.436.612,75
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1033,16	$ 192.597,00	$ 198.983.516,52
				Subtotal	$ 295.702.432,27
-	SECCION SEGUNDA	-	-	-	-
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	1678,88	$ 50.375,00	$ 84.573.580,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	904,01	$ 92.017,00	$ 83.184.288,17
2.02.02	Suministro y conformación de material filtrantes en zanjas y drenes	m3	33952,18	$ 4.024,00	$ 136.623.572,32
				Subtotal	$ 304.381.440,49
-	SECCION TERCERA	-	-	-	-
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	144,00	$ 1.167.505,00	$ 168.120.720,00
				Subtotal	$ 168.120.720,00
-	SECCION CUARTA	-	-	-	-
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.05	Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m	und	718,00	$ 786.836,00	$ 564.948.248,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.03	Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV	m2	2583,00	$ 170.566,00	$ 440.571.978,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

4.08	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero	und	718,00	$ 71.278,00	$ 51.177.604,00
				Subtotal	$ 1.056.697.830,00
-	SECCION QUINTA	-	-	-	-
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	6462,00	$ 441.807,00	$ 2.854.956.834,00
				Subtotal	$ 2.854.956.834,00
-	SECCION QUINTA	-	-	-	-
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	195,00	$ 135.840,00	$ 26.488.800,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	294,00	$ 263.974,00	$ 77.608.356,00
				Subtotal	$ 104.097.156,00
	Valor Costos directos				$ 4.783.956.412,76
	Administración:			24%	$ 1.148.149.539,06
	Imprevistos			1%	$ 47.839.564,13
	Utilidades:			5%	$ 239.197.820,64
	A.I.U.:			30%	$ 1.435.186.923,83
	I.V.A.			19%	$ 45.447.585,92
	VALOR TOTAL OBRA				$ 6.264.590.922,51

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SECCION PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	$ 11.689.695,00	$ 23.379.390,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.688.664,00	$ 2.688.664,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1380,00	$ 5.503,00	$ 7.594.140,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	414,00	$ 87.397,00	$ 36.182.358,00
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1334,34	$ 192.597,00	$ 256.989.880,98
				Subtotal	$ 326.834.432,98
	SECCION SEGUNDA				
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2668,69	$ 50.375,00	$ 134.435.258,75
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	667,17	$ 92.017,00	$ 61.390.981,89
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	69,00	$ 255.876,00	$ 17.655.444,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	34743,10	$ 4.024,00	$ 139.806.234,40
2.04	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	1067,70	$ 1.726,00	$ 1.842.850,20
				Subtotal	$ 355.130.769,24
	SECCION TERCERA				
3.00	Concretos				

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	69,00	$ 1.099.361,00	$ 75.855.909,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m2	1380,00	$ 383.707,00	$ 529.515.660,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	173,00	$ 1.167.505,00	$ 201.978.365,00
				Subtotal	$ 807.349.934,00
	SECCION CUARTA				
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	13911,00	$ 12.209,00	$ 169.839.399,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	345,00	$ 891.145,00	$ 307.445.025,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	345,00	$ 57.761,00	$ 19.927.545,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	1380,00	$ 37.338,00	$ 51.526.440,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	345,00	$ 83.370,00	$ 28.762.650,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	345,00	$ 159.477,00	$ 55.019.565,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	345,00	$ 97.419,00	$ 33.609.555,00
				Subtotal	$ 666.130.179,00
	SECCION QUINTA				
5.00	Perforaciones horizontales				

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	225,00	$ 457.068,00	$ 102.840.300,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	75,00	$ 509.946,00	$ 38.245.950,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	5175,00	$ 441.807,00	$ 2.286.351.225,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1725,00	$ 469.209,00	$ 809.385.525,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	7200,00	$ 209.754,00	$ 1.510.228.800,00
				Subtotal	$ 4.747.051.800,00
	SECCION SEXTA				
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	133,00	$ 135.840,00	$ 18.066.720,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	29,00	$ 263.974,00	$ 7.655.246,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	435,00	$ 75.858,00	$ 32.998.230,00
				Subtotal	$ 58.720.196,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

	Valor Costos directos	-	$ 6.961.217.311,22
	Administración:	24%	$ 1.670.692.154,69
	Imprevistos	1%	$ 69.612.173,11
	Utilidades:	5%	$ 348.060.865,56
	A.I.U.:	30%	$ 2.088.365.193,36
	I.V.A.	19%	$ 66.131.564,46
	VALOR TOTAL OBRA		$ 9.115.714.069,04

Línea Base de costo actualizada

Línea de base sin cambios a fecha de corte.

Cambios identificados

No hay cambios a la fecha.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado

La gráfica presenta el seguimiento al programa de inversiones del proyecto, comparando el porcentaje programado frente al porcentaje ejecutado con base en las actas mensuales. De acuerdo con la programación establecida, se proyecta un avance progresivo que inicia en octubre de 2025 y alcanza el 100 % en octubre de 2026.





Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305



Con corte al periodo reportado, el avance ejecutado se encuentra por debajo de lo programado, lo cual evidencia una desviación frente al cronograma inicial. No obstante, se prevé que con el fortalecimiento de los frentes de trabajo y la optimización de las actividades en obra se logre recuperar gradualmente el ritmo de ejecución y acercar el comportamiento real al programado en los próximos periodos.

Revisión de Estabilidad Valor

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	**$ 13.328.747.897,08**
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 20.976.440.913,07

El valor total del proyecto es de $ 20.976.440.913,07 el cual se mantiene estable en alcance y costo, sin embargo, es importante continuar realizando monitoreo a cambios de balances, identificación de actividades no previstas e incidencias administrativas.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Inclusión de Cambios en presupuesto (Actas Modificatorias)

No aplica.

Compromisos Adquiridos

Para el próximo periodo se priorizará el fortalecimiento de los frentes activos y la recuperación progresiva del cronograma, con el objetivo de mejorar los indicadores de desempeño y asegurar el avance integral del proyecto. Asimismo, se prevé el inicio de actividades en los frentes restantes y la intensificación de las labores durante condiciones climáticas favorables, mediante la ampliación de jornadas diurnas y trabajo en días festivos.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Anexo No. 4: Aseguramiento de la calidad.

CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN EN CAMPO

CODIGO	OB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 DE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN OBRA	FRENTE ARRAYANES II

PERFORACIÓN HORIZONTAL E INYECCIÓN DE ANCLAJES

Tipo de perforación	Anclaje activo
Longitud total	20.00m
Longitud libre	12.00m
Longitud Bulbo	8.00m
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de torones	3 torones de 1/2"de 20.00
Diametro perforación	3"

Tipo de perforación	Dren
Longitud total	20.00m
Longitud libre	
Longitud Enmcamisado	20.00m
Cantidad de tubería	1 tubo de 2" de 20.00m
Diametro perforación	3"

Diseño de mezcla inyección	
Cantidad de agua	21 litros
Bultos de cemento	1 bulto
Plastol 4000 ultra	100ml
Cono de Marsh	18 seg
Resistencia 28 días	3000psi - 21MPa
Diametro perforación	20.00m

ITEM	No. DE ANCLAJE O DREN	FECHA PERFORACIÓN	EQUIPO #	PERFORACION	TIPO DE PERFORACIÓN			ENCAMISADO	FECHA INSTALACION ANCLAJE	FECHA DE INSTALACION DREN	FECHA DE INYECCIÓN	PRESIÓN DE INYECCIÓN (PSI)	OBSERVACIONES
					PASIVO	ACTIVO	DREN						
153	Anclaje No.153	2/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	2/02/2026		23/02/2026	170,19	
154	Anclaje No.154	2/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	2/02/2026		23/02/2026	202,83	
155	Anclaje No.155	2/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	2/02/2026		23/02/2026	264,00	
156	Anclaje No.156	2/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	2/02/2026		23/02/2026	216,38	
157	Anclaje No.157	3/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	3/02/2026		23/02/2026	235,48	
158	Anclaje No.158	3/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	3/02/2026		23/02/2026	153,08	
159	Anclaje No.159	3/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	3/02/2026		23/02/2026	249,04	
160	Anclaje No.160	3/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	3/02/2026		23/02/2026	242,30	
161	Anclaje No.161	4/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	4/02/2026		23/02/2026	148,23	
162	Anclaje No.162	4/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	4/02/2026		23/02/2026	268,73	
163	Anclaje No.163	4/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	4/02/2026		23/02/2026	259,61	
164	Anclaje No.164	4/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	4/02/2026		23/02/2026	212,69	
165	Anclaje No.165	5/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	5/02/2026		23/02/2026	195,06	
166	Anclaje No.166	5/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	5/02/2026		23/02/2026	189,53	
167	Anclaje No.167	5/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	5/02/2026		23/02/2026	273,06	
168	Anclaje No.168	5/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	5/02/2026		23/02/2026	200,74	
169	Anclaje No.169	6/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	6/02/2026		23/02/2026	168,55	
170	Anclaje No.170	6/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	6/02/2026		23/02/2026	170,82	
171	Anclaje No.171	6/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	6/02/2026		23/02/2026	179,71	
172	Anclaje No.172	6/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	6/02/2026		23/02/2026	156,22	
173	Anclaje No.173	9/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	9/02/2026		23/02/2026	225,05	
174	Anclaje No.174	9/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	9/02/2026		23/02/2026	200,75	
175	Anclaje No.175	9/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	9/02/2026		23/02/2026	212,99	
176	Anclaje No.176	9/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	9/02/2026		23/02/2026	236,84	
177	Anclaje No.177	10/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	10/02/2026		23/02/2026	167,86	
178	Anclaje No.178	10/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	10/02/2026		23/02/2026	219,25	
179	Anclaje No.179	10/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	10/02/2026		23/02/2026	170,85	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA	
NOMBRE	Johana Marcela Pedreros

CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN EN CAMPO

CÓDIGO	OBI-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LADOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN OBRA	FRENTE ARRAYANES II

PERFORACIÓN HORIZONTAL E INYECCIÓN DE ANCLAJES

Tipo de perforación	Anclaje activo
Longitud total	20.00m
Longitud libre	12.00m
Longitud Bulbo	8.00m
Longitud Enrcamisado	20.00m
Cantidad de torones	3 torones de 1/2"de 20.00
Diametro perforación	3"

Tipo de perforación	Dren
Longitud total	20.00m
Longitud libre	
Longitud bulbo	
Longitud Enrcamisado	20.00m
Cantidad de tubería	1 tubo de 2" de 20.00m
Diametro perforación	3"

Diseño de mezcla inyección	
Cantidad de agua	21 litros
Bultos de cemento	1 bulto
Plastol 4000 ultra	100ml
Cono de Marsh	18 seg
Resistencia 28 días	3000psi - 21MPa
Diametro perforación	20.00m

ITEM	No. DE ANCLAJE O DREN	FECHA PERFORACIÓN	EQUIPO #	PERFORADOR	TIPO DE PERFORACIÓN			ENCAMISADO	FECHA INSTALACIÓN ANCLAJE	FECHA DE INSTALACIÓN DREN	FECHA DE INYECCIÓN	PRESIÓN DE INYECCIÓN (PSI)	OBSERVACIONES
					PASIVO	ACTIVO	DREN						
180	Anclaje No.180	10/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	10/02/2026		23/02/2026	220,67	
181	Anclaje No.181	11/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	11/02/2026		23/02/2026	272,66	
182	Anclaje No.182	11/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	11/02/2026		25/02/2026	264,51	
183	Anclaje No.183	11/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	11/02/2026		25/02/2026	176,21	
184	Anclaje No.184	11/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	11/02/2026		25/02/2026	268,75	
185	Anclaje No.185	12/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	12/02/2026		25/02/2026	166,36	
186	Anclaje No.186	12/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	12/02/2026		25/02/2026	219,91	
187	Anclaje No.187	12/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	12/02/2026		25/02/2026	264,56	
188	Anclaje No.188	12/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	12/02/2026		25/02/2026	204,28	
189	Anclaje No.189	13/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	13/02/2026		25/02/2026	234,34	
190	Anclaje No.190	13/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	13/02/2026		25/02/2026	265,77	
191	Anclaje No.191	13/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	13/02/2026		25/02/2026	257,71	
192	Anclaje No.192	13/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	13/02/2026		25/02/2026	226,36	
193	Anclaje No.193	14/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	14/02/2026		25/02/2026	186,05	
194	Anclaje No.194	14/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	14/02/2026		25/02/2026	172,67	
195	Anclaje No.195	14/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	14/02/2026		25/02/2026	159,99	
196	Anclaje No.196	16/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	16/02/2026		25/02/2026	236,76	
197	Anclaje No.197	16/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	16/02/2026		25/02/2026	205,53	
198	Anclaje No.198	16/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	16/02/2026		25/02/2026	249,98	
199	Anclaje No.199	16/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	16/02/2026		25/02/2026	193,62	
200	Anclaje No.200	17/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	17/02/2026		25/02/2026	245,52	
201	Anclaje No.201	17/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	17/02/2026		25/02/2026	273,96	
202	Anclaje No.202	17/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	17/02/2026		25/02/2026	169,77	
203	Anclaje No.203	17/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	17/02/2026		25/02/2026	218,39	
204	Anclaje No.204	18/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	18/02/2026		25/02/2026	209,06	
205	Anclaje No.205	18/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	18/02/2026		25/02/2026	289,37	
206	Anclaje No.206	18/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	18/02/2026		25/02/2026	212,86	

OBSERVACIONES GENERALES:

	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA	Marcela Pacheco.
NOMBRE	Johanna Marcela Padierna

CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN EN CAMPO

CODIGO	OB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACION DE LA RIVERA DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LADO II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00090 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS BARRIOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN OBRA	FRENTE ARRAYANES II

PERFORACIÓN HORIZONTAL E INYECCIÓN DE ANCLAJES

Tipo de perforación	Anclaje activo
Longitud total	20.00m
Longitud libre	12.00m
Longitud Bulbo	8.00m
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de torones	3 torones de 1/2" de 20.00
Diametro perforación	3"

Tipo de perforación	Dren
Longitud total	20.00m
Longitud libre	
Longitud bulbo	
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de tubería	1 tubo de 2" de 20.00m
Diametro perforación	3"

Diseño de mezcla inyección	
Cantidad de agua	23 litros
Bultos de cemento	1 bulto
Plastol 4000 ultra	100ml
Cono de Marsh	18 seg
Resistencia 28 dias	3000psi - 21MPa
Diametro perforación	20.00m

ITEM	No. DE ANCLAJE O DREN	FECHA PERFORACIÓN	EQUIPO #	PERFORADOR	TIPO DE PERFORACIÓN			ENCAMISADO	FECHA INSTALACIÓN ANCLAJE	FECHA DE INSTALACIÓN DREN	FECHA DE INYECCIÓN	PRESIÓN DE INYECCIÓN (PSI)	OBSERVACIONES
					PASIVO	ACTIVO	DREN						
207	Anclaje No.207	18/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	18/02/2026		25/02/2026	227,17	
208	Anclaje No.208	19/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	19/02/2026		25/02/2026	256,52	
209	Anclaje No.209	19/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	19/02/2026		25/02/2026	240,95	
210	Anclaje No.210	19/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	19/02/2026		27/02/2026	278,64	
211	Anclaje No.211	19/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	19/02/2026		27/02/2026	216,43	
212	Anclaje No.212	19/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	19/02/2026		27/02/2026	265,41	
213	Anclaje No.213	20/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	20/02/2026		27/02/2026	222,11	
214	Anclaje No.214	20/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	20/02/2026		27/02/2026	231,80	
215	Anclaje No.215	20/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	20/02/2026		27/02/2026	223,87	
216	Anclaje No.216	20/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	20/02/2026		27/02/2026	240,44	
217	Anclaje No.217	23/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	23/02/2026		27/02/2026	199,62	
218	Anclaje No.218	23/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	23/02/2026		27/02/2026	237,52	
219	Anclaje No.219	23/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	23/02/2026		27/02/2026	195,10	
220	Anclaje No.220	23/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	23/02/2026		27/02/2026	221,11	
221	Anclaje No.221	24/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	24/02/2026		27/02/2026	217,32	
222	Anclaje No.222	24/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	24/02/2026		27/02/2026	285,54	
223	Anclaje No.223	24/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	24/02/2026		27/02/2026	171,01	
224	Anclaje No.224	24/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	24/02/2026		27/02/2026	219,26	
225	Anclaje No.225	25/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	25/02/2026		27/02/2026	224,04	
226	Anclaje No.226	25/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	25/02/2026		27/02/2026	266,54	
227	Anclaje No.227	25/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	25/02/2026		27/02/2026	216,24	
228	Anclaje No.228	25/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	25/02/2026		28/02/2026	267,01	
229	Anclaje No.229	25/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	25/02/2026		28/02/2026	244,96	
230	Anclaje No.230	26/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	26/02/2026		28/02/2026	181,00	
231	Anclaje No.231	26/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	26/02/2026		28/02/2026	278,62	
232	Anclaje No.232	26/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	26/02/2026		28/02/2026	268,53	
233	Anclaje No.233	26/02/2026	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	26/02/2026		28/02/2026	256,92	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA	Marcela Padierna.
NOMBRE	Johanna Marcela Padierna

CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN EN CAMPO

CODIGO	CB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2000-00060 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS BARRIOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN OBRA	FRENTE ARRAYANES 3

PERFORACIÓN HORIZONTAL E INYECCIÓN DE ANCLAJES

Tipo de perforación	Anclaje activo
Longitud total	20.00m
Longitud libre	12.00m
Longitud Bulbo	8.00m
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de torones	3 torones de 1/2"de 20.00
Diametro perforación	3"

Tipo de perforación	Dren
Longitud total	20.00m
Longitud libre	
Longitud Bulbo	
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de tuberia	1 tubo de 2" de 20.00m
Diametro perforación	3"

Diseño de mezcla inyección	
Cantidad de agua	21 litros
Bultos de cemento	1 bulto
Plastol 4000 ultra	100ml
Cono de Marsh	18 seg
Resistencia 28 días	3000psi - 21MPa
Diametro perforación	20.00m

ITEM	No. DE ANCLAJE O DREN	FECHA PERFORACIÓN	EQUIPO #	PERFORADOR	TIPO DE PERFORACIÓN			ENCAMISADO	FECHA INSTALACION ANCLAJE	FECHA DE INSTALACIÓN DREN	FECHA DE INYECCIÓN	PRESIÓN DE INYECCIÓN (PSI)	OBSERVACIONES
					PASIVO	ACTIVO	DREN						
234	Anclaje No.234	27/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	27/02/2026		28/02/2026	191,47	
235	Anclaje No.235	27/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	27/02/2026		28/02/2026	280,16	
236	Anclaje No.236	27/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	27/02/2026		28/02/2026	239,76	
237	Anclaje No.237	27/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	27/02/2026		28/02/2026	155,28	
238	Anclaje No.238	28/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	28/02/2026		28/02/2026	148,67	
239	Anclaje No.239	28/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	28/02/2026		28/02/2026	208,43	
240	Anclaje No.240	28/02/2026	Unidad neumática #11	Jhonatan Medina		x		x	28/02/2026		28/02/2026	230,89	
241	Anclaje No.241	28/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	28/02/2026		28/02/2026	234,19	
242	Anclaje No.242	28/02/2026	Unidad neumática #10	Jireh Lizarazo Navas		x		x	28/02/2026		28/02/2026	149,12	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA	Marcela Pacheco
NOMBRE	Johanna Marcela Pacheco

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GLI-043
	INFORME DE ENSAYO	FECHA	30/01/2025
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	VERSIÓN	5
		Página 1 de 2	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 23-31, BODEGA 18 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
12/03/2025	1	22/11/2024	005-25	ASENTAMIENTO	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA estabilizacionconsorcio@gmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/cm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADA
1	21/11/2024	28/11/2024	7	LLENADO E INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	51,20	50,43	2582	51,1	252,7	1,915	38202	20,7	14,80	2039	150,97	72%
1,1	21/11/2024	5/12/2024	14		51,3	48,8	2597	50,1	229,5	1,819	40886	20,7	17,60	2546*	181,85	85%
1,2	21/11/2024	12/12/2024	28		50,3	49,1	2470	51,5	245,9	1,907	54658	20,7	22,29	3229	227,01	108%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRA Y SE IDENTIFICARA EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE: MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin el previo autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS. Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisa y lo aprueba.

FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTION DE LABORATORIO	CODIGO	FT-GL-043
HSC	INFORME DE ENSAYO	FECHA	8/08/2025
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	VERSIÓN	0
		Página 2 de 5	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31, BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
12/8/2025	1	8/8/2025	016-25	ARRAYANES	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA estabilizacionvialfloridablanca@gmail.com

N° DE CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/mm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADA
1	29/11/2025	6/12/2025	7	LLENADO E INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	50,20	51,30	2575	97,2	250,7	1,917	27000	20,7	14,79	2150	150,40	71%
1,1	29/11/2025	13/12/2025	14		52,1	51,3	2668	98,6	263,5	1,902	37864	20,7	17,80	2606	183,05	87%
1,2	29/11/2025	27/12/2025	28		52,2	51,2	2672	93,3	242,8	1,758	58000	20,7	21,09	3185	223,84	106%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACION DEL CONCRETO, ASENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE NO INCLUIDA Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISO		APROBO	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA SAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS. Este documento es valido cuando lleva la firma de quien lo revisa y lo aprueba.

FIN DEL INFORME

HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
	INFORME DE ENSAYO	FECHA	09/08/2024
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	VERSIÓN	5

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA Nº 22-31, BODEGA 18 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME		Nº DE INFORME		FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO		FRENTE DE OBRA					INFORMACIÓN DEL CLIENTE				
13/01/2026		1		17/12/2025	518-25		ARRAYANES					CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA estabilizacionfloridablanca@gmail.com				
Nº ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE RASGADO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/cm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADA
1	19/12/2025	23/12/2025	7	LLENADO E INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICEA	51,50	52,40	3088	51,0	2538	1,834	20636	30,7	13,38	1937	136,17	65%
1.1	19/12/2025	30/12/2025	14		51,6	52,1	3474	52,5	2813	1,868	38985	33,7	11,22	3949	113,04	89%
1.2	19/12/2025	03/01/2026	28		50,8	52,3	2882	51,9	2610	1,921	57334	35,7	21,84	3124	218,62	104%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACION DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRA Y SE IDENTIFICARA EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin el previo consentimiento de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS. Este documento se rubrica cuando sea la última de cuatro (4) revisó y fe de erratas.

FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	5
		Página 4 de 5	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA Nº 22-31, BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	PERMITE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
12/03/2026	1	5/01/2026	503-26	ARRAYANES	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA estabilizacionconsorcio@gmail.com

Nº ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	AREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm^2)	(mm)	(g)	(g/mm^3)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm^2)	ESPECIFICADO
1	06/10/2025	6/01/2026	7	LLENADO E INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	52,80	51,80	2780	51,0	267,8	1,963	28455	20,7	14,37	2084	146,54	69%
1.1	06/10/2025	13/01/2026	79		49,2	52,8	2550	52,3	265,8	1,984	48080	20,7	18,85	2733	191,97	91%
1.2	06/10/2025	27/01/2026	28		51,3	50,9	2611	51,0	263,6	1,980	55036	20,7	21,42	3107	218,44	103%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRA Y SE IDENTIFICARA EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISO	APROBO
	
NOMBRE: WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE: MARTHA LILIANA MAYONA
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS. Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.
FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-041
HSC	INFORME DE ENSAYO	FECHA	30/08/2023
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	VERSIÓN	5
		Página 3 de 3	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA Nº 23-21, BODEGA 10 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
13/09/2025	1	03/01/2025	210-25	ANDAMIAJES	COMERCIAL ESTABILIZACION FLORIDABLANCA estabilizacionvial.sheasis@gmail.com

Nº ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LADO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/mm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADO
1	21/01/2025	28/01/2025	7	LLENADO E INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	51,69	51,36	2680	51,8	268,0	1,900	39951	20,7	15,08	2190	153,84	73%
1,1	21/01/2025	4/02/2025	14		52,3	52,9	2767	52,5	282,0	1,655	48498	20,7	18,07	2620	184,33	87%
1,2	21/01/2025	18/02/2025	28		52,0	51,5	2683	51,5	269,0	1,947	50865	20,7	22,31	3236	227,50	108%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRA Y SE IDENTIFICARA EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: WILLIAM EDUARDO CONTRERAS	NOMBRE: MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS. Este documento es valido cuando lleva la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

Anexo No. 5: Bitácoras de obra.

Anexo No. 5.1: Bitácora Arrayanes

Actividades: Se continuacion perforacion horizontal con encamisado, lavado e inyeccion de anclajes.

Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado

Dia 10: 31 de enero de 2026 (sábado)

Hora de inicio 8am y salida 12m

Estado del tiempo: seca

Personal: (2) oficiales, (2) operacion de perforacion, (1) operador de inyeccion, (10) ayudantes de obra, (4) ayudantes perforacion, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal de interventoria

Maquinaria y equipos: (1) unidad inyeccion (1) unidad perforacion, (1) compresor.

Actividades: llenado e inyeccion de anclajes, perforacion horizontal de anclajes con encamisado.

Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado

Dia 11: 01 de febrero de 2026 (domingo)

Hora de inicio: ~~7:30~~ se realizan labores

Observaciones: Ninguna.

Dia 11: 02 de febrero de 2026 (lunes)

Hora de inicio: 7:30am - salida: 5:00pm

Estado del tiempo: Lluvias fuertes

Personal: (1) oficial, (2) operadores de perforacion, (1) operador de inyeccion, (10) ayudantes de obra, (4) ayudantes de perforacion, (2) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental y personal interventoria

Maquinaria y equipos: (1) unidad inyeccion, (2) unidades perforacion, (2) compr

Actividades: Perforacion horizontal de anclajes con encamisado, armado

y personal de interventoria.
Maquinaria y equipos (2)unidades perforación, (1)unidad inyección, (2)compresores
Actividades: Se continúa con la perforación horizontal con encamisado e instalación de anclajes.
Observaciones: Ninguna

Dia 115 06 de febrero 2026 (viernes).
Hora inicio: 7:30am, salida: 5:00pm.
Estado del tiempo: seco.
Personal (1)oficial, (1)operador inyección, (2)operadores de perforación, (10) ayudantes de obra, (4)ayudantes perforación, (1)almacenista, (1)residente, (1) auxiliar de residente, (1)profesional SST y personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (1)unidad inyección, (2)compresores, 2)unidades perforación
Actividades: Se continúa con perforación horizontal con encamisado e instalación de anclajes.
Observaciones: Ninguna.

Dia 116 07 de febrero 2026 (sábado)
Actividades: No se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Dia 117 08 de febrero 2026 (domingo).
Actividades: No se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Dia 118 09 de febrero 2026 (lunes)

(1)auxiliar residente, (1)profesional SST y personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2)compresores, (2)unidades perforación y (1)unidad
Actividades: Perforación horizontal con encamisado e instalación de anclajes
Observaciones: Ninguna.

Dia 122 13 de febrero 2026 (viernes)
Hora inicio: 7:30am, salida: 500 pm
Estado del tiempo: seco
Personal: (1) oficial, (1)operador de inyeccion, (2)operadores perforación, (9)ayudantes de obra, (4)ayudantes de perforacion, (1)almacenista, (1) auxiliar perforacion, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST y personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2)compresores, (2)unidades perforacion, (1)unidad inyec
Actividades: Perforacion horizontal con encamisado e instalación de anclajes.
Observaciones: Ninguna.

Dia 123 14 de febrero 2026 (sábado)
Hora inicio: 7:30am, salida 12 m.
Estado del tiempo: seco
Personal: (1) oficial, (1) operador de inyeccion, (2) operadores perforacion (9) ayudantes obra, (4) ayudantes de perforacion, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residencia, (1) profesional SST y personal interventoria
Maquinaria y equipo: (2) compresores, (2) unidades perforacion, (2) unidad iny
Actividades: Perforacion horizontal con encamisado e instalacion de anclajes.
Observaciones: Ninguna.

(1)auxiliar de residente, (1)profesional SST y personal interventoria
Maquinaria y equipos: (2)compresores, (1)unidad inyeccion, (2)unidades perforación
Actividades: Perforacion horizontal con encamisado e instalacion de anclajes
Observaciones: ninguna

Dia 128 19 de febrero de 2026 (jueves)
Hora inicio: 7:30am y salida: 5:00 pm
Estado del tiempo: seco
Personal: (1)opicial, (1)operador de inyeccion, (2)operadores de perforacion, (1)almacenista, (10)ayudantes de obra, (4) ayudantes de perforacion, (1) residente, (1)auxiliar residente, (1) profesional SST y personal interventoria
Maquinaria y equipos: (2)compresores, (1)unidad inyeccion, (2)unidades perforacion
Actividades: Perforacion horizontal con encamisado e instalación de anclajes
Observaciones: ninguna.

Dia 129 20 de febrero de 2026 (viernes)
Hora inicio 7:30am, salida 5:00pm
Estado del tiempo: seco.
Personal: (1)opicial, (1)operador de inyección, (2)operadores de perforacion, (1)almacenista, (10)ayudantes de obra, (4)ayudantes de perforación, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, y personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2)compresores, (1)unidad inyeccion, (2)unidades perforación.
Actividades: Perforación horizontal con encamisado e instalación anclajes.
Observaciones: ninguna.

Dia 130 21 de febrero de 2026 (sábado)

Interventoria

Maquinaria y equipos: (2) compresores, (1) unidad inyección, (2) unidades inyección

Actividades: Perforación horizontal con encamisado e instalación de anclajes. Llenado e inyección de anclajes

Observaciones: ninguna

Dia 135 26 de febrero 2026 (jueves)

Hora de inicio 7:30am y salida 5:00 pm Estado del tiempo: Seco

Personal: (1) oficial, (1) operador inyección, (2) operadores perforación, (9) ayudantes de obra, (1) almacenista, (4) ayudantes de perforación, (1) residente, (1) auxiliar de residente, (1) profesional SST y personal de interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) compresores, (1) unidad inyección, (2) unidades de perforación

Actividades: Perforación horizontal con encamisado e instalación de anclajes.

Observaciones: ninguna.

Dia 136 27 de febrero 2026 (viernes)

Hora inicio 7:30am y salida 4:30pm. Estado del tiempo: Seco

Personal: (1) oficial, (1) operador inyección, (2) operadores perforación, (9) ayudantes de obra, (1) almacenista, (4) ayudantes de perforación, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor de obra y personal interventoria

Maquinaria y equipos: (2) compresores, (1) unidad inyección, (2) unidades de perforación.

Actividades: Llenado e inyección de anclajes. Perforación horizontal con encamisado e instalación de anclajes.

Observaciones: ninguna

Anexo No. 5.2: Bitácora Lagos II

Día 108 | 30 de enero 2026 (viernes)

Hora inicio: 7:30am salida 5:00 pm

Estado del tiempo: seco.

Personal: (1) maestro, (1) oficial, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) director, profesionales interventoria, (1) geotecnista.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (2) volquetas

Actividades: Cargue y transporte de material de excavación a sitio de disposicion final

Observaciones: Ninguna técnica. Visita COMB, Jesús Sánchez.

Melissa Donado Barcelo

Día 109 | 31 de enero 2026 (sábado)

Hora de inicio: 7:30am salida 12 m.

Estado del tiempo: seco

Personal: (1) maestro, (1) oficial, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, (2) personal interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (2) volquetas

Actividades: Se realiza control y replanteo topográfico, Excavación de roca y granular.

Observaciones: Ninguna.

Barcelo Melissa Donado

Día 110 | 01 de febrero 2026 (domingo)

Hora de inicio/Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.

Día 111 | 02 de febrero 2026 (lunes)


Hora de inicio: 7:30 am salida 5:00 pm.

Personal: (1) oficial, (1) almacenista, (7) ayudantes, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras
Actividades: control y replanteo topográfico. Conformacion de yarillon y excavación bajo el agua.
Observaciones: Se eleva la cota del rio, por lo cual se cancela fundida de dentellon en horas de la tarde y se suspenden actividades.


Dia 112 03 de febrero de 2026 (martes)
Hora de inicio: 7:30am, salida 5:00pm.
Estado del tiempo: lluvia moderada.
Personal: (1) oficial, (1) almacenista, (7) ayudantes, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) director de obra, (1) geotecnista, personal de interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras
Actividades: control y replanteo topográfico, reconformacion de yarillon tras aumento del caudal de ayer.
Observaciones: Nuevamente aumenta el caudal del rio, se cancela fundido de dentellon y se suspenden actividades dentro del pozo.

Dia 113 04 de febrero de 2026 (miercoles)
Hora de inicio: 7:30 am, salida: 5:00 pm + 1 hora extra
Estado del tiempo: Seco
Personal: (1) oficial, (1) almacenista, (7) ayudantes, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, personal interventoria
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras
Actividades: Control y replanteo topográfico, reconformacion de


suministro y colocación de refuerzo de acero.
Observaciones: Ninguna



Dia 114 05 de febrero de 2026 (jueves)
Hora de inicio: 7:30am, salida 5:00pm
Estado del tiempo: soleado
Personal: (1) oficial, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar SST, (1) auxiliar de residente, personal de interventoria.
Maquinaria y equipos: control y replanteo topográfico, sobre-acarreos de material de excavacion a sitio de disposicion final
Observaciones: Ninguna.



Dia 115 06 de febrero 2026 (viernes)
Hora inicio 7:30am, salida 4:30pm
Estado del tiempo: soleado
Personal: (1) oficial, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residencia, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, (1) profesional de interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (2) volquetas.
Actividades: control y replanteo topográfico, sobreacarreos de material de excavación a sitio de disposicion final.
Observaciones: Ninguna.



Dia 116 07 de febrero 2026 (sábado)
Actividades: No se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Dia 117 08 de febrero 2026 (domingo)
Actividades: No se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Dia 118 09 de febrero 2026 (Lunes).
Hora inicio: 7:30am, salida 5:00 pm. Estado del tiempo: seco
Personal: (1) oficial, (1) almacenista, (1) profesional SST, (7) ayudantes (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (2) volquetas
Actividades: Se continúa con excavación con acarreo libre, retiro y transporte de material de excavación. Se inicia conformación de las estructuras en gavión.
Observaciones Ninguna.

Dia 119 10 de febrero 2026. (martes).
Hora inicio 7:30am, salida 5:00pm
Personal: (1) oficial, (1) almacenista, (7) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, personal interventoria
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (2) volquetas.
Actividades: Se repuena la estructura de gavillón, excavacion bajo agua para posterior suministro y colocación de concreto ciclópeo y acero de refuerzo.
Observaciones: Ninguna.

Dia 120 11 de febrero 2026 (miércoles).
Hora de inicio 7:30am, salida: 5:00pm.
Personal: (2) oficiales, (1) almacenista, (7) ayudantes, (1) residente,

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (3) volquetas.
Actividades: Evacuación de material de excavación en volqueta, conformación de gaviones, control topográfico.
Observaciones: Ninguna.

Marcela -

Día 121 12 de febrero 2026 (Jueves)
Hora inicio: 7:30am - salida 5:00pm.
Estado del tiempo: soleado.
Personal: (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (3) volquetas.
Actividades: Evacuación de material de excavación, conformación de gaviones y control topográfico.
Observaciones: Visita de mitigación del Riesgo: Fredy Holguin. c.c. 91.297.276.

Marcela -

Día 122 13 de febrero 2026 (viernes)
Hora de inicio: 7:30am - salida: 5:00pm.
Estado del tiempo: soleado
Personal: (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST y personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (3) volquetas.
Actividades: Evacuación de material de excavación, conformación de gaviones y control topográfico.
Observaciones: Visita de COMB, Vicente Vargas cc. 91280494 y Marta Penagos 37729053.

Marcela -

Dia 123 14 de febrero de 2026 (sábado)
Hora de inicio: 7:30am y salida 12m
Estado del tiempo: soleado.
Personal: (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoría
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (3) volquetas
Actividades: Retiro de material de excavación en volquetas, conformación de aguanes y control topográfico.
Observaciones: Ninguna

Dia 124 15 de febrero de 2026 (domingo)
Hora inicio: No se realizan labores ni actividades.
Observaciones: Ninguna

Dia 125 16 de febrero de 2026 (lunes).
Hora inicio: 7:30am y salida 6:00pm
Estado del tiempo: Soleado
Personal: (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoría.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) volqueta:
Actividades: control y replanteo topográfico. Excavación bajo agua, para posterior suministro y colocación de concreto para solado
Observaciones: Ninguna

Dia 126 17 de febrero de 2026 (martes)
Hora inicio: 7:30am y salida 5:00 pm.
Estado del tiempo: Soleado
Personal: (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente,

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (3) volquetas.
Actividades: control y replanteo topográfico. Acarreos de material de excavación. Observaciones: Ninguna.

Dia 127 18 de febrero 2026 (miércoles)
Hora de inicio: 7:30am, salida: 5:00pm.
Estado del tiempo: soleado
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoría.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras.
Actividades: Control y replanteo topográfico. Conformación de gaviones.
Observaciones: Ninguna.

Dia 128 19 de febrero 2026 (Jueves).
Hora de inicio: 7:30am, salida: 5:00pm.
Estado del tiempo: soleado.
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoría.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras.
Actividades: Control y replanteo topográfico. Conformación de gaviones.
Observaciones: Ninguna.

Dia 129 20 de febrero 2026 (viernes).
Hora inicio: 7:30am salida: 5:00pm.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoría
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras
Actividades: Control y replanteo topográfico. Conformación de gaviones, refuerzo de jarillón.
Observaciones: Ninguna.

Carrera.

Día 130 | 21 de febrero de 2026 (sábado)
Actividades: No se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Día 131 | 22 de febrero de 2026 (domingo)
Actividades: No se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Día 132 | 23 de febrero de 2026 (lunes)
Hora de inicio: 7:30am, salida: 5:00pm
Estado del tiempo: soleado
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director de obra, (1) geotecnista, personal de interventoría.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (3) volquetas.
Actividades: control y replanteo topográfico. Acarreo de material de excavación en volqueta.
Observaciones: Ninguna.

Carrera.

Estado del tiempo: Soleado.
Hora inicio: 7:30am - 5:00pm.
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras. (1) volqueta.
Actividades: control y replanteo topográfico Armado de gaviones
Observaciones: Ninguna.

Dia 134 25 de febrero de 2026 (miércoles)
Hora inicio: 7:30am - 5:00 pm.
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) volqueta.
Actividades: Control y replanteo topográfico. Armado de gaviones.
Observaciones: Ninguna.

Dia 135 26 de febrero de 2026 (Jueves)
Hora inicio: 7:30am - 5:00 pm
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.
Maquinaria y equipos, (2) excavadoras. (1) volqueta.
Actividades: Refuerzo de jarillón para posterior fundida de dentellón. Colocación de acero de refuerzo y conformación de gaviones.
Observaciones: Ninguna.

Dia 136 27 de febrero de 2026 (viernes).
Hora inicio: 7:30am - salida 5:00pm.
Estado del tiempo: soleado
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente (1) auxiliar residente, (1) director de obra, (1) geotecnista, personal de interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) volqueta.
Actividades: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente.
Actividades: Conformación de gaviones. Se refuerza jarillón para posterior fundida de dentellón y colocación de barras de refuerzo
Observaciones: Visita de la cgr. Vicente Vargas.

Dia 137 28 de febrero 2026 (sábado)
Hora inicio: 7:30am - salida: 12 m.
Estado del tiempo: soleado.
Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal de interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras.
Actividades: Control y replanteo topografico, armado de gaviones.
Observaciones: Ninguna.

Dia 138 01 de marzo.

Anexo No. 6: Estado del tiempo.

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	01 FEB-28 FEB

AÑO	2026

SECO 1 LLUVIA MODERADA 2 LLUVIA INTENSA 3

DÍA	FECHA																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
LUNES		3							1							1							3					
MARTES			3							1							1							1				
MIÉRCOLES				1							1							1							1			
JUEVES					1							1							1							1		
VIERNES						1							1							1							1	
SÁBADO							1							1							3							1
DOMINGO	3							1							3							1						

RESUMEN MES	
1	82,00%
2	14,00%
3	4,00%



Anexo No. 7: Actas y correspondencia.
