

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO	
	PROYECTO	ADECUACION DEL PARQUE RECREO INFANTIL UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA.

# ITEM					
1	PISO EN MATERIAL SINTÉTICO GRANULADO COLORES VIVOS SE COMPONE DE DOS CAPAS MUY DEFINIDAS EN SBR Y EPDM MEZCLADOS CON UNA RECINA	UN	M2	CANT. TOTAL	18,0

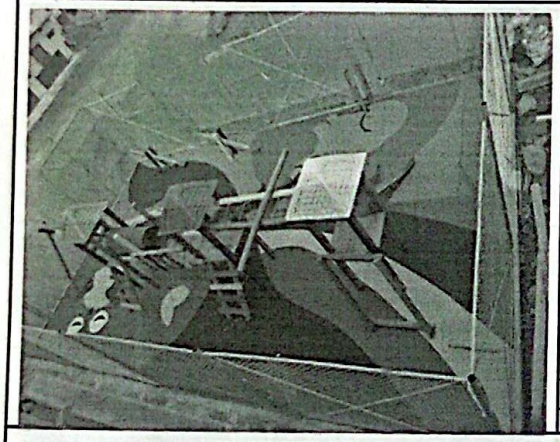

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
PISO EN MATERIAL SINTÉTICO GRANULADO COLORES VIVOS SE COMPONE DE DOS CAPAS	1	6	3,00		18
				TOTAL	18,0

# ITEM					
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ECOLÓGICO CANECA METÁLICA ELABORADO EN MALLA CAFETERA Y TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 0.90 MEDIDAS ALTURA 1300 mm DIAMETRO DEL CONTENEDOR 460 mm Alturra 650mm	UN	M2	CANT. TOTAL	1,00

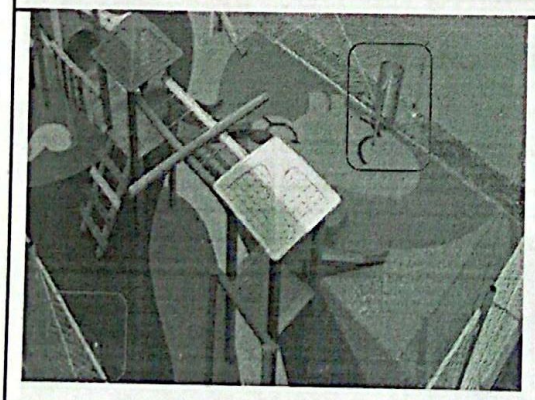

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ECOLÓGICO CANECA METÁLICA ELABORADO	1				1,00
				TOTAL	1,00

25/02/2026

X Cristo Rodriguez R


Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista
Firmado por: 2cf7dd26-1506-446a-9ee4-ebb12a5b6d43

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor

Powered by CamScanner

# ITEM					
8	SUMINISTRO E INSTLACIÓN BANCAS EN MADERA Y HIERRO FUNDIDO MEDIDAS ALTURA DE LA BANCA 40 CMS Y ANCHO 1.20	UN	ML	CANT. TOTAL	2,00

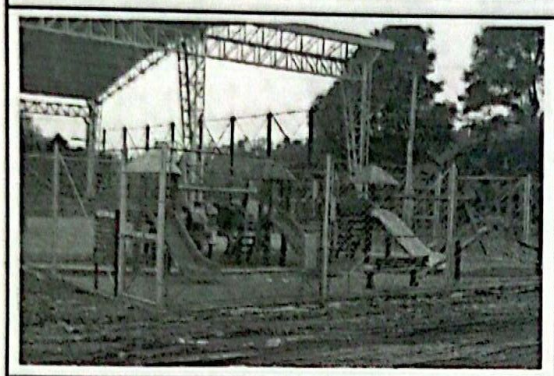

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
SUMINISTRO E INSTLACIÓN BANCAS EN MADERA Y HIERRO	2				2,00
				TOTAL	2,00

# ITEM					
9	CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M	UN	UND	CANT. TOTAL	39,40



DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M	39,4	19,7		2,000	39,4
				TOTAL	39,4

# ITEM					
10	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	UN	UND	CANT. TOTAL	



DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	peso Kg	TOTAL
REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	10,65			2,000	21,3
				TOTAL	21,30

25/02/2026

X Cristo Rodriguez R


Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor


Powered by CamScanner

# ITEM					
11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO	UN	M2	CANT. TOTAL	3,10

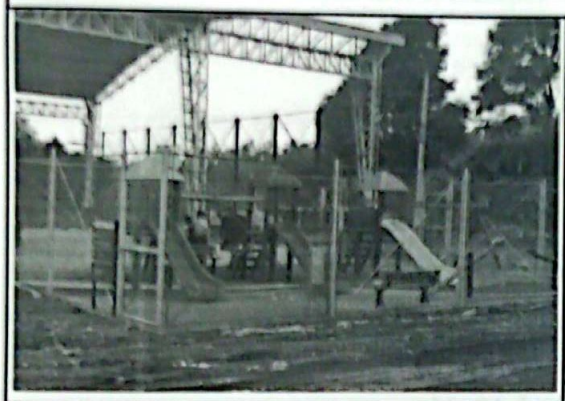

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO		1,55		2,00	3,10
				TOTAL	3,10

# ITEM					
12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	UN	kg	CANT.TOTAL	0,02

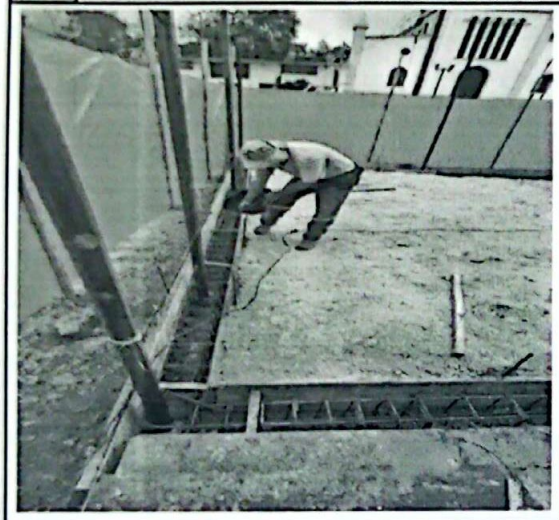

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	peso Kg	TOTAL
ACERO FIGURADO 60000 PSI		0,0357143		0,56	0,02
				TOTAL	0,02

25/02/2026

X Cristo Rodriguez R

Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista
Firmado por: 2cf7dd26-1506-446a-9ee4-ebb12a5b6d43

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor

Powered by CamScanner
