ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 15	**FECHA:**	**31/01/2026**
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA		No.	**252/2025**
CONVENIO		INTERVENTORÍA			

OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE INICIO:	2	5	0	3	2	0	2	5

PLAZO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**	MESES	10
		DÍAS	17

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE TERMINACION:	1	0	0	2	2	0	2	6

VALOR TOTAL	**$ 5.674.617.468,75**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

Ing. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.	**SUPERVISOR**
Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA	**CONTRATISTA**
Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS	**INTERVENTOR**

ASUNTO:	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: EL CORTE (ANEXO A) DEL PRESUPUESTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CORTE Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
Plazo Trascurrido	312 días
Plazo Disponible	10 días

- Balance del contrato
-

Valor inicial del contrato	$	3.783.078.312,50
Valor adición(es) del contrato	$	1.891.539.156,25
Valor Total del contrato	$	5.674.617.468,75
Valor acta de recibo parcial No. **01**	$	1.198.932.188,40
Valor acta de recibo parcial No. **02**	$	479.502.034,99
Valor acta de recibo parcial No. **03**	$	372.402.374,10
Valor acta de recibo parcial No. **04**	$	414.296.050,52
Valor acta de recibo parcial No. **05**	$	517.853.930,23
Valor acta de recibo parcial No. **06**	$	1.189.101.109,69
Valor acta de recibo parcial No. **07**	$	351.145.468,53
Valor acta de recibo parcial No. **08**	$	473.915.633,16
Valor Total Ejecutado	$	4.997.148.789,62
Amortización anticipo del **00** %	$	00,oo
Valor neto a pagar	$	473.915.633,16

- El valor a pagar en la presente acta es de: **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 16/100 M/CTE.**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo A, Acta No. 15 Corte 08 que consta de ___ Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**Ing. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.	
CONTRATISTA	**Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA	
INTERVENTOR	**Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA** Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS	

ANEXO A del ACTA No. 15 CORTE No. 08 **CORTE**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**						**FECHA**	**31/01/2026**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**25** (Día)	**3** (Mes)				**2025** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)				**2026** (Año)	ADICIÓN 1(+)	**$ 1.767.258.164,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$**					**5.674.617.468,75**	ADICIÓN 2(+)	**$ 124.280.992,25**

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En el Municipio de Facatativá se reunieron él **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** él **Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal de ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, él Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente corte a las actividades realizadas por el contratista y supervizadas por el interventor y/o supervisor.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6											**CANTIDAD**		**VALOR**		**SALDO POR EJECUTAR**	
CAP.	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT MAY Y MEN No 2**	**CANT MAY Y MEN No 3**	**CANT MAY Y MEN No 4**	**CANT MAY Y MEN No 5**	**CANT MAY Y MEN No 6**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CORTE No.08**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO DE CORTES**	**ACUMULADO TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	**1,30**	**MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS**														
1,01	1,27	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	-	-	-	-	-	$ 2.426,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	201,8	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	12,00	5,00	15,00	-	-	$ 44.135,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	3,1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)	M2	1.281,63	1.749,57	1.649,92	1.891,66	2.069,93	$ 20.729,00	$ 42.907.578,97	16,16	$ 334.980,64	1.905,58	$ 39.500.767,82	164,35	$ 3.406.811,15
1,04	16,2	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	10.504,63	7.278,39	11.943,79	9.778,31	9.706,46	$ 9.123,00	$ 88.552.034,58	313,78	$ 2.862.614,94	9.292,62	$ 84.776.572,26	413,84	$ 3.775.462,32
1,05	16,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)	M3	775,72	2.950,56	3.580,00	3.637,63	3.689,16	$ 25.563,00	$ 94.305.997,08	197,17	$ 5.040.256,71	3.247,27	$ 83.009.963,01	441,89	$ 11.296.034,07
1,06	4,53	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,98	330,11	427,85	652,15	642,26	$ 84.080,00	$ 54.001.220,80	92,39	$ 7.768.151,20	533,93	$ 44.892.834,40	108,33	$ 9.108.386,40
1,07	4,42	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	30,00	24,00	16,00	-	-	$ 136.932,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	28,80	300,00	346,50	304,76	304,76	$ 14.282,00	$ 4.352.582,32	0,00	$ -	304,76	$ 4.352.582,32	0,00	$ -
1,09	3,2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	675,60	831,30	1.142,17	1.447,82	1.415,97	$ 175.033,00	$ 247.841.477,01	58,81	$ 10.293.690,73	1.180,69	$ 206.659.712,77	235,28	$ 41.181.764,24
1,10	3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	-	-	203,60	-	-	$ 202.549,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	3,6	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	-	-	-	-	-	$ 221.204,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	3,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	-	-	-	-	$ 3.448,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	3,12	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	11.780,20	11.973,98	14.855,16	18.464,52	18.436,76	$ 7.071,00	$ 130.366.329,96	1886,64	$ 13.340.431,44	16.972,36	$ 120.011.557,56	1.464,40	$ 10.354.772,40
1,14	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	-	-	-	-	$ 1.351.710,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	961,94	983,95	1.289,00	1.378,73	1.362,79	$ 1.312.904,00	$ 1.789.212.442,16	120,55	$ 158.270.577,20	1.204,98	$ 1.582.023.061,92	157,81	$ 207.189.380,24
1,16	432.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3						$ 1.303.202,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	433.4	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-65	M2						$ 5.381,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	433.1	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-3	M2						$ 3.660,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	5,15	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-13	M2						$ 5.294,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	5,14	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	516,00	516,00	762,00	619,51	606,51	$ 157.971,00	$ 95.810.991,21	20,00	$ 3.159.420,00	599,51	$ 94.705.194,21	7,00	$ 1.105.797,00
1,21	6,8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML						$ 86.325,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	5,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	258,00	258,00	258,00	158,87	153,15	$ 111.150,00	$ 17.022.622,50	70,11	$ 7.792.726,50	153,15	$ 17.022.622,50	0,00	$ -
1,23	14,4	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35,00	46,00	44,50	14,50	19,50	$ 64.323,00	$ 1.254.298,50	0,00	$ -	14,50	$ 932.683,50	5,00	$ 321.615,00
1,24	5,1	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	M2	393,90	393,90	393,90	340,80	502,99	$ 119.688,00	$ 60.201.867,12	304,91	$ 36.494.068,08	502,99	$ 60.201.867,12	0,00	$ -
1,25	5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	-	-	-	-	-	$ 125.204,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	8,4	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	-	-	-	-	-	$ 146.416,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	8,3	CONCRETO 2500 PSI	M3	-	-	-	-	-	$ 492.263,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	8,1	CONCRETO 3000 PSI	M3	11,69	11,69	11,69	1,53	1,53	$ 554.671,00	$ 848.646,63	0,38	$ 210.774,98	1,53	$ 848.646,63	0,00	$ -
1,29	4,52	CONCRETO 4000 PSI	M3		-	-	7,02	7,58	$ 627.829,00	$ 4.758.943,82	1,51	$ 948.021,79	7,58	$ 4.758.943,82	0,00	$ -
1,30	B0013790	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	425,58	446,12	231,69	4.054,06	4.812,65	$ 9.411,00	$ 45.291.809,84	218,18	$ 2.053.291,98	668,77	$ 6.293.794,47	4.143,88	$ 38.998.015,37
1,31	1,6	DERECHO DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3		-	-	-	-	$ 9.270,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,32	4,7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3.197,53	3.370,82	5.062,62	4.002,91	4.483,46	$ 2.064,00	$ 9.253.861,44	314,52	$ 649.169,28	4.097,75	$ 8.457.756,00	385,71	$ 796.105,44
1,33	3,25	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)	UND	19,00	23,00	37,00	28,00	30,00	$ 1.822.048,00	$ 54.661.440,00	2,00	$ 3.644.096,00	23,00	$ 41.907.104,00	7,00	$ 12.754.336,00
1,34	3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	35,00	75,25	94,25	76,25	76,25	$ 80.786,00	$ 6.159.932,50	0,00	$ -	76,25	$ 6.159.932,50	0,00	$ -

ANEXO A del ACTA No. 15 CORTE No. 08 **CORTE**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**				**FECHA**	**31/01/2026**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**25** (Día)	**3** (Mes)		**2025** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)		**2026** (Año)	ADICIÓN 1(+)	**$ 1.767.258.164,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$**			**5.674.617.468,75**	ADICIÓN 2(+)	**$ 124.280.992,25**

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En el Municipio de Facatativá se reunieron él **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** él **Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal de ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, él Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente corte a las actividades realizadas por el contratista y supervizadas por el interventor y/o supervisor.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6											**CANTIDAD**		**VALOR**		**SALDO POR EJECUTAR**	
CAP.	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT MAY Y MEN No 2**	**CANT MAY Y MEN No 3**	**CANT MAY Y MEN No 4**	**CANT MAY Y MEN No 5**	**CANT MAY Y MEN No 6**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CORTE No.08**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO DE CORTES**	**ACUMULADO TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1,35	4611	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-	-	-	-	-	$ 113.498,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	4612	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	-	-	-	-	$ 231.839,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	3735	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	-	-	-	-	$ 232.634,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	4136	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	389,55	256,55	528,05	212,55	276,30	$ 3.129,00	$ 864.542,70	13,20	$ 41.302,80	201,25	$ 629.711,25	75,05	$ 234.831,45
1,39	3722	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	110,00	73,00	157,00	61,00	91,00	$ 7.059,00	$ 642.369,00	6,00	$ 42.354,00	61,00	$ 430.599,00	30,00	$ 211.770,00
1,40	3878	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	28,00	30,00	36,00	31,00	33,00	$ 157.807,00	$ 5.207.631,00	2,00	$ 315.614,00	28,00	$ 4.418.596,00	5,00	$ 789.035,00
1,41	5,1	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	13,00	11,00	19,00	19,00	23,00	$ 2.305.055,00	$ 53.016.265,00	1,00	$ 2.305.055,00	17,00	$ 39.185.935,00	6,00	$ 13.830.330,00
1,42		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML						$ 6.358,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	**3,15**	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**														
2,01	6,1	AFIRMADO	M3	78,78	72,28	78,78	211,64	139,47	$ 101.214,00	$ 14.116.316,58	20,51	$ 2.075.899,14	130,77	$ 13.235.754,78	8,70	$ 880.561,80
2,02	4779	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	-	-	630,75	-	$ 1.356,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	6,6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UND	-	-	-	-	-	$ 180.794,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	-	-	-	-	-	$ 2.899,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.		**NO PREVISTOS**														
NP-1.01		BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	2.797,71	2.651,83	3.932,45	3.848,36	3.815,84	$ 620.074,00	$ 2.366.103.172,16	260,07	$ 161.262.645,18	3.545,35	$ 2.198.379.355,90	270,49	$ 167.723.816,26
NP-1.02		BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON QUIMICO Y CEMENTO	M3	15,75	3,15	3,15	-	-	$ 620.074,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-1.03		PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	$ 1.380.768,00	$ 1.380.768,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.380.768,00	0,00	$ -
NP-1.04		CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	2,00	4,00	6,30	2,30	2,30	$ 1.193.218,00	$ 2.744.401,40	0,00	$ -	2,30	$ 2.744.401,40	0,00	$ -
NP-1.05		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	36,00	36,00	42,00	22,08	20,40	$ 107.088,00	$ 2.184.595,20	20,40	$ 2.184.595,20	20,40	$ 2.184.595,20	0,00	$ -
NP-1.06		SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN.	-	-	-	-	-	$ 198.869,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-1.07		CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160, SUMINISTRO E INSTALCIÓN.	UN.	2,00	5,00	6,00	4,00	4,00	$ 169.833,00	$ 679.332,00	0,00	$ -	4,00	$ 679.332,00	0,00	$ -
NP-1.08		RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	295,00	185,30	294,50	242,50	256,20	$ 162.938,00	$ 41.744.715,60	41,70	$ 6.794.514,60	230,20	$ 37.508.327,60	26,00	$ 4.236.388,00
NP-1.09		RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UN	57,00	39,00	74,00	54,00	57,00	$ 69.997,00	$ 3.989.829,00	3,00	$ 209.991,00	40,00	$ 2.799.880,00	17,00	$ 1.189.949,00
NP-1.10		ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN	36,00	36,00	42,00	17,00	21,00	$ 606.689,00	$ 12.740.469,00	0,00	$ -	15,00	$ 9.100.335,00	6,00	$ 3.640.134,00

ANEXO A del ACTA No. 15 CORTE No. 08 **CORTE**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**					**FECHA**	**31/01/2026**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**25** (Día)	**3** (Mes)			**2025** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)			**2026** (Año)	ADICIÓN 1(+)	**$ 1.767.258.164,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$**				**5.674.617.468,75**	ADICIÓN 2(+)	**$ 124.280.992,25**

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En el Municipio de Facatativá se reunieron él **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** él **Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal de ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, él Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente corte a las actividades realizadas por el contratista y supervizadas por el interventor y/o supervisor.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6

CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT MAY Y MEN No 2	CANT MAY Y MEN No 3	CANT MAY Y MEN No 4	CANT MAY Y MEN No 5	CANT MAY Y MEN No 6	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD		VALOR		SALDO POR EJECUTAR	
											CORTE No.08	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO DE CORTES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP-1.11		ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ MES	978,22	1.247,94	3.038,28	2.946,12	3.017,60	$ 15.629,00	$ 47.162.070,40	357,60	$ 5.588.930,40	2.916,84	$ 45.587.292,36	100,76	$ 1.574.778,04
NP-1.12	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALCIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2			121,20	123,80	91,66	$ 150.238,00	$ 13.770.815,08	72,66	$ 10.916.293,08	91,66	$ 13.770.815,08	0,00	$ -
NP-1.13	4085	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3 CM MORTERO 2000 PSI	UN			12,00	6,00	-	$ 134.151,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-1.14	4052	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UN			14,00	25,00	21,00	$ 77.604,00	$ 1.629.684,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.164.060,00	6,00	$ 465.624,00
NP-1.15	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3 CM MORTERO 2000 PSI	ML			28,00	257,93	300,31	$ 85.137,00	$ 25.567.492,47	74,58	$ 6.349.517,46	224,51	$ 19.114.107,87	75,80	$ 6.453.384,60
NP-1.16	4.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3			54,00	50,00	47,00	$ 866.003,00	$ 40.702.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -	47,00	$ 40.702.141,00
NP-1.17	3727	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES Y RENIVELACIÓN DE REJILLAS)	UN			72,00	63,00	65,00	$ 136.104,00	$ 8.846.760,00	2,00	$ 272.208,00	55,00	$ 7.485.720,00	10,00	$ 1.361.040,00
NP-1.18	6486	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASCIEDO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3			150,00	83,48	83,48	$ 78.927,00	$ 6.588.825,96	0,00	$ -	83,48	$ 6.588.825,96	0,00	$ -
NP-1.19	EN BASE A 3.2	CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 6"	UN			12,00	6,00	6,00	$ 214.926,00	$ 1.289.556,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.289.556,00	0,00	$ -
NP-1.20	2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3			395,70	171,46	192,11	$ 40.218,00	$ 7.726.279,98	26,95	$ 1.083.875,10	181,61	$ 7.303.990,98	10,50	$ 422.289,00
NP-1.21	3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML			275,00	203,17	203,17	$ 53.932,00	$ 10.957.364,44	0,00	$ -	203,17	$ 10.957.364,44	0,00	$ -
NP-1.22	4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3			184,50	50,92	50,92	$ 202.288,00	$ 10.300.504,96	0,00	$ -	50,92	$ 10.300.504,96	0,00	$ -
NP-1.23	3.5	CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UN			3,00	2,00	4,00	$ 493.905,00	$ 1.975.620,00	1,00	$ 493.905,00	3,00	$ 1.481.715,00	1,00	$ 493.905,00
NP-1.24	3,4	CAJA DE INSPECCIÓN 40X40	UN			7,00	8,00	15,00	$ 429.546,00	$ 6.443.190,00	4,00	$ 1.718.184,00	10,00	$ 4.295.460,00	5,00	$ 2.147.730,00
NP-1.25	2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2			62,40	52,80	52,80	$ 23.158,00	$ 1.222.742,40	0,00	$ -	52,80	$ 1.222.742,40	0,00	$ -
NP-1.26	EN BASE A 2,6	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3			530,90	735,65	803,55	$ 99.821,00	$ 80.211.164,55	81,13	$ 8.098.477,73	612,03	$ 61.093.446,63	191,52	$ 19.117.717,92
NP-1.27	4,6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	M3				39,24	40,65	$ 985.163,00	$ 40.046.875,95			0,00	$ -	40,65	$ 40.046.875,95
NP-1.28	4,25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3				35,06	17,31	$ 683.254,00	$ 11.827.126,74			0,00	$ -	17,31	$ 11.827.126,74
NP-1.29	4,21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3				22,71	25,43	$ 779.818,00	$ 19.830.771,74			0,00	$ -	25,43	$ 19.830.771,74
NP-1.30	3811	CORTE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML				882,30	-	$ 3.457,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -

ANEXO A del ACTA No. 15 CORTE No. 08 **CORTE**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**			**FECHA**	**31/01/2026**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**25** (Día)	**3** (Mes)	**2025** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)	**2026** (Año)	ADICIÓN 1(+)	**$ 1.767.258.164,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$**		**5.674.617.468,75**	ADICIÓN 2(+)	**$ 124.280.992,25**

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En el Municipio de Facatativá se reunieron él **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** él **Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal de ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, él Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente corte a las actividades realizadas por el contratista y supervizadas por el interventor y/o supervisor.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6										**CANTIDAD**		**VALOR**		**SALDO POR EJECUTAR**	
CAP.	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT MAY Y MEN No 2**	**CANT MAY Y MEN No 3**	**CANT MAY Y MEN No 4**	**CANT MAY Y MEN No 5**	**CANT MAY Y MEN No 6**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CORTE No.08**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO DE CORTES**	**ACUMULADO TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO VIAL								**$ 50.000.000,00**				**$ 50.000.000,00**		**0,00**
		ESTUDIOS Y DISEÑOS ADICIONAL PARA MANTENIMIENTO VIAL								**$ 36.300.000,00**		**$ 11.300.000,00**		**$ 36.300.000,00**		
	TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO									**$ 5.674.617.468,75**		**$ 473.915.633,16**		**$ 4.997.148.789,62**		**$ 677.468.679,13**
	TOTAL COSTO INDIRECTO									**$ 4.365.090.360,58**		**$ 364.550.487,05**		**$ 3.843.960.607,40**		**$ 521.129.753,18**
		ADMINISTRACIÓN							22%	960.319.879,33		80.201.107,15		845.671.333,63		114.648.545,70
		IMPREVISTOS							3%	130.952.710,82		10.936.514,61		115.318.818,22		15.633.892,60
		UTILIDAD							5%	218.254.518,03		18.227.524,35		192.198.030,37		26.056.487,66
	TOTAL AIU								**30%**	**$ 1.309.527.108,18**		**$ 109.365.146,11**		**$ 1.153.188.182,22**		**$ 156.338.925,96**
		IVA SOBRE UTILIDAD							0%	$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)									**$ 5.674.617.468,75**		**$ 473.915.633,16**		**$ 4.997.148.789,62**		**$ 677.468.679,13**
	AJUSTE AL PESO															
	VALOR TOTAL									**$ 5.674.617.468,75**		**$ 473.915.633,16**		**$ 4.997.148.789,62**		**$ 677.468.679,13**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº 252 / 2025

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$**	**3.783.078.312,50**	
VALOR ADICIONES:	**$**	**1.891.539.156,25**	
VALOR ACTUAL CONTRATO:	**$**	**5.674.617.468,75**	

| | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORCIO VIAS FACA

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

TRAMO : BARRIO VILLAS DEL NORTE

ABSCISA	Cotas iniciales			ABSCISA	Diseño		
	izq	eje	der		izq	eje	der
0				0			
10	2.598,00	2.598,02	2.598,04	10	2.597,97	2.598,02	2.597,97
20	2.597,79	2.597,79	2.597,79	20	2.597,73	2.597,77	2.597,73
30	2.597,60	2.597,48	2.597,46	30	2.597,50	2.597,54	2.597,50
40	2.597,43	2.597,41	2.597,38	40	2.597,36	2.597,40	2.597,36
50	2.597,31	2.597,25	2.597,26	50	2.597,23	2.597,27	2.597,23
60	2.597,18	2.597,12	2.597,09	60	2.597,06	2.597,10	2.597,06
70	2.596,93	2.596,82	2.596,87	70	2.596,87	2.596,91	2.596,87
75				75			

OBSERVACIONES:

REPONSABLES:

Maria Alejandra Bohorquez

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO CONTRATISTA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

TRAMO NUEVA HOLANDA BASE ESTABILIZADA

CONSORCIO VIAS FACA

ABSCISA	ANCHO SECCION	INICIAL			BASE			ESPESOR DE DISEÑO	DIFERENCIA DE NIVEL			PROMEDIO DE ESPESORES	AREA (m^2)		AREA TOTAL (m^2)	VOLUMEN TOTAL (m^3)
		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER									
K0+000	6,67	2634,309	2634,388	2634,539	2634,559	2634,638	2634,789		0,250	0,250	0,250	0,250	0,834	0,834	1,668	
K0+010	4,00	2635,097	2635,060	2635,075	2635,347	2635,310	2635,325		0,250	0,250	0,250	0,250	0,500	0,500	1,000	13,338
K0+020	4,00	2635,609	2635,620	2635,628	2635,859	2635,870	2635,878		0,250	0,250	0,250	0,250	0,500	0,500	1,000	10,000
K0+030	4,00	2635,929	2635,942	2635,909	2636,179	2636,192	2636,159	0,25	0,250	0,250	0,250	0,250	0,500	0,500	1,000	10,000
K0+040	4,00	2635,969	2636,035	2635,976	2636,219	2636,285	2636,226		0,250	0,250	0,250	0,250	0,500	0,500	1,000	10,000
K0+050	4,00	2636,039	2636,086	2636,067	2636,289	2636,336	2636,317		0,250	0,250	0,250	0,250	0,500	0,500	1,000	10,000
K0+060	4,00	2636,074	2636,083	2636,082	2636,324	2636,333	2636,332		0,250	0,250	0,250	0,250	0,500	0,500	1,000	10,000
K0+070	5,19	2636,067	2636,065	2636,097	2636,317	2636,315	2636,347		0,250	0,250	0,250	0,250	0,649	0,649	1,298	11,488
											TOTAL	**0,250**		TOTAL	**8,965**	**74,825**

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

TRAMO NUEVA HOLANDA ASFALTO

CONSORCIO VIAS FACA

ABSCISA	ANCHO SECCION	BASE			ASFALTO			ESPESOR DE DISEÑO	DIFERENCIA DE NIVEL			PROMEDIO DE ESPESORES	AREA (m^2)		AREA TOTAL (m^2)	VOLUMEN TOTAL (m^3)
		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER									
K0+000	6,67	2634,559	2634,638	2634,789	2634,654	2634,722	2634,842		0,095	0,084	0,053	0,077	0,228	0,298	0,527	
K0+010	4,00	2635,347	2635,310	2635,325	2635,442	2635,424	2635,407		0,095	0,114	0,082	0,097	0,196	0,209	0,405	4,660
K0+020	4,00	2635,859	2635,870	2635,878	2635,953	2635,969	2635,977		0,094	0,099	0,099	0,097	0,198	0,193	0,391	3,980
K0+030	4,00	2636,179	2636,192	2636,159	2636,262	2636,284	2636,247		0,083	0,092	0,088	0,088	0,180	0,175	0,355	3,730
K0+040	4,00	2636,219	2636,285	2636,226	2636,332	2636,368	2636,326	0,08	0,113	0,083	0,100	0,099	0,183	0,196	0,379	3,670
K0+050	4,00	2636,289	2636,336	2636,317	2636,378	2636,420	2636,402		0,089	0,084	0,085	0,086	0,169	0,173	0,342	3,605
K0+060	4,00	2636,324	2636,333	2636,332	2636,414	2636,440	2636,437		0,090	0,107	0,105	0,101	0,212	0,197	0,409	3,755
K0+070	5,19	2636,317	2636,315	2636,347	2636,414	2636,422	2636,454		0,097	0,107	0,107	0,104	0,278	0,265	0,542	4,757
	4,48										TOTAL	**0,094**		TOTAL	**3,350**	**28,156**

OBSERVACIONES:

REPONSABLES:

María Alejandra Bohórquez F.
ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO CONTRATISTA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

316

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

VILLA OLIMPICA BASE

ABSCISA	ANCHO SECCION	INICIAL			BASE			ESPESOR DE DISEÑO	DIFERENCIA DE NIVEL			PROMEDIO DE ESPESOR	AREA (m^2)		AREA TOTAL (m^2)	VOLUMEN TOTAL (m^3)
		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER									
K0+014	7,20	2603,085	2603,120	2603,030	2603,336	2603,368	2603,278		0,251	0,248	0,248	0,249	0,893	0,898	1,791	
K0+020	7,20	2602,934	2603,005	2602,986	2603,181	2603,256	2603,236		0,247	0,251	0,250	0,249	0,902	0,896	1,798	10,768
K0+030	7,20	2602,833	2602,935	2602,958	2603,081	2603,184	2603,208		0,248	0,249	0,250	0,249	0,898	0,895	1,793	17,955
K0+040	7,20	2602,717	2602,791	2602,907	2602,966	2603,041	2603,156		0,249	0,250	0,249	0,249	0,898	0,898	1,796	17,946
K0+050	7,20	2602,617	2602,692	2602,760	2602,866	2602,941	2603,010		0,249	0,249	0,250	0,249	0,898	0,896	1,795	17,955
K0+060	7,20	2602,509	2602,573	2602,597	2602,761	2602,821	2602,846	0,25	0,252	0,248	0,249	0,250	0,895	0,900	1,795	17,946
K0+070	7,20	2602,333	2602,430	2602,449	2602,581	2602,681	2602,701		0,248	0,251	0,252	0,250	0,905	0,898	1,804	17,991
K0+080	7,20	2602,330	2602,393	2602,354	2602,581	2602,641	2602,601		0,251	0,248	0,247	0,249	0,891	0,898	1,789	17,964
K0+090	7,20	2602,361	2602,395	2602,381	2602,611	2602,646	2602,631		0,250	0,251	0,250	0,250	0,902	0,902	1,804	17,964
K0+100	7,20	2602,452	2602,511	2602,439	2602,701	2602,761	2602,686		0,249	0,250	0,247	0,249	0,895	0,898	1,793	17,982
K0+109	7,20	2602,535	2602,524	2602,506	2602,786	2602,776	2602,753		0,251	0,252	0,247	0,250	0,898	0,905	1,804	15,285
	7,20										TOTAL	0,249		TOTAL	19,760	169,755

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

VILLA OLIMPICA ASFALTO

ABSCISA	ANCHO SECCION	BASE			ASFALTO			ESPESOR DE	DIFERENCIA DE NIVEL			PROMEDIO DE	AREA (m^2)		AREA TOTAL (m^2)	VOLUMEN TOTAL (m^3)
		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER									
K0+014	7,00	2603,336	2603,368	2603,278	2603,483	2603,488	2603,413		0,147	0,120	0,135	0,134	0,446	0,467	0,914	
K0+020	7,00	2603,181	2603,256	2603,236	2603,321	2603,398	2603,393		0,140	0,142	0,157	0,146	0,523	0,494	1,017	5,791
K0+030	7,00	2603,081	2603,184	2603,208	2603,223	2603,333	2603,357		0,142	0,149	0,149	0,147	0,521	0,509	1,031	10,238
K0+040	7,00	2602,966	2603,041	2603,156	2603,108	2603,183	2603,278		0,142	0,142	0,122	0,135	0,462	0,497	0,959	9,949
K0+050	7,00	2602,866	2602,941	2603,010	2602,988	2603,098	2603,136		0,122	0,157	0,126	0,135	0,495	0,488	0,983	9,712
K0+060	7,00	2602,761	2602,821	2602,846	2602,888	2602,958	2602,988	0,12	0,127	0,137	0,142	0,135	0,488	0,462	0,950	9,669
K0+070	7,00	2602,581	2602,681	2602,701	2602,718	2602,828	2602,835		0,137	0,147	0,134	0,139	0,492	0,497	0,989	9,695
K0+080	7,00	2602,581	2602,641	2602,601	2602,708	2602,783	2602,738		0,127	0,142	0,137	0,135	0,488	0,471	0,959	9,739
K0+090	7,00	2602,611	2602,646	2602,631	2602,743	2602,803	2602,768		0,132	0,157	0,137	0,142	0,514	0,506	1,020	9,896
K0+100	7,00	2602,701	2602,761	2602,686	2602,844	2602,911	2602,813		0,143	0,150	0,127	0,140	0,485	0,513	0,998	10,089
K0+109	7,00	2602,786	2602,776	2602,753	2602,920	2602,915	2602,873		0,134	0,139	0,120	0,131	0,453	0,478	0,931	8,196
											TOTAL	0,138		TOTAL	10,750	92,973

OBSERVACIONES:

REPONSABLES:

María Alejandra Bohórquez

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO CONTRATISTA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS FACA

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

TRAMO : BARRIO LAS PIEDRAS

ABSCISA	Cotas iniciales			ABSCISA	Diseño		
	izq	eje	der		izq	eje	der
0	2.607,91	2.607,89	2.607,78	0	2.607,91	2.607,89	2.607,78
10	2.607,86	2.607,94	2.607,97	10	2.607,87	2.607,92	2.607,98
20	2.608,01	2.608,08	2.608,04	20	2.608,06	2.608,04	2.608,03
30	2.608,14	2.608,22	2.608,12	30	2.608,12	2.608,10	2.608,08
40	2.608,30	2.608,29	2.608,31	40	2.608,18	2.608,15	2.608,13
50	2.608,20	2.608,24	2.608,27	50	2.608,23	2.608,20	2.608,18
60	2.608,13	2.608,13	2.608,16	60	2.608,29	2.608,22	2.608,16
70	2.608,07	2.608,13	2.608,20	70	2.608,23	2.608,16	2.608,09
80	2.607,97	2.608,12	2.608,18	80	2.608,18	2.608,12	2.608,06
90	2.608,23	2.608,21	2.608,28	90	2.608,22	2.608,17	2.608,12
100	2.608,24	2.608,27	2.608,27	100	2.608,25	2.608,23	2.608,21
110	2.608,23	2.608,23	2.608,22	110	2.608,25	2.608,24	2.608,22
120	2.608,20	2.608,24	2.608,28	120	2.608,21	2.608,19	2.608,16
130	2.608,18	2.608,15	2.608,12	130	2.608,17	2.608,14	2.608,11

ALMA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

LAS PIEDRAS EXCAVACAION

CONSORCIO VIAS FACA

ABSCISA	ANCHO SECCION	INICIAL			EXCAVACION			ESPESOR DE DISEÑO	DIFERENCIA DE NIVEL			PROMEDIO DE ESPESORES	AREA (m^2)		AREA TOTAL (m^2)	VOLUMEN TOTAL (m^3)
		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER									
K0+000	7,47	2607,911	2607,889	2607,783	2607,275	2607,240	2607,144		0,636	0,649	0,639	0,641	2,405	2,399	4,804	
K0+010	4,66	2607,860	2607,936	2607,970	2607,236	2607,279	2607,343		0,624	0,657	0,627	0,636	1,497	1,493	2,990	38,970
K0+020	4,69	2608,008	2608,080	2608,040	2607,415	2607,443	2607,465		0,593	0,637	0,575	0,602	1,420	1,441	2,861	29,255
K0+030	4,68	2608,143	2608,215	2608,120	2607,471	2607,494	2607,528		0,672	0,721	0,592	0,662	1,535	1,628	3,163	30,117
K0+040	4,75	2608,300	2608,289	2608,310	2607,532	2607,577	2607,613		0,768	0,712	0,697	0,726	1,675	1,759	3,434	32,981
K0+050	4,74	2608,198	2608,244	2608,270	2607,598	2607,593	2607,589		0,600	0,651	0,681	0,644	1,579	1,483	3,062	32,479
K0+060	4,63	2608,130	2608,126	2608,160	2607,644	2607,580	2607,520		0,486	0,546	0,640	0,557	1,374	1,196	2,570	28,158
K0+070	4,54	2608,070	2608,128	2608,201	2607,603	2607,531	2607,458	0,63	0,467	0,597	0,743	0,602	1,522	1,208	2,730	26,499
K0+080	4,57	2607,970	2608,124	2608,180	2607,529	2607,471	2607,422		0,441	0,653	0,758	0,617	1,612	1,250	2,862	27,962
K0+090	4,55	2608,232	2608,214	2608,276	2607,587	2607,527	2607,480		0,645	0,687	0,796	0,709	1,688	1,516	3,205	30,334
K0+100	4,61	2608,244	2608,265	2608,265	2607,620	2607,586	2607,560		0,624	0,679	0,705	0,669	1,594	1,501	3,095	31,502
K0+110	4,60	2608,230	2608,234	2608,220	2607,605	2607,599	2607,579		0,625	0,635	0,641	0,634	1,469	1,450	2,919	30,072
K0+120	4,63	2608,200	2608,239	2608,276	2607,566	2607,547	2607,518		0,634	0,692	0,758	0,695	1,677	1,534	3,210	30,647
K0+130	4,67	2608,180	2608,147	2608,117	2607,521	2607,506	2607,463		0,659	0,641	0,654	0,651	1,513	1,519	3,032	31,931
	4,84										**TOTAL**	**0,646**		**TOTAL**	**43,937**	**400,907**

916

CONTRATO DE OBRA 252- 2025 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

LAS PIEDRAS MEJORAMIENTO

CONSORCIO VIAS FACA

ABSCISA	ANCHO SECCION	MEJORAMIENTO			EXCAVACION			ESPESOR DE	DIFERENCIA DE NIVEL			PROMEDIO DE ESPESORES	AREA (m^2)		AREA TOTAL (m^2)	VOLUMEN TOTAL (m^3)
		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER									
K0+000	7,47	2607,569	2607,555	2607,443	2607,275	2607,240	2607,144		0,294	0,315	0,299	0,303	1,146	1,137	2,283	
K0+010	4,66	2607,525	2607,577	2607,628	2607,236	2607,279	2607,343		0,289	0,298	0,285	0,291	0,680	0,684	1,364	18,236
K0+020	4,69	2607,713	2607,736	2607,761	2607,415	2607,443	2607,465		0,298	0,293	0,296	0,296	0,690	0,692	1,382	13,731
K0+030	4,68	2607,784	2607,798	2607,817	2607,471	2607,494	2607,528		0,313	0,304	0,289	0,302	0,693	0,721	1,414	13,983
K0+040	4,75	2607,831	2607,878	2607,914	2607,532	2607,577	2607,613		0,299	0,301	0,301	0,300	0,715	0,713	1,429	14,214
K0+050	4,74	2607,887	2607,889	2607,887	2607,598	2607,593	2607,589		0,289	0,296	0,298	0,294	0,704	0,694	1,398	14,131
K0+060	4,63	2607,952	2607,889	2607,812	2607,644	2607,580	2607,520		0,308	0,309	0,292	0,303	0,696	0,715	1,411	14,044
K0+070	4,54	2607,895	2607,825	2607,760	2607,603	2607,531	2607,458	0,30	0,292	0,294	0,302	0,296	0,677	0,666	1,342	13,768
K0+080	4,57	2607,839	2607,778	2607,727	2607,529	2607,471	2607,422		0,310	0,307	0,305	0,307	0,699	0,705	1,404	13,733
K0+090	4,55	2607,872	2607,834	2607,773	2607,587	2607,527	2607,480		0,285	0,307	0,293	0,295	0,683	0,674	1,357	13,806
K0+100	4,61	2607,912	2607,889	2607,871	2607,620	2607,586	2607,560		0,292	0,303	0,311	0,302	0,707	0,685	1,393	13,749
K0+110	4,60	2607,913	2607,891	2607,880	2607,605	2607,599	2607,579		0,308	0,292	0,301	0,300	0,683	0,691	1,373	13,830
K0+120	4,63	2607,872	2607,853	2607,821	2607,566	2607,547	2607,518		0,306	0,306	0,303	0,305	0,704	0,708	1,412	13,926
K0+130	4,67	2607,826	2607,797	2607,764	2607,521	2607,506	2607,463		0,305	0,291	0,301	0,299	0,692	0,696	1,388	14,323
											TOTAL	0,300		TOTAL	20,351	185,475

OBSERVACIONES:

REPONSABLES:

Mario Alejandra Bohorquez

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

TOPOGRAFO CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

312

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,03	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)	UND.	M2

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K+074 - ENTRADA CONJUNTO	1	5,00	0,80		4,00
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA INCRESO CONJUNTO	1	6,08	2,00		12,16
TOTAL:					16,16



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

212

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,04	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)

UND.	M2

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	70,00	4,48		313,78
				TOTAL:	313,78

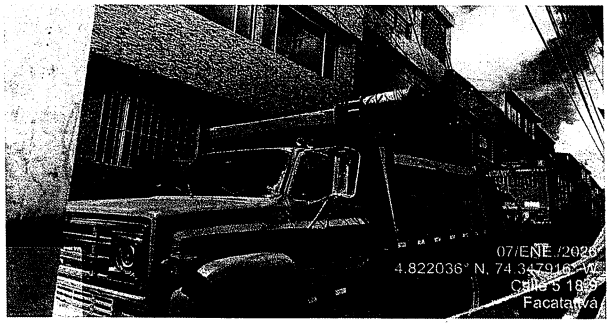

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,05	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	59	4,84	0,55	**156,05**
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS **(FALLO 1)**	1	7,00	2,50	0,25	**4,38**
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS **(FALLO 2)**	1	42,00	3,50	0,25	**36,75**
				TOTAL:	**197,17**

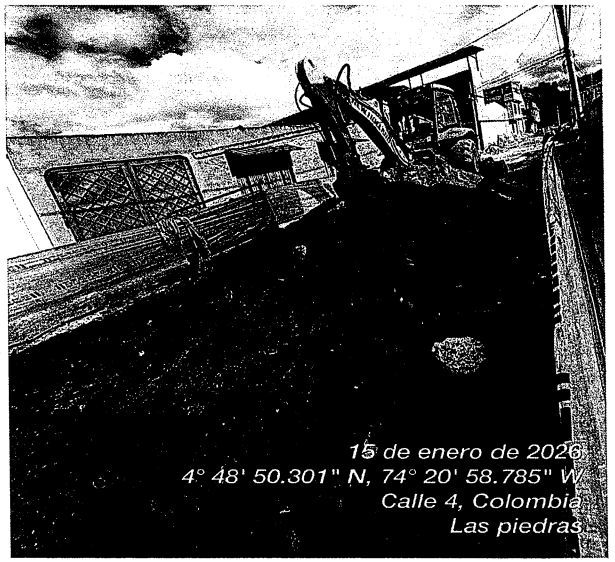

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	1,06 — EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	M3

CORTE No. 7

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1	68,00	0,22	0,21	3,14
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (TUBERIA NOVAFORT)	1	22,00	0,40	0,5	4,40
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (DOMICILIARIAS)	6	4,00	0,30	0,5	3,60
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (INSTALACIÓN SARDINEL)	1	20,00	0,30	0,22	1,32
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA (DOMICILIARIAS)	3	1,20	0,90	0,7	2,27
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA (SARDINEL BAJO RAMPA)	1	68,00	0,22	0,21	3,14
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA (TUBERIA NOVAFORT)	1	17,00	0,70	1,1	13,09
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA DOMICILIARIAS	2	1,20	0,90	0,7	1,51
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (TUBERIA NOVAFORT)	1	2,70	0,70	1,1	2,08
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (HUNDIMIENTO)	1	3,00	2,70	1,1	8,91
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA EXCAVACION PARA ANDENES	19	0,20	0,20	0,6	0,46
TRAMO 18: CALLE 17A CON CARRERA 4 - BARRIO VILLAS DEL NORTE (RETIRO SARDINEL EXISTENTE)	1	148,00	0,30	0,3	13,32
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+040 HASTA K0+082 COSTADO EL CONJUNTO - DILATACIONES)	1	22,00	0,22	0,22	1,06
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+020 HASTA K0+160 COSTADO EL COIEGIO - DILATACIONES)	1	72,86	0,22	0,22	3,53
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+160 HASTA K0+190 COSTADO EL COIEGIO - DILATACIONES)	1	5,56	0,22	0,22	0,27
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+160 HASTA K0+190 COSTADO EL COIEGIO - CONFORMACION ANDEN)	1	30,00	1,85	0,35	19,46
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+190 HASTA K0+215 COSTADO DERECHO - ANDEN EXISTENTE)	1	25,50	0,30	0,8	6,12
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+180 HASTA K0+190 COSTADO COLEGIO - VIGA DE AMARRE)	1	10,80	0,30	0,25	0,81
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+180 HASTA K0+190 COSTADO COLEGIO -ANDEN)	3	0,60	0,60	0,35	0,38
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+70 HASTA K0+76 COSTADO CONJUNTO- RAMPA DE ACCESO)	1	6,00	1,68	0,35	3,53
				TOTAL:	92,39

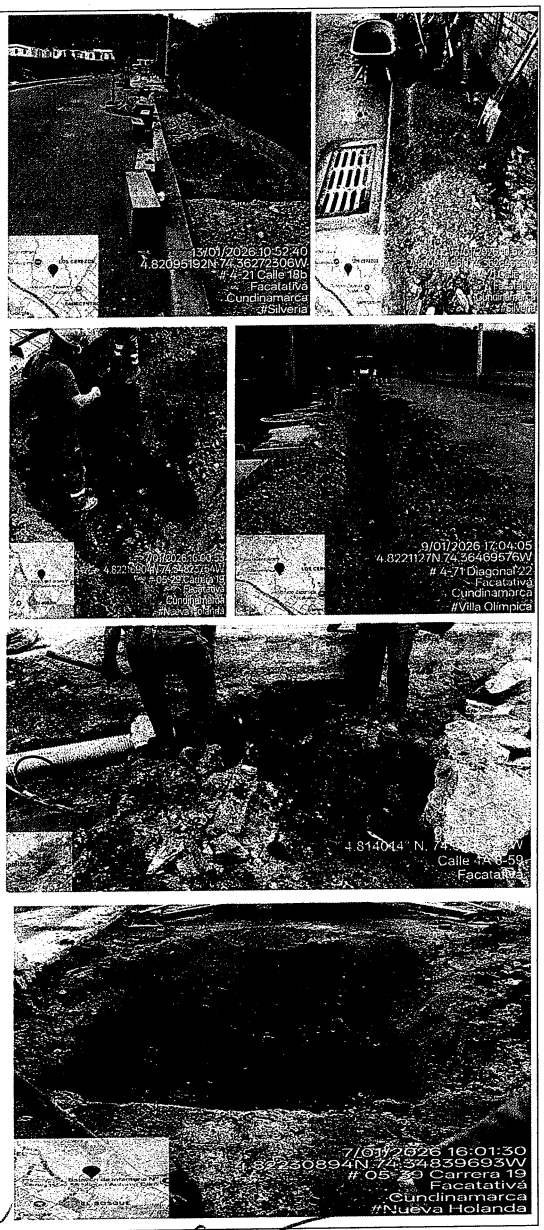

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,09	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	38,00	4,84	0,3	**55,21**
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (SATURACION MATERIAL)	1	6,00	3,00	0,2	**3,60**
				TOTAL:	58,81

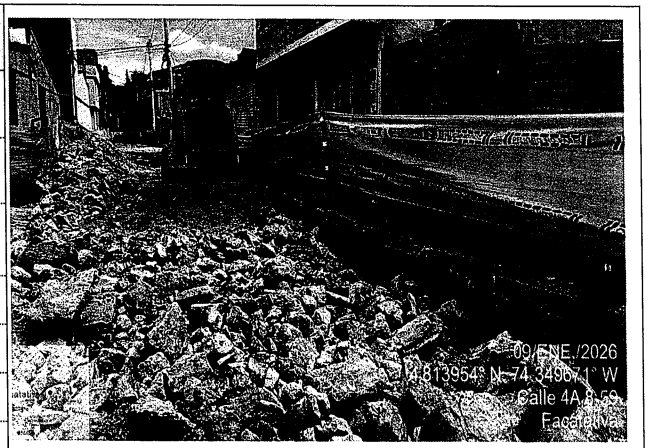

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO GUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maira Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026


ÍTEM	1,13	RIEGO DE IMPRIMACIÓN

UND.	M2

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	2	108,50	7,00		1.519,00
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA **(PARCHEO PUENTE)**	1	4,70	6,00		28,20
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	70,00	4,48		313,78
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (PARCHEO)	1	4,50	3,00		13,50
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA INCRESO CONJUNTO	1	6,08	2,00		12,16
				TOTAL:	1.886,64

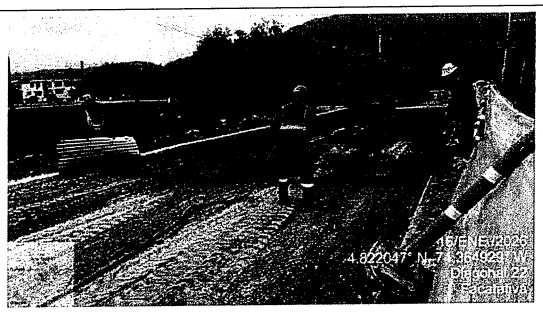

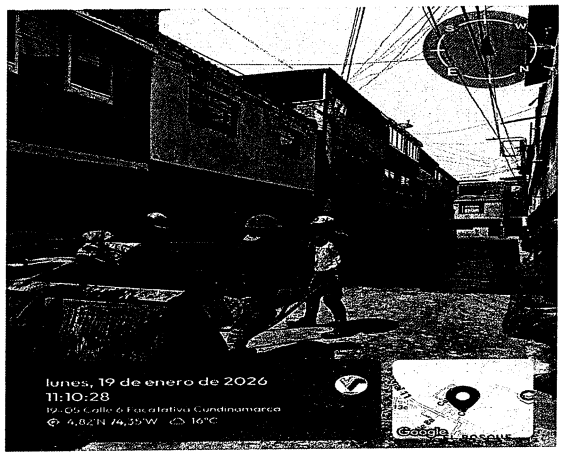

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandro Bohorquez
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,15	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL VOLUMEN SEGÚN CARTERAS TOPOGRAF.
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1	108,50	7,00	0,12	91,14
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA **(PARCHEO PUENTE)**	1	4,70	6,00	0,08	2,26
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	70,00	4,48	0,08	25,10
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (PARCHEO)	1	4,50	3,00	0,08	1,08
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA INCRESO CONJUNTO	1	6,08	2,00	0,08	0,97
				TOTAL VOLUMEN SEGÚN CARTERAS TOPOGRAFICAS:	120,55



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez 1
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karuto
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

32

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,20	SARDINEL PREFABRICADO A-10

UND.	ML

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (INSTALACIÓN SARDINEL)	1	20,00			20,00
				TOTAL:	20,00

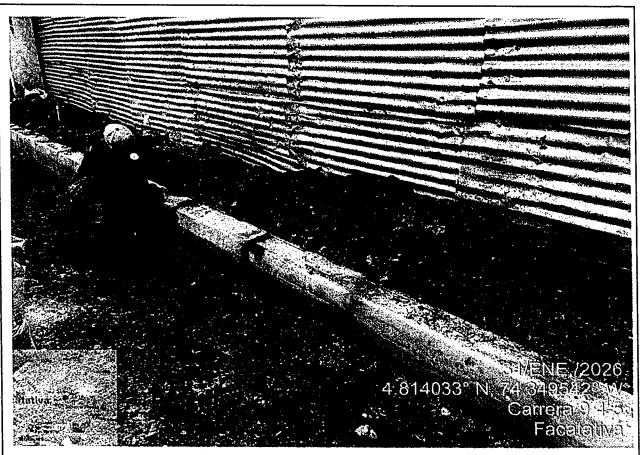

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,22	BORDILLO PREFABRICADO A-80	UND.	ML

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+040 HASTA K0+070 COSTADO EL CONJUNTO - DILATACIONES)	1	14,30			14,30
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+076 HASTA K0+080 COSTADO CONJUNTO - DILATACIONES)	1	1,25			1,25
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+070 HASTA K0+160 COSTADO COLEGIO - DILATACIONES)	1	49,00			49,00
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (DESDE K0+160 HASTA K0+190 COSTADO EL COIEGIO - DILATACIONES)	1	5,56			5,56
				TOTAL:	70,11



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO GUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez !.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

222

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,24	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM

UND.	M2

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (LADO DERECHO K0+000 HASTA K0+040)	1	40,00	1,30		10,40
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (LADO DERECHO K0+040 HASTA K0+080)	1	34,00	1,30		44,20
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (POMPEYANO)	1	7,20	2,10		1,51
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+020 HASTA K0+160 (LADO IZQUIERDO-COSTADO COLEGIO)	1	140,00	1,38		193,20
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+160 HASTA K0+190 (LADO IZQUIERDO-COSTADO COLEGIO)	1	30,00	1,85		55,60
				TOTAL:	304,91



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

329

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026			
ÍTEM	1,28	CONCRETO 3000 PSI	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (ELABORACION TAPA VALVULA DE GAS- BAHIA)	1	0,40	0,40	0,1	0,02
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS **(TAPAS CAJAS DE INSPECCION)**	2	0,60	0,60	0,1	0,07
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (CINTA DE DILATACIÓN)	3	0,60	0,60	0,05	0,05
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+000 HASTA K0+080 (CINTA DILATACIÓN ANDENES)	1	74,00	0,04	0,08	0,24
				TOTAL:	0,38



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez 1.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

230

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,28	CONCRETO 3000 PSI

UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (ELABORACION TAPA VALVULA DE GAS- BAHIA)	1	0,40	0,40	0,1	0,02
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS **(TAPAS CAJAS DE INSPECCION)**	2	0,60	0,60	0,1	0,07
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (CINTA DE DILATACIÓN)	3	0,60	0,60	0,05	0,05
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+000 HASTA K0+080 (CINTA DILATACIÓN ANDENES)	1	74,00	0,04	0,08	0,24
				TOTAL:	0,38

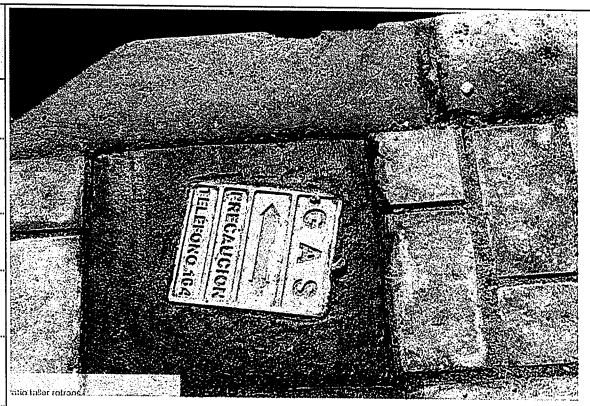

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez J.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,29	CONCRETO 4000 PSI

UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: RAMPA DE ACCESO VEHICULAR CONJUNTO	1	6,00	1,68	0,15	1,51
TOTAL:					1,51



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez !
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026


ÍTEM	1,30	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

UND.	KG

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS						TOTAL
	LARGO (M)	DIAMETRO (IN)	PESO (KG/M)	PESO POR UNIDAD	UNIDADES	REPETICIONES	
TRAMO 5: Bordillo (Refuerzo Varilla No 4)	1,60	1/2	1,00	1,6	4	2	12,80
TRAMO 5: Bordillo (Refuerzo flejes Varilla No 3)	0,60	3/8	0,56	0,336	4	6	8,06
TRAMO 5: Viga cimentacion (Refuerzo Varilla No 4)	11,60	1/2	1,00	11,6	1	4	46,40
TRAMO 5: Viga cimentacion (Refuerzo flejes Varilla No 3)	0,30	3/8	0,56	0,168	1	54	9,07
TRAMO 5: Tapas de inspeccion longitudinal y transversal (Refuerzo flejes Varilla No 4)	1,40	1/2	1,00	1,4	3	3	12,60
TRAMO 5: Anden en concreto costado derecho refuerzo longitudinal (Refuerzo Varilla No 3)	27,20	3/8	0,56	15,232	1	4	60,93
TRAMO 5: Anden en concreto costado derecho refuerzo transversal (Refuerzo Varilla No 3)	0,80	3/8	0,56	0,448	1	127,5	57,12
TRAMO 5: Tapas valvula de gas refuerzo longitudinal y transversal (Refuerzo varilla No 3)	1,00	3/8	0,56	0,56	2	5	5,60
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (TAPAS CAJAS DE INSPECCION)	1,00	3/8	0,56	0,56	2	5	5,60
						TOTAL:	218,18



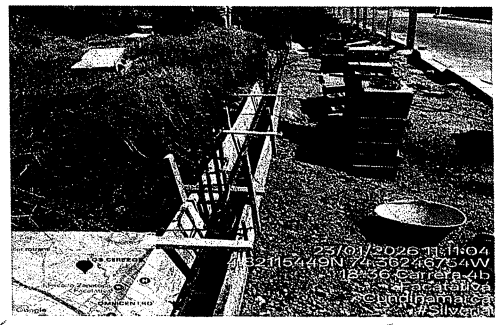

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026


ÍTEM	1,30	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

UND.	KG

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS						TOTAL
	LARGO (M)	DIAMETRO (IN)	PESO (KG/M)	PESO POR UNIDAD	UNIDADES	REPETICIONES	
TRAMO 5: Bordillo (Refuerzo Varilla No 4)	1,60	1/2	1,00	1,6	4	2	12,80
TRAMO 5: Bordillo (Refuerzo flejes Varilla No 3)	0,60	3/8	0,56	0,336	4	6	8,06
TRAMO 5: Viga cimentacion (Refuerzo Varilla No 4)	11,60	1/2	1,00	11,6	1	4	46,40
TRAMO 5: Viga cimentacion (Refuerzo flejes Varilla No 3)	0,30	3/8	0,56	0,168	1	54	9,07
TRAMO 5: Tapas de inspeccion longitudinal y transversal (Refuerzo flejes Varilla No 4)	1,40	1/2	1,00	1,4	3	3	12,60
TRAMO 5: Anden en concreto costado derecho refuerzo longitudinal (Refuerzo Varilla No 3)	27,20	3/8	0,56	15,232	1	4	60,93
TRAMO 5: Anden en concreto costado derecho refuerzo transversal (Refuerzo Varilla No 3)	0,80	3/8	0,56	0,448	1	127,5	57,12
TRAMO 5: Tapas valvula de gas refuerzo longitudinal y transversal (Refuerzo varilla No 3)	1,00	3/8	0,56	0,56	2	5	5,60
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (TAPAS CAJAS DE INSPECCION)	1,00	3/8	0,56	0,56	2	5	5,60
						TOTAL:	218,18



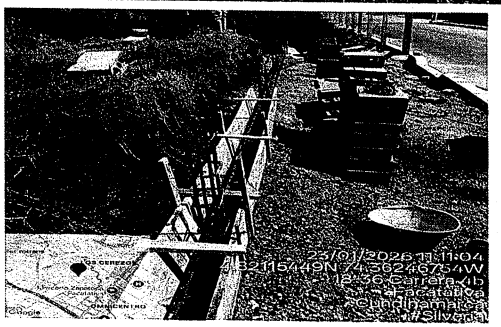

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

333


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,32	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	UND.	M3-KM

CORTE No. 8

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	VOLUMEN COMPACTO	% COMPACTACIÓN	VOLUMEN SUELTO	KM	
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1	25%	91,14	5,6	127,60
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA (PARCHEO PUENTE)	1	25%	2,26	5,6	3,16
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	25%	25,10	4,9	30,75
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (PARCHEO)	1	25%	1,08	4,9	1,32
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA INCRESO CONJUNTO	1	25%	0,97	6,6	1,61
TRAMO ALTAMIRA SUMINISTRO	1	25%	81,13	7	150,09
				TOTAL:	314,52

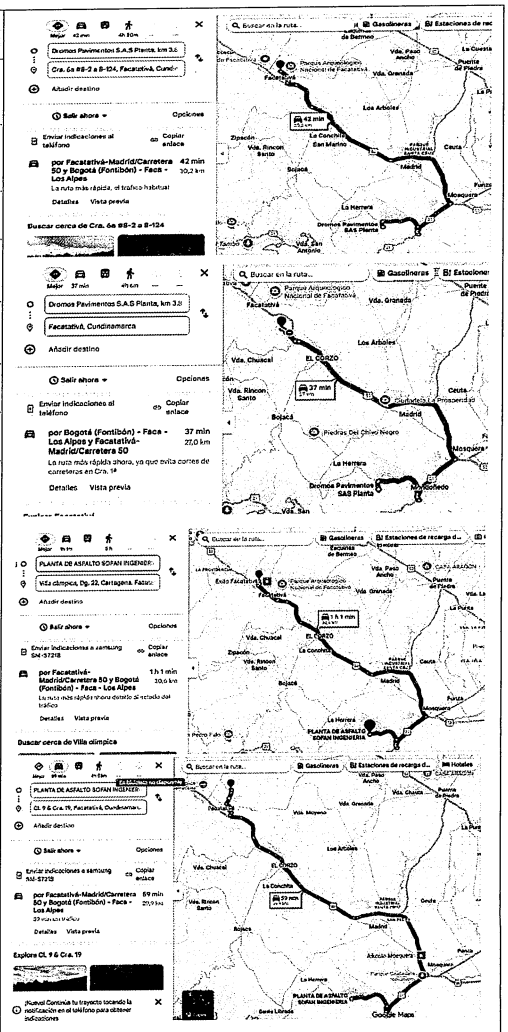

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329	
VERSIÓN: 04	
FECHA: 15 MAY 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,33	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)

UND.	UND

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	2				2,00
				TOTAL:	2,00

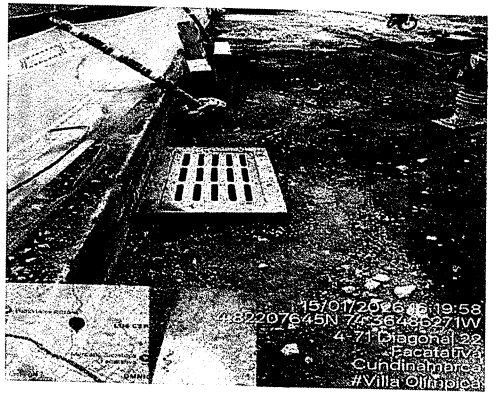

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez !
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,38	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UND.	ML

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	2	4,60			9,20
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	4,00			4,00
				TOTAL:	13,20





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,39	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	4				4,00
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	2				2,00
				TOTAL:	6,00

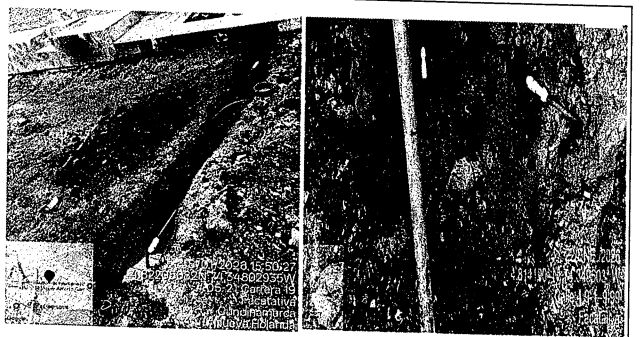

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

337

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026			
ÍTEM	1,40	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1				1,00
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1				1,00
TOTAL:					2,00

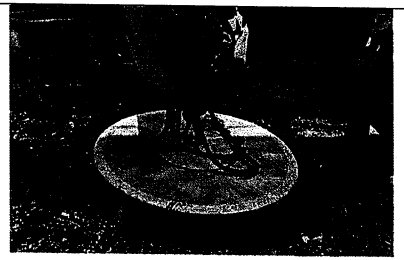



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Mario Alejandro Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	1,41	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
					-
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1				1,00
				TOTAL:	1,00

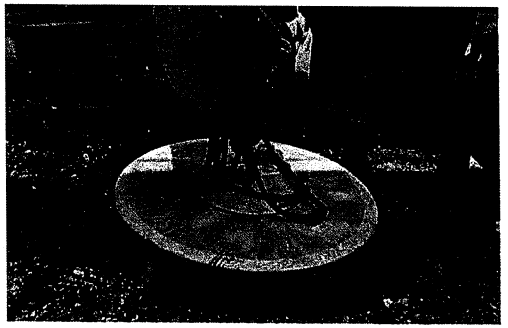

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez. J.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	2,01	AFIRMADO	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (LADO DERECHO K0+187 HASTA K0+214) ANDEN EXISTENTE	1	25,50	0,80	0,2	**4,08**
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA RAMPA INGRESO AL CONJUNTO	1	6,08	1,60	0,25	**2,43**
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA LADO IZQUIERDO K0+150 HASTA K0+190 (ANDEN)	1	40,00	1,40	0,25	**14,00**
				TOTAL:	20,51



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO GUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

340

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	NP-1.01	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	130,00	4,84	0,25	125,92
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (FALLO 1)	1	7,00	3,20	0,25	5,60
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (FALLO 2)	1	42,00	3,50	0,25	36,75
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	70,00	4,48	0,25	78,44
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (FALLO1)	1	4,50	2,70	1,10	13,37
				TOTAL:	260,07





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.05	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M

UND.	M2

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+190 HASTA K0+215 (ANDEN)	1	25,50	0,80		20,40
				TOTAL:	20,40



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Mario Alejandro Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026			
ÍTEM	NP-1.08	RED SANITARIA PVC-S 6"	UND.	ML

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 20: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1	17,00			17,00
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	22,00			22,00
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1	2,70			2,70
				TOTAL:	41,70

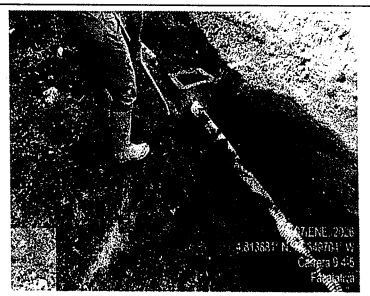

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez. 1
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.09	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	1				1,00
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	2				2,00
				TOTAL:	3,00

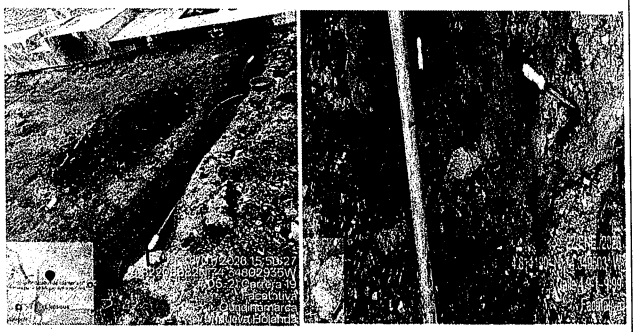

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

344

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.11	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UND.	ML/MES

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS						TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	MES	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	130,00	4,65	1/01/2026	31/01/2026	1,0	134,65
TRAMO 18: CALLE 17A CON CARRERA 4 - BARRIO VILLAS DEL NORTE	1	75,00	4,50	22/01/2026	31/01/2026	0,3	23,85
TRAMO 18: CALLE 17A CON CARRERA 4 - BARRIO VILLAS DEL NORTE	1	75,00	4,50	26/01/2026	31/01/2026	0,2	13,25
TRAMO 21: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1	108,50	7,15	1/01/2026	30/01/2026	1,0	111,80
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	2	70,00	4,05	5/01/2026	20/01/2026	0,5	74,05
						TOTAL:	357,60



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.12	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALCIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

UND.	M2

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+040 HASTA K0+070 (LADO IZQUIERDO)	1	30,00	0,40		12,00
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA K0+076 HASTA K0+080 (LADO IZQUIERDO)	1	4,00	0,40		1,60
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (LADO DERECHO K0+00 HASTA K0+080)	1	20,00	0,40		7,00
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (LADO DERECHO K0+080 HASTA K0+190)	1	110,00	0,40		44,00
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (BAHIA LINEA GUIA)	1	17,20	0,40		5,88
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (BAHIA LINEA TÁCTIL)	1	7,95	0,40		2,18
				TOTAL:	72,66



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

34

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.15	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3 CM MORTERO 2000 PSI

UND.	ML

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	1	68,50			68,50
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA INCRESO CONJUNTO	1	6,08			6,08
				TOTAL:	74,58

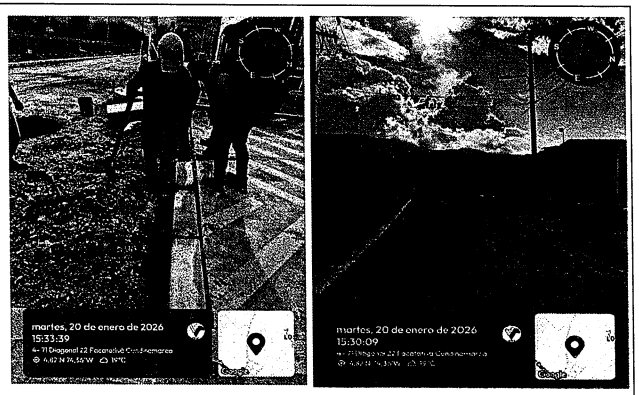

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

345

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	NP-1.17	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES Y RENIVELACIÓN DE REJILLAS)	UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA	2				2,00
				TOTAL:	2,00 ✓

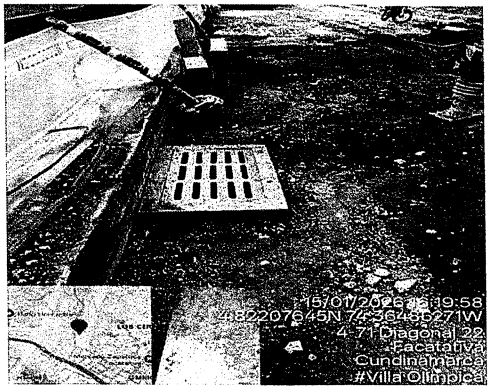

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

043

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	31/01/2026
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		


ÍTEM	NP-1.20	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (TUBERIA NOVAFORT)	1	22,00	0,40	0,5	**4,40**
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS (DOMICILIARIAS)	6	4,00	0,30	0,5	**3,60**
TRAMO 19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN RAFAEL - VILLA OLIMPICA (DOMICILIARIAS)	3	1,20	0,90	0,7	**2,27**
19: DIAGONAL 22 ENTRE CRA 5 Y VIA SAN - VILLA OLIMPICA (TUBERIA NOVAFORT)	1	17,00	0,70	1,1	**13,09**
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA DOMICILIARIAS	2	1,20	0,90	0,7	**1,51**
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA (TUBERIA NOVAFORT)	1	2,70	0,70	1,1	**2,08**
				TOTAL:	**26,95**



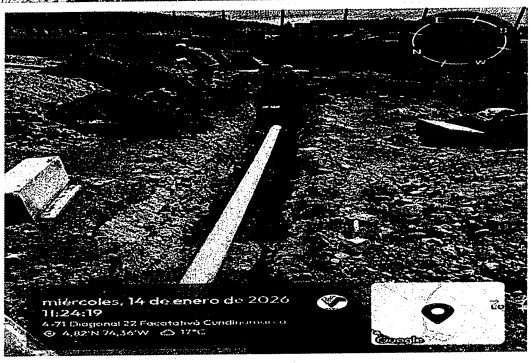

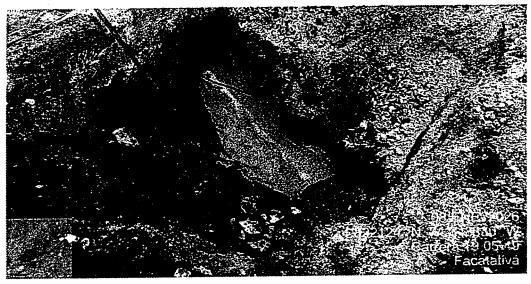

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.23	CAJA DE INSPECCIÓN 60x60

UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1				1,00
				TOTAL:	1,00



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Mario Alejandro Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

376

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.24	CAJA DE INSPECCIÓN 40X40

UND.	UN

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 17: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	2				2,00
TRAMO 21: CALLE 9 CON CARRERA 19 - BARRIO NUEVA HOLANDA	2				2,00
				TOTAL:	4,00



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Maria Alejandra Bohorquez
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Karen
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

53

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	31/01/2026

ÍTEM	NP-1.26	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"

UND.	M3

CORTE No. 8

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Placa huella en la vereda Bermeo sector Altamira	1	141,30	4,00	0,15	73,76
Relleno para confinamiento de cunetas placa huella	2	141,30	0,20	0,15	7,38
				TOTAL:	81,13



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO GUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

352
