CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PIEDECUESTA, SANTANDER

2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
4.1 CONTROL DE GARANTÍAS - PÓLIZAS 7
4.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 8
4.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO 8
5 INFORME DE AVANCE 9
5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
5.2 CONTROL DE EQUIPOS USADOS EN OBRA 14
5.3 CONTROL DE PERSONAL 17
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 18
7 ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18
8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL 18
9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 18
10 CONCLUSIONES 19

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización zonas a intervenir – Barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada ... 5
Ilustración 2. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Brisas de Primavera ... 9
Ilustración 3. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Halcón de Granada ... 12

TABLAS

Tabla 1 Control de Garantías - Contrato de Obra ... 7
Tabla 2 Control de Garantías actualizado a Acta de inicio ... 7
Tabla 3 Relación de actas a la fecha ... 8
Tabla 4 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Brisas de Primavera ... 9
Tabla 5 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Halcón de Granada ... 11
Tabla 6 Relación de equipo ... 14
Tabla 7 Relación de personal del contratista ... 17
Tabla 8 Relación de Actas de Cobro ... 18

1. INTRODUCCIÓN

El Contratista CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB, identificado con NIT 901.983.966-5, representado legalmente por el ingeniero Julián Andrés Serrano Gómez, fue seleccionado mediante licitación para ejecutar el Contrato de Obra No. 210.16223.6 cuyo objeto es la: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Dado lo anterior y en cumplimiento al objeto contractual, se presenta documento correspondiente al Informe técnico de obra, con información detallada de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar, evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en cumplimiento del objeto contractual "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", durante el plazo establecido del contrato, comprendido desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 14 de agosto de 2026.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ejecutar los ítems contractuales conforme a las especificaciones técnicas dadas, garantizando la calidad, estabilidad y seguimiento de las obras contempladas en el contrato.

Desarrollar las actividades administrativas, de seguridad y gestión ambiental, consolidando los resultados mediante documentación técnica, reportes fotográficos y demás soportes que respalden la gestión realizada durante el periodo evaluado.


Verificar y evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

Monitorear el avance físico y financiero de la obra, comparando lo ejecutado con lo programado, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma, la adecuada utilización de los recursos asignados y el correcto control y seguimiento del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en dos frentes de acción ubicados en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, los cuales se encuentran adscritos al municipio de Piedecuesta, Santander que pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

Ilustración 1. Localización zonas a intervenir – Barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada

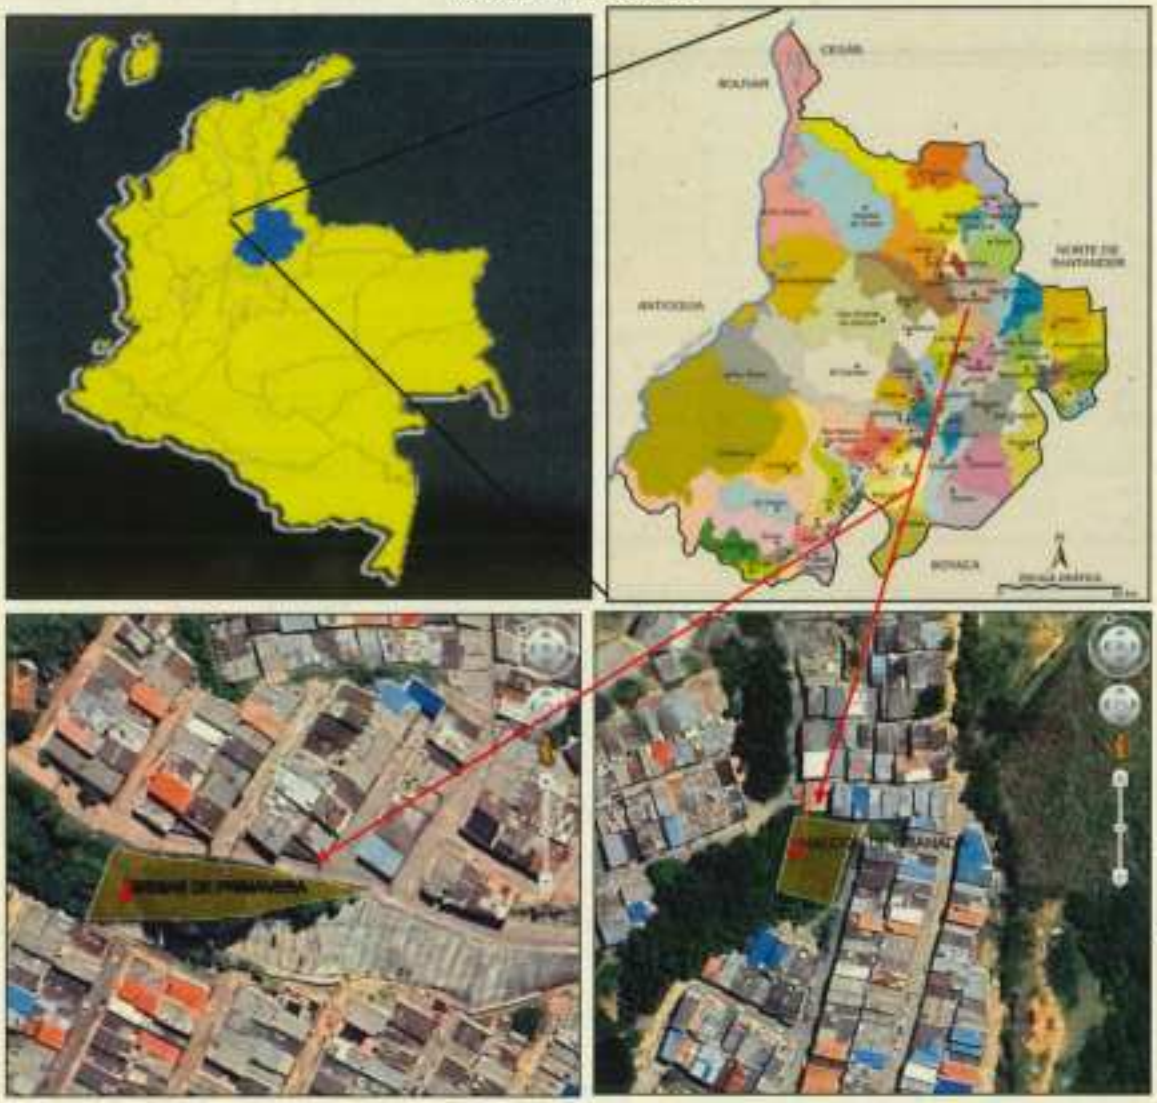

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se relaciona la información del contrato de obra N°210.16223.6 suscrito para la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE OBRA	N° 210.16223.6 del 05 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)
SUPERVISOR CONTRATANTE	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
REPRESENTANTE LEGAL	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.983.966-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
REPRESENTANTE LEGAL	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
NIT	901.982.939-1
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$ 9.651.664.101,92
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA, SANTANDER

4.1 CONTROL DE GARANTÍAS - PÓLIZAS

Tabla 1 Control de Garantías - Contrato de Obra

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 12/09/2025	
PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS RCE CONTRATOS				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y operaciones	$ 711.750,00	5/09/2025	5/07/2026	AB002677

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 12/09/2025	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 1.930.332.821,00	05/09/2025	05/11/2026	AB002676
Pago de salarios prestacionales	$ 482.583.205,25	05/09/2025	05/07/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.930.332.821,00	05/07/2026	05/07/2031	

Tabla 2 Control de Garantías actualizado a Acta de inicio

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 22/10/2025	
PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS RCE CONTRATOS				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y operaciones	$ 711.750,00	15/10/2025	15/08/2026	AB002677

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 22/10/2025	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 1.930.332.821,00	15/10/2025	15/12/2026	AB002676
Pago de salarios prestacionales	$ 482.583.205,25	05/09/2025	15/08/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.930.332.821,00	15/08/2026	15/08/2031	

4.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Tabla 3 Relación de actas a la fecha

RELACION DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
ACTA DE INICIO	15/10/2025	Se suscribe acta de inicio de obra el 15 de octubre de 2025, con un plazo para la ejecución total del proyecto de diez meses.	N/A
ACTA DE MODIFICATORIA 01	23/12/2025	Se suscribe acta de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos el 23 de diciembre de 2025, sin afectar el equilibrio financiero y el plazo contractual.	N/A

4.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 210.16223.6 para el periodo comprendido en este informe, suscribió la modificatoria 01 el 23 de diciembre de 2025, correspondiente al ajuste de mayores y menores cantidades de obra de mutuo acuerdo e items no previstos, en la cual se aprobó el cambio del sistema de estabilización del talud del barrio Brisas de Primavera, sustituyendo la pantalla de concreto lanzado con anclajes activos por un sistema de control de erosión superficial mediante manto sintético no degradable con protección UV, anclado al talud mediante sistema de anclajes pasivos tipo nails.

El ajuste aprobado obedece a las manifestaciones de inconformidad de la comunidad frente a la intervención de especies arbóreas dentro del área de influencia del proyecto. En atención a lo anterior, se realizó la evaluación de alternativas desde los componentes geotécnico, estructural y ambiental, las cuales fueron analizadas en el marco de comités técnicos y visitas de campo, dando lugar a la emisión de conceptos por parte de la autoridad ambiental y la interventoría. Como resultado, se definió un sistema de estabilización que garantiza la estabilidad del talud, minimiza la afectación ambiental y cumple con la normativa técnica y ambiental vigente. La presente modificatoria no implica alteración alguna de las condiciones contractuales del proyecto, ni genera variaciones en el valor total del contrato ni en el plazo de ejecución establecido.

Ver Anexo 1

5 INFORME DE AVANCE

5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 se relacionan todas las actividades de obra ejecutadas en los frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada, tal y como se especifica en el siguiente cuadro.

Tabla 4 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Brisas de Primavera

DESCRIPCION ITEM	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADAS EN EL PERIODO	CANT. ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,10	0,30	30,00%
Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	m2	1,00		1,00	100,00%
Desmonte y Limpieza	m2	1964,00	854,00	1964,00	100,00%
Retiro de basuras y escombros	m3	392,82		222,00	56,51%
Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m3	496,41		280,56	56,52%
Excavación en material granular a cualquier profundidad	m3	1553,94	150,03	1272,24	81,87%
Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad	m3	1035,93	140,00	888,14	85,73%
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-km	107965,80	0,97	75049,05	69,51%

Ver Anexo 2

Ilustración 2. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Brisas de Primavera



Replanteo, control y medición de la obra



Desmonte y Limpieza



Excavación en material granular a cualquier profundidad



Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad



Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

Tabla 5 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Halcón de Granada

DESCRIPCION ITEM	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADAS EN EL PERIODO	CANT. ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,30	0,30	30,00%
Desmonte y Limpieza	m2	518,00	518,00	518,00	100,00%
Retiro de basuras y escombros	m3	271,24	271,24	271,24	100,00%
Perfilado a mano descolgado de talud	m3	308,21	308,21	308,21	100,00%
Excavación en material granular a cualquier profundidad	m3	704,48	704,48	704,48	100,00%
Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad	m3	176,11	176,11	176,11	100,00%
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-km	35409,48	34774,56	34774,56	98,21%

Ver Anexo 3

Ilustración 3. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Halcón de Granada



Replanteo, control y medición de la obra



Desmonte y Limpieza



Retiro de basuras y escombros




Perfilado a mano descolgado de talud




Excavación en material granular a cualquier profundidad




Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad





Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

5.2 CONTROL DE EQUIPOS USADOS EN OBRA

Relación de equipos utilizados en el desarrollo del presente contrato en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Ver Anexo 3

Tabla 6 Relación de equipo

RELACIÓN DE EQUIPO UTILIZADO	
CANTIDAD	**MAQUINARIA/EQUIPO**
1	Nivel Topográfico
1	Equipo RTK - GNSS STONEX S900
1	Estación total Topcon
2	Volqueta (modelo mayor a 2010)
1	Excavadora DOOSAN DX225LCA
1	Minicargador CASE-2018

RELACIÓN DE EQUIPO UTILIZADO	
EQUIPO	**FOTOGRAFIA**
Nivel Topográfico TOPCON AT-B4	
Equipo RTK - GNSS STONEX S900	

Estación TOPCON GM-50	
2 Volquetas (modelos 2017 y 2018)	
Excavadora DOOSAN DX225LCA	

Minicargador CASE-2018	

5.3 CONTROL DE PERSONAL

Durante este periodo el Contratista presenta el personal operativo y profesional, que desarrolló labores en el marco del proyecto contractual, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 7 Relación de personal del contratista

PERSONAL CONTRACTUAL: PROFESIONALES SEGÚN PLIEGO			
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**INGRESO**
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	15/10/2025
Jhon Alexander González Rivera	1.098.760.722	Residente de obra	15/10/2025
William Eduardo Cortés Peña	91.278.912	Asesor en Geotecnia	15/10/2025
Lissette Ximena Niño Carvajal	63.395.720	Asesor Ambiental	15/10/2025
Víctor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional SST	15/10/2025
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80.187.378	PMP	15/10/2025
PERSONAL CONTRACTUAL: OPERATIVO			
Edgar Iván Palomino Holguín	1.098.636.620	Topógrafo	15/10/2025
Yeiner García Cadena	1.005.187.293	Operador de Perforación I	15/10/2025
Gumercindo Parra Solano	91.291.101	Oficial de Obra	15/10/2025
Alexander Prada López	13.745.736	Ayudante de Perforación II	15/10/2025
Harley Prada López	1.098.822.751	Operador de Perforación II	15/10/2025
Yoel Ardila Narváez	1.046.427.115	Operador de Perforación I	15/10/2025
Mauricio Villamizar Solano	1.005.541.892	Operador de inyección	16/10/2025
Luis Alberto Prada Rincón	5.691.822	Ayudante obra	16/10/2025
Yefferson Dyfred Gonzalez Ortega	5.823.211	Ayudante obra	4/11/2025
Andrés Francisco García Farías	6.656.491	Ayudante obra	4/11/2025
Luis Alfonso Fuentes Navarro	1.098.699.422	Ayudante de Perforación II	4/11/2025
José Alberto Ospino Baracamonte	1.050.719.060	Ayudante obra	4/11/2025
Juan Andrés Díaz Quintero	1.095.802.634	Almacenista	10/11/2025

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Para el presente periodo se presenta la primer modificatoria al proyecto, la cual no afectará el valor contractual del proyecto y su plazo establecido. Posterior a ello, se presenta el acta de cobro No. 1 por parte del contratista, para su revisión y aval pertinente por parte de la Interventoría y Supervisión del proyecto.

Tabla 8 Relación de Actas de Cobro

RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS			
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**	**ESTADO**
Acta de Inicio	15/10/2025	N/A	RADICADA
Anticipo		N/A	N/A
Acta de Cobro 01	15/10/2025-14/12/2025	$ 1.010.210.915,17	RADICADA

7 ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Respecto a las actividades correspondientes al componente de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas durante el periodo del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se presenta el respectivo informe, en el cual a su vez se anexa como soporte del personal en obra, su respectiva Seguridad Social.

Ver Anexo 4

8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se presenta el respectivo informe. A su vez, se anexa como uno de sus componentes, el informe social de obra en el que se desglosan todas las actividades afines desarrolladas desde el inicio del proyecto.

Ver Anexo 5

9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Para el presente periodo, se realiza la actividad de aseguramiento de la calidad a los materiales y/o actividades desarrolladas en obra, con el debido seguimiento y enfoque conceptual en los fundamentos del manejo gerencial de proyectos, concebidas por el PMI (Project Management Institute), para lo cual se presenta el respectivo informe.

Ver Anexo 6

10 CONCLUSIONES

- A la fecha de este informe se evidencia un porcentaje global acumulado de lo ejecutado del 11.32% contra un 11.22% correspondiente al porcentaje acumulado programado, lo cual evidencia un avance positivo en el desarrollo de las actividades preliminares y movimientos de tierras para ambos frentes de acción del proyecto.

- En el **frente de obra Brisas de Primavera** se evidencia un avance significativo en la ejecución, toda vez que las actividades de movimiento de tierras programadas para el período evaluado se desarrollaron dentro de los plazos previstos, en concordancia con la secuencia constructiva, la priorización definida y el cronograma general del proyecto, garantizando el cumplimiento de los rendimientos establecidos. A corte del presente informe se dio inicio a la intervención del área adicional a estabilizar dada el acta modificatoria presentada y avalada, zona en la cual se adelantaron actividades de desmonte, limpieza e inicio preliminar de las excavaciones sobre el talud.

- De manera complementaria, se dio inicio y apertura al **frente de obra Halcón de Granada**, mediante la ejecución de actividades preliminares tales como desmonte y limpieza del área, retiro de escombros y movimientos de tierra en el talud, incluyendo la evacuación y disposición final del material excavado en sitio debidamente autorizado. El arranque de este frente se realizó de forma ordenada, planificada y técnicamente controlada, evidenciando una ejecución óptima y eficiente en sus primeras actividades.

ING JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Representante legal
CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

LISTA DE ANEXOS DEL INFORME

ANEXO NO.1: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA-RADICADA

ANEXO NO.2: ESTADO DEL TIEMPO PARA EL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

ANEXO NO.3: BITACORA DE OBRA PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

ANEXO NO.4: PROGRAMA SG-SST E INFORME SST DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

ANEXO NO.5: INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

ANEXO NO.6: PROGRAMA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL

ANEXO NO.7: ACTAS DE REUNIÓN O COMITÈS DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO

ANEXO NO.1: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA-RADICADA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CODIGO: A-BS-FO48 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS**		

Acta No.	2	
Fecha acta	23/12/2025	
Contrato No.	210-16223-6	
Fecha de suscripción del contrato	05 de septiembre de 2025	
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (RA-OBRA-03-25)	
Contratista	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	
NIT Contratista	901.983.966-5	
Representante legal contratista	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ	
Valor	$ 9.651.664.101,92	
Plazo	DIEZ (10) MESES	
Supervisor o interventor	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA	
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	Contrato de Interventoria No.210-16227-4	
Funcionario competente para aprobar acta	DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO	
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución No. 0473 de 2020 suscrita por el Director General	
Fecha acta de inicio	15/10/2025	
Fecha estimada de terminación	14/08/2026	
Adicional en valor	(N/A)	Valor $ (N/A)
Adicional en plazo	(N/A)	_____ ( ) meses, días ,años
Fundamento jurídico del acta	Artículo 4 núm. 8 ley 80 de 1.993	

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de efectuar y aprobar el acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos del contrato antes referenciado, el funcionario delegado DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO, el supervisor o interventor CONSORCIO INTER PIEDECUESTA y el contratista CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB representado legalmente por JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ, para lo cual procedieron como se señala.

1. JUSTIFICACION

1.1 La CDMB celebro el contrato referenciado, pactando su remuneración por el sistema de precios unitarios;

1.2 El numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 dispone como deber de las entidades estatales; "adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación..., o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los

supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios"

1.3 Que la CDMB firmó el Contrato de obra Pública No. 210-16223-6 que tiene por objeto " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", el cual determino como punto el talud localizado en el barrio Brisas de Primavera 1, en el tramo comprendido entre la calle 16 (manzana D) y la calle 15B (manzana B), en donde se propuso continuar con la estabilización del talud, propuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y ejecutada en un primer momento bajo el contrato de obra No. 9677-PPAL001-695-2022.

1.4 Que El sistema propuesto por la Unidad fue una estructura de pantalla anclada en concreto, por lo cual para este sector y bajo el contrato de Obra No. 210-16223-6, la CDMB planteo continuar con el sistema de pantalla anclada en un área de estabilización de 1.110,00 m2, que comprende el mismo talud, pero en el tramo comprendido entre la calle 16 (manzana D) y la calle 15B (manzana B) del Barrio Bridas de Primavera I.

1.5 Que en la socialización del Proyecto en el punto crítico Brisas de Primavera 1, realizada el día 16/10/2025, una vez se les explicó a los asistentes el alcance del proyecto y el tipo de trabajo a realizar, en consenso, la comunidad y sus líderes manifestó su oposición a la tala de los árboles ubicados en la parte alta del talud que se va a intervenir, situación que se hizo oficial mediante el oficio con radicado de entrada CDMB No. 24849 del 20/10/2025, suscrito por la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de dicho barrio.

1.6 Que la CDMB mediante oficio de Salida CDMB No. 22060 del 13 de noviembre de 2025, le respondió a la Comunidad Indicando que se iba a analizar la solicitud, así mismo se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el Contratista CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB, la firma interventora CONSORCIO INTER PIEDECUESTA y la Subdirección de Gestión del Riesgo y seguridad territorial como Oficina Supervisora y Gestora de la CDMB para evaluar la situación expresada por la comunidad el día 24 de noviembre de 2025, en dicha reunión quedaron como compromisos: 1- Que el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB como parte de sus actividades de inicio de obra realizaría el inventario Forestal mediante el levantamiento de una ficha por individuo en donde se incluya el estado sanitario y se lo envía a la CDMB, 2- Que la CDMB realizara una evaluación del levantamiento arbóreo y hará una visita al sector con profesional idóneo. 3- que el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB en acompañamiento con la firma interventora, deberá realizar la revisión del diseño inicial y analizará una propuesta de obra de mitigación complementaria o un cambio de la estructura de estabilización que se enfoque en lo posible en la conservación de algunos individuos arbóreos, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, morfométricas, topográficas y geotécnicas de la zona.

1.7 Que por medio de profesional forestal la CDMB realizo visita al sector objeto de intervención el día 05 de diciembre de 2025, en donde se realizó un recorrido y se identificaron veinticuatro (24) individuos arbóreos en pie, establecidos sobre el talud y el área inmediata del predio, los cuales se encuentran actualmente en estado de conservación, formando parte de la cobertura vegetal existente del sector y cumpliendo una función ambiental relevante en términos de estabilidad del suelo, regulación micro climática y aporte paisajístico.

1.8 Que, a partir de la información recolectada en la visita técnica del día 05/12/2025 y de las fichas de evaluación de cada árbol realizada por el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB, en el que se incluye el estado fitosanitario de cada especie arbórea, la CDMB, emitió un informe con fecha 12/12/2025 con los siguientes argumentos técnicos:

- El arbolado presente conforma uno de los pocos núcleos verdes urbanos consolidados del sector, desempeñando un papel determinante como paso ecológico en la dinámica territorial. Este corredor natural facilita el desplazamiento, permanencia y anidación de fauna local, permitiendo la continuidad de los flujos ecológicos entre fragmentos de vegetación que aún persisten en el municipio.
- Entre la cobertura arbóreas estudiada, se encuentra un caracolí (Anacardium excelsum), la cual es una especie catalogada en veda forestal mediante resolución CDMB 196 de 23/03/2017 y cuya protección debe priorizarse. Adicionalmente este árbol funciona como nodo ecológico relevante debido a su capacidad para albergar fauna, aportar sombra de amplio rango, y servir como soporte biológico para diversas especies asociadas, convirtiéndose en un punto crítico de conectividad dentro del corredor ecológico del sector.
- Desde el componente forestal y teniendo en cuenta el grado de inclinación del terreno, los árboles presentan sistemas radiculares robustos, sanos y bien estructurados, los cuales cumplen un papel fundamental en la estabilización natural del talud. La arquitectura radicular incrementa la resistencia del suelo, mejora la cohesión y reduce procesos erosivos y riesgos de socavación o deslizamiento. La eliminación de estos árboles generaría pérdida inmediata de esta función de bioestabilización, aumentando la susceptibilidad del terreno a fenómenos de remoción en masa y comprometiendo la integridad física del entorno intervenido.
- En cuanto a los servicios ecosistémicos, la cobertura arbórea contribuye significativamente a la regulación de la temperatura local, generando una sensación térmica más fresca y confortable para los habitantes del barrio Brisas de Primavera.

1.9 Que, de acuerdo a los argumentos técnicos expuestos, la CDMB, en el informe mencionado, concluyó y/o recomendó:

- Estudiar la posibilidad de mantener en pie dicha cobertura arbóreas, en razón a su alta relevancia funcional y ambiental dentro del municipio de Piedecuesta.
- A pesar que el talud tiene una inclinación, las especies arbóreas, en función a sus sistemas radiculares robustos, presentan un papel fundamental en la estabilización del talud.
- No autorizar la intervención forestal de las especies arbóreas mencionadas en el presente documento.

1.10 Que, en cumplimiento del compromiso realizado en la reunión del 24 de noviembre de 2025, y una vez el contratista obtuvo la información primaria tomada en el sitio del talud y después de realizar las modelaciones pertinentes, se determinó que es viable realizar el proceso de estabilización del talud con un **sistema de control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV, anclado al talud a través de un sistema tipo nails (anclajes pasivos con varillas de Ø= 1-1/4") con una inclinación con respecto a la horizontal de 15° y una profundidad de L=9,00m**.

1.11 Que, el cambio del tipo de estructura de estabilización permitirá ampliar el área a intervenir en 854,00 m2, es decir se aumentó el área de 1.110,00 m2 a 1.964,00 m2 y podrá ejecutarse sin la necesidad de talar algún árbol.

1.12 Que el Contrato de Obra No. 210-16223-6, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** de acuerdo al concepto técnico, se modificará la estructura de estabilización en el barrio Brisas de

Primavera 1, se cambiará una pantalla de concreto lanzado soportada por anclajes activos por un sistema de control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV, anclado al talud a través de un sistema tipo nails, se aumentará el área de intervención de 1.110,00 m2 a 1.964,00 m2 y no se requerirá de adición en recursos ni prorroga al plazo contractual.

1.13 Que, durante el proceso del balancear el proyecto, se identificó que debían realizarse unas correcciones aritméticas por decimales en el frente de Halcón de Granada y ajuste de algunos ítems contractuales del proyecto requeridos para dicho frente.

1.14 Que, a continuación, se relaciona la variación de las cantidades obra en el frente BRISAS DE PRIMAVERA de la siguiente manera: **Mayores cantidades** ITEM 1.04 DESMONTE Y LIMPIEZA, ITEM 1.05 RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS, ITEM 1.07 PERFILADO A MANO DESCOLGADO DE TALUD (EN ROCA), ITEM 2.01.A.02 EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ITEM 2.01.A.03 EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ITEM 2.03 SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00 M, ITEM 3.08 LLENADO DE INYECCION CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES, ITEM 6.02 CANALETA (ANCHO = 1M; E= 10CM), ITEM 6.03 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y POSTE DE CONCRETO A 2,00M.
Menores cantidades ITEM 2.01.A.04 EXCAVACIÓN A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA ZAPATA, ITEM 3.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA HÚMEDA PARA ZAPATAS, ITEM 3.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA HÚMEDA DE ESPESOR 10 CM, ITEM 4.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, ITEM 4.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLES Ø=1/2" DE L=15M, ITEM 4.03 TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES, ITEM 4.04.01 MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y ABERTURA DE 0,15M X 0,15M, ITEM 4.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X 12MM CON TRES AGUJEROS, ITEM 4.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POPORA DE 3 AGUJEROS CÓNICOS PARA CUÑA DE Ø=1/2", ITEM 4.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CUÑAS DE Ø=1/2" PARA ANCLAJE, ITEM 5.01 SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES DE 0,00M A 15,00M, ITEM 5.01B SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES MAYORES A 15,00M; ITEM 5.04 EJECUCIÓN PERFORACIONES HORIZONTALES EN TALUDES CON PENDIENTE MAYORES A 1:1 (EN ROCA) CON EQUIPO DE PERFORACIÓN DESCOLGADO PARA ANCLAJES DE 0,00M A 15,00M, ITEM 6.06 SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA LÍNEAS HIDRÁULICAS DE INFILTRACIÓN INTERNA Y PROTECCIÓN DEL TRASDÓS DE LA ESTRUCTURA ESTABILIZADORA.
Ítems no previstos ITEM 7.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAILS Ø=1-1/4" DE L=9M ITEM 7.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA CONTROL DE EROSIÓN SUPERFICIAL MEDIANTE MANTO DE FIBRA SINTÉTICA NO DEGRADABLE CON ESTABILIZACIÓN UV, ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X 12MM CON UN AGUJERO.

1.15 Que, a continuación, se relaciona la variación de las cantidades obra en el frente HALCÓN DE GRANADA de la siguiente manera: **Mayores cantidades** ITEM 2.03 SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00M.
Menores cantidades ITEM 1.05 RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS, ITEM 2.01.A.03 EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ITEM 2.01.A.04 EXCAVACIÓN A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA ZAPATA,

ITEM 3.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA HÚMEDA PARA ZAPATAS, ITEM 3.08 LLENADO DE INYECCION CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES, ITEM 4.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2.

Ítems no previstos, ITEM 7.01 SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES DE 0,00M A 15,00M, ITEM 7.01B SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES MAYORES A 15,00M

1.16 Que funcionarios adscritos a la CDMB, junto con el representante legal del Contratista de Obra y el Representante Legal de la interventoría, realizaron la revisión de las condiciones en campo.

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Una vez verificada la visita técnica realizada por los profesionales adscritos a la CDMB el día 5 de diciembre de 2025, el concepto técnico emitido por la Entidad con fecha 12 de diciembre de 2025, y el documento técnico presentado por el contratista, la interventoría considera técnicamente viable el cambio del tipo de obra y el ajuste de las cantidades de obra propuestas, toda vez que la alternativa planteada garantiza la estabilidad del talud, cumple con los factores de seguridad exigidos y se encuentra acorde con la normativa técnica aplicable, conforme a la revisión detallada de la ingeniería del proyecto, asi mismo se enmarca dentro del objeto del contrato el cual es la " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

Así mismo, la alternativa de estabilización propuesta resulta pertinente para las condiciones reales del sector, considerando que el talud cuenta con aislamiento tanto en su corona como en su pie mediante una vía perimetral, lo cual elimina la incidencia directa de edificaciones sobre el mismo. En este contexto, la implementación de un sistema de control de erosión superficial con anclajes pasivos permite una solución técnicamente adecuada, ambientalmente sostenible y proporcional al nivel de riesgo identificado, ampliando además el área de intervención sin generar afectaciones adicionales.

Finalmente, la interventoria evidencia que la solución adoptada acoge de manera integral las recomendaciones emitidas por la CDMB, al no contemplar la tala de los individuos arbóreos existentes, los cuales, dadas las condiciones geomorfológicas del terreno y el adecuado desarrollo de sus sistemas radiculares, contribuyen a la estabilización natural del talud. Con ello, se da alcance a la solicitud elevada por la comunidad mediante radicado CDMB No. 24849 del 20 de octubre de 2025, concluyéndose que la modificación propuesta es técnicamente procedente y compatible con los criterios de gestión del riesgo y sostenibilidad ambiental definidos por la Entidad.

3. APROBACION

El arquitecto CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA con fundamento en el concepto del Interventor aprueba el acta de mayores y menores cantidades de obra y de ítems no previstos, correspondiente al contrato de obra No. 210-16223-6.

En consecuencia, **ACUERDAN**

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO48 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS**		

1. APROBAR el ajuste a las mayores y menores cantidades de obra de mutuo acuerdo el contrato de obra No. 210-16223-6 celebrado entre las partes, cuyo objeto se señaló en la parte inicial, que a continuación se describen:

2. La presente acta no implica modificación al valor del contrato y sus adicionales.

3. La Subdirección SURYT - SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL, remitirá la presente acta con sus anexos a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

4. Modificar las siguientes actividades en su cantidad. **FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA: Mayores cantidades** ITEM 1.04 DESMONTE Y LIMPIEZA, ITEM 1.05 RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS, ITEM 1.06 PERFILADO A MANO DESCOLGADO DE TALUD (EN ROCA), ITEM 2.01.A.02 EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ITEM 2.01.A.03 EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ITEM 2.03 SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00 M, ITEM 3.08 LLENADO DE INYECCION CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES, ITEM 6.02 CANALETA (ANCHO = 1M; E= 10CM), ITEM 6.03 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y POSTE DE CONCRETO A 2,00M. **Menores cantidades** ITEM 2.01.A.04 EXCAVACIÓN A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA ZAPATA, ITEM 3.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA HÚMEDA PARA ZAPATAS, ITEM 3.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA HÚMEDA DE ESPESOR 10 CM, ITEM 4.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, ITEM 4.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLES Ø=1/2" DE L=15M, ITEM 4.03 TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES, ITEM 4.04.01 MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y ABERTURA DE 0,15M X 0,15M, ITEM 4.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X 12MM CON TRES AGUJEROS, ITEM 4.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POPORA DE 3 AGUJEROS CÓNICOS PARA CUÑA DE Ø=1/2", ITEM 4.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CUÑAS DE Ø=1/2" PARA ANCLAJE, ITEM 5.01 SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES DE 0,00M A 15,00M, ITEM 5.01B SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES MAYORES A 15,00M; ITEM 5.04 EJECUCIÓN PERFORACIONES HORIZONTALES EN TALUDES CON PENDIENTE MAYORES A 1:1 (EN ROCA) CON EQUIPO DE PERFORACIÓN DESCOLGADO PARA ANCLAJES DE 0,00M A 15,00M, ITEM 6.06 SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA LÍNEAS HIDRÁULICAS DE INFILTRACIÓN INTERNA Y PROTECCIÓN DEL TRASDÓS DE LA ESTRUCTURA ESTABILIZADORA. **FRENTE HALCÓN DE GRANADA, Mayores cantidades:** ITEM 2.03 SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00M.Menores cantidades ITEM 1.05 RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS, ITEM 2.01.A.03 EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ITEM 2.01.A.04 EXCAVACIÓN A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA ZAPATA, ITEM 3.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA HÚMEDA PARA ZAPATAS, ITEM 3.08 LLENADO DE INYECCION CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES, ITEM 4.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. Ítems no previstos, ITEM 7.01 SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA DRENES DE 0,00M A 15,00M, ITEM 7.01B SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELES FREÁTICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2") PARA

DRENES MAYORES A 15,00M.

5. Pactar los siguientes ítems no previstos ITEM 7.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAILS Ø=1-1/4" DE L=9M ITEM 7.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA CONTROL DE EROSIÓN SUPERFICIAL MEDIANTE MANTO DE FIBRA SINTÉTICA NO DEGRADABLE CON ESTABILIZACIÓN UV, ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X 12MM CON UN AGUJERO.

6. Aprobar el cambio de la estructura de estabilización del talud del barrio Brisas de Primavera 1, de una pantalla de concreto lanzado soportada con anclajes activos a un sistema de control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV, anclado al talud a través de un sistema tipo nails.

7. Que, la presente modificación no generará adición en recursos ni requerirá ampliación en el plazo

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Subdirector o Jefe de Oficina
C.C.No.91496579

CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
Supervisor o interventor
Nit. No. 901982939

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
Contratista o representante legal
Nit. No. 901983966

ANEXO NO.2: ESTADO DEL TIEMPO PARA EL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CDMB

FECHA: 2 (Día) / 1 (Mes) / 2026 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: 210.16223.6

CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PERIODO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	19	24	24	24	24	22	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	729
Lluvias moderadas	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Lluvias intensas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ANEXO NO.3: BITACORA DE OBRA PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

BITÁCORA DE OBRA [TOMO 1]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Representante Legal - Contratista
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Representante Legal - Interventoría
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Director de Obra - Contratista
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
Director de Obra - Interventoría
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA
Ingeniero Residente - Contratista
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
Ingeniero Residente - Interventoría
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

Lunes, 1 de diciembre 2025
Estado del Clima: Lluvias intensas por la mañana
Se continúa con el sobreacarreo y retiro final del material generado por las excavaciones para su traslado respectivo al sitio de disposición autorizado. Se realiza acercamiento con los representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Halcón de Granada para organizar la fecha de socialización del inicio de obras en el segundo frente de obra.
Personal: Ing. Residente de obra e interventoría Siso, oficial, ayudante de obra y perforación
Equipo: Retroexcavadora 225, Minicargador y volquetas

Martes, 2 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día Soleado.
• Frente Brisas: Se realiza limpieza general en toda la zona de influencia del talud, removiendo todo el material suelto residual encontrado en el pie del talud posterior al retiro con sobreacarreos. • Frente Halcón de Granada: Se ejecutan actividades de topografía, e identificación de la zona a estabilizar, dado el inicio en la ejecución de este segundo frente de obra, enmarcado en el proyecto.
Personal: Ing residente de obra e interventoría, siso, oficial, Almacenista, ayudantes de obra y perforacios, Topógrafo.
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargadora y volquetas. Estación total y nivel.

Miércoles, 03 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día Soleado.
• Frente de Brisas: Se inicia la marcación de los anclajes sobre el talud con apoyo de los equipos topográficos. • Frente Halcón: Se inicia las actividades de desmonte y limpieza sobre el talud y se realiza acordonamiento del área del trabajo con lona verde. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, Almacenista, ayudantes de obra, de perforación y topógrafo. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, estación total y nivel.

Jueves 04 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día Soleado
• Frente Brisas: Se marca línea perimetral sobre la corona del talud, para identificación de la zona por donde pasan tuberías locales a determinada profundidad de la vía principal. Esta zona no podrá ser tocada con anclajes. Frente Halcón Se culmina con el desmonte sobre el talud y se inicia con el retiro de basuras y escombros previamente acumulados en la zona inferior del talud. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, Almacenista, ayudantes de obra, de perforación y topógrafo Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas y Estación topográfica.

· Viernes, 05 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día parcialmente nublado.
· Frente Brisas: Se recibe visita por parte de profesionales adscritos a la CDMB y forestal, los cuales realizaron una inspección de cada especie arbórea encontrada sobre el talud a estabilizar, dados los compromisos adquiridos en el comité de obra del 24 de noviembre 2025, en atención al requerimiento de la comunidad del sector. Frente Halcón. Se continúa con el retiro de basuras y escombros sobre el talud. Se inician las excavaciones en material granular y rocoso, y su posterior retiro con sobreacarreos al botadero autorizado. En horas de la noche se realiza la socialización de la obra con la comunidad del sector, dado la previa confirmación de la junta de Acción Comunal para realizarla el viernes en la noche. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, Almacenista, ayudantes de obra y perforación, topógrafo. Equipos: Retroexcavadora 225, mini-cargador, volquetas y estación topográfica

Sábado, 06 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día Soleado, con lluvia al final de la tarde
· Frente Brisas: Se realiza jornada de orden y aseo en áreas comunes y campamento.
· Frente Halcón: Se continua con la excavaciones en material granular y rocoso y su retiro en volqueta al sitio de disposición autorizado. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, Oficial, Almacenista, ayudantes de obra y perforación, topógrafo. Equipos:

Retroexcavadora, minicargador, volquetas, nivel y estación topográfica.

Martes, 09 de diciembre 2025.
Estado de Clima: Día Soleado.
- Frente Brisas: Se remueve material suelto en la zona inferior del talud, dejando la vía de accesos vehicular colindante libre de residuos.
- Frente Halcón: Se continúa realizando excavaciones sobre el talud con maquinaria amarilla y realizando el respectivo sobreacarreo y disposición final. Personal: Ing. residente de obra y de interventoría, SISO, oficial, Almacenista, ayudantes de obra y perforación, topógrafo. Equipos: Retroexcavadora, minicargador, volquetas, nivel y Estación topográfica.

Miércoles, 10 de diciembre 2025.
Estado de Clima: Día Soleado
- Frente Brisas: Se recibe visita por parte de profesionales de la ANLA para hacer el respectivo seguimiento al avance de obra y recorrido en campo para validación de las actividades ejecutadas contractualmente.
- Frente Halcón: Se prosigue con las excavaciones en material granular y rocoso y su posterior retiro del material residual generado. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación, topógrafo.

Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, nivel y estación topográfica.

Jueves, 11 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día Soleado.
• Se finalizan las excavaciones en material granural y rocoso en el talud del barrio Halcón de granada, se continúa realizando el retiro en volqueta del material residual excavado. Se inicia con el perfilado a mano en descolgado de talud.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación, topógrafo. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetes, nivel y estación total.

Viernes, 12 de diciembre 2025.
Estado del Clima: Día Soleado.
• Se continúa con el perfilado a mano en descolgado de talud, con el sobre-acarreo y retiro del material producto de excavaciones. Se realiza control topográfico sobre la superficie del talud. del frente Halcón de granada.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, Almacenista, ayudantes de Obra, y de perforación, topógrafo. Equipos: Retroexcavadora, minicargador, volquetas y estación total.

• Sábado, 13 de diciembre
Estación climática: Día Soleado
Frente Brisas: Se realizan jornadas de orden y

aseo a nivel general del frente. Frente Halcón: Se culminado con el perfilado manual en descolgado, se acopio en la zona baja del talud todo el material perfilado para su posterior retiro la próxima semana.
Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación, topógrafo. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, nivel y estación total.

Lunes, 15 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
Se realizan acarreos en volqueta del material acopiado en el frente de obra Halcón de Granada, efectuando el transporte desde las zonas de acopio hasta los sitios establecidos para su disposición final. Personal: Ing residente de obra e interventoria, Siso, Oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volqueta, nivel y estación total.

Martes, 16 de diciembre 2025
Estado del clima: Día soleado
Frente Brisas: Se ejecutan labores de limpieza de la vía en la zona inferior, incluyendo el raspe y retiro de material con el fin de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad en el área de intervención.
Frente HALCON: Se realizan sobreacarreos en volqueta del material acopiado en la pata del talud, trasladándolo hacia los sitios definidos para su disposición final.
Personal Ing. residente de obra e interventoria, Siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación.

Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volqueta, nivel y estación total.

Miércoles, 17 de diciembre 2025
Estado del Clima: Lluvias intensas en la madrugada, Día soleado
•Frente Brisas. Se continúan las labores de limpieza de la vía en la zona inferior, realizando el raseo y retiro de material en volqueta, trasladándolo hacia los sitios definidos para su disposición final.
•Frente Halcon: Se continúan los sobreacarreos del material acopiado en la pata del talud, trasladándolo hacia los puntos establecidos para su disposición final.
Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación.
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, nivel y estación total.

Jueves, 18 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
Se da inicio a las actividades de corte de grava para anclajes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para el sistema de anclaje del proyecto.
Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación.
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Viernes, 19 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado

- Frente Brisas: Se realiza jornada de aseo y limpieza preventiva de los equipos de trabajo en altura, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
- Frente Halcon: Se ejecuta el corte de guaya tipo toron de 1/2" destinada para la conformación de anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total

Sábado, 20 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
- Frente Brisas: Se realiza jornada de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de limpieza, organización y seguridad.
- Frente Halcon: Se ejecuta el corte de guaya tipo toron destinada para el armado de anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Lunes, 22 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
- Frente Brisas: Se realiza el acopio de escombros provenientes de la ladera colindante al talud previamente excavado.
- Frente Halcon: Se realiza el corte de neumáticos destinados al encauchetado de los anclajes Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación

Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Martes, 23 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día Soleado
- Frente Brisas: Se realiza el retiro de basuras y escombros en la zona adicional del talud, en cumplimiento del aval otorgado al modificatorio de cantidades presentado a la entidad
- Frente Halcon: Se realiza el acopio de las guayas tipo toron previamente cortadas en el sitio de armado. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, nivel y estación total

Miércoles, 24 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
- Frente Brisas: Se inicia el desmonte y la limpieza del área adicional a estabilizar en el talud, como consecuencia del cambio en el sistema de estabilización, pasando de una pantalla en concreto a un sistema de bioingeniería el cual permite una mayor área de cobertura y mejora las condiciones de estabilización del talud, sin afectar el plazo ni el valor contractual del proyecto. Frente Halcon: Se inicia el proceso de encauchetado de la tubería PVC de 1" realizando esta actividad en los primeros 8 metros lineales del anclaje, correspondientes a la zona de bulbo. personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Lunes, 29 de diciembre 2025
Estado del clima: Día soleado
- Frente Brisas: Se realiza el desmonte y la limpieza de la zona adicional del talud.
- Frente Halcon: Se realiza el encauchetado de la tubería para la zona de bulbo de los anclajes a instalar en el talud, correspondientes a una profundidad de 20 metros lineales.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Martes, 30 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
- Frente Brisas: Se realiza el desmonte, así como el retiro de basuras y escombros de la zona adicional a estabilizar.
- Frente Halcon: Se arma la estructura de madera destinada al punto de armado de los anclajes.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, nivel y estación total.

Miércoles, 31 de diciembre 2025
Estado del Clima: Día soleado
- Frente Brisas: Se realiza aseo y limpieza general del frente de obra. Frente Halcon: Se realiza el lavado

de la maquinaria pesada, con el fin de mantenerla en adecuadas condiciones de operación.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, sisa, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Jose Eduardo C.

ANEXO NO.4: PROGRAMA SG-SST E INFORME SST DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME SST N° 03

CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

CONSORCIO MITIGACIÓN
PIEDECUESTA CDMB

ELABORADO POR:
VICTOR JULIO GAMBOA
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 8
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 9
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 10
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 10
7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 11
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 11
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 12
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 12
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de Diciembre de 2025;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos especificos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
NIT	901.983.966-5
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
CONTRATO	210.16223.6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
DIRECCIÓN	Centro Industrial y Logístico San Jorge, bodega 16
TELÉFONO	6076159848
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No cotiza
Yeiner Garcia Cadena	1005187293	Operador de perforación I	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Gumersindo Parra Solano	91291101	Oficial	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Alexander Prada López	13745736	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Harley Prada López	1098822751	Operador de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Yoel Ardila Narváez	1046427115	Operador de perforación I	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
Mauricio Villamizar Solano	1005541892	Operador de inyección	16/10/2025	Axa Colpatria	Salud Mia	Porvenir	Comfenalco

Luis Alberto Prada Rincón	5691822	Ayudante de obra	16/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Yefferson Dyfred González Ortega	5.823.211	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Andrés Francisco García Farías	6.656.491	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Luis Alfonso Fuentes Navarro	1.098.699.422	Ayudante de perforación II	4/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
José Alberto Ospino Baracamonte	1.050.719.060	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Juan Andrés Diaz Quintero	1.095.802.634	Almacenista	11/11/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					13		
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
William Eduardo Cortés Peña	91.278.912	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Jhon Alexander González Rivera	1.098.760.722	Residente de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Porvenir	Comfenalco
Lissette Ximena Niño	63.395.720	Asesor Ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Ninguna
Victor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional SST	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80.187.378	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco

Edgar Iván Palomino Holguín	1.098.636.620	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					6		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**19**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

Durante el periodo del informe, no se presentaron ingresos de personal.

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO
NA	NA	NA	NA

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, no se presentaron novedades de retiro de personal

NOVEDADES DE RETIRO DE PERSONAL		
PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE RETIRO
NA	NA	NA

4.4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo se relaciona el equipo mínimo requerido:

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENTE DE SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
WFD114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026	Eduardo Santos Useche
TTW843	4308007289163000	31/10/2026	177552748	30/11/2025	Sergio Andrés Porras Villamizar

Ver anexo N° 2. Documentos personal rotativo

Tabla No. 4. Relación Maquinaria

TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
Minicargador	Case	2018	JAFSR175EJM446321	126894	Yeferson Acevedo Suarez
Excavadora	DOSSAN	2019	DHKCEBAACCK0022219	DB58TIS936644EN	Miguel Ángel Escandón

Ver anexo N° 3. Documentos maquinaria

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

5.1 COMITÉ PARIOTARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, el día 30 de diciembre de 2025 se realizó la reunión del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se dan a conocer las actividades realizadas en el periodo, dando cumpliendo con la

realización de inspecciones en el área de trabajo, garantizando que los riesgos de accidentes y enfermedades laborales sean reducidos al máximo, se adjunta acta de reunión.

Ver anexo N° 4. Acta de reunión comité Copasst

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El comité de convivencia laboral se realizará de manera mensual, de acuerdo a la resolución 3461 del 2025, el dia 29 de diciembre del 2025, se realizó la reunión del comité de convivencia laboral.

Ver anexo N° 5. Acta de reunión comité Convivencia laboral

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección personal, se realiza la inspección de los elementos de protección personal, no hubo reposición de los mismos ya que ser encuentran en optimas condiciones.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	2/12/2025	Actores Viales y señales de transito
2	12/12/2025	Reporte de incidentes y accidentes laborales
3	15/12/2025	Uso Adecuado de elementos de protección personal
4	22/12/2025	Funciones de los integrantes del copasst

Ver anexo No 6. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área de trabajo, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	2/12/2025
	3/12/2025
Inspección de botiquín y camilla	9/12/2025
	10/12/2025
Inspección de extintores	9/12/2025

	10/12/2025
Inspección Preoperacional de Herramienta Menor	1/12/2025
	9/12/2025
	15/12/2025
	22/12/2025
	29/12/2025

Ver anexo No 7. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, electrocución, heridas	- Señalización de riesgos y peligros; encerramiento - Delimitación áreas de trabajo. - Análisis de trabajo seguro para las actividades de alto riesgo - Permiso de trabajo para actividades en alturas	Del 1 al 31 de diciembre de 2025

Ver anexo No 8 Registro Fotográfico.

Ver anexo No 9 Medidas Preventivas.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo.

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		AI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	II
1	ago-25	0	0	0	33	0	0	34	0	1456	ago-25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sep-25	0	0	0	29	0	0	34	0	3648	sep-25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	oct-25	0	0	0	29	0	0	29	0	1456	oct-25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	0	0	33,0	0,0	0,0	34,0	0,0	17472,0	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Imagen 1. Distribución del indice de frecuencia



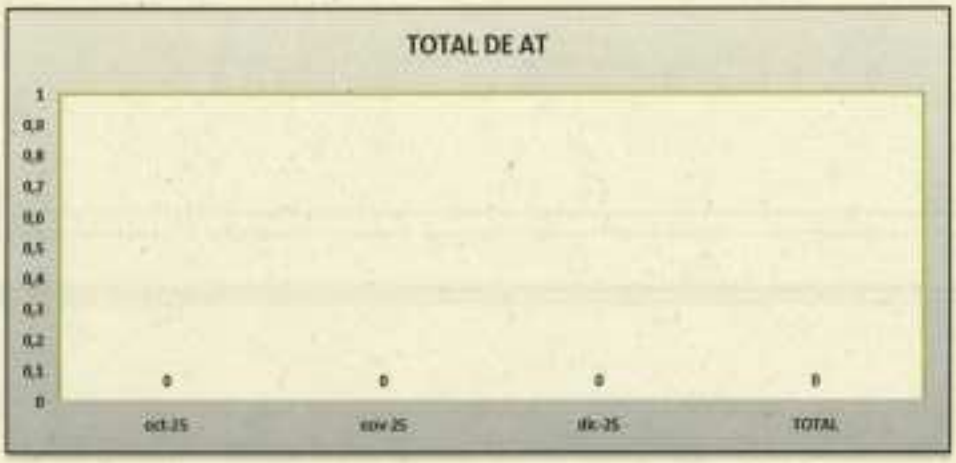
Imagen 2. Tasa de accidentalidad



Imagen 3. Número de trabajadores mensual



Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo


TOTAL DE AT
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0
0
0
oct-25
nov-25
dic-25
TOTAL

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-8
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-30, 09:45:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
NIT	NI 901983966
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078227068
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046393467
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 5.764.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230501	PORVENIR	6	$ 2.512.300	$ 0
N800229739	230501	PROTECCION	2	$ 705.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 282.900	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 56.400	$ 0
N800251440	EPS008	SANITAS EPS	2	$ 123.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 188.000	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 71.900	$ 0
N800156264	EPS041	CMICRECALFOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 178.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 130.000	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	12	$ 1.282.700	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	12	$ 750.300	$ 0
		SubTotales:		$ 5.764.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 5.764.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440534 - Cali: 602 5040577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 01:38:17 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1078227068

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 30/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB		
Documento	NI901983966	**Dirección**	KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076159648
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	12	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minedu	Total
CC 1005367295	YEIMIS GARCIA CARENA	01	00																																						
CC 1005367295	YEIMIS GARCIA CARENA	01	00																																						
CC 1005391680	MAURICIO YELANDIA SOLANO	01	00																																						
CC 1005391680	MAURICIO YELANDIA SOLANO	01	00																																						
CC 1006427710	YISEL ARDILA MARIANEZ	01	00																																						
CC 1006427710	YISEL ARDILA MARIANEZ	01	00																																						
CC 1007718681	JOSE ALBERTO ESPINO BARACHICHOTE	01	00																																						
CC 1007718681	JOSE ALBERTO ESPINO BARACHICHOTE	01	00																																						
CC 1008363204	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	01	00																																						
CC 1008363204	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	01	00																																						
CC 1008384402	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	01	00																																						
CC 1008384402	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	01	00																																						
CC 1098823731	HARLEY PRADA LOPEZ	01	00																																						
CC 1098823731	HARLEY PRADA LOPEZ	01	00																																						
CC 1216135704	ALEXANDER PRADA LOPEZ	01	00																																						
CC 1216135704	ALEXANDER PRADA LOPEZ	01	00																																						
CC 1991800	LUIS ALBERTO PRADA RINCON	01	00																																						
CC 1991800	LUIS ALBERTO PRADA RINCON	01	00																																						
CC 91241191	GUARDIANDO PARRA ROJAS	01	00																																						

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146889 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3452582 - Barranquilla: 605 3619850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 30/12/2025

Empresa Nit901983966
CONSORCIO MITIGACION
PIEDECUESTA CDMB

Planilla Nro: 1078227098

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	Total
CC 91291161	GUERRERO PARRA EDILMO	01	00															1		X	1	1	1	[illegible]	$ 50.844	$ 6.100	[illegible]	$ 50.844	$ 2.140	0,500	$ 50.844	$ 0	[illegible]	$ 50.844	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.340
PT 5855311	TORRADO OVIEDO VERGARA ORTEGA	01	00																		X	X	X	[illegible]	$ 1.376.200	$ 330.288	[illegible]	$ 1.376.200	$ 55.100	4,350	$ 1.376.200	$ 59.861	[illegible]	$ 1.376.200	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.289
PT 5855311	TORRADO OVIEDO VERGARA ORTEGA	03	00															1			1	1	1	[illegible]	$ 47.400	$ 7.900	[illegible]	$ 47.400	$ 1.900	0,500	$ 47.400	$ 0	[illegible]	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
PT 5855641	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	01	00																		X	X	X	[illegible]	$ 1.376.200	$ 330.288	[illegible]	$ 1.376.200	$ 55.100	4,350	$ 1.376.200	$ 59.861	[illegible]	$ 1.376.200	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.289
PT 5855641	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	03	00															1			1	1	1	[illegible]	$ 47.400	$ 7.900	[illegible]	$ 47.400	$ 1.900	0,500	$ 47.400	$ 0	[illegible]	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Subsidios Pagos EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.747.000	$ 18.747.000	$ 18.747.000	$ 18.740.813	$ 3.000.609	$ 750.800	$ 1.262.700	$ 750.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.764.200	$ 0	$ 5.764.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-30, 09:46:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CONS
NIT	NI 901983966
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078227094
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046398536
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 99.100
Estado de la Transacción	Aprobado
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a/o Mora	Total Intereses Mora
8600002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 99.100	$ 0
			SubTotales:	$ 99.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 99.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446834 - Cali: 602 5542577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 5439000 - Cartagena: 605 6545444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 01:38:15 PM **Tipo Planilla:** Y PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla:** 1078227094

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 30/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB		
Documento	NI901963966	**Dirección**	KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mín Educación	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	56	00																			SIN AFP	$ 0	$ 0	SIN EPS	$ 0	$ 0	0,522	$ 1.400.000	$ 99.100	SIN CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 99.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618550 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de GuiAporte
Fecha	2025-12-30, 10:11:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 13870690
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078029261
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046486100
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 13.331.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a/n Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 6.405.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 4.448.500	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 2.476.900	$ 0
			SubTotales:	$ 13.331.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 13.331.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4449634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140889 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818888 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 01:44:08 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1078029261

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 30/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC13870690	**Dirección**	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Nombres y Apellidos	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET A	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ING	VSP	Días APor	Días APen	Días ACot	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	SAAP	Aporte Minsalud	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	57	00															0	30	30	30	$ 30.087.000	$ 4.448.000	EPS020 EPS SANITAS	$ 30.087.000	$ 4.448.000	0.063	1 $ 30.087.000	$ 1.475.300	CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.231.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes SSAP	Aportes Min Educación	Descansillados, Licencias, Subsidios Fondo EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.087.000	$ 30.087.000	$ 30.087.000	$ 0	$ 4.405.000	$ 4.448.000	$ 1.475.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.331.300	$ 0	$ 13.231.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148689 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6545444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618600 - Resto del País: 018000 471 471 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-11, 10:23:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 63395720
Código Sucursal (Nombre)	[ ]
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077926511
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1999221526
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 649.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 336.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 262.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 51.100	$ 0
			SubTotales:	$ 649.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 649.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 08:40:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1077926511

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 11/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
Documento	CC63395720	**Dirección**	CR 26 #36 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	Días COT	Días PENS	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63395720	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL	54	00																X	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.097.211	$ 335.700	SURA EPS (Activa)	$ 2.097.211	$ 293.200	2.436	$ 2.097.211	$ 51.100	CAJA DE COMPENSACION CAJAMAG	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.097.211	$ 2.097.211	$ 2.097.211	$ 0	$ 335.700	$ 293.200	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 0	$ 680.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91278512
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	Tipo: CARRERA Nº: 7-48 APTO: 101	TELÉFONO:	3186591
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	8010
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / EMPRESA/CEN:	01 - SUCURSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7086630848	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SYPOS:	MES duración AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES duración AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	202610139

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25901	PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES										$ 384.000	$ 0	$ 384.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ACREE	COTIZACIÓN	VALOR ACREE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	Cia SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES													$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	PENSIONADO
1	CC 91278512	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	DEPEND		$ 1.400.000				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN								SALUD						ARP				PARAFISCALES						
ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	SEGUNDA TASA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ACREE	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	ESCUELA
25901-PORVENIR	$ 384.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS018-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	$ 384.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 684.000

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-31, 09:48:43 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076285838
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2049520868
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 51.785.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a/o Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	28	$ 9.745.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 6.182.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 6.383.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.879.900	$ 0
N800250355	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 953.800	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	17	$ 1.734.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 980.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 467.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	11	$ 1.017.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cosalud ADRES ESSC24	2	$ 102.700	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 394.700	$ 0
N800156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA.NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 184.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Cosalud ADRES EPS 042	1	$ 190.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	13	$ 1.707.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	62	$ 9.894.600	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	62	$ 7.990.900	$ 0

	SubTotales:	$ 51.785.200 $ 0
	Total a Pagar:	$ 51.785.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146069 - Bucaramanga: 607 6439300 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 871 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-02, 07:49:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1076285838

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 31/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	62	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días SAL	Días ARP	Días CCF	Días SLN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Exon	Aporte Minsalud	Total
CC 1005139247	MARIA CAMILA VARGAS ESPARZA	01	00	X	X														30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 1.772.333	$ 283.800	[illegible] EPS SURA	$ 1.772.333	$ 71.000	0,032	$ 1.772.333	$ 8.000	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.940.667	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.100
CC 1005139247	MARIA CAMILA VARGAS ESPARZA	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] FONDINAR	$ 83.333	$ 15.200	[illegible] EPS SURA	$ 83.333	$ 3.000	0,000	$ 83.333	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 83.333	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1005139679	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] FONDINAR	$ 73.000	$ 11.400	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 73.000	$ 2.900	0,000	$ 73.000	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 73.000	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 1005139679	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO	01	00	X															30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 3.058.000	$ 494.100	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 3.058.000	$ 122.000	0,040	$ 3.058.000	$ 184.000	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 3.484.000	$ 139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 940.000
CC 1007439872	JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] FONDINAR	$ 53.300	$ 8.600	[illegible] SALUD COOSALUD	$ 53.300	$ 2.100	0,000	$ 53.300	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 53.300	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800
CC 1007439872	JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS	01	00	X															30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 1.065.978	$ 172.000	[illegible] SALUD COOSALUD	$ 1.065.978	$ 42.000	0,040	$ 1.065.978	$ 70.000	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.065.978	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.000
CC 1023479874	JESUS ALBERTO MEDRANO LAINEZ	01	00	X							X								30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 1.709.178	$ 275.800	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 1.709.178	$ 68.400	0,040	$ 1.709.178	$ 112.800	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.039.041	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.100
CC 1023479874	JESUS ALBERTO MEDRANO LAINEZ	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] FONDINAR	$ 56.933	$ 10.200	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 56.933	$ 2.300	0,000	$ 56.933	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 67.333	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200
CC 1065552231	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00	X							X								30	30	30	30		[illegible] PROTECCION	$ 2.436.800	$ 389.900	[illegible] EPS SURA	$ 2.436.800	$ 97.500	0,040	$ 2.436.800	$ 160.700	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.910.966	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.800
CC 1065552231	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] PROTECCION	$ 85.700	$ 15.800	[illegible] EPS SURA	$ 85.700	$ 3.400	0,000	$ 85.700	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 85.700	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.700
CC 1065562241	ADRIAN JOSE SOLANO PERAZA	01	00	X															30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 1.852.230	$ 315.400	[illegible] EPS SANITAS	$ 1.852.230	$ 74.100	0,040	$ 1.852.230	$ 122.300	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.345.667	$ 92.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.300
CC 1065562241	ADRIAN JOSE SOLANO PERAZA	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] FONDINAR	$ 67.267	$ 11.500	[illegible] EPS SANITAS	$ 67.267	$ 2.700	0,000	$ 67.267	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 67.333	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200
CC 1065564640	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00	X															30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 1.807.440	$ 308.000	[illegible] EPS SURA	$ 1.807.440	$ 72.300	0,040	$ 1.807.440	$ 127.900	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.139.440	$ 85.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.600
CC 1065564640	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] FONDINAR	$ 83.000	$ 15.200	[illegible] EPS SURA	$ 83.000	$ 3.300	0,000	$ 83.000	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 83.000	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.400
CC 1065947139	WILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00	X							X								30	30	30	30		[illegible] PROTECCION	$ 2.316.730	$ 371.000	[illegible] SALUD MIA EPS[illegible]	$ 2.316.730	$ 92.600	0,040	$ 2.316.730	$ 161.400	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.666.594	$ 123.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.000
CC 1065947139	WILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00									L							0	1	1	1	1	[illegible] PROTECCION	$ 105.600	$ 20.000	[illegible] SALUD MIA EPS[illegible]	$ 105.600	$ 4.100	0,000	$ 105.600	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 86.800	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
CC 1065947139	WILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00									X							0	2	2	2	2	[illegible] PROTECCION	$ 251.647	$ 45.000	[illegible] SALUD MIA EPS[illegible]	$ 251.647	$ 10.100	0,000	$ 251.647	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 286.700	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.200
CC 1065947139	WILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00									X							0	7	7	7	7	[illegible] PROTECCION	$ 660.700	$ 121.000	[illegible] SALUD MIA EPS[illegible]	$ 660.700	$ 26.400	0,000	$ 660.700	$ 0	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 681.474	$ 27.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.600
CC 1065736119	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00	X							X								30	30	30	30		[illegible] FONDINAR	$ 2.737.333	$ 433.800	[illegible] EPS[illegible]	$ 2.737.333	$ 109.400	0,040	$ 2.737.333	$ 169.800	[illegible] COMFENALCO SANTANDER	$ 3.153.974	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 992.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146699 - Bucaramanga: 607 0438999 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3492583 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025

Empresa NI900849507
MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1078285838

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días TPE	Días IRP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minedu	Total
CC 1067961719	OSCAR JULIAN PALOMINO JUANITO	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 4.133.731	$ 19.900	[illegible]	$ 133.797	$ 5.000	0.000	$ 133.797	$ 0	[illegible]	$ 66.199	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000
CC 1042788981	SAMUEL ANDRES ORDOÑEZ ARCILA	01	00	X																	0	30	30	[illegible]	$ 3.150.000	$ 37.800	[illegible]	$ 1.150.000	$ 69.000	0.960	$ 1.150.000	$ 10.350	[illegible]	$ 1.150.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000
CC 1042788981	SAMUEL ANDRES ORDOÑEZ ARCILA	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 83.000	$ 4.900	[illegible]	$ 83.000	$ 2.400	0.000	$ 83.000	$ 0	[illegible]	$ 83.000	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000
CC 1042803270	SAMUEL ANDRES PUENTES VILLANUEVA	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.150.000	$ 37.800	[illegible]	$ 3.150.000	$ 189.000	0.960	$ 3.150.000	$ 28.350	[illegible]	$ 3.071.000	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.000
CC 1042803270	SAMUEL ANDRES PUENTES VILLANUEVA	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 116.900	$ 15.700	[illegible]	$ 116.900	$ 4.700	0.000	$ 116.900	$ 0	[illegible]	$ 73.000	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.500
CC 1004146822	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 1.944.744	$ 259.100	[illegible]	$ 1.944.744	$ 113.000	0.960	$ 1.944.744	$ 16.200	[illegible]	$ 1.797.279	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.300
CC 1004146822	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 41.775	$ 4.900	[illegible]	$ 41.775	$ 2.400	0.000	$ 41.775	$ 0	[illegible]	$ 41.775	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1065553586	JOSHUA FABIAN LOPEZ ANGELLA	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.233.046	$ 331.900	[illegible]	$ 3.233.046	$ 161.000	0.960	$ 3.233.046	$ 25.850	[illegible]	$ 4.211.229	$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.059.700
CC 1065553586	JOSHUA FABIAN LOPEZ ANGELLA	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 113.029	$ 16.200	[illegible]	$ 113.029	$ 4.600	0.000	$ 113.029	$ 0	[illegible]	$ 66.402	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700
CC 1004268744	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 66.702	$ 10.900	[illegible]	$ 66.702	$ 3.000	0.000	$ 66.702	$ 0	[illegible]	$ 66.193	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.000
CC 1004268134	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 2.961.200	$ 413.900	[illegible]	$ 2.961.200	$ 118.000	0.960	$ 2.961.200	$ 236.900	[illegible]	$ 3.262.999	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.700
CC 1004674839	JUDITH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 67.900	$ 1.900	[illegible]	$ 67.900	$ 1.900	0.000	$ 67.900	$ 0	[illegible]	$ 67.900	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600
CC 1004674839	JUDITH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 1.179.000	$ 165.100	[illegible]	$ 1.179.000	$ 59.000	0.960	$ 1.179.000	$ 9.400	[illegible]	$ 1.179.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.600
CC 1002214402	ANGEL RAFAEL ALVAREZ ESCORCIA	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.900.337	$ 546.000	[illegible]	$ 3.900.337	$ 195.000	0.960	$ 3.900.337	$ 31.200	[illegible]	$ 3.837.133	$ 194.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 994.200
CC 1002214402	ANGEL RAFAEL ALVAREZ ESCORCIA	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 87.044	$ 14.100	[illegible]	$ 87.044	$ 3.600	0.000	$ 87.044	$ 0	[illegible]	$ 87.044	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000
CC 1004264600	EDGAR DAVID PALOMINO HOLGUIN	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 2.641.200	$ 402.700	[illegible]	$ 2.641.200	$ 158.700	0.960	$ 2.641.200	$ 165.800	[illegible]	$ 2.653.648	$ 119.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.200
CC 1004264600	EDGAR DAVID PALOMINO HOLGUIN	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 91.280	$ 14.800	[illegible]	$ 91.280	$ 3.700	0.000	$ 91.280	$ 0	[illegible]	$ 91.280	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200
CC 1004264679	LUIS ALBERTO RIVERA PERUELA	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 80.300	$ 13.000	[illegible]	$ 80.300	$ 3.600	0.000	$ 80.300	$ 0	[illegible]	$ 80.300	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.200
CC 1004264679	LUIS ALBERTO RIVERA PERUELA	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.411.600	$ 382.900	[illegible]	$ 3.411.600	$ 136.500	0.960	$ 3.411.600	$ 197.800	[illegible]	$ 3.535.696	$ 151.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791.600
CC 1004264582	YURIS MILADYS ESCOBAR MARINA	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 1.675.400	$ 267.900	[illegible]	$ 1.675.400	$ 100.500	0.000	$ 1.675.400	$ 0	[illegible]	$ 1.675.400	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.100
CC 1004264582	YURIS MILADYS ESCOBAR MARINA	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 37.600	$ 6.000	[illegible]	$ 37.600	$ 2.400	0.000	$ 37.600	$ 0	[illegible]	$ 37.600	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1004661001	ALEJANDRO LOAIZA QUITIANREZ	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.322.200	$ 399.400	[illegible]	$ 3.322.200	$ 133.200	0.960	$ 3.322.200	$ 25.800	[illegible]	$ 3.256.726	$ 153.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.013.800
CC 1004661001	ALEJANDRO LOAIZA QUITIANREZ	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 109.700	$ 17.400	[illegible]	$ 109.700	$ 4.400	0.000	$ 109.700	$ 0	[illegible]	$ 109.700	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1004714107	YEISERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00											X							0	30	30	[illegible]	$ 133.333	$ 19.900	[illegible]	$ 133.333	$ 5.000	0.000	$ 133.333	$ 0	[illegible]	$ 133.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.900
CC 1004714107	YEISERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00												X						0	30	30	[illegible]	$ 41.775	$ 6.200	[illegible]	$ 41.775	$ 2.300	0.000	$ 41.775	$ 0	[illegible]	$ 41.775	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 1004714107	YEISERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 1.467.400	$ 207.200	[illegible]	$ 1.467.400	$ 73.200	0.960	$ 1.467.400	$ 11.600	[illegible]	$ 1.467.400	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.200
CC 1004714744	YICHEA PAOLA MURILLO	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 89.096	$ 14.200	[illegible]	$ 89.096	$ 3.600	0.000	$ 89.096	$ 0	[illegible]	$ 89.096	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.000
CC 1004714744	YESICA PAOLA MURILLO	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.300.296	$ 411.100	[illegible]	$ 3.300.296	$ 132.000	0.000	$ 3.300.296	$ 0	[illegible]	$ 3.300.296	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.100
CC 1004715839	JHON JAIRO MARTINEZ BENAVIDES	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.233.774	$ 469.700	[illegible]	$ 3.233.774	$ 150.300	0.960	$ 3.233.774	$ 193.000	[illegible]	$ 3.188.630	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 953.000
CC 1004715839	JHON JAIRO MARTINEZ BENAVIDES	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 86.946	$ 13.900	[illegible]	$ 86.946	$ 3.500	0.000	$ 86.946	$ 0	[illegible]	$ 86.946	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800
CC 1004744784	EDER EDWISSON GARCIA MARTINEZ	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 3.282.272	$ 535.200	[illegible]	$ 3.282.272	$ 131.200	0.960	$ 3.282.272	$ 226.000	[illegible]	$ 3.282.272	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.010.000
CC 1004744784	EDER EDWISSON GARCIA MARTINEZ	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 113.190	$ 18.200	[illegible]	$ 113.190	$ 4.600	0.000	$ 113.190	$ 0	[illegible]	$ 113.190	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400
CC 1004753063	HAROL JOHANNA DALUZ RODRIGUEZ	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 73.100	$ 11.900	[illegible]	$ 73.100	$ 3.000	0.000	$ 73.100	$ 0	[illegible]	$ 73.100	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1004753063	HAROL JOHANNA DALUZ RODRIGUEZ	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 73.100	$ 11.900	[illegible]	$ 73.100	$ 3.000	0.000	$ 73.100	$ 0	[illegible]	$ 73.100	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1004753063	HAROL JOHANNA DALUZ RODRIGUEZ	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 3.349.594	$ 527.300	[illegible]	$ 3.349.594	$ 134.000	0.522	$ 3.349.594	$ 10.700	[illegible]	$ 3.349.594	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804.000
CC 1004753007	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 101.010	$ 16.200	[illegible]	$ 101.010	$ 4.000	0.000	$ 101.010	$ 0	[illegible]	$ 101.010	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.200
CC 1004753007	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00														1				0	1	1	[illegible]	$ 2.940.804	$ 470.400	[illegible]	$ 2.940.804	$ 117.700	0.960	$ 2.940.804	$ 204.700	[illegible]	$ 2.940.804	$ 117.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 910.700
CC 1004715799	JUAN ANDRES ALVAREZ PADRON	01	00	X									X								0	30	30	[illegible]	$ 7.220.000	$ 346.600	[illegible]	$ 7.220.000	$ 288.800	0.960	$ 7.220.000	$ 57.700	[illegible]	$ 1.872.944	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.000

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146599 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1078285838 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1048727780	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PROTECCION	$ 99.400	$ 11.900	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 99.400	$ 2.900		$ 99.400	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 99.400	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200
CC 1048727780	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00												X					0	5	5	5	5	[illegible] PROTECCION	$ 393.371	$ 94.997	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 393.371	$ 11.700		$ 393.371	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 393.371	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.200
CC 1098758752	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 113.400	$ 14.200	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 113.400	$ 4.600		$ 113.400	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 113.400	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400
CC 1098758752	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	[illegible] PORVENIR	$ 3.289.190	$ 531.000	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 3.289.190	$ 131.600	0,040	$ 3.289.190	$ 355.000	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.289.190	$ 131.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.218.800
CC 1098764434	DAVID FERNANDO BEDOYA HOYOS VEGA	01	00												X					0	30	30	30	30	COMFE COLO MUTUAL SEGUROS	$ 3.700.000	$ 444.000	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 3.700.000	$ 148.000		$ 3.700.000	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.000
CC 1098788011	MARIA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00	X																0	31	31	31	31	[illegible] PORVENIR	$ 1.333.000	$ 186.000	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 1.333.000	$ 53.300	0,040	$ 1.333.000	$ 80.000	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.333.000	$ 106.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.900
CC 1098788011	MARIA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 39.333	$ 5.600	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 39.333	$ 2.400		$ 39.333	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 39.333	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000
CC 1098788011	MARIA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00												X					0	2	2	2	2	[illegible] PORVENIR	$ 118.667	$ 16.700	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 118.667	$ 4.700		$ 118.667	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 118.667	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.100
CC 1098788011	MARIA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00												X					0	6	6	6	6	[illegible] PORVENIR	$ 393.000	$ 55.200	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 393.000	$ 15.200		$ 393.000	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 393.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.400
CC 1098800915	DIEGO MAURICIO MIRO MEDINA	01	00	X																0	30	30	30	30	COLPE COLFONDOS	$ 3.419.667	$ 399.700	[illegible] EPS SURA	$ 3.419.667	$ 136.700	0,040	$ 3.419.667	$ 168.000	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.149.167	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.700
CC 1098803974	DIEGO MAURICIO MIRO MEDINA	01	00												L					0	1	1	1	1	COLPE COLFONDOS	$ 83.333	$ 13.900	[illegible] EPS SURA	$ 83.333	$ 3.300		$ 83.333	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 83.333	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.200
CC 1098806480	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00	X																0	11	11	11	11	[illegible] PORVENIR	$ 321.500	$ 38.900	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 321.500	$ 25.700	0,060	$ 321.500	$ 38.400	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 321.500	$ 25.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.800
CC 1098806480	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 47.400	$ 7.000	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 47.400	$ 1.900		$ 47.400	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 1098806480	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00												X					0	18	18	18	18	[illegible] PORVENIR	$ 854.100	$ 126.700	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 854.100	$ 34.200	0,040	$ 854.100	$ 34.200	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.100
CC 1098822550	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 97.200	$ 13.900	[illegible] EPS SANITAS	$ 97.200	$ 5.800		$ 97.200	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 97.200	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.400
CC 1098822550	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00												X					0	6	6	6	6	[illegible] PORVENIR	$ 388.800	$ 55.200	[illegible] EPS SANITAS	$ 388.800	$ 15.600		$ 388.800	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 388.800	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.400
CC 1098822550	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	[illegible] PORVENIR	$ 3.400.000	$ 396.400	[illegible] EPS SANITAS	$ 3.400.000	$ 97.200	0,060	$ 3.400.000	$ 168.000	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.400.000	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753.400
CC 1098822963	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00	X																0	30	30	30	30	[illegible] PORVENIR	$ 999.400	$ 139.400	[illegible] NUEVA EPS S.A. CH	$ 999.400	$ 39.900	0,060	$ 999.400	$ 59.900	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.039.100	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.200
CC 1098822963	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 51.234	$ 7.200	[illegible] NUEVA EPS S.A. CH	$ 51.234	$ 2.100		$ 51.234	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.200
CC 1098822963	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00												X					0	6	6	6	6	[illegible] PORVENIR	$ 661.200	$ 93.200	[illegible] NUEVA EPS S.A. CH	$ 661.200	$ 26.500		$ 661.200	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 653.000	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.500
CC 1103861718	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00	X																0	30	30	30	30	[illegible] PORVENIR	$ 1.020.670	$ 200.300	[illegible] PAMESANAR EPS	$ 1.020.670	$ 40.200	0,060	$ 1.020.670	$ 110.200	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.020.670	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.700
CC 1103861718	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 63.100	$ 10.200	[illegible] PAMESANAR EPS	$ 63.100	$ 2.000		$ 63.100	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 61.700	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1103861718	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00												L					0	4	4	4	4	[illegible] PORVENIR	$ 252.700	$ 40.800	[illegible] PAMESANAR EPS	$ 252.700	$ 10.100		$ 252.700	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 247.100	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.800
CC 1104062421	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	[illegible] PROTECCION	$ 1.089.610	$ 214.600	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 1.089.610	$ 78.700	0,060	$ 1.089.610	$ 168.600	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.089.610	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.000
CC 1104062421	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PROTECCION	$ 87.500	$ 14.100	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 87.500	$ 3.500		$ 87.500	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 75.200	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.600
CC 1104062421	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00												X					0	7	7	7	7	[illegible] PROTECCION	$ 612.864	$ 98.700	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 612.864	$ 24.500		$ 612.864	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 534.870	$ 21.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.900
CC 1102206241	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00	X																0	30	30	30	30	COLPE COLFONDOS	$ 3.135.271	$ 360.100	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 3.135.271	$ 90.700	0,060	$ 3.135.271	$ 168.600	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 2.963.900	$ 118.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.900
CC 1102206241	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00												L					0	1	1	1	1	COLPE COLFONDOS	$ 75.051	$ 11.300	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 75.051	$ 2.900		$ 75.051	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 67.270	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.700
CC 1102206241	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00												X					0	7	7	7	7	COLPE COLFONDOS	$ 3.094.396	$ 355.100	[illegible] NUEVA EPS S.A. CH	$ 3.094.396	$ 90.600	0,060	$ 3.094.396	$ 148.800	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.460.840	$ 138.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.600
CC 1102206241	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00												L					0	1	1	1	1	COLPE COLFONDOS	$ 99.972	$ 11.100	[illegible] NUEVA EPS S.A. CH	$ 99.972	$ 3.900		$ 99.972	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 91.170	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.400
CC 1102206241	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00												X					0	7	7	7	7	COLPE COLFONDOS	$ 3.275.000	$ 390.000	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 3.275.000	$ 95.100	0,060	$ 3.275.000	$ 165.400	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.146.200	$ 125.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 785.700
CC 1072000000	FABIANO RODRIGUEZ AVE	01	00												L					0	1	1	1	1	COLPE COLFONDOS	$ 87.809	$ 9.900	[illegible] EPS SANITAS	$ 87.809	$ 2.400		$ 87.809	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 87.809	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100
CC 1072000000	FABIANO RODRIGUEZ AVE	01	00	X																0	19	19	19	19	COLPE COLFONDOS	$ 1.089.210	$ 173.900	[illegible] EPS SANITAS	$ 1.089.210	$ 44.000	0,060	$ 1.089.210	$ 72.600	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.089.210	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.600
CC 1071676076	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00	X																0	30	30	30	30	COLPE COLFONDOS	$ 3.132.980	$ 361.800	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 3.132.980	$ 90.200	0,060	$ 3.132.980	$ 148.700	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.152.280	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CC 1071676076	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00												L					0	1	1	1	1	COLPE COLFONDOS	$ 75.644	$ 11.100	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$ 75.644	$ 3.100		$ 75.644	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 67.222	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.900
CC 1101620035	JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	[illegible] PORVENIR	$ 2.264.210	$ 276.700	[illegible] PAMESANAR EPS	$ 2.264.210	$ 90.200	0,060	$ 2.264.210	$ 163.800	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.451.810	$ 137.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.000
CC 1101620035	JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ	01	00												L					0	1	1	1	1	[illegible] PORVENIR	$ 74.800	$ 12.000	[illegible] PAMESANAR EPS	$ 74.800	$ 3.000		$ 74.800	$ 0	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 58.440	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.300
CC 1094616180	JAVIER HUMBERTO DIAZ ORTIZ	01	00	X																0	30	30	30	30	[illegible] PORVENIR	$ 3.684.900	$ 708.800	[illegible] EPS SANITAS	$ 3.684.900	$ 184.200	0,060	$ 3.684.900	$ 332.200	CCF80 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.396.300	$ 276.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.900

Líneas de Servicio PensSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540077 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6965444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616858 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025 | Empresa N°900549507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1078285838 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 31/12/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1078285838 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INGT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPN	IRL	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Días PEN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 91448520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00														X			30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 158.700	$ 33.300	EPS041 COOSALUD	$ 158.700	$ 6.400	0,522	$ 158.700	$ 0	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 158.700	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.300
CC 91448520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00	X																30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 6.634.800	$ 139.300	EPS041 COOSALUD	$ 6.634.800	$ 106.300	6,965	$ 6.634.800	$ 920.500	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.984.240	$ 335.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.401.200
CC 5442870	JAIRO ALBERTO TEPES CARBONELL	01	00														X			30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 47.400	$ 1.000	EPS034 COMFENALCO	$ 47.400	$ 1.400	0,522	$ 47.400	$ 0	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 47.400	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400
CC 5442870	JAIRO ALBERTO TEPES CARBONELL	01	00											X						30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 1.456.900	$ 310.600	EPS034 COMFENALCO	$ 1.456.900	$ 19.500	0,965	$ 1.456.900	$ 191.500	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.456.900	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000
CE 228449	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00	X										X						30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 2.031.100	$ 151.400	EPS037 NUEVA EPS S.A.	$ 2.031.100	$ 80.800	0,965	$ 2.031.100	$ 140.700	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 2.031.100	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.900
CE 228449	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00														X			30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 87.300	$ 15.900	EPS037 NUEVA EPS S.A.	$ 87.300	$ 3.700	0,522	$ 87.300	$ 0	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 87.300	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300
PT 532864	MANEL EDUARDO HERNANDEZ ESCORIHUELA	01	00														X			30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 33.900	$ 6.200	EPS037 NUEVA EPS S.A.	$ 33.900	$ 2.100	0,522	$ 33.900	$ 0	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 33.900	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400
PT 532864	MANEL EDUARDO HERNANDEZ ESCORIHUELA	01	00											X						30	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 1.654.847	$ 304.800	EPS037 NUEVA EPS S.A.	$ 1.654.847	$ 90.200	0,965	$ 1.654.847	$ 113.200	CCFC43 COMFENALCO SANTANDER	$ 1.654.847	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Cotizaciones Obligatorias, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 167.923.834	$ 169.347.334	$ 169.347.334	$ 202.010.000	$ 37.120.000	$ 5.778.800	$ 5.854.500	$ 7.980.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.795.200	$ 0	$ 51.795.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4468634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA: DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 05 26	2025 06 01	2026 05 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarte una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las ilaciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras, o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales suministrados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA WFD114 | MARCA FOTON | LÍNEA BJ3122DEPFA-G2 | MODELO 2017

CILINDRAJE 3.760 | COLOR AZUL | SERVICIO PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA | TIPO CARROCERÍA PLATON | COMBUSTIBLE DIESEL | CAPACIDAD TON/PAS 6000

NÚMERO DE MOTOR 60006343 | ANUL N | VIN LVBDHPES3HN000000

NÚMERO DE SERIE LVBDHPES3HN000000 | ANUL N | NÚMERO DE CHASIS LVBDHPES3HN000000 | ANUL N

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT 900945507



141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 82201600046112 | DE | FECHA IMPORT. 10/05/2016 | PUESTO 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA 26/05/2016 | FECHA EXP. LIC. TTO. 31/05/2016 | FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRANSITO STRIA MCPAL TTO/TTE GIRON

LT02003920795

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308007289163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	FOTON		PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO	BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	NÚM. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para prestar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 67 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A., Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE	POTENCIA HP
******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT030025257 39

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



MARCA:
CASE

TIPO:
MINICARGADOR SR175

SERIE:
JAFSR175EJM446321

MOTOR:
126894

MODELO:
2018

MQ-047
MINICARGADOR SR175

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

11/06/2019

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 78805

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC108909	CASE	SR175	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	JAFSR175EJM446321

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	126894	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2812 Kg	1970 mm	1350 mm	3300 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERNOTA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.178.054

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
26-11-2019	25-02-2021	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482018000509768	16/08/2018



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003943

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2018

4. Número de formulario
4820160005097686

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890930024 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

9. Dirección: CL 61 SUR CR 50 50 | 10. Teléfono: 3606161 | 12. Cód. Admón.: 48 | 14. Cód. Dpto.: 05 | 17. Cód. Ciudad/ Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081358 | 25. Dv: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia de Aduanas ML S.A. Nivel I | 27. Tipo declarante: 28 | 29. Cód. usuario: 513

28. Número documento de identificación: 73099640 | 30. Apellidos y nombres: Duarez Rojas Evard Edvar

31. Clase declaración: 02 | 32. Tipo declaración: Anticipada | 33. Cód.: 3 | 34. No. Formulario Anterior: 00000000000000X | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cód. Admón.: XX | 37. Declaración de Importación No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón.: XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: CTG | 41. Cód. Depósito: 7201 | 42. Manifiesto de carga No.: 1183750009185I1 | 43. Año - Mes - Día: 2018 - 08 - 12 | 44. Documento de transporte No.: SUOU28001AC4NAF8 | 45. Año - Mes - Día: 2018 - 08 - 03

46. Nombre importador o proveedor en el exterior: CNR INTERNATIONAL S.A. | 47. Ciudad: LUGANO | 48. Cód. País Exportador: 757

49. Dirección importador o proveedor en el exterior: RIVA PARADISO 14 CH 6902 LUGANO | 50. Email: 41918853643

51. No. de Items: FTCNH1800044284 | 52. Año - Mes - Día: 2018 - 07 - 30 | 53. Cód. país procedencia: 249 | 54. Cód. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Aduana: 434 | 56. Cód. Clase Modal: 5 | 57. Empresa transportadora: EDUARDO L GERLEIN S A | 58. Tasa de cambio $ vac.: 2,934.90

59. Subpartida arancelaria: 84659300 | 60. Cód. Campo descripción: XX | 61. Cód. Subpartida: 02 | 62. Cód. Dirección: C102 | 63. No. cuotas a pagar: XX | 64. Valor aduana USD: XXXX | 65. Forma de pago de la venta: XX | 66. Cód. país de origen: 249 | 67. Cód. Arancel: XXXX

68. Fecha de pago de la importación: 01 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cód. país compra: 757 | 71. Peso bruto kgs.: 2,938.56 | 72. Peso neto kgs.: 2,938.56 | 73. Código embalaje: YY | 74. No. Bultos: 5 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cód. unidad comercial: U | 77. Cantidad comercial: 1.00

78. Valor FOB USD: 23,416.85	79. Valor Bruto USD: 368.53	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
80. Valor Flete USD: 7.07	81. Valor Otros Gastos USD: 71.85	Arancel	0.00	69,323,553	0	0	0
82. Valor Seguros USD: 447.49	83. Ajuste valor USD: 0.00	I.V.A.	5.00	69,323,553	3,466,000	0	0
84. Valor aduana USD: 23,864.35	85. Código régimen y tratado: X	86. Partida: 3000000000	Sobretasa	0.00	0	0	0
87. Cód. Aforo: 99	88. Año: XXXX	89. Programa No.: 0000000000	90. Cód Interno del Producto: 0	Derechos Antidumping	0	0	0
				Gravamen	0	0	
				Recargo	0	0	
					Total	3,466,000	0

91. Descripción de las mercancías (Incluir la descripción de las mercancías a importar con la contenida en el manual de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, modelos y años) 92. El código no suministrado, corresponde al régimen de esta declaración

Que [illegible] Que Pedido y Orden Compra [illegible], Declaración Año Código SAP [illegible] y MERCANCIA NUEVA, NO SOMETIDO AL DECRETO 2153 DE 2016 Y AL DECRETO 2532 DE 2016, -EXCEPTUA DIRECTIVA- MONTO EXTRAORDINARIO 654 DE 1994, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO ARTICULO 428-1, DECRETO 4048 DE 2008 PARA LA NO PRESENTACION DE REGISTRO DE IMPORTACION, EL CUAL MENCIONADO CON BASE FACTURA, Bodega CL CARE CONSECUTIVO, Ref: 40117, Nom PRTO LLANTA , S. Fac: PRODUCTOS MENCIONADOS CON BASE FACTURA, DES DESTINO PARA EL COMERCIO, RAZON SOCIAL NOMBRE LLEGA, CONTIENE BATERIA Y NO EXCLUIDO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, [illegible]

93. Valor pagos anticipados: 0	94. Pueda recibir de pago pruebas de: 3000000000 USD	95. Pesos: 0000 DE 00	
96. Recibo consignado (B/S) - Nombre del banco: Estado de la pre. Cantidad pesos/pesos: Nº de la declaración anterior:	97. Si la declaración anterior es de forma anticipada de Pedimentos Especiales:	98. No. de Aceptación declaración: 4030100005752 / 99. Fecha: 2018 DE 00	
100. Levante No. 4520130023+2990	101. Fecha: 2018 - 08 - 16	Marca de seguridad de la mercancía:	102. Aforo: 103. CC de:

Firma declarante

897. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

104. Pago Total: 0

SYGA
Autoadhesivo 9348181037389
Fecha presentación 2018-08-06 10:33:42
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2018-08-16 16:36:17

2018174114681B



MARCA:
DOSSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBAACCK0022219

MOTOR:
DB58TIS936644EN

MODELO:
2019

MQ-044
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36-14
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

27/05/2019

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 58237

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC101917	DOOSAN	DX225LCA	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACCK0022219

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS936644EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	2940 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

Scanned by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-05-2019	29-05-2019	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352019000236032	22/05/2019

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM010000023 45

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1 Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario
3520190000236032-1

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6 DV: 1 | 11 Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

12 Dirección: CL 99 69 C 41 | 13 Teléfono: 4238300 | 14 Cod Aduana: 36 | 15 Cod Dpto: 11 | 17 Cod Cuidad Municipio: 001

Declarante

20 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 21 DV: 4 | 24 Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. | 27 Tipo usuario: 26 | 28 Cod usuario: 0095

29 Número Documento de identificación: 16504199 | 30 Apellidos y nombres: CACERES ZORRILLA WALTER ALFONSO

01 Clase importación	02 Tipo declaración	03 Cod	04 No Formulario Anulado	05 Año - Mes - Día	06 Cod Aduana	07 Declaración de Exportación	08 Año - Mes - Día	09 Cod Aduana
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod lugar ingreso de las mercancías	41 Cod Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907006791	2019 - 05 - 22	No HDGLKRCO0285674	2019 - 03 - 31

16 Nombre exportador o proveedor en el exterior	17 Ciudad	18 Cod País Exportación
DOOSAN INFRACORE CO. LTD	INCHEON	190

19 Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUG-GU-INCHEON KOREA 401-702 | 20 E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

31 No. de factura	32 Año - Mes - Día	33 Cod país procedencia	34 Cod Modo Transporte	35 Código de Aduana	36 Cod Dpto Destino	37 Empresa transportadora	38 Tasa de cambio $ x 1 US
HX92D190304461	2019 - 03 - 26	190	1	472	0	MULTIPORT E.U	3.290,27

39 Subpartida arancelaria	40 Cod Complementario	41 Cod Suplementario	42 Cod Modalidad	43 No. cuotas o plazos	44 Valor aseg USD	45 Periodicidad del pago de la cuota	46 Cod país de origen	47 Cod Acuerdo
8429520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

48 Forma de pago de la importación	49 Tipo de importación	50 Cod para compra	51 Peso bruto kgs	52 Peso neto kgs	53 Código de embalaje	54 No. bultos	55 Subpartidas	56 Cod unidad comercial	57 Cantidad items
02	01	190	322,500.00	322,500.00	YY	45	1	U	15.00

58 Valor FOB USD	59 Valor fletes USD	60 Valor seguros USD	61 Valor otros Gastos USD	62 Subtotal de fletes seguros y otros gastos USD	63 Ajuste valor USD	64 Valor aduana USD	65 Código negocio a liberada	66 No.Items
1,348,697.45	115,141.10	598.08	50.00	115,789.18	0.00	1,464,486.63	X	XXXXXXXXXX

67 Cod oficina	68 Año	69 Programa No	70 Cod técnico del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
	Arancel	0.00	4,618,556.424	0	0	0
	IVA	19.00	4,618,556.424	916,526,000	0	0
	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
	Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
	Sanción	0	0	0	0	
	Recargo	0	0	0	0	
			Total	915,526,000		0

DO 4011900571002 UAP: 005 DECLARACION(1-1) OD: 10944, MERCANCIA NUEVA // PEDIDO: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // RACIONALIZACION: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. PRODUCTO: EXCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX225LCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DMKCEBACLK0022205, DMKCEBACVK0022190, DMKCEBACEK0022213, DMKCEBACMK0022174, DMKCEBACEK0022190, DMKCEBACVK0022187, DMKCEBACJK0022199, DMKCEBACKK0022203, DMKCEBACHK0022193, DMKCEBA(continua al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera Estado de levante. Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado con exclusivo diligenciado de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 3520190000236032 133. Fecha: 2019 05 22

134. Levante No: 3520190000173135	135. Fecha: 2019 - 05 - 22	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C No. Jeisson Camilo Torres Forero C.C. 1.015.998.237

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92351910831377
Fecha presentación 2019-05-22 19:32:58
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2019-05-22 19:34:58

20192349164931

DIAN
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352019000236032-1
Subpartida : 8429520000

105. Continuación descripción mercancía en Bodega marcas, estados y otros)

CEN0022216, DH6CEBACCKC022219, DH6CEBACLH0022225, DH6CEBACVK0022223, DH6CEBACLN0022239, DH6CEBACAM0022236, AÑO DE FABRICACION: 20
19/ SERIAL MOTOR: DB5STIS936480EN, DB5STIS936464EN, DB5STIS936483EN, DB5STIS936459EN, DB5STIS936505EN, DB5STIS936479EN, DB5STIS93
6430EN, DB5STIS936639EN, DB5STIS936482EN, DB5STIS936465EN, DB5STIS936644EN, DB5STIS936713EN, DB5STIS936627EN, DB5STIS93664TEN, DB
5STIS936727EN, . COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DE
SCRIPCION SEGUN FACTURA: MODEL DX225LCA (EX90), EXCAVATOR MECHANICAL TIER-2 ENGINE (DOOSAN). 5.7M XD BOOM, 2.6M ARM 1.24 M3 H CLA
SS BKT A-KIT. // INFORMACION SEGUN INSPECCION PREVIA:DOOSAN INFRACORE CO, LTDA/ CUCHARA MODELO PH22N1496, DOOSAN No. 230104-02203
9, CAPACIDAD M3/ YD3 1.00/1.41, WIDTH MM / INCH 1246.00 /49.06, WEIGHT KG/LB 939.00/2070.36: SERIAL CUCHARA: SS19B2E22, SS19C1123
, SS19B2517, SS19B2831, SS19B2716, SS19B2111, SS19C0618, SS19C0407, SS19C0104, SS19B1509, SS19C1220, SS19C0514, SS1EL0306, SS19C1
530, SS19CCC19, CADA MAQUINA INCLUYE 2 CAJAS CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO/ PAIS ORIGEN: COREA DEL S
UR, REPUBLICA DE - 199. CANT 4150 U //XXXX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acuña Suárez	1.098.711.157		JATSF175EHM 16321	Bolconu

INSPECCIÓN

MES: Diciembre AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rápido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							
21		Verificar estado de la batería.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	5/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones 5
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Piedecuesta Cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1/12/25	2/12/25	3/12/25	4/12/25	5/12/25	6/12/25	
HOROMETRO	15411	15419	15431	15439	15490	15495	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	6 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	6 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	EQUIPO	UBICACIÓN
Miguel Angel Escobar	1096.219.995		DHHGEEAACGL	Holcomeo

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Diciembre 1 DIC/11	2 DIC	3 DIC	4 DIC	5 DIC	MES: 2012 6 DIC	DÍA
1	INSPECCIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de engrapadoriales (pujido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de planchas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión del aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el manejo de estacionamiento (luces de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓		
29	INSPECCIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolsquin.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de batería.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineres).							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pinzas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMF-03
		Fecha	1/12/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Hatonal
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez Escandon
PROYECTO: Consorcio Hrtigacion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1/12/25	2/12/25	3/12/25	4/12/25	5/12/25	6/12/25	
HORÓMETRO	15790	15796	A748	15860	15246	15869	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	6 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	6 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Suarez	1.098.719.137		JAT3R175EJM AG321	Huilonel

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES				AÑO		
			DIA	9 DIA	10	11	12	13	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones

OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez

PROYECTO: Consorcio Mitigacion Redcuesta Cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		9/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	
HOROMETRO		15455	15458	15461	15464	15469	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	13 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	13 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-xx
		Fecha	01/12/20
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	REGISTRO	MARCA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez Broda	1.096.249.995		DIECEBRACCA DE22PG	Alcoral

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES / DIA				AÑO		OBS
				9/12/25	15/12/25	16/12/25	12/12/25	13/12/25	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de espejos		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de planchas y pedales		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro		✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras		✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales		✓	✓	✓	-	✓	
27		Verificar sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro			✓	✓	✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolipuin							
30		Inspeccionar el ventilador del motor							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio							
33		Verificar estado de batería							
34		Verificar estado de los cilindros							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (ventilas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Halcon
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Vereda Acequia COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		9/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	
HORÓMETRO		15750	15780	15796	15819	15832	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	13 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	13 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID PRESTAO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acuedo Suarez	1.098.714.157		JA FS5175EM 163121	Alcony

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre			AÑO	2025	
			15	16	17	18	19	20	DIA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	2 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Hatillo 21
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Piedecuesta Cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	
HOROMETRO	15970	15975	15978	15979	15980	15985	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	20 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	20 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ESTADO	PLACA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez Exposito	1.096.249.995		DMK-EBAR CCK 00222T9	Aguachica

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	AÑO 2025 DIA	Diciembre MES 15	17	18	AÑO 19	2025 20	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad en la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (Agua, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de planchas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro	✓		—		✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bidquin							
30		Inspeccionar el ventilador del motor							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intercooler							
33		Verificar estado de batería							
34		Verificar estado de los cilindros							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de oscilación							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rueldas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Miguel Angel Alvarez Escandon
OPERADOR: Frente AA CONES
PROYECTO: Construccion Mitigacion Reducwate CONS

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	
HORÓMETRO	15833	15840	15849	15951	15860	15865	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	20 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCION	M
FECHA	20 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	5/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SEDE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo	1.098.714.159		JA FSE FFSE/14 16-321	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre			AÑO	2025	
			22	23	24	25	26	27	28
1	REVISION GUARDA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓				
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓				
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓				
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓				
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓				
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓				
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓				
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓				
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓				
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓				
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓				
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓				
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓				
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓				
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓				
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos)	✓	✓	✓				
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓				
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓				
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓				
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Hatonez
OPERADOR: yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Redcuesta cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/12/25	23/12	24/12				
HOROMETRO	15486	15488	15489				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	29/12/25
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	29/12/25

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM.F.49
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez Escudero	1.036.729.945		DH KC-CBAACCK 00222-76	Alcores

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: 24/12	Diciembre 23	24	DÍA	DÍA	AÑO: 2024 DÍA	DÍA
1	ANTES DE INICIAR	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓				
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓				
3		Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓				
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓				
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓				
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓				
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓				
8		Verificar estado de planacas y pedales.	✓	✓	✓				
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓				
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓				
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓				
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓				
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia).	✓	✓	✓				
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓				
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓				
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓				
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓				
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓				
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓				
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓				
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓				
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓				
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓				
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓				
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓				
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓				
27		Vidrificar sistema de escape.	✓	✓	✓				
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓				
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de batería.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del tubing (tuyos, pasadores, diarios, esquineros)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple tomar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcones
OPERADOR:	Miguel Angel Alvarez Escandon
PROYECTO:	Consorcio Hidroeléctrica piedrancha Adm5

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/12/25	23/12/25	24/12/25				
HORÓMETRO	15766	15869	15870				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel A.
FECHA	24 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	24 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acuña Suarez		1.018.7H 07	JAFSE17SEH4 96321	Helechal

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre			AÑO	2025		
			26	30	31	D/A	D/A	D/A	D/A	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓					
2		Verificar estado del extintor de incendios.	✓	✓	✓					
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓					
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓					
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓					
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de alarma y enclavamiento de control.	✓	✓	✓					
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓					
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓					
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓					
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓					
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓					
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓					
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓					
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓					
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓					
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓					
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓					
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓					
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓					
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.								
21		Verificar estado de la bateria.								
22		Verificar estado de los cilindros.								
23		Revisar tuercas de las ruedas.								
24		Revisar el nivel de la transmisión final.								
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).								
26		Revisar motor/ conex de transmisión hidrostatica.								

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Reduvante cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/12/25	30/12/25	31/12/25				
HOROMETRO	15493	15496	15499				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	31/Dic/25
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	31/DIC/25

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-2-46
		Fecha	1/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	CONTRATO	MARCA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez E.	1.096.219.415		RETROEXCAVADORA 0022-14	Ardcorb

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre			AÑO	2021		
			29/12	30/12	31/12	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓					
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓					
3		Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓					
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓					
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓					
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓					
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓					
8		Verificar estado de planchas y pedales.	✓	✓	✓					
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso	✓	✓	✓					
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓					
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓					
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓					
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓	✓	✓					
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓					
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓					
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)	✓	✓	✓					
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓					
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓					
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓					
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario	✓	✓	✓					
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓					
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓					
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓					
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓					
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓					
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓					
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓					
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓	✓	✓					
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bloquin.								
30		Inspeccionar el ventilador del motor.								
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.								
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.								
33		Verificar estado de batería.								
34		Verificar estado de los cilindros.								
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.								
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).								
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pinzas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías)								

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Aeropuerto
OPERADOR: Miguel Angel Escobar
PROYECTO: Consorcio Fidyacion Pedicuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/12/25	30/12/25	31/12/25				
HORÓMETRO	15876	15879	15889				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	31/12/25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	31/12/25

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 4
ACTA DE REUNION
COPASST

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	02:20 pm	4:00 pm	1	Mensual	x
30	12	2025					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL		Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Seguimiento al plan de formación 4. Inspecciones de lugares de trabajo 5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas 6. Ausentismo 7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores 8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores 9. Otros programas y actividades 10. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Yeiner García Cadena	
Mauricio Villamizar Solano	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el grado de cumplimiento de los compromisos pactados: - Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: se evidencia seguimiento y participación del comité.

Scanned with CamScanner

3. Seguimiento al plan de formación

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a los miembros del COPASST y a todo el personal en:

- Actores Viales – Señales de transito
- Reporte de incidente y accidentes laborales
- Uso adecuado de los elementos de protección personal
- Funciones de los integrantes del COPASST

4. Inspecciones de lugares de trabajo

Se observa la participación del comité en la realización de las inspecciones de seguridad: inspección locativa de obra, inspección de botiquines y camillas, inspección de extintores, de las cuales no se reportan hallazgos que requieran atención.

5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de Diciembre de 2025 no se presentaron accidentes de trabajo. No se notificaron presuntos casos de enfermedad laboral.

6. Ausentismo

En el mes de diciembre de 2025 no se presentaron casos de ausentismo laboral.

7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores

Durante el periodo no se registraron visitas de entes de control o partes interesadas.

8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

Durante el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de los trabajadores en materia de SST, ni se encuentra en proceso ningún proceso entre la empresa y los colaboradores.

9. Verificación normatividad

Se verifica la normatividad legal vigente que entra en vigencia que aplica a las actividades y funcionamiento del SG-SST durante el periodo

10. Otros programas y actividades

- El equipo SST realiza visitas permanentes a los frentes de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	COPASST - SST	Enero 2026

Fecha próxima reunión: Enero 2026

Yelner García Cadena
Presidente del COPASST

Mauricio Villamizar Solano
secretario del COPASST

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 5
ACTA DE REUNION
COCOLA

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	2:00 pm	4:00 pm	01	Mensual	x
29	12	25					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité 4. Casos no Resueltos 5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Yefferson Dyfred González Ortega	
Yelner García Cadena	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

Scanned with CamScanner

3. Quejas de Acoso Laboral:
Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:
En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros
Siguiendo el cronograma de capacitación, se socializo a los miembros del COCOLA:

- Funciones de los miembros del comité COCOLA.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Diciembre 2025

Fecha próxima reunión: enero 2026

Yefferson Dyfred González Ortega
Presidente

Yelner García Cadena
secretario

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 6
CAPACITACIONES SST

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Mitigacion Peñuela COMB

TEMA DE CAPACITACIÓN Actores Viales – Señales de transito

LUGAR: Campamento Frente Brisas Primera FECHA 2 Diciembre 2025

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 40 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andrés garcia	6565491	AYUDANTE	
2	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
3	Yeiner Garda	7005182273	Operador	
4	Luis Alberto pinedo R	8.669.822	Ayudante C	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB

TEMA DE CAPACITACIÓN Actores Viales – Señales de transito

LUGAR: Frente Helicopteo FECHA 2 Diciembre 2025

CAPACITADOR DURACIÓN 90 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Villamizar	1005541892	Operador	
2	Hurley Prada lopez	1098822751	Operador	Hurley Prada
3	Alexander Prado Lopez	13745736	Ayudante P.	Alexander Prado
4	Jefferson Gonzalez	5823211	AYUDANTE P.	
5	Luis A. Fuentes R.	91699427	Aux Perf	
6	Jose Osorio	1090774060	Ayudante P.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Hidrogracias Reducuenta COMS

TEMA DE CAPACITACIÓN Reporte de incidentes y accidentes laborales

LUGAR: Campamento Base Principal FECHA 12 Diciembre 2022

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 90 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
2	Andres oyola	G565491	R.Y.U DANTE	
3	Yiner garcia	7005181393	operador	
4	Luis Alberto prada	9.697822	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Consorcio Mitigación Pedregueta COMB

TEMA DE CAPACITACIÓN: Reporte de incidentes y accidentes laborales

LUGAR: Campamento Halcones | FECHA: 12 Diciembre 2025

CAPACITADOR: Victor Gamboa | DURACIÓN: 40 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Pradalopez	1371573C	Ayudante Bc	Alexander Prada
2	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante P.	
3	Luis Alfonso Fuentes R	08699417	Aux Perf	
4	Mauricio Villamizar	1005541892	operador	
5	José Ospino	7050774060	Ayudante P.	
6	Hurley Prada Lopez	1098822751	operador	Hurley Prada Lopez
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA: Consorcio Mitigación Redcreuta, CPMB

TEMA DE CAPACITACIÓN: Uso Adecuado de los elementos de Protección Personal

LUGAR: Campamento Base Primavera | FECHA: 15/12/2022

CAPACITADOR: Victor Gamboa | DURACIÓN: 90 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres garcia	6565491	AYUDANTE	
2	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
3	Yeiner Garcia	7005187273	Operador	
4	Luis Alberto pinedo	9.694.822	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Integracion Piedecuesta CPMB

TEMA DE CAPACITACIÓN Uso Adecuado de los elementos de Protección Personal

LUGAR: Campamento Halcones FECHA 15/12/2025

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 40 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Prada Lopez	1371573C	Ayudante Bc	Alexander Prada
2	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante P.	
3	Harley Prada lopez	1098827351	operador	Harley Prada
4	Mauricio Villamizar	1005741892	operador	
5	José Ospino	7050774060	Ayudante P.	
6	Luis A. Fuentes M.	1098699422	Aux Perf	Luis F
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Mitigacion Piedecuesta Cdmb

TEMA DE CAPACITACIÓN Funciones de los integrantes del Copasst

LUGAR: Campamento Brisas Primavera FECHA 22/12/2025

CAPACITADOR Victor Garboa DURACIÓN 90 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
2	Andres oprria	G565491	AYUDANTE	
3	Yeiner garcia	1005182393	operador	
4	Luis Alberto prada	91697028	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA: Consorcio Mitigacion Piedecuesta Cdmb

TEMA DE CAPACITACIÓN: Funciones de los integrantes del Copasst

LUGAR: Campamento Alcones FECHA: 22/12/25

CAPACITADOR: Victor Gamboa DURACIÓN: 10min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Villamiza	1005548892	Operador	
2	Hurley Prada Lopez	1099822751	Operador	Hurley Prada
3	Alexander Prada Lopez	13745736	Ayudante P.	Alexander Prada
4	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante P.	
5	Luis A. Fuentes R.	1094994422	Aux Perf	
6	Jose Ospino	7050776060	Ayudante P.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 7
INSPECCIONES SST

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Victor Gamboa Firma: CARGO: Profesional SISO

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Mitigacion Redefuerta COMB – Brisur

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Yeiner Garcia CARGO: operador

Tenga en cuenta que:

Ut: Uso y se califica con SI ó NO

Nota: La calificación se asigna al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																		OBSERVACIONES
			Casco		Protector facial		Protección auditiva		Protector respiratorio		Botas		Guantes		Gafas		Botas caucho		UNA		DOS	
NOMBRE	CARGO		U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	
Yeiner Garcia C.	operador Perf 1	2/12/25	SI	B		/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Esmeralda Parra	operador	2/12/25	SI	B		/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Yoel Andres Navarro	operador Perf 1	2/12/25	SI	B		/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Luis Alberto Ruda	Ayudante	2/12/25	SI	B		/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Andres Garcia F.	Ayudante	2/12/25	SI	B		/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Juan Andres Diaz	Almacenista	2/12/25	SI	B		/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Victor Camboa Firma: CARGO: Propietario SISO

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Halcon - Conviao Mitigación Predecente CONAB CARGO:

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Yenier Garcia

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI o NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se supsta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protección Respiratoria		Overol		Guantes		Botas		Reflectivos		Gafas		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Alexander Pradas	Ayudante Ref II	3/12/25	SI	B	/		SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Hadley Pradas L.	operador perf II	3/12/25	SI	B	/		SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Mauricio Villanueva	operador perf II	3/12/25	SI	B	/		SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Yefferson Gonzalez	Ayudante de ref	3/12/25	SI	B	/		SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Luis Alfonso Fuentes	Ayudante Ref I	3/12/25	SI	B	/		SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						
Jose Alberto Ospino	Ayudante	3/12/25	SI	B	/		SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	/						

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	de

FECHA: 9 Diciembre 2025 PROYECTO: Consorcio Hidrogeno Dedecorado

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Victor Bombon Colmb Blues

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA:

V.B. COPASST: Yeiner Bocica

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Última mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Manija	Seguridad	Manguera	Boquilla	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Soporte	Tarjeta	Manijal	Observaciones
1	Multipropósito	Almacen	10lbs	03/25	03/26	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	/

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores coloque B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código	SST-F-15
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	de

FECHA: 10 Diciembre 2025 PROYECTO: Consorcio Interconexión Predecuenta Calixto - Falcon

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Victor Gamboa

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: Yeiner Garcia

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Anclaje	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Sinfonía	Tarjeta	Gravilla	Observaciones
1	Multipropósito	Campamento	10lbs	04/25	09/26	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	—

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores colocar B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo evidenciado en la inspección.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Código	113-E-14
Fecha	19/05/2025
Versión	4
Página	de

Inspección realizada por

Nombre: Victor Gamboa | Fecha inspección: 9/10/25 | Próxima inspección: Enero 26

Cargo: Profesional SHO | Lugar: Campamento Bruval | Firma:

Ubicación del botiquín: Almacen | Ubicación de la camilla: Almacen

V.B. Copasst: Yeiner Garcia | V.B. Brigadas de emergencia:

Nombre y/o cargo de quien recibe | Fecha | Firma | Próxima inspección

Elementos	Factores a revisar: Medida	Cantidad Real	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Integridad empaque: B	R	M	NA	Plan de acción: Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	08/27	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	09/26	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	10	08/26	✓							
Gasa Limpia	Unidad	10										
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	17	09/28	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	08/26	✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1										
Apósito ocular	Unidad	1	7	10/28	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	90	07/27	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	27/01/27	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	27/01/27	✓							
Cánula con pilot	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miebros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	1	1	05/26	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	1	05/26	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	1	1	N/A	✓							
Toallitas desinfectable	Unidad	10	1	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	3	10	04/27	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	25										
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	12	08/27	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1										
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1										
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	09/27	✓							
Mascarilla a Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica sin partes en madera por seguridad, impermeable a rayos UV, fácil limpieza, con anclajes reflectivos

Descripción	Estado: B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizada	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpia y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Código	SST-F-14
Fecha	10/05/2015
Versión	4
Página	1 de 1

Inspección realizada por:

Nombre: Victor Gamboa | Fecha inspección: 19 Diciembre 2025 | Próxima inspección: Enero/26

Cargo: Profesional SISO | Lugar: Alcoazas | Firma:

Ubicación del botiquín: Campamento | Ubicación de la camilla: Campamento

V.B. Coapasst: Victor Gamboa | V.B. Brigadas de emergencia:

Marque con una X según criterio | B - Bueno | R - Regular | M - Malo | NA - No aplica

Elementos	Parámetros a revisar: Medida	Cantidad Ideal	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Integridad empaque: B	R	M	NA	Plan de acción: Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	09/27	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	07/26	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	10	07/26	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	10	09/27	✓							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	1	08/26	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	—									
Esparadrapo microporo	Unidad	1	1	09/26	✓							
Apósito ocular	Unidad	1	—									
Baja lenguas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	29/08/26	✓							
Clorhexidina Jabón Quirúrgico	Frasco	1	1	09/26	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	—									
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1	09/26	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	10	08/26	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	1	1	N/A	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	5	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	1	1	07/26	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	10	NA	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	—									
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	08/27	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	09/26	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	—									
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con asas tipo araña con refuerzos

Descripción	Estado: B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-10
		Fecha	16/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Hidrogacun Redcuente | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz

FRENTE: Bocas de primavera | FECHA: 1/12/23 al 5 Diciembre 2023

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓					
Coretas para esmeriar	Acetelo, tafiete	N/A	—		—		—		—		—					
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango	N/A	—		—		—		—		—					
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓					
Paladragas	Cabo, cavadora	7	✓		✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general	N/A	—		—		—		—		—					
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓					
Porras (9", 12", 18")	Mango	9	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A	—		—		—		—		—					
Tijeras Industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A	—		—		—		—		—					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Juego de Llaves	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Hachas	Cabo - filo	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1	✓		✓		✓		✓		✓					

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA: [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiner Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Hidroquera Reducente | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz

FRENTE: Bocas de Colpimaven | FECHA: 9/12/2025 al 13/12/25

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	5			✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cinceles	Estado general	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	N/A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Limas	Mango,estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	9			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	12			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general	N/A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Picas	Cabo	10			✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	9			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricás	Clavija, contacto	N/A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tijeras industriales	Estado general	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	9			✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1			✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA: [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiner Boca

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Hidrogeno Pedregal | INSPECCIONADO POR:

FRENTE: Bases y Muros | FECHA: 15/Dic/25 al 20 Dic /25

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, lafilete	N/A	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	N/A	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA: [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yelmer Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Hidrogucion Redicuente — INSPECCIONADO POR:

FRENTE: Bridge primera Edmb — FECHA: 22 al 24 Diciembre 2023

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓									
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓									
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—													
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓									
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓									
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓									
Extensiones	Mango	N/A	—													
Limas	Mango, estado general	2	✓		✓		✓									
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓									
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓									
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓									
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓									
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓									
Parasoles	Estado general	N/A	—													
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓									
Porras (9", 12", 18")	Mango	9	✓		✓		✓									
Extensiones electricas	Clavija, conlacto	N/A	—													
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓									
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓									
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓		✓									
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A	—													
Cizalla (12", 34", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓									
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓									
Juego de Llaves	Estado general	4	✓		✓		✓									
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	N/A	—													
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓									
Hachas	Cabo - filo	1	✓		✓		✓									
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	2	✓		✓		✓									

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiner Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR

Código	SST-F-16
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Mitigacion Pedregal | INSPECCIONADO POR:

FRENTE: Bases Primarias | FECHA: 24 al 31 Diciembre 2025

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓									
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓									
Carelas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—													
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓									
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓									
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓									
Extensiones	Mango	N/A	—													
Limas	Mango estado general	2	✓		✓		✓									
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓									
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓									
Martillos de uña	Mango	12	✓		✓		✓									
Palas	Cabo, hoja	3	✓		✓		✓									
Paladragas	Cabo, cavadora	N/A	—													
Parasoles	Estado general	10	✓		✓		✓									
Picas	Cabo	4	✓		✓		✓									
Porras (9", 12", 18")	Mango	N/A	—													
Extensiones electricas	Clavija, contacto	1	✓		✓		✓									
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓									
Serruchos	Mango, hoja, marco	4	✓		✓		✓									
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	N/A	—													
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	1	✓		✓		✓									
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓									
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	4	✓		✓		✓									
Juego de Llaves	Estado general	N/A	—													
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	1	✓		✓		✓									
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓									
Hachas	Cabo - filo	2	✓		✓		✓									
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1	✓		✓		✓									

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiner Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 8
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB




CAPACITACIONES SST




CAPACITACIONES SST






SENALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB





SE REALIZA REPLANTEO TOPOGRAFICO Y EXCAVACIONES GRANULAR Y ROCOSO





DESMONTE Y LIMPIEZA TALUD





SOBREACARREOS -SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES HALCONES



DESMONTE Y LIMPIEZA TALUD



EXCAVACION EN ROCA Y GRANULAR



SUPERVISION ACTIVIDADES BRISAS DE PRIMAVERA -RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS

ANEXO N° 9
MEDIDAS PREVENTIVAS

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CODIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigacion Rodeo	Ciudad:	Rodeo
Frente de obra:	Brisas Primavera		
Fecha de Inicio :	1 diciembre 2025	Fecha de finalización:	6 diciembre 2025
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	DESMONTE DE VEGETACIÓN DEL TALUD		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Macheta, azadón, picas, guadaña, motosierra, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria).		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caidas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?
Excavación		Caliente		

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar alerto a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Desmonte manual de talud (desyerbe)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel.	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	

Scanned with CamScanner

Desmonte manual de talud (Poda de arboles)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: Vibraciones por manipulación de motosierra	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Desmonte mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equip 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Alecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Acopio y cargue de residuos vegetales y otros	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Pausas activas. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: Manipulación manual de cargas y posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Scanned with CamScanner

Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad. Locativo (tenero irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridos.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehículo 10. Inducción al cargo y capacitación 11. Documentación del vehículo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de tránsito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos aledaños; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos; 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Yeimi Barda	7003182293	
Andres garcia	65 65 491	

IDENTIFICACION RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Alexander Gonzalez	1.098.950.722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91255 828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. FECHA DE INICIO Y HORA	1	Dic	2025	7:30	3. CENTRO DE TRABAJO	Base Primavera	
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	6	Dic	2025	12:00	4. ALTURA APROXIMADA	1.5 mts	5. CONDICIONES

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y RESPONSABLES

Consecutivo	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURAS VIGENTE?	¿ASISTIÓ AL REENTRENAMIENTO?
1	Yeimi García	1005 187293	Operador	SI	SI	SI
2	Andrés García	6565 991	Ayudante	SI	SI	SI
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

7. TAREAS DEL EMPLEADO Y TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	4:30 6	4:30 6	4:30 6	4:30 6	4:30 6	4:30 6	
2	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN ESTA LABOR A REALIZAR

8.A. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pica	✓	Hacha de un filo	
Pala	✓	Azada	
Azadón	✓	Hacha	
Guadaña		Machete	
Machete	✓	Podadora	
Otro de cual		Otro	
Serrucho		Guadaña	
Otro especifique		Otro	
Otro de cual		Otro	

8.B. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Arnés		Arnés de cuerpo completo	✓
Línea de vida horizontal		Eslinga	✓
Línea de posicionamiento		Mosquetón de acero	✓
Barras de posicionamiento			
Sistema de posicionamiento			
Cinturón		Otro	
Polea			
Absorbedor de energía			
Mosquetón Autobloqueo			

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA TAREA

El trabajo se ejecutará únicamente en caso de no encontrarse en condiciones de lluvia (Art. 2.2.5.1.23 Decreto 1072 Trabajo Seguro)

10. ACTUACIÓN ANTE CONDICIONES DE SALUD ¿PRESENTA ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE Y MARQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA TAREA

CASCO BARBUQUEJO	GUANTES DE CARNAZA	ARNÉS DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE
GAFAS OSCUROS	GUANTES DE PROTECCIÓN	ANCLAJE PORTÁTIL	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
BASES TRANSPARENTES	CALZADO DE SEGURIDAD	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS
TAPA OIDO DE COPA	BOTAS PANTANERAS	CALZADO DE LÍNEA ANTIESTÁTICA	MOSQUETÓN
TAPA OIDO INSERCIÓN	CARETA	CALZADO DE POSICIONAMIENTO	DISPOSITIVOS ANTIESTÁTICOS
TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS N95	ELEMENTOS DE RESTRICCIÓN	CHALECOS PARA TRABAJO NOCTURNO
UNIFORME		ARTÍCULOS DE VISIBILIDAD	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	1 DIC/25	2 DIC/25	3 DIC/25	4 DIC/25	5 DIC 25	6 DIC 25
	Ihan Gonzalez	Ihan Gonzalez	Ihan Gonzalez	Ihan Gonzalez	Ihan Gonzalez	Ihan Gonzalez
	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am
	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez
	Ivan Archila	Ivan Archila	Ivan Archila	Ivan Archila	Ivan Archila	Ivan Archila
	LuA	LuA	LuA	LuA	LuA	LuA
	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30
	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor G.	Victor G.	Victor G.
	Fin Jorn	Fin Jorn	Fin Jorn	Fin Jorn	Fin Jorn	Fin Jorn
	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	12:00 pm

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

2. FECHA DE INICIO Y HORA	5 Dic 2025 7:30	3. PUESTO DE TRABAJO	Bloque Primario Trapiche
4. FECHA DE TERMINACIÓN Y HORA	9 Dic 2025 12:00	4. ACTIVIDAD A DESARROLLAR	

6. PERSONAL AUTORIZADO Y ACTIVIDADES

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CURSO DE ALTURAS VIGENTE	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL VIGENTE
1	Yeiner Gar	1005101293	Operador	SI	SI	SI
2	Andrés Oporia	5565491	AYUDANTE	SI	SI	SI
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

7. FIRMAS DEL EJECUTOR Y TRABAJADOR AUTORIZADO EN LA LABOR

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1							
2							

8. SELECCIONE LOS TIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS

		ALTURAS
	Diligenciar el registro de trabajo en alturas	
	Verificación de salud mental y emocional	
	Topografía de ubicación de puntos de anclaje	
	Verificación del EPP	
	Llamada a puntos de no precipitar	
	Asignación a actividad personal	
	Reconocimiento de riesgos	
	Otros	

9. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN LA TAREA A REALIZAR

9.1. GESTIÓN DE HERRAMIENTAS

Pica	Punta de pica	
Pala	Cinta	
Azadón	Arco	
Pedalinga	Tijeras	
Machete	Archivo	
Lima de cola	Lima	
Serrucho	Segueta	
Otra manual	Otros	
Otra de poder		

9.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Computador	Aseguramiento
Unidad Motriz de	Soldadura
Otra de perforación	Soldadura de arco
Barra de perforación	
Barra de perforación	
Compresor	Otros
Taladro	
Medidor de profundidad	
Soldadura Eléctrica	

10. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA	El personal al presente documento del registro con especificación en procesos HSE y El Análisis de Trabajo Seguro

11. AUTOEVALÚE SU CONDICIONES DE SALUD ¿PRESENTA ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDAD?



12. SELECCIONE Y ANOTE CON UNA X LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA TAREA A REALIZAR

	✓	N/A
CASCO BARBUQUEJO	✓	
GUANTES DE CARNAZA	✓	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	
GUANTES DE PRECISIÓN	✓	
GAFAS POLICARBONATO	✓	
GUANTES AISLANTES		
TAPA OIDOS DE COPA		N/A
BOTAS CAUCHERAS	✓	
TAPA OIDOS INSERCIÓN		N/A
CAMISA	✓	
CAMISAS ALARGADAS		N/A
TAPONERAS ANTI	✓	
OTROS		

13. SELECCIONE Y ANOTE CON UNA X LOS EQUIPOS A UTILIZAR PARA LA TAREA A REALIZAR

	✓	N/A
ARNES DE SEGURIDAD		N/A
PUNTO DE ANCLAJE	✓	
ARNES PEATÓN		N/A
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
ARNÉS	✓	
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	✓	
ROSQUILLÓN	✓	
CINTAS DE POSICIONAMIENTO	✓	
ESTRUCTURAS METÁLICAS	✓	
ESLINGA DE POSICIÓN	✓	
COMUNICACIONES PUNTO DE APOYO	✓	
OTROS DE ARNÉS	✓	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

10. RESPONDE LAS CONDICIONES DE SALUD PARA LA TAREA CON UN (X) CONFORME LA OBSERVACIÓN

11. INSPECCIONA PARA QUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN

Nota: El proyecto debe realizar la inspección de los criterios propuestos al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

12. INSPECCIONA QUE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN

Trabajador No.	10A	10B	10C	10D	10E	10F	10G	11A	11B	11C	11D	11E	11F	11G	12A	12B	12C	12D	12E	12F	12G
1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

Observaciones de su condición de salud actual

Observaciones de su cumplimiento de criterios EPP

Observaciones de su cumplimiento de criterios EPCC

13. SELECCIONE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A EMPLEAR SEGÚN ACTIVIDAD A TAREA

Trabajador No.	ANTIDAD A EMPLEAR		ELEMENTOS DE ANCLAJE				CONECTORES								
	PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL	PUNTO DE ANCLAJE MOVIL	ESTRUCTURA DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNES DE CUERPO COMPLETO	ESLINGA EN Y	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA RETRACTIL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	ABSORBEDORES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SISTEMA DE RESCATE E.C.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

14. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A EMPLEAR VERIFICANDO LOS CRITERIOS ESPECIFICOS

CT	V	V	N/A
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
V			
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS DE ACTIVIDAD CRÍTICAS Y PELIGROSAS Y SUS SIGUIENTES CRITERIOS

N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
PA	PA		
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		

Nota 1: El trabajo en alturas de acuerdo a la Ley el análisis de riesgos para definir todos los sistemas de protección y prevención para la salud y vida, considerando para ello la evaluación de la capacidad física de los trabajadores el sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el montaje y desmontaje de andamios y el trabajador que realice maniobras para izaje de personas, deben contar con capacitación certificada en la seguridad de uso de los operaciones y montaje de los fabricantes y/o la norma nacional o internacional aplicable.

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

2.1. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

2.2. PARA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: Yo verifiqué el ítem de este trabajo, que todos los elementos requeridos para realizar el trabajo de la actividad son seguros y están disponibles en el sitio de trabajo y que los trabajadores autorizados están capacitados para realizar el trabajo de manera segura.

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fecha	15 DIC 25	16 DIC 25	17 DIC 25	18 DIC 25	19 DIC 25		
Nombre	Jhon Gord	Jhon Gord	Jhon Gord	Jhon Gord	Jhon Gord		
Firma							
Hora	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

2.3. PARA PERSONA COORDINADORA DE TRABAJO EN ALTURAS: Yo verifiqué el ítem de este trabajo, que todos los requisitos previos para el trabajo de la actividad son seguros y están disponibles en el sitio de trabajo y que los trabajadores autorizados están capacitados para realizar el trabajo de manera segura.

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre	Victor G.	Victor G.	Victor G.	Victor G.	Victor G.		
Firma							
Hora	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

2.4. PARA PERSONA RESPONSABLE DE AUTORIZAR EL PLAN DE RESCATE: Verifiqué que todos los equipos requeridos para el rescate de trabajos en altura, incluyendo el equipo de protección personal y el equipo de rescate, estén disponibles en el sitio de trabajo.

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre	Juan Andre	Juan Andre	Juan Andre	Juan Andre	Juan Andre		
Firma							
Hora	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

2.5. PARA PERSONA RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN TRABAJO: Yo verifiqué que los equipos requeridos para el trabajo de trabajos en altura, incluyendo el equipo de protección personal y el equipo de rescate, estén disponibles en el sitio de trabajo.

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

3. CONDICIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PERSONAL DE TRABAJO

3.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS: Solo el personal autorizado y capacitado podrá realizar trabajos en altura. Cualquier persona que no esté autorizada no podrá ingresar al área de trabajo.

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES

3.2. Verifiqué que el personal que va a realizar trabajos en altura cumple con los requisitos de aptitud médica y formación establecidos en la Resolución 4272 de 2021.

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

3.3. Verifiqué que el personal que va a realizar trabajos en altura cuenta con el certificado de aptitud médica vigente para trabajo en alturas.

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre	Victor Gord	Victor Gord	Victor Gord	Victor Gord	Victor Gord		
Firma							
Hora	Finalizo 5:00pm	Finalizo 5:00pm	Finalizo 5:00pm	Finalizo 5:00pm	Finalizo 5:00pm		

Scanned with CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigación Producente	Ciudad:	Producente
Frente de obra:	Arlequín		
Fecha de inicio:	1 Diciembre 2025	Fecha de finalización:	6 Diciembre 2025
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	DESMONTE DE VEGETACIÓN DEL TALUD		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Macheta, azadón, picas, guadaña, motosierra, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria)		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropecones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP. 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del area de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Desmonte manual de talud (descorte)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	

Scanned with CamScanner

Desmonte manual de talud (Poda de arboles)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: Vibraciones por manipulación de motosierra	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Desmonte mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caida de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Acopio y cargue de residuos vegetales y otros	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Pausas activas. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: Manipulación manual de cargas y posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Scanned with CamScanner

Organizacion de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, infección, afectaciones al estado de salud	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehiculo 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehiculo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de transito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de transito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Hadly Prada lopez	1098822751	Hadly Prada
Mauricio villamizar	1005541892	
Alexander Prada lopez	13745736	Alexander Prada
Jefferson GONZALEZ	5823211	
Luis A. Torres A	1098994172	
José OSPINO	1064074060	

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Alexander Gamboa	1.093 760 722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91 265 828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS


1	4	DIC	2025	7:30	Huckorp		
2	6	DIC	2025	12:00	15 mts	1	

	NOMBRE Y APELLIDO						LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Mauricio V.	1007574 1892	Operador	SI	SI	SI							
2	Huckey Prado	1067845 751	operador	SI	SI	SI	Huckey	Huckey	Huckey	Huckey	Huckey	Huckey	
3	Alexander P.	13745 936	Ayudante P.	SI	SI	SI							
4	Jeferson Cortez	58232 11	Ayudante P.	SI	SI	SI							
5	Jorge O	1007845 060	Ayudante P.	SI	SI	SI							
6	[illegible]	[illegible]	Aux Perf	SI	SI	SI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7													
8													
9													
10													

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

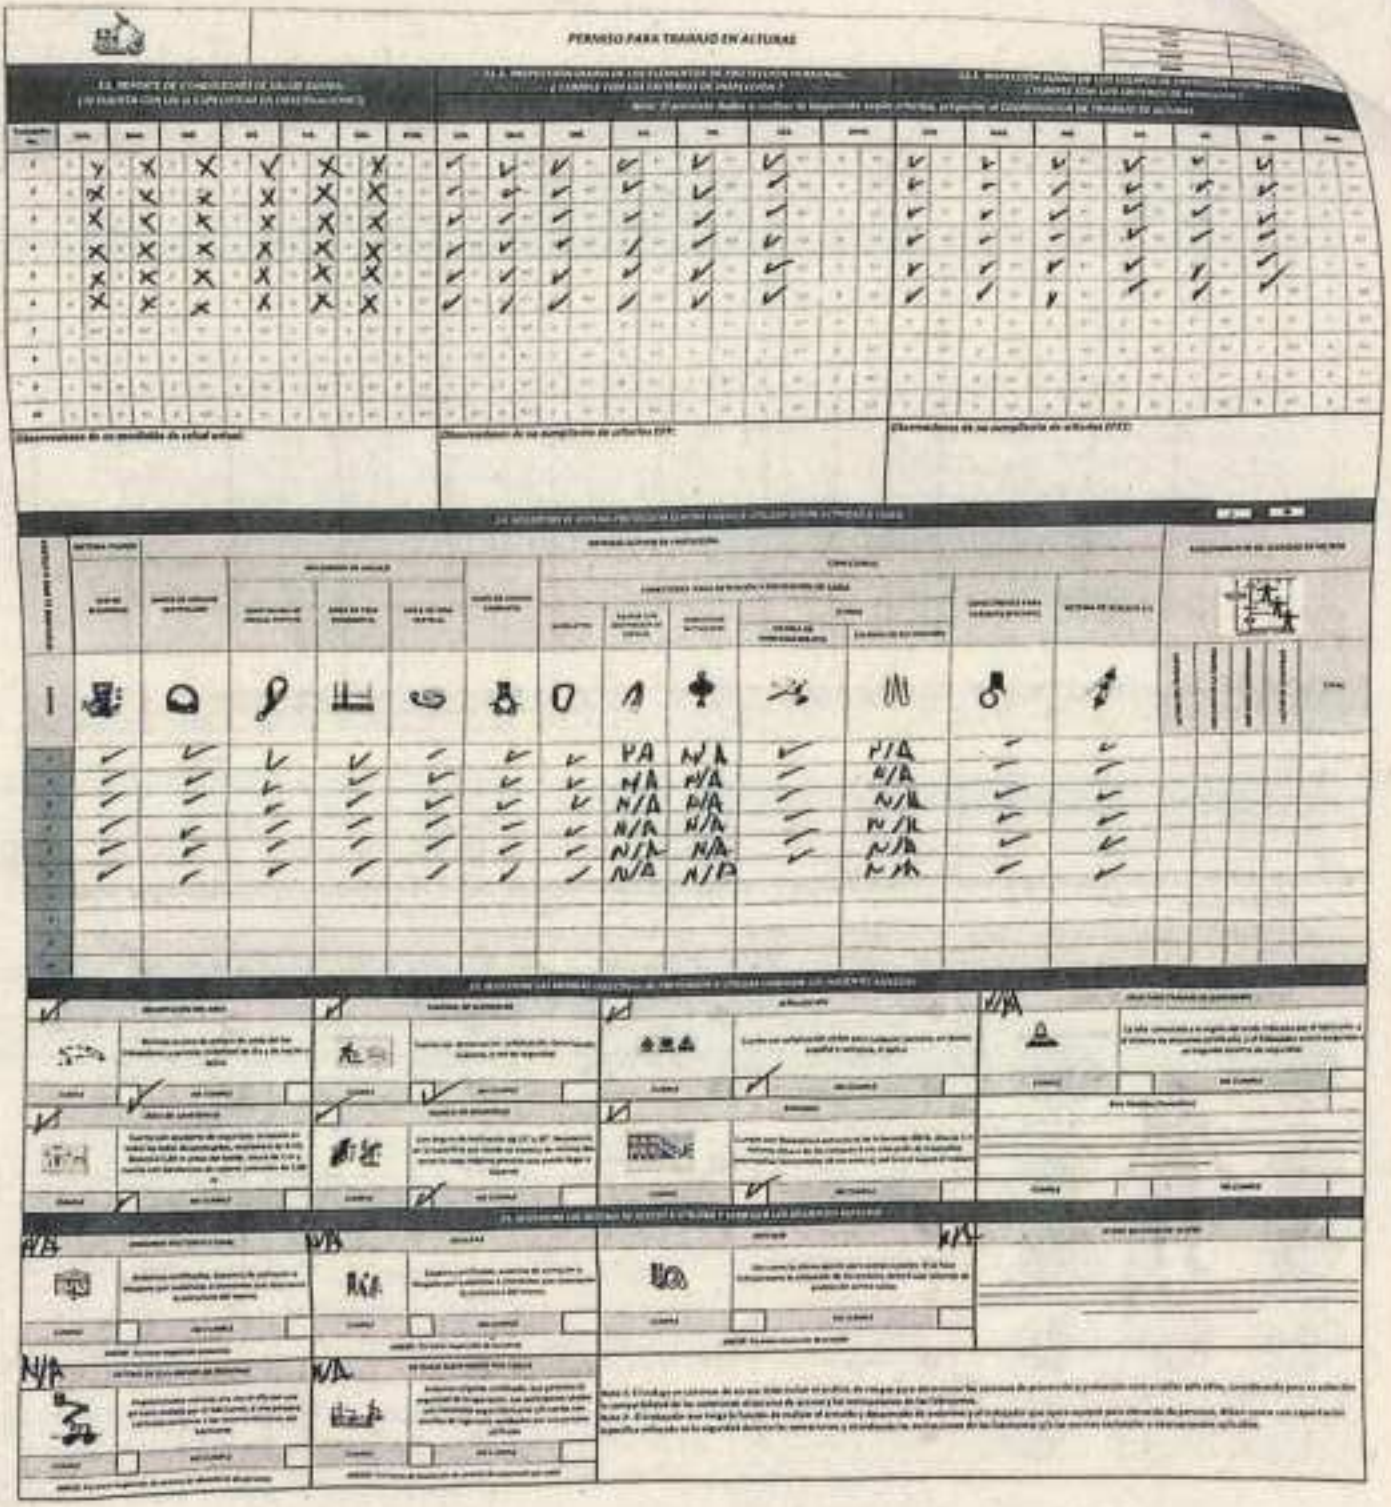

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	1 DIC 2025	2 DIC 2025	3 DIC 2025	4 DIC 2025	5 DIC 2025	6 DIC 2025
	Thor Gonzalez	Thor Gonzalez	Thor Gonzalez	Thor Gonzalez	Thor Gonzalez	Thor Gonzalez
	7:30 a	7:30 am	7:30 a	7:30 am	7:30 am	7:30 am
	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G
	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30
	Juan Andres	Juan Andres	Andres A	Juan Andres	Juan Andres	Juan Andres
	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30
	Victor G	Victor Gon	Victor Gon	Victor Gon	Victor Gonz	Victor G.
	Fin tarde	Fin tarde	Fin tarde	Fin tarde	Fin tarde	Fin tarde
	5:00	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	12:00 pm

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
ATS

CÓDIGO:	SST-F-55
FECHA:	15/08/2023
VERSIÓN:	2
PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Aclones		
Fecha de Inicio:	9 Diciembre/25	Fecha de finalización:	13 Acumbre 2025
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	DESMONTE DE VEGETACIÓN DEL TALUD		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Macheta, azadón, picas, guadaña, motosierra, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria)		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Desmonte manual de talud (desyerbe)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	

Scanned with CamScanner

Desmonte manual de talud (Poda de arboles)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: Vibraciones por manipulación de motosierra	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Desmonte mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caida de objetos)	Golpes, contusiones; aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Acopio y cargue de residuos vegetales y otros	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Pausas activas. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: Manipulación manual de cargas y posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Scanned with CamScanner

Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehículo. 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehículo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de tránsito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACION DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Harley Prada lopez	TI 1088227751	Harley Prada
Mauricio villamizar	1005541892	
Alexander Prada lopez	1374573G	Alexander Prada
Jeiffer Gonzalez	5823211	
Luis A. Tarazona	1098994477	
José Ospino	TI 1007190681	

IDENTIFICACION RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Alexander Gonzalez	1.098.750.722	

IDENTIFICACION DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91265828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

2. FECHA DE INICIO Y HORA	9	DIC	2015	7:30	4. CENTRO DE TRABAJO	Halcon	
3. TERMINACIÓN DE LA TAREA	13	DIC	2015	12:00	5. ALTURA APROXIMADA	15 mts	6. CONSECUTIVO 2

8. PERSONAL AUTORIZADO Y ACREDITADO A TSC

7. FIRMAS DEL Y DE LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS DE TA

	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ACCESO DE TSC	ACREDITACIÓN VIGENTE EN TA	9 DIC	10 DIC	11 DIC	12 DIC	13 DIC	OBSERVACIONES
1	Mauricio U	1007[illegible] 1842	Operario	SI	SI	SI						
2	Harley Prado	1004[illegible] 751	operador	SI	SI	SI	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley	
3	Alexander R	123745 936	Ayudante P.	SI	SI	SI	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	
4	SEPERSON LOPEZ	58232 11	AYUDANTE P.	SI	SI	SI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	JOGÉ O	1058[illegible] 060	Ayudante P.	SI	SI	SI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	Ayu Perf	SI	SI	SI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7												
8												
9												
10												

9. REVISIÓN EL ÁREA DE TRABAJO Y TAREA

	Reconocimiento de riesgos en sitio de trabajo	
	Prioridades de salud ocupacional y ambiental	
	Topografía de observación de puntos de anclaje	
	Verificación de salud	
	Llenado e inventario de los permisos	
	Accesorios a colocarse durante	
	Circunstancias de salud	
	Otros	

10. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE TRABAJO EN ALTURAS

10.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

	Pica	✓	Pistola de 14 libras
	Palo	✓	Cuchillo
	Martillo	✓	Alicate
	Machete		Destornillador
	Cinta de vida		Lima
	Serrucho		Maquina
	Otra herramienta		Otros
	Tarraja de 8 libras		

10.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

	Compresor		Martillo neumático
	Unidad hidráulica		Esmeril
	Cono de perforación		Maquina de soldar
	Barra de perforación		
	Broca de perforación		
	Compresor		Otros
	Pala		
	Modelo de perforación		
	Maquina hidráulica		

11. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Recomendación y mantenimiento de la tarea	Se asume el permiso documental de ingreso correspondiente en formato AP-F-01 Análisis de Trabajo Seguro

12. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS?




13. REVISIÓN E INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREVIOS AL INICIO DE LABORES

CASCO PARA ESCALADA	✓	GUANTES DE CABRETA	✓
GAFAS PERSONALES	✓	GUANTES DE PROTECCIÓN	✓
BANDO TRANSLÚCIDO	✓	ZAPATOS REGISTRADO	✓
CINTA VIDA DE CERA	NA	BOTAS PANTANEROS	✓
FAJA BOLSO BIFURCADA	NA	CAREZA	✓
CAPARAZONES ANTIRUIDO	NA	CAPARAZONES ANTI	✓
CAPARAZONES ANTIRUIDO	✓		

14. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA TAREA, SEGÚN ANÁLISIS

ARNES DE SEGURIDAD	NA	PUNTOS DE ANCLAJE	✓
ARNES PORTÁTIL	NA	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓
LÍNEA DE VIDA PERFIL	✓	ARNES	✓
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	MOSQUETÓN	✓
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS	✓
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓	CONECTORES PARA CAMPO ANCHO	✓
MOTOR DE ARRANQUE	✓		

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

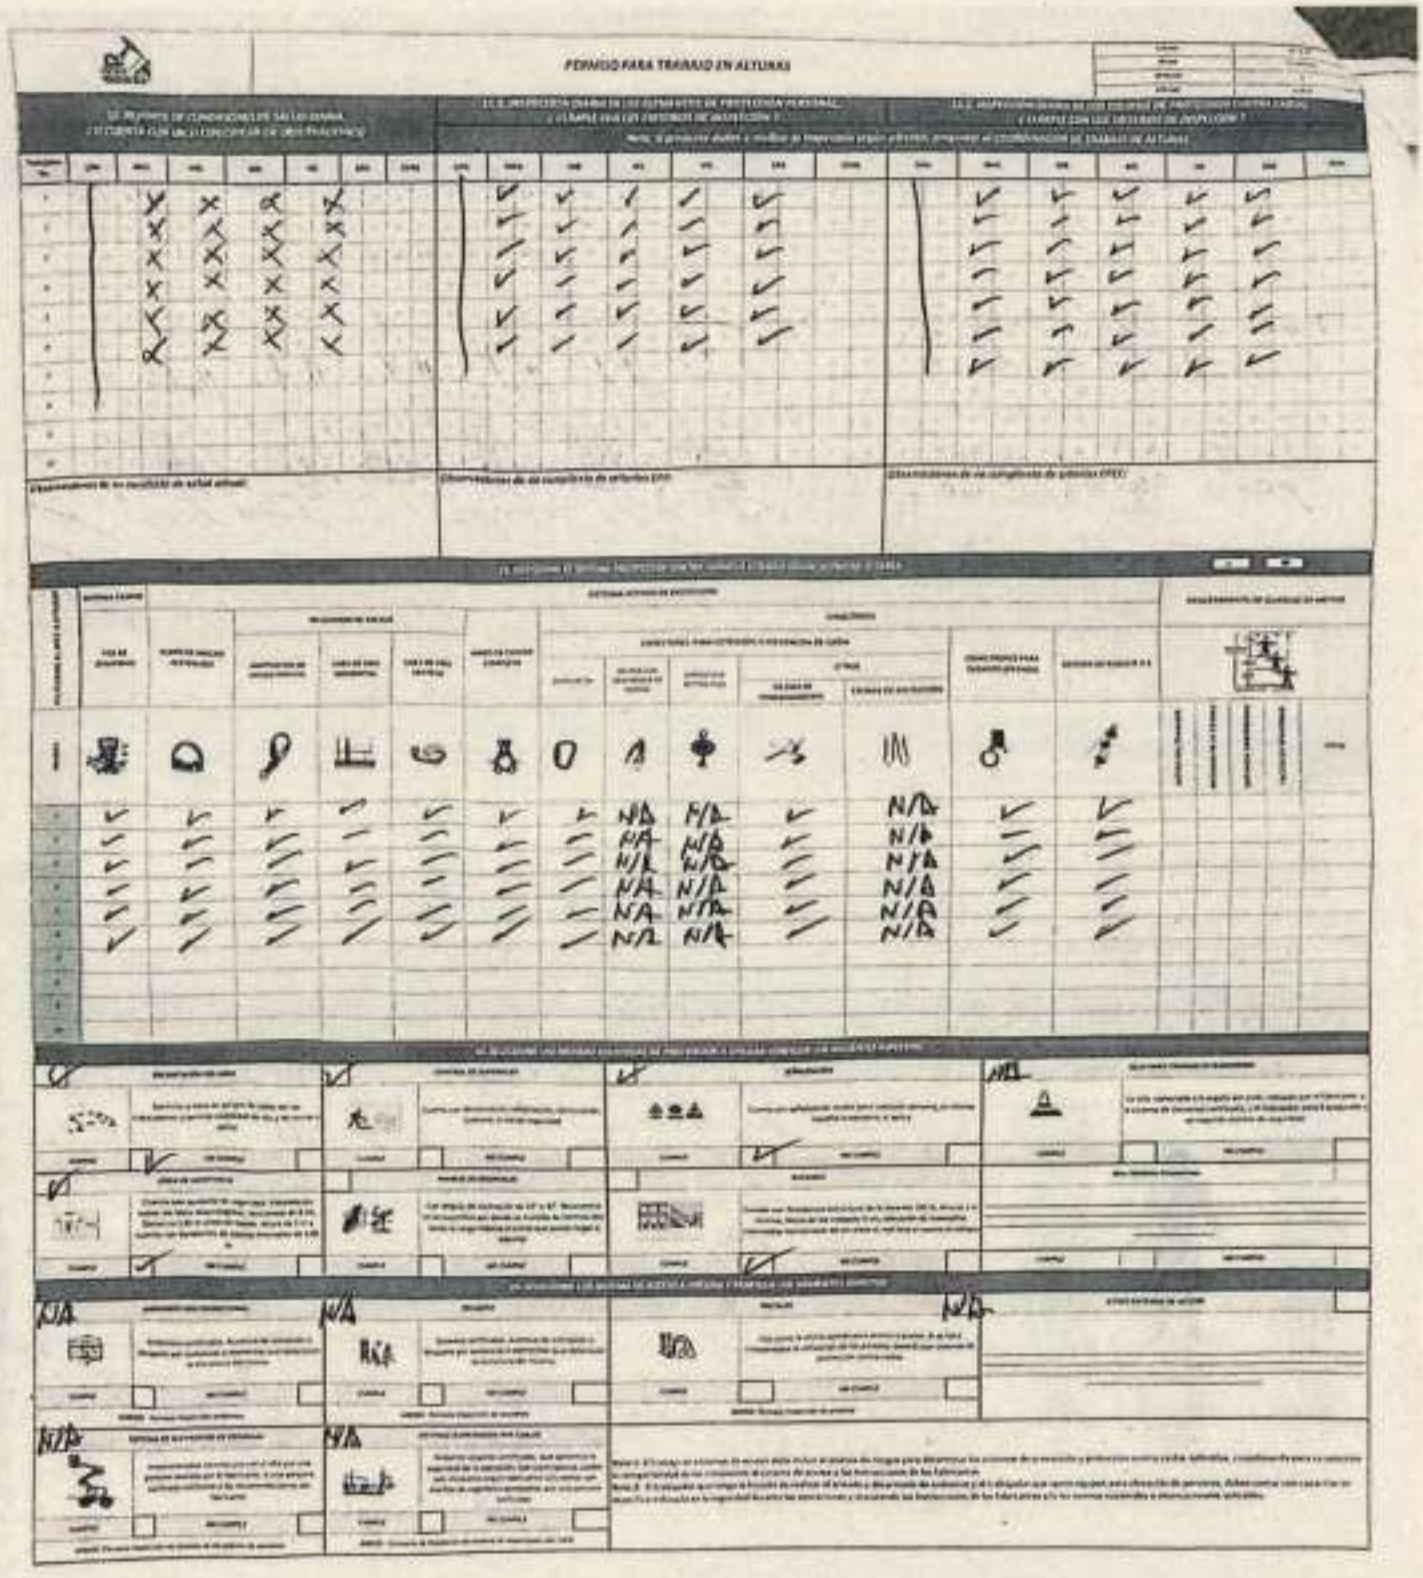

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

11. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TRABAJO

11.1. TAREA PERSONAL QUE AUTORIZA EL TRABAJO

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre		9 Dic/25 Jhon Gonzalez 7:30 am	10/Dic/25 Jhon Gonzalez 7:30 am	11/Dic/25 Jhon Gonzalez 7:30 am	12/Dic/25 Jhon Gonzalez 7:30 am	13/Dic/25 Jhon Gonzalez 7:30 am	
Firma							
Hora							

11.2. DE MAS COORDINACIÓN DE TRABAJO DE ALTURAS

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre		Victor G 7:30 am	Victor G 7:30	Victor G. 7:30	Victor G 7:30 am	Victor Gamboa 7:300	
Firma							
Hora							

11.3. OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN ACTIVIDAD AL TRABAJO

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre		Juan Andres Leal A 7:30 am	Juan Andres Leal A 7:30	Juan Andres Leal A 7:30 am	Juan Andres Leal A 7:30 am	Juan Andres Leal A 7:30 am	
Firma							
Hora							

11.4. OTRAS ACTIVIDADES DE ALGUNA DE LAS PERSONAS

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

12. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE TRABAJO

12.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINACIÓN DE ALTURAS, EMPLEADOR DE ALTURAS EL PLAN DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE	SOLDADO

12.2. PERSONAS AUTORIZADAS A LA COORDINACIÓN DE QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINACIÓN DE ALTURAS, EMPLEADOR DE ALTURAS O PLAN DE TRABAJO

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

12.3. OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO EN QUE AUTORIZA EL TRABAJO COORDINACIÓN DE ALTURAS

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre		Victor Gam 5:10 pm Fin tarea	Victor Gam 5:00 pm Fin tarea	Victor Gam 5:00 pm Fin tarea	Victor Gam 5:00 pm Fin tarea	Victor Gam 12:0 pm Fin tarea	
Firma							
Hora							

Scanned with CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigación Piedecuesta	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Halcones		
Fecha de Inicio:	15 Diciembre /25	Fecha de finalización:	19 Diciembre /25
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFILACIÓN DE TALUD MECANICO Y/O MANUAL		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Pala, pica, azadon, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria)		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera)		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	✓	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1 Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3 Trabajar en equipo 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar alerto a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Alender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Perfilación manual de talud (tiempo libre)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4 Verificar puntos de anclajes 5 Diligenciamiento de permisos necesarios 5 Trabajar en equipo 7 Alender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 8. Mantener condiciones de orden y aseo 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 10. Realizar pausas activas 11 Inspección preoperacional de EPCC y EPI 12. Uso adecuado de EPCC y EPI 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras tor grado	
Perfilación mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	1.Inspección del área de trabajo 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4 Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario 5. Demarcación de áreas seguras 6. Alender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 7. Mantener áreas en orden y aseo 8 Pausas activas. 9. Personal idóneo para manejar la retroexcavadora 10. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	

Scanned with CamScanner

Movimiento de material y cargue de material (escombros)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Atender a señalización. 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Fenómenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehículo. 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehículo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de tránsito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Fenómenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Hurley Prada Lopez	1049882751	Hurley Prada
Mauricio Villamizar	1005541893	
Luis A. Fuentes O.	1098 692 427	
Jose Ospino	1090 971060	
JEFFERSON GONZALEZ	5823211	
Alexander Prada Lopez	1374/5736	Alexander Prada

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Alexander	1.042.760.722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91265828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. FECHA DE INICIO Y HORA	15	Dic	2015	7:30	4. CENTRO DE TRABAJO	Huilcanes Santo	5. NÚMERO DE TRABAJADORES	3
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	19	Dic	2015	12:00	6. ACTIVIDAD ESPECÍFICA			

3. PERSONAS AUTORIZADAS Y RESPONSABILIDAD

7. FECHAS DEL ESTUDIO Y TRABAJADORES AUTORIZADOS EN CADA UNA DE ELLAS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿Conoce los riesgos de la tarea?	¿Conoce las medidas de control?	¿Conoce el plan de emergencia?	FECHAS DE TRABAJO: 15 Dic	16 Dic	17 Dic	18 Dic	19 Dic	HORAS	DIURNAS
1	Hurley Pedo	1098822751	operador	SI	SI	SI	Hurley	Hurley	Hurley	Hurley	Hurley		
2	Alexander P. Gonzalez	1372457	Ayunte P.	SI	SI	SI							
3		5887234	AYUNTE P.	SI	SI	SI							
4	Mauricio V.	1005541892	operador	SI	SI	SI							
5	JOSÉ OSPI	7656174060	AYUDANTE	SI	SI	SI							
6	LUIS A. FIL	[illegible]	AUX PERF	SI	SI	SI							
7													
8													
9													
10													

4. Diligencie la lista de chequeo a tarea

		¿Cumple? SI	NO
	Revisión de seguridad de arnés	✓	
	Mantenimiento de salud mental y motivación		
	Topografía de instalación de puntos de anclaje		
	Verificación de salud		
	Limpieza y inspección de los anclajes		
	Encuentro o encuentro terminal		
	Verificación de salud		
	Otros		

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA TAREA

5.1. DE CAÍDA DE ALTURA

Pie	✓	Arnés de 3/4 Dim	
Pies	✓	Cinch	
Anclaje	✓	Horca	
Polipasto		Tobillo	
Mosquetón		Pulsera	
Línea de vida	✓	Kit	
Retráctil		Arguelo	
Línea suspensora		Otros	
Línea de anclaje			

5.2. PROTECCIÓN DE CUERPO

Guantes		Protección auditiva	✓
Casco	✓	Respirador	
Gafas de protección		Protección de cara completa	
Overol de protección			
Chaleco de protección			
Zapatos	✓	Otros	
Cinta			
Máscara de protección			
Máscara de polvo			

6. Identifique y controle los peligros de la tarea

En caso de presentar diferencias de opinión entre trabajadores se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el Art. 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015

8. ANTECEDENTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SALUD

¿Presenta alguno de estos síntomas?




9. SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CASCO BARBUQUEJO	✓	GUANTES DE CARNAZA	✓
GAFAS ANTIVAHO	✓	ESCUDO DE PROTECCIÓN	✓
CALZADO TRADICIONAL	✓	ARNESES DE CUERPO	✓
GAFAS USO DE COPA	NA	BOTAS PANTANERAS	✓
GAFAS USO DE SOLDADURA	NA	CAMISA	✓
CALZADOS ANTIESTÁTICOS	NA	CALZADOS DIELÉCTRICOS	✓
CASCO	✓		

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	NA	PROTECCIÓN AUDITIVA	
MASCARILLA PARA POLVO	NA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	
CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	✓	ARNÉS	✓
CHALECO CON REFLECTIVIDAD	✓	MOSQUETÓN	✓
GUANTES DE MANIPULACIÓN	✓	ELEMENTOS DIELÉCTRICOS	✓
PROTECCIÓN DE MANOS	✓		
PROTECCIÓN FACIAL			
CAPUCHA			

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

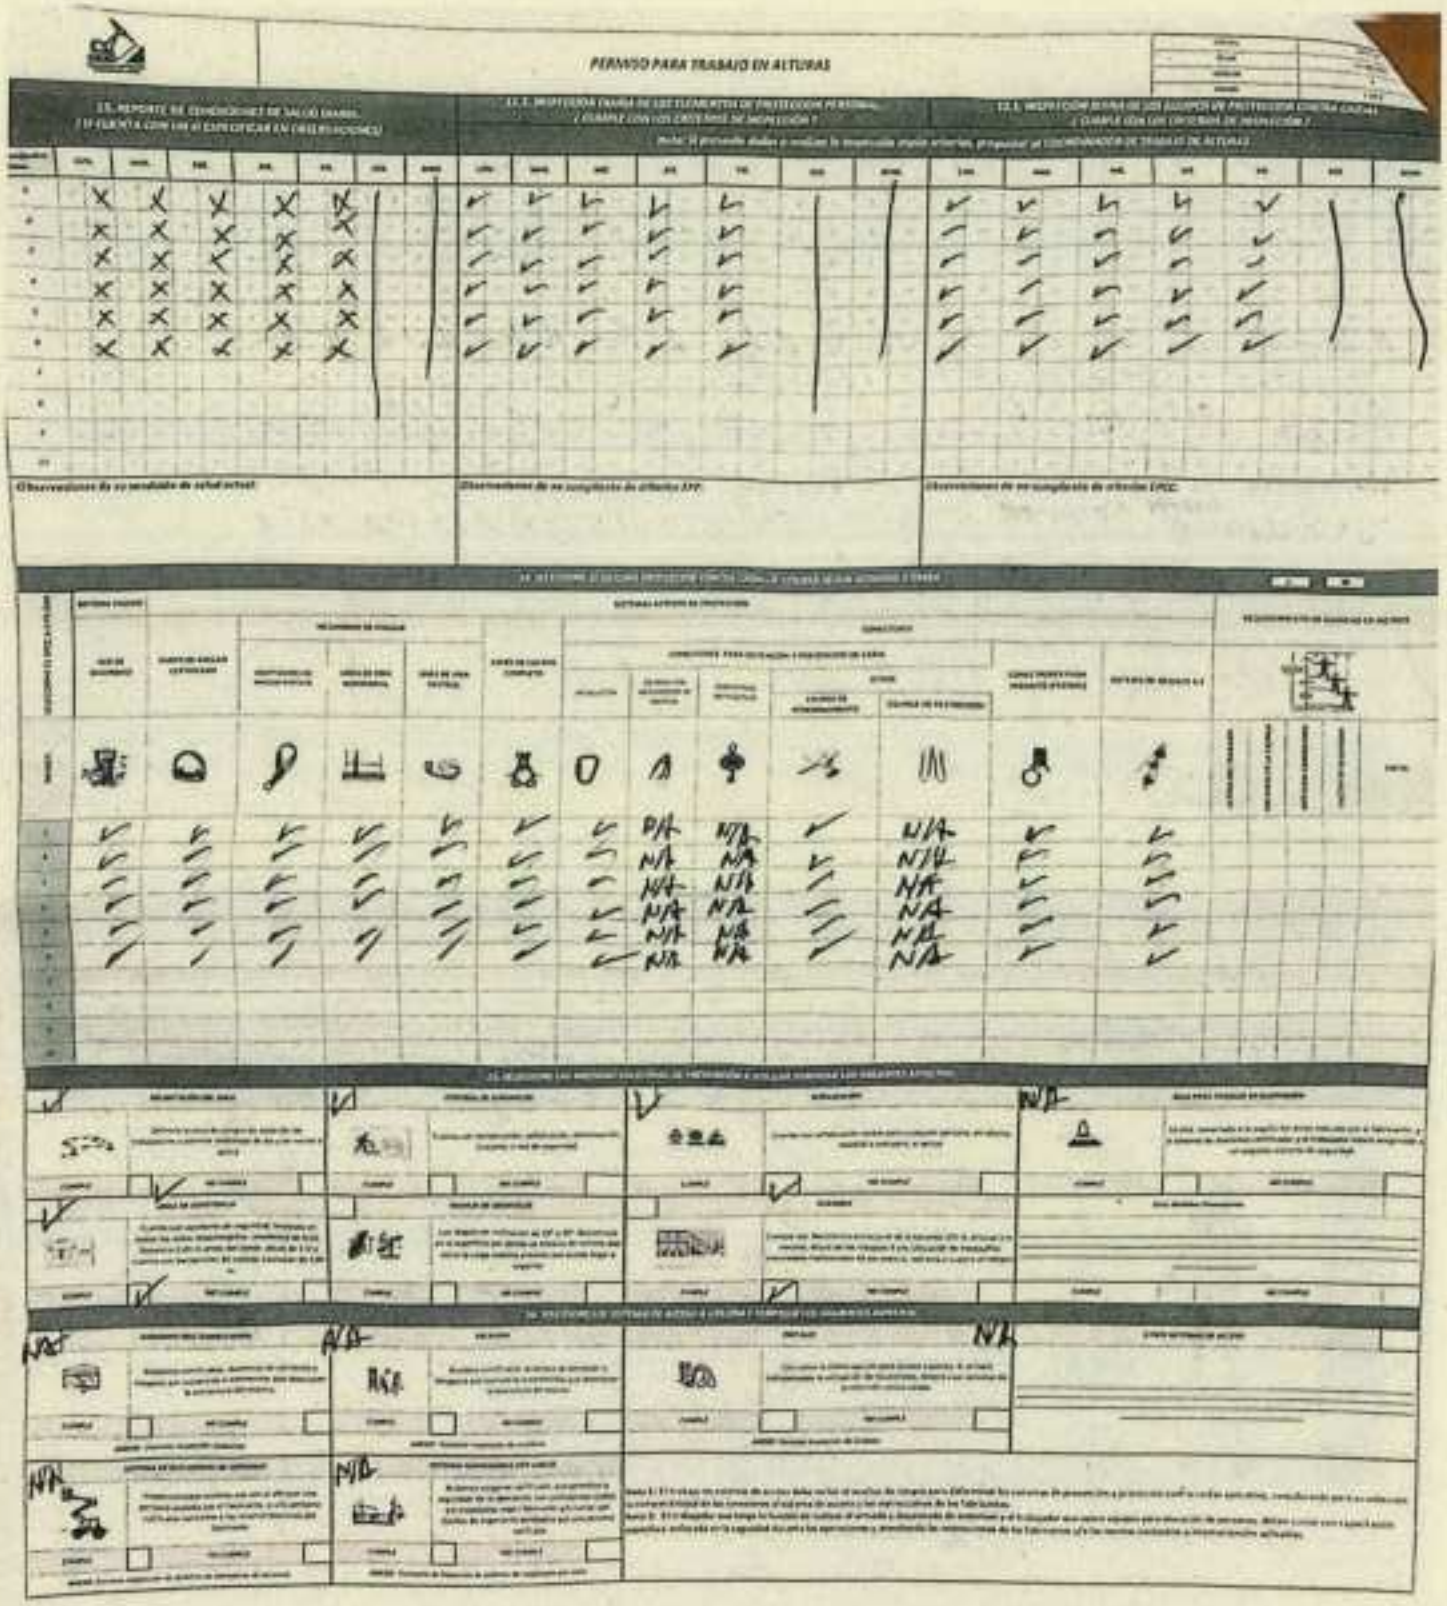

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Fecha	15 DIC 25	16 DIC 25	17 DIC 25	18 DIC 25	19 DIC 25		
Nombre	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez		
Firma							
Hora							

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez		
Firma							
Hora							

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre	Juan Andres Luna	Juan Andres Luna	Juan Andres Luna	Juan Andres Luna	Juan Andres Luna		
Firma							
Hora							

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

NOMBRE PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CHARLA	OBSERVACIÓN

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez	Victor Gonzalez		
Firma							
Hora	Fin tarea 5:00pm	Fin tarea 5:00pm	Fin tarea 5:00pm	Fin tarea 5:00pm	Fin tarea 5:00pm		

Scanned with CamScanner

ANEXO NO.5: INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

ELABORADO POR:

LISETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PIEDECUESTA

01 AL 31 DE DICIEMBRE

2025

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA durante la ejecución de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimientos en masa en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos especificos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander, se busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 31 de diciembre de 2025; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

Frente de obra Halcón de Granada

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Desmonte y limpieza
- ✓ Perfilado a mano descolgado de talud
- ✓ Retiro de basuras y escombros
- ✓ Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad
- ✓ Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad
- ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m

Frente de obra Brisas de Primavera

- ✓ Replanteo topográfico
- ✓ Desmonte y limpieza
- ✓ Retiro de basuras del talud y acopio de escombros para su posterior retiro

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander. Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto, son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales.							

- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

- ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
9.0 Kg	2.0 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Piedecuesta, entidad responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
En el periodo relacionado se generaron **2.0 Kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a una empresa legalmente constituida para realizar el aprovechamiento de este tipo de residuos, promoviendo así la economía circular y reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios. Este proceso facilita la reincorporación de los materiales reciclables en la cadena productiva, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad y al cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Manejo de material sobrante y RCD
De acuerdo con la planificación de la obra, durante el periodo de ejecución relacionado se realizaron, actividades de desmonte y limpieza, las cuales generaron volúmenes de material sobrante no aprovechable, dicho material fue dispuesto en la escombrera El Cairo (INVERNOTA S.A.S.); la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021. (ver Anexo No 2. Certificado de Disposición Final).

Es importante mencionar, que el material sobrante generado durante las actividades de descapote de la cobertura vegetal es acopiado temporalmente en áreas previamente definidas, y debidamente delimitadas dentro del área de intervención, garantizando su manejo ambiental adecuado. Este material se destina posteriormente a labores de reconformación y estabilización de taludes, así como a procesos de recuperación y mejoramiento del suelo, promoviendo su aprovechamiento sostenible y evitando la generación de residuos. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del Plan de acción socio ambiental y a la optimización de los recursos naturales intervenidos en el desarrollo del proyecto.

Así mismo, los vehículos destinados al transporte de material sobrante son llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 742 del Ministerio del Medio Ambiente (2017).

Actividades de Capacitación:
En el periodo relacionado se realizó capacitación a los trabajadores del frente de obra en el tema "Política Ambiental y política de Orden y Aseo" (ver Anexo No 3 Registro de Asistencia a Capacitación).



Punto Ecológico



Jornadas de Orden y Aseo en áreas de Campamento





Actividades de Capacitación ambiental





Retiro de material sobrante para disposición Final

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos										
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final										
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final										

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

9.0 / 9.0 *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica, los residuos se encuentran en almacenamiento temporal

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de Indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.							PASA - 02
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

BENEFICIOS

A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera:

- Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado.
- Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles.
- Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

Frente de obra Halcón de Granada

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Desmonte y limpieza
- ✓ Perfilado a mano descolgado de talud
- ✓ Retiro de basuras y escombros
- ✓ Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad
- ✓ Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad
- ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m

Frente de obra Brisas de Primavera

- ✓ Replanteo topográfico
- ✓ Desmonte y limpieza
- ✓ Retiro de basuras del talud y acopio de escombros para su posterior retiro

Para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas:

- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.

- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.

- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados.

- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.

- Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.

- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.

- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta que fue necesario realizar retiro de material sobrante hasta sitios de disposición final. (Ver anexo No 4 Documentos Volquetas).

RELACION DE VEHICULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
WFD 114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026
TTW 843	4308007289163000	31/10/2026	185644110	29/11/2026





Cerramiento perimetral para controlar emisiones de material particulado




Cerramiento perimetral para controlar emisiones de material particulado

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejo adecuado de material de construcción										
Mantenimiento de vehículos y maquinaria										

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

2 / 2 * 100 = 100%

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

2 / 2 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. Manejo de materiales de construcción: El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB verificara que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que							

cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

- El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.
- El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.
- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.
- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.

- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

Teniendo en cuenta las actividades del periodo relacionado, se manejaron las siguientes cantidades de materiales pétreos:

MATERIALES	CANTIDADES USADAS
Arena	3 m3
Cemento	10 bultos





Almacenamiento adecuado de materiales

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Identificación y obtención de los materiales de construcción										
Transporte y disposición de materiales										
Medidas de manejo para concretos										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador
1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción. 2. Aprovechamiento de material de construcción
Indicador de calificación
1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100 **8 / 8 * 100 = 100%** 2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100 **Cemento (bultos)** 10 / 10 * 100 = 100% **Arena** 3 m3 / 3 m3 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción.

La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que en caso de presentar derrames accidentales, será recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.

- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.



Perfilado a mano descolgado de talud



Excavación con acarreo libre en material granular

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

7 / 7 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de Indicador
Cuantitativo.
Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos						PASA-05
OBJETIVO						
Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.						
TIPO DE MEDIDA						
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación
BENEFICIOS						

En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo
- Prevenir la contaminación.
- Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía.
- Recircular aguas grises.
- Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos.
- Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento, dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.

- Se prohibe el vertimiento de residuos liquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- Inicialmente se cuenta con una unidad sanitaria portátil en el área destinada a campamento, del frente de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores. (ver anexo No 5 Mantenimientos Unidad Sanitaria)

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos





Unidad Sanitaria Portátil del frente de Obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transporte adecuado de ACPM										
Tanqueo de maquinaria con ACPM										
Aplicación del plan de contingencia										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto

Descripción del Indicador

- Indicador servicio de baños.
- Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.

Indicador de calificación
• No de US utilizadas/ No de US requeridas*100 1 / 1 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2025, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa: • Se realiza la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas. • Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.). • Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra. • Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego. • Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre. • Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.							

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.

- A partir de las condiciones identificadas en el área de influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

Actividades de Intervención Forestal

De acuerdo con lo constatado en el comité técnico realizado junto con la subdirección de Riesgo y Seguridad Territorial de la CDMB y al inventario forestal del proyecto, se recibió el Permiso de Tala Emitido por la autoridad Ambiental CDMB mediante el acta No 02 del 17 de Diciembre del 2025; en el mismo se estableció la medida de compensación y los compromisos adquiridos por el Consorcio Mitigación Piedecuesta para realizar la intervención arbórea requerida para el frente de obras Brisas de Primavera. (Ver Anexo No 6. Permiso de Tala).

En este sentido el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB iniciará las actividades de tala para el frente brisas de primavera, conforme al avance y planificación de actividades técnicas en el próximo periodo de ejecución.

En el periodo relacionado se realizó la intervención de los individuos arbóreos localizados dentro del área de influencia del frente de obra Halcón de Granada, correspondiente a las especies identificadas en el permiso de tala y aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La intervención se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el permiso otorgado, respetando las medidas de manejo ambiental definidas, con el fin de minimizar los impactos sobre el entorno y garantizar un manejo adecuado de los recursos forestales.

Queda pendiente la intervención de un individuo arbóreo de la especie *Persea americana* identificado con el nombre común aguacate.

FRENTE DE OBRA	INDIVIDUOS Y ESPECIES ARBÓREAS APROBADAS	INDIVIDUOS INTERVENIDOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
	Árboles	Árboles
Halcón de Granada	18	17




Intervención Forestal frente de obra Halcon de Granada




Intervención Forestal frente de obra Halcon de Granada




Intervención Forestal frente de obra Halcon de Granada

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural										
Manejo de la vegetación que permanecerá										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

8 / 8 * 100 = 100%

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

17 / 18 * 100 = 95 %

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización	PASA-.07

OBJETIVO

Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

BENEFICIOS

El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

- Se inicia la instalación de señalización requerida en áreas de campamento y de trabajo del frente de obra
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental





Señalización SST áreas de campamento





Señalización Informativa frente de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X

CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

1 / 1 * 100 = 100%

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.	PASA-08

OBJETIVO

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se mantienen las áreas de campamento y almacén temporal para el frente de obra, se cuenta con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y contará con señalización informativa y preventiva.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente.

- Los residuos sólidos generados en la instalación temporal son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos convencionales" y posteriormente son entregados a al operador del servicio de aseo del municipio.





Adecuación áreas de campamento temporal frente de obra Brisas de Primavera



Adecuación áreas de campamento temporal frente de obra Halcón de Granada

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Los Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalación de infraestructura temporal										
Desmantelamiento de las instalaciones temporales										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN CDMB PIEDECUESTA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100 NO APLICA
- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

4 / 4 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.9 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

3.9.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	**PGS-6.1-15**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Instalación de la oficina de atención a la comunidad Se ubica y adecúa la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de obras, con volante informativo que incluye número telefónico correo electrónico, para recibir, atender y brindar, respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexo de registro fotográfico y volante informativo) Se entrega el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al campamento ubicado en el barrio Brisas de Primavera I. (ver anexo de entrega de información de la oficina de atención a la comunidad)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

CRONOGRAMA DE EJECUCION										
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias									
EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD	X	X	X							

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

3.9.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	PGS-6.2-16
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la obra de mitigación y control a la erosión los datos específicos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Información a la comunidad El proyecto de mitigación y control a la erosión cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico. (ver anexo de registro fotográfico y de volante informativo) La información es entregada a los actores sociales del proyecto inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse. El viernes 5 de diciembre en el barrio Halcón de Granada se realiza reunión informativa de inicio de obras con participación de la comunidad del área de influencia directa de la obra, la CDMB, el Contratista, la Interventoría y la oficina de atención de Riesgo de Desastres de la alcaldía de Piedecuesta. (ver anexo de registro fotográfico y acta efectuada) **Atención a la comunidad en PQRS** Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto de mitigación y control a la erosión, los interesados, pueden acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, conforme las comunidades lo requieran, en la oficina de atención a la comunidad, en el horario de lunes a viernes. (ver anexo de formato de recepción de PQRS)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de mitigación y control a la erosión
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X		X							
ACTIVIDAD 2	X		X							

ACTIVIDAD 3	X		X								

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas 1 / número de reuniones realizadas 1 * 100 = 100%	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas 30 / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales 30 * 100 = 100%	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas 27 / número de actores sociales invitados 30 * 100 = 90%	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

3.9.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar. Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Levantamiento de actas de vecindad El Contratista, realiza 46 actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente se informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor. El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad a la fecha elaboradas para la obra de mitigación y control a la erosión, para los casos de personas que no colaboran con la elaboración del documento, el Contratista realiza la actividad con un testigo. En el presente periodo se realizaron 13 actas de vecindad de inicio en los barrios Halcón de Granada y Granadillo, para la obra a desarrollar en estos dos sectores del municipio de Piedecuesta. (ver anexo de registro fotográfico y de las actas de vecindad efectuadas) **Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.** Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad

ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X	X	X							
ACTIVIDAD 2	X	X	X							
ACTIVIDAD 3	X	X	X							

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra 13 / número de actas de vecindad realizadas 13 * 100 = 100%	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados 13 / número de actas de vecindad realizadas 13 * 100 = 100%	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios

Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

3.9.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se está construyendo una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

3.9.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria	PGS-6.5-19
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada. Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar. En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron capacitación el miércoles 10 de diciembre en temas de cultura vial. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X	X	X							

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de mitigación y control a la erosión
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales.

3.9.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	PGS-6.6-20
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).	

CDMB	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB CONTRATO No. 210-16223-6 **PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL**	

ACCIONES DESARROLLADAS
El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal. A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en Piedecuesta Emplea o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se postulan los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador, en caso de requerirse de estas acciones. Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron formación en temas varios de fortalecimiento del valor del emprendimiento y oficina de atención a la comunidad, el miércoles 10 de diciembre. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Piedecuesta y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERIODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X									
ACTIVIDAD 2	X									
ACTIVIDAD 3	X	X	X							
ACTIVIDAD 4	X	X	X							
ACTIVIDAD 5	X	X	X							

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en la localidad y área de influencia 6 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 8 * 100 = 75%	Mano de obra del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra loca 6 / registro en planillas de pago de seguridad social 6 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados

Tipo de Indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

3.9.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	PGS-6.7-21
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Conforme se está desarrollando una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB, este proyecto no aplica, ni tiene rubro presupuestal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

3.9.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	PGS-6.8-22
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB. En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

3.9.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	PGS-6.9-23
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a construir son taludes de espacio público y propiedad estatal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	**Código:**	SST-F-96
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Brisas de Primavera	ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
5/12/2025		X	1,2	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
12/12/2025		X	1,1	
19/12/2025		X	1,5	
26/12/2025		X	1,3	
TOTAL			**5,1**	

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Brisas de Primavera	ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
26/12/2025		X	1,2	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			**1,2**	

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma:

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	Código:	SST-F-96
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Halcón de Granada	ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
5/12/2025		X	0,5	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
12/12/2025		X	0,8	
19/12/2025		X	1,1	
26/12/2025		X	1,5	
TOTAL			3,9	

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Halcón de Granada	ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
26/12/2025		X	0,8	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			0,8	

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma:

ANEXO N° 2. CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL

INVERNOTA

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	
NIT	901.983.966 - 5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	315 6675536	
DIRECCION ELECTRONICA	conmitigacionptacdmb@hotmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	SECTOR HALCON DE GRANADA PIEDECUESTA	
PROYECTO GENERADOR	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 02/12/2025 al 13/12/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS EN MATERIAL GRANULAR Y ROCOSO, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS,	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	1540	MIL QUINIENTOS CUARENTA METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		1540

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **DIECISIETE** días (17) días del mes de **DICIEMBRE de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA

invernota.rcd@gmail.com
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BG 16 TEL: 607-6159848

Powered by CamScanner

ANEXO No 3 REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACION

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Consorcio mitigación Riohacha

TEMA DE CAPACITACIÓN Política Ambiental y Política de Orden y Aseo

LUGAR frente de obra FECHA 12 DIC. 2025

CAPACITADOR Nagore Pinilla DURACIÓN 30 Min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	José Ospino	1050774060	Ayudante obra	
2	Genaro Mendoza	91291101	oficial	
3	Harby Prado Lopez	1098812750	operador	Harby Prado
4	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
5	Yelner García	1005182272	Operador Perf.	
6	Luis A Tejeda	1002699422	Aux de Perf	
7	Alexander Prada L.	1374536	Maquinista P.	
8	Gisalberto prada	5.69182	Ayudante	
9	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante	
10	Andrés garcia	6565491	Ayudante	
11	Mauricio Suarez	1100890118	OP	
12	Mauricio Villamizar	1004141932	Operador	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

ANEXO No 4. DOCUMENTOS DE VOLQUETA

SOAT

SEGUROS COMERCIAL BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (año / mes / día)	VIGENCIA DESDE LAS DE HORAS DEL (año / mes / día)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (año / mes / día)
2025 / 05 / 26	2025 / 06 / 01	2026 / 05 / 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que consideren necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFQ114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-02
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PUBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD TON/PAS: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 65606243
NIDO: N
VIN: LVBDHPES3HN005000
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3HN005000
NIDO: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3HN005000
RNDC: N
PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT. 830048007



RADICADO: 141
LIC. TRÁNSITO: 10011843214
FECHA IMPORT.: 10/06/2016
PUESTOS: 2
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 10201400001465112
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:
FECHA MATRÍCULA: 23/06/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/06/2016
FECHA VENCIMIENTO:
ORGANISMO DE TRÁNSITO:
STEVA MORAL TIOVTTE GIRON

LT02003920796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PÓLIZA DE EVENTOS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
4308007289163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYAT	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #545, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Evite alarse al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REC	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REC	NUMERO DE CHASIS	REC
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DtR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT030025257 39

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTW843

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2018

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89951806

NRO. CHASIS: LVBDHPES4JN005111

VIN: LVBDHPES4JN005111

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

ANEXO No 5. MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

14975

Cliente: Consorcio Mitigación

Ubicación: Brisas de Primavera P/ta Campo:

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 2 de dic. 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: 2/12/25 2:50pm Juan Andrés Díaz

Firma:

cc 1095802634

Nombre Operador MASSI: Andrey

Firma: Sierra

cc

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 304 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15259

Cliente: Consorcio Mitigacion.

Ubicación: Brisas de Campo: Primavera

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 5 de Dic 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

5/12/24

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz 11:30 AM Firma: _____

C.C.

Nombre Operador MASSI: Andres Firma: Jerica.

C.C.

IMPRESO POR: IDENTICAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15233

Cliente: Cons Mitigacion
Ubicación: Brisas Campo: Primavera
Hora de Inicio: 1:30 Hora Final: 1:45
Fecha: 9-Dic-25

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz C.C.
9/12/25 1:40pm Firma:

Nombre Operador MASSI: FREDDY C.C.
Firma:

IMPRESO POR: IDENTICAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15186

Cliente: Consorcio mitigacion.

Ubicación: Bruses 2c Campo: Primavera PHc

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 12 de Dic 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Elaine Garcia CC

Firma:

Nombre Operador MASSI: Andrey CC

Firma: Sierra

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15378

Cliente: Consorcio Mitigacion

Ubicación: Brisas de Campo Primavera

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 16 de Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT.
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

16/12/25
10:50 AM

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Firma: _____

C. C.

Nombre Operador MASSI: Andrey Sierra. Firma: _____

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15199

Cliente: Consorcio mitigacion

Ubicación: Brisas de Campo: Primavera P/te

Hora de Inicio: 12:05. Hora Final: 12:20 pm

Fecha: 19 de DIC 2025.

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones: NO Presento en obra

Nombre de quien Revisó: Firma:

CC

Nombre Operador MASSI: Andres Firma: Sreiva

CC

IMPRESO POR: CIDAC 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 / contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15506

Cliente: Cons Mitigacion

Ubicación: Brisas D Campo: Primavera

Hora de Inicio: 12:50 Hora Final: 1:05

Fecha: 23-Dic-25

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz c.c. 23/12/25 1:30 pm Firma:

Nombre Operador MASSI: FREDDY c.c. Firma:

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15469

Cliente: Consorcio mitigación

Ubicación: Brisas de Primavera Campo: P/ta

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 26 de Dic 2025.

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: + C/S Sergio Suarez Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Andrey Sierra Firma:

C.C.

IMPRESO POR: IDENTICAD 310 - 30 94 724

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15523

Cliente: Consorcio Mitigacion

Ubicación: Brisas de Primavera Campo: Alta

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 30 de Dic 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones:

30/12/25 11:20AM

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Andrej Sierra Firma:

C.C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 84 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Scanned with CamScanner

ANEXO No 6. PERMISO DE TALA

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO A-PI-F008 / VERSION 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	CONTRATO No. 210.162236.6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OBJETO DE DESARROLLAR EL CONTRATO DE OBRA NUMERO No. 210.162236.6
LUGAR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINIS TRATIVA CDMB

ACTA No	FECHA		
	DD	MM	AA
002	17	12	2025
Hora Inicio	9:00 m		
Hora final	10:00 am		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	SALUDO A LOS ASISTENTES	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
2	CONTEXTUALIZACION DE LA INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL SECTOR DE BRISAS DE PRIMAVERA, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL
3	CONCLUSIONES DE LA REUNION	
4		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT de la CDMB Arquitecto Carlos Alberto Diaz Barrera da la bienvenida a los asistentes, indicando que el objeto de la reunión es tratar el tema de la intervención de individuos arbóreos en el Sector Brisas de Primavera, Municipio de Piedecuesta Santander, en el marco de ejecución de la obra de "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER)**", se ubica en el sector de brisas de Primaveras, en el municipio de Piedecuesta.

2

El ingeniero Jesús Evelio Sánchez Sánchez, profesional especializado grado 14 – coordinador grupo de gestión del riesgo, indica que se realizó visita a la obra de construcción ubicada en el barrio brisas de Primavera, en donde se verificó que para el sector donde se desarrolla la obra de mitigación por cuenta del Contratista **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** y donde existen 2 individuos arbóreos, que se encuentran en el área de intervención para la mitigación y así disminuir la amenaza por Erosión y fenómenos de remoción en masa, obras que coadyuvan a salvaguardar la vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

Nº Consecutivo	Nº Individuo	NOMBRE	NOMBRE CIENTÍFICO	D.A.P. (cm)	ALTURA COMERCIAL (m)	ALTURA TOTAL (m)	VOLUMEN COMERCIAL m³	VOLUMEN TOTAL (m³)	BIOMASA (Kg)
1	71	Benjamina	*Ficus benjamina*	16,23	3,1	9,0	0,04	0,1229	67,6209
	72	Benjamina	*Ficus benjamina*	19,10	6,5	8,8	0,11	0,1664	91,5130
	73	Benjamina	*Ficus benjamina*	15,92	6,5	8,8	0,08	0,1155	63,5507
2	78	Benjamina	*Ficus benjamina*	14,96	3,9	10,5	0,04	0,1218	67,0012
	79	Benjamina	*Ficus benjamina*	33,42	5,6	10,5	0,31	0,6080	334,3995
	80	Benjamina	*Ficus benjamina*	15,92	5,0	9,8	0,06	0,1287	70,7724
TOTAL							0,63	1,15	694,86

De acuerdo con el inventario forestal del proyecto, en el área de intervención se identificaron dos (2) individuos fustales, cada uno con tres bifurcaciones principales, razón por la cual fueron inventariados de manera independiente, asignándoles los códigos 71, 72 y 73 para el primer individuo y 78, 79 y 80 para el segundo. En conjunto, estos individuos presentan un volumen total acumulado de 1,15 m³, un volumen comercial de 0,63 m³ y una ocupación basal total de 0,1944 m².

	La Ingeniería Lissette Ximena Niño indica que el objeto del aprovechamiento de los 02 individuos presentes en el área de desarrollo de la obra, se ve justificado por la necesidad de intervenir el talud presente, aumentando los factores de seguridad a la dovela de deslizamiento mediante la construcción de pantallas ancladas, a su vez controlando los fenómenos de erosión por los fenómenos de intemperismo con la colocación del concreto lanzado y como se ha mencionado reduciendo la condición de vulnerabilidad y riesgo de los sectores, garantizando la protección de la vida y bienes los sus habitantes. Así mismo y continuando con su exposición, indica que la localización de los arboles a intervenir se muestra en el informe de inventario forestal adjunto a la presente acta, en donde en las tablas 4, 5 y 6 se detallan las especies a intervenir con su respectiva localización, información que fue corroborada durante la visita técnica y conjunta (contratista de obra, interventoría, CDMB) adelantada el día 05 de Noviembre de 2025. Igualmente indica que el contratista en dicho informe especifica la manera de intervención de cada especie, los materiales y personal requerido y adicionalmente se presenta el plan de manejo forestal, detallando a los asistentes dicho documento y cada una de las tablas referenciadas.
3	La CDMB por medio de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, una vez realizada la visita y analizado el informe de inventario Forestal allegado, con base en la ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente: *Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemes como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*, ve la necesidad de realizar el aprovechamiento forestal de las especies relacionadas en el informe de inventario forestal en las tablas 4, 5, y 6, para el Sector de Brisas de Primavera, toda vez que será desarrolladla en el sector una obra de mitigación que protegerá las vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos. Por lo anterior la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT AUTORIZA las Intervenciones que se deben realizar con el fin de desarrollar las obras de mitigación, las cuales tiene por fin principal reducir la amenaza y salvaguardar la vida, bienes y Enseres de todos los habitantes localizados en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos.

Para ello la entidad solicita a **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** hacer el seguimiento de cada individuo talado que se realice enmarcado en las recomendaciones del inventario forestal y una vez realizadas estas actividades elaborar un informe sobre las mismas, informe que deberá ser enviado a la CDMB.

Como Medida de Compensación por la intervención de las especies relacionadas anteriormente, **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA,** deberá realizar la plantación de Ciento Setenta **(30) árboles** de la especie nativas *Cedrela odorata* o cedro, *Albizia guachapele* o Nauno, *Tabebuia rosea* o guayacán rosado, *Handroanthus chrysanthus* o Guayacan amarillo, Schizolobium parahyba o (frijolito), Jacaranda caucana (Gualanday), Enterolobium cyclocarpum (Orejo), Pithecellobium dulce (Gallinero), Guazuma ulmifolia (Guacimo) al igual en aras de proteger la avifauna del sector deben llevar a cabo la siembra de algunos frutales como *Pouteria sapota* o arbol de Zapote, *Mangifera indica* Mango y *Syzygium malaccense* o Pomarroso Brasilero con una altura de mínima de 70 cm, las cuales deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, preferiblemente dentro del mismo predio, esta actividad deberá realizarse de manera **que se garantice la supervivencia de los individuos y no sean afectados por las actividades de la obra.**

La medida de compensación deberá iniciar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir dela aprobación del Plan de compensación; se deberá realizar su respectivo mantenimiento por un término de tres (03) años, con una preciosidad de seis (06) mantenimientos en el primer año, cuatro (04) mantenimientos en el segundo año y tres mantenimientos en el tercer año, para un total de 13 mantenimientos en los tres años, los cuales se realizarán con las condiciones técnicas de control fitosanitario y fertilización, así como podas de formación y mantenimiento

En este sentido se deben realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos arbóreos, la cual debe ser reportada a la CDMB anexando evidencias, con el fin de realizar seguimiento y control a la obligación.

Los productos obtenidos del aprovechamiento como: madera rolliza (horcones, postes) tablas, cuartón, listón, vigas, bloques, varas, leña, carbón entre otros, no podrán ser transportados fuera del área del proyecto ni comercializados, los residuos deben ser repicados y dispuestos en sitios adecuados, con el fin de acelerar la descomposición y mejor incorporación de la materia orgánica al suelo; lejos de fuentes hídricas. Estos productos se deben utilizar dentro del predio para la reparación de cercas arreglos locativos y demás de uso doméstico si así se requiere y pueda darse su uso.

No se permite la tala de árboles distintos a las aquí mencionados o que se encuentran en predios diferentes al autorizado, ni en zona de afloramientos de agua o áreas protectoras de quebradas, tampoco se permiten quemas ni caza de fauna silvestre de ninguna índole. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Seguimiento a las actividades de tala	CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	Durante el proceso de aprovechamiento
2	Presentación de Informe de tala a la CDMB	CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	Informe mensual una vez se inicie la tala
3	Plan de compensación ambiental por la tala de las especies arbóreas de acuerdo a lo indicado dentro de la conclusión del presente documento.	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA	Dos meses contados a partir de la suscripción de la presente acta

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FC05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	----------	HORA:	----------	LUGAR:	----------

Elaboró Acta	Cargo	Firma
JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA	SUBDIRECTOR SURYT	

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

NO.	NOMBRE COMPLETO	GÉNERO		CARGO U OFICIO	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO FIJO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		M	F					
1	CARLOS ALBERTO DIAZ BARREA	X		SUBDIRETOR SURYT	CDMB	3167560000	Carlos.diaz@cdmb.gov.co	
2	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	X		COORDINADOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -	3202090759	Jesus.sanchez@cdmb.gov.co	
3	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL		X	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA	3123551214	conmitigacionpiedacdmb@hotmail.com	
4	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS		X	INTERVENTORIA AMBIENTAL	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA	3106606047	coedcosas@gmail.com	

ANEXO No 7. GESTION SOCIAL

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra de intervención en Brisas de Primavera I – Piedecuesta, adecuada en la zona de obras



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad ubicado en la zona de obras



Reunión informativa de inicio de obras en el barrio Halcón de Granada



Actividad de información de inicio de obras con la comunidad de Halcón de Granada



Elaboración de actas de vecindad de inicio en el barrio Halcón de Granada



Actividad de acta de vecindad de inicio en el barrio Halcón de Granada



Actividad formativa con los colaboradores del Consorcio Mitigación Piedecuesta – CDMB, en fortaleicmiento de valores, oficina de atención a la comunidad y cultura vial

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA I DE PIEDECUESTA

Volante 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrio Brisas de Primavera I

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Centralista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 2115567726

Correo electrónico: consmitigacionpiedcdmb@hotmail.com

ANEXO 3. VOLANTE INFORMATIVO A LA COMUNIDAD DEL BARRIO HALCÓN DE GRANADA PARA CONOCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN.

Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico: consmitigacionpiedecuesta@hotmail.com

ANEXO 4. ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS EN EL BARRIO HALCÓN DE GRANADA DE PIEDECUESTA

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	OS-F-15 2/11/2021 1 1 de 5

N° DE ACTA	2

DATOS GENERALES			
LUGAR	Halcón de Granada	FECHA	5/12/2025
HORA DE INICIO	5:20 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	6:30 p.m.

SE ANEXA REGISTRO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	FIRMA
1				
2				
3				

AGENDA

N°	TEMA	RESPONSABLE
1	Información de la actividad a desarrollar en el barrio Halcon de Granada	Profesional Social del Contratista
2	Intervención en temas civiles de diseño de la obra en el Barrio Halcón de Granada	Ingeniero Residente del Contratista
3	Intervención de los temas ambientales para la obra en el barrio Halcón de Granada	Ingeniera Ambiental del Contratista
4	Intervención de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga	Ingeniero Jesús Evelio Sánchez de la CDMB
5	Información de las actividades sociales a desarrollar el Contratista en el barrio Halcón de Granada	Profesional Social del Contratista
6	Presentación de las inquietudes por parte de la comunidad de Halcón de Granada	Líderes y comunidad del barrio Halcón de Granada
7	Finalización de la reunión informativa de inicio de obras y agradecimiento a la comunidad del sector por la asistencia	Profesional Social del Contratista

DESARROLLO DE LA AGENDA

1	La Profesional Social del Contratista saluda a la comunidad presente en el evento, Interventoría, Oficina de Gestión del Riesgo de Piedecuesta, Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Contratista de obra, y convocada para conocer los temas técnicos, de diseño y ambientales para la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, obra civil a efectuar el Contratista Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, en el barrio Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta
2	La información técnica respecto al diseño de la obra a efectuar, la expone el ingeniero del Contratista, comunica a los asistentes el nombre de la obra, numero del Contrato, valor del contrato, tiempo de ejecución, descripción del proyecto desde la localización, ficha técnica, problemática del sector en el área proyectada de intervención, anclajes, perforación y pantallas ancladas, con actividades constructivas de desmonte, limpieza, retiro de escombros, movimiento de tierra para retiro de material meteorizado y buscando suelo resistente para la construcción de pantallas ancladas, conformación y perfilado del talud, perforación horizontal para los anclajes, suministro e instalación de anclajes, llenado e inyección de anclajes, excavación manual para configuración de zapatas en cada anclaje, instalación de acero de refuerzo para zapatas anclajes, instalación de malla electrosoldada para revestimiento de talud, concreto lanzado para zapatas y revestimiento de talud, canales en la parte inferior para canalización de aguas superficiales y finalizar con el tensionamiento de anclajes.
3	En Gestión ambiental, se van a implementar medidas de manejo que deben aplicarse en el desarrollo de la obra, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que puedan generarse sobre los recursos naturales y el ambiente. Relata el logro satisfactorio en el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas, desarrollando los programas de manejo de residuos, control de emisiones atmosféricas, uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción, protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía, prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos; manejo de la vegetación, fauna y paisaje; señalización y adecuación de campamentos.
4	Por parte de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, entidad contratante, el Ingeniero Jesús Evelio Sánchez informa a la comunidad de Halcón de Granada los estudios técnicos y geotécnicos que hicieron seleccionar el sector para la obra de mitigación a desarrollar, conforme existe un riesgo y se requiere la obra.

5	En temas sociales comunica a los asistentes los protocolos establecidos para esta obra de infraestructura, consistente en cinco programas de los nueve existentes, uno, de Atención a la comunidad, dos, Información y divulgación, tres, Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos, con la elaboración de las actas de vecindad donde se requiera, cuatro, proyecto de cultura vial y participación comunitaria y cinco, contratación de mano de obra, todos ellos para atender las necesidades de la comunidad en los diferentes aspectos requeridos.
6	La comunidad asistente en la reunión informativa de inicio de obras, manifestó su agrado y colaboración para el desarrollo de la obra en proceso, conforme las viviendas ubicadas en este sector a intervenir van a contar con estabilidad y tranquilidad para habitarlas, proyecto que habían solicitado a las entidades pertinentes desde hace algún tiempo y hoy lo ven convertido en realidad; expusieron inquietudes inherentes al inicio de la obra y temas civiles del desarrollo de las actividades constructivas, los cuales fueron atendidos y resueltos por parte del Ingeniero Residente del Contratista.
7	Una vez agotada la actividad informativa de reunión de inicio de obras, el Contratista agradece la asistencia de la comunidad del barrio Halcón de Granada, Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Oficina de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de la localidad y profesionales encargados por parte del contratista e Interventoría.
COMPROMISOS	
1	Por parte del Contratista Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, no se efectuaron compromisos con la comunidad del barrio Halcón de Granada en la reunión informativa de inicio de obras, diferentes al desarrollo de una obra con calidad y en los tiempos establecidos en el cronograma de obra, avalados y supervisados por la empresa Contratante e Interventoría.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	







REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-119

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión informativa a la comunidad de influencia directa de la obra de Construcción de Obras de Mitigación y Consolidación para el control de la erosión en el sector de Palmas de Granada	Viernes 6 de diciembre de 2019, 1:00 p.m., Barrio Palmas de Granada - Piedecuesta

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

MAYOR INFORMACIÓN

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-119

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión informativa a la comunidad de influencia directa de la obra de Construcción de obras de Mitigación y Consolidación para el control de la erosión en el sector de Palmas de Granada	Viernes 6 de diciembre de 2019, 3:00 p.m., Barrio Palmas de Granada - Piedecuesta

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

MAYOR INFORMACIÓN

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-115

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS

OBJETIVO	FECHA - LUGAR - HORA - REUNIÓN
Reunión informativa a la comunidad de influencia directa de la obra de Construcción de Obras de Mitigación y Consolidación para el control de la erosión en el sector de Mesón de Granada	Viernes 4 de diciembre de 2020, 5:30 p.m., Barrio Mesón de Granada - Piedecuesta

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

MAYOR INFORMACIÓN

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-115

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS

OBJETIVO	FECHA - LUGAR - HORA - REUNIÓN
Reunión informativa a la comunidad de influencia directa de la obra de Construcción de Obras de Mitigación y Consolidación para el control de la erosión en el sector de Mesón de Granada	Viernes 4 de diciembre de 2020, 5:30 p.m., Barrio Mesón de Granada - Piedecuesta

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

MAYOR INFORMACIÓN

ANEXO 5. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN– PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	HARLEY PRADA LÓPEZ	1098822751	23/06/1999	Bucaramanga - Santander	Vereda Granadillo - Piedecuesta	3187720633	Ayudante de obra
2	ALEXANDER PRADA LÓPEZ	13745736	13/01/1980	Bucaramanga - Santander	Vereda Granadillo - Piedecuesta	3202776747	Ayudante de obra
3	LUIS ALBERTO PRADA RINCÓN	5691822	23/02/1968	Molagavita - Santander	Brisas de Primavera I - Piedecuesta	3008527899	Ayudante de obra
4	ANDRÉS GARCÍA FARÍAS	6365491	27/07/1986	Farinas - Venezuela	Villas de Andalucía	3042607099	Ayudante de obra
5	JOSÉ OSPINO	105.071.906	7/07/1999	Magangué - Bolívar	Vereda El Granadillo - Piedecuesta	3208602704	Ayudante de obra
6	JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA	5.823.211	24/01/1979	Maracay - Venezuela	Brisas de Primavera I	3112602947	Ayudante de obra

ANEXO 6. CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES DE LA OBRA EN TEMAS VARIOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, CULTURA VIAL Y FORTALECIMIENTO DE VALORES

	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB CONTRATO No. 210-16223-6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL	

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [x] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 210-16223-6 - CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE

TEMA DE CAPACITACION: Fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB		FECHA:	10/12/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres correa	6563492	ASISTENTE	
2	Jose Ospino	7090796	Asistente	
3	Genesis a	1124911041	Asistente	
4	Andres Prada lopez	1098827951	Operador	
5	Juan Andres Gil	1095801634	Almacenista	
6	[illegible]	1096039422	Aux de Pert	
7	Alexander Badel	1095745256	Ayudante B	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	Mauricio Gomez	1005870112	OP	
10	Yeiner Garcia	7003182293	Operador	
11	Yefferson Gomez	5823211	Ayudante	
12	Luis Alberto Prada	5691899	Ayudante	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO 7. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS BRISAS DE PRIMAVERA I Y BRISAS DE PRIMAVERA II DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

BARRIO	NÚMERO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO REALIZADAS	PORCENTAJE
Brisas de Primavera I	28	61%
Brisas de Primavera II	5	10%
Halcón de Granada	7	16%
Granadillo	6	13%
TOTAL	**46**	**100%**

BRISAS DE PRIMAVER II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	BLANCA BENAVIDES PERILLA	Calle 15 C No. 0 - 58	Brisas de Primavera II	63.480.359	3116607711
2	MARÍA LEONOR VARGAS	Calle 15 B No. 0 - 58	Brisas de Primavera II	63.475.291	3132583994
3	MYRIAM ALMEIDA VILLAMIZAR	Calle 15 D No. 0 - 63	Brisas de Primavera II	63.303.495	3172470230
4	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Calle 15 C No. 0 - 57	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522
5	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Calle 15 B No. 0 - 63	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522

BRISAS DE PRIMAVERA I

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ADOLFO TORRES ROPERO	Manzana C Casa 3	Brisas de Primavera I	13.480.725	3156694907
2	CAMILO RÍOS ARNACHE	Manzana C Casa 10	Brisas de Primavera I	1.065.874.471	3105966785
3	CHERRYS POLANCO MEDINA	Manzana B Casa 2	Brisas de Primavera I	15.950.322	3209997334
4	CRISANTO MARTÍNEZ	Manzana B Casa 5	Brisas de Primavera I	5.670.293	3203330392
5	DIANA ROCÍO LAGOS	Manzana B Casa 3	Brisas de Primavera I	63.341.445	3016893592
6	FAUSTINO JIMÉNEZ	Manzana C Casa 11	Brisas de Primavera I	5.422.805	3212597205

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
7	JAIME TORRES PRIETO	Manzana B Casa 7	Brisas de Primavera I	19.264.692 .	3152487337
8	JAN CARLOS GRIMALDO MENA	MANZANA A CASA 12	Brisas de Primavera I	1.102.384.103	3182844206
9	JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	Manzana D Casa 3	Brisas de Primavera I	78.714.853	3185182952 - 3144065822
10	JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA	Manzana A Casa 10 piso 1	Brisas de Primavera I	5.823.211	3112802947
11	KELLY LEÓN DÍAZ	Manzana D Casa 1	Brisas de Primavera I	28.259.440	3028421645
12	LEIDY SERRANO RUGELES	Manzana A Casa 13	Brisas de Primavera I	28.078.590	3102096505
13	LILIANA GARNICA ROJAS	Manzana A Casa 9	Brisas de Primavera I	37.725.956	3025981705
14	LUIS EDUARDO GÉLEVEZ TARAZONA	Manzana A Casa 11 Taller	Brisas de Primavera I	1.097.303.276	3205890997
15	MARÍA CARREÑO ROJAS	Manzana A Casa 8-201 y 301	Brisas de Primavera I	37.542.792	3204753055
16	MARÍA FERNANDA DÍAZ NIÑO	Manzana D Casa 2	Brisas de Primavera I	1.102.386.883	3112239900
17	MARINA DÍAZ FUENTE	Manzana A Casa 8 piso 101	Brisas de Primavera I	37.796.087	3178621074
18	MARTHA BUITRAGO REYES	Manzana C Casa 9	Brisas de Primavera I	63.336.981	3167559614
19	MERCEDES MONCADA GÉLVEZ	Manzana B Casa 6	Brisas de Primavera I	1.097.303.966	3152841112
20	YENNY CABALLERO FLÓREZ	MANZANA B Casa 9	Brisas de Primavera I	1.116.792.286	3202180004
21	YOLANDA PABÓN REY	MANZANA A CASA 14	Brisas de Primavera I	28.162.431	3103020181
22	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	MANZANA B Casa 4	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
23	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana B Casa 8	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
24	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana C Casa 1	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
25	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana C Casa 2	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
26	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana D Casa 2	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
27	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	MANZANA B Casa 1	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
28	ANAHIL JIMÉNEZ	Vías y entorno	Brisas de Primavera I	37.753.450	3115562986

HALCÓN DE GRANADA

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	LIZETH CÁRDENAS CADENA	Calle 1 NA No. 19 – 120 APTO 101	Halcón de Granada	1.102.359411	3043493916
2	JAIME ANGARITA MAYA	Calle 1 NA No. 19 – 118 Piso 3	Halcón de Granada	5.670.471	3023964385
3	LEIDY KATHERINE RUGELES GONZÁLEZ	Calle 1 NA No. 19 – 114 Piso 1	Halcón de Granada	1.095.804.944	315669.3515
4	JENNIFER GARCÍA CORZO	Calle 1 NA No. 19 – 108 PISO 1	Halcón de Granada	1.102.714.486	3007599442
5	GLADYS FERREIRA ESTÉVEZ	Calle 1 NA No. 19 – 100 Piso 2	Halcón de Granada	63.356.193	3123428238
6	HUGO ANDRÉS PÉREZ CABALLERO	Calle 1 NA No. 19 – 96 PISO 1	Halcón de Granada	1.102.366.785	3022824765
7	VIVIANA OVIEDO RIAÑO	Calle 1 NA No. 19 – 126 - 128	Halcón de Granada	37.618.699	3243445819

GRANADILLO

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	EDINSON FABIÁN LUNA MANTILLA	Carrera 20 A No. 1N - 47	Granadillo	1.102.365.817	3194124965
2	JOHAN SEBASTIÁN NIÑO RAMÍREZ	Carrera 20 A No. 1N - 41	Granadillo	1.102.348.605	3157435741
3	CIRO ALFONSO MONTAÑEZ LEÓN	Carrera 20 A No. 1N - 37	Granadillo	5.630.410	3178724846
4	DIANA YOLIMA BRICEÑO RINCÓN	Carrera 20 A No. 1N - 31	Granadillo	37.620.775	3043249688
5	PAOLA ANDREA SILVA RÍOS	Carrera 20 A No. 1N - 25	Granadillo	1.102.365.934	3185269906
6	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Carrera 20 A No. 1N - 19	Brisas de Primavera II	91265826	3172113522

ANEXO NO.6: PROGRAMA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL

CONSORCIO MITIGACIÓN
PIEDECUESTA CDMB

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ANEXO: PROGRAMA GERENCIAL SEGUIMIENTO 03 DEL PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

PERIODO:
01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PRESENTA:

Ing. ANDRÉS LEONARDO LASSO AGUIRRE
PROFESIONAL PMP-GERENCIA DE PROYECTOS

SANTANDER
PIEDECUESTA
2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GESTIÓN DEL ALCANCE 4
3. CONTROL DEL COSTO Y AVANCE 5
4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6
5. GESTION DEL RIESGO 7
6. INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS 7
7. CONCLUSIONES 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente Programa de Gerencia de Proyecto es parte integral del Informe Técnico de Obra No. 3 donde se describe el desarrollo de la ejecución del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Ejecución contratada con el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB mediante contrato de Obra Pública Nro. 210-16223-6. Las actividades corresponden a las desarrolladas durante el periodo del 01 de diciembre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025.

Los capítulos a continuación se enfocarán en los índices claves de desempeño (KPIs), los mismos son medidas cuantificables del desempeño a lo largo del plazo de ejecución del contrato para un objetivo específico. Los KPI brindan objetivos que los equipos deben alcanzár, hitos para medir el progreso y perspectivas que ayudan a todos los interesados principalmente a los ejecutores a tomar mejores decisiones.

2. GESTIÓN DEL ALCANCE

La gestión del alcance es un componente crítico del Programa de Gestión del Proyecto de Construcción, que garantiza que todos los objetivos, entregables y tareas del proyecto estén claramente definidos, documentados y controlados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Desde el informe inicial se establece que, la minuta del contrato define que el alcance del contrato y sus especificaciones, son los plasmados en los documentos que hacen parte integral del presente contrato, definidos como Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas y planos. Así mismo, los mencionados documentos derivan las actividades del contrato como actividades necesarias para lograr cumplir con el objeto *Construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander.*

Del alcance del presente contrato se definió, a partir del programa de gerencia presentado, que el objetivo general del proyecto es el control de la erosión y la estabilización del talud mediante la implementación de un sistema de pantalla anclada en concreto con anclajes activos, en ambos frentes de obra. Dada la modificatoria presentada y avalada bajo el Otrosí 01 del 23 de diciembre de 2025, se presenta un cambio en el sistema de estabilización del frente Brisas de Primavera, el cual pasa a ser un sistema de bioingeniería con la instalación de pernos tipo Nails y cobertura en geomanto, garantizando factores de estabilidad y control de erosión, y a su vez ampliando el **área de cobertura en 854.00 m2**, sin afectar el equilibrio financiero del contrato.

Es por todo lo anterior que el indicador clave del cumplimiento del alcance corresponde a cumplimiento del área establecida a estabilizar, estimada en condiciones iniciales por el contratante en 1628.00 m2, totalizados por ambos frentes de obra; la cual pasa a ser ahora de **2482.00 m2** (1964.00 m2 a estabilizar con Bioingeniería en el frente Brisas de Primavera y 518.00 m2 a estabilizar en concreto lanzado en el frente Halcon de Granada).

El indicador como tal es la evaluación del porcentaje de área estabilizada. También es claro que por proceso de ejecución de este tipo de proyecto las primeras medidas se reflejarán en los últimos meses de la ejecución del contrato, a medida que la interventoría acepte las áreas ya estabilizadas.

En el presente mes que corresponde al tercero, el valor esperado del indicador corresponde a 0 tal como se explicó previamente, esto a que las actividades se enfocaron en la preparación del área a intervenir, así como el desarrollo parcial de las actividades de movimiento de tierras.

3. CONTROL DEL COSTO Y AVANCE

Esta sección se centra en el monitoreo y seguimiento de un calendario detallado del proyecto junto con un presupuesto desglosado en actividades unitarias, buscando la asignación eficiente de los recursos y el tratamiento proactivo ante posibles retrasos o riesgos de ejecución, el plan pretende mantener el impulso del proyecto y cumplir los plazos y el valor del proyecto, en consonancia con las expectativas del cliente y los compromisos contractuales.

El indicador clave establecido para el monitoreo del cumplimiento del costo del proyecto, correspondiente a la relación entre el valor ejecutado y el valor inicialmente presupuestado, evidenció que durante el periodo evaluado no se presentaron modificaciones en los costos del contrato. En consecuencia, el valor del índice para el presente plazo corresponde a **1,0**, al mantenerse un costo actual de **$ 9.651.664.101,92**, igual al costo inicial establecido de **$ 9.651.664.101,92**.

Con respecto al indicador establecido para el control del avance de obra, se estableció como el valor resultante entre la comparación del Avance Real sobre el Avance Programado, para el periodo 3 según el programa actualizado de obra al Otrosí 01, el avance se estimó en **$955.063.298,77** que representa al **9,90%** del valor total del proyecto, con un acumulado proyectado de **$1.083.338.064,63** que corresponde al **11,22%** del total del valor del contrato, pero el real ejecutado del mes 2 correspondió a **$401.994.290,91** que es el **4,17%** del valor total del proyecto, con un acumulado real de **$1.093.749.201,87** que corresponde al **11,33%** del valor total del contrato, dando como resultado un indicador de 0,42 durante el corte y 1,01 del acumulado del proyecto, lo que nos muestra que mientras el resultado sea igual o superior a 1, el avance real es superior al programado, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Avance Programado Vs Avance Ejecutado Acumulado (Curva S)

Descripción	Periodo 3
Estimado	$ 955.063.298,77
Acumulado Estimado	$ 1.083.338.064,63
Ejecutado	$ 401.994.290,91
Acumulado Ejecutado	$ 1.093.749.201,87
KPI Mensual	0,42
KPI Acumulado	1,01
% Programado	9,90%
% Acumulado	11,22%
% Ejecutado	4,17%
% Acumulado	11,33%

Tabla 1. Datos de avance de obra – Periodo 3

4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el presente reporte, las actividades desarrolladas correspondieron principalmente al movimiento de tierras, tales como las excavaciones en material granular y rocoso, perfilado y su posterior retiro al sitio de disposición autorizado. En esta fase del proyecto no se registraron actividades constructivas que involucraran el uso de materiales estructurales o de uso principal, tales como los usados en anclajes, mezclas de concreto o lechadas. Por lo anterior, no se adjuntan certificados de materiales ni documentos asociados al aseguramiento de la calidad, en tanto estas exigencias aplican para etapas posteriores de ejecución que comprendan la utilización de dichos insumos y la realización de ensayos de laboratorio correspondientes, por lo cual para los siguientes informes se adjuntarán dichos soportes de calidad, conforme al avance de las actividades contractuales que lo requieran. **(Ver anexo 1)**

Con respecto al indicador de porcentaje de actividades aceptadas, el informe técnico de obra en su numeral 5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, menciona que se presentaron a interventoría un total de 12 (doce) actividades, de las cuales no se presentó ninguna objeción, dando como resultado del indicador un cumplimiento del 100%.

5. GESTION DEL RIESGO

La minuta contractual, en su cláusula décima segunda, establece las garantías mínimas exigidas para la adecuada cobertura de los riesgos asociados a la ejecución del contrato. Dichas garantías comprenden el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal vinculado, la responsabilidad civil extracontractual, y la estabilidad de la obra, todas ellas en concordancia con las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones y demás documentos contractuales.

Las pólizas de garantía correspondientes fueron presentadas por el contratista una vez suscrito el contrato de obra, y posteriormente revisadas y aprobadas tanto por la interventoría como por la entidad contratante, asegurando el cumplimiento de las coberturas y montos establecidos. Así mismo, dichas pólizas fueron actualizadas conforme al acta de inicio de obra, suscrita el 15 de octubre del presente año, garantizando su vigencia y aplicabilidad durante la ejecución del proyecto.

6. INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS

En esta sección se describen los KPI que se utilizarán para hacer un seguimiento de aspectos críticos como la gestión de recursos. Mediante el establecimiento de objetivos claros y mensurables, el proyecto puede supervisar continuamente el rendimiento, identificar áreas de mejora y garantizar la alineación tanto con las expectativas del cliente como con los objetivos de la organización durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Así mismo el Indice de tiempo productivo de recursos se encuentra en 100%, indicando que las condiciones laborales correspondieron a condiciones ideales, esto igual se refleja en el resultado de los indicadores previamente mencionados correspondientes a costo y avance.

7. CONCLUSIONES

Luego de la evaluación del tercer periodo de ejecución del proyecto, las condiciones ideales de una obra se han presentado ayudando a que el avance sea superior al estimado; este avance físico a la fecha representa una ejecución positiva del presupuesto, en un tiempo acorde del mismo. Por lo que no se hace necesario implementar ninguna medida correctiva al desarrollo del proyecto, todo lo contrario, continuar con el plan existente y seguir su monitoreo con el fin de seguir interpretando los datos emitidos que permitan la toma de decisiones adecuadas para el cumplimiento del mismo dentro de los límites preestablecidos con relación a calidad, costo, tiempo, alcance, entre otros.

ANEXO 1:

INFORME DE SEGUIMIENTO 03 AL PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

INFORME PLAN DE CALIDAD 003

CONTRATO Nº 210.16223.6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
12/01/2025	Ing. Sindy Sared Cano	Ing. Jhon Gonzalez	Julián A Serrano Gómez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 4
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 6
2.4 Comunicaciones 6
2.5 Información documentada 6
3. OPERACIÓN 8
3.1 Planificación y control operacional 8
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9
3.3 Control en la prestación del servicio 9
3.4 Liberación de productos y servicios 9
3.5 Control de salidas no conformes 10
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente 10
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10
5. AUDITORIAS INTERNAS 12
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 12
7. MEJORA CONTINUA 12
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 12
9. CONCLUSIONES 12
10. RECOMENDACIONES 13

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

El presente informe comprende el periodo entre el 01 al 31 diciembre 2025, describe el cumplimiento de las actividades propuestas en el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 diciembre 2025 se realizaron las siguientes actividades:

FRENTE BRISAS

- Replanteo, control y medición de la obra
- Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)
- Desmonte y Limpieza
- Retiro de basuras y escombros
- Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)
- Excavación en material granular a cualquier profundidad
- Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad
- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

FRENTE HALCON

- Replanteo, control y medición de la obra
- Desmonte y Limpieza
- Retiro de basuras y escombros
- Perfilado a mano descolgado de talud
- Excavación en material granular a cualquier profundidad
- Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad
- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210.16223.6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.983.966-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
REPRESENTANTE LEGAL	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
NIT	901.982.939-1
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
FECHA DE INICIO	15/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/08/2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA- SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 diciembre 2025 NO se realizaron ingresos tampoco se registraron egresos.

El pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoría.

2.2 Infraestructura

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, la cual se encuentra ubicada en el Centro industrial y logístico san Jorge Bodega 16, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños.



Tabla 3. Ubicación del proyecto

En el periodo comprendido se usaron los siguientes equipos y maquinaria.

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
EXCAVADORA DOOSAN DX225LCA	MINICARGADOR CASE

	
ESTACIÓN TOPOGRAFICA	VOLQUETA

Anexo 1. Control de maquinaria y equipo

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre 01 al 31 diciembre 2025, se presentaron 6 capacitaciones. 4 del área SST; Actores Viales y señales de transito, Reporte de incidentes y accidentes laborales, Uso Adecuado de elementos de protección personal y Funciones de los integrantes del copasst 1 capacitación del área ambiental política ambiental y política de orden y aseo. y 1 social; Fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad. Los soportes de asistencia a las capacitaciones fueron entregadas a interventoría en el informe técnico.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido del 01 al 31 diciembre 2025 se realizaron 1 comité técnico.

ACTAS	
Acta de mayores y menores cantidades de obra-radicada	23/12/2025

La comunicación con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como correo electrónico, mensajería instantánea y correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo, revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista Maquinobras de Colombia S.A.S.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	**NOMBRE**	**TIPO DE DOCUMENTO**	**VERSIÓN**	**FECHA**
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024
OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	2	30/06/2022
SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	3	02/01/2024
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp's	Procedimiento	1	27/02/2022
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/02/2022
SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Politica	3	22/07/2025
SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	3	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este período, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.

3. OPERACIÓN

3.1 Planificación y control operacional.

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron actividades constructivas en los frentes Brisas y Halcón, las cuales fueron previamente planificadas conforme al cronograma de obra y a los procedimientos establecidos, garantizando el control técnico, ambiental y de seguridad en cada una de las etapas ejecutadas.

En el Frente Brisas, se ejecutaron actividades de replanteo, control y medición de la obra, instalación de valla informativa tipo 1A, desmonte y limpieza del área de intervención, así como el retiro de basuras y escombros. Adicionalmente, se realizaron labores de perfilado manual de taludes en roca, excavaciones en material granular y suelo rocoso a diferentes profundidades, y sobreacarreos para distancias mayores a 1.000 metros, asegurando la adecuada disposición y manejo de los materiales resultantes.

Por su parte, en el Frente Halcón, se llevaron a cabo actividades similares que incluyeron el replanteo y control de obra, desmonte y limpieza, retiro de residuos, perfilado manual de taludes, excavaciones en material granular y en suelo rocoso, así como el manejo de sobreacarreos. Estas actividades fueron ejecutadas bajo lineamientos de control operacional, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la gestión

adecuada de los impactos ambientales y la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

En ambos frentes se mantuvo seguimiento continuo mediante registros de obra, control de cantidades ejecutadas y supervisión técnica, lo cual permitió garantizar la conformidad de los procesos constructivos con los requisitos del proyecto.

Así mismo para el periodo se aprobó un cambio en la solución de estabilización del talud en el frente Brisas, lo cual implicó la modificación de las cantidades inicialmente previstas, ajustándose a un sistema de control de erosión superficial con manto sintético anclado. Dicho cambio fue debidamente evaluado, aprobado y controlado conforme a los procedimientos del proyecto.

Para el periodo mencionado se avanza de acuerdo a la programación. *(ver pdf anexo al informe técnico)*

3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo establecido no se realizó la adquisición de materiales, ya que la actividad a ejecutar requiere específicamente de recurso humano.

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que no se han iniciado actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

3.3 Control en la prestación del servicio

Para la ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales
2. Fotografías
3. Actas de comités
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra

Esta información se encuentra consignada en los informes de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo.

Para el periodo comprendido se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pública lo establecido por el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 31 de diciembre de 2025:

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	100,89%
Atención de quejas	Mensual	100%	No se han presentado quejas
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	No se ha realizado la evaluación de proveedores
Multas en el periodo	Mensual	0	No se han presentado multas
Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	No se tenían capacitaciones programadas

- En el periodo del 01 al 31 de diciembre se evidencia el 100,89% toral de la ejecutado del proyecto con un avance acumulado del 11,32%, superior al programado del 11,22%, evidenciando cumplimiento del cronograma. Se destacan avances en movimiento de tierras en el frente Brisas de Primavera, incluyendo la intervención de un área adicional aprobada, y el inicio del frente Halcón de Granada con ejecución organizada de actividades preliminares.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- para el periodo comprendido entre 01 al 31 diciembre 2025, se presentaron 6 capacitaciones. 4 del área SST; Actores Viales y señales de transito, Reporte de incidentes y accidentes laborales, Uso Adecuado de elementos de protección personal y Funciones de los integrantes del copasst 1 capacitación del área ambiental política ambiental y política de orden y aseo. y 1 social; Fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Ver Anexo 2. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

Para el periodo establecido no se realizaron auditorías internas, se tiene programado por parte del CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA realizar una auditoría interna pendiente definir fecha de realización.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido, no se ha hecho dicha revisión, se tiene previsto esta revisión para el mes de marzo del 2025.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo a la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y programa de inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. Se realizó correctamente la contratación y afiliación del personal, de acuerdo a lo establecido por la organización, permitiendo contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades correspondientes a la revisión y ajuste de los diseños.
2. Se cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de este periodo a satisfacción.
3. Se cuenta con registros y soportes que permiten llevar el seguimiento del proyecto, se han realizado los respectivos informes y actas de comité que soportan dicho seguimiento.
4. No se han presentado quejas, multas o productos no conformes que interfieran con las actividades del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la elaboración de informes y actas de comités del proyecto que permitan realizar el correcto seguimiento de las actividades.
2. Planear detalladamente las actividades del proyecto y realizar seguimiento a los equipos y/o materiales que se requieran.

Anexo 1. Control de maquinaria y equipo.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Suarez	1.098.711.157		JAFSF175EKH0 16321	Aeropuerto

INSPECCIÓN

MES: Diciembre — AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones 5
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Hidrojuncion Redecuesta Cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1/12/25	2/12/25	3/12/25	4/12/25	5/12/25	6/12/25	
HORÓMETRO	15411	15419	15431	15439	15490	15495	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	6 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	6 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ESTADO	SEDE	UBICACIÓN
Miguel Angel Escandon	1096.219.995		DHSCEMACOL	Helicoco

INSPECCIÓN

MES: Diciembre — AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	1 DIC/11	2 DIC	3 DIC	4 DIC	5 DIC.	6 DIC	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (agua, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de pluma-cable y poleas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cabezal de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el manejo de estacionamiento (freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite Hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de batería.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Helicoy
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez Escandon
PROYECTO: Consorcio Hrligacion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1/12/25	2/12/25	3/12/25	4/12/25	5/12/25	6/12/25	
HORÓMETRO	15790	15796	15798	15860	15866	15869	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	6 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	6 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ESTATURO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Suarez	1.096.119.137		JATSR175EJM 16329	Hulcone)

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES				AÑO		
			DIA	9 DIA	10	11 DIA	12	13	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Contrato Mitigacion Radicuesta cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		9/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	
HOROMETRO		15455	15458	15461	15464	15469	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	13 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	13 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-xx
		Fecha	11/11/20
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERARIO	CEDULA	EQUIPO NO.	SERIE	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez Escobar	1.096.219.995		DIECEBRASCCK 06622 PQ	Falcon 1

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: JUL	AÑO: 2025					
				9/12/25	15/12/25	16/12/25	12/12/25	13/12/25	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de lubricantes/refrigerante (líquido, pluviales)		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asientos		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos		-	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado		-	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de planchas y pedales		✓	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente)		✓	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible		-	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	-	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro		✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras		✓	✓	✓	-	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales		✓	✓	✓	-	✓	
27		Verificar sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro			✓		✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín							
30		Inspeccionar el ventilador del motor							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio							
33		Verificar estado de batería							
34		Verificar estado de los cilindros							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de tracción							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pasas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Helicoy
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez
PROYECTO: Construcción Mitigación Reductante COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		9/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	
HORÓMETRO		15750	15780	15796	15819	15832	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	13 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	13 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acuña Suarez	1.098.719.157		JA FSF 175EJA 16321	Alcony

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: 15	Diciembre 16	19	18	AÑO: 19	2025 20	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rápido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							
21		Verificar estado de la batería.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Malcorel

OPERADOR: Yefersan Acevedo Suarez

PROYECTO: Consorcio Hidrogucion Reducuele Cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	
HOROMETRO	15970	15975	15978	15979	15985	15985	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yefeson Acevedo
FECHA	20 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	20 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SST-F-09
		Fecha	07/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	INVENTARIO	MARCA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez Escudero	1.096.249.995		DOOSAN DX225LCA	Antioquia

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Diciembre 2025						
			DIA: 05/12	11	12	13	14	20	Observaciones
1	Aforo interno	Verificar el funcionamiento de todas las luces (intensas, de la cabina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de planchas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escalones y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		—		✓		
29	Revisión bimensual	Verificar estado de bolsquin							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio							
33		Verificar estado de batería							
34		Verificar estado de los cilindros							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación							
36		Verificar estado general del tubo (bujes, pasadores, dientes, esquineros)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rueldas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMF-05
		Fecha	01/12/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Miguel Angel Alvarez Escandon
OPERADOR:	Frente HALCONES
PROYECTO:	Construccion Mitigacion Reductante COMJ

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	
HORÓMETRO	15835	15840	15849	15851	15860	15865	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	20 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCION	M
FECHA	20 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo	1.048.714.103		JAFSEFTSE1M4 46521	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre					2025
			22	23	24	25	26	27	28
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓				
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓				
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓				
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓				
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓				
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓				
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓				
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓				
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓				
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓				
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓				
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓				
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓				
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓				
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓				
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓				
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓				
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓				
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓				
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de boliquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineros, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Hidrotest

OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez

PROYECTO: Consorcio Mitigacion Redcuesta cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/12/25	23/12	24/12				
HOROMETRO	15480	15488	15489				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	29/12/25
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	29/12/25

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-05
		Fecha	17/11/2021
		Versión	5
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	CONTRATO	MARCA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez Esco	1.036.274.945		DIRECSA/CASE 8022-40	Alcoa 1

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	Nº 12/12	Diciembre 23	29	AÑO	2024
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓		
4		Verificar estado del extintor de incendios.	✓	✓	✓		
5		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓		
6		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓		
8		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓		
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓		
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓		
8		Verificar estado de planacas y pedales.	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓		
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓		
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓		
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓		
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia).	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓		
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓		
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓		
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓		
23		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓		
31		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓		
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓		
32		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓		
33		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓		
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓		
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓	✓	✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.					
30		Inspeccionar el ventilador del motor.					
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
22		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.					
33		Verificar estado de bateria.					
34		Verificar estado de los cilindros.					
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.					
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)					
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pasos flojos, gastados o dañados (ventilas, zapatas, rodillos, guias)					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	FO-P-05
		Fecha	11/11/2025
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcones
OPERADOR:	Miguel Angel Alvarez Escandon
PROYECTO:	Consorcio Hidrogación 127 pedregal Alamb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/12/25	23/12/25	24/12/25				
HORÓMETRO	15866	15869	15870				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	29 Diciembre 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	29 Diciembre 2025

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acuña Suarez		1.018.7M.107	JAFE17SESM 96321	Helvia

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: 24	Diciembre 30	31	DIA	AÑO:	2025 DIA	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓				
2		Verificar estado de extinto de incendios.	✓	✓	✓				
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓				
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓				
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓				
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓				
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓				
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓				
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓				
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓				
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓				
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓				
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓				
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓				
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓				
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, contaduras, abultamientos).	✓	✓	✓				
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓				
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓				
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓				
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de boliqui.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Reductora cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/12/25	30/12/25	31/12/25				
HOROMETRO	15493	15496	15499				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	31/Dic/25
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	31/DIC/25

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-09
		Fecha	11/11/2021
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	IDENTIFICADOR	MARCA / SERIE	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez E.	1.096.219.415		DH KOREA / D022L-7Q	Asticonis

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre		AÑO		2021	
			29/12	30/12	31/12	DIA	DIA	DIA	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓				
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓				
3		Verificar estado vidrio panorámica.	✓	✓	✓				
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	—	✓	✓				
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓				
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓				
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓				
8		Verificar estado de planacas y pedales.	—	✓	✓				
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓				
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓				
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	—	✓	✓				
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓				
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia).	✓	✓	✓				
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	✓	✓				
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓				
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	—	✓	✓				
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓				
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓				
19		Controlar el nivel de combustible	✓	—	✓				
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	—	✓				
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓				
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓				
23		Verificar estado de mangueras.	✓	—	✓				
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓				
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	—	✓	✓				
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓				
27		Verificar sistema de escape.	✓		✓				
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓	✓	✓				
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botellón.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de batería.							
34		Verificar estado de los cinturones.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	0[illegible]
		Fecha	[illegible]
		Versión	1
		Página	2 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Tulcoyes
OPERADOR:	Miguel Angel Escobar
PROYECTO:	Consorcio Fidyuciar Pedicuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/12/25	30/12/25	31/12/25				
HORÓMETRO	15876	15879	15887				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E.
FECHA	31/12/25
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	31/12/25

Scanned with CamScanner

TIENDA TOPOGRAFICA

NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S	VERSION 2
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Bucaramanga 11/JUNIO/2025 **Nº 1201**

EQUIPO: ESTACION TOTAL **MARCA:** TOPCON **REF:** GM-55 **PRECISION:** 5" **No:** **1Y001620**

EMPRESA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA **NIT:** 900.849.507 - 1 **CIUDAD:** BUCARAMANGA

DIRECCION : Carrera 26 No. 36 – 14 Of. 403 Edificio Fenix

TELEFONO: 6914305 - 3164735387

NUEVO **SI** ☐ **NO** ■

Certificado vigente hasta: 11 DE DICIEMBRE/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía.

DIAGNOSTICO Y AJUSTE

DESCRIPCION	1	2	3	4
Base Nivelante	X	X		X
Nivel circular y tubular		X		X
Movimiento Horizontal	X	X		X
Movimiento Vertical	X	X		X
Freno Horizontal	X	X		X
Freno Vertical	X	X		X
Display		X		X
Ajuste plomado		X		X
Revisión Batería		X		X
Revisión Cargador				X

DESCRIPCION	1	2	3	4
Lente Interno		X		X
Base de Retículo		X		X
Retículo		X		X
Objetivo				X
Verticalidad		X		X
Operación				X
Revisión de Teclado		X		X
Programación de Parámetros		X		X
Entrada y Salida de Datos				X

1. Cambio de Grasas **2.** Ajuste y/o limpieza **3.** Requiere Cambio **4.**Correcto

Nota el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema

Cambio de Repuestos **SI** ☐ **NO** ■

Cuales:

Observaciones o Recomendaciones:

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
Nit. 901.342.575-9
Firma Autorizada

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33*26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
1201

LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
Fecha: 2025.06.16 16:32:21 -05'00'

TIENDA TOPOGRAFICA

NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S	VERSION 2
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Nº 1201

La Verificación se efectúo siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL Y VERTICAL

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:120663)***:

	A HORIZONTAL		A VERTICAL
P1	0°00'00"	P1	269°56'40"
P2	180°00'00"	P2	90°03'19"
ERROR	00°00'00"	ERROR	00°00'01"

TOLERANCIA DE ERROR PERMITIDO POR EL FABRICANTE ES DE 2 SEGUNDOS
(La tolerancia de error especifica un margen como aceptable en la calibración)

ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION DEL EQUIPO			
	°	'	''
Posición 1 (Vertical D)	90	58	03
Posición 1 (Horizontal D)	00	00	00
Posición 1 (Vertical I)	269	01	40
Posición 1 (Horizontal I)	179	59	50
Error Observado V	00	00	17
Error Observado H	00	00	10

ERROR CORREGIDO Y CALIBRADO EL EQUIPO			
	°	'	''
Posición 2 (Vertical D)	90	58	32
Posición 2 (Horizontal D)	00	00	00
Posición 2 (Vertical I)	269	01	29
Posición 2 (Horizontal I)	180	00	00
Error Observado V	00	00	01
Error Observado H	00	00	00

INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE (DISTANCIOMETRO) COND. 25° P. ATM 763MMHG CON. PRISMA -30					
ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION			ERROR CORREGIDO Y CÁLIBRACO EL EQUIPO		
DISTANCIA	MEDIDO	ERROR	DISTANCIA	MEDIDO	ERROR
5 MTRS	4.992	8MM	5 MTRS	5.000	------
10 MTRS	9.992	8MM	10 MTRS	10.000	------
100 MTRS	99.992	8MM	100 MTRS	99.999	1MM

Nota: Los ajustes realizados a la estación están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de cierre permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, precisión técnica garantizada por el fabricante.

EQUIPO: ESTACION TOTAL **MARCA:** TOPCON **REF:** GM - 55 **PRECISION:** 5" NO: **1Y001620**

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
NIT. 901342575-9
Firma Autorizada
LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S.
NIT. 901342575-9
Firma Autorizada
LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33ª26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
1201

Anexo 2. Ficha de indicadores

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SIST-P-44
		FECHA	3/03/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR											
Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de avance de obra ejecutado a la fecha del proyecto				Nombre del indicador	Avance de obra					
Interpretación del indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				Formula de calculo	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100					
Fuente de información	Informes tecnicos mensuales de obra				Tipo de indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				A quien se comunica	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	90%	Nivel Critico	80%

2. RESULTADOS 2025															
Periodo	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	0,13%	7,17%	11,32	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1126,28%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	0,08%	1,33%	11,22	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1122,41%
Resultado	144,28%	226,10%	100,89%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	101,41%



3. ANALISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo del 15 y el 31 de octubre se evidencia el 144,58 % de avance general del proyecto donde se ejecutan actividades preliminares tales como el replanteo topografico, la instalación de la valla informativa y el desmonte y limpieza a nivel superficial del lote intervenido.
En el periodo del 01 al 30 de noviembre se evidencia el 226,10 % de avance general del proyecto donde se evidencia un avance positivo en la ejecución de la obra, se finalizan actividades preliminares en el frente Bilbao de primavera y se inician actividades del frente Hebron de Granada.
En el periodo del 01 al 31 de diciembre se evidencia el 100,89% total de la ejecución del proyecto con un avance acumulado del 11,32%, superior al programado del 11,22%, evidenciando cumplimiento del cronograma. Se destacan avances en movimiento de tierras en el frente Bilbao de Primavera, incluyendo la intervención de un área adicional aprobada, y el inicio del frente Hebrón de Granada con ejecución organizada de actividades preliminares.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/03/2021
		VERSIÓN	3
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				Nombre del indicador	Atención de quejas					
Interpretación del indicador	Porcentaje de quejas mensuales respecto al periodo inmediatamente anterior				Formula de calculo	(N° de quejas mes anterior - N° de quejas mes actual/N° de quejas mes anterior)*100					
Fuente de información	No conformidades presentadas por las partes interesadas				Tipo de indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				A quien se comunica	General general					
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Descendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Rango satisfactorio	99%	Rango Critico	98%

2. RESULTADOS 2025

Periodo	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
N° de quejas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de quejas resueltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y 31 de octubre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Identificar el porcentaje de multas en los proyectos				Nombre del indicador	Multas en los proyectos							
Interpretación del indicador	Porcentaje de multas mensuales				Formula de calculo	(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual)/N° de multas mes anterior)*100							
Fuente de información	Correspondencia de multas generadas en el periodo				Tipo de indicador	Cuantitativo							
Responsable de medición	Director de obra				A quien se entrega	Gerente general							
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Acumulativo	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	99%	Nivel Crítico			97%

2. RESULTADOS 2024 / 2025

Periodo	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
N° de multas mes anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de multas mes actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de octubre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Presupu	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	GCI-F-48
		FECHA	5/5/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				Nombre del indicador		Desempeño de proveedores					
Interpretación del indicador	Medir la eficacia de los proveedores				Formula de calculo		Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores					
Fuente de información	Evaluación de desempeño de proveedores				Tipo de indicador		Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador de compras				A quien se comunica		Gerente general					
Frecuencia	Anual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	90%	Nivel Critico	75%	

2. RESULTADOS 2024/2025

Periodo	may-25
Suma de calificación de proveedores	4,83
Mayor calificación	5,00
Resultado	97%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se realiza evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (97% satisfactorio) de los proveedores involucrados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de ponerlos en conocimiento y resaltar el compromiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	[illegible]
		VERSIÓN	3
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR													
Objetivo del indicador	Identificar el cumplimiento del plan de capacitación					Nombre del indicador	Cumplimiento del plan de capacitación organizacional						
Interpretación del indicador	capacitaciones					Formula de calculo	(N° de capacitaciones programadas/N° de compañías ejecutadas)*100						
Fuente de información	Plan de capacitación					Tipo de indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Coordinador recursos humanos					A quien se entrega	Gerencia						
Frecuencia	mensual	Tendencia	Incremento	Unidad	porcentaje	Meta	100%	nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico		70%	

2. RESULTADOS															
PERIODO 2025/2027															
Periodo	ago-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
# capacitaciones ejecutadas	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
# capacitaciones programadas	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Resultado	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%




3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para el periodo se desarrollaron 2 capacitaciones. 1 del área SST, Funciones y responsabilidades en el COCAT, 1 capacitación del área ambiental y social, Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria.
para el periodo comprendido entre 01 al 30 noviembre 2025, se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST, Identificación de peligros y riesgos en el trabajo, Actos y condiciones inseguras en el trabajo. 1 capacitación del área ambiental Clasificación de Residuos – Manejo adecuado del Punto Ecológico, y 1 social, Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria.
para el periodo comprendido entre 01 al 31 diciembre 2025, se presentaron 6 capacitaciones. 4 del área SST, Activos Viales y señales de tránsito, Reporte de incidentes y accidentes laborales, Uso Adecuado de elementos de protección personal y Funciones de los integrantes del copasst 1 capacitación del área ambiental política ambiental y política de orden y aseo, y 1 social, Fortalecimiento de valores (empoderamiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad.


4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	244 días	mié 15/10/25	vie 14/08/26		$ 9.651.664.101,92
2		FIRMA ACTA DE INICIO DEL PROYECTO	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25		$ 0,00
3		FRENTE DE OBRA: BRISAS DE PRIMAVERA	244 días	mié 15/10/25	vie 14/08/26		$ 6.576.758.713,62
4		SECCIÓN PRIMERA	232 días	jue 16/10/25	vie 31/07/26		$ 245.885.228,83
5	1	Actividades Preliminares	232 días	jue 16/10/25	vie 31/07/26		$ 245.885.228,83
6	1.01	Replanteo, control y medición de la obra	30 días	jue 16/10/25	vie 31/07/26	2CC+1 día	$ 15.230.963,62
7	1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	3 días	mar 21/10/25	jue 23/10/25	6CC+4 días	$ 3.503.166,07
8	1.04	Desmonte y limpieza	18 días	vie 24/10/25	sáb 20/12/25	7	$ 14.081.951,30
9	1.05	Retiro de basuras y escombros	12 días	jue 30/10/25	mar 23/12/25	8CC+5 días	$ 44.731.517,42
10	1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	15 días	vie 14/11/25	vie 2/01/26	15CC+8 día	$ 168.337.630,42
11		SECCIÓN SEGUNDA	62 días	mié 5/11/25	mié 21/01/26		$ 792.252.888,45
12	2.01	Excavación a tajo abierto en taludes	45 días	mié 5/11/25	mar 30/12/25		$ 226.193.607,06
13	2.01.A	Excavación con acarreo libre	45 días	mié 5/11/25	mar 30/12/25		$ 226.193.607,06
14	2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	22 días	mié 5/11/25	mar 30/12/25	9CC+4 días	$ 101.993.840,77
15	2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	22 días	mié 5/11/25	mar 30/12/25	14CC	$ 124.199.766,29
16	2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m	45 días	sáb 8/11/25	mié 21/01/26	14CC+3 día	$ 566.059.281,39
17		SECCIÓN TERCERA	118 días	sáb 10/01/26	jue 4/06/26		$ 394.900.573,50
18	3	Concretos	118 días	sáb 10/01/26	jue 4/06/26		$ 394.900.573,50
19	3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	118 días	sáb 10/01/26	jue 4/06/26	31CC+4 día	$ 394.900.573,50
20		SECCIÓN CUARTA	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25		$ 0,00
21	4	Aceros	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25		$ 0,00
22		SECCIÓN QUINTA	120 días	mar 6/01/26	mar 2/06/26		$ 3.924.251.991,56
23	5	Perforaciones horizontales	120 días	mar 6/01/26	mar 2/06/26		$ 3.924.251.991,56
24	5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendiente mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	120 días	mar 6/01/26	mar 2/06/26	10FC+2 días	$ 3.924.251.991,56
25		SECCIÓN SEXTA	35 días	jue 25/06/26	jue 6/08/26		$ 51.515.015,98
26	6	Varios	35 días	jue 25/06/26	jue 6/08/26		$ 51.515.015,98
27	6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	12 días	jue 25/06/26	jue 9/07/26	32FC-5 días	$ 17.567.929,42
28	6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	15 días	mar 21/07/26	jue 6/08/26	33	$ 33.947.086,56
29		SECCIÓN SEPTIMA	178 días	mar 6/01/26	vie 14/08/26		$ 1.167.953.015,30
30		Items No Previstos	178 días	mar 6/01/26	vie 14/08/26		$ 1.167.953.015,30
31	7.01	Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m	120 días	mar 6/01/26	mar 2/06/26	24CC	$ 668.704.770,56
32	7.02	Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV	30 días	lun 25/05/26	mié 1/07/26	19FC-10 días	$ 438.671.531,63
33	7.03	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero	20 días	jue 25/06/26	sáb 18/07/26	32FC-5 días	$ 60.576.713,11
34		Orden y aseo final	6 días	sáb 8/08/26	vie 14/08/26	28	$ 0,00
35		FINALIZACIÓN DEL FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	34	$ 0,00
36		FRENTE DE OBRA: HALCON DE GRANADA	179 días	lun 1/12/25	sáb 11/07/26		$ 3.074.905.388,30
37		SECCIÓN PRIMERA	116 días	lun 1/12/25	jue 23/04/26		$ 130.677.983,92
38		Actividades Preliminares	116 días	lun 1/12/25	jue 23/04/26		$ 130.677.983,92
39		Inicio de labores en el frente	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	40CC	$ 0,00
40	1.01	Replanteo, control y medición de la obra	30 días	lun 1/12/25	jue 23/04/26	10CC+13 dí	$ 15.230.963,62
41	1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m)	3 días	sáb 6/12/25	mié 10/12/25	40CC+5 día	$ 3.503.166,07
42	1.04	Desmonte y limpieza	3 días	lun 1/12/25	mié 3/12/25	40CC	$ 3.714.078,80
43	1.05	Retiro de basuras y escombros	4 días	mar 2/12/25	vie 5/12/25	42FC-2 días	$ 30.886.861,12
44	1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	4 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25	48FC-2 días	$ 77.342.914,31
45		SECCIÓN SEGUNDA	108 días	mié 3/12/25	jue 16/04/26		$ 260.404.596,00

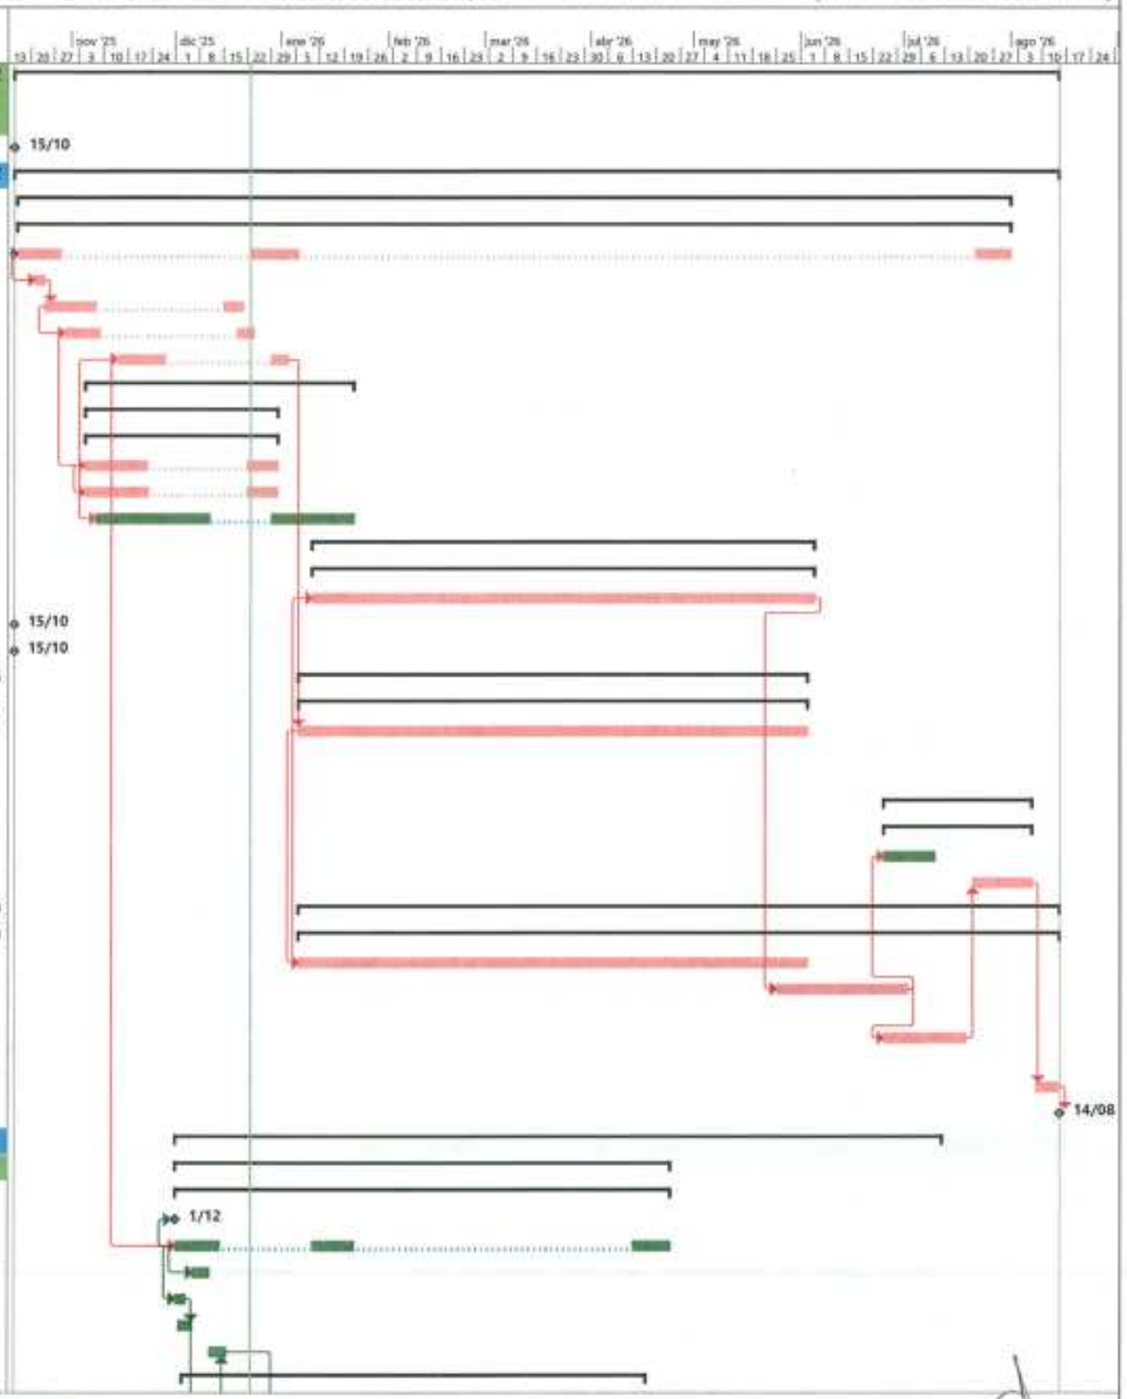

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
46	2.01	Excavación a tajo abierto en taludes	105 días	mié 3/12/25	lun 13/04/26		$ 74.754.466,02
47	2.01.A	Excavación con acarreo libre	105 días	mié 3/12/25	lun 13/04/26		$ 74.754.466,02
48	2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	42FC-1 día	$ 46.238.993,11
49	2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	8 días	jue 4/12/25	sáb 13/12/25	42	$ 21.114.188,06
50	2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	15 días	mar 24/03/26	lun 13/04/26	56	$ 7.401.284,85
51	2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m	30 días	jue 4/12/25	jue 16/04/26	48CC+1 día	$ 185.650.129,98
52		SECCIÓN TERCERA	95 días	vie 23/01/26	mié 20/05/26		$ 375.197.821,84
53	3	Concretos	95 días	vie 23/01/26	mié 20/05/26		$ 375.197.821,84
54	3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	7 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	64	$ 31.799.292,63
55	3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	7 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	64	$ 258.972.559,14
56	3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	50 días	vie 23/01/26	sáb 21/03/26	61CC+20 días	$ 84.425.970,07
57		SECCIÓN CUARTA	144 días	lun 29/12/25	jue 25/06/26		$ 282.840.598,26
58	4	Aceros	144 días	lun 29/12/25	jue 25/06/26		$ 282.840.598,26
59	4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2	15 días	mar 14/04/26	jue 30/04/26	50	$ 71.192.011,67
60	4.02	Suministro y colocación de anclajes	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26		$ 128.882.997,83
61	4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26	72CC	$ 128.882.997,83
62	4.03	Tensionamiento de anclajes	4 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	55FC+25 días	$ 8.353.793,47
63	4.04	Suministro y colocación	5 días	mié 6/05/26	lun 11/05/26		$ 25.200.378,09
64	4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	5 días	mié 6/05/26	lun 11/05/26	77	$ 25.200.378,09
65	4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	4 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	55FC+25 días	$ 12.057.481,37
66	4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	4 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	55FC+25 días	$ 23.064.622,40
67	4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	4 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	55FC+25 días	$ 14.089.313,43
68		SECCIÓN QUINTA	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26		$ 1.904.469.951,07
69	5	Perforaciones horizontales	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26		$ 1.904.469.951,07
70	5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26	44FC+10 días	$ 958.452.659,63
71	5.03	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26	44FC+10 días	$ 339.299.526,73
72	5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	55 días	lun 29/12/25	mié 4/03/26	44FC+10 días	$ 606.717.764,71
73		SECCIÓN SEXTA	54 días	sáb 2/05/26	mié 8/07/26		$ 60.038.822,02
74	6	Varios	54 días	sáb 2/05/26	mié 8/07/26		$ 60.038.822,02
75	6.02	Canaleta (ancho=1m; e=10cm)	4 días	sáb 23/05/26	mié 27/05/26	55FC+2 días	$ 15.044.234,88
76	6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	10 días	vie 26/06/26	mié 8/07/26	62	$ 13.069.800,30
77	6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	3 días	sáb 2/05/26	mar 5/05/26	59	$ 31.924.786,84
78		SECCIÓN SÉPTIMA	87 días	mar 24/03/26	sáb 11/07/26		$ 61.275.615,19
79		Items No Previstos	3 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26		$ 61.275.615,19
80	7.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	3 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	56	$ 44.664.895,13
81	7.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	3 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	56	$ 16.610.720,06
82		Orden y aseo final	3 días	jue 9/07/26	sáb 11/07/26	76	$ 0,00
83		FINALIZACIÓN DEL FRENTE HALCON DE GRANADA	0 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26	82	$ 0,00

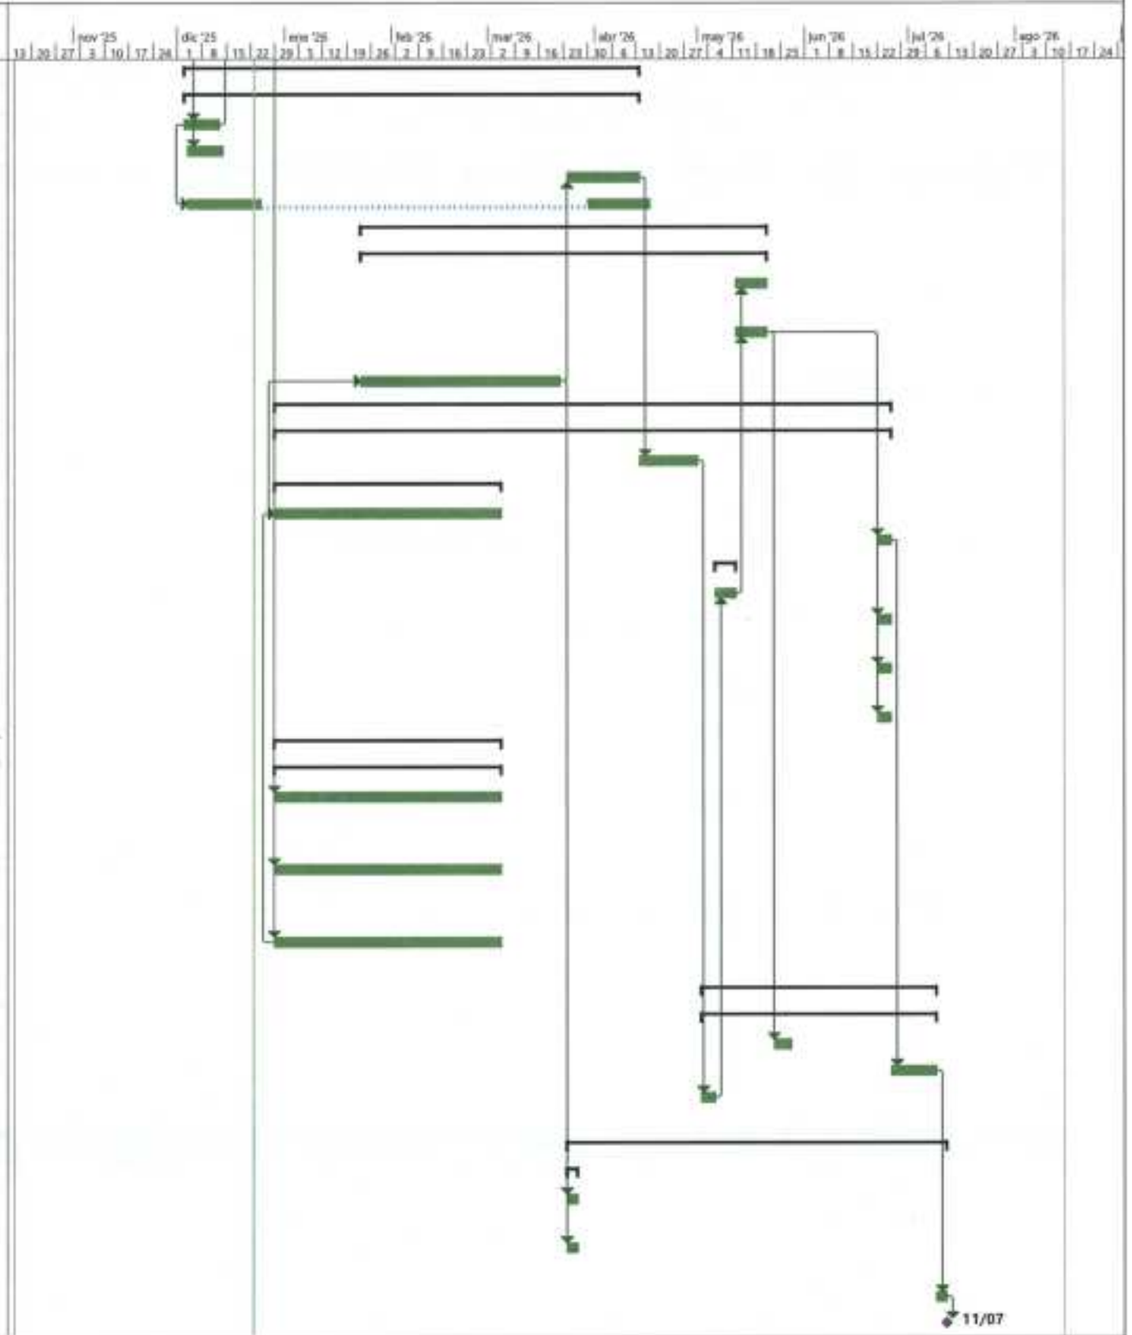

ANEXO NO.7: ACTAS DE REUNIÓN O COMITÉS DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO35 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
LUGAR:	Frente de obra del barrio Brisas de Primavera - Piedecuesta, Santander

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
01	13	11	25
Hora Inicio	10:00 AM		
Hora final	12:00 PM		

AGENDA

No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Saludo y presentación de los profesionales asistentes a la reunión. Seguimiento al avance del proyecto.	Contratista – Interventoría
2	Recorrido y revisión del avance físico de obra.	Contratista – Interventoría
3		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Se inicia comité con profesionales del contratista e interventoria, realizando como primera medida la presentación de los profesionales asistentes,
2	Se realiza recorrido y revisión del avance físico en la ejecución de obra, evidenciando avance en actividades tales como cerramiento perimetral del área, construcción de campamento de obra, retiro de basuras y escombros. Se evidencia en la zona baja del talud el acondicionamiento de una barricada para protección de la infraestructura local, dado el inicio próximo de las actividades de excavación en material granular y rocoso.

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FD66 / VERSION: 6	ACTA DE REUNIÓN		

3	El contratista de obra manifiesta que, una vez iniciadas las actividades de obra, la comunidad ha expresado inquietudes en relación con la intervención de las especies arbóreas encontradas sobre la zona a estabilizar. Por lo anterior, se evaluará el tema de manera técnica y ambiental con todos los profesionales afines al proyecto, tanto del contratista, interventoría y supervisión, para proponer alternativas que permitan atender y dar conformidad a dichas inquietudes de la comunidad.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Programar reunión con profesionales del contratista, interventoría y supervisión para revisar la ingeniería del proyecto sobre el talud a estabilizar en Brisas de Primavera, y plantear posibles alternativas que mitiguen el impacto ambiental, dado lo expreso por la comunidad.	Contratista - Interventoría	
2			
3			

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	21/11/2025	HORA:	8:00 AM	LUGAR:	Campamento Frente Brisas de Primavera, Piedecuesta.

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Jhon Alexander González Rivera	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Andrea Karina Quintero Ortiz	Residente de interventoría	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PLFD05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
LUGAR:	Frente de obra del barrio Brisas de Primavera - Piedecuesta, Santander

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
01	13	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Jhon Alexander González Rivera	x		Residente de Obra	Contratista	
2	Lissette Ximena Niño Carvajal		x	Asesor Ambiental	Contratista	
3	Andrea Karina Quintero Ortiz		x	Residente de interventoría	Interventoría	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Asesor Ambiental	Interventoría	
5						
6						

Género: M: Masculino / F: Femenino

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 8	ACTA DE REUNIÓN		

		ACTA No.	FECHA		
TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**	02	DD	MM	AA
			21	11	25
LUGAR:	Frente de obra del barrio Brisas de Primavera - Piedecuesta, Santander	**Hora Inicio**	10:00 AM		
		Hora final	12:00 PM		

AGENDA

No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Saludo y presentación de los profesionales asistentes a la reunión. Seguimiento al avance del proyecto.	Contratista – Interventoría
2	Recorrido y revisión del avance físico de obra.	Contratista – Interventoría
3		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Se inicia comité con profesionales del contratista e interventoría, realizando como primera medida la presentación de los profesionales asistentes de parte del Contratista de obra y de la Interventoría.
2	Se realiza recorrido y revisión del avance físico en la ejecución de obra, evidenciando avance en actividades tales como excavaciones en material granular y en roca sobre el talud. Adicionalmente se adelantan las actividades retiro de dicho material proveniente de las excavaciones al sitio de disposición autorizado. Durante la semana se han ejecutado estas actividades de manera continua, conforme a la programación establecida, garantizando el adecuado desarrollo del frente de trabajo.

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

3	Durante el recorrido, la interventoria puede verificar el cumplimiento de la ejecución de obra conforme a la programación, al igual que la presencia del personal de obra y la maquinaria necesaria para el buen desarrollo de las actividades.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Programar con la comunidad, entidad e interventoría socialización y aclaración de inquietudes.	Contratista de obra - Interventoría	Por definir
2			
3			

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	28/11/2025	HORA:		LUGAR:	Brisas de Primavera, Piedecuesta.

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Jhon Alexander González Rivera	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Andrea Karina Quintero Ortiz	Residente de interventoría	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
LUGAR:	Frente de obra del barrio Brisas de Primavera.

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
02	21	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jhon Alexander González Rivera	x		Residente de Obra	Contratista	
2	Andrea Karina Quintero Ortiz		x	Residente de interventoria	Interventoría	
3						
4						
5						
6						

Género: M: Masculino / F: Femenino

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F035 / VERSION: 6	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
		03	24	11	25
LUGAR:	Oficinas SURYT Tercer Piso en sede principal CDMB	**Hora Inicio**	10:00 AM		
		Hora final	12:00 PM		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Saludo y presentación de los profesionales asistentes a la reunión.	CDMB - Contratista – Interventoría
2	Análisis y estudio de la solicitud realizada por la comunidad del barrio Brisas de Primavera 1 para no talar los árboles existentes ubicados en la parte alta del talud, ubicado a borde de la vía principal de acceso al barrio, en el tramo comprendido entre la calle 16 (manzana D) y la calle 15B (manzana B).	CDMB - Contratista – Interventoría
3		

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Se inicia el comité con la asistencia de los profesionales que actúan en representación del contratista, la interventoría y de la entidad contratante, en Donde el Arquitecto Carlos Alberto Díaz como supervisor les da el saludo de bienvenida.
2	El Arquitecto Diaz deja claro que la CDMB, como entidad contratante formulo el proyecto de estabilización en el sector Brisas de Primavera 1, continuando con la estabilización iniciada por la Unidad Nacional Para La Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD bajo el Contrato de obra No. 9677-PPAL001-695-2022 que tubo por objeto "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ANCLADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS BARRIOS BRISAS DE PRIMAVERA, VILLA ALICIA, VILLA MARÍA, VILLAMAR Y CERROS DEL MEDITERRÁNEO, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 017 DE 2020, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.101 DE 2020 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 0156 DE 2020", en donde se ejecutó la misma tipología de obra de mitigación proyectada y que hace parte del Contrato de obra No. 210.16223.6, y que la CDMB para este sector esta actuando como apoyo en los procesos de reducción del riesgo al municipio de Piedecuesta.

Seguidamente El Arquitecto Carlos Alberto Díaz, manifiesta que el motivo del presente comité, es establecer una hoja de ruta para dar respuesta a la solicitud realizada por la comunidad del barrio Brisas de Primavera 1, la cual fue manifestada durante el proceso de socialización realizado el día 16 de octubre de 2025 y se radicó de manera formal con el número 24849 de 2025 ante la CDMB el día 20/10/2025, y en la que exigen, en el marco del contrato de obra No. 210.16223.6, no talar los árboles ubicados en la parte alta del talud, ubicado a borde de la vía principal de acceso al barrio, en el tramo comprendido entre la calle 16 (manzana D) y la calle 15B (manzana B).

Interviene el Ingeniero Jhon Alexander González Rivera, el cual indica que el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB ha venido desarrollando actividades preliminares en el lugar, y que la comunidad es renuente con el desarrollo de la obra, y de manera reitera ha manifestado que no permitirá el retiro de las especias arbóreas, que son conscientes de la importancia de la obra de mitigación, y piden se reconsidere el diseño.

Se le da la palabra al Ingeniero Jesús Evelio Sánchez, profesional Especializado adscrito a la CDMB, e informa que, el día 27/10/2025 se realizó visita técnica de inspección por parte de personal de la Entidad Ambiental al talud en mención, con el objetivo de identificar las condiciones existentes y en dicha visita se verificó la existente de 23 especies arbóreas, las cuales son las mencionadas en el oficio enviado por parte de la comunidad de Brisas de Primavera 1, así mismo indica que al oficio con radicado de ingreso CDMB No. 24849 de 2025, se le dio respuesta mediante radicado de Salida CDMB No. 22060 del 13 de noviembre de 2025, en donde queda el compromiso de revisar la solicitud con el Contratista y la Firma Interventora.

Interviene la Ingeniera Edith Costanza Toloza Rojas y manifiesta que es necesario tener un panorama claro para la intervención del sector, en donde se debe trabajar en conceso con la comunidad para que no se generen retraso al contrato y se puedan ejecutar a satisfacción de todas las partes el objeto del contrato el cual es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por lo cual considera necesario que se realice una evaluación de las especies arbóreas y que se verifique su estado y función en dicho zona.

El Arquitecto Carlos Alberto Díaz indica que solicitara apoyo de un profesional forestal de la CDMB para que realice una visita técnica y evalué las condiciones arbóreas del sector del Barrio Brisas de Primavera 1 en el tramo comprendido entre la calle 16 (manzana D) y la calle 15B (manzana B), así mismo solicita a la firma Interventora y al contratista para que se realice un ficha de caracterización de cada individuo arbóreo en pie y sea enviada a la CDMB para su análisis como complemento previo a la visita que realice el profesional forestal de la CDMB de tal manera que la visita sea mas productiva.

Igualmente, el arquitecto Diaz le solicita a la interventoría para el contratista de obra revise los diseños actuales y genere una proyección constructiva que minimice los impactos sobre los árboles del sector y que además no sobrepase el valor contratado para ese frente , teniendo como base que la intervención se realiza para mitigar una amenaza latente que compromete la vida y los bienes de los habitantes del sector, así c0mo la estructura comunitario y que urge su intervención, toda vez que se trata de realizar una medida de reducción y prevención

La interventoria le solicita al contratista de obra, que conjuntamente, proyecten alguna opción constructiva que permita estabilizar el talud mencionado en el presente comité y que pueda ejecutarse sin perjudicar las especies arbóreas existentes, teniendo en cuenta lo indicado por le Arquitecto Diaz, así mismo indica que se es importante la evaluación técnica de la CDMB, la cual debe ser presentada para verificar un mejor contexto de cada individuo arbóreo.

Por último, el contratista de obra manifiesta estar de acuerdo con la solicitud y manifiesta que realizará los estudios pertinentes y que proyecta entregar en los primeros días de diciembre una evaluación o solución para estabilizar el talud del barrio Brisas de Primavera 1, sin afectar los árboles existentes.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Realizar el inventario Forestal mediante el levantamiento de una ficha por individuo en donde se incluya el estado sanitario y se lo envía a la CDMB,	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB - INTERVENTORIA	Primera Semana de Diciembre
2	Realizar una evaluación del levantamiento arbóreo y hacer una visita al sector con profesional idóneo	CDMB	Primera Semana de Diciembre
3	Realizar la revisión del diseño inicial y analizará una propuesta de obra de mitigación complementaria o un cambio de la estructura de estabilización que se enfoque en lo posible en la conservación de algunos individuos arbóreos, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, morfométricas, topográficas y geotécnicas de la zona.	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB - INTERVENTORIA	Primera Semana de Diciembre

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	12/12/2025	HORA:		LUGAR:	Oficina SURYT – CDMB

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Jhon Alexander González Rivera	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Andrea Karina Quintero Ortiz	Residente de interventoría	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
LUGAR:	Oficinas SURYT Tercer Piso en sede principal CDMB

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
03	24	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jhon Alexander González Rivera	x		Residente de Obra	Contratista	
2	Lissette Ximena Niño Carvajal		x	Asesor Ambiental	Contratista	
3	Jorge Eliecer Alvarez Carreño		x	Director de interventoría	Interventoría	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Asesor Ambiental	Interventoría	
5	Carlos Alberto Díaz	x		Subdirector - Supervisor	SURYT	
6	Jesús Evelio Sánchez	x		Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	SURYT	

Género: M: Masculino / F: Femenino

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

CDMB

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026



CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PIEDECUESTA, SANTANDER

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
4.1 CONTROL DE GARANTÍAS - PÓLIZAS 7
4.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 8
4.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO 8
5 INFORME DE AVANCE 9
5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
5.2 CONTROL DE EQUIPOS USADOS EN OBRA 15
5.3 CONTROL DE PERSONAL 19
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 19
7 ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL 20
9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 20
10 CONCLUSIONES 21

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización zonas a intervenir – Barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada ... 5
Ilustración 2. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Brisas de Primavera ... 10
Ilustración 3. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Halcón de Granada ... 13

TABLAS

Tabla 1 Control de Garantías - Contrato de Obra ... 7
Tabla 2 Control de Garantías actualizado a Acta de inicio ... 7
Tabla 3 Relación de actas a la fecha ... 8
Tabla 4 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Brisas de Primavera ... 9
Tabla 5 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Halcón de Granada ... 12
Tabla 6 Relación de equipo ... 15
Tabla 7 Relación de personal del contratista ... 19
Tabla 8 Relación de Actas de Cobro ... 20

1. INTRODUCCIÓN

El Contratista CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB, identificado con NIT 901.983.966-5, representado legalmente por el ingeniero Julián Andrés Serrano Gómez, fue seleccionado mediante licitación para ejecutar el Contrato de Obra No. 210.16223.6 cuyo objeto es la: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Dado lo anterior y en cumplimiento al objeto contractual, se presenta documento correspondiente al Informe técnico de obra, con información detallada de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar, evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en cumplimiento del objeto contractual "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", durante el plazo establecido del contrato, comprendido desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 14 de agosto de 2026.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ejecutar los ítems contractuales conforme a las especificaciones técnicas dadas, garantizando la calidad, estabilidad y seguimiento de las obras contempladas en el contrato.

Desarrollar las actividades administrativas, de seguridad y gestión ambiental, consolidando los resultados mediante documentación técnica, reportes fotográficos y demás soportes que respalden la gestión realizada durante el periodo evaluado.

Verificar y evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

Monitorear el avance físico y financiero de la obra, comparando lo ejecutado con lo programado, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma, la adecuada utilización de los recursos asignados y el correcto control y seguimiento del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en dos frentes de acción ubicados en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, los cuales se encuentran adscritos al municipio de Piedecuesta, Santander que pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

Ilustración 1. Localización zonas a intervenir – Barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada



4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se relaciona la información del contrato de obra N°210.16223.6 suscrito para la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE OBRA	N° 210.16223.6 del 05 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)
SUPERVISOR CONTRATANTE	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
REPRESENTANTE LEGAL	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.983.966-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
REPRESENTANTE LEGAL	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
NIT	901.982.939-1
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$ 9.651.664.101,92
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA, SANTANDER

4.1 CONTROL DE GARANTÍAS - PÓLIZAS

Tabla 1 Control de Garantías - Contrato de Obra

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 12/09/2025	
PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS RCE CONTRATOS				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y operaciones	$ 711.750,00	5/09/2025	5/07/2026	AB002677

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 12/09/2025	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 1.930.332.821,00	05/09/2025	05/11/2026	AB002676
Pago de salarios prestacionales	$ 482.583.205,25	05/09/2025	05/07/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.930.332.821,00	05/07/2026	05/07/2031	

Tabla 2 Control de Garantías actualizado a Acta de inicio

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 22/10/2025	
PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS RCE CONTRATOS				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y operaciones	$ 711.750,00	15/10/2025	15/08/2026	AB002677

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 22/10/2025	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 1.930.332.821,00	15/10/2025	15/12/2026	AB002676
Pago de salarios prestacionales	$ 482.583.205,25	05/09/2025	15/08/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.930.332.821,00	15/08/2026	15/08/2031	

4.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Tabla 3 Relación de actas a la fecha

RELACION DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
ACTA DE INICIO	15/10/2025	Se suscribe acta de inicio de obra el 15 de octubre de 2025, con un plazo para la ejecución total del proyecto de diez meses.	N/A
ACTA DE MODIFICATORIA 01	23/12/2025	Se suscribe acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos el 23 de diciembre de 2025, sin afectar el equilibrio financiero y el plazo contractual.	N/A
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No.1	29/12/2025	Se presenta el acta para pago parcial No.1 correspondiente al periodo entre el 15 de octubre de 2025 al 14 de diciembre de 2025.	$ 1.010.210.915,17

4.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 210.16223.6 durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, no presentó cambios técnicos y/o modificaciones.

5 INFORME DE AVANCE

5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026 se relacionan todas las actividades de obra ejecutadas en los frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada, tal y como se especifica en el siguiente cuadro.

Ver Anexo 1

Tabla 4 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Brisas de Primavera

DESCRIPCION ITEM	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADAS EN EL PERIODO	CANT. ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,10	0,40	40,00%
Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	m2	1,00		1,00	100,00%
Desmonte y Limpieza	m2	1964,00		1964,00	100,00%
Retiro de basuras y escombros	m3	392,82	170,82	392,82	100,00%
Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m3	496,41	215,85	496,41	100,00%
Excavación en material granular a cualquier profundidad	m3	1553,94	281,70	1553,94	100,00%
Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad	m3	1035,93	147,79	1035,93	100,00%
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-km	107965,80	32916,75	107965,80	100,00%

Ver Anexo 2


Ilustración 2. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Brisas de Primavera



Replanteo, control y medición de la obra



Retiro de basuras y escombros

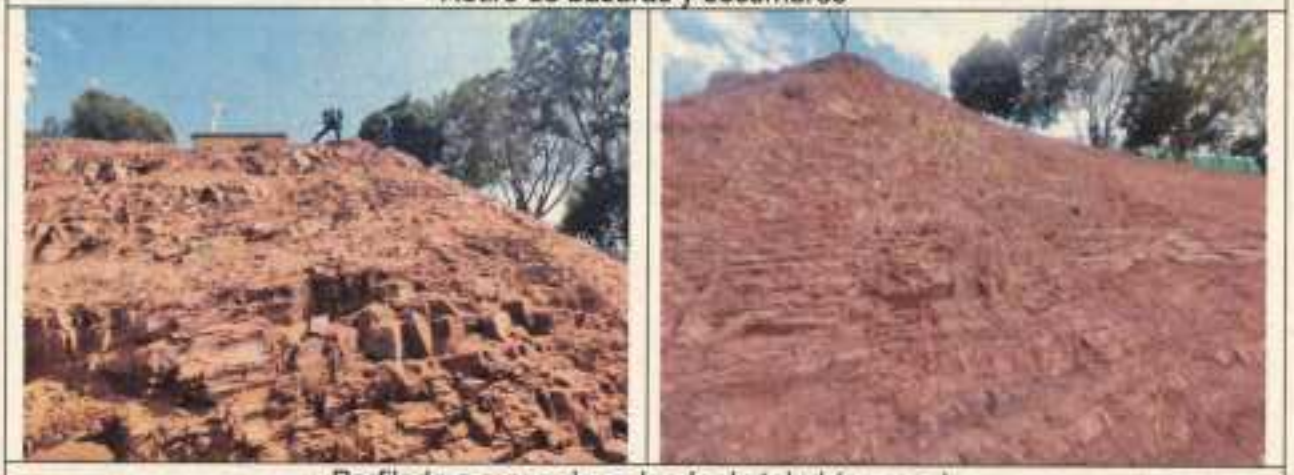

Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)




Excavación en material granular a cualquier profundidad




Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad




Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

Tabla 5 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Halcón de Granada

DESCRIPCION ITEM	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADAS EN EL PERIODO	CANT. ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,10	0,40	40,00%
Desmonte y Limpieza	m2	518,00		518,00	100,00%
Retiro de basuras y escombros	m3	271,24		271,24	100,00%
Perfilado a mano descolgado de talud	m3	308,21		308,21	100,00%
Excavación en material granular a cualquier profundidad	m3	704,48		704,48	100,00%
Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad	m3	176,11		176,11	100,00%
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-km	35409,48		34774,56	98,21%
Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	55,50	11,00	11,00	19,82%
Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	111,00	22,00	22,00	19,82%
Ejecución perforación horizontal con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	1665,00	330,00	330,00	19,82%
Ejecución perforaciones horizontales con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	555,00	110,00	110,00	19,82%
Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes	m	2220,00	440,00	440,00	19,82%

Ver Anexo 3

Ilustración 3. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Halcón de Granada



Replanteo, control y medición de la obra



Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes



Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m




Ejecución perforación horizontal - con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m




Ejecución perforaciones horizontales con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m




Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes

5.2 CONTROL DE EQUIPOS USADOS EN OBRA

Relación de equipos utilizados en el desarrollo del presente contrato en el periodo comprendido del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

Tabla 6 Relación de equipo

RELACIÓN DE EQUIPO UTILIZADO	
CANTIDAD	**MAQUINARIA/EQUIPO**
1	Nivel Topográfico
1	Equipo RTK - GNSS STONEX S900
1	Estación total Topcon
2	Volqueta (modelo mayor a 2010)
1	Excavadora DOOSAN DX225LCA
1	Minicargador CASE-2018
1	Unidad neumática de perforación (#10)
1	Compresor Atlas Copco XAVS 450
1	Unidad de inyección (#2)

RELACIÓN DE EQUIPO UTILIZADO	
EQUIPO	**FOTOGRAFIA**
Nivel Topográfico TOPCON AT-B4	

Equipo RTK - GNSS STONEX S900	
Estación TOPCON GM-50	

2 Volquetas (modelos 2017 y 2018)	
Excavadora DOOSAN DX225LCA	
Minicargador CASE-2018	

Unidad neumática de perforación (#10)	
Compresor Atlas Copco XAVS 450 (#60)	
Unidad de inyección (#2)	

5.3 CONTROL DE PERSONAL

Durante este periodo el Contratista presenta el personal operativo y profesional, que desarrolló labores en el marco del proyecto contractual, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 7 Relación de personal del contratista

PERSONAL CONTRACTUAL: PROFESIONALES SEGÚN PLIEGO			
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**INGRESO**
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	15/10/2025
Jhon Alexander González Rivera	1.098.760.722	Residente de obra	15/10/2025
William Eduardo Cortés Peña	91.278.912	Asesor en Geotecnia	15/10/2025
Lissette Ximena Niño Carvajal	63.395.720	Asesor Ambiental	15/10/2025
Víctor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional SST	15/10/2025
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80.187.378	PMP	15/10/2025
PERSONAL CONTRACTUAL: OPERATIVO			
Edgar Iván Palomino Holguín	1.098.636.620	Topógrafo	15/10/2025
Yeiner García Cadena	1.005.187.293	Operador de Perforación I	15/10/2025
Gumercindo Parra Solano	91.291.101	Oficial de Obra	15/10/2025
Alexander Prada López	13.745.736	Ayudante de Perforación II	15/10/2025
Harley Prada López	1.098.822.751	Operador de Perforación II	15/10/2025
Yoel Ardila Narváez	1.046.427.115	Operador de Perforación I	15/10/2025
Mauricio Villamizar Solano	1.005.541.892	Operador de inyección	16/10/2025
Luis Alberto Prada Rincón	5.691.822	Ayudante obra	16/10/2025
Yefferson Dyfred Gonzalez Ortega	5.823.211	Ayudante obra	4/11/2025
Andrés Francisco García Farias	6.656.491	Ayudante obra	4/11/2025
Luis Alfonso Fuentes Navarro	1.098.699.422	Ayudante de Perforación II	4/11/2025
José Alberto Ospino Baracamonte	1.050.719.060	Ayudante obra	4/11/2025
Juan Andrés Diaz Quintero	1.095.802.634	Almacenista	10/11/2025
Rodolfo Jesús Quiñonez Gutiérrez	6.356.621	Ayudante obra	13/1/2026
Kelvin Nicol Páez Buitrago	7.014.092	Ayudante de Perforación II	13/1/2026
Diego Andres Flores Rincón	1.063.560.222	Ayudante de Perforación II	13/1/2026
Frank Yan Pier James Cañas	1.005.060.412	Almacenista	21/1/2026
Pedro Jesus Vergel Vergel	3.285.355	Ayudante obra	27/1/2026

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado no se tramitaron actas parciales de pago, ni se presentaron ajustes o novedades de índole financiera relacionadas con la ejecución contractual del proyecto.

Tabla 8 Relación de Actas de Cobro

RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS			
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**	**ESTADO**
Acta de Inicio	15/10/2025	N/A	RADICADA
Anticipo		N/A	N/A
Acta de Cobro 01	15/10/2025-14/12/2025	$ 1.010.210.915,17	RADICADA

7 ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Respecto a las actividades correspondientes al componente de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas durante el periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, se presenta el respectivo informe, en el cual a su vez se anexa como soporte del personal en obra, su respectiva Seguridad Social.

Ver Anexo 3

8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, se presenta el respectivo informe. A su vez, se anexa como uno de sus componentes, el informe social de obra en el que se desglosan todas las actividades afines desarrolladas desde el inicio del proyecto.

Ver Anexo 4

9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Para el presente periodo, se realiza la actividad de aseguramiento de la calidad a los materiales y/o actividades desarrolladas en obra, con el debido seguimiento y enfoque conceptual en los fundamentos del manejo gerencial de proyectos, concebidas por el PMI (Project Management Institute), para lo cual se presenta el respectivo informe.

Ver Anexo 5

10 CONCLUSIONES

- A la fecha de este informe se evidencia un porcentaje global acumulado de lo ejecutado del 18.82% contra un 18.54% correspondiente al porcentaje acumulado programado, lo cual evidencia un avance positivo en el desarrollo e inicio de las actividades de perforación en el frente Halcón de Granada y la culminación de los movimientos de tierra totales del frente Brisas de Primavera.

- En el frente de obra del barrio **Brisas de Primavera**, con corte al periodo reportado en el presente informe, se culminaron las actividades correspondientes a la intervención del área adicional objeto de estabilización, la cual fue incorporada mediante acta modificatoria debidamente presentada y avalada. En dicha zona se ejecutaron en su totalidad las actividades contractuales asociadas al movimiento de tierra, excavaciones y perfilado del terreno, conforme a los alcances técnicos establecidos.

- De manera complementaria, para el **frente de obra Halcón de Granada** se dio por finalizadas las actividades correspondientes a movimientos de tierras e iniciaron las actividades concernientes a la perforación, encamisado e instalación de anclajes activos a 20 ml de profundidad.

ING JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Representante legal
CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

LISTA DE ANEXOS DEL INFORME

ANEXO NO.1: ESTADO DEL TIEMPO PARA EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.

ANEXO NO.2: BITACORA DE OBRA PERIODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.

ANEXO NO.3: PROGRAMA SG-SST E INFORME SST DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

ANEXO NO.4: INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

ANEXO NO.5: PROGRAMA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL

ANEXO NO.6: ACTAS DE REUNIÓN O COMITÉS DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO

ANEXO NO.1: ESTADO DEL TIEMPO PARA EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CDMB

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: 210.16223.6

CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PERIODO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	19	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	18	24	24	19	24	716
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	15
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	13
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ANEXO NO.2: BITACORA DE OBRA PERIODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.

BITÁCORA DE OBRA [TOMO 1]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Representante Legal - Contratista
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Representante Legal - Interventoría
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Director de Obra - Contratista
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
Director de Obra - Interventoría
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA
Ingeniero Residente - Contratista
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
Ingeniero Residente - Interventoría
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

de la maquinaria pesada, con el fin de mantenerla en adecuadas condiciones de operación.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, nivel y estación total.

Jose E. Alvarez C.

Lunes, 5 de enero 2026
Estado del clima: Día soleado
Brisas: Se realizó el replanteo topográfico y el control de excavaciones, verificando ejes, niveles y dimensiones conforme a los planos y especificaciones técnicas
Halcon: Se inicia con el armado de anclajes de 20 ml conforme a las especificaciones técnicas y planos estructurales establecidos para la obra. Personal. Ing. residente de obra e interventoría, topógrafo, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos. Retroexcavadora 225, Minicargador, nivel y estación total

Jose E. Alvarez C.

Martes, 6 de enero 2026
Estado del clima. Día nublado
Frente Brisas: Se realiza el replanteo topográfico del área de intervención, y se efectúa el retiro de basura y escombros.
Frente Halcon: se realiza el armado de anclajes
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, topógrafo, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación.
Equipos. Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, nivel y estacion total

Jose E. Alvarez C.

Miércoles, 7 de enero 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se realizaron excavaciones en material granular y roca dentro de la zona adicional de intervención. Así mismo, se efectuó el retiro de escombros mediante volqueta, los cuales fueron trasportados al punto de disposición final autorizado
Frente Halcon: Se realizo el retiro y limpieza de material residual producto de las excavaciones en la zona baja del talud. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas

Jueves, 8 de enero 2026
Estado del Clima: Dia soleado, lluvias leves en la tarde
Frente Brisas: Se continúa con excavación en material granular y roca en zona adicional de intervención y retiro de escombros en volqueta hacia punto de disposicion final
Frente Halcon: Se continúa con el armado de andajes y el corte de guaya de torón. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudante de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas

Viernes, 9 de enero 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se finalizan las excavaciones en material granular y roca. Posteriormente, se realiza el retiro de escombros, los cuales son transportados al punto de

disposicion final autorizado.
Frente Halcon: Se realiza el encauchetado de tubería PVC para anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, almacenista, oficial, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas.

Martes, 13 de enero 2026
Estado del Clima: Lluvias intensas en la madrugada. Ora nublado.
Frente Brisas: Se inicia el perfilado manual y descolgado de talud (en roca) en la zona adicionada de acuerdo con la modificatoria suscrita.
Frente Halcon: Se realiza la redistribución y demarcación de todos los anclajes a instalar sobre el talud. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso almacenista, oficial, Topógrafo, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, Nivel y estacion total.

Miércoles, 14 de enero 2026
Estado del Clima: Ora soleado
Frente Brisas: Se continúa con el perfilado a mano descolgado de talud (en roca) Asi mismo, se realizan sobreacarreos y retiro del material excavado hacia el sitio de disposición final autorizado
Frente Halcon: Se realiza el chequeo topográfico de las líneas de anclajes previamente marcadas y sus respectivos espaciamientos. Personal: Ing. residente de obra, interventoria, siso, almacenista, oficial, Topógrafo, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, nivel y estacion total.

Jueves, 15 de enero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la tarde
Frente Brisas: Se prosigue con las labores de perfilado manual y sobreacarreos de retiro del material excavado al sitio de disposicion autorizado
Frente Halcon: Se culmina la marcacion sobre el talud de los anclajes, dejando instalados los pines para la ubicacion respectiva de cada uno.
Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, almacenista, siso, oficial, topógrafo, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, nivel y estacion total

Viernes 16 de enero 2026
Estado del clima: Dra nublado
Frente Brisas: Se continúa con el perfilado manual del talud en material rocoso. Asimismo, se ejecutan sobreacarreos para el retiro del material excavado hacia el sitio de disposicion final.
Frente Halcon: Se moviliza unidad de perforacion a obra con su respectivo compresor. Personal: Ing Residente de obra e interventoria, almacenista, siso, oficial, ayudante de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas y unidad de perforacion con respectivo Compresor

Sabado 17 de enero 2026
Estado del clima: Dra soleado
Frente Brisas: Se finaliza el perfilado manual del talud en material rocoso. De igual manera, se ejecutan los sobreacarreos correspondientes para el retiro

y transporte del material excavado hacia el sitio de disposición final autorizado. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudante de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas y Unidad de perforación y compresor. Frente Halcon: Se instala sobre el talud la und de perforación y se hace prueba de todo el sistema hidraulico y general del equipo.

Lunes 19 de enero 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se continua con los sobreacarreos y retiro del material excavado al sitio de disposicion final. Frente Halcon: Se inicia con la perforacion e instalacion de anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventorias, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo compresor y unidad de inyeccion.

Martes 20 de enero 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se continua con la ejecución de sobreacarreos para el retiro y transporte del material excavado hacia el sitio de disposicion final autorizado. Frente Halcon: Se perfora a 20 m de profundidad con sistema tipo Jacket de encamisado y se instalan anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial almacenista, ayudantes de obra y perforacion: Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion

con respectivo compresor y unidad de inyección.

Miércoles, 21 de enero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se da continuidad a las actividades de sobreacarreos y retiro del material excavado, efectuando su transporte hacia el sitio de disposición final autorizado. Frente Halcon: se da continuidad a los trabajos de perforación a 20 ml de Profundidad utilizando sistema tipo Jacket con encamisado.
Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo Compresor y unidad de inyección

Jueves, 22 de enero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Brisas: se prosigue con las actividades de sobreacarreo y evacuación del material producto de la excavación, realizando su transporte hacia el sitio de disposicion final autorizado.
Frente Halcon: Se realizan perforaciones hasta 20 ml de profundidad empleando sistema tipo Jacket con encamisado para control de estabilidad del tajo. Personal: Ing. residente de obra e interventoria siso, oficial, almacenista, ayudante de obra y perforación
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo Compresor y unidad de inyeccion.

Viernes, 23 de enero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se mantiene la ejecución de sobreacarreos para la evacuación del material resultante de la excavación, efectuando su traslado al sitio de disposicion final autorizado. Frente Halcon: Se desarrollan perforaciones a una profundida de 20 ml empleando sistema tipo Jacket con encamisado, y se efectua la colocación de los anclajes de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el diseño. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Minicargador, volquetas, Retroexcavadora 225, unidad de perforación con respectivo compresor y unidad de inyeccion.

Lunes, 26 de enero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la madrugada, Dia nublado
Frente Brisas: Se continúa con los sobreacarreos y el retiro del material producto del perfilado hacia el sitio de disposicion final autorizado.
Frente Halcon: Se ejecutan perforaciones hasta 20 ml de profundidad mediante sistema tipo Jacket con encamisado. Posteriormente, se realiza la instalación de los anclajes conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el diseño. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación, Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con su respectivo compresor y unidad de inyeccion.

Jose E Alvarez C.

Martes, 27 de enero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la madrugada. Ora nublado
Frente Brisas: Se sigue con los sobre acarreos y retiro del material perfilado al sitio de disposicion autorizado. Dicho material se acopió previamente en la zona baja del talud para su posterior retiro
Frente Halcon: Se perfora a 20 ml de profundidad con sistema tipo Jacket de encamisado y se instalan anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Retroexcavadora 225, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo compresor y unidad de inyeccion.
Jose E Alvarez C

Miercoles, 28 de enero 2026
Estado del clima: Ora soleado
Frente Brisas: Se da continuidad a las actividades de sobreacarreos y evacuación del material proveniente del perfilado, realizando su transporte al sitio de disposición final autorizado
Frente Halcon: Se ejecutan perforaciones para la instalación de anclajes conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se realiza el llenado de los anclajes mediante inyección de lechada cementicia. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudante de obra y perforacion
Equipos: Retroexcavadora 225, minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo compresor y unidad de inyeccion
Jose E Alvarez C

Jueves, 29 de enero 2026
Estado del clima: Ora soleado

Frente Brisas: Se continúa con los trabajos de sobreacarreos y disposición del material resultante del perfilado, efectuando su traslado al sitio autorizado Frente Halcon: Se ejecutan perforaciones para la posterior instalación de anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos. Retroexcavadora zzs, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo compresor, y unidad de inyecion

Viernes, 30 de enero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas por la madrugada, día soleado
Frente Brisas: Se da continuidad a los sobreacarreos y al retiro del material producto del perfilado efectuando su transporte al sitio de disposicion final autorizado. Frente Halcon: Se realizan perforaciones y se procede con la instalación de anclajes.
personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Retroexcavadora zzs, Minicargador, volquetas, unidad de Perforacion con su respectivo compresor y unidad de inyeccion

Sábado, 31 de enero 2026
Estado del clima: Día soleado
Frente Brisas: Se continúa con la ejecución de sobreacarreos y el retiro del material proveniente del perfilado, efectuando su traslado al sitio de disposicion final. El material fue previamente acopiado en la zona inferior del talud para optimizar su cargue y posterior transporte.

Frente Halcon: Se realiza inyeccion de anclades con lechada cementicia. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, sso, oficial, almacenista, ayudante de obra y perforacion. Equipos: Retroexcavadora zzs, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo Compresor, y unidad de inyeccion

Jose E Arango C

ANEXO NO.3: PROGRAMA SG-SST E INFORME SST DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME SST N° 04

CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

CONSORCIO MITIGACIÓN
PIEDECUESTA CDMB

ELABORADO POR:
VICTOR JULIO GAMBOA
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 8
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 10
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 11
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 11
7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 11
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 12
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 13
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 13
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 14

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de Enero de 2026;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
NIT	901.983.966-5
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
CONTRATO	210.16223.6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
DIRECCIÓN	Centro Industrial y Logístico San Jorge, bodega 16
TELÉFONO	6076159848
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil Incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026							
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No cotiza
Yeiner García Cadena	1005187293	Operador de perforación I	29/09/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Gumersindo Parra Solano	91291101	Oficial	6/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Alexander Prada López	13745736	Ayudante de perforación II	6/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Harley Prada López	1098822751	Operador de perforación II	6/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Yoel Ardila Narváez	1046427115	Operador de perforación I	6/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
Mauricio Villamizar Solano	1005541892	Operador de inyección	16/10/2025	Axa Colpatria	Salud Mia	Porvenir	Comfenalco

Luis Alberto Prada Rincón	5691822	Ayudante de obra	16/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Yefferson Dyfred González Ortega	5.823.211	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Andrés Francisco García Farías	6.656.491	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Luis Alfonso Fuentes Navarro	1.098.699.422	Ayudante de perforación II	4/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
José Alberto Ospino Baracamonte	1.050.719.060	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Juan Andrés Diaz Quintero	1.095.802.634	Almacenista	10/11/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Kelvin Nicol Páez Buitrago	7.014.092	Ayudante de perforación II	13/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Diego Andrés Flores Rincón	1.063.560.222	Ayudante de perforación II	13/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Rodolfo Jesús Quiñonez Gutiérrez	6.356.621	Ayudante de obra	13/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Frank Yan Pier James Cañas	1.005.060.412	Almacenista	21/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Pedro Jesús Vergel Vergel	13.285.355	Ayudante de obra	27/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					**18**		

CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
William Eduardo Cortés Peña	91.278.912	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco

Jhon Alexander González Rivera	1.098.760.722	Residente de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Porvenir	Comfenalco
Lissette Ximena Niño	63.395.720	Asesor Ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Ninguna
Victor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional SST	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80.187.378	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Edgar Iván Palomino Holguín	1.098.636.620	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					**6**		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**24**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

Durante el periodo del informe, se presentaron los siguientes ingresos de personal.

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Kelvin Nicol Páez Buitrago	7.014.092	Ayudante de perforación II	13/01/2026
Diego Andrés Flores Rincón	1.063.560.222	Ayudante de perforación II	13/01/2026

Rodolfo Jesús Quiñonez Gutiérrez	6.356.621	Ayudante de obra	13/01/2026
Frank Yan Pier James Cañas	1.005.060.412	Almacenista	21/01/2026
Pedro Jesús Vergel Vergel	13.285.355	Ayudante de obra	27/01/2026

Ver anexo No 2. Inducciones.

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, no se presentaron novedades de retiro de personal

NOVEDADES DE RETIRO DE PERSONAL		
PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2026		
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE RETIRO
NA	NA	NA

4.4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo se relaciona el equipo mínimo requerido:

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENTE DE SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
WFD114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026	Eduardo Santos Useche
TTW843	4308007289163000	31/10/2026	177552748	30/11/2025	Sergio Andrés Porras Villamizar

Ver anexo N° 3. Documentos personal rotativo

Tabla No. 4. Relación Maquinaria

TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
Minicargador	Case	2018	JAFSR175EJM446321	126894	Yeferson Acevedo Suarez
Excavadora	DOSSAN	2019	DHKCEBAACCK0022219	DB58TIS936644EN	Miguel Ángel Escandón
Compresor	ATLAS COPCO	2021	WUX543518	82445954	Harley Prada López
Unidad de perforación neumática No10	Core -Dril	A 432 HD	43218250621	378C0189	Harley Prada López

Ver anexo N° 4. Documentos maquinaria

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

5.1 COMITÉ PARIOTARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, el día 30 de enero de 2026 se realizó la reunión del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se dan a conocer las actividades realizadas en el periodo, dando cumpliendo con la realización de inspecciones en el área de trabajo, garantizando que los riesgos de accidentes y enfermedades laborales sean reducidos al máximo, se adjunta acta de reunión.

Ver anexo N° 5. Acta de reunión comité Copasst

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El comité de convivencia laboral se realizará de manera mensual, de acuerdo a la resolución 3461 del 2025, el día 29 de enero 2026, se realizó la reunión del comité de convivencia laboral.

Ver anexo N° 6. Acta de reunión comité Convivencia laboral

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI:

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección personal, se realiza la inspección de los elementos de protección personal y se hace entrega de los epp.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	6/01/26	Higiene Postural
2	8/01/26	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
3	13/01/26	Pausas Activas
4	21/01/26	Política sst
5	27/01/26	Peligros locativos

Ver anexo No 7. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área de trabajo, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal y entrega de dotación al personal nuevo que ingreso	6/01/26
	13/01/26
	21/01/26
	27/01/26
Inspección de botiquín y camilla	19/01/26
	22/01/26
Inspección de extintores	19/01/26
	21/01/26
Inspección Preoperacional de Herramienta Menor	5/01/26

	13/01/26
	19/01/26
	21/01/26
	26/01/26

Ver anexo No 8. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, electrocución, heridas	- Señalización de riesgos y peligros; encerramiento - Delimitación áreas de trabajo. - Análisis de trabajo seguro para las actividades de alto riesgo - Permiso de trabajo para actividades en alturas	Del 1 al 31 de enero de 2026

Ver anexo No 9 Registro Fotográfico.

Ver anexo No 10 Medidas Preventivas.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo.

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HOMBRE HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		SI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	IG
1	oct-25	0	0	0	13	0	0	14	0	1456	oct-25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nov-25	0	0	0	19	0	0	20	0	2080	nov-25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dic-25	0	0	0	19	0	0	23	0	1976	dic-25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ene-26	0	0	0	20	0	0	23	0	4420	ene-26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	0	0	13,0	0,0	0,0	14,0	0,0	11472,0	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia



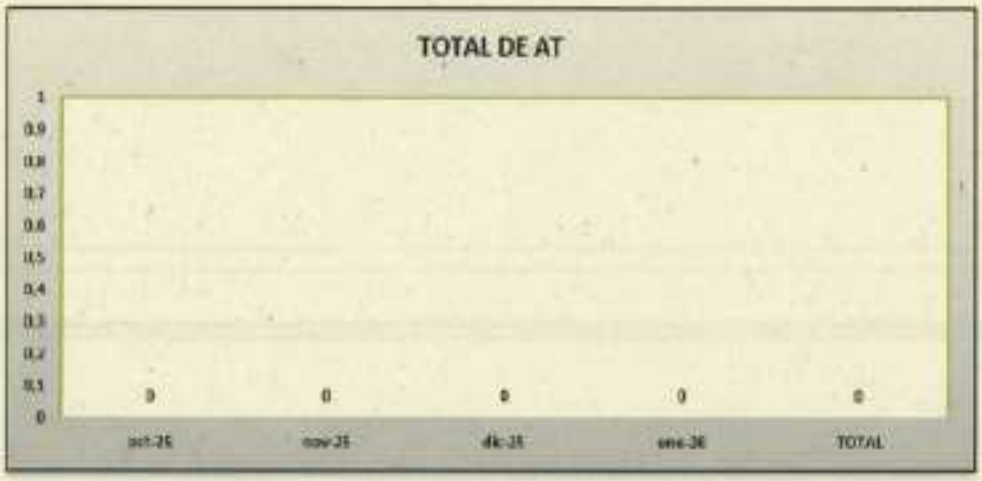
Imagen 2. Tasa de accidentalidad



Imagen 3. Número de trabajadores mensual



Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo


TOTAL DE AT
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0
0
0
0
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
TOTAL

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 08:45:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
NIT	NI 901983966
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079174102
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	41747834
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 7.677.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	13	$ 2.940.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 636.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 177.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 146.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 213.600	$ 0
N900914254	EPS048	SALUD MIA EPS	1	$ 72.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R.MOVILIDAD	5	$ 366.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 143.800	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	17	$ 1.558.800	$ 0
N890001578	CCF40	COMFENALCO	17	$ 1.020.400	$ 0
			SubTotales:	$ 7.677.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 7.677.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 10:42:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1079174102

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

)S DEL APORTANTE

Social	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB		
ento	NI901983966	Dirección	KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16
: Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6076159848
ersona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	GIRON	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	17	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
1	PIMAR YAN PIER JAIMUR CARIAS	47	00	X																0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 980.600	$ 93.400	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 980.600	$ 23.400	0.960	$ 980.600	$ 42.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 980.600	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	YEINER GARCIA CADENA	47	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.057.346	$ 240.654	(EPS010) EPS SURA	$ 1.057.346	$ 61.654	0.960	$ 1.057.346	$ 107.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.057.346	$ 61.654	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
3	YEINER GARCIA CADENA	47	00										X							0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 253.454	$ 57.446	(EPS010) EPS SURA	$ 253.454	$ 5.400	0.000	$ 253.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 253.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
4	MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO	51	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.067.193	$ 230.800	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.067.193	$ 62.700	0.960	$ 1.067.193	$ 165.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.067.193	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO	47	00										X							0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 233.454	$ 57.446	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 233.454	$ 5.400	0.000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
6	YOEL AROLA NARVAEZ	51	00										X							0	4	4	4	(23301) | COLPENSIONES	$ 233.454	$ 57.446	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 5.400	0.000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
7	YOEL AROLA NARVAEZ	47	00									L								0	5	5	5	(23301) | COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.818	$ 11.700	0.000	$ 291.818	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
8	YOEL AROLA NARVAEZ	51	00								X									31	31	31	31	(23301) | COLPENSIONES	$ 1.223.934	$ 196.066	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.223.934	$ 49.100	0.960	$ 1.223.934	$ 83.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.223.934	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	JOSE ALBERTO OSPINO BARACANCONTE	47	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.067.193	$ 230.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.067.193	$ 62.700	0.960	$ 1.067.193	$ 165.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.067.193	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	JOSE ALBERTO OSPINO BARACANCONTE	51	00										X							0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 233.454	$ 57.446	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 5.400	0.000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON	47	00	X																0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.050.540	$ 186.160	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.050.540	$ 43.100	0.960	$ 1.050.540	$ 72.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.050.540	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	51	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.818.934	$ 634.966	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.818.934	$ 84.700	0.960	$ 1.818.934	$ 115.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.818.934	$ 84.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
13	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	47	00										X							0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 233.454	$ 57.446	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.454	$ 5.400	0.000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
14	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	51	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.041.239	$ 247.946	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.041.239	$ 61.654	0.960	$ 1.041.239	$ 107.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.041.239	$ 61.654	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
15	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	47	00										X							0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 233.454	$ 57.446	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 5.400	0.000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
16	HARLEY PINDA LOPEZ	51	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.067.193	$ 230.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. 230	$ 1.067.193	$ 62.700	0.960	$ 1.067.193	$ 111.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.067.193	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
17	HARLEY PINDA LOPEZ	47	00										X							0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 233.454	$ 57.446	(EPS041) NUEVA EPS S.A. 230	$ 233.454	$ 5.400	0.000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
18	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	51	00	X																0	4	4	4	(23301) | PORVENIR	$ 233.454	$ 57.446	(EPS041) NUEVA EPS S.A. 230	$ 233.454	$ 5.400	0.960	$ 233.454	$ 16.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
19	ALEXANDER PINDA LOPEZ	47	00								X	X								0	30	30	30	(23301) | PORVENIR	$ 1.067.386	$ 230.654	(EPS010) EPS SURA	$ 1.067.386	$ 62.846	0.960	$ 1.067.386	$ 115.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.067.386	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

sas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6436500 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3615850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/02/2026

Empresa NI901983966
CONSORCIO MITIGACION
PIEDECUESTA CDMB

Planilla Nro: 1079174102

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	T
	ALEXANDER PINDA LOPEZ	01	00														X				1	4	4	4	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 27.400	(EPS010) EPS SURA	$ 333.454	$ 9.400	0,522	$ 333.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	LUIS ALBERTO PRADA RINCON	01	00						X												3	30	30	30	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.017.461	$ 83.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.017.461	$ 86.700	6,960	$ 1.017.461	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.017.461	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	LUIS ALBERTO PRADA RINCON	01	00														X				1	4	4	4	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 27.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 333.454	$ 9.400	0,522	$ 333.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	GUARDIANDO PARRA BOLAÑO	01	00								X	X									3	30	30	30	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.377.141	$ 630.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.377.141	$ 82.100	6,960	$ 1.377.141	$ 109.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.377.141	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	GUARDIANDO PARRA BOLAÑO	01	00														X				1	4	4	4	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 27.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 333.454	$ 9.400	0,522	$ 333.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA	01	00								X	X									3	30	30	30	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.937.044	$ 349.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.937.044	$ 82.500	6,960	$ 1.937.044	$ 156.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.937.044	$ 82.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA	01	00														X				1	4	4	4	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 27.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 333.454	$ 9.400	0,522	$ 333.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ARGELIO JESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ	01	00	X																	1	16	16	16	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.555.540	$ 148.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.555.540	$ 82.100	6,960	$ 1.555.540	$ 175.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.555.540	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	01	00								X										1	30	30	30	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.017.461	$ 240.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.017.461	$ 82.700	6,960	$ 1.017.461	$ 165.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.017.461	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	01	00														X				1	4	4	4	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 27.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 333.454	$ 9.400	0,522	$ 333.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 333.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	KELVIN NIGOL PAEZ BUITRAGO	01	00	X																	1	16	16	16	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.555.540	$ 148.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A.	$ 1.555.540	$ 82.100	6,960	$ 1.555.540	$ 175.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.555.540	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
20.476.986	$ 20.476.986	$ 20.476.986	$ 20.476.986	$ 4.077.600	$ 1.020.400	$ 1.058.800	$ 1.020.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.977.200	$ 0	$ 7.977.200

sas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438500 - Cartagena: 605 6943444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Po de la Si

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900087333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 10:53:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
NIT	NI 901983966
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079175594
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	42132873
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 121.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800000183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 121.900	$ 0
			SubTotales:	$ 121.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6948444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618800 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 11:19:47 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079175594

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/02/2026

OS DEL APORTANTE

Social	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB		
ento	NI901963966	Dirección	KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16
Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	6076159848
rsona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	GIRON	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																							Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	ING	RET	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SLP	Días APO	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	56	00																0	0	0	0	(909-AP) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(909-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(909-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148869 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 08:59:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 13870690
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079179963
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	41783443
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 16.397.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 7.879.200	$ 0
N800251440	EPS008	SANITAS EPS	1	$ 5.471.600	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 3.046.600	$ 0
			SubTotales:	$ 16.397.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 16.397.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436020 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 671 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 11:10:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1079179963

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/02/2026

OS DEL APORTANTE

Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
ento	CC13870690	Dirección	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
ersona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Tc
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INT	INT E	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUF	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPE	IRP	Días IRP	Días PEN	Días ERP	Días APO	Días ATP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	
	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.772.625	$ 7.879.200	(EPS048) EPS SANITAS	$ 43.772.625	$ 5.471.600	0.960	43.772.625	$ 5.046.600	(ARL 23) MAGDALENA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
43.772.625	$ 43.772.625	$ 43.772.625	$ 0	$ 7.879.200	$ 5.471.600	$ 5.046.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.397.400	$ 0	$ 18.397.400

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-26, 11:21:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 63395720
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079062920
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	9359877
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 649.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 335.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 262.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 51.100	$ 0
			SubTotales:	$ 649.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 649.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146868 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-04, 09:02:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1079062920

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 26/01/2026

OS DEL APORTANTE

Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
ento	CC63395720	Dirección	CR 26 #36 - 14
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
ersona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Tc
#	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días SLN	Días IGE	Días VAC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
1	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL	56	00																	0	00	00	00	230-ING COLPENSIONES	$ 3.097.511	$ 335.700	EPS010 EPS SURA	$ 3.097.511	$ 382.200	0,348	$ 3.097.511	$ 51.150	230-CCF MISIONAL CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Sabbo a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.097.511	$ 3.097.511	$ 3.097.511	$ 0	$ 335.700	$ 382.200	$ 51.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.000	$ 0	$ 848.000

as de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 04:02:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079161173
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	33735243
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 48.282.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230201	PORVENIR	25	$ 9.088.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 5.316.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	20	$ 9.043.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.359.600	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 745.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	15	$ 1.563.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 977.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	3	$ 337.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	12	$ 1.049.200	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cocasalud ADRES ESSC24	2	$ 153.800	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	7	$ 443.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 223.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Cocasalud ADRES EPS 042	1	$ 184.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	13	$ 1.513.200	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 11.700	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	65	$ 10.112.100	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	$ 6.280.700	$ 0
		SubTotales:		$ 48.282.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 48.282.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-04, 08:45:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1079161173

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 03/02/2026

OS DEL APORTANTE

Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
ento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
ersona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
filiados	65	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

ALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | Novedades | | | | |

Pagado: 03/02/2026

Empresa NI900849507
MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1079161173

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
#	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARL	Días IBC	Días PEN	Días IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
1	PEDICA PAOLA MURILLO	01	00																		30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 2.657.880	$ 425.200	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.657.880	$ 106.400	0,252	$ 2.657.880	$ 10.900	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.657.880	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	JHON JAIRO MARTINEZ HOYOS	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 2.182.140	$ 349.100	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 2.182.140	$ 96.000	0,360	$ 2.182.140	$ 100.300	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.182.140	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
3	EDER DANGDER GARCIA MARTINEZ	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) PROTECCION	$ 2.940.870	$ 470.500	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 2.940.870	$ 117.600	0,360	$ 2.940.870	$ 264.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.940.870	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
4	DARLY PAOLA PEÑARANDA RODRIGUEZ	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 3.083.333	$ 493.300	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 3.083.333	$ 123.300	0,360	$ 3.083.333	$ 210.300	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.083.333	$ 123.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00														X				0	1	1	1	1	(28-14) COLPENSIONES	$ 73.199	$ 11.800	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 73.199	$ 3.000	0,000	$ 73.199	$ 0	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 73.199	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
6	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	03	00		X																30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 2.102.452	$ 338.900	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.102.452	$ 84.600	0,252	$ 2.102.452	$ 11.100	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.102.452	$ 84.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
7	JHONATAN ALBERTO SIRALLO ARENAS	01	00																		30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 3.043.214	$ 490.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.043.214	$ 121.700	0,360	$ 3.043.214	$ 211.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.043.214	$ 121.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
8	JULIAN ANDRES RAMIREZ PINZON	01	00	X								X									30	30	30	30	30	(220501) PROTECCION	$ 1.746.954	$ 281.600	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 1.746.954	$ 69.900	0,360	$ 1.746.954	$ 121.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.746.954	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00																		30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 2.946.000	$ 471.300	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 2.946.000	$ 118.000	0,360	$ 2.946.000	$ 203.000	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.946.000	$ 118.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	03	00														X				0	4	4	4	4	(220501) FONDO#1	$ 453.980	$ 72.600	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 453.980	$ 18.200	0,000	$ 453.980	$ 0	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 453.980	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	MARIA FERNANDA RIVERA HERCILVESA	03	00													X					0	30	30	30	30	(220501) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	0,000	$ 2.700.000	$ 0	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	MARIA ALEJANDRA PEREZ HARDOY	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 1.517.451	$ 60.700	0,360	$ 1.517.451	$ 105.700	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
13	FRANCY VANESSA DIGIDIO GONZALEZ	01	00	X																	30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 2.193.667	$ 346.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.193.667	$ 86.700	0,360	$ 2.193.667	$ 153.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.193.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
14	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 1.750.000	$ 281.200	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.000	$ 70.100	0,360	$ 1.750.000	$ 121.900	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
15	DIEGO MAURICIO MIRO MECOM	01	00	X																	30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 2.189.667	$ 346.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.189.667	$ 86.700	0,360	$ 2.189.667	$ 153.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.189.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
16	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 1.750.000	$ 281.200	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.000	$ 70.100	0,360	$ 1.750.000	$ 121.900	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
17	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																		30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 2.027.200	$ 454.400	(EPS044) EPS SANITAS	$ 2.027.200	$ 101.100	0,360	$ 2.027.200	$ 175.800	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.027.200	$ 101.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
18	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	03	00														X				0	4	4	4	4	(220501) FONDO#1	$ 388.800	$ 62.800	(EPS044) EPS SANITAS	$ 388.800	$ 15.600	0,000	$ 388.800	$ 0	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 388.800	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
19	WARLOW DAVID TOLOZA BARROS	01	00	X								X									30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 1.710.034	$ 275.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.710.034	$ 68.400	0,360	$ 1.710.034	$ 119.700	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.710.034	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
20	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 1.606.170	$ 257.200	(EPS011) FAMISANAR EPS	$ 1.606.170	$ 64.300	0,360	$ 1.606.170	$ 111.900	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.606.170	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
21	CESAR ANDRES PRADA SOTOPOMA	01	00	X	X																0	2	2	2	2	(28-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 116.727	$ 4.700	0,360	$ 116.727	$ 8.000	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 121.094	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
22	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00	X								X									30	30	30	30	30	(220501) PROTECCION	$ 2.197.084	$ 351.600	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 2.197.084	$ 87.900	0,360	$ 2.197.084	$ 153.000	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.197.084	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
23	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00	X								X									30	30	30	30	30	(221001) COLFONDOS	$ 1.722.000	$ 275.600	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 1.722.000	$ 68.900	0,360	$ 1.722.000	$ 118.900	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.722.000	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
24	JOEL ALONSO RIVERA BARRIOS	01	00	X								X									30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 1.874.344	$ 315.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.874.344	$ 75.000	0,360	$ 1.874.344	$ 137.000	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.874.344	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
25	JONATAN RAMIRO CORDOBA CACERES	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 2.009.000	$ 329.500	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 2.009.000	$ 80.400	0,360	$ 2.009.000	$ 146.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.009.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
26	JHON FREDY AZA DIAZ	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 979.334	$ 160.600	(EPS044) SALUD MIA EPS044	$ 979.334	$ 39.200	0,122	$ 979.334	$ 4.800	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 979.334	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
27	FARMENIO RODRIGUEZ AVE	01	00								X	X									30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 1.885.207	$ 307.700	(EPS044) EPS SANITAS	$ 1.885.207	$ 75.500	0,360	$ 1.885.207	$ 131.500	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.885.207	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
28	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00	X																	30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 1.211.760	$ 197.800	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 1.211.760	$ 48.500	0,360	$ 1.211.760	$ 84.400	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.211.760	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
29	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 4.793.640	$ 782.000	(EPS044) EPS SANITAS	$ 4.793.640	$ 191.800	0,360	$ 4.793.640	$ 651.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.793.640	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
30	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) FONDO#1	$ 5.230.000	$ 858.300	(EPS044) EPS SANITAS	$ 5.230.000	$ 209.200	0,360	$ 5.230.000	$ 364.700	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.230.000	$ 209.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
31	JUAN DE DIOS PEREZ PABON	01	00								X	X									30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 1.885.207	$ 307.700	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 1.885.207	$ 75.500	0,360	$ 1.885.207	$ 131.500	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.885.207	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
32	JESUS ALEXIS MANTILLA RAMOS	01	00	X								X									30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 2.782.596	$ 445.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.782.596	$ 111.400	0,360	$ 2.782.596	$ 193.700	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.782.596	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
33	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00																		30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 7.000.400	$ 1.190.000	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 7.000.400	$ 280.000	0,360	$ 7.000.400	$ 488.000	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 7.000.400	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
34	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00	X																	30	30	30	30	30	(220501) PROTECCION	$ 5.833.333	$ 937.500	(EPS044) EPS SANITAS	$ 5.833.333	$ 233.300	0,360	$ 5.833.333	$ 382.100	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.833.333	$ 233.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
35	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	03	00														X				0	4	4	4	4	(220501) PROTECCION	$ 866.667	$ 139.700	(EPS044) EPS SANITAS	$ 866.667	$ 34.700	0,000	$ 866.667	$ 0	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
36	LINETH JANITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00	X																	30	30	30	30	30	(221001) COLFONDOS	$ 2.560.682	$ 411.200	(EPS047) NUEVA EPS S.A.	$ 2.560.682	$ 102.400	0,360	$ 2.560.682	$ 179.200	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.560.682	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
37	PERLA JOHANNA GRECUELA RAMOS	01	00	X																	30	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 3.012.049	$ 514.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.012.049	$ 120.500	0,360	$ 3.012.049	$ 220.900	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.012.049	$ 120.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
38	RAFAEL DE JESUS GOMEZ LOPEZ	01	04	X																	5	5	5	5	5	(909-INY) ninguna AFP	$ 0	$ 0	(999999) ADRES NOMAS emitir FOSFINA	$ 261.818	$ 11.700	0,360	$ 261.818	$ 20.600	CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 261.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 6148669 - Bucaramanga: 607 6438500 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3818850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El P... de la Si...

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 03/02/2026

Empresa NI900849507
MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1079161173

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
#	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLP	Días EAU	Días ESS	Días ARP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00	X															0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 3.241.206	$ 518.600	EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.241.206	$ 129.700	0,522	$ 3.241.206	$ 325.600	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.241.206	$ 129.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS	01	00	X															0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 11.000.000	$ 1.870.000	EPS010) EPS SURA	$ 11.000.000	$ 440.000	4,000	$ 11.000.000	$ 760.000	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 11.000.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	AMERED LEONARDO LASSO AGUIRRE	03	00	X															0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.000	EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,000	$ 1.750.905	$ 121.000	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	WILSON MORENO SIÑO	01	00	X							X								0	30	30	30	(23)(0) POR DEFINIR	$ 3.429.000	$ 548.200	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.429.000	$ 97.100	4,000	$ 3.429.000	$ 148.000	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.429.000	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	LUIS ANTONIO ZAMARRA REY	01	00	X															0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.000	EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.750.905	$ 70.100	4,000	$ 1.750.905	$ 121.000	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VICTOR JULIO GAMBOA CARRIZO	02	00	X															0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.000	EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	4,000	$ 1.750.905	$ 121.000	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	EDUARDO SANTOS USECHE	01	00	X								X							0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 3.951.975	$ 632.300	EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.951.975	$ 142.900	4,000	$ 3.951.975	$ 142.900	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.951.975	$ 142.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ARTURO ARENAS JAIMES	01	00							X		X							0	30	30	30	(23)(0) POR DEFINIR	$ 1.965.207	$ 314.700	EPS034) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.965.207	$ 70.100	4,000	$ 1.965.207	$ 141.200	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.965.207	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JAVIER MAURICIO LOPEZ OSORIO	01	00	X								X							0	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.781.185	$ 285.000	EPS042) EPS SANITAS	$ 1.781.185	$ 70.100	4,000	$ 1.781.185	$ 122.800	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.781.185	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00	X															0	30	30	30	(23)(0) PROTECCION	$ 4.804.852	$ 736.800	EPS040) COOSALUD	$ 4.804.852	$ 184.200	4,000	$ 4.804.852	$ 333.000	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.804.852	$ 784.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00							X									0	30	30	30	(23)(0) PROTECCION	$ 1.617.481	$ 242.600	EPS034) EPS-S COOSALUD	$ 1.617.481	$ 60.700	4,000	$ 1.617.481	$ 102.700	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.617.481	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	43	00												X				0	4	4	4	(23)(0) PROTECCION	$ 225.454	$ 37.400	EPS034) EPS-S COOSALUD	$ 225.454	$ 9.400	4,000	$ 225.454	$ 0	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 225.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE LUIS BRICENO HERNANDEZ	01	00	X								X							0	30	30	30	(23)(0) PROTECCION	$ 1.767.333	$ 280.000	EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.767.333	$ 70.100	4,000	$ 1.767.333	$ 122.100	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.767.333	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANIBAL EDUARDO HERNANDEZ ESCOBAR	40	00							X		X							0	30	30	30	(23)(0) PROTECCION	$ 1.382.115	$ 221.100	EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.382.115	$ 55.300	4,000	$ 1.382.115	$ 110.200	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.382.115	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANIBAL EDUARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00												X				0	4	4	4	(23)(0) PROTECCION	$ 225.454	$ 37.400	EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 225.454	$ 9.400	0,522	$ 225.454	$ 0	CCFH43) COMFENALCO SANTANDER	$ 225.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favo) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$0.568.820	$ 159.951.338	$ 159.951.338	$ 155.139.060	$ 25.593.000	$ 6.357.100	$ 10.112.100	$ 6.260.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.282.920	$ 0	$ 48.282.920

nas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945644 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El P... de lo Si...

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 04:18:55 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079160184
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	33760585
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 365.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	3	$ 365.700	$ 0
			SubTotales:	$ 365.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 9540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3616950 - Resto del País: 018000 571 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-04, 08:45:19 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079160184

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 03/02/2026

OS DEL APORTANTE

Social	MAQUINOBRAS	Nombre Sucursal	MAQUINOBRAS	Código Sucursal	01
ento	NI900849507	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	6914305		
ersona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690		
filiados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	ESP	AVP	VTE	IRP	Días APO	Días ERT	Días VSP		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
	[DANIEL RICARDO ZAMBRANO LEMUS]	59	00														0	0	30	0	(100% AFP) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(100% EPS) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0.000	$ 1.760.000	$ 101.000	(100% CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	[ODETTE XIMENA ARIZA CARVAJAL]	59	00														0	0	30	0	(100% AFP) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(100% EPS) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0.000	$ 1.760.000	$ 101.000	(100% CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	[WILLIAN EDUARDO CORTES PEÑA]	59	00														0	0	30	0	(100% AFP) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(100% EPS) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0.000	$ 1.760.000	$ 101.000	(100% CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.283.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.700	$ 0	$ 366.700

eas de Servicio FenoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146589 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	91279512
O RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA
UNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
N:	TRAN 15#87STA.#4 T.9 APTO 101	TELÉFONO:	6396581
R/DATE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
EDA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
): PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	301 - INDEPENDIENTE
*S EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			69013336[illegible]	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPEND
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	anero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	anero AÑO	
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaammdd)			20260121	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			219

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
COD	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	52001-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	
RS:										$ 384.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
COD	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 303.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.000	$ 0	$ 0	
RS:													$ 303.000	$ 0	$ 0	

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

SAN DIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-01-07

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON	Documento:	CC 1063560222
Fecha de nacimiento:	2002-05-22	Lugar de nacimiento:	LA GLORIA (CESAR)
Edad:	23 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	BRISAS 1 MZA I CAS A 4	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3226918975	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AYUDANTE DE PERFORACION II	EPS:	Nueva EPS
Responsable**:	RUTH RINCON (MADRE)	Teléfono:	3112843162
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - Ultima dosis: no refiere

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometria: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON con documento de identificación No. 1063560222 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE PERFORACION II del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES


OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL RIESGO CARDIOVASCULAR METODOLOGÍA OMS No se calcula por ser menor de 40 años.

RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales; - Triglicéridos: Dentro de valores límites normales; - Colesterol total: Dentro de valores límites normales.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

EMMA ALEXANDRA ROMERO OLIER
Medico y Cirujana UIS
R.M. 07295/08
Especialista Salud Ocupacional
Universidad Manuela Beltrán
Lic. S.O. 01405 de 08/02/17



Firma para identificación de usuario *Indice der*
DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON
Documento: 1063560222

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia **PBX: 6351618**
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-01-09 Hora: 09:00

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1063560222
Nombre:	DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON
Fecha Ingreso:	13/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	09/01/2026 11:40:45 a. m.

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

COMFENALCO SANTANDER
PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

CERTIFICADO

Fecha: 22/01/2026

Nombre: DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON
Identificación: 1063560222
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**, Nit 901983966, desde el 13 de Enero del 2026 con fecha de vinculación laboral del 13 de Enero del 2026.

No cuenta con personas inscritas a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Jefe Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida González Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/01/2026, el empleador CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB identificado con NIT número 901983966 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9777763	14/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1063560222	DIEGOANDRES FLOREZ RINCON	1750905	OTROS OFICIALES, OPERARIOS Y OFICIOS	2026-01-13

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.063.560.222**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**

La presente certificación se expide el 1 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir. ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Powered by CamScanner

SANDIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-01-19

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	FRANK YAN PIER JAIMES CAAS	Documento:	CC 1005060412
Fecha de nacimiento:	2002-01-05	Lugar de nacimiento:	PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Edad:	24 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	VILLAS DE SAN JUAN MANZANA L CASA 155	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3164184403	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	ALMACENISTA	EPS:	Nueva EPS
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	A+		
Responsable**:	ALEXANDRA (PAREJA)	Teléfono:	3229748425
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - pfizer y aztrazeneca Dosis 3 - Ultima dosis: 2022/01/01

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a FRANK YAN PIER JAIMES CAAS con documento de identificación No. 1005060412 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de ALMACENISTA del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normaless.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Karen SAñez O

KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
Médico Cirujana
Universidad Libre
R.M. 20276/2009
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17



Firma para identificación de usuario
FRANK YAN PIER JAIMES CAAS
Documento: 1005060412

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia **PBX: 6351618**
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-01-22 Hora: 10:59

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1005060412
Nombre:	FRANK YAN PIER JAMES CAÑAS
Fecha Ingreso:	21/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	20/01/2026 10:56:07 a. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/01/2026, el empleador CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB identificado con NIT número 901983966 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9817268	20/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1005060412	FRANKYAN PIER JAIMES	1750905	OTROS OFICIALES, OPERARIOS Y OFICIOS	2026-01-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1005060412,** *no está registrado/a* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de enero de 2026.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SAN DIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-01-07

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO	Documento:	PT PT7014092
Fecha de nacimiento:	1997-11-23	Lugar de nacimiento:	VENEZUELA (VENEZUELA)
Edad:	28 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Casado	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	BRISAS 1 MANZANA I CASA 4	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3209898603	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AYUDANTE DE PERFORACION II	EPS:	Nueva EPS
Responsable**:	YARIANA LOPEZ (ESPOSA)	Teléfono:	3213573135
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión, no aporta

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO con documento de identificación No. PT7014092 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE PERFORACION II del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales; - Triglicéridos: Dentro de valores límites normales; - Colesterol total: Dentro de valores límites normales.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Karen SAñez O

KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
Médico Cirujana
Universidad Libre

Kelvin P

Firma para identificación de usuario
KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO
Documento: PT7014092



Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

R.M. 20276/2009
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia **PBX: 6351618**
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-01-09 Hora: 09:45

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	7014092
Nombre:	KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO
Fecha Ingreso:	13/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	09/01/2026 11:48:30 a. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/01/2026, el empleador CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB identificado con NIT número 901983966 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9777747	14/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	7014092	KELVINNICOL PAEZ BUITRAGO	1750905	OTROS OFICIALES, OPERARIOS Y OFICIOS	2026-01-13

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfenalco SANTANDER
Siempre por ti
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 13/01/2026 10:11:50 AM
Fecha de radicación : 13/01/2026 10:11:00 AM



1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación		Razón social
NIT 901983968	5	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB

Sucursal	Agencia
PR6 - CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
PT 7014092	2022/10/06	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	1997/11/23

Nombres y apellidos			
KELVIN	NICOL	PAEZ	BUITRAGO

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	MANZ I CASA 4	BRISAS 1

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA		3209986603

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
KELVINPAEZ98@GMAIL.COM	BÁSICA (1° A 5°)

3. INFORMACION DE VINCULACION LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/13	

¿Trabajador servicio domestico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/Ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	1,750,905		1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos			

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/Ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cual Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo (F o M)	Parentesco	Estudiante (sólo 1 opción)	Nivel de escolaridad	Certificado de discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(R.C.) Registro de identificación o tarjeta
(T.I.) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NR) No Aplica

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Nieto(a)
5. Dependiente por mandato legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica primaria (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnica/Tecnológica
10. Profesional universitaria
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida Corredor Vehicular No. 22-09 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 3577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mi representado, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, cruzados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y servicios SMS, y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en ella se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaro(amos) que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, asumiendo que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

FO-GS-7.1-002 Versión: 23/08/19 Fecha de creación: 23/08/2019 Subproceso: Afiliación y Novedad

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
Firma del empleador

Número documento empleador: 901983968

KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO
Firma del trabajador

Número documento trabajador: 7014092

SANDIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-01-21

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	Documento:	CC 13285355
Fecha de nacimiento:	1981-12-28	Lugar de nacimiento:	Bucaramanga (Santander)
Edad:	44 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	BRR SAN PEDRO BAJO CLL 418 MANZ O	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3222277681	Escolaridad:	Analfabeta
Ocupación:	AYUDANTE DE OBRA	EPS:	NO SABE
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	O-		
Responsable**:	HUMBERTO VERGEL (HERMANO)	Teléfono:	3213433139
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva está disminuida unilateralmente.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a PEDRO JESUS VERGEL VERGEL con documento de identificación No. 13285355 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

Solicitar en su entidad de salud valoración de su condición auditiva actual por Otorrinolaringólogo..

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

Clasificación PVE:
CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.

OBSERVACIONES FINALES

RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales; - Triglicéridos: Dentro de valores límites normales; - Colesterol total: Dentro de valores límites normales.

CONSIDERACIONES OCUPACIONALES ESPECIALES POR DEFICIENCIA AUDITIVA DE TIPO CONDUCTIVO QUE NO LE GENERA RESTRICCIONES OCUPACIONALES: Presenta una disminución de su capacidad auditiva de tipo Conductivo sin dificultades para la comunicación, definida como de origen común. No le genera restricciones ocupacionales actualmente para el desempeño de su ocupación.Debe tenerse en cuenta el uso adecuado de protección auditiva, los controles audiométricos y el seguimiento acorde con lo definido en el Programa de Conservación auditiva del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. Se debe solicitar en su entidad de salud, evaluación por Otorrinolaringología para establecer plan de manejo y de ser necesario, de su origen.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Salua T Feris Teheran

DRA. SALUA TERESA FERIS TEHERAN
Médico U. Del SINU
R.M. 70952/2014
Especialista en Gestión del Riesgo Laboral
U. De Cartagena
Lic. S.O. 959 de 28/06/18



Firma para identificación de usuario Indice der
PEDRO JESUS VERGEL VERGEL
Documento: 13285355

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Cll 35 21-74 Int. 113 Edificio Apolo - Bucaramanga - Santander - Colombia **PBX: 6351618**
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por: so.maquinobras
Fecha: 2026-01-23 Hora: 10:24

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13285355
Nombre:	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL
Fecha Ingreso:	27/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	26/01/2026 05:15:52 p. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 28/01/2026, el empleador CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB identificado con NIT número 901983966 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9874321	28/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	13285355	PEDROJESUS VERGEL VERGEL	1750905	AYUDANTE DE OBRA	2026-01-27

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfenalco SANTANDER
Tu principio para ir...
N.I.T 890.201.576-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 28/01/2026 04:48:29 PM
Fecha de radicación : 28/01/2026 04:48:00 PM

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación		Razón social
NIT 901583966	5	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Sucursal	Agencia
PRI - CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 13.285.355	2000/04/07	NORTE DE SANTANDER	LA ESPERANZA	1981/12/28

Nombres y apellidos			
PEDRO	JESUS	VERGEL	VERGEL

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	MANZ O CASA 418	SAN PEDRO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA		3222277681

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
VERGELVERGELPEDROJESUS@GMAIL.COM	BÁSICA (1° A 5°)

3. INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/27	

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/Ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	1,750,905		1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
BUCARAMANGA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos			

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/Ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cual Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o Int	Parentesco	Estudiante hasta 25 años	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primaria rotativa
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional/ universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida Gonzalo Valencia No. 52-89 en Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6517000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, son conocedor que tal estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, cuando para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web o mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información dispuesta en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y cuyo que en esta se especifican cuales datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que pueda autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

FO-AS-13-002 Versión: 22/05/25 Fecha de revisión: 28/01/2026 Subproceso: Afiliación y Subsidio

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
Firma del empleador
Número documento empleador: 901983966

PEDRO JESUS VERGEL VERGEL
Firma del trabajador
Número documento trabajador: 13.285.355

SANDIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-01-07

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	RODOLFO JESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ	Documento:	PT 6356621
Fecha de nacimiento:	1987-02-04	Lugar de nacimiento:	VENEZUELA (VENEZUELA)
Edad:	38 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	VILLANDA LUCIA MANZANA I	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3245517143	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AYUDANTE DE OBRA	EPS:	Nueva EPS
Responsable**:	NO REFIERE (NO REFIERE)	Teléfono:	NO REFIERE
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

trabajador refiere no tener vacunas COVID 19

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a RODOLFO JESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ con documento de identificación No. 6356621 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES


Clasifiación PVE:
CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL RIESGO CARDIOVASCULAR METODOLOGÍA FRAMINGHAM De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como RIESGO BAJO.

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL RIESGO CARDIOVASCULAR METODOLOGÍA FRAMINGHAM De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como RIESGO BAJO.
RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales; - Triglicéridos: fuera de valores límites normales; - Colesterol total: fuera de valores límites normales.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

EMMA ALEXANDRA ROMERO OLIER
Medico y Cirujana UIS
R.M. 07295/08
Especialista Salud Ocupacional
Universidad Manuela Beltrán
Lic. S.O. 01405 de 08/02/17



Firma para identificación de usuario Indice der
RODOLFO JESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ
Documento: 6356621

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia **PBX: 6351618**
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-01-09 Hora: 09:43

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	6356621
Nombre:	RODOLFO QUIÑONEZ GUTIERREZ
Fecha Ingreso:	13/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	09/01/2026 12:25:20 p. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/01/2026, el empleador CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB identificado con NIT número 901983966 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9777716	14/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6356821	RODOLFOJESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ	1750905	AYUDANTE DE OBRA	2026-01-13

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfenalco SANTANDER
Es provisión para ti.
N.I.T 890.201.579-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 13/01/2026 10:29:53 AM
Fecha de radicación : 13/01/2026 10:29:00 AM
ITD_20260113102953_6356621

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación		Razón social
NIT 901983988	5	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Seccional	Agencia
PRI - CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
PT 6356621	2022/03/08	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	1987/02/04

Nombres y apellidos			
RODOLFO	JESUS	QUIÑONEZ	GUTIERREZ

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	CL 14 5	HOYO GRANDE

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA		3245517143

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
RQUINONEZGUTIERREZ38@GMAIL.COM	BÁSICA (1° A 5°)

3. INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/13	

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	1,750,905		1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos			

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cual Caja de Compensación familiar?

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo (M, F o I)	Parentesco	Discapacidad (sea o no capital)	Nivel de escolaridad	Certificado de discapacidad
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(R.C.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C.) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C.) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Padre
2. Madre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijo(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° y 11°)
5. Básica + Media (1° a 11°)
6. Secundaria completa (6° a 9°)
7. Media completa (10° y 11°)
8. Primaria completa
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida Gonzalez Valencia No. 51-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577905, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, sin conocerido que no somo obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, a países para comercializarlos para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS, y en general para los demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican todos estos sensibles. Así mismo, conozco que como titular en ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización, igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministre (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco tratandor los de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaro que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la cunfia nación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que cuadad registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
Firma del empleador
Número documento empleador 901983988

RODOLFO JESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ
Firma del trabajador
Número documento trabajador 6356621

ANEXO N° 2
INDUCCIONES

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Melvin nicol Paez Buitrago DOCUMENTO 7014092

DIRECCIÓN Brisas 1 Mz 1 casa 4 TELÉFONO 3209898603

CARGO ayudante de perforacion PROYECTO Consorcio Mitigacion Piedecuesta

TIPO DE CONTRATO Obra Labor ARL CAMB

JEFE INMEDIATO FECHA 13/01/26

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









Scanned with CamScanner

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL




Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA

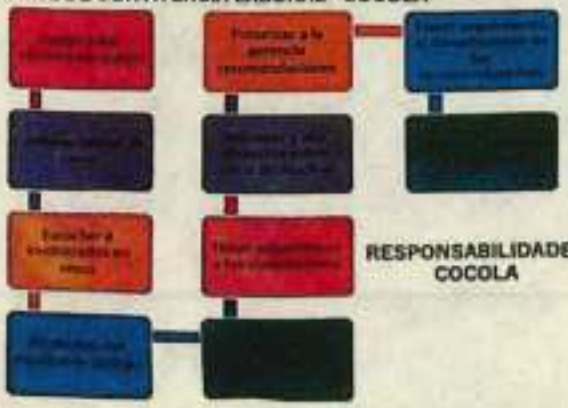

RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS









La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Kelvin Rojas Buitrago	DOCUMENTO:	7010092
CARGO:	Ayudante de Perforacion	AREA DE TRABAJO:	Drill Promotion
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	17/01/26

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMARILLA

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 7

- X a. Política SST 
- X b. Política de Vacaciones 
- X c. Política de Seguridad Vial 
- X d. Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 5

- X a. Picaduras y mordeduras 
- X b. Fenómenos Naturales 
- X c. Biomecánicos 
- d. Locativo 
- e. Químicos 
- f. Eléctrico 
- X g. Trabajo 
- X h. Locativo 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje:

- a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa
- b. Para que nos paguen mejor
- X c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje:

- a. Informar al compañero de trabajo
- b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica
- c. Continuar laborando normalmente
- X d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 2




6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6



INFORMACIÓN DEL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

- a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 
- b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 
- X c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje:

- X a. Manual de Funciones 
- b. Manual de Calidad 
- c. Manual Esotérico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 3365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas : — Puntaje: 1



- X a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización
- b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.
- c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses)
- X d. Todas las anteriores.

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-[illegible]
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite saber si la peligrosidad de la sustancia o mezcla, enfierne las que tuvieron alto grado de toxicidad.	Puntaje: 3	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje:
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje:	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje:
a. Workflow	c. Trello	b. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Sub-grupo	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correcta

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje:



17. De los siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje:
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje:
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
	VERSIÓN:	3
	FECHA:	2/01/2024
	PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos	✓	
	Ricketsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos	✓	
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras	✓	
	Líquidos	✓	
	Gases y vapores	✓	
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea	✓	
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico	✓	
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas	✓	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación	✓	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Kelvin Nicol Paez identificado con documento 70 194 092

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante Portuario

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Mantenimiento Red desde la fecha 13/01/24

Kelvin
Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Angie Lorena Flores Jiménez DOCUMENTO 1067586122

DIRECCIÓN Barrio 1° de Mayo - Casa 4 TELÉFONO 3216418975

CARGO Auxiliar de Inspección de Vía PROYECTO Concesión Malla Vial del Valle

TIPO DE CONTRATO Obra Labor ARL

JEFE INMEDIATO Jose Cuervo FECHA 8/01/2026

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST

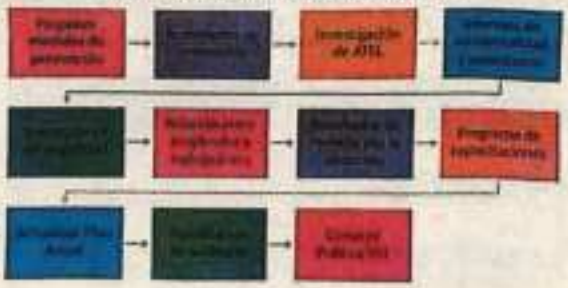

8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner

9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES




Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS











La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Diego Adrel Florez	DOCUMENTO:	1063560222
CARGO:	Ayudante de Profesional	AREA DE TRABAJO:	Estabilización salud
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	13/01/26

SEGURIDAD Y SALUDABLE TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 5

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radioactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 2



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 4



MANUAL DE FUNCIONES

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje:

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Escolar 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas : — Puntaje:



a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización


b. Confidencialidad y protección de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denuncia (estabilidad laboral reforzada por 6 meses)

d. Todas las anteriores

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Versión	

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre las que indiquen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 3	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje:
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones. b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos. c. Mantener condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente. d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SST?	Puntaje:	15. ¿Cómo puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje:
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Mis apps	d. copaso	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo — Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a y c son correctas

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos o higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos	✓	
	Rickettsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos	✓	
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas	✓	
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos	✓	Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras	✓	
	Líquidos	✓	
	Gases y vapores	✓	
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional	✓	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización	✓	
	Características del grupo social	✓	
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea	✓	
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y callistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo		
	Manipulación de cargas		
Condiciones de seguridad	Mecánico		Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo		
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito		
	Públicos		
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos		Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Diego Andres Flores, identificado con documento 1063502222

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante Perforacion

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Interconexion Vial desde la fecha 13/01/26

Firma del trabajador

Firma del quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Rodolfo Jesus Quiñonez G DOCUMENTO PPT 6356621

DIRECCIÓN Villa andalucia MZ 1 CASA 1 TELÉFONO 3245517143

CARGO Ayudante obra PROYECTO Cobertura Mitigacion Pta

TIPO DE CONTRATO obra labor ARL Nueva EPS

JEFE INMEDIATO FECHA 13-01-2026

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA

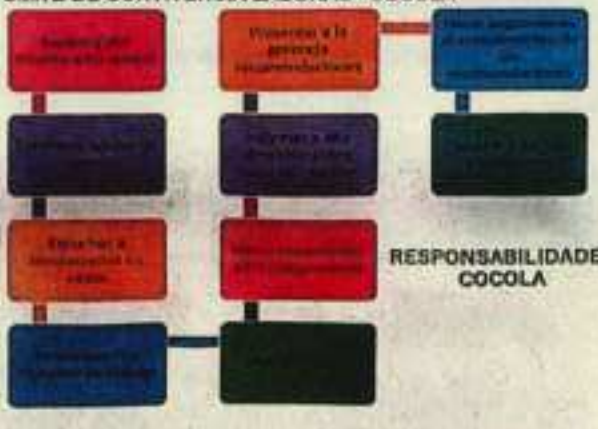

RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES




Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO





13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS









La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Rodolfo
Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	8

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Rodolfo Jesus Quiñonez	DOCUMENTO:	63516621
CARGO:		AREA DE TRABAJO:	Estab Urgencias Salud
TEMA:	INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐	FECHA:	13/01/26

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 1

- ✓ a. Política SST 
- b. Política de Vacaciones 
- ✓ c. Política de Seguridad Vial 
- d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

- a. Picaduras y mordeduras 
- b. Fenómenos Naturales 
- c. Biomecánico 
- d. Locativo 
- e. Materiales radiactivos 
- f. Eléctrico 
- g. Tránsito 
- h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

- a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa
- b. Para que nos paguen mejor
- ✓ c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

- a. Informar al compañero de trabajo
- b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica
- c. Continuar laborando normalmente
- ✓ d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 2




6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 5

Residuos



Canecas

INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

- a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 
- b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 
- ✓ c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

- ✓ a. Manual de Funciones 
- b. Manual de Calidad 
- c. Manual Estético 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

- a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.
- b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.
- c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).
- ✓ d. Todas las anteriores.

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	
		Fecha	
		Versión	

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, enciérre las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 3	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje:
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje:	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-iplan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a,b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR: Rodolfo	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos	✓	
	Ricketsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos	✓	
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras	✓	
	Líquidos	✓	
	Gases y vapores	✓	
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea	✓	
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico		Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas	✓	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval	✓	
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Rodolfo Jesus Quiroz *identificado con documento* 6356621

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante obra

que desempeño en la empresa/proyecto _____ *desde la fecha* 13/01/24

Rodolfo

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Frank Yan piet Grimas Cañas — DOCUMENTO: CC. 1005060412

DIRECCIÓN: villas de san Juan — TELÉFONO: 3164184403

CARGO: Almacenista — PROYECTO: Consorcio Mitigacion

TIPO DE CONTRATO: obra labor — ARL:

JEFE INMEDIATO: — FECHA: 21/01/26

ETAPA — INDUCCIÓN: X — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









SST-F-02 Formato de Inducción y Reinducción V4

Scanned with CamScanner

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5


9. DEFINICIONES BÁSICAS











Todo debe ser reportado e investigado





10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Pictogramas
2. Etiquetado
3. Fichas de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS







La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto.
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpa la fuente del derrame para evitar que siga ingresando el producto
- Cortar el derrame utilizando rollos formando un dique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los parches absorbentes
- Recoger todos los residuos en las bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	26/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Frank yor Her	DOCUMENTO:	1005056412
CARGO:	Almacenista	AREA DE TRABAJO:	Estabilización salud
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	21/01/26

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que corresponden a políticas de la empresa — Puntaje: 1

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Informar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que están relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 2



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 3

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen las funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Estético 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuáles son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos	✓	
	Rickettsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos	✓	
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras	✓	
	Líquidos	✓	
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional	✓	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea		
	Interfase persona - tarea	✓	
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico		Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	✓	
	Locativo	✓	
	Tecnológico	✓	
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas	✓	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación	✓	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Frank Rey Jaimes identificado con documento 1005060412

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Almacenista

que desempeño en la empresa/proyecto Mitigacion Pto2 *desde la fecha* 21/01/24

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Pedro Jesus Vergel — DOCUMENTO: 13 285355

DIRECCIÓN: San Pedro bajo 9-18 Manzo — TELÉFONO:

CARGO: Ayudante obra labor — PROYECTO: Consorcio Antioquia Alg

TIPO DE CONTRATO: — ARL:

JEFE INMEDIATO: — FECHA: 27/01/26

ETAPA: INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST















3. POLÍTICAS SIG









Scanned with CamScanner

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST

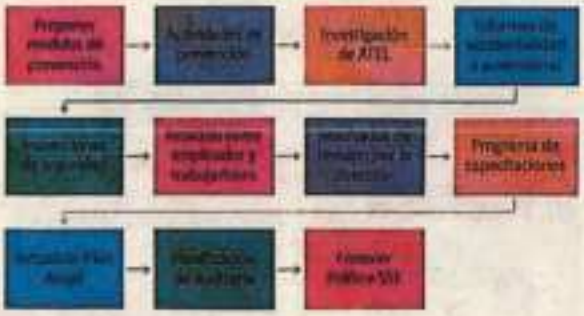

8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA

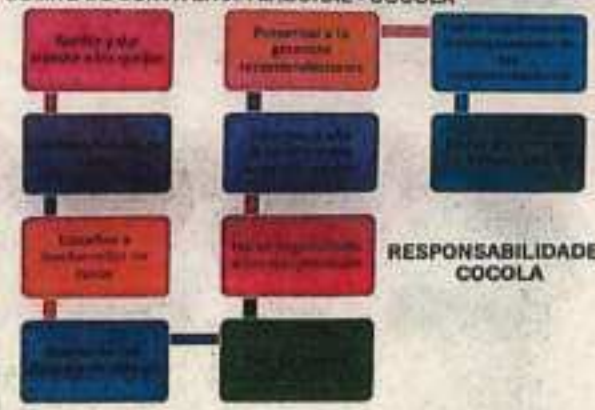

RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner


...IONES BÁSICAS











ACOSO LABORAL







10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS











La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Pedro

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

Scanned with CamScanner

FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
	Fecha	28/07/2023
	Versión	5

PARTICIPANTE:	Pedro Jesus Vegel	DOCUMENTO:	13285355
Ayudante		AREA DE TRABAJO:	Metalmecanica
INDUCCIÓN [X]	REINDUCCIÓN [ ]	FECHA:	27/01/26

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

De las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que consideran a políticas de la empresa — Puntaje: 3

- a. Política SST 
- b. Política de Vacaciones 
- [X] Política de Seguridad Vial 
- [X] Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (3) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

- a. Picaduras y mordeduras 
- b. Fenómenos Naturales 
- c. Biomecánico 
- d. Locativo 
- e. Materiales radiactivos 
- f. Eléctrico 
- g. Tránsito 
- h. Químico 

3. Selecciona UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

- a. Para disminuir las condiciones laborales de la empresa
- b. Para que nos paguen mejor
- [X] c. Evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- d. Todos los anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

- a. Informar al compañero de trabajo
- b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica
- c. Continuar laborando normalmente
- [X] d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 2



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas


8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

- a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 
- b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 
- [X] c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, selecciona en cuál de ellos se establecen las funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

- [X] a. Manual de Funciones 
- b. Manual de Calidad 
- c. Manual Estético 

10. Selecciona opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

- a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.
- b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.
- c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).
- [X] d. Todas las anteriores

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Ver.

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierra las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 3	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones. b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos. c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente. d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje:
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Desplan	d. copass	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones ✱

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje:
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje:
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR: Pedro	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos	✓	
	Rickettsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas	✓	
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras	✓	
	Líquidos	✓	
	Gases y vapores	✓	
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	✓	
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas	✓	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos	✓	
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe	✓	
	Precipitaciones		

Yo, Pedro Luis Vergel identificado con documento 13 285 351

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Mitigación desde la fecha 27/01/26

pedro

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 05 26	2025 06 01	2026 05 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/HATOS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849587	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, renovación y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales suministrados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843274

PLACA: WFD114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 2.780
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD TON/PAS: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 03606243
RADI: N
VIN: LVBDHPE53HN005100
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPE53HN005000
RADI: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPE53HN005000
RADI: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900049507



141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 3320160000145112
FECHA IMPORT.: 13/05/2016
FOLIOS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA: 26/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/05/2016
FECHA ADHESIVO
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MOVAL TTOYTTE GIRON

LT02003920786

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFD114	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89806243
NRO. CHASIS:	LVBDHPES3HN005000	**VIN:**	LVBDHPES3HN005000
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE AÑO | MES | DÍA LAS 00 HORAS DEL	HASTA AÑO | MES | DÍA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE POLIZA	PLACA No	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308007289163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	LINEA VEHICULO	BJ3122DEPFA-G2	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS.	*******720	NI	9006495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
HASTA	
180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión Física en papel de seguridad; impresión Física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerda portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Está atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del **accidente** siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con esta contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o no les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A., Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177552748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/11/30

Fecha de vencimiento: 2025/11/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NÚMERO DE MOTOR	REC	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NÚMERO DE SERIE	REC	NÚMERO DE CHASIS	REC
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900949507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352017000435854

DE: I

FECHA IMPORT: 18/10/2017

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

ANEXO N° 4
DOCUMENTOS MAQUINARIA



MARCA:
CASE

TIPO:
MINICARGADOR SR175

SERIE:
JAFSR175EJM446321

MOTOR:
126894

MODELO:
2018

MQ-047
MINICARGADOR SR175

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36-24
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

xx/06/2019

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 78805

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC108909	CASE	SR175	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	JAFSR175EJM446321

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	126894	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2812 Kg	1970 mm	1350 mm	3300 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERNOTA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.178.054

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
26-11-2019	25-02-2021	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482018000509768	16/08/2018



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003943

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2018**

4. Número de Formulario
4820180005097686

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890803034 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

12. Dirección: CL 11 SUR CR 50 50 | 13. Teléfono: 3606161 | 14. Cód. Ciudad: 45 | 15. Cód. Dpto: 05 | 17. Cód. Actividad económica: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081359 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia de Aduanas ML S.A. (Nivel I) | 27. Tipo usuario: 28 | 24. Cód. usuario: 513

28. Número documento de identificación: 73089640 | 29. Apellidos y nombres: Suarez Rolas Evand Eduar

31. Clase Importación	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No./Formulario Anterior	35. Año - Sec. - Dic.	36. Cod. Aduana	37. Declaración de Importación No.	38. Año - Mes - Dic.	39. Cod. Aduana
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de mercancía	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
CTG	7201	No. 116570009196511	2018 - 06 - 13	No. SUDU25001AC4NAF8	2018 - 06 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CHIHI INTERNATIONAL S.A. | 47. Ciudad: LUGANO | 48. Cód País Exportador: 767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: RIVA PARADISO 14 CH 6902 LUGANO | 50. Email: 41919853643

51. No. de Items	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Oficio Aduana	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ por:
FTCRH180044284	2018 - 07 - 28	249	1	434	5	EDUARDO L GERLEIN S A	2,934.00

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Compl.	61. Cod. Mercancía	62. Cod. Mercancía	63. No. ventas a nacion.	64. Valor venta USD	65. Particularidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	01	C102	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso Bruto Kgs.	Bruto.	72. Peso neto Kgs.	Bruto.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartida	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad Bruto.
01	01	767	2,636.56		2,636.56		YY	5	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Subvalores y otros gastos (US)	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen de tributos	86. Numero
23,416.80	368.50	7.00	71.50	447.46	0.00	23,864.30	K	XXXXXXXXX

87. Cod. tributo	88. Año	89. Programa No.	90. Cod tributo del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	69,333,550	0	-	0
IVA	5.00	69,333,550	3,466,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Antidumping/Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reexpedición	0	0	0	0	
		Total	3,466,000		0

91. Descripción de las mercancías tales la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - indique marcas, modelos y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de esta forma/copia)

Item 1:MAQUINARIA, Uso Propio / Nuevo Capacidad(Aplica):93224, Declaración: 4/4; Codigo SARA 1515 ; MERCANCIA NUEVA, BAJO ACUERDO AL DECRETO 1165 DE 2016 Y EL DECRETO 1472 DE 2018, -SEGUROS INTERNACIONALES- DECRETO ESTATUTARIO 444 DE 1967, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO ARTICULO 868-1, DECRETO 1165 DE 2016 PARA LA NO PRESENTACION DE REGISTRO DE IMPORTACION EL CUAL MENCIONADOR CON BASE FACTURA, Poder Ch CASE CONSTRUCTION, Ref: 88317, Item: BRITO LOPEZ , Ch Cod: PRODUCTO MENCIONADOR CON BASE FACTURA, GESTIONO PARA LA NACIONALIZACIÓN, MARCO CESAR LOPEZ LARA, CONTIENE BARCOS Y AC CILINDRO PARA EL MISMO FUNCIONAMIENTO, 25/25-[illegible]

107. Valor pagos anteriores: 0	20. Forma de pago anterior cta.	109. Fecha
110. Declaración anterior DIAN - Sistema Interno Estado de la anterior. Continúa anterior	111. Oficina anterior ante la cual se presentó declaración de importación anterior	112. No. Autoadhesivo declaración anterior
113. Ley declaración anterior		114. Para: 20-8 05 05

115. Levante No. 452018000347985	116. Fecha: 2018 - 08 - 16	117. Observaciones levante	118. Aforo	119. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Vlr. Pago Total: 0

SYGA
Autoadhesivo 9348181097388
Fecha presentación 2018-08-06 10:33:42
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2018-08-16 16:30:17

20181701148813



MARCA:
DOSSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBAACCK0022219

MOTOR:
DB58TIS936644EN

MODELO:
2019

MQ-044
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -24
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

27/05/2019

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 58237

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC101917	DOOSAN	DX225LCA	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACCK0022219

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS936644EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	2940 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

Scanned by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-05-2019	29-05-2019	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352019000236032	22/05/2019

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TMD1000002345

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3520190000236032-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

8. Dirección: CL 99 69 C 41 | 9. Teléfono: 4238300 | 10. Cód. Admón: 35 | 11. Cód. Ciiu: 11 | 12. Cód. Cuenta Vantegral: 001

Declarante

14. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 15. DV: 4 | 16. Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. | 17. Tipo usuario: 26 | 18. Cód. usuario: 0095

19. Número documento de identificación: 16504199 | 20. Apellidos y nombres: CACERES ZORRILLA WALTER ALFONSO

21. Clase importador	22. Tipo declaración	23. Cod	24. No. Formulario Anterior	25. Año - Mes - Día	26. Cod. Admón	27. Declaración de Exportación	28. Año - Mes - Día	29. Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

30. Cod. lugar ingreso de las mercancías	31. Cod. Depósito	32. Manifiesto de carga	33. Año - Mes - Día	34. Documento de transporte	35. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907009791	2019 - 05 - 22	No. HDGUKRCO0285674	2019 - 03 - 31

36. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO. LTD | 37. Ciudad: INCHEON | 38. Cod País Expedición: 150

39. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUG-GU-INCHEON KOREA 401-702 | 40. E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

41. No. de factura	42. Año - Mes - Día	43. Cod. para procedencia	44. Cod. Modo Transporte	45. Código de Aduana	46. Cod. Depto Aduana	47. Empresa transportadora	48. Tasa de cambio $ a/x
HXB2019030461	2019 - 03 - 26	190	1	472	0	MULTIPORT E.U	3,290.27

49. Subpartida arancelaria	50. Cod. Complementario	51. Cod. Suplementario	52. Cod. Modalidad	53. No. cuotas o meses	54. Valor cuota USD	55. Periodicidad del pago de la cuota	56. Cod. país de origen	57. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

58. Forma de pago de la importación	59. Tipo de importación	60. Cod. para cerrar	61. Peso bruto kgs	62. Peso neto kgs	63. Código unidad comercial	64. No. bultos	65. Subpartidas	66. Cod. unidad comercial	67. Cantidad ítems
02	01	190	322,500.00	322,500.00	YY	45	1	U	15.00

68. Valor FOB USD	69. Valor fletes USD	70. Valor Seguros USD	71. Valor Otros Gastos USD	72. Sumatoria de fletes seguros y otros gastos USD	73. Ajuste valor USD	74. Valor aduana USD	75. Código régimen o licencia	76. Número
1,348,697.45	115,141.10	596.08	50.00	115,789.18	0.00	1,464,486.63	X	XXXXXXXXXX

77. Cod. oficina	78. Año	79. Programa No.	80. Cod. Interno del Profesional
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	4,818,556.424	0	0	0
IVA	19.00	4,818,556.424	915,526.000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	915,526.000		0

81. Descripción de las mercancías (Indicar la descripción de las mercancías a importar con la precisión que el arancel de aduanas exige, subpartida arancelaria, marca, modelo, serial, referencia, calidad, grado, tipo, variedad, composición, características técnicas y demás datos que permitan identificarlas)

DO 401190571002 CAF: 005 DECLARACION(1-1: OO: 10944, MERCANCIA NUEVA // PEDIDO: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // NACIONALIZACION: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. PRODUCTO: EXCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX225LCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DHKCEBACN0022208, DHKCEBACN0022190, DHKCEBACN0022213, DHKCEBACN0022174, DHKCEBACN0022180, DHKCEBACVN0022187, DHKCEBACJN0022199, DHKCEBACKN0022203, DHKCEBACHN0022193, DHECEBA(continúa al respaldo)

82. Valor pagos anteriores	83. Recibo oficial de pago anterior No.	84. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

85. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	86. Espacio reservado exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	87. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		3520190000236032 88. Fecha 2019 05 22

89. Levante No	90. Fecha	Firma funcionario responsable	91. Nombre 92. C.C. No
352019000173135	2019 - 05 - 22		Jeisson Camilo Torres Forero C.C. 1 015 998 237

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

0

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92351910831377
Fecha presentación 2019-05-22 19:32:58
Valor pagado 50

Fecha de Impresión: 2019-05-22 19:34:58

20192349164931

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

muisca

Declaración de Importación

Aceptación : **352019000236032-1**
Subpartida : **8429520000**

[illegible] Continuación descripción mercancía en Código marca, modelo y serie:

2HN00222216, DHKCEBACKN0022219, DHKCEBACLN0022225, DHKCEBACWN0022223, DHKCEBACLN0022239, DHKCEBACAN0022230, AÑO DE FABRICACION: 2[illegible]19/ SERIAL MOTOR: DB58TI8936480EN, DB58TI8936644EN, DB58TI8936683EN, DB58TI8936459EN, DB58TI8936505EN, DB58TI8936579EN, DB58TI89[illegible]6C3DEN, DB58TI8936639EN, DB58TI8936642EN, DB58TI8936665EN, DB58TI8936444EN, DB58TI8936719EN, DB58TI8936617EN, DB58TI8936647EN, DB[illegible]58TI8936[illegible]7EN, . COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DE[illegible]SCRIPCION SEGUN FACTURA: MODEL DX225LCA (EN50), EXCAVATOR MECHANICAL TIER-2 ENGINE (DOOSAN), 5.7M HD BOOM, 2.4M ARM 1.24 M3 H CLA[illegible]SS BKT A-PIT. // INFORMACION SEGUN INSPECCION PREVIA:DOOSAN INFRACORE CO, LTDAJ CUCHARA MODELO REZDM1496, DOOSAN No. 2301[illegible]94-02207[illegible]9, CAPACIDAD M3/ YD3 1.05/1.41, WIDTH MM / INCH 1246.00 /49.06, WEIGHT KG/LB 939.00/2070.26; SERIAL CUCHARA: SS19B2E22, SS19C1123[illegible], SS19B2517, SS19B2821, SS19B2716, SS19B2113, SS19C0418, SS19C0407, SS19G0104, SS19B1509, SS19C1226, SS19C0514, SS19L0565, SS19C1[illegible]930, SS19C0615, CADA MAQUINA INCLUYE 2 CAJAS CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO// PAIS ORIGEN: COREA DEL S[illegible]UR, REPUBLICA DE - 190. CANT (15) U //[illegible]

352019000236032-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

4820210005469l1-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900649607 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección: CR 26 36 14 OF 403 ED FENIX | 13. Teléfono: 6914305 | 14. Cód. Admón.: 48 | 15. Cód. Ope.: 58 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900107358 | 25. DV: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 528

29. Número documento de identificación: 1126061889 | 30. Apellidos y nombres: RUBEN TELLO ARAGON

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cons.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575011764732	2021 - 09 - 02	No. 21EM-0011MEX	2021 - 08 - 22

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CORE-DRL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 47. Ciudad: CUERNAVACA | 48. Cód.País Exportador: 493

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: NACIONAL 93 SANTA MARIA AHUACATITLAN, MORELOS | 50. E-mail: EXPORTACIONES@COREDRL.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cód. Depto. Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x us.
C2309	2021 - 06 - 10	493	1	169	68	GERLEINCO S.A.S.	3,780.85

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Comprobante	61. Cód. Sustentamiento	62. Cód. Mercancía	63. No. sueltos o masas	64. Valor suelto USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
8430492000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	493	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código Embalaje	74. No. bultos	75. Subcantidad	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	493	2,720.89		2,448.80		PK	74	3	U	4,00

78. Valor FOB USD	79. Valor Bienes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen	86. Número	87. Cod. adhesivo	88. Año	89. Programa No.	90. Cód Interno del Producto
59,697.65	1,023.24	238.79	0.00	1,262.03	0.00	60,959.68	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	230,479,406	0	0	0
IVA	19.00	230,479,406	43,791,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Reexte		0	0	0	
		Total	43,791,000		0

91. Descripción de las mercancías/Si todas las descripciones de las mercancías a importar son la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, modelos y series) (Si el espacio es insuficiente, continúe en hoja adicional de este formulario)

DO 2021081112 DECLARACION(1-3) NOS ACOGEMOS A LA LEY 49 DE MAYO/1981 ARTICULO VIII DEL GATT. PARRAFO 2. PARRAFO 3 PRINCIPIO DE JU STICIA Y PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL ESTABLECIDO COMO DE OBLIGATORIA APLICACIÓN EN LAS ACTUACIONES ADUANERAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART 3 DEL DECRETO 1165 DE 2019. MERCANCIA NUEVA NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DE ACUERDO AL DECRETO 0925 DEL 09 DE MAYO DE 2013.. PRODUCTO: EQUIPO DE PERFORACION NUEVO, MARCA: COREDRIL, MODELO: A 432 HD, REFERENCIA: AIRMORIL 432HD, USO O DESTINO: R EALIZAR PERFORACIONES VERTICALES, SERIAL: 432 1825 0631, 432 1826 06 21, INFORMACION SEGUN FACTURA: EQUIPADOS CON LUBRICADOR DE L INEA, EQUIPO 1: No. DE CHASIS: 432 1825 0631, MOTOR DE ROTACION: SERIAL: 379392, MOTOR DE AVANCE: SERIAL: 3 (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago aduanero No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Aduanas aduaneras	131. Espacio reservado DIAN - Aduanas Aduaneras	132. No. Aceptación declaración: 4820210005469l1
No hay declaración a aforar		133. Fecha: 2021 08 06

134. Levante No. 4820210004693487	135. Fecha: 2021 - 09 - 08	Firma funcionario responsable	136. Nombre	137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

845. Pago Total $

0

896. Espacio para Número autoadhesivo

9104816999335

Fecha de Impresión: 2021-09-08 12:14:19

20213732318353

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **482021000546911-1**

Subpartida : **8430490000**

108. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serialas y otros)

78 C 0189, EQUIPO 2: No. No. DE CHASIS: 432 1826 06 21, MOTOR DE ROTACION: SERIAL: 379896, MOTOR DE AVANCE: SERIAL: 378 C 0185, I
NFORMACION PREINSPECCION: CADA EQUIPO TRAE 2 LLANTAS. TITAN 185/65R15 88H, NUMERO PLAQUETA: 101104, CANT (2) PC // PRODUCTO: EQUI
PO DE PERFORACION MOD . ECO 432, MARCA: CUMMERIL, MODELO: ECO MOBIL 432, REFERENCIA: ECOMOBIL432, USO O DESTINO: REALIZAR PERFORA
CIONES VERTICALES, SERIAL: 432 1827 06 21, 432 1828 06 21, INFORMACION SEGUN FACTURA: MOD . ECO MOBIL 432, EQUIPADOS CON LUBRICAD
OR DE LINEA, EQUIPO 1: No. DE CHASIS: 432 1827 06 21, MOTOR DE ROTACION: SERIAL: 378 D 0034, MOTOR DE AVANCE: SERIAL: 378 C 0186,
EQUIPO 2: No. DE CHASIS: 432 1828 06 21, MOTOR DE ROTACION: SERIAL: 378 D0035, MOTOR DE AVANCE: SERIAL: 378 C 0187, INFORMACION
PREINSPECCION: CADA EQUIPO TRAE 2 LLANTAS. TERRA PLUS GR-505 / 8.80-12, NUMERO EN LLANTA: A1215620486 CANT (2) PC //XXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora



MARCA:
ATLAS COPCO

TIPO:
COMPRESOR

SERIE:
WUX543518

MOTOR:
82445954

MODELO:
2021

MQ-060
COMPRESOR
XAVS450

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -34
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

06/04/2022



Factura Electrónica De Venta No

MCFE No. 849

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023721705 que habilita desde MCFE 725 hasta MCFE 1000. Vence 2022-07-04

HENRY BLANCO PEREZ

Nit 13.839.427-0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 10.00 X 1000
Autoretenedor ICA Girón Acuerdo 59 de 2018

CLIENTE	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO	
NIT	900849507 1	FACTURA DE VENTA N°849	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 26 36 14 OF 403 ED FENIX BUSSINES		Bucaramanga	6382809
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/04/2022	14/04/2022	HENRY BLANCO PEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COM-100003	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL, ATLAS COPCO, MODELO XAVS450 SERIAL:WUX543519	1	Und.	152.635.367	19%	29.000.720	152.635.367
2	COM-100009	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL, ATLAS COPCO, MODELO XAVS450 SERIAL:WUX543518	1	Und.	152.635.367	19%	29.000.720	152.635.367

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	305.270.734
DESCUENTO	0
IVA	58.001.439
TOTAL DE LA OPERACIÓN	363.272.173
RETEFUENTE	7.631.768
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	355.640.405

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N°60490193001 O CUENTA CORRIENTE N°79660627660 a nombre de Henry Blanco Perez

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2022 16:14:00

De acuerdo con la Ley 1581 del 2012 de Protección de Datos y el Decreto 1377 del 2007 informamos que los datos proporcionados por usted estaran incorporados en una base de datos bajo la responsabilidad de la empresa MOTORES Y COMPRESORES.

CALLE 47 # 32-53 GIRÓN -SANTANDER Teléfono 6465686

Celular: 310-2774197

Correo Electrónico motoresycompresores@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800834356-3 Software: World Office (ww_3)
CUFE: 03787f1ceb8dc900de2fd8f4042a0807234d0ec887b4d72ca542e7d5e41acbbbefeea9301e6ee0f80a08f1f0c2997e7fe –Fecha y Hora de Expedición : 06/04/2022 4:38:13 p. m.

DIAN — Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **352021000516503-9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860023691 | 5. DV: 1 | 6. Apellidos y nombres o Razón Social: RODRIGUEZ Y LONDOTO S A

7. Dirección: AV CL 80 116 B 61 | 8. Teléfono: 2938830 | 9. Cód. Agrup.: 35 | 10. Cód. País: 11 | 11. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

22. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830147508 | 23. DV: 2 | 24. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 476

25. Número Documento de Identificación: 88470953 | 26. Apellidos y nombres: BALANTA ARIZALA ANYELA YESENIA

Documento

12. Clase importación	13. Tipo declaración	14. Cód.	15. No. Formulario Anterior	16. Año - Mes - Día	17. Cód. Aduana	18. Declaración de Importación	19. Año - Mes - Día	20. Cód. Agrupación
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

21. Cód. lugar ingreso de las mercancías	22. Cód. Depósito	23. Identificación de carga	24. Año - Mes - Día	25. Declaración de transporte	26. Año - Mes - Día
BUN	937	No. 937033654	2021 - 12 - 28	No. 84-080086628	2021 - 11 - 08

27. Nombre suministrador o proveedor en el exterior: ATLAS COPCO (WUXI) COMPRESSOR CO. LTD | 27. Divisa: (WUX) | 28. Cód. País Exportación: 218

29. Dirección suministrador o proveedor en el exterior: 72 CHANG JIANG ROAD NEW DIST. WUXI 214028 PR | 30. E-mail: 510-65211410

31. No. de factura	32. Año - Mes - Día	33. Cód. para procedencia	34. Cód. Divisa Transporte	35. Código de Moneda	36. Cód. Ciudad Destino	37. Empresa transportadora	38. Tasa de cambio	39. Cód. Ajuste
860529	2021 - 11 - 01	218	1	467	79	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	3,997.0	

40. Subpartida arancelaria	41. Cód. Complementario	42. Cód. Complementario	43. Cód. Estadístico	44. No. cuotas de pagos	45. Valor aduana US$	46. Formalidad del lugar de la cuota	47. Cód. para la cuota	48. Cód. Adicional
8414409000	XX	XX	C000	XX	XXXX	XX	218	XXX

49. Forma de pago de la importación	50. Tipo de importación	51. Cód. Zona franca	52. Peso bruto kgs.	53. Peso neto kgs.	54. Código arancelario	55. No. bultos	56. Embalajes	57. Cód. unidad comercial	58. Cantidad Bultos
01	01	218	5,810.00	5,220.00	PE	3	1	U	0.00

59. Valor FOB US$	60. Valor Flete US$	61. Valor Seguros US$	62. Valor Otros Gastos US$	63. Sumatoria de Valor, seguros y otros gastos US$	64. Ajuste valor US$	65. Valor aduana US$	66. Código régimen y numeral	67. Numero
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	X	XXXXXXXXXX

68. Cód. oficina	69. Año	70. Programa No.	71. Cód. Destino del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (US$)
Arancel	0.00	[redacted]	0	0	0
I.V.A.	19.00	[redacted]	[redacted]	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	[redacted]
Reexte	0	0	0	0	[redacted]
		Total	[redacted]	[redacted]	0


DECLARACION 1 DE 1/ D.O. 589-21-DNF CODIGO OTS 860194 PEDIDO ATLAS 15575 DO CUSTON 83-1519-1221-1 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION. MERCANCIA NUEVA Y EN BUEN ESTADO/ //// RE FERENCIA: 8161008191, PRODUCTO: COMPRESOR DE AIRE CON ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO, MARCA: ATLAS COPCO, AÑO FABRICACION: 2021, MODELO: XAVB45B YZ/XAVB45B SERIAL MAQUINA: WUX543518, SERIAL MOTOR: 8244T251/ SERIAL MAQUINA: WUX543519, SERIAL MOTOR: 8.24 45954/ SERIAL MAQUINA: WUX543520, SERIAL MOTOR: 82443944/ MARCA MOTOR: DONG FENG CUMMINS ENGINE LTD. USO O DESTINO: EQUIPOS DE CO NSTRUCCION Y MINERIA POTENCIA: 176.9 HP (132 KW), TIPODE COMPRESOR: TORNILLO, PRESION: 205 PSI (14 BAR), (continúa al reverso/doc)

107. Valor pagos anticipados: 0	108. Medio oficial de pago exterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	109. Fecha: XXXX XX XX
110. Espacio reservado DIAN - Aduana/s aduanera/s Distrito de levante. Levante automático. No hay declaración anterior.	111. Espacio reservado para entidades Ministerio de Relaciones Exteriores	112. No. Identificación declaración: 352021000516503 113. Fecha: 2021 12 30
114. Levante No. 352020000033047	115. Fecha: 2022 - 01 - 04	Firma funcionario responsable	116. Nombre Diff. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el límite de la máquina registradora al dorso de este formulario	998. Pago Total $: 0
		999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352102974777 Fecha presentación 2021-12-30 10:01:51 Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2022-01-04 10:23:27

202125333020O4

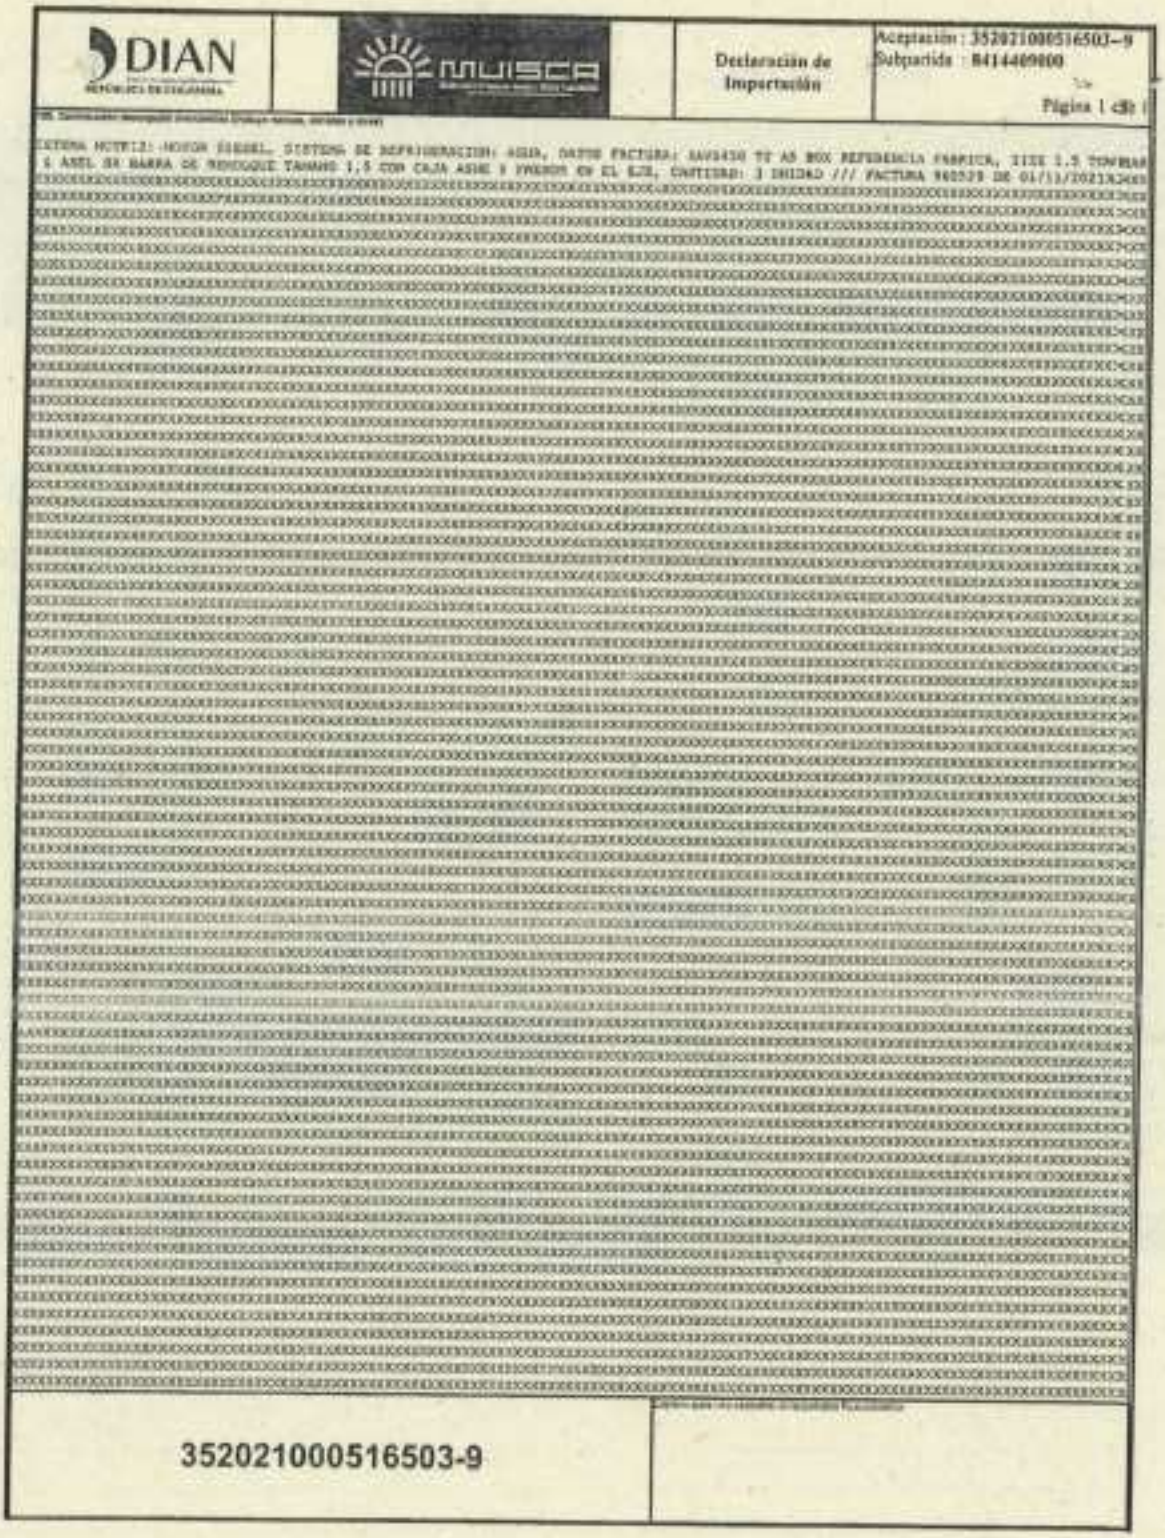
DIAN
MUISCA
Declaración de Importación
Aceptación : 352021000516503-9
Subpartida : 8414409000
Página 1 de 1
352021000516503-9

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Suarez	1.098.714.137		JAFJ7175EL449C221	Bello Plaza

INSPECCIÓN

MES: Enero | AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA 2	DÍA 3	DÍA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.					✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.					✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.					✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.					✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.					✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.					✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.					✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.					✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.					✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.					✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.					✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.					✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.					✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.					✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.					✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, contaduras, abultamientos).					✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.					✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.					✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.					✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (tuyes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM F-13
		Fecha	9/11/2021
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bolívar de Antioquia
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Autopistas Pacífico CONAP

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/01/26	31/01/26					
HOROMETRO	15540	15598					
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	3 enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	3 Enero 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeiferson Acevedo S	1093731817		JJHF5321754	Alcalá

INSPECCIÓN

MES: Enero | AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26	DIA	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de direccion o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, estabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, contaduras, abultamientos)	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esqueneras, cuchillas)							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	3 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Yefersan Acevedo Suarez
PROYECTO: Contrato Mitigacion Redecuesta CORB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26		
HOROMETRO	15560	15569	15576	15580	15585		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yefersan Acevedo
FECHA	9 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	9 Enero 2026

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yerferson Acevedo Sierra	1.097.774.158		JAT5T175EM1T16732	Valencia

INSPECCIÓN

MES: Enero — AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	DIA	12/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	DIA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar bieno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rápido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bodquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Balcones
OPERADOR:	Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Reducuesta CONS

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	
HOROMETRO		15586	15596	15598	15611	15620	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	17 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	17 enero 2026

Scanned with CamScanner

Código	GM-F-13
Fecha	9/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Sierra	1.047.714.137		JAFSF175EK4 T 96325	Falcon

INSPECCIÓN

MES: Enero — AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	26/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26	DIA	DIA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bolsquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas)							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones

OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez

PROYECTO: Construcción Mitigación Piedecuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26		
HOROMETRO	15630	15635	15639	15640	15648		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	23 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	23 Enero 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	CARGO	MARCA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez	1.096.214.995		DIRECCIÓN	Helconi

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Enero					2026	
			5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26	DIA	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la cabina y de los tubos indicadores y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado del extintor de incendios.	✓	✓	—	✓	✓		
3		Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓			
5		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar aire acondicionado.	✓	—	✓	✓	—		
8		Verificar estado de planchas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	—	✓	✓		
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el manejo de estacionamiento (freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓		✓		
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓		
29	REVISIÓN MENSUAL	Verificar estado de botiquín.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo (rejilla) del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de batería.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del balde (hojas, pasadores, dientes, esquineras)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rodillos, zapatas, rieles, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcones
OPERADOR:	Miguel Angel Alvarez
PROYECTO:	Consorcio Montejuerga Piedecuesta CAMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26		
HORÓMETRO	15890	15895	15898	15899	15601		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E
FECHA	9 Enero 2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	9 Enero 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-09
		Fecha	1/1/2026
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN
Miguel Angel Nuñez	1.096.210.945		OBRAS CIVILES	Helicony

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Enero				2026
			DIA	1 Martes	2 Jueves	3 Viernes	4 Sabado	5 Lunes
1	ANTES DE INICIAR	Verificar el funcionamiento de todos los luces internas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control		✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de avance de izquierdo		✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panorámico		✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaplo delantero (líquido, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado de asientos		✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar estado de espejos		✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar estado de planchas y pedales		✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores		✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)		✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro		✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓
27		Verificar sistema de escape.		/	✓	✓	✓	✓
28		Engrasar el rodamiento de giro.			✓		✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolsillo.						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de batería.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pasos flojos, gastados o dañados (ventilas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-09
		Fecha	17/01/2026
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Miguel Angel Alvez Halcon
OPERADOR: Miguel
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Predicente

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	
HORÓMETRO		15610	15615	15630	15633	15695	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	17 enero 2026
FECHA	Miguel
FIRMA INSPECCION	
FECHA	17 Enero 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GRF-08
		Fecha	14/04/22
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERARIO	CÉDULA	PLACA/SERIAL	MARCA	OBSERVACIÓN
Miguel Angel Alvarez	1.096.214115		CAT 226B3	Alcocer

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	14/04/22	20/04/22	21/04/22	22/04/22	23/04/22
1	INSPECCIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces estroboscópicas y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (aguja, plumillas).	✓	✓	—	✓	—
5		Verificar estado de asientos.	✓	—	✓	—	✓
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	—	✓
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	—	✓
8		Verificar estado de planchas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y agarres de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓
29	REVISIÓN MENSUAL	Verificar estado de bisagras.					
30		Inspeccionar el ventilador del motor.					
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.					
33		Verificar estado de batería.					
34		Verificar estado de los cilindros.					
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.					
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).					
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rueldas, zapatas, rodillos, guías).					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Alcores
OPERADOR:	Miguel Angel Alvarez
PROYECTO:	Consorcio Interconexión Pacífico Centro COMIX

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26		
HORÓMETRO	15645	15644	15649	15650	15650		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel
FECHA	23 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	27 Enero 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	CARGO	UNIDAD	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvira	1.096.214.445		D HKC8BARGE 8023	Alcarey

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	AÑO	Enero			AÑO	2026	
			27/ene	27/ene	26/ene	29/ene	30/ene	31/ene	
1	ESTADO GENERAL	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de planeras y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de giro	✓		✓		✓		
29	REVISIÓN ESPECIAL	Verificar estado de botiquín							
30		Inspeccionar el ventilador del motor							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio							
33		Verificar estado de turbina							
34		Verificar estado de los cilindros							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación							
36		Verificar estado general del balde (filos, pasadores, dientes, esquineras)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Helicopta
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez
PROYECTO: Consorcio Vertigacion Redeveria COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/01/26	27/01/26	29/01/26	29/01/26	30/01/26	31/01/26	
HORÓMETRO	15655	15659	15660	15665	15669	15670	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E
FECHA	31 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	31 Enero 2026

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-65
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	#2
OBRA/PROYECTO	Helicon de granada	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villamizar	SEMANA	A

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			19	20	21	22	23	24	25
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Válvula de seguridad funcionando.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Chupas en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Manómetros de presión en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Nivel y estado de valvulina.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Estado de camisas.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Estado de esferas y canastilla.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		*Estado de base de copa de pistón.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Estado de eje central de la bomba.	✓	✓	✓	✓	✓		
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		*Motor en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Tubo de escape en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		*Encendido del motor en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		*Control de fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Indicadores de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Estado de sistema eléctrico (cables, batería y terminales).	✓	✓	✓	✓	✓		
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Estado de válvula y manguera de retorno.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Mangueras con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Recores de empalme en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado de empaque dixon.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Estado e inspección de orings.	✓	✓	✓	✓	✓		
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Estado de llantas.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Mekoa de ganado

INSPECCIONADO POR: Mauricio Villamizar

PROYECTO: Cesarcia Mitigacion Piedraviesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19-01	20-01	21-01	22-01	23-01	24-01	25-01
COMBUSTIBLE		1 GL		1 GL			
ACEITE DE MOTOR	3/4 GL						
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Mauricio Villamizar
FECHA	23-01-2026
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	#2
OBRA/PROYECTO	Helicoptero de grava da	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villarroel	SEMANA	5

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			26	29	29	29	30	31	DIA
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Válvula de seguridad funcionando.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Chupas en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Manómetros de presión en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Nivel y estado de valvulina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Estado de camisas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de esferas y canastilla.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de base de copa de pistón.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Estado de eje central de la bomba.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		*Motor en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Tubo de escape en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		*Encendido del motor en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		*Control de fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Indicadores de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Estado de sistema eléctrico (cables, batería y terminales).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Estado de válvula y manguera de retorno.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Mangueras con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Racores de empalme en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Estado de empaque dixon.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado e inspección de orings.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones .

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Halcon de granada
INSPECCIONADO POR: Mauricio villarreal
PROYECTO: Concesion Mitigacion piedemonte

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26-01	27-01	28-01	29-01	30-01	31-01	
COMBUSTIBLE	1 gl		1 gl		1 gl		
ACEITE DE MOTOR							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Mauricio villarreal
FECHA	31-01-2026
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-10
		Fecha	11/02/2022
		Versión	1
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 10
OBRA/PROYECTO	Mitigación Pedregal	MES	
OPERADOR	Harley Prada	Enero	

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA								
			19	20	21	22	23				
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Inspeccionar estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓				
2		Inspeccionar estado de teflones.	✓	✓	✓	✓	✓				
3		Inspeccionar estado motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓				
4		Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓				
5		Inspeccionar estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓				
6		Inspeccionar estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓				
7		Inspeccionar estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓				
8		Inspeccionar estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓				
9		Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓	✓				
10		Inspeccionar estado de acoples rapidos.	NA	NA	NA	NA	NA				
11		Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓				
12		Inspeccionar estado de mandos	✓	✓	✓	✓	✓				
13		Engrasar sistema rotario	✓	✓	✓	✓	✓				
14		Inspeccionar estado de mangueras y abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓				
15		Inspeccionar estado del pulmón	✓	✓	✓	✓	✓				
16	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento	✓	✓	✓	✓	✓				
17		Estado del martillo	✓	✓	✓	✓	✓				
18		Estado de mano de angel.	✓	✓	✓	✓	✓				
19		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓				

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✕ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

N. OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-33
		Fecha	15/02/2022
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Piedecuesta - Halcon de Granada
CONDUCTOR:	Harley Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/1	20/1	21/1	22/1	23/1		
GRASA	1 Lb	1 Lb	1 Lb	1 Lb	1 Lb		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Harley Prada Lopez
FECHA	19/01/26
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Scanned with CamScanner

MAQUINARIAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	11/02/2022
		Versión	1
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 10
OBRA/PROYECTO	Antioquia Occidente	MES	
OPERADOR	Harley Prada	ENERO	

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA							
			26	27	28	29	30	31		
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Inspeccionar estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Inspeccionar estado de teflones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Inspeccionar estado motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Inspeccionar estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Inspeccionar estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Inspeccionar estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Inspeccionar estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Inspeccionar estado de acoples rapidos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11		Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Inspeccionar estado de mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Engrasar sistema rotario	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar estado de mangueras y abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Inspeccionar estado del pulmón	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Estado del martillo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Estado de mano de angel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

MAQUINOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM.F-37
		Fecha	11/02/2022
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Piedecuesta - Alto de Granada
CONDUCTOR:	Hailey Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	
GRASA	1lb	1lb	1lb	1lb	1lb	1lb	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Hailey Prada Lopez
FECHA	26/01/26
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	60
OBRA/PROYECTO	Halcon de Granada	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Harley Prada	SEMANA	19 21 23

INSPECCIÓN

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA							
			19	20	21	22	23			
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2		*Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
3		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
4		*Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓			
5		*Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
6		*Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓			
7		*Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓			
8		*Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓			
9		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓			
10		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓			
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓			
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
13		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓			
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓			
16		*Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓			
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓			
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓			
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓			
20		Estado de baterías y cables	✓	✓	✓	✓	✓			
21		*Estado del radiador	✓	✓	✓	✓	✓			
22		Estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓			
23		Estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓			
24		Estado de limpieza general	✓	✓	✓	✓	✓			
		FIRMA DEL RESPONSABE	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

#¡VALOR!	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcon de Granada
INSPECCIONADO POR:	Harley prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01		
HOROMETRO	3837	3842	3848	3853	3861		
COMBUSTIBLE	30	30	30	30	30		
ACEITE MOTOR							
REFRIGERANTE							
ACEITE DE LA UNIDAD							
OTRO:							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Harley prada Lyz
FECHA	23/01/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	# 60
OBRA/PROYECTO	Halcon de Granada	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Harley Rojas	SEMANA	26 al 31

INSPECCIÓN

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA							
			26	27	28	29	30	31		
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2		*Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4		*Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5		*Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6		*Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7		*Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8		*Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16		*Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Estado de baterias y cables	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21		*Estado del radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Estado de limpieza general	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

#¡VALOR!	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcon de Granada
INSPECCIONADO POR:	Holley Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	
HOROMETRO	3868	3874	3881	3888	3895	3901	
COMBUSTIBLE	30	30	30	30	30	30	
ACEITE MOTOR							
REFRIGERANTE							
ACEITE DE LA UNIDAD							
OTRO:							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Holley Prada Lopez
FECHA	26/01/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 5
ACTA DE REUNION COPASST

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	02:20 pm	4:00 pm	2	Mensual	x
30	01	2026					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL		Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Seguimiento al plan de formación 4. Inspecciones de lugares de trabajo 5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas 6. Ausentismo 7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores 8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores 9. Otros programas y actividades 10. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Yeiner Garcia Cadena	
Mauricio Villamizar Solano	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el grado de cumplimiento de los compromisos pactados: - Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: se evidencia seguimiento y participación del comité.

3. Seguimiento al plan de formación

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a todo el personal en:

- Higiene Postural
- Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
- Pausas activas
- Política sst
- Peligros locativos

4. Inspecciones de lugares de trabajo

Se observa la participación del comité en la realización de las inspecciones de seguridad: inspección locativa de obra, inspección de botiquines y camillas, inspección de extintores, de las cuales no se reportan hallazgos que requieran atención.

5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de enero de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo. No se notificaron presuntos casos de enfermedad laboral.

6. Ausentismo

En el mes de enero de 2026 no se presentaron casos de ausentismo laboral.

7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores

Durante el periodo no se registraron visitas de entes de control o partes interesadas.

8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

Durante el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de los trabajadores en materia de SST, ni se encuentra en proceso ningún proceso entre la empresa y los colaboradores.

9. Verificación normatividad

Se verifica la normatividad legal vigente que entra en vigencia que aplica a las actividades y funcionamiento del SG-SST durante el periodo

10. Otros programas y actividades

- El equipo SST realiza visitas permanentes a los frentes de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	COPASST - SST	Enero 2026

Fecha próxima reunión: febrero 2026

Yeiner García Cadena
Presidente del COPASST

Mauricio Villamizar Solano
secretario del COPASST

ANEXO N° 6
ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	2:00 pm	4:00 pm	02	Mensual	x
29	01	26					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité 4. Casos no Resueltos 5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Yefferson Dyfred González Ortega	
Yeiner García Cadena	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

3. Quejas de Acoso Laboral:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:

En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros

Siguiendo el cronograma de capacitación, se socializo las políticas sst

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Enero 2026

Fecha próxima reunión: Febrero 2026

Yefferson Dyfred González Ortega
Presidente

Yeiner García Cadena
secretario

ANEXO N° 7
ASISTENCIA CAPACITACIONES SST

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB

TEMA DE CAPACITACIÓN Higiene Postural

LUGAR: BNel de Primavera FECHA 6 ENERO 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andrés garcía	6565491	AYUDANTE	
2	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
3	Geiner Garda	7005182273	Operador	
4	Luis Alberto prado	5.694.822	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA Construccion Mitigacion Piedecuesta CPMB

TEMA DE CAPACITACIÓN Matriz de identificacion de Peligros y valoracion peligros

LUGAR: Bruss de Primavera FECHA 8 Enero 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Bradalozzi	13715736	Ayudante Sc	Alexander Brad
2	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante P.	
3	Luis Alfonso Fuentes R	098699412	Aux Perf	
4	Mauricio Villamizar	1005541892	operador	
5	José Ospino	1052074060	Ayudante P.	
6	Hurley Prado lopez	1098811761	operador	Hurley Prado lopez
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA Consorcio Mitigación Piedecuesta

TEMA DE CAPACITACIÓN Pausas activas - la importancia de los estramentos

LUGAR: Brisas de primavera FECHA 13 Enero 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yeiner García	1005187293	Operador Perforadora	
2	Andrés garcia	6565491	AYUDANTE	
3	Mauricio Suarez P	1100340118	OP Maquinaria	
4	Brandon Rodriguez Rodriguez	1043733325	Auxiliar	
5	Rodolfo Quiñonez	6356621	Ayudante obra	
6	Kelvin Paez	7014092	Ayudante Perforación	
7	Jorge Andres Perez Garcia	1063560222	Tecnico de Perforacion	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [ ] CHARLA [x]

OBRA: Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB

TEMA DE CAPACITACIÓN: la importancia de los elementos - Puntos Ciegos

LUGAR: Halcon FECHA: 13 ENERO 2026

CAPACITADOR: Victor Gamboa DURACIÓN: 20 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	MAURICIO VILLAMIZA	1005[illegible]78	Operador	
2	Hurley Prada Lopez	1098822751	Operador	Hurley Prada
3	Alexander Prada Lopez	13745736	Ayudante P.	Alexander Prada
4	JEFFERSON GONZALEZ	5823211	AYUDANTE P.	
5	Luis A. Fuentes N.	[illegible]99422	Aux Dect	
6	JOSE OSPINO	7050774060	AYUDANTE P.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA Consorcio Hidroquicua Piedecuesta COMB

TEMA DE CAPACITACIÓN Política SST

LUGAR: Brisas de Primavera FECHA 21/01/26

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Andres Flores Parra	1063460223	Ayudante	
2	Mauricio Suarez P.	1100880168	OP	
3	Rodolfo Quintanez	6356621	Ayudante	Rodolfo
4	Yeiner Garcia	7005184293	Operador Perf.	
5	Andri garcia	6565491	AYUDANTE	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA Consorcio Mitigacion Piedecuesta cdmb

TEMA DE CAPACITACIÓN Politica SST

LUGAR: Helconcol FECHA 21 Enero 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hayley Prada Lopez	1098822957	operador	Hayley Prada
2	Alexander Prada L.	13745736	Ayudante P.	
3	Luis Alberto prada	5.697822	Ayudante	
4	Pedro Jesus Velez C	13.281355	Ayudante	P.Pedro
5	Frank Jairo Chaus	1005060412	Almacenista	
6	Comercializadora	91291101	oficial	
7	Mauricio villamizar .s	1005511892	Operador	
8	José espino	1098919060	Ayudante. O	
9	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante "P"	
10	Luis Alfonso Fuentes n	1096699427	Ack Pert	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO N° 8
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina	de

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Victor Gamboa Firma: CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Ruta de Primavera - Helconia

Vo Bo COPASST (Nombre y Firma): Yeiner Garcia CARGO: operador

Tenga en cuenta que:

U: Uno y se califica con SI ó NO.

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
NOMBRE	CARGO		Casco		Protector Auditivo		Protección visual		Protección respiratoria		Overol		Guantes		Botas		Arnés		Línea de vida		Eslinga		
			U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Juan Andres Diaz	Almacenista	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Andres Garcia F	Ayudante	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Yeiner Garcia	operador fer 1	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Esmeraldo Parra	oficial obra	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Yoel Arteaga	operador fer 1	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Alberto Prada	Ayudante obra	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Harley Prada	operador	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alexander Prada	Ayudante	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Yeppersin Gomez	Ayudante P	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Alfonso Tarazona	Ayudante P1	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jose alberto apon	Ayudante	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Marcos Villamizar	operador fer	6/01/26	SI	B			SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

Scanned wi
CamScar

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Código	SST-F-14
Fecha	19/05/2025
Versión	4
Página	de

Inspección realizada por:

Nombre:	Juan Andres M.	Fecha inspección: 19 Enero 2026	Próxima inspección: Febrero/26
Cargo:	Profesional SST	Lugar: Almacen - Barrel	Firma:
Ubicación del botiquín:	Almacen	Ubicación de la camilla: Almacen	
V.B. Copasst:	Yeiner Giron	V.B. Brigadas de emergencia:	

Diligenciar con una X según el caso

Elementos	Parámetros a tener								Plan de acción			
	Medida	Cantidad Ideal	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Integridad empaque: B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	08/27	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	07/26	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	10	08/26	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	—	—								
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	17	09/28	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	03/26	✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1	—	—								
Apósito ocular	Unidad	1	7	10/28	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	40	07/27	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	27/01/27	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	17/01/27	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1	05/26	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	10	09/27	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	5	—	—								
Tapabocas desechable	Unidad	10	12	08/27	✓							
Compresas Estériles	Unidad	3	—	—								
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	—	—								
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	2	09/27	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	—	—								
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	—	—								
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	2	04/27	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser Rígida en polietileno de alta densidad, de tipo cuchara o tabla de rescate, de fácil manejo, con 2 o 4 agarraderas de cada lado y inflexible.

Descripción	Estado: B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpia y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Versión	4
Página	de

Inspección realizada por

Nombre: Frank Julian Cañas	Fecha Inspección: 22-01-2026	Próxima Inspección: Febrero
Cargo: Almacenista	Lugar: Halcones	Firma:
Ubicación del botiquín: Almacen	Ubicación de la camilla: Almacen	
V.B. Copasst: Yeiner Garcia	V.B. Brigadas de emergencia:	

Marque con una X según criterio | B = Bueno | R = Regular | M = Malo | NA = No aplica

Elementos	Parámetros a revisar								Plan de acción			
	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Integridad empaque B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1		✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1		✓							
Algodón	Paquete	1	1		✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	5	31-07-2027	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20										
Aplicadores s/n copitos	Unidad	10	10	01-04-2027	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1		✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1	1		✓							
Apósito ocular	Unidad	1	3		✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10		✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1		✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	22-04-2027	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1										
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1										
Inmovilizador Cervical	Unidad	1										
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1										
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	2	22-04-27	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1										
Tijeras	Unidad	1										
Curitas	Unidad	10	10	3-04-2027	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	3	02-2027	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	4		✓							
Compresas Esteriles	Unidad	3	5		✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	12		✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1										
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1		✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polipropileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, bordeada tipo asa en sus extremos

Descripción	Estado B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con facil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Pagina	de

FECHA: 19 Enero 2026 PROYECTO: Cuadro Mitigacion Redeworks

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Juan Andres Diaz Brigadista de Primeros

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: Yeiner Garcia

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Mantenimiento	Presión	Palanca	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Observaciones
1	Multiproposito	Almacen	10lbs	03/25	03/26	B	B	D	D	B	B	B	/	B	B	B	B	/

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	de

FECHA: 21 Enero 2026 PROYECTO: Consorcio Hidrogucua Redes Eléctricas

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Frank Quiñones Cano

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: Yeiner Bucla

No. interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Cilindro	Tobera	Manija	Observaciones
1	Multipropósito	Almacen	10 lbs	01/26	01/27	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR

Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Hidrogeron Piedecuesta | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz Quintero

FRENTE: Brisas de primavera | FECHA: 5 al 9 Enero 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI X NO | Periocidad de la limpieza: ato d la obra

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—		—		—		—		—					
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango	N/A	—		—		—		—		—					
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓					
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general	N/A	—		—		—		—		—					
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓					
Porras (9", 12", 18")	Mango	9	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricás	Clavija, contacto	N/A	—		—		—		—		—					
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A	—		—		—		—		—					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Juego de Llaves	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Hachas	Cabo - filo	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1	✓		✓		✓		✓		✓					

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiver Garcia

OBSERVACIONES:

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Mitigación Ptda | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz.

FRENTE: Bulla de Aluviones | FECHA: 17 al 17 Enero 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? | SI | | NO | | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	5			✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A			—		—		—		—		—			
Cinceles	Estado general	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	N/A			—		—		—		—		—			
Limas	Mango,estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	12			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general	N/A			—		—		—		—		—			
Picas	Cabo	10			✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	4			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A			—		—		—		—		—			
Tijeras industriales	Estado general	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A			—		—		—		—		—			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1			✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeimi Garcia

OBSERVACIONES:

Código	[illegible]
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 1

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR

EMPRESA: Consorcio Metroquerua Ptda | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz

FRENTE: Bocas de Pimienta | FECHA: 19 al 23 Enero 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? | SI [X] | NO [ ] | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—		—		—		—		—					
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango	N/A	—		—		—		—		—					
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓					
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general	N/A	—		—		—		—		—					
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓					
Porras (9", 12", 18")	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A	—		—		—		—		—					
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A	—		—		—		—		—					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Juego de Llaves	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Hachas	Cabo - filo	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1	✓		✓		✓		✓		✓					

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA: [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: [signature]

OBSERVACIONES:

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR

Código	SST-F-16
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Fotovoltaico Puerto Colombia | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz

FRENTE: Bases de Proteccion | FECHA: 26 al 31 Enero 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	✓		—		—		—		—		—			
Cinceles	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	N/A	—		—		—		—		—		—			
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general	N/A	—		—		—		—		—		—			
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A	—		—		—		—		—		—			
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	N/A	—		—		—		—		—		—			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigía: Yeimy Garcia

OBSERVACIONES:

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR

Código	SST-F-16
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 1

EMPRESA: Coasarsio Mitigacio Pedrowsk

INSPECCIONADO POR: Frank Yan Pier

FRENTE: Halcones

FECHA: 21 Enero 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1					/		/		/					
Barras	Estado general	1					/		/		/					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete															
Cinceles	Estado general	1					/		/		/					
Cinta métrica	Estado general	1					/		/		/					
Destornilladores	Mango, punta															
Extensiones	Mango															
Limas	Mango,estado general	1					/		/		/					
Llaves Expansivas	Estado general															
Machetes con funda	Mango sin Funda	1					/		/		/					
Martillos de uña	Mango	2					/		/		/					
Palas	Cabo, hoja	6					/		/		/					
Paladragas	Cabo, cavadora	1					/		/		/					
Parasoles	Estado general															
Picas	Cabo	6					/		/		/					
Porras (9", 12", 18")	Mango															
Extensiones electricas	Clavija, contacto	1					/		/		/					
Tijeras industriales	Estado general															
Serruchos	Mango, hoja, marco	1					/		/		/					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	3					/		/		/					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango															
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos															
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1					/		/		/					
Juego de Llaves	Estado general															
Llave de Tubo	Mordaza, regulador															
Nivel de Mano	Gota de nivel	1						/		/		/				
Hachas	Cabo - filo	1					/		/		/					
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA: Frank Yan pier Falcones Cañas

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yenny Correa

OBSERVACIONES:

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Hidrogeico pidrocuesta | INSPECCIONADO POR: Frank Yan Pier

FRENTE: Halcones | FECHA: 26 - Enero - 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] | Periocidad de la limpieza: a la entrega

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete															
Cinceles	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta															
Extensiones	Mango															
Limas	Mango,estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general															
Machetes con funda	Mango Sin Funda	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general															
Picas	Cabo	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango															
Extensiones electricás	Clavija, contacto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras industriales	Estado general															
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango															
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos															
Polidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general															
Llave de Tubo	Mordaza, regulador															
Nivel de Mano	Gota de nivel	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Hachas	Cabo - filo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA: Frank Yan Pier Jaimes Cañas

FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yuner Garcia

OBSERVACIONES:

ANEXO N° 9
REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPACITACIONES SST





CAPACITACIONES SST







SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB





PERFORACION PARA ANCLAJES HALCONES





SUPERVISION DE ACTIVIDADES FRENTE HALCONES





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA

ANEXO N° 10
MEDIDAS PREVENTIVAS

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
ATS

FECHA:	15/08/2023
VERSIÓN:	2
PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Brisas de Primavera		
Fecha de inicio:	05/01/2026	Fecha de finalización:	09/01/2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFILACIÓN DE TALUD MECANICO Y/O MANUAL		
Herramientas, equipos o insumos a utilizar:	Pala, pica, azadon, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria).		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caidas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencia	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Trabajar en equipo 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Perfilación manual de talud (terreno firme)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion precperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Perfilacion mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caida de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (cedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	

Movimiento de material y cargue de material (escombros)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caida de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar alerto a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Fenómenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehículo. 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehículo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de transito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Fenómenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACION DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Andrés Agudelo	65 65 491	
Yeiner García	7005187293	

IDENTIFICACION RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon González	1.098.760.722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91 265 828	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. FECHA DE INICIO Y FINAL	5	01	2026	HORA	
	9	01	2026	HORA	
2. CENTRO DE TRABAJO	Brisas de Primavera				
3. TERMINACIÓN DE LA TAREA				4. ALTURA APROXIMADA	5. CONSECUTIVO

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y RESPONSABILIDAD

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

#	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTO DE EXAMEN DE ALTURAS	ACCESO DE ALTURA (SI/NO)	ENTREGA POLITICA SEGURIDAD EN TA	ANALISIS DE TRABAJO						
							LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
							5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26		
1	Yeiner Galvis	7003 180273	Operador	SI	SI	SI	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00		
2	Andres Galvis	6565491	AYUDANTE	SI	SI	SI	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres		
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		9. ¿TRABAJO ALTURAS? SI	NO
	Diligencia de seguridad en alturas		
	Reforzamiento de salud manual y mecánica		
	Topografía de instalación de puntos de anclaje		
	Re-Entrenamiento de salud		
	Montaje y desmontaje de andamios		
	Montajes y cambios de luminarias		
	Mantenimiento de salud		
	Otros		

10. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TEMPORALMENTE EN ESTA TA

10.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pico		Barra de 10 libras	
Pala	✓	Palustre	
Destornillador		Pinzas	
Polipasto		Taladro	
Machete		Pulidora	
Llaves de tubo		Sierra	
Serrucho		Escalera	
Otras maquinarias		Otros	
Barra de 5 libras			

10.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor	✓	Arnes de cuerpo completo	✓
Unidad hidráulica		Arnes pelvico	
Taco de perforación		Eslinga de cinta	
Barras de perforación			
Manguera de aire			
Compresor		Otros	
Taladro			
Manguera de perforación			
Eslinga hidráulica			

11. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

En caso de presentarse alguna novedad, las registraremos en formato GES-F-02 Análisis de Trabajo Seguro

12. ¿PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



13. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA TAREA SEGÚN CRITERIO

CASCO BARBUQUEJO	✓	GUANTES DE CARNAZA	✓		
Con Forros, Limpio, con barbuquejo		Sin oficios, libre de grasa, aceite/sol			
GAFAS OSCURAS	✓	GUANTES DE PRESIÓN	✓		
Sin rayones, sin fisuras y con tiras ajustables		Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo			
GAFAS TRANSPARENTES	NA	ZAPATOS REFORZADO	✓		
Sin rayones, sin fisuras y con tiras ajustables		Sin agujeros, sin fisuras de agua y aceite/sol			
TAPA OIDO DE COPA	NA	BOTAS PANTANERAS	✓		
Sin dobleces, sin fisuras		Sin agujeros, sin filtraciones de agua			
TAPA OIDO INSERCIÓN	NA	CAMISA	✓		
Sin dobleces, sin fisuras		Sin manchas, sin fisuras y con cuellares			
TAPABOCAS DESECHABLE	NA	TAPABOCAS (N95)	✓		
Sin dobleces, libre de grasa, suciedad y polvo		Sin dobleces, libre de grasa, suciedad y polvo			
Camiseta	✓				
Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo					

14. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS PROPIAS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

RED DE SEGURIDAD	NA	PUNTO DE ANCLAJE	✓		
Instalada por personal calificado, en buen estado para su uso		Certificado, Sin deformación, deterioro, desgaste, identificado			
ANCLAJE PORTÁTIL	NA	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓		
Sin dobleces, sin cortes, sin costuras, sin deformación, visible sucios y deformación		Sin deformación, sin cortes, quemaduras, visible sucios y deformación			
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	ARNÉS	✓		
Sin dobleces, sin cortes, sin costuras, sin deformación, sin fisuras, sin fisuras, Sin fisuras, Sin fisuras, Sin fisuras, Sin fisuras		Sin dobleces, sin cortes, quemaduras, sin deformación y deformación			
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	MOSQUETÓN	✓		
Sin dobleces, libre y cortes, sin deformación, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras		Sin deformación, deformación, sin fisuras			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	✓		
Sin dobleces, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras		Sin dobleces, sin fisuras, sin deformación, sin fisuras, sin fisuras			
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓	CONECTORES TRAMPA DOBLE	✓		
Sin dobleces, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras		Sin Dobleces, deformación, fisuras y cortes, sucios/oxidados			
ESLINGA DE ROSCADO	✓				
Sin dobleces, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras, sin fisuras					

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD (PARA) (SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)	14.1. INVENTARIO (PARA) DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (¿CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN?)	14.2. INSPECCIÓN (PARA) DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (¿CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN?)
	Nota: El proyecto debe verificar la disponibilidad según alturas, programa de CONDICIONES DE TRABAJO DE ALTURAS	

(Restricciones de su condición de salud actual)	(Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP)	(Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC)

14. SELECCIONE EL SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD A REALIZAR

TRABAJADOR No.	SISTEMA PUESTO		SISTEMA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN											PROCEDIMIENTO DE CUIDADO DE METODO				
			RESTRICCIÓN DE CAÍDAS				CONDICIONES											
							CONDICIONES PARA DISTANCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA											
	SOLO DE DESCANSO	PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	ALCANCE	FACTOR CAÍDA MÁXIMO DE CAÍDA	ABSORBEDOR DE ENERGÍA	OTROS: PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL	OTROS: CUERDA DE POSICIONAMIENTO	CARACTERÍSTICAS PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	SISTEMA DE RESCATE Y A					
1																		
2								N/A	N/A									
3								N/A	N/A									
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR DURANTE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

DELIMITACIÓN DEL ÁREA Delimitar la zona de acceso de cada uno de los trabajadores y permitir únicamente las de ayuda de rescate y apoyo CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐	SEÑALIZACIÓN Cuenta con señalización, advertencia, prohibición, obligación, rescate, o uso de equipo CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐	APLICACIÓN Cuenta con señalización visible para cualquier persona en alturas expuesta a accidente o caída CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐	ÁREA PARA TRABAJO EN ALTURAS La zona delimitada a la vigilia de acuerdo indicada por el fabricante, y el número de trabajadores autorizados y el ingreso control de seguridad CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
CÓDIGO DE ACCIDENTES Cuenta con equipos de rescate (camillas, botiquines de primeros auxilios, elementos de protección personal, etc.) y cuenta con elementos de protección, mínimo de 1.80 m CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐	ANCLAJE DE SEGURIDAD Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Asegurarse de la superficie sin riesgo de caída de más de 1.80 m de altura a cada trabajo primero que pueda caer a superior CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	ACCESORIOS Cumple con Resolución vigente con el artículo 2016, artículo 1 numeral 4 de las categorías 4 en relación de trabajadores mayores/menores 48 en el artículo, con fines a superior al trabajo CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	Área Delimitar Preventiva CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIONE LOS ACTIVOS DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFICA LOS DOCUMENTOS ACTIVOS

N/A DOCUMENTOS ADICIONALES (CURSOS) Asistencia certificados, diploma de aprobación o asignado por capacitación, cumplimiento que demuestren la aptitud y del usuario CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ OBSERVACIONES: Verificar inspección ambiental	N/A CRÉDITOS Cuenta con certificados, diploma de aprobación o asignado por capacitación, cumplimiento que demuestren la aptitud y del usuario CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ OBSERVACIONES: Verificar inspección de arnés	N/A ANCLAJE Cuenta con sistema de anclaje para puntos a asumir, la verifica independiente la utilización de los puntos, deberá ser anclajes de protección contra caídas CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ OBSERVACIONES: Verificar inspección de anclajes	N/A OTROS ACTIVOS DE ACCESO CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
N/A SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE PERSONAL Cuenta con equipo de elevación de personal, cuenta con operario, cuenta con certificado vigente y no se encuentra vencido, del fabricante CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ OBSERVACIONES: Verificar inspección de sistema de elevación de personal	N/A EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA CARGA Cuenta con certificado vigente con el artículo 2016, artículo 1 numeral 4 de las categorías 4 en relación de trabajadores mayores/menores 48 en el artículo, con fines a superior al trabajo CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ OBSERVACIONES: Verificar inspección de sistema de elevación por carga		

Nota 1: El trabajo en alturas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los controles de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para la selección la compatibilidad de los sistemas, el estado de acceso y las instrucciones de los fabricantes.
Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el anclaje y descenso de pasajeros y el trabajador que opera equipo para elevación de personas, deben contar con capacitación en la seguridad durante las operaciones y acreditación las instrucciones de los fabricantes y/o normas nacionales e internacionales aplicables.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. EMPLEADOR (Datos del Empleador de Trabajo)

1.1. PERSONAL AUTORIZADO QUE AUTORIZA EL TRABAJO (La persona que autoriza el trabajo debe ser competente, conocer todos los riesgos asociados con el trabajo a realizar, tener la autoridad para detener el trabajo y estar familiarizado con el área de trabajo y los procedimientos que se aplican.)

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Fecha	5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26		
Nombre	Jhon Gomez	Jhon G.	Jhon G.	Jhon G	Jhon G		
Firma							
Hora	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

1.2. PERSONAL AUTORIZADO PARA COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS (Se verificará que cumplan todos los requisitos establecidos para ser autorizado, de acuerdo a la tarea, herramientas y materiales asignados en el permiso de trabajo.)

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G		
Firma							
Hora	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

1.3. PERSONAL AUTORIZADO PARA SUPERVISAR EL PLAN DE CONTINGENCIA (Se verificará que cumplan todos los requisitos establecidos para ser autorizado, de acuerdo a la tarea, herramientas y materiales asignados en el permiso de trabajo.)

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre	Juan Ard	Juan Ard	Juan Ard	Juan Ard	Juan Ard		
Firma							
Hora	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

1.4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EL USO DE EQUIPOS (Se verificará que cumplan todos los requisitos establecidos para ser autorizado, de acuerdo a la tarea, herramientas y materiales asignados en el permiso de trabajo.)

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

2. CLASIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

2.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, COORDINACIÓN DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE CONTINGENCIA

CALIFICADO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE TRABAJO (Describa el programa aquí o anexe copia del programa. Asegúrese de que el programa de capacitación cubra todos los requisitos de capacitación y calificación del personal.)

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	FECHA DEL CURSO	CALIFICADO

2.2. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS, COORDINACIÓN DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE CONTINGENCIA

EVALUACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE TRABAJO (El nivel competente (carrera de nivel superior, tecnólogo, tecnólogo, técnico, etc.) o experiencia de una educación de alturas (curso básico, básico de reentrenamiento, básico de rescate, básico de rescate de reentrenamiento, básico de rescate de reentrenamiento, básico de rescate de reentrenamiento

	ATS	VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigación Piedecuesta	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Brisas de Primavera		
Fecha de inicio:	13/01/26	Fecha de finalización:	17/01/26
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFILACIÓN DE TALUD MECANICO Y/O MANUAL		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Pala, pica, azadon, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria)		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera)		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Trabajar en equipo 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Perfilación manual de talud (terreno firme)	Condiciones de seguridad Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas 11 Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Perfilación mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4 Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	

Movimiento de material y cargue de material (escombros)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones o indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Fenómenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehículo 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehículo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de tránsito	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Fenómenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Andrés García	6565491	
Rodolfo Quiñonez	6356621	
Yeiner García	7005187293	
Helgin Plaza	7014098	
	1065560222	

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon González	1.042760722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91261823	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. FECHA DE INICIO Y HORA	13	01	26	HORA
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	17	01	26	HORA

3. CENTRO DE TRABAJO: Brisas de Primavera

4. ALTURA APROXIMADA:

5. CONSECUTIVO:

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y RESPONSABILIDAD

7. TAREAS DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN 16

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?	CURSO DE ALTURAS VIGENTE?	ACEPTA RIESGO DEL ALTURAS?	TAREAS DEL TRABAJADOR						
							LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Andres Garcia	6569491	AYUDANTE	SI	SI	SI		Andres	Andres	Andres			
2	Kelvin Poos	7014092	Ayudante de Perforacion	SI	SI	SI				Kelvin	Kelvin	Kelvin	
3		1065610210	Ayudante de Soldador	SI	SI	SI							
4	Rodolfo	6355000	Ayudante	SI	SI	SI					Rodolfo	Rodolfo	
5	Yeinel Garcia	1005187293	Operador	SI	SI	SI							
6													
7													
8													
9													
10													

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

		¿TRABAJO AUTORIZADO? SI	¿TRABAJO AUTORIZADO? NO
	Examenes de ingreso de salud		
	Suministro de suplementos de salud manual y auxiliar	✓	
	Diagnóstico de intoxicación de puntos de anclaje		
	Perforación de salud	✓	
	Uso de y manejo de los anclajes		
	Recreación y concreto forzado		
	Levantamiento de salud		
	Otros		

9. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR

9.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pica	✓	Barra de 10 libras	
Pala	✓	Cuña	
Azadón	✓	Cinceles	
Pulidoras		Taladro	
Machete		Pulidora	
Lima de mano		Sierra	
Serrucho		Taqueo	
Llave inglesa		Otros	
Pinza de 8 libras			

9.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor	✓	Retroexcavadora	✓
Unidad hidráulica		Polipasto	✓
Torre de perforación		Maquina de aire	
Barras de perforación			
Martillo de perforación			
Compresor			
Tolva		Otros	
Mandíbula de perforación			
Maquina hidráulica			

10. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se anexan el presente documento los registros correspondientes en Formato GH-F-33 Análisis de Trabajo Seguro

11. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD: ¿PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



12. SELECCIONE Y ESPECIFIQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA TAREA A REALIZAR

CASCO ANTICHOQUE ✓	GUANTES DE CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD NA	PUNTO DE ANCLAJE ✓
Con Visores, Arnés, con Barbuquejo	Con oficios, Libre de grasa, Humedad	Incluidos con pantalón cuando se hacen trabajos en altura	Certificado, Con Dilatación, antiperforación, Antiestático, Identificado
GAFAS CELULARES ✓	GUANTES DE PROTECCIÓN ✓	ANCLAJE PORTÁTIL NA	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL ✓
Sin rayones, con Espejo y con Vida superior	Con oficios, Libre de grasa, resistente a golpes	Con adquera, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades	Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades
GAFAS TRANSPARENTES NA	CALZADO SEGURIDAD ✓	LÍNEA DE VIDA VERTICAL ✓	ARNÉS ✓
Sin rayones, con Espejo y con Vida superior	Con adquera, con Elemento de agarre y resistentes	Con adquera, Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, Puntuales	Con adquera, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades
CARA SIDE DE CARA NA	BOTAS PANTANERAS ✓	CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO ✓	RESOLUCIÓN ✓
Sin desgarro, sin Fracturas	Sin agujeros, con Elemento de agarre	Con adquera, Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades	Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades
CARA SIDE RESOLUCIÓN NA	CAPUCHA ✓	CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO ✓	DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ✓
Sin desgarro, con Fracturas	Sin rayones, con Fracturas y con agujeros	Con adquera, Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades	Con adquera, Sin Dilatación, antiperforación, Antiestático, Identificado
CARAMAS QUIRÚRGICO NA	TAPABOCAS ✓	CINTURÓN DE POSICIÓN ✓	CONECTORES CONECTOR ✓
Sin desgarro, Libre de grasa, resistente y pulido	Sin desgarro, Libre de grasa, resistente y pulido	Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades	Sin Dilatación, deformidades, Abierto y cierre correctamente
GANCHO ✓	Otros	LÍNEA DE VIDA ✓	Otros
Sin oficios, Libre de grasa, resistente y pulido		Libre y libre con amortiguador, Sin Dilatación, cortes, quemaduras, Humedad, cuerdas y deformidades	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA
(SI CUENTA CON UN SI CUPO EN LAS OBSERVACIONES)

13.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN)

13.2. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
(CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN)

Marque si procede. Anule o realice la inspección según: Fabricante, Empresa o el COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	13.1.	Casco	Gafas	Guantes	Botas	Arnés	Línea de vida	13.2.	Casco	Gafas	Guantes	Botas	Arnés	Línea de vida
1		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			
2				✓	✓						✓	✓	✓	
3				✓							✓	✓	✓	
4					✓							✓	✓	
5		✓	✓						✓	✓			✓	
6														
7														
8														
9														
10														

Observaciones de condiciones de salud diaria:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIÓN DE ARTURA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD A REALIZAR

Trabajador No.	ARTURA PASIVA	SISTEMA ACTIVO DE PROTECCIÓN												PROCEDIMIENTO DE SALVAMENTO EN ALTURAS				
		ANCLAJE				CONECTORES												
		PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL	PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PROTECCIÓN DE CAÍDA			ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO	SISTEMA DE RESCATE Y EVACUACIÓN					
							ABSORBEDOR	RETRACTIL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	CONECTORES RETRACTILES					ALTURA DE TRABAJO	DISTANCIA DE CAÍDA LIBRE	DISTANCIA DE FRENADO	ALTURA DE SEGURIDAD	TOTAL
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓				
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓				
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓				
4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓				
5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓				
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

15. SELECCIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR DURANTE LOS MOMENTOS CRÍTICOS

✓ **ENCAPSULADO DEL ANCLAJE**	✓ **CONTROL DE ALMACENAMIENTO**	✓ **ANCLAJES**	**ACTIVIDADES TRABAJO EN MANTENIMIENTO**
Se cubre la zona de peligro de cada punto de anclaje y se evita visibilidad de él a un metro a la redonda	Cuenta con demarcación, señalización, Cerramiento, Cuenta con el de seguridad	Cumple con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o en idioma a definir	La zona controlada a la espera del anclaje cumplen con el Manual de Seguridad establecido, y el trabajador tiene designado a un segundo nivel de supervisión
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	CUMPLE ✓ NO CUMPLE ☐	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ✓	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
✓ **CÓDIGO DE COLORIMETRÍA**	✓ **UNIFORME DE TRABAJO**	✓ **ANDAMIOS**	**Otras Medidas Preventivas**
Cuenta con elementos de seguridad, instalados en todos los niveles encontrados, mezclamos de EPP, Elementos 1,80 m. antes del borde, altura de 1 m y cuenta con barandillas de altura intermedia de 1,50 m	Los dispositivos de retracción de 14 a 20. Asociados en la superficie por donde se inicia de mínimo dos veces la longitud máxima posible que puede llegar a suceder	Cumple con Normativa vigente en la de la Resolución 1016, Artículo 1 en idioma, todos de los trabajos 6 mts. Obligación de supervisión permanente Normativa 1016 con todos los niveles y cuenta de trabajo	
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ✓	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ✓	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIÓN DE MEDIDAS DE ACCESO A ÁREAS Y EQUIPOS DURANTE LOS MOMENTOS CRÍTICOS

N/A **ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES**	N/A **ESCALERAS**	**ESCALERAS**	**OTRAS MEDIDAS DE ACCESO**
Andamios certificados, diseñados, montados y mantenidos por personal competente y entregados con etiquetas que identifiquen claramente su estado	Escaleras certificadas, asegurando correctamente y designada para asegurarse el movimiento que se desplazará de la escalera en el momento	Escaleras de tijera, asegurando correctamente y designada para asegurarse el movimiento que se desplazará de la escalera en el momento	
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	
N/A **ESCALERA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL**	N/A **ANTENAS ELEVADORES DE CARGA**		
Elevador cumple con una vez al año por una persona acreditada en el mismo, y una persona calificada autorizada a las recomendaciones del fabricante	Elevador cumple con una vez al año por una persona acreditada en el mismo, y una persona calificada autorizada a las recomendaciones del fabricante		
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐		

Nota 1: El riesgo se controla de acuerdo dicho actual el análisis de riesgos para determinar las controles de prevención y protección contra caídas actuales, considerando que es la selección la competencia de las condiciones al momento de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el arnesado y desarrollo de andamios y el trabajador que sepa equipo para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y el cumplimiento las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales e internacionales aplicables.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. [illegible]

1.1. [illegible]

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Cedula		13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26
Nombre		Jhon 6	Jhon 6	Jhon 6	Jhon 6	Jhon 6
Firma						
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30	7:30

1.2. [illegible]

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre		Victor 6	Victor 6	Victor 6	Victor 6	Victor 6
Firma						
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30	7:30

1.3. [illegible]

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre		Jhon And	Jhon And	Jhon And	Jhon And	Jhon And
Firma		LuA	LuA	LuA	LuA	LuA
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30	7:30

1.4. [illegible]

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre						
Firma						
Hora						

2. [illegible]

2.1. [illegible]

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE

2.2. [illegible]

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre						
Firma						
Hora						

2.3. [illegible]

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre		Victor 6	Victor 6	Victor 6	Victor 6	Victor 6
Firma						
Hora		Fin Turno 9:32 p	Fin Turno 4:30	Fin Turno 9:30	Fin Turno 9:30	Fin Turno 2:35

3. [illegible]

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Hidroquicen Piedras de Halcones	Ciudad:	Floridablanca
Frente de obra:			
Fecha de inicio:	19 Enero 2026	Fecha de finalización:	23 Enero 2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	DESMONTE DE VEGETACIÓN DEL TALUD		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Macheta, azadón, picas, guadaña, motosierra, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria).		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Desmonte manual de talud (desyerba)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	

Desmonte manual de talud (Poda de arboles)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: Vibraciones por manipulación de motosierra	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Desmonte mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Acopio y cargue de residuos vegetales y otros	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Pausas activas. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: Manipulación manual de cargas y posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehiculo. 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehiculo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de transito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Harley Prada Lopez	1098812151	Harley Prada
Luis Alfonso Fuentes M	1098 699 422	
Kaureen Villamizar S	1005 41872	
Alexander Prada Lopez	13745736	
José Ospino	1090779060	

IDENTIFICACION RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Gonzalez	1048760722	

IDENTIFICACION DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91 265 828	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

2. FECHA DE INICIO Y HORA	19	01	2026	7:30	3. LUGAR DE TRABAJO: Falcon CJ
3. TERMINACIÓN DE LA TAREA	23	01	2026	5:00	4. ALTURA APROXIMADA: 15 mts

5. CONTRATISTA:

6. PERSONAL AUTORIZADAS Y BENEFICIARIOS

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN 6.

#	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTITUD MÉDICA ALTURAS	CURSO DE ALTURAS VIGENTE	EXAMEN MÉDICO PRE-EMPLEO ALTURAS	FECHAS DEL TRABAJO: 19/01/26 (LUNES)	20/01/26 (MARTES)	21/01/26 (MIÉRCOLES)	22/01/26 (JUEVES)	23/01/26 (VIERNES)	SÁBADO	DOMINGO
1	Hurley P.	1094[illegible] 351	operador	Si	Si	Si	Hurley	Hurley	Hurley	Hurley	Hurley		
2	Luis Tuirán	1098	AUX	Si	Si	Si	LUIT	LUIT	LUIT	LUIT	LUIT		
3	Mauricio-AS	1005541 892	ayud	Si	Si	Si							
4	Alexander P.	1037455 336	Ayudante P.	Si	Si	Si	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex		
5	José Ospino	1004[illegible] 060	Ayudante P.	Si	Si	Si	JAT4	JAT4	JAT4	JAT4	JAT4		
6													
7													
8													
9													
10													

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO Y TAREA

		9. TRABAJO AUTORIZADO SI	NO
	Documento de aceptación de riesgo		
	Certificado de salud mental y ocupacional		
	Topografía de ubicación de puntos de anclaje		
	Perforación de tabal	✓	
	Izmado o instalación de los anclajes		
	Montaje o concreto lanzado		
	Tratamiento de salud		
	Otros		

10. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA TAREA A REALIZAR

10.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pico		Barra de 1.5 Libra	
Pala		Cincel	
Azadón		Pinza	
Pulverizador		Taladro	
Vibrador		Pulidora	
Llave de tubo		Sierra	
Carretilla		Soldadora	
Llave inglesa		Otros	
Barra de 6 libras			

10.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor	✓	Andamio metálico	
Unidad Hidráulica		Polipasto	
Taladro de perforación		Maquina de oxi	
Martillo de perforación			
Compresor			
Taladro		Otros	
Martillo de perforación			
Maquina hidráulica			

11. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se anexa el procedimiento documento de seguridad con responsabilidades en formato GES-F-03 Análisis de Trabajo Seguro

12. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENCIA ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS?



13. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA TAREA (SEGÚN CRITERIO)

	✓	N/A
CASCO BARBUQUEJO	✓	
GUANTES DE CARNAZA	✓	
GAFAS OSCURAS	✓	
GUANTES DE PROTECCIÓN		
GAFAS TRANSPARENTES		
TAPAS DE SEGURIDAD	✓	
TAPA OIDO DE COPA		N/A
BOTAS PANTANERAS	✓	
TAPA OIDO INSERCIÓN		N/A
CARETA	✓	
RESPIRADOR QUIMICOS		N/A
RESPIRADOR HOS	✓	
OTROS	✓	

14. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS DE CONTRA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
ARNES DE SEGURIDAD		N/A
ANCLAJE PUNTUAL		N/A
LINEA DE VIDA VERTICAL	✓	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓	
ESLINGA DE RESCATE	✓	
PUNTO DE ANCLAJE	✓	
LINEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
MANTA	✓	
MOSQUETON	✓	
DISPOSITIVOS RETRACTILES	✓	
DISPOSITIVO CAIDA LIBRE (FRENO)	✓	
Otros		

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD (MARQUE CON UNA X O ESPECIFIQUE EN OBSERVACIONES)	13.2. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN?	13.3. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ¿CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN?
	Nota: El personal diligencia y realiza la inspección visual anterior, previamente al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS	

Trabajadores No.	13.1.	Nom.	Ape.	Ced.	Firma	Hora	Hora
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6							
7							
8							
9							
10							

Observaciones de su condición de salud actual	Observaciones de su cumplimiento de criterios EPP	Observaciones de su cumplimiento de criterios EPCC

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR (MARQUE ACTIVIDAD Y TAREA)

SELECCIONE EL ÍTEM A UTILIZAR	SISTEMAS PASIVOS	SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN													ELEMENTOS DE CLASIFICACIÓN DE METROS				
			RELLENOS DE AGUA O				CONECTORES												
								CONECTORES PARA DE ANCLAJE E INCORPORACIÓN DE CARGA											
	USO DE HERRAMIENTAS	ARNÉS DE CAÍDA CUERPO ENTERO	RELLENOS DE AGUA PORTÁTIL	LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL	LÍNEAS DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	ELEMENTOS	ELEMENTOS DE DESCENSO DE CARGA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO	ELEMENTOS DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA PUNTOS DE ANCLAJE	ESTRUCTURA DE SOPORTE					
ÍTEM																			
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓						
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓						
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓						
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓						
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓						
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

15. ACTIVIDAD DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PREVENCIÓN A CAÍDAS DE ALTURA (DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE RIESGO)

✓ Señalización del área	✓ Control de Accesos	✓ Señalización	NA Vías para Vehículos de Suministro
Delimite la zona de peligro de caída de los trabajadores y prevenir la caída de los materiales y objetos	Cuenta con demarcación, señalización, información, Cintas, y vías de seguridad	Cuenta con señalización en línea para cualquier peligro, en donde requiera señalizar, o aplique.	Se cita nuevamente la regla del pare indicado por el Operador y el control de velocidad certificado, y el trabajador debe respetarlas y no exceder el límite de seguridad
CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE
✓ Línea de Advertencia	✓ Barreras de Advertencia	✓ Escaleras	Otras Medidas Preventivas
Cuenta con dispositivo de seguridad, cumpliendo el Código de Señalización Vial Colombiano, Resolución 1231 de 2016, Capítulo 3, Artículo 3.1 y cuenta con Dimensiones de colores Verticales de 1.20 m.	Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Recomienda en la superficie que donde se transite de manera más segura y cuenta con Material antideslizante que evite fisuras o caídas	Cuenta con Escalera de tijera de acuerdo (NTC 4), Artículo 1 y 2 técnicos, Artículo de las especies 3 con Ubicación de materiales Documentos Normativos NTC con norma de referencia y Apoyo N° Colegio	
CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE

16. REVISIÓN DE SISTEMA DE ANCLAJE UTILIZADO Y VERIFICAR LOS ELEMENTOS ANTICAÍDAS

NA Dispositivo de Anclaje	NA Eslingas	Mosquetón	NA Otros Sistemas de Acceso
Dispositivo certificado. Asesoría de instructor o ingeniero que autorice o determine que dispositivo le entregue las cargas	Eslingas certificadas. Asesoría de instructor o ingeniero que autorice o determine que determinen la estructura de anclaje	Cuenta con Mosquetón para anclaje o eslinga. Si se trata de mosquetón o ubicación de las puntas, deberá ser asesorado de proveedor certificado	
CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	
NA Líneas de Suministro de Aire/Gas	NA Sistema de Retroceso (Self Cable)		
Trabajadores cuentan con el Certificado de Competencia Laboral para el manejo de la línea de suministro de aire/gas	Sistema cuenta con un Certificado que garantiza la seguridad de la línea de vida, que cumple con las condiciones según fabricante y/o norma con diseño de ingeniería detallado por una persona certificada		
CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE		

Nota 1. El trabajo en altura de acuerdo a la ley el trabajo de riesgo para determinar los sistemas de prevención y protección correspondientes, considerando para la utilización la compatibilidad de los conectores, el tamaño de cuerpo y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2. El trabajador que tenga la función de realizar el arnesado y desarnesado de asistencia y el trabajador que tiene equipos para elevación de personas, deben tener una capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y procedentes las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	1
	1 de 1

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26		
Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez		
7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G		
7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
-	Frank	Frank	Frank	Frank	Frank		
-	Frank	Frank	Frank	Frank	Frank		
-	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE	OBSERVACIÓN

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Mañana							
Tarde							
Noche							
Hora							

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G		
	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma		
	4:30pm	4:30pm	4:30pm	4:30pm	4:30pm		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
ATS

FECHA:	15/08/2023
VERSIÓN:	2
PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Comercio Mitigacion pinedacuesta	Ciudad:	Floridablanca
Frente de obra:	Halcon		
Fecha de inicio:	26 - Enero - 2026	Fecha de finalización:	31 - Enero - 2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadara pequeña, llavo de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación, Tiflor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad. Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad. Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad. Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus complementos	Condiciones de seguridad. Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección general del área de trabajo, equipos y herramientas (incluye de la torre)	Químicos: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantener áreas en orden y aseo 5. Uso adecuado de EPI. 6. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	

Engrasado de rotaria y motor de avance	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección maquinarias, equipos y herramientas. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Rotulación, manipulación y almacenamiento seguro de sustancias químicas. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
Instalación de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Fenomenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Perforación del talud	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramientas y partes en movimiento)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas, atrapamiento	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
	Biomecánico: posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Desmonte de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Instalación de anclajes en el	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	

talud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10. Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Harley Pineda Lopez	1048822951	
José Ospino	1050779060	
Jefferson Gonzalez	5823211	

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Alexander Gonzalez	1.093 760 722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91. 265 828	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. FECHA DE INICIO E HORA	26	Enero	2026	7:30	
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	31	Enero	2026	12:00	
3. CENTRO DE TRABAJO	Arkonos				
4. ALTURA APROXIMADA	10 mts				
5. CONSECUTIVO					

6. PERSONAL AUTORIZADO Y RESPONSABILIDAD

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN EA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CURSO DE ALTURAS VIGENTE	AFILIACIÓN SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	FIRMA DEL TRABAJADOR 26-01-26 (DOM)	27-01-26 (LUNES)	28-01-26 (MARTES)	29-01-26 (MIERCOLES)	30-01-26 (JUEVES)	31-01-26 (VIERNES)	(SABADO)
1	Yeferson	5823246	Ayudante Perforación	Si	Si	Si							
2	Harby Pinto	751	operador	Si	Si	Si							
3	Jose Ospino		ayudante de o	Si	Si	Si							
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

	9. TRABAJO AUTORIZADO SI	NO
Examenes de aspiración de salud	✓	
Certificación de salud mental y emocional		
Topografía de inspección de puntos de anclaje		
Verificación de salud		
Llenado e inspección de los anclajes	✓	
Asistencia a entorno familiar		
Acompañamiento de salud		
Otros:		

9. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN CASO DE CAIDA A DESNIVEL

9.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pica	✓	Barra de 10 libras	
Pala	✓	Cuerda	
Azadon	✓	Palustre	
Polipasto		Taladro	
Machete	✓	Palustre	
Llave de tubo		Lima	
Serrucho		Segueta	
Llave expansiva		Otros	
Barra de 6 libras			

9.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor	✓	Antiparras plasticas	✓
Combustible		Arnes	✓
Cara de perforación		Mosqueton de cinta	
Barras de perforación			
Martillo de perforación			
Compresor		Otros:	
Pulso			
Mandriles de perforación			
Mosqueton Autobloqueo			

10. ANEXOS AL PERMISO (COLOQUE SI/NO)

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA	Se anexan al presente documento los registros correspondientes en formatos GTH-F-03 Análisis de Trabajo Seguro

11. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD ¿PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



12. REVISIÓN E INSPECCIÓN LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA TAREA SEGÚN CRITERIO

✓	N/A						
CASCO BARBUQUEJO	✓	GUANTES DE CARNAZA	✓	VOZ DE SEGURIDAD	N/A	PUNTO DE ANCLAJE	
Sin fisuras, limpio, con barbuquejo		Sin orificios, libre de grasa, suciedad		Vestido por personas o dificultad, sin fisuras estado para su uso		Certificado, Sin Corrosión, deformación, desgastado, identificado	
GAFAS OSCURAS	✓	GUANTES DE PRECISIÓN		ANCLAJE PORTATIL	N/A	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓
Sin rayaduras, sin fisuras y con lente especificado		Sin orificios, libre de grasa, suciedad y polvo		Con etiqueta, Sin Deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos y deformación		Libre y libre correspondiente, Sin Deformación, deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos	
GAFAS TRANSPARENTES		GUANTES ANTIGOLPES	✓	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	ARNES	✓
Sin rayaduras, sin fisuras y con lente especificado		Sin agujeros, con fin costuras de agua y antideslizante		Con etiqueta, libre y cierre correspondiente, Sin Deformación, cortes, desgaste, Fisuras, Fisuras		Sin etiqueta, Sin Deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos y deformación	
CAPA CASCO DE CUERA	N/A	BOTAS ANTIGOLPES	✓	ESLINGA EN Y CON DOBLE MOSQUETÓN	✓	MOSQUETÓN	✓
Sin desgaste, sin fisuras etc.		Sin agujeros, con fin costuras de agua		Con etiqueta, libre y cierre correspondiente, Sin Deformación, deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos		libre y cierre correspondiente, Sin Deformación, deformación,	
CAPA CASCO INSERCIÓN	N/A	CARETA	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	DISPOSITIVOS RETRACTILES	✓
Sin desgaste, sin fisuras etc.		Sin rayaduras, sin fisuras y con lente especificado		Con etiqueta, libre y cierre correspondiente, Sin Deformación, deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos		Con etiqueta, Sin Deformación, deformación, libre y cierre correspondiente	
PANTALLA SOLDADURA	N/A	PANTALLA N15	✓	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓	ANCLAJES ESTRUCTURALES	✓
Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		Libre y cierre correspondiente, Sin Deformación, deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos		Sin Deformación, deformación, libre y cierre correspondiente	
CALZADO	✓			ARNES DE CUERPO	✓		
Sin orificios, libre de grasa, suciedad y polvo				Libre y cierre correspondiente, Sin Deformación, deformación, cortes, quemaduras, abolsos sueltos			

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA. (SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

13.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN)

13.2. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN)

Nota: Si presenta dudas o realizo la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	13A)	13A1)	13B)	13C)	13D)	13E)	13F)	13G)	13H)	13I)	13J)	13K)	13L)	13M)	13N)	13O)	13P)	13Q)
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA

ACCIDENTE DE MAYOR CUANTÍA	SISTEMA PASIVO	SISTEMA ACTIVO DE PROTECCIÓN													RESCATE DE CAÍDAS DE ALTURA
			PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL	PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	ARNESES CUERPO COMPLETO	CONECTORES							
									CONECTORES PARA RETENCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE CAÍDA				CONECTORES PARA PERSONAS ATRAPADAS	SISTEMA DE TRABAJO 2:1	
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR DURANTE LOS EQUIPOS ASPECTOS

✓ SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA	✓ CAMPOS DE ADVERTENCIA	✓ ACORDONADO	NA/ VALLAS PARA TRABAJO EN ALTURAS
Señalizar la zona de peligro de caída de los trabajadores y permitir visibilidad de día y de noche al aplico	Cuenta con demarcación, señalización, (barreras, etc. Cubierta, o mal de seguridad	Cuenta con señal para evitar evitar que personas en distinta aquella o vea acceso, el aplico	La cita, comunicar a la zona del área trabajo por el terminal, y el ingreso de personas certificadas, y el trabajador actual acompañado a un experto durante de seguridad
CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE
✓ ÁREA DE ADVERTENCIA	✓ ÁREAS DE DESARROLLO	✓ BARANDAS	Otras Medidas Preventivas
Cuenta con elemento de seguridad. Ubicado en todas las áreas desprotegidas, mediante de 0.91 (Diámetro 1.20 m sobre del borde, ubicar de 1.2 m y cumplir con distancias de puntos mínimos de 1,20 m	Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistente en la superficie por donde se circula de volumen dos veces la carga máxima prevista sea posible fijarse a transitar	Cuenta con elemento estructural de 0.9 metros (Art 5, ubicado 1.2 metros, ubicar de las salpicó 0 m, distancia de barandas intermedias horizontales 45 cm entre 0, no tiene el espacio al riesgo	
CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE ✓ NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE

16. SELECCIONE LOS SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR Y ADEMÁS LOS ELEMENTOS ASPECTOS

N/A ANDAMIOS PARA TRABAJO EN ALTURA	N/A ESCALERAS	N/A ESCALAS	N/A OTROS SISTEMAS DE ACCESO
Andamios certificados, ajustados de estructura a designado por instancias e inspectores que mantienen la estructura del mismo.	Escaleras certificadas, ajustadas de estructura a designado por instancias e inspectores que mantienen la estructura del mismo	Una vez la información para acceso a puntos. Si se hace mantenimiento la colocación de los anclajes, deberá usar sistemas de protección contra caídas	
CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	
OBSERVACIONES: Tipología inspección de andamio	OBSERVACIONES: Tipología inspección de escalera	OBSERVACIONES: Tipología inspección de escalas	
N/A ESCALERAS DE TIJERA	N/A ESCALERAS PARA CAMIÓN		
Asegurar que el arriostramiento de tijeras	Asegurar anclajes certificados, que garantice la seguridad de los operarios. Los elementos serán por diámetro según especificaciones con una presión aplicada		
CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE		
OBSERVACIONES: Tipología inspección de escaleras de tijeras de personas	OBSERVACIONES: Se usa en el trabajo de manera no apropiada por cada		

Nota 1: El trabajo en personas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección y competencia de los operadores al uso como de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios o el trabajador que cuente realice para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y el cumplimiento de las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales e internacionales aplicables.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	27/01/26 Jhon Gonzalez 7:30	28/01/26 Jhon Gon 7:30	29/01/26 Jhon Gonzal 7:30	30/01/26 Jhon Gonzale 7:30	31/01/26 Jhon Gonzal 7:30	
		Victor Gonzal 7:30	Victor Gonzal 7:30	Victor Gonzal 7:30	Victor Gonzal 7:30	Victor Gonzal 7:30 am	
		Frank 7:30	Frank 7:30	Frank 7:30	Frank 7:30	Frank 7:30	

	Victor Gonzal 5:00pm	Victor Gonz 5:00pm	Victor Gonz 5:00pm	Victor Gonzal 5:00 pm	Victor Gonzal 12:00	

	Victor Gonzal Fin tarea 5:00pm	Victor Gon Fin tarea 5:00pm	Victor Gonz Fin tarea 5:00pm	Victor Gonzal Fin tarea 5:00 pm	Victor Gonzal Fin tarea 12:00	

ANEXO NO.4: INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

ELABORADO POR:

LISETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PIEDECUESTA

01 AL 31 DE ENERO

2026

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA durante la ejecución de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimientos en masa en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander, se busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 31 de enero de 2026; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

Frente de obra Halcón de Granada

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- ✓ Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- ✓ Ejecución perforación horizontal – con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- ✓ Ejecución perforación horizontal con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- ✓ Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes

Frente de obra Brisas de Primavera

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Retiro de basuras y escombros
- ✓ Perfilado a mano descolgado de talud
- ✓ Excavación en material granular a cualquier profundidad
- ✓ Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad
- ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander. Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto, son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales.							

- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de enero de 2026, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
11.0 Kg	2.7 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Piedecuesta, entidad responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
En el periodo relacionado se generaron **2.7 Kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a una empresa legalmente constituida para realizar el aprovechamiento de este tipo de residuos, promoviendo así la economía circular y reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios. Este proceso facilita la reincorporación de los materiales reciclables en la cadena productiva, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad y al cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado se generaron residuos sólidos especiales correspondiente a llantas neumáticas las cuales fueron retiradas durante las actividades de obra y fueron entregadas a la comunidad para su aprovechamiento en acciones de control de erosión. Como soporte de esta actividad,

se anexa la correspondiente acta de entrega debidamente suscrita por las partes. (Ver Anexo No 2. Acta de entrega Residuos Especiales)

Manejo de material sobrante y RCD
De acuerdo con la planificación de la obra, durante el periodo de ejecución relacionado se realizaron, actividades de desmonte y limpieza, las cuales generaron volúmenes de material sobrante no aprovechable, dicho material fue dispuesto en la escombrera El Cairo (INVERNOTA S.A.S.); la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021. (ver Anexo No 3. Certificado de Disposición Final).

Es importante mencionar, que el material sobrante generado durante las actividades de descapote de la cobertura vegetal es acopiado temporalmente en áreas previamente definidas, y debidamente delimitadas dentro del área de intervención, garantizando su manejo ambiental adecuado. Este material se destina posteriormente a labores de reconformación y estabilización de taludes, así como a procesos de recuperación y mejoramiento del suelo, promoviendo su aprovechamiento sostenible y evitando la generación de residuos. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del Plan de acción socio ambiental y a la optimización de los recursos naturales intervenidos en el desarrollo del proyecto.

Así mismo, los vehículos destinados al transporte de material sobrante son llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 742 del Ministerio del Medio Ambiente (2017).

Actividades de Capacitación:
En el periodo relacionado se realizó capacitación a los trabajadores del frente de obra en el tema "Control de Emisiones Atmosféricas" (ver Anexo No 4 Registro de Asistencia a Capacitación).



Puntos Ecológicos




Jornadas de Orden y Aseo en áreas de Campamento




Actividades de Capacitación ambiental




Retiro de material sobrante para disposición Final

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos										
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final										
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final										

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

11.0 / 11.0 *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica, los residuos se encuentran en almacenamiento temporal

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas								PASA - 02
OBJETIVO								
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.								
Tipo de medida								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
BENEFICIOS								
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera: • Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado. • Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles. • Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.								
ACCIONES A EJECUTAR								
Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2026, se realizaron las siguientes actividades: Frente de obra Halcón de Granada ✓ Replanteo, control y medición de la obra ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes ✓ Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m ✓ Ejecución perforación horizontal – con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m ✓ Ejecución perforación horizontal con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m ✓ Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes Frente de obra Brisas de Primavera ✓ Replanteo, control y medición de la obra ✓ Retiro de basuras y escombros ✓ Perfilado a mano descolgado de talud ✓ Excavación en material granular a cualquier profundidad ✓ Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m Para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas: • Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.								

- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.
- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.
- Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta que fue necesario realizar retiro de material sobrante hasta sitios de disposición final. (Ver anexo No 5 Documentos Volquetas).

RELACION DE VEHICULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
WFD 114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026
TTW 843	4308007289163000	31/10/2026	185644110	29/11/2026



Cerramiento perimetral para controlar emisiones de material particulado




Cerramiento perimetral para controlar emisiones de material particulado

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejo adecuado de material de construcción										
Mantenimiento de vehículos y maquinaria										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

2 / 2 * 100 = 100%

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

2 / 2 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador

Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. **Manejo de materiales de construcción:** El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB verificara que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños.							

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

- El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.
- El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.
- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.
- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.
- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

Teniendo en cuenta las actividades del periodo relacionado, se manejaron las siguientes cantidades de materiales pétreos:

MATERIALES	CANTIDADES USADAS
Arena	5 m3
Triturado	3 m3
Cemento	150 bultos





Almacenamiento adecuado de materiales

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Identificación y obtención de los materiales de construcción										
Transporte y disposición de materiales										
Medidas de manejo para concretos										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.

2. Aprovechamiento de material de construcción
Indicador de calificación
1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100 **8 / 8 * 100 = 100%** 2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100 **Cemento (bultos)** 150 / 150 * 100 = 100% **Arena** 5 m3 / 5 m3 * 100 = 100% **Triturado** 3 m3 / 3 m3 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía	PASA -04
OBJETIVO
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.
TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción.

La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que en caso de presentar derrames accidentales, será recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.
- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.



Suministros e instalación de anclajes activos frente de obra Halcón de Granada



Armado de anclajes frente de obra Halcón de Granada



Perforación e instalación de anclajes



Sobre acarreos de material excavado frente de obra Brisas de Primavera

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.			

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

7 / 7 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos	PASA-05

OBJETIVO

Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación

BENEFICIOS

En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo

- Prevenir la contaminación.
- Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía.
- Recircular aguas grises.
- Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos.
- Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento; dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.

- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- Inicialmente se cuenta con una unidad sanitaria portátil en el área destinada a campamento, del frente de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores. (ver anexo No 6 Mantenimientos Unidad Sanitaria)

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos





Unidad Sanitaria Portátil del frente de Obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transporte adecuado de ACPM										
Tanqueo de maquinaria con ACPM										
Aplicación del plan de contingencia										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto

Descripción del Indicador

- Indicador servicio de baños.
- Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.

Indicador de calificación

- No de US utilizadas/ No de US requeridas*100

1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe Mensual
Registro fotográfico

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							
ACCIONES A EJECUTAR							

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de enero de 2026, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa:

- Se realiza la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.
- A partir de las condiciones identificadas en el área de Influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

Actividades de Intervención Forestal

En el periodo relacionado se realizó la intervención de 2 individuos arbóreos localizados dentro del área de influencia del frente de obra Brisas de Primavera, correspondiente a las especies identificadas en el permiso de tala y aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

De acuerdo con el inventario forestal del proyecto se identificaron 2 individuos fustales donde cada uno tiene tres bifurcaciones principales, razón por la cual fueron inventariados de manera independiente.

La intervención se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el permiso otorgado, respetando las medidas de manejo ambiental definidas, con el fin de minimizar los impactos sobre el entorno y garantizar un manejo adecuado de los recursos forestales.

En el desarrollo de las actividades de tala y aprovechamiento forestal, los residuos vegetales generados fueron acopiados de manera temporal dentro del área de la obra, en sitios previamente definidos para tal fin. Este acopio se realiza de forma organizada, evitando la obstrucción de vías internas, drenajes

naturales o zonas operativas, y como medida previa a su posterior disposición, aprovechamiento o retiro por gestor autorizado, conforme a los lineamientos de manejo ambiental establecidos para el proyecto.

FRENTE DE OBRA	INDIVIDUOS Y ESPECIES ARBÓREAS APROBADAS	INDIVIDUOS INTERVENIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026
	Árboles	Árboles
Brisas de Primavera	2	2




Intervención Forestal frente de obra Brisas de Primavera




Intervención Forestal frente de obra Brisas de Primavera

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural										
Manejo de la vegetación que permanecerá										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

8 / 8 * 100 = 100%

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

17 / 18 * 100 = 95 %

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra, a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							

El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo del 01 al 31 de enero del 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades.

- Se inicia la instalación de señalización requerida en áreas de campamento y de trabajo del frente de obra
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental



Señalización SST áreas de campamento



Señalización Informativa frente de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

1 / 1 * 100 = 100%

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.	PASA-08

OBJETIVO

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo del 01 al 31 de enero de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se mantienen las áreas de campamento y almacén temporal para el frente de obra, se cuenta con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y contará con señalización informativa y preventiva.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente.

- Los residuos sólidos generados en la instalación temporal son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos convencionales" y posteriormente son entregados a al operador del servicio de aseo del municipio.



Campamento temporal frente de obra Brisas de Primavera



Campamento temporal frente de obra Halcón de Granada

ETAPA

PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Los Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalación de infraestructura temporal										
Desmantelamiento de las instalaciones temporales										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN CDMB PIEDECUESTA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100 **NO APLICA**
- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

4 / 4 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS

Código:	SST-F-96
Fecha:	27/07/202
Versión:	1

YECTO:
NSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS ICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

TIPO DE RESIDUO :

AR: Frente de obra Brisas de Primavera

ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
9/01/2026		X	1,5	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
16/01/2026		X	1,2	
23/01/2026		X	1,6	
30/01/2026		X	1,5	
TOTAL			5,8	

YECTO:
NSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS ICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

TIPO DE RESIDUO :

AR: Frente de obra Brisas de Primavera

ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
30/01/2026		X	1,5	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener u volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			1,5	

isó: Sandra Bermudez

go: Ing. Ambiental

ıa:

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS

Código:	SST-F-96
Fecha:	27/07/202
Versión:	1

)YECTO:
NSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS ICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

TIPO DE RESIDUO :

AR: Frente de obra Halcón de Granada

ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
9/01/2026		X	1,0	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
16/01/2026		X	1,5	
23/01/2026		X	1,1	
30/01/2026		X	1,6	
TOTAL			5,2	

)YECTO:
NSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS ICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

TIPO DE RESIDUO :

AR: Frente de obra Halcón de Granada

ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
30/01/2026		X	1,2	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener u volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			1,2	

isó: Sandra Bermudez

go: Ing. Ambiental

ıa:

ANEXO No 2. ACTA DE ENTREGA RESIDUOS ESPECIALES

	ACTA DE COMPROMISO F-121			
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

OBJETIVO	LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE COMPROMISO
ENTREGAR ELEMENTOS RETIRADOS DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO HALCÓN DE GRANADA EN PIEDECUESTA - SANTANDER	Sábado 31 de enero de 2026 - Barrio Halcón de Granada - Piedecuesta

El Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB realiza la entrega de llantas neumáticas usadas, previamente retiradas del talud ubicado en la zona de la obra del barrio Halcón de Granada, municipio de Piedecuesta – Santander, al señor Dorelva Rojas B. identificado con cédula de ciudadanía No. 63444237 expedida en Piedecuesta

La presente entrega se efectúa con el propósito de dar aprovechamiento a dicho material en actividades de control de erosión en otra zona ubicada en otro sector cercano, conforme a las medidas de manejo ambiental establecidas.

En total se entregan treinta (30) llantas, el día sábado treinta y uno (31) de enero de 2026, en el barrio Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta – Santander.

PARA CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVIENEN EN ESTA ACTA DE COMPROMISO

POR LA COMUNIDAD O ENTIDAD	POR EL CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA - CDMB
Firma: _____ Nombre: Dorelva Rojas Barrera C.C. No. 63444237 de Piedecuesta Número telefónico 3185173381 Dirección: Calle 1A N° 19-124 - Halcón de Granada Cargo: Presidenta Junta de Acción Comunal	Firma: _____ Nombre: JHON GONZÁLEZ RIVERA Cargo: Ingeniero Residente C.C. No. 1098760722 Número telefónico: 3103225544

	ACTA DE COMPROMISO F-121			
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 2 de 1	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16
Tel: 3115557728
Correo electrónico: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

ANEXO No 3. CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera EL CAIRO con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	
NIT	901.983.966 - 5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	315 6675536	
DIRECCION ELECTRONICA	conmitigacionptacdmb@hotmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	SECTOR HALCON DE GRANADA PIEDECUESTA	
PROYECTO GENERADOR	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 15/12/2025 al 31/12/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS EN MATERIAL GRANULAR Y ROCOSO, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	406	CUATROCIENTOS SEIS METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		406

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los CINCO días (05) días del mes de ENERO de 2026.

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	
NIT	901.983.966 - 5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	315 6675536	
DIRECCION ELECTRONICA	conmitigacionptacdmb@hotmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	SECTOR BRISAS DE PRIMAVERA	
PROYECTO GENERADOR	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS EN MATERIAL GRANULAR Y ROCOSO, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	1547	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		1547

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **CUATRO** días (04) días del mes de **FEBRERO de 2026.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

RCD
INVERNOTA

ANEXO No 4 REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACION

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Mitigación Pedregosa

TEMA DE CAPACITACIÓN Control de Emisiones Atmosféricas

LUGAR Frente de Obra FECHA 23 Enero 2026

CAPACITADOR Yaggiot Pinilla DURACIÓN 30 Min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yeiner García	7005187293	Operador	
2	Kelvin Perez	7014092	Ayudante Perforación	
3	Pedro Pablo Flores Lemus	1043560222	Jefe de Operaciones	
4	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	
5	Luis Eduardo Lafont	2000.006746	Ayudante	
6	Darlin martin olivera	1005327109	Ayudante	
7	Andres garcia	6565491	Ayudante	
8	Baudilio Rivera Gomez	1047738325	Ayudante	
9	Rodolfo Quintanez	6356621	Ayudante	
10	Mauricio Suarez P	1100890118	OP	
11	Frank Jaimes Cañas	1005060912	Almacenista	
12	Luis Alfonso Fuentes M	1098699422	Aux Dest	
13	José Ospino	1065774660	Ayudante	
14	Cornelio de Arco	9129911101	oficial	
15	Luis Alberto pineda	5.169.788	Ayudante	
16	Mauricio Olivares .S	1003[illegible]	Operador	
17	Alexander Prada Lobo	13745726	Ayudante P.	
18	Harley prada lopez	1049822951	operador P.	Harley Prada
19	JEFFERSON GONZALEZ	5823211	AYUDANTE "P"	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Yaggiot P

FIRMA

ANEXO No 5. DOCUMENTOS DE VOLQUETA

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
AÑO	MES	DÍA		DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	05	26			2025	06	01		2026	05	31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2		FOTON	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO	BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el responsable por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFQ114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PUBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD PASAJ: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 85806243
RUEDA: N
VIN: LVBDHPES3H6005030
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3H6005060
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3H6005060
RDO: N
PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900848507



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 562016000146112
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:
MOTOR:
FECHA MATRÍCULA: 26/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO:
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON
SERIAL: 141
DE: 1
FECHA IMPORT.: 10/05/2016
PUERTAS: 2

LT02003920796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PREVISORA SEGUROS

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CV/TON	MODELO
4308007269163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FOTON	PLATON

LINEA VEHICULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #545, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información señalada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6060

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDAJE: ******

POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352017000435854

DS: I

FECHA IMPORT: 18/10/2017

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA: 02/11/2018

FECHA EXP. LIC. TTO: 02/11/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA





LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

ANEXO No 6. MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

MASSI
MAS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15339

Cliente: Consorcio mitigacion

Ubicación: Hulcon de Campo: Granadas

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 13 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	7	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

cc

Nombre Operador MASSI: Firma:

cc

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15722

Cliente: Consorcio mitigacion

Ubicación: Volcan 4 Campo: granada

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 20 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____

C. C.

Nombre Operador MASSI: Andrej Firma: Sierra

C. C.

IMPRESO POR: CDAD 310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15754

Cliente: Consorcio Mitigación

Ubicación: Falcon de grarada Campo: Q Pita

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 27 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	55		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Harley Prada

CC

Firma: _____

Nombre Operador MASSI: O Rodriguez

CC

Firma: Sicarer

IMPRESO POR IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE

15772

Cliente: Consorcio Mitigación.

Ubicación: Halcon de Campo: Gaviotas

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 30 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	✓	✓

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Frank Triana-S

Firma: _____

Nombre Operador MASSI: Audrey

Firma: Sierra.

C.C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE

15544

Cliente: Consorcio Mitigacion

Ubicación: Brisas de Primavera Campo: P1/a

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 6 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: Yaineth García

C.C.

Nombre Operador MASSI: Yhadney Firma: Sierra Gh

C.C.

IMPRESO POR: IDENTICAD 310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15563

Cliente: Consorcio Mitigación

Ubicación: Brisas de Campo: Primavera

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 9 de Enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz 09/01/25 1:07pm Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Firma:

C.C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15336

Cliente: Consorcio Mitigacion.

Ubicación: Brisas de Campo: Primavera

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 13 de Enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones: _____

13/01/26 12:35

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz Firma: _____

C.C.

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

C.C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE

15595

Cliente: Consorcio Migraciones

Ubicación: Brisas de Primavera Campo: N/A

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 16 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones: _____

16/01/26

Nombre de quien Revisó: Juan Andres C.C. _____ Firma: _____

Nombre Operador MASSI: _____ C.C. _____ Firma: _____

IMPRESO POR: IDENTICAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15719

Cliente: Consorcio mitigacion

Ubicación: Brisas de Campo: Palmaceral. Plato

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 20 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Bar

C. C.

Firma:

Nombre Operador MASSI: Andrés Sierra

C. C.

Firma:

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15679

Cliente: Cons mitigacion

Ubicación: Brisas Campo: Primavera

Hora de Inicio: 11:05 Hora Final: 11:20

Fecha: 23-ENE-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz C.C.

Firma:

Nombre Operador MASSI: FREDDY C.C.

Firma:

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15751

Cliente: Consorcio Mitigacion

Ubicación: Minas de Campo: Primavera

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 27 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz C.C. _____ Firma: _____

Nombre Operador MASSI: Andres C.C. _____ Firma: _____

IMPRESO POR: IDENTICAD 310 - 30 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15769

Cliente: Consorcio mantenimiento

Ubicación: Cusiana Campo: Piedemonte 2 Norte

Hora de Inicio: : Hora Final:

Fecha: 30 de enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz

C.C.

Firma:

Nombre Operador MASSI: Andrey

C.C.

Firma:

IMPRESO POR IDENTIDAD: 310 - 30 94 724

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Enero de 2025

2.6.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	**PGS-6.1-15**

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.

ACCIONES DESARROLLADAS

Instalación de la oficina de atención a la comunidad

Se ubica y adecúa la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de obras, con volante informativo que incluye número telefónico correo electrónico, para recibir, atender y brindar, respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexo de registro fotográfico y volante informativo)

Se entrega el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al campamento ubicado en el barrio Brisas de Primavera I. (ver anexo de entrega de información de la oficina de atención a la comunidad)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos criticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias									
EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD	X	X	X	X						

RESPONSABLE DE EJECUCION		Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
Indicador:		Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100		Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100		Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.	
Periodicidad de evaluación:	Mensual	
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.	

2.6.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-16**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la obra de mitigación y control a la erosión los datos específicos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Información a la comunidad El proyecto de mitigación y control a la erosión cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico. (ver anexo de registro fotográfico y de volante informativo) La información es entregada a los actores sociales del proyecto inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse. El jueves 22 de enero se realiza reunión informativa con las comunidades de Brisas de Primavera I y Brisas de Primavera II para comunicar los ajustes realizados en el diseño de la obra, la cual incluye estabilización del talud con geo manto y amplia las áreas a intervenir, beneficiando a las comunidades de este proyecto y atendiendo la reclamación respecto a no talar los árboles que brindan sombra y frescura, cuando las inclemencias del tiempo se presentan en este conglomerado urbano. (ver anexo de registro fotográfico y acta realizada)	

Atención a la comunidad en PQRS

Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto de mitigación y control a la erosión, los interesados, pueden acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, conforme las comunidades lo requieran, en la oficina de atención a la comunidad, en el horario de lunes a viernes. (ver anexo de formato de recepción de PQRS)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de mitigación y control a la erosión
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (PERIODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X		X	X						
ACTIVIDAD 2	X		X	X						
ACTIVIDAD 3	X		X	X						

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas 1 / número de reuniones realizadas 1 * 100 = 100%	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas 20 / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales 20 * 100 = 100%	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas 22 / número de actores sociales invitados 20 * 100 = 100%	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

2.6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**

OBJETIVO DEL PROYECTO

Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar.

Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

ACCIONES DESARROLLADAS

Levantamiento de actas de vecindad

El Contratista, realiza 47 actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente se informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor.

El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad a la fecha elaboradas para la obra de mitigación y control a la erosión, para los casos de personas que no colaboran con la elaboración del documento, el Contratista realiza la actividad con un testigo.

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X	X	X							
ACTIVIDAD 2	X	X	X							
ACTIVIDAD 3	X	X	X							

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	PGS-6.4-18
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se está construyendo una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

2.6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria	PGS-6.5-19
OBJETIVO DEL PROYECTO	

Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comitè de Participación Comunitaria.
ACCIONES DESARROLLADAS
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada. Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar. En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron capacitación el jueves 15 de enero en temas de cultura vial. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X	X	X	X						

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de mitigación y control a la erosión
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales.

2.6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-20**

OBJETIVO DEL PROYECTO
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).
ACCIONES DESARROLLADAS
El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal. A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en Piedecuesta Emplea o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se postulan los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador, en caso de requerirse de estas acciones. Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron formación en temas varios de fortalecimiento del valor de la colaboración y oficina de atención a la comunidad, el jueves 15 de enero. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos criticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Piedecuesta y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X									
ACTIVIDAD 2	X									
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X						
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X						
ACTIVIDAD 5	X	X	X	X						

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del Indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en la localidad y área de influencia 10 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 14 * 100 = 71.4%	Mano de obra del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra loca 10 / registro en planillas de pago de seguridad social 10 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

2.6.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	PGS-6.7-21
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Conforme se está desarrollando una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB, este proyecto no aplica, ni tiene rubro presupuestal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos criticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

2.6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos criticos determinados por la CDMB. En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos criticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

2.6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a construir son taludes de espacio público y propiedad estatal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de	

Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra de intervención en Brisas de Primavera I – Piedecuesta, adecuada en la zona de obras



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad ubicado en la zona de obras



Volante informativo de la Oficina de atención a la comunidad en el campamento de obra de Halcón de Granada



Actividad de capacitación con los trabajadores en el campamento de Brisas de Primavera I



Capacitación en fortalecimiento de valores con los colaboradores del Consorcio Mitigación Piedecuesta



Capacitación en temas varios a los colaboradores en el campamento del barrio Halcón de Granada



Actividad de fortalecimiento de valores con los trabajadores del frente Halcón de Granada



Reunión informativa con las comunidades de Brisas de Primavera I y II

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA I DE PIEDECUESTA

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrio Brisas de Primavera I

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico: conmitigacionpiedcdmb@hotmail.com

ANEXO 3. VOLANTE INFORMATIVO A LA COMUNIDAD DEL BARRIO HALCÓN DE GRANADA PARA CONOCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN.



Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro Industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico: [illegible]

ANEXO 4. ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA REALIZADA CON LAS COMUNIDADES DE BRISAS DE PRIMAVERA I Y II RESPECTO A REDISEÑO DE LA OBRA.

	ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	OB-F-19 2/11/2021 1 1 de 5

N° DE ACTA	3

DATOS GENERALES			
LUGAR	Brisas de Primavera II - lindante a la residencia de Máryury Meza - Pte JAC - Piedecuesta	FECHA	22/01/2026
HORA DE INICIO	6:40 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	8:10 p.m.

SE ANEXA REGISTRO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	FIRMA
1				
2				
3				

AGENDA

N°	TEMA	RESPONSABLE
1	Información de la actividad a desarrollar en el barrio Brisas de Primavera I y II de Piedecuesta	Profesional del Contratista
2	Intervención en temas civiles de ajuste de diseños para la obra a desarrollar en los barrios Brisas de Primavera I y II de Piedecuesta	Ingeniero Residente del Contratista
4	Intervención de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga	Ingeniero Jesús Evelio Sánchez de la CDMB
5	Presentación de las inquietudes por parte de la comunidad de Brisas de Primavera I y II	Líderes y comunidad del barrio Brisas de Primavera I y II
6	Finalización de la reunión informativa y agradecimiento a la comunidad del sector por la asistencia	Profesional Social del Contratista

DESARROLLO DE LA AGENDA

1	El Contratista saluda a la comunidad presente, Interventoría, Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Contratista de obra, convocada para conocer los temas técnicos ajustados respecto al diseño, para la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, obra civil a efectuar el Contratista Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, en el barrio Brisas de Primavera I y II del municipio de Piedecuesta
2	La exposición técnica respecto a los ajustes autorizados desarrollar al diseño de la obra la informa el Ingeniero Residente del Contratista, comunicando generalidades del Contrato de Obra, nombre, número, valor del contrato, tiempo de ejecución, descripción del proyecto desde la localización de la obra, problemática del sector en el área de intervención, erosión y deslizamientos en sitios críticos, estabilización de taludes, cantidades de obra representativas, localización de la obra, actividades de construcción, localización y replanteo topográfico desmonte y limpieza, retiro de escombros, movimiento de tierras, excavación en roca, sobre acarreos, perfilado manual del talud, perforación horizontal, suministro e instalación de anclajes, llenado e inyección con leche cementicia, instalación de malla y geo manto para revestimiento del talud, canalización de aguas superficiales, y cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto.
3	Por parte de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, entidad contratante, el Ingeniero Jesús Evelio Sánchez informa a la comunidad de Brisas de Primavera I y II, los ajustes autorizados a desarrollar, acorde a las revisiones técnicas y geotécnicas para atender las inquietudes expuestas por la comunidad del área de influencia directa de la obra, considerando viable el desarrollo de la obra con geo manto, mitigando el impacto ambiental y evitando la tala de los árboles que la comunidad considera aportan mejor clima, aireación y sombra en el sector a intervenir.
4	La comunidad asistente en la reunión informativa manifestó complacencia y agradecimiento con los ajustes desarrolladas al contrato y diseño de la obra, conforme no afectan la arborización existente en el sector, el entono y ambiente va a mejorar con el geo manto e igualmente las áreas a construir van a ser mayores a las inicialmente expuestas, beneficiando a más viviendas del sector, en temas de estabilidad y control a la erosión.
5	Una vez agotada la actividad informativa de reunión informativa el Contratista agradece la asistencia de la comunidad del barrio Brisas de Primavera I y II, Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y profesionales encargados por parte del contratista e Interventoría.
COMPROMISOS	

1	Por parte del Contratista Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, no se efectuaron compromisos con la comunidad del barrio Brisas de Primavera I y II en la reunión informativa desarrollada, diferentes a una construcción con calidad , acorde al diseño expuesto y en los tiempos establecidos en el cronograma de obra, atendiendo las sugerencias y supervisión de la empresa Contratante e Interventoria.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







REGISTRO DE ASISTENCIA

	CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-155		
	Versión 02	Fecha de revisión: Julio de 2018	Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 215.16223.8

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA COMB

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA COMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión informativa a la comunidad de influencia directa de la obra de Construcción de obras de Mitigación y Consolidación para el control de la erosión en los barrios de Brisas de Primavera I y II	Jueves 23 de enero de 2020, 5:30 p.m., Casa de Meryury Meza, presidente de la JAC de Brisas de Primavera II en Piedecuesta

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	Brisas 2	37695[illegible]	3[illegible]	[illegible]	
2	Rosalba Alvarez	Brisas 2	37215[illegible]	31[illegible]		
3	[illegible]	Brisas 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Anail [illegible]	Brisas 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Martha Molina	Brisas 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	Brisas 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

MAYOR INFORMACION

Contratista: CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB

Centro Industrial Agrícola San Jorge Bodega 18 Tel: 3110927739

Correo electrónico: comitigacionpiedecuesta@hotmail.com



CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-111

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
8	Adriana Valentina Ayala	Bosques II	1005136481	3209445688	Adriana Ayala	
9	Jorge Ardila	Cristal Alto	1.095.801.138	3138960411		
10	Hector Arnoldo R.	N-3338 CDMB	91238865	3172602004		
11	Diana Milena Arias	Interventoria	1098127987	3007534410		
12	Jesus Emilio Sanchez	CDMB	1053316815	3204470198		
13	Guillermo Alfredo Rivera	Interventoria	1098108693	3103108693		
14	Miguel Ayala	Bosques II	91351	3142021419		
15	Jaime Rueda	Provivienda II	9134105	3165		
16	Fernando Perez	Bucaramanga	91347868	3135960828		
17	Eduardo Ayala	Bosques II	1098788681	3045119761		
18	Oneiber Valderrama	MOS/CDMB	91232446	3152 CDM		
19	Edwin Carvajal Rivera	Contratista	1098760182	3132824826		
20	Wilson Alexis Ortiz Tapia	Cuadrilla	91238912	3007203447		
21	Oscar Rueda	Contratista	91385724	3142000210		
22	Diego Andres Rueda R.	Contratista 2	1098 3447	3142 3412		
23						

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
Centro Industrial Agustino San Jorge Bodega 16 Tel: 6708728
Correo electrónico: mitigacionpiedecuesta@hotmail.com

ANEXO 5. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN– PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	HARLEY PRADA LÓPEZ	1098822751	23/06/1999	Bucaramanga - Santander	Vereda Granadillo - Piedecuesta	3187720633	Ayudante de obra
2	ALEXANDER PRADA LÓPEZ	13745736	13/01/1980	Bucaramanga - Santander	Vereda Granadillo - Piedecuesta	3202778747	Ayudante de obra
3	LUIS ALBERTO PRADA RINCÓN	5691822	23/02/1968	Molagavita - Santander	Brisas de Primavera I - Piedecuesta	3008327899	Ayudante de obra
4	ANDRÉS GARCÍA FARÍAS	6565491	27/07/1986	Farinas - Venezuela	Villas de Andalucía	3042807099	Ayudante de obra
5	JOSÉ OSPINO	105.071.906	7/07/1999	Magangué - Bolívar	Vereda El Granadillo - Piedecuesta	3209902704	Ayudante de obra
6	JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA	5.823.211	24/01/1979	Maracay - Venezuela	Brisas de Primavera I	3112802947	Ayudante de obra
7	KELVIN NICOL PÁEZ BUITRAGO	7.014.092	23/11/1997	Caracas - Venezuela	Brisas de Primavera I	3209898603	Ayudante de obra
8	DIEGO ANDRÉS FLÓREZ RINCÓN	1.063.560.222	22/05/2002	La Gloria - Cesar	Brisas de Primavera I	3226918975	Ayudante de obra
9	RODOLFO JESÚS QUIÑONES GUTIÉRREZ	6.366.521	4/02/1987	Guanare - Venezuela	Barrio Villa Andalucía	3245517143	Ayudante de obra
10	FRANK JAN PIER JAIMES CAÑAS	1.005.060.412	5/01/2002	Pamplona - Norte de Santander	Barrio Villas de San Juan	3164184403	Almacenista

ANEXO 6. CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES DE LA OBRA EN TEMAS VARIOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, CULTURA VIAL Y FORTALECIMIENTO DE VALORES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 210 16223-8 - CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA COMB - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA COMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Mitigación Piedecuesta COMB		FECHA:	16/01/2023
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Andres Diaz	1095807634	Almacenista	
2	Yeiner Garcia	1005162293	Operador Perf.	
3	Luis Alberto pinto	5.607.822	Ayudante	
4	Andres Ospina	6565991	Ayudante	
5	Luis Alberto pinto	3.607.822	Ayudante	
6	Comercializadora	91291101	Oficial	
7	Marcelo Villamiza	1005144832	operad	
8	Jose Ospino	[illegible]	Ayudante	
9	Alejandro Bohorquez	13745736	Ayudante	
10	Hadey Prada Lopez	1098827331	operador perf.	
11	Luis A Tarazona	1098169462	Ayud Perf	
12	Andres Jaimes Cano	1005260412	Almacenista	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
FIRMA

ANEXO 7. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS BRISAS DE PRIMAVERA I, BRISAS DE PRIMAVERA II, HALCÓN DE GRANADA Y GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

BARRIO	NÚMERO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO REALIZADAS	PORCENTAJE
Brisas de Primavera I	28	60%
Brisas de Primavera II	5	10%
Halcón de Granada	8	17%
Granadillo	6	13%
TOTAL	**47**	**100%**

BRISAS DE PRIMAVERA I

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ADOLFO TORRES ROPERO	Manzana C Casa 3	Brisas de Primavera I	13.480.725	3156694907
2	CAMILO RÍOS ARNACHE	Manzana C Casa 10	Brisas de Primavera I	1.065.874.471	3105966785
3	CHERRYS POLANCO MEDINA	Manzana B Casa 2	Brisas de Primavera I	15.950.322	3209997334
4	CRISANTO MARTÍNEZ	Manzana B Casa 5	Brisas de Primavera I	5.670.293	3203330392
5	DIANA ROCÍO LAGOS	Manzana B Casa 3	Brisas de Primavera I	63.341.445	3016893592
6	FAUSTINO JIMÉNEZ	Manzana C Casa 11	Brisas de Primavera I	5.422.805	3212597205
7	JAIME TORRES PRIETO	Manzana B Casa 7	Brisas de Primavera I	19.284.692	3152487337
8	JAN CARLOS GRIMALDO MENA	MANZANA A CASA 12	Brisas de Primavera I	1.102.384.103	3182844206
9	JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	Manzana D Casa 3	Brisas de Primavera I	78.714.853	3185182952 - 3144085822
10	JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA	Manzana A Casa 10 piso 1	Brisas de Primavera I	5.823.211	3112802947
11	KELLY LEÓN DÍAZ	Manzana D Casa 1	Brisas de Primavera I	28.259.440	3028421645
12	LEIDY SERRANO RUGELES	Manzana A Casa 13	Brisas de Primavera I	28.078.590	3102096505
13	LILIANA GARNICA ROJAS	Manzana A Casa 9	Brisas de Primavera I	37.725.956	3025981705

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
14	LUIS EDUARDO GÉLEVEZ TARAZONA	Manzana A Casa 11 Taller	Brisas de Primavera I	1.097.303.276	3205890997
15	MARÍA CARREÑO ROJAS	Manzana A Casa 8-201 y 301	Brisas de Primavera I	37.542.792	3204753055
16	MARÍA FERNANDA DÍAZ NIÑO	Manzana D Casa 2	Brisas de Primavera I	1.102.386.883	3112239900
17	MARINA DÍAZ FUENTE	Manzana A Casa 8 piso 101	Brisas de Primavera I	37.796.087	3178621074
18	MARTHA BUITRAGO REYES	Manzana C Casa 9	Brisas de Primavera I	63.336.981	3167559614
19	MERCEDES MONCADA GÉLVEZ	Manzana B Casa 6	Brisas de Primavera I	1.097.303.966	3152841112
20	YENNY CABALLERO FLÓREZ	MANZANA B Casa 9	Brisas de Primavera I	1.116.792.286	3202180004
21	YOLANDA PABÓN REY	MANZANA A CASA 14	Brisas de Primavera I	28.162.431	3103020181
22	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	MANZANA B Casa 4	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
23	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana B Casa 8	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
24	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana C Casa 1	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
25	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana C Casa 2	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
26	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana D Casa 2	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
27	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	MANZANA B Casa 1	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
28	ANAHIL JIMÉNEZ	Vías y entorno	Brisas de Primavera I	37.753.450	3115562986

BRISAS DE PRIMAVER II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	BLANCA BENAVIDES PERILLA	Calle 15 C No. 0 - 58	Brisas de Primavera II	63.480.359	3116607711
2	MARÍA LEONOR VARGAS	Calle 15 B No. 0 - 58	Brisas de Primavera II	63.475.291	3132583994
3	MYRIAM ALMEIDA VILLAMIZAR	Calle 15 D No. 0 - 63	Brisas de Primavera II	63.303.495	3172470230
4	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Calle 15 C No. 0 - 57	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522
5	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Calle 15 B No. 0 - 63	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522

HALCÓN DE GRANADA

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	LIZETH CÁRDENAS CADENA	Calle 1 NA No. 19 – 120 APTO 101	Halcón de Granada	1.102.359411	3043493916
2	JAIME ANGARITA MAYA	Calle 1 NA No. 19 – 118 Piso 3	Halcón de Granada	5.670.471	3023964385
3	LEIDY KATHERINE RUGELES GONZÁLEZ	Calle 1 NA No. 19 – 114 Piso 1	Halcón de Granada	1.095.804.944	315669.3515
4	JENNIFER GARCÍA CORZO	Calle 1 NA No. 19 – 108 PISO 1	Halcón de Granada	1.102.714.486	3007599442
5	GLADYS FERREIRA ESTÉVEZ	Calle 1 NA No. 19 – 100 Piso 2	Halcón de Granada	63.356.193	3123428238
6	HUGO ANDRÉS PÉREZ CABALLERO	Calle 1 NA No. 19 – 96 PISO 1	Halcón de Granada	1.102.366.785	3022824765
7	VIVIANA OVIEDO RIAÑO	Calle 1 NA No. 19 – 126 - 128	Halcón de Granada	37.618.699	3243445819
8	DORELBA ROJAS B.	Áreas de entorno, fachadas, andenes y vías	Halcón de Granada y San Carlos	63.444.237	3185173381

GRANADILLO

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	EDINSON FABIÁN LUNA MANTILLA	Carrera 20 A No. 1N - 47	Granadillo	1.102.365.817	3194124965
2	JOHAN SEBASTIÁN NIÑO RAMÍREZ	Carrera 20 A No. 1N - 41	Granadillo	1.102.348.605	3157435741
3	CIRO ALFONSO MONTAÑEZ LEÓN	Carrera 20 A No. 1N - 37	Granadillo	5.630.410	3178724846
4	DIANA YOLIMA BRICEÑO RINCÓN	Carrera 20 A No. 1N - 31	Granadillo	37.620.775	3043249688
5	PAOLA ANDREA SILVA RÍOS	Carrera 20 A No. 1N - 25	Granadillo	1.102.365.934	3185269906
6	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Carrera 20 A No. 1N - 19	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO
(BRISAS DE PRIMAVERA I Y II)

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	27 / 10 / 2025
CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: BLANCA BENAVIDES PERILLA

Tenencia: Propietario: X Arrendatario: Familiar: Otro:

Nombre del Propietario: BLANCA BENAVIDES PERILLA

Cédula de ciudadanía: 63480359

Dirección: Lote AP CF 0.58

Teléfono: 3116607711 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin conexión antihumedad,
2. Alcantarillado	X		Ley 400 97 sin juicio vecindad
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	pedanal sin andenes y vías de-
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet tapadas

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cubiertos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Son columnas anclajes - CSS

MUROS: Con deterioro y despañe

CUBIERTA: Con desprotes y deterioro

PISOS: Con fisuras y desprendo

FACHADA: Con fisuras y deterioros

GRIETAS Y FISURAS: Con pisos y muros

HUMEDADES: Si se ubican en muros

HUNDIMIENTO PISO: No se visualiza

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Filtración y oxidación en todo de anclaje y cabezales

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO	INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
Blanca Benavides		
NOMBRE: BLANCA BENAVIDES	NOMBRE: JHÓN GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE: ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.: 63480359	C.C. No.: 1.098.760.722	C.C. No.: 1.091.665.386


ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Viviendas sin condiciones ambientales, ley Ano/ 97 con desperdicios y alrededores en zona de andén y calzada, en predios colindantes

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.

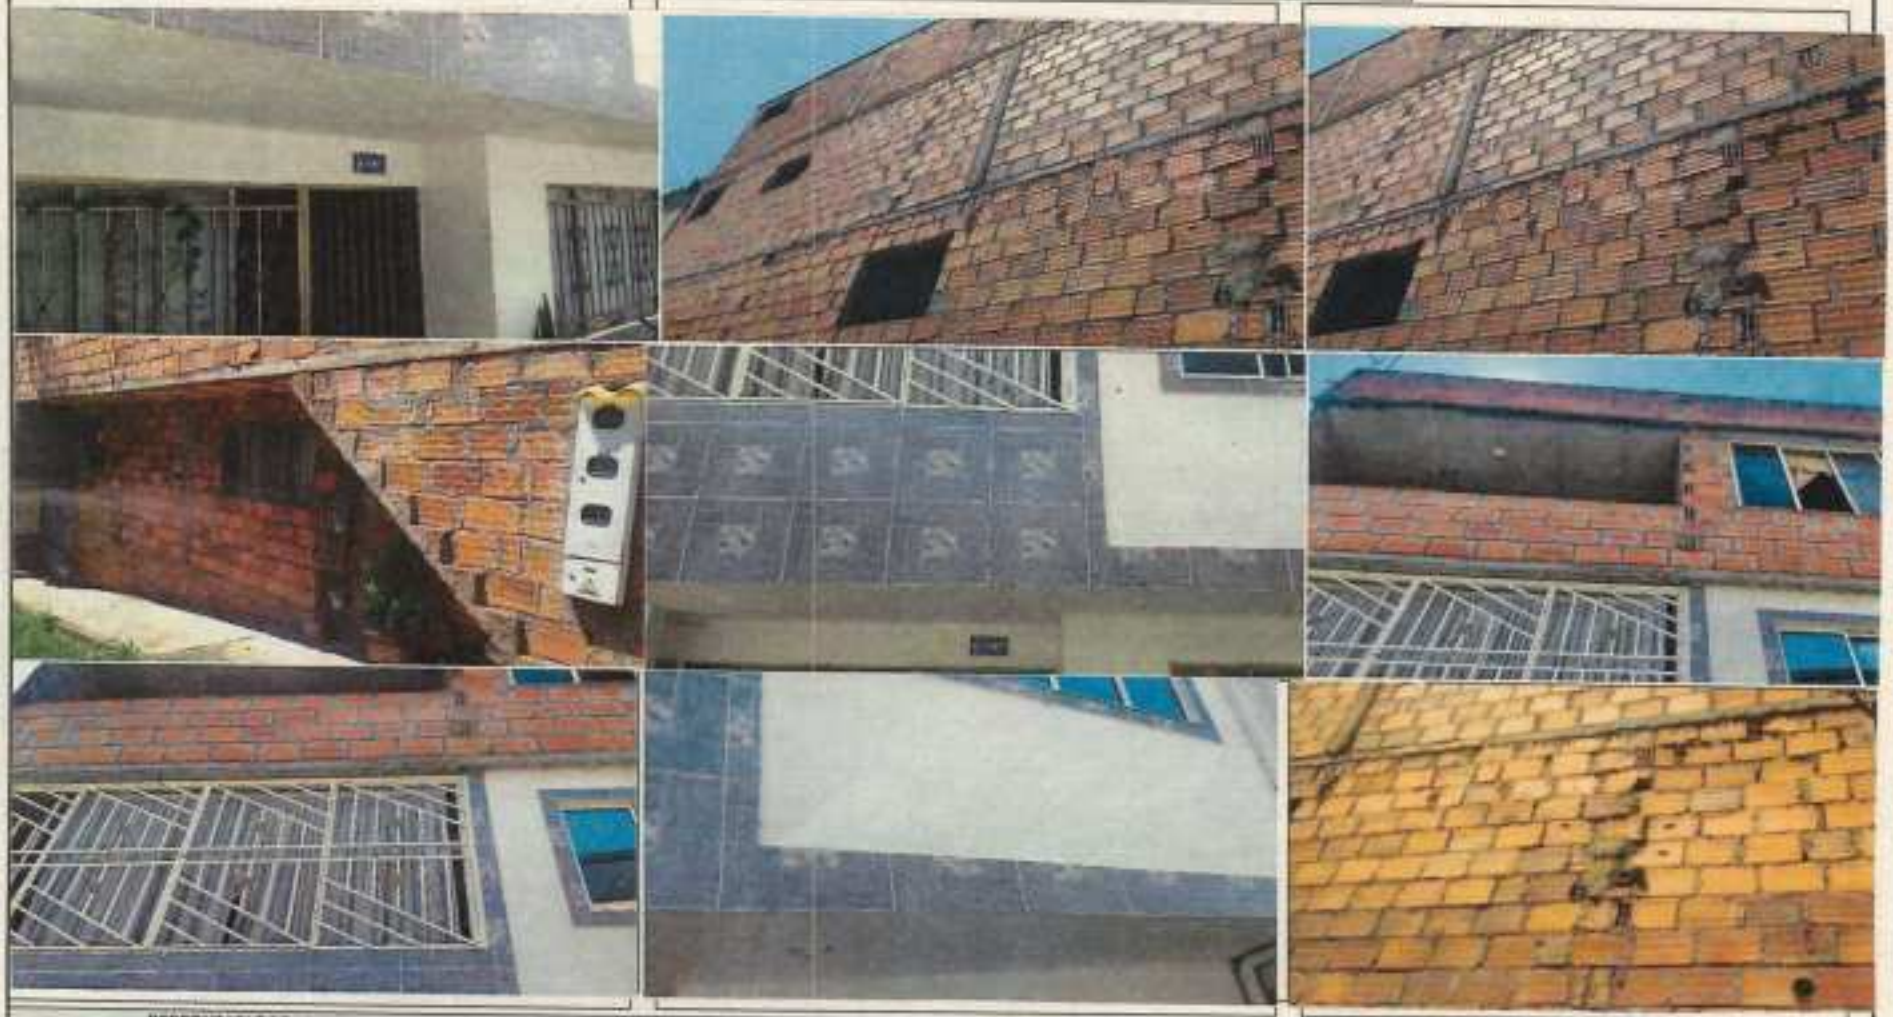

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	MARIA LEONOR VARGAS	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	63471491	C.C.	1.006.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MARIA LEONOR VARGAS

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: MARIA LEONOR VARGAS

Cédula de ciudadanía: 63425291

Dirección: CLL 15 B # 0-52

Teléfono: 3131572994 Celular: ___ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones intrinsecas
2. Alcantarillado		X	en deterioro y dispuesta en tierra
3. Energía	X		de anden y calzada
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin estrenar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "8. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones dignas

MUROS: Con fisuras y deterioro

CUBIERTA: Con deterioro y defectuosas

PISOS: Con fisuras y deterioro

FACHADA: Con fisuras y deterioro

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En viviendas en cubierta y muros

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Electrico y deterioro en zona de anden y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MARIA LEONOR VARGAS	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	63425291	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OD-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones ambientales, ley 400/97, con deterioro y daños en zona de andenes, vía de acceso en carretera destapada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
Blanca Benavides					
NOMBRE	BLANCA BENAVIDES PEÑALOZA	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	63 480 359	C.C.	1.099.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.389

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	27 / 10 / 2025
CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MYRIAM ALVIRA VILLAMIZAR

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: MYRIAM ALVIRA VILLAMIZAR

Cédula de ciudadanía: 63303495

Dirección: CLL 15 D # 0-63

Teléfono: 3172470280 Celular: ___ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Vivienda sin condiciones antihumicas,
2. Alcantarillado	X	☐	con deficiencias y fuertes en todo
3. Energía	X	☐	su anden y calzada
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet - comunales

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antihumicas

MUROS: Con afectaciones y deficiencias

CUBIERTA: Con deficiencias y deterioro

PISOS: Con fisuras y afectaciones

FACHADA: Con deficiencias y afectaciones

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: Se detallan en muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se visualiza

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deficiencias y deterioro en zona de calzada y anden

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MYRIAM ALVIRA V.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	63303495	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 / 1997 en proceso construcción con deficiencias y desplomes en zona de andén y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	MYRIAM ALEIDA VILLAMIZAR	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	63.293.495	C.C.	1.096.790.722	C.C. o NIT	1.091.905.388

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 91265828

Dirección: Calle 15 B No. 9 - 57

Teléfono: 3172113622 Celular: No de pisos: 4

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antitérmicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con anденes y calzada con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	[illegible]
4. Teléfonos	☐	☐	[illegible]
5. Gas	☐	☐	[illegible]
6. Televisión cable	☐	☐	[illegible]
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA: Con humedad, deterioros y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes y zona de anденes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quintero
C.C., No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1041663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y desgastes en zona de andenes, calzada y fachada

Despues de varias visitas al inmueble no se pudo contactar al propietario o morador, se realiza el acta de vecindad de inicio con un testigo

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	Andres Quintero
C.C.	91265828	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1071 563 366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	27 / 10 / 2025

CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 91265828

Dirección: Calle 15 B No. 0 - 63

Teléfono: 3172113522 Celular: No de pisos: 1

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997

Con áreas de andenes y calzada con deterioro y averías

Se realiza el acta de vecindad sin tener ningún tipo de queja por parte del propietario o vecindario del inmueble

Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cubiertos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA Con humedad, deterioros y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes y zona de andenes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que la diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1004663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y desgastes en zona de andenes, calzada y fachada

Dupvii de varias visitas al inmueble no se pudo contactar al propietario o residente del inmueble, por tanto, se realiza el acta de vecindad con un tercero

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Aguinaga
C.C.	91265828	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1094263586

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: ADOLFO TORRES ROPERO

Tenencia: Propietario: X Arrendatario: Familiar: Otro:

Nombre del Propietario: ADOLFO TORRES ROPERO

Cédula de ciudadanía: 13.480.725

Dirección: MANZANA C CASA 3

Teléfono: 3156699907 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		viviendas sin conexiones intradomiciliarias
2. Alcantarillado	X		en pisos de contrapiso
3. Energía	X		con retiros y ausencia
4. Teléfonos		X	de andén y calzada
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: viviendas sin conexiones antidomiciliarias

MUROS: con fisuras y dispuestas

CUBIERTA: con deterioro y daños

PISOS: con fisuras y dispuestas

FACHADA: con fisuras y dispuestas

GRIETAS Y FISURAS: en piso y muros

HUMEDADES: se distinguen en muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: no se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: no se observan

OTRO: X Cuál? capilla y deterioro en zona de andén y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	ADOLFO TORRES R.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	13.480.725	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.566

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 3	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400/97 con deterioros y ausencia en zona de andén y calzada, en predio constructivo

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	ADOLFO TORRES ROMERO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA CLENTERO ORTIZ
C.C.	13.820.734	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: CAMILO ROS MARANGUIS

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1065874421

Dirección: MANZANA C CASA 10

Teléfono: 3102966733 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Vivienda sin condiciones sanitarias
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	Luz A101, 97 fb conectada
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	Con basuras y escombros en sanitario y cocina
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	☐	X	Cuál? Tanque

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐				URBANO ☑
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	X	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información):

ESTRUCTURA: Sin condiciones sanitarias

MUROS: Con deterioro alrededor

CUBIERTA: Con deterioro alrededor

PISOS: Con humedad y deterioro

FACHADA: Con humedad, deterioro

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros, cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se observa

DESPLAZAMIENTOS: No se observa

OTRO: X Cuál? Deterioro alrededor en pisos y escombros

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
Camilo Arrocho					
NOMBRE	Camilo Ros Marangunis	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	1065874421	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.368

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones ambientales ley 400/97 con deficiencia severa y daños en área de andén y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Camilo Hernandez	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1015[illegible]	C.C.	1.098.760.733	C.C. o NIT	1.091.665.998

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: CHERLIS POLANCO MEDINA

Tenencia: Propietario: ____ Arrendatario: X Familiar: ____ Otro: ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1.15950322

Dirección: MANZANA B CASA 2 - 101

Teléfono: 320 9997334 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

		NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Vivienda en condiciones satisfactorias (en
2. Alcantarillado	X	☐	todos los servicios y estructura
3. Energía	X	☐	en zona de ladera y estable
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones satisfactorias.

MUROS: Con deterioro y desplomo

CUBIERTA: Con desplomo y deterioro

PISOS: Con fisuras y desplomo

FACHADA: Con fisuras y deterioro

GRIETAS Y FISURAS: Con fisuras y humedad

HUMEDADES: Si humedad en muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se observa

DESPLAZAMIENTOS: No se observa

OTRO: X Cuál? Deterioro y desplomo en zona de ladera

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	CHERLIS POLANCO M.	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	1.15950.322	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.685.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Viviendo sin condiciones artículo 31. ley 400/97 son daños y deterioro en andén y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CATERINE PALACIO MOSQUERA	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KATRINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1.5950.322	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	GB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: CRISANTO MARTINEZ

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: CRISANTO MARTINEZ

Cédula de ciudadanía: 1.670293

Dirección: MANZANA A CASA 1

Teléfono: 3203170342 Celular: ___ No de pisos: 1

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda en condiciones aceptables,
2. Alcantarillado	X		las aguas se devuelven y
3. Energía	X		avanzan en toda la anden y
4. Teléfonos	X		calzada
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cuál? ___

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál? ___	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viviendas en condiciones aceptables

MUROS: con fisuras y desplomes

CUBIERTA: con deterioro y deterioro

PISOS: tes con fisuras y desplomes

FACHADA: con deterioro y desplomes

GRIETAS Y FISURAS: en pisos y muros

HUMEDADES: se detallan en muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: no se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: no se observan

OTRO: Y Cuál? deterioro y desplomes en toda la anden, calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO	INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
Crisanto Martinez		
NOMBRE: CRISANTO MARTINEZ	NOMBRE: JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE: ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.: 1.670293	C.C. No.: 1.098.780.722	C.C. No.: 1.001.606.206

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Viviendas sin condiciones habitacionales, ley 820/97 con deficiencias y invasión en zona de andenes y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CRISANTO MARTINEZ	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1.140.293	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.390

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	DB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Diana Rocio Lagos

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: 1

Cédula de ciudadanía: 63341445

Dirección: Urbanizacion A casa 3

Teléfono: 3016893593 Celular: ____ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Viviendas sin conexiones domiciliarias,
2. Alcantarillado	☐	☐	las redes son subterraneas y
3. Energía	☐	☐	disponibles en antenas y cajas de
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐			URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin conexiones domiciliarias

MUROS: Sin fisuras, grietas, deterioros

CUBIERTA: Sin goteras, deterioro

PISOS: Sin fisuras, deterioros disponibles

FACHADA: Con deterioros disponibles

GRIETAS Y FISURAS: En pisos, muros y vigas

HUMEDADES: En pisos, muros y vigas

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se visualizan

OTRO: X Cuál? Daños y deterioros en losas de andén y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIANA ROCIO LAGOS	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	63341445	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.098.665.386


ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones sanitarias, las a-001 97, con deficiencia y ausencia en cubierta interior y exterior en general de la vivienda

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.

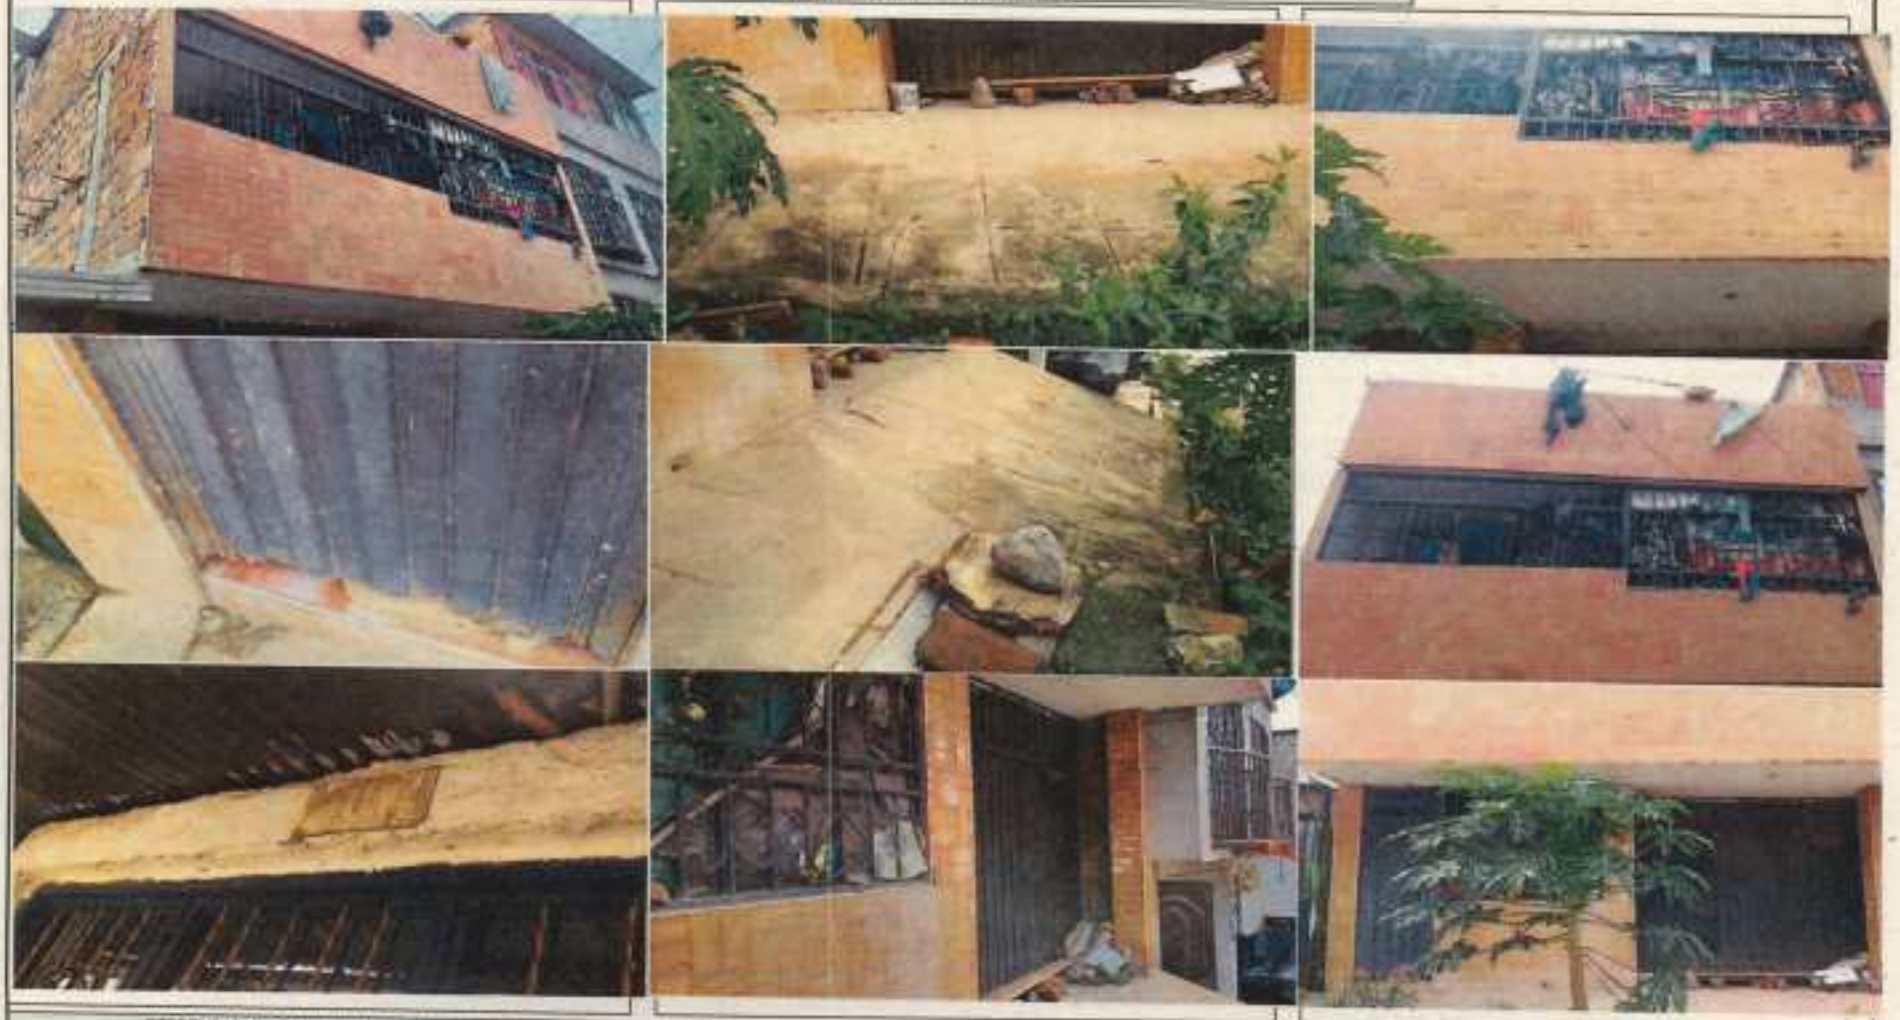

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIANA ROJAS VARGAS	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	63.344.945	C.C.	1.098.783.722	C.C. o NIT	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: FAUSTINO JIMENEZ

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 5.423.805

Dirección: MANZANA C CASA A1

Teléfono: 3123597205 Celular: No de pisos: 3 y patio

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones sanitarias
2. Alcantarillado	X		Tiene pozo septico deteriorado y
3. Energía	X		averiado en cocina y caseta
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje - SI X NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones sanitarias

MUROS: Con humedad, deterioro, grietas, fisuras, desplazamiento

CUBIERTA: Con deterioro, averiada y desplazada

PISOS: Con fisuras, deterioro y desplazados

FACHADA: Con fisuras, deterioro y desplazados

GRIETAS Y FISURAS: En piso inverso

HUMEDADES: En muros, cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se observa

OTRO: X Cuál? Desplazado, deteriorado y averiado en cocina y caseta

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	FAUSTINO JIMENEZ	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	5.423.805	C.C. No.	1.098.760.732	C.C. No.	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400/97. con fisuras en zocalo de anden y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
Faustino Jiménez					
NOMBRE	Faustino Jiménez	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	5.422.805	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.097.666.368

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: JAIME TORRES PUETO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: JAIME TORRES PUETO

Cédula de ciudadanía: 19284492

Dirección: MANZANA B CASA 7

Teléfono: 3152487337 Celular: ___ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera T

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Vivienda sin condiciones sanitarias,
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	en proceso construcción
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet. (2M3127

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia daños visibles

MUROS: No se evidencia daños

CUBIERTA: No se evidencia daños visibles

PISOS: Sin daños

FACHADA: Sin evidencia

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia

HUMEDADES: Se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

OTRO: X Cuál? Daños y evidencia en base de casa

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JAIME TORRES P.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	19284492	C.C. No.	1.098.750.722	C.C. No.	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en proceso construcción según 12 Lem 400/97. Sin condiciones existentes - básicas con daños y averías en toma de calzada

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO












RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JAIME TORRES PRETO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA CONTRERO ORTIZ
C.C.	19284492	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: JAN CARLOS GRIMALDO MENA

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1152238103

Dirección: MANZANA A CASA 12 Cpro 65

Teléfono: 3182844206 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda en condiciones iniciales,
2. Alcantarillado	X		con goteras, en diferentes
3. Energía	X		partes en toda la cubierta
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐		URBANO X	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Con condiciones iniciales

MUROS: Con deflexiones y fisuras

CUBIERTA: Con daños y deterioro visibles

PISOS: Con fisuras y daños

FACHADA: Con deflexiones y fisuras

GRIETAS Y FISURAS: Con pisos y muros

HUMEDADES: Se visualizan en muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se observan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Daños en cubierta y andenes

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JAN CARLOS GRIMALDO MENA	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	1152238103	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/03/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 3	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Vivienda sin condiciones antihumanas, ley 400/97, con deterioro y despintes en andenes y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.





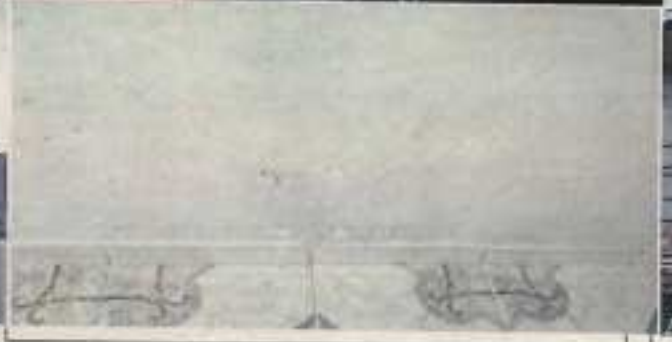


RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Jhon Carlos Giraldo Hoyos	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1.102.338.103	C.C.	1.096.793.722	C.C. o NIT	1.091.665.385

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.18223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.18227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: JAVIER MAURICIO HOYOS

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: JAVIER MAURICIO HERNANDEZ

Cédula de ciudadanía: 78[illegible]3

Dirección: MANZANA D CASA 3

Teléfono: 3185182252 Celular: 3144081822 No de pisos: 2 y LOFANO

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		VIVIENDA SIN CONDICIONES SANITARIAS
2. Alcantarillado	X		CON ANTIOJOS Y ZAPATOS EN
3. Energía	X		MANO DE ARENA Y CALZADA
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	X	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? TALLER	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO X

Cuantos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: SIN CONDICIONES SANITARIAS

MUROS: CON HUMEDADES Y GRIETAS

CUBIERTA: CON GOTERAS Y DAÑOS

PISOS: CON FISURAS Y DESPLAZ.

FACHADA: CON FISURAS Y DESPLAZ.

GRIETAS Y FISURAS: EN PISOS Y MUROS

HUMEDADES: SE OBSERVAN EN MUROS Y CUBIERTA

HUNDIMIENTO PISO: NO SE NOTA

DESPLAZAMIENTOS: NO SE VISUALIZA

OTRO: X Cuál? ANTIOJOS Y ZAPATOS EN MAL ESTADO Y CALZADA

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO	INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: JAVIER MAURICIO	NOMBRE: JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE: ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No. 78[illegible]3	C.C. No. 1.098.760.722	C.C. No. 1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400/97. con averías y deterioro en zona de andén y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.




RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JANISTE MARTINEZ HIDA	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	28.714.803	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

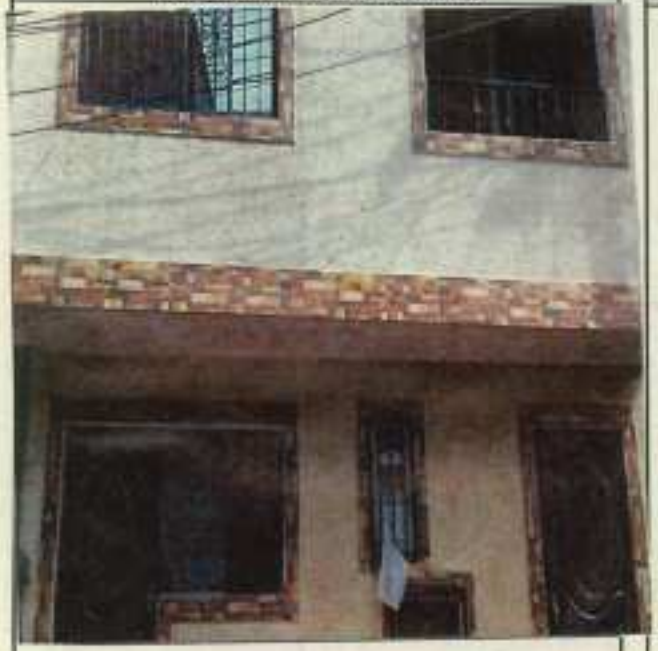

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jeferson Gonzalez Ortega

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 5823211

Dirección: Manzana 5 casa 10 Piso 1

Teléfono: 3112896482 Celular: No de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Vivienda sin condiciones adecuadas
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	Ley 142/94 con calidad ilm
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	vía destapada
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "8. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin deflexiones aparentes

MUROS: Con deflectores y despegues

CUBIERTA: Con despegues y deterioro

PISOS: Con fisuras y deterioro

FACHADA: Con fisuras y despegues

GRIETAS Y FISURAS: En muros y pisos

HUMEDADES: No se detallan

HUNDIMIENTO PISO: No se observan

DESPLAZAMIENTOS: No se visualizan

OTRO: X Cuál? Deflectores y despegues en zona de andenes y calzada con calzada destapada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JEFERSON GONZALEZ	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	5823211	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	DB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas. ley 400 / 97. sin caltada en vía destapada. con deterioro y desprotección y andenes

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	[illegible]	C.C.	1.066.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.8	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: KELLY LEON DIAZ

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: ____

Cédula de ciudadanía: 28219440

Dirección: MANZANA D CASA 1

Teléfono: 3022842164 Celular: ____ No de pisos: 2 y PISCO

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	VIVIENDA SIN CONDICIONES ADICIONALES
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	CON DATOVIAS Y SUELTAS EN
4. Teléfonos	☐	X	ZUDIN Y CALZADA
5. Gas	☐	X	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	X	☐	Cuál? INTERNET - CAMARAS

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐			URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	X	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Otro PANADERIA	☐	Y
4. Institucional	☐	Cuál? SALÓN MÚLTIPLES		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: SIN CONDICIONES ADICIONALES

MUROS: CON AGRIETAMIENTOS

CUBIERTA: CON DATOVIAS Y DESPRENDIMIENTOS

PISOS: CON FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS

FACHADA: CON FISURAS Y DATOVIAS

GRIETAS Y FISURAS: EN PISO Y MUROS

HUMEDADES: EN LA CANCHA EN MUROS Y CUBIERTA

HUNDIMIENTO PISO: NO SE EVIDENCIAN

DESPLAZAMIENTOS: NO SE OBSERVAN

OTRO: Y Cuál? AVISOS Y DATOVIAS EN TODA LA ZONA Y CALZADA

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	KELLY LEON DIAZ	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	28219440	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.903.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 3	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antihumicas, las A20/1957, con diferentes averias en zona de calzada y anden

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	KELLY LEON DIAZ	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1.098.219440	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.098.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: LEIDY JOHANA SUAREZ

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 2307[illegible]

Dirección: MANZANA A CASA 13 P.5 A

Teléfono: 3102096[illegible] Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Viviendas sin conexiones definitivas
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		Con medidor
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		Gas domiciliario en la cocina
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? [illegible]

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin conexiones definitivas

MUROS: Con [illegible]

CUBIERTA: Con deterioro

PISOS: Con deterioro

FACHADA: Con [illegible]

GRIETAS Y FISURAS: En [illegible]

HUMEDADES: No [illegible] en [illegible]

HUNDIMIENTO PISO: No [illegible]

DESPLAZAMIENTOS: No [illegible]

OTRO: X Cuál? Pisos y [illegible] con cerámica deteriorados, paredes en bahareque

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
Leidy Serrano					
NOMBRE	LEIDY JOHANA SUAREZ P	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	2307[illegible]90	C.C. No.	1.099.760.722	C.C. No.	1.091.665.396

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	DB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400/97
con acceso vehicular en contrapiso de 12 cm de

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
· Leidy Serrano					
NOMBRE	Leidy Serrano Rueles	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	23028390	C.C.	1.098.780.722	C.C. o NIT	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	27 / 10 / 2025
CONTRATO DE OBRA No.	210.18223.8
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	210.18227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: LILIANA GARNICA ROJAS
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario: ____
Cédula de ciudadanía: 37725946
Dirección: MANZANA A CASA 5
Teléfono: 3025781701 Celular: ____ No de pisos: 3
Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera X

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin conexion actualmente
2. Alcantarillado	X		Ley 9097 1997 con calzada sin
3. Energía	X		via destapada la calle
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: sin conexion actualmente
MUROS: con afectaciones
CUBIERTA: con deterioro
PISOS: con fisuras
FACHADA: con afectacion y deterioro

GRIETAS Y FISURAS: en pisos y muros
HUMEDADES: en zona de patio
HUNDIMIENTO PISO: no se observa
DESPLAZAMIENTOS: no se visualizan
OTRO: X Cuál? vivienda en deterioro en todo su ancho, sin uso de servicios encontrada antepasada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO	INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: LILIANA GARNICA R	NOMBRE: JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE: ANDREA KARINA CUANTERO ORTIZ
C.C. No.: 37725946	C.C. No.: 1.098.760.722	C.C. No.: 1.091.662.395

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en condiciones aceptables, 1 cuarto adicional en construcción de ladrillo pañete

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	37.735.956	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.388

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: LUIS EDUARDO GELVES TARAZONA

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: LUIS EDUARDO GELVES TARAZONA

Cédula de ciudadanía: 1097393376

Dirección: TRANSVERSAL A CASA 11

Teléfono: 3015290997 Celular: ___ No de pisos: 1

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	CAFE ABDELIATED como TARIFA
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☐	☑	Sin piso, con detector y depósito
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	Sin normalización (Ley 404/97)
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☑	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? TALLER	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones óptimas para una vivienda

MUROS: Con deficiencias para tallar. Sin pañetes

CUBIERTA: Con deficiencias para tallar en teja y duela

PISOS: Con deficiencias en tierra

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: En pisos, muros

HUMEDADES: No hay humedades, filtraciones

HUNDIMIENTO PISO: No hay asentamientos

DESPLAZAMIENTOS: No hay desplazamientos

OTRO: X Cuál? Pocas deficiencias en vivienda para tallar en teja y sin muros

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
· Luis Eduardo Gelves					
NOMBRE	Luis Eduardo Gelves T	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	1097393376	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.936

Luis Eduardo Gelves

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones sanitarias. Ley 400/97, sin adecuaciones. pz/s funcionalidad de tallu sus muros, y sus pisos

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
Luis Eduardo Galves					
NOMBRE	Luis Eduardo Galvez T.	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1.097.203.376	C.C.	1.086.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.566

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16225.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MARIA CARREÑO ROJAS

Tenencia: Propietario X Arrendataria ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: MARIA CARREÑO ROJAS

Cédula de ciudadanía: 37542792

Dirección: MANZANA A CASA 8 - 291

Teléfono: 3204713005 Celular: ___ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Viviendas sin condiciones ambientales.
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	Ley A 001 1991
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	☐	X	Con suero a la vivienda en via, doble pozo
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	X	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones ambientales

MUROS: Con deposito y fisuras

CUBIERTA: Con deterioros y deposito en madera

PISOS: Con fisuras y deterioros

FACHADA: Con deterioro y desprendimiento

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: Se visualizan en muros

HUNDIMIENTO PISO: No se observa

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Daños y averias en zonas de anclaje via

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MARIA CARREÑO R	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA CONTRERO ORTIZ
C.C. No.	37542792	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda in condiciones aceptables, (en 400(97 con daños y suciedad en área de cubierta, vía pavimentada

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA CONTRERO ORTIZ
C.C.	[illegible]	C.C.	1.098.700.722	C.C. o NIT	1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MARIA FERNANDA DIAZ NIÑO
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía: 1102386883
Dirección: MANZANA D CASA 2 PISO 2
Teléfono: 3112239900 Celular: No de pisos: 3
Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		VIVIENDA SIN CONDICIONES ADECUADAS
2. Alcantarillado	X		CON DIVISIONES Y ACCESO EN
3. Energía	X		TECHO DE ZINC Y CALZADA
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐			URBANO ☒		
1. Monumento Nacional	☐		5. En construccion	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐		6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐		7. Otro	☐	
4. Valor normal	☒		Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: SIN CONDICIONES ADECUADAS
MUROS: SON DIVISIONES EN MADERA
CUBIERTA: SON DE ZINC Y DE TEJA DE BARRO
PISOS: SON EN MADERA Y CEMENTO
FACHADA: SON EN MADERA, CEMENTO Y LADRILLO

GRIETAS Y FISURAS: EN PISOS Y MUROS
HUMEDADES: LA VIVIENDA EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN
HUNDIMIENTO PISO: NO SE EVIDENCIA
DESPLAZAMIENTOS: NO SE EVIDENCIA
OTRO: X Cuál? DIVIDIDAS Y AVISOS EN MADERA Y CALZADA

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
María Fernanda Diaz					
NOMBRE	MARIA FDA DIAZ N	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	1102386883	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.665.396

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400/97, sin aviso y deficiencia en zona de anden y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
María Fernanda Oiñz					
NOMBRE	MARIA FDA DIAZ NIÑO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1193286883	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.388

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MARINA DIAZ FUENTE

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Familiar ___ Otro ___

Nombre del Propietario: MARINA DIAZ FUENTE

Cédula de ciudadanía: 37.196.087

Dirección: MANZANA CASA 8 PISO 1ER

Teléfono: 3178621074 Celular: ___ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones sanitarias
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		A001 92 con datos y medidor
4. Teléfonos		X	En dos de calle 2 desapareció
5. Gas		X	la vía
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

	RURAL		URBANO	
1. Monumento Nacional		5. En construccion		
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor intermedio		7. Otro		
4. Valor normal	X	Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda sin condiciones sanitarias

MUROS: con fisuras, deteriorados y despañetados

CUBIERTA: con deterioro y daño tejas

PISOS: con fisuras, deteriorados y despañetados

FACHADA: con deterioro despañetado

GRIETAS Y FISURAS: en pisos y muros

HUMEDADES: no se visualizan

HUNDIMIENTO PISO: no se observan

DESPLAZAMIENTOS: no se visualizan

OTRO: X Cuál? Deterioro y desgaste, sin embargo es toma lindante vía y despañetada.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MARINA DIAZ F.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	37196087	C.C. No.	1,098.760.722	C.C. No.	1.091.665.388

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en condiciones antiguas las 4001 1512, vivienda construida hay más de 15 años con detalles en andenes y vía de la calle destapada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MARINA DIAZ FUENTE	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	37.756.087	C.C.	1.099.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.369

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.18223.8	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.18227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MARINA QUINTERO PEREZ

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: MARINA QUINTERO PEREZ

Cédula de ciudadanía: 63.326.981

Dirección: MANZANA 5 CASA 9

Teléfono: 3167575414 Celular: ____ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda en condiciones ambientales,
2. Alcantarillado	X		con aseo y distribución en
3. Energía	X		sala y cocina
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones ambientales

MUROS: Con filtración, despegue, humedad

CUBIERTA: Con filtración y deterioro

PISOS: Con fisuras y deterioro

FACHADA: Con despegue y deterioro

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros, existentes

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

OTRO: X Cuál? Filtración y despegue en todo el exterior y cubierta

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MARINA QUINTERO P.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	63.326.981	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.365.986

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones sanitarias, la casa esta deshabitada y despañada en zona de anden y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	MARTHA BUITRAGO REYES	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	52.334.981	C.C.	1.098.793.722	C.C. o NIT	1.091.665.366

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	6/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16257.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MERCEDES MARIANA CELIZ

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1097 303 966

Dirección: MANZANA 6 CASA 6

Teléfono: 315 284 1112 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Vivienda sin terminar instalación
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	con detalles y despalte
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin terminar instalación

MUROS: con detalles y despalte

CUBIERTA: con despalte, humedad

PISOS: Con Rivas y sin grafa

FACHADA: Con Rivas y detalles

GRIETAS Y FISURAS: Con grafa y rivas

HUMEDADES: En vigas de pisos, muros contiguos

HUNDIMIENTO PISO: no se visualiza

DESPLAZAMIENTOS: no se visualiza

OTRO: X Cuál? Detalles y despalte en muros externos

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO	INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
Mercedes Marcado		
NOMBRE: MERCEDES MARIANA C	NOMBRE: JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE: ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No. 1097303966	C.C. No. 1.098.760.722	C.C. No. 1.091.665.396

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antihúmicas, ley 995/97. Con deficiencia y deficiencias en cubierta y acceso al predio en condiciones deshabitadas

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
Mercedes Moncada Delvéz					
NOMBRE	MERCEDES MONCADA G	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1097303966	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.369

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	09-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: YENNY CARDENAS FLOREZ

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: ____

Cédula de ciudadanía: 1116292286

Dirección: MANZANA G CASA 9 2 ETAPA

Teléfono: 3162180000 Celular: ____ No de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera X

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	UNIFICADO SIN CONEXIONES DOMICILIARIAS
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	CON MEDIDORES Y AVISOS EN TODA
4. Teléfonico	☐	X	EL BARRIO Y CALZADA
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	☐	X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: SIN CONEXIONES SANITARIAS MUROS: CON HUMEDADES Y FISURAS

CUBIERTA: CON DESPRENDIMIENTO Y DAÑOS

PISOS: CON FISURAS Y DESPLIEGUES

FACHADA: CON FISURAS Y DAÑOS

GRIETAS Y FISURAS: EN PISOS Y MUROS

HUMEDADES: NO SE OBSERVAN

HUNDIMIENTO PISO: NO SE DETALLAN

DESPLAZAMIENTOS: NO SE VISUALIZAN

OTRO: X Cuál? DESNIVELES Y DESPLIEGUES EN TODA LA CALZADA

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	YENNY CARDENAS F.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA GUANTERO ORTIZ
C.C. No.	116.292.286	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1.091.668.398

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones sanitarias, ley 400/97, con deterioro y despeche en zona de anden y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO:



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	YENNY CABALLERO C	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	1116792286	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.385.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁRSA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
FECHA	27 / 10 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: YOLANDA PAEZ REY

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 28162431

Dirección: MANZANA A CASA 14

Teléfono: 3105929181 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones sanitarias
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		Luz, agua con deficiencias y
4. Teléfonos		X	sucios en sanitario y baño deteriorado
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐			URBANO X
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	X	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:		
4. Institucional	☐	Cuál?			SI ☐	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda sin condiciones sanitarias

MUROS: con deficiencia y fisuras

CUBIERTA: con deficientes y deficiencia

PISOS: con fisuras y deficientes

FACHADA: con deficientes y deterioros

GRIETAS Y FISURAS: En piso y muros

HUMEDADES: X Viviendo en muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: no X deficiencia

DESPLAZAMIENTOS: no X deficiencia

OTRO: X Cuál? Deficiente y deficiencia en entrada, carretera

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	YOLANDA PAEZ REY	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.	28162431	C.C. No.	1.098.760.702	C.C. No.	1.091.[illegible].386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin anotaciones adicionales. Ley 400/97, con despiste y Anden en mal estado y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	YOLANDA PARDO RUIZ	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	28.162.421	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.666.396

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	6/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía: 91265828
Dirección: MANZANA B Casa 4
Teléfono: 9172113622 Celular: No de pisos: 4
Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con fachada, anden y calzada con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	Se realizo acta de vecindad en un
4. Teléfonos	☐	☐	tubo con fisuras en la pared con
5. Gas	☐	☐	fisuras en la propiedad y el andén
6. Televisión cable	☐	☐	del inmueble
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☑
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA: Con humedad, deterioros y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En placa y muros

HUMEDADES: En muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cual? Deterioros y desgastes y zona de andenes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que la diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VÍCTOR JULIO ORMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Ortega
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091 663 386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y descostes en zona de andenes, calzada y fachada

Durante la visita al inmueble se realizo el acta de vecindad con un fa-
milia conocida no se pudo contactar al propietario y/o vecindad del inmueble

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quintero
C.C.	91265828	C.C.	1.098.760.723	C.C. o NIT	1091 CC 53 382

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-33
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	27 / 10 / 2025

CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía: 91265828
Dirección: Manzana B Casa 6
Teléfono: 3172113023 Celular: No de pisos: 2
Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antitérmicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con andenes y calzada con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	La señora no le pudo contactar al arq. para tomarle el predio del inmueble
4. Teléfonos	☐	☐	se realizó la ficha de vecindad con un tiempo
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antitérmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA: Con humedad, deterioro y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioro y desgastes y zona de andenes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quintero
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091 665 356

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OS-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sincondiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y descostes en zona de anden es, calzada y fachada

Despues de varias visitas al inmueble, no se pudo contactar al propietario y/o residente del inmueble por tanto se realizo el acta de vecindad con un testigo

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Duarte
C.C.	91265828	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1091685736

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	6/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	27 / 10 / 2025

CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 91265828

Dirección: Manzana C Casa 1

Teléfono: 3172113022 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con anderes y calzada con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	Contacto no se pudo contactar al propie-
5. Gas	☐	☐	tario para brindar información de
6. Televisión cable	☐	☐	realizar el acta de vecindad, con un
7. Otros	☐	☐	tiempo
			Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA Con humedad, deterioros y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes y zona de anderes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Ortiz
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES [Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR"]

Vivienda sin condiciones antisismicas, ley 400 de 1997, con deterioros y desgastes en zona de anden es, calzada y fachada

Dolpris de vanas al visitar al inmueble se realizo el acta de vecindad al inicio con su fachada, conforme no se pudo contactar al residente y la propietaria del predio

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C.	91265828	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 91265828

Dirección: Manzana O Casa 3

Teléfono: 3172113522 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antitécnicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con andenes y calzada con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	La vivienda no tiene contrato de energía, la señora manifiesta que vende el servicio
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA Con humedad, deterioros y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes y zona de andenes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Gutiérrez
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665302

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y desgastes en zona de andenes, calzada y fachada

Riesgos de volver visitar al inmueble y realizar el acta de vecindad de inicio con un testigo, confirmo no se pudo contactar al propietario y/o residente del inmueble

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Fuentes
C.C.	91269828	C.C.	1.096.760.722	C.C. o NIT	1041665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	27	10	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 91265828

Dirección: MANZANA B Casa 1

Teléfono: 3172113522 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera I

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con andenes y calzada con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	La vivienda al 2022 de vecindad
4. Teléfonos	☐	☐	con un trabajo constructivo de todo
5. Gas	☐	☐	contacto al propietario de inmueble
6. Televisión cable	☐	☐	del inmueble
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con fisuras y deterioros

CUBIERTA: Con deterioros y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En placa y muros

HUMEDADES: En muros

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes y zona de andenes, fachada y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665396

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y desgastes en zona de andenes, calzada y fachada

Se realizo el acta de vecindad con un testigo, confirma no se pudo contactar al propietario y/o residente del inmueble debido a visitar visitar el predio

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO:



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	andres Buentes
C.C.	91356826	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1091663376

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	OS-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	4	11	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Anel Jimenez Vargas

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro X

Nombre del Propietario: ____

Cédula de ciudadanía: ____

Dirección: Calles 1A, 75A, 75B, 75C y calle 76, Brisas Primavera

Teléfono: ____ Celular: 3115562986 No de pisos: ____

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Brisas de Primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Acta que soporta el estado de las vías previo al movimiento de maquinaria pesada e inicio de actividades afines de obra.
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☐

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? Vía Pública	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vía de zona inferior del talud en algunos tuvieres en concreto y otros en terreno natural.

MUROS: ____

CUBIERTA: ____

PISOS: Descascaramiento, multiples fisuras a lo largo de las vias aledañas

FACHADA: ____

GRIETAS Y FISURAS: Vía de 2 carriles en la corona del talud, doble sentido con un carril en buenas condiciones y dos con multiples afectaciones a nivel superficial.

HUMEDADES: ____

HUNDIMIENTO PISO: a lo largo de la vía de acceso a bomo, en uno de sus carriles.

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: X Cuál? Desportillamiento y aberturas en algunos de sus andenes de la vía principal.

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO	INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRE: Anel Jimenez V.	NOMBRE: JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE: ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C. No.: 37753450	C.C. No.: 1.098.760.722	C.C. No.: 1.091.665.386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se observan multiples grietas y fisuras en la estructura vial local, entorno a la zona de influencia del proyecto, presencia de hundimientos y remosión de la carpeta vial en diversos puntos.

Algunos anderes con desprendimientos o afectaciones en su desarrollo.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		INGENIERO RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	ANDREA KARINA QUINTERO ORTIZ
C.C.	37753450	C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	1.091.665.386

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO
(HALCON DE GRANADA Y GRANADILLO)

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	6/03/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA: 06 | 12 | 2025

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Lizeth Cardenas Cadena

Tenencia: Propietario X Arrendatario Familiar Otro

Nombre del Propietario: Lizeth Cardenas Cadena

Cédula de ciudadanía: 1.102.359.411

Dirección: Cll 4 #1 A-120 Apto 103

Teléfono: 3045491911 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Holcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones habitables, tiene 4 años 87, con deterioros, del-
2. Alcantarillado	X		pastes, desprendimientos
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones habitables

MUROS: Con humedades fisuras, desplomo

CUBIERTA: Con deterioros, desplomo del fisuras

PISOS: Con desplomo deterioros desplazamientos

FACHADA: con desplomo, deterioros fisuras

GRIETAS Y FISURAS: En pisos muros

HUMEDADES: En muros

HUNDIMIENTO PISO: En andenes,

DESPLAZAMIENTOS: En andenes

OTRO: ☒ Cuál? Deterioros desplomo y desplazamientos en andenes y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
Lizeth Cardenas Cadena					
NOMBRE	Lizeth Cardenas Cadena	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quintero
C.C. No.	1.102.359.411	C.C. No.	1.098.750.722	C.C. No.	1091662336

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones satisfactorias en regular estado con deficiencias de aseo y desplazamiento en zona de andén y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO:












RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	LIZETH CARDENAS CADENA	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	1102.359.454	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	5/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	05	12	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: JAIME ANGARITA MAYA

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 5.670.471

Dirección: C/LLE ANDAR 19-11 P/F 301

Teléfono: 3022576432 Celular ____ No de piso: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin conexiones actualmente
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		Hay alta 97
4. Teléfono		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros sin condiciones actuales

MUROS: Con humedades detectadas y deficientes

CUBIERTA: Con humedades deficientes y detectadas

PISOS: Con fisuras, detectadas y deficientes

FACHADA: Con fisuras detectadas y deficientes

GRIETAS Y FISURAS: En piso y muros

HUMEDADES: En muros y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: En tenz a andén y calzada

DESPLAZAMIENTOS: En área de andenes

OTRO: X Cuál? Deterioros deficientes y deplazamientos en andén y calzada

Nota: Se deja constancia que la diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JAIME ANGARITA M.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quiroz
C.C. No.	5.670.471	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091.665.938

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	GB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en condiciones antiguas la 410/ 97 con detalles deficientes y dos. pisos anteriores en zona de andén y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.




RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	JANE ANGARITA MAYA	NOMBRE	ING. ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quiroz
C.C. No.	5.675.474	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091963386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	06 / 12 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

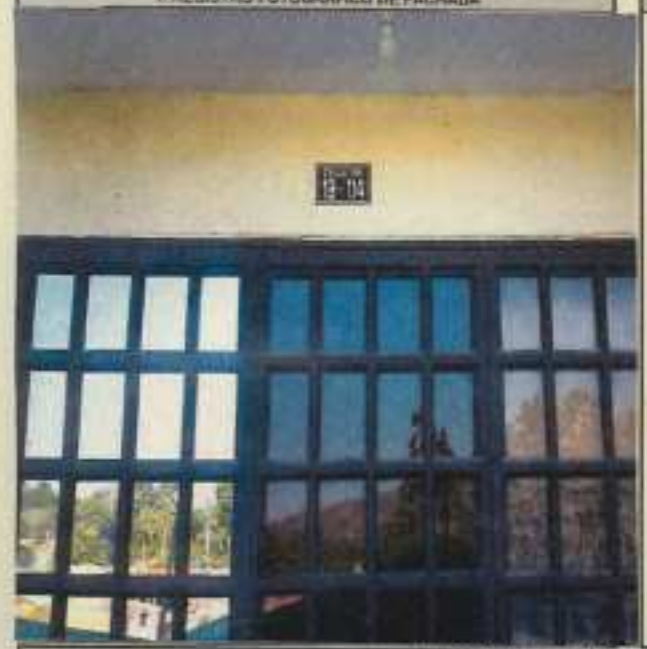

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: LEIDY KATHERINE RUEDA

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____ LEIDY RUEDA

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1095 900 960

Dirección: CRA 1A # 19-11A BIS A

Teléfono: 315 6[illegible] 3518 Celular: No de piso: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si tiene? Si, conexiones domiciliarias
2. Alcantarillado	☒	☐	En AAA? Si, con diferencias de
3. Energía	☒	☐	pisos y humedades
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuántos?

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones aparentes

MUROS: Con humedades, daños visibles, fisuras.

CUBIERTA: Con humedades, daños visibles y deflexiones

PISOS: Con fisuras y Asentamientos visibles

FACHADA: Con fisuras, deterioro y deflexiones

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En cubierta, muros

HUNDIMIENTO PISO: En zona de sanitarios y cocina

DESPLAZAMIENTOS: En andenes y calzada

OTRO: X Cuál? Calzada deformada y deteriorada en andenes, muros y

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
LEIDY K. RUEDA					
NOMBRE	LEIDY KATHERINE RUEDA	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	[illegible]
C.C. No.	1095900960	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/07/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4) OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda un condominio antiguo, la cual tiene deterioro y daños en zonas de techo y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
	Leidy K Rugeles.				Andrea Cuadro
NOMBRE	LEIDY KATHERINE RUGELES	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	1.151.949.44	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSION	1
	Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	06 / 12 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: JENNIFER GARCIA CORZO

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario: ____

Cédula de ciudadanía: 1102714486

Dirección: CALLE 1 # 19-102 PISO 1

Teléfono: 3007329444 Celular: ____ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones antihigienicas
2. Alcantarillado	X		Hay daño en distribución de
3. Energía	X		red y luminarias
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuántos? ____

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Vivienda sin condiciones antihigienicas	GRIETAS Y FISURAS:	En pisos y muros
MUROS:	Con humedades, deterioro y humedades	HUMEDADES:	En muros y cubierta
CUBIERTA:	Con humedades, deterioro y deposito	HUNDIMIENTO PISO:	En andén y calzada
PISOS:	Con humedades, deterioro y deposito	DESPLAZAMIENTOS:	En andén y calzada
FACHADA:	Con humedades, deterioro y deposito	OTRO: ☒ Cuál? andén y calzada	Deterioro, deposito y desplazamientos en

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JENNIFER GARCIA C.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	1102714486	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665336

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en condiciones aceptables ley 400/97, con detalles despalles y fisuras en fachada sobre y costado

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	JENNIFER GARCIA LOPEZ	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	1.10.414.426	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA: 06 | 12 | 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 210.16223.6 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: GLADYS FUENTES ESTUPIÑAN

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 63 356 193

Dirección: CLL 7 KA 4 19-180 APTO 3

Teléfono: 3125422837 Celular: No de piso:

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Holcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefónica		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES: Vivienda en condiciones aceptables en general se encuentra deterioro avanzado en techos y cielo raso

Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones aparentes

MUROS: Con fisuras, deterioro avanzado

CUBIERTA: Con deterioro, filtraciones avanzado

PISOS: Con fisuras deterioro y deterioro

FACHADA: Con fisuras deterioro y deterioro

GRIETAS Y FISURAS: En piso y muros

HUMEDADES: En techos y cubierta

HUNDIMIENTO PISO: En andenes y calzada

DESPLAZAMIENTOS: En andenes y calzada

OTRO: X Cuál? Deterioro, deterioro y deprimimiento en techos de andenes y calzada

Nota: Se deja constancia que la diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GLADYS FUENTES E.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Duarte
C.C. No.	63 356 193	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
	Página 2 de 3

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en condiciones estructurales Mx A30197, con detrimior deposito y deposito en zona de garaje y cocina

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	GLADYS PEREZ TITULAR	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quintero
C.C. No.	C3 516 193	C.C. No.	1.088.760.722	C.C. No.	1091665326

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	08 / 12 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: HUGO ANDRES PEREZ GRANADOS

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1102365785

Dirección: Cll 10A # 4E-96 Este A

Teléfono: 3022823465 Celular: Nº de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones salubridad
2. Alcantarillado	X		ten casa 97 los dueños de
3. Energía	X		Gaitan firmar, tenencia
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Sin condiciones salubridad -
MUROS:	con humedad filtraciones humedad
CUBIERTA:	con deterioro deficiente humedad
PISOS:	con fisuras desplazamiento y deterioro
FACHADA:	con deterioro filtraciones y deficiente
GRIETAS Y FISURAS:	En piso y muros
HUMEDADES:	En muros y cubierta
HUNDIMIENTO PISO:	En anden y calzada
DESPLAZAMIENTOS:	En anden y calzada
OTRO: Cuál?	Deficiente deterioro y desplazamiento en anden y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	HUGO ANDRES PEREZ	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quiroga
C.C. No.	1.102.365.785 C	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones actuales (e, 400/ 97 . sin detalles. Carretera destapada en tierra y gravilla

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	[illegible]
C.C. No.	[illegible]	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665395

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	6/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA: 06 | 12 | 2025

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.8 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: VIVIANA OVIEDO PARRA

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 37.618.699

Dirección: CLL 4 No 19-126 - 128

Teléfono: 3643248319 Celular: ____ No de pisos: 4

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones ambientales
2. Alcantarillado	X		con fig. año 97 con deterioro.
3. Energía	X		y depósito en sanidad y cocina
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

	RURAL		URBANO
1. Monumento nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Cuantos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: sin condiciones ambientales

MUROS: con deterioro por humedad y desprendimiento

CUBIERTA: con desprendimiento por humedad y deterioro

PISOS: con humedad, desprendimiento y deterioro

FACHADA: con humedad desprendimiento deterioro

GRIETAS Y FISURAS: en piso y muro

HUMEDADES: en muros

HUNDIMIENTO PISO: en andén y calzada

DESPLAZAMIENTOS: en andén y calzada

OTRO: X Cuál? humedad, deterioro, desprendimiento en andén y calzada

Nota: Se deja constancia que la diligencia corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VIVIANA OVIEDO P.	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Ortero
C.C. No.	37.618.699	C.C. No.	1.098.780.722	C.C. No.	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones entre Hernández Ley 1801/97, con deficiencias de acceso y área en zonales y calzada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
Viviana Quedo Riaño.					
NOMBRE	VIVIANA QUEDO RIAÑO	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	37.618.699	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091669336

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA: 06 | 12 | 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 210.16223.8 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: EDINSON FABIAN LUNA MARTIN

Tenencia: Propietario X | Arrendatario | Familiar | Otro

Nombre del Propietario: EDINSON FABIAN LUNA MARTIN

Cédula de ciudadanía: 1102345817

Dirección: CRA 23 #20AA-21

Teléfono: 3194202462 | Celular | Nº de pisos: 1 2 (tercio)

Departamento: Santander | Municipio: Piedecuesta | Barrio o vereda: Hacienda Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones salubres.
2. Alcantarillado	X		Con luz hace 97. con deterioro
3. Energía	X		y divisi en madera y cal-
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet todo

TIPO DE PREDIO — RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? Panadería	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☒ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Use el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Sin condiciones sanitarias	GRIETAS Y FISURAS:	En pisos y muros
MUROS:	En mal estado deteriorados	HUMEDADES:	En muros
CUBIERTA:	En regular estado deteriorado y deteriorados	HUNDIMIENTO PISO:	En andenes y calzada
PISOS:	En mal estado y deteriorados	DESPLAZAMIENTOS:	En andenes y calzada
FACHADA:	En deficientes y deteriorados	OTRO: ☒ Cuál?	Deterioro deterioro y avanzado en todas de andenes y calzada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
Edinson Fabián Luna					
NOMBRE	EDINSON F. LUNA	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrés Quiroz
C.C. No.	1.102345817	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091663386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones habitables. Ley A09/93, con deterioro, deficit y deterioro en zona de cocina y baño

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
Edinson Fabian Jara					
NOMBRE	Edinson F. Jara Martinez	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andres Mateus
C.C. No.	1.082.556.217	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665336

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	06	12	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.0	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: JOHN SEBASTIAN NIÑO [illegible]

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: ____

Cédula de ciudadanía: 1102348601

Dirección: Cra 20 Nº AN – 64 piso 1

Teléfono: 3157432741 Celular: ____ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Hacón de Granada

Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☒

OBSERVACIONES: Vivienda en condiciones [illegible] Ley 640/97. Se [illegible] y detectamos en toda la vivienda.

Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☒

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Vivienda en condiciones [illegible]	GRIETAS Y FISURAS:	En pilar y muros
MUROS:	Con fisuras diversas, humedad	HUMEDADES:	En muros y cubierta
CUBIERTA:	Con filtros, deficiente humedad	HUNDIMIENTO PISO:	En anden y fachada
PISOS:	Con fisuras y deformidad	DESPLAZAMIENTOS:	En calzada y anden
FACHADA:	Con fisuras deficiente y deformidad	OTRO: X Cuál?	Filtros deficientes y desplazamientos en anden y fachada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
JOHAN					
NOMBRE	JOHAN SEBASTIAN NIÑO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	[illegible]
C.C. No.	1102348601	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1095655356

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin vecindario existente. Ley 100/97. con deposito, obteniendo y
despejando sanitario en ducha y cocina

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO:











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
JOHAN					
NOMBRE	Johan J. Mino Gonzalez	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Ortiz
C.C. No.	1.082.142.643	C.C. No.	1.098.769.722	C.C. No.	1091665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	06 / 12 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: URO ALFONSO MONTAÑEZ LEON

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario: J-630440

Cédula de ciudadanía: CC 3A KM-37

Dirección: 3178727484 Celular: No de pisos: 3

Teléfono: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Hatón de Granada

Departamento: Granadillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones Adecuadas
2. Alcantarillado	X		tiene 4001 97 con deficiencias y
3. Energía	X		aseo en pésimas condiciones
4. Teléfonico		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda sin acabados

MUROS: con fisuras y deterioro

CUBIERTA: con deterioros

PISOS: con fisuras y deterioro en baldosas

FACHADA: con fisuras deterioro y deficiencias

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros

HUNDIMIENTO PISO: En área de andenes

DESPLAZAMIENTOS: En área de andenes y muros

OTRO: X Cuál? Deterioro, deyaite, fisuras en andenes

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	URO ALFONSO MONTAÑEZ LEON	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	J-630440	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	109.663886

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones saludables ley 400/97 con deficiencias, daños en fachadas, muros, cubierta

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	[illegible]
C.C. No.	[illegible]	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1094665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA: 06 | 12 | 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 210.16223.6 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 210.15227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: DIANA YOHANA BOLEÑO RINCÓN

Tenencia: Propietario: X Arrendatario: Familiar: Otro:

Nombre del Propietario: DIANA YOHANA BOLEÑO RINCÓN

Cédula de ciudadanía: 37.620.731

Dirección: C/a 2 # 1N-31

Teléfono: 3043249622 Celular: No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Hatón de Granada Granadillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones arbitrarias
2. Alcantarillado	X		Cuenta con servicio con deficiencia
3. Energía	X		y desagüe en pésimas condiciones
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet prestadores

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO X

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones arbitrarias

MUROS: Con fisuras deterioro. Vivienda sin

CUBIERTA: Con desgaste deterioro y filtraciones

PISOS: Con desgaste y deterioro

FACHADA: Con fisuras desgaste y deterioro

GRIETAS Y FISURAS: En muros y pisos

HUMEDADES: En muros y cielorraso

HUNDIMIENTO PISO: En sectores

DESPLAZAMIENTOS: En sectores

OTRO: X Cuál? Deterioro desgaste y filtración en sectores y canales prestador

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIANA Y BOLEÑO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C. No.	37.620.731	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1041665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones de habitabilidad. Las AAA/ 97 con deficiencias, fisuras y daños en pintura y cielo raso pintura.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.












RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIANA J ROLDÁN R	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Vanegas
C.C. No.	37.620.710	C.C. No.	1.088.760.722	C.C. No.	1094665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA	06 / 12 / 2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

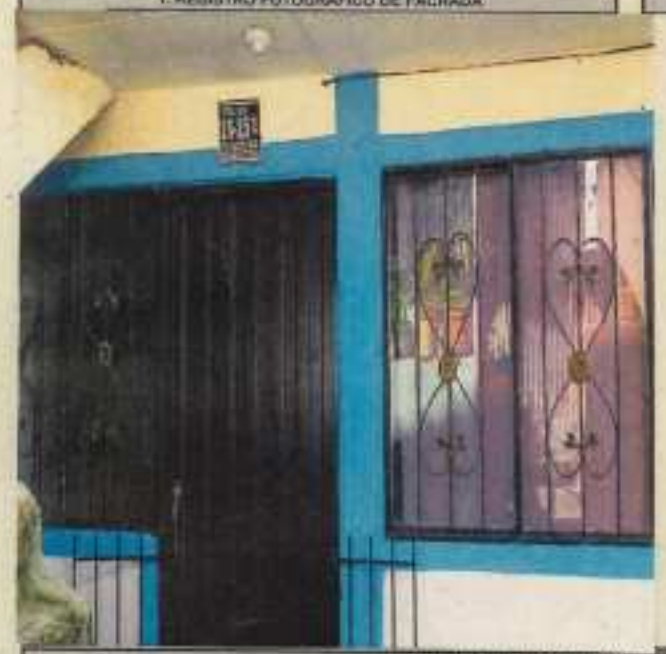

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: PAOLA ANDREA SILVA PEÑA

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar X Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 1102362734

Dirección: Cra 2 # AN - 26

Teléfono: 3184[illegible] Celular: ____ No de pisos: 3

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

Granadino

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda sin condiciones antisísmicas
2. Alcantarillado	X		ley 400/97, con deficiencias y
3. Energía	X		deficiencias en anclajes
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Tabuit

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐			URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construccion	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? Galpones	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones sísmicas

MUROS: Con fisuras, deterioro, deplomes, humedades

CUBIERTA: Con deterioro, fisuras, humedades

PISOS: Con fisuras, baldosas

FACHADA: Con fisuras, deterioro

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: Lavado - muros

HUNDIMIENTO PISO: En anden y costado posterior

DESPLAZAMIENTOS: En anden y costado posterior

OTRO: X Cuál? Deterioro, deplome, fisuras y daños en anden

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	PAOLA ANDREA SILVA PEÑA	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Ortiz
C.C. No.	1102362734	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin modificaciones estructurales. Tiene 4 en 97 con deficiencias, despiche y
acometida en zona de andén y frente predio.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
Paola Andrea Silva Ruiz					
NOMBRE	PAOLA ANDREA SILVA RUIZ	NOMBRE	JHON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Medina
C.C. No.	1.052.445.938	C.C. No.	1.098.780.722	C.C. No.	1019563386


ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/03/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA	06 / 12 / 2025

CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	210.16237.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

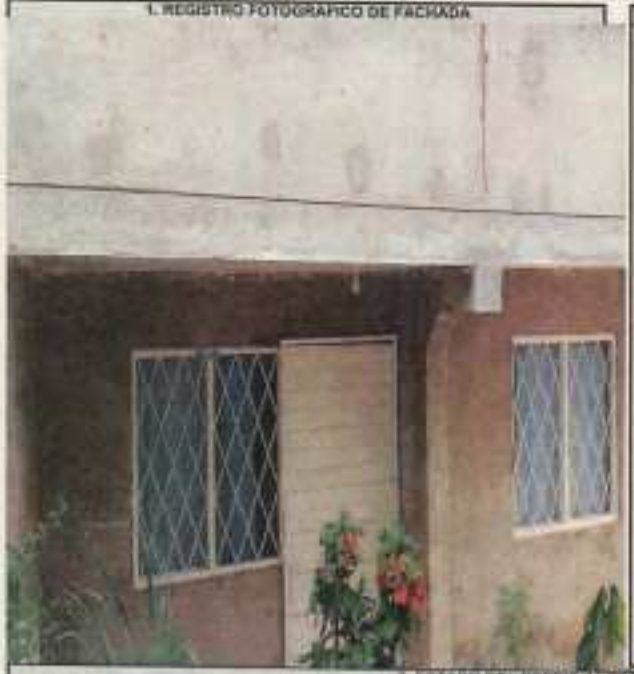

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro ____

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 91265828

Dirección: Cra 20 A No. 1 N - 19

Teléfono: 3172113522 Celular: No de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Granadillo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Vivienda sin condiciones antitérmicas, ley 400 de 1997
2. Alcantarillado	☐	☐	Con andenes con deterioros y averías
3. Energía	☐	☐	Conforme no se pudo contactar a los propietarios y / o residentes de la vivienda, se efectúa el
4. Teléfonos	☐	☐	acta de vecindad de inicio con un testigo de la tarea realizada
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio:

SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin condiciones antitérmicas

MUROS: Con fisuras, humedades y deterioros

CUBIERTA: Con deterioros, humedades y desgastes

PISOS: Con fisuras, desgastes y deterioros

FACHADA: Con fisuras, deterioros y desgastes

GRIETAS Y FISURAS: En placa y muros

HUMEDADES: En muros

HUNDIMIENTO PISO: No se visualizan

DESPLAZAMIENTOS: No se observan

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes y zona de andenes y fachada

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrés Ortiz
C.C. No.	91265828	C.C. No.	1.098.760.722	C.C. No.	1091665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Vivienda sin condiciones antisísmicas, ley 400 de 1997, con deterioros y desgastes en zona de andenes, calzada y fachada
Teniendo en cuenta que no se pudo contactar a los residentes y o propietarios del inmueble, se realiza el acta de vecindad de inicio con registro fotográfico externo y con apoyo de un testigo de la tarea desarrollada

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
NOMBRE	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	
C.C.	91265828	C.C.	1.098.793.722	C.C. o NIT	1094665386

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA	09	12	2025	CONTRATO DE OBRA No.	210.16223.6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	210.16227.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: DORELBA ROJAS B.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Familiar ____ Otro: PTE JAC BARRIO HALCÓN DE GRANADA

Nombre del Propietario:

Cédula de ciudadanía: 63444237

Dirección: Áreas de vías de acceso, andenes y fachadas desde el barrio San Carlos a Halcón de Granada en Piedecuesta

Teléfono: Celular: 3165173381 No de pisos: 1 y más

Departamento: Santander Municipio: Piedecuesta Barrio o vereda: Halcón de Granada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Áreas de vías, andenes y fachadas linderas al proceso constructivo, por donde va a ingresar
2. Alcantarillado	☑	☐	maquinaria y demás equipo para la actividad edificativa
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☑	☐	Cuál? Internet - cámaras

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐ URBANO ☑

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál? Fachadas, andenes, calzadas	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐

Cuántos?:

El garaje se usa como comercio

SI ☑ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Fachadas sin condiciones antisísmicas

MUROS: Con humedades, desgastes, deterioros, fisuras, averías

CUBIERTA Con deterioros, desgastes, humedades, averías

PISOS: Con desgastes, deterioros, fisuras

FACHADA: Con desgastes, deterioros, averías

GRIETAS Y FISURAS: En pisos y muros

HUMEDADES: En muros de fachadas

HUNDIMIENTO PISO: En zona de calzada, andenes y acceso al barrio San Carlos

DESPLAZAMIENTOS: En calzada y andenes, acceso barrio San Carlos

OTRO: X Cuál? Deterioros y desgastes a nivel general en zonas de andenes, fachadas, muros y calzada de acceso al barrio San Carlos

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a lo realizado.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	Dorelba Rojas Bareiro	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrés Quintero
C.C. No.	63444237	C.C. No.	1.098.780.722	C.C. No.	

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSION	1
	Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Áreas de acceso a la obra constructiva con desgastes deterioros, averías, tanto en calzada como anderes y fachadas lindantes a esta zona de influencia de la actividad edificativa

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.











RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE	53444237 Dorelva Rojas	NOMBRE	JHON GONZÁLEZ RIVERA	NOMBRE	Andrea Quintero
C.C.		C.C.	1.098.760.722	C.C. o NIT	

ANEXO NO.5: PROGRAMA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL

CONSORCIO MITIGACIÓN
PIEDECUESTA CDMB

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ANEXO: PROGRAMA GERENCIAL SEGUIMIENTO 04 DEL PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

PERIODO:
01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

PRESENTA:

Ing. ANDRÉS LEONARDO LASSO AGUIRRE
PROFESIONAL PMP-GERENCIA DE PROYECTOS

SANTANDER
PIEDECUESTA
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GESTIÓN DEL ALCANCE 4
3. CONTROL DEL COSTO Y AVANCE 5
4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6
5. GESTION DEL RIESGO 7
6. INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS 7
7. CONCLUSIONES 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente Programa de Gerencia de Proyecto es parte integral del Informe Técnico de Obra No. 4 donde se describe el desarrollo de la ejecución del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Ejecución contratada con el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB mediante contrato de Obra Pública Nro. 210-16223-6. Las actividades corresponden a las desarrolladas durante el periodo del 01 de enero del 2026 hasta el 31 de enero del 2026.

Los capitulos a continuación se enfocarán en los índices claves de desempeño (KPIs), los mismos son medidas cuantificables del desempeño a lo largo del plazo de ejecución del contrato para un objetivo específico. Los KPI brindan objetivos que los equipos deben alcanzar, hitos para medir el progreso y perspectivas que ayudan a todos los interesados principalmente a los ejecutores a tomar mejores decisiones.

2. GESTIÓN DEL ALCANCE

La gestión del alcance es un componente crítico del Programa de Gestión del Proyecto de Construcción, que garantiza que todos los objetivos, entregables y tareas del proyecto estén claramente definidos, documentados y controlados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Desde el informe inicial se establece que, la minuta del contrato define que el alcance del contrato y sus especificaciones, son los plasmados en los documentos que hacen parte integral del presente contrato, definidos como Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas y planos. Así mismo, los mencionados documentos derivan las actividades del contrato como actividades necesarias para lograr cumplir con el objeto *Construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander.*

Del alcance del presente contrato se definió, a partir del programa de gerencia presentado, que el objetivo general del proyecto es el control de la erosión y la estabilización del talud mediante la implementación de un sistema de pantalla anclada en concreto con anclajes activos, en ambos frentes de obra. Dada la modificatoria presentada y avalada bajo el Otrosí 01 del 23 de diciembre de 2025, se presenta un cambio en el sistema de estabilización del frente Brisas de Primavera, el cual pasa a ser un sistema de bioingeniería con la instalación de pernos tipo Nails y cobertura en geomanto, garantizando factores de estabilidad y control de erosión, y a su vez ampliando el **área de cobertura en 854.00 m2**, sin afectar el equilibrio financiero del contrato.

Es por todo lo anterior que el indicador clave del cumplimiento del alcance corresponde a cumplimiento del área establecida a estabilizar, estimada en condiciones iniciales por el contratante en 1628.00 m2, totalizados por ambos frentes de obra; la cual pasa a ser ahora de **2482.00 m2** (1964.00 m2 a estabilizar con Bioingeniería en el frente Brisas de Primavera y 518.00 m2 a estabilizar en concreto lanzado en el frente Halcon de Granada).

El indicador como tal es la evaluación del porcentaje de área estabilizada. También es claro que por proceso de ejecución de este tipo de proyecto las primeras medidas se reflejarán en los últimos meses de la ejecución del contrato, a medida que la interventoría acepte las áreas ya estabilizadas.

En el presente mes que corresponde al cuarto, el valor esperado del indicador corresponde a 0 tal como se explicó previamente, esto a que las actividades se enfocaron en la culminación de los movimientos de tierras en Brisas de Primavera, así como el inicio de las perforaciones en el frente Halcon de Granada.

3. CONTROL DEL COSTO Y AVANCE

Esta sección se centra en el monitoreo y seguimiento de un calendario detallado del proyecto junto con un presupuesto desglosado en actividades unitarias, buscando la asignación eficiente de los recursos y el tratamiento proactivo ante posibles retrasos o riesgos de ejecución, el plan pretende mantener el impulso del proyecto y cumplir los plazos y el valor del proyecto, en consonancia con las expectativas del cliente y los compromisos contractuales.

El indicador clave establecido para el monitoreo del cumplimiento del costo del proyecto, correspondiente a la relación entre el valor ejecutado y el valor inicialmente presupuestado, evidenció que durante el periodo evaluado no se presentaron modificaciones en los costos del contrato. En consecuencia, el valor del índice para el presente plazo corresponde a **1,0**, al mantenerse un costo actual de **$ 9.651.664.101,92**, igual al costo inicial establecido de **$ 9.651.664.101,92**.

Con respecto al indicador establecido para el control del avance de obra, se estableció como el valor resultante entre la comparación del Avance Real sobre el Avance Programado, para el periodo 4 según el programa actualizado de obra al Otrosí 01, el avance se estimó en **$705.800.744,49** que representa al **7,31%** del valor total del proyecto, con un acumulado proyectado de **$1.789.138.809,12** que corresponde al **18,54%** del total del valor del contrato, pero el real ejecutado del mes 4 correspondió a **$722.701.000,19** que es el **7,49%** del valor total del proyecto, con un acumulado real de **$1.816.450.202,06** que corresponde al **18,82%** del valor total del contrato, dando como resultado un indicador de 1,02 durante el corte y 1,02 del acumulado del proyecto, lo que nos muestra que mientras el resultado sea igual o superior a 1, el avance real es superior al programado, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

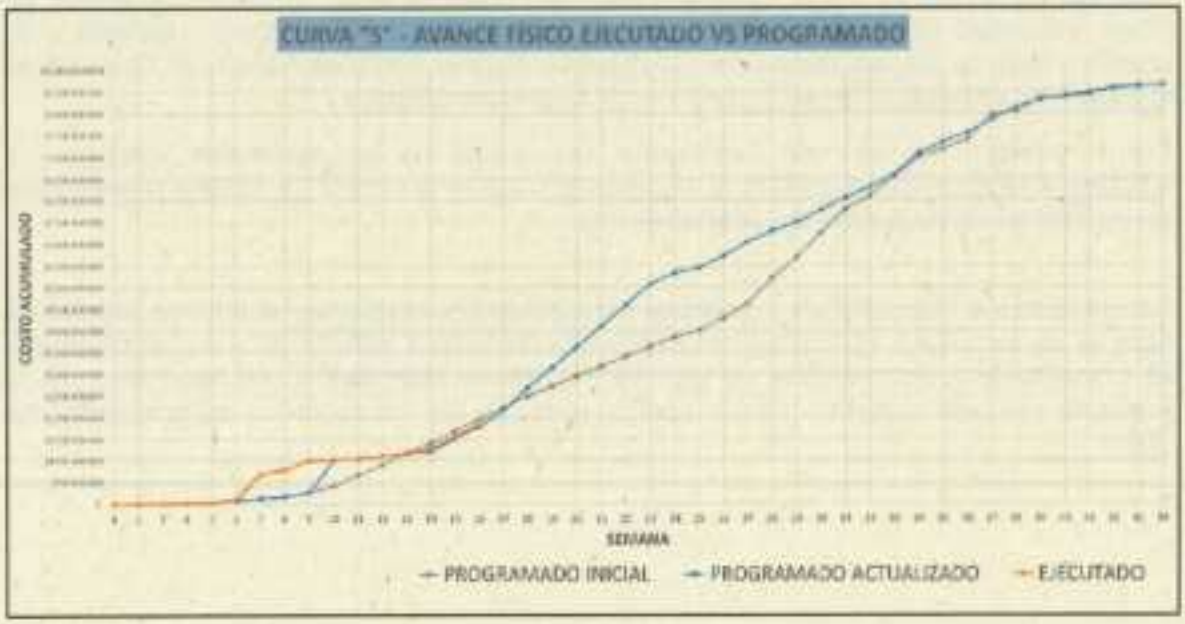


Ilustración 1. Avance Programado Vs Avance Ejecutado Acumulado (Curva S)

Descripción	Periodo 4
Estimado	$ 705.800.744,49
Acumulado Estimado	$ 1.789.138.809,12
Ejecutado	$ 722.701.000,19
Acumulado Ejecutado	$ 1.816.450.202,06
KPI Mensual	1,02
KPI Acumulado	1,02
% Programado	7,31%
% Acumulado	18,54%
% Ejecutado	7,49%
% Acumulado	18,82%

Tabla 1. Datos de avance de obra – Periodo 4

4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el presente reporte, las actividades desarrolladas correspondieron principalmente al movimiento de tierras de la zona a estabilizar adicionada en el frente de Brisas de Primavera, tales como las excavaciones en material granular y rocoso, perfilado y su posterior retiro al sitio de disposición autorizado. Para el frente de Halcon de Granada se iniciaron las actividades de perforación e instalación de anclajes.

Por lo anterior, se adjuntan certificados de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio respectivos y entre otros documentos afines al control de calidad presentados en su informe correspondiente. **(Ver anexo 1)**

Con respecto al indicador de porcentaje de actividades aceptadas, el informe técnico de obra en su numeral 5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, menciona que se presentaron a interventoría un total **de 12 (doce) actividades**, de las cuales no se presentó ninguna objeción, dando como resultado del indicador un cumplimiento del 100%.

5. GESTION DEL RIESGO

La minuta contractual, en su cláusula décima segunda, establece las garantías mínimas exigidas para la adecuada cobertura de los riesgos asociados a la ejecución del contrato. Dichas garantías comprenden el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal vinculado, la responsabilidad civil extracontractual, y la estabilidad de la obra, todas ellas en concordancia con las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones y demás documentos contractuales.

Las pólizas de garantía correspondientes fueron presentadas por el contratista una vez suscrito el contrato de obra, y posteriormente revisadas y aprobadas tanto por la interventoría como por la entidad contratante, asegurando el cumplimiento de las coberturas y montos establecidos. Así mismo, dichas pólizas fueron actualizadas conforme al acta de inicio de obra, suscrita el 15 de octubre del presente año, garantizando su vigencia y aplicabilidad durante la ejecución del proyecto.

6. INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS

En esta sección se describen los KPI que se utilizarán para hacer un seguimiento de aspectos críticos como la gestión de recursos. Mediante el establecimiento de objetivos claros y mensurables, el proyecto puede supervisar continuamente el rendimiento, identificar áreas de mejora y garantizar la alineación tanto con las expectativas del cliente como con los objetivos de la organización durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Así mismo el índice de tiempo productivo de recursos se encuentra en 100%, indicando que las condiciones laborales correspondieron a condiciones ideales, esto igual se refleja en el resultado de los indicadores previamente mencionados correspondientes a costo y avance.

7. CONCLUSIONES

Luego de la evaluación del cuarto periodo de ejecución del proyecto, las condiciones ideales de una obra se han presentado ayudando a que el avance sea superior al estimado; este avance físico a la fecha representa una ejecución positiva del presupuesto, en un tiempo acorde del mismo. Por lo que no se hace necesario implementar ninguna medida correctiva al desarrollo del proyecto, todo lo contrario, continuar con el plan existente y seguir su monitoreo con el fin de seguir interpretando los datos emitidos que permitan la toma de decisiones adecuadas para el cumplimiento del mismo dentro de los límites preestablecidos con relación a calidad, costo, tiempo, alcance, entre otros.

ANEXO 1:

INFORME DE SEGUIMIENTO 04 AL PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

INFORME PLAN DE CALIDAD 004

CONTRATO Nº 210.16223.6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
16/02/2026	Ing. Sindy Sared Cano	Ing. Jhon Gonzalez	Julián A Serrano Gómez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 4
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 7
2.4 Comunicaciones 7
2.5 Información documentada 7
3. OPERACIÓN 9
3.1 Planificación y control operacional. 9
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9
3.3 Control en la prestación del servicio 10
3.4 Liberación de productos y servicios. 10
3.5 Control de salidas no conformes 10
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente. 11
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 11
5. AUDITORIAS INTERNAS 12
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 12
7. MEJORA CONTINUA 13
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 13
9. CONCLUSIONES 13
10. RECOMENDACIONES 13

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

El presente informe comprende el periodo entre el 01 al 31 enero 2026, describe el cumplimiento de las actividades propuestas en el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 enero 2026 se realizaron las siguientes actividades:

FRENTE BRISAS

- Replanteo, control y medición de la obra
- Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)
- Desmonte y Limpieza
- Retiro de basuras y escombros
- Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)
- Excavación en material granular a cualquier profundidad
- Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad
- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m

FRENTE HALCON

- Replanteo, control y medición de la obra
- Desmonte y Limpieza
- Retiro de basuras y escombros
- Perfilado a mano descolgado de talud
- Excavación en material granular a cualquier profundidad
- Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad
- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m
- Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- Ejecución perforación horizontal - con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m

- Ejecución perforaciones horizontales con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210.16223.6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.983.966-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
REPRESENTANTE LEGAL	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
NIT	901.982.939-1
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
FECHA DE INICIO	15/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/08/2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA- SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 enero 2026 se realizaron los siguientes ingresos, NO se registraron egresos.

INGRESO DE PERSONAL	
NOMBRE	**CARGO**
Rodolfo Jesús Quiñonez Gutiérrez	Ayudante obra
Kelvin Nicol Páez Buitrago	Ayudante de Perforación II
Diego Andres Flores Rincón	Ayudante de Perforación II
Frank Yan Pier James Cañas	Almacenista
Pedro Jesus Vergel Vergel	Ayudante obra

Ver Anexo 1. Manual de Funciones y Responsabilidades

El pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoría.

2.2 Infraestructura

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, la cual se encuentra ubicada en el Centro industrial y logístico san Jorge Bodega 16, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños.



Tabla 3. Ubicación del proyecto

En el periodo comprendido se usaron los siguientes equipos y maquinaria.

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
EXCAVADORA DOOSAN DX225LCA	MINICARGADOR CASE
	
ESTACIÓN TOPOGRAFICA	VOLQUETA
	
Unidad neumática de perforación (#10)	Compresor Atlas Copco XAVS 450 (#60)
	
Unidad de inyección (#2)	

Ver Anexo 2. Control de maquinaria y equipo

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre 01 al 31 enero 2026, se presentaron 7 capacitaciones. 5 del área SST; Higiene Postural, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, Pausas Activas, Política sst y Peligros locativos 1 capacitación del área ambiental; control de emisiones atmosféricas. y 1 social; Fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atención a la comunidad. Los soportes de asistencia a las capacitaciones fueron entregadas a interventoría en el informe técnico.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido del 01 al 31 enero 2026 se realizaron 1 comité técnico.

ACTAS	
Acta de reunión 05	23/01/2026

La comunicación con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como correo electrónico, mensajería instantánea y correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo, revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista Maquinobras de Colombia S.A.S.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024

OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	2	30/06/2022
SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	3	02/01/2024
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp's	Procedimiento	1	27/02/2022
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/02/2022
SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política	3	22/07/2025
SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	3	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este período, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA

MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.

3. OPERACIÓN

3.1 Planificación y control operacional.

Durante el periodo entre el 01 y el 31 enero 2026 se llevó a cabo la planificación y ejecución de actividades constructivas en los frentes de obra **Brisas** y **Halcón**, conforme a lo establecido en el cronograma del proyecto, las especificaciones técnicas y los procedimientos definidos en el sistema de gestión.

En el **frente Brisas**, se ejecutaron actividades preliminares y de movimiento de tierras que incluyeron el replanteo, control y medición de la obra, instalación de señalización mediante valla tipo 1A, desmonte y limpieza del área, retiro de basuras y escombros, así como el perfilado manual de taludes en roca. Adicionalmente, se desarrollaron excavaciones en material granular y suelo rocoso a diferentes profundidades, junto con la ejecución de sobreacarreos para distancias mayores a 1.000 metros, garantizando la adecuada gestión y disposición de los materiales resultantes.

Por su parte, en el **frente Halcón**, se adelantaron actividades similares en su fase inicial, incluyendo replanteo, desmonte, limpieza, retiro de residuos y perfilado de taludes, así como excavaciones en material granular y rocoso y manejo de sobreacarreos. De manera complementaria, se dio inicio a actividades especializadas asociadas al sistema de estabilización, tales como la ejecución de perforaciones horizontales con equipo descolgado para la instalación de anclajes, el suministro e instalación de cables de acero de Ø 1/2" con longitud de 20 metros, y el llenado de inyecciones con lechada cementicia, conforme a los parámetros técnicos establecidos.

Todas las actividades fueron ejecutadas bajo condiciones controladas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, mediante supervisión permanente, control de calidad en sitio y registros de seguimiento, asegurando la conformidad de los procesos constructivos con los lineamientos del proyecto.

Para el periodo mencionado se avanza de acuerdo a la programación. *(ver pdf anexo al informe técnico)*

3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo establecido se realizó la adquisición de materiales.

LISTA DE MATERIALES
TORON
ALAMBRE
CEMENTO

Ver Anexo 3. Control de ingreso y salida de materiales – certificados de calidad.

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que no se han iniciado actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

3.3 Control en la prestación del servicio

Para la ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales
2. Fotografías
3. Actas de comités
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra

Esta información se encuentra consignada en los informes de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo.

Para el periodo comprendido se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

Ver Anexo 4. Resultado de ensayos.

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pùblica lo establecido por el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 31 de enero de 2026:

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	101,51%
Atención de quejas	Mensual	100%	No se han presentado quejas
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	No se ha realizado la evaluación de proveedores
Multas en el periodo	Mensual	0	No se han presentado multas

Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	No se tenían capacitaciones programadas

- En el periodo del 01 al 31 de enero se evidencia cumplimiento del 101,51%, evidenciando un desempeño superior a lo programado *(18,82% ejecutado vs 18,54% programado)*. Este resultado se debe a la culminación anticipada de los movimientos de tierra en el frente Brisas de Primavera y al inicio oportuno de las actividades de perforación e instalación de anclajes en el frente Halcón de Granada, lo que permitió optimizar la secuencia constructiva y mejorar el rendimiento del proyecto.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- para el periodo comprendido entre 01 al 31 enero 2026, se presentaron 7 capacitaciones. 5 del área SST; Higiene Postural, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, Pausas Activas, Política sst y Peligros locativos 1 capacitación del área ambiental; control de emisiones atmosféricas. y 1 social; Fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Ver Anexo 5. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

Para el periodo establecido no se realizaron auditorías internas, se tiene programado por parte del CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA realizar una auditoría interna pendiente definir fecha de realización.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido, no se ha hecho dicha revisión, se tiene previsto esta revisión para el mes de abril del 2026.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo a la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y

programa de inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. Se realizó correctamente la contratación y afiliación del personal, de acuerdo a lo establecido por la organización, permitiendo contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades correspondientes a la revisión y ajuste de los diseños.
2. Se cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de este periodo a satisfacción.
3. Se cuenta con registros y soportes que permiten llevar el seguimiento del proyecto, se han realizado los respectivos informes y actas de comité que soportan dicho seguimiento.
4. No se han presentado quejas, multas o productos no conformes que interfieran con las actividades del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la elaboración de informes y actas de comités del proyecto que permitan realizar el correcto seguimiento de las actividades.
2. Planear detalladamente las actividades del proyecto y realizar seguimiento a los equipos y/o materiales que se requieran.

Anexo 1. Manual de Funciones y Responsabilidades

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	**CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**
NIT:	**901.983.966-5**
DOMICILIO DEL EMPLEADOR:	**KM 7 #22 CEN - 31 CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE - BODEGA 16, Girón, Santander**
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**Frank Yan Pier James Cañas**
OFICIO QUE DESEMPEÑARA	**Almacenista**
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:	**Cédula de Ciudadanía: 1.005.060.412**
JEFE INMEDIATO:	**Jhon Alexander Gonzalez Rivera**
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:	**Ingeniero Residente**
IDENTIFICACION DEL JEFE INMEDIATO:	**Cédula de Ciudadania: 1.098.760.722**

DESCRIPCION DEL CARGO

Objetivo: Asegurar la custodia, recepción y entrega del material, combustible y equipos de la obra.

✔Funciones Principales:

• Realizar diariamente reporte por el sistema de información, de uso de combustible y horómetros de las maquinas que se encuentren en obra.
• Ejecutar el recibo físico de los materiales enviados a la obra por los proveedores, siguiendo los criterios de recepción que le indique el Residente de Obra en cada caso. Confrontar además lo recibido con la remisión y requisición de Compra.
• Ejecutar o verificar personalmente el almacenamiento adecuado de los materiales recibidos, de acuerdo con las indicaciones del instructivo para la manipulación, embalaje y conservación de materiales y las recomendaciones del fabricante para cada caso.
• Adecuar el sitio de almacenamiento con el espacio suficiente y la seguridad necesaria para evitar el deterioro o sustracción de materiales que van a estar bajo su responsabilidad.
• Efectuar las entregas de materiales requeridos para la obra, previa verificación de su autorización por el Residente de Obra establecidas en el formato de salida de materiales.
• Informar diariamente al Residente de Obra sobre el estado de existencias de materiales y alertar oportunamente cuando se presenten inconvenientes en su suministro.
• Participar en los inventarios mensuales sobre el estado de existencias de los materiales, atender y resolver las observaciones que se presenten.
• Entregar y recibir herramientas, formaleta y equipos menores a los trabajadores, de acuerdo con las indicaciones del Residente de Obra, verificando en ambos casos que se encuentren en buen estado para su utilización.
• Llevar el registro actualizado de la utilización de los equipos menores, propios y alquilados.
• Mantener el almacén en orden y aseo.
• Mantener en estricta confidencialidad la información de la empresa.

• Realizar todas las demás funciones que sean asignadas por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

Responsabilidad con el sistema de gestión integral (SST, CALIDAD Y AMBIENTAL):
• Conocer y aplicar las políticas de la organización, los objetivos del Sistema de Gestión Integral, ejecutando las actividades asignadas en los procedimientos, instructivos y perfiles de cargo.
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado
• Asistir procesos de inducción y entrenamientos en temas del SGI.
• Participar en las actividades de capacitación definidas en los planes de capacitación de SG-SST y organizacional.
• Informar oportunamente al jefe inmediato o al coordinador SST acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como de nuevos aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables SST, Ambiental y otros compromisos que adquiera la empresa con el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible con el Sistema de Gestión Integral.
• Reportar los accidentes que se presenten en su puesto de trabajo y suministrar la información verídica y oportuna para elaborar reporte y la investigación del mismo.
• Reportar los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en su lugar de trabajo.
• Reportar al COPASST y/o supervisor de Seguridad y salud en el trabajo los nuevos peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como actos y condiciones inseguras, oportunidades de mejora y sugerencias para el Sistema de Gestión.
• Aplicar las actividades de seguridad como orden y aseo, pausas activas, prevención de lesiones musculares y los programas y procedimientos del medio ambiente como gestión ambiental.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en los programas ambientales de la organización.
• Participar de los simulacros de emergencias de SST y Ambientales definidos en el plan de actividades de la Organización.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGI.

Doy fe de haber recibido a satisfacción los elementos, dotación, funciones y responsabilidades de mi cargo, las políticas y procedimientos de la empresa de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Fecha de entrega y socialización del manual de funciones y responsabilidades **20 del mes de enero de 2026.**

Firma de Recibido:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Frank Yan Pier James Cañas
Número de Documento	1.005.060.412
Email	fcanas791@gmail.com
Fecha	20/01/2026 a las 16:47
IP	191.156.248.142
Token	3ffa6ce05690be505c8c0de5e349952b

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



NOMBRE DEL EMPLEADOR:	**CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**
NIT:	**901.983.966-5**
DOMICILIO DEL EMPLEADOR:	**KM 7 #22 CEN - 31 CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE - BODEGA 16, Girón, Santander**
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**Pedro Jesus Vergel Vergel**
OFICIO QUE DESEMPEÑARA	**Ayudante de Obra**
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:	**Cédula de Ciudadanía: 13.285.355**
JEFE INMEDIATO:	**Jhon Alexander Gonzalez Rivera**
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:	**Ingeniero Residente**
IDENTIFICACION DEL JEFE INMEDIATO:	**Cédula de Ciudadania: 1.098.760.722**

DESCRIPCION DEL CARGO

 Objetivo: Realizar actividades asignadas para la ejecución de obras civiles, optimizando los recursos dispuestos en la ejecución de sus labores.

✔ Funciones Principales:
• Limpiar y preparar terrenos de construcción.
• Preparar y disponer los concretos y morteros de acuerdo con las instrucciones del oficial a cargo.
• Apoyar los movimientos de tierra atendiendo las indicaciones (excavaciones, rellenos, cargue de volqueta, etc).
• Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo.
• Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción.
• Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto.
• Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en ejecución de acuerdo a especificaciones.
• Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro equipo.
• Realizar las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones locativas.
• Realizar las actividades de orden y aseo de las instalaciones locativas.
• Realizar todas las demás funciones que sean asignadas por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

Responsabilidad con el sistema de gestión integral (SST, CALIDAD Y AMBIENTAL):
• Conocer y aplicar las políticas de la organización, los objetivos del Sistema de Gestión Integral, ejecutando las actividades asignadas en los procedimientos, instructivos y perfiles de cargo.
• Procurar el cuidado integral de su salud suministrando información clara, completa y

veraz sobre el mismo.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado.
• Asistir procesos de inducción y entrenamientos en temas del SGI.
• Participar en las actividades de capacitación definidas en los planes de capacitación de SG-SST y organizacional.
• Informar oportunamente al jefe inmediato o al coordinador SST acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como de nuevos aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables SST, Ambiental y otros compromisos que adquiera la empresa con el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible con el Sistema de Gestión Integral.
• Reportar los accidentes que se presenten en su puesto de trabajo y suministrar la información verídica y oportuna para elaborar reporte y la investigación del mismo.
• Reportar los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en su lugar de trabajo.
• Reportar al COPASST y/o supervisor de Seguridad y salud en el trabajo los nuevos peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como actos y condiciones inseguras, oportunidades de mejora y sugerencias para el Sistema de Gestión.
• Aplicar las actividades de seguridad como orden y aseo, pausas activas, prevención de lesiones musculares y los programas y procedimientos de la gestión ambiental.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en los programas ambientales de la organización.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Participar de los simulacros de emergencias de SST y Ambientales definidos en el plan de actividades de la Organización.
• Firmar los Formatos de permisos de trabajos con actividades críticas (ats, aptitud física, entre otros) diligenciados por el coordinador de alturas y /o responsable de la actividad.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGI.

Doy fe de haber recibido a satisfacción los elementos, dotación, funciones y responsabilidades de mi cargo, las políticas y procedimientos de la empresa de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Fecha de entrega y socialización del manual de funciones y responsabilidades **26 del mes de enero de 2026.**

Firma de Recibido:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Pedro Jesus Vergel Vergel
Número de Documento	13.285.355
Email	vergelvergelpedrojesus@gmail.com
Fecha	26/01/2026 a las 08:41
IP	181.48.103.202
Token	954519d736f52fa4258011012797d162

Este QR permite verificar la información de firma mientras el servicio esté activo. El documento válido es el PDF enviado al correo de los firmantes.



NOMBRE DEL EMPLEADOR:	**CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**
NIT:	**901.983.966-5**
DOMICILIO DEL EMPLEADOR:	**KM 7 #22 CEN - 31 CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE - BODEGA 16, Girón, Santander**
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**Kelvin Nicol Paez Buitrago**
OFICIO QUE DESEMPEÑARA	**Ayudante de Perforación II**
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:	**Permiso por Proteccion Temporal: 7.014.092**
JEFE INMEDIATO:	**Jhon Alexander Gonzalez Rivera**
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:	**Ingeniero Residente**
IDENTIFICACION DEL JEFE INMEDIATO:	**Cédula de Ciudadania: 1.098.760.722**

DESCRIPCION DEL CARGO

Objetivo: Apoyar y asistir al operador en la ejecución de las actividades de perforación, según las especificaciones constructiva y lineamientos de operatividad, seguridad y salud en el trabajo.

✔Funciones Principales:
• Mantener el orden y aseo del sitio de trabajo, reportando de manera oportuna cualquier anomalía.
• Recoger y trasladar combustible para el tanqueo de los equipos, desde el punto de acopio hasta la zona de ejecución.
• Apoyar en el traslado de equipos de perforación al punto asignado de operación, el cual involucra el ensamble y desemsamble de mangueras hidráulicas, movimiento de mandos, compresor, unidad, tubería y herramienta menor.
• Apoyar en las actividades de mantenimiento básico rutinario enfocadas en la lubricación, engrase, limpieza, revisión de conexiones y cuerpos independientes de los equipos de perforación usados.
• Ensamblar y desemsamblar tubería de perforación, según las condiciones dadas en el proceso de perforado y requerimientos del operador, a los que amerite.
• Apoyo en el posicionamiento estratégico del equipo de perforación en el punto de perforación en el descolgado del Talud o piso.
• Salvaguardar la integridad del equipo en piso (compresor o unidad hidráulica) a la exposición de material particulado y demás factores externos que afecten su optimo desempeño.
• Realizar todas las demás funciones complementarias que le sean asignadas por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

Responsabilidad con el sistema de gestión integral (SST, CALIDAD Y AMBIENTAL):
• Conocer y aplicar las políticas de la organización, los objetivos del Sistema de Gestión Integral, ejecutando las actividades asignadas en los procedimientos, instructivos y

perfiles de cargo.
• Procurar el cuidado integral de su salud suministrando información clara, completa y veraz sobre el mismo.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado
• Asistir procesos de inducción y entrenamientos en temas del SGI.
• Participar en las actividades de capacitación definidas en los planes de capacitación de SG-SST y organizacional
• Informar oportunamente al jefe inmediato o al coordinador SST acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como de nuevos aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables SST, Ambiental y otros compromisos que adquiera la empresa con el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible con el Sistema de Gestión Integral.
• Reportar los accidentes que se presenten en su puesto de trabajo y suministrar la información verídica y oportuna para elaborar reporte y la investigación del mismo
• Reportar los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en su lugar de trabajo.
• Reportar al COPASST y/o supervisor de Seguridad y salud en el trabajo los nuevos peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como actos y condiciones inseguras, oportunidades de mejora y sugerencias para el Sistema de Gestión
• Aplicar las actividades de seguridad como orden y aseo, pausas activas, prevención de lesiones musculares y los programas y procedimientos del medio ambiente como gestión ambiental.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en los programas ambientales de la organización.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Firmar los Formatos de permisos de trabajos con actividades críticas (ats, aptitud física, entre otros) diligenciados por el coordinador de alturas y /o responsable de la actividad.
• Participar de los simulacros de emergencias de SST y Ambientales definidos en el plan de actividades de la Organización
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGI.

Doy fe de haber recibido a satisfacción los elementos, dotación, funciones y responsabilidades de mi cargo, las políticas y procedimientos de la empresa de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Fecha de entrega y socialización del manual de funciones y responsabilidades **09 del mes de enero de 2026.**

Firma de Recibido:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Kelvin Nicol Paez Bultrago
Número de Documento	7.014.092
Email	kelvinpaez88@gmail.com
Fecha	09/01/2026 a las 17:57
IP	179.19.89.201
Token	5a54c177cda439e3ac150d26749cd71e

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



NOMBRE DEL EMPLEADOR:	**CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**
NIT:	**901.983.966-5**
DOMICILIO DEL EMPLEADOR:	**KM 7 #22 CEN - 31 CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE - BODEGA 16, Girón, Santander**
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**Diego Andres Florez Rincon**
OFICIO QUE DESEMPEÑARA	**Ayudante de Perforación II**
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:	**Cédula de Ciudadanía: 1.063.560.222**
JEFE INMEDIATO:	**Jhon Alexander Gonzalez Rivera**
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:	**Ingeniero Residente**
IDENTIFICACION DEL JEFE INMEDIATO:	**Cédula de Ciudadania: 1.098.760.722**

DESCRIPCION DEL CARGO

Objetivo: Apoyar y asistir al operador en la ejecución de las actividades de perforación, según las especificaciones constructiva y lineamientos de operatividad, seguridad y salud en el trabajo.

✔Funciones Principales:
• Mantener el orden y aseo del sitio de trabajo, reportando de manera oportuna cualquier anomalía.
• Recoger y trasladar combustible para el tanqueo de los equipos, desde el punto de acopio hasta la zona de ejecución.
• Apoyar en el traslado de equipos de perforación al punto asignado de operación, el cual involucra el ensamble y desemsamble de mangueras hidráulicas, movimiento de mandos, compresor, unidad, tubería y herramienta menor.
• Apoyar en las actividades de mantenimiento básico rutinario enfocadas en la lubricación, engrase, limpieza, revisión de conexiones y cuerpos independientes de los equipos de perforación usados.
• Ensamblar y desemsamblar tubería de perforación, según las condiciones dadas en el proceso de perforado y requerimientos del operador, a los que amerite.
• Apoyo en el posicionamiento estratégico del equipo de perforación en el punto de perforación en el descolgado del Talud o piso.
• Salvaguardar la integridad del equipo en piso (compresor o unidad hidráulica) a la exposición de material particulado y demás factores externos que afecten su optimo desempeño.
• Realizar todas las demás funciones complementarias que le sean asignadas por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

Responsabilidad con el sistema de gestión integral (SST, CALIDAD Y AMBIENTAL):
• Conocer y aplicar las políticas de la organización, los objetivos del Sistema de Gestión Integral, ejecutando las actividades asignadas en los procedimientos, instructivos y

perfiles de cargo.
• Procurar el cuidado integral de su salud suministrando información clara, completa y veraz sobre el mismo.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado
• Asistir procesos de inducción y entrenamientos en temas del SGI.
• Participar en las actividades de capacitación definidas en los planes de capacitación de SG-SST y organizacional
• Informar oportunamente al jefe inmediato o al coordinador SST acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como de nuevos aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables SST, Ambiental y otros compromisos que adquiera la empresa con el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible con el Sistema de Gestión Integral.
• Reportar los accidentes que se presenten en su puesto de trabajo y suministrar la información verídica y oportuna para elaborar reporte y la investigación del mismo
• Reportar los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en su lugar de trabajo.
• Reportar al COPASST y/o supervisor de Seguridad y salud en el trabajo los nuevos peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como actos y condiciones inseguras, oportunidades de mejora y sugerencias para el Sistema de Gestión
• Aplicar las actividades de seguridad como orden y aseo, pausas activas, prevención de lesiones musculares y los programas y procedimientos del medio ambiente como gestión ambiental.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en los programas ambientales de la organización.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Firmar los Formatos de permisos de trabajos con actividades críticas (ats, aptitud física, entre otros) diligenciados por el coordinador de alturas y /o responsable de la actividad.
• Participar de los simulacros de emergencias de SST y Ambientales definidos en el plan de actividades de la Organización
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGI.

Doy fe de haber recibido a satisfacción los elementos, dotación, funciones y responsabilidades de mi cargo, las políticas y procedimientos de la empresa de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Fecha de entrega y socialización del manual de funciones y responsabilidades **09 del mes de enero de 2026.**

Firma de Recibido:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Diego Andres Florez Rincon
Número de Documento	1.063.560.222
Email	diegoaflorezrincon@gmail.com
Fecha	09/01/2026 a las 17:55
IP	186.103.17.222
Token	487873e5ddf6d5b216b71ecd8f6d7159

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



NOMBRE DEL EMPLEADOR:	**CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**
NIT:	**901.983.966-5**
DOMICILIO DEL EMPLEADOR:	**KM 7 #22 CEN - 31 CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE - BODEGA 16, Girón, Santander**
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**Rodolfo Quiñonez Gutierrez**
OFICIO QUE DESEMPEÑARA	**Ayudante de Obra**
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:	**Permiso por Proteccion Temporal: 6.356.621**
JEFE INMEDIATO:	**Jhon Alexander Gonzalez Rivera**
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:	**Ingeniero Residente**
IDENTIFICACION DEL JEFE INMEDIATO:	**Cédula de Ciudadania: 1.098.760.722**

DESCRIPCION DEL CARGO

 Objetivo: Realizar actividades asignadas para la ejecución de obras civiles, optimizando los recursos dispuestos en la ejecución de sus labores.

✔ Funciones Principales:
• Limpiar y preparar terrenos de construcción.
• Preparar y disponer los concretos y morteros de acuerdo con las instrucciones del oficial a cargo.
• Apoyar los movimientos de tierra atendiendo las indicaciones (excavaciones, rellenos, cargue de volqueta, etc).
• Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo.
• Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción.
• Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto.
• Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en ejecución de acuerdo a especificaciones.
• Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro equipo.
• Realizar las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones locativas.
• Realizar las actividades de orden y aseo de las instalaciones locativas.
• Realizar todas las demás funciones que sean asignadas por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

Responsabilidad con el sistema de gestión integral (SST, CALIDAD Y AMBIENTAL):
• Conocer y aplicar las políticas de la organización, los objetivos del Sistema de Gestión Integral, ejecutando las actividades asignadas en los procedimientos, instructivos y perfiles de cargo.
• Procurar el cuidado integral de su salud suministrando información clara, completa y

veraz sobre el mismo.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado.
• Asistir procesos de inducción y entrenamientos en temas del SGI.
• Participar en las actividades de capacitación definidas en los planes de capacitación de SG-SST y organizacional.
• Informar oportunamente al jefe inmediato o al coordinador SST acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como de nuevos aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables SST, Ambiental y otros compromisos que adquiera la empresa con el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible con el Sistema de Gestión Integral.
• Reportar los accidentes que se presenten en su puesto de trabajo y suministrar la información verídica y oportuna para elaborar reporte y la investigación del mismo.
• Reportar los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en su lugar de trabajo.
• Reportar al COPASST y/o supervisor de Seguridad y salud en el trabajo los nuevos peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como actos y condiciones inseguras, oportunidades de mejora y sugerencias para el Sistema de Gestión.
• Aplicar las actividades de seguridad como orden y aseo, pausas activas, prevención de lesiones musculares y los programas y procedimientos de la gestión ambiental.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en los programas ambientales de la organización.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Participar de los simulacros de emergencias de SST y Ambientales definidos en el plan de actividades de la Organización.
• Firmar los Formatos de permisos de trabajos con actividades criticas (ats, aptitud física, entre otros) diligenciados por el coordinador de alturas y /o responsable de la actividad.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGI.

Doy fe de haber recibido a satisfacción los elementos, dotación, funciones y responsabilidades de mi cargo, las políticas y procedimientos de la empresa de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Fecha de entrega y socialización del manual de funciones y responsabilidades **09 del mes de enero de 2026.**

Firma de Recibido:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Rodolfo Quiñonez Gutierrez
Número de Documento	6.356.621
Email	rquinonezgutierrez38@gmail.com
Fecha	09/01/2026 a las 17:57
IP	191.95.39.163
Token	4fb05a98e7fc543d2a48c57354a98661

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



Anexo 2. Control de maquinaria y equipo

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	01/1/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Suarez	1.098.714.177		JAFSF12SE24496 221	Brisas Alto

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Enero				AÑO: 2026		
			DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA 2	DÍA 3	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.					L	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.					✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.					✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.					✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.					✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.					✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.					✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.					✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.					✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.					✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.					✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.					✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.					✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.					✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.					✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).					✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.					✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.					✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.					✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de boliquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bilies de Arancera
OPERADOR: Yeferson Acevedo Dozer
PROYECTO: Consorcio Pitragucion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	2/01/26	3/01/26					
HOROMETRO	15540	15548					
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	3 enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	3 Enero 2026

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeiferson Acevedo S	1092731817		JAFSF175CH4996	Aldrals

INSPECCIÓN

MES: Enero — AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	S1 6/1/26	S2 6/1/26	S3 7/1/26	S4 8/1/26	S5 9/1/26	DIA	DIA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la batería.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha	5/11/2020
Versión	1
Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Yefferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Aeropuerto CORB

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26		
HOROMETRO	15566	15579	15576	15580	15585		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yefferson Acevedo
FECHA	9 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	9 Enero 2026

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Sierra	1.098714157		JAT5F175EM1 T-16332	Helicoptero

INSPECCIÓN

MES: Enero AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	DIA	12/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	DIA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape dúrante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcones
OPERADOR:	Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	
HOROMETRO		15586	15596	15598	15611	15620	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	17 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	17 enero 2026

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yeferson Acevedo Suarez	1.047.714.817		JAFSF175ERH4 46329	Falcones

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES:	Enero			AÑO:	2026	
								DÍA	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	—		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidraulicas.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de boliqui.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas)							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostática.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Yeferson Acevedo Suarez
PROYECTO: Contrato Mitigacion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26		
HOROMETRO	15630	15635	15639	15640	15648		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Yeferson Acevedo
FECHA	23 Enero 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	23 Enero 2026

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-08
		Fecha	01/07/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	VENCIMIENTO	MARCA	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez	1.046.214.995		DOOSAN DX140LCR-5	Helonia

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	5/01/22	6/01/22	7/01/22	8/01/22	9/01/22	2026 SEM	DIC
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la cocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Verificar estado de planchas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corrente)	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, segun sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcansa y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓		✓		
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de bateria.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-05
		Fecha	17/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Halcones
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez
PROYECTO: Consorcio Metroquia PI Piedecuesta CDMB

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	5/01/26	6/01/26	7/01/26	8/01/26	9/01/26			
HORÓMETRO	15890	15895	15898	15899	15601			
COMBUSTIBLE								
ACEITE MOTOR								
ACEITE HIDRAULICO								
ACEITE TRANSMISIÓN								
GRASA								
REFRIGERANTE								
OTRO								

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E
FECHA	9 Enero 2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	9 Enero 2026

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-05
		Fecha	07/12/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO	PLACA	UNIDAD DE NEGOCIO
Miguel Angel Nuñez	1.096210495		0622294	Helicopteros

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES / DÍA	Enero 2026				
				Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la cabina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control		✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios		✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panorámico		✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado de espejos		✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar estado de asiento		✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar estado de planchas y pedales		✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos		✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el manejo de estacionamiento (freno de emergencia)		✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores		✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)		✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro		✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras		✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales		✓	✓	✓	✓	✓
27		Verificar sistema de escape		/	✓	✓	✓	✓
28		Engrasar el cojinete de giro			✓		✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín						
30		Inspeccionar el ventilador del motor						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
33		Verificar estado de batería						
34		Verificar estado de los cilindros						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GHF-05
		Fecha	5/11/2025
		Versión	1
		Página	2 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Miguel Angel Alvarez Halcones
OPERADOR: Miguel
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	
HORÓMETRO		15610	15615	15630	15633	15640	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel
FECHA	17 enero 2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	17 enero 2026

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GHF-F-05
		Fecha	01/1/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	CELULAR	CARGO	LOCALIZACIÓN
Miguel Angel Alvarez	1.096.219.115	3162234960	Operador	Bolivar

INSPECCION

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	14/04/23	20/04/23	21/04/23	22/04/23	23/04/23		
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado vidrio parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	—	—	—		
5		Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	—	✓		
6		Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	—	—		
7		Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	—	✓		
8		Verificar estado de planeras y pedales	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de boliqui.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de bateria.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (vandas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Valledupar
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez
PROYECTO: Construcción Pradera Norte COMEX

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26		
HORÓMETRO	15643	15644	15649	15650	15650		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel
FECHA	23 Enero 2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	27 Enero 2026

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	CARGO	UBICACIÓN
Miguel Angel Alvarez	1.096.214.455	OPERADOR	Alcoa

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Enero 2026				AÑO: 2026	
			22/01/26	23/01/26	26/01/26	24/01/26	30/01/26	31/01/26
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar estado de planacas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el mando de estacionamiento (freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y realizar drenaje del tanque, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, biela y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		Verificar sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Engrasar el cojinete de giro.	✓		✓		✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolsillon.						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de batería.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (vanfas, zapatas, rodillos, guias)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SM-F-05
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Valcarfs
OPERADOR: Miguel Angel Alvarez
PROYECTO: Consorcio Mitigación Redes vieja COMIA

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/01/20	27/01/20	29/01/20	29/01/20	30/01/20	31/01/20	
HOROMETRO	15655	15659	15660	15663	15669	15670	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRAULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Miguel E
FECHA	31 Enero 2021
FIRMA INSPECCION	
FECHA	31 Enero 2021

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-65
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	#2
OBRA/PROYECTO	Helicon de grandes	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villamizar	SEMANA	A

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			19	20	21	22	23	24	25
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Chupas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Manómetros de presión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Nivel y estado de valvulina	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Estado de camisas	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Estado de esferas y canastilla.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		*Estado de base de copa de pistón	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Estado de eje central de la bomba	✓	✓	✓	✓	✓		
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		*Motor en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Tubo de escape en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		*Encendido del motor en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		*Control de fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Indicadores de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Estado de sistema eléctrico (cables, batería y terminales).	✓	✓	✓	✓	✓		
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Estado de válvula y manguera de retorno.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Mangueras con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Racores de empalme en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado de empaque dixon.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Estado e inspección de orings.	✓	✓	✓	✓	✓		
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Estado de llantas.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones .

OBSERVACIONES

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Tabaa de ganado

INSPECCIONADO POR: Mauricio Villamizar

PROYECTO: Consorcio Mitigacion Piedraviesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19-01	20-01	21-01	22-01	23-01	24-01	25-01
COMBUSTIBLE		1 GL		1 GL			
ACEITE DE MOTOR	3/4 GL						
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Mauricio Villamizar
FECHA	23-01-2026
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	#2
OBRA/PROYECTO	Helicon de granada	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villamizar	SEMANA	5

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			26	27	28	29	30	31	DIA
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Válvula de seguridad funcionando.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Chupas en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Manómetros de presión en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Nivel y estado de valvulina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Estado de camisas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de esferas y canastilla.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de base de copa de pistón.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Estado de eje central de la bomba.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		*Motor en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Tubo de escape en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		*Encendido del motor en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		*Control de fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Indicadores de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Estado de sistema eléctrico (cables, batería y terminales).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Estado de válvula y manguera de retorno.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Mangueras con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Racores de empalme en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Estado de empaque dixon.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado e inspección de orings.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones .

OBSERVACIONES

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Frente Halcon de grosada
INSPECCIONADO POR: Mauricio villarreal
PROYECTO: Consorcio Mitigacion piedemonte

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26-01	27-01	28-01	29-01	30-01	31-01	
COMBUSTIBLE	1 gl		1 gl		1 gl		
ACEITE DE MOTOR							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Mauricio villarreal
FECHA	31-01-2026
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Fecha	11/02/2022
		Versión	1
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 10
OBRA/PROYECTO	Mitigación Piedecuesta	MES	
OPERADOR	Harley Pinto	Enero	

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA								
			19	20	21	26	27	DÍA		DÍA	
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Inspeccionar estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓				
2		Inspeccionar estado de teflones.	✓	✓	✓	✓	✓				
3		Inspeccionar estado motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓				
4		Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓				
5		Inspeccionar estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓				
6		Inspeccionar estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓				
7		Inspeccionar estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓				
8		Inspeccionar estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓				
9		Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓	✓				
10		Inspeccionar estado de acoples rapidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
11		Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓				
12		Inspeccionar estado de mandos	✓	✓	✓	✓	✓				
13		Engrasar sistema rotario	✓	✓	✓	✓	✓				
14		Inspeccionar estado de mangueras y abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓				
15		Inspeccionar estado del pulmón	✓	✓	✓	✓	✓				
16	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento	✓	✓	✓	✓	✓				
17		Estado del martillo	✓	✓	✓	✓	✓				
18		Estado de mano de angel.	✓	✓	✓	✓	✓				
19		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓				

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION NEUMÁTICA	Fecha	11/02/2022
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Piedecuesta - Halcon de Granada
CONDUCTOR:	Harley Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/1	20/1	21/1	22/1	23/1		
GRASA	1 Lb	1 Lb	1 Lb	1 Lb	1 Lb		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Harley Prada Lopez
FECHA	19/01/26
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

MAQUIOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Fecha	11/02/2022
		Versión	1
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 10
OBRA/PROYECTO	Mitigación Siskowski	MES	
OPERADOR	Harley Prada	ENERO	

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA							
			26	27	28	29	30	31		
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Inspeccionar estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Inspeccionar estado de teflones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Inspeccionar estado motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Inspeccionar estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Inspeccionar estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Inspeccionar estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Inspeccionar estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Inspeccionar estado de acoples rapidos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11		Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Inspeccionar estado de mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Engrasar sistema rotano	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar estado de mangueras y abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Inspeccionar estado del pulmón	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Estado del martillo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Estado de mano de angel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

MAQUINOBRAS	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION NEUMÁTICA	FECHA	11/02/2022
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Piedecuesta - Alto de Granada
CONDUCTOR:	Harley Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	
GRASA	1lb	1lb	1lb	1lb	1lb	1lb	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Harley Prada Lopez
FECHA	26/01/26
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	60
OBRA/PROYECTO	Halcon de Granada	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Haley Prada	SEMANA	19 al 23

INSPECCION

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			19	20	21	22	23	DIA	DIA
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		*Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
4		*Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓		
5		*Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
6		*Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓		
7		*Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓		
8		*Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓		
16		*Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Estado de baterías y cables	✓	✓	✓	✓	✓		
21		*Estado del radiador	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Estado de limpieza general	✓	✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE	Haley	Haley	Haley	Haley	Haley		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

#¡VALOR!	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	3 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcon de Granada
INSPECCIONADO POR:	Harley prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01		
HOROMETRO	3837	3842	3848	3853	3861		
COMBUSTIBLE	30	30	30	30	30		
ACEITE MOTOR							
REFRIGERANTE							
ACEITE DE LA UNIDAD							
OTRO:							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Harley prada Lyz
FECHA	23/01/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	#60
OBRA/PROYECTO	Halcon de Granada	MES	Enero
INSPECCIONADO POR	Harley Prada	SEMANA	26 al 31

INSPECCIÓN

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA							
			26	27	28	29	30	31		
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2		*Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4		*Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5		*Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6		*Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7		*Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8		*Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16		*Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Estado de baterías y cables	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21		*Estado del radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Estado de limpieza general	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

#¡VALOR!	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Halcon de Granada
INSPECCIONADO POR:	Halley Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	26/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	
HOROMETRO	3868	3874	3881	3888	3895	3901	
COMBUSTIBLE	30	30	30	30	30	30	
ACEITE MOTOR							
REFRIGERANTE							
ACEITE DE LA UNIDAD							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Halley Prada Lopez
FECHA	26/07/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Anexo 3. Control de ingreso y salida de materiales – certificados de calidad.

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Mitigacion Piedecuesta - Holcon de Granada | MATERIAL: Tarion de 1/1"

RESPONSABLE: Juan Andres Diaz Quintero | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
16/12/25		301		UND	2					
						5/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	1.8
						6/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	1.6
						7/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	1.4
						8/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	1.2
						9/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	1.0
						13/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	0.8
						14/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	0.6
						15/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	0.4
						16/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	0.2
						17/01/26	0.2	Anclajes	Luis P	0

Scanned wi
CamScar

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: C. Mitigacion Redecuesta – Halcon de Granada | MATERIAL: Tubos Presion de 1"

RESPONSABLE: Juan Andres Diaz Quintero | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
05/01/26		4001	Comercio Diesto	UND	370					
						05/01/26	41	Anclajes	Luis P	329
						06/01/26	41	Anclajes	Luis P	288
						07/01/26	41	Anclajes	Luis P	247
						08/01/26	41	Anclajes	Luis P	206
						09/01/26	41	Anclajes	Luis P	165
						13/01/26	41	Anclajes	Luis P	124
						14/01/26	41	Anclajes	Luis P	83
						15/01/26	41	Anclajes	Luis P	42
						16/01/26	41	Anclajes	Luis P	1

Scanned wi
CamScar

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: C. Hotel Balcon Piedecuesta – Balcon de Granada
MATERIAL: Manguera Cristalina
RESPONSABLE: Juan Andres Diaz Quintero
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
05/01/26		5012	Ferreteria El Paraiso co	UNO	60					
						05/01/26	6	Anclajes	Luis P	54
						06/01/26	6	Anclajes	Luis P	48
						07/01/26	6	Anclajes	Luis P	42
						08/01/26	6	Anclajes	Luis P	36
						09/01/26	6	Anclajes	Luis P	30
						13/01/26	6	Anclajes	Luis P	24
						14/01/26	6	Anclajes	Luis P	18
						15/01/26	6	Anclajes	Luis P	12
						16/01/26	6	Anclajes	Luis P	6

Scanned with CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: C. Mirasagan Piedecuesta - Halcon de Granada
MATERIAL: Separadores Plasticos
RESPONSABLE: Juan Andres Diaz Quintero
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
05/01/26		51	Metalcort	UND	2.000					
						05/01/26	45	Anclajes		1.955
						06/01/26	45	Anclajes		1.910
						07/01/26	45	Anclajes		1.865
						08/01/26	45	Anclajes		1.820
						09/01/26	45	Anclajes		1.775
						13/01/26	45	Anclajes		1730
						14/01/26	45	Anclajes		1.685
						15/01/26	45	Anclajes		1.640
						16/01/26	45	Anclajes		1.595
						17/01/26	45	Anclajes		1.550
						19/01/26	45	Anclajes		1.505
						20/01/26	45	Anclajes		1.460
						21/01/26	45	Anclajes		1.415
						22/01/26	45	Anclajes		1.370
						23/01/26	45	Anclajes		1.325
						26/01/26	45	Anclajes		1.280
						27/01/26	45	Anclajes		1.235
						28/01/26	45	Anclajes		1.190
						29/01/26	45	Anclajes		1.145
						30/01/26	45	Anclajes		1.100
						31/01/26	20	Anclajes		1.080

Scanned with CamScanner

emcocables

Ensayos realizados en el Km 5.5 vía Cajicá - Zipaquirá Colombia laboratorio de ensayos
Tel: 57 (1) 794 0359 - www.emcocables.com

PRESTRENSSED STRAND TEST REPORT
(REPORTE DE ENSAYO TORÓN PRETENSADO)

1722618A

CUSTOMER (CLIENTE):	CONSORCIO MITIGACION PEDECUESTA CDMB	TOTAL COILS (TOTAL ROLLOS): 7	ACCEPTANCE OF ORDER (ACEPTACIÓN DE PEDIDO):	66526-1	DATE (FECHA EMISIÓN): 03/12/2025
COUNTRY OF ORIGIN (PAÍS DE ORIGEN):	COLOMBIA	NET WEIGHT (PESO NETO): 30979,00	PURCHASE ORDER (ORDEN DE PEDIDO):	28/11/2025	STANDARD (NORMA): ASTM A416/A416M-18

PRODUCT (PRODUCTO): Low-relaxation uncoated steel strand, grade 270 for prestressed concrete 1/2" 12,700 mm (0,500 inch) 3X7 Left lay (zS) - Torón de acero para concreto preesforzado, grado 270 baja relajación 1/2" 0,500 Pulg (12,700 mm) 3X7 Paso izquierdo (zS)

EXPORT (EXPORTACIÓN): NA

PAGE (PÁGINA): 1 / 1

PROPERTIES (PROPIEDADES):

REQUIREMENTS (REQUISITOS)	DTF	DIAMETER (DIAMETRO)		AREA (ÁREA)	BREAKING LOAD (CARGA ROTURA)		MINIMUM LOAD AT 1% (CARGA AL 1% MINIMA)		FORCE RATIO (RELACION DE FUERZA)	AREA REDUCTION (REDUCCION DE AREA)		% ELONGATION (% ELONGACION)	LAY LENGHT AND DIRECTION (LONGITUD DE PASO Y DIRECCION)			MODULUS OF ELASTICITY (MODULO DE ELASTICIDAD)		STRAIGHTNESS (RECTITUD)	WEIGHT BY LENGTH (PESO POR LONGITUD)
	10	mm	inch	mm2	Kgf	Lbf	Kgf	Lbf	%	%	TYPE REDUCTION (TIPO REDUCCION)		mm	Inch	S/Z	Kgf/mm2	KN/mm2	mm	Kg/m
	Min.	12,547	0,494	NA	18734	41300	16881	37171	NA	%			152,4	5,9		18600	182,2	NA	NA
	Nom.	12,700	0,500	98,70	NA	NA	NA	NA		NA	DUCTILE BREAK (ROTURA DUCTIL)	3,5	NA	N.	S	NA	NA	NA	0,780
	Max.	13,360	0,526	NA	NA	NA	NA	NA	NA				203,2	8,0		21400	209,7	NA	NA

RESULTS (RESULTADOS):

SAMPLE (MUESTRA)	IDENTIFICATION (IDENTIFICACIÓN)																		
1	4488132	12,630	0,497	98,10	19513	43016	17860	39374	NA	0,0	PASS	8,9	184,5	7,258	S	19890	194,9	NA	0,780

PACKING (EMPAQUE):	CHEMICAL COMPOSITION (%) (COMPOSICIÓN QUÍMICA) (%):						REMARKS (OBSERVACIONES):
	HEAT (COLADA) N°:	C	Mn	P	S	Si	
Rolls (Rollos)	K715030329	0,82	0,62	0,012	0,017	0,21	

WIRE DIAMETERS (DIAMETROS ALAMBRES)		
UNITS (UNIDADES)	mm	in
CORE WIRE DIAMETER (DC) DIAMETRO ALAMBRE CENTRAL	4,3100	0,1697
OUTER WIRE DIAMETER (DE) DIAMETRO ALAMBRES EXTERNOS	4,2102	0,1658
DIFFERENCE (DC-DE) (DIFERENCIA)	0,0998	0,0039


ID DISPATCHED (ID despachados): 4488132, 4510006, 4510553, 4510556, 4510557, 4510558, 4510559

We report that the material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the customer's requirements, results valid only for the items listed in this report. This report may not be reproduced except in its entirety, unless written permission for reproduction has been obtained from the laboratory.
(Reportamos que el material aquí descrito se ha fabricado y probado con resultados satisfactorios de acuerdo con los requisitos solicitados por el cliente, resultados validos solo para los items relacionados en el presente informe. Este reporte no puede ser reproducido excepto en su totalidad, a menos que el permiso para reproducción haya sido obtenido por escrito a través del laboratorio)

STRESS Vs STRAIN (CURVA CARGA-ELONGACION) COIL SAMPLE (ROLLO MUESTRA): 4488132

Load Vs. Deformation graphic (Gráfico de tensión Vs. Deformación)

Extensometer (Extensometro)	Load (Carga)
mm	kgf
0,0000	1987,0
0,0500	3713,0
0,1000	5846,0
0,1500	7906,0
0,2000	10065,0
0,2500	12010,0
0,3000	13997,0
0,3500	15784,0
0,4000	17029,0
0,4500	17920,0
0,5000	17860,0



Graph scale (Escala del gráfico) 0 - 20000 kgf

X= Extensometer (Extensometro) mm

Test report according to ASTM A1061/A1061M-16, point 10 (Reporte de prueba de acuerdo con la norma ASTM A1061/A1061M-16, numeral 10)
The Modulus of elasticity reported as been calculated between 30% and 70% of breaking load of material. (El módulo de elasticidad reportado está calculado entre el 30% y 70% de la carga obtenida del material)

If you need confirm the authenticity of your test report please write to:
reportedeensayos@emcocables.co Or call to:
+57 (1) 7940359 ext. 2293

Si requiere confirmar la autenticidad de su reporte de ensaye, por favor escriba a:
reportedeensayos@emcocables.co o llame a:
+57 (1) 7940359 ext. 2293

Propiedad	Método utilizado
Resistencia mecánica	ASTM A1061
Dimensional	GAC-IT-002

VERSION: 3

REVISED BY (REVISADO POR)

JR. QUALITY LEADER. (LÍDER JR DE CALIDAD).

AUTHORIZED BY (AUTORIZADO POR)

(QUALITY MANAGER.) DIRECTOR DE CALIDAD (ENC)

FIN DEL REPORTE

reportes\t_pre.frx

Fecha y hora de generación: 03/12/2025 09:08:56 AM

PROALCO @ BEKAERT	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-81-11
		VERSION	7

INFORME DE ENSAYO Nº
DCEM 311 2025

FECHA DE ELABORACION
28/10/2025

OC	CLIENTE	CIUDAD
NA	G Y J FERRETERIA SA	GIRON
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg	

CODIGO DEL PRODUCTO:	270093	Nº FACTURA	FABQ-25194
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD	
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,03	

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
1320	25	33000

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad

Yesica Hernandez

Yesica Hernandez .

REALIZO: Auxiliar de Calidad Proalco Bekaert.

CONTROL CALIDAD

PROALCO @ BEKAERT

better together

"Se recomienda que la selección, separación y disposición de residuos de los Productos de Proalco SAS, se realice de acuerdo a la Norma técnica Colombiana GTC-24"

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 08-ene-26
Norma:

Consecutivo 8.545
Referencia: LIMPIADOR GERFOR. PVC-CPVC 1/4 GAL.
Lote de Fabricación: 30000083057

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
VOLUMEN	cm^3	NTC-576	946,00 - 960,00	960,00
DENSIDAD	g/cm^3	NTC-578	0,910 - 0,940	0,93

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 860502091
AUT. MEDELLIN KM 2, 800 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776648
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

Anexo 4. Resultado de ensayos.

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31, BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
23/02/2026	1	27/01/2026	004-26	HALCON DE GRANADA PEDECUESTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB conmitgacionpiedcdmb@hotmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	AREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm^2)	(mm)	(g)	(g/mm^3)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm^2)	ESPECIFICADA
1	23/01/2026	30/01/2026	7	INYECCIÓN DE LECHADA	52,66	52,23	2750	52,28	252,7	1,757	42700	20,7	15,5	2254	158,5	75%
1,1	23/01/2026	6/02/2026	14		52,32	50,13	2623	54,07	253,4	1,787	46700	20,7	18,8	2693	188,3	90%
1,2	23/01/2026	20/02/2026	28		52,3	52,26	2734	52,31	256,6	1,794	59360	20,7	21,7	3149	221,4	105%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.

- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUBMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISO		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleva la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

Anexo 5. Ficha de indicadores.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	8/03/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR											
Objetivo del Indicador	Evaluar el porcentaje de avance de obra ejecutado a lo largo del proyecto				Nombre del Indicador	Avance de obra					
Interpretación del Indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				Formula de calculo	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100					
Fuente de Información	Informes tecnicos mensuales de obra				Tipo de Indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				A quien se suministra	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico	70%

2. RESULTADOS 2020 - 2026															
Periodo	oct-20	nov-20	dic-20	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	5,12%	7,17%	11,32	16,82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1156,11%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	3,08%	1,33%	11,22	16,54%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1141,80%
Resultado	144,33%	338,30%	100,89%	101,31%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	101,41%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo del 13 y el 31 de octubre se evidencia el 144,68 % de avance general del proyecto donde se ejecutan actividades preliminares tales como el replanteo topográfico, la instalación de la valla informativa y el desmonte y limpieza a nivel superficial del retiro intervenido.
En el periodo del 01 al 30 de noviembre se evidencia el 338,15 % de avance general del proyecto donde se evidencia un avance positivo en la ejecución de la obra, se finalizan actividades preliminares en el frente Brisas de primavera y se inician actividades del frente Halcón de Granada.
En el periodo del 01 al 21 de diciembre se evidencia el 100,89% total de la ejecución del proyecto con un avance acumulado del 11,32%, superior al programado del 11,21%, evidenciando cumplimiento del cronograma. Se destacan avances en movimiento de tierra en el frente Brisas de Primavera, incluyendo la intervención de un área adicional aprobada, y el inicio del frente Halcón de Granada con ejecución organizada de actividades preliminares.
En el periodo del 01 al 21 de enero se evidencia cumplimiento del 101,31%, evidenciando un desempeño superior a lo programado (16,82% ejecutado vs 16,54% programado). Este resultado se debe a la culminación anticipada de los movimientos de tierra en el frente Brisas de Primavera y al inicio oportuno de las actividades de perforación e instalación de anclajes en el frente Halcón de Granada, lo que permitió optimizar la secuencia constructiva y mejorar el rendimiento del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	3
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				Nombre del indicador	Atención de quejas						
Interpretación del indicador	Porcentaje de quejas mensuales respecto al periodo inmediatamente anterior				Formula de calculo	(N° de quejas mes anterior - N° de quejas mes actual)/N° de quejas mes anterior)*100						
Fuente de información	No conformidades presentados por las partes interesadas				Tipo de indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra				A quien se comunica	General general						
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Descendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Crítico		70%

2. RESULTADOS 2025 - 2026

Periodo	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
N° de quejas mensuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de quejas del mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y 31 de octubre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero 2026 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	30/03/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR														
Objetivo del indicador	Identificar el porcentaje de multas en los proyectos				Nombre del indicador	Multas en los proyectos								
Interpretación del indicador	Porcentaje de multas mensuales				Formula de calculo	(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual)/N° de multas mes anterior)*100								
Fuente de información	Correspondencia de multas generadas en el periodo				Tipo de indicador	Cuantitativo								
Responsable de medición	Director de obra				A quien se entrega	Gerente general								
Frecuencia	Mensual	Semestral	Anual	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	95%	Nivel Critico			90%	

2. RESULTADOS 2024 / 2025															
Periodo	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	Logro
N° de multas mes anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de multas mes actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo comprendido entre el 10 y el 31 de octubre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre no se presentaron multas que afecten al desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero no se presentaron multas que afecten al desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	GST-F-46
		FECHA	1/1/2021
		VERSIÓN	3
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del Indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				Nombre del Indicador	Desempeño de proveedores						
Interpretación del Indicador	Medir la eficacia de los proveedores				Formula de calculo	Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores						
Fuente de Información	Evaluación de desempeño de proveedores				Tipo de Indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Coordinador de compras				A quien se comunica	Gerente general						
Frecuencia	Anual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	90%	Nivel Crítico	75%	

2. RESULTADOS 2024/2025

Periodo	may-25
Suma de calificación de proveedores	4.85
Mayor calificación	5.00
Resultado	97%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se realiza evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (97% satisfactorio) de los proveedores involucrados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de generlos un conocimiento y resaltar el compromiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN


Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-xx
		FECHA	2/03/2021
		VERSIÓN	3
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR											
Objetivo del indicador	Identificar el cumplimiento de plan de capacitación				Nombre del indicador	Cumplimiento del plan de capacitación organizacional					
Interpretación del indicador	capacitaciones				Formula de calculo	#Y de capacitaciones programadas/#Y de cumplimientos ejecutadas(*100					
Fuente de información	Plan de capacitación				Tipo de indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador recursos humanos				A quien se comunica	Gerencia					
Frecuencia	mensual	Trimestral	Anual/mes	Unidad	porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	50%	Nivel Crítico	0%

2. RESULTADOS															
PERIODO EVALUADO															
Periodo	oct-20	nov-20	dic-20	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	Logros
# capacitaciones ejecutadas	2,00	4,00	6,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
# capacitaciones programadas	2,00	4,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
Resultado	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%

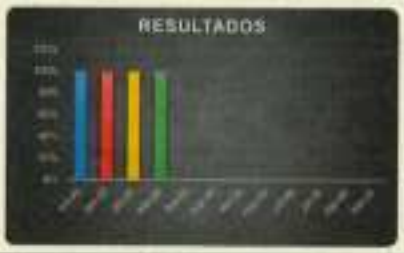

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para el periodo se desarrollaron 2 capacitaciones, 1 del área SST; Funciones y responsabilidades en el SGSST, 1 capacitación del área ambiental y social; Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria.
para el periodo comprendido entre 01 al 30 noviembre 2020, se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Identificación de peligros y riesgos en el trabajo, Actos y condiciones inseguras en el trabajo. 1 capacitación del área ambiental Clasificación de Residuos – Manejo adecuado del Punto Ecológico, y 1 social; Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria.
para el periodo comprendido entre 01 al 31 diciembre 2020, se presentaron 6 capacitaciones. 4 del área SST; Actores Viales y señales de tránsito, Pausas de microbreles y ocasionales laborales, Uso Adecuado de elementos de protección personal y Funciones de los integrantes del copasst 1 capacitación del área ambiental política ambiental y política de orden y aseo, y 1 social; Fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad
para el periodo comprendido entre 01 al 31 enero 2020, se presentaron 7 capacitaciones. 5 del área SST; Higiene Postural, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, Pausas Activas, Política sst y Peligros locativos 1 capacitación del área ambiental, control de emisiones atmosféricas, y 1 social; Fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atención a la comunidad.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

ANEXO NO.6: ACTAS DE REUNIÓN O COMITÉS DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Procesо Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
LUGAR:	Frente de Brisas de Primavera y Halcón de Granada - Piedecuesta, Santander

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
05	23	01	26
Hora Inicio	9:00 AM		
Hora final	11:00 PM		

AGENDA

No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Saludo y presentación de los profesionales asistentes a la reunión. Seguimiento al avance del proyecto.	Contratista – Interventoría
2	Recorrido y revisión del avance físico de obra.	Contratista – Interventoría
3		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Se inicia comité con profesionales del contratista e interventoría, realizando como primera medida la presentación de los profesionales asistentes de parte del Contratista de obra y de la Interventoría.
2	Se realiza recorrido y revisión del avance físico en la ejecución de obra en los dos frentes de trabajo: 1. Brisas de Primavera. En este frente de trabajo se han iniciado las actividades en relación con el cambio del tipo de sistema de estabilización que implicó la ampliación de del área de intervención del talud en 864m2.

	A la fecha se han adelantado actividades de replanteo y ubicación del área de ampliación de intervención, así como la ubicación de los puntos de anclaje sobre el talud. Adicionalmente se han ejecutado actividades de excavaciones sobre el talud, perfilado a mano descolgado y el cargue y retiro de material sobrante de excavaciones. El pasado 22 de enero de 2026 se realizó socialización con la comunidad por los cambios generados en esta área de intervención. 2. Halcón de Granada. A la fecha evidencia el avance en el replanteo del talud, realizando la ubicación de los puntos de anclajes del mismo; se ha realizado el armado del cuerpo de los anclajes y se iniciaron con las perforaciones sobre el talud. Durante la semana se han ejecutado estas actividades de manera continua, conforme a la programación establecida, garantizando el adecuado desarrollo de los frentes de trabajo.
3	Durante el recorrido, la interventoría puede verificar el cumplimiento de la ejecución de obra conforme a la programación, al igual que la presencia del personal de obra y la maquinaria necesaria para el buen desarrollo de las actividades.
4	

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Realizar revisión de los avances de obra en los dos frentes de trabajo.	Interventoría	-
2			-

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

3			

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:		**HORA:**		**LUGAR:**	

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Jhon Alexander González Rivera	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Andrea Karina Quintero Ortiz	Residente de interventoria	

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
LUGAR:	Frente de obra del barrio Brisas de Primavera.

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
05	23	01	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jhon Alexander González Rivera	x		Residente de Obra	Contratista	
2	Andrea Karina Quintero Ortiz		x	Residente de interventoría	Interventoría	
3						
4						
5						
6						

Género: M: Masculino / F: Femenino
