INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1024 de 2023 CON OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.



INFORME MENSUAL DEL CONTRATO No. 1045 DE 18-12-2025 CON OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CRESSE CONSULTING S.A.S

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

2. DOCUMENTOS LEGALES 8

2.1 ULTIMA PÓLIZA Y CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA MISMA. 8

3. DOCUMENTOS TECNICOS 10

4. GENERALIDADES. 11

4.1 GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 11

4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 13

5. ASPECTOS TÉCNICOS. 14

5.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 14

6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 16

6.1 ACTIVIDADES CONTRACTUALES 16

6.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO N°1045 DEL 2025. 18

6.3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. 20

6.4 INCONVENIENTES TÉCNICOS Y DETERMINACIONES. 78

6.5 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (OBRA EJECUTADA VS OBRA PROGRAMADA) 78

6.5.1 ACOMULADO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO No 1045 DE 2025 78

6.6 RESUMEN DE ENSAYOS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 79

6.7 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 80

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 88

7.1 PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO 89

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 91

8. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 92

8.1 CONTROL DE PÓLIZAS 92

8.2 CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL. 94

8.2.1 SEGURIDAD CONTRATO DE OBRA No. 1045 DE 2025 94

8.2.2 SEGURIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1024 DE 2025 95

8.3 CONTROL DE CORRESPONDENCIA. 95

8.4 CONTROL ACTAS DE COMITÉ 98

9. ASPECTOS FINANCIEROS 98

9.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 1045 DE 2025 98

9.2 GRAFICA DE AVANCE EJECUTADO OBRA CONTRATO 1045 DE 2023. 98

9.3 INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° 1045 2023..... 99

9.3.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO 1045 DE 2025. 99

9.3.2 CONCILIACIÓN BANCARIA PARA MENEJO DE ANTICIPO. 99

9.4 INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1024 2023…… 99

10. CONCLUSIONES 100

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL PMA - PMT

ANEXO 2: PÓLIZAS APROBACION

ANEXO 3: -SEGURIDAD SOCIAL

-NOMINAS

ANEXO 4: ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 5: ACTAS GENERADAS

ANEXO 6: COMITES

ANEXO 7: CORRESPONDENCIA

ANEXO 8: BITÁCORA

ANEXO 9: INFORMES SEMANALES

GUÍA DE TABLAS

Tabla 1: *Control de Pólizas Contrato de Consultoría*

Tabla2: *Control de Pólizas Contrato de Obra*

Tabla 3: *Control cronológico*

Tabla 4: *Control de Pólizas Contrato de Interventoría*

Tabla 5: *Control de actas Contrato de Consultoría*

Tabla 6: *Control de actas Contrato de obra*

Tabla 7: *profesionales asociados al proyecto contrato de Interventoría n°1024 2023*

Tabla 8: *profesionales asociados al proyecto contrato de Obra n°1045 2025*

Tabla 9: *personales asociados al proyecto contrato de Obra N°1045 2025*

Tabla 10: *maquinaria y equipo contrato de Obra N°1045 2025*

Tabla 11: *Relación de correspondencia contrato de obra n°1045 2025*

Tabla 12: *Relación de correspondencia contrato de obra n°1024 2025*

Tabla 13: *control de comités contrato de obra N°1024 2025*

1. INTRODUCCIÓN

La empresa **CRESSE CONSULTING S.A.S** presenta ante la Alcaldía de Aguazul el **INFORME MENSUAL** de **INTERVENTORIA** del proceso de ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1045 DEL 2025, donde se avala como **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1024 de 2025** cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE**, la cual realiza seguimiento y control al Contrato de Obra **No. 1045 DE 2025** cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE,** a nombre del **CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025**.

El siguiente documento contiene la información técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental, salud y seguridad en el trabajo de las actividades ejecutadas durante el periodo del 26 de enero del 2026 hasta el 26 de febrero del 2026 correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de Obra pública **No. 1045 DE 2025,** actividades que fueron verificadas en campo y que se manifiestan en el presente informe.

2. DOCUMENTOS LEGALES

2.1 ULTIMA PÓLIZA Y CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA MISMA.

Dentro de las actividades que desarrolla la interventoría del proyecto durante la ejecución de este se encuentra el seguimiento y control de las pólizas que el contratista **CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025** ha adquirido para el contrato **N° 1045 de 2025**, con el fin de dar cobertura y garantía al proyecto, las siguientes pólizas o garantías están de acuerdo con la ley y parámetros de la entidad contratante, suscrita por la compañía de AFIANZADORA DE ORIENTE S.A.S y para la interventoría ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Relación de documentos en **ANEXO 2 DE INTERVENTORIA.**

Tabla 1: Control de Pólizas Contrato de Consultoría

CONTROL DE POLIZAS CUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA – ACTA INICIO					
CONTRATO No.	1024 DE 2025				
CONTRATISTA	CRESSE CONSULTING SAS				
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101008677	17-12-2025	17-10-2026	$ 9.731.650,80
ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	17-10-2026	$ 48.658.254,00

PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	19-04-2029	$ 4,865.825,40
CALIDAD DEL BIEN	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	17-10-2030	$ 9.731.650,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
PREDIOS , LABORES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101003929	17-12-2025	19-04-2026	$ 284,700,000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	19-04-2026	$ 284,700,000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	19-04-2026	$ 284,700,000,00

Tabla2: *Control de Pólizas Contrato de Obra*

CONTROL DE POLIZAS CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA – ACTA INICIO					
CONTRATO No.	1045 DE 2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025				
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	NB-100423897	26-01-2026	10-11-2026	$ 106.855.699,00

BUEN MANEJO DE ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL		26-01-2026	10-11-2026	$ 534.278.495,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL		26-01-2026	10-05-2029	$ 53.427.849,00
ESTABILIDAD	SEGUROS MUNDIAL		10-05-2026	10-05-2031	$ 320.567.097,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	NB-100112749	18-12-2025	10-05-2026	284.700.000,00

3. DOCUMENTOS TECNICOS

Relación de actividades contiene la información técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental, salud y seguridad en el trabajo de las actividades ejecutadas en el presente periodo del desde el 26 de enero del 2026 hasta el 26 de febrero del 2026 correspondiente al mes (1) uno de ejecución del contrato de Obra pública **N° 1045 DE 2025,** actividades que fueron verificadas en campo y que se manifiestan en el presente informe, dependiendo su componente.

El proyecto fase (2) dos de reforzamiento estructural de la torre 17 en la Ciudadela La Esperanza teniendo como objetivo la **CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE,** para mejorar la capacidad de carga y la seguridad de estas edificaciones, la intervención incluye verificación y aprobación detallada del estado actual de las estructuras mediante inspecciones visuales, ensayos ejecución de obra y evaluación de trabajo, Se seguimiento a los sistemas de refuerzo en los cimientos para aumentar la estabilidad y resistencia sísmica; Los

trabajos se realizaron siguiendo las normativas vigentes y garantizando la mínima interrupción para los residentes.

Se suministra la información necesaria para el reforzamiento estructural de la edificación.

• Se verificaron y aprobaron las condiciones de la edificación reforzada con respecto a las exigencias de la Norma Sismo resistente vigente.

• Se revisó el cumplimiento de elementos reglamentarios respecto al título D de la NSR-10.

• Dar seguimiento a los planos de reforzamiento estructural para los elementos de la edificación.

4. GENERALIDADES.

4.1 GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

PRESENTADO POR: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1024 DE 2025.

ASUNTO: INFORME MENSUAL No.1 CONTRATO DE OBRA N°1045 DE 2025.

Tabla 3: Control cronológico obra

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO INICIAL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDIA DE AGUAZUL
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
N.I.T.	902.017.884-0
CONTRATO DE OBRA No.	1045
FECHA DEL CONTRATO	18-12- 2025
PLAZO (MESES)	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 DE MAYO 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 1,068,556,990.00
VALOR DEL ANTICIPO	NO ESTÁ EFECTUADO AÚN

Tabla 4: *Control cronológico interventoría*


CONTRATO DE INTERVENTORIA	
INTERVENTOR	CRESSE CONSULTING S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
NIT	900.842.743-1
CONTRA DE COSULTORÍA N°	1024 DE 2025
FECHA DEL CONTRATO	04-12- 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO (MESES)	CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIACIÓN	16-12- 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	15-04- 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 97.316.508.00
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 48.658.254,00
SUPERVISIÓN	ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los trabajos del objeto del contrato de obra se desarrollan en EL bloque 17 de apartamentos de la Ciudadela La Esperanza, el cual se encuentra localizada en el municipio de Aguazul con coordenadas 5°10′53.43″N 72°32′54.39″O – Departamento de Casanare, región central, en el cruce de caminos de la vía Marginal del Llano, la vía del Cusiana y el acceso al municipio de Maní. Se ubica en la margen izquierda del rio Únete, en su salida de las montañas al Llano.

Imagen 1: *Ubicación Proyecto*

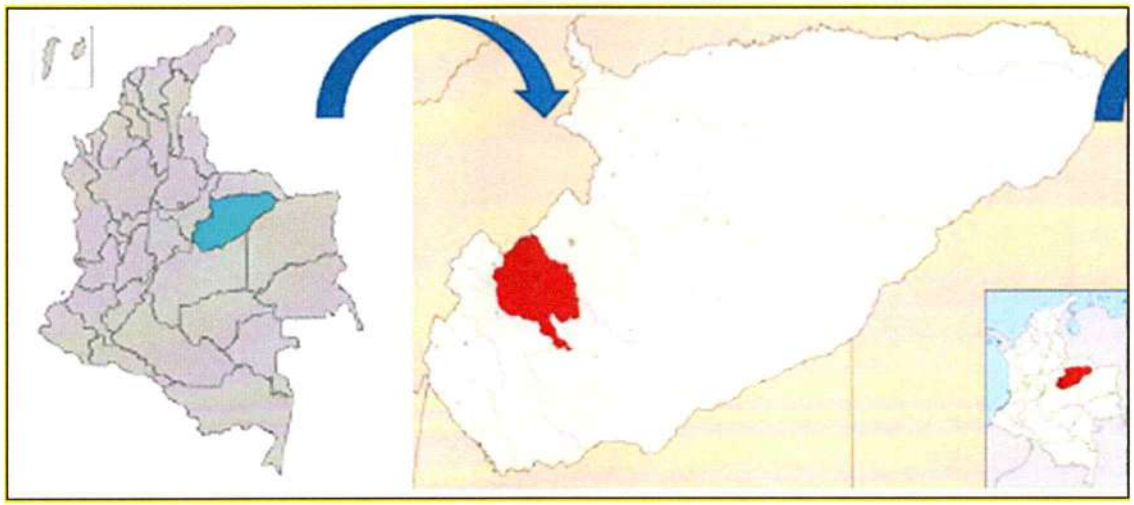



5. ASPECTOS TÉCNICOS.

5.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La administración municipal a través de su plan de desarrollo 'LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024-2027"cuenta con mecanismos de interrelación para desarrollar actividades que realicen la cobertura total del territorio urbano y rural del municipio, vinculando a la totalidad de la población de acuerdo a los diferentes sectores de las líneas estratégicas. Es por esta razón, que bajo las facultades que lo determinan la administración realizó la actualización a través de la Resolución No. 189 del 25 de noviembre de 2020, en la cual realizó la inclusión o agrupamiento de los diferentes procesos referente al sistema de gestión de calidad y modelo integrado de planeación y Gestión MIPG. Por lo cual se adoptó el SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD en el municipio, realizando la articulación de los objetivos estratégicos del direccionamiento estratégico. De acuerdo a lo estipulado a través del plan de desarrollo con vigencia 2024-2027 'LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL" aprobado mediante ACUERDO No. 021 (DEL 31 DE MAYO DE 2024), que dentro de la LINEA AGUAZUL A LA VANGUARDIA DIGITAL,INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA, el cual para el presente proceso se enmarca dentro del sector VIVIENDA,CIUDAD Y TERRITORIO, cuenta con el programa Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, donde se incorpora el programa de ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA.

La Administración Municipal de Aguazul, comprometida con sus objetivos misionales y generadora de espacios de desarrollo social y económico, ve imprescindible aunar los esfuerzos necesarios para garantizar excelentes condiciones en todos los recursos físicos con

los que cuenta actualmente el municipio. Esto es esencial para el óptimo funcionamiento y en beneficio de la comunidad de Aguazul.

En el marco de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, la Secretaria de Infraestructura es responsable de gestionar la infraestructura física del municipio desde su planificación, construcción, adecuación y mantenimiento a obras públicas de infraestructura vial, educativa, deportiva, agua potable ,saneamiento básico, energía, gas y equipamiento municipal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; así mismo, a través del Sistema de Gestión Integral de Calidad se establece el proceso de Gestión de la Infraestructura, con programas encaminados al acceso a una vivienda digna y adecuada para las familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, es un compromiso fundamental en el Municipio de Aguazul.

Pese a las deficiencias presentadas en los bloques de apartamentos de la Ciudadela La Esperanza, el Tribunal Administrativo de Casanare el día 13 de diciembre de 2018 generó un fallo en segunda instancia, el cual le ordenó al municipio de Aguazul realizar actuaciones tendientes a obtener la perfección de los estudios técnicos integrales, realizar el diagnóstico del estado general de la situación en perspectiva estructural, evaluar informes finales de los consultores, escoger alternativas y preparar un presupuesto oficial para futuros trabajos u otras soluciones que permitan la concreción de obras que brinden soluciones eficaces a la situación presentada en la Ciudadela la esperanza, así coma presentar informes trimestrales de avance para dar cumplimiento en la sentencia del fallo 09/VIII/2016 del juzgado 2 administrativo de Yopal.

De acuerdo con lo anterior, la administración municipal adelantó procesos con el fin de dar cumplimiento y mejorar la calidad de vida de los habitantes, de esta manera se realizó un estudio de patología y vulnerabilidad de la Ciudadela La Esperanza, donde se evidenció que la mayoría de los materiales de mampostería no cumplen con la resistencia mínima requerida, lo cual generó preocupaciones desde la fase de construcción. Además, el análisis de vulnerabilidad sísmica reveló deficiencias estructurales importantes, como la inadecuada rigidez de la escalera metálica, que excede los desplazamientos permitidos por norma y podría colisionar con la edificación principal durante un sismo. También se identificó una secuencia progresiva de fallas en muros de varios pisos, principalmente por esfuerzos de flexo-compresión, lo que llevó a recomendar un reforzamiento estructural a los 20 bloques de apartamentos de la Ciudadela.

Conforme a lo previamente descrito, el municipio procede a proponer el reforzamiento de los muros de mampostería estructural, de esta manera la Administración Municipal para el año 2023, celebró un contrato mediante el proceso de Licitación obra Pública, Proceso Número: MA-SI-LP-011-2023, contrato número:0730-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUÉS DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

6. DESARROLLO DEL PROYECTO.

6.1 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

CONDICIONES INICIALES CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	364.42	$ 11,390.00	$ 4,150,744.00
1.02	Demolicion a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02m	m²	68.52	$ 17,419.00	$ 1,193,550.00
1.03	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	m²	68.52	$ 96,976.00	$ 6,644,796.00
1.04	Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m	und	16.00	$ 202,568.00	$ 3,241,088.00
1.05	Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.	und	16.00	$ 380,218.00	$ 6,083,488.00
1.06	Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi	und	4.00	$ 924,139.00	$ 3,696,556.00
1.07	Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye accesorios.	und	2.00	$ 607,461.00	$ 1,214,922.00
1.08	Traslado de timbres	und	16.00	$ 108,593.00	$ 1,737,488.00
1.09	Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua de 1/2" y 3/4". Suministro e Instalacion	und	16.00	$ 91,528.00	$ 1,464,448.00
2	RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES				
2.01	Excavacion a mano en material comun	m³	39.99	$ 53,778.00	$ 2,150,582.00
2.02	Excavacion manual en conglomerado	m³	51.64	$ 83,749.00	$ 4,324,798.00
2.03	Demolicion cimientos enterrados con retiro	m³	2.14	$ 590,753.00	$ 1,264,211.00
2.04	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material	m²	27.86	$ 32,207.00	$ 897,287.00
2.05	Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	51.64	$ 111,209.00	$ 5,742,833.00
2.06	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	3.23	$ 686,909.00	$ 2,218,716.00
2.07	Limpieza franja de trabajo	m²	27.86	$ 5,510.00	$ 153,509.00
2.08	Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.	m³	17.04	$ 1,375,866.00	$ 23,444,757.00
2.09	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	21,240.39	$ 7,804.00	$ 165,760,004.00
2.10	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	86.10	$ 35,878.00	$ 3,089,096.00
3	REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO				
3.01	Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar	m²	33.95	$ 109,418.00	$ 3,714,741.00
3.02	Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.	m²	350.45	$ 300,806.00	$ 105,417,463.00
3.03	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	8,472.97	$ 7,804.00	$ 66,123,058.00
3.04	Conector de cortante de Ø 3/8" x 570 mm con epoxico (incluye perforación L=200 mm). Suministro e Instal.	und	2,272.00	$ 31,162.00	$ 70,800,064.00
3.05	Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.	und	10,164.00	$ 16,810.00	$ 170,856,840.00
3.06	Piso porcelanato rectificado gris claro caras diferenciadas 60x60 cm de corona o similar	m²	85.95	$ 131,778.00	$ 11,326,319.00
3.07	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	392.37	$ 30,637.00	$ 12,021,040.00

3.08	Limpieza mamposteria a la vista con acido	m²	727.73	$ 13,705.00	$ 9,973,540.00
3.09	Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	m	39.80	$ 62,094.00	$ 2,471,341.00
4	**REFORZAMIENTO PUNTO FIJO**				
4.01	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	1,528.84	$ 22,394.00	$ 34,236,843.00
4.02	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	737.35	$ 22,003.00	$ 16,223,912.00
4.03	Reubicacion de viga IPE 220*110*6mm de estructura metalica en Acero ASTM - A500 C	kg	597.36	$ 15,489.00	$ 9,252,509.00
4.04	Esmalte sobre lamina lineal	ml	22.80	$ 13,841.00	$ 315,575.00
4.05	Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura	und	16.00	$ 275,698.00	$ 4,411,168.00
4.06	Pintura para baranda metalica	ml	144.00	$ 57,273.00	$ 8,247,312.00
5	**REPOSICION DE ANDENES**				
5.01	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	27.60	$ 40,036.00	$ 1,104,994.00
5.02	Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m.	m²	77.27	$ 106,817.00	$ 8,253,750.00
5.03	Alistado de pisos e= 0.05 m	m²	77.27	$ 37,956.00	$ 2,932,860.00
5.04	Sub base Granular para bacheo (Art. 320.2 INVIAS)	m³	80.00	$ 124,128.00	$ 9,930,240.00
5.05	Malla Electrosoldada Q-5 o M 188	m²	77.27	$ 25,282.00	$ 1,953,540.00
6	**ADECUACIONES HIDROSANIARIAS**				
6.01	Desmonte De Canales Y Bajantes De Aguas Lluvias	m	20.64	$ 3,807.00	$ 78,576.00
6.02	Bajante aguas negras-grises 6"	m	20.64	$ 116,747.00	$ 2,409,658.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 790,528,216.00**
	ADMINISTRACION (29,17%)				$ 230,597,081.00
	IMPREVISTO (1%)				$ 7,905,282.00
	UTILIDAD (5%)				$ 39,526,411.00
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 1,068,556,990.00**

6.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO N°1045 DEL 2025.

CONDICIONES ACTUALIZADAS						EJECUTADO MES (1)		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	VR. TOTAL	%
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.01	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	364.42	$ 11,390.00	$ 4,150,744.00	364.42	$ 4,150,743.80	100.00 %
1.02	Demolicion a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02m	m²	68.52	$ 17,419.00	$ 1,193,550.00	18.14	$ 315,980.66	26.47%
1.03	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	m²	68.52	$ 96,976.00	$ 6,644,796.00	68.52	$ 6,644,795.52	100.00 %
1.04	Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m	und	16.00	$ 202,568.00	$ 3,241,088.00	16.00	$ 3,241,088.00	100.00 %
1.05	Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.	und	16.00	$ 380,218.00	$ 6,083,488.00	16.00	$ 6,083,488.00	100.00 %
1.06	Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi	und	4.00	$ 924,139.00	$ 3,696,556.00	4.00	$ 3,696,556.00	100.00 %
1.07	Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye accesorios.	und	2.00	$ 607,461.00	$ 1,214,922.00	-	$ -	0.00%
1.08	Traslado de timbres	und	16.00	$ 108,593.00	$ 1,737,488.00	-	$ -	0.00%
1.09	Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua de 1/2" y 3/4". Suministro e Instalacion	und	16.00	$ 91,528.00	$ 1,464,448.00	-	$ -	0.00%
2	RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES							
2.01	Excavacion a mano en material comun	m³	39.99	$ 53,778.00	$ 2,150,582.00	39.99	$ 2,150,582.22	100.00 %
2.02	Excavacion manual en conglomerado	m³	51.64	$ 83,749.00	$ 4,324,798.00	51.64	$ 4,324,798.36	100.00 %
2.03	Demolicion cimientos enterrados con retiro	m³	2.14	$ 590,753.00	$ 1,264,211.00	2.14	$ 1,264,211.42	100.00 %
2.04	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material	m²	27.86	$ 32,207.00	$ 897,287.00	27.86	$ 897,287.02	100.00 %
2.05	Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	51.64	$ 111,209.00	$ 5,742,833.00	51.64	$ 5,742,832.76	100.00 %
2.06	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	3.23	$ 686,909.00	$ 2,218,716.00	3.23	$ 2,218,716.07	100.00 %
2.07	Limpieza franja de trabajo	m²	27.86	$ 5,510.00	$ 153,509.00	27.86	$ 153,508.60	100.00 %
2.08	Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.	m³	17.04	$ 1,375,866.00	$ 23,444,757.00	17.04	$ 23,444,756.64	100.00 %
2.09	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	21,240.39	$ 7,804.00	$ 165,760,004.00	1,711.09	$ 13,353,346.36	8.06%
2.10	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	86.10	$ 35,878.00	$ 3,089,096.00	86.10	$ 3,089,095.80	100.00 %
3	REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO							

3.01	Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar	m²	33.95	$ 109,418.00	$ 3,714,741.00	33.95	$ 3,714,741.10	100.00 %
3.02	Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.	m²	350.45	$ 300,806.00	$ 105,417,463.00	-	$ -	0.00%
3.03	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	8,472.97	$ 7,804.00	$ 66,123,058.00	2,050.00	$ 15,998,200.00	24.19%
3.04	Conector de cortante de Ø 3/8" x 570 mm con epoxico (incluye perforación L=200 mm). Suministro e Instal.	und	2,272.00	$ 31,162.00	$ 70,800,064.00	125.00	$ 3,895,250.00	5.50%
3.05	Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.	und	10,164.00	$ 16,810.00	$ 170,856,840.00	652.00	$ 10,960,120.00	6.41%
3.06	Piso porcelanato rectificado gris claro caras diferenciadas 60x60 cm de corona o similar	m²	85.95	$ 131,778.00	$ 11,326,319.00	-	$ -	0.00%
3.07	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	392.37	$ 30,637.00	$ 12,021,040.00	-	$ -	0.00%
3.08	Limpieza mamposteria a la vista con acido	m²	727.73	$ 13,705.00	$ 9,973,540.00	-	$ -	0.00%
3.09	Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	m	39.80	$ 62,094.00	$ 2,471,341.00	-	$ -	0.00%
4	**REFORZAMIENTO PUNTO FIJO**							
4.01	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	1,528.84	$ 22,394.00	$ 34,236,843.00	-	$ -	0.00%
4.02	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	737.35	$ 22,003.00	$ 16,223,912.00	-	$ -	0.00%
4.03	Reubicacion de viga IPE 220*110*6mm de estructura metalica en Acero ASTM - A500 C	kg	597.36	$ 15,489.00	$ 9,252,509.00	-	$ -	0.00%
4.04	Esmalte sobre lamina lineal	ml	22.80	$ 13,841.00	$ 315,575.00	-	$ -	0.00%
4.05	Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura	und	16.00	$ 275,698.00	$ 4,411,168.00	-	$ -	0.00%
4.06	Pintura para baranda metalica	ml	144.00	$ 57,273.00	$ 8,247,312.00	-	$ -	0.00%
5	**REPOSICION DE ANDENES**							
5.01	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	27.60	$ 40,036.00	$ 1,104,994.00	18.69	$ 748,118.49	67.70%
5.02	Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m.	m²	77.27	$ 106,817.00	$ 8,253,750.00	-	$ -	0.00%
5.03	Alistado de pisos e= 0.05 m	m²	77.27	$ 37,956.00	$ 2,932,860.00	-	$ -	0.00%
5.04	Sub base Granular para bacheo (Art. 320.2 INVIAS)	m³	80.00	$ 124,128.00	$ 9,930,240.00	-	$ -	0.00%
5.05	Malla Electrosoldada Q-5 o M 188	m²	77.27	$ 25,282.00	$ 1,953,540.00	-	$ -	0.00%
6	**ADECUACIONES HIDROSANIARIAS**							
6.01	Desmonte De Canales Y Bajantes De Aguas Lluvias	m	20.64	$ 3,807.00	$ 78,576.00	-	$ -	0.00%
6.02	Bajante aguas negras-grises 6"	m	20.64	$ 116,747.00	$ 2,409,658.00	-	$ -	0.00%


TOTAL COSTO DIRECTO	$ 790,528,216.00	AVACE 14.68%	$ 116,088,217	
ADMINISTRACION (29,17%)	$ 230,597,081.00			
IMPREVISTO (1%)	$ 7,905,282.00			
UTILIDAD (5%)	$ 39,526,411.00			
COSTO TOTAL PROYECTO	$ 1,068,556,990.00			

6.3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD: M2	
1.01 Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	CAN	EJECUTADA
	364.42	364.42

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verificaron las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano.
- Se verifico en el replanteo los ejes principales para generar línea de referencia para elaborar la actividad a ejecutar.
- A partir de los ejes principales se trazaron los ejes definitivos colocando estacados en el perímetro del terreno y a partir de estos se colocaron los hilos de referencia.
- Se establece y conserva los sistemas de referencia planímetro y altimétrico.
- Para comprobar ángulos rectos de 90° se utiliza método 3-4-5 que proviene del teorema de Pitágoras.
- Se utiliza nivel de manguera.
- Con ayuda de plomada bajo los niveles ya referenciados se macaron lápiz rojo.

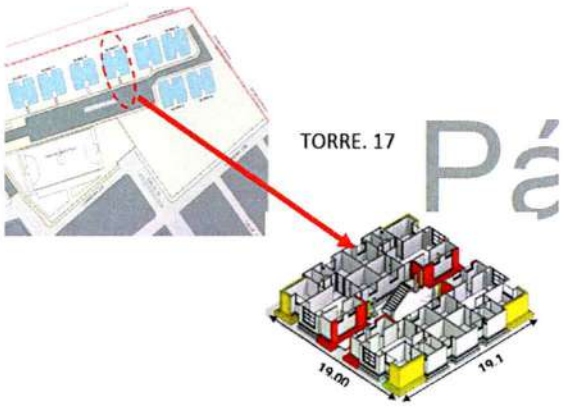

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD: M2	
1.02 Demolición a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02 m	**CAN**	**EJECUTADA**
	68.52	18.14

Se verifican las cantidades de demolición a mano alistado o mortero de piso e= 0.02 m de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se ubicó el lugar de trabajo.
- Se verifico en el lugar de demolición, este libre de objetes que obstruyan la actividad.
- Se retiró el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y puntero.
- se verificaron las áreas de demolición según planos.
- se verifico la demolición con, maceta y puntero.

	• se verifico la demolición con maceta y puntero. • se verificaron acopios de del escombro proveniente de la demolición para posterior retiro.
	• se verifico la demolición con maceta y puntero.
	• se verifico la demolición con maceta y puntero.

1. REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD: M2	
1.03 Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	**CAN**	**EJECUTADA**
	68.52	68.52

Se verifico la demolición de placas de piso, previamente indicadas en los planos de diseño en donde se tuvieron en cuenta:

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se adecuaron zonas de demolición para los procesos constructivos que se realizaran en estas zonas.
- Se realizó corte mecánico en la placa hasta donde la actividad lo requiera teniendo en cuenta los planos constructivos.
- Se realizó acopio del escombro proveniente de la demolición.
- Retiro de escombro.



- Demoliciones con equipo rotomartillo.
- Se verificaron acopios de escombro proveniente de la demolición para posterior retiro.

	• Se verificaron acopios de escombro proveniente de la demolición para posterior retiro.
	• Demoliciones con equipo rotomartillo.
	• Se verificaron acopios de escombro proveniente de la demolición para posterior retiro. • Acopio de demolición.

	• Se verifico la demolición con los equipos y herramienta necesaria. • Se verificaron acopios de escombro proveniente de la demolición para posterior retiro.
	• Demoliciones con equipo rotomartillo. • Se verificaron acopios de escombro proveniente de la demolición para posterior retiro.

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD: UN**	
1.04 Reubicación de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m	**CAN**	**EJECUTADA**
	16	16

Consiste en el suministro e instalación de tubería en PVC y accesorios necesarios de la reubicación de los medidores existentes, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en NTC 382.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Retiro de instalación existente
- Instalar el medidor sobre tubería recta, alejado de cualquier codo o conexión que genere turbulencia.

- Colocar el medidor de manera horizontal al piso y con el registro hacia arriba.
- Colocar una caja de protección para evitar daños o golpes al medidor.

	• Adecuación zona traslado medidor de agua.
	• Traslado de medidor de agua
	• Traslado de medidor de agua

	• Traslado de medidor de agua

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES -	UNIDAD: UND	
1.05 Reubicación de medidor de gas incluye accesorios	**CAN**	**EJECUTADA**
	16	16

Este ítem hace referencia a la reubicación de las instalaciones de tubería de cobre para gas de ½" en la edificación para el suministro de gas. Para la ejecución de los trabajos, el contratista realizo la secuencia que se nombrará a continuación: Consulto planos de instalaciones de la red de gas o Consultar y cumplir con las especificaciones y reglamentos de la empresa que presta el servicio de gas. Realizo las adecuaciones en los muros y/o pisos para el tendido e instalación de la tubería.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Retiro de instalación existente
- Instalar el medidor sobre tubería recta, alejado de cualquier codo o conexión que genere turbulencia.
- Colocar el medidor de manera horizontal al piso y con el registro hacia arriba.
- Colocar una caja de protección para evitar daños o golpes al medidor.

	• Adecuación zona traslado medidor de gas.
	• Adecuación zona traslado medidor de gas.
	• Adecuación zona traslado medidor de gas.

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD: UND	
1.06 Caja de inspección de 70x70 con excavación, base recebo, marco y tapa concreto reforzado de 3000 psi.	**CAN**	**EJECUTADA**
	4	4

Ejecución de cajas de inspección para complementar las redes de tuberías de los diferentes sistemas de desagüe y drenaje.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se consultó Planos de Detalle del Proyecto Sanitario.
- Se Verifico excavaciones y niveles de fondo.
- Se Cubrió el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm.
- Se fundió una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 140 kg. /cm², con el espesor que se indique en los Planos Hidráulicos.
- Se elaboró regatas en las paredes en ladrillo recocido, unidas con mortero de las Especificaciones dadas.
- Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor.
- Se ejecutó en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente del 5% y en la dirección del flujo.
- tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 60 a 80 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 p.s.i. ó de 140 kg. /cm.²; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro de 2" x 2" x 1/8", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas, o por lo menos en la última caja del sistema.
- Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación.
- Se verifico niveles finales para aceptación.

	• Localización de caja existente, para posterior demolición.
	• Caja de inspección de 70x70 con excavación, base recebo, marco y tapa concreto reforzado de 3000 psi..
	• Caja de inspección de 70x70 con excavación, base recebo, marco y tapa concreto reforzado de 3000 psi..

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: M3	
2.01 Excavación a mano en material comun	**CAN**	**EJECUTADA**
	39.99	39.99

Se verifico la remoción y retiro de todo material común necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad con las dimensiones señaladas en los planos de detalle.

Se realizó excavaciones la cuales quedaron limpias y niveladas horizontalmente de acuerdo con los planos de diseño.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se consultaron recomendaciones de estudio de suelos.
- Se verificaron los procesos constructivos.
- Se corroboro la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.
- Se verifico mano de obra herramientas y /o equipos necesarios para la extracción de materiales excavados.
- Se depositó la tierra proveniente de excavación mínimo a un metro del borde de la excavación.
- Se verificaron niveles inferiores de excavación y ancho planteado en el diseño del recalce.
- Se cargó y retiro sobrantes.



- Excavaciones manuales.
- Herramienta menor, pica y pala.
- Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

	• Excavaciones manuales. • Se verificaron las los volúmenes de excavación mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Material proveniente de excavación. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Se verificaron las los volúmenes de excavación mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Material proveniente de excavación. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

2. REALIZAR RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: M3	
2.02 Excavación manual en conglomerado	**CAN**	**EJECUTADA**
	206.55	206.55

Se verifico la remoción y retiro de todo el conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad con las dimensiones señaladas en los planos de detalle.

Se verifico el fondo de la excavación quedando totalmente limpio y nivelado horizontalmente, correspondiente al diseño mostrado en planos.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se consultaron recomendaciones de estudio de suelos para densidades.
- Se verificaron los procesos constructivos.
- Se corroboro la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.
- Se verifico mano de obra herramientas y /o equipos necesarios para la extracción de materiales excavados.
- Se depositó la tierra proveniente de excavación mínimo a un metro del borde de la excavación.
- Se verificaron niveles inferiores de excavación y ancho planteado en el diseño del recalce.
- Se cargó y retiros sobrantes.



- Excavaciones manuales.
- Herramienta menor, pica y pala.
- Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

	• Se verificaron las los volúmenes de excavación mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Material proveniente de excavación. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.
	• Excavaciones manuales. • Herramienta menor, pica y pala. • Con las dimensiones mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

	• Se verificaron las los volúmenes de excavación mostradas en las memorias de cálculo de la actividad.

2. REALIZAR RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	**UNIDAD: M3**	
2.03 Demolición cimientos enterrados con retiro	**CAN**	**EJECUTADA**
	2.14	2.14

Se verifico demolición parcial de cimientos y estructuras de concreto reforzado existentes.

Para este caso de demolición parcial de cimientos a fin de reforzar de reforzar los cimientos a fin de reforzar los elementos existentes de acuerdo a recomendaciones del estudio de diseño del reforzamiento.

Las demoliciones se realizaron con el equipo necesario (demoledor tipo taladro martillo y rotomartillo), en los elementos de refuerzo existentes de la edificación.


METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifico los elementos a demoler revisando en planos de diseño.
- Se prevén daños que se puedan ocasionar durante el desarrollo de la actividad.
- Se realizó demolición seccionada, generando cortes con disco para concreto para luego con el taladro tipo martillo generara la demolición.

- Luego de la demolición se deja expuesto el acero existente para los traslapos y adecuación de ganchos del nuevo recalce.
- Se verifico y adecuo las zonas de demolición para iniciar proceso constructivo.
- Se verifico el acopio e escombros provenientes de la demolición, para posterior retiro.

	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.
	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.
	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.

	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.
	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.
	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.

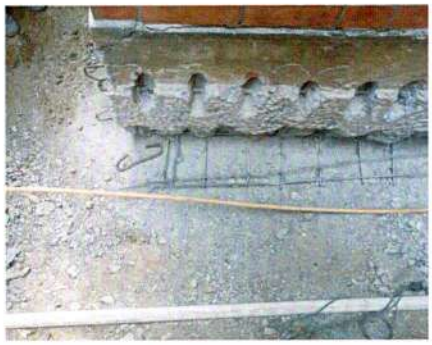	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.
	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.
	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.

	• Demolición de cimientos existentes, elementos mostrados en los planos de diseño. • Cantidades de demolición expresadas en la memoria de cálculo de la actividad. • La zona se deja libre del escombro proveniente de la excavación.


2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	**UNIDAD: M2**	
2.04 Escarificación de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material	**CAN**	**EJECUTADA**
	27.86	27.86

Se verifico la demolición de parte de la zapata, dejando intacto y expuesto el refuerzo existente, luego de esto, se debe escarificar de 4 a 7 cm con limpieza de la superficie para luego realizar aplicación de Sikadur -32 para mejorar la adherencia entre concreto fresco y endurecido para generar el recalce.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifico e identificó los elementos a demoler según los planos constructivos.
- Se adecuo las zonas de demolición para el inicio de la actividad.
- Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño.
- Se retiraron sobrantes y/o escombros producto de la demolición.

	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

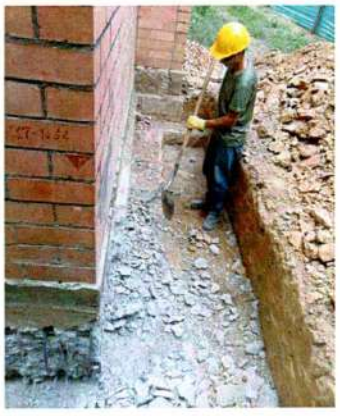	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero.

	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Se escarificaron con demoledor tipo taladro martillo a los cimientos existentes de acuerdo con las especificaciones de los planos del diseño. • La demolición se genera de 4 a 7 cm dependiendo el recubrimiento que tenga el acero.

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: M3	
2.05 Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	**CAN**	**EJECUTADA**
	51.64	51.64

Se dio verificación de la base granular proveniente de cantera la cual es recibida en el sitio de obra para su posterior extensión y compactación del material empleando como mejoramiento al terreno existente de conformidad con los alineamientos, dimensiones indicados en los planos de diseño.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Los rellenos se construyeron de acuerdo a los alineamientos, cotas, secciones trasversales indicadas en los planos de diseño.
- se verifico la base granular seleccionada con su tipo de calidad.
- Se verifico la colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
- Antes de ser compactado, el material fue extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm.



- Acopio de material base granilar.
- Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Extendido de del material sub base. • colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Cxtendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material sub base. • Colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. • Extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: M3	
2.06 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	**CAN**	**EJECUTADA**
	3.23	3.23

Se verifico la elaboración de concreto de limpieza con bajo contenido de cemento, mezclado en obra que se aplicó al fondo de la excavación para el recalce con el fin de proteger, emparejar y mantener limpia la superficie del piso de cimentación de cualquier contaminación o la alteraciones iniciales del terreno. Este elemento se construyó en una capa de concreto de 5.0 cm de espesor.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Para el inicio de la actividad se verifico estudio de suelos.
- Se consultó el plano de cimentación, los tipos de excavación, sus cotas, para la localización y replanteo de la actividad.
- Se verifico que el fondo de la excavación este limpia y libre de materias orgánicas
- Se extendió el concreto de 175 kg/ cm2
- Se verifico la capa de espesor de 5 cm.
- Se nivelo la superficie y se verifico las cotas inferiores.



- Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2.
- Concreto solado capa, de espesor de 5 cm.
- Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores.
- Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2. • Concreto solado, capa de espesor de 5 cm. • Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2. • Concreto solado capa de espesor de 5 cm. • Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2. • Concreto solado, capa de espesor de 5 cm. • Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2. • Concreto solado, capa de espesor de 5 cm. • Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2. • Concreto solado, capa de espesor de 5 cm. • Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Extendido de del material concreto solado 175 kg/ cm2. • Concreto solado, capa de espesor de 5 cm. • Nivel de superficie y se verifico las cotas inferiores. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: M2	
2.07 Limpieza de franja de trabajo	**CAN**	**EJECUTADA**
	27.86	27.86

Luego de ser escarificada se realizó limpieza en la superficie donde se une el concreto existente con el del recalce para aplicar correctamente el sikadur -32.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verificaron los elementos expuestos para limpieza revisando planos de la actividad.
- .se adecuo la zona a intervenir
- Se verifico la limpieza con brochas de acuerdo a las áreas especificadas en planos.
- Se verifico el elemento esté libre de toda sociedad para la aplicación del producto.



- Elementos expuestos para limpieza
- limpieza de la zona a intervenir.
- Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.



- Elementos expuestos para limpieza
- limpieza de la zona a intervenir.

Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: M3	
2.08 Recalce zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.	**CAN**	**EJECUTADA**
	17.04	17.04

Se verifico el recalce de zapatas existentes teniendo en cuenta los detalles constructivos en planos.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifica la zona a intervenir para realizar el vaciado del concreto
- Se aplica el sikadur-32, cuando el epoxico aplicado presento pegajosidad, se realizó el vaciado del concreto logrando la adherencia requerida.
- Se colocó de forma segura la formaleta, realizando chequeos de las medidas interiores del recalce verificado ángulos internos, ejes y verticalidad exigida mediante colocación de plomos.
- Durante el proceso de vaciado, se verifico vibrado para garantizar un acabado satisfactorio, libre de vacíos.
- Luego del armado de acero como se establece en planos, se realiza vaciado de concreto al recalce de las zapatas con la resistencia de 3000 Psi.
- Luego de cumplir el proceso de fragüe, se retira formaleta, evitando golpear o someter el recalce a esfuerzos, hasta tanto el concreto no haya alcanzado la suficiente resistencia.

	• Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo a l recalce tipo 1 según planos. • Armado de acero para recalce. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo a l recalce tipo 1 según planos. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo a l recalce tipo 1 según planos. • Aplicación del producto sicadur-32 para la adherencia del concreto viejo al nuevo. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Armado de acero para recalce. • Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo a l recalce tipo 1 según planos. • Vaciado del concreto de 3000 psi, con el respectivo vibrado • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo al recalce tipo 1 según planos. • Vaciado del concreto de 3000 psi, con el respectivo vibrado • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo a l recalce tipo 1 según planos. • Vaciado del concreto de 3000 psi, con el respectivo vibrado • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo al recalce tipo 2 según planos. • Vaciado del concreto de 3000 psi, con el respectivo vibrado • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero apara recalce. • Encofrado del recalce a zapata con las medidas requeridas de acuerdo al recalce tipo 2 según planos. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad de la actividad.
	• Desencofrado del recalce a zapata tipo 2. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Desencofrado del recalce a zapata tipo 2. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Desencofrado del recalce a zapata tipo 1. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Desencofrado del recalce a zapata tipo 1. • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	UNIDAD: KG	
2.09 Acero de Refuerzo Grado 60	**CAN**	**EJECUTAD**
	21240.39	1711.09

Se verifica el suministro de acero operaciones de corte, doblado, colocación y amarre de la varillas de refuerzo en las estructuras del concreto.

Se verifico que el acero de refuerzo, al colocarlo en la estructura, ha de estar libre de mugre, escamas, exceso de óxido, algún tipo de aceite u otra materia extraña.

MITOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifico en planos la localización y formas de las varillas requeridas para la obra, se le suministra al contratista despiece de aceros en planos y memorias de calculo, los cuales le indicaron a detalle la figuración y la disposición del refuerzo.
- Los despieces del refuerzo se realizaron de forma que estos se ajustaron a las juntas de construcción.
- Las dimensiones mostradas en los planos de refuerzo indicaron las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaron las distancias entre las superficies externas de las varillas.
- Las varillas de refuerzo fueron dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección pertinente.
- El refuerzo se colocó con exactitud según lo indicado en planos asegurado firmemente en las posiciones indicadas de manera que no sufrieron desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto.
- Donde las varillas de refuerzo se cruzaron, estas se unieron con alambre amarrado firmemente alrededor de los cruces.
- Se aplicaron las siguientes tolerancias en colocación de acero de refuerzo.

➢ Desviación en espesor de recubrimiento

- Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm = ½ cm
- Con recubrimiento superior a 5 cm = 1 cm

- Con recubrimiento superior a 5 cm = 1 cm

- Los traslapos y uniones de las varillas y mallas electrosoldadas de refuerzo cumplieron con los requisitos mostrados en diseño.

Cantidades mostradas en la memoria en la memoria de cálculo, para verificación.

	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.
	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

	• Armado de acero para recalce. • Acero longitudinal, acero transversal figurado, ganchos, acero de arranque para los muros • Cantidades demostradas en la memoria de la actividad.

2. RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES	**UNIDAD: M3**	
2.10 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	**CAN**	**EJECUTADA**
	86.10	86.10

Se verifica cargue manual en obra, con acopio en sitio de obra, transportado en volqueta y disposición en escombrera autorizada por el municipio, en este caso escombros de concreto y material proveniente de excavación conglomerado.

MITOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifico el tipo de escombro
- Acopio en sitio mecánico y cargue manual.
- Retiro de escombro con volqueta
- Retiro de material conglomerado con volqueta.

La cantidad de cargue de material presento una disminución pequeña ya que parte de este material la comunidad solicito en manera de donación para unos arreglos de sus predios por ende disminuyo, todo el material se cargo manualmente y retiro de material hasta 6 Km es una parte crítica del proceso de reforzamiento estructural tipo 1 en la torre 17 Este proceso implica la manipulación y transporte manual de materiales para preparar el sitio y retirar los escombros provenientes de las

demoliciones realizadas según planos y especificaciones se lleva a cabo una planificación detallada para determinar las áreas donde se requiere el cargue manual y retiro de material, se asegura el área circundante y se implementan medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y las estructuras adyacentes los trabajadores cargan manualmente los materiales necesarios, como herramientas, equipo ligero o suministros, para llevar a cabo las actividades de construcción y reforzamiento, se utilizan técnicas adecuadas de levantamiento y transporte para minimizar el riesgo de lesiones.



- Retiro manual de sitio de obra



- Acopio en sitio escombro.



- Acopio en sitio material conglomerado.
- Retiro con volqueta de escombro

3. REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO	UNIDAD: M2	
3.01 Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar	**CAN**	**EJECUTADA**
	33.95	33.95

Se verifico la aplicación del adhesivo estructural epoxico sikadur 32 premier, el cual fue usado para mejorar para la adherencia entre el concreto fresco y endurecido.

MITOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifico la aplicación con brocha y rodillo.
- Correcta preparación del producto sikadur-32
- Para verifico que la superficie a aplicar estuviera limpia y seca en las áreas expresadas en los planos de diseño.
- Se utilizó brocha con cerdas cortas.

La cantidad que se aplicó el recubrimiento epóxido de alta resistencia, como Sikadur 32 primer o un producto similar, se utiliza en la torre 17 como parte del reforzamiento estructural tipo 1 y tipo 2. Este proceso fortalece y protege las superficies de concreto viejas, para una adherencia con el concreto nuevo y mejorando así la durabilidad y la vida útil de las estructuras.

	• Sikadur -32 en zona recalce. • Áreas de aplicación del producto mostradas en la memoria de cálculo de la actividad
	• Aplicación de sikadur -32 en zona recalce. • Áreas de aplicación del producto mostradas en la memoria de cálculo de la actividad • Aplicación en zona de zapatas
	• Aplicación de sikadur -32 en zona recalce. • Áreas de aplicación del producto mostradas en la memoria de cálculo de la actividad. • Aplicación en zona de zapatas

	• Aplicación de sikadur -32 en zona recalce. • Áreas de aplicación del producto mostradas en la memoria de cálculo de la actividad. • Aplicación en zona de zapatas

3. REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO	**UNIDAD: KG**	
3.03 Acero de Refuerzo Grado 60	**CAN**	**EJECUTADA**
	8472.97	2050.00

Se verifica el suministro de acero operaciones de corte, doblado, colocación y amarre de la varillas de refuerzo en las estructuras del concreto.Se verifico que el acero de refuerzo, al colocarlo en la estructura, ha de estar libre de mugre, escamas, exceso de óxido, algún tipo de aceite u otra materia extraña.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Se verifico en planos la localización y formas de las varillas requeridas para la obra, se le suministra al contratista cartilla de despiece, los cuales le indicaron a detalle la figuración y la disposición del refuerzo.
- Los despieces del refuerzo se realizaron de forma que estos se ajustaron a las juntas de construcción.
- Las dimensiones mostradas en los planos de refuerzo indicaron las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaron las distancias entre las superficies externas de las varillas.
- Las varillas de refuerzo fueron dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección pertinente.

- El refuerzo se colocó con exactitud según lo indicado en planos asegurado firmemente en las posiciones indicadas de manera que no sufrieron desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto.
- Donde las varillas de refuerzo se cruzaron, estas se unieron con alambre amarrado firmemente alrededor de los cruces.
- Se aplicaron las siguientes tolerancias en colocación de acero de refuerzo.

➢ Desviación en espesor de recubrimiento

- Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm = ½ cm
- Con recubrimiento superior a 5 cm = 1 cm

- Los traslapos y uniones de las varillas y mallas electrosoldadas de refuerzo cumplieron con los requisitos mostrados en diseño.
- Cantidades mostradas en la memoria en la memoria de cálculo de la actividad.




- Armado de refuerzo de columnas internas del muro.



- Instalación del armado de refuerzo de columnas internas del muro.

	• Instalación del armado de refuerzo de columnas internas del muro.
	• Instalación del armado de refuerzo de columnas internas del muro.
	• Armado de refuerzo de columnas internas del muro.

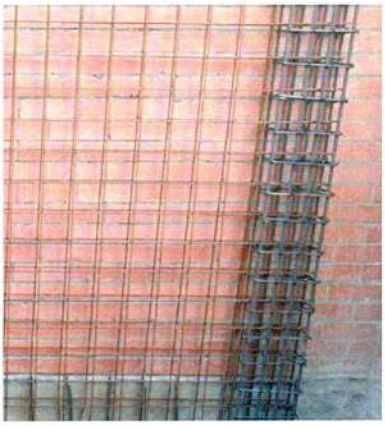	• Instalación del armado de refuerzo de columnas internas del muro. Instalación de malla electrosaldada
	• Instalación del armado de refuerzo de columnas internas del muro. • Instalación de malla electrosaldada
	• Instalación del armado de refuerzo de columnas internas del muro. • Instalación de malla electrosaldada.

3. REALIZAR REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO	UNIDAD: UND	
3.04 Conector de cortante de Ø 3/8" x 570 mm con epoxico (incluye perforación L=200 mm). Suministro e Instal.	**CAN**	**EJECUTADA**
	2272	125

Se suministró las barras de acero generando operaciones de cortes, doblando la y colocando las varillas de refuerzo en los muros de mampostería existente.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Los conectores se anclaron mínimo a 20 cm de profundidad de la placa de entrepiso con el recubrimiento epóxico Sika Anchorfix 3001, con una separación de 10 cm entre cada uno.
- Las actividades la realizaron personal capacitado, se dispusieron los lugares a intervenir dejando despejada el área.
- Teniendo en cuenta que fueron trabajos en altura se realizaron las disposiciones correspondientes del andamio.
- Se realizaron las perforaciones.
- Antes de la aplicación del epóxico se verifico que el orificio estuviera libre de polvo, suciedad y totalmente seco.
- Se realizó aplicación a presión del epóxido Sika anchorfix 3001.
- Se anclo Conector de cortante de Ø 3/8".
- Las cantidades se expresan en la memoria de calcula de la actividad.

La cantidad de conectores para el aseguramiento de la formaleta disminuyo ya que en el primer nivel del muro de 0.75 no se vio la necesidad de realizar los conectores de aseguramiento en toda su área solo en puntos estratégicos ya que estos se lograron asegurar con parales apuntalados por ende se disminuyó, se instalaron conectores cortantes de diámetro de 3/8" en placas de entrepiso para adherencia de muro en concreto se debe comenzar realizando la perforación y la aplicación a presión del epóxico Sika anchorfix 3001, y luego de tener las varillas figuradas y listas libres de polvo y suciedad, se debe anclar teniendo en cuenta que esta quede totalmente anclada con mínimo a 20 cm en las placas, estoy fue revisado y acepto por el interventor del proyecto para su posterior fundida.

	• Perforación con taladro para anclajes, mínimo a 20 cm profundidad de la placa de entrepiso, con separación de 10 cm entre cada uno.
	• Perforación con taladro para anclajes, mínimo a 20 cm profundidad de la placa de entrepiso, con separación de 10 cm entre cada uno.
	• Perforación con taladro para anclajes, mínimo a 20 cm profundidad de la placa de entrepiso, con separación de 10 cm entre cada uno.

3. REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO	UNIDAD: UND	
3.05 Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.	**CAN**	**EJECUTADA**
	10164	600


Se suministró las barras de acero generando operaciones de cortes, doblando la y colocando las varillas de refuerzo en los muros de mampostería existente. Este tipo de conector cortante, tendrá una longitud de 44 cm figurado tipo gancho con distribución en su instalación en la mampostería estructural.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Los conectores se anclaron mínimo a 7 cm de profundidad de la mampostería estructural con el recubrimiento epóxico Sika Anchorfix 3001.
- Las actividades la realizaron personal capacitado, se dispusieron los lugares a intervenir dejando despejada el área.
- Teniendo en cuenta que fueron trabajos en altura se realizaron las disposiciones correspondientes del andamio.
- Se realizaron las perforaciones con los limites permitidos.
- Antes de la aplicación del epóxico se verifico que el orificio estuviera libre de polvo, suciedad y totalmente seco.
- Se realizó aplicación a presión del epóxido Sika anchorfix 3001.
- Se anclo Conector de cortante de Ø 1/4"
- Las cantidades se expresan en la memoria de calcula de la actividad.



- Perforación con taladro para anclajes, mínimo a 7 cm profundidad en la mampostería estructura

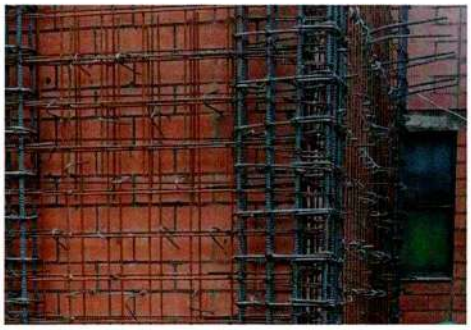	• Perforación con taladro para anclajes, mínimo a 7 cm profundidad en la mampostería estructural.
	• Perforación con taladro para anclajes, mínimo a 7 cm profundidad en la mampostería estructural
	• Anclajes con epóxido, mínimo a 7 cm de profundidad en la mampostería estructural.

5. REPOSICION DE ANDENES	UNIDAD: M3	
5.01 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	CAN	EJECUTADA
	27.60	27.60

Se dio verificación rellena de material seleccionada en obra para su posterior extensión y compactación del material empleando como mejoramiento al terreno existente de conformidad con los alineamientos, dimensiones indicadas en los planos de diseño.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

- Los rellenos se construyeron de acuerdo a los alineamientos, cotas, secciones trasversales indicadas en los planos de diseño.
- se verifico material seleccionado
- Se verifico la colocación en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
- Antes de ser compactado, el material fue extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepaso de 10 cm.



- Los rellenos se construyeron de acuerdo a los alineamientos, cotas, secciones trasversales indicadas en los planos de diseño

	• Los rellenos se construyeron de acuerdo a los alineamientos, cotas, secciones trasversales indicadas en los planos de diseño
	• Los rellenos se construyeron de acuerdo a los alineamientos, cotas, secciones trasversales indicadas en los planos de diseño
	• Los rellenos se construyeron de acuerdo a los alineamientos, cotas, secciones trasversales indicadas en los planos de diseño

6.4 INCONVENIENTES TÉCNICOS Y DETERMINACIONES.

- El inquilino del apartamento 104 del bloque N.° 17 se presenta en la oficina manifestando inconformidad por el cerramiento del acceso;

Determinación: sin embargo, se le informa que, debido a la ejecución de la excavación, fue necesario realizar el cerramiento temporal del área intervenida con el fin de evitar accidentes, caídas o cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los residentes y transeúntes.

- Durante la ejecución de las actividades de excavación manual/mecánica en el área intervenida, se presentó la rotura accidental de una tubería de gas domiciliaria de 1/2", correspondiente a la acometida que conecta con el medidor de gas del inmueble.

Determinación: De manera inmediata se suspendieron las labores en el frente de trabajo y se activó el protocolo de atención de emergencias, realizando el reporte a la empresa prestadora del servicio, Cusianagas. El personal técnico de la entidad acudió al sitio aproximadamente una hora después del aviso, procediendo a asegurar el área, controlar la fuga y efectuar la reparación de la red afectada conforme a los procedimientos técnicos y la normatividad vigente para redes de gas combustible. Una vez finalizada la intervención y verificada la hermeticidad del sistema, se autorizó la continuidad de las actividades constructivas.

6.5 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (OBRA EJECUTADA VS OBRA PROGRAMADA)

6.5.1 ACOMULADO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO No 1045 DE 2025

A la fecha del presente informe mensual No.1 del contrato de obra No. 1045 de 2025, presenta un porcentaje acumulado de 14.68 % equivalente a $156,916,443; Porcentaje ajustado al valor contractual de contrato de obra de $1,068,556,990.



6.6 RESUMEN DE ENSAYOS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Se solicitaron al contratista ensayos de calidad y certificados de calidad de materiales para dar garantía de la correcta ejecución de cada una de las diferentes actividades donde se relaciona la siguiente información: **ANEXO 4**

- Resistencia de compresión de testigos de concreto, elaborado por:

INCONS INGENIERIA LTDA.

- reporte malla electrosoldada por:

TERNIUM COLOMBIA S.A.S

- acero por:

GROPO SIDERURGICO REYNA

- Concreto por:

HOLCIM

- Sikadur®-32 por:

SIKA

6.7 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

- INTERVENTORIA TECNICA

1. Impartir el orden de iniciación de las obras.
2. Verificar el replanteo y el programa de ejecución de obras.
3. conocer los estudios técnicos del proyecto.
4. Exigir al contratista de obra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del proyecto.
5. Revisar el cumplimiento de las Especificaciones a través del control de especificaciones, para lo cual utilizara el documento general del proyecto.
6. Controlar la programación y avance de obras, a través de la línea de balance.
7. Solucionar los problemas técnicos de obra.
8. Revisar y aprobar los estudios y/o rediseños propuestos en el desarrollo de las obra.
9. Revisar y aprobar el personal profesional exigido en los términos de referencia.
10. Exigir y recibir dentro del plazo estipulado los documentos: programación de trabajos, flujo mensual de caja, organigrama del personal de nómina y

contratado, frente y cuadrillas de obra, inventario de materiales en almacén y de equipos, subcontratos de obra y plan de inversión de dineros recibidos en calidad de anticipo.

11. Realizar comités técnicos de obra periódicamente en un conjunto el contratista de obra y la supervisión.

- INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

1. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual.
2. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría.
3. Controlar la correspondencia que se produzca con el contratista de obra, en la ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
4. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados.
5. Coordinar con las dependencias Municipales relacionadas con la ejecución del contrato de obra, para que cumplan con sus obligaciones. En esta obligación se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.
6. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no se cause un rompimiento del equilibrio financiero.
7. Programar y coordinar con quien sea necesario, reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato de obra.
8. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato de obra, con la periodicidad que se requiera, entendiendo el objeto y naturaleza.

9. Presentar los informes necesarios para entender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo.

10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

11. Entregar información al Municipio relacionada con el incumplimiento del contrato de obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan por o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de obra.

12. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato de obra.

13. Aprobar las modificaciones y entregar al municipio los soportes técnicos y planos aprobados.

14. Elaborar los informes periódicos mensuales conforme a la circular 002 del 24 de noviembre de 2017, que derogó la circular 10 de 2012 – documentos soporte para el trámite de actas parciales y/o de liquidación.

15. Suscribir conjuntamente con el contratista, las actas correspondientes al desarrollo del contrato de obra derivado del proceso, lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el manual de interventoría adoptado mediante Resolución Municipal 152 de 16 de mayo de 2018.

-INTERVENTORIA FINANCIERO

1. Llevar el control financiero del contrato de obra.

2. Estudiar y aplicar el programa de obra, flujos de fondos de inversión del anticipo.

3. Hacer seguimiento, aprobación y control del anticipo.

4. Emitir concepto sobre los análisis de precios elaborados por el constructor y de ítems no previstos.

5. Preparar con el contratista de obra las actas de recibo de los bienes, servicios y productos contratados, estableciendo las cantidades correctas de ítems de los bienes, servicios y obras ejecutadas, y recibidas, así como los valores a pagar y los valores a descontar.

6. Mantener información actualizada sobre los valores pagados al contratista de obra y la amortización del anticipo.

7. Llevar un cuadernillo financiero con todos aquellos documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas en el desarrollo del contrato.

- INTERVENTORIA AMBIENTAL

1. Conocer los estudios técnicos del proyecto.

2. Velar porque el contratista de obra cumpla los requerimientos ambientales generales para un proyecto de obra civil.

3. Controlar y hacer y seguimiento ambiental a las actividades de construcción para evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros.

4. Solicitar al contratista de obra el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo.

5. Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificaciones de este.

6. Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y los actos administrativos de CORPORINOQUIA que adoptan decisiones ambientales.

7. Presentar informes de interventoría ambiental.

-INTERVENTORIA CONTABLE

1. Constatar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal.
2. Solicitar al contratista de obra copia de los documentos de apertura de cuenta bancaria para el manejo del anticipo para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución de contrato correspondiente.
3. Solicitar al contratista de obra el informe mensual de inversión del anticipo, soportado los pagos realizados.
4. Revisar que las facturas presentadas por el contratista de obra para efectos de pago, cumplan los requisitos legales y los establecidos en el contrato (IVA, ICA, amortización de anticipo).
5. Constatar el pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista de obra.
6. Presentar informe del estado de los rendimientos financieros y verificar la correcta devolución de los mismos.

-INTERVENTORIA JURIDICA

1. Conocer y aplicar la normatividad y reglamentación vigente del Sistema de regalías "SGR" especialmente lo relacionado con los acuerdos de la comisión rectora del Sistema General de Regalías.
2. Conocer el clausulado del contrato y establecer el cumplimiento de los requisitos de legalización (publicación y timbre entre otros).
3. Conocer la etapa precontractual.
4. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales.

5. Constatar el registro presupuestal del contrato.

6. Obtener copia de la garantía única y su póliza anexa junto con su aprobación, verificar vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.

7. Solicitar al contratista la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

8. Informar a la Oficina Asesoría Jurídica el cumplimiento de cualquier obligación contractual.

9. Solicitar al ordenador del gasto, en los casos estipulados en Contrato de obra la aplicación de las clausulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, mulatas o caducidad.

10. Solicitar a la Oficina Asesora jurídica los documentos mediante los cuales se haga constar las modificaciones del contrato de obra.

11. Solicitar al contratista de obra, copia del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demás amparos, así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto con su aprobación.

12. Llevar un cuadernillo legal, conformado con todos los documentos del seguimiento.

13. Proyecto de pliego de condiciones o términos de referencia, pliego o termino s definitivos y adendas.

14. Disponibilidad y reserva presupuestal.

15. Contrato de obra.

16. Acta de recibo y aprobación de diseños.

17. Acta de anticipo.

18. Informe de inversión y buen manejo del anticipo.
19. Acta de liquidación del anticipo.
20. Acta de reajustes.
21. Acta de recibo parcial de obra.
22. Análisis unitarios de actividades no previstas. Acta de suspensión.
23. Acta de cambio de supervisor o interventoría.
24. Acta de recibo final de contrato de obra.
25. Acta de terminación del contrato de obra.
26. Acta de liquidación del Contrato de obra.
27. Acta de recibo final y liquidación de consultoría.
28. Control de ajustes.
29. Acta de fijación de precios no previsto.
30. Control de legalidad del contrato de obra.
31. Autorización reintegro de anticipo.
32. Evolución cumplimiento de obligaciones contractuales.
33. Solicitud de prórroga o adición.
34. Acta de reiniciación.
35. Solicitud de sanción del contratista de obra.
36. Impartir las solicitudes, ordenes documentación, determinaciones, consultas definiciones y demás gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, etc., solo por escrito.
37. Estudiar y aplicar las cláusulas del contrato de obra.

38. Velar por el cumplimiento Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución Municipal 152 de 16 Mayo de 2018.

39. Informar al personero municipal o veeduría ciudadanas cuando sea requerido.

40. Liquidar el contrato de obra de acuerdo con la normatividad nacional vigente.

41. La interventoría entregara las obras terminadas de acuerdo con las condiciones contractuales.

42. Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de obra y demás documentos correspondientes al proyecto.

43. Ordenar la remoción y reemplazo de la obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto plazo determinando. En caso de incumplimiento por parte del contratista de la orden importada, solicitar la ampliación de la sanción.

44. Asegurar que no se presenten litigios o conflictos por repetición en contra del municipio en aspectos laboral, civil o daños a terceros.

45. Emitir concepto para mordicar y/o aclarar las cláusulas del contrato de obra, para realizar ajustes en lo que respecta a mayores y menores cantidades de obra contratada, para adicionar el valor del contrato y para prorrogar el plazo de ejecución del mismo, concepto que debe estar debidamente soportado y argumentado.

46. Conocer, manejar y emplear el manual de interventoría y supervisor, y formatos adoptados por el municipio.

47. Solicitar al municipio las licencias y documentos requeridos para la construcción del proyecto del contrato de obra.

48. El contratista debe realizar la entrega almacén del bien o servicio a entregar (bines muebles, inmuebles, diseños, estudio o servicio.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Resumen de actas.

Tabla 5: Control de actas Contrato de Consultoría

RELACIÓN ACTAS CONTRATO DE CONSULTORIA		
CONTRATO No.	1024 DE 2023 -10-03	
CONTRATISTA	CRESSE CONSULTING SAS	
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ – SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE DEL ACTA	**FECHA DEL ACTA**	**OBSERVACIONES**
MINUTA	04-12-2025	Firma del contrato de interventoría - proceso del concurso de méritos abiertos. MA-CMA-SI-018-2025
ACTA N° 1 DE INICIO	16-12-2025	Acta de inicio del contrato de interventoría No. 1024 de 16-dic-2023 cuyo objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ACTA ACLARATORIA	17-12-2025	Acta aclaratoria del acta de inicio, donde cambia la fecha acta de inicio del contrato 1024 de 2025.
ACTA DE ANTICIPO	23-12-2025	Elaboración de acta de anticipo por parte del Municipio de Aguazul (ALCALDÍA)

Tabla 6: Control de actas Contrato de obra

RELACIÓN ACTAS CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.	1045 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ – SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL ACTA	FECHA DEL ACTA	OBSERVACIONES
MINUTA	18-12-2023	Firma del contrato de Obra - proceso de selección licitación pública. MA-LP-SI-009-2025
ACTA N° 1 DE INICIO	26-01-2026	Acta de inicio del contrato de obra No 1045 de 2025 cuyo objeto: " CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

7.1 PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO

A continuación se relaciona los profesionales que contrato **1024 de 2025**, para el desarrollo del proyecto:

Tabla 7: *profesionales asociados al proyecto contrato de Interventoria n°1024 2025*

CRESSE CONSULTING S.A.S	
CARGO	**NOMBRE**
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA SARMIENTO BONILLA
DIRECTOR	CAMILO ANDRES FORERO GALAN
RESIDENTE	LEIDY CUENTAS PERALTA
TECNICO	JHON WILMAR CASTRO MORA

- Relación los profesionales que contrato **1045 de 2025**, para el desarrollo del proyecto:

Tabla 8: profesionales asociados al proyecto contrato de Obra n°1045 2025

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	
CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
DIRECTOR DE OBRA	LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO
RESIDENTE DE OBRA	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA
PROFESIONAL HSE	MIRYAM YANETH BERNAL SÁNCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	KENNY GERALDINNE SALAMANCA NUÑES
PSICOLOGA	MARIA ANGELICA TORRES AGUILAR

- Relación de personal en obra hasta el corte del presente periodo.

Tabla 9: personal asociados al proyecto contrato de Obra N°1045 2025

CONTROL DE PERSONAL EN OBRA							
CEDULA	NOMBRE	CARGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
9,397,224	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA	RESIDENTE DE OBRA	X				
77,016,379	LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO	DIRECTOR DE OBRA	X				
1,116,551,202	KENNY GERALDINNE SALAMANCA NUÑES	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				
1,116,548,416	MARIA ANGELICA TORRES AGUILAR	PSICOLOGA	X				
47,439,331	MIRYAM YANETH BERNAL SANCHEZ	PROFESIONAL HSEQ	X				
9,657,251	CARLOS JULIO GAITAN	MAERTRO GENERAL	X				
74,860,094	LUIS FERNEY ACHAGUA	OFICIAL DE OBRA	X				

4,153,818	ANYELO GOYENECHE OCHOA	OFICIAL DE OBRA	X				
1,006,443,447	DUMAR SCHNEIDER TORRES TORRES	AYUDANTE DE OBRA	X				
1,118,560,448	WILMER EDUARDO HERNANDES PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	X				
1,010,091,586	DIEGO ALEXANDER SANCHES BOTELLO	AYUDANTE DE OBRA	X				

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La relación de equipo utilizado por el Contratista en el desarrollo de las obras en este periodo se presenta en el siguiente cuadro, donde se indica la cantidad disponible en obra y su estado.

Tabla 10: *maquinaria y equipo contrato de Obra N°1045 2025*

CONSORCIO INGESA 2023		
Relación de maquinaria y equipo		
Cantidad	**Maquinaria**	**Estado**
1	Sierra circular para madera	Bueno
1	Pulidora	Bueno
1	Tronzadora	Bueno
3	Taladro	Bueno
2	Rotomartillo	Bueno
≥18	Andamios	Bueno

8. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

8.1 CONTROL DE PÓLIZAS.

Tabla 1: Control de Pólizas Contrato de Interventoria

CONTROL DE POLIZAS CUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA – ACTA INICIO					
CONTRATO No.	1024 DE 2025				
CONTRATISTA	CRESSE CONSULTING SAS				
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101008677	17-12-2025	17-10-2026	$ 9.731.650,80
ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	17-10-2026	$ 48.658.254,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	19-04-2029	$ 4,865.825,40
CALIDAD DEL BIEN	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	17-10-2030	$ 9.731.650,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
PREDIOS , LABORES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101003929	17-12-2025	19-04-2026	$ 284,700,000,00

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	19-04-2026	$ 284,700,000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-12-2025	19-04-2026	$ 284,700,000,00

Tabla2: *Control de Pólizas Contrato de Obra*

CONTROL DE POLIZAS CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA – ACTA INICIO					
CONTRATO No.	1045 DE 2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025				
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
GARANTIAS	**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	NB-100423897	26-01-2026	10-11-2026	$ 106.855.699,00
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL		26-01-2026	10-11-2026	$ 534.278.495,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL		26-01-2026	10-05-2029	$ 53.427.849,00
ESTABILIDAD	SEGUROS MUNDIAL		10-05-2026	10-05-2031	$ 320.567.097,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	NB-100112749	18-12-2025	10-05-2026	284.700.000,00

8.2 CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL.

De acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Artículo 50 "Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Control en los pagos de aportes parafiscales (salud, pensión y riesgos laborales).

Para dar cumplimiento a esta actividad, la interventoría verificó mensualmente al contratista de obra con el listado de profesionales, técnicos, y obreros con el fin de verificar las afiliaciones, pagos de seguridad social y parafiscal. Después de revisadas las planillas aportadas por CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025 y comprobar con la información llevada por esta interventoría, se pudo constatar que el contratista ha CUMPLIDO con los pagos de seguridad social en el periodo comprendido entre 26 de enero del 2026 hasta el 26 de febrero del 2026, las cuales se relacionan a continuación y se encuentran anexas en el presente informe (Anexo 3).

8.2.1 SEGURIDAD CONTRATO DE OBRA No. 1045 DE 2025

PERIODO ENERO 2026 Contrato No. 1045 DE 2025. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

CONSORCIO INGESA 2023					
Planilla No.	PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	SENA/ICBF	BANCO	VALOR
1113362092	02-2026	01-2026	EXONERADOS	DAVIVIENDA	$998.400
1750211754	02-2026	01-2026	EXONERADOS	BANCOLOMBIA	$362.500
6006277284	02-2026	01-2026	EXONERADOS	BANCOLOMBIA	$82.900

8.2.2 SEGURIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1024 DE 2025

PERIODO DICIEMBRE 2025 Contrato No. 1024 DE 2025 - CRESSE CONSULTING SAS.

CRESSE CONSULTING S.A.S					
Planilla No.	PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	SENA/ICBF	BANCO	VALOR
6003062661	12-2026	01-2025	EXONERADOS	DAVIVIENDA	$1.768.400
600297468	12-2026	01-2025	EXONERADOS	BANCOLOMBIA	$490.500

PERIODO ENERO 2026 Contrato No. 1024 DE 2025 - CRESSE CONSULTING SAS.

CRESSE CONSULTING S.A.S					
Planilla No.	PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	SENA/ICBF	BANCO	VALOR
6004416147	02-2024	01-2024	EXONERADOS	DAVIVIENDA	$ 2.636.100
6004415922	02-2024	01-2024	EXONERADOS	BANCOLOMBIA	$ 613.100

8.3 CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

Relación de correspondencia a la fecha.

Tabla 12: *Relación de correspondencia contrato de obra N°1045 2025*

DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA	REF.
CORRESPONDENCIA ENVIADA CTO 1045 DE 2023			
MUNICIPIO AGUAZUL	Radicación polizas para aprobación Cto 1045 de 2025	22-dic-2025	OF_CR_1045_001
MUNICIPIO AGUAZUL	POLIZAS	23-dic-2025	OFI_CR_1045_002

MUNICIPIO AGUAZUL	Radicación soporte de pago planillas Cto 1045 2025	29-dic-2025	OFI_CR_1045_003
MUNICIPIO AGUAZUL	Radicación pólizas corregidas Cto 1045 2025	29-dic-2025	OFI_CR_1045_004
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE AGUAZUL	Radicación documentos para firma de acta de inicio Cto 1045	29-dic-2025	OFI_CR_1045_005
OFICINA JURÍDICA MUNICIPIO DE AGUAZUL	Radicación pólizas actualizadas con acta de inicio para aprobación Cto 1045	10-feb-2026	OFI_CR_1045_006
CRESSE CONSULTING S.A.S	Solicitud de desembolso de anticipo Cto No. 1045	24-feb-2026	OFI_CR_1045_007
CRESSE CONSULTING S.A.S	Entrega de informe mensual No.1	26-feb-2026	OFI_CR_1045_008

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	REF.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA CTO 1045 DE 2023			
SANDRO CARRILLO R/L	Solicitud informe No.1	03-01-2024	OFI_INT_1024_004

Tabla 12: Relación de correspondencia contrato de obra n°1024 2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA CTO 1024 DE 2023			
DESTINATARIO	**ASUNTO**	**FECHA**	**REF.**
OFICINA JURIDICA	Solicitud de aprobación de póliza CTO-1024 de 2025	10-dic-2025	
OFICINA JURIDICA	Comprobante de pago estampillas	10-dic-2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Documentos para acta de inicio CTO-1024 de 2025	12-dic-2025	
OFICINA JURIDICA	Radicación pólizas para aprobación -CTO-1045 de 2025	17-dic-2023	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de desembolso de anticipo	18-dic-2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega informe preconstructivo	26-ene-2026	OF_INT_01024_002
OFICINA JURIDICA	Traslado de póliza actualizada con acta de inicio CTO-1024 de 2025	29-ene-2026	OF_INT_01024_003
CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Solicitud informe ménsula No.1	20-feb-20	OF_INT_01024_004
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de desembolso de anticipo CTO 1045 de 2025	24-02-2026	OF_INT_01024_005

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CTO 1024 DE 2025			
REMITENTE	**ASUNTO**	**FECHA**	**REF.**
CONSORCIO REFORZAMIENTO	Solicitud de desembolso de anticipo Cto No. 1045	24-feb-2026	OFI_CR_1045_007
CONSORCIO REFORZAMIENTO	Entrega de informe mensual No.1	26-feb-2026	OFI_CR_1045_008

8.4 CONTROL ACTAS DE COMITÉ

Ver **ANEXO 6.** Comités relacionados que muestran la trazabilidad del presente informe mensual

Tabla 13: *control de comités contrato de obra N°1045 2023*

DESCRIPCIÓN COMITÉ	FECHA
Comité técnico entre profesionales de interventoría y obra con el fin de manifestar el avance de obra y compromisos contractuales.	06/02/2026

9. ASPECTOS FINANCIEROS

9.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 1045 DE 2025

En el presente periodo no se han tramitado aspectos financieros.

9.2 GRAFICA DE AVANCE EJECUTADO OBRA CONTRATO 1045 DE 2023.

En el presente periodo no se han tramitado aspectos financieros.

9.3 INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° 1045 2023.

El contratista de obra radico solicitud de desembolso de anticipo mediante oficio y anexos requeridos con fecha de 9 de enero 2026, por lo cual está a la espera de aprobación por parte de la secretaria de infraestructura y hacienda.

9.3.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO 1045 DE 2025.

Pendiente por aprobación.

9.3.2 CONCILIACIÓN BANCARIA PARA MENEJO DE ANTICIPO.

Pendiente por aprobación.

9.4 INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1024 2023.

Aprobada mediante ACTA DE ANTICIPO, con fecha de 23 de diciembre de 2025

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Personal profesional y prestaciones sociales	$ 48,658,254.00	100.00%
TOTAL		**$ 48,658,254.00**	**100%**

- Datos bancarios.

Banco Davivienda S.A. con fecha de apertura10/12/2025, cuenta bancaria para recibir cobro anticipo.

TIPO DE CUENTA	CUENTA
Cuenta de ahorros	091600076789

10. CONCLUSIONES

La interventoría mediante contrato 1024 de 2025 con objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, le dio aprobación y verificación de unidad y medida a las actividades que el contratista de obra manifestó mediante el INFORME mensual No.1, bajo el cumplimiento del objeto del contrato 1045 del 2025.

Con el presente informe mensual No.1, se validó la información técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental, salud y seguridad en el trabajo de las actividades ejecutadas en el periodo entre 26 de enero al 26 de febrero 2026 periodo de ejecución del contrato de Obra pública **N° 1045 DE 2025** actividades que fueron verificadas en campo de acuerdo a las memorias de cálculo presentadas por el contratista.

Los trabajos objeto del presente contrato se realizaron dando cumplimiento a lo establecido en los estudios previos realizados por la Administración Municipal de Aguazul, a través de la secretaria de Planeación y obras públicas de acuerdo con las especificaciones técnicas contractuales y con materiales de buena calidad, lo anterior atendiendo los requerimientos realizados por la interventoría y supervisión del contrato.

Las actividades estipuladas en el contrato de obra se realizan con todos los elementos de protección personal, a fin de no generar ningún tipo de accidente al personal que labora en la ejecución del contrato, de igual manera se tiene una amplia comunicación con la supervisión del contrato, para evitar malentendidos y realizar la ejecución de la obra de una manera eficiente sin tener que detener la ejecución de esta.

En el presente periodo se alcanzó un avance del 14.68 %, mostrando un leve retrasó con respecto a lo programado equivalente al 17.68%, por lo que se tendrá que nivelar para el siguiente periodo.

La ejecución se llevó a cabo bajo las normas técnicas, legales y de seguridad aplicables, lo cual garantizó tanto la calidad de los procesos como la funcionalidad de los elementos intervenidos. No se presentaron novedades que comprometieran la ejecución del proyecto.

Como parte de los controles establecidos, se realizaron los ensayos de laboratorio pertinentes para verificar la resistencia de los materiales estructurales utilizados, especialmente el concreto, los resultados confirmaron el cumplimiento de los parámetros exigidos en el diseño y las especificaciones contractuales.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CAMILO ANDRES FORERO GALAN
ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
T.P. 25202-141072 CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LEIDY CUENTAS PERALTA
ING. CIVIL
T.P. 15202-260338 BYC

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING SAS

ANEXO 1: CONTROL PMA - PMT

INFORME AMBIENTAL, SST Y MANEJO DE TRANSITO

RE

INTERVENTORIA

CRESSE CONSULTING S.A.S

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1045 DE 4 DICIEMBRE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

2026

INTRODUCCIÓN

Con el ánimo finalizar el proyecto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANAREE**. Se elaboró informe ambiental, SST y de manejo de transito como instrumento para asegurar que las obras de construcción derivadas de este proyecto garantizaron un manejo controlado de los impactos ambientales y sociales.

La interventoría realizo la verificación del cumplimiento de plan de manejo ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y plan de manejo de tránsito, a través de las diferentes visitas e inspecciones visuales realizadas en sitio, donde se evidencio las diferentes medidas implementadas para dar cumplimiento a los requerimientos estipulados.

Consorcio Reforzamiento 2025 como medida de compensación al medio ambiente implemento un programa de residuos sólidos donde se evidencio un punto ecológico, un centro de acopio para residuos sólidos y se capacito al personal en la importancia de clasificar adecuadamente estos como medida que contribuye al mejoramiento del medio ambiente.

Para la prevención de accidentes laborales se observó acompañamiento permanente por parte de la constructora a los trabajadores donde se destacó el uso adecuado de EPP´s, y la cultura del autocuidado.

Se evidencio la importancia de la implementación del plan de manejo de transito ya que una buena señalización garantiza la prevención de accidentes

viales y afectaciones tanto a la comunidad como a los colaboradores de la organización.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de la empresa constructora en cuanto a los requerimientos ambientales, SST y plan de manejo de tránsito donde se pudo garantizar el buen desarrollo de la obra bajo los requerimientos establecidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Se realizó inspecciones periódicas a cumplimiento programa de residuos sólidos, donde se evidencio la clasificación adecuada de los residuos como también la capacitación al personal.
- Se evidencio instalación de señalización en la obra con cinta peligro, conos, colombinas, tipo trípode y cerramientos en lona, lo que garantiza la integridad de los trabajadores y el personal de la comunidad.
- Se exigió a la constructora que los trabajadores hicieran buen uso de los EPP´s, y que se realizara acompañamiento permanente durante su jornada laboral.
- Se enfatizó en el cumplimiento de programas ambientales tales como los residuos sólidos, uso eficiente del agua y la energía y de esta manera garantizar el desempeño del plan de manejo ambiental.
- Se verifico a través de inspecciones y visitas a la obra la implementación y cumplimientos de los requerimientos ambientales como el buen manejo y clasificación adecuada de residuos sólidos, la seguridad y la salud de los colaboradores y la señalización instalada correctamente.

ALCANCE

El alcance abarca durante la **CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.** Y verifica que las medidas de control sean implementadas de manera eficiente donde se evidencio las medidas orientadas a controlar y mitigar los impactos generados durante el desarrollo de las actividades.

Este informe tiene un alcance de verificación de las medidas de manejo ambiental y control de tránsito que se ejecutaron durante el desarrollo del proyecto donde se verifico el control y la mitigación de los impactos generados y además aseguro el tránsito de vehículos se realice de manera conveniente sin afectar a la población del sector.

Este informe contiene las evidencias de las medidas implementadas para compensar el impacto ambiental y social causado durante el desarrollo de las actividades.

LOCALIZACIÓN GENERAL

Proyecto ubicado en el municipio de Aguazul departamento de Casanare. El municipio de Aguazul se encuentra localizado en el piedemonte de la cordillera oriental.

Es uno de los 19 municipios que conforman el departamento de Casanare, haciendo parte de la zona centro junto con Yopal, Tauramena, Mani, nunchia y Recetor.

Tiene una extensión total de 1.329..96 Km y 31577 habitantes

Localización particular: El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Aguazul Casanare cuidadela la esperanza, ubicada en la zona norte del municipio en la dirección diagonal 23E con calle 18. Limita al norte con la ruta 65. Se encuentra limitado con las siguientes edificaciobes estructurales viales.

Norte: Via marginal de la selva

Sur: Diagonal 23 E, carrera 23 C y carrera 23 B de la nomenclura urbana.

Oriente: Caño Aguazulero, actualmente urbanozado

Occidente: Calle 17.

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El area de influencia directa es el bloque 17 de la cuidadela la esperanza donde se manifiestan los impactos y/o efectos directos generados en las obras de reforzamiento estructural que se esta adelantando en el conjunto habitacional cuidadela la esperanza del municipio de Aguazul, proceso que contempal actividadades de demolición, excavciones, construcción de zapatas, vigas y muros en concreto, impermeabilización de muros y obras

complementarias, Para determinar el area de influencia directa AID según plan de manejo ambiental se consulto APLICATIVO TREAMARCTOS la influencoa según esta herramienta preenta una afectación baja, el proyecto no tiene presencia sobre areas de protección, ecosistemas especiales, area de distribución de fauna sensible, resguardos o areas de interes arqueológico.



ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno

Demolicion a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02m

Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro

Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m

Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.

Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi

Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye accesorios.

Traslado de timbres

Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua de 1/2" y 3/4". Suministro e Instalacion

RECALCE DE CIMIENTOS EN TORRES

Excavacion a mano en material comun

Excavacion manual en conglomerado

Demolicion cimientos enterrados con retiro

Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material

Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada

Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi

Limpieza franja de trabajo

Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.

Acero de Refuerzo Grado 60

Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km

REFORZAMIENTO CON MUROS EN CONCRETO

Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar

Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.

Acero de Refuerzo Grado 60

Conector de cortante de Ø 3/8" x 570 mm con epoxico (incluye perforación L=200 mm). Suministro e Instal.

Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.

Piso porcelanato rectificado gris claro caras diferenciadas 60x60 cm de corona o similar

Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos

Limpieza mamposteria a la vista con acido

Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.

REFORZAMIENTO PUNTO FIJO

Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)

Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)

Reubicacion de viga IPE 220*110*6mm de estructura metalica en Acero ASTM - A500 C

Esmalte sobre lamina lineal

Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura

Pintura para baranda metalica

REPOSICION DE ANDENES

Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado

Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m.

Alistado de pisos e= 0.05 m

Sub base Granular para bacheo (Art. 320.2 INVIAS)

Malla Electrosoldada Q-5 o M 188

ADECUACIONES HIDROSANIARIAS


Desmonte De Canales Y Bajantes De Aguas Lluvias


Bajante aguas negras-grises 6"

FUNCIONES AMBIENTALES

PGS -1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A COMUNIDADES Y AUTORIDADES MUNICIPALES.

La interventoría verifico que la empresa constructora mantuviera informada a la comunidad sobre las diferentes actividades que se desarrollaron con el fin de mantener una comunicación acertada y de esta manera programar el tiempo de cada uno de los habitantes, se realizaron reuniones y además en la oficina se mantenía atención permanente a todos los habitantes don se desarrolló la obra.

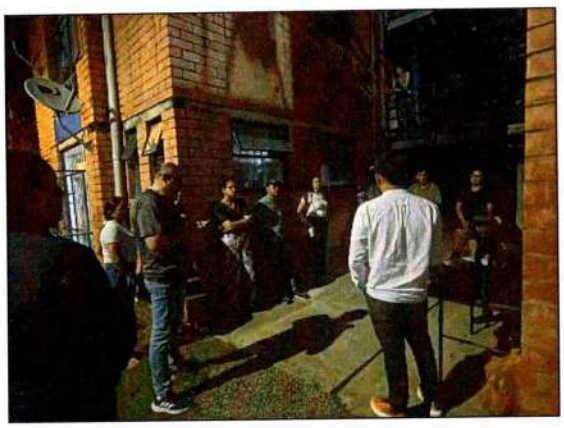

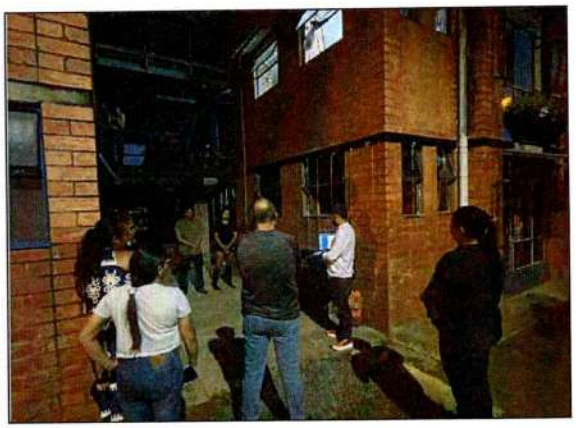

REUNIONES REALIZADAS ATENCIÓN COMUNIDADES

PGS -2 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SOCIOAMBIENTAL AL PERSONAL DEL PROYECTO

Se realizo verificación por parte de interventoria de las inducciones realizadas al personal que ingreso en la obra (Ver anexo anexo informe ambiental, SST y manejo de transito obra), ademas se realizaron charlas diarias que furon verificadas a traves de formatos de asistencia

PGS -3 RECEPCIÓN Y TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS

Se realizó verificación de interventoría que el consorcio informara a la comunidad sobre las diferentes actividades que se realizaron a diario en la obra. Y d esta manera la comunidad pueda programar su tiempo y realizar sus actividades de forma más cómoda.



REUNIONES REALIZADAS

PGS -4 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES

Interventoría realizo verificación donde se evidencia que 100% del personal de mano de obra no calificada pertenece o vive en el municipio de Aguazul, lo que brinda confianza con la empresa constructora que está comprometida con los habitantes del sector.

Durante la ejecución de la obra se tuvo prelación por el personal del municipio de Aguazul.

PGS 5 CONFORACIÓN DL GRUPO DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Se verifico con el contratista el grupo de trabajo estuvo conformado de la siguiente manera

Representante legal: SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES

Residente de obra: Fabio Nelson Peña Amezquita

Profesional ambiental: Kenny Geraldinne Salamanca Núñez

El anterior grupo de trabajo fue el encargado de dar cumplimiento al plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito y entregar la información oportuna a interventoría cuando sea requerida.

PGS -6 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

La interventoría realizo recorridos permanentes a la obra donde se identificó la existencia del programa de residuos sólidos y un personal comprometido con su cumplimiento, verificación a través de los registros de asistencias a charlas se realizó inspección visual, donde se verifico un punto ecológico con sus respectivas canecas para una adecuada clasificación de residuos sólidos y la construcción de un centro de acopio para almacenar los mismos.

Por otra parte, se verifico el titulo minero de la cantera que suministro los residuos pétreos en este caso.



PUNTO ECOLÓGICO **CENTRO DE ACOPIO**

PGS-SST -1 MANEJO DEL RIESGO A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES SG-SST

La interventoría realizo verificación del cumplimiento del área de SST

- Se realizó verificación de exámenes de ingreso para el personal que ingresaba a laborar.
- Se evidencio a través de registros de asistencia la inducción impartida por parte del consorcio al personal que ingresa a laborar.
- Se realizó verificación de seguridad social según planillas canceladas con el personal que labora en el consorcio.
- Se verifico en campo y a través del registro de entrega de dotaciones la entrega de los respectivos EPP´s necesarios para la actividad.
- Se realizó revisión en campo sobre la entrega de dotación al personal que labora para el consorcio y se verifica en el formato de entrega. informe ambiental, SST y de manejo de transito obra.
- La interventoría verifico la realización de charlas diarias por parte del área de HSE y del ingeniero residente con el objetivo de sensibilizar al personal en el autocuidado y la protección del medio ambiente.

- La interventoría realizo verificación de los respectivos permisos de trabajo como método del área de SST para aseguramiento del sitio de trabajo y las medidas de seguridad usadas.
- De igual manera se realizó verificación que el personal que realizo trabajos en alturas tenga los respetivos certificados
- Interventoría realizo la respectiva verificación de los pre operacionales que se le realizaron a las maquinas usadas, esto con el objetivo de prevenir accidentes que pueden ser ocasionados por máquinas y herramientas en mal estado.
- Por otra parte, se verifico la hidratación constante al personal
- Se evidencio la construcción de sitio para acopio de madera

INSPECCIÓN DE EPCC

SEÑALIZACIÓN GENERAL AMBIENTAL PMC -1

La interventoría realizo verificación de la señalización instalada que sea acorde con el peligro que se presenta y de esta manera se dio cumplimiento a plan de manejo de tránsito.





CERRAMIENTO CON LONA VERDE





SEÑALIZACIÓN CON CINTA PELIGRO

PMC – 2 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERILALES

- Se verifico documentos de vehículos y conductores al personal que suministra concreto para fundida de muros.
- Se verifico documentación vigente de canteras título minero y licencia ambiental



DESCARGUE DE METERIALES

PMC – 3 MANEJO DE CAMPAMENTOS TRANSITORIOS

Por verificación de interventoria se evidencio la construcción de una bodega para almacenamiento de materilales, una casta para el descanso de los trabajadores u se acosndiciono un apartamento como oficina de la obra.

CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS

PMC – 4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERILES SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN

Durante la ejecución de la obra por parte de la obra se verifico el material sobrante de la excavación donde una parte fue utilizado como relleno y la parte sobrante s entrego a ESPA para su respectiva disposición final,



MATERIAL EN ACOPIO

PMC – 5 MANEJO DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUPIOS – MANEJO DE COMBUSTIBLES.

Se realizó verificación de interventoría donde se evidencio que en la obra no se utilizó maquinaria ya que para la construcción de las diferentes actividades no es permitido y los equipos que allí se utilizan son eléctricos como retomártelo, pulidora, tronzadora y taladros, por lo que no hay generación de aceites usados.

Por otra parte, se verifica que la empresa que suministra concreto se estén verificando documentos tanto del vehículo como del personal y seguridad social.

PMR-1 MANEJO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

Se verifico por parte de interventoría los mantenimientos periódicos que se realizaron a la unidad sanitaria se toma registro fotográfico y se evidencia a través de los recibos de mantenimiento por parte de la empresa que realiza la actividad.

PMR-2 MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

La interventoría realizo verificación donde se evidencio los registros de charlas sobre sensibilización ambiental dadas al personal con el objetivo de dar cumplimiento al programa de residuos sólidos se muestra un punto ecológico para la clasificación de residuos sólidos y un centro de acopio para almacenar los respectivos residuos y posteriormente entregarlos a empresas autorizadas para su disposición final. También se evidencia un centro de acopio para madera.



PUNTO ECOLÓGICO



CENTRO DE ACOPIO

PMR-3 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

La interventoría realizo inspección donde se evidencio los controles utilizados por la empresa constructora para la mitigación del ruido por parte de equipos como rotomartillo, pulidoras y taladros, donde se verifico la doble protección auditiva y los pre operacionales que diariamente se realizan a los equipos con el objetivo de mantenerlos en buenas condiciones mecánicas.





PRN-1 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Se realizó verificación por parte de interventoría que el personal recibió charlas de sensibilización sobre la importancia de la flora y la fauna.

Según registro de asistencia a charlas se puede evidenciar charlas como:

- Contaminación ambiental
- Desechos peligrosos
- Importancia del agua para la vida
- Orden y aseo en áreas de trabajo
- Ahorro eficiente del agua
- Contaminación del aire

- Orden y aseo en áreas de trabajo

- Ahorro eficiente del agua
- Contaminación del aire
- Manejo de productos químicos
- Funciones de los árboles nativos
- Ahorro de energía electica
- Cuidemos el recurso agua
- Re ubicación de animales silvestres
- Código de colores residuos sólidos
- Agua recurso natural y vital para la vida
- Función de los árboles para la vida
- Importancia de las abejas en el medio ambiente
- Ahorro de energía eléctrica
- Agua recurso natural no renovable
- Clasificación adecuada de residuos sólidos
- Técnicas para ahorro de energía
- Cuidados de los arboles presentes en la obra
- Programa de residuos solidos
- Uso eficiente de la energía eléctrica
- Contaminación por residuos
- Contaminación del agua
- Contaminación del suelo
- Porque usar el código de colores
- Conservación de la flora y la fauna
- Técnicas de ahorro de agua

CONCLUSIONES

- Es responsabilidad de interventoria la verificación de los controles implementados con el objetivo de garantizar el menor impacto posible a nuestro medio ambiente y de igual manera aprobar los controles que se implementen en pro de la protección y la segurd de los trabajadores.

- Es de resaltar la importancia que la interventoria realice las respectivas verificaciones de los controles implementados por parte de la constructora ya que de sta manera se garantiza el cumplimiento de los requerimeintos.

- Por parte de interventoria se garantizo el compromiso de la empresa constructora en la prevención y consrvación del medio ambiente, mitigando su afectación a traves de programas ambientlaes como gestión de residuos sólidos, uso efienciente del agua y la energia electrica.

- La implementación de señalización son metodos que brindan la prevención de siniestros viales y afectación de la integridad física tanto de los habitantes del sector como de los colaboradores ya que a traves de ella se alerta sobre los peligros existentes.

- Se observo que el material de excavación se encuentra en acopio para luego ser entregado a empresa autorizada para su posterior disposición final.

- Se verifico la continuidad con el desarrollo del programa de residuos sólidos, se pudo evidenciar que el personal realiza de manera adecuada su clasificación.

ANEXO 2: PÓLIZAS

INTERVENTORIA 1024

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101003929	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	17	12	2025	00:00	19	04	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CRESSE CONSULTING S.A.S	NIT: 900.842.743-1

DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 17 A - 09	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO: 3105540494

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	NIT: 891.855.200-9

DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO 6392323

BENEFICIARIO: 891855200 - MUNICIPIO DE AGUAZUL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 01024 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/12/2025	19/04/2026	$284,700,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/12/2025	19/04/2026	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/12/2025	19/04/2026	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****239,850.00	$ *******3,000.00	$ ******46,141.00	$ **********288,991.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101003929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101003929	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	17	12	2025	00:00	19	04	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CRESSE CONSULTING S.A.S	NIT: 900.842.743-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 12 NRO. 17 A - 09	AGUAZUL, CASANARE	3105540494

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	NIT: 891.855.200-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 11 NRO. 11 - 35	AGUAZUL, CASANARE	6392323

BENEFICIARIO: 891855200 - MUNICIPIO DE AGUAZUL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/12/2025	19/04/2026	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/12/2025	19/04/2026	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/12/2025	19/04/2026	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101003929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101008677	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	17	12	2025	00:00	17	12	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CRESSE CONSULTING S.A.S	NIT: 900.842.743-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 NRO. 17 A - 09	AGUAZUL, CASANARE	3105540494

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AGUAZUL	NIT: 891.855.200-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 NRO. 11 - 35	AGUAZUL, CASANARE	6392323

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 01024 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OPERA CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/12/2025	17/10/2026	$9,731,650.80	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17/12/2025	17/10/2026	$48,658,254.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/12/2025	19/04/2029	$4,865,825.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/12/2025	17/12/2030	$9,731,650.80	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****227,134.00	$ *******8,000.00	$ ******44,675.00	$ **********279,809.00	$ *******72,987,381.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101008677

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1 General Information
2 Conditions
3 Catalogue Items
4 Attestation Documents
5 Contract Document
6 Budget Information
7 Contract Execution
8 Contract Versions
9 Non-Compliances

Cancel | Previous Step | Buyer Evaluation | Next Step

VIEW CONTRACT

Documents Type

Documents Type: No — Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Sentencia T-302 de 2017

Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017: Yes / No — Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

Financial & Delivery Conditions

Delivery options

Renewable Contract? Yes / No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties? Yes / No

Warranties by lots, groups or stages Yes / No

Seriousness of the offer Yes / No

% Value of the Contract: 10,00

Compliance Yes / No

- Good use and right investment of the advance payment
  - % of advance payment: 100,00 — Warranty Start Date: 25/11/2025 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Value of the warranty — Warranty End Date: 25/09/2026 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Contract Compliance
  - % of contract value: 10,000000 — Warranty Start Date: 25/11/2025 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Value of the warranty — Warranty End Date: 25/09/2026 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Wages payment
  - % of contract value: 5,00 — Warranty Start Date: 25/11/2025 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Value of the warranty — Warranty End Date: 25/03/2029 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Quality of Service
  - % of contract value: 10,00 — Warranty Start Date: 25/11/2025 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Value of the warranty — Warranty End Date: 25/03/2031 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Extra-contractual civil liability Yes / No

Number of minimum wages: 200

Due date to deliver Warranties: 25/11/2025 10:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Warranties Delivery Date: 17/12/2025 12:22:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Value	Issuer	End date	State	
CO1.WRT.18680300	Extra-contractual	Insurance Contract	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL	24 days left	Accepted	Detail

	civil liability			ESTADO	(19/04/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
CO1.WRT.18680515	Compliance - Good use and right investment of the advance payment	Bank	72.987.381,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Accepted	Detail
CO1.WRT.18604083	Extra-contractual civil liability	Bank	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11 days left (6/04/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Accepted	Detail
CO1.WRT.18604547	Compliance - Good use and right investment of the advance payment	Bank	72.987.381,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/10/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Accepted	Detail
CO1.WRT.18483447	Seriousness of the offer	-	9.731.650,80 COP	-	18/02/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Expired	Detail

Add

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan? Yes No

Payment Conditions

Payment Method

Invoice Payment Deadline

Contract Comments

Comment:

Contract Attachments

Description

No items found...

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: Calle 11 No 11-35 Tercer Piso

Location CO-CAS-85010 - Aguazul

Country COLOMBIA

State/City Casanare

Province Aguazul

Address Calle 11 No 11-35 Tercer Piso

ZIP Code 856010

	Degrees (°)	Minutes (')	Seconds (")
Latitude:			
Longitude:			

Additional Locations

X-Ref	Address	Location

1 calle 11 No 11-35 COLOMBIA > Casanare > Aguazul

Cancel Previous Step Buyer Evaluation Next Step

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda English

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

OBRA CTO 1045

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ca3SJ6f3KdfQ1vNzHqpATQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100423897	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72775975	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/12/2025	24:00 Horas Del	10/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	902017884-0
DIRECCIÓN	CL 14 A 3 E 2 TORRES DE SION AP 505	**TELÉFONO**	3103286323
ASEGURADO	MUNICIPIO DE AGUAZUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	891855200-9
DIRECCIÓN	CALLE 11 NO 11-35	**TELÉFONO**	6345995
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE AGUAZUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	891855200-9
DIRECCIÓN	CALLE 11 NO 11-35	**TELÉFONO**	6345995

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONOCE ACTA DE INICIO CON FECHA DE FIRMA 26 DE ENERO DE 2026
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.01045 EL AÑO 2025.
CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 830105738 (PART. 60,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900627856 (PART. 40,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 10/11/2026	106.855.699,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 10/11/2026	534.278.495,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 10/05/2029	53.427.849,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/05/2026	24:00 Horas Del 10/05/2031	320.567.097,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.015.129.140,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AXEGURO LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100423897	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72775975	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/12/2025	24:00 Horas Del	10/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R800000027-D00I

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: TJFVUjdTzjhVoPeARUNAXQ==

No. PÓLIZA	NB-100112749	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72780892	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/12/2025	24:00 Horas Del	10/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	902.017.884-0
DIRECCIÓN	CL 14 A 3 E 2 TORRES DE SION AP 505	TELÉFONO	3103286323
ASEGURADO	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	902.017.884-0
DIRECCIÓN	CL 14 A 3 E 2 TORRES DE SION AP 505	TELÉFONO	3103286323
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONOCE ACTA DE INICIO CON FECHA DE FIRMA 26 DE ENERO DE 2026

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.01045 EL AÑO 2025 , CUYO OBJETO ES

COSNTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIO$	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AXEGURO LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100112749	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72780892	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/12/2025	24:00 Horas Del	10/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 830105738 (PART. 60,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900627856 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE AGUAZUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE AGUAZUL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE AGUAZUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100423897** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE AGUAZUL / MUNICIPIO DE AGUAZUL ,** expedida por la Compañía en **28/01/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **28** días del mes **ENERO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CO1.WRT.19247992	Responsabilidad civil extracontractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 pesos	SEGUROS MUNDIAL	05/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	[
CO1.WRT.18720007	Responsabilidad civil extracontractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 pesos	SEGUROS MUNDIAL	04/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	[
CO1.WRT.18718648	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	480.850.645,50 pesos	SEGUROS MUNDIAL	04/05/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	[
CO1.WRT.18516153	Seriedad de la oferta	-	106.855.699,00 pesos	-	Quedan 11 días *(21/02/2026 23:59 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	[

Agregar

Configuración financiera - Pagos avanzados

¿Qué es un plan de pago? Sí No

Condiciones de pago

Método de pago

Fecha límite de pago de facturas

Comentarios del contrato

Comentario:

Anexos del contrato

Descripción

No se encontraron artículos...

Ubicación del contrato

Emplazamiento principal de las obras, lugar de entrega o de ejecución: Calle 11 No 11-35 Tercer Piso

Ubicación CO-CAS-85010 - Aguazul

País COLOMBIA

Estado/Ciudad Casanare

Provincia Aguazul

DIRECCIÓN Calle 11 No 11-35 Tercer Piso

Código postal 856010

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Ubicaciones adicionales

X-Ref	DIRECCIÓN	Ubicación
1	Calle 11 No 11-35	COLOMBIA > Casanare > Aguazul

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Inglés 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Artículos del catálogo
4 Documentos de certificaci...
5 Documento contractual
6 Información presupuestaria
7 Ejecución del contrato
8 Versiones del contrato
9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Tipo de documentos

Tipo de documentos: No — Tipos de documentos adoptados por la ANCP-CCE bajo la Ley 2022 de 2020

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las providencias emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017: ○ Sí ○ No — Proceso asociado a las providencias emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones financieras y de entrega

Opciones de entrega

¿Contrato Renovable? ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Qué es Garantías? ○ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ○ No

Seriedad de la oferta ○ Sí ○ No

○ % Valor del Contrato 10,00

Cumplimiento ○ Sí ○ No

○ Cumplimiento del contrato

○ % del valor del contrato 10.000000 — Fecha de inicio de la garantía 18/11/2025 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de finalización de la garantía 08/06/2026 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

○ % del valor del contrato 5,00 — Fecha de inicio de la garantía 18/11/2025 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de finalización de la garantía 25/02/2028 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Estabilidad y Calidad de las Obras

○ % del valor del contrato 30,00 — Fecha de inicio de la garantía 18/11/2025 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de finalización de la garantía 26/02/2031 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extracontractual ○ Sí ○ No

○ Número de salarios mínimos 200

Fecha límite de entrega de garantías: 12/01/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** Hace 3 horas *(02/10/2026 10:24:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

ID de garantía	Objetivo	Tipo de garantía	Valor	Editor	Fecha de finalización	Estado
CO1.WRT.19248061	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	480.850.645,50 pesos	SEGUROS MUNDIAL	05/10/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado

ANEXO 3: -SEGURIDAD SOCIAL
-NOMINAS

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

NOMINA CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

NIT: 902017884-0

PERIODO DE PAGO

MES DE ENERO 2026

N°	ID	NOMBRE COMPLETO	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUXILIO TRANSPORTE	DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	NETO PAGAR	FIRMA
1	9,397,224	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA	9397224	RESIDENTE DE OBRA	$ 1,750,905	30	$ 1,750,905	$ 249,095	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 140,072	$ 1,859,928	
2	77,016,379	LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO	77019379	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,750,905	30	$ 1,750,905	$ 249,095	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 140,072	$ 1,859,928	
3	1,116,551,901	KENNY GERALDINNE SALAMANCA NUÑEZ	1116551901	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1,750,905	30	$ 1,750,905	$ 249,095	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 140,072	$ 1,859,928	
4	1,116,548,416	MARIA ANGELICA TORRES AGUILAR	1116548416	PSICOLOGA	$ 1,750,905	30	$ 1,750,905	$ 249,095	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 140,072	$ 1,859,928	
5	47,439,331	MIRYAM YANETH BERNAL SANCHEZ	47439331	PROFESIONAL HSEQ	$ 1,750,905	30	$ 1,750,905	$ 249,095	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 140,072	$ 1,859,928	
							$ 8,754,525	$ 1,245,475	$ 10,000,000	$ 350,181	$ 350,181	$ 700,362	$ 9,299,638	

ELABORO
RESPONSABLE DE NOMINA

APROBO
SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

137

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830105738-1	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS	CALLE 93b No. 15 -34 OFICINA 302	8051014	COOPNAL@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		42985193	19/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$1,750,905	$440.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	37	1.700	0	71.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	37	6.700	0	286.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	37	300	9.500			92	9.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	70.100	37	1.700	71.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	37	0	0	0
ICBF				
0	37	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	71.800
Pensión	1	280.200	286.900
Riesgos Laborales	1	9.200	9.500
CCF	1	70.100	71.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.600	440.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830105738-1	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS	CALLE 93b No. 15 -34 OFICINA 302	8051014	COOPNAL@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		42985193	19/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$1,750,905	$440.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	LMA	VAC	AFP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79616221	CARRILLO TORRES SANDRO WVALTER	1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017884
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CIUDADELA LA ESPERANZA	TELÉFONO:	6015858
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1113362092		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		6					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2514242800

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 411.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 411.200	$ 1.600	$ 412.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 102.800	$ 400	$ 103.200
SUBTOTALES:										**$ 514.000**	**$ 2.000**	**$ 516.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 77.100	$ 300	$ 0	$ 77.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 51.400	$ 200	$ 0	$ 51.600
SUBTOTALES:													**$ 128.500**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 129.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 223.500	$ 223.500	$ 900	$ 0	$ 224.400
SUBTOTALES:									**$ 223.500**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 224.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	5	$ 128.500	$ 500	$ 129.000
SUBTOTALES:			**$ 128.500**	**$ 500**	**$ 129.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118548418	TORRES AGUILAR MARIA ANGELICA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																	230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999	2	$ 44.700	11	$ 641.999	CCF69-COMFACASANARE	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1118551901	SALAMANCA NUÑEZ KENNY GERALDINN E	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																	230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS005-SANITAS S.A	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999	2	$ 44.700	11	$ 641.999	CCF69-COMFACASANARE	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 47439331	BERNAL SANCHEZ MIRYAM YANETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																	230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS005-SANITAS S.A	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999	2	$ 44.700	11	$ 641.999	CCF69-COMFACASANARE	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77018379	RIVERO LONDOÑO LEIDER ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																	25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999	2	$ 44.700	11	$ 641.999	CCF69-COMFACASANARE	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 9397224	PEÑA AMEZQUITA FABIO NELSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																	230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS005-SANITAS S.A	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999	2	$ 44.700	11	$ 641.999	CCF69-COMFACASANARE	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 998.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9657251
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JULIO GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20 YOPAL CASANARE	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			6006277284	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/06				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 0	$ 37.400
SUBTOTALES:										**$ 37.400**	**$ 0**	**$ 37.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 29.200
SUBTOTALES:													**$ 29.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.300	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 16.300
SUBTOTALES:									**$ 16.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9657251	GAITAN CARLOS JULIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO	27																	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4	$ 233.454	$ 29.200	$ 0	$ 29.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 233.454	9657251	$ 16.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 82.900

Planilla NO Pagada

741

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9657251
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JULIO GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20 YOPAL	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1750211762**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/02/12	0	$ 0	$ 82.900
2026/02/13	1	$ 300	$ 83.200
2026/02/16	4	$ 300	$ 83.200
2026/02/17	5	$ 400	$ 83.300
2026/02/18	6	$ 500	$ 83.400
2026/02/19	7	$ 500	$ 83.400

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 37.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 37.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 29.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 29.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 16.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 16.300**

TOTAL POR PAGAR: $ 82.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9657251
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JULIO GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20 YOPAL CASANARE	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1750211754	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/06			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.000	$ 0	$ 187.000
SUBTOTALES:										**$ 187.000**	**$ 0**	**$ 187.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 28.200
SUBTOTALES:													**$ 47.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 81.500	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 81.500
SUBTOTALES:									**$ 81.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 81.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	5	$ 47.000	$ 0	$ 47.000
SUBTOTALES:			**$ 47.000**	**$ 0**	**$ 47.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006443447	TORRES TORRES DUMAR SCHNEIDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 233.454	9657251	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010091586	SANCHEZ BOTELLO DIEGO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	NUEVA EPS CM	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 233.454	9657251	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1118580448	HERNANDEZ PEREZ WILMER EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 233.454	9657251	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 4153816	BOYENECH E OCHOA ANYELO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 233.454	9657251	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 74860094	ACHAGUA LUIS FERNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 233.454	9657251	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 362.500**

142

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9657251
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JULIO GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20	YOPAL TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1750211754**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/02/12	0	$ 0	$ 362.500
2026/02/13	1	$ 700	$ 363.200
2026/02/16	4	$ 1.300	$ 363.800
2026/02/17	5	$ 1.400	$ 363.900
2026/02/18	6	$ 1.800	$ 364.300
2026/02/19	7	$ 2.000	$ 364.500

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 187.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 187.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 9.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 9.400
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3	$ 28.200
		SUBTOTAL:	5	**$ 47.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	5	$ 47.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 47.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	$ 81.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 81.500**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 362.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9657251
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JULIO GAITAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20	YOPAL TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1750211754**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/02/12	0	$ 0	$ 362.500
2026/02/13	1	$ 700	$ 363.200
2026/02/16	4	$ 1.300	$ 363.800
2026/02/17	5	$ 1.400	$ 363.900
2026/02/18	6	$ 1.800	$ 364.300
2026/02/19	7	$ 2.000	$ 364.500

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 187.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 187.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 9.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 9.400
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3	$ 28.200
		SUBTOTAL:	5	**$ 47.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	5	$ 47.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 47.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	$ 81.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 81.500**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 362.500**

NIT. 900.842.743 – 1	CRESSE CONSULTING S.A.S **NÓMINA**	CÓDIGO	AF-FT-03
		VERSIÓN	1
		FECHA	OCTUBRE DE 2017

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
DICIEMBRE 2025

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No.	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS	IBC	AUXILIO TRANSP.	VALOR DEVENGADO	DESCUENTOS			TOTAL A PAGAR	FIRMA Y CEDULA
									SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS		
1	LEIDY DE JESUS CUENTAS PERALTA	1049617846	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 3,558,750	19	$ 2,253,875	$ 0	$ 2,253,875	$ 90,155	$ 90,155	$ 180,310	$ 2,073,565	
2	JHON WILMAR CASTRO MORA	1116544012	TECNOLOGO DE INTERVENTORIA	$ 1,423,500	19	$ 901,550	$ 126,667	$ 1,028,217	$ 36,062	$ 36,062	$ 72,124	$ 956,093	
3	CAMILO ANDRES FORERO GALAN	74814849	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3,202,875	19	$ 2,028,488	$ 0	$ 2,028,488	$ 81,140	$ 81,140	$ 162,279	$ 1,866,209	
4	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA	1116552719	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ 160,000	$ 2,040,000	
	TOTALES			**$ 10,185,125**		**$ 7,183,913**	**$ 326,667**	**$ 7,510,580**	**$ 287,357**	**$ 287,357**	**$ 574,713**	**$ 6,935,867**	

DEVENGADO				DEDUCCIONES		PROVISIONES		PROVISIONES			
Sueldo Basico	$ 7,183,913	Recargos Nocturnos	0	Aportes	$ 574,713	Cesantias	$ 625,631	Comfacasanare	$ 287,357		
Horas Extras Dominicales Diurnas	-	Recargos Nocturnos Festivos	0			Intereses Cesant.	$ 6,256	ICBF	$ 0		
Horas Extras Nocturnas	-	Recargos Festivos	0	TOTAL DEDUCCIONES	$ 574,713	Prima	$ 625,631	SENA	$ 0		
Horas Extras Diurnas	-		0			Vacaciones	$ 299,569	SUBTOTAL	$ 287,357		
Horas Extras Nocturnas Festivas	-	TOTAL DEVENGADO	$ 7,183,913	NETO A PAGAR	$ 6,609,200	SUBTOTAL	$ 1,557,088		$ 1,844,445	ELABORO	REVISO

NIT. 900.842.743 – 1	CRESSE CONSULTING S.A.S **NÓMINA**	CÓDIGO	AF-FT-03
		VERSIÓN	1
		FECHA	OCTUBRE DE 2017

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
ENERO 2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No.	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS	IBC	AUXILIO TRANSP.	VALOR DEVENGADO	DESCUENTOS			TOTAL A PAGAR	FIRMA Y CEDULA
									SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS		
1	LEIDY DE JESUS CUENTAS PERALTA	1049617846	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 3,558,750	30	$ 3,558,750	$ 0	$ 3,558,750	$ 142,350	$ 142,350	$ 284,700	$ 3,274,050	
2	JHON WILMAR CASTRO MORA	1116544012	TECNOLOGO DE INTERVENTORIA	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	$ 249,095	$ 1,672,595	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,558,715	
3	CAMILO ANDRES FORERO GALAN	74814849	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3,202,875	30	$ 3,202,875	$ 249,095	$ 3,451,970	$ 128,115	$ 128,115	$ 256,230	$ 3,195,740	
4	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA	1116552719	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2,500,000	30	$ 2,500,000	$ 0	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 200,000	$ 2,300,000	
	TOTALES			$ 10,685,125		$ 10,685,125	$ 498,190	$ 11,183,315	$ 427,405	$ 427,405	$ 854,810	$ 10,328,505	

DEVENGADO				DEDUCCIONES		PROVISIONES		PROVISIONES			
Sueldo Basico	$ 10,685,125	Recargos Nocturnos	0	Aportes	$ 854,810	Cesantias	$ 931,570	Comfacasanare	$ 427,405		
Horas Extras Dominicales Diurnas	-	Recargos Nocturnos Festivos	0			Intereses Cesant.	$ 9,316	ICBF	$ 0		
Horas Extras Nocturnas	-	Recargos Festivos	0	TOTAL DEDUCCIONES	$ 854,810	Prima	$ 931,570	SENA	$ 0		
Horas Extras Diurnas	-		0			Vacaciones	$ 445,570	SUBTOTAL	$ 427,405		
Horas Extras Nocturnas Festivas	-	TOTAL DEVENGADO	$ 10,685,125	NETO A PAGAR	$ 9,830,315	SUBTOTAL	$ 2,318,026		$ 2,745,431	ELABORO	REVISO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900842743
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CRESSE CONSULTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 #17A-09 LUIS MARIA JIMENEZ	TELÉFONO:	6383303
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	06 - CIUDADELA II
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6003062661	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2063566499

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 588.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 588.500	$ 400	$ 588.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 324.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 324.600	$ 200	$ 324.800
SUBTOTALES:										**$ 913.100**	**$ 600**	**$ 913.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 81.200	$ 100	$ 0	$ 81.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 147.200	$ 100	$ 0	$ 147.300
SUBTOTALES:													**$ 228.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 228.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 397.200	$ 397.200	$ 300	$ 0	$ 397.500
SUBTOTALES:									**$ 397.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 397.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	$ 228.400	$ 200	$ 228.600
SUBTOTALES:			**$ 228.400**	**$ 200**	**$ 228.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RECONOMIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049617846	CUENTAS PERALTA LEIDY DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI								12-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.775.825	$ 444.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 444.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.775.825	$ 111.100	$ 0	$ 111.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.775.825	2	$ 193.200	30	2.775.825	$CCF69-COMFACASANARE	$ 111.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1118544012	CASTRO MORA JOHN WILMAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	12																	230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 901.550	2	$ 82.800	19	$ 901.550	CCF69-COMFACASANARE	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 3.202.875	FIJO			SI	12																	25-14 COLPENSIONES	19	$ 2.028.488	$ 324.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.600	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 2.028.488	$ 81.200	$ 0	$ 81.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 2.028.488	2	$ 141.200	19	$ 2.028.488	$CCF69-COMFACASANARE	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.768.400

147

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900842743
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CRESSE CONSULTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 #17A-09 LUIS MARIA JIMENEZ	TELÉFONO:	6383303
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - R PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6002937468	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2073837105

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													**$ 80.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 80.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:			**$ 80.000**	**$ 0**	**$ 80.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1116545173	SARMIENTO BONILLA LEIDY JOHANNA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000	2	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 490.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900842743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRESSE CONSULTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 #17A-09 LUIS MARIA JIMENEZ	TELÉFONO:	6383303
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	06 - CIUDADELA II
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004416147	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40048931

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 849.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.600	$ 0	$ 849.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 512.500
SUBTOTALES:										**$ 1.362.100**	**$ 0**	**$ 1.362.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.200	$ 0	$ 0	$ 128.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 212.500
SUBTOTALES:													**$ 340.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 340.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 592.600	$ 592.600	$ 0	$ 0	$ 592.600
SUBTOTALES:									**$ 592.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 592.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	$ 340.700	$ 0	$ 340.700
SUBTOTALES:			**$ 340.700**	**$ 0**	**$ 340.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049617846	CUENTAS PERALTA LEIDY DE JESUS	DEPEND		$ 3.558.750	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.558.750	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 569.400	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 142.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.558.750	2	$ 247.700	30	$ 3.558.750	$CCF69-COMFACASANARE	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116544012	CASTRO MORA JOHN WILMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	2	$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 3.202.875	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.202.875	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.202.875	$ 128.200	$ 0	$ 128.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.202.875	2	$ 223.000	30	$ 3.202.875	$CCF69-COMFACASANARE	$ 128.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.636.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900842743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRESSE CONSULTING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 #17A-09 LUIS MARIA JIMENEZ	TELÉFONO:	6383303
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - R PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6004415922		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			39976901

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:										**$ 400.000**	**$ 0**	**$ 400.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
SUBTOTALES:													**$ 100.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.100	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 13.100
SUBTOTALES:									**$ 13.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
SUBTOTALES:			**$ 100.000**	**$ 0**	**$ 100.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN						SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116545173	SARMIENTO BONILLA LEIDY JOHANNA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.500.000	2	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 613.100

Planilla Pagada

ANEXO 4: ENSAYOS DE LABORATORIO

INCONS INGENIERIA LTDA.

INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17A - 10 CEL. 3102834805 YOPAL - CASANARE

E-MAIL: INCONSINGLTDA@HOTMAIL.COM PAGINA WEB: WWW.INCONSINGENIERIALTDA.COM

RESISTENCIA DE COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. E – 410 – 13

F-LB C6
Version 6 - Pag 1


OBRA: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BLOQUES CIUDADELA
INTERESADO: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
FECHA: 20/02/2026

RESPONSABLE : ING. MARLON ZARAMA
TELEFONOS: 32236663882
DIRECCION:
E-MAIL: consorcioreforzamiento2025@gmail.com

CILINDRO No	FECHA DE FUNDIDO			FECHA DE ROTURA			EDAD ROTURA (DIAS)	CARGA ROTURA (KN)	PESO CILINDRO (KG)	ALTURA CILINDRO (CM)	DIAMETRO PROMEDIO		AREA			ESFUERZO ROTURA			PROYECCION (28 DIAS)	% RESISTENCIA ESPECIFICADA	ESPECIFICACION DEL DISEÑO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	D	M	A	D	M	A					(CM)	(MM)	MM2	CM2	PULG2	Kg./Cm2	PSI	(MP)					
1	13	2	2026	20	2	2026	7	234.2	13.011	30.0	15.1	151	17908	179.1	27.8	133.4	1893	13.1	2981	63.10	3000	A	RECALCE CIMIENTO
	13	2	2026	20	2	2026	7	242.7	12.976	30.1	15.1	151	17908	179.1	27.8	138.2	1962	13.6	3069	65.39		A	
	13	2	2026	20	2	2026	7	250.1	13.010	30.1	15.0	150	17672	176.7	27.4	144.3	2049	14.2	3180	68.28		B	
	13	2	2026	13	3	2026	28																
	13	2	2026	13	3	2026	28																
	13	2	2026	13	3	2026	28																

OBSERVACIONES: LOS CILINDROS FUERON TOMADOS Y TRAIDOS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

TIPOS DE FALLA



LABORATORISTA:
JOSE PALACIOS

INCONS INGENIERIA LTDA.
NIT.: 832.000.118-9
V.B. INGENIERO RAUL SUAREZ
M.P. 25202-45189 CND

ANEXO 5: ACTAS GENERADAS

Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE INICIO**	

Acta No. 1 del 26 de Enero de 2026

CONTRATO	:	1045 de 18-12-2025 (BIEN)
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO	:	MA-LP-SI-009-2025
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	:	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
NIT/CC	:	902017884-0
REPRESENTANTE LEGAL	:	SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
CC	:	79616221
VALOR	:	$1.068.556.990,00 M/CTE
PLAZO	:	Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS
FECHA INICIO	:	26-01-2026
FECHA TERMINACIÓN	:	10-05-2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el Supervisor de Contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así mismo manifiesta que verificó el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
2) El contratista a su vez manifiesta que conoce las condiciones contractuales, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el contrato y la normatividad vigente para dar inicio a la ejecución de actividades.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026,se reunieron el señor(a) **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **79616221** de **Bogotá D.C.,** en calidad de representante legal del **CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025** identificado con NIT **902017884-0** quien actúa en calidad de contratista de obra, la señora **LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1116545173** de **YOPAL,** en calidad de representante legal de **CRESSE CONSULTING S.A.S.** identificada con NIT **900842743-1** quien actúa en calidad de interventor y el ingeniero **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA** quien actúa en calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 1024 de 2025, con el fin de dar INICIO a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
R/L CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
Contratista.

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S.
Interventoría.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor de Cto de Interventoría 1024-2025
Secretario De Infraestructura

Revisó: DINA SOFIA BARRETO ROSAS
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO SIA

Elaboró: YENNY ALEJA RODRIGUEZ OTALORA
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE INICIO**	

No. 1 del 17-12-2025

CONTRATO	:	1024 de 04-12-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	CONCURSO DE MÉRITOS
PROCESO	:	MA-CMA-SI-018-2025
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	:	CRESSE CONSULTING S.A.S.
NIT/CC	:	900842743-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
CC	:	1116545173
VALOR	:	$ 97.316.508,00 M/CTE
PLAZO	:	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO	:	16-12-2025
FECHA TERMINACIÓN	:	15-04-2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el Supervisor de Contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así mismo manifiesta que verificó el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
2) El contratista a su vez manifiesta que conoce las condiciones contractuales, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el contrato y la normatividad vigente para dar inicio a la ejecución de actividades.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025,se reunieron el señora **LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1116545173** de **YOPAL**, en calidad de representante legal de **CRESSE CONSULTING S.A.S.** identificada con NIT **900842743-1** quien actúa en calidad de contratista, y el Ingeniero **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA** quien actúa en calidad de supervisor con el fin de dar INICIO a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA R/L
CRESSE CONSULTING S.A.S.
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a).

Revisó: NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: YENNIS PAOLA RODRIGUEZ OTALORA FF
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

Alcaldía de Aguazul	ACTA ACLARATORIA	

ACTA No. 2 Aclaratoria No. 01 Al Acta de Inicio No. 01 de fecha 17 de diciembre del 2025

MODALIDAD:	CONCURSO DE MERITOS
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
CONTRATO:	No.1024 de 04-12-2025
PROCESO:	MA-CMA-SI-018-2025
CONTRATISTA	CRESSE CONSULTING S.A.S.
R/L:	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
NIT:	900842743-1
C.C. No.	1.116.545.173 de YOPAL – CASANARE
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO:	$ 97.316.508,00
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO:	17-12-2025
FECHA TERMINACIÓN:	16-04-2026

ACLARACIÓN: Mediante la presente acta se procede a realizar aclaración No. 01 al Acta de inicio No. 01 de fecha 17 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de Supervisor,** y **LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA**, identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.116.545.173 de Yopal, en su calidad de Contratista Interventor, con el fin de aclarar el Acta No. 01 de Inicio del contrato, por los siguientes motivos:

1. Que, el día 17 de diciembre de 2025 se suscribió el **Acta de inicio No. 01** del contrato de consultoría (interventoría) No. 1024 de 04 de diciembre de 2025, pero por un error involuntario dentro de la mencionada acta quedo estipulado que la fecha de inicio del contrato es de 16 de diciembre de 2025, siendo la fecha de inicio correcta del contrato el día 17 de diciembre de 2025, y consecuentemente la fecha de terminación del mismo será para el 16 de abril de 2026.

Alcaldía de Aguazul	ACTA ACLARATORIA	

2. Los demás literales y numerales del acta No. 01 de Inicio de fecha 17 de diciembre de 2025 se conservan en su integridad.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025.

CRESSE CONSULTING S.A.S.
R/L: LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional Jurídico SIA

Elaboró:
YENNY PAOLA RODRIGUEZ OTALORA
Profesional Contratado SIA

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

Alcaldía de Aguazul	ACTA ENTREGA DE ANTICIPO	

ACTA No. 3 – 23 de diciembre del 2025

MODALIDAD:	CONCURSO DE MERITOS
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
CONTRATO:	No.1024 de 04-12-2025
PROCESO:	MA-CMA-SI-018-2025
CONTRATISTA	CRESSE CONSULTING S.A.S.
R/L:	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
NIT:	900842743-1
C.C. No.	1.116.545.173 de YOPAL – CASANARE
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO:	$ 97.316.508,00
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO:	17-12-2025
FECHA TERMINACIÓN:	16-04-2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de Supervisor,** y **LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA**, identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.116.545.173 de Yopal, en su calidad de Contratista Interventor, con el fin de Suscribir la presente Acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 20251024 de 04 de diciembre del 2025 para la entrega del anticipo.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES

SUSPENSIONES

B. ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$ 48.658.254,00	50 %	$ 97.316.508,00

IDENTIFICACION BANCARIA: CUENTA D0E AHORROS DE BANCO DAVIVIENDA No. 091600076789 APERTURADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 DENOMINADA: **CRESSE CONSULTING S.A.S,** SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA.



C. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	Personal Profesional, salarios, prestaciones sociales	$48.658.254,00	100 %
	TOTAL	**$ 48.658.254,00**	**100%**

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones.

D. GARANTIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula decimo primera y en aprobación por la Oficina Asesora Jurídica de fecha 19 de diciembre de 2025, el manejo del anticipo está amparado, así:

ASEGURADORA	No. PÓLIZA	ANEXO	AMPARO	VEGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TOTAL, SEGURADORA
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/12/2025	06/04/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/12/2025	06/04/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/12/2025	06/04/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	04/12/2025	04/10/2026	$ 9.731.650,80
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/12/2025	04/10/2026	$ 48.658.254,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2025	06/04/2026	$ 4.865.825,40
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	0	CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2025	04/12/2026	$ 9.731.650,80
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	17/12/2025	17/10/2026	$ 9.731.650,80
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/12/2025	17/10/2026	$ 48.658.254,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17/12/2025	19/04/2029	$ 4.865.825,40
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	CALIDAD DEL SERVICIO	17/12/2025	17/12/2030	$ 9.731.650,80
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/12/2025	19/04/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/12/2025	19/04/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	57-44-101008677	2	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/12/2025	19/04/2026	$ 284.700.000,00

Alcaldía de Aguazul	ACTA ENTREGA DE ANTICIPO	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 23 de diciembre del 2025, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas

CRESSE CONSULTING S.A.S.
R/L: LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional Jurídico SIA

Elaboró:
YENNY PAOLA RODRIGUEZ OTALORA
Profesional Contratado SIA

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

ANEXO 6: COMITES

Cresse Consulting S.A.S NIT. 900.842.742-1	**CRESSE CONSULTING S.A.S**
	ACTA DE COMITÉ
	FECHA: 6 de febrero 2025

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
INTERVENTORÍA	CRESSE CONSULTING S.A.S
NÚMERO DE CONTRATO OBRA	01045 DEL 2025
NÚMERO DE CONTRATO INTERVENTORIA	01024 DEL 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

DESARROLLO DE COMITÉ

-Hoy viernes 6 de febrero de 2026, en las instalaciones del contratista de interventoría, se llevó a cabo el comité técnico, con la participación de los profesionales de obra y de interventoría, con el fin de exponer el estado y avance del desarrollo de la obra.
Durante el comité, el ingeniero residente de obra manifestó que, a la fecha, se registra un avance del 8 %, teniendo en cuenta la ejecución de las siguientes actividades:

- **ACTIVDADES PRELIMINARES.**

  - Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno.
  - Demolicion a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02m.
  - Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro.
  - Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m.
  - Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.
  - Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye accesorios.

Cresse Consulting S.A.S NIT. 920.942.718-1	CRESSE CONSULTING S.A.S
	ACTA DE COMITÉ
	FECHA: 6 de febrero 2025

➢ **ACTIVIDADES DE RECALCE EN CIMIENTOS.**

- Excavacion a mano en material común.
- Excavacion manual en conglomerado.
- Demolicion cimientos enterrados con retiro.
- Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material.
- Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada.
- Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi.
- Acero de Refuerzo Grado 60.

- El ingeniero residente de obra informa que para la próxima semana se tiene previsto realizar la fundición del concreto correspondiente al recalce en dos zonas tipo 1 y dos zonas tipo 2, de acuerdo con la programación establecida. Asimismo, señala que previamente se garantizará la verificación del acero de refuerzo, el encofrado y las condiciones técnicas requeridas, con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y las normas de calidad vigentes.

Cresse Consulting S.A.S	**CRESSE CONSULTING S.A.S**
	ACTA DE COMITÉ
	FECHA: 6 de febrero 2025

COMPROMISOS

-Los profesionales de obra se comprometen a entregar los informes mensuales dentro de las fechas establecidas, conforme a los parámetros definidos en el comité, así mismo, garantizan que dichos informes incluirán componentes técnicos, administrativos y financieros, asegurando su coherencia con el avance real de la obra y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- El próximo comité se programa para el día 13 de febrero 2025, en presencia de los profesionales de obra e interventoría.

Cresse Consulting S.A.S NIT 900.912.710-	**CRESSE CONSULTING S.A.S**
	ACTA DE COMITÉ
	FECHA: 6 de febrero 2025

ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	NUMERO DE CELULAR	DEPENDENCIA	FIRMA
LEIDY CUENTAS PERALTA	1049.617.846	3134738886	CRESSE	
Fernando Orozco G.	1.057.571.430	3504771769	Apoyo Tec CRESSE	
JOHANNA SARMIENTO. B.	1.116.545.173	3105540444	R.L CRESSE.	
Fabio Pena		3113481623	Residente Consorcio Fortalecimiento.	
Camilo Forero			Cresse	

ANEXO 7: CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA CTO 1045 OBRA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_001

Aguazul, 22 de diciembre de 2025

22 DIC 2025

Señores
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de pólizas para aprobación – Contrato No. 01045 de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01045, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMEINTO 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar las pólizas de cumplimiento y RCE para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso

Atentamente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_003

Aguazul, 29 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de soporte de pago de estampillas – Contrato No. 01045 de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01045, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMEINTO 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar ante la Oficina Asesora Jurídica el comprobante de pago correspondiente a las estampillas exigidas por la entidad para la legalización del contrato.

Para los fines pertinentes, se adjunta:

- Comprobante de pago de estampillas.

Agradecemos se sirvan verificar la documentación aportada y continuar con los trámites administrativos y legales a que haya lugar.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional.

Atentamente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

29 DIC 2025

170

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI CR 01045 004

ALCALDIA DE AGUAZUL
OFICINA ASESORA JURÍDICA
08 ENE 2026
Recibido por
Hora
Radicado No.
anexo 2.
Folios

Aguazul, 08 de enero de 2026

Señores
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de pólizas corregidas para aprobación – Contrato No. 01045 de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01045, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMEINTO 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar las pólizas de cumplimiento (Anexo 2) y RCE (Anexo 1) para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso

Atentamente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_005

Aguazul, enero 23 de 2026.

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "ICONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Asunto: Radicación documentos para firma de Acta de Inicio Contrato de obra No. 01045 del 18 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo estipulado en el contrato de obra No 01045 de 2025, atención al Contrato No. 01045, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025, nos permitimos radicar los siguientes documentos para su revisión y respectiva firma del Acta de Inicio del contrato de la referencia

- Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant).
- Secuencia y duración de cada una de las actividades.
- Flujo de manejo de inversión.
- Programa de suministros de insumos detallado.
- Programa de suministros de equipos.
- Análisis de precios unitarios
- Hoja de vida de profesionales.
- Soportes de afiliación a seguridad social de los profesionales.

.

Cordialmente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
26 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 5:04 AM PM
Folios:
Radicado No.

172

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_006

Aguazul, 10 de febrero de 2026

10 FEB 2026

Señores
OFICINA JURIDICA
Municipio de Aguazul
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de pólizas actualizadas con Acta de Inicio para aprobación – Contrato No. 01045 de 2025 de acuerdo a ajuste solicitado

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01045, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMEINTO 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar las pólizas de RCE (Anexo 3) de acuerdo con el ajuste solicitado, para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso

Atentamente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

Aguazul, febrero 24 de 2026.

OFI_CR_1045_007

RECIBIDO
FIRMA: Leidy C.
FECHA: 24/02/26 HORA: 7:00am

Señores:
CRESSE CONSULTING S.A.S
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No. 01045 DE 2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de desembolso de anticipo Contrato de obra No. 01045 del 18 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En calidad de contratista del Contrato de obra No 01045 de 2025, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025, de manera atenta me permito solicitar el desembolso del anticipo pactado, de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales y en el acta de inicio debidamente suscrita.

El anticipo solicitado corresponde al 50% del valor total del contrato, equivalente a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($534.278.495,00), el cual será destinado exclusivamente a la ejecución del objeto contractual, garantizando su correcta administración y uso conforme a la normatividad vigente y a lo estipulado en el contrato.

Para tal efecto, informamos que se han cumplido los requisitos previos exigidos, tales como:

- Aprobación de las pólizas de garantía.
- Suscripción del acta de inicio.
- Plan de Inversión del anticipo
- Certificación bancaria

En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa se adelanten los trámites administrativos y financieros necesarios para el desembolso del anticipo a la cuenta de Ahorros **BANCOLOMBIA** No. **171-999746-11** a nombre de **FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL** registrada para tal fin de la cual se anexa la respectiva certificación

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información o documentación adicional que sea requerida.

Cordialmente,

SANDRO WALTER CARRILLO TORRES
C.C. No. 79.616.221 de Bogotá D.C
R.L. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
NIT. 902.017.884-0

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Aguazul, 26 de febrero del 2026.

OFI_CR_1045_008

Ingeniera:
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S
Ciudad

RECIBIDO
FIRMA: dayana Sarmiento
FECHA: 26-02-26 HORA: 2:00 PM

REF.: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1045 DE 08 DE DICIEMBRE 2025, CON OBJETO: "**CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE**".

ASUNTO.: INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL

Cordial Saludo Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito hacer entrega del INFORME MENSUAL PARA ACTA PARCIAL del periodo correspondiente a 26 de enero hasta el 26 de febrero de 2026, correspondiente al Contrato de Obra Pública N° 01045 del 18 de diciembre del 2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Anexos,

- 01 COPIA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE INSUMOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO
- 02 COPIA DE BITACORA DIARIA DE OBRA
- 03 CORRESPONDIA ENVIADA Y RECIBIDA
- 04 COPIA DE LAS AFILIACIONES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA

Agradezco la atención prestada

SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
R/L. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO CTO 1045 OBRA

Cresse Consulting S.A.S NIT. 900.842.743-1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, febrero 20 de 2026.

OFI_INT_01024_004

Señores:
SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: solicitud de informe mensual No.1 del contrato de obra 1045 de 2025

Cordial saludo,

lo presente, es con el fin de solicitar informe mensual No.1, con fin de verificar la información técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental, salud y seguridad en el trabajo de las actividades ejecutadas durante el periodo del 26 de enero hasta el 26 de febrero del 2026 correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de Obra pública No. 1045 DE 2025.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

RECIBIDO
FIRMA:
FECHA: 20-02-26 HORA: 2:00 PM

CORRESPONDENCIA ENVIADA CTO 1024 INTERVENTORIA

Cresse Consulting S.A.S NIT. 900.842.743-1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, diciembre 10 de 2025.

Señores:
OFICINA JURIDICA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación comprobante de pago de estampillas – Contrato No. 01024 del 04 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01024, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CRESSE CONSULTING S.A.S, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar ante la Oficina Asesora Jurídica el comprobante de pago correspondiente a las estampillas exigidas por la entidad para la legalización del contrato.

El pago fue realizado el día 10 de diciembre, por un valor total de $6.378.729,00 MLCTE

Para los fines pertinentes, se adjunta:

- Comprobante de pago de estampillas.

Agradecemos se sirvan verificar la documentación aportada y continuar con los trámites administrativos y legales a que haya lugar.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

Cresse Consulting S.A.S NIT 900.842.743 – 1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, diciembre 10 de 2025.

10 DIC 2025

Señores:
OFICINA JURIDICA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de pólizas para aprobación – Contrato No. 01024 del 04 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01024, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CRESSE CONSULTING S.A.S, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar las pólizas de cumplimiento y RCE para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

180

Cresse Consulting S.A.S NIT 900.842.743-1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, diciembre 12 de 2025.

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
AGUAZUL CASANARE
12 DIC 2025
Recibido por:
Hora: 3:25 AM PM
Folios:
Radicado No.

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación documentos para firma de Acta de Inicio Contrato de Interventoría No. 01024 del 04 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo estipulado en el contrato de interventoría No 01024 de 2025, atención al Contrato No. 01024, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CRESSE CONSULTING S.A.S, nos permitimos radicar los siguientes documentos para su revisión y respectiva firma del Acta de Inicio del contrato de la referencia

- Hoja de vida del Tecnólogo de Interventoría
- Soportes de afiliación a seguridad social del director, residente y Tecnólogo de Interventoría

.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

Cresse Consulting S.A.S NIT. 900.842.743-1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, diciembre 17 de 2025.

OFICINA ASESORA JURIDICA
17 DIC 2025
Folios

Señores:
OFICINA JURIDICA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de pólizas para aprobación – Contrato No. 01024 del 04 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01024, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CRESSE CONSULTING S.A.S, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar las pólizas de cumplimiento y RCE actualizadas con Acta de Inicio de fecha 17 de Diciembre de 2025, para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

Cresse Consulting S.A.S NIT 900.842.743-1	CRESSE CONSULTING S.A. S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, diciembre 18 de 2025.

MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
18 DIC 2025
Recibido por: Hora: 2:41 AM PM Folios: Radicado No.

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de desembolso de anticipo Contrato de Interventoría No. 01024 del 04 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En calidad de contratista del Contrato de interventoría No 01024 de 2025, atención al Contrato No. 01024, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CRESSE CONSULTING S.A.S, de manera atenta me permito solicitar el desembolso del anticipo pactado, de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales y en el acta de inicio debidamente suscrita.

El anticipo solicitado corresponde al 50% del valor total del contrato, equivalente a la suma de Cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($ 48.658.254,00), el cual será destinado exclusivamente a la ejecución del objeto contractual, garantizando su correcta administración y uso conforme a la normatividad vigente y a lo estipulado en el contrato.

Para tal efecto, informamos que se han cumplido los requisitos previos exigidos, tales como:

- Aprobación de las pólizas de garantía.
- Suscripción del acta de inicio.
- Pago de las estampillas correspondientes.

Cresse Consulting S.A.S	**CRESSE CONSULTING S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°01024 DE 2025
		INFORME PRE CONSTRUCTIVO

Aguazul, 26 de enero 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
26 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 5:04 AM PM
Radicado No. Folios:

Doctor:**JUAN MIGUEL SANDOVAL**
Secretario de Obras
Alcaldía Aguazul Casanare

REFERENCIA. CONTRATO No. 01024 DE 2025

ASUNTO: Radicación Informe Etapa Preconstructiva – Contrato de Obra N.° 1045 de 2025

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa, con el fin de realizar la **entrega y radicación del Informe de la Etapa Preconstructiva** correspondiente al **Contrato de Obra N.° 1045 de 2025**, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

En desarrollo de la etapa preconstructiva, se realizó la evaluación y verificación de las hojas de vida del personal propuesto para la ejecución del contrato, evidenciando que cumplen con los perfiles, experiencia y criterios establecidos en los documentos contractuales y normativos aplicables.

Así mismo, una vez efectuadas las revisiones técnicas, administrativas y operativas correspondientes, se concluye que la obra se encuentra en óptimas condiciones para dar inicio a la etapa constructiva, de conformidad con lo establecido en el contrato de obra.
En consecuencia, se hace entrega formal del informe para su respectiva revisión, aprobación y los trámites a que haya lugar.

Agradezco la atención prestada y quedo atento(a) a cualquier observación o requerimiento adicional.

El anterior informe se entrega según lo acordado en el Contrato No. 01024 de 2025.

Respetuosamente:

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L. CRESSE CPNSULTING S.A.S

Cresse Consulting S.A.S NIT 900.842.743-1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, enero 29 de 2025.

29 ENE 2026

OFI_INT_01024_003

Señores:
OFICINA JURIDICA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Traslado de pólizas actualizadas con acta de inicio – Contrato de obra No – Contrato No. 01045 del 18 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En atención al contrato de obra No. 01045 suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y el contratista CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025, nos permitimos informar que el contratista ya realizó la radicación ante Interventoría de las pólizas contractuales correspondientes, junto con la documentación requerida para su revisión.

En virtud de lo anterior, y una vez verificada la información aportada, esta interventoría realiza el traslado formal de las pólizas, con el fin de que la entidad proceda a la revisión y aprobación, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales y la normatividad vigente.

Se adjuntan para su conocimiento y trámite los siguientes documentos:

- Copia de las pólizas contractuales actualizadas

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

Cresse Consulting S.A.S NIT. 900.842.743 – 1	CRESSE CONSULTING S.A.S	CÓDIGO	GE-FT-07
		VERSIÓN	1
	OFICIO	FECHA	NOVIEMBRE 2017

Aguazul, febrero 20 de 2026.

OFI_INT_01024_004

Señores:
SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: solicitud de informe mensual No.1 del contrato de obra 1045 de 2025

Cordial saludo,

lo presente, es con el fin de solicitar informe mensual No.1, con fin de verificar la información técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental, salud y seguridad en el trabajo de las actividades ejecutadas durante el periodo del 26 de enero hasta el 26 de febrero del 2026 correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de Obra pública No. 1045 DE 2025.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

RECIBIDO
FIRMA:
FECHA: 20-02-26 HORA: 2:00 Pm

786

Aguazul, febrero 24 de 2026.

MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
24 FEB 2026
Recibido por:
Hora: 2:24 AM PM
Folios:
Radicado No.

OFI_INT_01024_005

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Atn: Ing. Paola Rodríguez
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No 01024 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Traslado de solicitud desembolso de anticipo del – Contrato de obra No – Contrato No. 01045 del 18 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En mi calidad de Interventoría del Contrato de Obra No. 01045 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, me permito dar traslado formal a la solicitud de anticipo presentada por el contratista CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025, mediante comunicación de fecha 24 de febrero de 2026.

La solicitud se encuentra acompañada de los documentos soporte exigidos contractualmente, incluyendo: plan de inversión del anticipo, pólizas aprobadas, acta de inicio, certificación bancaria

Una vez revisada la documentación aportada, esta Interventoría deja constancia de que la misma cumple con los requisitos establecidos en el contrato, por lo cual se remite a su despacho para el trámite correspondiente.

Se solicita muy respetuosamente dar el trámite pertinente conforme a las disposiciones contractuales.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
C.C. No. 1.116.545.173 de Aguazul
R.L. CRESSE CONSULTING SAS
NIT. 900.842.743-1

CORRESPONDENCIA
RECIBIDO CTO 1024 INTERVENTORIA

Aguazul, febrero 24 de 2026.

OFI_CR_1045_007

RECIBIDO
FIRMA: Leidy C.
FECHA: 24/02/26 HORA: 7:00am

Señores:
CRESSE CONSULTING S.A.S
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO No. 01045 DE 2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de desembolso de anticipo Contrato de obra No. 01045 del 18 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

En calidad de contratista del Contrato de obra No 01045 de 2025, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025, de manera atenta me permito solicitar el desembolso del anticipo pactado, de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales y en el acta de inicio debidamente suscrita.

El anticipo solicitado corresponde al 50% del valor total del contrato, equivalente a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($534.278.495,00), el cual será destinado exclusivamente a la ejecución del objeto contractual, garantizando su correcta administración y uso conforme a la normatividad vigente y a lo estipulado en el contrato.

Para tal efecto, informamos que se han cumplido los requisitos previos exigidos, tales como:

- Aprobación de las pólizas de garantía.
- Suscripción del acta de inicio.
- Plan de Inversión del anticipo
- Certificación bancaria

En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa se adelanten los trámites administrativos y financieros necesarios para el desembolso del anticipo a la cuenta de Ahorros **BANCOLOMBIA** No. **171-999746-11** a nombre de **FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL** registrada para tal fin de la cual se anexa la respectiva certificación

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información o documentación adicional que sea requerida.

Cordialmente,

SANDRO WALTER CARRILLO TORRES
C.C. No. 79.616.221 de Bogotá D.C
R.L. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
NIT. 902.017.884-0

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Aguazul, 26 de febrero del 2026.

OFI_CR_1045_008

Ingeniera:
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S
Ciudad

RECIBIDO
FIRMA: dayana Sarmiento
FECHA: 26-02-26 HORA: 2:00 PM

REF.: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1045 DE 08 DE DICIEMBRE 2025, CON OBJETO: "**CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE**".

ASUNTO.: INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL

Cordial Saludo Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito hacer entrega del INFORME MENSUAL PARA ACTA PARCIAL del periodo correspondiente a 26 de enero hasta el 26 de febrero de 2026, correspondiente al Contrato de Obra Pública N° 01045 del 18 de diciembre del 2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Anexos,

- 01 COPIA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE INSUMOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO
- 02 COPIA DE BITACORA DIARIA DE OBRA
- 03 CORRESPONDIA ENVIADA Y RECIBIDA
- 04 COPIA DE LAS AFILIACIONES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA

Agradezco la atención prestada

SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
R/L. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

ANEXO 8: BITÁCORA

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 DE 2025

OBJETO: Construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul - casanare (ciudadela Bloque N. 17)

FECHA: 29 de enero de 2026

CLIMA: Soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

PERSONAL EN OBRA:
Maestro general : 1
oficial de obra : 2
Ayudante de obra : 5
Residente de obra : 1
Supervisor HSE : 1

MATERIALES UTILIZADOS:
- Bolas de madera.
- lona verde.
- Base granular 1 1/2"

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Replanteo y localizacion
- cerramiento
- Demolicion placas macizas
- Excavacion Manual
- Suministro base granular 1 1/2 - 14 m³.

EQUIPOS EN USO
- Demoledor
- Soldadora industrial 9" DEWALT DWE4559-B3.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma.

Marlon David Zarara
Residente de obra. 2
cc. 1.116.553.656.

Leidy de Jesus Cuentas
Interventoria
cc. 1.049.619.646.

FABIO PEÑA
Ingeniero residente 1
cc. 9.397.224.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA.

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de agua zul, departamento de casanare.

LUGAR: Agua zul - casanare (ciudadela Bloque N17).

FECHA: 28 de enero de 2026

CLIMA: SOLEADO

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

PERSONAL EN OBRA:
- Maestro general. : 1
- oficial de obra : 2
- Ayudantes de obra: 5
- residente de obra: 1
- supervisor HSE: 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Demolición placas macizos
- EXCAVACIÓN MANUAL.
- SUMINISTRO CEMENTO 1TON
- Cerramiento en lona.
- Suministro acero figurado.

MATERIALES UTILIZADOS.
- Postes de madera
- lona verde.

EQUIPOS EN USO
- Dobladora
- soldadora industrial 911
- Herramienta menor

OBSERVACIONES
- NO se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma

MARLON DAVID ZARAMA.
residente de obra. 2
CC 1.116.353.656.

LEIDY DE JESUS CUENTAS
Interventoría
C.C 1049.617.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1
CC. 9.397.224

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA.

CONTRATO N. 0645 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de agua azul, departamento de casanare.

LUGAR: Agua azul-Casanare (ciudadela Bloque N.17)

FECHA: 29 de enero de 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM.

PERSONAL OBRA.
- Maestro general: 1
- oficial obra.: 2
- Ayudante obra: 5
- Residente obra: 1
- operador HSE.: 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Excavación manual.
- Instalación y compactación base granular BG-40 1-1/2"
- Demolición placa.

MATERIALES UTILIZADOS
- Base granular BG-40 1-1/2"
- Agua.

EQUIPOS EN USO
- Pulidora industrial.
- Demoledor
- cargador
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES.
- No se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma.

MARLON DAVID ZARAMA
Residente de obra. 2
C.C 116.553.656.

LEIDY DE JESUS CUENTAS.
Interventoría
C.C 1049.619.546.

PABLO PEÑA
Ing. residente 1
CC. 9.397.224.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare

LUGAR: AGUAZUL - CASANARE (ciudadela bloque 19)

FECHA: 30 de enero de 2025

CLIMA: Nublado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 P.M.

PERSONAL OBRA:
- Maestro general : 1
- Oficial de obra : 2
- Ayudante de obra : 5
- Residente de obra : 1
- Supervisor HSE : 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Excavación Manual
- Relleno Base granular BG-40 1½"
- Cargue y retiro de material sobrante
- Compactación Base granular.

MATERIALES UTILIZADOS
- Base granular BG-40

EQUIPOS EN USO
- cargador - Vibrocompactador
- Retroexcavadora - Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma.
- El inquilino del apartamento 104 manifiesta que deberemos quitar la tierra de derrumbe donde tenemos la excavación, ya que le impide el acceso a su vivienda o en así contando con el otro acceso al apartamento.

"La loma no se puede retirar ya que actúa como división para restringir el paso y evitar accidentes a los residentes".

MARLON DAVID ZARAMA
Residente de obra. 2
CC. 1.116.553.656.

LEIDY DE JESUS CUENTAS
Interventoría
C.C 1.049.617.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1
CC. 9.397.224.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIO DE OBRA

CONTRATO N.: 01645 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: AGUAZUL-casanare (ciudadela Bloque N 17).

FECHA: 31 de enero del 2025

CLIMA: Soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 12:00 PM

PERSONAL OBRA
- Maestro general 1
- oficial de obra 2
- Ayudante de obra 5
- Residente de obra 1
- Supervisor HSE 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Excavación manual
- Excarificación cimentación
- Relleno, compactación e instalación de base granular
- Demolición concreto

MATERIALES UTILIZADOS
- Base granular B6-40.

EQUIPOS UTILIZADOS
- Cargador - Retroexcavador
- Rodillo vibratorio - Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades.
- Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma.

MARLON DAVID ZARAMA
Residente de obra. 2
C.C. 1.116.553.656.

LEIDY DE JESUS CONTRERAS
Interventoria
CC. 1.049.619.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1
CC. 9.397.224.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO Nº 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de agua azul, departamento de casanare.

LUGAR: Agua azul - casanare (ciudadela bloque 17)

FECHA: 02 de febrero del 2025

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN:: 5:00 P.M.

PERSONAL OBRA:	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Residente de obra: 1	- Excavación manual.
Supervisor HSE: 1	- Demolición placa
Maestro general: 1	- excavación de cimiento
oficial de obra: 2	- Solado de limpieza
Ayudante de obra: 5	- retiro de material.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN OBRA
- cemento	- Martillo
- Arenocillo	- Taladro percutor
	- herramienta menor

OBSERVACIONES

- No se encontraron novedades
- las actividades se ejecutaron con forme al cronograma.

MARLON DAVID ZARAMA.
Residente de obra 2
cc. 1.116.553.636

LEIDY DE JESUS CONTAC
Interventoria
C.C 1049.619.846

PEDRO PEÑA
Vig residente 1
cc. 9 397 224

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare

LUGAR: Aguazul - Casanare (ciudadela Bloque N.7)

FECHA: 03 de febrero 2025

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM.

PERSONAL OBRA:
Residente de obra: 1
supervisor HSE: 1
Maestro general: 1
oficial de obra: 2
Ayudante de obra: 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- excavación manual caja de inspección
- construcción caja de inspección 70x70
- relleno base granular
- cobado de limpieza.

MATERIALES UTILIZADOS
- cemento
- arenocillo
- base granular.
- ladrillo

EQUIPOS EN USO
- cargador
- volqueta
- taladro
- retroexcavador

OBSERVACIONES
- no se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma.

MARLON BARAMA
Residente de obra 2
CC. 1.116.553.856

LEIDY CUENTAS
Interventoria
CC. 1.044.617.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1
CC. 9.397.224.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: AGUAZUL - casanare (ciudadela bloque 17.)

FECHA: 04 de febrero 2025

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM

PERSONAL OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-Residente de obra: 1	-construccion caja de inspección
-Supervisor HSE: 1	-Instalado registro agua
-Maestro general: 1	-excavacion cimentacion
-oficial de obra: 2	-excavacion mecanica/manual.
-Ayudante de obra: 5	

Materiales utilizados	EQUIPOS UTILIZADOS
-tobera PVC Hidraulico 1/2"	-Soldadora industrial.
-ACCESORIOS	-taladro percutor.
-tobera PVC sanitario 4"	-Cerraduras.
-ACCESORIOS	-Herramienta menor

OBSERVACIONES

-No se presentaron novedades

-las actividades se ejecutaron conforme al cronograma

MARON ZARAMA
Residente de obra. 2
CC 1.116.353.656.

LEIDY CUENTAS
Interventoria
CC. 1.049.619.846.

FABIO REINA
Seg. ocup. Sede 1
CC. 9.397.224

Powered by CamScanner

9

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul - casanare (ciudadela - bloque 19)

FECHA: 05 de febrero de 2025

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM.

PERSONAL OBRA
- residente de obra: 1
- supervisor HSE: 1
- maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- Ayudante de obra: 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- excavacion circunferencial
- traslado registro agua
- reduccion caja de registro gas
- excavacion manual circunferencial
- excavacion manual caja de inspeccion
- construccion caja de inspeccion
- suministro base granular 1 1/2"

MATERIALES UTILIZADOS
- tuberia PVC 1/2"
- accesorios
- tuberia PVC sanitario 4"
- accesorios
- cemento
- mastocillo
- ladrillo.
- Registro anti fraude.

EQUIPOS EN USO
- Soldadora industrial.
- taladro percutor
- Demoledor
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma.
- visita de supervision por parte de la alcaldia

NARLON ZARAMA
RESIDENTE
residente de obra 2
CC 1.116.553.656.

LEIDY CUENTAS
interventoria
CC 1.049.617.846.

Paola Rodriguez
Apoyo Supervision SIA

FABIO PEÑA
ing. residente 1
CC. 9.997.274.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA.

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (ciudadela Bloque 17)

FECHA: 06 de febrero de 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM.

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS.
-Residente de obra: 1	- construcción caja de inspección
-Supervisor HSE: 1	- excavación manual cimentación
-Maestro oficial: 1	- suministro de acero de refuerzo
-oficial de obra: 2	- retiro de material.
-ayudante de obra: 5	- compactación e instalación de base granular 06-40.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS UTILIZADOS
BASE granular	- polidora
cemento	- taladro percutor
ladrillo	- Herramienta menor
ARENOCILLO.	

OBSERVACIONES

- Al momento de hacer el traslado del registro de agua del apartamento 104, se fracturo el tubo de PVC 1-1/4"; en ese instante se cerro el tubo con un accesorio en tee y quedo codo de 1-1/4"
- las actividades se ejecutaron con base al cronograma de actividades.

MARLON ZABARAIN
Residente de obra 2
CC. 1116.553.636.

LEIDY COENEO
interventoria.
CC 1.049.617.846.

FABIO PEÑA
Ing residente.
CC. 9.397.724.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de agua azul, departamento de casanare.

LUGAR: Agua azul - casanare (ciudadela bloque N.17)

FECHA: 07 de febrero de 2026

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 12:PM

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Residente de obra 1	- Armado de acero
Soldadores Hoz: 1	- Instalación de base granular 1.1/2"
Maestro oficial: 1	- corte de arden para el traslado de la viga.
oficial de obra: 2	
Ayudante de obra: 5	

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO
- Acero de refuerzo.	- Herramienta menor.
- alambre de amarre.	
- base granular.	

OBSERVACIONES

- No se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron con forme al cronograma.

MARLON ZARAMA
Residente de obra 2
CC 1.46.553.688.

LEIDY CUENTAS
Interventoria
CC. 1.049.617.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1
CC. 9.399.224.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 0045 de 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la cooperativa del municipio de agua zol - departamento de casanare.

LUGAR: Aguazol Casanare (ciudadela Bloque 17)

FECHA: 09 de febrero 2026

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA
- Maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- Residente de obra: 1
- Supervisor HSE: 1
- Ayudante de obra: 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Armado de acero para cimentación
- Excavación de cimiento

MATERIALES UTILIZADOS
- Acero de refuerzo 5/8"
- Acero de refuerzo 1/2"
- Acero de refuerzo 3/8"
- Alambre negro

EQUIPOS EN USO
- Vibrador
- taladro percutor
- Formaleta.
- Soldadora.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades
- Los actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.
- Por parte de la alcaldía se realizo visita de obra bajo la supervisión del ing Gustavo Ceby y la ing. Paola.

MARLON ZARAMA
Residente de obra 2
CC. 1116.553.656.

LEIDY CUENTAS
Interventoria
CC. 1.094.619.846.

Paola Rodriguez
Apoyo Supervisión SIA

Gustavo Ceby Ing.
Supervisión.

FABIO SERNA
Maestro de obra 1

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA.

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (ciudadela - Bloque 19)

FECHA: 10 de febrero de 2026.

CLIMA: Soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN.: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-residente de obra: 1	- Armado de acero de refuerzo
-ingeniero HSE: 1	- traslado de vigueta de gas
-maestro general: 1	- construcción soporte caja para gas.
-oficial de obra: 2	
-Ayudante de obra.: 5	

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO
- Acero de refuerzo 6/8"	- Polidora.
- Acero de refuerzo 4/8"	- Tronzadora.
- Acero de refuerzo 3/8"	

OBSERVACIONES

- No se presentaron novedades
- las actividades de ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARLON ZARAMA
Residente de obra 2
CC 1.116.553.656.

LENDY MONTAÑA
Interventoria
CC. 1049.619.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare

LUGAR: Aguazul-casanare (ciudadela Bloque 17)

FECHA: 11 de febrero del 2026.

CLIMA: soleado

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra: 1
- Supervisor HSE: 1
- Maestro general: 1
- Oficial de obra.: 2
- Ayudante de obra.: 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Armada de acero circular
- Armada de acero columnas.
- Encofrado de acero

MATERIALES UTILIZADOS
- Acero de refuerzo 5/8"
- Acero de refuerzo 1/2"
- Acero de refuerzo 3/8"
- Alambre negro.
- Tabla de rodeca 30x3m
- Listones 5x5cm.

EQUIPOS EN OBRA.
- trozadora
- soldadora.
- Herramienta menor

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades
- Las actividades se ejecutaron con base al cronograma de actividades

MARLON ZARAMA
Residente de obra 2
CC 1116533654

LEIDY CONTRERAS
Interventora.
CC 1049.619.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N: 01040 de 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del fortalecimiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de agua zul, departamento de cazadores

LUGAR: Agua zul - cazadores (ciudadela Bloque A)

FECHA: 12 de febrero del 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM.

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Residente de obra: 1	- Arranque de acero cimiento
- Supervisor HSE: 1	- Arranque de acero columna.
- Maestro general: 1	- encofrado de acero
- oficial de obra: 2	- corte & derivación de anden
- Ayudante de obra: 5	- excavación manual para pisicina.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPO EN USO.
Acero de refuerzo 5/8"	- retroexcavadora
Acero de refuerzo 1/2"	- vibradora industrial
Acero de refuerzo 3/8"	- vibradora.
Alambre negro	- mezcladora.
Tabla de madera 30x3m	
Listones de madera. 5x5cm	

OBSERVACIONES

- No se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron con forme al cronograma de actividades

MARION ZARAMA
Residente de obra 2
CC. 1116.333.656

LEIDY CORTES
Interventoria
CC. 1049.619.646.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamento de la ciudadela la esperanza del municipio de agua zul, departamento de cesarose.

LUGAR: Aguazul cesarose (ciudadela bloque N)

FECHA: 13 de febrero del 2026.

CLIMA: Nublado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-residente de obra: 1	- excavación mecánica y manual de cimientos
-supervisor HSE: 1	- vaciado de concreto para cimientos
- Maestro general: 1	- aplicación viga doble
-oficial de obra: 2	
-Ayudantes de obra: 6	

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS UTILIZADOS
-concreto premezclado 3000 psi	-vibrador de concreto
-viga doble	- mixer
	- bomba estacionaria
	- herramienta menor

OBSERVACIONES

-no se presentaron novedades

-las actividades se ejecutaron con forme al cronograma de actividades.

MARLON ZAMARRA
residente de obra 2
cc. 1.116.333.656.

LEIDY CUENTAS
interventora
cc. 1.049.619.646

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA N.17

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamento de la ciudadela la esperanza del municipio de agua zol, departamento de casanare.

LUGAR: Agua zol - casanare Ciudadela - Bloque 17

FECHA: 14 de febrero 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 12:00 PM.

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-Residente de obra: 1	- retiro de formaletas
-operador tbe: 1	- excavación manual de cimientos
-Maestro general: 1	- relleno de seleccionado para cimiento
-oficial de obra: 2	
-Ayudante de obra: 6	

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO.
-seleccionado de excavación	- tanque
	- Herramienta menor.

OBSERVACIONES.

- no se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARLON ZAPATA.
Ing residente de obra 2
CC. 1116.553.656.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

LEIDY CUENTAS
interventoria
CC. 1.049.617.846.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamento de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul - casanare (ciudadela - Bloque 3)

FECHA: 16 de febrero 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN.: 5:00 P.

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-Residente de obra.: 1	- Excavación manual de cimentación
-Supervisor HSE: 1	- Excavación manual caja de
-Maestro general.: 1	inspección
-oficial de obra: 2	- Relleno de seleccionado por
-Ayudante de obra: 6.	cimientos
	- construcción caja de red de gas.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO
- Seleccionado de excavación	- Soldadora
- Relleno	- taladro percutor
- Arenocillo	- cargador.
- ladrillo común	- Herramienta menor.

OBSERVACIONES

- no se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARION ZARAMA
Residente de obra 2
CC 1.116.553.606

LEIDY CUENTAS
Interventora
CC. 1.049.617.846

FABIO RUBIA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartado de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (Ciudadela Bloque N.17)

FECHA: 11 de febrero 2026

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-Residente de obra: 1	-Excavacion manual cimentacion
-Supervisor HSE: 1	-Relleno base granular 1-1/2"
-Maestro general: 1	-Traslado registro - medidor de agua.
-oficial de obra 2	-Construccion caja de inspeccion
-Ayudante de obra.: 8	-construccion caja medidor de gas.
	-Demolicion zapata cimentacion

MATERIALES UTILIZADOS		EQUIPOS EN USO
-Arrocillo	-tuberia PVC 1/2"	-Taladro percutor
-cemento	-Accesorios PVC 1/2"	-pulidora
-Arena	-tuberia cantera 4"	-cargador
-Agua.	-Accesorios 4"	-Demoledor.
-ladrillo	-soldadora 4	
	limpiador PVC	

OBSERVACIONES
-No se presentaron novedades
-las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARION ZARAMA
Residente de obra. 2
C.C 1.116.853.656.

LEIDY CUENTAS
Interventora
CC. 1.049.617.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01043 de 2025

OBJETO: Construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare Ciudadela bloque 17

FECHA: 18 de febrero del 2026.

CLIMA: Nublado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra: 1
- Supervisor HSE: 1
- Maestro general: 1
- Oficial de obra: 2
- Ayudante de obra: 8

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Excavación manual cimientos
- Demolición cimientos
- Escarificación de cimiento
- Construcción caja de inspección
- Reubicación medidor de agua
- Relleno de base 1-1/2"
- Retiro de material.
- Limpieza de obra.

MATERIALES UTILIZADOS
- Base granular 1-1/2"
- ladrillo común
- arrocillo
- cemento.
- tubería PVC 1/2"
- tubería sanitaria 4"
- accesorios.

EQUIPOS USADO
- Taladro percutor
- Perforador
- Cargador
- pagaleta.
- volqueta.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- Al momento de realizar la excavación se perforo la tubería del gas con el pulín, en ese instante se llamo a emergencia de cospasa gas para la reparación.
- las actividades se ejecutaron con forme al cronograma de actividades.

MARLON ZARAMA
Ing residente 2
CC. 1.116.553.656.

LEIDY CUENTAS
Interventoria
CC. 1049.617.846.

FABIO PEÑA
Ing residente 1

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Agualzol, departamento de casanare.

LUGAR: Agualzol casanare (ciudadela bloque 17)

FECHA: 19 de febrero del 2026.

CLIMA:

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra: 1
- supervisor HSE: 1
- maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- Ayudante de obra: 8

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Excavación manual cimientos
- Relleno de base granular L1/2"
- Rubricación reductor de agua.
- Solado de limpieza
- 2 muretes de valla
- construcción caja de inspección
- Demolición placa
- Demolición cimientos

MATERIALES UTILIZADOS
- cemento
- Arenocillo.
- tubería. PVC 1/2"
- Accesorios.

EQUIPOS EN USO
- Demoledor
- taladro percutor
-

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARON ZARAMA
Ing residente 2
cc. 1116.553.656.

LEIDY CUENTAS
Interventoria
cc. 1.010.617.846.

FABIO PEÑA
Ing residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA N.22

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamento de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (ciudadela Bloque 17)

FECHA: 20 de febrero de 2026.

CLIMA: Nublado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-residente de obra: 1	- excavación manual suelo
-Supervisor HSE: 1	- conformación cimientos
-Maestro general: 1	- Armado de acero de refuerzo
-oficial de obra: 2	para cimiento
-ayudante de obra: 8	- construcción de cota de inspección
	- relleno de base 1-1/2"

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPO EN SITIO
-Acero de refuerzo 1/2" 5/8"	-cargador
-concreto	-formaletas
-recebo.	-taladro percutor
-base granular 1-1/2"	

OBSERVACIONES.

-No se presentaron novedades de obra.

-las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades

MARLON ZARAMA.
Ing. residente 2
cc. 1.116.553.656.

LEIDY CONTRATO
interventoria
cc. 1.049.617.846.

FABIO PEÑA
SST residente 1

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamento de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare (ciudadela Bloque 17)

FECHA: 21 de febrero del 2026.

CLIMA: Soleado.

HORA INICIO: 7:00 a.m. HORA FINAL: 12:00PM

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-residente de obra: 1	-Anclaje de acero circular
-supervisor de obra HSE: 1	-Pellero base granular 1-1/2"
-Maestro general: 1	-Excavación manual
-oficial de obra.: 2	-Demolición cimientos
-Ayudante de obra.: 8	-escarificación cimientos
	-Anclaje de acero columnas
	-solado de limpieza

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO.
-Acero de refuerzo 1/2", 5/8"	-Bailadora
-Alambre negro	-Carretilla
-cemento	-Pendedor
-arenillo.	-cincel.
	-Herramienta menor.

OBSERVACIONES

-No se presentan novedades

-las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARLON ZARAMA
Ing. residente 2
cc. 1.116.553.656.

LEIDY CUENTAS
interventoria.
cc. 1.049.619.846

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 0104S de 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (Bloque 17 - ciudadela

FECHA: 23 de febrero del 2026.

CLIMA: Soleado

HORA INICIO: 7:00 AM. HORA FIN: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA
- residente de obra: 1
- supervisor HSE: 1
- maestro general: 1
- oficial de obra.: 2
- Ayudante de obra.: 6

ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- Aforte de acero circuito.
- instalacion formaleta
- Relleno base granular 1-1/2"
- Recubrimiento radier de gas.

MATERIALES UTILIZADOS
- Acero de refuerzo 1/2", 3/8" 4 5/8"
- MADERA.
- Base granular 1-1/2"

EQUIPO EN USO.
- cargador
- vibrador
- soldadora.
- Herramienta menor

OBSERVACIONES.
- No se presentaron novedades de obra.
- Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

Mayor Zapata.
Ing. residente 2.
CC. 1116.553.656.

Ledy Cuentas
Interventoria
cc. 1.049.617.646.

Fabio Pena
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construccion de la base II del reforzamiento de la ciudadela estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare

LUGAR: Aguazul Casanare Ciudadela Bloque 17

FECHA: 24 de febrero del 2025

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 Am.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra: 1
- supervisor HSE: 1
- Maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- Ayudante de obra: 6.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Armado de acero cimientos
- solado de limpieza
- excavacion cimiento
- instalacion formaletas de rodera

MATERIALES UTILIZADOS
Acero de refuerzo 1/2", 3/8" y 5/8"
Cemento
Arrocillo
Madera

EQUIPOS EN OBRA
- Formadora
- Soldadora.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES.
- No se presentaron novedades de obra
- las actividades se realizaron con base al cronograma de actividades.

MARION ZARAMA
Ing. residente 2
cc. 1.116.553.656.

LEIDY CUENTAS
interventoria
cc. 1.049.619.846.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA N. 26.

BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N 01045 de 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (ciudadela bloque 17)

FECHA: 25 de febrero del 2026

CLIMA: soleado.

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM.

PERSONAL DE OBRA
- residente de obra: 1
- operador hoe: 1
- maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- ayudante de obra: 6.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- Arranc de acero cimentos
- Arranc de acero columnas.
- instalación tuberias de radera.
- H

MATERIALES UTILIZADOS
- Acero de refuerzo 1/2", 3/8" y 5/8"
- Tablas de radera.
- Bastillas.

EQUIPOS EN USO.
- Soldadora
- Ironcadora.
- Herramienta menor

OBSERVACIONES
- No se presentan novedades de obra
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades
- se realizo visita por parte de la Alcaldia y el supervisor de la obra.

MARLON ZARAMA
Ing. residente 2
cc. 1116.553.656

LEIDY CUENTAS
interventoria
cc. 1049617846

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA N. 27.

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO N. 0005 de 2025

OBJETO.: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del vecindario de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare (ciudadela bloque 17)

FECHA: 26 de febrero del 2026.

CLIMA: soleado

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FIN: 5:00 PM.

PERSONAL OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
-Residente de obra: 1	- Armada de acero columnas.
-supervisor HSE: 1	- Aplicación SIKA BOND
-Maestro general: 1	- vaciado de concreto 3000psi para
- oficial de obra: 2	cimientos
- Ayudante de obra: 6	- limpieza de obra.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO.
-Acero de refuerzo 1/2" y 5/8"	- Soldadora.
- concreto 3000 psi	- vibrador de concreto.
- SIKA BOND	- mixer.
- alambre de amarre	- Herramienta menor.

OBSERVACIONES.

- No se presentaron novedades de obra.
- las actividades se ejecutaron con base al cronograma de actividades.

MARION ZARAMA
Ing. residente.
CC 1116.553.656.

LEIDY COGNIAS
interventora
CC. 1.049.617.846

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

Powered by CamScanner

ANEXO 9: INFORMES SEMANALES

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025		Cresse Consulting S.A.S			INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		31	1	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 01 — Del: 26 de enero de 2026 — Al: 31 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	3.00%	3.00%
Avance financiero obra:	$ 32,056,709.70	$ 32,056,709.70

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	3.00%	3.00%
Avance financiero interventoria:	$ 2,919,495.24	$ 2,919,495.24

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1,068,556,990.00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2025
Fecha de Términación:	04 de Noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97,316,508.00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	15 de abril 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
	

#¡VALOR!			#¡VALOR!		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		31	1	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Excavacion a mano en material comun	Excavacion manual en conglomerado
	
Demolicion cimientos enterrados con retiro	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material
	
Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
	

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		31	1	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Excavacion manual en conglomerado



Excavacion a mano en material comun



Cerramiento perimetral en polisombra



Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada



Excavacion manual en conglomerado



Demolicion cimientos enterrados con retiro



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		31	1	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno
Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
Excavacion a mano en material comun
Excavacion manual en conglomerado
Demolicion cimientos enterrados con retiro
Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material
Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
Excavacion manual en conglomerado
Excavacion a mano en material comun
Cerramiento perimetral en polisombra
Demolicion cimientos enterrados con retiro

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 1 se reporta un avance del 3%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		7	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 02 — Del: 01 de febrero de 2026 — Al: 07 de febrero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	2.50%	5.50%
Avance financiero obra:	$ 26,713,924.75	$ 58,770,634.45

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	2.50%	5.50%
Avance financiero interventoria:	$ 2,432,912.70	$ 5,352,407.94

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1,068,556,990.00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2025
Fecha de Términación actulizada	04 de Noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97,316,508.00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación actulizada	15 de abril 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro



Excavacion manual en conglomerado



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		7	2	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Demolicion cimientos enterrados con retiro	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material
	
Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	**Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi**
	
Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi	**Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m**
	

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		7	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material



Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi



Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi



Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material



Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi



Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		7	2	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
Excavacion manual en conglomerado
Demolicion cimientos enterrados con retiro
Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material
Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi
Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi
Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 2 se reporta un avance del 5,5%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cresse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		14	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 03 — Del: 08 de febrero de 2026 — Al: 14 de febrero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	3.25%	8.75%
Avance financiero obra:	$ 34,728,102.18	$ 93,498,736.63

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	3.25%	8.75%
Avance financiero interventoría:	$ 3,162,786.51	$ 8,515,194.45

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1,068,556,990.00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2025
Fecha de Términación actulizada	04 de Noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97,316,508.00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación actulizada	15 de abril 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.	Acero de Refuerzo Grado 60 para cimientos





CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		14	2	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Limpieza franja de trabajo



Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar




Acero de Refuerzo Grado 60 para muro



Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.



Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro

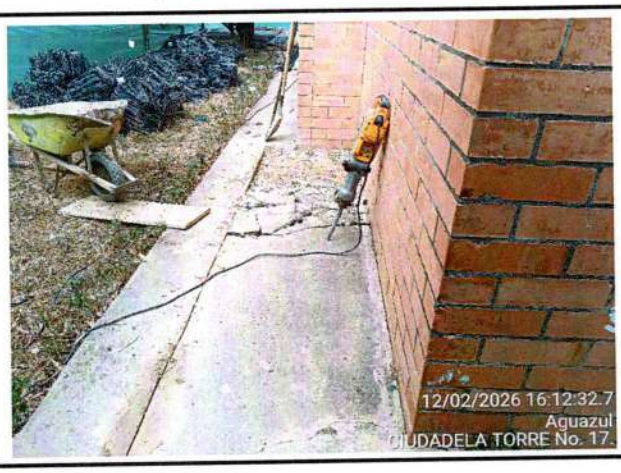

Excavacion a mano en material comun



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025		Cesse Consulting S.A.S			INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		14	2	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Excavacion manual en conglomerado	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material
	
Demolicion cimientos enterrados con retiro	Acero de Refuerzo Grado 60 para cimiento
	
Acero de Refuerzo Grado 60 para cimiento	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi
	

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		14	2	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.
Acero de Refuerzo Grado 60 para cimientos
Limpieza franja de trabajo
Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar
Acero de Refuerzo Grado 60 para muro
Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.
Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
Excavacion a mano en material comun

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 3 se reporta un avance del 8,75%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	 FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	 LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cresse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		21	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 04 — Del: 15 de febrero de 2026 — Al: 21 de febrero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	3.55%	12.30%
Avance financiero obra:	$ 37,933,773.15	$ 131,432,509.77

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	3.55%	93.55%
Avance financiero interventoría:	$ 3,454,736.03	$ 91,039,593.23

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1,068,556,990.00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2025
Fecha de Términación actulizada	04 de Noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97,316,508.00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación actulizada	15 de abril 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Excavacion a mano en material comun	Excavacion manual en conglomerado
	

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consultoría S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		21	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m	Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.
	
Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	Demolicion cimientos enterrados con retiro
	
Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material	Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
	

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		21	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi



Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi



Acero de Refuerzo Grado 60 para cimentación



Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km



Acero de Refuerzo Grado 60 para muro



Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		21	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavacion a mano en material comun
Excavacion manual en conglomerado
Reubicacion de medidor de agua incluye tuberia pvc 1/2" x 5 m
Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.
Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
Demolicion cimientos enterrados con retiro
Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material
Relleno con material base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, incluye tapa de concreto reforzado 4000 psi
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi
Acero de Refuerzo Grado 60 para cimentación
Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km
Acero de Refuerzo Grado 60 para muro

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 4 se reporta un avance del 15,30%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025			Cresse Consulting S.A.S		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 04 — Del: 22 de febrero de 2026 — Al: 26 de febrero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	2.38%	14.68%
Avance financiero obra:	$ 25,431,656.36	$ 156,864,166.13

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	2.38%	14.68%
Avance financiero interventoría:	$ 2,316,132.89	$ 14,286,063.37

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1,068,556,990.00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2025
Fecha de Términación actulizada	04 de Noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97,316,508.00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación actulizada	15 de abril 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material





CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Limpieza franja de trabajo



Acero de Refuerzo Grado 60



Acero de Refuerzo Grado 60



Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.



Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar




Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Construtora S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

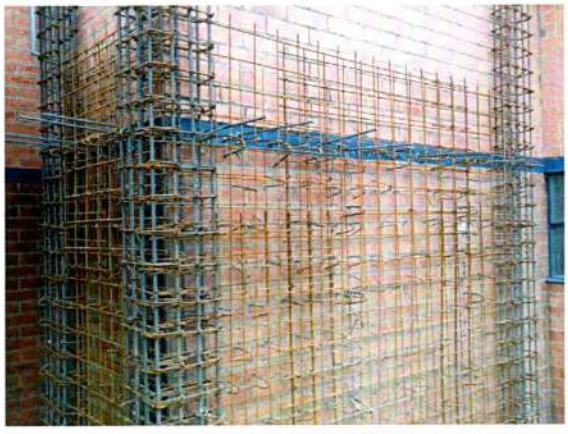Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.	Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.
	
Acero de Refuerzo Grado 60 muro	Acero de Refuerzo Grado 60 muro
	
Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.	Conector de cortante de Ø 3/8" x 570 mm con epoxico (incluye perforación L=200 mm). Suministro e Instal.
	

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	2	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi

Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, Incluye retiro de material

Limpieza franja de trabajo

Acero de Refuerzo Grado 60

Acero de Refuerzo Grado 60

Reubicacion de medidor de gas incluye accesorios.

Recubrimiento epóxico de alta resistencia Sikadur 32 primer o similar

Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.

Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.

Recalce de zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.

Acero de Refuerzo Grado 60 muro

Acero de Refuerzo Grado 60 muro

Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.

Conector de cortante de Ø 3/8" x 570 mm con epoxico (incluye perforación L=200 mm). Suministro e Instal.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 4 se reporta un avance del 15,30%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
