| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | FECHA | 1/01/2026 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) | No. 4 |
|---|---|

**1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)**

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

**2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO (NUMERO)** | ICCU-785-2025 (CONSULTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 5/09/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |
| | ICCU-883-2025 (INTERVENTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 15/10/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | CONSORCIO GPM VIAL | | N/A | **NIT** | 901985761-1 |
| | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S. | | N/A | **NIT** | 829000727-3 |
| **OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO URBANO DE TIBACUY, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE SAN CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL MORTIÑO, 6. VÍA DEL ANILLO VÍAL EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA, 7. VÍA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 3: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO URBANO DE TIBACUY, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE SAN CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL MORTIÑO, 6. VÍA DEL ANILLO VÍAL EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA, 7. VÍA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA. | | | | |
| **PLAZO EJECUCIÓN OBRA** | El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 05 de noviembre del 2025 hasta el 04 de julio de 2026 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo). | | | | |
| **PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA** | El plazo de ejecución es de NUEVE (09) meses según el acta de inicio, va desde el 05 de noviembre del 2025 hasta el 04 de agosto de 2026 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo). | | | | |
| **MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)** | N/A | | | | |
| **PRORROGAS (Insertar filas necesarias)** | N/A | | | | |
| **SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)** | N/A | | | | |
| **ADICIONES (Insertar filas necesarias)** | N/A | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | El plazo de ejecución es hasta el 4 de julio de 2026 según acta de inicio para consultoría y el plazo de ejecución es hasta el 4 de agosto de 2026 según acta de inicio para interventoría. | | | | |
| **FORMA DE PAGO - CONSULTORÍA** | El pago de la ejecución del contrato se realizará de la siguiente forma:<br>1. Se realizará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato.<br>2. El pago restante del contrato se pagará por volumen entregado y aprobado por la interventoría hasta completar el 95% del valor total del contrato.<br>3. Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor total del contrato una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.<br><br>NOTA 1: EL ICCU no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.<br>NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el trámite de los giros así.<br>NOTA 3: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el trámite de liquidación y posterior pago de la misma (10 % final), el contratista deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones correspondientes al 10% final.<br>NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br>NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>NOTA 6: El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.<br>NOTA 7: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al consultor, serán asumidas por el mismo | | **VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)** | $4.834.400.134,00 | |
| | Los desembolsos del valor del contrato se realizarán de la siguiente forma:<br><br>La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación.<br><br>El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.<br><br>Parágrafo 1. La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la liquidación de la interventoría recibidos a entera satisfacción de la entidad.<br><br>La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.<br>La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.<br><br>Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del | | | | |

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | FECHA | 1/01/2026 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** **No. 4**

**1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)**

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

**2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO (NUMERO)** | ICCU-785-2025 (CONSULTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 5/09/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |
| | ICCU-883-2025 (INTERVENTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 15/10/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |
| **FORMA DE PAGO INTERVENTORIA** | contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce interventoría Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.<br><br>NOTA 1: El pago se realizará de acuerdo con los componentes del formulario No 1, gestión que debe quedar debidamente sustentadas y soportada en el informe de interventoría del correspondiente mes.<br>NOTA 2: El reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal se realizará sobre el que efectivamente fue empleado en la ejecución de los trabajos, aprobados por la entidad, afectados por un factor multiplicador. De igual modo, otros costos directos ocasionados deberán ser aprobados por la entidad.<br>Para tal efecto, el interventor deberá solicitar aprobación del inicio de cada uno de los profesionales y otros costos que componen su oferta, conforme con el plan de obra y actividades en ejecución.<br>NOTA 3: EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de las propuestas.<br>NOTA 4: El contratista deberá realizar los pagos que corresponden al impuesto de Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad económica que ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el trámite de la liquidación y posterior pago del contrato (5% final). Así las cosas, El Contratista deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación del Impuesto de Industria y Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de acuerdo con el valor total del contrato.<br>NOTA 5: Teniendo en cuenta que el contrato de consultoría a realizar la interventoría contiene variables en cuanto a su ejecución y forma de pago, en caso de que, el contrato de obra termine antes de finalizar el plazo de ejecución de la presente interventoría, el ICCU solo reconocerá los valores ejecutados por el interventor hasta el término del contrato de obra.<br><br>Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato | | | **VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)** | $1.054.622.506,00 |
| | | **PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** | 01/2/2025 al 28/02/2025 | | |

**3. GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**Contrato de consultoría**

| Póliza: | | Vigencia | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Número** | **Desde** | **Hasta** | |
| **Cumplimiento** | **NB-100409347** | **11/05/2025** | **1/04/2027** | **$ 966.880.026,80** |
| **Buen manejo del anticipo** | **NB-100409347** | **11/05/2025** | **1/04/2027** | **$ 966.880.026,80** |
| **Prestaciones sociales** | **NB-100409347** | **11/05/2025** | **7/04/2029** | **$ 966.880.026,80** |
| **Calidad del servicio** | **NB-100409347** | **7/04/2026** | **7/04/2031** | **$ 1.450.320.040,20** |

**Contrato de interventoría**

| Póliza: | | Vigencia | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Número** | **Desde** | **Hasta** | |
| **Cumplimiento del contrato** | **SGPL-226707018-1** | **11/05/2025** | **2/05/2027** | **$ 105.462.250,60** |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | **SGPL-226707018-1** | **11/05/2025** | **8/05/2029** | **$ 210.924.501,20** |
| **Calidad del servicio** | **SGPL-226707018-1** | **8/05/2026** | **8/05/2031** | **$ 210.924.501,20** |

**4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)**

| | | |
|---|---|---|
| **Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)** | **Responsable diligenciamiento** | **JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO** |
| | **Fecha diligenciamiento** | **17 DE FEBRERO** |

**4. DESCRICIÓN DEL AVANCE**

En Seguimiento a los contratos a la interventoria y consultoria se hace un recuento del desarrollo de los mismos: En cuanto a la documentación contractual, se evidencia que la mayoría de los componentes se encuentran aprobados. Las garantías y la documentación inicial fueron validadas sin novedades, y se ajustó el cronograma por parte del consultor del proyecto priorizando varios tramos viales según solicitud del ICCU. Las hojas de vida del equipo también están aprobadas, aunque algunos perfiles de interventoría tuvieron observaciones que ya fueron corregidas y están en revisión final.

Respecto al anticipo, este fue aprobado y desembolsado parcialmente por un valor cercano a $966 millones, aunque se solicitaron aclaraciones sobre retenciones y rendimientos financieros. En relación con los informes, los primeros informes mensuales y varios semanales ya fueron aprobados, mientras que otros aún se encuentran en proceso de revisión tanto por la interventoría como por la entidad.

En el componente técnico, el estudio de tránsito está en proceso. Se han realizado observaciones a varios tramos y el consultor ya ha enviado ajustes que están siendo revisados.
En cuanto a la topografía, la mayoría de los tramos ya finalizaron actividades de campo, excepto el tramo de Facatativá que requiere de aclaraciones técnicas y mesa de trabajo con el municipio en cuanto gestión predial por lo encontrado en campo durante la exploración de campo y otros temas técnicos que garanticen el trazado de este corredor, de esta manera realizar las otras actividades como sondeos y temas predios.
También se presentó un avance en la caracterización ambiental preliminar.

Finalmente, el trazado del Anillo Vial de Útica ya fue definido, teniendo en cuenta la normativa férrea vigente.
En el componente de geotecnia, las actividades avanzan en general de manera positiva. Los apiques ya fueron ejecutados al 100% en varios tramos como San Cayetano – Cogua, Cáqueza – Fosca, Une – Caraza y Silvania – Tibacuy. Sin embargo, algunos tramos como Ramal Gama – Gama y el Anillo Vial de Útica aún presentan avances parciales (85% y 67% respectivamente). En cuanto a los resultados de laboratorio, la mayoría de los tramos ya cuentan con resultados completos, excepto Ramal Gama – Gama, que apenas tiene un avance inicial.

Respecto a las perforaciones manuales, varios tramos ya están finalizados, pero otros como Útica y San Cayetano – Cogua aún no han iniciado. En las perforaciones mecánicas, algunos tramos ya están completamente ejecutados, mientras que otros presentan avances parciales, especialmente Ramal Gama – Gama y Silvania – Tibacuy. El Anillo Vial de Útica tiene programado su inicio en marzo.

Las actividades de deflectometría fueron reprogramadas para inicios de marzo en varios tramos, lo que indica ajustes en la planificación técnica.

En cuanto al diseño geométrico, ya se entregaron algunos avances por parte del consultor en tramos como San Cayetano – Cogua y Une – Caraza, los cuales están en proceso de revisión por parte de la interventoría, incluyendo mesas de trabajo entre especialistas.

En el área de geología, la interventoría realizó observaciones a los estudios entregados y se están desarrollando mesas de trabajo para su revisión y ajuste.

Adicionalmente, la interventoría ha recibido múltiples entregables técnicos y socioambientales, incluyendo diseños preliminares, estudios de estabilidad de taludes, suelos para fundaciones y análisis de impacto ambiental en diferentes tramos.

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | FECHA | 1/01/2026 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** — **No. 4**

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

## 2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO (NUMERO)** | ICCU-785-2025 (CONSULTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 5/09/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |
| | ICCU-883-2025 (INTERVENTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 15/10/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |

**RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:**
**Al no contar con cronograma aprobado no se ha creado la curva S de avance del contrato fisico.**

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 35,00% | 28,50% | |
| Durante el periodo | 3,50% | 4,50% | |
| Acumulado Actual | **38,50%** | **33,00%** | -5,50% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 241 días | 117 días | 180 días | -13 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**


| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 580.128.016 | $ 1.377.804.038 | 238% |
| Durante el periodo | $ 169.204.005 | $ 217.548.006 | 129% |
| Acumulado Actual | $ 1.861.244.052 | $ 1.595.352.044 | 86% |

Se presenta un atraso del 1%, con respecto al cronograma de consultoría.

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 265.892.007

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**




**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**


| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ - | | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

Se realizó desembolso por parte del ICCU al consultor, el consultor solicito ajuste al Plan de inversión el cual fue aprobado por interventoría, a través del comunicado CTO883-134-26 del 14 de febrero de 2026.
La interventoría aprobó el desembolso por $966.880.027 y remitió las siete (7) órdenes de giro; sin embargo, no fue posible realizar pagos debido a inconvenientes en la plataforma transaccional de Bancolombia.

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 265.892.007,37

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

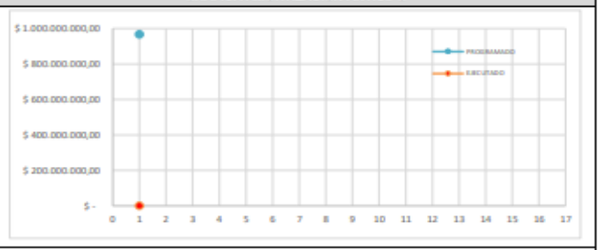


## 5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO GPM VIAL | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S. |
|---|---|---|
| **Anticipo** | $966.880.026,80 | $0,00 |
| **Pago No. 1** | $0,00 | $31.909.203,00 |
| **Pago No. 2** | $0,00 | $95.292.344,00 |
| **Pago No. 3** | $0,00 | $0,00 |
| **Pago No. 4** | $0,00 | $0,00 |
| **Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)** | $0,00 | $0,00 |
| **Valor Pagado Total** | $966.880.027,00 | $127.201.547,00 |
| **Saldo Pendiente por Cancelar** | $3.867.520.107,00 | $927.420.959 |
| **Porcentaje de ejecución** | 20,00% | 12,06% |

## 6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| | | |
|---|---|---|
| **Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)** UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoria (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU) | **Responsable diligenciamiento** | **JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO** |
| | **Fecha diligenciamiento** | **EN REVISIÓN** |

## 7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Verificación del uso adecuado de la imagen institucional** | **Vallas** | **EN REVISIÓN** | **Chalecos** | **N/A** |
| | **Cascos** | **N/A** | **Otros** | **N/A** |
| **Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial** | **SI** | **N/A** | **NO** | **N/A** |

## 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Panorámica Apique 01



Muestra extraída Apique 01



Resultado final posterior a la ejecución del apique 01

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | FECHA | 1/01/2026 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) | No. 4 |
|---|---|

**1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)**

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

**2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO (NUMERO)** | ICCU-785-2025 (CONSULTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 5/09/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |
| | ICCU-883-2025 (INTERVENTORÍA) | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 15/10/2025 | **FECHA INCIO** | 11/05/2025 |



Panorámica Apique 02



Muestra extraída Apique 02



Resultado final posterior a la ejecución del apique 02




Panorámica Apique 03



Muestra extraída Apique 03



Resultado final posterior a la ejecución del apique 03



Muestra extraída PM-07-GGD



Muestra extraída PM-07-GGD




Muestra extraída PM-07-GGD



Muestra extraída PM-07-GGD




Muestra extraída PM-07-GGD



Muestra extraída PM-07-GGD







**9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

DEL PERIODO DE SUPERVISIÓN SE HAN REALIZADO COMITES DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA, ADICIONALMENTE SE ESTAN SE ADELANTARON MESAS DE TRABAJO, VERIFICACIONES Y CONSULTAS CON EL MUNICIPIO EN TEMAS TECNICOS, DE GESTION PREDIAL, AMBIENTAL PARA EL TRAMO DE VIA CARTAGENITA SANTA MARTA CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCESO, REFERENCIANDO EL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO. SE DEFINIÓ LA FRANJA DE RETIRO OBLIGATORIA PARA VÍA EN SUELO URBANO CON RELACIÓN A CERCANÍAS A LÍNEAS FÉRREAS. SE HACEN COMITES DE SEGUIMIENTO EN CUANTO A LOS AVANCES REALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION LEVANTADA EN CAMPO POR EL CONSULTOR PARA LOS 7 TRAMOS OBJETO DEL CONTRATO POR EL CONSULTOR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CAMPO.

**10- ANEXOS**

N/A

**FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA - ELABORÓ |
|---|---|---|
| JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO | APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA - SUPERVISOR(A)** |
| SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ | SUBDIRECTORA TECNICA - SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| **FECHA DEL PRESENTE INFORME** | 2 DE MARZO DE 2026 | |
