INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	7			FECHA:	6	de	MARZO	de	2026		
PERIODO:	DEL	1	de	FEBRERO	de	2026	AL	28	de	FEBRERO	de	2026

CONTRATO No:	**IPVO-017-2025**	DE	2025	REGISTRO BP Y P No	**REGALIAS**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se localiza específicamente en la vía secundaria (61BY10) Úmbita - Puente Sisa, en la abscisa de inicio K7+660 y final K9+160.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO SISA 25 R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	**JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	N/A	0	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 368.302.174,03	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 368.302.174,03

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	18	de	JUNIO	de	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	2	de	JULIO	de	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**59,21%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**23,51%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**15,01%**



INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101174421		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	8	2025	21	12	2026	$ 36.830.217,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	8	2025	20	6	2029	$ 36.830.217,40
CALIDAD DEL SERVICIO	19	8	2025	20	6	2031	$ 73.660.434,81

No PÓLIZA	39-44-101174421		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19	8	2025	20	6	2026	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19	8	2025	20	6	2026	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19	8	2025	20	6	2026	$ 284.700.000,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	19	8	2025
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	19	8	2025
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 DE INTERVENTORÍA	31	12	2025
ACTA DE REINICIO 1 DE INTERVENTORÍA	13	1	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	
INTERVENTORIA TÉCNICA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	K9+150 - K9+160
INTERVENTORIA TÉCNICA EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	K7+660 - K9+160
INTERVENTORIA TÉCNICA CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	Disposición de material de excavación
OBRAS DE DRENAJE	
INTERVENTORIA TÉCNICA EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Alcantarillas

INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D-36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Filtros
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D-4" DRENAJE SIN FILTRO	Filtros
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Rellenos y mejoramientos de suelo de rasante.
PAVIMENTO FLEXIBLE	
INTERVENTORIA TECNICA INSTALACIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO	Rellenos y mejoramientos de suelo de rasante.

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Cinta métrica.	Verificación dimensiones	30%	
Computador.	Elaboración de informes.	100%	
Elementos de oficina.	Elaboración de informes.	50%	
Estación total topografía y rtk	Verificación topografía	40%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		**N/A**
Acta Parcial No. 1	24 12 2025	$ 122.866.672,22
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 122.866.672,22**

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
2/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME 05, 01/12/2025-31/12/2025	X
2/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME 06, 01/12/2025-31/12/2025	X
2/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA	X
5/02/2026	INTERVENTORIA	CITACION A COMITE TECNICO DE OBRA #11	X

9/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA	X
11/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL 6 DE INTERVENTORÍA	X
11/02/2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	X
11/02/2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	X
12/02/2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD CERTIFICADO DE EGRESOS Y RETENCIONES	X
13/02/2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	X
16/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME 06, 13/01/2026-31/01/2026	X
16/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME 06, 13/01/2026-31/01/2026	X
16/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA	X
16/02/2026	INTERVENTORIA	ACTA DE COMITÉ #11	X
17/02/2026	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN DE OBRA	X
17/02/2026	INTERVENTORIA	CITACION A COMITE TECNICO DE OBRA #12	X
18/02/2026	INTERVENTORIA	DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE OBRA.	X
21/02/2026	INTERVENTORIA	REMISION DOCUMENTOS MODIFICATORIO	X
23/02/2026	INTERVENTORIA	DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE OBRA.	X
23/02/2026	INTERVENTORIA	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA	X
24/02/2026	INTERVENTORIA	AJUSTE DE POLIZAS ACTA DE REINICIO #1 INTERVENTORÍA	X
25/02/2026	INTERVENTORIA	ORDEN DE OPERACIÓN 7	X
26/02/2026	INTERVENTORIA	ORDEN DE OPERACIÓN 7	X
26/02/2026	INTERVENTORIA	BALANCE DE OBRA PARA REVISIÓN	X

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Jaime Humberto Pinzón Álvarez	7.172.271	X	X	X	13	1	2026	31	12	2026
Andrés David Mendivelso Álvarez	1.054.254.612	X	X	X	13	1	2026	31	12	2026
María Clara Cáceres Estupiñán	39.724.228	X	X	X	13	1	2026	31	12	2026
Claudia Rocío Suarez Castillo	52.351.443	X	X	X	13	1	2026	31	12	2026

Jorge Andrés Roa Romero	1.049.622.654	X	X	X	13	1	2026	31	12	2026
Hernando Andrés Álvarez Arévalo	7.181.652	X	X	X	13	1	2026	31	12	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Jaime Humberto Pinzón Álvarez	7.172.271
RESIDENTE DE INETERVENTORIA	Andrés David Mendivelso Álvarez	1.054.254.612
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD	María Clara Cáceres Estupiñán	39.724.228
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO	Claudia Rocío Suarez Castillo	52.351.443
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Jorge Andrés Roa Romero	1.049.622.654
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Hernando Andrés Álvarez Arévalo	7.181.652

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Solicitud y verificación de manejo de escombros y licencias de explotación de materiales	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud implementación PMA	PROYECTO EN GENERAL
Se solicitó la instalación de señalización adecuada acorde con las actividades ejecutas en campo.	PROYECTO EN GENERAL
Se solicitó afiliación de todo el personal que ingreso, tanto al sistema de salud, pensión y riesgos laborales. Y entrega de los respectivos exámenes de ingreso.	PROYECTO EN GENERAL
Se solicitó la implementación del SG-SST, con los seguimientos al PMA y entrega de las evidencias realizadas.	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de entrega de EPP's y verificación del uso de estos, control de seguridad social integral y manejo de materiales	PROYECTO EN GENERAL
La interventoría ha requerido al contratista con el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial, por medio de oficios, comités técnicos y bitácora de obra, al igual, se han revisado los informes del PMA y se han solicitado ajuste y aclaraciones al mismo.	PROYECTO EN GENERAL
La interventoría solicito la entrega de paz y salvos del personal que ha egresado y la revisión de manejo del tema de residuos peligrosos en obra y su disposición final, así como los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso.	PROYECTO EN GENERAL

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	26	8	2025	VERIFICACION AVANCE Y ESTADO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 2	5	9	2025	VERIFICACION AVANCE Y ESTADO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 3	19	9	2025	VERIFICACION AVANCE Y ESTADO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 4	3	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 5	14	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 6	16	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 7	22	10	2025	VISITA CONSULTORES
Acta de Comité de Obra No 8	30	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 9	13	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 10	27	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 11	11	12	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 12	20	1	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 13	6	2	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA
Acta de Comité de Obra No 14	19	2	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOPOGRAFIA

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	19	8	2025	31	8	2025	Cargado en Secop
Informe de Supervisión No. 2	1	9	2025	30	9	2025	Cargado en Secop
Informe de Supervisión No. 3	1	10	2025	31	10	2025	Cargado en Secop
Informe de Supervisión No. 4	1	11	2025	30	11	2025	Cargado en Secop
Informe de Supervisión No. 5	1	12	2025	31	12	2025	Cargado en Secop
Informe de Supervisión No. 6	13	1	2026	31	1	2026	Cargado en Secop
Informe de Supervisión No. 7	1	2	2026	28	2	2026	Presente informe

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

OBSERVACIONES **EL**


AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA ESTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMADO

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Certificación de ejecución de actividades	SI	
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

OBSERVACIONES:

FIRMA:	
	Supervisor
NOMBRE:	JULIAN EDGARDO DUERRERO RINCON



VoBo. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA TEC. EN INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IPVO 017-2025

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

PRESENTADO A:

TIERRASUA S.A.S
NIT. 901.285.377-2

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR

INFORME N° 7 -V1
Del 1 al 28 de febrero de 2026

ORIGINAL
MARZO DE 2026

PRESENTACIÓN DEL INFORME

El Ingeniero JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, subscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IPVO 017-2025cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", con TIERRASUA S.A.S, para el seguimiento y control de un contrato de obra.

El Contrato de obra es el N° IPO 001-2025, desarrollado por el contratista de obra CONSORCIO SISA 25, representado legalmente por el Ing. JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", y para la cual la entidad contratante es TIERRASUA S.A.S.

Los contratos se firmaron en julio de 2025 y las actas de inicio de los contratos de Obra y de interventoría se suscribieron el 19 de agosto de 2025, teniendo un plazo total de diez (10) meses; se suscriben actas de suspensión 1 de los contratos de obra e interventoría el día 31 de diciembre de 2025 y actas de reinicio 1 el día 13 de enero de 2026; en labores de interventoría se tiene por objetivo la inspección y aprobación de las actividades ejecutadas por el contratista, según los planos, diseños y especificaciones entregados por la entidad contratante.

OBJETIVOS

- ✓ Informar de forma clara y precisa a la entidad contratante de lo ocurrido en el proceso de Interventoría mencionado durante el periodo de ejecución pactado para un total de DIEZ (10) meses, dentro del tiempo estimado en el contrato de obra.

- ✓ Verificar que se ejecuten las obligaciones por parte del contratista, de acuerdo objeto contractual del contrato.

- ✓ Verificar que el contratista cumpla con especificaciones técnicas según lo descrito con los procedimientos técnicos de la normatividad vigente.

- ✓ Verificar el estado real ejecutado a la fecha, desde el 19 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2025 fecha de suspensión 1 de los contratos de obra e interventoría y desde el 13 de enero de 2026 fecha de reinicio 1, a la fecha de corte del presente informe.

1. INFORMACIÓN GENERAL.

INFORME N.º: 7 (SIETE).

PERIODO DEL INFORME: Del 1 al 28 de febrero de 2026.

1.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Numero:	N° IPVO 017-2025
Contratista:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
NIT:	7172271 - 2
Rep. Legal:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Valor Inicial:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Fecha de Inicio:	19 DE AGOSTO DE 2025
Fecha suspensión 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de reinicio 1:	13 DE ENERO DE 2026
Fecha prevista finalización inicial:	18 DE JUNIO DE 2026.
Fecha prevista finalización vigente:	2 DE JULIO DE 2026
Valor anticipo inicial:	N/A
Valor anticipo adicional:	N/A
Valor anticipo total:	N/A

EQUIPO HUMANO:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD	MARIA CLARA CACERES ESTUPIÑAN
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGIC	ING. CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ING. JORGE ANDRES ROA ROMERO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ING. HERNANDO ANDRES ALVAREZ AREVALO

1.2. CONTRATO DE OBRA

Numero:	N° IPO 001-2025
Contratista:	CONSORCIO SISA 25
NIT:	901.969.390-5
Rep. Legal:	JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
C.C:	6.775.637 de Tunja
Valor Inicial:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Fecha de Inicio:	19 DE AGOSTO DE 2025
Fecha suspensión 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de reinicio 1:	13 DE ENERO DE 2026
Fecha prevista finalización inicial:	18 DE JUNIO DE 2026.
Fecha prevista finalización vigente:	2 DE JULIO DE 2026
Valor anticipo inicial:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)
Valor anticipo adicional:	N/A

Valor anticipo total:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)

EQUIPO HUMANO:

DIRECTOR DE OBRA:	ING. YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN
RESIDENTE DE OBRA:	ING. NESTOR ANDRES MEDINA ROA
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ING. JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL	ING. ELIZABETH MAHECHA VALERO
ESPECIALISTA EN HSEQ	ING. HUGO MAURICIO SUAREZ RINCON

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE

TIERRASUA S.A.S
NIT. 901.285.377-2

SUPERVISOR:	Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO
Supervisor–	Entidad contratante

1.4. CAPITULO ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO.

A la fecha los contratos de obra, de acuerdo al contrato suscrito, y del contrato de Interventoría se encuentran vigentes, de acuerdo al acta de reinicio #1, pólizas establecidas y plazo de los mismos.

1.4.1. PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

- **CONTRATO DE OBRA IPO 001-2025**

- N° DE PÓLIZA 94219 Anexo 2
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	94219	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							14	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	8	2025	1	1	2027	$ 526,077,196.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	19	8	2025	2	11	2026	$ 2,104,308,782.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	8	2025	2	7	2029	$ 526,077,196.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19	8	2025	2	7	2031	$ 1,052,154,391.00

- N° DE PÓLIZA 27100 Anexo 3
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS

No PÓLIZA	27100	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							14	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30	5	2025	2	7	2026	$ 569,400,000.00

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IPVO 017-2025**

- N° DE PÓLIZA 39-44-101174421 – ANEXO 5
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	**39-44-101174421**	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	FECHA EXP	de	mm	a
							23	02	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	08	2025	04	01	2027	$36,830,217.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	08	2025	04	07	2029	$36,830,217.40
CALIDAD DEL SERVICIO	19	08	2025	04	07	2031	$73,660,434.81

- N° DE PÓLIZA 39-40-101045618 – ANEXO 4
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	**39-40-101045618**	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	FECHA EXP	de	mm	a
							23	02	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19	08	2025	04	07	2026	$350,181,000.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19	08	2025	04	07	2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19	08	2025	04	07	2026	$350,181,000.00

1.5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio Úmbita, provincia de Márquez, departamento de Boyacá, y comprende la construcción de 1500 metros lineales de pavimento flexible con respectivas cunetas laterales, además de construcción de alcantarillas a lo largo del tramo a intervenir, y se pretende la construcción de 1160 metros lineales de filtro.
Dicha intervención se realizará desde la abscisa K7+660 al K9+160 con coordenadas de inicio: E4950295,650 N2134652,658 y Fin E4949889,199, N2314999.383.

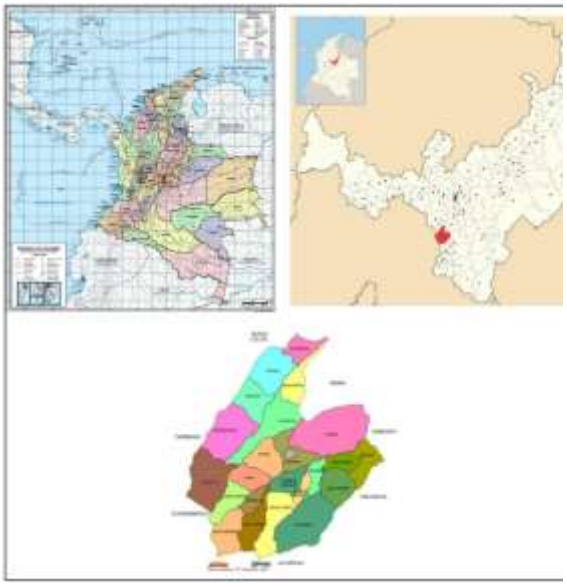


Ilustración 1. Imagen de Google e informe



Ilustración 2. Ubicación general del proyecto

2.6 ANTECEDENTES

Que, el Departamento de Boyacá mediante Decreto 1182 del 20 de diciembre de 2024, priorizó y aprobó el proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Con BPIN 2024004150432, por un valor total de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($5.629.761.803,07), los cuales soportan su financiamiento de la siguiente manera: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

($779.382.431,31) con cargo a los recursos del 60% de la Asignación para la Inversión Regional Departamento de Boyacá para el Bienio 2023 - 2024, la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 4.220.617.568,69) del 60% de la Asignación para la Inversión Regional Departamento de Boyacá para el Bienio 2025 - 2026, y SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 629.761.803,07), con cargo a la Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría Municipio de Úmbita para el Bienio 2023-2024.

Que así mismo, el Departamento de Boyacá mediante Decreto No. 0270 del 19 de marzo de 2025, realizó ajuste del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Con BPIN 2024004150432, designándose como entidad ejecutora del Proyecto de inversión y su interventoría a la Sociedad de Economía Mixta TIERRASUA S.A.S.

Que la sociedad TIERRASUA S.A.S., adelantó los respectivos estudios previos, estudios del sector y demás anexos, y adelantó la respectiva INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS RE- IPO-001 -2025, Que, dentro De acuerdo con los resultados de la verificación de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras, así como a la ponderación de criterios de selección objetiva, se dio publicidad del informe final de evaluación, teniéndose en cuenta las observaciones y/o subsanaciones al informe preliminar por parte de los oferentes, en el que el comité evaluador sugirió de acuerdo con los resultados del proceso de selección, adjudicar la INVITACION PUBLICADE OFERTAS RE-IPO-001-2025 al oferente CONSORCIO SISA 25, representado legalmente por JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 6.775.637 de Tunja, por cumplir con los requisitos habilitantes y obtener un puntaje de (99.9494 PUNTOS) como criterios de selección ponderables, tratándose de una propuesta favorable para la entidad.

Que la sociedad TIERRASUA S.A.S., adelantó los respectivos estudios previos, estudios de mercado e invitación con el fin de realizar la convocatoria de invitación privada de varias ofertas IPVO – 021 - 2025, Que, atendiendo a la recomendación efectuada por el comité evaluador como consecuencia del proceso contractual INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS IPVO – 021 - 2025, la sociedad TIERRASUA S.A.S, encuentra conveniente ADJUDICAR el precitado proceso a JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ, identificado con C.C 7.172.271 de Tunja, de acuerdo a su propuesta económica presentada.

2. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al contrato de obra, el cual fue firmado desde el pasado treinta (30) días del mes de julio de 2025, de las actas de inicio firmadas el 19 de agosto de 2025, y de las diferentes mesas y comités desarrollados con el supervisor de la entidad contratante, así como con los funcionarios del municipio de Umbita, y de las visitas al sitio de las obras realizadas, y de la socialización con la comunidad, se conoció el sitio y aspectos relevantes del proyecto.

Posterior al recibo de la información técnica, de estudios y diseños que dieron origen al proyecto, se realiza un análisis de información de documentos precontractuales, análisis de soportes de entrega del contratista de obra, respuestas y recomendaciones a la entidad contratante, contratista de obra inicia con la ejecución de las actividades de obra.

En la ejecución de obra se empieza por la localización y replanteo topográfico del proyecto en todo el trayecto de intervención del proyecto, continuando con las excavaciones mecánicas para ampliación de la vía y disposición final del material proveniente de estas excavaciones al botadero conformado; posteriormente se empieza la ejecución de las excavaciones mecánicas y manuales para las obras de arte del proyecto, empezando por las alcantarillas, de igual manera se realiza la instalación de solados y atraques para la posterior instalación de tubería en concreto reforzado de 36", se deja en claridad que debido a las condiciones del terreno se tienen algunos imprevistos en los cuales ha requerido hacer sobre excavaciones, así como mejoramientos al terreno natural, para lo cual se ha recomendado al contratista de obra, empezar a justificar e incluir estas actividades dentro del rubro de imprevistos que contempla el proyecto.

Sin embargo, el contratista continúa con la ejecución de las actividades de obra propias de la construcción de las alcantarillas, continuando con la instalación de tuberías, solados y atraques de estas, así como los solados de limpieza para los concretos de las estructuras de descole y encole, para lo cual se ha instalado el acero de refuerzo y posterior fundida de concreto para estos mismos elementos.

De igual manera se ha empezado con actividades de excavaciones mecánicas para filtros de drenaje y cajeos para mejoramientos de suelo, para la construcción de filtros se empiezan desde la abcisa K7+960 hasta el K9+160, realizando instalación de geotextil, tubería de drenaje de 4" y así mismo el relleno con piedra para filtro según granulometría especificada en diseños, alternamente se realizan cajeos y mejoramientos de suelo con pedraplén y material granular en este mismo trayecto referenciado.

Así mismo se han desarrollado comités de obra, en donde se requirió la presencia del consultor y diseñador del proyecto, con el fin de realizar aclaraciones a algunas observaciones encontradas durante la ejecución del proyecto, debido a las condiciones que se presentan en el terreno.

2.1. SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA

De acuerdo al contrato de obra, y de los pliegos de condiciones, estudios previos y normas contractuales se solicitó:

.

1. Copia física y magnética de la propuesta técnica y económica presentada por el contratista de obra.
2. Copia de las pólizas y garantías, a favor de la entidad contratante, tanto de las iniciales del contrato, como de las actualizadas con el acta de inicio de obra.
3. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato a la para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el contrato de obra:
    a. Hojas de vida del personal profesional.
    b. Relación del equipo mínimo obligatorio.
    c. Entrega de copia editable del presupuesto general de la obra.
    d. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
    e. Programa de obra y flujo de inversión.
    f. Plan de manejo de tránsito- PMT.
    g. Plan de adaptación de la guía ambiental.
    h. Caracterización del tramo vial.
    i. Plan de inversión del anticipo.
    j. Copia del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo.
    k. Copia de las afiliaciones a los sistemas de seguridad social integral, del personal administrativo y operativo, a nombre del Consorcio.
    l. Los demás que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones y del contrato.
4. Presentar antes de quince (15) días calendario, el concepto técnico de los estudios y diseños recibidos de la entidad, contados a partir del acta de inicio; superado este plazo, al NO presentar ninguna solicitud por parte del contratista, se entenderá, que acepta su contenido.
5. Presentar del programa de obra y flujo de inversión, y cumplir con el mismo. Este documento debe ser entregado en medio físico firmado y en medio magnético editable, para su verificación.

6. Entregar el organigrama de trabajo de acuerdo a la propuesta presentada.
7. Diligenciar y entregar para revisión las actas de vecindad del proyecto, tanto de los predios y edificaciones como de las vías y redes municipales aledañas al proyecto. En este documento se debe realizar de manera clara las revisiones de arboles o especies nativas que deban ser retiradas del trazado entregado para su construcción.
8. Instalar la valla informativa sobre el proyecto en la cual se indique la información del proyecto. Para ello debe solicitar a la entidad modelo, datos y lugar de instalación.
9. Deberá entregar una certificación suscrita por el contratista de obra, en la que se manifieste de manera expresa la revisión y aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto.
10. Se realiza especial solicitud de dar cumplimiento a la cláusula séptima. *OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA,* dado que en la misma se enmarcan las principales obligaciones para el correcto desarrollo del contrato de obra, de la referencia.
11. Todas las obligaciones generales y específicas definidas en el contrato de la referencia.

Adicional a ello la interventoría se permite recordar:

- El plazo previsto para la realización de las obras, de acuerdo al contrato de obra, es de diez (10) meses.
- La interventoría no aprueba la ejecución de actividades no previstas o desarrollo de mayores cantidades de obra, sin la autorización expresa y escrita de la entidad contratante, en caso de realizarse por el contratista de obra este tipo de obras, será por su cuenta y riesgo y no se tomará como base para posibles futuras reclamaciones.

CAPITULO ADMINISTRATIVO:

2.2. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ

En los anexos se adjuntan las actas de comité técnico, realizadas a la fecha del presente informe.

2.3. COPIA DE LA BITACORA

En los anexos se adjuntan copia de la bitácora para el periodo del presente informe. En el libro diario de obra se anotarán las actividades ejecutadas, el personal que está en campo, el equipo, pruebas, y demás condiciones de acuerdo a las tareas desarrolladas.

2.4. **PERSONAL.**

Por parte del contratista de obra ha entregado la seguridad social que corresponde al mes de enero de 2026, del personal operativo, así como administrativo ofertado en la propuesta, del mismo modo, se realiza la entrega de los certificados de afiliación del personal que ingresa durante el mes de febrero de 2026.

- **Personal Interventoría.**

Desde el inicio de los trabajos el personal en obra con la dedicación exigida en los documentos contractuales ha sido el siguiente:

Por parte de la firma Interventora.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD:	MARIA CLARA CACERES ESTUPIÑAN
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO:	ING. CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA:	ING. JORGE ANDRES ROA ROMERO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS:	ING. HERNANDO ANDRES ALVAREZ AREVALO

- **Personal de Obra.**

DIRECTOR DE OBRA:	ING. YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN
RESIDENTE DE OBRA:	ING. NESTOR ANDRES MEDINA ROA
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ING. JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL	ING. ELIZABETH MAHECHA VALERO
ESPECIALISTA EN HSEQ	ING. HUGO MAURICIO SUAREZ RINCON

3. PLAN DE TRABAJO / CRONOGRAMA DE OBRA.

Se anexó por el contratista de obra, en proyección mensual y semanal, los cuales incluyen duración, actividades con precedencias y sucesoras. Se encuentra suscrita por el representante legal de CONSORCIO SISA 25. Para el cual la interventoría hace la respectiva verificación del plan de trabajo establecido por el contratista.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL INICIO DE OBRA HASTA EL CORTE DEL PRESENTE INFORME

Durante el mes de febrero se dio inicio y/o continuación a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra No. IPO 001-2025, las cuales se hacen referencia a continuación:

- ✓ Socialización y recorrido del proyecto a la comunidad, contando con presencia de alcaldía municipal, concejo municipal, entidad contratante TIERRASUA S.A.S, equipos de contratista de obra e interventoría y la comunidad en general.
- ✓ Localización y replanteo topográfico de obra.
- ✓ Excavaciones mecánicas y cortes requeridos para la ampliación de la vía del proyecto.
- ✓ Retiro de material proveniente de excavaciones hacia botadero.
- ✓ Excavaciones mecánicas para construcción de obras de arte como alcantarillas.
- ✓ Instalación de solados y atraques para la tubería en concreto reforzado de las alcantarillas.
- ✓ Instalación de tuberías en concreto reforzado de 36", emboquillado de las mismas, para las alcantarillas 1 a 10 del proyecto.
- ✓ Instalación de solados de limpieza para concretos de las estructuras de las alcantarillas.
- ✓ Amarre e instalación de acero de refuerzo para placas de piso de cajas de encole y descole de alcantarillas, así como de los muros de las pocetas y aletas de las mismas.
- ✓ Fundida de concretos de 3000 PSI para las placas de piso de cajas de encole y descole de alcantarillas, así como de muros de aletas y pocetas de alcantarillas.
- ✓ Excavaciones mecánicas para construcción de filtros de drenaje y cajeos para mejoramientos de suelos.
- ✓ Construcción de filtros de drenaje, instalación de geotextil, tubería de 4"y piedra filtro.
- ✓ Mejoramientos de suelos mediante cajeos, con instalación y compactación de pedraplén compacto y material granular.
- ✓ Conformación de subrasante mediante nivelación e instalación de afirmado granular, debidamente compactado.
- ✓ Seguimiento y control del PMT.

- ✓ Seguimiento y control del PAGA.
- ✓ Seguimiento, control e implementación del SGSST.

4. CAPITULO FINANCIERO

4.1. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Para todos los efectos legales y fiscales de cada uno de los contratos (Interventoría) los valores son:


Valor Inicial:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Valor anticipo inicial:	N/A
Valor anticipo adicional:	N/A
Valor anticipo total:	N/A

4.2. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA.

Valor Inicial:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Valor anticipo inicial:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)
Valor anticipo adicional:	N/A

Valor anticipo total:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA

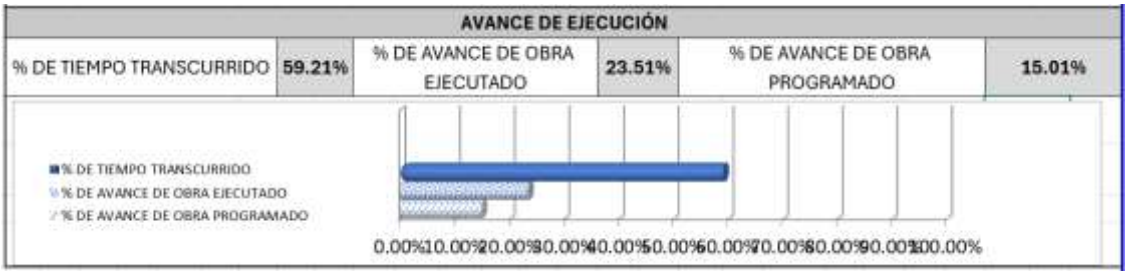

En el presente informe es pertinente aclarar que, de acuerdo a la verificación realizada a las cantidades contractuales, se tiene un porcentaje ejecutado del 23.51% sin retraso en la ejecución de actividades de obra y según el cronograma de obra enviado por el contratista de obra.

4.3. ESTADO DEL ANTICIPO DE OBRA

Se solicitó la entrega de la documentación requerida para la conformación de la fiducia y el contrato para la inversión del anticipo, así como el plan de inversión mensualizado, el cual ya ha sido radicado ante la entidad contratante para su respectivo trámite.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista y a la información enviada, se solicitó ajuste al plan de inversión del anticipo, por lo cual se revisa y acepta por la interventoría, el cual ya ha sido radicado ante la entidad contratante para su respectivo trámite.


De igual manera interventoría ha solicitado los soportes de acuerdo al nuevo documento, para el seguimiento, control y verificación del mismo, todo dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, es pertinente destacar que dentro de la información que allega el contratista a la fecha se han tenido siete (07) ordenes de giro de seguimiento al anticipo, en las cuales se entrega la documentación soporte para esos mismos pagos.

5. OTROS Y RECOMENDACIONES

- Se solicitó la entrega de documentación para la verificación y seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista de obra.

- Se solicitó la implementación y cumplimiento del PAGA y PMT por parte del contratista de obra.
- Se realiza constante comunicación con la entidad contratante, y el contratista de obra, manteniendo en todo tiempo informado del proceso a las partes.
- Se solicita al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y APU's aprobados por la entidad contratante.
- Se solicita la entrega de los documentos soportes de acuerdo al plan de inversión del anticipo.
- Se solicita el cumplimiento del SGSST.
- Se recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra, sin previa aprobación de la entidad contratante.
- Se solicita el cumplimiento del personal mínimo ofertado, de acuerdo a las dedicaciones contractuales.
- Se solicita al contratista entregar afiliaciones, planillas de seguridad social del personal operativo y administrativo de obra.
- Se solicita el cumplimiento en la entrega de la documentación pactada en los comités, oficios y demás requerimientos, dentro de los plazos establecidos, así como el cumplimiento de los compromisos pactados.
- Se solicita la entrega de dotación al personal, entrega de exámenes de ingreso laboral, y demás documentación soporte del seguimiento, control e implementación del SGSST.
- Se ha recomendado mantener la señalización nocturna y diurna en los puntos de intervención del proyecto, con el fin de mantener informado al usuario de los trabajos en la vía y dar cumplimiento a lo establecido en el PMT.
- Se ha solicitado la entrega de soportes de acuerdo a las ordenes de giro y plan de inversión del anticipo, para realizar seguimiento y verificación del mismo.
- Se solicita la entrega de resultados de laboratorio de concretos fundidos en obra, con los respectivos soportes de entrega de documentación del profesional laboratorista y certificado de calibración del equipo usado en campo.
- Se ha recomenado cumplir con las fechas establecidas en la entrega de informes y documentación para evitar reprocesos en la ejecución de obra.
- Se ha solicitado la entrega de certificados de calidad de los materiales usados en obra, así como la entrega de caracterización de materiales granulares a usar en el proyecto, previo a su instalación.
- Se ha solicitado realizar pruebas y ensayos requeridos según las especificaciones técnicas entregadas, así como los lineamientos establecidos en las normas vigentes como la INVIAS.

- Se ha solicitado monitoreo y seguimiento a los taludes que presentan actividad, con el fin de realizar verificación y control de estos y si s requieren obras de estabilización y contención, para informar a la entidad contratante.
- Interventoría solicita cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la entrega de la documentación requerida para el seguimiento al plan de inversión del anticipo, informes en las fechas pactadas con soportes y demás documentación para seguimiento y control de obra.
- Se ha solicitado la entrega de la caracterización de materiales a usar en obra, así como realizar y entregar los resultados de todos los ensayos requeridos en los anexos técnicos, así como en la normatividad vigente.



Elaboró: **ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Aprobó y Revisó: **ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ**
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 1 de febrero de 2026	**HASTA EL**	sábado, 28 de febrero de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Construcción de filtro de drenaje.



Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Construcción de filtro de drenaje.



Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 1 de febrero de 2026	**HASTA EL**	sábado, 28 de febrero de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Excavaciones mecánicas para construcción de filtro de drenaje.



Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Compactación de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Realización de comité de obra #12.



Compactación de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 1 de febrero de 2026	**HASTA EL**	sábado, 28 de febrero de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Construcción de filtro de drenaje.



Construcción de filtro de drenaje.



Conformación de subrasante del proyecto, compactación de material granular.



Excavación mecánica para construcción de filtro de drenaje.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO CONTROL DE TIEMPO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	ESTADO DEL TIEMPO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2026 Y EL 28/02/2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	MES FEBRERO																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
MAÑANA		S	S	S	N	S	S		S	N	S	S	S	S		N	N	N	N	N	S		N	S	S	S	S	S			
TARDE		S	S	S	N	S	S		S	S	S	S	S	S		LL	LL	N	N	N	S		N	S	S	S	S	S			Los días dominicales y festivos no se laboran.

CONVENCIONES					
Lloviznas	LL		Soleado - Lloviznas	SZ	
Seco - Nublado	SN		Nublado - lloviznas	NL	
Nublado	N		Despejado	D	
Seco	S				

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:	El estado del tiempo es bueno, no afecta en consideración el desarrollo de las actividades programadas en las jornadas donde se presenta lluvias.

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO DATOS DE PROYECTO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO EL INTERVENTOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA	CONSORCIO SISA 25
NIT.:	901.969.390-5
REP. LEGAL	JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
C.C.	6.775.637 de Tunja
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
C.C.	7.172.271 de Tunja
SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE	ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
DEPENDENCIA	TIERRASUA S.A.S.
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	miércoles, 30 de julio de 2025
FECHA DE INICIO:	martes, 19 de agosto de 2025
FECHA PROYECTADA FINAL INICIAL:	jueves, 18 de junio de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	miércoles, 31 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 1:	martes, 13 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 2 de julio de 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	N/A

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra / Consultoría / Diseño	X			
2	Pólizas de contrato (revisar según contrato)	X			Se tiene actualización de acuerdo a suscripción de acta de reinicio 1.
3	Aprobación de pólizas del contrato	X			Se tiene actualización de acuerdo a suscripción de acta de reinicio 1.
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificación de obligaciones contractuales (listado)	X			
6	Copia de la propuesta del contratista	X			No se ha entregado la totalidad por parte del contratista.
7	Programación de Obra	X			Se solicita el cumplimiento de la programación de obra presentada por el contratista de acuerdo al plazo vigente.
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			Se solicita el cumplimiento del profesional de acuerdo a dedicación según oferta.
9	Copia de equipos propuestos	X			Se solicita cumplimiento del equipo propuesto de acuerdo a oferta presentada.
10	Acta de suspensión (es)	X			Se suscribe acta de suspensión 1 el día 31 de diciembre de 2025.
11	Acta de Reinicio (s)			X	Se suscribe acta de reinicio 1 el día 13 de enero de 2026.
12	Ajuste de programación			X	Se tiene actualización de acuerdo a suscripción de acta de reinicio 1 y ajustada de acuerdo a solicitud de contratista.

observaciones adicionales: Dentro de las actividades, se solicita el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones impartidas por interventoría.

SUPERVISOR: ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

FORMATO CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE MAQUINARIA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2026 Y EL 28/02/2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	FEBRERO																														OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
MAQUINARIA																																	
ANDAMIOS (multidireccional, multifuncional con certificado de conformidad de las normas NTC1641, NTC16442, NTC1735)																																N/A	
																																N/A	
RETROEXCAVADORA DE ORUGA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				En buen estado.	
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				En buen estado.	
VOLQUETA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				En buen estado.	
MOTONIVELADORA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				En buen estado.	
MEZCLADORA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				En buen estado.	
ALLANADORA DE CONCRETO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				N/A	
PLANCHA VIBRADORA TIPO RANA O CANGURO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				N/A	
CARRO TANQUE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				N/A	
ESTACION TOTAL		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				En buen estado.	
VIBRO COMPACTADOR		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				N/A	
MAQUINARIA CONTRATISTA	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**180**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:	1.La interventoría recuerda que el equipo que se apruebe deberá permanecer en obra durante todo el periodo de ejecución del proyecto, de acuerdo a las condiciones adquiridas por el contratista. 2. La interventoría solicita la entrega de certificados de calibración de los equipos usados en obra.

JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: domingo, 1 de febrero de 2026 Y EL: sábado, 28 de febrero de 2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | | MES | ENERO | | | | | | | |

FORMATO CONTROL DE PERSONAL BITÁCORA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**CONTROL DE PERSONAL BITÁCORA** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	**INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2026 Y EL 28/02/2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	FEBRERO																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
CARGO																																
DIRECTOR DE OBRA		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
SISO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
ESPECIALISTA AMBIENTAL		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
ESPECIALISTA PAVIMENTOS		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
TOPÓGRAFO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				
CADENERO		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
MAESTRO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				
AYUDANTE		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7				
OPERADOR DE MAQUINARIA		3	3	3	2	2	2		2	2	2	2	2	2		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3				
CONTROLADORES DE TRANSITO		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**17**	**17**	**17**	**16**	**16**	**16**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**0**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **399**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

1. La interventoría ha requerido la presencia de los profesionales propuestos por el contratista de obra así mismo se solicita la presencia de personal en obra.

2. Se recuerda que todo el personal, operativo y administrativo deberá portar y usar los EPP's (elementos de protección personal), de acuerdo a las actividades que ejecuten, y del cual el contratista de obra, debe entregar y documentar dicha entrega a cada trabajador.

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO EL SUPERVISOR SOLICITE

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 1 de febrero de 2026	**HASTA EL**	sábado, 28 de febrero de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		



No.	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	lunes, 2 de febrero de 2026	CORREO		X		INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025
2	lunes, 2 de febrero de 2026	CORREO	X		X	INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025
3	lunes, 2 de febrero de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA
4	jueves, 5 de febrero de 2026	CORREO	X			CITACIÓN A COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #11
5	lunes, 9 de febrero de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA
6	miércoles, 11 de febrero de 2026	CORREO	X			INFORME MENSUAL 6 DE INTERVENTORÍA
7	miércoles, 11 de febrero de 2026	CORREO	X		X	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA
8	miércoles, 11 de febrero de 2026	CORREO		X	X	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA
9	jueves, 12 de febrero de 2026	CORREO	X			SOLICITUD CERTIFICADO DE EGRESOS Y RETENCIONES
10	viernes, 13 de febrero de 2026	CORREO	X		X	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA
11	lunes, 16 de febrero de 2026	CORREO		X	X	INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026
12	lunes, 16 de febrero de 2026	CORREO	X		X	INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026
13	lunes, 16 de febrero de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA
14	lunes, 16 de febrero de 2026	CORREO	X			ACTA DE COMITÉ #11
15	martes, 17 de febrero de 2026	CORREO	X			OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN DE OBRA.
16	martes, 17 de febrero de 2026	CORREO	X			CITACIÓN A COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #12
17	miércoles, 18 de febrero de 2026	CORREO		X	X	DOCUMENTACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA.
18	sábado, 21 de febrero de 2026	CORREO		X	X	REMISIÓN DOCUMENTOS MODIFICATORIO
19	lunes, 23 de febrero de 2026	CORREO	X		X	DOCUMENTACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA.
20	lunes, 23 de febrero de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA
21	martes, 24 de febrero de 2026	CORREO	X			AJUSTE DE PÓLIZAS ACTA DE REINICIO #1 INTERVENTORÍA
22	miércoles, 25 de febrero de 2026	CORREO		X	X	ORDEN DE OPERACIÓN 7
23	jueves, 26 de febrero de 2026	CORREO	X		X	ORDEN DE OPERACIÓN 7

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

24	jueves, 26 de febrero de 2026	CORREO	X			BALANCE DE OBRA PARA REVISIÓN

observaciones adicionales:

 SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

FORMATO CONTROL DE COMITÉS

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE COMITÉS	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 1 de febrero de 2026	**HASTA EL**	sábado, 28 de febrero de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

No.	FECHA	REFERENCIA	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS		COMPROMISOS	
1	6/02/2026	Técnico, administrativo, financiero y contable.	Seguimiento y control de obra.	1	Informe de la obra y recomendaciones de las partes.	1	Entrega informe mensual enero con soportes.
				2	Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.	2	Entrega de materiales granulares (caracterización)
				3	Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra.	3	Balance de obra con soportes.
				4	Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.	4	Entrega de justificación para cambio de fuente de materiales.
				5	Seguimiento y control al SGSST, informe de contratista de obra a las acciones adelantadas durante la ejecución de obra.	5	Visita a cantera "TRITURADOS VALLE DE TENZA"
				6	Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.		
				7	Solicitudes de contratista de obra.		
				8	Solicitudes de la entidad.		
				9	Recomendaciones y sugerencias de interventoría.		
				10	Otros y varios.		
				11	Compromisos.		
2	19/02/2026	Técnico, administrativo, financiero y contable.	Seguimiento y control de obra.	1	Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.	1	Entrega de balance de obra con soportes.
				2	Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.	2	Entrega de justificación para cambio de fuente de materiales.
				3	Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.	3	Entrega de resultados de concretos fundidos en obra.
				4	Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.		
				5	Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.		
				6	Solicitudes de contratista de obra.		
				7	Solicitudes de la entidad.		
				8	Recomendaciones y sugerencias de interventoría.		
				9	Otros y varios.		
				10	Compromisos.		

Observaciones adicionales: Se solicita cumplimiento de los compromisos pactados.

SUPERVISOR: ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

FORMATO CONTROL DE MUESTRAS DE CONCRETO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE MEZCLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
FECHA INICIAL	1/02/2026 **HASTA EL** 28/02/2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	MIXER	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	EDAD CILINDRO
1	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1220	8/10/2025	5107	35
2	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1221	8/10/2025	4256	35
3	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1222	14/10/2025	5970	29
4	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1223	14/10/2025	6033	29
5	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1224	23/10/2025	5212	20
6	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1225	23/10/2025	5541	20
7	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1226	24/10/2025	5232	19
8	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1227	24/10/2025	5265	19
9	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1228	28/10/2025	5150	15
10	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1229	28/10/2025	5040	15
11	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1230	29/10/2025	5741	14
12	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1231	29/10/2025	5191	14
13	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1232	30/10/2025	4228	13
14	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1233	30/10/2025	5552	13
15	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	12/11/2025	En estudio	
16	Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	19/11/2025	En estudio	
17	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	20/11/2025	En estudio	
18	Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	26/11/2025	En estudio	
19	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	28/11/2025	En estudio	
20	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	2/12/2025	En estudio	
21	Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	3/12/2025	En estudio	
22	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	5/12/2025	En estudio	
23	Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	10/12/2025	En estudio	
24	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	13/12/2025	En estudio	
25	Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	16/12/2025	En estudio	
26	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	18/12/2025	En estudio	

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE MEZCLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
FECHA INICIAL	1/02/2026 **HASTA EL** 28/02/2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	MIXER	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	EDAD CILINDRO
27	Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	N/A	20/12/2025	En estudio	

SUPERVISOR: ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

INFORME MENSUAL FORMATO ENTIDAD

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	7			FECHA:	3	de	MARZO	de	2026		
PERIODO: DEL	1	de	FEBRERO	de	2026	AL	28	de	FEBRERO	de	2026

CONTRATO No:	**IPO 001**	DE	2025	RECURSOS:	REGALÍAS

OBJETO:

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

ÚMBITA - BOYACÁ

Registro BPIN proyecto:	**2024004150432**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SISA 25	**JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	N/A		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

VALOR INICIAL:	$ 5,260,771,954.77	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 5,260,771,954.77

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (Según prorrogas y suspensiones)	18	de	JUNIO	de	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	2	de	JULIO	de	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**59.21%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**23.51%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**15.01%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	94219	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							14	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	8	2025	1	1	2027	$ 526,077,196.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	19	8	2025	2	11	2026	$ 2,104,308,782.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	8	2025	2	7	2029	$ 526,077,196.00

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19	8	2025	2	7	2031	$ 1,052,154,391.00

No PÓLIZA	27100	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							14	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30	5	2025	2	7	2026	$ 569,400,000.00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	
Descripción: Se presentan algunas lluvias, sin embargo no afectan con la ejecución de las actividades programadas.							

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio de obra e interventoría.	19	8	2025
Acta de socialización del proyecto.	19	8	2025
Acta de suspensión 1 de obra e interventoría.	31	12	2025
Acta de reinicio 1 de obra e interventoría.	13	1	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	K9+150 - K9+160
EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	K7+660 - K9+160
CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	Disposición de material de excavaciones.
OBRAS DE DRENAJE	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	Alcantarillas.
EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	Alcantarillas.
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	Alcantarillas.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Alcantarillas.
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Alcantarillas.
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Alcantarillas.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Alcantarillas.
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Alcantarillas.
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Filtros.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	Filtros.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Rellenos y mejoramientos de suelo de rasante.
PAVIMENTO FLEXIBLE	
PEDRAPLÉN COMPACTO	Mejoramiento de suelo de rasante.

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA
¡Conectamos región!

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Solicitudes de entrega de información y documentación, programación y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Correo electrónico y oficios
Se realizan solicitudes a la entidad de entrega de información relevante del proyecto.	Correo electrónico y oficios
Se recomienda asistencia y cumplimiento de comités técnicos.	Correo electrónico y oficios
Se solicita la entrega de informes mensuales al contratista de obra.	Comités, correos y oficios
Solicitud de entrega de revisión de diseños y conceptos técnicos solicitados.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista.	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Estación total topográfica.	Localización y replanteo.	100%	En buen estado.
Retroexcavadora de oruga.	Excavaciones y cortes.	60%	En buen estado.
Volqueta sencilla.	Retiro de material de excavaciones.	80%	En buen estado.
Motoniveladora	Ajuste de cunetas y vía.	20%	En buen estado.
Excavadora sobre llantas.	Excavaciones y cortes.	40%	En buen estado.
Vibro compactador	Rellenos.	40%	En buen estado.
Mezcladora	Fundidas de concretos.	25%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Estacas de madera	Contratista de obra.	Compra directa.
Herramienta menor.	Contratista de obra.	Compra directa.
Tubería en concreto.	Contratista de obra.	Fabricado in situ.
Grava para filtro	Contratista de obra.	Compra directa.
Tubería para filtro de 4"	Contratista de obra.	Compra directa.
Geotextil NT 2000	Contratista de obra.	Compra directa.
Cemento	Contratista de obra.	Compra directa.
Grava	Contratista de obra.	Compra directa.
Arena de peña	Contratista de obra.	Compra directa.
Afirmado	Contratista de obra.	Compra directa.
Pedraplén	Contratista de obra.	Compra directa.
Aceros	Contratista de obra.	Compra directa.

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Cinta métrica.	Elaboración de informes.	30%	Interventoría.
Computador.	Elaboración de informes.	100%	Interventoría.
Elementos de oficina.	Verificación de dimensiones.	50%	Interventoría.
Estación total topográfica y RTK.	Verificación de topografía.	40%	Interventoría.

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	14	10	2025	$ 2,104,308,781.91
N/A				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 2,104,308,781.91**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Acta parcial 1	24	12	2025	$ 122,866,672.22
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 122,866,672.22**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
2/02/2026	INTERVENTORÍA	INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025	SÍ
2/02/2026	SUPERVISIÓN	INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025	SÍ - RESPUESTA
2/02/2026	SUPERVISIÓN	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA	NO
5/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	CITACION A COMITE TECNICO DE OBRA #11	NO
9/02/2026	SUPERVISIÓN	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA	NO
11/02/2026	SUPERVISIÓN	INFORME MENSUAL 6 DE INTERVENTORÍA	NO
11/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	SÍ
11/02/2026	INTERVENTORÍA	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	SÍ - RESPUESTA
12/02/2026	SUPERVISIÓN	SOLICITUD CERTIFICADO DE EGRESOS Y RETENCIONES	NO
13/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	SÍ - RESPUESTA
16/02/2026	INTERVENTORÍA	INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026	SÍ
16/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026	SÍ - RESPUESTA
16/02/2026	SUPERVISIÓN	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA	NO
16/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	ACTA DE COMITÉ #11	NO
17/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN DE OBRA.	NO
17/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	CITACION A COMITE TECNICO DE OBRA #12	NO
18/02/2026	INTERVENTORÍA	DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE OBRA.	SÍ
21/02/2026	INTERVENTORÍA	REMISION DOCUMENTOS MODIFICATORIO	SÍ
23/02/2026	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE OBRA.	SÍ - RESPUESTA
23/02/2026	SUPERVISIÓN	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA	NO
24/02/2026	SUPERVISIÓN	AJUSTE DE POLIZAS ACTA DE REINICIO #1 INTERVENTORÍA	NO
25/02/2026	INTERVENTORÍA	ORDEN DE OPERACIÓN 7	SÍ
26/02/2026	CONTRATISTA	ORDEN DE OPERACIÓN 7	SÍ - RESPUESTA

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

26/02/2026	SUPERVISIÓN	BALANCE DE OBRA PARA REVISIÓN	NO

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
YOFRE LEÓNIDAS LÓPEZ MERCHÁN	6773517	X	X	X	19	8	2025	31	1	2026
NÉSTOR ANDRÉS MEDINA ROA	1049618290	X	X	X	19	8	2025	31	1	2026
JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ	6775637	X	X	X	19	8	2025	31	1	2026
ELIZABETH MAHECHA VALERO	52797064	X	X	X	19	8	2025	31	1	2026
HUGO MAURICIO SUAREZ RINCÓN	1049621129	X	X	X	19	8	2025	31	1	2026
DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO	1054708889	X	X	X	19	8	2025	31	1	2026
JULIÁN ANDRÉS CANTE TORRES	1002565586	X	X	X	13	1	2026	18	1	2026
CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ VELOSA	1000974330	X	X	X	15	1	2026	31	1	2026
JHON ALEXANDER FONSECA RODRÍGUEZ	1049641192	X	X	X	13	1	2026	31	1	2026
ARTURO DIAZ MARTÍNEZ	1056612043	X	X	X	13	1	2026	31	1	2026
HÉCTOR JULIO DIAZ SÁNCHEZ	1056612762	X	X	X	26	1	2026	31	1	2026
JUAN CARLOS GÓMEZ SIERRA	79873842	X	X	X	18	1	2026	31	1	2026
LUZ ADRIANA JUNCO	1002682724	X	X	X	13	1	2026	31	1	2026
HOLMANT MORENO MENDOZA	74329975	X	X	X	16	1	2026	31	1	2026
MILTON AUGUSTO PEDREROS VELOSA	1056612181	X	X	X	21	1	2026	31	1	2026
FLOR DARY PLAZAS DIAZ	1056612562	X	X	X	13	1	2026	31	1	2026
JOSÉ AGUSTÍN RAMOS MARTÍNEZ	1056614050	X	X	X	13	1	2026	31	1	2026
JEIDERTH DAMIÁN SEPÚLVEDA MORENO	1007859149	X	X	X	17	10	2026	14	1	2026
NELSON LIBARDO SOLER CASTELBLANCO	1056612577	X	X	X	26	10	2026	31	1	2026
SALVADOR VALERO SÁNCHEZ	4291064	X	X	X	20	10	2026	31	1	2026

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	YOFRE LEÓNIDAS LÓPEZ MERCHÁN	6773517
RESIDENTE DE OBRA	NÉSTOR ANDRÉS MEDINA ROA	1049618290
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ	6775637
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA AMBIENTAL	ELIZABETH MAHECHA VALERO	52797064
ESPECIALISTA EN HSEQ	HUGO MAURICIO SUAREZ RINCÓN	1049621129

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	7172271
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	1054254612
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD	MARÍA CLARA CÁCERES ESTUPIÑÁN	39724228

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO	CLAUDIA ROCÍO SUAREZ CASTILLO	52351443
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	1049622654
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	HERNANDO ANDRÉS ÁLVAREZ ARÉVALO	7181652

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Solicitud y verificación de manejo de escombros y licencias de explotación de materiales	En toda la obra
Seguimiento plan de calidad.	En toda la obra
Seguimiento SGSST.	En toda la obra
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Solicitud y verificación de manejo de escombros y licencias de explotación de materiales	En toda la obra
Solicitud implementación PMA	En toda la obra
Se solicitó la instalación de señalización adecuada acorde con las actividades ejecutas en campo	En toda la obra
Se solicitó afiliación de todo el personal que ingreso, tanto al sistema de salud, pensión y riesgos laborales. Y entrega de los respectivos exámenes de ingreso.	En toda la obra
Se solicitó la implementación del SG-SST, con los seguimientos al PMA y entrega de las evidencias realizadas.	En toda la obra
Solicitud de entrega de EPP's y verificación del uso de estos, control de seguridad social integral y manejo de materiales	En toda la obra
La interventoría ha requerido al contratista con el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial, por medio de oficios, comités técnicos y bitácora de obra, al igual, se han revisado los informes del PAGA y se han solicitado ajuste y aclaraciones al mismo.	En toda la obra

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	12	11	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	19	11	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	20	11	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	26	11	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	28	11	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	2	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	3	12	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	5	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	10	12	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	13	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	16	12	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	18	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	20	12	2025	En estudio.
Concreto para tuberías de alcantarillas.	28	1	2025	En estudio.

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	12	11	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	19	11	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	20	11	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	26	11	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	28	11	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	2	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	3	12	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	5	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	10	12	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	13	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	16	12	2025	En estudio.
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	18	12	2025	En estudio.
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	20	12	2025	En estudio.
Concreto para tuberías de alcantarillas.	28	1	2025	En estudio.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CANTERA SAN SEBASTIÁN		110	Material según diseño de mezcla.
CANTERA LA LIBERTAD		130	Material según diseño de mezcla.

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra #1	26	8	2025	Realizado en TIERRASUA S.A.S.
Acta de Comité de Obra #2	5	9	2025	Realizado en TIERRASUA S.A.S.
Acta de Comité de Obra #3	19	9	2025	Realizado en TIERRASUA S.A.S.
Acta de Comité de Obra #4	3	10	2025	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra Extraordinario	14	10	2025	Seguimiento topografía.
Acta de Comité de Obra #5	16	10	2025	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra Extraordinario	22	10	2025	Visita de consultores.
Acta de Comité de Obra #6	30	10	2025	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra #7	13	11	2025	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra #8	27	11	2025	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra #9	11	12	2025	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra #10	20	1	2026	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra #11	6	2	2026	Seguimiento y control de obra.
Acta de Comité de Obra #12	19	2	2026	Seguimiento y control de obra.

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0	19	8	2025	19	8	2025	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 1	19	8	2025	31	8	2025	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 2	1	9	2025	30	9	2025	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 3	1	10	2025	31	10	2025	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 4	1	11	2025	30	11	2025	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 5	1	12	2025	30	12	2025	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 6	13	1	2026	31	1	2026	Entregado a supervisor.
Informe de Interventoría No. 7	1	2	2026	28	2	2026	Presente informe.

OBSERVACIONES:
La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.
La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento al SGSST. Se requirió de la presencia del profesional SISOMA con una dedicación del 100%. Se solicitó que se dotara al personal con overoles y elementos de protección, de acuerdo a las actividades ejecutadas.
La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también la asistencia de los profesionales de acuerdo a dedicación establecida.
Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de seguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.
La interventoría ha reiterado y enviado oficios, correos al contratista de obra, indicando la solicitud de documentación requerida para la ejecución de las obras.
Se realizó la verificación diaria en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional del personal de la obra, que garantizaba que cada uno de los trabajadores, contara con los todos elementos de seguridad industrial y con las herramientas y espacios de trabajo adecuados para el desarrollo de las labores cotidianas.
Se solicita cumplimiento de la programación presentada, en cuanto a los porcentajes programados, se recomienda mantener con anterioridad los insumos y equipos, y garantizar el personal necesario de acuerdo a las actividades programadas.
Se solicita mantener la totalidad de los planos de construcción, firmados por las partes, en campo para su consulta y desarrollo, así mismo, debe estar toda la documentación técnica, programación, especificaciones de construcción, y de igual manera la carpeta de plan de calidad de obra y desarrollo del SGSST.
Se solicita realizar y dejar la evidencia de los trabajos del SGSST según la normativa nacional, y mantener en campo además los elementos tanto de protección personal EPP's, requerir el uso de acuerdo a las actividades desarrolladas y los equipos como botiquín de obra, camilla, y demás elementos que se registran en los informes SGSST.
Se solicita la entrega de dotación al personal, entrega de exámenes de ingreso laboral, y demás documentación soporte del seguimiento, control e implementación del SGSST.
Interventoría ha solicitado la entrega de la información dentro de los plazos establecidos, para la realización de los informes, y demás soportes que son contenido mínimo de estos.
Se ha solicitado la entrega de la caracterización de materiales a usar en obra, así como realizar y entregar los resultados de todos los ensayos requeridos en los anexos técnicos, así como en la normatividad vigente.
Interventoría solicita cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la entrega de la documentación requerida para el seguimiento al plan de inversión del anticipo, informes en las fechas pactadas con soportes y demás documentación para seguimiento y control de obra.
Se ha recomendado mantener la señalización nocturna y diurna en los puntos de intervención del proyecto, con el fin de mantener informado al usuario de los trabajos en la vía y dar cumplimiento a lo establecido en el PMT.


INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACION	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	47
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	6-8, 43-44
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	47
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	69-93
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	129-147
Amortización del anticipo	NO	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	NO	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	NO	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	NO	
Memorias y planos de diseño aprobados	NO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	56-68
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	181
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	NO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	NO	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	NO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	20-23
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	94-147

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: JAIME HUMBERTO PINZÓN

CERTIFICACIÓN DE AVANCE MENSUAL

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Fecha:	2/03/2026

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2024004150432 ejecutado mediante contrato de obra No. IPO 001 - 2025, CERTIFICA la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo 01/02/2026 al 28/02/2026:

						CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	**CAP. 1: PRELIMINARES**	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL	M7 - 01/02/2026 al 28/02/2026	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	$ 328,465.00	1.50	0.00%	$ 492,697.50	0.00	$ -
1.2	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	$ 12,244.00	10089.29	0.00%	$ 123,533,266.76	4104.40	$ 50,254,273.60
1.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	$ 84,648.00	159.86	0.00%	$ 13,531,829.28	159.86	$ 13,531,829.28
1.4	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO libre 5 Km.)	$ 264,630.00	54.96	0.00%	$ 14,544,064.80	0.00	$ -
1.5	CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 3,600.00	11376.42	0.00%	$ 40,955,112.00	4339.21	$ 15,621,156.00
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 193,056,970.34**		**$ 79,407,258.88**
2	**CAP. 2: OBRAS DE DRENAJE**						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	$ 51,935.00	566.30	0.00%	$ 29,410,790.50	0.00	$ -
2.2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	$ 16,419.00	665.87	0.00%	$ 10,932,919.53	0.00	$ -
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	$ 90,641.00	211.97	0.00%	$ 19,213,172.77	0.00	$ -
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 516,340.00	42.04	12.00%	$ 24,311,765.63	0.00	$ -
2.5	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 961,644.00	52.05	12.00%	$ 56,059,998.62	-10.93	-$ 11,772,061.19
2.6	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1,004,305.00	68.97	12.00%	$ 77,578,945.75	-2.94	-$ 3,306,975.50
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	$ 700,220.00	88.00	12.00%	$ 69,013,683.20	0.00	$ -
2.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,002.00	16047.81	12.00%	$ 125,850,777.49	2214.55	$ 17,367,032.59
2.9	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 696,586.00	519.76	12.00%	$ 405,504,444.08	0.00	$ -
2.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	$ 7,389.00	7548.11	12.00%	$ 62,465,742.96	0.00	$ -
2.11	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	$ 230,536.00	556.80	12.00%	$ 143,765,938.18	327.56	$ 84,576,096.82
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	$ 29,162.00	1160.00	12.00%	$ 37,887,270.40	787.00	$ 25,704,553.28
2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 2,311.00	8775.56	0.00%	$ 20,280,319.16	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 1,082,275,768.27**		**$ 112,568,646.00**
3	**CAP. 3: PAVIMENTO FLEXIBLE**						
3.1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	$ 1,249,671.00	1.50	0.00%	$ 1,874,506.50	0.00	$ -
3.2	PEDRAPLEN COMPACTO	$ 119,390.00	3908.25	12.00%	$ 522,598,683.60	452.92	$ 60,563,013.06
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 8,393.00	10150.00	12.00%	$ 95,411,624.00	0.00	$ -
3.4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	$ 102,474.00	2695.79	0.00%	$ 276,248,384.46	0.00	$ -
3.5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	$ 120,635.00	1593.00	0.00%	$ 192,171,555.00	0.00	$ -
3.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	$ 4,374.00	9000.00	12.00%	$ 44,089,920.00	0.00	$ -
3.7	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS	$ 943,454.00	810.00	0.00%	$ 764,197,740.00	0.00	$ -
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULARES DESPUES DE 5KM	$ 2,311.00	184174.11	0.00%	$ 425,626,368.21	0.00	$ -
3.9	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM	$ 2,978.00	64071.00	0.00%	$ 190,803,438.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 2,513,022,219.77**		**$ 60,563,013.06**
4	**CAP. 4: SEÑALIZACIÓN VIAL**						
4.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS	$ 3,185.00	4500.00	12.00%	$ 16,052,400.00	0.00	$ -
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFELECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	$ 10,867.00	575.00	12.00%	$ 6,998,348.00	0.00	$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTALES DE TAMAÑO 40 X 50 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	$ 92,709.00	180.00	12.00%	$ 18,690,134.40	0.00	$ -
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	$ 394,494.00	18.00	12.00%	$ 7,952,999.04	0.00	$ -
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	$ 250,000.00	475.00	12.00%	$ 133,000,000.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 182,693,881.44**		**$ -**
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 3,971,048,839.82		$ 252,538,917.94
	TOTAL COSTOS INCLUYE (AIU)				$ 5,162,363,491.77		$ 328,300,593.32

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	**Fecha:**	**2/03/2026**

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2024004150432 ejecutado mediante contrato de obra No. IPO 001 - 2025, CERTIFICA la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo 01/02/2026 al 28/02/2026:

	OTROS							
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 45,843,796.00	9.65%	$	4,423,524.16
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 40,288,767.00	9.65%	$	3,887,512.60
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 12,275,900.00	0.00%	$	-
	TOTAL OBRA				**$ 5,260,771,954.77**		**$**	**336,611,630.08**
	INTERVENTORIA							
	INTERVENTORIA				$ 368,302,174.03	10.00%	**$**	**36,830,217.40**
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M7 - 01/02/2026 al 28/02/2026				**$ 5,629,074,128.80**		**$**	**373,441,847.48**

NOTA: Se ajustan cantidades de acuerdo a las actividades ejecutadas por contratista de obra, dado que anteriormente por errores de digitación se había introducido valores superiores en los ítems 2.5 y 2.6, los cuales se ajustan en la presente certificación, sin embargo se aclara que esto no afecta el porcentaje de avance reportado del 23.51% a corte del 28 de febrero de 2026, comunicado en el informe semanal 27.

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
INTERVENTOR
Contrato No IPVO 017-2025

Vo.Bo ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Fecha:	2/03/2026

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2024004150432 ejecutado mediante contrato de obra No. IPO 001 - 2025, CERTIFICA la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo 01/02/2026 al 28/02/2026:

						PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	CAP. 1: PRELIMINARES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL	M7 - 01/02/2026 al 28/02/2026	
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 193,056,970.34	41.13%	$ 79,407,258.88
2	CAP. 2: OBRAS DE DRENAJE						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 1,082,275,768.27	10.40%	$ 112,568,646.00
3	CAP. 3: PAVIMENTO FLEXIBLE						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 2,513,022,219.77	2.41%	$ 60,563,013.06
4	CAP. 4: SEÑALIZACIÓN VIAL						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 182,693,881.44	0.00%	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 3,971,048,839.82		$ 252,538,917.94
	TOTAL COSTOS INCLUYE (AIU)				$ 5,162,363,491.77		$ 328,300,593.32
	OTROS						
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 45,843,796.00	9.65%	$ 4,423,524.16
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 40,288,767.00	9.65%	$ 3,887,512.60
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 12,275,900.00	0.00%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 5,260,771,954.77	6.40%	$ 336,611,630.08
	INTERVENTORIA						
	INTERVENTORIA				$ 368,302,174.03	10.00%	$ 36,830,217.40
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M7 - 01/02/2026 al 28/02/2026				$ 5,629,074,128.80	6.63%	$ 373,441,847.48

NOTA: Se ajustan cantidades de acuerdo a las actividades ejecutadas por contratista de obra, dado que anteriormente por errores de digitación se había introducido valores superiores en los ítems 2.5 y 2.6, los cuales se ajustan en la presente certificación, sin embargo se aclara que esto no afecta el porcentaje de avance reportado del 23.51% a corte del 28 de febrero de 2026, comunicado en el informe semanal 27.

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
INTERVENTOR
Contrato No IPVO 017-2025

Vo.Bo ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	06/02/2026	**COMITÉ N° :**	11
HORA DE INICIO:	10:30 am	**TERMINACIÓN:**	12:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	OFICINAS TIERRASUA SAS.	**OBJETO:**	Seguimiento y control de obra
CONTRATO OBRA #	IPO- 001-2025		
OBJETO CONTRATO OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S. NIT. 901.285.377-2		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SISA 25 NIT. 901.969.390-5 REP. L: JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ		
INTERVENTORÍA:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ C.C: 7. 172.271		
SUPERVISIÓN:	ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R. Director Tecnico / SUPERVISOR DESIGNADO		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

No se tienen observaciones, se aprueba por las partes

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	FECHA	CUMPLE (S/N/P)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Lista de chequeo de ajuste de Proyecto	22/01/26	P	Contratista de Obra	
Ajuste de Programación de obra y flujo de inversión	22/01/26	S	Contratista de Obra	
Balance de Obra para revisión	23/01/26	P	Contratista de Obra	
Oficio de comunicación de horarios laborales.	22/01/26	S	Contratista de Obra	
Caracterización de materiales laborales	23/01/26	P.	Contratista de Obra.	

3. AGENDA DEL DÍA

1) Informe de la obra y recomendaciones de las partes.
2) Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3) Verificación de la ejecución del proyecto en función del plazo vigente y de la programación de obra.
4) Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados
5) Seguimiento y control al SGSST, Informe de contratista de Obra
6) Verificación de balance de obra, se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.
7) Solicitudes contratista de obra
8) Solicitudes de la entidad.
9) Recomendaciones y Sugerencias de interventoría
10) Otros y varios

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÙMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	06/02/2026	COMITÉ N°:	11.

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1) Se da el saludo de bienvenida al desarrollo de comité de obra #11 de la ejecución del proyecto mejoramiento de la vía secundaria Umbita - Puente Sisa, contando con presencia de supervisión de la entidad contratante, contratista de obra, interventoría y consultor de estudios y diseños

De acuerdo a la solicitud de la anterior reunión realizada por la supervisión la interventoría realiza presentación usando herramientas gráficas para dar un pequeño resumen de las actuaciones, administrativas, financieras y técnicas, en donde se inicia referenciando la información de trazabilidad y de los actos generados, como actas de inicio, suspensiones y el reinicio, así como se indica que se tienen pólizas y actualización al plazo vigente y su aprobación por la supervisión de la entidad.

Se menciona de estado financiero se tiene otorgado un anticipo al contrato de obra del 40%, en obra se tiene un avance del 16,26% y un programado del 10% aproximado.

Se da a conocer las actividades ejecutadas en obra, en donde se tiene pedraplén instalado y conformado, la subrasante, así como la instalación de filtros y construcción de los mismos.

Se está cumpliendo el desarrollo e implementación del PMT y PAGA.

De acuerdo al balance de obra contratista menciona que no se tiene versión final dado que se estan finiquitando algunas detalles y se presenta una necesidad de adicional de aproximadamente el 10%.

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	06/02/2026	COMITÉ N°:	11

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

Interventoría comenta que se ha realizado seguimiento y control a los 5 puntos donde se vió algún movimientos en tubos debido a las actividades de obra, sin embargo es pertinente aclarar que 4 ya se encuentran estabilizados y el 5to y último todavia presenta actividad, aclarando que es en una zona donde se presenta manejo inadecuado de aguas por parte de los propietarios de los predios aledaños al sector.

Con lo anterior se mencionaron los aspectos más relevantes durante la ejecución del proyecto, por lo cual interventoría recomienda y solicita continuar con la implementación del PMT, PAGA y SGSST. Continuar con el cumplimiento de las especificaciones de diseños y estudios aprobados, cumplir con las fechas de entregas de informes, entrega de documentación de manejo de plan de inversión del anticipo y entrega de la certificación de los rendimientos financieros.

2) Interventoría solicita la entrega de documentos y compromisos pactados en los comités, así como de las diferentes solicitudes realizadas durante la ejecución del proyecto.

3) Como se informa en el punto 1, se está cumpliendo con la programación de obra entrega y plazo vigente según el acta de reinicio #, teniendo un tiempo transcurrido cercano al 50%, un avance ejecutado del 16,50% y un programado del 12%.

Interventoría recomienda mantener acopio de materiales y buen stock para las actividades programadas, dado que es importante y vital para el

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	06/02/2026	COMITÉ N°:	11

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

cumplimiento de la programación de obra, garantizar el material suficiente para acometer las actividades según la ejecución del proyecto.

4) Interventoría manifiesta que a la fecha se tiene ejecución en actividades de excavaciones de aguas, instalación y compactación de pedraplén y la instalación y construcción de filtros.

Se solicita la entrega de resultados de laboratorio de los concretos usados en obra, dar cumplimiento a la toma de pruebas y ensayos según especificaciones técnicas de estudios y diseños, así como de acuerdo a la normatividad vigente.

5) Interventoría solicita el cumplimiento del SGSST de acuerdo a normatividad vigente así como a especificaciones de diseño y contractuales. entrega de ATS, certificación de ARL de estándares mínimos y actualización del Plante trabajo anual correspondiente a 2026.

Así mismo se solicita entrega de certificados RESPEL, como entrega de soportes de los mantenimientos y demás procesos relacionados a la maquinaria en obra.

6) Se solicita la entrega del balance de acuerdo a las observaciones realizadas así como los soportes, ajustes a la topografía de acuerdo a las condiciones requeridas en obra, así como entrega de conceptos hidráulicos.

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	06/02/2026	COMITÉ N°:	11

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

7) Contratista de obra solicita la revisión oportuna y trámite del balance de obra para el ajuste del contrato.

8) No se presentan.

9) Interventoría manifiesta que adicional a las realizadas durante el desarrollo del comité de obra, se recomienda

Mejorar señalización y continuar con la implementación del PMT y continuar con señalización diurna y nocturna.

Entrega de informe mensual con soportes.

Continuar con implementación de PAGA y SSGST

10) N/A

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	06/02/2026	COMITÉ N°:	11 .

COMPROMISOS PACTADOS

Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
Entrega de informe mensual Enero con Soportes.	10/02/2026.	Contratista de obra.
Entrega de materiales granulares (caracterización)	10/02/2026	Contratista de obra.
Balance de obra con Soportes.	10/02/2026.	Contratista de obra
Entrega de justificación para cambio de fuente materiales	11/02/2026	Contratista de Obra
Visita a cantera "Trituradas valle de Tenza"	11/02/2026	Contratista de obra - Interventoría Supervisión.

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:	Por definir	LUGAR	Obra

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA
N/A.		

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
Maria clara cáceres	SST Interventoria	Jaime Pinzon Interventor	3134833	
Nestor Andres Medina	Residente de Obra	Consorcio SISA 25	3125620135	
Jaime Gómez R.	R/L Consorcio SISA 25	C. SISA 25	3134858032	
Rafael Camilo Suárez S.	Ing. Apoy. Superv.	Tierrosca S.A.S.	3212905565	
Juan Sebastian Gonzalez	Apoyo Supervisión	Tierrasca S.AS	3143299082	
Yilmar Medina A	Consultoria	Quirca Ingeniería	3142703251	
Jaime Pinzon A	Interventor	Jaime Pinzon Int	3143600982	
Dario Alejandro Alvarez	R. Interventoria	Jaime Pinzón Interventor	3227009141	

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	19/02/2026	**COMITÉ N° :**	12
HORA DE INICIO:	9:46 am	**TERMINACIÓN:**	12:20 am.
LUGAR DE REUNIÓN:	OBRA	**OBJETO:**	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
CONTRATO OBRA #	IPO- 001-2025		
OBJETO CONTRATO OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S. NIT. 901.285.377-2		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SISA 25 NIT. 901.969.390-5 REP. L: JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ		
INTERVENTORÍA:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ C.C: 7. 172.271		
SUPERVISIÓN:	ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R. Director Tecnico / SUPERVISOR DESIGNADO		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

No se tienen observaciones, se aprueba por las partes.

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	FECHA	CUMPLE (S/N/P)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Entrega de informe mensual de enero con soportes.	10/02/2026	S	Contratista de obra.	
Entrega de caracterización de materiales granulares.	10/02/2026	P	Contratista de obra.	
Balance de obra con soportes.	10/02/2026	P	Contratista de obra.	
Entrega de justificación para cambio de fuente de materiales.	11/02/2026	P	Contratista de obra.	
Visita a cantera "TRITURADOS VALLE DE TENZA"	11/02/2026	S	Contratista de obra.	

3. AGENDA DEL DÍA

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.	8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.	9. Otros y varios.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.	10. Compromisos.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.	
5. Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.	
6. Solicitudes de contratista de obra.	
7. Solicitudes de la entidad.	

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	19/02/2026	COMITÉ N° :	12

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1) Se da el saludo de bienvenida al desarrollo del comité de obra # 12 por parte de interventoría, contando con presencia de la supervisión de la entidad contratante, equipos de contratista de obra e interventoría.

Se inicia el recorrido de obra en el sentido Úmbita - Puente Sisa, observándose que ya se han adelantado labores de conformación de subrasante en este sentido y se tiene materializado labores de topografía para anchos de vía hasta aretas.

Interventoría nuevamente recomienda y solicita la entrega de resultados granulares de los materiales usados en obra, así como dar cumplimiento a los requeridos mediante especificaciones técnicas de diseño, como lo indicado por la normatividad vigente.

De igual manera se reitera la solicitud de mejorar los acabados de las alcantarillas construidas, como se ha mencionado en anteriores comités, dado que se debe garantizar la calidad de los acabados de la obra.

Se tiene de igual manera como observación y se reitera la necesidad de dar cumplimiento al PMT y PAGA, se recomienda y solicita la señalización de los puntos intervenidos, así como la nocturna, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía.

En cuanto al SGSST es pertinente reiterar el adecuado uso de EPPS, casco y guantes del personal, así como recomendar que el personal de maquinaria en el momento de descender del vehículo realice el porte del casco.

Así mismo se manifiesta que se observa a contratista realizar entrega de tapabocas para protección del material particulado el cual debe entregarse el

Scanned with CamScanner

FECHA PRESENTE ACTA	19/02/2026	COMITÉ N° :	12

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

respectivo formato de Entrega en los informes.

2) Interventoría recuerda la importancia de cumplir con los compromisos pactados en comités así como de la entrega oportuna de los documentos en las fechas establecidas.

Se reitera nuevamente la entrega de los resultados de concretos fundidos en obra así como de la caracterización de materiales granulares.

3) Se manifiesta y se comenta que a la fecha del presente comité de obra se tiene un tiempo transcurrido del 56,5%, un avance programado del 13% y un ejecutado del 19,5%

Se recomienda mantener el avance y rendimientos en positivo, garantizando el acopio del material requerido para las actividades de obra, así como de la programación vigente.

4) Interventoría solicita nuevamente la entrega de los concretos fundidos en obra sus respectivos resultados de laboratorio como se ha indicado en anteriores comités

Si bien se entregó en el informe mensual de enero la caracterización del material granular de afirmado, se solicita se entregue previamente para revisar la documentación y dar el respectivo seguimiento y control a la obra

Continuar con los encargos de acuerdo al anexo técnico y condiciones

Scanned with CamScanner

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

Contractuales, así como lo establecido por la normatividad vigente.

Tener en cuenta con las observaciones realizadas en el recorrido de obra, así como atender las sugerencias hechas durante la ejecución del proyecto.

Supervisión realiza las siguientes recomendaciones y solicitudes e indicaciones, donde no se aprueban mayores cantidades contractuales dado que no están autorizadas bajo ningún documento oficial.

Entregar los informes y respectivos soportes en las fechas establecidas. para dar cumplimiento al cargue de la documentación en sus plazos previstos.

5) Se han realizado avances en la consolidación de esta documentación sin embargo, se solicita como se ha mencionado en varias reuniones que se debe entregar la documentación completa, con sus soportes, memorias sin globales, sino detalladas para su respectiva aprobación

De igual manera cabe resaltar que el balance ya está bastante adelantado por lo cual se solicita la entrega a la mayor brevedad para dar continuidad a la revisión del documento.

Se solicita nuevamente a la entidad la lista de chequeo requerida para el ajuste modificatorio del proyecto.

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	19/02/2026	COMITÉ N° :	12

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

6) N/A.

7) Supervisión recuerda que no se autorizan ni se aprueban mayores cantidades sin previa revisión y viabilización del contrato y proyecto

Se solicita la presencia de los representantes legales en los comités de obra.

8) Aparte de las mencionadas en el desarrollo del comité de obra se tienen las siguientes recomendaciones

- → Entrega de informes en los plazos previstos con sus respectivos soportes
- → Entrega de resultados de concretos fundidos en obra
- → Mantener la señalización diurna y nocturna en los puntos intervenidos del proyecto
- → Continuar con la implementación del PMT y PAGA según condiciones y obligaciones contractuales
- → Entregar el balance de obra con sus respectivos soportes
- → Continuar con la implementación del 86857 así como la documentación de ATS, formatos de entrega de EPP's, preoperacionales y demás soportes.
- → Realizar entrega de certificados RESPEL.
- → Uso de los EPP's en todo momento durante la jornada laboral

9) N/A

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	19/02/2026	COMITÉ N° :	12

COMPROMISOS PACTADOS

Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
Entrega de balance de obra con soportes	24/02/2026	Contratista de obra
Entrega de justificación para cambio fuente de materiales	28/02/2026	Contratista de Obra
Entrega de resultados de concretos fundidos en obra	24/02/2026	Contratista de Obra

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN: 25/03/2026 9:30 am LUGAR OBRA.

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA
N/A		

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
Rafael Camilo Suárez S.	Apoyo Supervisión Tierrasua.	Tierrasua	3212905565	
María clara cáceres estupiñan	Lider SST	Jaime Pinzon Interventoria	3134833544	
Elizabeth Echeverry	Ambiental Consorcio SISA 25	CONSORCIO SISA 25	3202754077	
Jaime Gómez R.	R/L. C. SISA 25	C. SISA 25	3134958032	
Adriana Marcela Pedraza	Prof Apoyo.	Consorcio Sisa 25	3105836891	
Nestor Andres Medina Rey	Residente Obra	Consorcio Sisa 25	3125820135	
Diego Alexander Castiblanco	Topografo	consorcio sisa 205	3112568526	
Omar Daniel Mora Acosta	Sup. SST	C.SISA 25	3142965501	
David Mendivelso A	Residente Interventoría	JAIME PINZON INTERVENTOR	3227009441	

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Lunes, 2 de febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de ojos y filtros de drenaje.
Mejoramiento de suelo de cuneta, mediante ojeos, instalación y compactación de pedraplén
Construcción de filtros de drenaje. K8 + 050 a K8 + 130

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría.	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra.	1
e.	Operador de maquinaria.	3
f.	Cadenero de obra	2
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Ayudante de obra.	7
i.		
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta sencilla (1)	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga.	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre Llantas.		
e)	Motoniveladora.		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de postores
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado.

OBSERVACIONES:

Se recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.
Se solicita cumplimiento del personal de acuerdo a dedicación ofertada y establecida en condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Rodriguez
Residente de Obra

Rafael Camilo S.

127

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 3 de febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de cajeos y filtros de drenaje.
Mejoramiento de Suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de pedraplén
Construcción de Filtro de drenaje, K8+130 a K8+190

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Cadenero de obra	2
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de Tránsito	2
h.	Ayudantes de obra	7.
i.		
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta sencilla (1)	
b.	Herramienta menor	g) Vibrocompactador	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora sobre llantas		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:
Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana Soleado	
b.	Tarde Soleado	

OBSERVACIONES:
Se solicita mejorar orden y aseo en el trayecto del tramo intervenido.
Se solicita dar cumplimiento al SGSST de acuerdo a condiciones contractuales y normatividad vigente.

FIRMAS:

Interventoría.

Residente de Obra

Rafael Cuadro S.

128

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 4 de febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de cajeos y filtros de drenaje.
Mejoramiento de suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de pedraplén.
Construcción de Filtro de drenaje K8+190 a K8+230.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoria.	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Cuadrero de obra	2
f.	Operador de maquinaria.	3
g.	Controlador de transito	2
h.	Ayudante de obra	9.
i.		
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma.	f) Volqueta Sencilla (1)	
b.	Herramienta menor	g) Vibrocompactador	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre llantas		
e)	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:

Barricadas de listones
Cintas pare y siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Se solicita mejorar la señalización diurna y nocturna en los tramos intervenidos.
Se solicita dar cumplimiento a PMT y PAGA de acuerdo a condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoria

Nesto. A Medina R.
Residente de Obra

129

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 5 de febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de cajeos y filtros.

Mejoramiento de suelo mediante cajeos, instalación y compactación de pedraplén.

Construcción de filtro de drenaje K8+230 a K8+300.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Cadenero de obra	2
f.	Operador de maquinarias	2
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Ayudantes de Obra	7.
i.		
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Vibro compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Mezcladora	
d	Excavadora Sobre llantas.		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana Nublado	
b.	Tarde Nublado	

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones de acuerdo a estudios y diseños

Se Solicita entrega de informes en los plazos pactados con sus soportes.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor Medina R.
Residente de obra

130

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 6 de febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de cajeos y filtros.

Mejoramiento de suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de Pedraplén

Construcción de filtro de drenaje K8 + 300 a K8 + 330.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Cadenero de obra	2
f.	Operador de maquinaria	2
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Ayudantes de obra	7.
i.		
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Vibro compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre Llantas.		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Se solicita entrega de resultados de laboratorio de concretos fundidos en obra, así como de materiales granulares a usar en actividades

Se solicita cumplimiento del SGSST de acuerdo a especificaciones establecidas

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Acevedo R
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 7 de febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de cajeos y filtros

Mejoramiento de suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de Pedraplén.

Construcción de filtro de drenaje K8+330 a K8+360.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Inspector de obra	1
e.	Cadenero de obra	2
f.	Operador de maquinaria	2
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Ayudante de obra	7.
i.		
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	f) Vibrocompactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre Llantas		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de tambores Paletas Pare y Siga Delineadores tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Se solicita mejorar la señalización diurna y nocturna en los espacios intervenidos.

Interventoría recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.

FIRMAS:

Nestor A Martinez R.
Residente de Obra

Interventoría

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Lunes, 9 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavaciones mecánicas para construcción de cajeos y filtros.

Mejoramiento de Suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de Pedraplén

Construcción de filtro de dique K7+950 a K8+100

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Inspector de obra	1
e.	Topografo de Obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de motoniveladora	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudantes de obra	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Vibro compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta sencilla	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Mezcladora	
d	Excavadora sobre llanteS.		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita el cumplimiento del PAGA y PMT de acuerdo a condiciones contractuales.

Interventoría solicita presencia del personal de acuerdo a dedicación ofertada

FIRMAS:

Interventoría

Nesta Medina L.
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 10 de Febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de cajeos y filtros.

Mejoramiento de suelo de rasante, mediante cajeo, instalación y compactación de pedraplén.

Construcción de filtro de drenaje. K86+000 a K87+050.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de Apoyo Supervisión	1
d	Maestro de obra	1
e.	Topografo de obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de maquinaria	2
h.	Controlador de Tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Vibro Compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre llantas		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Soleado.

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento de Especificaciones técnicas de acuerdo a estudios y diseños, así como de las obligaciones contractuales.

FIRMAS:

Interventor 2.

Nestor H Hahn R
Residente de obra

134

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 11 de Febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de ajeos y filtros
Mejoramiento de Sub de rasante, mediante ajeos, instalación y compactación de pedraplén

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Maestro de Obra	1
e.	Topografo de Obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de excavadoras	2
h.	Controlador de Tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre llantas.		
e)	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Palas Pare y Siga	
Delineadores Tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Soleado	
b.	Tarde	Soleado	

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento del 6685T de acuerdo a normatividad vigente y especificaciones contractuales
Se solicita entrega de informes dentro de los plazos establecidos.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R.
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 12 de febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de filtros y cajeos.

Mejoramiento de suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de pedraplén.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Maestro de obra	1
e.	Topógrafo de obra	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Mezcladora	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Vibro Compactador	
d	Excavadora Sobre Llantas.		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Paletas pare y siga	
Delineadores tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita mejorar la señalización de acuerdo al PMT y especificaciones de diseño en los puntos intervenidos.

Se solicita cumplimiento del PAGA de acuerdo a obligaciones contractuales

FIRMAS:

Interventoría

Nestor Hernandez R
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 13 de febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de filtros y cajeos.
Mejoramiento de Suelo de rasante, mediante cajeos, instalación y compactación de pedraplén.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisor	1
d	Maestro de Obra	1
e.	Topógrafo de obra	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	2
h.	Controlador de Tránsito	2
i.	Ayudante de Obra.	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	f) Vibro compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora sobre llantas		
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:
Barrizada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Interventoría recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor M Medina R
Residente de obra

137

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 14 de febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación mecánica para construcción de filtros. 4

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Maestro de obra	1
e.	Topografo de Obra	1
f.	Cuadrero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	2
h.	Controlador de Transito	2
i.	Ayudante de obra.	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	f) Vibro Compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de oruga.	h) Niveladora.	
d	Cuadrilla Sobre Llantas.		
e)	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:

Delineadores tubulares
Barricada de listones.
Paletas Pare y Siga.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Se solicita mantener la señalización diurna y nocturna en los puntos intervenidos para garantizar la seguridad vial en el trayecto.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor H Hedna R.
Residente de obra

138

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Lunes, 16 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Localización y replanteo topográfico para conformación de Sobrasante.

Debido a intensidad de lluvias no se pudo laborar en la jornada de la tarde.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Maestro de obra	1
e.	Topografo de obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito.	2
i.	Ayudantes de Obra.	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Vibro compactador	
b.	Herramienta menor	g) Volqueta Sencilla	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre llantas	i) Cuatrón Cuatrotangue.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:
Barrera de bolones
Paletas para v. Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Lluvioso

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita cumplimiento de SGSST y PMA de acuerdo a condiciones contractuales.
Se solicita mejora de señalización diurna nocturna y en especial en puntos intervenidos

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A. Martinez R.
Residente de obra

139

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 17 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Mejoramiento de suelo de rasante y nivelación, instalación y compactación de afirmado granular abscisa K9+160 a K8+970.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obras	1
f.	Cadenero de obras	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obras	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibrocompactadores	
c.	Retroexcavadora de Oruga.	h) Mezcladoras	
d	Excavadora Sobre llantas	i) Camión Carrotanque.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones Delineadores tubulares Paletas Pare y Siga	

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Nublado	
b.	Tarde	Nublado - Lluvioso	

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento del PAGA y PMT de acuerdo a condiciones contractuales.

Se recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.

FIRMAS:

Interventoría

Victor A Medina R.
Residente de obra

140

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 18 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Mejoramiento de Suelo de rasante y nivelación instalación y compactación de afirmado granular abscisa K8 + 970 a K8 + 900.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra.	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra.	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Motoniveladora	
d	Excavadora sobre llantas.	i) Camión carrotanque	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:	
Cerramiento de listones	
Delineadores fluorescentes	
Paletas pare y siga.	

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Nublado	
b.	Tarde	Nublado	

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita presencia del personal mínimo ofertado de acuerdo a dedicación establecida.

Se solicita cumplimiento de estudios y diseños especificaciones técnicas en el desarrollo del proceso.

FIRMAS:

Interventoría

Residente de obra
Nestor Medina R

A1

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 19 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa K8 + 900 a K8 + 800

Se realiza comité técnico de obra #12 en compañía de Supervisión de entidad contratante, equipos de contratista de obra e interventoría

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra - Residente de interventoría	1-1
b.	Profesional de apoyo supervisión	1
c.	Especialista pavimentos - Especialista ambiental - Especialista SISO	1-1-1.
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Fresadora	
d	Excavadora Sobre llantas.	i) Camión Carrotanque.	
e) Motoniveladora.			

SEÑALIZACIÓN:	
Delineadores tubulares	
Barricada de listones	
Paletas pare y Siga.	

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Nublado	
b.	Tarde	Nublado	

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento del SGSST de acuerdo a normatividad vigente y de acuerdo a condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R.
Residente de obra

142

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes 20 de Febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abscisa KB+800 a KB+650.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Guadañero de obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga.	h) Mezcladora.	
d	Excavadora sobre llantas.	i) Camión Grafanque.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Palotus Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita mantener y mejorar la señalización vial diurna y nocturna en los puntos intervenidos

Se solicita cumplimiento del PMA de acuerdo a condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R.
Residente de obra

143

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 21 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa KB+650 a KB+400

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Cuadrero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria.	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra.	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Orugas	h) Mezcladora	
d	Excavadora Sobre llantas.	i) Camión Carrotanque.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricadas de listones
Pelotas para señal
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana Soleado	
b.	Tarde Soleado	

OBSERVACIONES:

Se solicita continuar la implementación del PTT de acuerdo a condiciones y obligaciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor Atalaya R
Residente de obra

144

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Lunes, 23 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa K8+100 a K8+300

Construcción de filtro de drenaje entre abcisas. K8+050 a K8+100.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Conductor de tracto	2
i.	Ayudante de Obra.	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibrocompactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Mezcladora.	
d	Excavadora Sobre llantas	i) Camión Cisterna	
e)	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.

Se solicita cumplimiento del personal mínimo ofertado de acuerdo a dedicación establecida

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Molina R.
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 24 de Febrero de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa KB + 300 a KB+ 200.

Excavación mecanica para construcción de Filtro.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de grupo Supervisión	1
d	Topógrafo de Obra	1
e.	Maestro de Obras	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obras	7.
j.		

EQUIPO:

a.	Estación total con prisma	k) Volqueta sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibrocompactador	
c.	Retroexcavadora de oruga	m) Elevadora	
d	Excavadora Sobre Llantas.	λ) Camión carro-tanque.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Sigá
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Se solicita nuevamente entrega de certificados de laboratorio de concretos fundidos en obra así como materiales granulares a usar.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R
Residente de obra

146

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 25 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformacion y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa K8 +200 a K8 +100.

Construcción de Filtro de drenaje abcisa. K8+580 a K8+640

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estacion total con Prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga	h) Camión Cuba tanque	
d	Excavadora sobre llantas	i) Niveladoras.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Paletas Pare y Siga	
Delineadores tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Soleado	
b.	Tarde	Soleado	

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento del 8855T de acuerdo a normatividad vigente y de acuerdo a condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor H Medina R
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 26 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa KB+100 a KB+000.

Construcción de Alfio de drenaje abcisa. KB+190 + KB+050.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Ayudante de Obra	1
e.	Maestro de obra.	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total compisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibro compactador	
c.	Retroexcavadora de Orugas	h) Mezcladora	
d	Excavadora Sobre llantas.	i) Camión Carrotanque	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento del PAGA y PMT de acuerdo a condiciones y obligaciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Hadiva R.
Residente de obra

148

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 27 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa K8+000 + K7+900

Construcción de filtro de drenaje abbisa K7+960 a K8+040

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría.	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Cadenero de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de Transito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Libro compactador	
c.	Retroexcavadora de Oruga.	h) Mezcladora	
d	Excavadora sobre llantas.	i) Camión carrotanque.	
e)	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas pare y siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Soleado	
b.	Tarde	Soleado	

OBSERVACIONES:

Se solicita el cumplimiento delas especificaciones técnicas y según obligaciones contractuales y de diseños.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Molina R
Residente de obra

49

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 28 de Febrero de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conformación y nivelación de rasante, instalación y compactación de afirmado granular abcisa K7+900 a K7+850.

Construcción de filtro de drenaje abcisa K8+040 – K8+030.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Cadenero de obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra.	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	f) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	g) Vibrocompactador	
c.	Retroexcavadora de oruga	h) Mezcladora	
d	Excavadora Sobre llantas.	i) Camión aguatanque.	
e) Motoniveladora			

SEÑALIZACIÓN:

Cerramiento de listones
Paletas pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Soleado	
b.	Tarde	Soleado	

OBSERVACIONES:

Se recomienda y solicita mejorar y mantener la señalización diurna y nocturna en el tramo del proyecto, en especial de los puntos intervenidos.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Pachon R.
Residente de obra

Scanned with CamScanner

CORRESPONDENCIA ENVIADA

INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 lun, 2 feb, 4:22 p.m.

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> lun, 2 feb, 5:27 p.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

Señores

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se remite informe mensual de obra, correspondiente al mes de diciembre de 2025, dado que el contratista realiza subsanación de las observaciones realizadas, cabe aclarar que se ha requerido a contratista la entrega de estos documentos en los plazos establecidos.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

lun, 2 feb, 5:29 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 23 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

CITACION A COMITÉ TECNICO DE OBRA #11

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, CONSORCIO

jue, 5 feb, 8:39 a.m.

Señores

CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día viernes 6 de febrero de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en las instalaciones de la entidad contratante TIERRASUA, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Informe de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Seguimiento y control al SGSST, informe de contratista de obra a las acciones adelantadas durante la ejecución de obra.
6. Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.
7. Solicitudes de contratista de obra.

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día viernes 6 de febrero de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en las instalaciones de la entidad contratante TIERRASUA, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Informe de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Seguimiento y control al SGSST, informe de contratista de obra a las acciones adelantadas durante la ejecución de obra.
6. Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.
7. Solicitudes de contratista de obra.
8. Solicitudes de la entidad.
9. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
10. Otros y varios.

Se solicita verificar y validar la agenda, si existe alguna solicitud de inclusión se solicita se indique para anexar a la agenda.

Se solicita cumplir con la hora y requiere la presencia del director de obra, representante legal, asesor SISO, de manera indelegable al presente comité.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica

lun, 9 feb, 7:18 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 24 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive

INFORME MENSUAL 6 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mié, 11 feb, 5:16 p.m.

1. INFORME MENSUAL FIRMADO.pdf

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe mensual 6 de interventoría, correspondiente al mes de enero de 2026, de acuerdo a las solicitudes, observaciones y ajustes requeridos.

De acuerdo a la documentación enviada por el contratista se encuentra en revisión el informe mensual de obra correspondiente al mes de diciembre,se envían observaciones para la subsanación del documento.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA

Recibidos ×

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para CONSORCIO, tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mié, 11 feb, 6:04 p.m.

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se realiza envío del oficio 13 de interventoría según las solicitudes y requerimientos de obra.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Umbita (Boyacá), 11 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

OFC-INT-013

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA ENERO 2026.

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, los compromisos pactados durante el desarrollo de obra, las actividades ejecutadas y la documentación requerida para el seguimiento y control de obra, la interventoría se permite solicitar de carácter urgente la entrega del informe mensual de obra #6 correspondiente al período correspondido entre el 13 y 31 de enero de 2026, con todos los soportes, lo razón a las siguientes acotaciones:

- CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, obligación 11 “Oportunamente rendir y elaborar los informes, técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales, contables, entre otros que sean requeridos, junto con los respectivos soportes, a la interventoría, a la entidad y demás entidades a que haya lugar”

- Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de las solicitudes de la supervisión de la entidad contratante, para el cargue de información concerniente a informes mensuales y los compromisos pactados durante la ejecución del proyecto, en los cuales se establecía la entrega de informes con los respectivos soportes el primer día de cada mes, con el fin de realizar revisión, verificación y observación por parte del equipo de interventoría para posterior entrega a entidad contratante.

- A la fecha de la presente aún no se ha entregado subsanado y completo el informe mensual de obra a interventoría correspondiente a las fechas citadas al inicio de este documento, por lo cual se requiere de carácter urgente el envío para su revisión, dado que el informe mensual de interventoría requiere soportes y documentos del informe de obra y la no entrega de esta documentación retrasa el cumplimiento de las obligaciones de interventoría, teniendo en cuenta lo anterior y la fecha en la que se realiza este requerimiento excedida de los plazos pactados, es necesario la entrega a la mayor brevedad del informe para no concurrir a incumplimientos con la entidad contratante.

Sin otro en particular y atentos a la entrega de la documentación requerida.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. Archivo general.
Proyectó: Ing. David Mendivelso – residente de interventoría.
Aprobó: Ing. Jaime Pinzón – director de interventoría.

Solicitud certificado de egresos y retenciones

Recibidos ×

Jaime Humberto Pinzon A
para tecnica, David, mí

jue, 12 feb, 9:31 a.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

Cordial saludo, por este medio se solicita respetuosamente se envié por medio electrónico al correo del contratista, copia de la certificación de los egresos y retenciones practicadas en el año 2025.

Se anexa oficio al respecto

Por favor confirmar el recibo de este correo.

Atentamente,

JAIME HUMBERTO PINZÓN Á.
INGENIERO CIVIL - U.P.T.C.
Diseños, Construcción y Consultoría en Obras Civiles


Antes de imprimir este correo piensa si es realmente necesario hacerlo: el medio ambiente es la vida de todos.


**********AVISO LEGAL DE ENVÍO CORREO ELECTRÓNICO **********
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala o errónea Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de Otro (aclarando y estipulando quien es ese otro) .

Tunja (Boyacá), 12 de febrero de 2026

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

OFC-INT-014

Asunto: SOLICITUD PAGO PARCIAL CONTRATO – N° IPVO 017-2025

Referencia: CONTRATO IPVO-017-2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cordial saludo,

Cordial saludo, por este medio se solicita respetuosamente se envié por medio electrónico al correo del contratista, copia de la certificación de los egresos y retenciones practicadas en el año 2025.

Correo para recibo de la información: jaimepinzoning@gmail.com

Lo anterior con fines de pagos de impuestos y procedimientos contables.

Atentamente,

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. Archivo general.

SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA

Recibidos ×

Jaime Pinzón mié, 11 feb, 6:04 p.m.

Señores CONSORCIO SISA 25 ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA CC TIERRASUA SAS ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO SUPERVISOR

CONSORCIO SISA 25 mié, 11 feb, 6:46 p.m.

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> vie, 13 feb, 10:18 a.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez, CONSORCIO

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, y de la revisión al informe mensual de obra 6 correspondiente a enero de 2026, se tienen las siguientes observaciones:

De acuerdo al contrato de obra de referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, y de la revisión al informe mensual de obra 6 correspondiente a enero de 2026, se tienen las siguientes observaciones:

1. Página 11, ajustar dado que se menciona que se anexa planillas del personal anterior y de acuerdo a la ejecución de obra se anexa es del período de diciembre 2025, referenciar que se anexan son las afiliaciones del personal y las planillas de diciembre 2025.
2. Página 73, informe ambiental en fichas de manejo ambiental apartado 6.4. Manejo de Calidad del Aire, incluir registro fotográfico de esta actividad realizada para dejar la evidencia del cumplimiento de esta actividad.
3. Página 78, quitar de la ficha ambiental, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES, el apartado de Control de desperdicios en actividades de mezcla, corte y vaciado de concreto, dado que en este período no se ejecutaron en el trayecto actividades concernientes fundidas de concreto.
4. Página 91, ajustar en la ficha ambiental, MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUES DE GÉNERO, DERECHOS Y DIFERENCIAL, informe de obra sst 05, y el informe referenciado es el 06.
5. Página 92, ajustar en la ficha ambiental, INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS, las actividades referenciadas de labores Perfilado y adecuación de vía, con remoción de capa vegetal, descapote y limpieza de áreas cubiertas de rastrojo o maleza y Ajustes en accesos a predios rurales, dado que no se ejecutaron esas actividades durante el mes, de igual manera las medidas implementadas, ajustar acorde a las labores realizadas en el período.
6. Página 102, las sumatorias de los líquidos recolectados no coinciden con lo especificado en la página siguiente, corregir.
7. Página 134, informe de calidad, corregir la fecha de inicio del período reportado de ejecución, dado que aparece desde el 1 de enero, y el reinicio se efectuó desde el día 13 de enero.
8. Página 135, informe de calidad, menciona 2 veces informe 6 y el de diciembre corresponde al informe 5, ajustar.
9. Página 147, informe de calidad, ajustar nuevamente fecha de inicio del período reportado de ejecución, dado que aparece desde el 1 de enero, y el reinicio se efectuó desde el día 13 de enero.
10. Página 148, informe de calidad, ajustar fecha de suspensión del contrato, dado que aparece 31 de enero de 2026 y la fecha correcta es 31 de diciembre de 2025.
11. Página 148, informe de calidad, incluir la fecha de terminación vigente según el acta de reinicio 1, la cual es del 2 de julio de 2026.
12. Página 149, informe de calidad, ajustar la tabla del personal de acuerdo a la reportada tanto en informe técnico, como sst, dado que la controladora 1, operador oruga, ya no se encuentra laborando durante el período del presente informe, así como adjuntar al personal operativo.
13. Página 150, informe de calidad, nuevamente ajustar fechas del período del informe, aparece del 1 al 31 de enero y es desde el 13 al 31 de enero.
14. Página 154, informe de calidad, ajustar el tiempo transcurrido ya que es del 50.33%, reportado tanto en informes semanales.
15. Página 156, informe de calidad, incluir registro fotográfico de las actividades relacionadas a Control de emisiones y material particulado, Se realizaron actividades periódicas de humectación de la vía y de las zonas de trabajo,
    especialmente durante las labores de excavación y tránsito de maquinaria pesada, con el fin de minimizar la generación de material particulado.
16. Página 162, ajustar datos del anexo de las pólizas, dado que se indica en la parte del número de póliza cumplimiento anexo 2 y en la tabla anexo 1, lo cual no coincide, para la póliza rce, es el anexo 3 el vigente y ajustar la misma observación y revisar el valor asegurado.
17. Página 163, ajustar materiales utilizados en el período dado que concretos no se requirieron en el período del informe, así como aceros de refuerzo y tubería de concreto, no se incluye pedraplén, geotextil, y tubería para filtro que sí fue la usada durante el periodo.
18. Página 213, dentro de los resultados de los concretos de tuberías de 36", falta incluir el certificado de calibración del equipo, así como los documentos del profesional que realizó la falla del cilindro, esto se había comentado en comités de obra.

15. Página 156, informe de calidad, incluir registro fotográfico de las actividades relacionadas a Control de emisiones y material particulado, Se realizaron actividades periódicas de humectación de la vía y de las zonas de trabajo,
    especialmente durante las labores de excavación y tránsito de maquinaria pesada, con el fin de minimizar la generación de material particulado.
16. Página 162, ajustar datos del anexo de las pólizas, dado que se indica en la parte del número de póliza cumplimiento anexo 2 y en la tabla anexo 1, lo cual no coincide, para la póliza rce, es el anexo 3 el vigente y ajustar la misma observación y revisar el valor asegurado.
17. Página 163, ajustar materiales utilizados en el período dado que concretos no se requirieron en el período del informe, así como aceros de refuerzo y tubería de concreto, no se incluye pedraplén, geotextil, y tubería para filtro que sí fue la usada durante el periodo.
18. Página 213, dentro de los resultados de los concretos de tuberías de 36", falta incluir el certificado de calibración del equipo, así como los documentos del profesional que realizó la falla del cilindro, esto se había comentado en comités de obra.
19. Página 225, informe sst, referenciar las fechas del informe, no dejar general enero 2026, dado que no se laboró todo el mes.
20. Página 227, informe sst, de igual manera que la anterior observación especificar la fecha del período del informe en la tabla de contenido.
21. Página 230, en la nota se referencia textualmente "Según acuerdo de interventoría se anexa el cuadro de afiliaciones del personal del mes de anterior (diciembre)", se aclara que es de acuerdo a los lineamientos iniciales pactados entre las partes intervinientes como supervisión, contratista de obra, donde se anexan planillas de seguridad social del mes vencido, por lo cual ajustar esa nota, así como se debe además de esa tabla, referenciar el personal que se encuentra durante el período del proyecto, el cual cuenta con las respectivas afiliaciones a partir del reinicio del proyecto.
22. Página 231,informe sst, nuevamente incluir el período de ejecución del proyecto, dado que no se labora el mes completo.
23. Página 277, incluir las afiliaciones del personal ingresado desde el reinicio del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, y para evitar mayores tiempos en la entrega de la documentación se solicita realizar un meet, entre las partes intervinientes, contratista de obra, supervisión de la entidad contratante e interventoría, el día de hoy, sobre las 11:15 am, el cual será enviado por medio de whatsapp, para la corrección del informe de obra y posterior entrega a la supervisión.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

•••

INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 lun, 16 feb, 2:28 p.m.

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> lun, 16 feb, 2:54 p.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

Señores

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se remite informe mensual de obra, correspondiente al mes de enero de 2026 y especificamente al período del 13 al 31 de enero de 2026, dado que el contratista realiza subsanación de las observaciones realizadas, cabe aclarar que se ha requerido a contratista la entrega de estos documentos en los plazos establecidos.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

lun, 16 feb, 4:15 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 25 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive

ACTA DE COMITE DE OBRA #11

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, CONSORCIO, rafaelcamilosuarezsuarez

lun, 16 feb, 6:21 p.m.

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se realiza envío del acta de comité de obra #11, para su conocimiento y fines pertinentes.acta

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN DE OBRA.

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para CONSORCIO, tecnica

mar, 17 feb, 8:45 a.m.

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se realiza envío del oficio 15 de interventoría según las observaciones, consideraciones, solicitudes y requerimientos de obra.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

Umbita (Boyacá), 17 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

OFC-INT-015

Asunto: OBSERVACIONES RESPECTO A EJECUCIÓN DE OBRA.

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato de referencia, de la documentación entregada como la programación de obra, del seguimiento y control de obra realizado, la interventoría tiene las siguientes consideraciones:

- Teniendo en cuenta la programación de obra, entregada a entidad contratante y vigente al plazo establecido según el acta de reinicio #1, y de acuerdo a la visita de campo a la cantera "TRITURADOS VALLE DE TENZA", compañía de suministro de materiales según estudios y diseños para materiales granulares como base y sub base; en la inspección realizada el personal encontrado de dicha empresa, ratifica que tienen la capacidad de suministrar hasta un máximo de veinte (20) viajes de material diarios, el cual debe especificarse si es base o subbase con anterioridad al cargue para su preparación, en vehículo tipo volqueta doble troque.

- Teniendo en cuenta la cantidad que puede suministrar la cantera serían un aproximado de 280 metros cúbicos de material suelto, el cual instalado en campo y compactado por un supuesto máximo del 30%, se tendrían 215 metros cúbicos al día en obra.

- Que, de acuerdo a las condiciones que puedan presentarse, de un análisis y evaluación de interventoría se toman cuatro (4) días a la semana disponibles para el suministro de material, dado que pueden presentarse situaciones o circunstancias ajenas a la ejecución del proyecto que imposibiliten el suministro los seis días laborales que cuenta la semana, por lo cual y con la anterior consideración se tendría un volumen aproximado de 860 metros cúbicos compactados disponibles por semana en obra.

- De acuerdo a la programación, entregada por el contratista de obra y con vigencia según el plazo vigente al acta de reinicio #1, se tiene una fecha establecida de inicio de "SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)" el día dieciséis (16) de abril, contando con una duración de 14 días, abarcando un aproximado de 3 semanas de trabajos en el proyecto.

- Teniendo en cuenta la cantidad contractual establecida de 2695,79 metros cúbicos, para sub base granular, y las 3 semanas de duración aproximada de esta actividad, de la capacidad en volumen de suministro de la cantera, se tendría un aproximado de 2580 metros cúbicos en el lapso de la ejecución de esta actividad, teniendo un déficit de 116 metros cúbicos; sin embargo como se menciona en el anterior apartado la fecha de inicio está programada para inicio el día 16 de abril, teniendo aún holgura en el comienzo de ejecución de esta actividad, por lo cual interventoría y acorde a lo manifestado durante la realización del proyecto y aunado a lo manifestado en comités de obra, se recomienda a contratista de obra, tener acopio de materiales, el cual garantice la cantidad necesaria de insumos para dar el cumplimiento de los plazos establecidos y según la programación de obra aprobada, de las actividades a ejecutar.

- De acuerdo a la programación, entregada por el contratista de obra y con vigencia según el plazo vigente al acta de reinicio #1, se tiene una fecha establecida de inicio de "SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)" el día treinta (30) de abril, contando con una duración de 11 días, abarcando un aproximado de 3 semanas de trabajos en el proyecto.

- Teniendo en cuenta la cantidad contractual establecida de 1593,00 metros cúbicos, para base granular, y las 3 semanas de duración aproximada de esta actividad, de la capacidad en volumen de suministro de la cantera, se tendría un aproximado de 2580 metros cúbicos en el lapso de la ejecución de esta actividad, teniendo un superávit de 987 metros cúbicos; sin embargo como se menciona en el anterior apartado la fecha de inicio está programada para inicio el día 30 de abril, teniendo aún holgura en el comienzo de ejecución de esta actividad, por lo cual interventoría y acorde a lo manifestado durante la realización del proyecto y aunado a lo manifestado en comités de obra, se recomienda a contratista de obra, tener acopio de materiales, el cual garantice la cantidad necesaria de insumos para dar el cumplimiento de los plazos establecidos y según la programación de obra aprobada, de las actividades a ejecutar.

- De igual manera cabe aclarar que, según el APU contractual, correspondiente a "TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)", se menciona y establece la unidad de pago por M3-km, sin importar el tamaño del vehículo de carga, por lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones posibles de restricción de paso en el puente militar provisional, ubicado y denominado "PUENTE SISA", se podría garantizar el transporte en volquetas sencillas, dado que el volumen de suministro por parte de la cantera no se limita al tamaño del vehículo, sino a la disponibilidad de material y capacidad de producción de la empresa.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al análisis realizado por la interventoría y de la visita a la cantera de suministro del material granular de base y sub base, se reitera la recomendación a contratista de obra, de realizar acopio de materiales para garantizar la cantidad requerida para la ejecución de las actividades de obra, así como se tiene la holgura de inicio según el cronograma presentado, cabe mencionar que este acopio de material debe garantizar las calidades del material y que no se afecten las características mínimas exigidas dentro de las especificaciones técnicas de diseño, así como de la normatividad vigente.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. Archivo general.
Proyectó: Ing. David Mendivelso – residente de interventoría.
Aprobó: Ing. Jaime Pinzón – director de interventoría.

CITACION A COMITÉ TECNICO DE OBRA #12

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> mar, 17 feb, 2:50 p.m.
para tecnica, CONSORCIO

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día jueves 19 de febrero de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en el sitio de obra, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.
6. Solicitudes de contratista de obra.
7. Solicitudes de la entidad.
8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
9. Otros y varios.
10. Compromisos

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día jueves 19 de febrero de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en el sitio de obra, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Verificación balance de obra. Se solicita al contratista entrega previa para revisión en medio editable.
6. Solicitudes de contratista de obra.
7. Solicitudes de la entidad.
8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
9. Otros y varios.
10. Compromisos.

Se solicita verificar y validar la agenda, si existe alguna solicitud de inclusión se solicita se indique para anexar a la agenda.

Se solicita cumplir con la hora y requiere la presencia del director de obra, representante legal, asesor SISO, de manera indelegable al presente comité.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE OBRA

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 mié, 18 feb, 8:00 a.m.

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> lun, 23 feb, 3:41 p.m. (hace 10 días)

para tecnica, CONSORCIO

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, de las solicitudes por parte del contratista de obra, realizada el día 18 de febrero del presente año, se remite el requerimiento de envío de la lista de chequeo y/o documentación y/o formatos necesarios para realizar el respectivo trámite de cobro de actas parciales, lo anterior según los diferentes procesos y procedimientos internos que tienen dentro de la empresa entidad contratante.

Quedando atentos a la información solicitada y posterior comunicación al contratista de obra.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

lun, 23 feb, 4:58 p.m. (hace 10 días)

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 26 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

AJUSTE DE PÓLIZAS ACTA DE REINICIO #1 INTERVENTORÍA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica

mar, 24 feb, 2:52 p.m. (hace 9 días)

Señores
TIERRASUA S.A.S
ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

De acuerdo a las observaciones realizadas a las pólizas de interventoría, se remiten las pólizas de interventoría actualizadas al acta de reinicio #1, subsanando dichos requerimientos por parte de la entidad contratante.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive


5. POLIZA CUMPL...


6. POLIZA RCE A...

ORDEN DE OPERACION 7

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 mié, 25 feb, 4:05 p.m. (hace 8 días)

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> jue, 26 feb, 10:05 a.m. (hace 7 días)

para CONSORCIO

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, de la revisión a la documentación adjunta en el anterior correo, se remite firmada para su respectivo trámite la orden de giro #7 del anticipo al contrato de obr, se recuerda y se reitera la entrega de los rendimientos financieros ante la fiducia del mismo anticipo.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

BALANCE DE OBRA PARA REVISIÓN

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

jue, 26 feb, 2:12 p.m. (hace 7 días)

SABANA CANTIDADES MODIFICATORIO.xlsx

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se remite el balance de obra para revisión en medio editable.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregado a Drive

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025 Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25
para mí

lun, 2 feb, 4:22 p.m.

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: INFORME 05, 01/12/2025 - 31/12/2025

Cordial saludo.

Por medio de la presente adjunto informe 5 correspondiente al periodo comprendido del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Se realizaron las debidas subsanaciones de acuerdo a lo informado de manera verbal, lo anterior con el fin de tener informe de obra completo para interventoría.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA

Recibidos ×

Jaime Pinzón
Señores CONSORCIO SISA 25 ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA CC TIERRASUA SAS ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO SUPERVISOR

mié, 11 feb, 6:04 p.m.

CONSORCIO SISA 25
para mí

mié, 11 feb, 6:46 p.m.

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026

Cordial saludo.

Por medio de la presente adjunto informe 6 correspondiente al periodo comprendido del 13 al 31 de enero de 2026.

•••

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25
para mí

lun, 16 feb, 2:28 p.m.

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: INFORME 06, 13/01/2026 - 31/01/2026

Cordial saludo.

Por medio de la presente adjunto informe 6 correspondiente al periodo comprendido del 13 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

Se realizaron las debidas subsanaciones de acuerdo a lo observado, lo anterior con el fin de tener informe de obra completo para interventoría.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



PDF INFORME MENSU...

DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE OBRA

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25
para mí

mié, 18 feb, 8:00 a.m.

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: Solicitud de documentación y formatos para presentación de Acta Parcial de Obra

Cordial saludo,

Me permito solicitar muy respetuosamente se sirva indicar y remitir la documentación requerida para la correcta elaboración y radicación de Acta Parcial de Obra.

Lo anterior, con el fin de allegar la información completa, organizada y conforme a los lineamientos establecidos por la entidad contratante. En caso de que la entidad cuente con formatos propios, plantillas o modelos específicos para la presentación de actas parciales, agradecemos sean suministrados oportunamente, a efectos de garantizar que la documentación se estructure de manera adecuada y acorde con los requerimientos institucionales.

Entendiendo que la interventoría es el canal encargado de solicitar y validar ante la entidad contratante TIERRASUA SAS la documentación pertinente para este trámite, solicitamos su amable gestión ante dicha entidad, con el propósito de evitar inconsistencias o reprocesos en la radicación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus indicaciones para proceder conforme corresponda.

REMISION DOCUMENTOS MODIFICATORIO

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25
para mí

sáb, 21 feb, 12:24 p.m. (hace 12 días)

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: Remisión de documentos – Modificatoria al Contrato

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir a la Interventoría los documentos correspondientes a la **modificatoria del contrato**, para su respectiva revisión, análisis y trámite pertinente.

Quedo atento a sus comentarios.

MODIFICATORIO.rar

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

ORDEN DE OPERACION 7

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25

para mí

mié, 25 feb, 4:05 p.m. (hace 8 días)

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: ORDEN DE OPERACIÓN 6

Cordial saludo.

Por medio del presente, se realiza el envío de la Orden de Pago No. 7 correspondiente al anticipo, para su respectiva revisión y aprobación.

Agradecemos que, una vez verificada y aprobada, sea remitida por este mismo medio debidamente firmada por la Interventoría, con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



PDF Orden de pago 7 ...

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	3
18049	PA ANT CONSORCIO SISA 25	7	88200006298	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	23/02/2026	REEMBOLSOS	$ 431,518,178.00	$ 0.00	$ 431,518,178.00	Pesos		

Generar Orden

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
901969390	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO SISA 25	25800006906	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 21,098,000.00		$ 21,098,000.00							3.0	
901969390	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO SISA 25	25800006906	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 144,132,246.00		$ 144,132,246.00							4.0	
901969390	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO SISA 25	25800006906	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 266,287,932.00		$ 266,287,932.00							5.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 03					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 23/02/2026		
18049 P.A. ANT CONSORCIO SISA 25			PAGADO A : CONSORCIO SISA 25		
			N.I.T : 901.969.390-5		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
3	ALQUILER MAQ, EQUIPOS Y ELEM REQUERIDOS	MADDA YIVE	CUENTA DE C	03/02/26	$ 10,890,000.00
		JUAN C PEDRAZA	CUEBNTA DE C	23/02/26	$ 10,208,000.00
				TOTAL ITEM 3	$ 21,098,000.00
4	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	MEXICHEM COLOMBIA	WBG-34160	06/12/25	$ 37,806,746.00
		INGENIERIA DE VIAS SAS	CUENTA DE COBRO	19/02/26	$ 106,325,500.00
				TOTAL ITEM 4	$ 144,132,246.00
5	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	CRISTIAN F ROJAS	CRR-142	16/02/26	$ 225,610,932.00
		SALVADOR VALERO	CUENTA DE C	30/12/25	$ 15,000,000.00
		SALVADOR VALERO	CUENTA DE C	30/01/26	$ 10,000,000.00
		DIEGO CASTAÑEDA	CUENTA DE C	06/01/26	$ 7,270,000.00
		DIEGO CASTAÑEDA	CUENTA DE C	22/12/25	$ 8,407,000.00
				TOTAL ITEM 5	$ 266,287,932.00
				TOTAL ITEM	$ 0.00
				TOTAL ITEM	$ 0.00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 431,518,178.00

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

CUENTA DE COBRO # 4

Umbita Boyacá 3 de febrero del 2026

Consorcio SISA 2025

NIT. 901969390-5

Dirección calle 20 #12-84 Tunja Boyacá

DEBE A

MADDA YIVE GUTIERREZ GIRALDO

Cedula 1014220793 de Bogotá

Dirección vereda sisa medio umbita

La suma de $10,890,000 diez millones ochocientos noventa mil pesos

Por concepto alquiler de maquinaria al contrato de obra cuyo objetivo es el mejoramiento de la vía secundaria umbita puente sisa del municipio umbita del departamento de Boyacá, en el periodo del 14 de enero hasta el 30 del mismo, mas 3,8 horas día 26 de diciembre del 2025.

Para un total de 108.9 horas trabajadas.

Menos combustible ACPM ($1,898,000) millón ochocientos noventa y ocho mil pesos.

Cordialmente

MADDA GUTIERREZ.

Madda Gutierrez Giraldo

Cc. 1014220793

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

3. Clase de: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141223567593

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1014220793 | 8. DV:

12. Dirección seccional: | 14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1014220793

27. Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	GIRALDO	MADDA	YIVE

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Umbita 8 4 2

41. Dirección principal: VDA SISA MEDIO

42. Correo electrónico: liamgutierrez030@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3208376590	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2023/12/13	0141	2015/03/06	7730			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	4	9																							

53. Código

05- Impto renta y compl régimen ordinar

48 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Fecha | 56. Tipo | Sección | 1 | 2 | 3

57. Modelo

58. CAC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso, parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: GUTIERREZ GIRALDO MADDA YIVE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UMBITA, 15 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO SISA 25

NIT. 901.969.390-5

DEBE A:

JUAN CAMILO PEDRAZA GÓMEZ

C.C. 1.193.447.840

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE (10.208.000,00).

POR CONCEPTO DE: ALQUILER CAMIONETA PARA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VÍA ÚMBITA PUENTE SISA.

Juan Camilo Pedraza G.

JUAN CAMILO PEDRAZA GÓMEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141237401824

(415)7707212489984(8020) 000014123740182 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 9 3 4 4 7 8 4 0	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	1 1 9 3 4 4 7 8 4 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEDRAZA	GOMEZ	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá	1 5	Tunja	0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 B 47 A 2

42. Correo electrónico: juanca20-05@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 5 0 0 0 1	3 1 0 5 8 3 4 6 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 1 0 2 1 1	0 0 9 0	2 0 2 1 0 2 1 1		7 7 3 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz: en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEDRAZA GOMEZ JUAN CAMILO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-02-2026 10:47:43AM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PAVCO WAVIN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
56c48a5e9cff22117cdad0f546c34fc5295bfe91d84a83927008928793d69d92e18ab5a5913d3493da99762fcd10e4ae

Número de Factura: WBG-34160
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 01.12.2025
Fecha de orden de pedido: 01/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Mexichem Colombia S.A.S.
Nombre Comercial: Mexichem Colombia S.A.S.
Nit del Emisor: 860005050
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15;O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Dirección: AUT SUR71 75 BRR PERDOMO
Teléfono / Móvil:
Correo: crfbogota@wavin.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO SISA 25
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901969390
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: CO
Municipio / Ciudad: BOYACA TUNJA,COLOMBIA
Dirección: CL 20 12 84
Teléfono / Móvil: 3134858032 / 3134858032
Correo: facturacionelectronica042@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	19270000-9	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 3.5	MTK	11.375,00	$ 2.793,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.036.371,25	19.00			$ 31.770.375,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	4204230489	01/12/2025

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2025 14:51:57
Documento validado por la DIAN:
04/12/2025 14:51:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.770.375,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.770.375,00
IVA	6.036.371,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.036.371,25
Total neto factura (=)	37.806.746,25
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $37.806.746,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101533890 | Rango desde: 33770 | Rango hasta: 99999 | Vigencia: 2027-11-13

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.
INGENIEROS CONTRATISTAS

Bogotá, 19 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO ANTICIPO

CONSORCIO SISA 25
NIT. 901.969.390-5

DEBE A:

INGENIERA DE VIAS S.A.S
NIT. 800.186.228-2

VALOR TOTAL: CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($106.325.500).

CONCEPTO: ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE UMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PEDRO CONTECHA CARIILLO
C.C. 2.284.145
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141191807072

(415)7707212489984(8020) 000014119180707 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 6 2 2 8	2	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá. D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 18 23 OF 201

42. Correo electrónico: gerencia@ingenieriadevias.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 2 0 4 8 2 0	3 1 8 2 6 5 5 9 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 3 0 2 1 7	4 2 9 0	1 9 9 3 0 2 1 7	7 1 1 2	4 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 10 13 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

56. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	4		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984. Nombre: CONTECHA CARRILLO PEDRO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-10-2025 08:58:01AM

Factura Electrónica de Venta
No.CRR-142

CRISTIAN ROJAS

CRISTIAN FABIAN ROJAS RODRIGUEZ

Nit: 1049644228-5
Departamento: Boyacá
Ciudad: TUNJA
Dirección: calle 7 13 12
Teléfono: 3134814561

Correo: cristianrojasing741@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: CONSORCIO SISA 25
Número Documento: NIT 901969390-5
Teléfono: 3134858032
Dirección: cl 20-12-84
Correo: facturacionelectronica042@gmail.com
Departamento: Boyacá

Ciudad: TUNJA
Fecha Expedición: 16/02/2026 08:42 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Medio pago: Efectivo

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	% INC	Total
M	MOVIMIENTO TIERRA	$ 85,000	2,289.13 Metro cúbico(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194,576,050
UTILIDAD	UTILIDAD	$ 9,728,803	1 unidad(s)	$ 0	$ 1,848,472.57	19 $ 0	$ 9,728,803
IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	$ 1,945,761	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,945,761
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$ 17,511,845	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,511,845

Total items: 4 Total cantidad: 2292.13

Descripcion de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 0%:	$ 214,033,656
Subtotal IVA 19%:	$ 9,728,803
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 19%:	$ 1,848,472.57
Total factura:	$ 225,610,931.57
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 225,610,932**

Valor en Letras:
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Cufe: 6ffb4ce9fcb3a8b1e7d2cf3ffa700d9fcd43743cf486991af4c11fc9d95d7a26a1cf0fc2cac3d75bded8ebdd3b22ca22

Observaciones: Consignese en la cuenta de ahorros No.60626829051 Bancolombia. Consignese en la cuenta de ahorros No.585132285 Banco de Bogota. Cuentas a nombre de Cristian Fabian Rojas R.

Numero de resolucion: 18764098361387
Rango Autorizado: Desde CRR-117 Hasta CRR-500
Vigencia:09/09/2025 Hasta 09/03/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141235323044

(415)7707212489984(8020) 000014123532304 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 4 9 6 4 4 2 2 8	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 4 4 2 2 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	RODRIGUEZ	CRISTIAN	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 7 13 12 BRR LIBERTADOR

42. Correo electrónico cristianrojasing741@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 8 1 4 5 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 2 2 0 4 0 1	4 2 9 0	2 0 2 0 0 2 0 3		4 6 6 3		8 3 2 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	2	2	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

UMBITA, 30 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO SISA 25

NIT. 901.969.390-5

DEBE A:

SALVADOR VALERO SANCHEZ

CEDULA. 4.291.064

LA SUMA DE QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (15.000.000,00), POR CONCEPTO DE ABONO MANO DE OBRA EN LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

TOTAL 15.000.000

ATENTAMENTE,

SALVADOR VALERO SANCHEZ
CEDULA. 4.291.064

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14757922521

(415)7707212489984(8020) 000001475792252 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 2 9 1 0 6 4	3	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 9 1 0 6 4	1 9 8 5 0 7 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Umbita 8 4 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALERO	SANCHEZ	SALVADOR	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONCRETOS VALERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Umbita 8 4 2

41. Dirección principal: CL 6 4 34

42. Correo electrónico: svalerosanchez@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 5 1 1 0 6 6	3 2 0 9 4 9 0 5 4 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 9 1 0 2 3	4 9 2 3	2 0 1 7 0 3 1 0		0 8 1 1	4 6 6 3	3 4 2 3	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 13 / 13 : 22: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO

UMBITA, 30 DE ENERO DE 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO SISA 25

NIT. 901.969.390-5

DEBE A:

SALVADOR VALERO SANCHEZ

CEDULA. 4.291.064

LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (10.000.000,00), POR CONCEPTO DE ABONO MANO DE OBRA EN LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.

TOTAL 10.000.000

ATENTAMENTE,



SALVADOR VALERO SANCHEZ
CEDULA. 4.291.064

Tunja, 06 de enero del 2026

CUENTA DE COBRO __

CONSORCIO SISA 25
NIT. 901969390-5
Dirección: CL 20 12 84
Boyacá – Tunja

DEBE A

DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO
C.C No 1.054.708.889 de Nuevo Colón - Boyacá
Dirección: carrera 7ª N 74-19
Teléfono: 3112568526

LA SUMA DE: ..... $ 7,270.000.

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS MES DE ENERO DEL 2026, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Atentamente.



DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO
C.C No 1.054.708.889 de Nuevo Colón - Boyacá
Dirección: carrera 7ª 74-19
Teléfono: 3112568526

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042905858

(415)7707212489984(8020) 000014104290585 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 5 4 7 0 8 8 8 9	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	1 0 5 4 7 0 8 8 8 9	

Lugar de expedición	28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9	Boyacá	1 5	Nuevo Colón	4 9 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑEDA	ARANGO	DIEGO	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá	1 5	Tunja	0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 A 74 19

42. Correo electrónico daca-13@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 5 6 8 5 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 2 0 7 0 2	7 7 3 0	2 0 1 2 0 7 0 2	4 9 2 3		3 1 1 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑEDA ARANGO DIEGO ALEXANDER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Tunja, 22 de diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO __

CONSORCIO SISA 25
NIT. 9 0 1 9 6 9 3 9 0 - 5
Dirección: CL 20 12 84
Boyacá – Tunja

DEBE A

DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO
C.C No 1.054.708.889 de Nuevo Colón - Boyacá
Dirección: carrera 7ª N 74-19
Teléfono: 3112568526

LA SUMA DE: ..... $ 8,407.000.

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Atentamente.

DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO
C.C No 1.054.708.889 de Nuevo Colón - Boyacá
Dirección: carrera 7ª 74-19
Teléfono: 3112568526

INFORME SST DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No: IPO 001-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IPVO 017-2025

INFORME NUMERO 7

FECHA DE CORTE DEL INFORME:

Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL CONSORCIO SISA 25

Decreto 1072 del 2015
Res. 0312 de 2019.
Resolucion 4272 de 2021 “reglamento para el trabajo en alturas
Resolución 3461 de 2025, constitución y funcionamiento del CCL

Dirección: Calle 30 #10-36 Tunja
Email: Interumbita@gmail.com
Contacto: 314 -3600483

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO	N° IPO 001-2025
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA	CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5 R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ CC 6.775.637 de Tunja
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
PLAZO PRORROGA #1:	N/A
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO 1:	13 DE ENERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE FINALIZACIÓN	02 DE JULIO DE 2026

ELABORADO POR	**APROBADO POR**
María Clara Cáceres Estupiñán **Profesional especializado en SST** **Lic. 0315 Expedida por SSB**	Jaime Humberto Pinzón Álvarez **Director de interventoría.** **JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 4

a. OBJETIVO GENERAL: 4

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 4

3. INFORME GENERAL 5

a. Relación del personal en obra en las fechas del corte. 5

b. Relación del personal por parte de la interventoría 6

c. Relación de personal retirado 6

d. Relación de maquinaria en obra 6

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. 7

a. Las actividades ejecutadas en esta fase del proyecto fueron: 7

5. ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 8

6. LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENIDOS POR EL CONTRATISTA SISA 2025 FUERON: 8

a. AUSENTISMO LABORAL 9

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 9

8. ACTIVIDADES DEL SG-SST (DOCUMENTOS, CAPACITACIONES EJECUTADAS) 10

9. EVIDENCIAS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST. 11

10. OBSERVACIONES 12

1. INTRODUCCIÓN

El decreto único reglamentario 1072 de 2015 del sector trabajo, expedido por el Ministerio del Trabajo, establece los parámetros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre ellos, establece que se debe crear un mecanismo por medio del cual las personas e instituciones públicas y privadas, informen sobre el desempeño de este, a través de la implementación de los estándares mínimos, contemplados en la resolución 0312 de 2019, de igual manera se adopta las resoluciones 4272 de 2021 "reglamento para el trabajo en alturas" y la resolución 3461 de 2025, constitución y funcionamiento del CCL

Este mecanismo en el proceso constructivo, se intervine a través de las ARLs, interventorías, veedores ciudadanos, entidades de control entre otras, es por ello que la interventoría en cabeza de **JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ,** establece medidas de verificación de la implementación del SG-SST por parte del contratista CONSORCIO SISA 25, durante la ejecución del mejoramiento de la vía secundaria Umbita – puente sisa del municipio de Umbita – departamento de Boyacá

2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL:

Verificar la implementación del SG-SST, en la obra civil del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", en cumplimiento normativo, para con el reglamento único del sector trabajo decreto 1072 del 2015 y su documento anexo resolución 0312 de 2019, resolución

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación del SG-SST mediante el del plan de trabajo presentado por el contratista **CONSORCIO SISA 25.** (afiliaciones al SGSST).

- Verificar que el plan de trabajo presentado cumpla con los lineamientos del reglamento único del sector trabajo en cuanto a charlas de seguridad, vigilancia de estado de salud de los trabajadores, reporte e investigación de accidentes de trabajo.

- Verificar la conformación de la brigada de emergencia, el entrenamiento y el suministro de los elementos para la atención de emergencias (botiquín clase B o C, camilla de rescate, extintores.

- Verificación y seguimiento de la conformación de los comités reglamentarios COPASST, COCOLA. y la ejecución de las actividades de cada comité.

- Verificar la intervención a los peligros inmersos en las actividades diarias mediante el diligenciamiento

de los ATS, y los PTSA si fuere el caso.

3. INFORME GENERAL

Información del personal en obra:

El contratista **CONSORCIO SISA 25,** ha venido contratando personal para la ejecución del proyecto en número y especificaciones necesarias según la fase del mismo:

a. Relación del personal en obra en las fechas del corte.

Tabla 01. Relación del personal en obra en las fechas del corte.

#	NOMBRES	CEDULA	EPS	ARL	PENSIÓN	CCF	PLANILLA #
1	YOFRE LEÓNIDAS LÓPEZ MERCHÁN	6,773,517	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES		83556327
2	NÉSTOR ANDRÉS MEDINA ROA	1,049,618,290	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
3	JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ	6,775,637	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMFABOY	9499631254
4	ELIZABETH MAHECHA VALERO	52,797,064	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES		9499393676
5	HUGO MAURICIO SUAREZ RINCÓN	1,049,621,129	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR		6004170334
6	DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO	1,054,708,889	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR		4639980487
7	JULIÁN ANDRÉS CANTE TORRES	1,002,565,586	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	4641157704
8	CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ VELOSA	1,000,974,330	COMPENSAR	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
9	JHON ALEXANDER FONSECA RODRÍGUEZ	1,049,641,192	SANITAS	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFABOY	9499051206
10	ARTURO DIAZ MARTÍNEZ	1,056,612,043	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
11	HÉCTOR JULIO DIAZ SÁNCHEZ	1,056,612,762	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
12	JUAN CARLOS GÓMEZ SIERRA	79,873,842	SALUD TOTAL	POSITIVA	PROTECCIÓN	COMFABOY	9499631254
13	LUZ ADRIANA JUNCO	1,002,682,724	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
14	HOLMANT MORENO MENDOZA	74,329,975	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCIÓN	COMFABOY	9499631254
15	MILTON AUGUSTO PEDREROS	1,056,612,181	NUEVA EPS	POSITIVA	COLFONDOS	COMFABOY	9499631254
16	FLOR DARY PLAZAS DIAZ	1,056,612,562	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
17	JOSÉ AGUSTÍN RAMOS MARTÍNEZ	1,056,614,050	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
18	JEIDERTH DAMIÁN SEPÚLVEDA MORENO	1,007,859,149	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
19	NELSON LIBARDO SOLER CASTELBLANCO	1,056,612,577	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9499631254
20	SALVADOR VALERO SÁNCHEZ	4,291,064	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMFABOY	9499631254

NOTA: se reciben planillas de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de enero 2026 .

b. Relación del personal por parte de la interventoría

Tabla 02 relación personal de la interventoría

CARGO	NOMBRE
Director De Interventoría	Jaime Humberto Pinzón Alvarez
Residente De Interventoría	Andrés David Mendivelso Alvarez
Profesional De Aseguramiento O Gestión De Calidad	María Clara Cáceres Estupiñán
Especialista Hidráulico E Hidrológico	Claudia Rocío Suarez Castillo
Especialista En Geotecnia	Jorge Andrés Roa Romero
Especialista En Pavimentos	Hernando Andrés Alvarez Arévalo

c. Relación de personal retirado

Tabla 03, Relación de personal retirado

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Arturo Diaz Martínez	1056612043

d. Relación de maquinaria en obra

En esta fase del proyecto el contratista **CONSORCIO SISA 25**, relaciona la siguiente maquinaria usada en el desarrollo de varias actividades:

EQUIPOS	CANTIDADES
Estación total topográfica	1
RTK	1
Retroexcavadora de oruga	1
Excavadora sobre llantas tipo pajarita.	1
Motoniveladora	1
Vibro compactador	1
Camión carro tanque.	1

Tabla 4. Relación de vehículos, Periodo del 1 al 28 de febrero de 2026.

No	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA				
	TIPO	**PLACA**	**RTM**	**SOAT**	**CONDUCTOR**
1	Volqueta	UFZ964	CERTIFICADO 175967567	PÓLIZA 23-09-2026	NÉSTOR OSWALDO CASTIBLANCO MARTÍNEZ

Nota: el contratista adjunta documentación anterior referenciada vigente**.**

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

a. Las actividades ejecutadas en esta fase del proyecto fueron:

Descripción de actividades técnicas de obra.

El contratista en esta fase del proyecto realizo las siguientes actividades:

- Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a máquina incluye cargue y acarreo libre de 5km
- Esta actividad comprende en el cajeo para la instalación de pedraplén.
- Suministro, extendida y compactación de material para afirmado hasta un diámetro de 2" y un índice plástico menor o igual 9% y compacto al 95% Proctor, incluye acarreo libre 5 km (**)
- Esta actividad es para la renivelación y conformación de la subrasante.
- Conformación de botadero o escombrera
- Se refiere a la cantidad de material proveniente de excavaciones.
- Excavaciones mecánicas varias en material común seco
- Excavación para la posterior instalación de filtro.
- Construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000
- Construcción de filtro
- Suministro e instalación tuberia pvc d=4" drenaje sin filtro
- Construcción de filtro
- Pedraplén compacto
- Instalación de pedraplén
- Transporte de material de afirmado y/o granulares despues de 5km
- Transporte de afirmado para la nivelación de la subrasante

Nota: interventoría ha solicitado que todas las actividades se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

5. ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños aprobados.
- Verificación de afiliaciones y aportes a la seguridad social de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Verificación del suministro de la dotación y de los EPP'S por parte del contratista a los trabajadores.
- Verificación del uso de los EPP'S durante la jornada laboral.
- Verificación de la implementación del plan de trabajo en SST por parte del contratista.
- Verificación del cumplimiento con el PAGA.
- Verificación del cumplimiento con el PMT.
- Acompañamiento y asesoría por parte de la líder SST al residente SST del contratista en la ejecución de actividades del SG-SST.

6. LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENIDOS POR EL CONTRATISTA SISA 2025 FUERON:

El contratista CONSORCIO SISA 25, realizo la intervención a los riesgos inmersos en cada actividad implementando el SG-SST contemplado en el del decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 de 2019, junto a la resolución 4272 del 2021.

La intervención se hizo en cuanto a los siguientes aspectos:

Afiliación al SGSST, realización de capacitaciones, pago de aportes a seguridad social en salud, suministro de EPP'S y Dotación, suministro de unidad sanitaria y punto de hidratación.
Realización de los ATS, inspección a la maquinaria amarilla.
Implementación del plan de trabajo vigencia 2026.

RIESGOS	CONSECUENCIA	MEDIDA DE INTERVENCIÓN
Riesgos biomecánicos: generados por la posición en bipedestación más del 99 % de la jornada laboral, sumado de manejo de herramientas manuales y manipulación manual de cargas.	Posible dolores o molestias osteomusculares, fatiga muscular, machucón en las manos, colpes en las piernas, tensión muscular, calambres. Posible caída a distinto nivel.	Calistenia diaria Pausas activas Verificación del estado de salud de los trabajadores. Actividad programada por cuadrillas. Mantenimiento a las carretillas Revisión a las herramientas manuales.
Riesgo psicosocial: Las actividades fueron rutinarias, monótonas y con alta carga mental y de concentración.	Estrés laboral Fatiga física Fatiga emocional Estrés laboral	Descansos y programación de actividades alternadas. Verificación del estado de salud. Pausas activas. Programación y coordinación de las actividades.
Riesgo físico:	Lesiones leves, graves.	Suministro y uso de los EPP'S,

Ruido: Generado por la condición ambiental asociada al uso de maquinaria amarilla, herramienta manual **Vibración:** generada por la maquinaria amarilla las volquetas etc. y vehículos para el acopio de materiales. **Temperaturas extremas:** Generada por la exposición a temperaturas extremas, según los cambios climáticos	Posible trauma y lesiones leves o graves a nivel osteomuscular. Posibles accidentes de trabajo. Posible golpe de calor, fatiga muscular	(protección auditiva). Actividades alternas Descansos en la jornada laboral Suspensión de actividades en tiempo de lluvias fuertes.
Riesgo químico: este factor de riesgo se presentó durante la ejecución de esta fase del proyecto debido a la manipulación de productos o sustancias químicas como componentes del cemento, la oxidación de los aceros, los productos químicos componentes del pegante y limpiador de tuberías.	Posible irritación de la piel, alergias. Posible lesión en ojos Enfermedades gástricas ocasionado por el olor o inhalación del material particulado, generado por el polvillo del cemento e inflación de los productos químicos	Suministro y uso de EPP'S como protección auditiva, guantes. Suministro de ropa de labor (overol), suministro de tapabocas.

a. AUSENTISMO LABORAL

AUSENTISMO POR ACCIDENTE E INCIDENTES DE TRABAJO

Durante esta fase del proyecto el contratista no reportó accidentes de trabajo.

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN

No se reportó ausentismo por esta causa.

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista entrego los siguientes elementos de protección personal a los trabajadores:

- Guantes

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Protección auditiva
- Monogafas o gafas de seguridad

Nota: los registros entregados por el contratista son:

- 4 formatos de ATS
- 13. Registros de entrega de EPPS
- 1 formato de inspección a EPPS
- 6 registros de asistencia a capacitaciones
- 4 formato inspección a motoniveladora.
- 4 formatos de inspección a oruga.
- 4 formatos inspección a la volqueta

8. ACTIVIDADES DEL SG-SST (DOCUMENTOS, CAPACITACIONES EJECUTADAS)

El contratista de obra adjunta registro de asistencia a las siguientes capacitaciones:

TEMA	FECHA
Orden y aseo en frentes de trabajo	11-02-2026
Comunicación segura entre trabajadores y operadores de maquinaria	11-02-2026
Riesgos por uso de maquinaria pesada	19-02-2026
Atrapamientos y golpes por equipos en movimiento	19-02-2026
Uso seguro de herramientas manuales y eléctricas	27-02-2026

INSPECCIONES

Inspecciones: el contratista adjunta los formatos de ATS y de inspecciones realizadas a las volquetas y a la motoniveladora

CONCEPTOS MEDICOS LABORALES

En esta fase del proyecto hubo ingresos ya que se reiniciaron actividades el día 13 de enero 2026, se debe revisar los conceptos médicos laborales del personal nuevo las afiliaciones al sistema general de seguridad social en salud.

Actas comités reglamentarios:

El contratista no presento acta de COPASST ni del CCL

9. EVIDENCIAS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST.





10. OBSERVACIONES

El contratista debe:

- Continuar con la implementación del SG-SST mediante charlas de seguridad, soportadas con listas de asistencia y registro fotográfico y programadas en el plan de trabajó presentado.
- El contratista debe hacer el diagnostico de condiciones de salud y seguimiento a los conceptos médicos laborales ya que se presento un preinfarto en la población trabajadora.
- No se evidencia la entrega y socialización de los conceptos médicos laborales a los trabajadores y del diagnóstico de condiciones de salud (adjuntar evidencia de notificación a cada trabajador)
- Debe continuar con la entrega y reposición de EPPS, (botas de caucho con puntera, barbuquejos para los cascos, gafas de seguridad, cofias o cuellos) llevando registro de entrega
- Continuar con la entrega de dotación, evidenciando la entrega mediante registró de entrega
- El contratista debe continuar con la inspección a los equipos y herramientas de trabajo.
- Realizar los ATS diarios y adjuntarlos.
- La contratista debe continuar adjuntando los preoperacionales de las volquetas de manera legible.
- El contratista en el informe del componente de seguridad industrial no adjunto paz y salvos y conceptos médicos de retiro del personal retirado ni los relaciono en el cuadro diseñado para tal fin.

.

REALIZO	**MARÍA CLARA CÁCERES E**	**REVISO Y APROBÓ:**	**JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**
CARGO	SISO Interventoría	**CARGO**	Director de interventoría
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA INICIO CORTE	01 de febrero de 2026	**FECHA FINAL CORTE**	28 de febrero de 2026

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	24

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	9	2	2026	1.2 SEMANA: Del 02/02/2026 hasta 08/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-001-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IPVO-017-2025		
1.4 CONTRATISTA:				1.7 INTERVENTOR:			
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	2	7	2026		2	7	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Soleado	Soleado	Soleado	Nublado	Soleado	Soleado	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realizan excavaciones mecánicas para construcción de cajeo e instalación de pedraplén y subbase granular.*
** Se realizan excavaciones mecánicas para terminación construcción de filtro en abscisas de K8+050 a K8+360.*
** Se continúa la construcción de filtro en abscisas de K8+050 a K8+360.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	10	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA	10	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	5.26	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	5.26	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	12.00%
% AVANCE DE OBRA	16.50%
% DE ATRASO	-4.50%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	52.63%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	52.63%

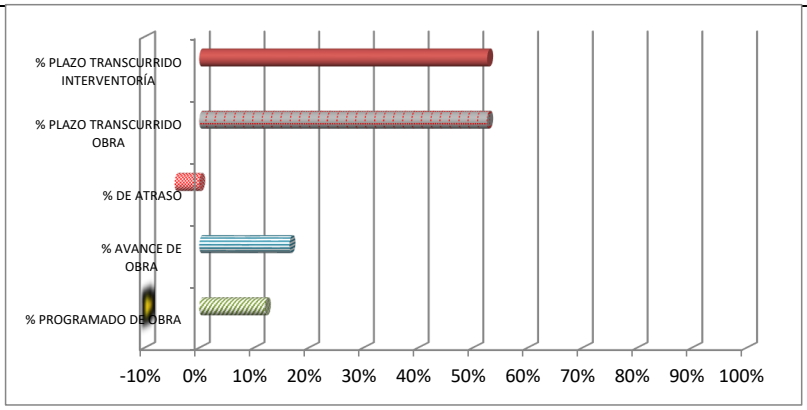

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta avance de obra, respecto al avance programado, sin embargo se solicita a contratista de obra continuar con los rendimientos para evitar posibles retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de los concretos fundidos en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de balance de obra.
8. Entrega de certificados de calidad de los materiales usados en obra.
9. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
10. Entrega de informe mensual en los plazos establecidos y pactados.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.
7. Se realiza comité técnico de obra #11, contando con presencia de supervisión, contratista de obra e interventoría.

5. FIRMAS

Firma: _____

Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO SISA 25
R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Construcción de filtro de drenaje.



Descripción de la fotografía:
Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Descripción de la fotografía:
Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Descripción de la fotografía:
Construcción de filtro de drenaje.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	25

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	16	2	2026	1.2 SEMANA: Del 09/02/2026 hasta 15/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-001-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IPVO-017-2025		
1.4 CONTRATISTA:				1.7 INTERVENTOR:			
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	2	7	2026		2	7	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Soleado	Nublado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realizan excavaciones mecánicas para construcción de cajeo e instalación de pedraplén y subbase granular.*
** Se realizan excavaciones mecánicas para terminación construcción de filtro en abscisas de K8+050 a K7+660..*
** Se continúa la construcción de filtro en abscisas de K8+050 a K7+950.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	10	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA	10	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	5.49	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	5.49	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	13.03%
% AVANCE DE OBRA	19.50%
% DE ATRASO	-6.47%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	54.93%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	54.93%

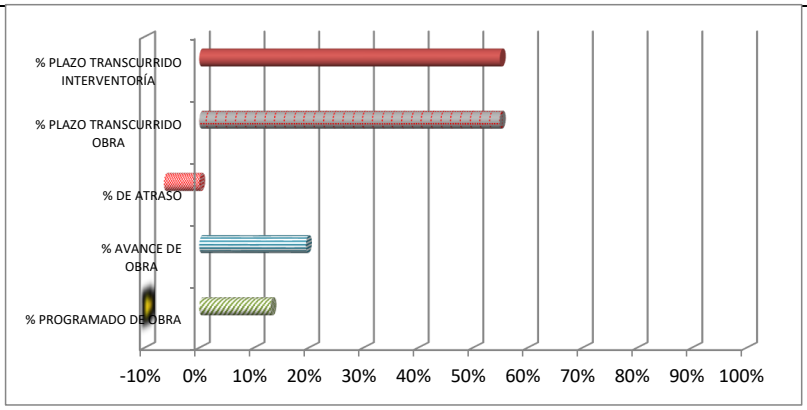

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta avance de obra, respecto al avance programado, sin embargo se solicita a contratista de obra continuar con los rendimientos para evitar posibles retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de los concretos fundidos en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de balance de obra.
8. Entrega de certificados de calidad de los materiales usados en obra.
9. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
10. Entrega de informe mensual en los plazos establecidos y pactados.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.
7. Se realiza visita a sitio de cantera prevista en estudios y diseños para verificación de disponibilidad de material requerido para la ejecución del proyecto, visita se efectúa en conjunto con contratista de obra, interventoría y personal de la supervisión de la entidad contratante.

5. FIRMAS

Firma: _____

Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO SISA 25
R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Descripción de la fotografía:
Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Descripción de la fotografía:
Excavación mecánica para mejoramiento de suelo mediante instalación y compactación de pedraplén.



Descripción de la fotografía:
Excavaciones mecánicas para construcción de filtro de drenaje.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	26

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	23	2	2026	1.2 SEMANA: Del 16/02/2026 hasta 22/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-001-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IPVO-017-2025		
1.4 CONTRATISTA:				1.7 INTERVENTOR:			
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	2	7	2026		2	7	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Nublado lluvias leves	Nublado lluvias leves	Nublado	Nublado	Nublado	Soleado	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realiza levantamiento topográfico de conformación de sub rasante, materializando anchos de vías y niveles, mediante estacas testigos y chaflanes.*
** Se realiza extendido y compactación de afirmado para conformación de sub rasante.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	10	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA	10	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	5.72	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	5.72	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	14.02%
% AVANCE DE OBRA	22.50%
% DE ATRASO	-8.48%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	57.24%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	57.24%

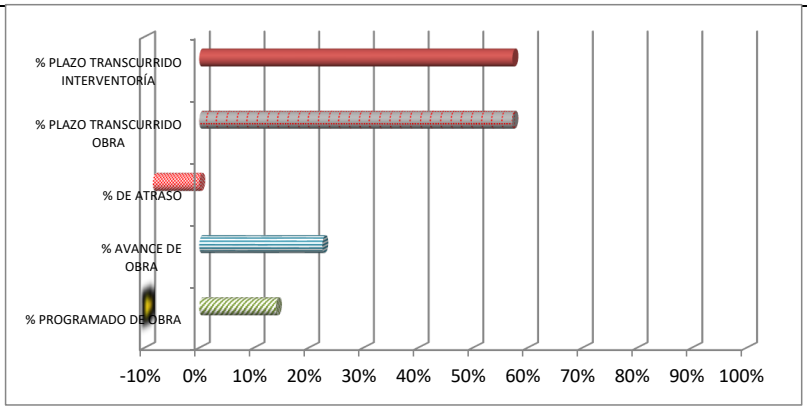

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta avance de obra, respecto al avance programado, sin embargo se solicita a contratista de obra continuar con los rendimientos para evitar posibles retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de los concretos fundidos en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de balance de obra.
8. Entrega de certificados de calidad de los materiales usados en obra.
9. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
10. Entrega de informe mensual en los plazos establecidos y pactados.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.
7. Se realiza comité de obra #12 en compañía de contratista de obra, supervisión de la entidad contratante e interventoría.

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma:** _____
Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**Nombre: CONSORCIO SISA 25**
	R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Descripción de la fotografía:
Compactación de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Descripción de la fotografía:
Realización de comité de obra #12.



Descripción de la fotografía:
Compactación de material granular para conformación de subrasante del proyecto.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	27

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	2	3	2026	1.2 SEMANA: Del 23/02/2026 hasta 01/03/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-001-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IPVO-017-2025		
1.4 CONTRATISTA:				1.7 INTERVENTOR:			
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	2	7	2026		2	7	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Nublado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realiza levantamiento topográfico de conformación de sub rasante, materializando anchos de vías y niveles, mediante estacas testigos y chaflanes.*
** Se realiza extendido y compactación de afirmado para conformación de sub rasante.*
** Se realizan excavaciones mecánicas y la construción de filtro entre las abcisas K8+050 - K8+190 y K8+580 - K8+640 y K7+960 - K8+040.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	10	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA	10	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	5.92	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	5.92	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	15.01%
% AVANCE DE OBRA	23.51%
% DE ATRASO	-8.50%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	59.21%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	59.21%

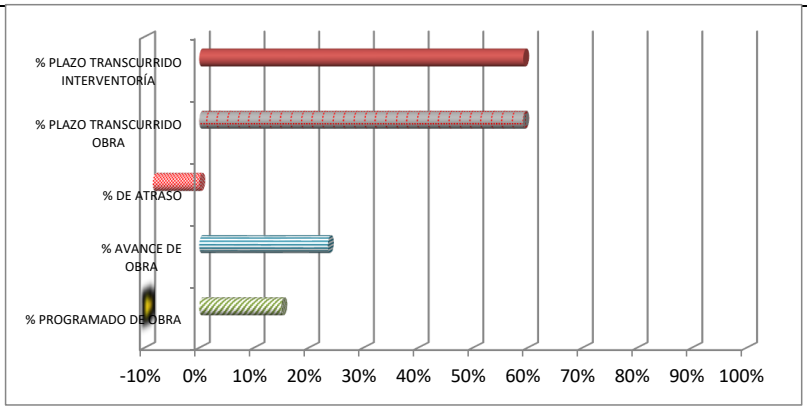

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta avance de obra, respecto al avance programado, sin embargo se solicita a contratista de obra continuar con los rendimientos para evitar posibles retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de los concretos fundidos en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de balance de obra.
8. Entrega de certificados de calidad de los materiales usados en obra.
9. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
10. Entrega de informe mensual en los plazos establecidos y pactados.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma:** _____
Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**Nombre: CONSORCIO SISA 25**
	R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Descripción de la fotografía:
Extendida de material granular para conformación de subrasante del proyecto.



Descripción de la fotografía:
Construcción de filtro de drenaje.



Descripción de la fotografía:
Construcción de filtro de drenaje.

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
TIERRASUA S.A.S
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

El suscrito, JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con C.C. No 7.172.271 expedida en Tunja, en calidad de Director de interventoría de la firma empresa JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, con NIT 7.172.271 - 2, y representada legalmente por JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, certifico que la empresa JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, se encuentran al día en pagos por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Art 23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.

Dada en Tunja al dos (02) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. TIERRASUA SAS / ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

cc. Archivo general.

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JAIME HUMBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 7172271, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ con documento CC 7172271, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6007008570	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2026	Periodo Cotización Salud	ENERO/2026
Fecha Pago	2026/02/26	Número de Autorización	92007624

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7172271	2	JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 30 10-36		3174340986			LIQUIDACIONPLANILLAPILA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36358547	E	2026-02-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.666.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36358547	2026-02-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7181652	ALVAREZ VALLEJO HERNANDO ANDRES	1.750.905	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.050.543	42.100	COMFABOY-CCF10	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5429001
2	CC 40044917	MOZO PULIDO SANDRA PATRICIA	1.750.905	F	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	1.050.543	168.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.050.543	42.100	COMFABOY-CCF10	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5429001
3	CC 52351443	SUAREZ CASTILLO CLAUDIA ROCIO	1.750.905	F	X															0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	1.050.543	168.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.050.543	42.100	COMFABOY-CCF10	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5429001
4	CC 1054254612	MENDIVELSO ALVAREZ ANDRES DAVID	3.715.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	2.229.000	356.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.229.000	89.200	COMFABOY-CCF10	2.229.000	89.200	2.229.000	155.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	690.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7172271	2	JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 30 10-36		3174340986			LIQUIDACIONPLANILLAPILA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36358547	E	2026-02-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.666.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36358547	2026-02-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.380.629	5.380.629	5.380.629	5.380.629	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	861.000	0	0	0	861.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	524.800	0	0	0	524.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	168.100	0	0	0	168.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	168.100	0	0	0	168.100
EPS(Administradoras: 2)				4	215.500	0	0	0	215.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	173.400	0	0	0	173.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	42.100	0	0	0	42.100
ARP(Administradoras: 1)				4	374.800	0	0	0	374.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	374.800	0	0	0	374.800
CCF(Administradoras: 1)				4	215.500	0	0	0	215.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	215.500	0	0	0	215.500
Gran Total					1.666.800	0	0	0	1.666.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39724228
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CLARA CACERES ESTUPINAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7411111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4635164022**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995128715	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 227.800	$ 1.500	$ 229.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.500**	**$ 229.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 178.000	$ 1.200	$ 0	$ 179.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 179.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39724228	CACERES ESTUPINAN MARIA CLARA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	39724228	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 416.100

Planilla Pagada

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE OBRA EXPEDIDA POR INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE PAGO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
TIERRASUA S.A.S
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

El suscrito, JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con C.C. No 7.172.271 expedida en Tunja, en calidad de Director de interventoría de la firma empresa JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, con NIT 7.172.271 - 2, y representada legalmente por JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, certifico que CONSORCIO SISA 25, se encuentra a paz y salvo hasta el mes de enero de 2026 por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Art 23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.

Dada en Tunja al dos (02) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. TIERRASUA SAS / ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

cc. Archivo general.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969390	5	CONSORCIO SISA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	59434310	9499631254	E	2026/02/20	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0	$6,064,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1056612043	DIAZ ARTURO	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000	No	$26,200
2	CC	1056612762	DIAZ HECTOR	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$36,500	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$291,818	$14,700	No	$130,000
3	CC	6775637	GOMEZ JAIME																		25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$412,500	CCF10	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$229,700	30	$3,300,000	$165,000	No	$1,467,200
4	CC	79873842	GOMEZ JUAN	X																	230201	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$94,900	CCF10	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	$52,900	13	$758,726	$38,000	No	$337,600
5	CC	1002682724	JUNCO LUZ	X																	230301	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$124,100	CCF10	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	$69,100	17	$992,180	$49,700	No	$441,400
6	CC	1000974330	MARTINEZ CAMILO	X																	230301	15	$875,453	$140,100	EPS008	15	$875,453	$109,500	CCF10	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900	No	$389,600
7	CC	1049618290	MEDINA NESTOR	X																	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS017	19	$1,108,907	$138,700	CCF10	19	$1,108,907	$44,400	14-23	19	$1,108,907	$77,200	19	$1,108,907	$55,500	No	$493,300
8	CC	74329975	MORENO HOLMANT	X																	230201	15	$875,453	$140,100	EPS041	15	$875,453	$109,500	CCF10	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900	No	$389,600
9	CC	1056612181	PEDREROS MILTON	X																	231001	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$73,000	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$583,635	$29,300	No	$259,800
10	CC	1056612562	PLAZAS FLOR	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS041	18	$1,050,543	$131,400	CCF10	18	$1,050,543	$42,100	14-23	18	$1,050,543	$73,200	18	$1,050,543	$52,700	No	$467,500
11	CC	1056614050	RAMOS JOSE	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
12	CC	1007859149	SEPULVEDA JEIDERTH	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS041	14	$817,089	$102,200	CCF10	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	$56,900	14	$817,089	$41,000	No	$363,600
13	CC	1056612577	SOLER NELSON	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$36,500	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$291,818	$14,700	No	$130,000
14	CC	4291064	VALERO SALVADOR	X																	231001	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$109,500	CCF10	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900	No	$389,600
Total	**Afiliados(14)**																						$13,630,344	$2,181,300			$13,630,344	$1,704,500			$13,630,344	$545,900			$13,630,344	$949,500		$13,630,344	$683,000		$6,064,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969390	5	CONSORCIO SISA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	59434310	9499631254	E	2026/02/20	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0	$6,064,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,181,300	$0	$0	$2,181,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$233,500	$0	$0	$233,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,158,300	$0	$0	$1,158,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$261,500	$0	$0	$261,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$949,500	$0	$0	$949,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$949,500	$0	$0	$949,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$545,900	$0	$0	$545,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	$545,900	$0	$0	$545,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$1,704,500	$0	$0	$1,704,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$109,500	$0	$0	$109,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$357,600	$0	$0	$357,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,600	$0	$0	$160,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$452,600	$0	$0	$452,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,900	$0	$0	$94,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$529,300	$0	$0	$529,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$409,600	$0	$0	$409,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$409,600	$0	$0	$409,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$273,400	$0	$0	$273,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$273,400	$0	$0	$273,400
TOTAL				14	$6,064,200	$0	$0	$6,064,200

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 09:47:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83556327

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN		
Documento	CC6773517	**Dirección**	CL 20 #18 - 82
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7400099
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6773517	YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 1.400	$ 500.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797064		MAHECHA VALERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58D #1A-27Este	TUNJA-BOYACA	7428006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	46076778	9499393676	I	2026/02/16	2026/02/09	NEQUI	0	$233,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 52797064	MAHECHA ELIZABETH	25-14	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$102,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797064		MAHECHA VALERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58D #1A-27Este	TUNJA-BOYACA	7428006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	46076778	9499393676	I	2026/02/16	2026/02/09	NEQUI	0	$233,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,800	$0	$0	$130,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$130,800	$0	$0	$130,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$102,200	$0	$0	$102,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$102,200	$0	$0	$102,200
TOTAL				**1**	**$233,000**	**$0**	**$0**	**$233,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049621129
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HUGO MAURICIO SUAREZ RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004170334**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		80069480

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 282.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 282.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 220.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 43.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 43.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 4.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 546.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1054708889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO ALEXNADER CASTANEDA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 26 N 25 35	TELÉFONO:	3322336
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4639980487**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2030418169

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 121.900
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 121.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD					ARP											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1054708889	CASTANEDA ARANGO DIEGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	105470888	$ 121.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 621.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1054708889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO ALEXNADER CASTANEDA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 26 N 25 35	TELÉFONO:	3322336
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4641157704**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995618701

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.100	$ 0	$ 168.100
SUBTOTALES:										**$ 168.100**	**$ 0**	**$ 168.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
SUBTOTALES:													**$ 42.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.200	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 73.200
SUBTOTALES:									**$ 73.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 42.100	$ 0	$ 42.100
SUBTOTALES:			**$ 42.100**	**$ 0**	**$ 42.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COT. EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002565586	CANTE TORRES JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	NUEVA EPS CM	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.050.543	105470888	$ 73.200	18	$ 1.050.543	CCF10-COMFABOY	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 325.500

SuAporte | factura

Fecha creación reporte: 2026-02-14, 10:33:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 83737687

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

Fecha limite de pago: 2026-03-10

PAGADA 14/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR DELFIN MOLINA MOLINA				
Documento	CC7163340	**Dirección**	CR 2E #20 - 04		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118483415		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7163340	MOLINA MOLINA HECTOR DELFIN	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 76.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300	$ 0	$ 575.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049644228		CRISTIAN FABIAN ROJAS RODRIGUEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTIAN ROJAS	CALLE 7 # 13 12	TUNJA-BOYACA	3134814561	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	44603863	9499051206	E	2026/02/06	2026/02/09	BANCOLOMBIA	3	$2,803,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CRISTIAN ROJAS (10 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: OPERARIOS (3 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																																
1	CC	1049641192	FONSECA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER	X																		25-14	18	EPS005	18	CCF10	18	14-4	18	6.960%	18	Si
2	CC	1051210442	RODRIGUEZ MORENO LUIS ALEJANDRO	X																		230301	18	EPS017	18	CCF10	18	14-4	18	6.960%	18	Si
3	CC	1055227559	TENJO BAUTISTA FABIO ORLANDO	X																		231001	18	EPS017	18	CCF10	18	14-4	18	6.960%	18	Si
Centro de Trabajo: TRASPORTE (7 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (7 Afiliados)																																
4	CC	7170836	AMAYA QUINTERO JIMMY	X																		25-14	18	EPS037	18	CCF10	18	14-4	18	4.350%	18	Si
5	CC	6776102	AMAYA QUINTERO JOSE ALONSO	X	X																	230301	2	EPS037	2	CCF10	2	14-4	2	4.350%	2	Si
6	CC	1049627759	AMAYA VARGAS JUAN CAMILO	X																		230301	18	EPS037	18	CCF10	18	14-4	18	4.350%	18	Si
7	CC	7188315	CASTIBLANCO MARTINEZ NESTOR OSWALDO	X																		230301	18	EPS037	18	CCF10	18	14-4	18	4.350%	18	Si
8	CC	7178212	GONZALEZ VARGAS OMAR HERNAN	X																		230301	18	EPS005	18	CCF10	18	14-4	18	4.350%	18	Si
9	CC	7165670	PULIDO ARCHILA JAIRO	X																		25-14	18	ESSC24	18	CCF10	18	14-4	18	4.350%	18	Si
10	CC	7183569	RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO	X																		230201	18	EPS005	18	CCF10	18	14-4	18	4.350%	18	Si
Total			**Afiliados(10)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,531,600	$3,200	$0	$1,534,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$168,100	$400	$0	$168,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$504,300	$1,000	$0	$505,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$691,100	$1,400	$0	$692,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$168,100	$400	$0	$168,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$498,900	$1,000	$0	$499,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$498,900	$1,000	$0	$499,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$383,600	$800	$0	$384,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$383,600	$800	$0	$384,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$383,600	$900	$0	$384,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$42,100	$100	$0	$42,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$84,200	$200	$0	$84,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$131,000	$300	$0	$131,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$126,300	$300	$0	$126,600
TOTAL				**10**	**$2,797,700**	**$5,900**	**$0**	**$2,803,600**

CER_AFI_2026019527175

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Jose Bernabe Mendoza Sanchez identificado con CC. 74329901 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO SISA 25	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901969390

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/02/23	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de febrero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22022026N74329901A10394274.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

CER_AFI_2026017148219

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Hector Andres Moreno Huertas identificado con CC. 1033691318 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO SISA 25	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901969390

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/02/11	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 10 días del mes de febrero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC10022026N1033691318A8127447.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

PÓLIZAS INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	**TUNJA**	**39**	**39-44-101174421**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**02**	**2026**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**20**	**07**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
PINZON ALVAREZ, JAIME HUMBERTO	**CC: 7.172.271**	3143600483

DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 12 - 84 OF 201 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
TIERRASUA S.A.S.	**NIT: 901.285.377-2**	3108808902

DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA MBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE MBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACA. CONTRATO No. IPVO 017-2025

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/08/2025**	**04/01/2027**	**$36,830,217.40**	**$36,830,217.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/08/2025**	**04/07/2029**	**$36,830,217.40**	**$36,830,217.40**
CALIDAD DEL SERVICIO	**19/08/2025**	**04/07/2031**	**$73,660,434.81**	**$73,660,434.81**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******147,320,869.61	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101174421

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101174421	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2026	19	08	2025	00:00	20	07	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PINZON ALVAREZ, JAIME HUMBERTO		**CC: 7.172.271**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 12 - 84 OF 201	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3143600483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	TIERRASUA S.A.S.		**NIT: 901.285.377-2**
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108808902

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101174421

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	**TUNJA**	**39**	**39-40-101045618**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**02**	**2026**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**04**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PINZON ALVAREZ, JAIME HUMBERTO	**CC: 7.172.271**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 12 - 84 OF 201	TUNJA, BOYACA	3143600483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	**NIT: 901.285.377-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACA CONTRATO No. IPVO 017-2025.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS Y TIERRASUA S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT 901.285.377-1

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**04/07/2026**	**$350,181,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**04/07/2026**	**$350,181,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**04/07/2026**	**$350,181,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO AL SALARIO MINIMO AÑO 2026.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******47,002.00	$ *******3,000.00	$ *******9,500.00	$ ***********59,503.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101045618

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101045618	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2026	19	08	2025	00:00	04	07	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PINZON ALVAREZ, JAIME HUMBERTO		**CC: 7.172.271**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 12 - 84 OF 201	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3143600483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	TIERRASUA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 901.285.377-2**
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**04/07/2026**	**$350,181,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**04/07/2026**	**$350,181,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**04/07/2026**	**$350,181,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101045618

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101045618	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2026	19	08	2025	00:00	04	07	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PINZON ALVAREZ, JAIME HUMBERTO		**CC: 7.172.271**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 12 - 84 OF 201	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3143600483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	TIERRASUA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 901.285.377-2**
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101045618

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
