	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	JULIO	**INFORME No.**	**2**	DEL	**20/06/2025**	AL	**19/07/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	OBRAS DE CANALIZACIÓN, CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA QUEBRADA SABANETICA, DESDE EL PASAJE 4 SECTOR CAÑAVERALEJO HASTA LA CARRERA 45A DEL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Quebrada Sabanetica, desde el callejón Nro 4 hasta la Cra 45 A

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			
CONTRATO No.:	SAB-01-2078-25			CONTRATO No.:	SAB-01-2077-25		
PLAZO INICIAL:	226 DIAS			PLAZO INICIAL:	226 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de ,mayo de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	20 de ,mayo de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	226			PLAZO ACTUALIZADO:	226		
PLAZO TRANSCURRIDO:	60,0	EQUIVALE AL	26,55%	PLAZO TRANSCURRIDO:	60,0	EQUIVALE AL	26,55%
VALOR INICIAL :	$ 7.416.111.464			VALOR INICIAL :	$ 710.076.093		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7.416.111.464			VALOR ACTUALIZADO:	$ 710.076.093		
VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL		VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL	
VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL		VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL	
SUPERVISOR	ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA			INTERVENTOR:	COMPAÑÍA DE INGENIEROS S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		
contrato de INTERVENTORIA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	JULIO	INFORME No.	2	DEL	20/06/2025	AL	19/07/2025

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE

En este swegundo período (junio 20 y julio 19 de 2025) se realizan las siguientes actividades:
• Comisión de topografía para el levantamiento del canal
• Ingreso de material a obra: madera, zinc, tornillería, polietileno, sarán, herramienta menor
• inician con excavaciones, para la construccion del Boxcolvert en zona 3
• inician con el armado de refuerzo, formaleteado y vaciado de concreto del Boxcolvert en zona 3

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

Interventiría
• RPC 3750
• RPC 3754
• RPC 3809
Obra
• RPC 3893
• RPC 3749

FECHA	JULIO	INFORME No.	2	DEL	20/06/2025	AL	19/07/2025

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se continuan las actividades dee obra, segun planos e indicaciones entregadas por el ingeniero consultor Carlos Vasquez.
- Se realiza comites de obra para conocer el avance de las mismas y dar soluciones con respecto a situaciones presentadas.

ADMINISTRATIVOS:

• Se esta revisando el presupuesto y elaborando programacion
• Una vez se cuente con el presupuesto definitivo, se solicitará un cronograma que incluya la totalidad de las actividades y el plan de intervención
• Se le solicita al contratista de obra e interventoria organizar toda la información necesaria para la legalizacion del contrato.

AMBIENTALES:

• se realizan los respectivos controles ambientales en los diferentes frentes de obra
• Se mantienen en obra las medidas preventivas de contaminación del recurso suelo; uso de plástico para acopias materiales e insumos de obra, etc.
• El contratista de obra está pendiente de darle cumplimiento al cronograma de capacitaciones y/o sensibilización ambiental.
• En este mismo orden de ideas se ejecutan y se les hace seguimiento a los demás programas de manejo ambiental presentado en el plan socio ambiental de obra y que están relacionado indirectamente con las medidas preventivas, de control, minimización o solución presentadas anteriormente.

SOCIALES:

- Se realiza socialización con las comunidad.
- Se continuan on las actas de vecindad y entorno.
- Se atienden quejas puntuales del colegio el Remanso

LEGALES:

- Se continua con los tramites para la legalizacion de los contratos.

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES


No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto

FECHA	JULIO	INFORME No.	2	DEL	20/06/2025	AL	19/07/2025

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO



Excavaciones para la construccion del canal abierto. Tramo 3

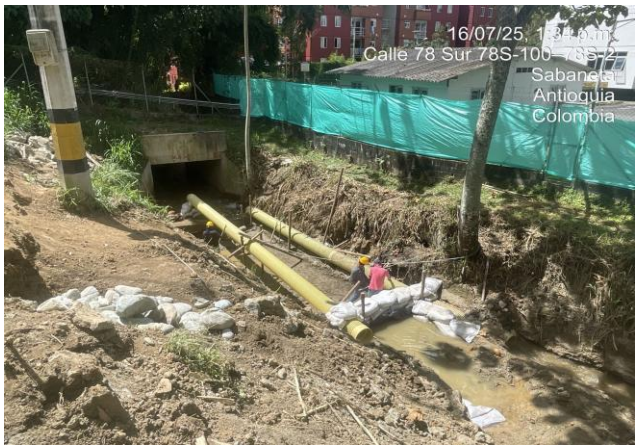

Manejo de aguas. Tramo 3



Demolicion de piedra . Tramo 3



Socializacion personal colegio el Remanso . Tramo 4



Instalacion de tela verde. Tramo 6



Excavacion para construccion de gaviones. Tramo 7

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Ana Milena Molina Osorio

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa
