Consorcio Vias Colombia 055

CASAHIDALGO CONSTRUCTORES

Villagarzón, 01 de Diciembre del 2025

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
Fecha y hora: Lunes 1 Diciembre 2025 20:55:52
Dirigido a: CONSORCIO VIAL JAC 2022

Enviado por: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Procesado por: SANDRA VIVIANA ERAZO BERNAL
Asunto: Remisión – Acta Parcial de Obra No. 41, del 1 a 30 de Noviembre de 2025
CS-CV55-25-CL-0507

Ingeniero
RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Consorcio Vial JAC 2022
Transversal 55A # 115A-06
Villagarzón, Putumayo.
correspondencia@g-proyectos.com.co

Referencia: **Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022**. "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Villagarzón - San José de Fragua y puente sobre el río Caquetá en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá en marco de la reactivación económica, mediante el programa de las vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2,0"

Asunto: **Remisión –** Acta Parcial de Obra No. 41, del 1 a 30 de Noviembre de 2025

Cordial Saludo, Ingeniero Pérez.

De conformidad con el Instructivo Único de Facturación del INVIAS y el Manual de Interventoría, nos permitimos entregar el Acta Parcial de Obra No. 40 correspondiente al período comprendido desde el 1 a 30 de Noviembre de 2025, junto con los documentos que se relacionan a continuación, los que se podrán descargar del enlace adjunto al final de este comunicado:

00. Hoja de Ruta y Orden de Pago MEPI-MN1-IN-4-FR-2.
01. Factura Proforma.
02. Acta de Recibo Parcial MEPI-MN1-IN-4-FR-1.
03. Afectación Presupuestal AFINCO-FR-12.
04. Identificación de la Distribución AFINCO-FR-13.
06. Certificado pago Parafiscales y Seguridad.
07. Copia RUT Contratistas e Integrantes.
08. Informe Financiero y Presupuestal MEPI-MN1-IN-15-FR-8.
09. Acta de modificación de cantidades 05 MEPI-MN1-IN-7-FR-1.
10. Acta de fijación de ítem NP MEPI-MN1-IN-10-FR-4.
11. Seguimiento Programa Inversión MEPI-MN1-IN-6-FR-2.
12. Pre-acta de obra.
12.1 Memoria de Calculo.
14. Aprobación parcial de EYD MEPI-MN1-IN-1-FR-4.
14.1 Pre-acta estudios y diseños porcentajes.
14.2 Pre-acta estudios y diseños recursos.
15. Pre-acta Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-3.
16. Pre-acta Social MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.
17. Pre-acta Predial MASPS-MN1-IN-5-FR-11, MASPS-MN1-IN-5-FR-10, MASPS-MN1-IN-5-FR-09, MASPS-MN1-IN-5-FR-08
18. Pre-acta Sostenibilidad MASPS-MN-IN1-6-FR-4.
19. Anexo-1 (Certificación bancaria).
20. Anexo-2 Poder Especial Luis Carlos Romo Velasco.

Cordialmente,

LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Director de Obra
Consorcio Vías Colombia 055

Anexos: Lo indicado

Enlace de descarga: 251201_CVC055_Acta Parcial Obra 41 nov25

Radicado Interno: N/A

CC. Ing. Ricardo Burbano Barcenas – Director Territorial – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS: jburbano@invias.gov.co
Cesar Malaver Díaz: cmalaver@casahidalgo.com.co
Jaime Sánchez García: jsanchez@casahidalgo.com.co
Leonardo Molina Montero: lmolina@casahidalgo.com.co
Sergio Paguay Fajardo: spaguay@hehcol.com
Diego Sebastián Molina: smolina@casahidalgo.com.co
Santiago Correa Serna: scorrea@casahidalgo.com.co
Paulo Cesar Zuluaga: pzuluaga@Casahidalgo.com.co
Archivo

PERIODO:NOVIEMBRE2025 **CVC 055 Acta de Obra 41, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada** **Contrato:** 985 DE 2022					**PROFORMA No. CVC055 -072**
TOTAL ACTA DE OBRA No. 41	**$ 2,480,017,144.00**				
Valor Basico de Obra		1	$	1,665,481,910.00	1,665,481,910.00
Administracion	20.00%	1	$	333,096,382.00	333,096,382.00
Imprevistos	5.00%	1	$	83,274,096.00	83,274,096.00
Utilidad	5.00%	1	$	83,274,096.00	83,274,096.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$	15,822,078.00	
Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales					
			$	-	-
Administracion	20.00%		$	-	-
Utilidad	5.00%		$	-	-
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$	-	
Valor Realización Estudios y Diseños			$	251,318,136.00	251,318,136.00
IVA (E&D)	19.00%		$	47,750,446.00	
Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto)			$	-	-
Administracion	20.00%		$	-	-
Imprevistos	5.00%		$	-	-
Utilidad	5.00%		$	-	-
IVA (G.S.A)	19.00%		$	-	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.			$	-	-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)	2.50%		$	-	-
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$	-	
Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion)			$	-	-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)			$	-	-
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$	-	
Gestion Predial			$	-	-
IVA (G.P)	19.00%		$	-	
Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19			$	-	-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)			$	-	-
IVA (R.P.BC19)	19.00%		$	-	
SUBTOTAL BASICO			$	2,416,444,620.00	
SUBTOTAL IVA			$	63,572,524.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		1	$	(236,912,701.00)	(236,912,701.00)
NETO A PAGAR			$	2,243,104,443.00	
#$24-02-00;985-2022;ldiazp@invias.gov.co#$					
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334- 3) CASAHIDALGO CONSTRUCTORES (75% - 900.354.637-5)					

SON:	**SUBTOTAL**	$	2,179,531,919.00
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	**IVA**	$	63,572,524.00
	TOTAL	**$**	**2,243,104,443.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO PERIODO MES: NOVIEMBRE2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **41** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.416.444.620,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1-dic-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAÚL ANTONIO PÉREZ G.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2-dic-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAÚL ANTONIO PÉREZ G.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE RICARDO BURBANO B.	Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3-dic-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE RICARDO BURBANO B.	Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	04/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jose D Alarcón A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	04-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 985 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055 **NIT.** 901.584.893-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.243.104.443,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 41 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma — Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSE DAVID ALARCON ALARCON
Matricula profesional No.: 25202-101337 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 04-12-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 04-12-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 41 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,416,444,620.00 **MES** NOVIEMBRE2025

CONTRATO No : 985 de 2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES PLAZO ACUMULADO: 97 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 319,366,761,001.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 319,366,761,001.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No._5_ de fecha __06/10/2025__		OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA - ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	200.2 (11601)	200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,083,131.00	$ 17,330,096.00	5.00	$ 5,415,655.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2	201.7 (11601)	201-22		Demolición de Estructuras	m3	132.00	$ 107,114.00	$ 14,139,048.00	2,060.00	$ 220,654,840.00	0.00	$ -	362.50	$ 38,828,825.00
3	210.1.2 (11601)	210-22		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150,000.00	$ 12,300.00	$ 1,845,000,000.00	8,562.30	$ 105,316,290.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4	210.2.2 (11601)	210-22		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24,314.00	$ 10,685.00	$ 259,795,090.00	103,134.50	$ 1,101,992,133.00	0.00	$ -	45897.60	$ 490,415,856.00
5	220.1 (11602)	220-22		Terraplenes	m3	150,000.00	$ 12,800.00	$ 1,920,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	223.2 (11606)	223-22		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	297,712.00	$ 11,100.00	$ 3,304,603,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	230.1P (11602)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	86,400.00	$ 92,500.00	$ 7,992,000,000.00	72,042.20	$ 6,663,903,500.00	0.00	$ -	52255.10	$ 4,833,596,750.00
Subtotal								**$ 15,352,867,434.00**		**$ 8,097,282,418.00**		**$ -**		**$ 5,362,841,431.00**
SUBBASES Y AFIRMADOS														
8	310.1 (11602)	310-22		Conformación de la calzada existente	m2	350,000.00	$ 925.00	$ 323,750,000.00	1,201,415.90	$ 1,111,309,708.00	0.00	$ -	1049279.70	$ 970,583,723.00
9	311.1 (11602)	311-22		Afirmado	m3	73,000.00	$ 90,000.00	$ 6,570,000,000.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00	0.00	$ -	24878.00	$ 2,239,020,011.00
10	320.1 (11602)	320-22		Subbase Granular clase A	m3	105,120.00	$ 127,410.00	$ 13,393,339,200.00	269,560.60	$ 34,344,716,046.00	0.00	$ -	131447.60	$ 16,747,738,716.00
Subtotal								**$ 20,287,089,200.00**		**$ 40,210,995,754.00**		**$ -**		**$ 19,957,342,450.00**
BASES														
11	330.1 (11602)	330-22		Base granular clase A	m3	101,972.00	$ 139,500.00	$ 14,225,094,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	330.4 (11602)	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	14,000.00	$ 143,000.00	$ 2,002,000,000.00	200.00	$ 28,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 16,227,094,000.00**		**$ 28,600,000.00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
13	420.2 (11603)	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525,600.00	$ 2,921.00	$ 1,535,277,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14	421.1 (11603)	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525,600.00	$ 1,852.00	$ 973,411,200.00	12,680.00	$ 23,483,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -
15	450.1P (11603)		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36,792.00	$ 807,000.00	$ 29,691,144,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16	450.2P (11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33,752.00	$ 811,000.00	$ 27,372,872,000.00	634.00	$ 514,174,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
17	450.9P (11603)		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 825,000.00	$ 5,775,000,000.00	100.00	$ 82,500,000.00	0.00	$ -	76.00	$ 62,700,000.00
18	460.1P (11603)		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,500.00	$ 65,590.00	$ 229,565,000.00	100.00	$ 6,559,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
19	465.1 (11603)	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7,000.00	$ 71,686.00	$ 501,802,000.00	1,000.00	$ 71,686,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 66,079,071,800.00**		**$ 698,402,360.00**		**$ -**		**$ 62,700,000.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
20	600.1.1 (11604)	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10,390.00	$ 25,170.00	$ 261,516,300.00	17,349.70	$ 436,691,949.00	0.00	$ -	11769.10	$ 296,228,247.00
21	600.2.4 (11601)	600-22		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1,039.00	$ 59,656.00	$ 61,982,584.00	19,851.50	$ 1,184,261,084.00	0.00	$ -	13557.40	$ 808,780,254.00
22	610.1 (11604)	610-22		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,078.00	$ 38,696.00	$ 80,410,288.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23	610.2 (11604)	610-22		Reellenos para Estructuras con recebo	m3	52,672.00	$ 102,000.00	$ 5,372,544,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24	610.3 (11604)	610-22		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	3,117.00	$ 165,162.00	$ 514,809,954.00	3,432.00	$ 566,835,984.00	0.00	$ -	264.60	$ 43,701,865.00
25	621.1.4P (14103)		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diametro D=2,50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1,334.00	$ 7,250,000.00	$ 9,671,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26	630.1.P (14103)		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajon voladizos de puentes	m3	2,014.00	$ 2,000,000.00	$ 4,028,000,000.00	11,844.60	$ 23,689,200,000.00	311.20	$ 622,400,000.00	1125.80	$ 2,251,600,000.00
27	630.2.P (14103)		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	8,054.00	$ 1,900,000.00	$ 15,302,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
28	630.1.1P (14103)		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,882.00	$ 1,300,000.00	$ 2,446,600,000.00	428.40	$ 556,920,000.00	0.00	$ -	222.40	$ 289,120,000.00
29	630.1.2P (14103)		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14,354.00	$ 1,320,000.00	$ 18,947,280,000.00	176.20	$ 232,584,000.00	0.00	$ -	87.40	$ 115,368,000.00
30	630.3.1P (14103)		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	10,120.00	$ 1,100,000.00	$ 11,132,000,000.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00	0.00	$ -	1045.80	$ 1,150,380,000.00
31	630.3.4P (14103)		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936.00	$ 1,254,299.00	$ 1,174,023,864.00	476.60	$ 597,798,903.00	0.00	$ -	30.30	$ 38,005,260.00
32	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	254.00	$ 1,010,000.00	$ 256,540,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32.1	630.3.5P (11604)		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	0.00	$ 1,010,000.00	$ -	2,451.30	$ 2,475,813,000.00	0.00	$ -	1337.10	$ 1,350,471,000.00
32.2	630.3.5P (14103)		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	0.00	$ 1,010,000.00	$ -	1,038.70	$ 1,049,087,000.00	0.00	$ -	559.60	$ 565,196,000.00
33	630.4 (11604)	630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	847.00	$ 720,000.00	$ 609,840,000.00	409.80	$ 295,056,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
34	630.60	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	169.00	$ 509,329.00	$ 86,076,601.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
34.1	630.6 (11604)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 509,329.00	$ -	880.40	$ 448,413,252.00	0.00	$ -	115.50	$ 58,827,500.00
34.2	630.6 (14103)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 509,329.00	$ -	120.20	$ 61,221,346.00	0.00	$ -	19.30	$ 9,830,050.00
35	632.1P (14103)		632.1P	Baranda Metalica	m	3,041.00	$ 665,000.00	$ 2,022,265,000.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
36	640.10	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	7,427,664.00	$ 6,752.00	$ 50,151,587,328.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36.1	640.1 (11604)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	$ 6,752.00	$ -	805,176.00	$ 5,436,548,352.00	0.00	$ -	110685.00	$ 747,345,120.00
36.2	640.1 (14103)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	$ 6,752.00	$ -	3,667,801.00	$ 24,764,992,352.00	81115.30	$ 547,690,506.00	1203768.10	$ 8,127,842,212.00
37	641.1 (14103)	641-22		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4,228,628.00	$ 2,426.00	$ 10,258,651,528.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00	84249.00	$ 204,388,074.00	407361.30	$ 988,258,514.00
38	642.1 (14103)	642-22		Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	64.00	$ 723,081.00	$ 46,277,184.00	47.00	$ 33,984,807.00	0.00	$ -	0.00	$ -
39	642.2 (14103)	642-22		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	120.00	$ 372,145.00	$ 44,657,400.00	252.20	$ 93,854,969.00	0.00	$ -	0.00	$ -
40	661.1 (11604)	661-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,724.00	$ 670,000.00	$ 1,155,080,000.00	1,311.50	$ 878,705,000.00	0.00	$ -	486.20	$ 325,754,000.00
41	671.1 (11604)	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	6,250.00	$ 560,000.00	$ 3,500,000,000.00	5,445.00	$ 3,049,200,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
42	673.1 (11604)	673-22		Geotextil Tipo II no tejido	m2	126.00	$ 7,777.00	$ 979,902.00	119,616.20	$ 930,255,187.00	0.00	$ -	71942.50	$ 559,496,823.00
43	673.20	673-22		Material granular drenante	m3	1,230.00	$ 122,801.00	$ 151,045,230.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
43.1	673.2 (11604)	673-22		Material granular drenante	m3	0.00	$ 122,801.00	$ -	3,929.80	$ 482,583,370.00	0.00	$ -	2539.40	$ 311,840,859.00
43.2	673.2 (14103)	673-22		Material granular drenante	m3	0.00	$ 122,801.00	$ -	332.00	$ 40,769,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -
44	673.3 (11604)	673-22		Material de cobertura tipo SBG	m3	560.00	$ 172,304.00	$ 96,490,240.00	2,858.90	$ 492,599,906.00	0.00	$ -	1367.80	$ 235,677,411.00
45	683.4P (11606)		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 90Zn10Al revestido . Rellenos y conformación realizados mecanicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12,184.00	$ 440,000.00	$ 5,360,960,000.00	19,560.80	$ 8,606,752,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 142,733,717,403.00**		**$ 103,302,204,953.00**		**$ 1,374,478,580.00**		**$ 18,273,723,115.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
46	1P (11607)		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	218,321.00	$ 1,989.00	$ 434,240,469.00	63,898.50	$ 127,094,116.00	0.00	$ -	0.00	$ -
47	2P (11607)		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1,160.00	$ 24,098.00	$ 27,953,680.00	1,568.00	$ 37,785,664.00	0.00	$ -	0.00	$ -
48	4P (11607)		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44,212.00	$ 8,377.00	$ 370,363,924.00	12,488.00	$ 104,611,976.00	0.00	$ -	0.00	$ -
49	5P (11607)		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244.00	$ 399,456.00	$ 97,467,264.00	214.00	$ 85,483,584.00	0.00	$ -	16.00	$ 6,391,296.00
50	730.1 (11607)	730-22		Defensa metalica	m	3,214.00	$ 233,492.00	$ 750,443,288.00	8,850.00	$ 2,066,404,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -
51	730.2 (11607)	730-22		Sección final	u	84.00	$ 103,783.00	$ 8,717,772.00	180.00	$ 18,680,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -
52	740.1 (11607)	740-22		Captafaros	u	7,498.00	$ 22,154.00	$ 166,110,692.00	3,470.00	$ 76,874,380.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 1,855,297,089.00**		**$ 2,516,934,860.00**		**$ -**		**$ 6,391,296.00**
OBRAS VARIAS														
53	810.1 (11606)	810-22		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	144,000.00	$ 17,900	$ 2,577,600,000.00	31,499.00	$ 563,832,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 2,577,600,000.00**		**$ 563,832,100.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES														
54	900.2 (11608)	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,144,729.00	$ 1,060	$ 7,573,412,740.00	587,466.10	$ 622,714,066.00	0.00	$ -	158658.00	$ 168,177,480.00
Subtotal								**$ 7,573,412,740.00**		**$ 622,714,066.00**		**$ -**		**$ 168,177,480.00**
ITEMS NO PREVISTOS														
55	500.1 (11603)	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 (Sector Putumayo)	m3		$ 1,101,441.00	$ -	25,613.00	$ 28,211,208,333.00	0.00	$ -	9798.50	$ 10,792,469,639.00
56	NP-05 (14103)		NP-05P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u		$ 8,156,902.00	$ -	320.00	$ 2,610,208,640.00	0.00	$ -	158.00	$ 1,288,790,516.00
57	NP-06 (14103)		NP-06P	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro)	m		$ 31,499,390.00	$ -	22.80	$ 718,186,092.00	0.00	$ -	0.00	$ -
58	NP-07 (14103)		NP-07P	JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m		$ 15,057,059.00	$ -	22.80	$ 343,300,945.00	0.00	$ -	0.00	$ -
59	NP-08 (14103)		NP-08P	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m		$ 36,175,223.00	$ -	11.40	$ 412,397,542.00	0.00	$ -	0.00	$ -
60	621.1P (14103)	621-22		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m		$ 6,212,436.00	$ -	2,031.00	$ 12,617,457,516.00	108.00	$ 670,943,088.00	1101.50	$ 6,842,998,254.00
61	621.5P (14103)	621-22		CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m		$ 14,963,102.00	$ -	1,320.00	$ 19,751,294,640.00	8.00	$ 119,704,816.00	1032.80	$ 15,453,891,746.00
62	NP-09 (14103)		NP-09P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u		$ 240,175,334.00	$ -	6.00	$ 1,441,052,004.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,441,052,004.00
63	NP-10 (14103)		NP-10P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u		$ 396,887,878.00	$ -	10.00	$ 3,968,878,780.00	0.00	$ -	7.90	$ 3,135,414,236.00
64	642.1.1 (14103)	621-22		APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u		$ 41,366,523.00	$ -	34.00	$ 1,406,461,782.00	0.00	$ -	29.50	$ 1,220,312,429.00
65	642.1.2 (14103)	621-22		APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u		$ 154,812,009.00	$ -	8.00	$ 1,238,496,072.00	0.00	$ -	7.20	$ 1,114,646,465.00
66	800.5 (11601)	800-22		CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m		$ 39,679.00	$ -	24,776.00	$ 983,086,904.00	0.00	$ -	4098.90	$ 162,640,253.00
67	201.16 (11601)	201-22		REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m		$ 6,174.00	$ -	24,776.00	$ 152,967,024.00	0.00	$ -	9188.90	$ 56,732,269.00
68	201.15 (11601)	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m		$ 134,575.00	$ -	1,311.00	$ 176,427,825.00	0.00	$ -	336.80	$ 45,324,860.00
69	900.1 (11608)	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E		$ 1,889.00	$ -	100,000.00	$ 188,900,000.00	0.00	$ -	36092.70	$ 68,179,110.00
70	NP-01 (11604)		NP-01P	Cinta PVC V15 o similar	m		$ 68,117.00	$ -	750.00	$ 51,087,750.00	0.00	$ -	419.70	$ 28,588,705.00
71	NP-02 (11604)		NP-02P	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m		$ 24,478.00	$ -	2,000.00	$ 48,956,000.00	0.00	$ -	1352.20	$ 33,099,152.00
72	NP-03 (11604)		NP-03P	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m		$ 70,616.00	$ -	100.00	$ 7,061,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
73	NP-11 (11601)		NP-11P	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	Día		$ 3,203,366.00	$ -	365.00	$ 1,169,228,590.00	0.00	$ -	126.00	$ 403,624,116.00
Subtotal								**$ -**		**$ 75,496,658,039.00**		**$ 790,647,904.00**		**$ 42,087,763,754.00**
TOTAL OBRAS										**$ 231,537,624,550.00**				
Ajuste al peso										$ 981.00				

Concepto	VALOR TOTAL (Condiciones iniciales)	VALOR (Condiciones actualizadas)	VALOR (Presente acta)	VALOR (Acumulado)
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 272,686,149,666.00	$ 231,537,625,531.00	$ 2,165,126,484.00	$ 85,918,939,526.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 73,508,379,476.00		$ 17,557,322,002.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.00	$ 305,346,005,007.00	$ 2,165,126,484.00	$ 103,476,261,528.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 1,692,005,725.00	$ 15,822,078.00	$ 627,869,175.00
VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 537,176,619.00	$ -	$ 128,346,090.00
VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,192,308.00	$ 2,192,308.00	$ -	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 307,577,379,659.00**	**$ 2,180,948,562.00**	**$ 104,232,476,793.00**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3,340,000,000.00	$ 3,340,000,000.00	$ 251,318,136.00	$ 3,340,000,000.00
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 634,600,000.00	$ 47,750,446.00	$ 634,600,000.00
TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K =(I+J)	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 299,068,582.00**	**$ 3,974,600,000.00**
TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)	**$ 7,814,781,342.00**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ -**	**$ 435,263,820.00**
VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ -	$ -	$ -
VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2,324,836.00	$ -	$ -	$ -
TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)	**$ 504,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL BASICO ACTA. Q = (D+I+M)	$ 308,687,336,528.00	$ 308,686,005,007.00	$ 2,416,444,620.00	$ 106,816,261,528.00
TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)	$ 2,864,643,131.00	$ 2,865,974,652.00	$ 63,572,524.00	$ 1,390,815,265.00
VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 2,480,017,144.00**	**$ 108,642,340,613.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 21,000,000,000.00	100.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 236,912,701.00	1.13%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 5,066,096,601.00**	**24.12%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 15,933,903,399.00**	**75.88%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2,165,126,484.00	$ 15,822,078.00	$ 2,180,948,562.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 251,318,136.00	$ 47,750,446.00	$ 299,068,582.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 2,416,444,620.00	$ 63,572,524.00	$ 2,480,017,144.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 5,408,166,291.00
SB	$ -	$ 19,957,342,450.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ 10,855,169,639.00
OA	$ 2,165,126,484.00	$ 48,832,516,622.00
SCT	$ -	$ 6,391,296.00
OV	$ -	$ 622,996,638.00
T	$ -	$ 236,356,590.00
TOTAL	$ 2,165,126,484.00	$ 85,918,939,526.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601. Preliminares y explanacion	$ -	$ 2,006,346,433.00
11602. Afirmados, subbases y bases	$ -	$ 24,790,939,200.00
11603. Pavimentos asfalticos / Concreto	$ -	$ 10,855,169,639.00
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes	$ -	$ 3,991,030,682.00
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607. Señalización y control de transito	$ -	$ 6,391,296.00
11608. Transporte y sobre acarreos	$ -	$ 236,356,590.00
14103. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ 2,165,126,484.00	$ 44,032,705,686.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 251,318,136.00	$ 17,700,562,009.00
TOTAL	$ 2,416,444,620.00	$ 103,619,501,535.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,416,444,620.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,179,531,919.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,243,104,443.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
Matricula Profesional No.: 52202-58774 NRÑ

Firma:
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
REPESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA CONSORCIO VIAL JAC 2022
Matricula Profesional: 25202-100584 CND

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 985 de 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	No. 41	NOVIEMBRE2025
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **121825** RUBRO No. **C-2401-0600-132-51102D-2401008-02** RECURSO No. **11**

VALOR AFECTADO	$	2,243,104,443.00
TOTAL ACTA	**$**	**2,243,104,443.00**

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional: 52202-46096 NRÑ

Formulado RP121825;11;2243104443
Texto Libre SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE- ACTA DE OBRA 41 CONT 985 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 NIT: 901584893-4
Asunto **SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE- ACTA DE OBRA 41 CONT 985 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 NIT: 901584893-4RP121825;11;2243104443**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 985 de 2022 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Acta N' **41** Valor basico $ **$ 2,416,444,620.00** Período: NOVIEMBRE2025

Valor Incluido Iva $ **$ 2,480,017,144.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	65-01	CARRETERA	$ -	$ 203,085,159.00	$ -	$ 203,085,159.00
2	65-01	PUENTE	$ 2,180,948,562.00	$ 95,983,423.00	$ -	$ 2,276,931,985.00
3	65-01	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 2,180,948,562.00**	**$ 299,068,582**	**$ -**	**$ 2,480,017,144.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO (PUTUMAYO)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800054249-0	VILLAGARZON	MANTENIMIENTO	$ -	$ -
800054249-0	VILLAGARZON	MEJORAMIENTO	$ -	$ -
800054249-0	VILLAGARZON	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 144,608,456.00	$ 140,901,576.00
8000102891-6	MOCOA	MANTENIMIENTO	$ -	$ -
8000102891-6	MOCOA	MEJORAMIENTO	$ -	$ -
8000102891-6	MOCOA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 58,476,704.00	$ 56,977,718.00
800222489-2	PUERTO GUZMAN	MANTENIMIENTO	$ -	$ -
800222489-2	PUERTO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PUENTE	$ 2,180,948,561.00	$ 2,125,042,333.00
800222489-2	PUERTO GUZMAN	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 95,983,423.00	$ 93,522,993.00
	TOTAL DEPARTAMENTO (PUTUMAYO)		**$ 2,480,017,144.00**	**$ 2,416,444,620.00**

NIT	DEPARTAMENTO (CAUCA)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
817000992-5	PIAMONTE	MEJORAMIENTO	$ -	$ -
817000992-5	PIAMONTE	MANTENIMIENTO	$ -	$ -
817000992-5	PIAMONTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO (CAUCA)		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO (CAQUETA)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095728-0	SANJOSE DEL FRAGUA	MEJORAMIENTO	$ -	$ -
800095728-0	SANJOSE DEL FRAGUA	MANTENIMIENTO	$ -	$ -
800095728-0	SANJOSE DEL FRAGUA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO (CAQUETA)		**$ -**	**$ -**

LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA.: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
Matricula Profesional No: 52202-58774 NRÑ

JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal
INTERVENTOR.: CONSORCIO JAC VIAL 2022
Matricula Profesional No: 25202-100584 CND

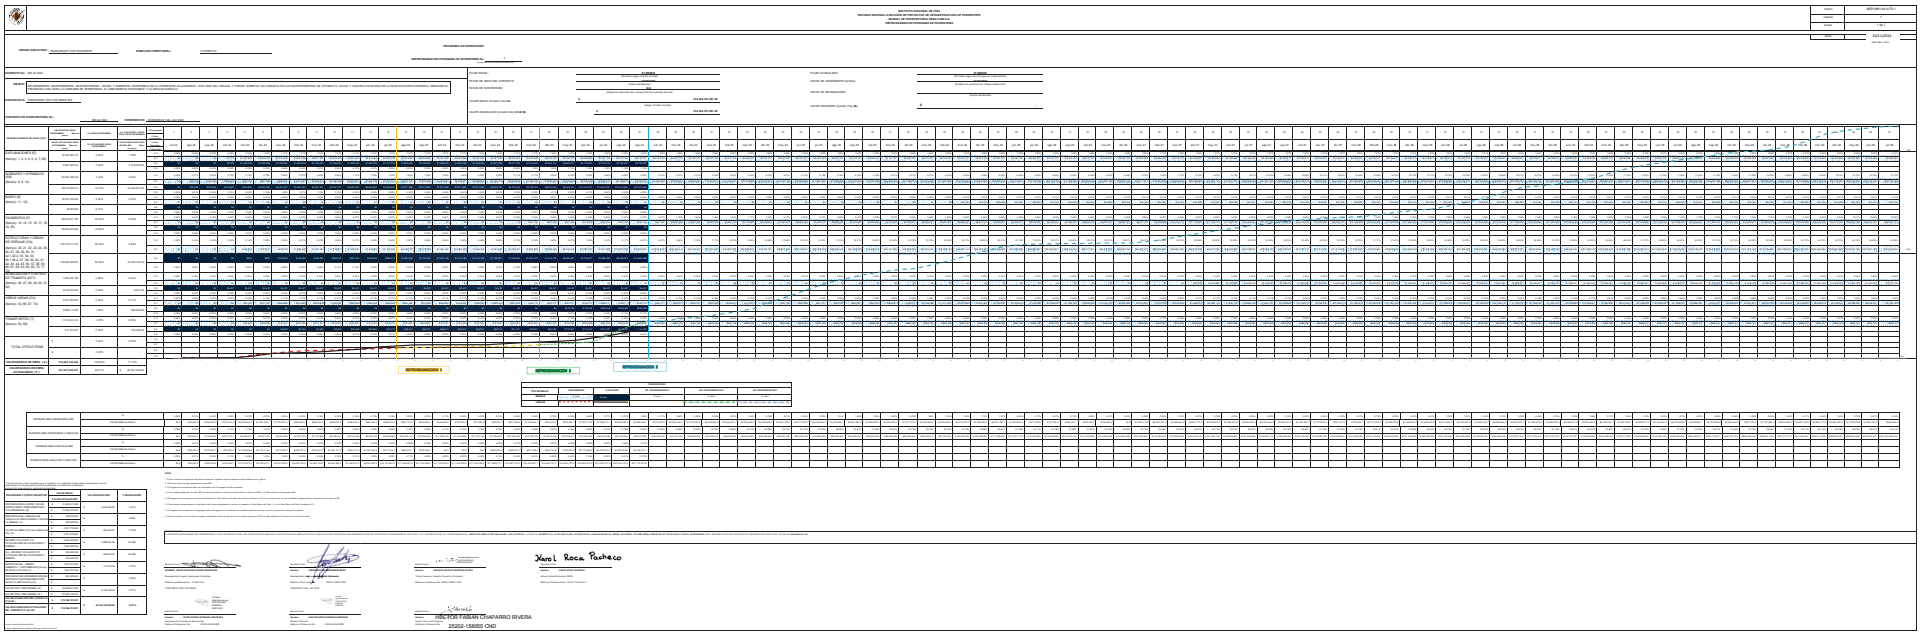

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 **DE** NOVIEMBRE2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2,416,444,620.00

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 985 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL: **97 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2022** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 319,366,761,001.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 319,366,761,001.00

PLAZO ACUMULADO: **97 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (E) (No. de Orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 68)	15,352,867.43	5.63%	1.98%
	8,273,710.24	3.03%	5,408,166.29
SUBBASES Y AFIRMADOS (SB) (No. de Orden: 8, 9, 10)	20,287,089.20	7.44%	7.32%
	40,210,995.75	14.75%	19,957,342.45
BASES (B) (No. de Orden: 11, 12)	16,227,094.00	5.95%	0.00%
	28,600.00	0.01%	-
PAVIMENTOS (P) (No. de Orden: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 55)	66,079,071.80	24.23%	3.98%
	28,909,610.69	10.60%	10,855,169.64
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (OA) (No. de Orden: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72)	142,733,717.40	52.34%	17.91%
	147,917,044.32	54.24%	48,832,516.62
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (SCT) (No. de Orden: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	1,855,297.09	0.68%	0.00%
	2,516,934.86	0.92%	6,391.30
OBRAS VARIAS (OV) (No. de Orden: 53, 66, 67, 73)	2,577,600.00	0.95%	0.23%
	2,869,114.62	1.05%	622,996.64
TRANSPORTES (T) (No. de Orden: 54, 69)	7,573,412.74	2.78%	0.09%
	811,614.07	0.30%	236,356.59
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%
	$ -	0.00%	-
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	272,686,149.7	100.00%	31.51%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	231,537,625.5	84.91%	$ 85,918,939.5

Filas por GPP: % P, $ P, $ E, % E (% Programado, $ Valor programado, $ Valor Ejecutado, % Ejecutado), meses 1 (jul-22) a 97 (jul-30).

REPROGRAMACIÓN 1 REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACION 3 REPROGRAMACION 4

100% 50% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	RE- PROGRAMACION 1	RE- PROGRAMACION 2	RE- PROGRAMACION 3	RE- PROGRAMACION 4
BARRAS	$ valor	$ valor	$ valor	$ valor	$ valor	$ valor
CURVAS						

Concepto		1 jul-22	2 ago-22	3 sep-22	4 oct-22	5 nov-22	6 dic-22	7 ene-23	8 feb-23	9 mar-23	10 abr-23	11 may-23	12 jun-23	13 jul-23	14 ago-23	15 sep-23	16 oct-23	17 nov-23	18 dic-23	19 ene-24	20 feb-24	21 mar-24	22 abr-24	23 may-24	24 jun-24	25 jul-24	26 ago-24	27 sep-24	28 oct-24	29 nov-24	30 dic-24	31 ene-25	32 feb-25	33 mar-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.01%	0.05%	0.06%	0.97%	0.57%	0.62%	0.36%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.23%	0.21%	0.11%	0.05%	0.02%	0.01%	0.23%	0.46%	0.19%	0.28%	0.65%	2.77%	2.81%	1.80%	0.11%	0.96%	0.54%	0.92%	0.97%	1.24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$34,600	$140,000	$162,414	$2,653,064	$1,567,250	$1,700,541	$993,863	$488,254	$488,254	$488,254	$488,254	$488,254	$637,127	$564,494	$305,891	$143,093	$57,496	$25,522	$621,555	$1,254,541	$512,024	$763,865	$1,781,718	$7,558,917	$7,659,098	$4,895,437	$312,349	$2,624,237	$1,475,202	$2,509,881	$2,643,647	$3,382,565
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.06%	0.12%	1.10%	1.67%	2.29%	2.66%	2.84%	3.02%	3.20%	3.38%	3.55%	3.79%	4.00%	4.11%	4.16%	4.18%	4.19%	4.42%	4.88%	5.07%	5.35%	$0	8.77%	11.58%	13.38%	13.49%	14.45%	14.99%	15.91%	16.88%	18.12%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$34,600.0	$174,600.0	$337,013.7	$2,990,077	$4,557,327	$6,257,868	$7,251,732	$7,739,986	$8,228,241	$8,716,495	$9,204,750	$9,693,004	$10,330,131	$10,894,625	$11,200,516	$11,343,609	$11,401,105	$11,426,627	$12,048,182	$13,302,722	$13,814,746	$14,578,611	$16,360,329	$23,919,246	$31,578,344	$36,473,780	$36,786,130	$39,410,366	$40,885,569	$43,395,449	$46,039,097	$49,421,661
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.01%	0.05%	0.04%	0.57%	0.94%	0.18%	0.20%	0.32%	0.47%	0.43%	0.78%	0.39%	0.39%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.37%	0.27%	0.27%	0.34%	$0	0.97%	1.26%	2.17%	2.26%	1.34%	0.02%	2.51%	2.00%	2.11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$34,628	$140,659	$112,125	$1,564,588	$2,562,852	$489,097	$537,261	$872,256	$1,290,439	$1,159,320	$2,114,519	$1,073,345	$1,051,593	$144,458	$0	$0	$0	$944,873	$1,015,476	$731,728	$747,527	$919,723	$2,496,630	$2,643,475	$3,444,791	$5,910,232	$6,165,563	$3,647,939	$47,834	$6,847,999	$5,446,311	$5,759,788
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.06%	0.11%	0.68%	1.62%	1.80%	2.00%	2.32%	2.79%	3.21%	3.99%	4.38%	4.77%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	5.17%	5.54%	5.81%	6.08%	6.42%	7.34%	8.30%	9.57%	11.74%	14.00%	15.33%	15.35%	17.86%	19.86%	21.97%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$34,628	$175,286	$287,411	$1,851,999	$4,414,851	$4,903,948	$5,441,209	$6,313,465	$7,603,904	$8,763,224	$10,877,742	$11,951,087	$13,002,680	$13,147,139	$13,147,139	$13,147,139	$13,147,139	$14,092,011	$15,107,488	$15,839,215	$16,586,742	$17,506,465	$20,003,095	$22,646,570	$26,091,362	$32,001,594	$38,167,157	$41,815,096	$41,862,930	$48,710,929	$54,157,240	$59,917,028

Concepto		34 abr-25	35 may-25	36 jun-25	37 jul-25	38 ago-25	39 sep-25	40 oct-25	41 nov-25	42 dic-25	43 ene-26	44 feb-26	45 mar-26	46 abr-26	47 may-26	48 jun-26	49 jul-26	50 ago-26	51 sep-26	52 oct-26	53 nov-26	54 dic-26	55 ene-27	56 feb-27	57 mar-27	58 abr-27	59 may-27	60 jun-27	61 jul-27	62 ago-27	63 sep-27	64 oct-27	65 nov-27	66 dic-27
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.55%	2.07%	2.35%	2.22%	1.54%	1.46%	0.72%	0.84%	0.84%	0.55%	0.74%	0.81%	0.90%	0.89%	0.80%	0.87%	0.87%	0.76%	0.75%	0.72%	0.65%	0.57%	0.91%	0.97%	0.83%	0.88%	0.84%	0.82%	0.81%	0.79%	0.75%	0.73%	0.50%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6,958,929.0	$5,655,156	$6,417,412	$6,040,447	$4,199,460	$3,967,695	$1,972,110.9	$2,303,885.5	$2,303,885.5	$1,509,507.9	$2,013,264.6	$2,219,794.5	$2,452,850.5	$2,438,480.0	$2,176,810.3	$2,379,143.6	$2,365,177.5	$2,079,976.1	$2,053,028.2	$1,961,868.1	$1,763,939.0	$1,566,171	$2,484,887	$2,656,685	$2,251,667	$2,402,758	$2,288,219	$2,239,125	$2,200,620	$2,151,253	$2,053,240	$1,995,849	$1,351,284
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	20.68%	22.75%	25.10%	27.32%	28.86%	30.31%	31.04%	31.88%	32.73%	33.28%	34.02%	34.83%	35.73%	36.63%	37.42%	38.30%	39.16%	39.93%	40.68%	41.40%	42.05%	42.62%	43.53%	44.51%	45.33%	46.21%	47.05%	47.87%	48.68%	49.47%	50.22%	50.95%	51.45%
	VALOR (Miles de Pesos)	$56,380,590	$62,035,746	$68,453,158	$74,493,605	$78,693,065	$82,660,761	$84,632,872	$86,936,757	$89,240,643	$90,750,151	$92,763,415	$94,983,210	$97,436,060	$99,874,540	$102,051,351	$104,430,494	$106,795,672	$108,875,648	$110,928,676	$112,890,544	$114,654,483	$116,220,654	$118,705,541	$121,362,226	$123,613,893	$126,016,651	$128,304,869	$130,543,995	$132,744,615	$134,895,868	$136,949,108	$138,944,957	$140,296,241
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.18%	1.02%	1.84%	0.84%	1.08%	1.09%	1.70%	0.79%																									
	VALOR (Miles de Pesos)	$3,204,409	$2,774,351.9	$5,022,094.4	$2,301,589.6	$2,946,582.2	$2,962,400.4	$4,625,357.1	$2,165,126.5																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	23.15%	24.17%	26.01%	26.85%	27.93%	29.02%	30.71%	31.51%																									
	VALOR (Miles de Pesos)	$63,121,437	$65,895,789.3	$70,917,883.8	$73,219,473.3	$76,166,055.5	$79,128,455.9	$83,753,813.1	$85,918,939.5																									

Concepto		67 ene-28	68 feb-28	69 mar-28	70 abr-28	71 may-28	72 jun-28	73 jul-28	74 ago-28	75 sep-28	76 oct-28	77 nov-28	78 dic-28	79 ene-29	80 feb-29	81 mar-29	82 abr-29	83 may-29	84 jun-29	85 jul-29	86 ago-29	87 sep-29	88 oct-29	89 nov-29	90 dic-29	91 ene-30	92 feb-30	93 mar-30	94 abr-30	95 may-30	96 jun-30	97 jul-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.80%	1.15%	1.06%	1.07%	1.06%	1.13%	1.04%	1.05%	1.04%	1.05%	1.09%	0.72%	0.55%	1.03%	1.10%	1.20%	1.14%	1.09%	1.08%	1.37%	1.06%	1.28%	1.06%	0.68%	1.64%	1.03%	1.62%	1.64%	1.07%	0.87%	0.67%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,183,543	$3,135,785	$2,896,053	$2,923,502	$2,882,661	$3,070,289	$2,844,985	$2,863,956	$2,847,627	$2,856,894	$2,969,946	$1,975,591	$1,509,275	$2,805,131	$3,002,251	$3,281,191	$3,102,951	$2,972,529	$2,958,380	$3,730,453	$2,895,093	$3,495,751	$2,886,872	$1,844,378	$4,477,800	$2,821,254	$4,411,711	$4,481,875	$2,907,956	$2,378,467	$1,827,232
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	52.25%	53.40%	54.46%	55.53%	56.59%	57.72%	58.76%	59.81%	60.86%	61.90%	62.99%	63.72%	64.27%	65.30%	66.40%	67.60%	68.74%	69.83%	70.92%	72.28%	73.35%	74.63%	75.69%	76.36%	78.01%	79.04%	80.66%	82.30%	83.37%	84.24%	84.91%
	VALOR (Miles de Pesos)	$142,479,784	$145,615,570	$148,511,623	$151,435,125	$154,317,786	$157,388,075	$160,233,060	$163,097,017	$165,944,644	$168,801,538	$171,771,484	$173,747,075	$175,256,350	$178,061,481	$181,063,732	$184,344,923	$187,447,874	$190,420,403	$193,378,783	$197,109,236	$200,004,329	$203,500,080	$206,386,952	$208,231,330	$212,709,130	$215,530,384	$219,942,095	$224,423,970	$227,331,926	$229,710,393	$231,537,625
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																															
	VALOR (Miles de Pesos)																															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																															
	VALOR (Miles de Pesos)																															

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511.70 / $ 73,508,379.48	$ 17,557,322.0	55.11%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000.00 / $ 300,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2,227,718.30 / $ 2,231,374.65	$ 756,215.27	33.95%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,340,000.00 / $ 3,340,000.00	$ 3,340,000.0	100.00%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 634,600.00 / $ 634,600.00	$ 634,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (J)	$ 7,814,781.34 / $ 7,814,781.34	$ 435,263.82	5.57%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 504,000.00 / $ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 46,680,611.34 / $ 87,829,135.47	$ 22,723,401	48.68%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) / **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')**	$ 319,366,761,001 / $ 319,366,760,997	$ 108,642,340,613	34.02%

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Representante legal o apoderado del Contratista (S)
Matrícula Profesional No.: 52202-58774 NRÑ
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		
		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 **PROYECTO:** Troncal Villagarzon - Saravena, Ruta 65 - Tramo 01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	585822	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 7,387,965,642.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 79,593,413.00	$ -
2023	159623	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 4,918,364,716.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 5,021,987,798.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 84,276,679.00	$ -
2024	240324	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 203,749,724	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	16	Nación	985 de 2022	$ 56,665,263	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 15,124,971,919	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 798,403,963	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	16	Nación	985 de 2022	$ 8,669,155,092	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	Nación	985 de 2022	$ 6,123,163,678	$ -
	377724	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 18,400,000,000	$ -
2025	121825	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	11	Nación	985 DE 2022	$ 47,500,835,898	$ 3,028,400,910.00
		C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	Nación	985 DE 2022	$ 9,467,559,055	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	Nación	985 DE 2022	$ 491,750,484	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	Nación	985 DE 2022	$ 1,033,097,155	$ -
				TOTAL		$ 125,361,540,479.00	$ 3,028,400,910.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **319,366,761,001.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
									585822 de 2022-05-20	$ 7,467,559,055.00	$ 319,366,761,001.00	-	-			
1	Obra	jul-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 7,467,559,055.00	$ 319,366,761,001.00	-	-			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02 Recurso:11
2	Obra	ago-22	$ 34,627,838.00	$ 253,050.00	$ 34,880,888.00	$ -	$ 34,880,888.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 7,432,678,167.00	$ 319,331,880,113.00	140255	23/11/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02 Recurso:11
3	Obra	sep-22	$ 429,513,922.00	$ 55,910,399.00	$ 485,424,321.00	$ -	$ 485,424,321.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,947,253,846.00	$ 318,846,455,792.00	140271	23/11/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:1
4	Obra	oct-22	$ 194,738,517.00	$ 16,515,989.00	$ 211,254,506.00	$ -	$ 211,254,506.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,999,340.00	$ 318,635,201,286.00	134325	7/12/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
1D	Ajuste	jul-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,999,340.00	$ 318,635,201,286.00	-				Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
2D	Ajuste	ago-22	$ 907,942.00	$ 6,635.00	$ 914,577.00	$ -	$ 914,577.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,084,763.00	$ 318,634,286,709.00	140264	19/12/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
3D	Ajuste	sep-22	$ 3,942,661.00	$ 28,812.00	$ 3,971,473.00	$ -	$ 3,971,473.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,731,113,290.00	$ 318,630,315,236.00	140271	19/12/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
4D	Ajuste	oct-22	$ 4,189,281.00	$ 30,614.00	$ 4,219,895.00	$ -	$ 4,219,895.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,726,893,395.00	$ 318,626,095,341.00	140256	20/12/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
5	Obra	nov-22	$ 2,101,797,305.00	$ 113,503,348.00	$ 2,215,300,653.00	$ -	$ 2,215,300,653.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 4,511,592,742.00	$ 316,410,794,688.00	139224	17/12/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
5P	Ajuste	nov-22	$ 55,299,951.00	$ 404,115.00	$ 55,704,066.00	$ -	$ 55,704,066.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 4,455,888,676.00	$ 316,355,090,622.00	42413	28/04/2023			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
6	Obra	dic-22	$ 3,969,824,318.00	$ 286,053,247.00	$ 4,255,877,565.00	$ -	$ 4,255,877,565.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 200,011,111.00	$ 312,099,213,057.00	138966	17/12/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
6P	Ajuste	dic-22	$ 88,930,970.00	$ 649,880.00	$ 89,580,850.00	$ -	$ 89,580,850.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 110,430,261.00	$ 312,009,632,207.00	42413	28/04/2023			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
									159623 de 2023-02-17	$ 10,024,629,193.00						
7	Obra	ene-23	$ 489,097,323.00	$ 3,574,173.00	$ 492,671,496.00	$ -	$ 492,671,496	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,642,387,958.00	$ 311,516,960,711.00	29786	27/03/2023			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11. Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023. Recurso:11. Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
8	Obra	feb-23	$ 537,260,607.00	$ 3,926,135.00	$ 541,186,742.00	$ -	$ 541,186,742	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,101,201,216.00	$ 310,975,773,969.00	29785	27/03/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
7D	Ajuste	ene-23	$ 51,358,181.00	$ 375,310.00	$ 51,733,491.00	$ -	$ 51,733,491	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,049,467,725.00	$ 310,924,040,478.00	42413	28/04/2023			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
8D	Ajuste	feb-23	$ 51,451,517.00	$ 375,992.00	$ 51,827,509.00	$ -	$ 51,827,509	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 8,997,640,216.00	$ 310,872,212,969.00	42418	28/04/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
9	Obra	mar-23	$ 872,255,617.00	$ 6,374,176.00	$ 878,629,793.00	$ -	$ 878,629,793	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 8,119,010,423.00	$ 309,993,583,176.00	44872	5/05/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
9D	Ajuste	mar-23	$ 85,261,340.00	$ 623,064.00	$ 85,884,404.00	$ -	$ 85,884,404	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 8,033,126,019.00	$ 309,907,698,772.00	50075	19/05/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
10	Obra	abr-23	$ 1,290,439,123.00	$ 9,430,132.00	$ 1,299,869,255.00	$ -	$ 1,299,869,255	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 6,733,256,764.00	$ 308,607,829,517.00	50078	19/05/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
10D	Ajuste	abr-23	$ 165,962,133.00	$ 1,212,800.00	$ 167,174,933.00	$ -	$ 167,174,933	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 6,566,081,831.00	$ 308,440,654,584.00	67744	12/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
11	Obra	may-23	$ 1,159,320,039.00	$ 8,471,954.00	$ 1,167,791,993.00	$ -	$ 1,167,791,993.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 5,398,289,838.00	$ 307,272,862,591.00	67761	12/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
11D	Ajuste	may-23	$ 171,475,030.00	$ 1,253,087.00	$ 172,728,117.00	$ -	$ 172,728,117.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 5,225,561,721.00	$ 307,100,134,474.00	68023	13/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
12	Obra	jun-23	$ 2,114,518,527.00	$ 15,452,251.00	$ 2,129,970,778.00	$ -	$ 2,129,970,778.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 3,095,590,943.00	$ 304,970,163,696.00	74810	1/08/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
12D	Ajuste	jun-23	$ 327,710,229.00	$ 2,394,806.00	$ 330,105,035.00	$ -	$ 330,105,035.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 2,765,485,908.00	$ 304,640,058,661.00	82230	27/09/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
13	Obra	jul-23	$ 1,073,344,848.00	$ 7,843,674.00	$ 1,081,188,522.00	$ -	$ 1,081,188,522.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 1,684,297,386.00	$ 303,558,870,139.00	80857	30/08/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
13D	Ajuste	jul-23	$ 166,228,420.00	$ 1,214,746.00	$ 167,443,166.00	$ -	$ 167,443,166.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 1,516,854,220.00	$ 303,391,426,973.00	82302	28/09/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
14	Obra	ago-23	$ 1,189,120,370.00	$ 8,729,926.00	$ 1,197,850,296.00	$ -	$ 1,197,850,296.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 319,003,924.00	$ 302,193,576,677.00	82561	4/10/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
14D	Ajuste	ago-23	$ 150,725,499.00	$ 1,101,456.00	$ 151,826,955.00	$ -	$ 151,826,955.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 167,176,969.00	$ 302,041,749,722.00	83704	17/10/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
15	Obra	sep-23	$ 144,458,120.00	$ 1,055,655.00	$ 145,513,775.00	$ -	$ 145,513,775.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 21,663,194.00	$ 301,896,235,947.00	83708	17/10/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
15P	Ajuste	sep-23	$ 21,505,999.00	$ 157,159.00	$ 21,663,158.00	$ -	$ 21,663,158.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00	84110	19/10/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
16	Obra	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00	-	-			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
17	Obra	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00	-	-			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
18	Obra	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00	-	-			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
									240324 de 2024-03-20	$ 30,976,109,639.00						
19	obra	ene-24	$ 1,550,017,688.00	$ 121,882,423.00	$ 1,671,900,111.00	$ -	$ 1,671,900,111.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00	2485	17/04/2024			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11. Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401023-02. Recurso:11, Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401023-02. Recurso:16, Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
15D	Ajuste	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00	-	-			El Acta de Ajuste 15D negativa se ajusta dentro del Acta de Ajuste 19D
16D	Ajuste	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00	-	-			
17D	Ajuste	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00	-	-			
18D	Ajuste	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00	-	-			
19P	Ajuste	ene-24	$ 145,709,202.00	$ 1,064,798.00	$ 146,774,000.00	$ -	$ 146,774,000.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,157,435,564.00	$ 300,055,898,678.00	PCC44	16/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
20	Obra	feb-24	$ 1,015,476,457.00	$ 7,420,789.00	$ 1,022,897,246.00	$ -	$ 1,022,897,246.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 28,134,538,318.00	$ 299,033,001,432.00	2483	17/04/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
19D	Ajuste	ene-24	$ 26,047,766.00	$ 190,349.00	$ 26,238,115.00	$ -	$ 26,238,115.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 28,108,300,203.00	$ 299,006,763,317.00	3857	15/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11. Se descontó Acta de Ajuste 15D con valores negativos
20P	Ajuste	feb-24	$ 191,870,693.00	$ 1,402,132.00	$ 193,272,825.00	$ -	$ 193,272,825.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 27,915,027,378.00	$ 298,813,490,492.00	3858	14/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
21	Obra	mar-24	$ 752,230,866.00	$ 9,242,812.00	$ 761,473,678.00	$ -	$ 761,473,678.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 27,153,553,700.00	$ 298,052,016,814.00	13308	19/02/2021			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
20D	Ajuste	feb-24	$ 18,444,618.00	$ 134,788.00	$ 18,579,406.00	$ -	$ 18,579,406.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 27,134,974,294.00	$ 298,033,437,408.00	3859	15/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
21P	Ajuste	mar-24	$ 152,747,487.00	$ 1,116,232.00	$ 153,863,719.00	$ -	$ 153,863,719.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 26,981,110,575.00	$ 297,879,573,689.00	3860	15/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
22	Obra	abr-24	$ 747,526,952.00	$ 5,462,697.00	$ 752,989,649.00	$ -	$ 752,989,649.00		240324 de 2024-03-20	$ 26,228,120,926.00	$ 297,126,584,040.00	26773	31/03/2021			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
21D	Ajuste	mar-24	$ 5,569,547.00	$ 40,700.00	$ 5,610,247.00	$ -	$ 5,610,247.00		240324 de 2024-03-20	$ 26,222,510,679.00	$ 297,120,973,793.00	26769	31/03/2021			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
22P	Ajuste	abr-24	$ 160,895,520.00	$ 1,175,775.00	$ 162,071,295.00	$ -	$ 162,071,295.00		240324 de 2024-03-20	$ 26,060,439,384.00	$ 296,958,902,498.00	26771	31/03/2021			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
									377724 de 2024-04-30	$ 18,400,000,000.00						
23	Obra	may-54	$ 1,087,608,451.00	$ 38,619,360.00	$ 1,126,227,811.00	$ -	$ 1,126,227,811.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 43,334,211,573.00	$ 295,832,674,687.00	43283	21/05/2021			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
22D	Ajuste	abr-24	$ 2,280,667.00	$ 16,666.00	$ 2,297,333.00	$ -	$ 2,297,333.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 43,331,914,240.00	$ 295,830,377,354.00	6794	3/07/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
23P	Ajuste	may-24	$ 188,350,117.00	$ 1,376,405.00	$ 189,726,522.00	$ -	$ 189,726,522.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 43,142,187,718.00	$ 295,640,650,832.00	7086	10/07/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
	Anticipo	jun-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000,000.00	240324 de 2024-03-20	$ 28,142,187,718.00						Las afectaciones presupuestales del Anticipo fueron las diguientes: Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11 por $ 798,403,963 ; Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:16. por $ 8,669,155,092 ; Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Registro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11. por $ 5,532,440,945
24	Obra	jun-24	$ 2,500,164,997.00	$ 18,916,254.00	$ 2,519,081,251.00	$ 126,851,551.00	$ 2,392,229,700.00	$ 14,873,148,449.00	240324 de 2024-03-20	$ 25,749,958,018.00	$ 293,121,569,581.00	7389	17/07/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
23D	Ajuste	may-24	$ 2,815,434.00	$ 20,574.00	$ 2,836,008.00		$ 2,836,008.00		240324 de 2024-03-20	$ 25,747,122,010.00	$ 293,118,733,573.00	8700	9/08/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
25	Obra	jul-24	$ 2,643,475,447.00	$ 19,317,705.00	$ 2,662,793,152.00	$ 134,132,685.00	$ 2,528,660,467.00	$ 14,739,015,764.00	240324 de 2024-03-20	$ 23,218,461,543.00	$ 290,455,940,421.00	9334	20/08/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
24D	Ajuste	jun-24	$ 484,070,473.00	$ 3,537,438.00	$ 487,607,911.00		$ 487,607,911.00		240324 de 2024-03-20	$ 22,730,853,632.00	$ 289,968,332,510.00	11386	12/09/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
25P	Ajuste	jul-24	$ 530,795,914.00	$ 3,878,893.00	$ 534,674,807.00		$ 534,674,807.00		240324 de 2024-03-20	$ 22,196,178,825.00	$ 289,433,657,703.00	11391	12/09/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
26	Obra	ago-24	$ 3,569,777,048.00	$ 48,920,786.00	$ 3,618,697,834.00	$ 243,654,092.00	$ 3,375,043,742.00	$ 14,495,361,672.00	240324 de 2024-03-20	$ 18,821,135,083.00	$ 285,814,959,869.00	11447	13/09/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11. Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:16.
25D	Ajuste	jul-24	$ -	$ -	$ -		$ -		240324 de 2024-03-20	$ 18,821,135,083.00	$ 285,814,959,869.00					El Acta de Ajuste 25D negativa se ajusta en la factura del Acta de Ajuste 26D, conforme a lo estipulado en el manual de interventoría.
26D	Ajuste	ago-24	$ 630,511,141.00	$ 4,607,581.00	$ 635,118,722.00		$ 635,118,722.00		240324 de 2024-03-20	$ 18,186,016,361.00	$ 285,179,841,147.00	16544	30/10/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:16. En la factura descuenta Acta de Ajuste 25D con valores negativos
27	Obra	sep-24	$ 5,910,232,069.00	$ 43,190,157.00	$ 5,953,422,226.00	$ 347,415,905.00	$ 5,606,006,321.00	$ 14,147,945,767.00	377724 de 2024-04-30	$ 12,580,010,040.00	$ 279,226,418,921.00	14137	25/09/2024			Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
28	Obra	oct-24	$ 6,290,067,581.00	$ 45,657,179.00	$ 6,335,724,760.00	$ 362,424,797.00	$ 5,973,299,963.00	$ 13,785,520,970.00	377724 de 2024-04-30	$ 6,606,710,077.00	$ 272,890,694,161.00	16314	19/11/2024			Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
27D	Ajuste	sep-24	$ 1,101,728,323.00	$ 8,051,092.00	$ 1,109,779,415.00		$ 1,109,779,415.00		377724 de 2024-04-30	$ 5,496,930,662.00	$ 271,780,914,746.00	17458	19/11/2024			Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
29	Obra	nov-24	$ 3,693,243,139.00	$ 35,265,777.00	$ 3,728,508,916.00	$ 214,433,555.00	$ 3,514,075,361.00	$ 13,571,087,415.00	240324 de 2024-03-20	$ 1,982,855,301.00	$ 268,052,405,830.00	18027	11/12/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:16.
28D	Ajustes	oct-24	$ 1,145,368,207.00	$ 8,369,998.00	$ 1,153,738,205.00		$ 1,153,738,205.00		240324 de 2024-03-20	$ 829,117,096.00	$ 266,898,667,625.00	18873	13/12/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11. Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:16.
29P	Ajustes	nov-24	$ 765,484,843.00	$ 5,593,928.00	$ 771,078,771.00		$ 771,078,771.00		240324 de 2024-03-20 377724 de 2024-04-30	$ 58,038,325.00	$ 266,127,588,854.00	18812	13/12/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Regustro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11. Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
30	Obra	dic-24	$ 47,834,107.00	$ 349,557.00	$ 48,183,664.00	$ 3,421,633.00	$ 44,762,031.00	$ 13,567,665,782.00	377724 de 2024-04-30	$ 13,276,294.00	$ 266,079,405,190.00	18802	13/12/2024			Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
30P	Ajustes	dic-24	$ 13,179,897.00	$ 96,315.00	$ 13,276,212.00		$ 13,276,212.00		377724 de 2024-04-30	$ 82.00	$ 266,066,128,978.00	18823	13/12/2024			Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
									121825 de 2025-03-05	$ 58,493,242,592.00						
31	Obra	ene-25	$ 6,847,999,013.00	$ 50,043,070.00	$ 6,898,042,083.00	$ 489,845,847.00	$ 6,408,196,236.00	$ 13,077,819,935.00	377724 de 2024-04-30 121825 de 2025-03-05	$ 52,085,046,438.00	$ 259,168,086,895.00	943	7/03/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
29D	Ajuste	nov-24	$ (2,725,841.00)	$ (19,920.00)	$ (2,745,761.00)		$ (2,745,761.00)		121825 de 2025-03-05	$ 52,085,046,438.00	$ 259,168,086,895.00	9443	3/09/2025			El Acta de Ajuste 29D negativa se ajusta en la factura del Acta de Ajuste 31D, conforme a lo estipulado en el manual de interventoría.
30D	Ajuste	dic-24	$ (220,277.00)	$ (1,610.00)	$ (221,887.00)		$ (221,887.00)		121825 de 2025-03-05	$ 52,085,046,438.00	$ 259,168,086,895.00	9443	3/09/2025			El Acta de Ajuste 30D negativa se ajusta en la factura del Acta de Ajuste 31D, conforme a lo estipulado en el manual de interventoría.
32	Obra	feb-25	$ 5,446,311,499.00	$ 39,799,969.00	$ 5,486,111,468.00	$ 389,581,404.00	$ 5,096,530,064.00	$ 12,688,238,531.00	121825 de 2025-03-05	$ 46,988,516,374.00	$ 253,681,975,427.00	1552	45745			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11, Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11
31D	Ajuste	ene-25	$ 1,762,053,356.00	$ 12,876,543.00	$ 1,774,929,899.00		$ 1,774,929,899.00		121825 de 2025-03-05	$ 45,213,586,475.00	$ 251,907,045,528.00	9443	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11, se descuenta acta de ajuste 29D y 30D
33	Obra	mar-25	$ 5,759,787,881.00	$ 42,090,758.00	$ 5,801,878,639.00	$ 412,004,757.00	$ 5,389,873,882.00	$ 12,276,233,774.00	377724 de 2024-04-30 121825 de 2025-03-05	$ 39,823,712,593.00	$ 246,105,166,889.00	3132	45792			Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Regustro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11 , Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11, Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401023-02. Recurso:11, Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
32D	Ajuste	feb-25	$ 1,368,747,296.00	$ 10,002,384.00	$ 1,378,749,680.00		$ 1,378,749,680.00		121825 de 2025-03-05	$ 38,444,962,913.00	$ 244,726,417,209.00	9445	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
34	Obra	abr-25	$ 3,204,409,144.00	$ 23,416,836.00	$ 3,227,825,980.00	$ 229,215,353.00	$ 2,998,610,627.00	$ 12,047,018,421.00	121825 de 2025-03-05	$ 35,446,352,286.00	$ 241,498,591,229.00	4600	8/06/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
33D	Ajuste	mar-25	$ 1,580,748,550.00	$ 11,551,624.00	$ 1,592,300,174.00		$ 1,592,300,174.00		121825 de 2025-03-05	$ 33,854,052,112.00	$ 239,906,291,055.00	3132	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
35	Obra	may-25	$ 2,790,955,372.00	$ 23,428,775.00	$ 2,814,384,147.00	$ 199,640,493.00	$ 2,614,743,654.00	$ 11,847,377,928.00	121825 de 2025-03-05	$ 31,239,308,458.00	$ 237,091,906,908.00	6477	8/07/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
34D	Ajuste	abr-25	$ 785,310,693.00	$ 5,738,809.00	$ 791,049,502.00		$ 791,049,502.00		121825 de 2025-03-05	$ 30,448,258,956.00	$ 236,300,857,406.00	9453	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
36	Obra	jun-25	$ 5,022,094,444.00	$ 36,699,921.00	$ 5,058,794,365.00	$ 359,236,633.00	$ 4,699,557,732.00	$ 11,488,141,295.00	121825 de 2025-03-05	$ 25,748,701,224.00	$ 231,242,063,041.00	7586	24/07/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
35D	Ajuste	may-25	$ 639,033,203.00	$ 4,669,858.00	$ 643,703,061.00		$ 643,703,061.00		121825 de 2025-03-05	$ 25,104,998,163.00	$ 230,598,359,980.00	9457	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
36D	Ajuste	jun-25	$ 1,168,173,429.00	$ 8,536,652.00	$ 1,176,710,081.00		$ 1,176,710,081.00	$ -	121825 de 2025-03-05	$ 23,928,288,082.00	$ 229,421,649,899.00	9460	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
37	Obra	jul-25	$ 2,301,589,553.00	$ 16,819,308.00	$ 2,318,408,861.00	$ 164,635,550.00	$ 2,153,773,311.00	$ 11,323,505,745.00	121825 de 2025-03-05	$ 21,774,514,771.00	$ 227,103,241,038.00	9436	3/09/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
	Anticipo	ago-25						$ 6,000,000,000.00	121825 de 2025-03-05	$ 15,774,514,771.00						Las afectaciones presupuestales del Anticipo 2 fueron las diguientes: Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Registro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11 por $ 6,000,000,000.
37D	Ajuste	jul-25	$ 557,291,602.00	$ 4,072,516.00	$ 561,364,118.00		$ 561,364,118.00		121825 de 2025-03-05	$ 15,213,150,653.00	$ 226,541,876,920.00	11282	2/10/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
38	Obra	ago-25	$ 3,003,188,185.00	$ 32,287,856.00	$ 3,035,476,041.00	$ 322,421,230.00	$ 2,713,054,811.00	$ 17,001,084,515.00	121825 de 2025-03-05	$ 12,500,095,842.00	$ 223,506,400,879.00	11291	2/10/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
39	Obra	sep-25	$ 2,962,400,420.00	$ 21,648,311.00	$ 2,984,048,731.00	$ 324,152,095.00	$ 2,659,896,636.00	$ 16,676,932,420.00	121825 de 2025-03-05	$ 9,840,199,206.00	$ 220,522,352,148.00	12265	23/10/2025			Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
38D	Ajuste	ago-25	$ 795,502,623.00	$ 5,813,288.00	$ 801,315,911.00		$ 801,315,911.00		121825 de 2025-03-05	$ 9,038,883,295.00	$ 219,721,036,237.00					Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
40	Obra	oct-25	$ 4,625,357,115.00	$ 33,800,687.00	$ 4,659,157,802.00	$ 506,116,320.00	$ 4,153,041,482.00	$ 16,170,816,100.00	121825 de 2025-03-05	$ 4,885,841,813.00	$ 215,061,878,435.00					Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
39D	Ajuste	sep-25	$ 761,181,864.00	$ 5,562,483.00	$ 766,744,347.00		$ 766,744,347.00		121825 de 2025-03-05	$ 4,119,097,466.00	$ 214,295,134,088.00					Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
40D	Ajuste	oct-25	$ 1,082,783,904.00	$ 7,912,652.00	$ 1,090,696,556.00		$ 1,090,696,556.00		121825 de 2025-03-05	$ 3,028,400,910.00	$ 213,204,437,532.00					Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
41	Obra	nov-25	$ 2,416,444,620.00	$ 63,572,524.00	$ 2,480,017,144.00	$ 236,912,701.00	$ 2,243,104,443.00	$ 15,933,903,399.00	121825 de 2025-03-05	$ 785,296,467.00	$ 210,724,420,388.00					Registro Presupuestal No 121825 Fecha de Regustro 2025-03-05, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11
TOTALES			**$ 107,200,154,044.00**	**$ 1,442,186,569.00**	**$ 108,642,340,613.00**	**$ 5,066,096,601.00**	**$ 103,576,244,012.00**	**$ 15,933,903,399.00**		**$ 785,296,467.00**	**$ 210,724,420,388.00**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 85,918,939,526.00	$ 627,869,175.00	$ 86,546,808,701.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 17,557,322,002.00	$ 128,346,090.00	$ 17,685,668,092.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,340,000,000.00	$ 634,600,000.00	$ 3,974,600,000.00
GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	$ 383,892,516.00	$ 51,371,304.00	$ 435,263,820.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 107,200,154,044.00**	**$ 1,442,186,569.00**	**$ 108,642,340,613.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
NOMBRE: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Director de Obra
Matricula Profesional No: 52202-58774 NRÑ

Firma
NOMBRE: RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 25202-39452 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO N° 005 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAGUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAGUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

PRECATA PARCIAL DE OBRA No. 41 - CORRESPONDIENTE DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE 2025

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	VR. UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		ACUMULADO FINAL	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				EXPLANACIONES				$ 5,097,282,410.00			$ 5,362,841,401.00	$ -			$ 5,362,841,401.00
1	200.2 (1 Y/07)	200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,085,131.00	5.00	$ 5,475,655.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
2	201.7 (1 Y/07)	201-22		Demolición de estructuras	m3	$ 187,134.00	2,060.00	$ 220,084,040.00	1	362.99	$ 39,839,829.66	0.000	$ -	362.99	$ 39,839,829.66
3	210.1.2 (1 Y/07)	210-22		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 13,380.00	8,562.00	$ 185,316,360.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
4	210.2.2 (1 Y/07)	210-22		Excavaciones en material conocido de la Explanación y Canales	m3	$ 10,685.00	103,134.00	$ 1,101,992,133.00	1	45,997.60	$ 490,413,896.00	0.000	$ -	45,997.60	$ 490,413,896.00
5	220.1 (1 Y/07)	220-22		Terraplenes	m3	$ 12,680.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
6	220.2 (1 Y/07)	220-22		Cacheos de rellenos tipo Asphalt rato o similar	m2	$ 11,180.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
7	208 1P (1Y/07)		208-1P	Mejoramiento de la subrasante con material granul., cruce de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compactado y incluye transporte)	m3	$ 92,580.00	72,042.20	$ 6,668,563,560.00	1	52,265.10	$ 4,839,094,758.00	0.000	$ -	52,265.10	$ 4,839,094,758.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				$ 40,239,865,784.00			$ 19,807,242,489.00	$ -			$ 19,807,242,489.00
9	310.1 (1 Y/07)	310-22		Conformación de la calzada existente	m2	$ 920.00	1,201,415.00	$ 1,111,303,780.00	1	1,040,270.70	$ 970,583,723.00	0.000	$ -	1,040,270.70	$ 970,583,723.00
9	311.1 (1 Y/07)	311-22		Afirmado	m3	$ 80,000.00	52,033.00	$ 4,754,570,080.00	1	24,970.00	$ 2,293,020,011.00	0.000	$ -	24,970.00	$ 2,293,020,011.00
10	330.1 (1 Y/07)	330-22		Subbase Granular clase A	m3	$ 127,410.00	269,060.00	$ 34,544,717,196.00	1	191,447.65	$ 16,747,739,716.00	0.000	$ -	191,447.65	$ 16,747,739,716.00
11	330.1 (1 Y/07)	330-22		Base granular clase A	m3	$ 139,180.97	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
12	330.4 (1 Y/07)	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	$ 143,080.00	280.00	$ 40,062,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 698,402,360.00			$ 62,700,000.00	$ -			$ 62,700,000.00
13	420.2 (1 Y/07)	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,921.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
14	421.1 (1 Y/07)	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,680.00	12,480.00	$ 20,966,400.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
15	450 1P (1Y/07)		450-1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	$ 687,080.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
16	450 2P (1Y/07)		450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 611,080.00	634.00	$ 514,174,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
17	450 3P (1Y/07)		450-3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheo	m3	$ 605,080.00	103.00	$ 62,700,000.00	1	76.00	$ 62,700,000.00	0.000	$ -	76.00	$ 62,700,000.00
18	460 1P (1Y/07)		460-1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 85,580.00	103.00	$ 8,815,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
19	465 1 (1 Y/07)	465-22		Escarificación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de los viejos asfálticos y de las subyacentes	m3	$ 71,680.00	1,080.00	$ 77,414,400.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				$ 193,362,294,083.00			$ 16,859,244,035.00	$ 1,274,478,800.00			$ 18,273,725,115.00
20	600.1.1 (1 Y/04)	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 25,170.00	17,349.70	$ 436,681,549.00	1	11,769.10	$ 296,229,247.00	0.000	$ -	11,769.10	$ 296,229,247.00
21	600.2.4 (1 Y/07)	600-22		Excavaciones varias en material conan bajo agua	m3	$ 95,680.00	19,061.66	$ 1,164,261,084.00	1	13,597.40	$ 830,780,284.00	0.000	$ -	13,597.40	$ 830,780,284.00
22	610.1 (1 Y/04)	610-22		Rellenos para estructuras con suelo	m3	$ 30,690.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
23	610.2 (1 Y/04)	610-22		Rellenos para estructuras con recebo	m3	$ 182,080.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
24	610.3 (1 Y/04)	610-22		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	$ 165,162.00	3,402.00	$ 562,005,924.00	1	264.40	$ 43,701,368.80	0.000	$ -	264.40	$ 43,701,368.80
25	621.1 (P (1Y/03)		621.1-P	Pilote in concreto de 30 kilos en diametro D=2.50 m, incluye excavación con pilotoadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=2.50 m y e = 50/12.5mm, no incluye acero de refuerzo	M	$ 2,280,080.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
26	630.1 P (1Y/03)		630.1-P	Concreto clase 4S MPA, para viga capn voladizo de puentes	m3	$ 2,080,080.00	11,064.64	$ 23,009,280,080.00	1	914.49	$ 1,629,000,000.00	211.200	$ 422,400,000.00	1,125.80	$ 2,251,680,080.00
27	630.2 P (1Y/03)		630.2-P	Concreto clase 4S MPA, para vigas preesforzadas tastadas de puentes	m3	$ 1,560,080.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
28	630.1.1P (1Y/03)		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo I	m3	$ 1,560,080.00	428.46	$ 668,500,080.00	1	332.40	$ 283,120,000.00	0.000	$ -	332.40	$ 283,120,000.00
29	630.1.2P (1Y/03)		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	$ 1,520,080.00	170.25	$ 252,084,080.00	1	87.43	$ 115,000,000.00	0.000	$ -	87.43	$ 115,000,080.00
30	630.3.1P (1Y/03)		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,180,080.00	2,791.00	$ 3,070,780,080.00	1	1,045.90	$ 1,150,000,000.00	0.000	$ -	1,045.90	$ 1,150,000,080.00
31	630.3.4P (1Y/03)		630.3.4P	Concreto clase 35 MPa para tablero y andén	m3	$ 1,264,299.00	476.68	$ 687,780,183.00	1	90.00	$ 99,999,390.00	0.000	$ -	90.00	$ 99,999,390.00
32	630.3 0P		630.3 0P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,010,080.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
32.1	630.3 3P (1Y/04)		630.3 3P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,010,080.00	2,451.30	$ 2,475,012,080.00	1	1,227.10	$ 1,250,671,000.00	0.000	$ -	1,227.10	$ 1,250,671,080.00
32.2	630.3 3P (1Y/03)		630.3 3P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,010,080.00	1,080.75	$ 1,049,087,080.00	1	550.60	$ 565,156,000.00	0.000	$ -	550.60	$ 565,156,080.00
33	630.4 (1 Y/04)	630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 720,080.00	469.00	$ 295,056,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
34	630 0	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 689,329.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
34.1	630 0.1 (1 Y/04)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 689,329.00	080.48	$ 445,413,282.00	1	110.58	$ 95,827,000.00	0.000	$ -	110.58	$ 95,827,080.00
34.2	630 0.1 (1 Y/03)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 689,329.00	120.35	$ 81,221,346.00	1	19.30	$ 9,930,000.00	0.000	$ -	19.30	$ 9,930,080.00
35	632 1P (1Y/03)		632-1P	Baranda Metalica	m	$ 640,080.00	3,140.64	$ 2,121,749,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
36	640-18	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	$ 6,782.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
36.1	640 1 (1 Y/04)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	$ 6,782.00	805,170.00	$ 5,460,540,382.00	1	110,685.00	$ 747,945,130.00	0.000	$ -	110,685.00	$ 747,945,130.00
36.2	640.1 (1 Y/03)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	$ 6,782.00	3,647,061.00	$ 24,764,982,282.00	1	1,122,652.80	$ 7,580,151,700.00	81,115.000	$ 547,490,550.00	1,203,767.80	$ 8,127,642,212.00
37	641 1 (1 Y/03)	641-22		Acero de Preesforzado	Ton	$ 3,430.00	6,347,080.00	$ 21,765,067,560.00	1	323,112.38	$ 1,108,870,440.00	84,249.000	$ 294,399,074.00	407,361.30	$ 1,983,269,514.00
38	642 1 (1 Y/03)	642-22		Apoyo elastoménico de neopreno, dureza 60 (Elastoflon con 2 platinas)	U	$ 723,081.00	47.00	$ 33,984,087.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
39	643 2 (1 Y/03)	643-22		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo tipo SEJ-E (Elastomeric Strip Seal) PAVMOP incluye lecho de pega de bordillos y pasos (MALLA CVC CI-22 e imprimación)	m	$ 372,145.00	262.35	$ 93,884,989.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
40	661 1 (1 Y/04)	661-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1830mm de diámetro interior	m	$ 670,080.00	1,311.00	$ 878,783,080.00	1	486.20	$ 325,764,000.00	0.000	$ -	486.20	$ 325,764,080.00
41	671 1 (1 Y/04)	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m2	$ 540,080.00	5,445.00	$ 3,049,243,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
42	673 1 (1 Y/04)	673-22		Gaviadil Tipo 2 no bajio	m2	$ 7,777.00	119,614.20	$ 930,255,187.00	1	71,942.50	$ 559,696,822.00	0.000	$ -	71,942.50	$ 559,696,822.00
43	673 2	673-22		Material granular drenante	m3	$ 122,081.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
43.1	673.2 (1 Y/04)	673-22		Material granular drenante	m3	$ 122,081.00	3,023.00	$ 482,083,370.00	1	2,539.40	$ 311,940,859.00	0.000	$ -	2,539.40	$ 311,940,859.00
43.2	673.2 (1 Y/03)	673-22		Material granular drenante	m3	$ 122,081.00	332.00	$ 40,783,092.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
44	673.3 (1 Y/04)	673-22		Material de cobertura tipo SBG	m3	$ 172,364.00	2,099.00	$ 482,083,080.00	1	1,367.80	$ 235,677,411.00	0.000	$ -	1,367.80	$ 235,677,411.00
45	805 4P (1Y/09)		805.4P	Muro en suelo mecanicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, atestan con revestimiento GEOTUB revestido. Relleno y conformación resistencias mecanicamente y anclados manualmente incluye transporte	m2	$ 440,080.00	10,580.00	$ 5,655,752,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 2,016,504,080.00			$ 6,391,296.00	$ -			$ 6,391,296.00
46	1P (1 Y/07)	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimento	m	$ 1,989.00	63,095.00	$ 127,084,110.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
47	2P (1 Y/07)	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca vial con pintura en rio	m2	$ 342,999.00	1,068.00	$ 91,789,644.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
48	4P (1 Y/07)	Manual de Señalización		Suministro e instalación de tachas reflectivo bidireccionales	U	$ 8,377.00	12,480.00	$ 104,511,576.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
49	5P (1 Y/07)	Manual de Señalización		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tal, sr y sv (.75mx75cm) con lamina acero galvanizado reflectivotipo	U	$ 389,436.00	214.00	$ 85,483,584.00	1	16.00	$ 6,391,296.00	0.000	$ -	16.00	$ 6,391,296.00
50	700 1 (1 Y/07)	700-22		Delineac tentativa	m	$ 233,612.00	9,080.00	$ 2,066,464,280.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
51	700.2 (1 Y/07)	700-22		Seccion Tetal	U	$ 152,783.00	192.00	$ 10,480,040.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
52	740.1 (1 Y/07)	740-22		Captafaros	U	$ 22,154.00	3,472.00	$ 76,874,380.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
				OBRAS VARIAS				$ 843,832,100.00			$ -	$ -			$ -
53	810 1 (1 Y/06)	810-22		Protección de Taludes con Bolsacreto de cimpent	m2	$ 17,800	31,469.00	$ 560,058,100.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
				TRANSPORTES				$ 622,714,066.00			$ 168,177,480.00	$ -			$ 168,177,480.00
54	900.2 (1 Y/09)	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstames para distancias mayores de mil metros (1000 m), exceso o parte de este metro (000 m)	m3/km	$ 1,800	087,480.11	$ 622,714,066.00	1	180,650.00	$ 105,177,480.00	0.000	$ -	180,650.00	$ 105,177,480.00
				NO PREVISTOS				$ 75,496,680,830.00			$ 41,287,115,059.00	$ 706,647,304.80			$ 42,207,762,704.80
55	900.1 (1 Y/07)	900-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HORALUCO MR-45 (SVISA/ PAVIMAX)	m3	$ 1,131,441.00	39,477.00	$ 44,667,000,000.00	1	9,799.50	$ 10,792,449,039.00	0.000	$ -	9,799.50	$ 10,792,449,039.00
56	MP-55 (1Y/07)		MP-55P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1055 DIAMETRO=57 mm L=55 M. (5 a 6 varillas) (Nova Transpasa)	U	$ 8,190,982.00	320.00	$ 2,620,962,880.00	1	160.00	$ 1,289,790,016.00	0.000	$ -	160.00	$ 1,289,790,016.00
57	MP-56 (1Y/07)		MP-56P	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 3 (LE 12) (GARVIBER)	m	$ 31,499,380.00	22.80	$ 718,186,080.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
58	MP-57 (1Y/07)		MP-57P	JUNTA T-200 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	$ 15,087,089.00	99.80	$ 1,505,693,945.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
59	MP-58 (1Y/07)		MP-57P	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 3 o similar PARA PILA 3 (suministro)	m	$ 34,115,333.00	17.40	$ 412,267,542.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
60	621.1P (1Y/03)	621-22		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 30 MPA, DIAMETRO D = 1.80 m, INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m	$ 6,210,434.00	2,030.00	$ 12,617,457,516.00	1	960.00	$ 6,172,955,166.00	158.000	$ 670,943,000.00	1,101.50	$ 6,843,898,256.00
61	621 5P (1Y/03)	621-22		CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO 1.80 m. (en acero A 36 en 10mm)	m	$ 14,563,182.00	4,100.00	$ 59,751,284,640.00	1	1,024.00	$ 15,204,156,000.00	8.000	$ 119,734,016.00	1,032.80	$ 15,453,891,740.00
62	MP-59 (1Y/07)		MP-59P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS FUENTE 1 (Fila 3-4-5) o similar	U	$ 343,175,354.00	4.00	$ 1,441,283,084.00	1	4.00	$ 1,441,283,084.00	0.000	$ -	4.00	$ 1,441,283,084.00
63	MP-60 (1Y/07)		MP-60P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Fuente 2 (Fila 1-2-6-7-8-9-10-11) o similar	U	$ 596,087,570.00	10.00	$ 3,065,875,780.00	1	7.50	$ 3,105,414,230.00	0.000	$ -	7.50	$ 3,105,414,230.00
64	642 1.3 (1Y/03)	621-22		APOYO ELASTOMERICO HDR3-H 900/1035 (Vigas Postensadas) o similar	U	$ 41,390,523.00	52.00	$ 1,480,441,782.00	1	20.00	$ 1,220,312,420.00	0.000	$ -	20.00	$ 1,220,312,420.00
65	642 1.2 (1Y/03)	621-22		APOYO ELASTOMERICO HDR3-H 900/1035 (Pilas 2-5-12) o similar	U	$ 154,512,089.00	8.00	$ 1,289,496,072.00	1	7.20	$ 1,114,648,400.00	0.000	$ -	7.20	$ 1,114,648,400.00
66	800.8 (1 Y/07)	800-22		CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	$ 359.00	741,720.00	$ 1,983,080,184.00	1	4,299.90	$ 102,640,255.00	0.000	$ -	4,299.90	$ 102,640,255.00
67	201.16 (1Y/21)	201-22		REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (incluye transp)	m	$ 23,114.00	142,736.00	$ 182,967,024.00	1	5,199.90	$ 95,722,269.00	0.000	$ -	5,199.90	$ 95,722,269.00
68	201.16 (1Y/21)	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	$ 130,679.00	1,161,679.00	$ 176,427,920.00	1	336.80	$ 45,024,960.00	0.000	$ -	336.80	$ 45,024,960.00
69	900.1 (1 Y/09)	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE 5001 METROS Y MIL METROS (1000 METROS DE DISTANCIA	m3-ft	$ 1,800.00	100,000.00	$ 180,000,000.00	1	36,092.70	$ 65,179,110.00	0.000	$ -	36,092.70	$ 65,179,110.00
70	MP-61 (1Y/04)		MP-61P	CINTA PVC V15 o similar	m	$ 46,117.00	780.00	$ 51,087,780.00	1	419.70	$ 29,580,705.00	0.000	$ -	419.70	$ 29,580,705.00
71	MP-62 (1Y/04)		MP-62P	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 150 mm (6") o similar	m	$ 16,476.00	10,000.00	$ 40,056,080.00	1	1,202.20	$ 32,990,152.00	0.000	$ -	1,202.20	$ 32,990,152.00
72	MP-63 (1Y/04)		MP-63P	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	$ 20,410.00	597.00	$ 7,041,680.00	1	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
73	MP-11 (1Y/21)		MP-11P	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 lt/m2 - Lado Putumayo)	Dia	$ 3,165,740.00	364.00	$ 1,165,220,560.00	1	130.00	$ 403,624,116.00	0.000	$ -	130.00	$ 403,624,116.00
												0.000	$ -		
												0.000	$ -		
				TOTALES				$ 231,537,824,569.00			$ 83,703,813,642.80	$ 2,185,126,484.80			$ 85,910,939,926.08
								$ 991							
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 231,537,825,551.00			$ 83,703,813,642.80	$ 2,185,126,484.80			$ 85,910,939,926.08
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 19,908,319,478.00			$ 17,997,007,002.00				$ 17,997,007,002.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO DE HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 308,808,008.00			$ -	$ -			$ -
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 308,364,008,007.00			$ 101,311,105,644.80	$ 2,185,126,484.80			$ 103,474,264,329.08
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)				$ 1,600,308,705.60			$ 612,647,697.60	$ 15,822,076.80			$ 627,969,170.08
				VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)				$ 435,174,418.00			$ 120,346,080.00	$ -			$ 120,346,080.00
				VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)				$ 58,673,521.00			$ -	$ -			$ -
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)				$ 307,577,379,689.00			$ 102,051,535,231.20	$ 2,199,948,562.80			$ 104,232,476,795.00
				REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)				$ 3,340,308,008.00			$ 3,090,651,804.80	$ 251,515,195.00			$ 3,342,083,080.00
				IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)				$ 634,858,008.00			$ 587,043,934.80	$ 47,799,446.00			$ 634,843,080.00
				TOTAL REVISIÓN Y O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K =(H+J)				$ 3,974,666,000.00			$ 3,678,031,418.80	$ 299,468,802.00			$ 3,974,926,080.00
				TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (incluye IVA,PAGOS A TERCEROS) (L)				$ 7,814,781,342.00			$ 439,283,820.00				$ 439,283,820.00
				VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)				$ -			$ -	$ -			$ -
				VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)				$ -			$ -	$ -			$ -
				TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)				$ -			$ -	$ -			$ -
				TOTAL BASICO ACTA. Q = (D+H+M)				$ 308,364,008,007.00			$ 104,390,610,909.60	$ 2,410,444,620.80			$ 106,800,612,409.08
				TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+N+O)				$ 2,868,974,652.20			$ 1,327,242,741.60	$ 63,672,524.80			$ 1,390,915,266.08
				VALOR TOTAL. S = (Q+R+L+P)				$ 319,368,781,001.00			$ 106,102,223,488.80	$ 2,488,817,144.80			$ 108,602,240,813.08

VALOR TOTAL	**$ 106,102,223,488.80**
$ 2,488,817,144.80	
VALOR TOTAL A FACTURAR	**$ 2,488,817,144.80**

Firma

Nombre: WALTER ORDULA REYES

Residente de Obra

Matrícula No. : 20202-370436 CND

Nombre: JUAN CARLOS CARVAJAL

Residente de Interventoría

Matrícula No. : 15202-349414 CAU

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: KG TOTAL **81,115.30**

PUENTE 1 - MARTILLO 3

ELEMENTO	PARTE	POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (m)	PESO PARCIAL (Kg)	% Ejecutado	PESO EJECUTADO (Kg)	OBSERVACIONES
DOVELA 5	HACIA MAYORES Y MENORES	1	5	6.36	1.552	41	260.76	809.40	100%	809.40	
		2	4	4.6	0.994	27	124.20	246.91	100%	246.91	
		3	4	6.26	0.994	41	256.66	510.24	100%	510.24	
		4	4	4.85	0.994	31	150.35	298.90	100%	298.90	
		5	8	5.3	3.973	6	31.80	252.68	100%	252.68	
		6	6	5.29	2.235	164	867.56	3,877.99	100%	3,877.99	
		7	5	4.75	1.552	84	399.00	1,238.50	100%	1,238.50	
		8	4	2.36	0.994	42	99.12	197.05	100%	197.05	
		9	4	2.25	0.994	42	94.50	187.87	100%	187.87	
		10	4	4.85	0.994	85	412.25	819.55	100%	819.55	
		10a	4	4.85	0.994	27	130.95	260.33	100%	260.33	
		11	5	4	1.552	21	84.00	260.74	100%	260.74	
		12	5	2.75	1.552	82	225.50	699.95	100%	699.95	
		13	5	11.66	1.552	41	478.06	1,483.90	100%	1,483.90	
		15	5	2.75	1.552	82	225.50	699.95	100%	699.95	
DOVELA 6	HACIA MAYORES Y MENORES	1	5	6.36	1.552	41	260.76	809.40	100%	809.40	
		2	4	4.60	0.994	27	124.20	246.91	100%	246.91	
		3	4	6.26	0.994	41	256.66	510.24	100%	510.24	
		4	4	4.85	0.994	31	150.35	298.90	100%	298.90	
		5	8	5.30	3.973	6	31.80	252.68	100%	252.68	
		6	6	4.97	2.235	164	815.08	3,643.41	100%	3,643.41	
		7	5	4.75	1.552	76	361.00	1,120.54	100%	1,120.54	
		8	4	2.36	0.994	42	99.12	197.05	100%	197.05	
		9	4	2.25	0.994	42	94.50	187.87	100%	187.87	
		10	4	4.85	0.994	85	412.25	819.55	100%	819.55	
		10a	4	4.85	0.994	27	130.95	260.33	100%	260.33	
		11	5	4.00	1.552	21	84.00	260.74	100%	260.74	
		12	5	2.75	1.552	82	225.50	699.95	100%	699.95	
		13	5	11.66	1.552	41	478.06	1,483.90	100%	1,483.90	
		15	5	2.75	1.552	82	225.50	699.95	100%	699.95	
TOTAL								23,335.37		23,335.37	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA - nov25										23,335.37	






OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

PUENTE 1 - MARTILLO 5

ELEMENTO	PARTE	POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (m)	PESO TOTAL (Kg)	% Ejecutado	PESO EJECUTADO (Kg)	OBSERVACIONES
DOVELA 0	HACIA MAYORES Y MENORES	6	6	7.84	2.235	240	1,881.60	4,205.38	50%	2,102.69	
		16	8	7.83	3.973	108	845.64	3,359.73	50%	1,679.86	
		24	10	8.55	6.404	60	513.00	3,285.25	50%	1,642.63	
		26	10	6.8	6.404	40	272.00	1,741.89	50%	870.94	
		28	8	6.6	3.973	38	250.80	996.43	50%	498.21	
		29	6	2.77	2.235	96	265.92	594.33	50%	297.17	
		30	7	3.94	3.042	68	267.92	815.01	50%	407.51	
		31	7	6.45	3.042	30	193.50	588.63	50%	294.31	
		32	7	5.2	3.042	88	457.60	1,392.02	50%	696.01	
		33	5	7.8	1.552	28	218.40	338.96	50%	169.48	
		34	4	1.46	0.994	48	70.08	69.66	50%	34.83	
DOVELA 1	HACIA MAYORES Y MENORES	1	5	6.35	1.552	36	228.60	709.57	50%	354.79	Losa Inferior
		2	4	4.10	0.994	27	110.70	220.07	50%	110.04	Losa Inferior
		3	4	6.25	0.994	36	225.00	447.30	50%	223.65	Losa Inferior
		4	4	4.35	0.994	31	134.85	268.08	50%	134.04	Losa Inferior
		5	8	4.80	3.973	6	28.80	228.84	50%	114.42	Losa Inferior
		6	6	6.73	2.235	144	968.40	4,328.75	50%	2,164.37	Muro
		7	5	4.25	1.552	108	459.00	1,424.74	50%	712.37	Losa Inferior-Muro
		8	4	2.35	0.994	38	89.30	177.53	50%	88.76	Losa Superior
		9	4	2.25	0.994	38	85.50	169.97	50%	84.99	Losa Superior
		10	4	4.35	0.994	85	369.75	735.06	50%	367.53	Losa Superior
		10a	4	4.35	0.994	27	117.45	233.49	50%	116.75	Losa Superior
		11	5	4.00	1.552	19	76.00	235.90	50%	117.95	Losa Superior
		12	5	2.75	1.552	72	198.00	614.59	50%	307.30	Losa Superior
		13	5	11.65	1.552	36	419.40	1,301.82	50%	650.91	Losa Superior
		7b	5	1.50	1.552	52	78.00	242.11	50%	121.06	Almas
		14	4	0.78	0.994	108	84.24	167.47	50%	83.73	Losa Inferior
TOTAL								28,893.00		14,446.29	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA - nov25										14,446.29	

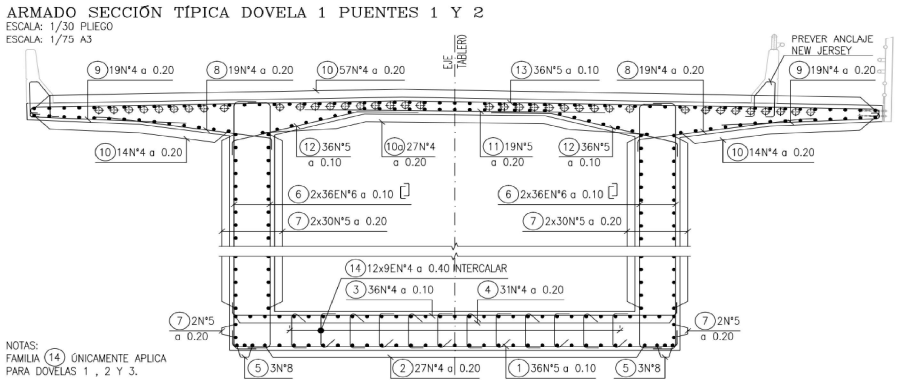





OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

PUENTE 1 - PILA 6

ELEMENTO	PARTE	POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (m)	PESO TOTAL (Kg)	% *Ejecutado*	PESO EJECUTADO (Kg)	OBSERVACIONES
PILA 6	PILA	1	8	7.67	3.973	144	1,104.48	4,388.10	100%	4,388.10	
		1a	8	7.67	3.973	36	276.12	1,097.02	100%	1,097.02	
		2	5	6.30	1.552	248	1,562.40	2,424.84	100%	2,424.84	
		3	5	4.30	1.552	248	1,066.40	1,655.05	100%	1,655.05	
		4	5	0.75	1.552	2976	2,232.00	3,464.06	100%	3,464.06	
		4a	4	0.66	0.994	1488	982.08	976.19	100%	976.19	
		5	5	1.73	1.552	248	429.04	665.87	100%	665.87	
	DADO SUPERIOR	1	10	8.00	6.404	118	944.00	6,045.38	100%	6,045.38	
		2	10	6.65	6.404	118	784.70	5,025.22	100%	5,025.22	
		3	10	7.91	6.404	118	933.38	5,977.37	100%	5,977.37	
		4	10	6.65	6.404	118	784.70	5,025.22	100%	5,025.22	
		5	5	1.75	1.552	112	196.00	304.19	100%	304.19	
		6	5	6.32	1.552	60	379.20	588.52	100%	588.52	
		7	6	9.00	2.235	12	108.00	241.38	100%	241.38	
		8	6	4.55	2.235	12	54.60	122.03	100%	122.03	
	MESETAS	6	6	6.80	2.235	32	217.60	486.34	100%	486.34	
		7	6	4.21	2.235	140	589.40	1,317.31	100%	1,317.31	
TOTAL								39,804.00		39,804.09	
Descuento acero de dovela 4 pila 3 posición 6 - pagado en acta 40										131.90	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA - nov25										39,672.19	

CUADRO DE DESPIECE DADO SUPERIOR
PILA 6 CANTIDADES PARA:1 (ES:1)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	10	118	8.00	0.25 5.91 0.25	944.00
2	10	118	6.65	0.25 5.90 0.25	784.70
3	10	118	7.91	0.25 5.90 0.25	932.79
4	10	118	6.65	0.25 5.90 0.25	784.70
5	5	112	1.75	0.25 1.35 0.25	195.44
6	5	60	6.32	0.25 5.92 0.25	378.90
7	6	12	9.00	0.25 5.92 0.25	108.00
8	6	12	4.55	4.55	54.60

RESUMEN

No.	LONGITUD TOTAL (m)	PESO kg/m	PESO Kg
10	3446.19	6.40	22055.6

CUADRO DE DESPIECE PILA 6
CANTIDADES PARA: 1 (ES:1)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	8	144	7.67	0.25 6.97 0.25	1104.48
1a	8	36	7.67	0.25 6.97 0.25	276.12
2	5	248	6.30	0.25 5.91 0.25	1562.40
3	5	248	4.30	0.25 3.91 0.25	1067.84
4	5	2976	0.75	0.25 0.25 0.25	2217.12
4a	4	1488	0.66	0.25 0.25 0.25	974.64
5	5	248	1.73	0.25 1.23 0.25	429.54
6	6	12	6.80	0.25 1.25 1.25 1.25 0.25	217.60
7	6	140	4.21	0.25 1.25 1.25 1.25 0.25	589.68

RESUMEN

No.	LONGITUD TOTAL (m)	PESO kg/m	PESO Kg
8	1380.60	4.00	5522.4
6	807.28	2.25	1816.4
5	3276.70	1.56	8231.8
4	974.64	1.00	974.6
		PESO TOTAL	16545.1 Kg





OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

PUENTE 1 - PILA 6


PILOTE	POSICIÓN	No. VARILLA	LONGITUD PARCIAL (m)	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg)	% *Ejecutado*	PESO EJECUTADO (Kg)
1	1	5	6.00	1.552	398	2,388.00	3,706.18	100%	3,706.18
	1a	6	6.00	2.235	82	492.00	1,099.62	100%	1,099.62
	2	10	12.00	6.404	16	192.00	1,229.57	100%	1,229.57
	2a	10	9.00	6.404	16	144.00	922.18	100%	922.18
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	6.80	6.404	16	108.80	696.76	100%	696.76
	4a	10	3.80	6.404	16	60.80	389.36	100%	389.36
2	1	5	6.00	1.552	398	2,388.00	3,706.18	100%	3,706.18
	1a	6	6.00	2.235	82	492.00	1,099.62	100%	1,099.62
	2	10	12.00	6.404	16	192.00	1,229.57	100%	1,229.57
	2a	10	9.00	6.404	16	144.00	922.18	100%	922.18
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	6.80	6.404	16	108.80	696.76	100%	696.76
	4a	10	3.80	6.404	16	60.80	389.36	100%	389.36
3	1	5	6.00	1.552	398	2,388.00	3,706.18	100%	3,706.18
	1a	6	6.00	2.235	82	492.00	1,099.62	100%	1,099.62
	2	10	12.00	6.404	16	192.00	1,229.57	100%	1,229.57
	2a	10	9.00	6.404	16	144.00	922.18	100%	922.18
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	6.80	6.404	16	108.80	696.76	100%	696.76
	4a	10	3.80	6.404	16	60.80	389.36	100%	389.36
4	1	5	6.00	1.552	398	2,388.00	3,706.18	100%	3,706.18
	1a	6	6.00	2.235	82	492.00	1,099.62	100%	1,099.62
	2	10	12.00	6.404	16	192.00	1,229.57	100%	1,229.57
	2a	10	9.00	6.404	16	144.00	922.18	100%	922.18
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	6.80	6.404	16	108.80	696.76	100%	696.76
	4a	10	3.80	6.404	16	60.80	389.36	100%	389.36
TOTAL							49,388.59		49,388.59
Cantidad Cobrada en Actas Anteriores (Acta 29: 94% Pilotes 1 al 4. Acta 31: 6% Pilotes 1 y 3. Acta 32: 6% Pilote 4)									48,647.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA 6%- nov25									741.59

CUADRO DE DESPIECE PILOTES ø1.80m
L=29.00m CANTIDADES PARA: 1 (SON:4)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	5	398	6.00	R0.81 5.13 .17 .17 0.53	2388.40
1a	6	82	6.00	R0.81 5.12 .20 .20 0.48	492.08
2	10	16	12.00	11.55 0.45	192.00
2a	10	16	9.00	8.55 0.45	144.00
3	10	32	12.00	12.00	384.00
3a	10	32	9.00	9.00	288.00
4	10	16	6.80	6.80	108.80
4a	10	16	3.80	3.80	60.80

RESUMEN

No.	LONGITUD TOTAL (m)	PESO kg/m	PESO Kg
10	1177.60	6.40	7536.6
6	492.08	2.25	1107.2
5	2388.40	1.56	3725.9
		PESO TOTAL	12369.7 Kg
		VOLUMEN DE CONCRETO	74.18 m³
		CUANTIA	166.76 Kg/m³

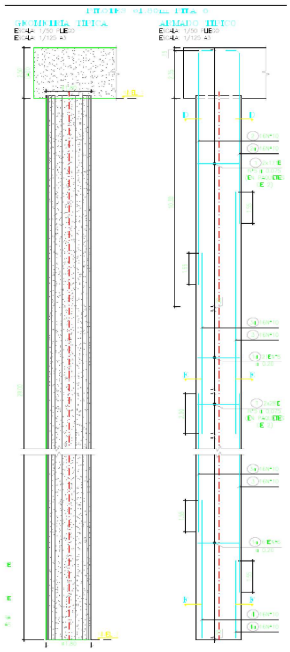

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

PUENTE 2 - PILA 7

PILOTE	POSICIÓN	No. VARILLA	LONGITUD PARCIAL (m)	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg)	% *Ejecutado*	PESO EJECUTADO (Kg)
1	1	5	6.00	1.552	520	3,120.00	4,842.24	100%	4,842.24
	1a	6	6.00	2.235	96	576.00	1,287.36	100%	1,287.36
	2	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	11.75	6.404	32	376.00	2,407.90	100%	2,407.90
	5	10	12.00	6.404	8	96.00	614.78	100%	614.78
	6	10	6.00	6.404	8	48.00	307.39	100%	307.39
3	1	5	6.00	1.552	520	3,120.00	4,842.24	100%	4,842.24
	1a	6	6.00	2.235	96	576.00	1,287.36	100%	1,287.36
	2	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	11.75	6.404	32	376.00	2,407.90	100%	2,407.90
	5	10	12.00	6.404	8	96.00	614.78	100%	614.78
	6	10	6.00	6.404	8	48.00	307.39	100%	307.39
5	1	5	6.00	1.552	520	3,120.00	4,842.24	100%	4,842.24
	1a	6	6.00	2.235	96	576.00	1,287.36	100%	1,287.36
	2	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3	10	12.00	6.404	32	384.00	2,459.14	100%	2,459.14
	3a	10	9.00	6.404	32	288.00	1,844.35	100%	1,844.35
	4	10	11.75	6.404	32	376.00	2,407.90	100%	2,407.90
	5	10	12.00	6.404	8	96.00	614.78	100%	614.78
	6	10	6.00	6.404	8	48.00	307.39	100%	307.39
TOTAL							48,666.91		48,666.91
Cantidada Cobrada en Actas Anteriores 94%									45,747.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA 6% - nov25									2,919.91

CUADRO DE DESPIECE PILOTES ø1.80m
L=36.00m CANTIDADES PARA: 1 (SON:6)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	5	520	6.00	R0.81	3120.52
1a	6	96	6.00	R0.81	576.10
2	10	32	12.00	11.55	384.00
3	10	32	12.00	12.00	384.00
3a	10	32	9.00	9.00	288.00
4	10	32	11.75	11.75	376.00
5	10	8	12.00	12.00	96.00
6	10	8	6.00	6.00	48.00

RESUMEN

No.	LONGITUD TOTAL (m)	PESO kg/m	PESO Kg
10	1576.00	6.40	10086.4
6	576.10	2.25	1296.2
5	3120.52	1.56	4868.0
		PESO TOTAL	16250.6 Kg



Observaciones:

Descripcion	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	Camila Idrobo	Ing. Costos y presupuestos	
Revisó	Walter Orrala Reyes	Residente de obra	
Revisó	Jhon Hernan Torres	Topografo de obra	
Revisó Interventoria	Hector Escobar	Inspector obra Interventoria	
Aceptación Interventoría	Juan Carlos Carvajal	Residente de Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 630.1.P CONCRETO CLASE 42 MPA, PARA VIGA CAJON VOLADIZOS DE PUENTES

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		


UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **311.20**


PUENTE 1 - MARTILLO 5

UBICACIÓN	PARTE	ELEMENTO	Area 1 (m2)	Area 2 (m2)	Espesor (m)	Longitud (m)	Cantidad	Volumen (m3)	% *Ejecutado*	Volumen Ejecutado (m3)	Observaciones
DOVELA 0	Etapa 2	Muro Central	15.277			1.50	1.00	22.92	*100%*	22.92	
		Ventana	-0.920			1.50	1.00	- 1.38	*100%*	- 1.38	
		Cartelas	0.020			3.47	4.00	0.28	*100%*	0.28	
		Superior	3.118			2.75	1.00	8.57	*100%*	8.57	
		Muro lateral Izq	3.161			4.00	1.00	12.64	*100%*	12.64	
		Muro Lateral der	3.140			4.00	1.00	12.56	*100%*	12.56	
	Etapa 3	Losa Superior	4.187			4.00	1.00	16.75	*100%*	16.75	
DOVELA 1	Etapa 1	Muro Lateral izq	2.980			3.50	1.00	10.430	*100%*	10.43	Hacia menores
		Muro Lateral der	2.960			3.50	1.00	10.360	*100%*	10.36	Hacia menores
		Muro Lateral izq	2.960			3.50	1.00	10.360	*100%*	10.36	Hacia mayores
		Muro Lateral der	2.950			3.50	1.00	10.33	*100%*	10.33	Hacia mayores
	Etapa 2	Losa Superior	4.217			3.50	1.00	14.76	*100%*	14.76	Hacia mayores
		Losa Superior	4.217			3.50	1.00	14.76	*100%*	14.76	Hacia menores
Total								**143.33**		**143.33**	
Cantidad a cobrar presente acta nov										**143.33**	


DOVELA 0 – ETAPA 3


3.314

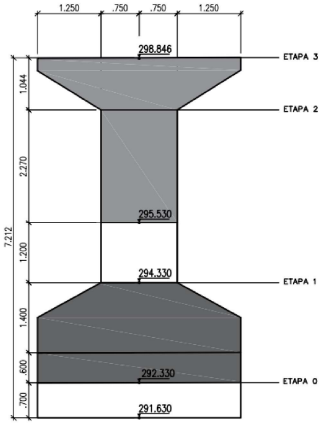

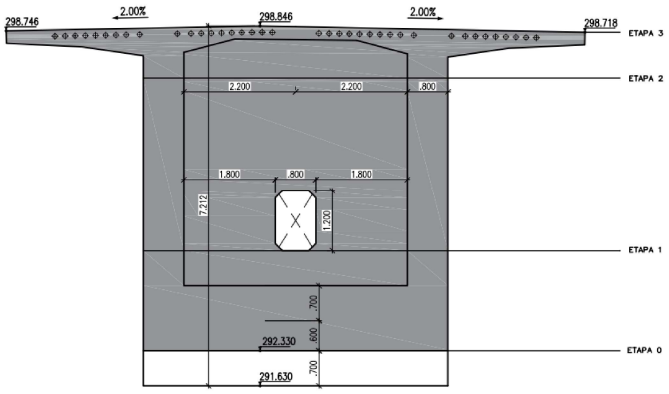

FUNDICION DOVELA 1 – ETAPA 2

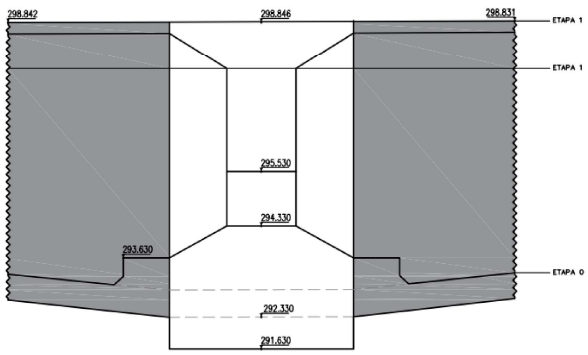

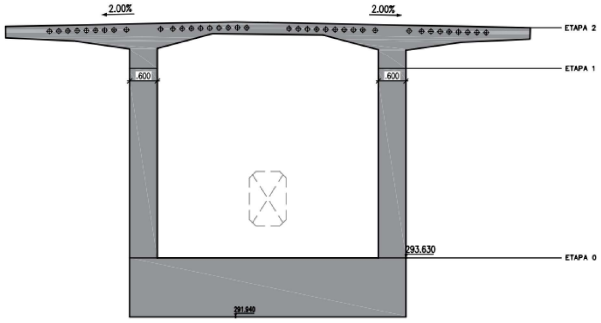

VISTA 1 VISTA 2

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 630.1.P CONCRETO CLASE 42 MPA, PARA VIGA CAJON VOLADIZOS DE PUENTES

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		



PUENTE 1 - MARTILLO 3

UBICACIÓN	PARTE	ELEMENTO	Area 1 (m2)	Area 2 (m2)	Espesor (m)	Longitud (m)	Cantidad	Volumen (m3)	% *Ejecutado*	Volumen Ejecutado (m3)	Observaciones
DOVELA 5	Dovela Hacia Menores	Losa Inferior	2.793			4.00	1.00	11.17	*100%*	11.17	
		Muro Lateral izq	1.898			4.00	1.00	7.59	*100%*	7.59	
		Muro Lateral der	1.884			4.00	1.00	7.53	*100%*	7.53	
		Losa Superior	4.138			4.00	1.00	16.55	*100%*	16.55	
	Dovela Hacia Mayores	Losa Inferior	2.793			4.00	1.00	11.17	*100%*	11.17	
		Muro Lateral izq	1.898			4.00	1.00	7.59	*100%*	7.59	
		Muro Lateral der	1.884			4.00	1.00	7.53	*100%*	7.53	
		Losa Superior	4.138			4.00	1.00	16.55	*100%*	16.55	
DOVELA 6	Dovela Hacia Menores	Losa Inferior	2.682			4.00	1.00	10.728	*100%*	10.73	
		Muro Lateral izq	1.735			4.00	1.00	6.940	*100%*	6.940	
		Muro Lateral der	1.721			4.00	1.00	6.884	*100%*	6.884	
		Losa Superior	4.138			4.00	1.00	16.55	*100%*	16.552	
	Dovela Hacia Mayores	Losa Inferior	2.682			4.00	1.00	10.728	*100%*	10.73	
		Muro Lateral izq	1.735			4.00	1.00	6.940	*100%*	6.940	
		Muro Lateral der	1.721			4.00	1.00	6.88	*100%*	6.884	
		Losa Superior	4.138			4.00	1.00	16.55	*100%*	16.552	
Total								167.90		167.90	
Cantidad a cobrar presente acta-nov										167.90	





Observaciones:

Descripcion	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	Camila Idrobo	Ing. Costos y Presupuestos	
Revisó	Walter Orrala Reyes	Residente de Obra	
Revisó	Jhon Hernan Torres	Topografo de Obra	
Revisó Interventoria	Hector Escobar	Inspector obra Interventoria	
Aceptación Interventoría	Juan Carlos Carvajal	Residente de Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 621.5P CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: ML TOTAL 8.00

PUENTE 2

PILA	PILOTE	CANTIDAD	LONGITUD INSTALADA (*) (m)	% *Aprobado*	LONGITUD APROBADA (m)	LONGITUD APROBADA TOTAL (m)	OBSERVACIONES
7	1	1	23.06	86.73%	20.00	80.00	
	3	1	23.00	86.96%	20.00		
	4	1	24.41	81.93%	20.00		
	5	1	22.87	87.45%	20.00		
TOTAL			93.34		80.00	80.00	
Cantidad cobrada Actas anteriores Pila 7- Pilote 1						18.00	
Cantidad cobrada Actas anteriores Pila 7-Pilote 3						18.00	
Cantidad cobrada Actas anteriores Pila 7-Pilote 4						18.00	
Cantidad cobrada Actas anteriores Pila 7-Pilote 5						18.00	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA - Nov25						8.00	





Observaciones: (*) Pendiente analisis de justificacion tecnica del uso adicional de camisas por parte de especialistas.

Descripcion	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	Camila Idrobo	Ing. Costos y presupuestos	
Revisó	Walter Orrala Reyes	Residente de obra	
Revisó	Jhon Hernan Torres	Topografo de obra	
Revisó Interventoria	Hector Escobar	Inspector obra Interventoria	
Aceptación Interventoría	Juan Carlos Carvajal	Residente de Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 621.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)


CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: ML TOTAL 108.00

PUENTE 2

PILA	PILOTE	CANTIDAD	LONGITUD DISEÑO (m)	LONGITUD EJECUTADA (m)	% *Ejecutado*	LONGITUD EJECUTADA (m)	OBSERVACIONES
7	1	1	36.00	36.00	100%	36.00	
	3	1	36.00	36.00	100%	36.00	
	5	1	36.00	36.00	100%	36.00	
TOTAL			108.00	108.00		108.00	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA - nov25						108.00	



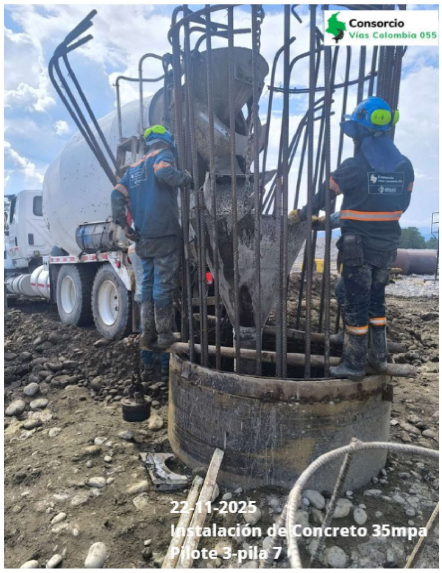

Observaciones:

Descripcion	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	Camila Idrobo	Ing. Costos y presupuestos	
Revisó	Walter Orrala Reyes	Residente de obra	
Revisó	Jhon Hernan Torres	Topografo de obra	
Revisó Interventoria	Hector Escobar	Inspector obra Interventoria	
Aceptación Interventoría	Juan Carlos Carvajal	Residente de Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 641.1 ACERO DE PRE-EFUERZO

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: Tf-m TOTAL **84,249.00**

PUENTE 1 - MARTILLO 3

ELEMENTO	FAMILIA	CABLE	No TORONES	FUERZA DE TENZADO EN EL GATO (KN)	FUERZA DE TENZADO EN EL GATO (TON.F)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	LONGITUD BRUTA (M)	FUERZA EFECTIVA (TON.F.M)
DOVELA 4	4	DERECHO	19	3820	20.5	100%	33.35	12,989.63
		IZQUIERDO	19	3820	20.5	100%	33.35	12,989.63
	5	DERECHO	19	3820	20.5	100%	33.40	13,009.30
		IZQUIERDO	19	3820	20.5	100%	33.40	13,009.30
DOVELA 5	6	DERECHO	19	3820	20.5	100%	41.40	16,125.30
		IZQUIERDO	19	3820	20.5	100%	41.40	16,125.30
TOTAL							216.30	84,249.00
A COBRAR PRESENTE ACTA								84,249.00





Observaciones:

Descripcion	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto	Camila Idrobo	Ing. Costos y presupuestos	
Revisó	Walter Orrala Reyes	Residente de obra	
Revisó	Jhon Hernan Torres	Topografo de obra	
Revisó Interventoria	Hector Escobar	Inspector obra Interventoria	
Aceptación Interventoria	Juan Carlos Carvajal	Residente de Interventoría	

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 7

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

El CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055, mediante las comunicaciones relacionadas en el numeral uno (1) "Documentos" de la presenta acta, presentó al INVIAS y al CONSORCIO VIAL JAC 2022, el resultado del desarrollo de los estudios y diseños a Fase III para el proyecto Villagarzon - San Jose del Fragua.

CONTRATO DE OBRA No: 985-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 (Día) DE Julio (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE Julio (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 **CONTRATO No.** 988-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
985 - 2022	25/03/2022	97 MESES	$ 319,366,761,001	$ 319,366,761,001

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDOR VIAL VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

TRAMO PR2+750 - PR23+000

VOLUMEN	DESCRIPCION	ENTREGA CVC055	APROBACION INTERVENTORIA
XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	273-24	702-1818
	ESTUDIO Y DISEÑO GLORIETA LIMON	428-24	702-1926

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

TRAMO PUENTE RIO CAQUETA PR23+000 - PR25+000

VOLUMEN	DESCRIPCION	ENTREGA CVC055	APROBACION INTERVENTORIA
II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	472-24	702-1916
XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	224-24	702-1474
XV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	221-24	702-1514

TRAMO PR23+000 - PR80+000

VOLUMEN	DESCRIPCION	ENTREGA CVC055	APROBACION INTERVENTORIA
VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION.	271-24	702-1553
VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	514-24	702-1920
IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	293-24	702-1596
XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	273-24	702-1818
XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	CS-CV55-25-CL-010	702-1817

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 299,068,582

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Representante legal o apoderado.
Contratista.
Matrícula Profesional No.: 52202-58774NRÑ

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante legal o apoderado.
Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PRE-ACTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NO.7

30 | NOVIEMBRE | 2025

CONTRATADO

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN		TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 KM	9 KM	33 KM	27 KM	9 KM	EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.00000%	3.00000%						
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	I	ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	XIV	EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.	1.00000%							1.00000%
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO GLORIETA LIMON	0.00000%							0.00000%
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	1.00000%							1.00000%
	TOTAL EYD		74.78708%	3.00000%	2.69514%	4.41690%	30.91833%	23.01482%	8.78708%	2.00000%
	COBRO POR ENTREGA		70.00000%	1.65510%	3.09183%	21.64283%	16.11034%	6.15396%	1.40000%	
	COBRO POR APROBACIÓN FINAL		30.00000%	0.79504%	1.32507%	9.27550%	6.90439%	2.63812%	0.60000%	

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS						1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	2.81716%	2.00000%						0.81716%
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	0.46889%							0.46889%
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	12.11550%							12.11550%
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	0.77334%							0.77334%
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	7.92127%							7.92127%
	XII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	0.25134%							0.25134%
	XV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	0.84743%							0.84743%
	SUB-TOTAL EYD		25.21292%	2.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	23.21292%
	COBRO POR ENTREGA		70.00000%							16.24904%
	COBRO POR APROBACIÓN FINAL		30.00000%							6.96388%
	TOTAL EYD		100.00000%	5.00000%	2.69514%	4.41690%	30.91833%	23.01482%	8.78708%	25.21292%
	ACUMULADO EYD			5.00000%	7.69514%	12.09769%	42.99437%	66.00956%	74.78708%	100.00000%

EJECUTADO PRESENTE MES

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN		TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 KM	9 KM	33 KM	27 KM	9 KM	EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00000%							
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	I	ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	0.39147%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.12798%	0.26261%
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	0.95455%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.69044%	0.26261%
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	1.51598%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.99043%	0.26261%
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	2.09361%		0.00000%	0.00000%	0.07660%	0.13231%	0.92755%	0.26261%
	XIV	EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO GLORIETA LIMON	1.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	1.00000%
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	1.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	1.00000%
	TOTAL EYD		6.94972%	0.00000%	0.07660%	0.13231%	1.49488%	2.19918%	1.05443%	2.00000%

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS						1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	0.24515%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.24515%
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	XII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	0.07540%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.07540%
	XV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	0.25423%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.25423%
	SUB-TOTAL EYD		0.57478%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.57478%
	TOTAL EYD		7.52450%	0.00000%	0.07660%	0.13231%	1.49488%	2.19918%	1.05443%	2.57478%
	ACUMULADO EYD			0.00000%	0.07660%	0.21051%	1.69969%	3.89277%	4.94972%	7.52450%

EJECUTADO ACUMULADO

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN		TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 KM	9 KM	33 KM	27 KM	9 KM	EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.00000%	3.00000%						
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	I	ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	6.97871%	0.00000%	0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	6.97871%		0.26931%	0.44169%	3.09183%	2.30168%	0.87871%	
	XIV	EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO GLORIETA LIMON	1.00000%						1.00000%	
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	1.00000%						1.00000%	
	TOTAL EYD		74.78708%	3.00000%	2.69514%	4.41690%	30.91833%	23.01482%	8.78708%	2.00000%

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS						1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	2.81716%	2.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.81716%
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	0.46889%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.46889%
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	12.11550%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	12.11550%
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	0.77334%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.77334%
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	7.92127%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	7.92127%
	XII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	0.25134%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.25134%
	XV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	0.84743%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.84743%
	SUB-TOTAL EYD		25.21292%	2.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	23.21292%
	TOTAL EYD		100.00000%	5.00000%	2.69514%	4.41690%	30.91833%	23.01482%	8.78708%	25.21292%
	ACUMULADO EYD			5.00000%	7.69514%	12.09769%	42.99437%	66.00956%	74.78708%	100.00000%

SALDO

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN		TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 KM	9 KM	33 KM	27 KM	9 KM	EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00000%							
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	I	ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
	XIV	EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.	1.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	1.00000%
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO GLORIETA LIMON	-1.00000%							-1.00000%
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	0.00000%							0.00000%
	TOTAL EYD		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TECNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	sep-22		oct-22		nov-22	dic-22	
				REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS						1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos a de Fase III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	XII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	XV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	SUB-TOTAL EYD		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	TOTAL EYD		0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
	ACUMULADO EYD			0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%

Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO BETANCOURT
Líder de Integracion
Contratista: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

Firma:
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 52202-58774NRN

Firma:
NOMBRE: JUAN CARLOS CARVAJAL ARCINIEGAS
Residente de interventoría
Interventoría: CONSORCIO VIAL JAC 2022

Firma:
NOMBRE: RAUL ANTONIO PÉREZ G.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-39452 CND

PRE-ACTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NO.7

30 | NOVIEMBRE | 2025

CONTRATADO

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	VOLUMEN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 Una	6 Una	24 Una	27 Una	9 Una		9 Una		EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 116.228.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	I	ESTUDIO DE TRÁNSITO, SUPERIOR Y RADIUS DE GIRO(S)	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	H	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	HI	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, DERRUMBES Y ZONAS DE DESLIZAMIENTO	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS Y PRESUPUESTO	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIV	EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.748.000,00
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO ALCANTA LLADOS	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.748.000,00
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.748.000,00
		TOTAL EYD	$ 2.972.487.300,00	$ 176.218.000,00	$ 165.532.055,70	$ 170.954.256,80	$ 1.220.072.610,00	$ 614.732.368,32	$ 246.251.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.493.000,00
		COBRO PUNTO FIJO	95%	$ 11.742.768,00	$ 157.207.953,00	$ 162.406.943,76	$ 1.159.068.979,50	$ 584.995.749,90	$ 233.938.735,00	$ -	$ -	$ -	$ 70.768.350,00
		COBRO POR APROBACIÓN Y FIN	80%	$ 11.599.768,72	$ 152.693.177,96	$ 158.833.924,96	$ 1.134.431.660,80	$ 574.175.398,50	$ 229.770.147,20	$ -	$ -	$ -	$ 69.267.200,00

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS										1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ 9.740.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.740.000,47
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 16.391.607,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.391.607,48
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 481.240.483,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 481.240.483,00
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 35.737.101,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.737.101,48
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ 514.000.000,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 514.000.000,78
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTO	$ 8.000.004,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.000.004,00
	XIV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 53.561.264,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.561.264,00
		SUB TOTAL EYD	$ 1.068.670.460,74	$ 76.492.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.820.700,00
		COBRO PUNTO FIJO	75%										5	675.324.450,00
		COBRO POR APROBACIÓN Y FIN	60%										5	170.760.250,00
		TOTAL EYD		$ 1.791.488.300,00	$ 165.532.055,70	$ 170.954.256,80	$ 1.220.072.610,00	$ 614.732.368,32	$ 246.251.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 845.581.700,00
		ACUMULADO EYD		$ 1.791.488.300,00	$ 1.957.020.355,70	$ 2.127.974.612,50	$ 3.348.047.222,50	$ 3.962.779.590,82	$ 4.209.030.890,82	$ 4.209.030.890,82	$ 4.209.030.890,82	$ 4.209.030.890,82	$ 5.054.612.590,82

EJECUTADO PRESENTE MES

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	VOLUMEN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 Una	6 Una	24 Una	27 Una	9 Una		9 Una		EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	I	ESTUDIO DE TRÁNSITO, SUPERIOR Y RADIUS DE GIRO(S)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	H	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	HI	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, DERRUMBES Y ZONAS DE DESLIZAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 10.898.424,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.061.868,00	$ -	$ 10.477.536,00	$ -	$ -
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ 47.616.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.440.181,00	$ -	$ 10.477.536,00	$ -	$ -
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	$ 66.038.998,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.118.638,72	$ 27.440.181,00	$ -	$ 10.477.536,00	$ -	$ -
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS Y PRESUPUESTO	$ 51.212.012,76	$ -	$ 8.553.678,57	$ 8.298.882,72	$ 30.359.451,47	$ 27.440.181,00	$ 10.477.536,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIV	EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO ALCANTA LLADOS	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL EYD	$ 213.261.435,51	$ -	$ 8.553.678,57	$ 8.298.882,72	$ 30.359.451,47	$ 50.558.819,72	$ 93.419.766,00	$ -	$ 31.432.608,00	$ -	$ -
		TOTAL EYD	$ 213.261.435,51	$ -	$ 8.553.677,14	$ 8.298.882,72	$ 30.359.451,47	$ 50.558.819,72	$ 93.419.766,00	$ -	$ 31.432.608,00	$ -	$ -
		ACUMULADO EYD		$ -	$ 8.553.677,14	$ 16.852.559,86	$ 47.212.011,33	$ 97.770.831,05	$ 191.190.597,05	$ -	$ 222.623.205,05	$ -	$ -

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS										1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTO	$ 2.666.672,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.666.672,26
	XIV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 15.104.560,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.104.560,48
		SUB TOTAL EYD	$ 17.771.232,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.771.232,74
		TOTAL EYD	$ 231.032.668,25	$ -	$ 8.553.677,14	$ 8.298.882,72	$ 30.359.451,47	$ 50.558.819,72	$ 93.419.766,00	$ -	$ 31.432.608,00	$ -	$ 17.771.232,74
		ACUMULADO EYD		$ -	$ 8.553.677,14	$ 16.852.559,86	$ 47.212.011,33	$ 97.770.831,05	$ 191.190.597,05	$ -	$ 222.623.205,05	$ -	$ 240.394.437,79

EJECUTADO ACUMULADO

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	VOLUMEN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 Una	6 Una	24 Una	27 Una	9 Una		9 Una		EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 116.228.000,00	$ 76.492.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	I	ESTUDIO DE TRÁNSITO, SUPERIOR Y RADIUS DE GIRO(S)	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	H	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	HI	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, DERRUMBES Y ZONAS DE DESLIZAMIENTO	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS Y PRESUPUESTO	$ 277.379.730,00	$ -	$ 16.553.205,57	$ 17.095.425,68	$ 122.007.261,00	$ 61.473.208,64	$ 24.625.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIV	EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO ALCANTA LLADOS	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL EYD	$ 2.972.487.300,00	$ 115.238.000,00	$ 165.532.055,70	$ 172.954.256,80	$ 1.220.072.610,00	$ 614.732.368,32	$ 246.251.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.493.000,00
		TOTAL EYD	$ 2.972.487.300,00	$ 191.730.000,00	$ 357.262.055,70	$ 530.216.312,50	$ 1.750.288.922,50	$ 2.365.021.291,32	$ 2.611.272.591,32	$ -	$ -	$ -	$ 2.685.765.591,32
		ACUMULADO EYD		$ 191.730.000,00	$ 548.992.055,70	$ 1.079.208.368,20	$ 2.829.497.290,70	$ 5.194.519.582,02	$ 7.805.791.873,34	$ 7.805.791.873,34	$ 7.805.791.873,34	$ 7.805.791.873,34	$ 10.491.557.464,66

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS										1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ 11.511.200,48	$ 9.740.000,00									$ 12.479.209,00
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 16.391.607,48										$ 16.391.607,48
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 481.240.483,00										$ 481.240.483,00
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 35.737.101,48										$ 35.737.101,48
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ 514.000.000,78										$ 514.000.000,78
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTO	$ 8.000.004,00										$ 8.000.004,00
	XIV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 53.561.264,00										$ 53.561.264,00
		SUB TOTAL EYD	$ 1.068.670.460,74	$ 9.740.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.820.700,00
		TOTAL EYD	$ 1.300.703.128,99	$ 205.788.000,00	$ 330.231.234,70	$ 373.253.252,68	$ 1.250.072.610,00	$ 664.732.368,32	$ 340.251.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.060.212.700,00
		ACUMULADO EYD		$ 166.730.000,00	$ 364.961.234,70	$ 491.214.487,38	$ 1.741.287.097,38	$ 2.406.019.465,70	$ 2.746.270.765,70	$ -	$ -	$ -	$ 3.806.483.465,70

SALDO

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	VOLUMEN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	3 Una	6 Una	24 Una	27 Una	9 Una		9 Una		EVALUACIÓN E INFORME FINAL
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños		REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	I	ESTUDIO DE TRÁNSITO, SUPERIOR Y RADIUS DE GIRO(S)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	H	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	HI	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, DERRUMBES Y ZONAS DE DESLIZAMIENTO	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS Y PRESUPUESTO	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIV	EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.748.000,00
	XV	ESTUDIO Y DISEÑO ALCANTA LLADOS	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.748.000,00
	XVI	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ 18.748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.748.000,00
		TOTAL EYD	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL EYD	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		ACUMULADO EYD		$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -

REDISTRIBUCIÓN DE COBROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE A FASE III %

ANEXO TÉCNICO	VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOTAL %	mes 02		mes 03			mes 04		mes 05		mes 06	
				REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS										1 GLB
4.1.1 Revisión Estudios y Diseños	II	ESTUDIO DE TRABAJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.4 Estudios y Diseños Subsidios a la Vía III	III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIII	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	XIV	INFORME FINAL EJECUTIVO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUB TOTAL EYD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL EYD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ACUMULADO EYD		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO BETANCOURT
Líder de Integracion
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 955

Firma:
Nombre: LUIS JORGE ROJAS MEJIACO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 52030-50774WRR

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS CARVAJAL ARCHINIEGAS
Residente de Interventoria
Interventoria CONSORCIO VIAL JAC 2022

Firma:
NOMBRE: RAUL ANTONIO PÉREZ D.
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-39452 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 30 (Día) Noviembre (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUROCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 41 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: (Indicar con una X) Resolución N°: (Indicar N° de Resolución día, mes y año) NO LICENCIADO (PMA o PAGA): X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LAS VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

N° CONTRATO: 985 de 2022 FECHA DE INICIO: 26-jul-22 FECHA DE TERMINACIÓN: 31-jul-30

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

N° CONTRATO: 988 de 2022 FECHA DE INICIO: 26-jul-22 FECHA DE TERMINACIÓN: 31-jul-30

Valor Inicial Contrato Obra	$	319.366.761.001,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	319.366.761.001,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1.953.695.335,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1.953.695.335,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	1.953.695.335,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	18.999.896.700,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	18.999.896.700,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha ______

Observaciones (same text in every row below, referred to as [Obs]): Esta Interventoría se permite informar que, mediante comunicado 2024S-VBOG-096647 del 19 de diciembre de 2024 la Subdirección de Sostenibilidad da_Concepto No Objeción al Plan Inversión Ambiental V1, a las actividades presentadas en el plan de inversión para que procedan las acciones que correspondan por parte del Consorcio Vías Colombia 055.

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	OBSERVACIONES
DAGA-1.3-03	GESTIÓN DEL PROYECTO	Cumplimiento de requerimientos legales	Monitoreos de calidad de agua contrucción del Puente sobre el rio Caqueta - Res. DTP-1808 de 2023	X	X	X			[Obs]
DAGA-1.3-03	GESTIÓN DEL PROYECTO	Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Suministro e instalación de vivero para rescate de epifitas 6 mts X 12 mts - Permiso de tala por emergencia DTP-016 del 2 de febrero del 2023,Permiso de Aprovechamiento forestal único Resolución 0622 de 2024 y Resolución 0636 de 2024	X	X	X			[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares (Incluye insumos). - Permiso de Aprovechamiento forestal único Resolución 0622 de 2024 y Resolución 0636 de 2024 tala por emergencia DTP-016 del 2 de febrero del 2023	X	X	X			[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación de epifitas vasculares por el término de 3 años - Permiso de Aprovechamiento forestal único Resolución 0622 de 2024 y Resolución 0636 de 2024.	X	X	X			[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Establecimiento de especies forestales por compensación permiso de tala por emergencia Concepto CT-DTP-001 de 2022	X	X	X			[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental de especies en veda	Mantenimiento plantación forestal (cada 6 meses) (durante 3 años) - Permiso de tala por emergencia Concepto CT-DTP-001 de 2022.					X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Ocupación de Cauce sobre el Río Caquetá - Res. DTP 1808 - Adquisión predial (Incluye vallas)					X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Ocupación de Cauce sobre el Río Caquetá - Res. DTP 0524 - Adquisión predial (Incluye vallas)					X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Aprovechamiento forestal Único sobre el Río Caquetá - Res. DG 0622 de 2024 - Adquisión predial 1,68 Ha.					X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Reposición y siembra de especies fustales en veda Permisos de Aprovechamiento Forestal Único - Res. DG 0622 de 2024 y Resolución DG 0636 de 2024					X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Recuperación, Rehabilitación o Restauración Ecológica de Epifitas no Vasculares Permisos de aprovechamiento forestal único Resolución DG 0622 de 2024 y Resolución DG 0636 de 2024				X	X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Rescate, Traslado y Reubicación de Brinzales en In situ en cumplimiento a los aprovechamientos forestales Resolucion 0622 del 2024 y Resolucion 0636 del 2024.				X	X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Aprovechamiento forestal Único PR 9+300 hasta PR 22+500 - Res. DG 0636 de 2024 adquisición predial 21,94 Has					X	[Obs]
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Permiso aprovechamiento forestal Resolución DG 0636 de 2024 Reposición y siembra de especies en veda: (*Cyathea cf. poeppigii* (Hook.) Domin).					X	[Obs]

Columnas de valores (vacías en todas las filas): CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL — CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($); VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($), VALOR ITEM NO PREVISTO ($), OTRO; VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($), VALOR ITEM NO PREVISTO ($), OTRO; TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($), VALOR ITEM NO PREVISTO ($), OTRO. EJECUTADO EN EL MES — CANTIDAD; VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($), VALOR ITEM NO PREVISTO ($), OTRO; IVA; TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($), VALOR ITEM NO PREVISTO ($), OTRO. ACUMULADO EJECUTADO — CANTIDAD, VALOR TOTAL ACUMULADO ($). VALOR POR EJECUTAR — CANTIDAD, VALOR TOTAL ($). REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente).

SUBTOTAL	VB Reembolso	VB No previsto	VB Otro	IVA Reembolso	IVA No previsto	IVA Otro	Total Reembolso	Total No previsto	Total Otro	Ejec. Cantidad	Ejec. VB Reembolso	Ejec. VB No previsto	Ejec. VB Otro
SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 52202-58774 NRN

Firma
Nombre: JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 25202-100584 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ANAEL GUTIERREZ LOZANO
Profesional Ambiental
Contratista
Matricula No. 70238216249TLM

Vo. Bo. Firma
Nombre : JESUS DAVID ANGARITA
Prtofesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 54238159391NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	41	FECHA	nov-25 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN –SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	985 de 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Putumayo			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	988 de 2022

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	31	7	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Obras con participación comunitaria	OPC Placa Huella - San Isidro, Villagarzón, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -		$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Institución Educativa Rural El Mesón, Mocoa, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Caseta comunal - Vereda Villa Gloria, Mocoa, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Mejoramiento Vía Terciaria a Puerto Limón, Mocoa, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Institución Educativa Rural Rafael Reyes, sede El Jauno, Puerto Guzmán, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Institución Educativa Rural Rafael Reyes, sede El Jauno, Puerto Guzmán, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Caseta Comunal - Vereda El Muelle, Puerto Guzmán, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Institución Educativa Rural La Vega, Puerto Guzmán, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Gestión del Riesgo -Vereda La Patria, El Jauno, El Muelle y La Vega, Puerto Guzmán, Putumayo	Global	1	$ 130,000,000.00	$ 130,000,000.00		X	$ 130,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130,950,000.00	
	OPC Universidad Panamazónica de los Pueblos Indígenas,Piamonte, Cauca	Global	1	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00		X	$ 302,192,308.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 302,192,308.00	
Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes	Caracterización y transformación socioeconómica Vereda El Muelle, El Jauno, La Vega, y la Floresta	Global	1	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00	X		$ 411,900,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0.23	$ 94,737,000	$ 317,163,000.00	**Anexo 9:** Factura 243CVC055
	Plan de capacitaciones en productividad y seguimiento	Global	8	$ 40,000,000.00	$ 320,000,000.00	X		$ 329,520,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 329,520,000.00	
Programa de Arqueología Preventiva	Fase de registro	Global	1	$ 25,000,000.00	$ 25,000,000.00	X		$ 25,743,750.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 25,743,750.00	
	Fase de diagnóstico y prospección arqueológica	Global	1	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00	X		$ 411,900,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 411,900,000.00	
Protección del patrimonio geológico y paleontológico	Plan de capacitaciones para reconocimiento de objetos del patrimonio geológico y paleontológico	Global	1	$ 25,000,000.00	$ 25,000,000.00	X		$ 25,743,750.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 25,743,750.00	
Accesibilidad de la población e integración territorial	Programa de accesibilidad y conectividad de la red vial (diagnóstico, concertación e implementación)	Global	3	$ 100,000,000.00	$ 300,000,000.00	X		$ 308,925,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 308,925,000.00	

Información y divulgación	Volantes	Un	7000	$ 500.00	$ 3,500,000.00	X		$ 3,604,125.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,604,125.00	
	Pasacalles	Un	14	$ 480,000.00	$ 6,720,000.00	X		$ 6,919,920.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6,919,920.00	
	Banner publicitario	Un	10	$ 750,000.00	$ 7,500,000.00	X		$ 7,723,125.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0.67	$ 517,449	$ 7,205,676.00	**Anexo 1:** 1.Factura No. FVE 629 2.Factura No. FVE 631
	Refrigerios	Un	6720	$ 15,000.00	$ 100,800,000.00	X		$ 103,798,800.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	313.12	$ 4,836,530	$ 98,962,270.00	**Anexo 2:** 1.Cuenta de Cobro No. 001-23 2. Cuenta de cobro Nukanchipa
	Almuerzos	Un	3000	$ 16,500.00	$ 49,500,000.00	X		$ 50,972,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	408.79	$ 6,945,700	$ 44,026,925.00	**Anexo 3:** 1.Cuenta de cobro No. 001 – 23 2.Cuenta de cobro No. 001 – 23 3.Cuenta de cobro No. 001 – 23 4.Cuenta de cobro Yamiled Murcia 5.Acta de donación
	Alquiler de salones	Un	100	$ 600,000.00	$ 60,000,000.00	X		$ 61,785,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0.35	$ 216,248	$ 61,568,752.00	**Anexo 4:** 1.Cuenta de cobro No. 001 – 23
	Alquiler de videobeam	Un	168	$ 150,000.00	$ 25,200,000.00	X		$ 25,949,700.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 25,949,700.00	
	Alquiler de sonido	Un	168	$ 200,000.00	$ 33,600,000.00	X		$ 34,599,600.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 34,599,600.00	
	Alquiler de silletería	Un	8400	$ 4,000.00	$ 33,600,000.00	X		$ 34,599,600.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 34,599,600.00	
	Perifoneo	Un	840	$ 80,000.00	$ 67,200,000.00	X		$ 69,199,200.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	37.61	$ 3,098,312	$ 66,100,888.00	**Anexo 5:** 1.Factura No. 0438 2.Factura No. 0029 3.Cuenta de cobro Paola Jamoy 4.Cuenta de cobro No. 001 – 23 Soel Correa 5.Cuenta de cobro 002 – 23 Soel Correa 6.Cuenta de cobro 001 – 23 Anderson Sierra
	Grabación de pauta para perifoneo-radio	Un	168	$ 45,000.00	$ 7,560,000.00	X		$ 7,784,910.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7,784,910.00	
	Alquiler de transporte	Un	24	$ 800,000.00	$ 19,200,000.00	X		$ 19,771,200.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	6.08	$ 5,008,704	$ 14,762,496.00	**Anexo 6:** 1.Cuenta de cobro No. 001 – 23 2.Cuenta de cobro No. 003 – 23 Cuenta de cobro No. 002-23 Cuenta de cobro No. 2 Cuenta de cobro No. 1 Comu Indígena Factura No. 2986 Factura No. 2987 Factura No. 2988 Factura No. 2989 Factura No. 2990 Factura No. 2991 Factura No. 2992 Factura No. 2993 Factura No. 2994 3.Cuenta de cobro No. 6
	Anuncios publicitarios en medios de circulación regional y nacional	Un	74	$ 350,000.00	$ 25,900,000.00	X		$ 26,670,525.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 26,670,525.00	
	Pautas radiales	Un	760	$ 30,000.00	$ 22,800,000.00	X		$ 23,478,300.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	30.67	$ 947,473	$ 22,530,827.00	**Anexo 7:** 1.Factura No. 0028 2. Factura No. 0029 2.Cuenta de cobro No. 01 – 23
	Cartilla finalización de obra	Un	1	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	X		$ 51,487,500.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 51,487,500.00	

Cultura vial y participación comunitaria	Kit temático; seguridad vial para estudiantes	Un	1080	$ 93,500.00	$ 100,980,000.00	X		$ 103,984,155.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 103,984,155.00	
	Kit temático; seguridad vial para actores viales	Un	720	$ 85,500.00	$ 61,560,000.00	X		$ 63,391,410.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 63,391,410.00	
	Kit temático; Taller pedagógico de seguridad vial (29/11/22)	Un	15	$ 38,000.00	$ 570,000.00	X		$ 586,957.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	15	$ 586,958	-$ 0.50	**Anexo 8:** 1.Factura No. 045
	Campañas de seguridad vial con población estudiantil y comunidad en general	Un	1	$ 200,000,000.00	$ 200,000,000.00	X		$ 205,950,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 205,950,000.00	
Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización	Programa de capacitación y prevención de las violencias	Un	1	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	X		$ 10,297,500.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10,297,500.00	
Rubro para imprevistos, pendientes y pasivos sociales	Rubro para imprevistos, pendientes y pasivos sociales	Un	1	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	X		$ 10,297,500.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10,297,500.00	

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	31	7	2023									
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**AEM**	**ITMXE**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
Acompañamiento a la gestión sociopredial	Factor por unidad mínima de vivienda (UMV)	Unitario	60	$ 40,000,000	$ 2,400,000,000	X		$ 2,471,400,000		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,471,400,000	
	Factor por Unidad Mínima Económica (UME)	Unitario	29	$ 10,000,000	$ 290,000,000	X		$ 298,627,500		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 298,627,500	
	Factor de arrendamiento y/o almacenamiento	Unitario	10	$ 2,320,000	$ 23,200,000	X		$ 23,890,200		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 23,890,200	
	Factor por Traslado (TDO)	Unitario	30	$ 2,320,000	$ 69,600,000	X		$ 71,670,600		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 71,670,600	
	Factor por hacinamiento (HTO)	Unitario	28	$ 3,480,000	$ 97,440,000	X		$ 100,338,840		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 100,338,840	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 6,354,459,235.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 116,894,373.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 6,471,353,608.00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	1.81%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: T.P. 52202-58774 NRÑ

Firma
Nombre: DUFHARD ALEXANDER VEGA OSORIO
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 148251023-I

Firma
Nombre: JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND

Firma
Nombre: JAVIER ALBEIRO PANTOJA FERNÁNDEZ
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	30/11/2025
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO	**2025** MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 **11** 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**30/11/2025**
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		

11. PLAZO INICIAL:	97 meses	12. FECHA DE INICIO:	26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1,953,695,336,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	1,953,695,336,00
21. VR. ANTICIPO:	$	-
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	1,953,695,336,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
INFORME GENERAL DEL SECTOR	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10KM	0	$ 1,631,500,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR ADICIONAL	0	$ 979,000,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO - VALOR CADA 500 MTS	0	$ 2,508,000,00	$ -
DIAGNOSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II DE FACTIBILIDAD POR KM	0	$ 4,740,500,00	$ -
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1,421,500,00	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2,842,500,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1,066,000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 355,500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1,095,000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 821,500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 273,500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 769,000,00	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 384,500,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 384,500,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 326,500,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 221,500,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1,366,000,00	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2,732,500,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 877,000,00	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 438,500,00	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 653,000,00	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 326,500,00	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 353,500,00	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 235,500,00	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 353,500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 235,500,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 118,000,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 471,000,00	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 235,500,00	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 235,500,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 327,500,00	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 327,500,00	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 109,000,00	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 763,500,00	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 654,500,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 153,000,00	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 306,000,00	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 153,000,00	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 153,000,00	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 652,500,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79		0		$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 [11] 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**30/11/2025**
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		

11. PLAZO INICIAL:	97 meses	12. FECHA DE INICIO:	26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1,953,695,336,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE**	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	$	-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	267,537,350,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	50,832,097,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	318,369,447,00
77. SALDO POR EJECUTAR	$	1,635,325,889,00

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**LUIS CARLOS ROMO VELASCO**		**NOMBRES Y APELLIDOS**	**JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO**	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	16,714,865	C.C. X	NUMERO	79,785,874
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	5220258774 NRÑ	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-100584 CND
Representante Legal [ ]	Apoderado	[X]	Representante Legal [X]	Apoderado	[ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORAL:** PUTUMAYO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
CONTRATO DE OBRA No	985 de 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	988 de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)			

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIEDENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 41
PERIODO - MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA ELABORACION: 30/11/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

VALOR ADICIÓN No: $ -

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Estudio Titulo y/o Diagnostico	Ajuste Estudio Titulo y/o Diagnostico	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso publico
										Permiso de intervencion	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en vía admin. y su noti.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policiva logrando la restitución
007IT1MCVSF	FLORO HERNAN ALVAREZ MORA									21													
010IT1MCVSF	AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO S.A.S. "AGRECON PUTUMAYO S.A.S."	29		35		38		38		24													
011IT1MCVSF	AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO S.A.S. "AGRECON PUTUMAYO S.A.S."	29		35		38		38		24													
012DIT1MCVSF	SAMUEL ALEJANDRO URQUIJO ARCOS Y OTROS	29		35		38				24													
012AIT1MCVSF	FRANKLIN YOBANY QUINTERO NARVAEZ	29		35		38		38		24													
013IT1MCVSF	DIEGO FERNANDO SERNA CHAMORRO	29		38		38				21													
014DT1MCVSF	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES LA FORTALEZA LTDA	29		38		38				21													
015DIT1MCVSF	NORBERTO AURELIO CORDOBA BENAVIDES	29		35		38		38		21													
016DT1MCVSF	RUFINA ALVAREZ MARCO TULIO PANTOJA CALDERON	29		35		38		38		21													
017IT1MCVSF	NORBERTO AURELIO CORDOBA BENAVIDES	29		38						21													
018ADT1MCVSF	MARIA ROSALBA PANTOJA ALVAREZ	29		35		38		38															
018DT1MCVSF	RUFINA ALVAREZ	29		38		38				21													
020IT1MCVSF	HECTOR PANTOJA ALVAREZ ERFILIA DORA GUALGUAN JOSA	29		38		38				21													
020IMT1MCVSF	MARIA ROSALIA JOSA DE GUALGUAN	29		38		38																	
021IT1MCVSF	HERMENCIO LAUREANO CALDERÓN	29								21													
022DT1MCVSF	ROBER ARLEY CHAVES MUÑOS MYRIAM DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	29		38		38				21													
023IT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ	35		38						21													
024DT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ	35		38		38				21													
025IT1MCVSF	GRUPO UNIVERSAL ADELANTE S.A.S	35		38						21													
026DT1MCVSF	DIANA YURLEDY AVILEZ MUÑOZ	35								21													
031DT1MCVSF	NOHEMY GUTIERREZ HURTADO	29								21													
032IT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ	38								21													
034DT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON									21													
033DT1MCVSF	JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ Y OTROS	29																					
035IT1MCVSF	LORGIO DILBER YELA PONCE Y OTROS	29								21													
036IT1MCVSF	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	29		38		38				21													
038IT1MCVSF	MAURO OJEDA MEZA	29		38		38																	
039IT1MCVSF	LUZ ALEYDA ORDOÑEZ ACOSTA									29													
040DT1MCVSF	JUAN CUERO VALLEJO									21													
041DIT1MCVSF	AMANDA GOMEZ ARCINIEGAS									21													
042DT1MCVSF	LUZ NERY ORDOÑEZ CLAROS	29								21													
044DT1MCVSF	SERGIO LUIS JIMENEZ RENDON	29		38						21													
044ADMT1MCVSF	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO -UCHUPAYACO	29				38																	
045DT1MCVSF	MARIA EMERITA BRAVO									21													
046AIT1MCVSF	BERTILDE SEMANATE Y OTROS	35		38		38				21													
046IT1MCVSF	MAYELI AVENDAÑO SOLARTE	38								21													
050DT1MCVSF	RUBEN DARIO MORENO PANTOJA DOLLY YANETH CORDOBA VALLEJO									21													
051IT1MCVSF	EVER STEINER ZAMBRANO SOLARTE									21													
052IT1MCVSF	MIGUEL ANGEL BOLAÑOS BOTINA	35								21													
053DT1MCVSF	FLOR ALBA BOLAÑOS BOTINA									21													
054DT1MCVSF	MILLER OBANDO ROJAS GLORIA ROCIO DELGADO RENZA									21													
056DT1MCVSF	JUAN DIEGO ORDOÑEZ MELENDES									21													
057DT1MCVSF	ERIKA YULIETH VARGAS MEDINA									21													
058DT1MCVSF	BRITNEY KAROL JULIANA PANTOJA GUALGUAN WHINDY ERIKA GUERRERO GUALGUAN									21													
059DT1MCVSF	DARGUIN WUEYMAR GUALGUAN JACANAMEJOY									21													
060DT1MCVSF	DIEGO ALEJANDRO TORRES LOPERA CLAUDIA ROCIO LEON									21													
061IT1MCVSF	MIGUEL ANGEL BOLAÑOS BOTINA	38								21													
062IT1MCVSF	JOSE SEGUNDO BOLIVAR SOLARTE YELA	38								21													
063IT1MCVSF	FABIAN CARABALI JIMENEZ	29		38		38				21													
064IT1MCVSF	ADRIANA PATRICIA ISAZA BURBANO	38																					
068IT1MCVSF	YOLIMA ORTEGA RAMOS									24													
069AIT1MCVSF	MARIA LEONOR BOLAÑOS									21													
069BIT1MCVSF	NEREO ÑAÑEZ JANSASOY									21													
069IT1MCVSF	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD									21													

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIEDENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 41

PERIODO - MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA ELABORACION: 30/11/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

076IT1MCVSF	OMAR UBERTINO TONGUINO MARIA FRANCIA RAMIREZ									21														
081ADT1MCVSF	JORGE ORLANDO TOVAR RENZA									21														
081BDT1MCVSF	MARIA ROSALIA JOSA DE GUALGUAN									24														
095DT1MCVSF	OLGA ARANDIA VARGAS									21														
105IT1MCVSF	JOSE ABRAHAM DELGADO DELGADO									21														
107IDT1MCVSF	GLADYS DEL CARMEN BOTINA DELGADO									21														
117DIT1MCVSF	HERMINDA FIDELINA ERASO VDA DE SAMUDIO									24														
118DT1MCVSF	PEDRO NEL CASTILLO ANGULO									21														
120DT1MCVSF	ELBANO HECTOR ERAZO VALLEJO									24														
121DIT1MCVSF	JAIRO EDGAR ZAMUDIO ERAZO									24														
129DT1MCVSF	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PATRIA									24														
146DIT1MCVSF	JORGE ENRIQUE MEJIA RAMIREZ									21														
154DIT1MCVSF	GERARDO PORTILLA CEBALLOS	29		35		38				21														
156DIT1MCVSF	MARCIAL FERNANDEZ MERA JORGE ISAAC FERNANDEZ MERA	29		35		38		38		21														
009AIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	29								21														
009BIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	29								21														
043IT1MCVSF	OSCAR EDUARDO AVILEZ MUÑOZ									21														
065IT1MCVSF	HUMBERTO JIMENEZ SALAZAR	38								21														
100DIT1MCVSF	ROSA MONICA LOPEZ DE BURBANO									21														
126DIT1MCVSF	ROBERTH ALVEIRO ROJAS LÓPEZ									24														
156ADIMT1MCVSF	LUZ MARINA VERU GONZALEZ	29		38		38		38																
156BIMT1MCVSF	VICTOR JAMIOY JOJOA	29		35		38		38																
156CDIMT1MCVSF	MARGOT JAMIOY OROBIO	29		35		38		38																
156DDIMT1MCVSF	VICENTE MAVISOY	29		35		38		38																
159IT1MCVSF	MARIA MIRIAM LOZADA MUTUMBAJOY	29		38		38				21														
TOTAL		**45**	**0**	**29**	**0**	**26**	**0**	**11**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 35	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 38	6	0	17	0	26	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**45**	**0**	**29**	**0**	**26**	**0**	**11**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista

Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre : FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	4

FECHA	30/11/2025
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

Pre-acta Predial No. 41

PERIODO - MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA ELABORACION: 30/11/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

VALOR ADICIÓN No 1: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS, ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO: MASPS-MN-IN1-6-FR-4 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1

FECHA: 30/11/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **PERIODO:** 01 al 30 de noviembre de 2025
(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	41	DEL	1 (Día)	Noviembre (Mes)	2025 (Año)	AL	30 (Día)	Noviembre (Mes)	2025 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	41	DEL	1 (Día)	Noviembre (Mes)	2025 (Año)	AL	30 (Día)	Noviembre (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	X

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
N° CONTRATO	985 de 2022	**N° CONTRATO**	988 de 2022
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2022	**FECHA DE INICIO**	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE JULIO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 319,366,761,001.00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	**$ 319,366,761,001.00**

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ 1,880,517,308.00
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ 1,880,517,308.00
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ 1,880,517,308.00

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 18,999,896,708.00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 18,999,896,708.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)**	**VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:**			**VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:**			**TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:**		
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**				**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**
	N.A.						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE**			**EJECUTADO EN EL MES**								
					CANTIDAD	**VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO**			**VALOR TOTAL IVA MENSUAL**			**TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:**		
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**		**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**		**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**
	N.A.				0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE**			**ACUMULADO EJECUTADO CON IVA**		**VALOR POR EJECUTAR CON IVA**		**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)**	**OBSERVACIONES**
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL ($)**		
	N.A.				**0**	$ -		$ -		
						$ -		$ -		
						$ -		$ -		
						$ -		$ -		
						$ -		$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Luis Carlos Roño Velasco
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
Matrícula No. 52202-58774 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Luis Fernando Castrillón Marín
Especialista Sostenibilidad
Contratista Consorcio Vías Colombia 055
Matrícula No. 66238170084 RIS

Firma
Nombre: Jorge Álvaro Sánchez Blanco
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 25202-100584 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre Mónica Denir Lombana Luna
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matrícula No. 41.183.043

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CERTIFICACIÓN

Yo, LUIS CARLOS ROMO VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16714865 de Cali, Valle del Cauca y Tarjeta Profesional No. 52202-58774 NRÑ expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en mi condición de Apoderado, certifico que el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055, NIT 901.584.893-4, ha cumplido con todas las obligaciones legales en cuanto al pago de aportes a seguridad social (pensión, salud y riesgos (ICBF, SENA y CCF) durante el periodo de 1 a 30 de noviembre de 2025. Esta certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, y para ser presentada ante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS - en relación con el Contrato de Obra Pública Nº 985 de 2022.

Se expide en la ciudad de Villagarzón el 30 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

LUIS CARLOS ROMO VELASCO
C.C. n°. 16714865 de Cali, Valle del Cauca
D.C. Representante Legal o Apoderado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0	0 8	1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1	3	1	4	1	8	2	6	4 2	4	8	5 2	5	5	5 9							

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 9
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 2 4 1 1 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 2 4 1 2 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 8 1 2 1 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	GARCIA	JAIME	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206599927

(415)7707212489984(8020) 000014120659992 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 7 5 9 6 6 2	6	2 9 9 7 0 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOZANO	CONTRERAS	RONALDO	STIVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 1 1 7 0 6 5	1	3 3 1 8 2 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GUTIERREZ	RAMOS	WENDY	YULIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221378940

(415)7707212489984(8020) 000014122137894 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico notificacionescvc055@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MALAVER DIAZ CESAR ANATOLI
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 4 0 4	
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 8 4 6 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAVER	DIAZ	CESAR	ANATOLI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 3 4 3 9 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLINA	ANDRADE	DIEGO	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 5 2 0 2 5 0 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 2 0 2 5 0 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 7 0 8 5 7 4 0	6	3 2 9 3 3 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	SOLARTE	ERIN	JASMIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 1 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
1790059111001	ECUADOR 2 3 9		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO ACTA No: 5 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐
POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha) 1 de 1

CONTRATO No : 985 de 2022 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **319,366,761,001.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **319,366,761,001.00**

PLAZO ACUMULADO: 97 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES: DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES – CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR (ACTA No. 4 FECHA 20/11/2024): CANTIDAD	ACTA ANTERIOR: VALOR	PRESENTES: + / -	PRESENTES: CANTIDAD	PRESENTES: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 de fecha 05/10/2025: CANTIDAD	EJECUCIÓN: VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR
EXPLANACIONES																	
1	200.2 (11601)	200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,083,131.00	$ 17,330,096.00	5.00	$ 5,415,655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	$ 5,415,655.00
2	201.7 (11601)	201-22		Demolición de Estructuras	m3	132.00	$ 107,114.00	$ 14,139,048.00	2,060.00	$ 220,654,840.00		0.00	0.00	342.10	36,643,699.00	2,060.00	$ 220,654,840.00
3	210.1.2 (11601)	210-22		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150,000.00	$ 12,300.00	$ 1,845,000,000.00	8,562.30	$ 105,316,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.30	$ 105,316,290.00
4	210.2.2 (11601)	210-22		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24,314.00	$ 10,685.00	$ 259,795,090.00	103,134.50	$ 1,101,992,133.00		0.00	0.00	40,863.90	436,630,773.00	103,134.50	$ 1,101,992,133.00
5	220.1 (11602)	220-22		Terraplenes	m3	150,000.00	$ 12,800.00	$ 1,920,000,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
6	223.2 (11606)	223-22		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	297,712.00	$ 11,100.00	$ 3,304,603,200.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
7	230.1P (11602)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	86,400.00	$ 92,500.00	$ 7,992,000,000.00	50,293.00	$ 4,652,102,500.00	+	21,749.20	2,011,801,000.00	46,911.00	4,339,267,500.00	72,042.20	$ 6,663,903,500.00
Subtotal								**$ 15,352,867,434.00**		**$ 6,085,481,418.00**			**$ 2,011,801,000.00**		**$ 4,812,541,972.00**		**$ 8,097,282,418.00**
SUBBASES Y AFIRMADOS																	
8	310.1 (11602)	310-22		Conformación de la calzada existente	m2	350,000.00	$ 925.00	$ 323,750,000.00	1,201,415.90	$ 1,111,309,708.00		0.00	0.00	1,049,279.70	970,583,728.00	1,201,415.90	$ 1,111,309,708.00
9	311.1 (11602)	311-22		Afirmado	m3	73,000.00	$ 90,000.00	$ 6,570,000,000.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00		0.00	0.00	24,458.40	2,201,256,011.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00
10	320.1 (11602)	320-22		Subbase Granular clase A	m3	105,120.00	$ 127,410.00	$ 13,393,339,200.00	269,560.60	$ 34,344,716,046.00		0.00	0.00	126,275.10	16,088,710,491.00	269,560.60	$ 34,344,716,046.00
Subtotal								**$ 20,287,089,200.00**		**$ 40,210,995,754.00**			**$ -**		**$ 19,260,550,230.00**		**$ 40,210,995,754.00**
BASES																	
11	330.1 (11602)	330-22		Base granular clase A	m3	101,972.00	$ 139,500.00	$ 14,225,094,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
12	330.4 (11602)	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	14,000.00	$ 143,000.00	$ 2,002,000,000.00	200.00	$ 28,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	$ 28,600,000.00
Subtotal								**$ 16,227,094,000.00**		**$ 28,600,000.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 28,600,000.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
13	420.2 (11603)	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525,600.00	$ 2,921.00	$ 1,535,277,600.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
14	421.1 (11603)	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525,600.00	$ 1,852.00	$ 973,411,200.00	12,680.00	$ 23,483,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	$ 23,483,360.00
15	450.1P (11603)		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36,792.00	$ 807,000.00	$ 29,691,144,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
16	450.2P (11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33,752.00	$ 811,000.00	$ 27,372,872,000.00	634.00	$ 514,174,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	$ 514,174,000.00
17	450.9P (11603)		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 825,000.00	$ 5,775,000,000.00	100.00	$ 82,500,000.00		0.00	0.00	76.00	62,700,000.00	100.00	$ 82,500,000.00
18	460.1P (11603)		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,500.00	$ 65,590.00	$ 229,565,000.00	100.00	$ 6,559,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	$ 6,559,000.00
19	465.1 (11603)	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7,000.00	$ 71,686.00	$ 501,802,000.00	1,000.00	$ 71,686,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	$ 71,686,000.00
Subtotal								**$ 66,079,071,800.00**		**$ 698,402,360.00**			**$ -**		**$ 62,700,000.00**		**$ 698,402,360.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
20	600.1.1 (11604)	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10,390.00	$ 25,170.00	$ 261,516,300.00	9,208.50	$ 231,777,945.00	+	8,141.20	204,914,004.00	9,208.50	231,777,945.00	17,349.70	$ 436,691,949.00
21	600.2.4 (11601)	600-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	1,039.00	$ 59,656.00	$ 61,982,584.00	8,850.00	$ 527,955,600.00	+	11,001.50	656,305,484.00	8,850.00	527,955,600.00	19,851.50	$ 1,184,261,084.00
22	610.1 (11604)	610-22		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,078.00	$ 38,696.00	$ 80,410,288.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
23	610.2 (11604)	610-22		Relleno para estructuras con recebo	m3	52,672.00	$ 102,000.00	$ 5,372,544,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
24	610.3 (11604)	610-22		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	3,117.00	$ 165,162.00	$ 514,809,954.00	-	$ -	+	3,432.00	566,835,984.00	0.00	0.00	3,432.00	$ 566,835,984.00
25	621.1.4P (14103)		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diámetro D=2,50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1,334.00	$ 7,250,000.00	$ 9,671,500,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
26	630.1.P (14103)		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes	m3	2,014.00	$ 2,000,000.00	$ 4,028,000,000.00	11,844.60	$ 23,689,200,000.00		0.00	0.00	503.40	1,006,800,000.00	11,844.60	$ 23,689,200,000.00
27	630.2.P (14103)		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	8,054.00	$ 1,900,000.00	$ 15,302,600,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
28	630.1.1P (14103)		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,882.00	$ 1,300,000.00	$ 2,446,600,000.00	428.40	$ 556,920,000.00		0.00	0.00	222.40	289,120,000.00	428.40	$ 556,920,000.00
29	630.1.2P (14103)		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14,354.00	$ 1,320,000.00	$ 18,947,280,000.00	176.20	$ 232,584,000.00		0.00	0.00	76.80	101,376,000.00	176.20	$ 232,584,000.00
30	630.3.1P (14103)		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	10,120.00	$ 1,100,000.00	$ 11,132,000,000.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00		0.00	0.00	1,101.50	1,211,650,000.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00
31	630.3.4P (14103)		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936.00	$ 1,254,299.00	$ 1,174,023,864.00	476.60	$ 597,798,903.00		0.00	0.00	30.30	38,005,260.00	476.60	$ 597,798,903.00
32	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	254.00	$ 1,010,000.00	$ 256,540,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
32.1	630.3.5P (11604)		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3		$ 1,010,000.00		1,056.60	$ 1,067,166,000.00	+	1,394.70	1,408,647,000.00	1,056.60	1,067,166,000.00	2,451.30	$ 2,475,813,000.00
32.2	630.3.5P (14103)		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3		$ 1,010,000.00		7,072.50	$ 7,143,225,000.00	-	-6,033.80	-6,094,138,000.00	559.60	565,196,000.00	1,038.70	$ 1,049,087,000.00
33	630.4 (11604)	630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	847.00	$ 720,000.00	$ 609,840,000.00	409.80	$ 295,056,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	409.80	$ 295,056,000.00
34	630.6	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	169.00	$ 509,329.00	$ 86,076,601.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
34.1	630.6 (11604)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 509,329.00	$ -	880.40	$ 448,413,252.00		0.00	0.00	109.30	55,669,662.00	880.40	$ 448,413,252.00
34.2	630.6 (14103)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 509,329.00	$ -	120.20	$ 61,221,346.00		0.00	0.00	13.00	6,621,278.00	120.20	$ 61,221,346.00
35	632.1P (14103)		632.1P	Baranda Metálica	m	3,041.00	$ 665,000.00	$ 2,022,265,000.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00
36	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	7,427,664.00	$ 6,752.00	$ 50,151,587,328.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
36.1	640.1 (11604)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6,752.00		805,176.00	$ 5,436,548,352.00		0.00	0.00	107,366.00	724,935,233.00	805,176.00	$ 5,436,548,352.00
36.2	640.1 (14103)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6,752.00		3,667,801.00	$ 24,764,992,352.00		0.00	0.00	1,072,018.20	7,238,266,886.00	3,667,801.00	$ 24,764,992,352.00
37	641.1 (14103)	641-22		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4,228,628.00	$ 2,426.00	$ 10,258,651,528.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00		0.00	0.00	280,228.30	679,833,856.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00
38	642.1 (14103)	642-22		Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	64.00	$ 723,081.00	$ 46,277,184.00	47.00	$ 33,984,807.00		0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	$ 33,984,807.00
39	642.2 (14103)	642-22		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	120.00	$ 372,145.00	$ 44,657,400.00	252.20	$ 93,854,969.00		0.00	0.00	0.00	0.00	252.20	$ 93,854,969.00
40	661.1 (11604)	661-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,724.00	$ 670,000.00	$ 1,155,080,000.00	1,311.50	$ 878,705,000.00		0.00	0.00	474.20	317,714,000.00	1,311.50	$ 878,705,000.00
41	671.1 (11604)	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6,250.00	$ 560,000.00	$ 3,500,000,000.00	5,445.00	$ 3,049,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	$ 3,049,200,000.00
42	673.1 (11604)	673-22		Geotextil Tipo II no tejido	m2	126.00	$ 7,777.00	$ 979,902.00	72,202.20	$ 561,516,509.00	+	47,414.00	368,738,678.00	67,117.30	521,971,243.00	119,616.20	$ 930,255,187.00
43	673.2	673-22		Material granular drenante	m3	1,230.00	$ 122,801.00	$ 151,045,230.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
43.1	673.2 (11604)	673-22		Material granular drenante	m3	0.00	$ 122,801.00	$ -	1,050.00	$ 128,941,050.00	+	2,879.80	353,642,320.00	1,050.00	128,941,050.00	3,929.80	$ 482,583,370.00
43.2	673.2 (14103)	673-22		Material granular drenante	m3	0.00	$ 122,801.00		332.00	$ 40,769,932.00		0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	$ 40,769,932.00
44	673.3 (11604)	673-22		Material de cobertura tipo SBG	m3	560.00	$ 172,304.00	$ 96,490,240.00	-	$ -	+	2,858.90	492,599,906.00	0.00	0.00	2,858.90	$ 492,599,906.00
45	683.4P (11606)		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 90Zn10Al revestido . Rellenos y conformación realizados mecánicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12,184.00	$ 440,000.00	$ 5,360,960,000.00	19,560.80	$ 8,606,751,943.00	+	0.0001	57.00	0.00	0.00	19,560.80	$ 8,606,752,000.00
Subtotal								**$ 142,733,717,403.00**		**$ 105,344,659,520.00**			**$ (2,042,454,567.00)**		**$ 14,713,000,013.00**		**$ 103,302,204,953.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
46	1P (11607)		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	218,321.00	$ 1,989.00	$ 434,240,469.00	63,898.50	$ 127,094,116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63,898.50	$ 127,094,116.00
47	2P (11607)		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1,160.00	$ 24,098.00	$ 27,953,680.00	1,568.00	$ 37,785,735.00	-	-0.0029	-71.00	0.00	0.00	1,568.00	$ 37,785,664.00
48	4P (11607)		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44,212.00	$ 8,377.00	$ 370,363,924.00	12,488.00	$ 104,611,976.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	$ 104,611,976.00
49	5P (11607)		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244.00	$ 399,456.00	$ 97,467,264.00	214	$ 85,483,584.00		0.00	0.00	16.00	6,391,296.00	214.00	$ 85,483,584.00
50	730.1 (11607)	730-22		Defensa metálica	m	3,214.00	$ 233,492.00	$ 750,443,288.00	8,850.00	$ 2,066,404,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	$ 2,066,404,200.00
51	730.2 (11607)	730-22		Sección final	u	84.00	$ 103,783.00	$ 8,717,772.00	180	$ 18,680,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	$ 18,680,940.00
52	740.1 (11607)	740-22		Captafaros	u	7,498.00	$ 22,154.00	$ 166,110,692.00	3,470.00	$ 76,874,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	$ 76,874,380.00
Subtotal								**$ 1,855,297,089.00**		**$ 2,516,934,931.00**			**$ (71.00)**		**$ 6,391,296.00**		**$ 2,516,934,860.00**
OBRAS VARIAS																	
53	810.1 (11606)	810-22		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	144,000.00	$ 17,900.00	$ 2,577,600,000.00	31,499.00	$ 563,832,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00	$ 563,832,100.00
Subtotal								**$ 2,577,600,000.00**		**$ 563,832,100.00**			**$ -**		**$ -**		**$ 563,832,100.00**
TRANSPORTES																	
54	900.2 (11608)	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,144,729.00	$ 1,060.00	$ 7,573,412,740.00	587,466.10	$ 622,714,066.00		0.00	0.00	130,367.60	138,189,656.00	587,466.10	$ 622,714,066.00
Subtotal								**$ 7,573,412,740.00**		**$ 622,714,066.00**			**$ -**		**$ 138,189,656.00**		**$ 622,714,066.00**
ÍTEMS NO PREVISTOS																	
55	500.1 (11603)	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 (Sector Putumayo)	m3	0.00	$ 1,101,441.00	$ -	25,613.00	$ 28,211,208,333.00		0.00	0.00	9,415.30	10,370,397,448.00	25,613.00	$ 28,211,208,333.00
56	NP-05 (14103)		NP-05P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u	0.00	$ 8,156,902.00	$ -	320.00	$ 2,610,208,640.00		0.00	0.00	158.00	1,288,790,516.00	320.00	$ 2,610,208,640.00
57	NP-06 (14103)		NP-06P	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro)	m	0.00	$ 31,499,390.00	$ -	22.80	$ 718,186,092.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	$ 718,186,092.00
58	NP-07 (14103)		NP-07P	JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	0.00	$ 15,057,059.00	$ -	22.80	$ 343,300,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	$ 343,300,945.00
59	NP-08 (14103)		NP-08P	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m	0.00	$ 36,175,223.00	$ -	11.40	$ 412,397,542.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	$ 412,397,542.00
60	621.1P (14103)	621-22		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m	0.00	$ 6,212,436.00	$ -	2,031.00	$ 12,617,457,516.00		0.00	0.00	885.50	5,501,112,078.00	2,031.00	$ 12,617,457,516.00
61	621.5P (14103)	621-22		CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m	0.00	$ 14,963,102.00	$ -	1,320.00	$ 19,751,294,640.00		0.00	0.00	1,024.80	15,334,186,928.00	1,320.00	$ 19,751,294,640.00
62	NP-09 (14103)		NP-09P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u	0.00	$ 240,175,334.00	$ -	6.00	$ 1,441,052,004.00		0.00	0.00	6.00	1,441,052,004.00	6.00	$ 1,441,052,004.00
63	NP-10 (14103)		NP-10P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u	0.00	$ 396,887,878.00	$ -	10.00	$ 3,968,878,780.00		0.00	0.00	7.90	3,135,414,236.00	10.00	$ 3,968,878,780.00
64	642.1.1 (14103)	621-22		APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u	0.00	$ 41,366,523.00	$ -	34.00	$ 1,406,461,782.00		0.00	0.00	29.50	1,220,312,429.00	34.00	$ 1,406,461,782.00
65	642.1.2 (14103)	621-22		APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u	0.00	$ 154,812,009.00	$ -	8.00	$ 1,238,496,072.00		0.00	0.00	7.20	1,114,646,465.00	8.00	$ 1,238,496,072.00
66	800.5 (11601)	800-22		CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	0.00	$ 39,679.00	$ -	24,776.00	$ 983,086,904.00		0.00	0.00	3,838.20	152,295,938.00	24,776.00	$ 983,086,904.00
67	201.16 (11601)	201-22		REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m	0	$ 6,174.00	$ -	24,776.00	$ 152,967,024.00		0.00	0.00	8,928.20	55,122,707.00	24,776.00	$ 152,967,024.00
68	201.15 (11601)	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	0	$ 134,575.00	$ -	1,311.00	$ 176,427,825.00		0.00	0.00	259.00	34,854,925.00	1,311.00	$ 176,427,825.00
69	900.1 (11608)	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E	0	$ 1,889.00	$ -	100,000.00	$ 188,900,000.00		0.00	0.00	36,092.70	68,179,111.00	100,000.00	$ 188,900,000.00
70	NP-01 (11604)		NP-01P	Cinta PVC V15 o similar	m	0	$ 68,117.00	$ -	300.00	$ 20,435,100.00	+	450.00	30,652,650.00	300.00	20,435,100.00	750.00	$ 51,087,750.00
71	NP-02 (11604)		NP-02P	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	0	$ 24,478.00	$ -	2,000.00	$ 48,956,000.00		0.00	0.00	1,352.20	33,099,152.00	2,000.00	$ 48,956,000.00
72	NP-03 (11604)		NP-03P	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	0	$ 70,616.00	$ -	100.00	$ 7,061,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	$ 7,061,600.00
73	NP-11 (11601)		NP-11P	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	Dia	0	$ 3,203,366.00	$ -	365.00	$ 1,169,228,590.00		0.00	0.00	114.00	365,183,723.00	365.00	$ 1,169,228,590.00
Subtotal								**$ -**		**$ 75,466,005,389.00**			**$ 30,652,650.00**		**$ 40,135,082,760.00**		**$ 75,496,658,039.00**
TOTAL OBRAS								**$ 272.686.149.666.00**		**$ 231.537.625.538.00**			**$ (988.00)**		**$ 79.128.455.927.00**		**$ 231.537.624.550.00**
Ajuste al peso										$ (7.00)			988.00				981.00

	CONCEPTO	VALOR TOTAL	ACTA ANTERIOR	PRESENTES	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS
*	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 272,686,149,666.00	$ 231,537,625,531.00	$ -	$ 79,128,455,927.00	$ 231,537,625,531.00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 73,508,379,476.00	$ -	$ 14,917,853,611.00	$ 73,508,379,476.00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ 300,000,000.00
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.00	$ 305,346,005,007.00	$ -	$ 94,046,309,538.00	$ 305,346,005,007.00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 1,692,005,725.00	$ -	$ 578,246,410.00	$ 1,692,005,725.00
	VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 537,176,619.00	$ -	$ 109,057,667.00	$ 537,176,619.00
	VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,192,308.00	$ 2,192,308.00	$ -	$ -	$ 2,192,308.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 307,577,379,659.00**	**$ -**	**$ 94,733,613,615.00**	**$ 307,577,379,659.00**
*	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3,340,000,000.00	$ 3,340,000,000.00	$ -	$ 3,088,681,864.00	$ 3,340,000,000.00
*	IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 634,600,000.00	$ -	$ 586,849,554.00	$ 634,600,000.00
*	**TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K =(I+J)**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ -**	**$ 3,675,531,418.00**	**$ 3,974,600,000.00**
*	**TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ -**	**$ 435,263,820.00**	**$ 7,814,781,342.00**
*	VALOR BÁSICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ -	$ -	$ -	$ -
*	VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2,324,836.00	$ -	$ -	$ -	$ -
*	**TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)**	**$ 504,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
*	TOTAL BÁSICO ACTA. Q = (D+I+M)	**$ 308,687,336,528.00**	$ 308,686,005,007.00	$ -	$ 97,134,991,402.00	$ 308,686,005,007.00
*	TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)	**$ 2,864,643,131.00**	$ 2,865,974,652.00	$ -	$ 1,274,153,631.00	$ 2,865,974,652.00
*	**VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ -**	**$ 98,844,408,853.00**	**$ 319,366,761,001.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente modificación se realiza debido a la necesidad de mayores y menores cantidades de obra para cubrir las necesidades de mejoramiento de la sbrasante, excavaciones varias sin clasificar y bajo agua, concretos para obras de drenaje transversal, material granular dranánte y cinta de PVC, para las obras que se ejecutan en cielo abierto. Se ha realizado el Balance por parte del contratista; verificado y aprobado por la interventoría, según las necesidades del proyecto. Los ítem actualmente afectados son los siguientes: 230.1P, 600.1.1, 600.2.4, 610.3, 630.3.5P (11604),630.3.5P (14103) , 673.1 (11604), y NP-01. Las cantidades de los ítems 2P (11607) y 683.4P (11606) se ajustan para recortar los decimales que se tenian de mas en el acta de modificacion No.4.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: [firma]
NOMBRE: **LUIS CARLOS ROMO VELAZCO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula profesional No. : 52202-58774 NRÑ

Firma: [firma]
NOMBRE: **JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula profesional No. : 25202-100584 CND

Firma: Karol Roca Pacheco
NOMBRE: **KAROL ROCA PACHECO**
Titular Gerencia: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE
Matrícula profesional No. : 13202115547 BLV

Firma: Karol Roca Pacheco
NOMBRE: **KAROL ROCA PACHECO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No. : 13202115547 BLV

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	NOMBRE: **JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS** Matrícula profesional No. : 52202-46096 NRÑ	Firma (Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO) (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	NOMBRE: **JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS** Matrícula profesional No. : 52202-46096 NRÑ	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	NOMBRE: **JOSE DAVID ALARCON ALARCON** Matrícula profesional No. : 25202-101337 CND	Firma JOSE DAVID A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No:** 2

CONTRATO No. 985 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 **CONTRATO No.** 985 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 9 (Día) 2 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 26 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 319,366,761,001

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 319,366,761,001

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 7 (Mes) 2030 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800.5	11601	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	56,000.00	$ 39,679.00	$ 2,222,024,000.00
201.16	11601	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m	56,000.00	$ 6,174.00	$ 345,744,000.00
201.15	11601	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	1,377.00	$ 134,575.00	$ 185,309,775.00
900.1	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E	66,600.00	$ 1,889.00	$ 125,807,400.00
NP-01	11604	Cinta PVC V15 o similar	m	1,590.00	$ 68,117.00	$ 108,306,030.00
NP-02	11604	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	15,365.00	$ 24,478.00	$ 376,104,470.00
NP-03	11604	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	3,215.00	$ 70,616.00	$ 227,030,440.00
NP-05	14103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u	320.00	$ 8,156,902.00	$ 2,610,208,640.00
NP-06	14103	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y PILA 12 (suministro)	m	22.80	$ 31,499,390.00	$ 718,186,092.00
NP-07	14103	JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	22.80	$ 15,057,059.00	$ 343,300,945.00
NP-08	14103	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m	11.40	$ 36,175,223.00	$ 412,397,542.00
621.1P	14103	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m	2,084	$ 6,212,436.00	$ 12,946,716,624.00
621.5P	14103	CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m	1,320	$ 14,963,102.00	$ 19,751,294,640.00
NP-09	14103	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u	6.00	$ 240,175,334.00	$ 1,441,052,004.00
NP-10	14103	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u	10.00	$ 396,887,878.00	$ 3,968,878,780.00
642.1.1	14103	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u	34.00	$ 41,366,523.00	$ 1,406,461,782.00
642.1.2	14103	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u	8.00	$ 154,812,009.00	$ 1,238,496,072.00
NP-11	11601	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	DIA	250.00	$ 3,203,366.00	$ 800,841,500.00

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_0) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula profesional No. : 215422 CSJ

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula profesional No. : 25202-100584 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Firma:
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Titular Gerencia:
Matrícula profesional No. : 25202-103081CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No. : 25202-103081CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: MIGUEL ÁNGEL GUACALES DÍAZ — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

Certificación
Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055, identificado con NIT No 901584893 denominada CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055, a la fecha 05/11/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	04000003322	05/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO 93	40

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Consorcio
Vias Colombia 055

CASAHIDALGO
CONSTRUCTORES

SEÑORES,
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
E. S. M.

Referencia: **Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022**, cuyo objeto es *"Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Villagarzón - San José de Fragua y puente sobre el río Caquetá en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá en marco de la reactivación económica, mediante el programa de las vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2,0"*.

Asunto: **PODER ESPECIAL**

CÉSAR ANATOLI MALAVER DÍAZ, identificado con cédula de extranjería n° 7.846.410 de la República de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055**, identificado con NIT.901.584.83-4, manifiesto que, por medio del presente escrito, confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO** y **SUFICIENTE** al Ingeniero **LUIS CALOS ROMO VELASCO**, identificado con la cédula de ciudadanía n° 16.714.865 de Cali y portador de la tarjeta profesional n° 5220258774NRÑ expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-. Par que apruebe y suscriba ante el INTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- toda la documentación que se requiera al interior del Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022, en especial los documentos o formatos que formen parte del Manual de Interventoría de la precitada entidad.

Con base en las amplias facultades otorgadas, el precitado apoderado se encuentra facultado para suscribir y radicar cualquier documento que necesite presentar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-, salvo los que estén orientados a modificar, adicionar, prorrogar y/o aclarar el Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022 suscrito con el Consorcio Vías Colombia 055.

El presente mandato se otorga con representación, por lo que el apoderado responderá legalmente por cualquier consecuencia adversa que pueda generar su gestión ante las entidades y personas mencionadas. En ese orden, con la aceptación del presente mandato el apoderado declara que exonera al poderdante de toda responsabilidad que pueda llegar a endilgársele por la gestión acometida en virtud del presente poder.

Por favor reconocer al apoderado designado y las facultades dadas a él.

Cordialmente,

CÉSAR ANATOLI MALAVER DÍAZ
Representante Legal
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Director de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Hector E. Cortes Diaz
Notaria Encargada
NOTARIA SETENTA

Av. El Dorado # 69B – 45 OF. 605 ed. Bogotá Corporate Center
(601)9156317
notificaciones@casahidalgo.com.co
notificacionesvc055@casahidalgo.com.co
Bogotá D.C., Colombia







NOTARIA 73 BOGOTÁ
VICTORIA BUENAL TRUJILLO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA SETENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

La Notaría 73 de Bogotá hace constar que el presente documento fue presentado personalmente por:

CESAR ANTONILI MALAVER DIAZ

Quien se identificó con la **C.E. 7846410**

Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

En Bogotá D.C. 2025-11-28 15:24:49

276f1-ea3104b5

Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento

Cod. Verificación
z1wjh

HECTOR FABIO CORTES DIAZ
NOTARIO 73 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
RES. 2025-024030-E Del 27 De Noviembre De 2025



Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONSORCIO VIAL JAC 2022
NIT. 901582956-0

CERTIFICA:

Que, el **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055** identificado con NIT 901.584.893-4, realiza el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales correspondientes al mes de NOVIEMBRE DE 2025, en desarrollo del contrato No 985 de 2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

Lo anterior en consecuencia, a la certificación emitida por el contratista de obra, cuya verificación se realizará mes vencido por parte de la Interventoría, de acuerdo con el plazo para pago de aportes establecido según los últimos dígitos de identificación.

Para constancia se firma a los 3 días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente,

ING. JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL JAC 2022
