Actividades:

Se termina de realizar la instalacion de la red principal de alcantarillado, quedando pendiente tramos de conexion a pozos por construir.

Se da comienzo a la instalacion de domiciliarias de red de alcantarillado en tuberia PVC novaloit de 6".

Se realiza la excavacion en zanjas para la instalacion de domiciliarias, se realiza la conexion de 6 domiciliarias, colocacion de cama en triturado y respectivo relleno en material granular.

Se aclara o informa que las domiciliarias deben ir conectadas a la red principal mediante silla Y o en casos muy puntuales donde la domiciliaria venga perpendicular y para estados constructivos sea mejor silla T (Pero en casos muy puntuales y bajo previa autoriza cion de la interventoria).

En la conexion no se deben utilizar ningun tipo de accesorio diferente a la silla Y.

En la conexion de tuberia en gres con PVC se debe realizar una caja en mamposteria de transicion;

Ires
Inicio.

20 DE JUNIO. DE 2019.

EN LAS OFICINAS DE INTERVENTORIA EL DÍA 19 DE JUNIO. SE DISCUTIO EL TEMA DE LOS CODOS Y SEMICODOS PARA LA CONEXIONES DOMICILIARIAS. DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DETERMINARA EL ANGULO DE LA DOMICILIARIA CON LA RED PRINCIPAL PARA POR APROXIMACIÓN ESCOGER SI SE IMPLEMENTA SILLA "Y" O SILLA "Tee". PARA LOS ACCESORIOS COMO CODO Y SEMICODO SE LIMITARÁ SU USO AL MINIMO POSIBLE. YA QUE PARA CONSERVAR LAS COTAS DE LA DOMICILIARIA EN EL BORDILLO Y EN LA RED HAY QUE MANIOBRAR CON ESTOS ACCESORIOS Y LA LONGITUD.

27 de Junio de 2019

Se realiza recorrido por parte del area SST de interventoria y contratista, se solicita realizar mantenimiento a los

Norma

Scanned by CamScanner

Senderos peatonales i mejorar las condiciones de operación en los pozos, realizar el etiquetado de las sustancias químicas. Mejorar el sendero peatonal de la transversal 3 con 52 B.

Actividades:

Se terminan de instalar domiciliarias 4 und para un total de 10 en tubería PVC 6"

Se realiza cama en tubería, rellenos en recebo común compactado en capas de 30cm aproximadamente.

Se realiza corte sobre placa en concreto y excavación para construcción de pozo de inspección de aguas negras sobre abscisa Km 3.

Se recuerda al contratista de obra presentar las carteras con la rasante final de la vía.

22 Junio de 2019

Maquinaria: Retro excavadora - Herramienta menor

Personal: 1 ayudante, 1 Trabajo, 1 inspector, 1 oficial

Actividades

Se realiza construcción de pozo aguas negras sobre Km 0+003 en mampostería con placa fondo, cañuela, pendiente acuerdos generales.

25 Junio de 2019

No se encuentra personal ni maquinaria sobre el segmento vial, por tal motivo no se realizan actividades.

Se solicita al contratista de obra mantener los recursos necesarios y suficientes en obra para la ejecución de actividades y evitar atrasos en obra.

26 Junio de 2019

Maquinaria: Retroexcavadora

Personal: 1 ayudante, 1 inspector, 1 oficial, 1 Trabajo

Norma

Scanned by CamScanner

Se evidencia incumplimiento en el PMT a no contar con los 2 Traficos sobre las TIV 3 y 4.
Se solicita en todo momento la presencia de este personal.
Actividades:
Se realiza excavacion mecanica de 30m aprox para caja de estructura de pavimento. h=55cm aprox.
Se realiza corte de losa en concreto y excavacion para pozo sobre la abscisa Ko+071
Se realiza instalacion de placa fondo para pozo, Ko+071.

27 Junio de 2019
Personal: 1 ayudante, 1 inspector, 1 Oficial, 1 Trafico
Maquinaria: Retro excavadora, 1 Bomag.
Actividades:
Se realiza construccion de pozo en mampostena sobre Ko+071
Se continua con la excavacion mecánica sobre media calzada para caja de estructura de pavimento.
Se reitera la falta de Traficos sobre la TIV 3 y 4 los cuales son requisito para la correcta implementacion del PMT.
Nuevamente se recalca que se debe realizar la gestión ante la SDM para la actualización del PMT con el cierre total de la calzada, ya que el PMT aprobado es por media calzada y no se esta Cumpliendo
Se solicita realizar jornadas de aseo ya que se observan basuras y material a todo el Frente de dos Colombinas en el piso, cinta rasgada, etc
Se solicita la cartera de rasante final de la vía, considerando que se esta realizando el cajeo de la via (Carril Norte) y se requiere para control de excavaciones y volumenes de material a instalar.
Se solicita que la compactación alrededor de los pozos se realice con saltarin, ya que se dejó espacio suficiente para realizar esta actividad con este equipo. De igual forma, se requiere la presentación de la toma de densidades para estos rellenos y poder realizar el reabo por parte de la Interventoria.

Norma

Scanned by CamScanner

10

Se requiere la entrega a la Interventoría de cada capa para liberación de la misma.
Se solicitan los ensayos de calidad de la mampostería utilizada de acuerdo a la norma respectiva.

Diana M. Prado
Residente Interventoría.

02 de Julio de 2019.

- Se solicita al contratista de obra mantener actualizada la bitácora de obra con la información correspondiente a las actividades ejecutadas diariamente.
- El día viernes 28 de junio de 2019 se habilitaron los accesos vehiculares a los Edificios Lagos 05 y María Juliana
- Se terminó la construcción del pozo cerca a la Transversal 4 pero se observa filtración a ambos lados del tubo por lo que se solicita revisar y realizar las correcciones pertinentes.
- Se observan residuos de demolición de losas sin evacuar. y residuos de excavación sin retirar, por lo que se sugiere realizar esta actividad lo más pronto posible.
- De igual forma, se observa nuevamente incumplimiento del PMT aprobado, por lo que se recalca que se deben realizar las gestiones pertinentes ante la SDM para el cierre total de la calzada.
- Se observa afectación de zonas verdes al lado del sardinel por lo que el contratista de obra deberá realizar los arreglos respectivos
- Se debe realizar barrido de vías y andenes, ya que se observa material de excavación, el cual podría generar accidentes en transeuntes y motociclistas.
- Se debe realizar el embozalillado correcto de la tubería de alcantarillado en los pozos de inspección.
- A la fecha no se cuenta con el diseño de rasante para el chequeo de niveles de la vía.

Diana M. Prado R.
Residente Interventoría.

Norma

Scanned by CamScanner

EL 02 DE JULIO SE PRESENTA CUERPO CON LA EPPS PARA REALIZAR LA PROFUNDIZACION DE LA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE 1,5" QUE CRUZA LA CALLE 57B A COSTA DEL CONTRATISTA

03 de julio de 2019

- Se solicita al contratista realizar mantenimiento en los senderos peatonales.
- Se debe implementar el plan de emergencias aprobado y dotar los campamentos con los elementos del mismo.
- Se reitera la solicitud de dar cumplimiento al PMT aprobado por SDM.

Ray Hernández
P.S.T interventoria

De acuerdo a las actividades realizadas el dia de hoy se evidencia la instalación de la geoceldo, teniendo en cuenta que cada capa de material de la via se debe verificar y validar por parte de la interventoria, esta actividad no será reconocida debido a que se realizó sin previo autorización por parte de esta, por lo tanto se le solicita al contratista volver a realizar estas actividades con el fin de aprobar la sub-rasante y la geoceldo.

Elena P Franco.
Topografa Interventoria.

04 de Julio de 2019.
Clima: Soleado
Maquinaria: Retroexcavadora, compactador.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, cuadrilla Topografica, 2 operadores
1 inspector.
Actividades:
Se notifica nuevamente que las actividades de instalacion y relleno de geoceldo instalada el dia de ayer y hoy. no serán reconocidas por esta interventoria, dado que no se ha liberado la capa de la subrasante por interventoria.
Tener en cuenta que una vez aprobada la instalacion de geoceldo el relleno en material granular reciclado RCD, debe quedar 2cm por encima de la geoceldo de manera uniforme. hgeoceldo 15cm + 2cm sobrerelleno = 17cm.

Norma

Scanned by CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONTRATO 142 DE 2018

CONTRATISTA : CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

INTERVENTORIA : CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C.

CIV [redacted]

CRA 3A ENTRE CLL 63 Y CLL 64

Norma
Scanned by CamScanner

20 DE JUNIO DE 2019

* INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA
* EN EL SEGMENTO YA SE REALIZÓ LAVADO E' INSPECCIÓN DE REDES CON CCTV
* EL PMT DE ESTE SEGMENTO SE APROBÓ EN EL COI 20 No. 22880. EL PMT YA SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO.
* SE REALIZÓ NIVELACIÓN DEL TERRENO - PERFIL DE LA VÍA ENTRE CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

20 de Junio 2019

- Se inicia con la demolición de carpeta asfaltica y placas en concreto de la vía costado oriental.

21 de Junio 2019

- Se continúa con la demolición de carpeta asfaltica y se realiza retiro del material proveniente de la demolición.

22 de Junio 2019

- Suministro de material tubería de 12" para alcantarillado

25 de Junio 2019

- Se realiza cargue y retiro del material proveniente de la demolición de carpeta asfaltica.
- Suministro de material granular B-200 y suministro de material triturado.

- OBSERVACIONES: A la implementación del PMT, le hace falta la colocación de la valla de desvío, solicitada por ésta interventoría desde el pasado 20 de junio. Se debe mantener separada por todo el eje longitudinal la zona de intervención mediante colombina y

Norma

Scanned by CamScanner

cinta. Se solicita por parte de interventoría la presencia de la cuadrilla topográfica para iniciar con las actividades de excavación, zanja e instalación de red de alcantarillado de 12".
A la fecha el contratista no ha entregado a la interventoría la nivelación topográfica con sus perfiles y secciones transversales, información necesaria para aprobación y validación, sin esta documentación la interventoría no avala el inicio de instalación de la red de alcantarillado.

INTERVENTORIA

26 de Junio de 2019

* Se inicio excavación para rede de alcantarillado desde pozo existente en extremo con la calle 63
* Sobre las 8:30 AM se reportó daño en red de acueducto de asbesto de 3" al medio día ya se había realizado la reparación por parte del contratista.
* 1 Retro pajarito
  1 Ayudante 1 Maestro
  2 Volquetas

27 de Junio de 2019

* Se inician las actividades de instalación de tubería PVC 12" para alcantarillado.
* Instalación de cama en triturado para tubería
  1 Retro Pajarita
  1 Ayudante, 1 Maestro
  2 Volquetas

OBSERVACIONES: La interventoría solicita realizar la gestión pendiente para la actualización del PMT con el cierre total de la calzada, considerando las actividades de instalación de tubería de alcantarillado

Norma

Scanned by CamScanner

que se estan realizando. De igual forma, se reporta el daño del andén frente al predio cra 3A # 63 - 38, por lo cual se deben realizar las reparaciones pertinentes.
Se solicita la instalación de entibado para la excavación de alcantarillado por la profundidad mayor a 1,50 m, de igual forma se requiere la instalación de un medio de acceso seguro a la excavación, instalación de carpa de campamento con el kit de emergencia, señalización del punto ecológico con cubierta, instalación de la señal de desvío de acuerdo al PMT aprobado.
Se solicita que el personal dedicado a las actividades de instalación de tubería, presenten el curso de trabajo en alturas considerando que las excavaciones superan 1,50 m de profundidad; de no presentar esta información el día de hoy 27/06/19, se solicitará y ordenará el retiro de este personal de la obra.
Considerando que existe una excavación abierta, se solicita realizar la respectiva señalización.

INTERVENTORIA

- Se solicita mejorar el almacenamiento de la tubería de 12" de PVC ya que no cumple con las especificaciones del proveedor. De igual forma se requiere cubrir el material granular para evitar contaminación, humedecimiento excesivo o molestias en la comunidad por material particulado, se solicita verificar la estabilidad del talud de la excavación de alcantarillado ya que presenta asentamiento por el paso de las volquetas

INTERVENTORIA

Norma

Scanned by CamScanner

27 de Junio 2019

* Ingreso de carpa para campamento al frente de obra.
* El punto ecológico se encuentra instalado.

28 de Junio 2019 lluvias: 7:00 am a 9:30 am

- Se continúa con excavación mecánica para red de alcantarillado.

29 de Junio 2019

- OBSERVACIONES: Se solicita la corrección del entibado en madera ya que no cumple con los requisitos mínimos de protección del personal. Adicionalmente esta actividad no se encuentra de acuerdo a lo especificado en el ítem del contrato, por lo cual no se reconocerá su pago para los primeros 12 metros lineales, se solicita el retiro de material contaminado dentro de la excavación, se recuerda dejar la señalización pertinente de la excavación considerando que se aproxima un puente festivo donde no se ejecutaron actividades y se debe garantizar la seguridad de los transeúntes, se debe dejar habilitado el carril de acuerdo para dar cumplimiento al PMT aprobado, se requiere la instalación de la señal de desvío ya que aún no la han instalado.

INTERVENTORIA

- ACTIVIDADES:
- Se realiza nivelación e instalación de tubería de 12" para red de alcantarillado, verificación y ajustes.
- Instalación de primera capa de material granular

Norma

Scanned by CamScanner

5

y compactación, Adecuación de senderos y zonas de circulación con respectiva señalización.

PERSONAL:

1 Maestro 1 operador de maquinaria

1 Oficial

2 Ayudantes

CONTRATISTA

02 de Julio 2019 - Martes. Lluvias: 11:30 am a 1:30 pm

- Se realiza limpieza de material desprendido en excavación, se realiza nivelación de cama y se instala tubería, pieza de conexion a pozo, se autoriza lleno a 0,40 de lomo dejando libres uniones para posterior verificación de niveles, personal en obra. 1 oficial, 1 ayudante, 1 operador, 1 inspector de obra.

CONTRATISTA

- 03 de Julio de 2019

Clima: Soleado

Personal: Cuadrilla Topografica, 2 oficial, 1 ayudante, 1 Trabco, 1 operador

Maquinaria: Retroexcavadora, Herramienta menor

Actividades:

Se realiza relleno y compactacion de capas de recebo de Tuberia en 1ra capa de 39m aprox.

Se evidencia incumplimiento al PMT dado que no se encuentra habilitada media calzada al Trafico Vehicular.

No hay señalizacion valla desvio.

Se encuentra material Tirado sin cubrir.

RESIDENTE.

Scanned by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

GIV 2001592

CONTRATO Nº 142 DE 2018

CONTRATISTA: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MyA COS

"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.".

Norma

Scanned by CamScanner

CIV 2001592.

Localidad Chapinero

⊛ JUNIO 06 DE 2019.

Se da apertura a la bitácora de obra del CIV 2001592 ubicado en la Calle 58 entre Carreras 5 y 6 de la Localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá, incluido dentro del Contrato de Obra N° 142 de 2018.

El día 20 de mayo de 2019 se realizó el lavado de la tubería de alcantarillado combinado y el 21 de mayo se realizó la inspección con cámara de video para verificar el estado de la red.

La reunión de inicio con la comunidad se realizó el 23 de mayo de 2019 y 29 de mayo se inició con la implementación de las señales del PMT aprobado por la SDM y el cerramiento de obra.

El día 06 de junio de 2019, a las 12:00m, el contratista de Obra inicia con las actividades de demolición de la carpeta asfáltica existente, SIN AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ya que no ha cumplido con la entrega de la documentación requerida para la maquinaria y el personal de obra, de acuerdo a lo especificado en el Apéndice de Gestión Ambiental y SST. entregado por el FDLCH. De acuerdo a lo anterior, la Interventoría remitirá correo electrónico y comunicado informando sobre este incumplimiento a acatar las órdenes dadas por la Interventoría. Se anota también que el contratista de Obra realizó el cierre de la totalidad de la Calzada, a pesar de que el PMT aprobado solo contempla el cierre de media calzada, lo cual también se considera un incumplimiento a lo aprobado por la SDM, se adara que cualquier inconveniente presentado con la comunidad y/o la SDM será responsabilidad del Contratista de Obra Para realizar el cierre de toda la calzada, debe gestionar el trámite pertinente ante la Secretaría de Movilidad.

06/06/19 Diego A. Pulecio

Diana M. Prado
Residente Interventoría Norma

Scanned by CamScanner

Junio 7 de 2019
Personal: Operador Retroexcavadora. Volquetero, 4 ayudantes, 1 Oficial
1 Inspector, Operador minicargador
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, volqueta
Actividades:
Se termina de demoler cupeta asfaltica sin autorizacion de la interventoria, se inician labores de retiro de material de demolicion de carpeta asfaltica.
Se enfatiza en que el personal y maquinaria no esta autorizado por parte de la interventoria por tanto no pueden realizar actividades hasta no subsanar lo correspondiente a la documentacion.
Se reitera el incumplimiento a la implementación del PMT dado que la intervencion se aprobo por medios calzadas de tal forma que se debe garantizar el flujo vehicular por el carril que no esta siendo intervenido, cosa que no esta realizando el contratista de obra, por lo cual se solicita acondicione el carril del costado norte para permitir el flujo vehicular.
Se solicita en todo momento la valla movil ubicada en un lugar visible de la obra y las visitas del residente sisoma.

Ees Interventoria

Junio 8 de 2019
Personal: 2operadores, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 inspector
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador
Actividades:
Al no tener la documentacion conforme a lo exigido por el contrato y a las observaciones realizadas por la interventoria para maquinaria y personal, no se realizan actividades para este segmento vial.

Ees. Interventoria.

Norma

Scanned by CamScanner

Junio 10 de 2019
Personal: 2 operadores, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 inspector
Maquinaria. Minicargador, Retroexcavadora
Actividades:
No se realizan actividades por falencias en documentacion de maquinaria y personal, por tanto la interventoria no da el aval para continuar con las actividades hasta que no sea corregida la documentación.

Res Interv.

Junio 11 de 2019
Personal: 2 operadores, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 inspector
Maquinaria: Minicargador, Retroexcavadora.
Actividades:
Se continuan con falencias en la documentacion de maquinaria y personal, por tanto no se ejecutan actividades en este segmento vial.
La interventoria recomienda al contratista de obra la correcta implementacion del PMT, aprovechando el stand by de las obras.

Res Interv.

Junio 12 de 2019
Personal: 2 operadores, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 inspector.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador
Actividades:
No se realizan actividades de obra; el contratista de obra trabaja en la subsanacion de la documentacion de maquinaria y personal.
Se continua con la mala implementacion del PMT, lo cual esta ocasionando un incumplimiento por parte de consion al no acatar las solicitudes realizadas.

Res Interv.

Norma

Scanned by CamScanner

Junio 13 de 2019
Personal: 2 operadores, 4 ayudantes, 1 Oficial, 1 Inspector SI
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, Herramienta menor
Actividades:
Se continua con la subsanacion de la documentacion de personal y maquinaria, por tanto no se realizan actividades de obra.
La interventoria solicita los ensayos de caracterizacion de los materiales granulares los cuales seran utilizados para la intervencion del segmento vial, es importante dar cumplimiento al componente de calidad desde el inicio de las actividades. RES Interv.

Junio 14 de , 2019
Personal: 2 Operadores, 4 ayudantes, 1 Oficial, 1 Inspector
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, Herramienta menor
Actividades:
Se da aval por parte de la interventoria de dar inicio a la ejecucion de actividades, dada la subsanacion a la documentacion entregada el dia de hoy, sin embargo, no se ejecutan actividades para este corredor vial.
La interventoria solicita ademas de los ensayos de caracterizacion de materiales granulares, la entrega del diseño de asfalto- Marshall y diseño de concreto a usar durante el desarrollo del proyecto.
Nuevamente se solicita la correcta implementacion al PMT aprobado por medias calzadas habilitando el Trafico vehicular por una calzada.
RES Interventoria.

Junio 15 de 2019
Personal: 2 Operadores, 4 ayudantes, 1 Oficial, 1 Inspector
Maquinaria: Retroexcavadora, Minicargador, Herramienta menor
Actividades: No se realizan actividades; segun informe de CCTV presentado por el contratista de obra, la tuberia existente se encuentra en un diametro de 12" en material gres

Norma
Scanned by CamScanner

con un grado estructural 5, lo cual implica que la red tiene un diagnostico con riesgo al colapso. Por tal motivo la interventoria recomienda la actualizacion de esta red en tuberia PVC novafort en 12", con previa autorizacion de FDLCH.

Tres Interv.

Junio 17 de 2019
Personal: 2operadores, 4 ayudantes, 1 Oficial, 1 inspector.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, Herramienta menor
Actividades:
Dada la intervencion de redes en donde se requiere la renovacion en material y segun inspeccion esta tuberia se encuentra en su punto mas bajo a una profundidad aproximada de 3,20 metros, lo cual implica que estas actividades se deben realizar con personal el cual debe tener curso vigente de alturas.
Por otra parte es necesario entibar zanja de excavacion de redes, por lo cual se esta a la espera de la llegada de materiales y el personal idoneo para realizar estas actividades.

Tres Interv.

Junio 18 de 2019
Personal: 2 operadores, 4 ayudantes, 1 Oficial, 1 inspector.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, Herramienta menor
Actividades:
se continua a la espera de la llegada de materiales y personal idoneo, por tal motivo no se ejecutan actividades es este corredor vial.
Se reitera la correcta implementacion del PMT, haciendo una conformacion de media calzada para habilitar el flujo vehicular.

Tres Interv.

Norma

Scanned by CamScanner

Junio 19 de 2019

Personal: 2 Operadores, 4 ayudantes, 1 Oficial, 1 inspector

Maquinaria: Retroexcavadora, Minicargador, Herramienta menor

Actividades:

No se realizan actividades, se continua con la misma situacion, a la espera de llegada de materiales, en tal sentido la interventoria hace un llamado de atencion a mejorar la logistica y programacion de las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta que en primera instancia el frente de obra fue abierto sin autorizacion y que llevo ya 2 semanas en el cual ha estado quieto por faltantes imputables al contratista de obra, lo cual si ha generado incomodidades a la gente del sector sin razon alguna cuando no se habia tenido documentacion, personal, materiales en orden.

les Interv.

* JUNIO 20 | 19

SE REALIZARON APIQUES PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD Y DIAMETRO DE TUBERIA EN AMBOS EXTREMOS DEL SEGMENTO

* JUNIO 21/19.

LLEGARON A OBRA LAS UNIONES PARA ENTIBADO DE DEP DE ALCANTARILLADO

* JUNIO 22, 25, 26 DE 2019

NO HUBO ACTIVIDAD

* JUNIO 27/19

LLEGO LA TUBERIA, SE ENVIARON A INTERVENTORIA LOS CERTIFICADOS DE CURSOS DE ALTURA, SE REINICIAN TRABAJOS EL DÍA DE MAÑANA

1 Retroexcavadora Yanmar
1 Operario
1 Inspector SST
1 Puletero
1 Oficial - 2 ayudantes.

Norma

Scanned by CamScanner

No se realizan actividades
Frente sin ejecución desde el 07 de junio de 2019.
Esta pendiente la comisión de topografía para el inicio de la instalación de tubería de alcantarillado.
Se solicita el botiquín y el extintor en el campamento.

Diana M. Prado R.
Residente de Interventoría.

* Junio 28 de 2019 "viernes"
Se inician actividades de excavación desde cia 6°, se nivela cama y se instala tubo # 2, Se registran lluvias entre 12 y 1330, se retiran 02 viajes dobles de excavación.
Personal en obra: 01 maestro
02 Ayudantes
01 Ayudante transito
01 operador retro
01 inspector

Jhonatthan Torres
insp. tec. ConyCon

* Junio 29 de 2019 "Sabado"
Continúa excavación y ubicación de tubería, Se instalan tubos # 2 y 3 en ø 12", Se adecua entibado para desarrollo de actividades por debajo de ▽ 1.5, al finalizar la jornada se revisa orden y aseo del frente. Personal en obra: 01 Maestro, 02 ayudantes, 01 ambiental, 01 encargado, 01 operador excavadora, 01 comisión topográficas. S/N.

Jhonatthan Torres
insp. tec. conycon

* Lunes 02 de julio de 2019.
No se evidencian actividades de obra por falta de combustible de la maquinaria. Se solicita al contratista de obra gestionar todos los materiales para no generar atrasos en la ejecución de actividades.
Dia nublado y lluvioso. No se ha mejorado el acopio de la tubería de PVC solicitado desde la semana anterior.

Diana M. Prado R.
Residente Interventoría Norma

Scanned by CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONTRATO No 142 DE 2018

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO HBS 05

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTA D.C"

CIV 2002042 y 2002049

CALLE 42 ENTRE KR 13 y AV CHILCOS

Norma

Scanned by CamScanner

21/06/19

* ESTOS SEGMENTOS CUENTAN CON PMT APROBADO EN CDI No.

* PARA ESTOS SEGMENTOS YA SE REALIZO LAVADO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON CCTV. ESTE INFORME YA SE ENTREGO A INTERVENTORIA

* ESTOS SEGMENTOS YA TIENEN REUNION DE INICIO

* EL DÍA DE HOY SE INICIO CON LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

* SE REALIZO RETIRO DE VIAJES DE MATERIAL

22/6/19

* SE REALIZA RETIRO DE CARPETA ASFALTICA DE LOS DOS SEGMENTOS POR LA MEDIA CALZADA DEL COSTADO NORTE. SE INSPECCIONÓ EL SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE HACIA LA CAJILLAS CON MATERIAL ROJO.

25/6/19


* SE INICIA EXCAVACIÓN DE CAJA DE VÍA DESDE LA AV. CARACAS HACIA LA IGLESIA SE DESCUBRE CÁRCAMO DE ETB Y CODENSA

* SE REALIZA APIQUE PARA CHEQUEAR PROFUNDIDAD DEL CRUCE DE ALCANTARILLADO PROXIMO A LA AV CARACAS.

* SE GESTIONA SOLICITUD DE VISITA CON LA ETB PARA VERIFICAR EN TERRENO EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CRUCE DE LA RED DE ALCANTARILLADO.

* INTERVENTORIA SOLICITA HACER ENTREGA DE LA PROXIMA SEMANA DE COMO VA A QUEDAR EL TERMINADO DE ESTOS SEGMENTOS

* CON INTERVENTORIA SE DEFINE LA LINEA POR DONDE SE RENOVARÁ LA RED EN PVC DE 16"

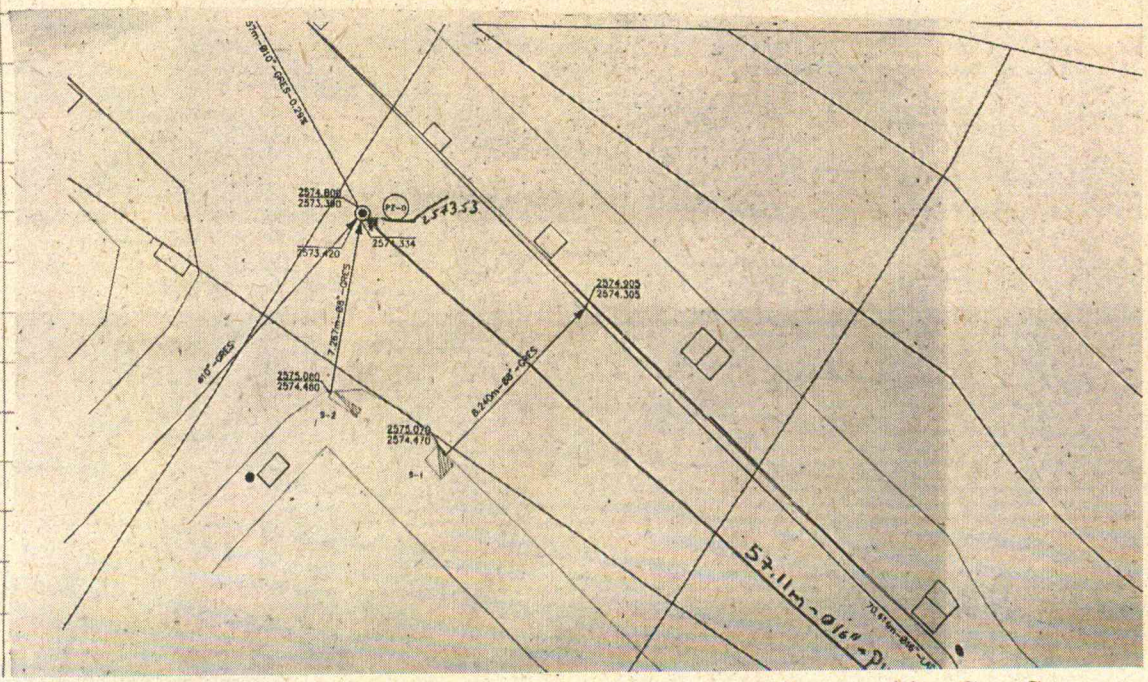

Scanned by CamScanner

26/6/19

* EN ESPERA DE CONFIRMACION DE VISITA A CAMPO DE DELEGADOS DE LA ETB NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION

29/6/19

* ACTIVIDADES DE CORTE Y EXCAVACION PARA TUBERIA EN EL CIV 2002042

1 MAESTRO — 4 Trafico.
1 AYUDANTE
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETES

A LAS 9:30 AM. HAY RECORRIDO DEL AREA SST EN CONJUNTO CONTRATISTA - INTERVENTORIA.

A las 4:08 pm no se ha iniciado la excavación para instalación de tubería de alcantarillado. No cuentan con tubería en el sitio para realizar esta actividad.
Se inició con el cajeo de la vía pero no cuentan con la cartera de rasante final de la vía por lo que no se pueden verificar los volumenes excavados. Se solicita la entrega de esta información lo más pronto posible, con el fin de evitar demoras en la liberación de actividades
Se solicita cubrir el material granular acopiado, de acuerdo a lo aprobado en el PMAO.
Se solicita realizar las inspecciones preoperacionales de la maquinaria. Se solicita que las volquetas tengan un sistema de auto carpado con el fin de evitar que los conductores se suban al volco a realizar esta actividad, de lo contrario se solicitará curso de trabajo en alturas para este personal.
De igual forma, se requiere la entrega a la Interventoria de las inspecciones a botiquín y extintores del campamento.
A la fecha no se ha informado a la Interventoria sobre la respuesta de ETB para coordinar la visita para verificar y coordinar trabajos por el circuito encontrado cerca a la Av. Caracas.

Diana M. Prado
Residente Interventoria

Norma

Scanned by CamScanner

28/06/19

7:30 am - Inicio de Excavación para Red principal alcantarillado.
Clima Nublado.

1 maestro — 1 comisión de topografía.
2 operarios. — 1 Retroexcavadora
1 ayudante.

Se realiza recorrido de obra del área social de interventoría donde se observa destrucción para acceso vehicular de IPS del edificio estelar 42, incumpliendo compromiso adquirido con esta entidad de garantizar el acceso a los arrendatarios.
Angelica Gaeuma - Residente social de interventoría.
Se recuerda al contratista realizar la ubicación de los acometidos esto con el fin de realizar la conexión a la nueva línea residual, la cual debe conectar a 45° y a su vez realizando la instalación de los silla yee. Se recomienda compactar el relleno de la excavación del alcantarillado en capas de 30 cm./ Elana P Franco.
Topografa Interventoria.

4:00 pm - Se suspenden actividades por lluvia.
Se instalo 24 mts de tubería pvc 16" con su respectiva Relleno de triturado de cama. y Recebo de Relleno.
4:20 pm - Se reanudan actividades.
Se habilita el paso de acceso vehicular de IPS del edificio. estelar 42.

29/06/19

Se realiza excavación para Red de Alcantarillado.
1 maestro — 1 Retroexcavadora.
1 ayudante. — 2 traficos
2 operarios., — 1 Boal.

Se descubre en el tramo aprox 30 mts de excavacion con respecto al pozo. (41/42-Cra 13a). Redes electricas y cordon en concreto (sello de excavacion.

Norma

Scanned by CamScanner
