
EVIDENCIAS.


ACTIVIDAD 1. APOYAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA PRIVADA Y EL DESPACHO DEL GOBERNADOR, GARANTIZANDO SU ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

- Se hace el seguimiento al Libro Blanco: Diagnostico y Contexto de las Obras Inconclusas.

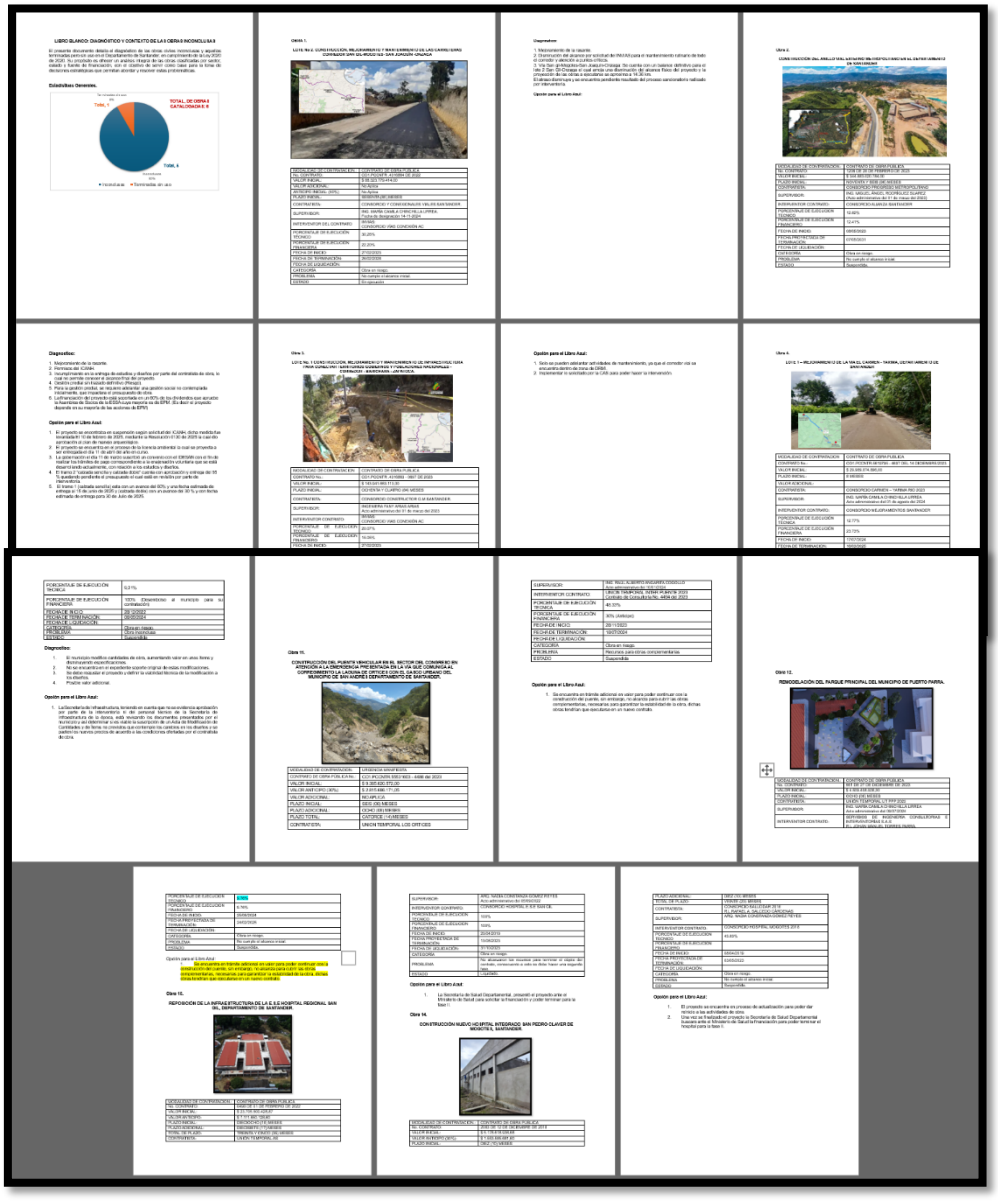

ACTIVIDAD 2. REVISAR Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, CONDICIONES CONTRACTUALES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD.

- Se consolida información de las obras en riesgo en conjunto con los supervisores de cada proyecto para la presentación del informe de obras en riesgo.

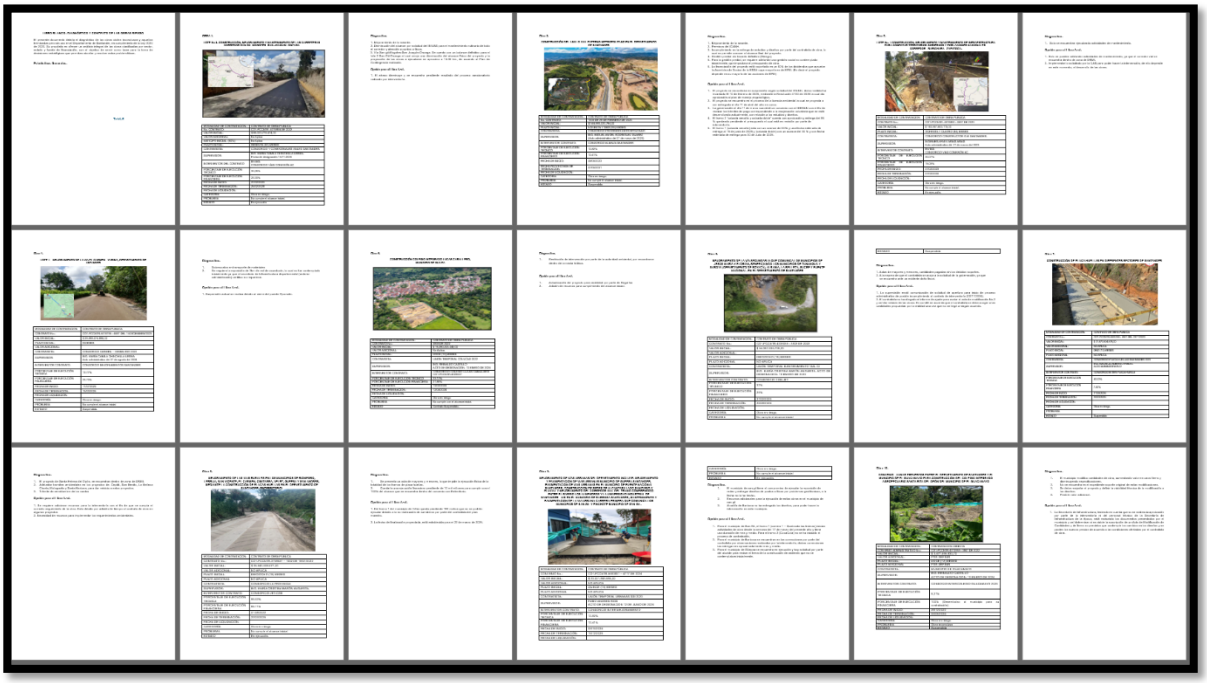

- Se proyecta cuadro producto de los avances y compromisos adquiridos en el comité de Obras Inconclusas.

CUADRO DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBRAS INCONCLUSAS Y OBRAS EN RIESGO.

ITEM	No. CONTRATO Y/O CONVENIO	OBJETO	ESTADO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	% FISICO	% FINANCIERO	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PROBLEMA	COMPROMISOS
OBRAS INCONCLUSAS										
1	1185 DE 2018	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL COMPLEJO DE ACUATICO DE BARRANQUERO, PARA EL MUNICIPIO DE RABINAL	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	RABINAL	0%	71.0%	MUNICIPIO DE RABINAL	APORTE NACIONAL PRODUCTIVO MUNICIPAL	Ejecución inoportuna por problemas técnicos	* Proponer a fin de ser el proyecto de inclusión para el presente año, la posibilidad alternativa para la terminación del proyecto. * Promover la rentabilidad que ingresos económicos y productivos genere el proyecto. * Capacitar trabajadores, técnicos, instructores y clientes, técnicos sobre el buen uso de la piscina pública y de los horarios de ingresos a 877 de 475 de julio de 2015
2	5377 DE 2012	ADENDA DE RESCISIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑON PARA LA RESCISIÓN DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO NEGRO, ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑON DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑON DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO	EJECUCIÓN	EL PEÑON	18%	77%	MUNICIPIO DEL PEÑON	FED-DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	Rescisión y replanteamiento técnico	* La Mun. Infraestructura debe permitir a la Unidad Ejecutora Final para poder hacerse de la medida de obras necesarias. * Gestionar el Segundo DESEMBOLSO de Liquidación de obra pendiente para que el proyecto se encuentre en condiciones de uso.
3	2454 DE 2015	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA VARA QUE CONFLUENCIA A LA VEREDA CAPILLITA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHIQUIMULA Y VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO.	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	CARMEN DE CHIQUIMULA	50%	50%	CONSTRUCTORA LOS ANDES	ASIGNACIONES DIRECTAS - RECURSOS DE PRIMAS - 35% APORTE MUNICIPAL - 15% DEPARTAMENTAL	Retrasos y fuertes lluvias	* Proponer modificaciones a la infraestructura de rodeos y diseños.
4	1351 DE 2014	EL COMPARECIENTE DECLARA PARA CONSTRUIR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA ALDEA LA PRADERA HASTA LA ALDEA LA CUMBRE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO.	LIQUIDADO POR MUTUO ACUERDO	LA PRADERA	100%	100%	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A.	FED-DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	Problemas de suelos	* Incluir en proximo contractual
5	1351 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL BAJE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA	EJECUCIÓN	CHIQUIMULA	80%	70%	UNION EMPRESARIAL PUENTE CHIQUIMULA 2018	FED-DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	No respeto a notificación plazo de entrega de acuerdo a cronograma de trabajo.	* Agilizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista para terminar el proyecto.
6	1407 DE 2015	"CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA VIA DE ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL MORENO BARRANQUERO".	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	MORENO	47.77%	80%	MUNICIPIO DEL MORENO	FED-DESCENTRALIZACION MUNICIPAL - 25% INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Falta de estudios técnicos, ausencia de estudios geotécnicos en proyectos de alto impacto por parte Consultor Interventor, Diseños que requieren el diseño y cotizar las especiales de acuerdo a las condiciones del terreno.	* Mantener un diseño a los diseños de la obra para el cumplimiento que se necesita para terminar el proyecto. * Diseño Integrado. Diseños que requieren el diseño y cotizar las especiales de acuerdo a las condiciones del terreno.
7	1391 DE 2017	EJECUCIÓN PARA PRESTACIÓN DE OBRAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO MUNICIPAL DE LAMINA, DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO, EJECUTADA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA ALDEA LA PRADERA HASTA LA ALDEA LA CUMBRE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE BARRANQUERO.	LIQUIDADO	LAMINA	100%	100%	CONSTRUCTORA LAMINA 2017	FED-DESCENTRALIZACION MUNICIPAL - VIAL	Pasado de lluvias y mal manejo de obra, se derrumbo 6346 de 2018, cuando se realizaban pilas de concreto para la cimentación del puente, la cual se vio afectada por el derrumbe de la estructura de concreto.	* Promover Acta de Liquidación para poder recibir definitivo el obra en terminos. * Recibir Obra y promover el proyecto de una Planta de Asfalto Caliente.
OBRAS EN RIESGO										
8	8264 DE 2014	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN DESDE LOS MUNICIPIOS SAN JOSE VILLA - LA ALDEA.	EN EJECUCION		28.26%	77.78%	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2846/2021 - FINANCIAMIENTO PROPIO	* Replanteamiento de la obra. * Proponer un diseño de obra por subdivisiones para el desarrollo de las diferentes etapas de la obra de acuerdo a las condiciones climáticas y topográficas. * Visitas de Supervisión, Inspección, Revisión de Contratos en los Informes y Archivos para el Cierre Definitivo del Contrato, el cual se realizará una vez que se haya finalizado el plazo de la obra y se haya recibido a satisfacción por parte de la Supervisión de

CUADRO DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBRAS INCONCLUSAS Y OBRAS EN RIESGO.

ITEM	No. CONTRATO Y/O CONVENIO	OBJETO	ESTADO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	% FISICO	% FINANCIERO	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PROBLEMA	SEGUIMIENTO	COMPROMISOS
OBRAS INCONCLUSAS											
1	1354 DE 2018	EQUIPAMIENTO (CONSTRUCCIÓN Y OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN) COMPLEMENTACIÓN Y ADICIONAL DEL CENTRO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA	LIQUIDADO SIN ASIGNAR DRE	BARBOSA	0%	79,33%	MUNICIPIO DE BARBOSA	70% RENTAS PROPIAS Y COFINANCIACIÓN (CDMB)	Obras ejecutadas parcialmente inconclusas		* Comunicar Gestiona, el predio ha colindado el diseño, el cual se solicitamos pago. Se puede pedir a nuevo Mercado, de ir dentro de 2024 de diciembre de 2024. *Verificar si el contratista cuenta con el cerramiento, se debe realizar con los vecinos y dejarlo por escrito para el Municipio de Colores los fines de desembolso.
2	527 DE 2013	ADICIONAL DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y FINANCIACIÓN REQUERIDOS PARA COMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 527 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN (CUNDINAMARCA) Y EL CONSORCIO PEÑÓN 2013	TERMINADA, FALTA DE RECIBO FINAL	EL PEÑÓN	100%	72%	MUNICIPIO DE EL PEÑÓN	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Pendiente y no pone fecha de obra		* La Toma se sitúa en tal manera que, debemos de ver el tema de la bomba, y se el adjudicado nuevo y observar que si se van a ver si no nos beneficia, debemos ver si es un beneficio para el municipio y que no exista un nuevo gasto.
3	3484 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER SOBRE LA CARRERA 5A LA CALLE 5A (DIAGONAL) A LA VEREDA CAMPOHERMOSO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VISTA NAMPETOVA DEL MISMO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	LIQUIDADO SIN ASIGNAR DRE	CARMEN DE CHUCURÍ	98%	98%	CONSTRUCTORES DE LA PAZ	ASIGNACIONES DIRECTAS (EXCEDENTES DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO)	Maquinaria y terreno fuera de vía		* Pasa maquinaria nuestra en diciembre hasta marzo de la visibilidad de las vías y predios.
4	1315 DE 2014	EL CONSORCIO "EL CRISOL PRESENTA EL PROYECTO DE LA OBRA RELACIONADA CON LA TERMINACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO DEL BARRIO "EL CRISOL"	LIQUIDADO POR MESA ASTRO	LEBRIJA	100%	100%	CONSORCIO CAMINO DE ACCESO LEBRIJA 2014	CRÉDITO BANCO BANCA COMERCIAL	Finalizada obra		* La ubicación de alcantarilla debe ser en la palmera, ancho de cuneta que quedaría en el predio, se debe hacer para poder eliminar el proyecto de la plataforma de obra en mención. *Que por el predio se debe ver el tema de cerrar, no el personal ingresa.
5	1357 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER SOBRE LA CARRERA 5A LA CALLE 5A (DIAGONAL) A LA VEREDA CAMPOHERMOSO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VISTA NAMPETOVA DEL MISMO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	TERMINADO	CHARALÁ	85%	70%	PROYECTOS DE INGENIERÍA, PROYECTOS 2018	ICLD RECAUDO	No reportan actividades desde el 2019		* Realizar mesa mensual con el contratista y evaluar como va el proyecto, ya que no se ha visto ningún avance desde el 2019
6	1460 DE 2018	"CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".	LIQUIDADA SIN ASIGNAR DRE	SOCORRO	97,33%	98%	MUNICIPIO DEL SOCORRO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Falta de un millón para dar terminado el proyecto, se solicita que se pueda terminar la obra, ya que se encuentra inconclusa.		* Se solicita el cerramiento del predio, ya que se encuentra en la vía y la policía informa de hurtos en los alrededores.
PREDIOS DE RIESGO											
7		CENTRO ADMINISTRATIVO INTERINSTITUCIONAL DE TOPOCORO									*Requiere para el próximo control la presencia del director de recursos físicos para que verifique el estado actual y manifieste las necesidades para poner en marcha del CAI
8		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PEÑON, FLORIAN, PALMAR Y PUENTE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO		PEÑON- FLORIAN - PALMAR - PUENTE NACIONAL							* Se ha hecho adicional en tiempo de 5 meses y un adición ordinario de 400 millones a la inventoria. *Los municipios de Peñon y Florian las actividades se encuentran suspendidas debido a las situaciones climáticas.
9		CONSTRUCCIÓN DE LA MONUMENTO A LA VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER		SOCORRO							*Se solicita a la contraloría hacer los requerimientos al municipio para que hagan el desembolso de los cursos y no puede hacer el tramite del acto administrativo para poder eliminar el proyecto de la plataforma de obra en mención.
10	1309 DE 2007	EJECUTARA PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LANDAZURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER EJECUTARA PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LANDAZURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER	LIQUIDADO	LANDAZURI	100%	100%	CONSORCIO LANDAZURI 2007	PRO DESARROLLO - 10%	Planta de beneficio esta cerrada debido al decreto 694 de 2015, cuando va a contar plan de reordenamiento de Plan de Beneficio, toque cavar el diferente dela infraestructura existente.		*Se requiere documento de instrumentos públicos para dar conformidad a la formulación del proyecto y así poder lo ejecutar.
11		CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE BADILLO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES		PUERTO WILCHES							*Realizar nuevamente mesa técnica donde involucre la contraloría para verificar la viabilidad de nuevo uso y se cuenta con los argumentos técnicos como jurídicos y pertinentes para argumentar que no es viable mirando para el municipio y que no exista volver a este tema para poder ser liberado el predio y que nacional en un desequilibrio financiero
12	6763 DE 2023	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL CORREDOR SAN GIL-MOGOTES- SAN JOAQUIN - ONZAGA	EN EJECUCION	SAN GIL - MOGOTES - SAN JOAQUIN - ONZAGA	30,28%	22,20%	CONSORCIO Y CONDICIONALES VIALES SANTANDER.	CONVENIO INTRADMINISTRATIVO V 2644/2023 - INVIAS VIGENCIAS FUTURAS	* Mejoramiento las pasivo. * Disminución del alcance por solicitud del INVIAS para el mantenimiento rutinario dado el corredor y atención a emergencias viales. * Vía San gil Mogotes- San Joaquin- Onzaga. Se cuenta con un tramo destinado para el tipo 2 San Gil Onzaga el cual ha sido una disminución del alcance físico del proyecto y la proyección las obras ejecutarse se aproxima a 14,36 km, de acuerdo al Plan de Contingencia radicado.		* La ejecución del mantenimiento No. 04 * Se encuentra en proceso de incumplimiento.
13	1206 DE 2023	CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUSPENDIDO	PIEDECUESTA - GIRON	12,82%	12,41%	CONSORCIO PROGRESO METROPOLITANO	ICLD INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)	* Mejoramiento las pasivo. * Promisos del ICANH. * Incumplimiento en la entrega de estudios y diseños por parte del contratista otra, lo cual no permite conocer el alcance final del proyecto. * Ejecución predial sin trazado definido. * Riesgos. * Para la gestión predial, se requiere adelantar una gestión social no contemplada inicialmente, que impactara el presupuesto de obra. * La financiación del proyecto está soportada en un 40% de los dividendos que aprueba la Asamblea de Socios de la ESSA cuya mayoría es de EPM, (Es decir el proyecto depende en su mayoría de las aclaraciones de EPM).	* Se encuentra en la ejecución de actividades en Gestión predial y estudios y diseños.
14	0497 DE 2023	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES - CORREDOR - BARICHARA - ZAPATOCA.	EN EJECUCIÓN	BARICHARA - ZAPATOCA	20,67%	15,03%	CONSORCIO CONSTRUCTOR G.M SANTANDER.	CONVENIO INTRADMINISTRATIVO V 2644/2023 - INVIAS VIGENCIAS FUTURAS	* Se están ejecutando solo actividades de mantenimiento.		* Solo se pueden adelantar actividades de mantenimiento, ya que el corredor vial se encuentra dentro de zona de DRMI. * Implementar lo solicitado por la CAS para poder hacer la intervención, dicho lo depende en este momento, el desarrollo de las obras.
15	4497 DE 2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN - YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUSPENDIDO	EL CARMEN - SAN VICENTE	12,7%	23,73%	CONSORCIO CARMEN – YARIMA RIO 2023	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	* Sobrecostos en transporte de materiales * Se requiere tar aplicación de 2km de vía de acuerdo, lo cual no fue contemplado * Inconvenientes ya que el secretario de infraestructura departamental (anterior administración) certificó no requerirse.		* Cierre del Puente Oponcito * Problemas con el vía el transporte de material
16	3844 DE 2023	CONSTRUCCIÓN COLEGIO RETORNO UNOS CABALLOS, MUNICIPIO DE SIMACOTA	NINGUNO	SIMACOTA	31,13%	31,13%	EMPRENDEPOSAL COLEGIO 2022	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	* Desde vía de bomberos no por parte de la vía hacia el colegio, por ser una vereda de vía de la media ladera.		* Se requiere los diseños de la vía y diseños, no incluido en el contrato por esto la inconveniencia de la misma.
17	3068 DE 2022	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARÍA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS MUNICIPIOS DE TUNUNGUÁ Y SUSACYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	JESÚS MARÍA Y FLORIÁN	32%	25%	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL C1	SGR - AR 40%	* Acoso de mayores y menores, cambios pegados en los debidos tiempos. * A la espera de que el contratista haga la solicitud de la prórroga, ya que se encuentra ante un evidente daño fiscal.		* Reinicio obras de junio de 2023. * Salió a favor del departamento por la suma de 7 mil millones aproximadamente. * Adición en tiempo de 6,5 meses * Avance de un 49% físico y 25% financiero
18	4561 DE 2023	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTANDER	SUSPENDIDO	11 municipios	40,63%	7,60%	CONSORCIO PLACA HUELLAS SANTANDER 2023	[redacted]	* El proyecto de Santa Helena del Opón, se encuentran dentro de zona de DRMI. * Adicionar tramos ambientales en los proyectos de: Cepitá, San Benito, La Belleza Chanchá, Molagavita y Santa Bárbara, para darle inicio a estos proyectos. * Trámite de servidumbre de los santos		*. Se requiere adicionar recursos para la intervención del tiempo de la obra, ya que se encuentra en el mes de julio, afectado por adición de tiempo al contrato y/o en algunos proyectos. * Para establecer recursos para implementar los requerimientos ambientales.
19	1402 DE 2022	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA, SAN VICENTE, EL CARMEN, CHITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SAN ANDRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (ENTREGADO)	EN EJECUCIÓN	RIONEGRO, LEBRIJA, SAN VICENTE, EL CARMEN, CHITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SANANDRES	96,63%	94,11%	CONSORCIO LA PROVINCIA		* Se presenta un acta de mayores y menores, toque impide la ejecución toda de la totalidad de los ramos de placa huellas. * Queda una ejecución financiera pendiente de 1bn millones para cumplir con el 100% del alcance que se encuentra dentro del convenio con el ente.		* El proyecto fue emagro a la secretaria de planeación para la revisión de los nuevos ítems..
20	4717 DE 2024	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO INCLUYE: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER, PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER, CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO CON CONCRETO DEL CORREDOR VIAL, EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE MUNICIPIO DE SAN GIL.	EN EJECUCIÓN	GUEPSA	12,82%	12,41%	UNIÓN TEMPORAL URBANAS SSI2023	AR - DPTOS	* El municipio de sangil tiene el compromiso de ejecutar la reposición de redes y empalmes de puntos críticos por problemas geotécnicos, ala fecha no ha hecho. * Requiere adicionales para la ejecución de las obras en el municipio de sangil. * Alcaldía de Barbosa no ha entregado los diseños, para poder hacer la intervención en ese municipio.		* Para el municipio de San Gil, el tramo 1 (comuna 1 – Quebrada las Arenas) inician actividades de obra desde la semana del 17 de marzo del presente año y tiene una duración de seis y medio. Para el tramo 2 (Cacaotal) no se ha iniciado el proceso de contratación * Para el municipio de Barbosa se encuentran en las correcciones por parte del contratista por observaciones realizadas por la interventoría, dichas correcciones las entregaron aproximadamente mes y medio.. * Para el municipio de Guepsa se encuentra en ejecución y hay voluntad por parte del alcalde para revisar el tema de la construcción de andenes y quiere se contemplan inicialmente.
21	3347 DE 2022	CONVENIO - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO PARA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA DEL OPÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	SUSPENDIDO	GUACAMAYO	9,21%	100%	MUNICIPIO DE GUACAMAYO	PRODESARROLLO 25% INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	* El municipio modifico cantidades de obra, aumentado valor en unos ítems y disminuyendo especificaciones. * No se encuentra en el expediente soporte original de estas modificaciones. * Se debe rajustar el proyecto y definir la viabilidad técnica de la modificación a los diseños. * Prorroga valor adicional.		* La disponibilidad de infraestructura, teniendo en cuenta que nos evidencia aprobación por parte de la intervención y del personal técnico de la Secretaría de Infraestructura de la época, está variando los documentos presentados por el municipio y así determinar si es viable la suscripción de Acta de Modificación de Cantidades y de Ítems no previstos que contemple los cambios en los diseños y se ajusten los nuevos precios de acuerdo a las condiciones ofertadas por el contratista de obra.
22	4455 DE 2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DEL CONGRESO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LA LAGUNA DE ORTICES CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	EJECUCIÓN	SANANDRÉS	44,33%	30%	UNION TEMPORAL LOS ORTICES	[redacted]	* Debido a desprendimiento del paquete de roca donde se proyecta la cimentación izquierda del puente, se requiere que el sistema de apoyo de la luz de 30 metros se reconfigure a un sistema central con apoyo para reducir las solicitaciones actuantes.		* Se hizo adicional por un valor aproximado de 4.892 millones y una adición de 4 meses. * Se percata de avance es del 37%
23	0490 DE 2022	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	LIQUIDADO	SAN GIL	100%	100%	UNIÓN TEMPORAL AS	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	* Los recursos que se asignaron para la culminación del objeto del proyecto no son suficientes, se requiere la formulación de la fase II para adelantar terminación del Hospital Regional San Gil.		* se presentó el proyecto para terminar la fase II al mismo de salud para ajuste y respectiva financiación.
24	2983 DE 2018	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL INTEGRADO SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES, SANTANDER.	SUSPENDIDO	MOGOTES	47%	49%	CONSORCIO SALUDDAR 2018	APN - RES MINEDUCAL 4523/2017 $5.000.000.000 - RES. 5263/2017 $7.000.000.000 ICLD $1.843.435.240	* Debido a que los recursos asignados al proyecto no fueron suficientes para ejecutar el objeto del contrato, se debe realizar una segunda fase.		* Se tiene proyectado hacer una adición a la intervención y darle inicio al proyecto.
25	2471 DE 2019	EL OBJETO TOTAL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2017-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CHIMA - SIMACOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	SUSPENDIDO	CHIMA	97%	96%	MUNICIPIO DE CHIMA	ICLD RECAUDO Y APN RESOLUCION 1263/2017 REPOSIC. INFRAEST. FISICA HOSPITALES	* Puntos críticos por inestabilidad del terreno		* Realizar mesa técnica en conjunto con la contraloría donde se socialice el resultado del estudio de la consultoría externa para contar con los resultados del concepto técnico y propuesta para el próximo comité
