@gobertolima
www.tolima.gov.co

INVERSIONES AGM SAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA- TOLIMA"



INVERSIONES AGM SAS - INFORME DE INTERVENTORIA N° 04

09 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN. 4
2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO. 4
3. PROCESO CONSTRUCTIVO: 5
4. **TRAMOS A INTERVENIR:** 6

DENOMINACION TRAMO 6

UBICACIÓN TRAMO 6

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 6
6. MUNICIPIO DE LERIDA -TOLIMA 7
7. TRAMOS INTERVENIDOS: 8
8. PERSONAL PROPUESTO POR LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT. SUPERVISORES. 9
9. ESTADO PÓLIZAS : 10
10. INFORMACIÓN FINANCIERA 10
11. AVANCE FINANCIERO : 11
12. PRESUPUESTO OFICIAL CONTRACTUAL DE OBRA. 12
13. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EN EL MES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 15
14. ACTIVIDADES Y/O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA. 16
15. INFORME DE AVANCE 16
16. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO MAYO 16

(ACTA PARCIAL No.1- AVANCE 17,20%) 16

17. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO: 21
18. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO AGOSTO (ACTA PARCIAL No.3 26
19. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 32

DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO 39

DEMOLICIÓN DE POZOS 39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO 45° PVC PRESIÓN 3" – SOLDADO 39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE UNIÓN MECÁNICA 3"X3"X3" 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE REPARACIÓN 3" 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN SOLDADA 3" 40
INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO (0,50 x 0,165 x 1) – 3000 PSI.....40
SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPa.....42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS).....42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA.....43
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (ESPESOR 15 CM).....43
20. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA. 45
21. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA: 46
23. CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 47
25. REGISTRO FOTOGRAFICO: 49
26. OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA: AFECTACIONES TÉCNICAS:.....72
FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE REDES DE GAS: 72
Se detectó presencia de tuberías de gas natural instaladas a una profundidad inadecuada: en algunos tramos tan solo 15 cm por debajo de la rasante de la vía. Asimismo, no se encuentra señalización ni separación conforme a la normatividad técnica vigente. Estas condiciones representan un riesgo directo de daño físico a la red durante actividades de excavación o intervención. Además, inciden negativamente en los rendimientos previstos, generando retrasos y posibles sobrecostos.....72
28. BITACORA DE OBRA.....72

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento corresponde al **Informe Mensual de Interventoría No. 4**, en el cual se detalla el seguimiento técnico realizado al **Contrato de Obra No. 1469**, suscrito con el **Consorcio Vías JCSR**, cuyo objeto es la *"Pavimentación de vías urbanas en el municipio de Lérida, Tolima."* El periodo evaluado comprendido del **9 de Agosto al 9 de septiembre del 2025**.

De igual manera, se consignan las actividades ejecutadas por **la interventoría INVERSIONES AGM S.A.S.**, en desarrollo del **Contrato No. 1507 del 31 de marzo de 2025**, cuyo alcance comprende la *interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica* al contrato de obra mencionado.

El informe presenta el análisis y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, así como las labores de control, supervisión y gestión técnica realizadas por la interventoría. Se abordan los componentes **técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y jurídico**, con sus respectivos avances y observaciones.

Finalmente, se exponen las conclusiones derivadas de la evaluación del periodo, destacando los aspectos más relevantes, particularmente en lo correspondiente a la fase administrativa del proyecto.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El avanzado estado de deterioro que presentan las vías urbanas en los sectores de El Jordán, San Lorenzo, Las Brisas, Barrio Progreso y Barrio Adraofasa, en el municipio de Lérida, Tolima, ha generado una serie de problemáticas relacionadas con la limitada transitabilidad vehicular y peatonal. Estas zonas, en su mayoría, no han recibido intervenciones recientes en infraestructura vial, y algunas nunca han sido objeto de obras civiles, lo cual ha incrementado el grado de afectación.

Las deficiencias actuales están directamente asociadas a la ausencia de sistemas adecuados de drenaje pluvial, infraestructura sanitaria (acueducto y alcantarillado) y estructura de pavimento, lo cual ocasiona encharcamientos, deterioro acelerado de la superficie vial y riesgos en la movilidad urbana.

Con el propósito de mejorar las condiciones funcionales de la infraestructura vial y garantizar una adecuada transitabilidad para los usuarios que diariamente circulan por estas vías, se proyecta la ejecución de obras de rehabilitación integral.


Las vías presentan deterioro generalizado en la estructura de pavimento, así como afectaciones puntuales en elementos de drenaje existente, como alcantarillas y cunetas, derivadas de su antigüedad y falta de mantenimiento.

Las actividades constructivas previstas contemplan la conformación de una nueva estructura de pavimento, mediante trabajos de excavación (cajeo), instalación de material de mejoramiento, construcción de subbase y base granular, y aplicación de carpeta asfáltica, así como la ejecución de obras hidráulicas complementarias, alcantarillas, filtros longitudinales y cunetas, que permitirán una adecuada evacuación de aguas lluvias y contribuirán a la durabilidad de la intervención.

3. PROCESO CONSTRUCTIVO:

El desarrollo del proyecto iniciará en el Tramo 5, correspondiente a la calle 7 entre carreras 3 y 4, y se irá extendiendo progresivamente a los demás tramos distribuidos en el área urbana del municipio de Lérida, Tolima, conforme a la programación establecida. La ejecución de las obras contempla un plazo aproximado de 360 días calendario, en cumplimiento de los términos contractuales vigentes.

La intervención será ejecutada por personal técnico idóneo y debidamente calificado, garantizando el cumplimiento de las actividades constructivas conforme a los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas del proyecto. Cada fase del proceso constructivo se desarrollará bajo criterios de calidad, seguridad y eficiencia, asegurando la correcta ejecución de las obras en todas sus etapas.

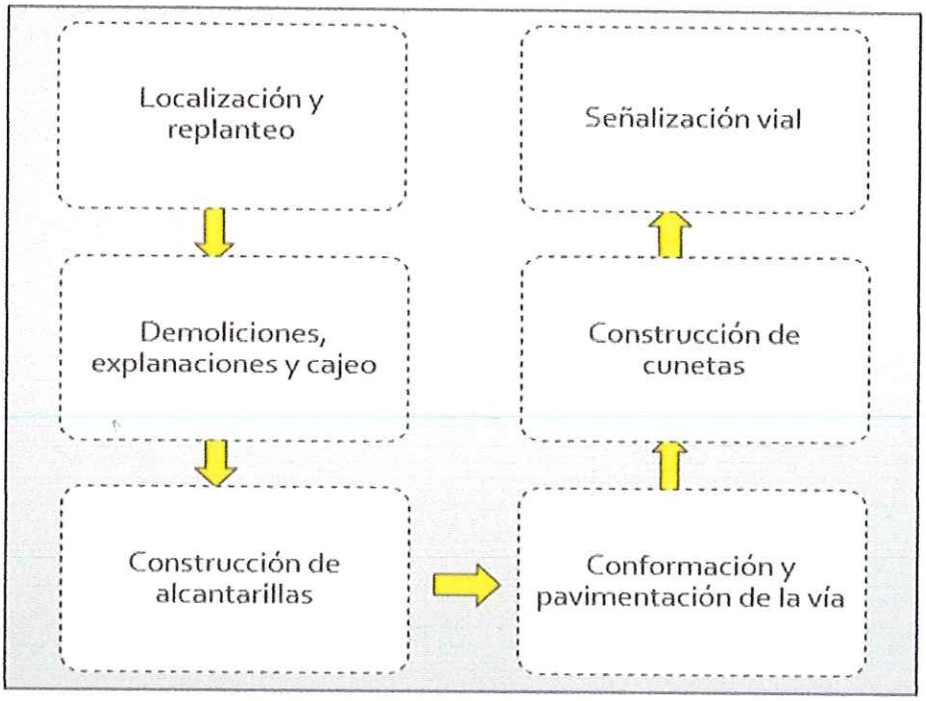

4. TRAMOS A INTERVENIR:


DENOMINACION TRAMO	UBICACIÓN TRAMO
2.	CALLE 6 ENTRE CRA. 4 y 5
3.	CALLE 8 ENTRE CRA.3 Y AV. NACIONAL
5.	CALLE 7 ENTRE CARRERA 3 Y 4
6.	CARRERA 3 ENTRE CALLES 5 Y 6
7.	CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7
10.	CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 1
12.	CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5
15.	CALLE 2 ENTRE CARRERA 5A Y 6
16.	CARRERA 6 ENTRE CALLE 5 Y 3
17.	CALLE 2 SUR ENTRE CARRERA 14 Y 16
18.	CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y QUEBRADA EL JORDAN

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en Departamento del Tolima, en el municipio de lerida en su zona urbana.


INVERSIONES AGM SAS
NIT: 901826372-9

6. MUNICIPIO DE LERIDA -TOLIMA

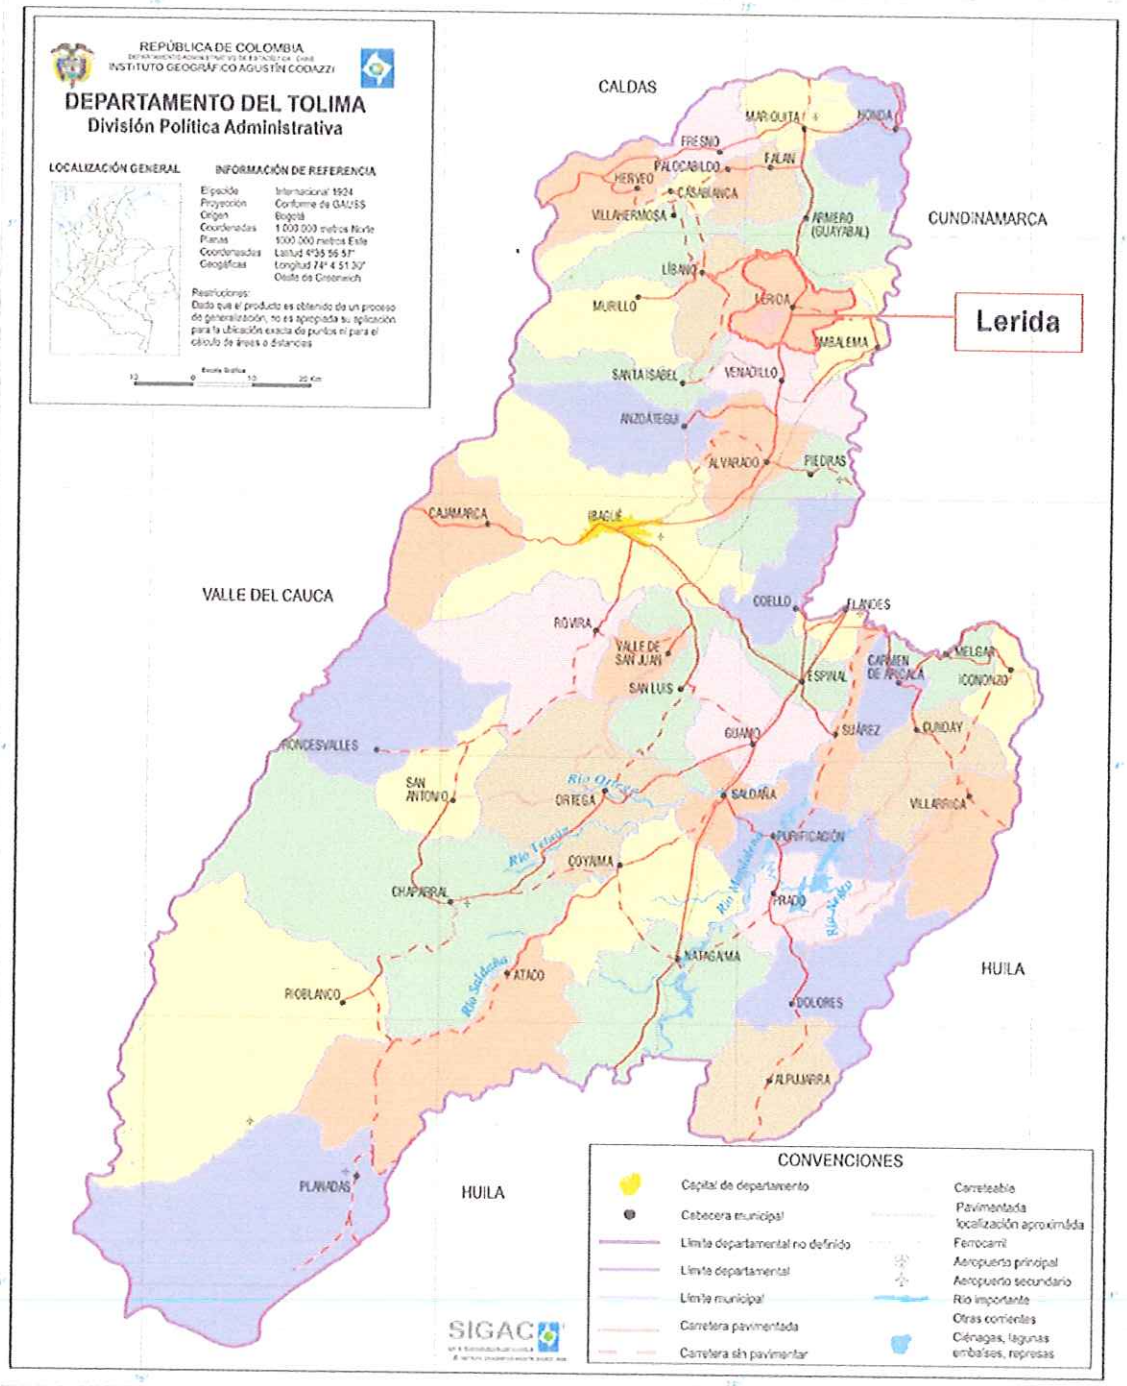

Fuente Google. Departamento del Tolima Municipio de Lerida

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

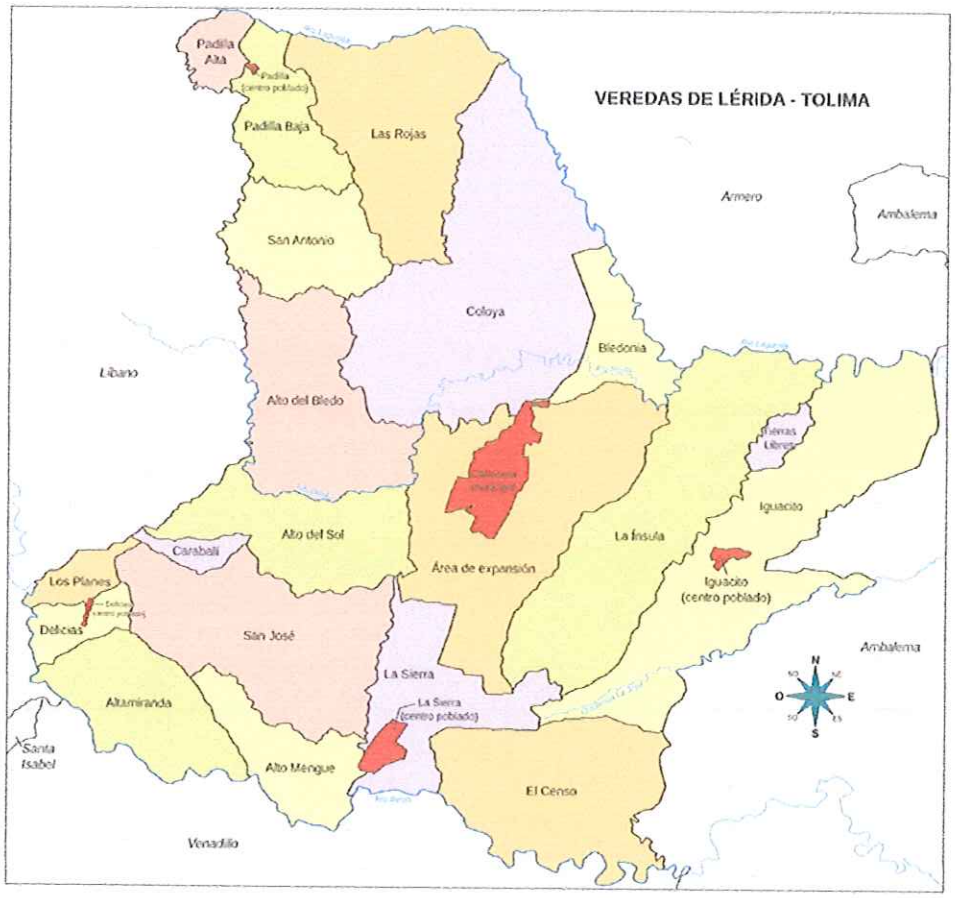

Fuente Google Lerida y sus veredas y Corregimientos.

7. ***TRAMOS INTERVENIDOS:***

TRAMO INTERVENIDOS	DIRECCION	LONGITUD / M
TRAMO N° 5	CALLE 7 ENTRE CRA 3 Y 4	79,65
TRAMO N°6	CRA 3 ENTRE CALLE 5 Y 6	106,00
TRAMO N°10	CRA 6 ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 1	87,20
TRAMO N°16	CRA 6 ENTRE CALLE 5 Y 3	167,00
TRAMO N°17	CALLE 2 SUR ENTRE CRA 14 Y 16	202,00
TRAMO N° 12	CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	122,84
TRAMO N°15	CALLE 2 ENTRE CARRERA 5A Y 6	138.05
TRAMO N° 18	CALLE 4 ENTRE CRA 5 Y QUEBRADA EL JORDAN	462,00

TRAMOS DE INTERVENCION MUNICIPIO LERIDA



Imagen. Localización de tramos a intervenir, autocad – Municipio Lerida Tolima.

8. ***PERSONAL PROPUESTO POR LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT. SUPERVISORES.***

CARGO	NOMBRE
Supervisor de Contrato de Obra	NEIL HAROLD LEAL PAVA

CARGO	NOMBRE
Supervisor de Interventoría	NEIL HAROLD LEAL PAVA

9. ESTADO PÓLIZAS :

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS -POLIZA DE SEGURO Y DE CUMPLIMIENTO ESTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 N° : I -100042794

El contrato de interventoria cuenta con las siguientes Pólizas, cuyas vigencias se encuentran generadas con respecto al contrato suscrito.

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	09/05/2025	09/10/2026	$48.213.811,52
PRESTACIONES SOCIALES	09/05/2025	09/05/2029	$24.106.905,76
CALIDAD DEL SERVICIO	09/05/2026	09/05/2031	$144.641.434,56

10. INFORMACIÓN FINANCIERA

Según lo establecido contractualmente la GOBERNACION DEL TOLIMA pagará el 95% del Valor total del Contrato mediante actas parciales de obra, así:

I. El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obra.

II. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima de la siguiente manera: Un tres (3%) al momento de la suscripción del acta de recibo final y un dos (2%) a la liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos.

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 482.138.115,20
PAGOS PARCIALES HASTA 95%	$ 458.031.209
PAGO FINAL ACTA DE RECIBO FINAL 3%	$ 14.464.143,5
PAGO A LA LIQUIDACIÓN 2%	$ 9.642.762,3

11. AVANCE FINANCIERO :

El contrato de interventoria presenta el siguiente estado financiero

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL	**$ 482.138.115,20**
VALOR ADICIÓN	$ 00,00
VALOR ACTUALIZADO	**$ 482.138.115,20**
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO (56,60%)	**$272.890.680,05**
VALOR PAGADO (46,84%)	**$225.833.493,15**
VALOR POR PAGAR (9,76%)	**$ 47.056.680,05**

El valor ejecutado registrado a la fecha del presente informe es de **$47.056.680,05** que representa el **9,76%** del valor del contrato, correspondiente a la ejecución acumulada con corte al primer periodo mensual.

1. **Actas de recibo parcial generadas**

Detalle	Fecha	Valor ($)	(%)
ACTA PARCIAL No.1	09/06/2025	**$82´927.755,81**	**17,20%**
ACTA PARCIAL No.2	09/07/2025	**$ 93'679.435,8**	**19,43%**
ACTA PARCIAL No.3	09/08/2025	**$49.226.301,56**	**10,21%**
ACTA PARCIAL No.4	09/08/2025	**$47.056.680,05**	**9,76%**
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA PARCIAL 1,2,3 Y 4		**$272.890.680,05**	**56,60%**

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

12. PRESUPUESTO OFICIAL CONTRACTUAL DE OBRA.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8.520,08
1.2	EXPLANACION Y CAJEO	M3	4.345,24
1.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	7.087,52
1.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1.055,64
1.5	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	1.952,56
1.6	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	142,80
	EXCAVACIONES		
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	2520,74
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	24,28
2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	198,22
3.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	8520,08
3.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1278,01
3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1533,61
3.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	9305,47
4.1	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1533,61

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

5.2	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	2380,00
5.3	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	154,30
6.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	26879,80
6.2	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	7030,91
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	1532,04
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	335,15
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	692,11
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	338,90
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	1086,01
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	68,37
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	7,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	100,00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	7,00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	129,42
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	122,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	122,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	658,18
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	67,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	UND	45,00

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	10,00
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	122,00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	531,81
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ML	493,45
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	103,91
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	12,00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	UND	8,00
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	2,00
9.1	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	29,00
9.2	PAÑETE INTERIOR	ML	44,24
9.3	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	44,24
9.4	CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	29,00
9.5	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	102,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	29,00
9.7	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	114,00
9.8	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	36,00
10.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	3570,00
10.2	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	3570,00
10.3	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	3040,00

10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	388,65
10.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	17,00
11	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	279697,71
12	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	51682,81

13. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EN EL MES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

Conforme a la programación de actividades y a las necesidades del contrato, el **CONSORCIO VIAS JCSR** en el periodo comprendido entre **el 9 de agosto y el 9 de septiembre del 2025**, realizo las siguientes actividades, logró un avance fisico que representa el **9,76%** del valor del contrato, correspondiente a las actividades y cantidades que se presentan a continuación:

- **Actividades Preliminares y Replanteo**
  - Localización y replanteo de ejes, tuberías y estructuras.
  - Señalización preventiva con señales verticales tipo 1.
  - Manejo y control de aguas superficiales.
  - Entibados tipo 1A en madera y tipo 3 metálico para excavaciones profundas.
- **Demoliciones y Desmontes**
  - Demolición de pavimento flexible y rígido.
  - Corte de pavimento rígido y flexible con cortadora.
  - Demolición de andenes, pisos, bordillos de concreto y pozos existentes.
- **Movimiento de Tierras**
  - Excavaciones en material común, conglomerado seco y roca a diferentes profundidades (a máquina y a mano).
  - Cargue y disposición de sobrantes (sin incluir transporte).
- **Redes Hidrosanitarias y Pluviales**
  - Suministro e instalación de tuberías PVC NTC 3722-3 y NTC 4764 en diámetros de 6", 10" y 12".
  - Instalación de accesorios: tees, codos, uniones mecánicas y soldadas, reducciones, válvulas de corte/lavado y tapas de válvulas tipo chorote.
  - Instalación de kits silla YEE en varias dimensiones (10x6", 12x6", 14x6").
  - Instalación de collarines, registros de corte, accesorios de acometidas y mangueras a presión.
  - Construcción de lechos en grava y arena para tuberías.
  - Construcción de sumideros con cajas desarenadoras y rejillas.

- Construcción de cajas de inspección y elementos complementarios (conos de reducción, cilindros en ladrillo, pasos en hierro, pañetes, aro-tapas en fibroconcreto).

- **Rellenos Estructurales y Subrasante**
  - Nivelación y compactación de subrasante.
  - Suministro, extendida y compactación de recebo en zanja.
  - Colocación de geotextil no tejido tipo NT-2500.
  - Suministro, extendida y compactación de material afirmado y subbase granular clase A (sin transporte).
- **Capas Estructurales y Pavimentación**
  - Construcción de placa de concreto MR-42 con alistado, juntas y sellantes.
  - Aplicación de imprimante para pavimentos de concreto rígido.
  - Construcción de base y cañuela en concreto de 3.000 psi.
- **Elementos Complementarios y Urbanismo**
  - Instalación de sardinel prefabricado con concreto de nivelación.
  - Instalación de acero de refuerzo FY 4200 MPa y barras pasa junta (dovelas).
  - Instalación de canastilla para dovelas.
- **Transporte y Logística**
  - Transporte de materiales de excavación, bases y subbases.
  - Transporte de concreto premezclado a distancias superiores a 1.000 m.

14. ACTIVIDADES Y/O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

El contratista se compromete a cumplir con el objetivo del contrato y materializar las obras establecidas en el mismo, también se compromete con dar cumplimiento a los requerimientos por parte de la interventoría y a cumplir con todas las normas técnicas y constructivas, para el buen desarrollo de la obra.

15. INFORME DE AVANCE

Para el presente informe se reporta un avance físico – financiero, las actividades que se ejecutan para el periodo del mes de JUNIO.

16. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO MAYO (ACTA PARCIAL No.1- AVANCE 17,20%)

			ACTA PARCIAL No 1	
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3961,32	$37.439.894,45
1.2	EXPLANACION Y CAJEO	M3	2672,46	$86.708.848,06

1.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	4.136,42	$49.856.038,39
1.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	532,30	$44.892.881,45
1.5	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	477,90	$6.157.233,61
1.6	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	0,00	$0,00
Subtotal				$ 225.054.895,96
2. EXCAVACIONES				
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1.400,01	$75.409.402,92
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$0,00
2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	101,84	$4.645.543,84
Subtotal				$ 80.054.946,76
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
3.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	3.058,50	$28.852.856,82
3.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	816,50	$96.440.379,16
3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	217,89	$32.668.624,47
3.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	2.128,62	$37.090.970,75
Subtotal				$ 195.052.831,20
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS				
Subtotal				$ 0,00

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

5. CONCRETOS				
5.2	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	200,00	$24.851.893,23
5.3	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	0,00	$0,00
Subtotal				$ 24.851.893,23
6. ACERO				
Subtotal				$ 0,00
7. ALCANTARILLADO				
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	547,19	$3.303.761,22
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	171,19	$21.733.709,46
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	328,33	$32.153.267,23
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	0,00	$0,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	478,82	$124.141.356,61
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	68,37	$23.832.202,59
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	0,00	$0,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	57,00	$31.915.546,35
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	6,00	$4.344.307,83
Subtotal				$ 241.424.151,29
8. ACUEDUCTO				

8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	104,42	$11.053.856,81
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	29,00	$2.517.845,94
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	29,00	$1.285.794,51
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	214,32	$3.893.627,49
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	31,00	$2.196.546,64
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	UND	0,00	$0,00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	10,00	$847.105,59
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	0,00	$0,00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	471,31	$46.846.219,91
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ML	0,00	$0,00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	100,00	$30.264.681,38
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	0,00	$0,00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	UND	0,00	$0,00
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	0,00	$0,00
Subtotal				$ 98.905.678,27
9. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO				
9.1	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	3,00	$3.351.779,59
9.2	PAÑETE INTERIOR	ML	0,00	$0,00

9.3	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	2,10	$3.108.833,38
9.4	CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	3,00	$2.352.866,63
9.5	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	0,00	$0,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	0,00	$0,00
9.7	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	61,00	$53.388.568,91
9.8	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	0,00	$0,00
Subtotal				$ 62.202.048,51
12. OBRAS ADICIONALES A LA VIA				
10.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	0,00	$0,00
10.2	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	0,00	$0,00
10.3	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	1.594,29	$61.210.084,94
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	246,13	$14.637.429,48
10.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	0,00	$0,00
Subtotal				$ 75.847.494,42
13. TRANSPORTE				
11	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	22.838,16	$41.676.901,36

12	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	0,00	$0,00
Subtotal				$ 41.676.901,36
TOTAL OBRAS				$ 1.045.070.841,00

17. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO:
(ACTA PARCIAL No. 2- AVANCE 19,43%

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA			
				ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES							
1.1	1P	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3.961,32	$37.439.894,45	1573,71	$14.873.712,88
1.2	5P	EXPLANACION Y CAJEO	M3	2.672,46	$86.708.848,06	150,39	$4.879.453,26
1.3	6P	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	4.136,42	$49.856.038,39	886,40	$10.683.729,61
1.4	7P	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	532,30	$44.892.881,45	63,30	$5.338.567,34
1.5	201.3P	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	477,90	$6.157.233,61		$0,00
1.6	201.9	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3		$0,00	44,68	$7.367.162,23
Subtotal					$ 225.054.895,96		$ 43.142.625,22
2. EXCAVACIONES							
2.1	210.2.1P	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1.400,01	$75.409.402,92	475,99	$25.638.475,22
2.2	210.2.2P	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3		$0,00		$0,00

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

2.3	600.2.3P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	101,84	$4.645.543,84	78,20	$3.567.179,19
Subtotal					**$ 80.054.946,76**		**$ 29.205.654,41**
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							
3.1	310.1P	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	3.058,50	$28.852.856,82	33,30	$314.140,96
3.2	311.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	816,50	$96.440.379,16	283,85	$33.526.280,65
3.3	320.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	217,89	$32.668.624,47	230,63	$34.578.754,70
3.4	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	2.128,62	$37.090.970,75	1365,30	$23.790.203,21
Subtotal					**$ 195.052.831,20**		**$ 92.209.379,52**
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS							
4.1	500.1.2P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	0,00	$0,00	338,36	$458.614.220,59
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 458.614.220,59**
5. CONCRETOS							
5.2	12P	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	200,00	$24.851.893,23	545,85	$67.827.029,60
5.3	13P	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal					**$ 24.851.893,23**		**$ 67.827.029,60**
6. ACERO							
6.1	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	0,00	$0,00	695,83	$7.912.014,48
6.2	640.2P	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	0,00	$0,00	554,40	$6.646.814,13
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 14.558.828,61**
7. ALCANTARILLADO							

7.1	1.1P	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	547,19	$3.303.761,22	319,90	$1.931.455,64
7.2	41P	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	171,19	$21.733.709,46	98,85	$12.549.665,17
7.3	15P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	328,33	$32.153.267,23	167,90	$16.442.401,15
7.4	17P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	0,00	$0,00	46,20	$8.662.006,63
7.5	18P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	478,82	$124.141.356,61	289,55	$75.070.234,76
7.6	19P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	68,37	$23.832.202,59		$0,00
7.7	25P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	0,00	$0,00	3,00	$1.201.966,88
7.8	26P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	57,00	$31.915.546,35	33,00	$18.477.421,57
7.9	27P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	6,00	$4.344.307,83	1,00	$724.051,30
Subtotal					**$ 241.424.151,29**		**$ 135.059.203,10**
8. ACUEDUCTO							
8.1	42P	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	104,42	$11.053.856,81	16,62	$1.759.386,13
8.2	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	29,00	$2.517.845,94	32,00	$2.778.312,76
8.3	33P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	29,00	$1.285.794,51	32,00	$1.418.807,73
8.4	34P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	214,32	$3.893.627,49	71,78	$1.304.052,73

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

8.5	35P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	31,00	$2.196.546,64	16,00	$1.133.701,49
8.6	35.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	UND		$0,00		$0,00
8.7	35.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	10,00	$847.105,59		$0,00
8.8	36P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND		$0,00	61,00	$3.339.242,68
8.9	37P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	471,31	$46.846.219,91	60,50	$6.013.444,03
8.10	37.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ML	0,00	$0,00		$0,00
8.11	37.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	100,00	$30.264.681,38	3,91	$1.183.349,04
8.12	60P	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	0,00	$0,00	11,00	$5.533.285,71
8.13	60.1P	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	UND	0,00	$0,00		$0,00
8.14	60.2P	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	0,00	$0,00	2,00	$1.124.107,29
Subtotal					**$ 98.905.678,27**		**$ 25.587.689,59**
9. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO							
9.1	38P	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	3,00	$3.351.779,59	5,00	$5.586.299,31
9.2	39P	PAÑETE INTERIOR	ML	0,00	$0,00		$0,00
9.3	40P	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	2,10	$3.108.833,38	2,65	$3.923.051,65
9.4	43P	CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	3,00	$2.352.866,63	2,00	$1.568.577,75
9.5	44P	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	0,00	$0,00		$0,00
9.6	45P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	0,00	$0,00		$0,00

9.7	46P	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	61,00	$53.388.568,91	41,00	$35.884.120,08
9.8	47P.1	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal					**$ 62.202.048,51**		**$ 46.962.048,79**
12. OBRAS ADICIONALES A LA VIA							
10.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	0,00	$0,00		$0,00
10.2	700.1.1P	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	0,00	$0,00		$0,00
10.3	48P	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	1.594,29	$61.210.064,94		$0,00
10.4	48.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	246,13	$14.637.429,48		$0,00
10.5	710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal					**$ 75.847.494,42**		**$ 0,00**
13. TRANSPORTE							
11	900.2P	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	22.838,16	$41.676.901,36	132.369,73	$241.558.894,36
12	900.2P1	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	0,00	$0,00	11.944,25	$26.096.974,68
Subtotal					**$ 41.676.901,36**		**$ 267.655.869,04**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.045.070.841,00**		**$ 1.180.822.548,47**

18. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO JULIO (ACTA PARCIAL No.3 AVANCE 10.21

CONDICIONES CONTRACTUALES		OBRA EJECUTADA				
		ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 03	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5.535,03	$52.313.607,32	466,92	$4.413.032,91
1.2	EXPLANACION Y CAJEO	M3	2.822,85	$91.588.301,32	842,58	$27.337.786,61
1.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	5.022,82	$60.539.767,90	1091,56	$13.156.511,49
1.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	595,60	$50.231.448,79	73,80	$6.224.111,69
1.5	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	477,90	$6.157.233,61		$0,00
1.6	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	44,68	$7.367.162,23	0,00	$0,00
Subtotal				**$ 268.197.521,17**		**$ 51.131.442,70**
2. EXCAVACIONES						
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1.876,00	$101.047.878,15	231,06	$12.445.694,42
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$0,00	24,23	$1.696.371,02
2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	180,04	$8.212.723,02	17,04	$777.298,38
Subtotal				**$ 109.260.601,17**		**$ 14.919.363,82**
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
3.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	3.091,80	$29.166.997,78	0,00	$0,00

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	448,52	$67.247.379,18	0,00	$0,00
3.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	3.493,92	$60.881.173,96	0,00	$0,00
Subtotal				**$ 287.262.210,73**		**$ 0,00**
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS						
4.1	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	338,36	$458.614.220,59	210,60	$285.447.910,08
Subtotal				**$ 458.614.220,59**		**$ 285.447.910,08**
5. CONCRETOS						
5.2	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	745,85	$92.678.922,83	532,26	$66.138.343,46
5.3	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	0,00	$0,00	35,44	$3.046.694,33
Subtotal				**$ 92.678.922,83**		**$ 69.185.037,79**
6. ACERO						
6.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	695,83	$7.912.014,48	4806,06	$54.648.115,91
6.2	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	554,40	$6.646.814,13	385,00	$4.615.843,15
Subtotal				**$ 14.558.828,61**		**$ 59.263.959,06**
7. ALCANTARILLADO						
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	867,09	$5.235.216,86	74,90	$452.222,66
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	270,04	$34.283.374,63	18,29	$2.322.037,19
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	496,23	$48.595.668,38	77,60	$7.599.346,81
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	46,20	$8.662.006,63	0,00	$0,00

7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	768,37	$199.211.591,37	35,90	$9.307.620,20
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	68,37	$23.832.202,59		$0,00
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	3,00	$1.201.966,88	0,00	$0,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	90,00	$50.392.967,92	9,00	$5.039.296,79
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	7,00	$5.068.359,13	0,00	$0,00
Subtotal				**$ 376.483.354,39**		**$ 24.720.523,65**
8. ACUEDUCTO						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	121,04	$12.813.242,94	0,00	$0,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	61,00	$5.296.158,71	0,00	$0,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	61,00	$2.704.602,24	0,00	$0,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	286,10	$5.197.680,22	0,00	$0,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	47,00	$3.330.248,12	0,00	$0,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	UND	0,00	$0,00		$0,00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	10,00	$847.105,59		$0,00
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	61,00	$3.339.242,68	0,00	$0,00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	531,81	$52.859.663,94	0,00	$0,00

8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ML	0,00	$0,00	153,00	$24.467.606,05
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	103,91	$31.448.030,42	0,00	$0,00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	11,00	$5.533.285,71	0,00	$0,00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	UND	0,00	$0,00	4,00	$2.137.654,71
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	2,00	$1.124.107,29	0,00	$0,00
Subtotal				**$ 124.493.367,86**		**$ 26.605.260,76**
9. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO						
9.1	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	8,00	$8.938.078,89	2,00	$2.234.519,72
9.2	PAÑETE INTERIOR	ML	0,00	$0,00	5,15	$976.658,10
9.3	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	4,75	$7.031.885,03	2,20	$3.256.873,07
9.4	CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	5,00	$3.921.444,38	1,00	$784.288,88
9.5	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	0,00	$0,00		$0,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	0,00	$0,00	7,00	$8.724.512,44
9.7	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	102,00	$89.272.688,99	11,00	$9.627.446,85
9.8	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	0,00	$0,00	9,00	$13.040.189,95
Subtotal				**$ 109.164.097,29**		**$ 38.644.489,01**
12. OBRAS ADICIONALES A LA VIA						
10.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	0,00	$0,00		$0,00

10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	246,13	$14.637.429,48	139,95	$8.322.752,13
10.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal				**$ 75.847.494,42**		**$ 8.322.752,13**
13. TRANSPORTE						
11	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	155.207,89	$283.235.795,72	14.118,44	$25.764.461,08
12	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	11.944,25	$26.096.974,68	7.434,18	$16.242.929,21
Subtotal				**$ 309.332.770,40**		**$ 42.007.390,29**
	SUBTOTAL OBRAS			**$ 2.225.893.389,46**		**$ 620.248.129,29**

19. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO AGOSTO (ACTA PARCIAL No.4 AVANCE 9.76%

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	6.001,95	$56.726.640,23	1846,38	$17.450.817,48
1.2	EXPLANACION Y CAJEO	M3	3.665,43	$118.926.087,93	568,55	$18.446.792,68
1.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	6.114,38	$73.696.279,39	966,26	$11.646.277,61
1.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	669,40	$56.455.560,48	183,21	$15.451.483,77
1.5	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	477,90	$6.157.233,61	1240,07	$15.976.984,05
1.6	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	44,68	$7.367.162,23	31,53	$5.198.894,92
Subtotal				**$ 319.328.963,87**		**$ 84.171.250,51**


INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

2. EXCAVACIONES						
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	2.107,06	$113.493.572,56	359,92	$19.386.541,74
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	24,23	$1.696.371,02	0,00	$0,00
2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	197,08	$8.990.021,40	0,71	$32.387,43
Subtotal				**$ 124.179.984,98**		**$ 19.418.929,17**
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
3.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	3.091,80	$29.166.997,78	1337,40	$12.616.580,25
3.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1.100,35	$129.966.659,81	128,13	$15.133.757,38
3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	448,52	$67.247.379,18	247,86	$37.162.078,40
3.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	3.493,92	$60.881.173,96	0,00	$0,00
Subtotal				**$ 287.262.210,73**		**$ 64.912.416,03**
4. PAVIMENTOS HIDRAULICO						
4.1	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	548,96	$744.062.130,67	75,06	$101.736.562,82
Subtotal				**$ 744.062.130,67**		**$ 101.736.562,82**
5. CONCRETOS						
5.2	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1.278,11	$158.817.266,29	686,37	$85.287.969,79
5.3	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	35,44	$3.046.694,33	48,38	$4.159.116,01
Subtotal				**$ 161.863.960,62**		**$ 89.447.085,80**
6. ACERO						
6.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	5.501,88	$62.560.130,38	1932,64	$21.975.472,22
6.2	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	939,40	$11.262.657,28	2573,93	$30.859.369,23
Subtotal				**$ 73.822.787,66**		**$ 52.834.841,45**
7. ALCANTARILLADO						
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	941,99	$5.687.439,51	247,25	$1.492.817,78
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	288,33	$36.605.411,82	46,47	$5.899.675,67


7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	573,83	$56.195.015,18	52,90	$5.180.482,55
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	46,20	$8.662.006,63	17,85	$3.346.684,38
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	804,27	$208.519.211,56	161,11	$41.770.214,20
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	68,37	$23.832.202,59		$0,00
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	3,00	$1.201.966,88		$0,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	99,00	$55.432.264,71	1,00	$559.921,87
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	7,00	$5.068.359,13		$0,00
Subtotal				**$ 401.203.878,01**		**$ 58.249.796,45**
8. ACUEDUCTO						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	121,04	$12.813.242,94	8,27	$875.458,68
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	61,00	$5.296.158,71		$0,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	61,00	$2.704.602,24		$0,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	286,10	$5.197.680,22		$0,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	47,00	$3.330.248,12		$0,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	UND	0,00	$0,00		$0,00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	10,00	$847.105,59		$0,00
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	61,00	$3.339.242,68		$0,00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	531,81	$52.859.663,94	0,00	$0,00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ML	153,00	$24.467.606,05	46,21	$7.389.856,70
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	103,91	$31.448.030,42		$0,00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	11,00	$5.533.285,71		$0,00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	UND	4,00	$2.137.654,71		$0,00
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	2,00	$1.124.107,29		$0,00
Subtotal				**$ 151.098.628,62**		**$ 8.265.315,38**

9. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO						
9.1	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	10,00	$11.172.598,62	4,00	$4.469.039,45
9.2	PAÑETE INTERIOR	ML	5,15	$976.658,10	3,80	$720.640,93
9.3	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	6,95	$10.288.758,10	2,90	$4.293.150,86
9.4	CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	6,00	$4.705.733,25	4,00	$3.137.155,50
9.5	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	0,00	$0,00		$0,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	7,00	$8.724.512,44	13,00	$16.202.665,95
9.7	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	113,00	$98.900.135,84	1,00	$875.222,44
9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	9,00	$13.040.189,95		$0,00
Subtotal				**$ 147.808.586,30**		**$ 29.697.875,13**
12. OBRAS ADICIONALES A LA VIA						
10.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	0,00	$0,00		$0,00
10.2	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	0,00	$0,00		$0,00
10.3	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	1.594,29	$61.210.064,94		$0,00
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	386,08	$22.960.181,61		$0,00
10.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal				**$ 84.170.246,55**		**$ 0,00**
13. TRANSPORTE						
11	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	169.326,33	$309.000.256,80	43.102,07	$78.656.112,50
12	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	19.378,43	$42.339.903,88	2.649,62	$5.789.150,93
Subtotal				**$351.340.160,68**		**$ 84.445.263,43**
SUBTOTAL OBRAS				**$2.846.141.518,76**		**$593.179.336,17**

Según el avance real registrado durante el periodo comprendido entre el 9 de AGOSTO y el 9 de SEPTIEMBRE de 2025 (31 días calendario), se alcanzó un avance físico acumulado del 3,63%.

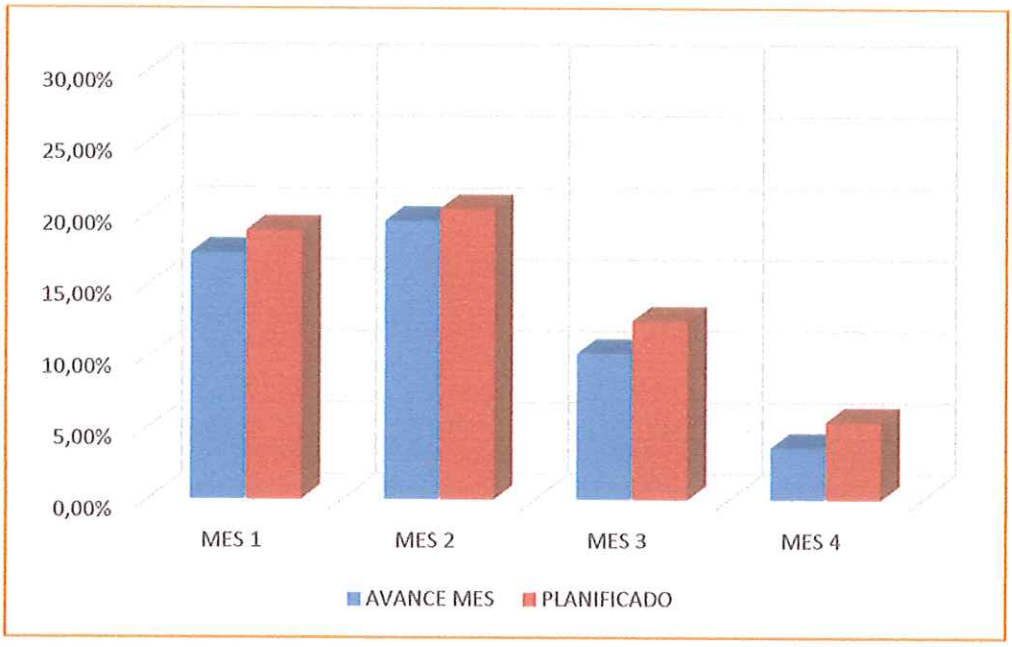

Cabe resaltar que el **avance acumulado total del proyecto a la fecha es del 50,47%**,y lo hemos discriminado así:

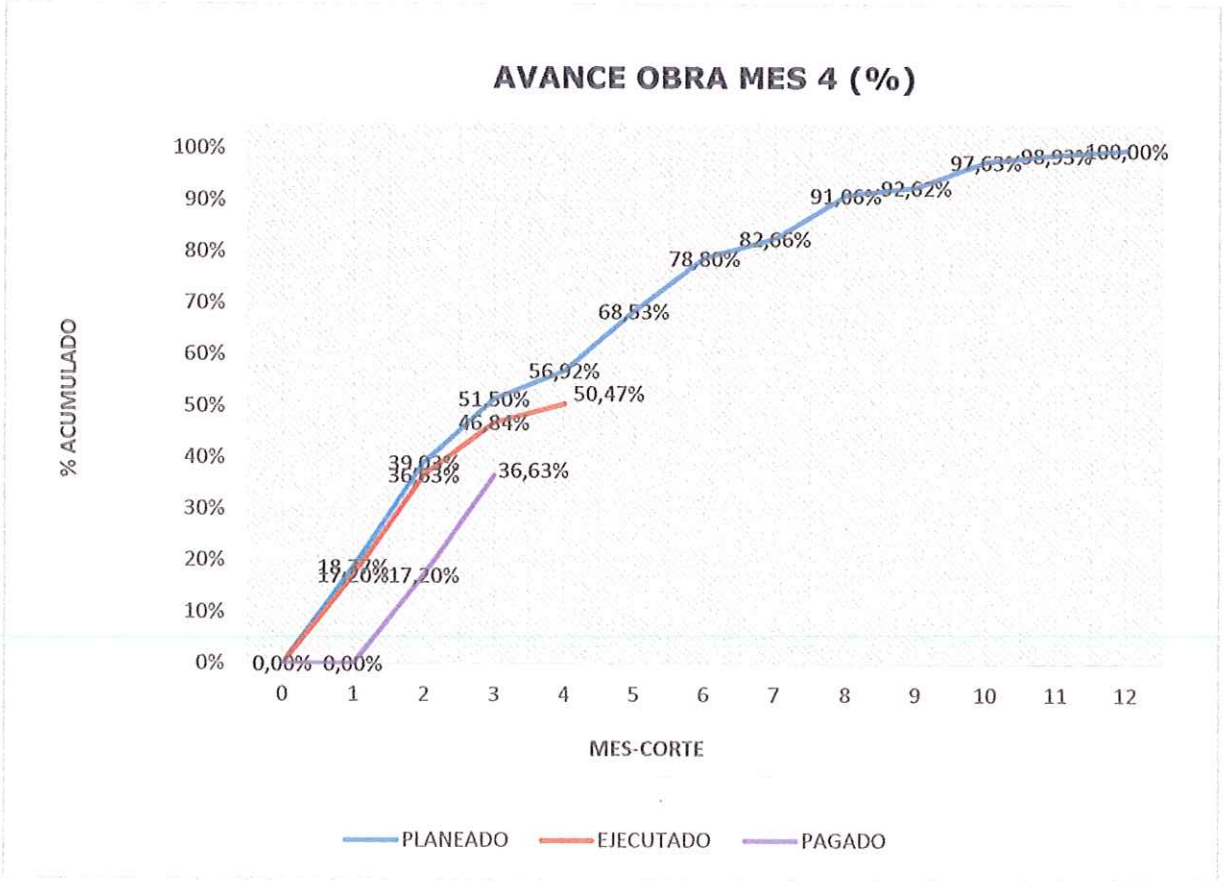

Lo anterior evidencia un cumplimiento positivo y un ritmo de ejecución al previsto en el cronograma base.

19. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO:1

La actividad de localización y replanteo consistió en la transferencia al terreno del diseño geométrico y topográfico establecido en los planos del proyecto, garantizando precisión en su ejecución. Esta labor se desarrolló en los siguientes frentes de obra:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6
- Tramo 10: Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1
- Tramo 16: Carrera 6 entre calles 5 y 3
- Tramo 17: Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.
- Tramo 12: Carrera 8 entre calle 3 y calle 5
- Tramo 15: Calle 2 entre carrera 5a y 6
- Tramo 18: Calle 4 entre carrera 5 y quebrada el jordan

EXPLANACIÓN Y CAJEO:

La actividad de explanación y cajeo comprendió el conjunto de labores orientadas a adecuar el terreno natural, con el fin de alcanzar la geometría y nivel establecidos en el diseño vial. Esta etapa implicó la excavación y preparación del volumen necesario de suelo para conformar el lecho donde se construirá la estructura del pavimento (subrasante, subbase, base, entre otros).
Los trabajos fueron ejecutados en los siguientes tramos:

- *Tramo 5,Tramo 6,Tramo 10,Tramo 16,Tramo 17.tramo 12 ,tramo 15 y tramo 18*

CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA (SIN INCLUIR TRANSPORTE):

La actividad comprendió el cargue y disposición mecánica de los materiales excedentes generados durante las excavaciones en zanja, así como de aquellos provenientes de las labores de explanación y cajeo. Esta operación no contempló el transporte de los materiales y fue ejecutada en los siguientes tramos:

- *Tramo 5,Tramo 6,Tramo 10,Tramo 16,Tramo 17.tramo 12, tramo 15 y tramo 18*
-

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA:

La actividad consistió en la identificación y marcación en el terreno del trazado exacto para la instalación de la tubería, conforme a los planos del proyecto y a las condiciones reales del sitio. Este procedimiento se ejecuta previo al inicio de las excavaciones, con el fin de asegurar que la tubería se instale en la ubicación, alineación y pendiente correctas.
Los trabajos se desarrollaron en los siguientes tramos:

- *Tramo 5,Tramo 6,Tramo 10,Tramo 16,Tramo 17. tramo 12, tramo 15 y tramo 18*

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO EN SECO A MÁQUINA

La actividad consistió en la ejecución de excavaciones mediante el uso de maquinaria pesada (retroexcavadora, excavadora, entre otras), para la remoción, cargue y posterior acopio o disposición de material común —como tierra suelta, arena, limo y arcilla—, así como de material conglomerado, compuesto por mezclas naturales de suelo con grava, piedras medianas y otros elementos de mayor dureza. Estas labores se realizaron en condiciones secas, es decir, sin presencia de agua o saturación en el terreno, y se desarrollaron en los siguientes tramos:

- *Tramo 5,Tramo 6,Tramo 10,Tramo 16,Tramo 17. tramo 12, tramo 15 y tramo 18*

INSTALACIÓN DE ENTIBADOS EN MADERA Y METÁLICOS

Durante la intervención se verificó la instalación de entibados en diferentes sectores de la obra, los cuales cumplen la función de asegurar la estabilidad lateral de las excavaciones y prevenir desplazamientos de suelo que puedan comprometer la seguridad y la integridad de las estructuras circundantes.Se identificaron entibados realizados con sistemas de madera y metálicos en las siguientes ubicaciones:

- *Tramo 5,Tramo 6,Tramo 10,Tramo 16,Tramo 17.*

Los entibados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el plan de obra, mostrando adecuada fijación y estabilidad. Se recomienda continuar con la supervisión constante para asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad durante toda la ejecución.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO:

La actividad consistió en el suministro, transporte, extendido y nivelación de una capa de grava o material granular seleccionado sobre el fondo de la zanja excavada.

Esta capa de lecho proporciona un apoyo uniforme y estable a la tubería de alcantarillado, asegurando el cumplimiento de las pendientes de diseño establecidas en el proyecto.

El lecho en grava mejora la capacidad portante del terreno y protege la tubería contra asentamientos diferenciales y puntos de esfuerzo que puedan comprometer la integridad del sistema. Durante la intervención, se verificó la correcta ejecución del suministro y la instalación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

- La actividad se desarrolló en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4,* ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6,* ***Tramo 10****: Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1,* ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3* ***Tramo 17****: Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16. tramo 12 y tramo 15. y tramo 18*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE 6" DE DIÁMETRO:

La intervención consistió en el suministro, transporte, alineación, acople e instalación en zanja de tubería de PVC rígido de 6 pulgadas de diámetro, conforme a las normas NTC 3722-3 y NTC 4764, destinada a la conexión de acometidas domiciliarias al sistema de alcantarillado sanitario.

La actividad se ejecutó en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4,* ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6,* ***Tramo 10****: Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1,* ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3* ***Tramo 17****: Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE 12" DE DIÁMETRO

Consiste en el suministro, transporte, alineación, acople e instalación en zanja de tubería de PVC para alcantarillado sanitario, con un diámetro nominal de 12 pulgadas, cumpliendo las normas técnicas **NTC 3722-3** y **NTC 4764**. Esta tubería funcionará como colector dentro del sistema de alcantarillado sanitario, garantizando la conducción adecuada de las aguas residuales domésticas hacia los sistemas de tratamiento o disposición final. Las labores incluyen todas las actividades necesarias para su correcta instalación, asegurando la integridad, estanqueidad y funcionalidad del sistema.

La actividad se desarrolla en los siguientes tramos: ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6,* ***Tramo 10:*** *Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1,* ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3 y* ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE 14" DE DIÁMETRO

La actividad se desarrolló en el siguiente tramo:

- ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4*

Consiste en el suministro, transporte, alineación, acople e instalación en zanja de tubería de PVC para alcantarillado sanitario, con un diámetro nominal de 14 pulgadas, conforme a las normas técnicas **NTC 3722-3** y **NTC 4764**. Esta tubería tiene la función de colector dentro del sistema de alcantarillado sanitario, permitiendo la recolección y conducción eficiente de aguas residuales. Las actividades ejecutadas garantizan una instalación adecuada, segura y conforme a los estándares técnicos exigidos para este tipo de redes.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE 12X6" PVC Y SILLA YEE 14X6" PVC

Consiste en el suministro e instalación de los kits de silla Yee en PVC, con tamaños 12x6" y 14x6", de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes. En el **tramo 5** se instalaron sillas Yee 14x6", mientras que en los **tramos 6, 10, 16 y 17** se instalaron sillas Yee 12x6". Esta actividad tiene como objetivo la construcción de las acometidas domiciliarias, permitiendo la conexión de las viviendas al sistema de alcantarillado sanitario, garantizando la correcta instalación y funcionalidad de las redes de conducción.

La actividad se desarrolló en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4 (instalación de sillas Yee 14x6")* , ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6*, ***Tramo 10:*** *Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1*, ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3* y ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16 (instalación de sillas Yee 12x6")*

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15 MEDIO MECÁNICO:

La actividad consiste en el suministro, transporte, extendida y compactación de material tipo recebo dentro de zanjas previamente excavadas, con el propósito de conformar un relleno estructurado o un lecho de apoyo para tuberías, ductos o estructuras enterradas. La compactación se realiza por capas de 15 cm, utilizando apisonador tipo canguro, garantizando una adecuada densificación del material, que asegura la estabilidad y funcionalidad de la estructura.

La actividad se desarrolló en los siguientes tramos:

Tramo 5: *Calle 7 entre carreras 3 y 4,* ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6 ,* ***Tramo 10:*** *Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1,* ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3,* ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

La correcta compactación del recebo en estos tramos asegura un adecuado soporte para la infraestructura de las redes de alcantarillado sanitario y otras estructuras enterradas, garantizando la estabilidad y durabilidad del sistema.

CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI:

Consiste en la construcción de cajas de inspección con dimensiones **60 x 60 x 100 cm**, elaboradas en mampostería de ladrillo, las cuales permiten el acceso, control, mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado sanitario en las acometidas domiciliarias. Las cajas están construidas con concreto de **2500 PSI** y cuentan con tapa reforzada en **concreto de 3000 PSI**, lo que garantiza su resistencia y durabilidad frente a las condiciones del entorno y el tráfico vehicular.

Estas estructuras son esenciales para facilitar el acceso al sistema de alcantarillado, permitiendo su inspección periódica y asegurando un funcionamiento óptimo de las redes.

La actividad se desarrolló en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4,* ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6 ,* ***Tramo 10:*** *Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1,* ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3,* ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DE 1,2 M DE DIÁMETRO

Consiste en la construcción de pozos de inspección de **1,2 metros de diámetro**, destinados a permitir el acceso y la realización de labores de mantenimiento, control y limpieza de las redes de alcantarillado sanitario. Estos pozos de inspección son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, facilitando la supervisión y reparación de las tuberías subterráneas. Su construcción incluye el uso de materiales adecuados para garantizar la durabilidad y resistencia frente a las condiciones del entorno.

La actividad se desarrolló en los siguientes tramos: ***Tramo 10:*** *Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1 y* ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN ARENA PARA TUBERÍA:

Consiste en el suministro e instalación de un lecho de arena para la colocación de tuberías, con el fin de proporcionar un soporte adecuado que minimice los riesgos de daño durante la instalación de las redes de alcantarillado sanitario. Este lecho de arena actúa como un material protector y estabilizador, garantizando la correcta alineación y soporte de las tuberías a lo largo de los tramos mencionados.

La instalación se realizó de acuerdo con las normativas y especificaciones técnicas, asegurando la durabilidad y la adecuada funcionalidad de las redes de alcantarillado.

La actividad se desarrolló en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4*, ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6*, ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calle 5 - 3* y ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA A PRESIÓN POR ML 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARÍN 3" A 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARÍN 6" A 1/2":

Las actividades descritas están relacionadas con la instalación de acometidas domiciliarias de acueducto, conforme al diámetro de la red matriz. Se instalaron los accesorios adecuados para conectar y poner en servicio la red de acueducto a cada usuario, con un diámetro de ½".

- Para el **tramo 16** (Carrera 6 entre calles 5 y 3) y **tramo 17** (Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16), se instaló el accesorio **collarín de 6" a ½"**, dado que la red matriz de estos tramos fue repuesta en **diámetro 6"**.
- Para los **tramos 5** (Calle 7 entre carreras 3 y 4), **6** (Carrera 3 entre calles 5 y 6), **10** (Carrera 6 entre calle 1 Sur y calle 1), y **16** (Carrera 6 entre calles 5 y 3), se instaló el accesorio **collarín de 3" a ½"**, ya que la red matriz en estos tramos se repuso con un **diámetro 3"**.

La correcta instalación de estos accesorios permite la conexión eficiente de la red de acueducto a las viviendas, garantizando un adecuado servicio de agua potable para los usuarios.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 3"

Esta tubería fue instalada para el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto, asegurando la conducción y distribución de agua potable en los tramos mencionados.

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC con unión mecánica de **presión RDE 21**, de **diámetro 3"**, en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4*, ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6*, ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calle 5 - 3* y ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 6":

La instalación de esta tubería fue necesaria debido a que la red matriz de acueducto a reponer en estos tramos se encontró con un diámetro de **3"**. Esta acción garantiza el adecuado abastecimiento y distribución de agua potable en el sistema.

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC con unión mecánica de **presión RDE 21**, de **diámetro 6"**, en los siguientes tramos:***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calles 5 y 3. y* ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE:

Esta actividad consistió en preparar la base de la vía, garantizando la estabilidad y resistencia del terreno para la instalación de las infraestructuras de alcantarillado y acueducto, asegurando un adecuado soporte para las siguientes capas de la obra.

Se realizó la nivelación y compactación de la subrasante en los siguientes tramos: ***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4*, ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6*, ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calle 5 - 3* y ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL

Esta actividad se llevó a cabo con el objetivo de proporcionar un relleno estable y resistente, que sirviera de base estructural para las obras de infraestructura, garantizando la correcta funcionalidad y durabilidad del sistema de alcantarillado y acueducto.

Se realizó el suministro, extendida y compactación de material afirmado para relleno estructural en los siguientes tramos:***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4*, ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 y 6*, ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calle 5 - 3* y ***Tramo 17:*** *Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16.*

GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO:

El geotextil fue colocado para proporcionar refuerzo y separación entre el material de relleno y el suelo subyacente, mejorando la estabilidad y durabilidad de la estructura de la vía y evitando el desplazamiento o mezcla de los materiales.

Se realizó la instalación de **geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido** en los siguientes tramos:***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4,* ***Tramo 6:*** *Carrera 3 entre calles 5 - 6* y ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calle 5 y 3.*

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE):

Esta actividad consistió en preparar y compactar la subbase, asegurando la resistencia y estabilidad necesaria para las futuras capas de la obra, garantizando la durabilidad de la infraestructura vial.

Se realizó el suministro, extendida y compactación de **material subbase granular clase A** (sin incluir transporte) en los siguientes tramos:***Tramo 5:*** *Calle 7 entre carreras 3 y 4* y ***Tramo 16:*** *Carrera 6 entre calle 5 y 3.*

DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO

Se realizó la demolición de elementos en concreto como pisos, andenes y bordillos existentes, con el fin de liberar el área de trabajo para la instalación de redes de servicios públicos y la posterior reconstrucción de elementos de urbanismo. Esta labor fue ejecutada de forma manual y mecánica, garantizando el retiro total del concreto sin comprometer la integridad de zonas aledañas.
Los trabajos se ejecutaron en los siguientes tramos:

- Tramo 5, Tramo 6, Tramo 10, Tramo 16, Tramo 17

DEMOLICIÓN DE POZOS

La actividad consistió en la demolición manual y/o mecánica de pozos de inspección existentes que se encontraban en desuso o no cumplían con los requisitos técnicos del nuevo diseño.
Este procedimiento incluyó el retiro de tapas, estructuras de ladrillo o concreto y cimentaciones, dejando el área libre para la construcción de nuevos pozos según especificaciones actuales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO 45° PVC PRESIÓN 3" – SOLDADO

La actividad comprendió el suministro y la instalación de accesorios tipo **semicodo de 45 grados**, en **PVC de presión de 3 pulgadas de diámetro**, utilizados para permitir los cambios de dirección en las redes de acueducto.

Los semicodos instalados fueron del tipo soldado, lo cual garantiza una unión hermética y segura entre los tramos de tubería, contribuyendo a la integridad del sistema hidráulico, minimizando el riesgo de fugas y pérdidas de presión. La soldadura se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, asegurando alineación y continuidad hidráulica.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE UNIÓN MECÁNICA 3"X3"X3"

La actividad consistió en el suministro e instalación de **accesorios tipo tee de unión mecánica**, con dimensiones **3" x 3" x 3"**, utilizadas en la red de acueducto para permitir derivaciones o empalmes entre tuberías del mismo diámetro.

Este tipo de unión mecánica facilita el montaje, desmontaje y mantenimiento de las redes, proporcionando un acople firme y estanco sin necesidad de soldadura. Su instalación se realizó conforme a las recomendaciones técnicas del fabricante, garantizando la alineación, estanqueidad y funcionalidad del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE REPARACIÓN 3"

La actividad consistió en el suministro e instalación de **uniones de reparación de 3 pulgadas de diámetro**, empleadas en la red de acueducto para la rehabilitación, empalme o corrección de tramos específicos de tubería.

Estas uniones permiten realizar intervenciones puntuales sin necesidad de desmontar tramos extensos de la red, facilitando una solución rápida y eficiente ante fallas o modificaciones en la infraestructura existente. Las uniones fueron instaladas con herramientas especializadas, asegurando un ajuste firme, alineado y hermético.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN SOLDADA 3"

La actividad comprendió el suministro e instalación de **uniones soldadas en PVC de presión**, con un diámetro de **3 pulgadas**, utilizadas en la red de acueducto para garantizar la continuidad de los tramos de tubería con alta resistencia mecánica e hidráulica.

Las uniones soldadas aseguran una conexión permanente y totalmente hermética, minimizando el riesgo de fugas o fallas en la conducción. Su instalación fue realizada mediante el procedimiento de soldadura química, cumpliendo con las especificaciones técnicas del fabricante y los lineamientos del proyecto.

INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO (0,50 x 0,165 x 1) – 3000 PSI

La actividad consistió en el **suministro e instalación de sardinel prefabricado de concreto**, con dimensiones de **0,50 m de largo, 0,165 m de alto y 0,10 m de**

ancho, y una resistencia característica de **3000 PSI**, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

El proceso incluyó la **excavación del terreno para su correcta ubicación**, la **colocación de concreto de nivelación de 5 cm de espesor**, y la **alineación y asentamiento de las piezas** prefabricadas, garantizando continuidad y estabilidad a lo largo del borde de la vía.

Este elemento cumple la función de confinamiento del andén y separación entre la calzada vehicular y peatonal, aportando durabilidad y acabado estético a la urbanización del proyecto vial.

La instalación fue ejecutada en los siguientes tramos:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6
- Tramo 16: Carrera 6 entre calles 5 y 3
- Tramo 17: Calle 2 Sur entre carreras 14 y 16

SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM

La actividad consistió en el **suministro e instalación de sardinel prefabricado de concreto**, con dimensiones de **1,00 m, 0,50 cm x0,165 cm**, y una resistencia de **3000 PSI**, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

El proceso incluyó la **excavación del terreno** para su correcta ubicación, la **colocación de una base de concreto de nivelación de 5 cm de espesor**, y la **instalación precisa y alineada** de cada módulo, garantizando continuidad, estabilidad y correcta funcionalidad.

Este elemento tiene como propósito el **confinamiento estructural entre calzada y andén**, sirviendo además como guía para el drenaje superficial y mejora del acabado urbano.

La actividad fue ejecutada en los siguientes tramos:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6
- Tramo 16: Carrera 6 entre calles 5 y 3
- Tramo 10: carrera 6 entre calle 1 sur y calle 1

SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPa

La actividad comprendió el **suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo**, con una resistencia especificada de **fy = 4200 MPa**, de acuerdo con los planos estructurales del proyecto y las normas técnicas vigentes para construcción de obras civiles.

El acero fue **cortado, doblado (figurado) y dispuesto en obra conforme a las dimensiones y geometrías requeridas**, garantizando su adecuada colocación dentro de elementos estructurales como placas de concreto.

Durante la ejecución, se verificó:

- El cumplimiento de los **recubrimientos exigidos** por norma.
- La **amarre correcto de las barras** con alambre recocido.
- La **limpieza del acero** previo a su instalación.
- La correcta integración con el concreto, asegurando el funcionamiento estructural conjunto.

Los trabajos se llevaron a cabo en los siguientes tramos:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)

La actividad consistió en el **suministro e instalación de acero liso**, utilizado como **barra pasa junta (dovela)** en estructuras de concreto rígido, con el fin de permitir la **transferencia de cargas entre losas adyacentes** sin restringir su movimiento horizontal, controlando así la aparición de grietas no deseadas.

Estas barras fueron colocadas de forma transversal en las juntas de construcción de la placa de concreto, conforme a lo indicado en los planos de diseño, y según especificaciones técnicas que definen su:

- **Diámetro y longitud**,
- **Espaciamiento entre barras**, y
- **Profundidad de embebido en el concreto**.

Durante la ejecución, se verificó:

- El uso de **acero liso libre de óxidos o residuos**,
- El alineamiento correcto para permitir la **dilatación controlada**,

- Y la implementación de **capuchones deslizantes o engrasado**, cuando fue requerido, para permitir el movimiento relativo sin fricción entre losas.

La actividad fue ejecutada en los siguientes tramos:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6
- Tramo 10: carrera 6 entre calle 1 sur y calle 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA

La actividad comprendió el **suministro e instalación de canastillas metálicas** diseñadas para alojar **barras pasa junta (dovelas)** en las placas de concreto rígido, con el propósito de **garantizar la transferencia de carga entre losas contiguas** y permitir el movimiento longitudinal controlado, minimizando el riesgo de fisuración por retracción o expansión térmica.

Cada canastilla estuvo conformada por:

- **Barras transversales de acero liso**, dispuestas en posición horizontal,
- **Elementos de soporte y guías**, que garantizan la correcta alineación y nivelación de las dovelas,

Durante la instalación se verificó:

- El correcto **anclaje al terreno**
- La **nivelación y alineación horizontal**,
- Y que las **dovelas estuvieran libres de deformaciones o corrosión**.

Estas estructuras fueron instaladas en las zonas previstas de junta de construcción de las placas de concreto, conforme a lo indicado en los planos estructurales del proyecto.

Los trabajos se llevaron a cabo en los siguientes tramos:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6
- Tramo 10: carrera 6 entre calle 1 sur y calle 1

CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (ESPESOR 15 CM)

La actividad comprendió el **suministro, extendida, nivelación, compactación y vaciado de concreto premezclado** con una **resistencia característica de 21**

MPa, para la conformación de la **placa de rodadura del pavimento rígido**, con un espesor final de **15 cm**, según los diseños estructurales del proyecto.

El concreto fue preparado en planta, transportado y colocado en obra garantizando los parámetros de **trabajabilidad, asentamiento, uniformidad y calidad**, conforme a las especificaciones técnicas establecidas y a la normativa vigente **(NSR-10, NTC 3318 y NTC 550)**.

Durante la ejecución de la placa se realizaron las siguientes actividades complementarias:

- **Alistado del terreno** y nivelación de la superficie de apoyo.
- **Colocación de formaletas laterales y juntas** de dilatación y construcción.
- **Vaciado del concreto** y posterior **vibrado mecánico** para garantizar la compactación.
- **Acabado superficial tipo escobillado**.
- **Aplicación de curado** para garantizar el desarrollo óptimo de la resistencia del concreto.

Los trabajos se realizaron en los siguientes tramos:

- Tramo 5: Calle 7 entre carreras 3 y 4
- Tramo 6: Carrera 3 entre calles 5 y 6
- Tramo 10: carrera 6 entre calle 1 sur y calle 1

RAZONES TECNICAS, JURIDICAS Y FINANCIERAS MAYORES Y MENORES, CERTIFICACION APUS Y NO PREVISTOS.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y en atención a lo definido en los comités y a las solicitudes de la Gobernación, la Interventoría, junto con el contratista, realizó la revisión técnica de las cantidades de obra en campo. Como resultado, se identificó la necesidad de ajustar y actualizar las cantidades proyectadas, generando mayores y menores volúmenes, así como nuevos precios unitarios, con el fin de garantizar la correcta ejecución del alcance físico establecido contractualmente.

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

20. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

9 DE JULIO 2025 AL 9 AGOSTO 2025

EQUIPO					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	MOTOR	ESTADO
Glb	Herramienta Menor	N/A	N/A	N/A	Activo desde el 9 de agosto al 9 de septiembre.
1	Compactador manual Apisonador (Saltarín) tipo canguro.	HONDA	13.7	GX120	
	Vibrador de Concreto		3HP	ELECTRICO	
1	Cortadora de Concreto				

MAQUINARIA					
TIPO	MARCA	LINEA	MODELO	COMBUSTIBLE	ESTADO
Excavadora Oruga	HYUNDAI	HX75S	2023	Diessel	Activo desde el 9 de agosto al 9 de septiembre.
Retroexcavadora	CASE	580N	2021	Diessel	
Motoniveladora	FIAT ALLIS	65-B	1980	Diessel	
Vibro compactador	INGERSOLL RAND	SD70DTF	2006	Diessel	

VEHICULOS						
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	ESTADO
OWH753	Volqueta	CHEVROLET	1986	7 m3/8 Ton	Diessel	Activo desde el 9 de agosto al 9 de septiembre.
GTM489	Volqueta	INTERNATIONAL	2021	14 m3 /15.9 Ton	Diessel	
SWW281	Volqueta	FREIGHTLINER	2012	14 m3/ 20 Ton	Diessel	
ESS711	Volqueta	INTERNATIONAL	2019	14 m3 /15.9 Ton	Diessel	

21. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA:

Para el desarrollo y ejecución del contrato, CONSORCIO VIAS JCSR cuenta con el personal requerido contractualmente, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos contratados, Para tal fin dispone de:

PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1
INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
TOPOGRAFO	1
SUPERVISOR SST	1

22. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.



Durante el mes de en Agosto de acuerdo al formato del estado del tiempo de los 31 dias calendario se presentaron (5) dias con registro de lluvias en horas de la mañana y a la madrugada.

23. *CONTRATO DE INTERVENTORÍA.*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1507 del 31 marzo 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1507 del 31 de Marzo 2025
OBJETO	El objeto del contrato de interventoría es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES " PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
CONTRATISTA	INVERSIONES AGM SAS, identificada con el NIT: 901.826.372-9 REPRESENTANTE LEGAL MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS.
FECHA DE INICIO	31 MARZO DEL 2025
PLAZO	TRESCIENTOS SESENTA DIAS (360)
VALOR	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS $ 1.872.252.466

24. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EN EL MES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

Dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, INVERSIONES AGM SAS, dispone del personal profesional y técnico al frente del proyecto, los cuales describen las actividades ejecutadas durante el presente periodo:

- Acompañamiento al contratista a socializaciones con la comunidad residente en el área del proyecto.
- Comités técnicos de obra y administrativos
- Por parte de la interventoría se llevó a cabo la revisión de los documentos técnicos, memorias de cálculo y planos topográficos de todo el tramo vial a intervenir.

- Se vienen llevando reuniones con el contratista con el fin de organizar todo lo concerniente a la parte administrativa y de obra del contrato.
- La interventoría realiza controles constructivos a las diferentes actividades que realiza el contratista desde la parte de topografía, calidad de los materiales y toma de densidades de las diferentes capas granulares.
- Verificación de la programación entregada por el contratista de obra.
- Elaboración de oficios al contratista, de acuerdo a las necesidades y obligaciones establecidas contractualmente
- Verificación del cumplimiento contractual por parte del contratista de obra
- La interventoría realiza la revisión de toda la documentación del personal del contratista como también de la maquinaria y equipos.

a. **CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.**

PERSONAL PROFESIONAL	
OCUPACIÓN	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
HSEQ	1
TOPÓGRAFO	1
PERSONAL TECNICO	
INGENIERO AUXILIAR	1
CADENERO	1
CONDUCTOR	1
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIBUJANTE	1
SECRETARIA	1

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

25. REGISTRO FOTOGRAFICO:

LOCALIZACION Y REPLANTEO

TRAMO 3: CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL





INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7.





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

EXPLANACION Y CAJEO :

TRAMO 3: CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS
NIT: 901826372-9







CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 3: CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL





INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7.





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7.





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES ACM SAS NIT: 901826372-9

CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA.

TRAMO 3: CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL





INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7.





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 18. CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y QUEBRADA EL JORDÁN:





INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL:



TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7.



INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL:



CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7.





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7:





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS
NIT: 901826372-9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com


INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC Y SILLA YEE 14X 6" PVC"

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL.





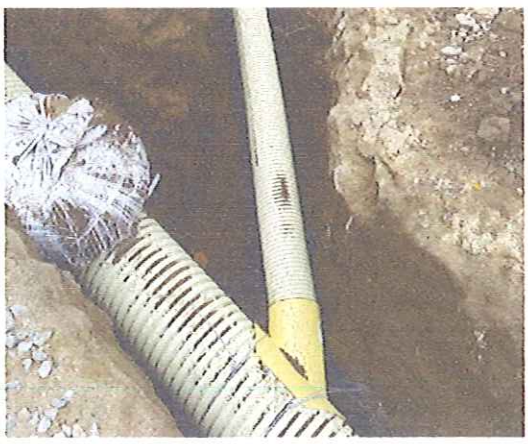

CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15 MEDIO MECANICO.

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL.





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 7. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7:





CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

TRAMO 3. CALLE 8 ENTRE CRA. 3 Y AV. NACIONAL.



CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"

TRAMO 18. CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y QUEBRADA EL JORDAN



INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"

TRAMO 18. CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y QUEBRADA EL JORDAN.



*SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM*

TRAMO 12. CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5



INVERSIONES AGM SAS
NIT: 901826372-9

TRAMO 12. CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

INVERSIONES AGM SAS NIT: 901826372-9

TRAMO 12. CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5



TRAMO 17. CALLE 2 SUR ENTRE CARRERA 14 Y 16:





CARRERA 4 No 42-73 CASA CLUB IBAGUE- TOLIMA – CEL.: 311 482 7110
Correo: contrato1172@gmail.com

27. OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA: AFECTACIONES TÉCNICAS:

FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE REDES DE GAS:

Se detectó presencia de tuberías de gas natural instaladas a una profundidad inadecuada: en algunos tramos tan solo 15 cm por debajo de la rasante de la vía. Asimismo, no se encuentra señalización ni separación conforme a la normatividad técnica vigente. Estas condiciones representan un riesgo directo de daño físico a la red durante actividades de excavación o intervención. Además, inciden negativamente en los rendimientos previstos, generando retrasos y posibles sobrecostos.

28. CONCLUSION:

Durante el periodo evaluado se verificó un avance físico de obra equivalente al 3,63%, sustentado en la ejecución de actividades de localización y replanteo, excavaciones en material conglomerado (mecánicas y manuales), cargue y disposición de sobrantes, instalación de tubería PVC de 12" para colector principal y de 6" para acometidas domiciliarias, así como la instalación de accesorios y elementos complementarios (silla yee, codos, cajas de inspección) y la construcción de pozos de inspección.

La interventoría constató que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y requisitos de calidad establecidos en los pliegos contractuales. Se evidenció la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo en el frente de obra, garantizando condiciones adecuadas para el personal.

En cuanto a los tiempos, el avance se desarrolla dentro de lo programado, considerando las variaciones justificadas presentadas durante el periodo. El proyecto mantiene equilibrio con el presupuesto asignado, sin sobrecostos a la fecha.

En conclusión, la ejecución de la obra presenta un desarrollo acorde a lo previsto, manteniendo cumplimiento en calidad, seguridad, presupuesto y cronograma.

Atentamente:

INVERSIONES AGM SAS
R/L. MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS
NIT: 901.826.372-9

CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

INFORME SST – AMBIENTAL - SOCIAL DE INTERVENTORIA N°04

TOMO II

09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe de la interventoría data de las obras de mejoramiento de las diferentes vías del municipio de Lérida en el departamento del Tolima.

La obra se ejecuta en el marco del contrato 1469 DE 2025 suscrito entre la GOBERNACION DEL TOLIMA y el CONSORCIO VIAS JCSR. El objeto del contrato es "LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPO DE LERIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

La interventoría es realizada por INVERSIONES AGM SAS contrato 1506 DE 2025 suscrito con la GOBERNACION DEL TOLIMA, la cual se encarga de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, el cronograma de ejecución y el presupuesto aprobado, en el presente informe se describen los aspectos técnicos más relevantes de la obra, así como los resultados de la interventoría.

COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL Y SST DE LA INTERVENTORIA.

El objetivo de la Interventoría Ambiental es verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental de proyectos de infraestructura- Subsector vial, (PAGA), en el desarrollo y avance de las obras mediante los controles que fortalezcan los procesos que disminuyan el impacto sobre el entorno ambiental, realizando el debido seguimiento y supervisión de los procesos constructivos, y orientando al contratista en el adecuado cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

En materia de seguridad y salud en el trabajo la interventoría busca además de, evidenciar el conjunto de actividades en pro de la correcta implementación y cumplimiento de los estándares mínimos según la resolución 0312 de 2019 del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, todas estas encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades laborales de todo el personal vinculado al proyecto y mejorar la calidad de vida del trabajador.

Dentro del marco social, el área de gestión social es responsable de identificar y registrar el estado físico de las construcciones e infraestructura de todos los predios (lotes, viviendas y/o mixto) que se encuentran sobre la obra, antes de iniciar actividades constructivas, y así velar por la calidad de vida de los habitantes y evitar conflictos con los Propietarios de los predios. Para esto, la interventoría realizará procesos de acompañamiento a las reuniones que realice el contratista con propietarios o encargados de predios, para adquirir permisos de intervención, y en caso de no ser avisados con anterioridad realizar un seguimiento a las quejas y reclamos de la comunidad.

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA EN SST

INVERSIONES AGM SAS, realiza seguimiento al cumplimiento normatividad legal vigente colombiana con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades que se derivan del contrato de obra número 1469 de 2025.

Aspectos administrativos:

- **INVERSIONES AGM SAS** realiza el pago de la seguridad social, de todo el personal vinculado al consorcio, de igual forma solicita y verifica el pago de seguridad social del personal vinculado.
- Se realiza inspección en campo, verificando el estado de los EPP de todo el personal vinculado al consorcio vial JCSR, subcontratistas SUAREZ Construcciones y ZR construcciones y que los mismos porten los implementos de forma adecuada.
- Se solicitan las planillas soporte de entrega de dotación y elementos de protección personal al momento de ingresar personal nuevo.
- Se inspecciona en campo, que el personal que se encuentra en obra, sea el que se encuentra activo en las planillas y pagos de seguridad social.
- Previo ingreso a obra de vehículos y maquinaria se solicita al contratista sea entregado toda la documentación legal y reglamentaria, tanto del vehículo como del conductor
- Se solicita al contratista los soportes de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos y maquinaria.

- Se generan observaciones sobre hallazgos en obra tras los recorridos que se realizan diariamente, dándolos a conocer al contratista verbalmente y por medio de oficios.

Se realizaron actividades relacionadas con:

- Señalización perimetral en obra
- Excavación mecánica alcantarillado
- Excavación manual
- Excavación manual acueducto
- Retiro de RCD
- Corte y figurado de acero
- Instalación de sardineles
- Fundida concreto

Aspectos técnicos:

Control de personal:

Inversiones AGM S.A.S. cuenta con el personal profesional y técnico en obra y oficina para hacer seguimiento a las actividades del contrato 1469 del 29 de Marzo de 2025.

- Se verifica en campo que el personal en obra del contratista y sub contratistas cuenten con las planillas de afiliación y su respectivo examen de ingreso.
- El contratista cuenta el personal ofrecido en la propuesta presentada.

Sub programa de higiene y seguridad industrial:

Verificación de documentación del personal.

El contratista da fe y hace entrega a la interventoría de toda la documentación reglamentaria en seguridad y salud en el trabajo, durante el Periodo comprendido entre el 09 de agosto al 09 de septiembre de 2025, Se verifica que todo el personal vinculado al proyecto cuente con la documentación completa para poder iniciar actividades sin ningún inconveniente como:

La documentación que debe ser entregada se relaciona a continuación:

1. Fotocopia de cedula
2. Planillas de afiliación
3. Examen de ingreso
4. Evaluación de inducción por parte del profesional SST
5. Certificado de curso de manejo defensivo para conductores y operadores.

Verificación de seguridad social.

- Se verifican las afiliaciones de (ARL, EPS, AFP, CCF) y la planilla de seguridad social de todo el personal adscrito al proyecto, que se encuentre vigente con su respectivo pago para el periodo en curso
- El Consorcio en cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en la reglamentación laboral colombiana, da fe y garantiza que todos los 22 trabajadores antes relacionados (directos y contratistas), están afiliados al Sistema de Seguridad Social, así como también se realizar el pago de la seguridad social del mes de agosto de 2025.

- **Verificación del programa de inducción.**

Se solicita y se verifica que el personal Nuevo ha realizado el proceso de inducción, esto se hace mediante un formato que debe cumplir con características específicas, entre ellas dar a conocer al personal las políticas y generalidades de la empresa, reglamentos internos y en SST, riesgos a los que se encuentra expuesto entre otros aspectos.

El pasado mes de agosto de 2025, se realizaron 2 inducciones en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra.

Indicador de cumplimiento: 100%
Población total: 22 trabajadores
Cobertura: 22 trabajadores
Indicador de cobertura: 100%

Acción de mejora: Continuar con la realización de procesos de inducción SST al ingreso del personal con el fin de garantizar el cumplimiento del indicador del 100%.

- **Supervisión en la prevención de accidentes en cuanto a: Riesgo y prevención.**

Verificación de la notificación inicial de riesgos que incluya las medidas de prevención y que estas sean acordes al riesgo contemplado tanto en obra como en el panorama o matriz de riesgos asociada al SG-SST de cada contratista, de igual modo la verificación de las diferentes condiciones en que labora el personal, si cuentan con los debidos controles de prevención para la mitigación de enfermedades y accidentes de trabajo.

En el periodo del 09 agosto al 09 de septiembre del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, así como tampoco casos de enfermedad laboral:
No. AT: 0
Indicador accidentalidad: 0%.
No. Incidentes de trabajo: 0

- Se exige el suministro de los elementos de protección Personal (EPP), según lo demande la matriz de EPP relacionada en el SG-SST de cada contratista y lo amerite la tarea que se está ejerciendo por parte del trabajador.
- Se solicita el respectivo formato de entrega de EPP del contratista y Subcontratistas.

Indicador de cumplimiento EPP: 100%
Población total: 22 trabajadores
Cobertura: 22 trabajadores
Indicador de cobertura EPP: 100%

- **Control de maquinaria.**

Cuando ingresa personal con maquinaria o vehículos se solicita la documentación entre los que se encuentran:

1. Soportes de propiedad
2. Mantenimiento y certificación de idoneidad de los operadores y conductores (licencia de conducción vigente).

De igual forma, se verifica que cada uno cuente con extintor y botiquín dentro de la maquinaria en caso de que se presente una emergencia esta sea utilizada debidamente.

Mensualmente se realizará la inspección de vehículos y maquinaria, verificando que las condiciones con las que ingreso se conserven. (Luces, pito reverso, llantas, entre otras).

- **Revisión de documentación diaria en obra:**

Durante el proceso de ejecución de obra se solicita los soportes documentales (formatos) diligenciados que evidencien la implementación de los programas que se encuentran en el SG-SST y de los cuales se encuentran obligados a dar cumplimiento en campo, para verificación de que se está llevando a cabo durante la ejecución de las actividades relacionadas con cada subprograma.

- Capacitaciones / charlas diarias.
- Análisis de trabajo seguro.
- Permisos de trabajo.
- Control de personal.
- Pre operacional de maquinaria y equipos.
- Notificación de riesgo e inducción al personal nuevo.
- Pre operacional de vehículos (volquetas).

Plan de Emergencia: Se solicita al contratista el debido cumplimiento del plan de emergencia, el cual debe estar contemplado dentro del SG-SST; bajo la conformación de brigadas de emergencia (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), y contar con los elementos de atención para primeros auxilios.

Se evidencia y se realiza acompañamiento por parte de interventoría en la distribución de la señalización según plan de emergencia (rutas de evacuación, puntos de encuentro, etc.) tanto en los frentes activos como en la oficina principal.

Programa de capacitaciones: se realiza verificación al cumplimiento del programa de capacitaciones y charlas de 5 minutos diarias al personal del proyecto, capacitaciones por parte de los profesionales SST del contratista e interventoría.

COPASST: El Consorcio Vías JCSR realizó a los 28 días del mes de agosto del presente año, la segunda reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASS) donde se reunieron los integrantes del mismo para hacer seguimiento de las

acciones pactadas en la anterior reunión proponiendo ideas de mejora para el fortalecimiento de la cultura de Prevención, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 2013 del 6 de junio de 1996 y el Decreto 1295 de 1994 Articulo 63.

Comité de convivencia laboral: El Consorcio Vías JCSR, a los 03 días del mes de julio, se reunieron el Representante legal Hernando Sanabria y los Colaboradores con el fin de constituir el Comité de Convivencia Laboral de la empresa, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 1352 de 2012 y el Decreto 652 de 2012, realizando votación libre donde se eligieron a los representantes por parte de los trabajadores, se estableció fecha de la primera reunión siendo el día 27 de Octubre de 2025 y se solicitó una debida capacitación para el desempeño de las funciones y deberes.

Señalización: Se realizan recorridos en los distintos frentes, verificando que el contratista si cumpla con la implementación del programa de manejo de tránsito y requerimientos del contrato, donde se evidencia la instalación en cada frente de obra los elementos de seguridad vial con el fin de garantizar la seguridad en las vías, tales como: conos, reductores de velocidad, pasa vías y señalización preventiva e informativa; señalización de peligro de áreas de riesgo como excavaciones, alcantarillados, etc.

Demarcación: Se solicita y se verifica que el contratista cuente con la adecuación de senderos peatonales en los diferentes frentes del casco urbano de Lérida Tolima y de aquellas zonas que generen un alto riesgo a la comunidad y al personal dentro de obra.

Suministro de hidratación: Se verifica que los subcontratistas proporcionen la hidratación adecuada a las personas que trabajan en los diferentes frentes, considerando las altas temperaturas de la zona para prevenir posibles golpes de calor.

Condiciones de higiene: Se solicita y se verifica que las unidades sanitarias cuenten con condiciones de higiene adecuadas y estén debidamente habilitadas para el uso del personal que labora en los diferentes frentes.

Sub- programa de Medicina Preventiva:

El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo ocupacionales. Además, recomienda los lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones psico-fisiológicas del funcionario, con el fin de que pueda desarrollar sus actividades de manera eficaz.

Verificación de exámenes ocupacionales: se comprueba que todo el personal que ingresa al proyecto cuente con su examen médico ocupacional de ingreso cumpliendo con lo contemplado en el sub programa de medicina preventiva, con el objetivo de tener conocimiento del estado de salud del trabajador actual al ingreso y así mismo si está apto para desempeñar el cargo para el que fue contratado.

Realización de capacitaciones: se verifica que se realicen las capacitaciones al personal sobre hábitos, vida saludable, lavado de manos, alimentación saludable, que promueven la salud en el los trabajadores, los procedimientos adecuados para evitar accidentes de trabajo etc.

Programa de Orden y Aseo: se recomienda al contratista que al terminar la jornada laboral se realicen brigadas de orden y aseo. Se solicita el registro sea fotográfico o documental de la implementación del programa en las áreas de trabajo (vías intervenidas), unidades sanitarias etc.

Programa de vigilancia epidemiológica: Se verifica por medio de inspecciones a los puestos de trabajo para conocer los riesgos que puedan generar alguna patología laboral y solicitar la intervención del contratista, se recomienda realizar campañas masivas de vacunación, exámenes clínicos y paraclínicos requeridos para la vigilancia epidemiológica.

Enfermedades: no se evidencian reportes relacionados con la aparición de enfermedades de origen común y laboral, durante este periodo no se reportan ausentismo por dicha causa.

Accidentes e incidentes: Se solicita al contratista que al presentarse un accidente y/o incidente laboral, se realice la investigación pertinente según el caso

En el periodo del 09 agosto al 09 de septiembre del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, así como tampoco casos de enfermedad laboral:

No. AT: 0
Indicador accidentalidad: 0%.

No. Incidentes de trabajo: 0
Indicadores incidentes de trabajo: 0%.

No. EL: 0
Indicador EL es del 0%.

GESTION DEL CONTRATISTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIO-AMBIENTAL.

Personal a cargo del SG-SST del contratista

En la siguiente tabla se relaciona el personal vinculado por el Contratista para la gestión de los componentes SST.

Tabla 1. Tabla de personal empleado para la gestión

NOMBRE	Cargo	Profesión	Observación
Andrés José Cárdenas	Supervisor SST	Profesional en Salud Ocupacional.	Verificada y aprobada por interventoría hoja de vida.
Angely Eliana Quintero	Auxiliar SST	Profesional en Salud Ocupacional.	Verificada y aprobada por interventoría hoja de vida.

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describen las actividades de los programas para el manejo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo:

10.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	
OBJETIVO	- Controlar la implementación y la gestión del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que oferto el consorcio Vial JCSR, de acuerdo a la normatividad legal vigente. - Verificar el cumplimiento al control oportuno de los riesgos y al desarrollo de las actividades propuestas por el consorcio Vial JCSR para resguardar, mantener y mejorar las condiciones de salud individual y colectiva de los trabajadores que forman parte del Contratista y sub contratistas. - Verificar el cumplimiento a la ejecución de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial que se desarrollen en la ejecución del contrato.

	– Garantizar mediante la gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo ambientes de trabajo saludables y seguros para los trabajadores, la comunidad, los equipos, las máquinas y la propiedad. – Identificar, analizar y controlar los riesgos que se generen en cada actividad constructiva y operativa, dentro del contrato. – Controlar la implementación de los planes de acción propuestos en la matriz general de riesgos. – Identificar permanentemente los peligros, riesgos y las condiciones inseguras presentes en el desarrollo de las actividades constructivas que puedan llegar a afectar trabajadores y tomar acciones preventivas inmediatas que controlen en forma significativa dichos riesgos. – Verificar y garantizar el cumplimiento a la normatividad en salud, seguridad y medicina laboral vigente.
RIESGOS A MANEJAR	– Accidentes e incidentes laborales. – Accidentes de tránsito. – Enfermedades laborales – Salud pública. – Incumplimiento de requisitos legales. – Factores de riesgo identificados. – Emergencias y contingencias naturales y generadas por el proyecto.
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
OBJETIVO	El sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como fin la prevención, promoción y control de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo laborales, desarrollando las actividades encaminadas a garantizar el bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

RIESGOS A MANEJAR	– Enfermedades profesionales y de salud pública. – Ambientes de trabajo inseguros – Riesgos ocupacionales identificados en la matriz y panorama de riesgos – Ausentismo

AVANCE DE ACTIVIDADES

Exámenes médicos

- Se realiza examen de ingreso de todo el personal vinculado al proyecto, tanto del consorcio Vial JCSR como sub contratistas Suarez Construcciones y ZR Construcciones.

Capacitaciones

Se realizan capacitaciones al personal durante el periodo, donde se les instruye sobre los principales riesgos a los que están expuestos en obra, de igual modo se realizan pausas activas a todo el personal esto con el fin de mejorar las condiciones musculo esquelético.

Pausas Activas: El contratista implementa pausas activas durante los periodos de trabajo diario, con el fin de dar manejo al Riesgo biomecánico, psicosocial y demás asociados a las exigencias dadas por la labor ejercida por cada trabajador.

Afiliaciones al sistema de seguridad social

El contratista realiza las afiliaciones a todo el personal nuevo en seguridad social de la Concesión Vial JCSR y hace la solicitud de los pagos y afiliaciones del personal bajo la modalidad de subcontratistas e independientes, con el fin de verificar el cumplimiento de esta obligación y que todo el personal este cubierto por la ARL en caso de presentarse una emergencia.

Ausentismo: Para el periodo en mención no se presentaron casos de ausentismo, por ningún motivo.

Incidentes: para el periodo en mención no se presentaron casos de Incidentes, por ningún motivo.

Capacitaciones: Se verifica el cronograma de capacitaciones planteado por la Concesión Vial JCSR para dar al personal durante el periodo del 09 de julio al 09 de agosto del 2025:

PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
					09	10
11	12	13	14	15	16	17
Ergonomía y Manipulación de Cargas	Medidas preventivas y Control de Riesgos	Condiciones Climatológicas Extremas	Control de Tráfico Vehicular en Obra	Uso adecuado de EPP	Condiciones Seguras y Transporte de Materiales	
18	19	20	21	22	23	24
	Cultura Preventiva y Reporte de Condiciones Inseguras	Identificación de Peligros	EPP	Riesgo Físico	Riesgo Ergonómico	
25	26	27	28	29	30	31
Plan de Emergencias	Prevención de Enfermedades Agotamiento	Riesgo Biológico	Uso correcto de Herramientas de mano	Inspección de Maquinaria y Equipos	Pausas Activas	
01	02	03	04	05	06	07
Uso adecuado de Dotación	Riesgo Químico	Cuidado de Ojos	Riesgo Psicosocial	Cultura de Seguridad	Consumo de Bebidas Alcohólicas	
08	09					
Cuidado de Manos	Capacitación Ambiental					

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
OBJETIVO	Identificar permanentemente los factores de riesgo que pueden ser causa de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales; establecer las causas potenciales y reales que los generan; Formular medidas de control, efectuar el seguimiento de estos, para prevenir su ocurrencia.
RIESGOS A MANEJAR	– Accidentes e incidentes de trabajo. – Enfermedades laborales. – Factores de riesgo inherentes a las actividades de obra. – Condiciones ambientales peligrosas. – Condiciones higiénico sanitarias inadecuadas
AVANCE DE ACTIVIDADES	
Señalización en frente de obra. • El contratista y subcontratistas realizan la instalación de señalización vial como le fue solicitado por parte de interventoría en los frentes de trabajo activos y no activos, de igual modo realiza demarcación en la vía con elementos de seguridad, como conos, maletines, cinta para hacer señalización. • Se cuenta con personal como controlador de vía (paletero) con el objetivo de que no se presenten accidentes en la vía, haciendo verificación también de que	

las volquetas salgan con los controles establecidos para la circulación correcta en las vías.

- Cada frente de obra cuenta con señalización referente al plan de emergencia y seguridad en la obra.

Dotación en seguridad para el personal de obra

- Realizada la inspección a todos los vehículos y maquinaria, se evidencia que todos cuentan con el kit de primeros auxilios completos y sus respectivos extintores.
- Se hace entrega de dotación al personal nuevo.

E.P.P.

- El Contratista hace entrega de los E.P.P. al personal de obra nuevo y (casco, botas de material con puntera de seguridad, gafas, guantes, chaleco reflectivo) según la actividad a realizar el personal.
- Se realiza inspección de estos semanalmente para verificación de estado y reposición de los mismos.

Inspecciones

Durante el periodo el contratista realizo inspecciones en cada frente de obra.

- Inspección a maquinaria con acompañamiento de la interventoría.
- Inspección conjunta entre el Contratista y la Interventoría en los frentes de obra para la identificación de riesgos.
- Inspección a los EPP.
- Inspecciones de áreas de trabajo (orden y aseo).
- Inspección de herramientas manuales.
- Inspección a elementos de primero auxilios (botiquines y extintores).

Actividades de Capacitación

El contratista realiza capacitación e inducción al personal en (seguridad y salud en el trabajo, presentación de la empresa y políticas de prevención, riesgos a los que se encuentra expuestos.).

- Se realizan inducciones a todo el personal.
- Notificación de riesgos a personal nuevo
- Charla orden y aseo en frente de obra.
- Charla seguridad industrial.
- Medidas de prevención en riesgos.
- Higiene postural
- Que es el sistema de seguridad social en Colombia

Reporte e investigación de accidentes de trabajo

En el periodo del 09 agosto al 09 de septiembre del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, así como tampoco casos de enfermedad laboral:

No. AT: 0
Indicador accidentalidad: 0%.
No. Incidentes de trabajo: 0
Indicadores incidentes de trabajo: 0%.
No. EL: 0
Indicador EL es del 0%.

Vehículos y equipos

El contratista cuenta con Máquinas para el servicio de la obra tal como con una (1) volqueta y maquinaria pesada como una (1) Retroexcavadora Case, dos (2) motoniveladora, una (1) retroexcavadora de Oruga.

Se realiza y verifica el pre operacional según sea su uso en obra, a todos los conductores se les exigió para poder laborar el curso de manejo defensivo, se solicita se haga seguimiento al plan estratégico de seguridad vial, radicado por el contratista.

Capacitaciones

Se realizan capacitaciones sobre temas relacionado a seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión en SST. Como objetivo principal capacitar al personal en terminología, riesgos e implementación de los procesos dirigidos a los subprogramas del SG.SST.

Se realizan Inducciones Iniciales de capacitaciones a todo el personal, como evidencia del cumplimiento al SG-SST y se evalúan los conocimientos de los trabajadores ante seguridad y salud en el trabajo.

Documentación diaria.

El contratista gestiona permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro ATS, control de personal, registro de capacitaciones.

HIGIENE INDUSTRIAL

- **Unidades sanitarias:** el contratista cuenta con dos permisos de unidades sanitarias domiciliarias (Tramo 6 y Tramo 16) y dos de unidades sanitarias domiciliarias en (Tramo 17 y 18) para el personal de obra de los frentes referenciados.

- **Suministro de hidratación del personal**: Los Subcontratistas suministran hidratación en los sitios en donde el personal este realizando los distintos trabajos.

- **Campamentos y restaurantes temporales**: El personal de trabajadores van a sus alojamientos a descansar y consumen los alimentos en ese mismo lugar.

No hay restaurantes y se maneja una oficina para el área administrativa, atención al usuario y de acopio de materiales por el Contratista.

- **Plan de Emergencias**
  Se cuenta con un plan de emergencia operativo para la obra, el cual se solicita debe ser divulgado ante todo el personal de obra.
  Se cuenta con la camilla, extintor y botiquín de primeros auxilios, se solicita al contratista sea conformadas, capacitadas las brigadas de emergencias y elegir el respectivo vigía.

- **Prácticas de orden y aseo:** El contratista capacita al personal sobre la importancia del orden y aseo en cada frente de obra, el contratista realiza la contratación de un auxiliar encargado (Todero) de realizar recorridos diarios para la recolección de residuos generados en obra, adecuación de los centros de acopio y mejoramiento de todas las señalizaciones que estén en mal estado. Se evidencia la adecuación de tres (3) puntos ecológicos, y para el resto de tramos, el contratista mitiga la falta de los mencionados, con bolsas de basura negras en puntos estratégicos.

- **Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST)**
  El día 28 de Agosto se realizó por parte del contratista la segunda Reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo donde se desarrollaron varios temas y generaron los compromisos pertinentes.

- **Comité de Convivencia Laboral**: El día 03 de julio se realizó por parte del contratista la conformación del Comité de Convivencia Laboral fijando los integrantes del mismo y generaron los compromisos pertinentes, también se dejó pactada la próxima reunión para el día 27 de octubre del 2025.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

Se reitera a la empresa contratista implementar de forma inmediata las medidas establecidas en el PMT aprobado, garantizando una correcta señalización, delimitación

de zonas y control del tránsito. Además, se debe realizar una verificación diaria del cumplimiento del PMT por parte del responsable designado.

COMPONENTES DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

Objetivos:

- Supervisar la implementación de las medidas descritas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA suministrado por el contratista a interventoría, con el fin de verificar la prevención, mitigación y control de los impactos sobre la calidad del aire, el suelo y el paisaje.
- Formular las medidas necesarias para la mitigación, compensación y prevención de los efectos adversos (críticos y severos), causados por las actividades del proyecto sobre los elementos ambientales, según identificación y valoración efectuadas en el balance ambiental, así como las recomendaciones para el futuro control, seguimiento y mejoramiento de dichos efectos.

Actividades:

- Verificar el cumplimiento de los lineamientos Ambientales, correspondientes a permisos ambientales tramitados ante entidad competente y el seguimiento a todos los Programas y Proyectos ambientales que tienen aplicación en el proyecto según el PAGA Plan de adaptación de la guía ambiental.
- Se exige al contratista el manejo integral de residuos por medio de la instalación de puntos de recolección de residuos sólidos que se generan en la obra, los cuales se deben de ubicar en cada frente de obra en lugares estratégicos.
- Se exige la recolección de los residuos en las áreas de excavaciones en los tramos de vía por medio de puntos de recolección con bolsas de basura y hacer la debida recolección diaria de estos residuos.

- Se exige la conformación de brigada de aseo en el frente de obra, las cuales deben de realizar actividades durante la semana, con la finalidad de mantener el frente de obra aseados y en orden.
- Se exige capacitaciones al personal de la obra en el área ambiental, sensibilizando acerca de la importancia de realizar un buen manejo de los residuos sólidos. (Donde se generan, como se generan, como se clasifican, ventajas del reciclaje).
- Se exige capacitaciones al personal de la obra sobre orden y aseo.
- Se exige la debida señalización de puntos ecológicos y centros de acopio de material.
- Se exige el tener kit anti derrames en obra.
- Se exige la realización de pre operacional de maquinaria, vehículos y equipos evidenciando el buen estado.
- Se exige el carpado para el transporte de material.
- Se exige las licencias de permisos ambientales de la zona de disposición final de escombros, y licencias de las canteras, de donde adquieren los materiales pétreos.
- Se solicita la certificación o vales de control de la escombrera autorizada donde se logre verificar la debida disposición de este material de excavación.
- Se exige la implementación del programa de orden y aseo.
- No se permite el abastecimiento de la maquinaria en cuanto a combustible o actividades de reparación dentro de los frentes de trabajo, que puedan generar un impacto ambiental.
- Se solicita al contratista los soportes que certifique de donde se abastece el carro tanque para las actividades propias de la obra.
- Se solicita al contratista empezar a tramitar el permiso de tala y poda en el corredor vial.

El Consorcio Vial JCSR cumple con los requerimientos mínimos de personal para el área ambiental.

Tabla 2. Tabla de personal empleado para la gestión

NOMBRE	Cargo	Profesión	Observación
Lina María Medina Correa	Especialista ambiental	Ing. ambiental	Verificada y aprobada por interventoría hoja de vida.

A continuación, se describen las Fichas y programas con aplicación en el PAGA para el proyecto.

FICHAS Y PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL CON APLICACIÓN EN EL PAGA

Tabla 3. Fichas y programas gestión ambiental con aplicación en el PAGA

FICHAS		MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	OBSERVACIONES
Programa 1		**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**	
Proyecto 1	DAGA-1.1-01	Gestión socio - ambiental	Aplica
Proyecto 2	DAGA-1.2-02	Capacitación y concienciación para el personal de obra	Aplica

Proyecto 3	DAGA-1.3-03	Cumplimiento de requerimientos legales	Aplica
Programa 2		**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**	
Proyecto 1	PAC-2.1-0.4	Manejo integral de materiales de construcción	Aplica
Proyecto 2	PAC-2.2-0.5	Explotación fuentes de materiales	No Aplica
Proyecto 3	PAC-2.3-0.6	Señalización de frentes de obra y sitios temporales	Aplica
Proyecto 4	PAC-2.4-0.7	Manejo y disposición final de escombros y lodos	Aplica
Proyecto 5	PAC-2.5-0.8	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	Aplica
Programa 3		**GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO**	
Proyecto 1	PGH-3.1-0.9	Manejo de aguas superficiales	No Aplica
Proyecto 2	PGH-3.2-10	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	Aplica
Programa 4		**BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS**	
Proyecto 1	PBSE-4.1-11	Manejo del descapote y cobertura vegetal	Aplica
Proyecto 2	PBSE-4.2-12	Recuperación de áreas afectadas	No Aplica
Proyecto 3	PBSE-4.3-13	Protección de fauna	No Aplica
Proyecto 4	PBSE-	Protección de ecosistemas	No

	4.4-14	sensibles	Aplica
Programa 5		**MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES**	
Proyecto 1	PMIT-5.1-15	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Aplica
Proyecto 2	PMIT-5.3-16	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y concreto	No Aplica
Proyecto 3	PMIT-5.3-17	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Aplica

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE MAYO, POR CADA PROGRAMA.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

PROYECTO 1: CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIO AMBIENTAL Y SG-SST	IDENTIFICACIÓN DAGA-1.1-01
ACTIVIDADES A EJECUTAR	
- Se elabora documento mensual de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA. - Se realizan visitas de inspección ocular en los frentes de trabajo evaluando sus condiciones ambientales para crear estrategias de prevención, minimización y corrección de los impactos ambientales que se puedan desarrollar por el desarrollo del proyecto. - Tanto el contratista de obra CONSORCIO VIAS JCSR, cuyo representante legal es JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ, cómo el personal profesional de apoyo tiene como objetivos dar cumplimiento a	

PROYECTO 1: CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIO AMBIENTAL Y SG-SST	IDENTIFICACIÓN DAGA-1.1-01

total cabalidad de las actividades a ejecutar y las obligaciones en las áreas Ambiental, SG-SST y Social, garantizando el normal desarrollo y avance de la obra.

El personal encargado de realizar la gestión socio-ambiental y SG-SST durante el desarrollo de las actividades del proyecto se relacionan a continuación: Diego Fernando Girón Director Ingeniero, Lina María Medina Correa Ingeniera ambiental y Andrés Cárdenas Supervisor SG SST.

La gestión social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SG-SST estarán lideradas por el Ingeniero Residente, Ingeniero ambiental y especialista SG-SST, quienes establecen todas las políticas y lineamientos de conformidad por lo solicitado por la entidad contratante y la interventoría del Proyecto.

PROYECTO 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA	IDENTIFICACIÓN DAGA-1.2-02

IMPACTOS A MANEJAR

Afectación de los recursos naturales por desconocimiento del adecuado uso e Incumplimiento de los procedimientos establecidos dentro de los actos administrativos que otorgan licencias, autorizaciones y permisos.

ACCIONES A EJECUTAR

Se desarrolla capacitación al equipo de trabajo sobre MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LIQUIDOS, RCD, RECICLABLES Y NO APROVECHABLES

PROYECTO 3: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	IDENTIFICACIÓN DAGA-1.3-03

IMPACTOS A MANEJAR

Requerimiento de las autoridades competentes. Conflictos con la comunidad.
Demandas por inadecuados procesos de contratación o por mal manejo de los recursos naturales durante la ejecución de las obras.

ACCIONES A EJECUTAR

Actividades ejecutadas - Gestión de Permisos Ambientales.

-**Permiso de concesión de aguas superficiales:** Para el desarrollo del proyecto no se requiere.

-**Permiso de ocupación de cauce:** Para el desarrollo del proyecto no se requiere.

-**Permiso de Aprovechamiento Forestal**: Durante el periodo del 09 de agosto al 09 de septiembre de 2025, se desarrolló actividad de aprovechamiento forestal del frente 12, en la carrera 8 entre calle 3 y calle 5, en donde se evidencia de un individuo forestal con riesgo a la salud pública por contacto con cuerdas de alta.

-**Permiso de Vertimientos:** Se da continuidad a permisos a través de la comunidad para el uso de unidades sanitarias, de igual forma al alquiler de Instalación temporal que cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado.

-**Aire:** Durante el periodo del 09 de agosto al 09 de septiembre de 2025, no se desarrollaron actividades relacionadas con funcionamiento de plantas de asfalto y concreto, y tampoco se han desarrollado trabajos nocturnos a cargo de Consorcio Vías JCSR.

-**Suelo:** Título minero y licencia ambiental para explotación de materiales.

El suministro de materiales pétreos se realiza por parte de la empresa Triturados y Vías La Caima, Soportes entregados en el Informe No. 1.

-**Autorización de Sitios de disposición de materiales sobrantes:** Se da continuidad a la disposición final de material de excavación en el sitio autorizado por La secretaria de planeación, área que se encuentra en el municipio de Lérida para la disposición final de residuos de excavación y demolición, el cual se encuentra localizada en las coordenadas geográficas 4°50'40.54628" N, 74°51'49.15714" W.

-**Permiso para ubicación temporal de campamentos:** Se da continuidad al área de trabajo que opera como bodega, punto de atención al usuario, oficina, alojamiento, uso de unidad sanitaria, entre otros.

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

PROYECTO 1: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	IDENTIFICACIÓN PAC-2.1-04

IMPACTOS A MANEJAR

Generación de procesos de sedimentación Contaminación del aire
Contaminación del suelo Afectación cobertura vegetal
Incremento de demanda de recursos naturales Alteración calidad visual y paisajística

ACCIONES A EJECUTAR

Medida De Manejo Materiales Pétreos:
Los materiales de construcción son almacenados al interior de la obra, y cuando se requiere son cubiertos con plástico.

Materiales Para Concreto:
En cuanto al manejo del cemento, este viene empacado en sacos, los cuales se almacenan principalmente en bodega, en un sitio seco y aislado del suelo mediante polietileno, aislado de la intemperie y protegido de condiciones climáticas adversas.

PROYECTO 3. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES	IDENTIFICACIÓN PAC-2.3-06

IMPACTOS A MANEJAR

Accidentes de tránsito. Conflictos con la comunidad

ACCIONES A EJECUTAR

Implementando una adecuada señalización se reduce el riesgo de incidente y/o accidente en las obras, se realiza el aislamiento de los frentes de trabajo con polisombra y se realiza la instalación de señales preventivas informativas, con el fin de informar a la comunidad, peatones y transeúntes acerca de las condiciones del área de trabajo.

ROYECTO 4: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	IDENTIFICACIÓN PAC-2.4-07

IMPACTOS A MANEJAR

Afectación de áreas de cultivos Cambios de uso del suelo.
Alteración calidad visual. Afectación fauna.
Afectación cobertura vegetal

ACCIONES A EJECUTAR

Excavaciones y material de demolición: Se realiza la disposición final en el sitio autorizado por la administración municipal.

Transporte de RCD: Los vehículos destinados para tal fin tienen involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, la pérdida del material durante el transporte. El contenedor o platón está constituido por una estructura continua que en su contorno no contiene roturas, perforaciones, ranuras y espacios. La carga transportada es cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas.

PROYECTO 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES SÓLIDOS	DENTIFICACIÓN PAC-2.5-08

IMPACTOS A MANEJAR

Contaminación del aire Contaminación del suelo Afectación cobertura vegetal Afectación salud de trabajadores Proliferación de vectores
ACCIONES A EJECUTAR
Se entregan bolsas negras al equipo de trabajo para la recolección de residuos, y estos son gestionados por la empresa de servicios públicos de Lérida y para el mes de julio se realizó la instalación de puntos ecológicos en tres (3) frentes de trabajo.

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO

PROYECTO 2: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES	IDENTIFICACIÓN PGH-3.2-10
IMPACTOS A MANEJAR	
Contaminación del agua. Afectación zonas de recarga hídrica. Contaminación por indebida disposición de residuos especiales y peligrosos.	
ACCIONES A EJECUTAR	
Se da continuidad al permiso de uso de unidades sanitarias con la comunidad.	

PROGRAMA 04. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

PROYECTO 1: MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL	IDENTIFICACIÓN PBSE-4.1-11

IMPACTOS A MANEJAR

Afectaciones en la capa vegetal Natural
Remoción de la capa superficial del terreno natural

ACCIONES A EJECUTAR

- El día 12 de agosto de 2025 se atendió visita técnica por parte de Cortolima, con el propósito de verificar la viabilidad de la tala del árbol de la especie Olivo negro (Bucida buceras). Durante la inspección, la autoridad ambiental corroboró la condición de inclinación del individuo hacia el tendido eléctrico de mediana tensión, así como el riesgo que representaba para vehículos y transeúntes, además de la interferencia con el desarrollo de las redes de alcantarillado y gas. Esta revisión permitió sustentar la necesidad de la intervención, la cual posteriormente se ejecutó contando con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por riesgo.
- Por lo anterior se realizó la tala de un individuo arbóreo de la especie Olivo negro (Bucida buceras), contando con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal por riesgo. La intervención fue necesaria dado que el árbol presentaba una inclinación hacia el tendido eléctrico de mediana tensión, lo cual representaba un peligro potencial para vehículos y transeúntes. Adicionalmente, su ubicación interfería con el desarrollo de las obras de instalación del sistema de alcantarillado y de la red de gas, lo que hacía indispensable su retiro bajo criterios técnicos y de seguridad.
- Los trabajos de descapote son limitados solamente en las áreas requeridas para las obras del proyecto.
- No se permite el procedimiento de desmonte mediante quema, así sea controlada, ni el uso de herbicidas.
- Se vela por el buen cuidado de los árboles y/o de la cobertura vegetal.

PROGRAMA 05. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES	IDENTIFICACIÓN PMIT-5.1-15
IMPACTOS A MANEJAR	
Contaminación del agua Contaminación del aire Aumento en decibeles de ruido Perdida del suelo Contaminación del suelo Alteración uso actual del suelo Afectación áreas sensibles ambientales Afectación de la cobertura vegetal Afectación Especies endémicas Alteración de calidad visual Afectación en la salud de los trabajadores	
ACCIONES A EJECUTAR	
En el sitio o área de influencia del proyecto se cuenta con un sitio para el acopio temporal de insumos de obra, para el acopio de equipos pequeños y herramientas de trabajo. El sitio se encuentra ubicado en la zona urbana del Municipio de Lérida Tolima.	

PROYECTO 3: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	IDENTIFICACIÓN PMIT-5.3-17
IMPACTOS A MANEJAR	
Contaminación del aire Contaminación del agua Contaminación del suelo Contaminación del agua Aumento de ruido Pérdida del suelo Alteración uso actual del suelo Afectación de la cobertura vegetal Afectación de especies de fauna y flora	
ACCIONES A EJECUTAR	

Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo la operación de la siguiente maquinaria y vehículos:
Maquinaria Amarilla
-Retroexcavadoras case
-Excavadora de Oruga
-Motoniveladoras
-Compactadora
Volquetas:
SWW 281

COMPONENTE SOCIAL

Actividades

- se realizaron actividades de control y seguimiento social al contratista y todos los sub contratistas involucrados en el proyecto, logrando mitigar, compensar, corregir y prevenir los impactos directos e indirectos sobre la comunidad del AID, para esto, toda actividad constructiva del proyecto fue guiada desde el punto de vista social por los proyectos especificados en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA en adelante), asociados a cada actividad y en cada etapa del proyecto. Su objetivo principal es prevenir conflictos legales por daños que puedan surgir durante los trabajos.
- Se realiza acompañamiento en el levantamiento de actas de vecindad inicial dentro del área de influencia directa del proyecto.
- El día 21 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión con el Comité de Veeduría donde la interventoría hizo presencia, espacio en el cual se socializaron los avances y alcances del proyecto. La veeduría ciudadana es un mecanismo de participación y control social mediante el cual la comunidad organizada puede vigilar, supervisar y hacer seguimiento a la gestión pública y a la ejecución de proyectos de interés colectivo. Entre los principales beneficios de contar con este

comité se destaca el fortalecimiento de la transparencia en la gestión, la geberacion de confianza con la comunidad, la identificación temprana de inquietudes o posibles conflictos y el acompañamiento permanente al cumplimiento de la obligaciones ambientales y sociales del proyecto. Como resultado de la reunión, quedo establecido como compromiso la realización de un recorrido del 21 de septiembre de 2025 en los frentes de trabajo, con el fin de verificar de manera conjunta el desarrollo de las actividades y atender de forma directa las observaciones de la comunidad.

Comentarios y recomendaciones.

- La interventoría solicita al contratista mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o que permanezcan dentro de la construcción o de los transeúntes que circular por áreas aledañas a la obra de conformidad con las normas vigentes.

- Se exige utilizar el personal mínimo requerido, en los términos de referencia para la Obra, así mismo este personal deberá de contar con Uniforme y Carnet y/o distintivos como Chaleco y Carnet (El Carnet deberá contener como mínimo los siguientes datos: identificación (nombres y apellidos), documento de Identidad, profesión, cargo, objeto y número del contrato) que permita su fácil reconocimiento e identificación por parte del personal de la Administración Municipal, Autoridades y comunidad en general.

- La interventoría recalca la importancia de mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta.


ISSA NIYIRETH DEL CASTILLO V.
Profesional HSEQ

CARLOS FERNANDFO CUBIDES B.
Especialista Ambiental

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO.

Tramo 5 calle 7ma entre Cra 3ra y 4ta

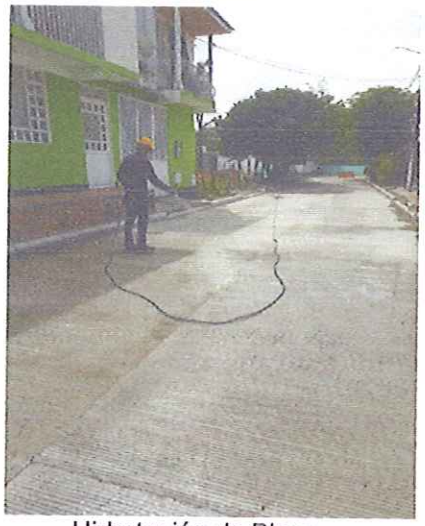

Hidratación de Placa



Cerramiento del costado oeste-este




Cerramiento en costado noreste




cerramiento costado este-oeste

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

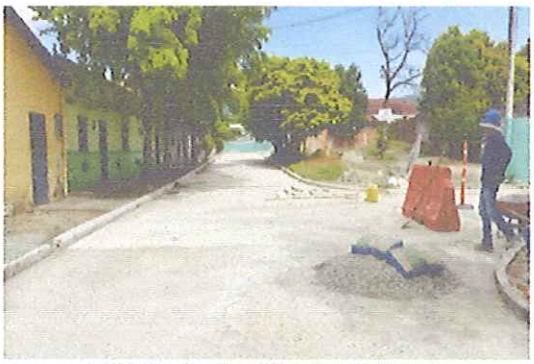 ultimando detalles en el tramo	 Terminación de actividades en tramo, fraguado final


Tramo 06 Cra 3ra entre calles 5ta y 6ta

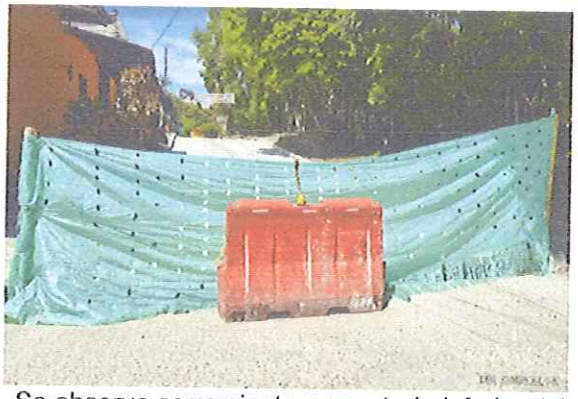

Se observa cerramiento en costado inferior del tramo



Terminación de actividades en tramo, fraguado final

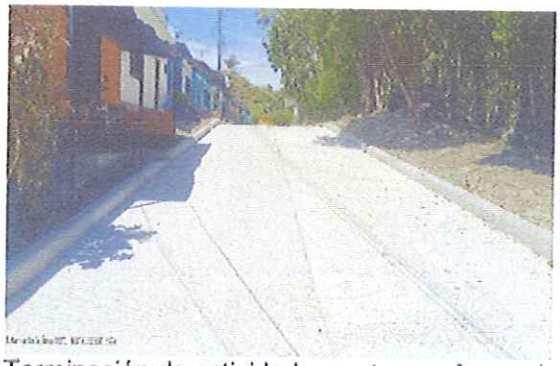

Terminación de actividades en tramo, fraguado final



Cerramiento de la parte superior del tramo

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Tramo 10 Cra 6 entre calle 1ra sur y calle 1ra



Se Evidencia Cerramiento de la parte inferior del Tramo con debida señalización



cerramiento de la parte superior del tramo



finalizando detalles del tramo




Terminación de actividades en tramo, fraguado final

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Tramo 12 Carrera 8va entre calle 3ra y calle 5ta



Se Evidencia Senderos Peatonales y Cerramiento principal del Tramo

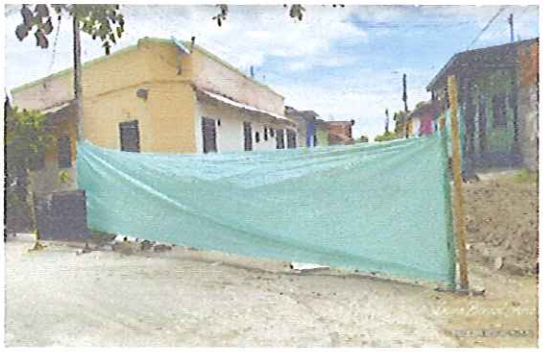

Cerramiento secundario



Recolección de RCD




Supervisión de actividades como cajeo en tramo

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

 Adecuado uso de EPP por parte de los colaboradores	 Supervisión de firma de ATS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Tramo 15 Calle 2 entre carrera 5ta y 6ta

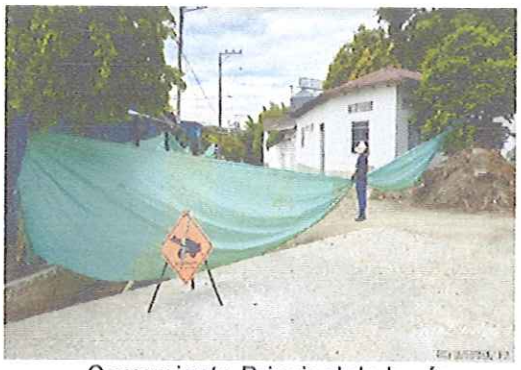

Cerramiento Principal de la vía



Se evidencia que el personal de obra porta los EPP adecuadamente




Recolección de RCD



Se Observa debida señalización en Pozos

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

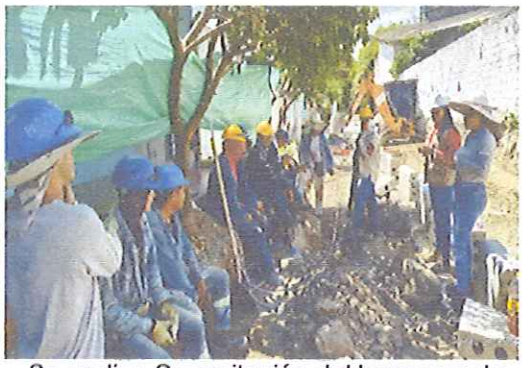 Se realiza Capacitación del buen uso de EPP	 Transporte de Material necesario para la obra


Tramo 16 Cra 6ta entre calle 5ta y 3ra



Cerramiento frontal




Inspección de obra y EPP

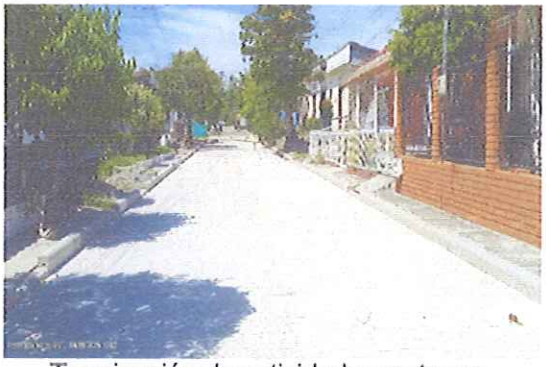

Terminación de actividades en tramo, fraguado final



Se evidencia orden y aseo en este tramo

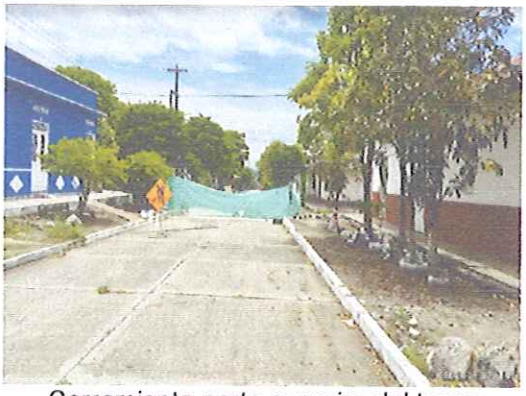

Cerramiento parte superior del tramo



Cerramientos laterales

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS


Tramo 17 Calle 2da sur entre Cra 14 y 16



Se evidencia cerramiento y senderos peatonales Temporales



Cerramiento de costado interior de obra y Pasacalle informativa

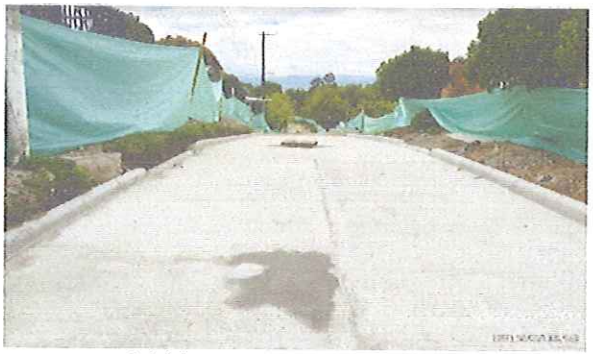

debido cerramiento del tramo




Buen uso de EPP por parte del personal del contratista

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS




Capacitación por parte del contratista e interventoría

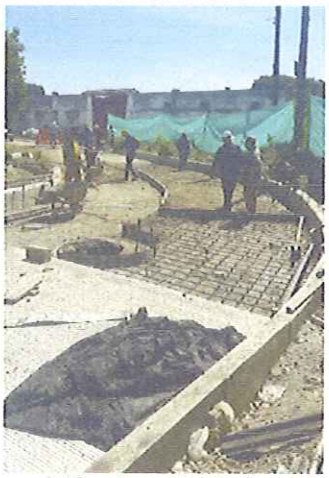

supervisión de actividad en obra

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Tramo 18 Calle 4 entre Carrera 5 y Quebrada el Jordán

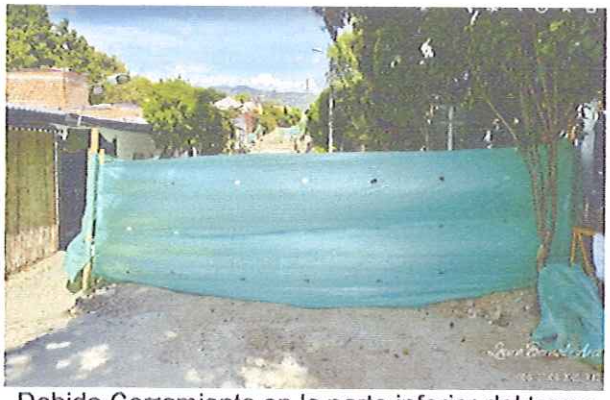


Debido Cerramiento en la parte inferior del tramo



Cerramiento en la parte superior del tramo



Acopio de cemento

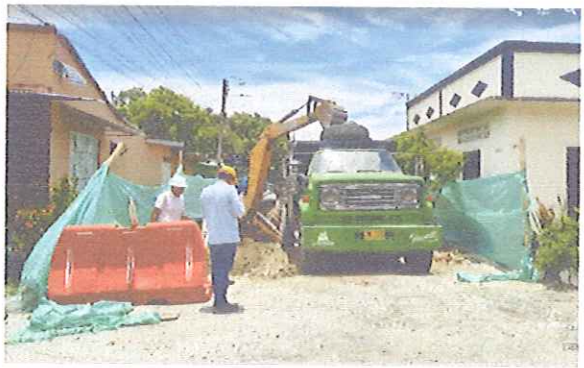

Recolección de RCD

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

 Acompañamiento por parte de interventoría en las actividades del tramo	 Punto Ecológico

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

OTRAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Reunión de veeduría









GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Visita Técnica Cortolima al Tramo 12










GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Entrega de Dotación para el área Administrativa



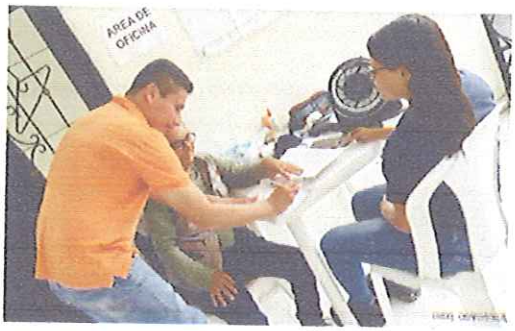





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS








GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Capacitación Ambiental con el acompañamiento de la Interventoría

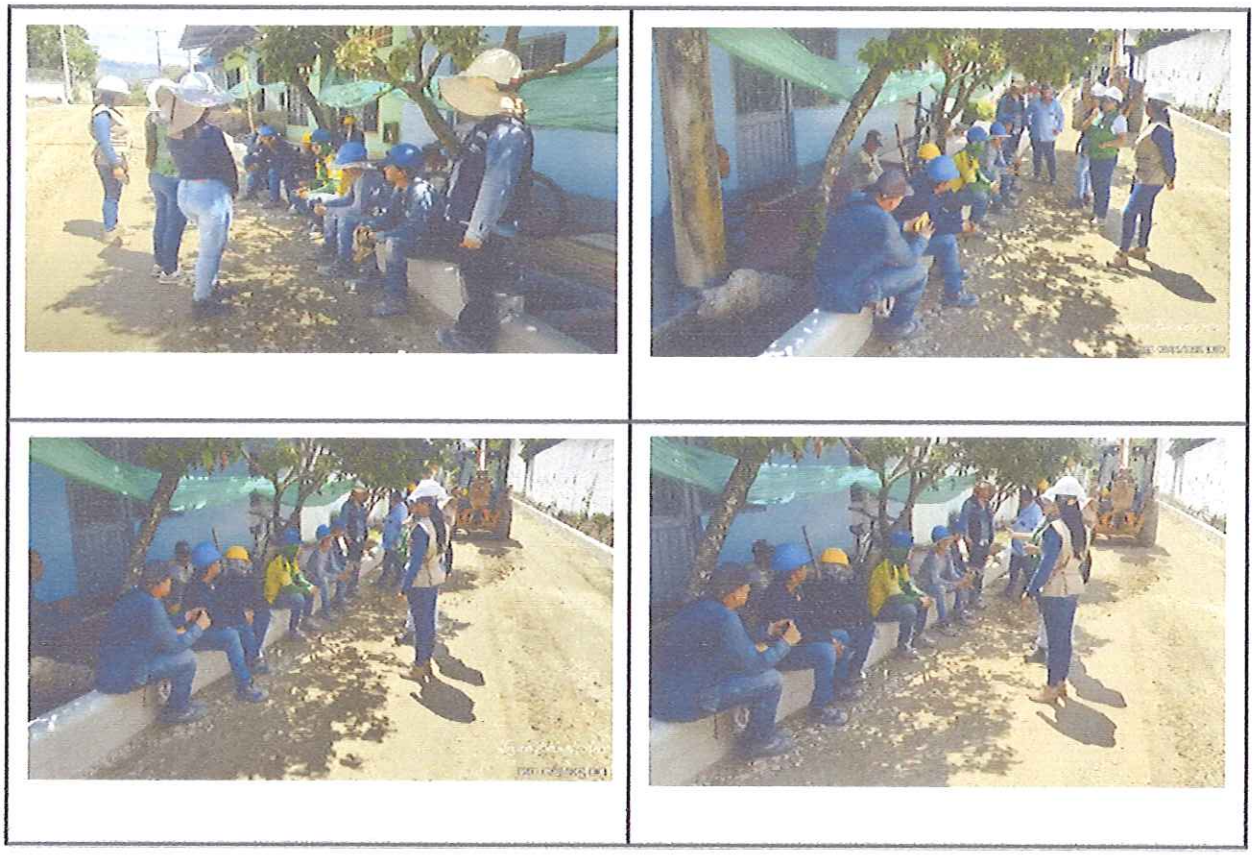

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Capacitaciones del contratista con el acompañamiento de la Interventoría











GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Visitas con Diligenciamiento de Actas de Vecindad

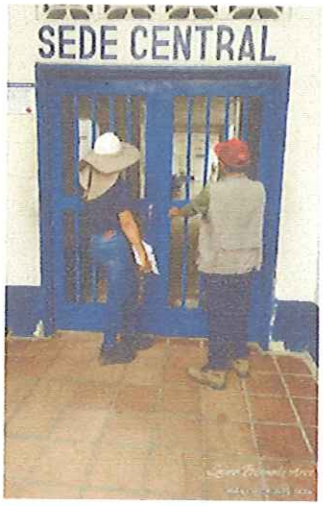

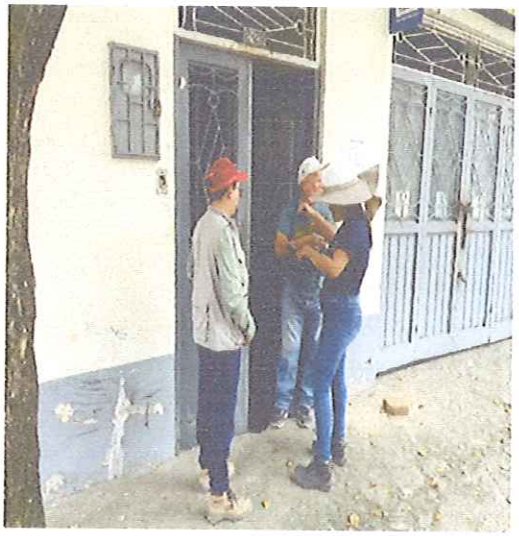






GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

Inspección de firma de Permisos de Trabajo y ATS







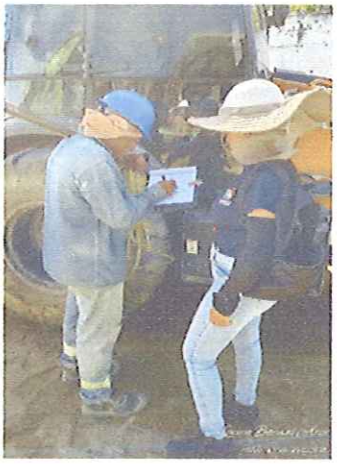

OTRAS EVIDENCIAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS



Acopio Principal en Garaje de Oficina



Herramientas Menores Civiles



Señalización de pozo



Acopio de Material



Compactadora en buenas condiciones



Pasa calle informativa

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS



volqueta con porta afiche con la información del contrato en ejecución



Retroexcavadora con porta afiche con la información del contrato en ejecución



Mixer y personal en obra en la aplicación del concreto



Inspección de Botiquín y extintor en la segunda retroexcavadora

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO No. 1507 DEL 31 DE MARZO DE 2025 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA"	INVERSIONES AGM SAS

ANEXOS SST

Anexo 1 Formato listado de Personal

Anexo 2 Inducciones

Anexo 3 Acta COPASST

Anexo 4 Acta CCL

Anexo 5 Afiliaciones y planillas de seguridad social

Anexo 6 Formato y entrenamiento

Anexo 7 Inspecciones Preoperacionales

Anexo 8 Permisos de trabajo y ATS

Anexo 9 Formato de entrega de EPP y Dotaciones

ANEXOS SOCIO-AMBIENTAL

Anexo 10 Registro de asistencia capacitación ambiental

Anexo 11 Acta de Permiso de aprovechamiento forestal en riesgo

Anexo 12 Permiso Uso de Unidades Sanitarias

Anexo 13 Documentos Maquinaria y Volquetas.

Anexo 14 Acta de Reunión Veeduría.

Atentamente:

INVERSIONES AGM SAS
R/L. MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS
NIT: 901.826.372-9

136

LISTADO DE PERSONAL CONSORCIO VIAS JCSR

ANTIGUOS

ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO	DIRECCIÓN	CORREO ELETRONICO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	CONTACTO DE EMERGENCIA	FECHA DE RETIRO	NOVEDADES	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PLANILLA
CONSORCIO VIAS JCSR																	
1	DIEGO FERNANDO	GIRON SANABRIA	5.820.803	DIRECTOR DE OBRA	3114867660	MZ 36 CASA 3 SANTA ANA	[illegible]	9/05/2025	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFATOLIMA	ROSALBA SANABRIA 3143496902			RADICADO	
2	JUAN DANIEL	GAMBOA GALEANO	1.110.444.787	RESIDENTE DE OBRA	3172824601	CALLE 67 N 5-26 TORRE 1, 403	[illegible]	9/05/2025	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFATOLIMA	ADRIANA MARCELA CALDERON 3166248665			RADICADO	
3	ANDRES JOSE	CARDENAS GUZMAN	1.110.450.648	SUPERVISOR SST	3152110405	MZ 45 CASA 3 JARDIN SANTANDER	andre21ab@hotmail.com	9/05/2025	SALUD TOTAL	SURA	COLPENSIONES	COMFATOLIMA	DILLCY GUZMAN 3167128696			RADICADO	
4	ANGELLY ELIANA	QUINTERO CASTAÑO	1.109.386.750	AUXILIAR SST	3015511323	MZ 1 CASA 17 MINUTO DIOS 2	ELIANAQ2130@GMAIL.COM	19/05/2025	ASMET SALUD	SURA	PORVENIR	COMFENALCO	GUIOMAR CASTAÑO 3134279520			RADICADO	
5	GUILLERMO	RODRIGUEZ MACHADO	1.110.540.018	TOPOGRAFO	3223660449	MZ 20 CASA 1 GALARZA	[illegible]	9/05/2025	SALUD TOTAL	sura	PORVENIR	COMFATOLIMA	MIYERLAY MACHADO 3116709907			RADICADO	
6	JOSE JAVIER	ÑUNGO TRUJILLO	5.938.212	AUXILIAR OFICIOS VARIOS	3115382721	CRA 6 N 11-19 CENTRO		19/05/2025	NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	COMFENALCO	INGRIS CHACON 3143426027			RADICADO	
SUAREZ CONSTRUCCIONES JSC																	
7	NELSON ENRRIQUE	CARDOZO	83.248.099	MAESTRO OBRA	3222445148	RESERVA SAN FERMIN SALADO	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFENALCO				RADICADO	
8	JHON	RODRIGUEZ	2.235.462	AUXILIAR OFICIOS VARIOS	3228870142	CRA 3 SUR # 39-05 B/ URIBE URIBE	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	COMFENALCO				RADICADO	
9	FERNEY	ROMERO MONTIEL	5971712	AUXILIAR OFICIOS VARIOS	3106199071	CRA 5 SUR 18-35 YULDAIMA	NO TIENE		NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	COMFENALCO				RADICADOS	
10	ALVARO	CUBILLA ENCISO	93.362.264	AYUDANTE	3222343103	CALLE 37 N 3 - 31 SUR	NO TIENE	9/05/2025	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	COMFENALCO				RADICADO	
11	LUIS ANDRES	GARCIA JARAMILLO	5.569.687	AYUDANTE			NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	COMFENALCO				RADICADOS	
12	ANDRES ALEJANDRO	MORENO PINEDA	80.464.277	AYUDANTE	3161090776	MZ 6 CASA 7 BARRIO PAJONALES	NO TIENE	11/06/2025	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFENALCO	XIOMARA MORENO 3106368677			RADICADOS	
13																	
14																RADICADO	
ZR CONSTRUCCIONES																	
15	EDILBERTO	SALGADO RUIZ	14.260.020	MAESTRO	3235771216	SAN ISIDRO IBAGUE	NO TIENE	9/05/2025	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	LUZ MILA SALGADO 3118360458			PLANILLA	MAYO
16	DUBER ERNESTO	TIGREROS PERDOMO	93.238.407	OPERADOR		CRA 9 NUMERO 42-14 IBAGUE	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMFENALCO	PAULA ANDREA 3208405030			PLANILLA	MAYO
17	JHONATHAN STEVEN	GUZMAN	14.295.885	AYUDANTE	3105817611	LERIDA	NO TIENE	9/05/2025	SALUD TOTAL	POSITIVA	PROTECCION	COMFENALCO	JOHAN PAOLO RUIZ 32032066602			PLANILLA	MAYO
18	LUIS MIGUEL	SANTERO MORALES	1104687455	AYUDANTE	326297797	LERIDA	NO TIENE	9/05/2025	MUTUALSER	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	DIANA SANTERO 3148452312			PLANILLA	MAYO
19	CARLOS ANDRES	FLORES	1.066.723.301	AYUDANTE	3214909746	LERIDA	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	URLENDA BRIJALBA 3224296368			PLANILLA	MAYO
20	KEVIN ANDRES	FLORES	1.104.951.065	AYUDANTE	3212469683	SAN ISIDRO IBAGUE	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	ERIKA SIAKGADO 3114869616			PLANILLA	MAYO
21	JUAN	LONDOÑO	1.013.605.907	MAESTRO	3208238102	MZ D CASA 25 REFUGIO	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	DIANA MURILLO 3118006010			PLANILLA	MAYO
22	LUIS	TIGREROS	1.110.570.542	OPERADOR	3165767239	COJUNTO PORVENIR SALADO	NO TIENE	9/05/2025	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLFONDOS	COMFENALCO	RAFAEL TIGREROS 3144293867			PLANILLA	MAYO
23	LUIS ALBERTO	PEDRAZA RODRIGUEZ	14.273.322	AYUDANTE		BAARIO RESURGIR LERIDA	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMFENALCO	ANAGARZON 3164927457			PLANILLA	MAYO
24	GABRIEL	GARCIA TORRES	14.254.456	AYUDANTE		LERIDA	NO TIENE	9/05/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO				RADICADO	MAYO
25	HYDELBRAND	LANCHEROS	1.098.704.264	OFICIAL	3116359034	PIRAMIDES DEL NORTE CASA 7	NO TIENE	9/06/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMFENALCO	3102747155 ESPOSA			PLANILLA	JUNIO
26	VICTOR	MARTINEZ	1.110.510.886	AYUDANTE	3208984602	IBAGUE	NO TIENE	9/06/2025	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMFENALCO	3102582797 ESPOSA			PLANILLA	JUNIO
27	VICTOR ALFONSO	LOZANO	1.109.383.189	AYUDANTE	315508093	CALLE 9 N 1 -28	NO TIENE	14/07/2025					NORDIS ZABALA 3213734177			RADICADO	JULIO
28	WILSON ANDRES	MARTINEZ	1.193.049.792	AYUDANTE	3105554651	CARA 7 N 16 - 14 EL SABROSO	NO TIENE	15/07/2024					3105554651 MADRE			RADICADO	JULIO
29	CARLOS HUMBERTO	REINA	14.136.553	AYUDANTE	3244232010	CALLE 4 39 A -4	NO TIENE	9/06/2025	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	CONFENALCO	YULI LILIANA 3144734003				

NUEVOS

ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO	DIRECCIÓN	CORREO ELETRONICO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	CONTACTO DE EMERGENCIA	FECHA DE RETIRO	NOVEDADES	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PLANILLA
1	YAIR ENRRIQUE	SOLANO PEREZ	1.005.416.673	AYUDANTE	3203971323	EL PALMAR	NO TIENE	20/08/2025	MUTUALSER	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	MARISELA 3018049100			RADICADO	AGOSTO
2	GUSTAVO ADOLFO	MAHECHA CANDIA	1.110.536.245	OPERADOR	3203404003	GAVIOTA IBAGUE	NO TIENE	20/08/2025	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	COMFENALCO	MARIA 3112061183			RADICADO	AGOSTO
3																	
4																	
5																	

CONSORCIO VI. JCSR	GUIA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CORPORATIVA

FECHA (dd/mm/aa): 20-08-2025	FACILITADOR: Angelly	FIRMA FACILITADOR: Angelly	
SUPERIOR INMEDIATO: Diego Giron		FIRMA SUPERIOR INMEDIATO	
LUGAR: Ierida - Tolima	DURACIÓN: 4 horas		
DIRIGIDO A: Gustavo Cantia	CARGO: Operador		

Inducción corporativa [X] Reinducción corporativa [ ] Reinducción por cambio de cargo [ ]

TEMA	REALIZADO
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	✓
1.1. Quienes somos	✓
1.2. Hacia dónde vamos	✓
1.3. POLITICAS: Integral Corporativa del Sistema, de prevención de consumo sustancias psicoactivas y de seguridad vial	✓
2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	✓
2.1. Perfil del cargo (funciones)	✓
2.2. Estructura organizacional (Organigrama)	✓
2.3. Plan de calidad	
3. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	✓
3.1. Objetivos, metas y programas aplicables al proceso	✓
3.2. Procedimientos aplicables a la actividad	✓
3.3. Formatos aplicables al proceso y otros	✓
4. REQUISITOS LEGALES	✓
4.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
4.2. Reglamento Interno de Trabajo / Ley 1010 de 2006. ACOSO LABORAL	✓
4.3. Copasst	✓
4.4. Requisitos legales SSTA y otros suscritos por la Organización	✓
4.5 Derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales	✓
5. PROGRAMA DE GESTIÓN SGI	✓
5.1. Peligros, riesgos y controles operacionales	✓
5.2. Aspectos e impactos ambientales del proceso	✓
5.3. Controles operacionales (procedimientos de trabajo seguro aplicables)	✓
5.4. Normas en el uso de epp y dotación	✓
5.5. Manejo seguro de sustancias químicas	✓
5.6. Procedimiento para la notificación de incidentes y accidentes de trabajo	✓
5.7. Plan de emergencias (prevención y actuación en caso de..., brigadistas, puntos de encuentro)	✓
5.8. Manejo de residuos	✓
5.9. Vestigios arqueológicos	✓
6. OTROS	✓
6.1. Normas especificas comunidades	✓
7. ENTRENAMIENTO EN CAMPO A CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO (a criterio del superior inmediato y de conformidad con el tipo de trabajo a desarrollar)	✓
7.1. Presentación de los compañeros de trabajo y reconocimiento de su puesto de trabajo.	✓
7.2. Información especifica de la actividad a desarrollar (Especificaciones de equipos, herramientas y maquinaria a utilizar si aplica)	✓

FIRMA (s) ASISTENCIA:	FECHA PRÓXIMA REINDUCCIÓN (en caso aplicable):
Gustavo Cantia	

GU-001. Rev.01

Frecuencia realización: Al ingreso de personal o cuando se requiera re inducción

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JC&R	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108 REVISIÓN: 00

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Lerida tolima Fecha: 19-08-2025

Nombre: Gustavo Cantia Edad: 31 Tel: 3203404003

Identificación No: 1110538245 Dirección: Cl Bayoteo Ibague

Empresa: ZR Cargo: Operador

RH: O+ ARL: Positiva Proceso Induccion

Contacto Emergencia: maria Tel/Cel: 3112061183

1. **¿Nuestro objetivo principal en seguridad y salud en el trabajo es?**

   A. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
   B. Cero Accidentes y Daños a las personas, ambiente, infraestructura, comunidad y cliente.
   C. Entregar la obra en el menor tiempo posible.

   B

2. **Responda F si es Falso o V si es Verdadero en los ( ) las siguientes afirmaciones:**

   A. La política de Seguridad y Salud en el Trabajo busca la prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales (V)
   B. La compañía permite el consumo, la posesión, comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas (F)
   C. El comité de convivencia laboral debe ejecutar el procedimiento de quejas para notificar casos de presunto de acoso laboral (V)
   D. Es obligación del empleador el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo (V)
   E. Puedo iniciar o ingresar a realizar actividades SIN previa autorización de mi jefe inmediato y SIN firmar permisos de trabajo y ATS. (F)

3. **Encierre en un círculo las actividades que debe realizar antes de iniciar sus labores en obra**

   Realizar y firmar los permisos de trabajo y ATS correspondientes.

   Realizar las inspecciones preocperacionales de los vehículos, equipos o herramientas que vaya a utilizar en el día

   Asistir a charla diaria de seguridad y salud en el trabajo.

   Inspeccionar las condiciones del área de trabajo y señalizar la zona.


4. **¿Cuál es la velocidad máxima de transito de los vehículos y maquinaria en obra? Señale con una X**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108
		REVISIÓN: 00

5. **Señale en el dibujo que elementos de protección individual usted debe utilizar, mientras realiza sus actividades en obra.**

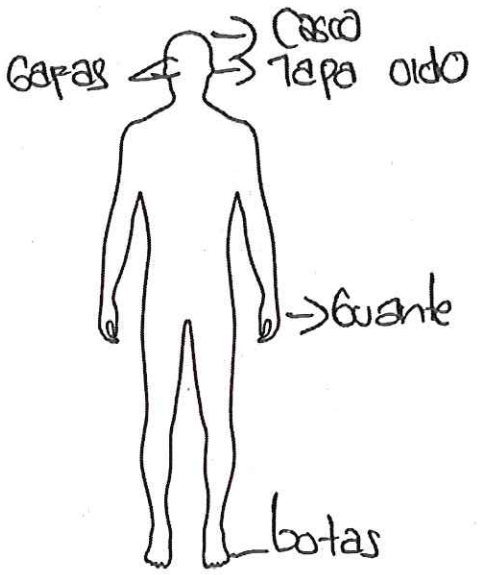

6. **¿Quién direcciona las actividades operativas en obra (nombre y cargo de su jefe directo)?**

Daniel gamboa.

7. **Encierre en un círculo las responsabilidades que usted tiene como trabajador:**

Reportar condiciones inseguras y actos inseguros.

Procurar el cuidado integro de su salud

Cometer actos inseguros

Tener EXCELENTE comportamiento en la empresa, con sus superiores, compañeros y personal de la comunidad

Fumar en obra


Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la Empresa

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JC&R	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108 REVISIÓN: 00

8.Señale con una X las consecuencias que usted puede sufrir por la exposición de peligros en obra.

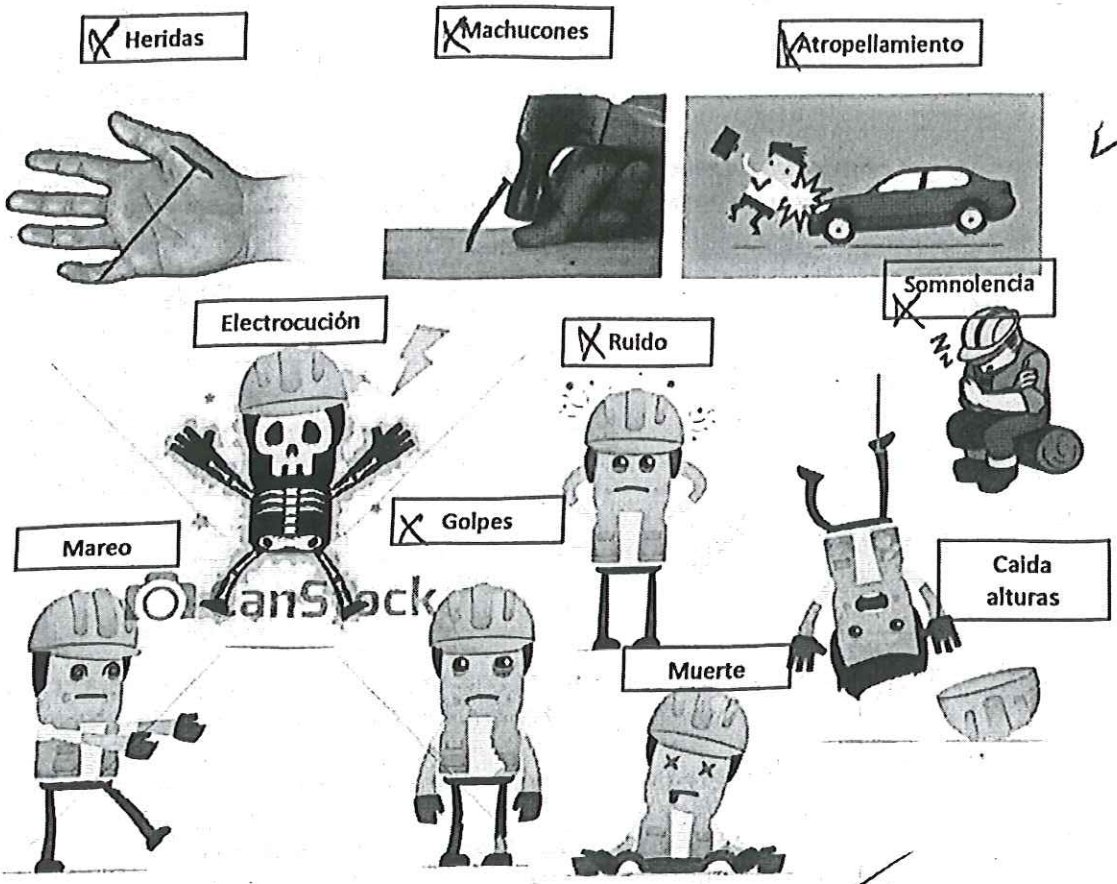

9.Enuncie 5 peligros a los cuales está expuesto:

1. Golpe
2. Calor
3. Machucones
4. Ruido
5. Somnolencia.

10.En caso de emergencia por sismo usted debe:

A. Conservar la calma, ubicarse en zonas seguras y protegerse de objetos que puedan caerle encima.

B. Perder la calma y salir corriendo.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108 REVISIÓN: 00

C. Llamar a un amigo.

11.Mencione el procedimiento a seguir en caso de Accidente de trabajo:

① Reportar
② Prestar primeros auxilios.

12.De acuerdo al perfil de competencias del cargo que va a desarrollar describa las funciones, responsabilidades y alcance en materia de producción y seguridad y salud en el trabajo.

Funciones: Operar la maquina,
• llevar a cabo las intrucciones del ingeniero

Responsabilidades:
• Cumplir las Normas de Seguridad y Salud en el trabajo

Alcance: Suspender la operacion de la Maquina Sino cumple con el mantenimiento Requerido

13.Marque con una X las faltas graves en seguridad y salud en el trabajo que pueden ocasionarle el despido inmediato de la empresa.

X a. Actos inseguros en trabajos de alto riesgo alturas, espacios confinados y excavaciones.
b. Faltar al trabajo.
X c. Operar maquinaria, equipo o herramienta para el cual no está autorizado.
X d. Realizar o involucrarse en actividades para el cual no está autorizado o no ha sido asignado.
e. Llegar tarde a trabajar.
X f. Presentarse a laborar bajos los efectos de sustancias psicoactivas, asimismo el consumo, la posesión, comercialización y/o distribución en la obra, del mismo.
X g. Presentarse con armas blancas o armas de fuego en la obra.
h. No reportar, reportar extemporáneamente o fingir un accidente de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACION	EXCELENTE (E): ENTRE 15 Y 16 RESPUESTAS ACERTADAS	ACEPTABLE (A): ENTRE 12 Y 14 RESPUESTAS ACERTADAS	INSUFICINETE (I): MENOS DE 11 RESPUESTAS ACERTADAS

Nombre: GUSTAVO C.C 1110 538 245 Firma: GUSTAVO

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JC8R

COMPETENCIA DEL PERSONAL

IR A INDICE

CARGO: Conductor y/o Operador	PROCESO: Todos los procesos	CARGO AL QUE REPORTA: Ingeniero residente

1 RESPONSABILIDAD FUNCIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2 AUTORIDAD	3 HABILIDADES
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	Suspender la operación de la maquina o equipo si no cumple el mantenimiento requerido.	Comunicación: Precisión, oportunidad y claridad en la información que suministra. Permanente comunicación con el superior inmediato y el personal relacionado.
Conducir vehiculo u operar maquinaria.	No ejecutar actividades para las cuales no este destinada la maquina o equipo, ó que infrinjan sus especificaciones de operación.	Disposición en la prestación del servicio: Buena disposición para realizar y cumplir sus labores.
Conocer el Sistema de Gestión SST de la Empresa e identificar la participación en el mismo.		Buena redacción: Reportes y demás documentos del sistema (registros) con redacción clara y fácil comprensión. Envió oportuno de la información.
Cuidar y custodiar adecuadamente el vehículo y/o maquina asignada.		Trabajo en equipo: Participación activa con su grupo de trabajo para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas . Promover y mantener buena ambiente laboral y adecuadas relaciones interpersonales.
Diligenciar en forma completa y con la información veraz las planillas y formatos de control.		Habilidad manual: Excelente conocimiento de operación y manejo de la maquinaria, equipo o herramienta relacionada a su labor.
Reportar los malos funcionamientos del equipo que tiene a su cargo al superior inmediato y en los medios destinados para ello (formato de control).		Prácticas seguras: Cumplimiento y divulgación de las normas de salud, seguridad y medio ambiente para la prevención de lesiones, enfermedades e impactos ambientales.
Solicitar y verificar los mantenimientos preventivos del equipo a su cargo al líder de infraestructura y activos.		
Transportar personal (unicamente personal de la empresa)o materiales requeridos en obra deacuerdo a las necesidades del Ingeniero de obra.		
Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación.		
Llevar a cabo instrucciones diarias del ingeniero de obra o programa de trabajo .		
Responder por el inventario del vehiculo o maquina asiganda y dar respuesta de su ubicación y estado.		
SG-SST		
Cumplir las normas de seguridad y salud del consorcio para prevenir daños a la integridad física, a los bienes materiales o al medio ambiente.		
Reportar incidentes, accidentes de trabajo y ambientales ocurridos al personal a su cargo o en su área.		
Cumplir las normas de salud, seguridad , medio ambiente y calidad de la Empresa para prevenir daños a la integridad física, a los bienes materiales o al medio ambiente.		
Procurar el cuidado integral de su salud.		
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.		
Participar en las actividades de capacitación en seguridad , salud en el trabajo y ambiente definidas en el plan de capacitación.		
Utilizar y velar por la utilización de los EPI en los frentes de trabajo.		
Reportar incidentes, accidentes de trabajo y ambientales ocurridos al personal a su cargo o en su área, o que los puedan propiciar.		
SG-SST (Mejora Continua)		
Reportar acciones para el mejoramiento continuo del proceso.		
OTROS		
Controlar la vigencia de los documentos legales del vehículo y personales, e informar la próxima caducidad de estos.		
Mantener en adecuado estado de limpieza el vehículo.		
No exceder las capacidades de carga, de los camiones y camionetas.		
Otras definidas por el encargado de Mantenimiento.		

NOMBRE DEL TRABAJADOR: **FIRMA DEL TRABAJADOR:**

NOTA: Esta autoridad complementa la definida en los procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema de Gestión SST - SG-SST **FT-019. REV 00**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JOBR

VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA

IR A INDICE

INSTRUCCIONES

1. Revise la hoja de vida con sus soportes
2. Describa en el punto I la competencia requerida (ver competencia del personal FT-019)
3. Confronte la competencia requerida con la competencia real
4. Concluya con SI o NO si con los soportes disponibles el aspirante al cargo o trabajador es competente
5. Plantee conforme su criterio, los temas que deben ser fortalecidos para aumentar la competencia conforme los requisitos de la Empresa

	I. COMPETENCIA REQUERIDA			
	EDUCACIÓN	ENTRENAMIENTO	HABILIDADES	EXPERIENCIA
CARGO: CONDUCTOR Y/O OPERADOR	Lecto escritura, bachiller, conductor: curso de manejo defensivo. Operador: certificacion de operador de maquinaria amarilla correspondiente. Nota: conductor de volqueta que no cuente con auto carpado debe ,Capacitacion en el nivel trabajador autorizado y con reentrenamiento vigente cuando aplique.	**SG-SST:** Inducción y actualización del programa de seguridad y salud en el trabajo Inducción y actualización del plan de emergencias **Específicos:** Responsabilidad y Autoridad Documentación del sistema aplicables a su cargo.	Comunicación Disposición Buena Redacción Trabajo en equipo Habilidad Manual Prácticas seguras	Conductor: 12 meses Certificada. Operador: 3 años de experiencia certificada
	II. COMPETENCIA REAL			
	EDUCACIÓN	ENTRENAMIENTO	HABILIDADES	EXPERIENCIA
NOMBRE:	Bachiller.	Cuenta con lo requerido. Para el cargo	Cuenta con lo requerido Para la Labor	
	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO

III. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN			
CUMPLE COMPETENCIA	SI	NO	Capacitar o reevaluar o buscar otra opción

IV. ACCIONES		
ACTIVIDAD	PLAZO (dd/mm/aa)	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

EVALUADOR:	CARGO:	FECHA EVALUACIÓN:	FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN:
Angelly	Aux SST		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	ACTA DE NOTIFICACION DE PELIGROS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	AC- 002
		REVISIÓN: 00

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, de conformidad con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019; el consorcio procedió a notificarle de forma verbal y por escrito al trabajador los riesgos a los cuales está expuesto en el desarrollo de sus labores y medio circundante, de las medidas preventivas que debe cumplir para evitar accidentes y de las normar y procedimientos de la empresa.

Conforme a lo expuesto, Yo ..GUSTAVO CANDIA..... identificado con CC N° .1110538211.... con el cargo de .OPERADOR..... trabajador del CONSORCIO VIAS JCSR, tengo por conocimiento la presente acta, que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de mis actividades. De esta manera notifico que he recibido del consorcio amplia y suficiente inducción general y adiestramiento operacional donde se me notifico y explico de manera verbal y por escrito los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo, las normas y procedimientos internos del consorcio y los análisis de riesgos de mis funciones; de igual manera, declaro que he recibido los elementos de protección personal para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir con mis obligaciones especificas en mi contrato de trabajo, las normas y procedimientos de seguridad.

Nuestras actividades están comprometidas con los siguientes peligros y medidas de control:

PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Superficies irregulares, distracción del trabajador	Caídas al mismo nivel	Inspección preventiva del estado del suelo. Orden y limpieza de la zona de paso y de trabajo
Trabajo en alturas (mayor a 1.5 mts) Uso de escaleras, andamios y plataformas temporales, huecos en el lugar de trabajo.	Caída a distinto nivel, muerte	Anclar las escaleras al ascender y descender, uso de arnés de seguridad y anclarse en la línea de vida, verificación y uso adecuado de los andamios, solicitar permiso de trabajo, realizar ats, inpección de elementos de protección contra caídas, señalización de área de trabajo, orden y aseo, comité de orden y aseo.
Manipulación manual de objetos y herramientas en altura. Cargas suspendidas	Caída de objetos	Uso de soga de servicio y contar con bolsa portaherramientas o adiestrar las herramientas, colocar vientos durante el izaje de carga, prohibido estar debajo de la carga.
Tránsito vehicular, maquinaria y vehículos en movimiento	Choque y atropello	Manejo a la defensiva, contar con controlador de tráfico, señalizar la zona de trabajo, prohibido estar en la línea de fuego en maniobra de la maquinaria o vehículo.
Alta, media y baja tensión	Contacto directo/ indirecto	Aplicar las 5 reglas de oro, tener distancia adecuada durante circuitos, cables y barras energizadas, bloqueo y etiquetado.
Posturas inadecuadas, esfuerzo por la manipulación de cargas, movimientos repetitivos	Sobre esfuerzo por la manipulación de cargas	Rotación de personal, prohibido levantar objetos mayores a 25 kg, uso de equipos de carga a cargas excesivas.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR	ACTA DE NOTIFICACION DE PELIGROS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	AC- 002
		REVISIÓN: 00

Radiación UV, radiaciones no ionizante	Lesión o enfermedad por exposición	Uso de capuchones, dotación adecuada y/o uso de bloqueadores
Ruido debido a trabajos con herramientas de golpe, a maquinarias o equipos	Efectos por exposición aniveles superiores al LMP, exposiciones prolongadas	Realizar mantenimiento a los equipos, uso de protección auditiva.
Material particulado	Efectos por exposición aniveles superiores al LMP	Realizar mantenimiento a los equipos, uso de protección respiratoria
Vibración debido a trabajos con herramientas de golpe, maquinas o equipos	Niveles superiores a límites permitidos, exposiciones prolongadas	Tomar pausas activas, ejercicios de pausas activas.
Mecanismos móviles sin protección	Atrapamientos	Verificación y uso adecuado de las herramientas y equipos de poder, no manipular equipos encendidos.
Objetos o superficies punzocortantes, herramientas manuales cortantes	Cortes	Uso de guantes de cuero y cortar
Presencia de animales	Mordeduras, picaduras.	verificar los EPP's verificando la ausencia de insectos dentro de los EPP's, No manipular enjambres de abejas
Sustancias irritantes o alergizantes, sustancias corrosivas, sustancias asfixiantes	Contacto, exposición prolongada, exposición aniveles superiores a límites permitidos	Contar con capacitación de las MSDS de los productos químicos, uso de equipos de protección de acuerdo a la MSDS
Impacto de fragmentos y/o particulas sólidas o liquidas o incandescente	Proyecciones	Uso de lentes contra impacto, uso de careta, uso de peto, mangas.

Nota. Recuerde que tiene prohibido realizar cualquier actividad que no ha sido aprobada mediante permiso de trabajo y ats, y se encuentra fuera de sus funciones y competencia.
La presente acta se firma en constancia por las siguientes personas:
El incumplimiento de cualquiera de estas normas de seguridad y salud en el trabajo puede ser tomada como causal de terminación del contrato y se hará seguimiento de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la empresa.
Agradecemos el cumplimiento de cada uno de las medidas de control tomadas para los diferentes peligros identificados anteriormente

DIRECTOR DE OBRA

Angelly Cuinteo
PROFESONAL SST

Gustavo Canga
TRABAJADOR
CARGO: operador

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

nsorcio Vias JCSR ejecutara la obra CONTRATAR LA MENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA IMA.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

mportante el cumplimiento de la normativa ambiental ente, dado que el inadecuado manejo de los recursos urales puede acarrear sanciones ambientales, por lo erior el suministro y disposicion final de materiales se llevará abo a través de proveedores que cuenten con los permisos bientales, y en caso de requerirse la afectación directa de ecurso natural se tramitará el respectivo tramite ambiental la autoridad competente CORTOLIMA.

MANEJO DE RESIDUOS EN OBRA

principales residuos a manejar en obra son los siguientes:

Residuo	*Almacenamiento*	*Aprovechamiento y/o Disposicion Final*
Aprovechable Pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse en nuevos productos.	En recipiente y/o bolsa de color blanco.	Se entregarán a recicladores de la zona.
No Aprovechable Presentan obstáculos importantes para ser aprovechado	En recipiente y/o bolsa de color negro.	Se entregarán a la empresa de servicios públicos del municipio.
Peligroso Pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente	Se almacenaran en recipiente y/o bolsa de color rojo	Gestor autorizado que preste los servicios de recolección, transporte, tratamiento, disposicion final de residuos peligrosos.
De construcción y demolición de naturaleza inerte generados en obras de excavación y de demolición.	Se almacenan en un area que no interfiera con el tránsito vehicular, ni peatonal.	Los residuos de excavación serán aprovechados en el nivelamiento topográfico de un suelo que sea ambientalmente topográfico de un suelo que sea ambientalmente viable o en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

- Cuando se requiera se realizará la instalación de polisombra y velar por su conservación.
- Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, se trabajará en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo.

SEÑALIZACION

- Se realizará cerramiento del area de trabajo con cinta de demarcación o polisombra cuando se requiera.
- Se deben señalizar los puntos criticos.
- Realizar señalizacion en instalaciones temporales.

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

- Los materiales de construcción serán adquiridos a través de empresa que cuente con licencia ambiental y titulo minero.
- Los materiales de construcción deben ser cubiertos y protegidos de la acción del agua y del aire, cuando se requiera se instalarán lonas de tierra para canalizar el agua derivada de las precipitaciones y evitar el arrastre de materiales.

AGUAS SUPERFICIALES Y SANEAMIENTO

- Se debe hacer un consumo responsable del agua en obra.
- El uso de unidades sanitarias se llevará a cabo a través de los existentes en las locaciones, permisos con la comunidad e instalación temporal, se debe velar por que siempre presenten buenas condiciones de orden y aseo.

MANEJO DE LA VEGETACION, FAUNA Y PAISAJE

- En caso de presentarse individuos forestales en conflicto con las obras, para proceder a realizar la tala debe tener aprobación de la autoridad ambiental y presupuesto aprobado para la actividad.
- En caso de afectar un area con cobertura vegetal se deberá restaurar toda el area intervenida mejorando su condición o dejándola como se encontró.

VEHÍCULOS

- Las instalaciones temporales y bodegas deben permanecer en buenas condiciones de orden y aseo.
- Las instalaciones temporales deberán contar con equipo de primeros auxilios tales como botiquín y camilla.
- Los vehículos que operen para el Consorcio, tendrán documentos vigentes entre ellos SOAT y Certificado de Tecnomecanica.
- Los vehículos cuando transporten material de obra deben tener protegido su volcó.

ACTIVIDADES DE CIERRE AMBIENTAL

- El alcance de esta actividad se refiere al retiro de todo lo que fue utilizado para el desarrollo del proyecto (almacenes, oficinas, maquinaria, equipos, vehículos, entre otros), asi como los residuos generados (no aprovechables, aprovechables, de construcción y demolición).
- El desmantelamiento se llevará a cabo bajo la premisa "las caracteristicas finales de cada uno de los sitios empleados deben ser iguales o superiores a las que tenía inicialmente".

CONSTANCIA DE INDUCCION

Doy fe de que el CONSORCIO VIAS JCSR, me brindo inducción sobre las medidas de Gestión Ambiental a ejecutar y ha resuelto las inquietudes generadas durante el proceso de inducción para el ingreso a la Organización, a través de folleto de inducción establecido para tal fin, tratando los siguientes temas:

- Cumplimiento de requerimientos legales.
- Manejo de residuos en obra.
- Calidad del Aire
- Señalizacion
- Manejo de materiales de construcción.
- Aguas superficiales y saneamiento.
- Manejo de la vegetación, fauna y paisaje.
- Manejo de instalaciones temporales, equipos y vehículos.
- Cierre Ambiental.

Nombres y Apellidos	GUSTAVO CANDIA
No. De Identificación	1110539445
Fecha de Inducción	21-08-2015
Firma de Trabajador	GUSTAVO CANDIA

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VI. JCSR	GUIA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CORPORATIVA

FECHA (dd/mm/aa): 20-08-25	FACILITADOR: Angelica Q.	FIRMA FACILITADOR: Angelica Q.	
SUPERIOR INMEDIATO: Tyler Giron		FIRMA SUPERIOR INMEDIATO:	
LUGAR: Lerida Tolima	DURACIÓN: 4 Horas		
DIRIGIDO A: Yair Enrique Solano	CARGO: Auxiliar		

Inducción corporativa [X] Reinducción corporativa [ ] Reinducción por cambio de cargo [ ]

TEMA	REALIZADO
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	✓
1.1. Quienes somos	✓
1.2. Hacia dónde vamos	✓
1.3. POLITICAS: Integral Corporativa del Sistema, de prevención de consumo sustancias psicoactivas y de seguridad vial	✓
2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	✓
2.1. Perfil del cargo (funciones)	✓
2.2. Estructura organizacional (Organigrama)	✓
2.3. Plan de calidad	✓
3. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	✓
3.1. Objetivos, metas y programas aplicables al proceso	✓
3.2. Procedimientos aplicables a la actividad	✓
3.3. Formatos aplicables al proceso y otros	✓
4. REQUISITOS LEGALES	✓
4.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
4.2. Reglamento Interno de Trabajo / Ley 1010 de 2006. ACOSO LABORAL	✓
4.3. Copasst	✓
4.4. Requisitos legales SSTA y otros suscritos por la Organización	✓
4.5 Derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales	✓
5. PROGRAMA DE GESTIÓN SGI	✓
5.1. Peligros, riesgos y controles operacionales	✓
5.2. Aspectos e impactos ambientales del proceso	✓
5.3. Controles operacionales (procedimientos de trabajo seguro aplicables)	✓
5.4. Normas en el uso de epp y dotación	✓
5.5. Manejo seguro de sustancias químicas	✓
5.6. Procedimiento para la notificación de incidentes y accidentes de trabajo	✓
5.7. Plan de emergencias (prevención y actuación en caso de..., brigadistas, puntos de encuentro)	✓
5.8. Manejo de residuos	✓
5.9. Vestigios arqueológicos	✓
6. OTROS	✓
6.1. Normas especificas comunidades	✓
7. ENTRENAMIENTO EN CAMPO A CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO (a criterio del superior inmediato y de conformidad con el tipo de trabajo a desarrollar)	✓
7.1. Presentación de los compañeros de trabajo y reconocimiento de su puesto de trabajo.	
7.2. Información especifica de la actividad a desarrollar (Especificaciones de equipos, herramientas y maquinaria a utilizar si aplica)	

FIRMA (s) ASISTENCIA:	FECHA PRÓXIMA REINDUCCIÓN (en caso aplicable):
Yair Enrique Solano Perez	

GU-001. Rev.01

Frecuencia realización: Al ingreso de personal o cuando se requiera re inducción

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCBR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108 REVISIÓN: 00

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Lerida Tolima Fecha: 20 de agosto - 2025.

Nombre: José Solano Edad: 28 Tel: 3203978335

Identificación No: 1006016673 Dirección: Barrio Sol Palma

Empresa: ZR R Cargo: Ayudante

RH: Positiva ARL: Positiva Proceso Proceso inducio

Contacto Emergencia: Mariluz Tel/Cel: 3118041990

1. ¿Nuestro objetivo principal en seguridad y salud en el trabajo es?

A. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
X Cero Accidentes y Daños a las personas, ambiente, infraestructura, comunidad y cliente.
C. Entregar la obra en el menor tiempo posible.

2. Responda F si es Falso o V si es Verdadero en los ( ) las siguientes afirmaciones:

A. La política de Seguridad y Salud en el Trabajo busca la prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales (V)
B. La compañía permite el consumo, la posesión, comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas (F)
C. El comité de convivencia laboral debe ejecutar el procedimiento de quejas para notificar casos de presunto de acoso laboral (V)
D. Es obligación del empleador el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo (V)
E. Puedo iniciar o ingresar a realizar actividades SIN previa autorización de mi jefe inmediato y SIN firmar permisos de trabajo y ATS. (F)

3. Encierre en un círculo las actividades que debe realizar antes de iniciar sus labores en obra

Realizar y firmar los permisos de trabajo y ATS correspondientes.

Realizar las inspecciones preocperacionales de los vehículos, equipos o herramientas que vaya a utilizar en el día

Asistir a charla diaria de seguridad y salud en el trabajo.

Inspeccionar las condiciones del área de trabajo y señalizar la zona.


4. ¿Cuál es la velocidad máxima de transito de los vehículos y maquinaria en obra? Señale con una X



Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCBR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108
		REVISIÓN: 00

5. **Señale en el dibujo que elementos de protección individual usted debe utilizar, mientras realiza sus actividades en obra.**

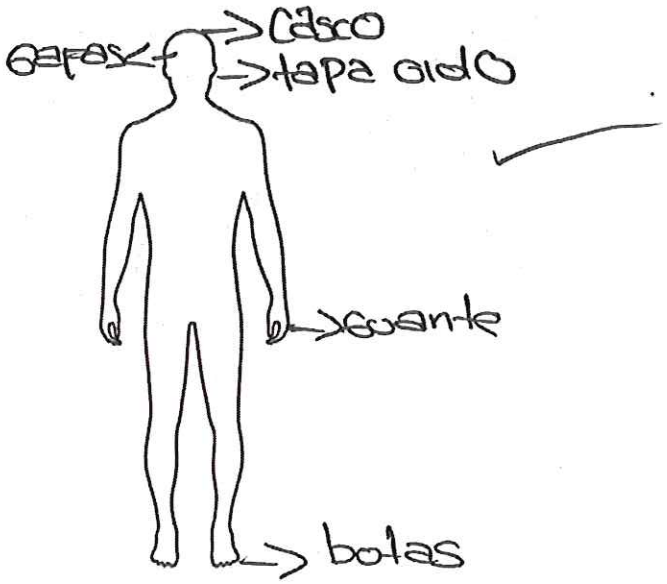

6. **¿Quién direcciona las actividades operativas en obra (nombre y cargo de su jefe directo)?**

Daniel Gamboa.

7. **Encierre en un círculo las responsabilidades que usted tiene como trabajador:**

Procurar el cuidado integral de su salud

Tener EXCELENTE comportamiento en la empresa, con sus superiores, compañeros y personal de la comunidad

Reportar condiciones inseguras y actos inseguros.

Cometer actos inseguros

Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la Empresa


Fumar en obra

Scanned with CamScanner

...CORPORATIVA

CONSORCIO VIAS JCBR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108
		REVISIÓN: 00

8.Señale con una X las consecuencias que usted puede sufrir por la exposición de peligros en obra.

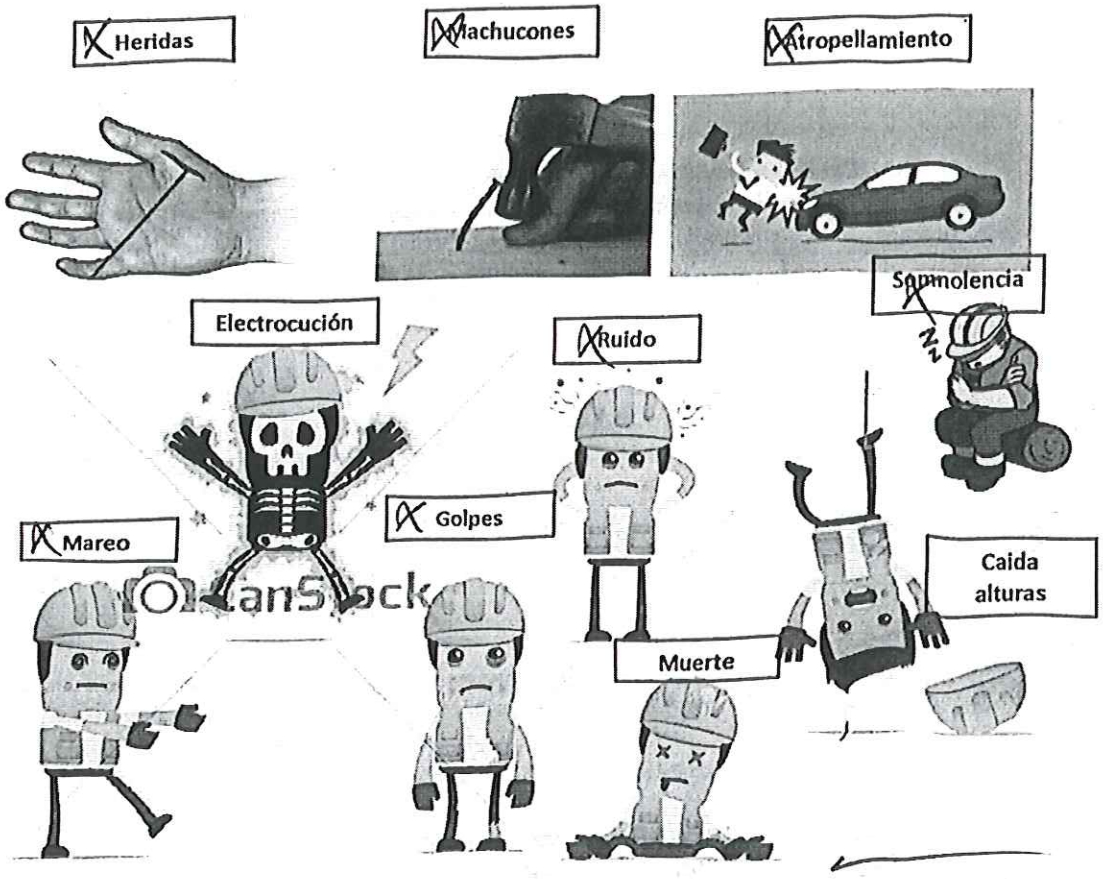

9.Enuncie 5 peligros a los cuales está expuesto:

1. Golpe
2. Mareo
3. Machucones
4. Heridas
5. Ruido

10.En caso de emergencia por sismo usted debe:

X A. Conservar la calma, ubicarse en zonas seguras y protegerse de objetos que puedan caerle encima.

B. Perder la calma y salir corriendo.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108
		REVISIÓN: 00

C. Llamar a un amigo.

11.Mencione el procedimiento a seguir en caso de Accidente de trabajo:

1 Reportar
2 Prestar Primeros Auxilios

12.De acuerdo al perfil de competencias del cargo que va a desarrollar describa las funciones, responsabilidades y alcance en materia de producción y seguridad y salud en el trabajo.

Funciones: * Realizar Mescla de cemento, arena, Gravilla.
* Romper Pavimentos

Responsabilidades: · Portar adecuadamente los EPP
* Cumplir las Normas de Salud y Seguridad en el trabajo

Alcance: Suspender actividades, si esta Representa Peligro

13.Marque con una X las faltas graves en seguridad y salud en el trabajo que pueden ocasionarle el despido inmediato de la empresa.

X a. Actos inseguros en trabajos de alto riesgo alturas, espacios confinados y excavaciones.
b. Faltar al trabajo.
X c. Operar maquinaria, equipo o herramienta para el cual no está autorizado.
X d. Realizar o involucrarse en actividades para el cual no está autorizado o no ha sido asignado.
e. Llegar tarde a trabajar.
X f. Presentarse a laborar bajos los efectos de sustancias psicoactivas, asimismo el consumo, la posesión, comercialización y/o distribución en la obra, del mismo.
g. Presentarse con armas blancas o armas de fuego en la obra.
X h. No reportar, reportar extemporáneamente o fingir un accidente de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACION	EXCELENTE (E): ENTRE 15 Y 16 RESPUESTAS ACERTADAS	ACEPTABLE (A): ENTRE 12 Y 14 RESPUESTAS ACERTADAS	INSUFICINETE (I): MENOS DE 11 RESPUESTAS ACERTADAS

Nombre: Yair Solano C.C 1006476675 Firma: Solano

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JOBR

COMPETENCIA DEL PERSONAL

CARGO: Oficios varios	PROCESO: Gestión de obras civiles	CARGO AL QUE REPORTA: Ingeniero residente

1 RESPONSABILIDAD FUNCIONES Y RENDICION DE CUENTAS	2 AUTORIDAD	3 HABILIDADES
Controlar el tráfico vehicular y peatonal y apoyar en los movimientos de los equipos y maquinaria de la obra	Suspender las labores si estas representan peligro para la integridad física de las personas, medio ambiente o para la Empresa.	Comunicación: Precisión, oportunidad y claridad en la información que suministra. Permanente comunicación con el superior inmediato y el personal relacionado.
Guiar a los usuarios para el tránsito seguro en los sitios de obra o lugares a donde se haya designado		Disposición : Buena disposición para realizar y cumplir sus labores.
Ubicar señalización reglamentaria, preventiva e informativa en los lugares respectivos de la obra		Trabajo en equipo: Participación activa con su grupo de trabajo para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas. Promover y mantener buena ambiente laboral y adecuadas relaciones interpersonales.
Colaborar en el mantenimiento de la señalización en su sitio de trabajo		Prácticas seguras: Cumplimiento y divulgación de las normas de salud, seguridad y medio ambiente para la prevención de lesiones, enfermedades o impactos ambientales.
Reportar condiciones de peligro que puedan desencadenar en incidentes, accidentes o impactos ambientales.		
Excavar con el pico y la pala o con otras herramientas siguiendo el nivel o los lineamientos que se le indiquen.		
Cargar y movilizar en carretillas los materiales para la preparación en concreto		
Inspeccionar herramientas y equipos antes de su uso.		
Realizar mezcla de cemento, arena, gravilla u otros materiales siguiendo las especificaciones dadas por el maestro, oficial o supervisor de obra.		
Romper pavimentos y concretos con herramientas manuales,electricas o neumaticas		
Custodia y vigilancia de equipo y maquinaria		
Prestar apoyo a la realización de actividades del equipo de topografía.		
Realizar el traslado de herramientas,equipos y materiales para el desarrollo de la obra.		
Desarrollar los trabajos asignados con estándares de calidad y seguridad, preservando el medio ambiente.		
SGSST		
Asegurar que en el sistema de gestión se implementan y se cumplen las normas de Seguridad y salud en el trabajo.		
Cumplir las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente de la Empresa para prevenir daños a la integridad física, a los bienes materiales o al medio ambiente		
Reportar incidentes, accidentes de trabajo y ambientales ocurridos al personal a su cargo o en su área.		
Procurar el cuidado integral de su salud		
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.		
Participar en las actividades de capacitación en seguridad , salud en el trabajo y ambiente definidas en el plan de capacitación		
Utilizar y velar por la utilización de los EPI en los frentes de trabajo.		
Cumplir las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente establecidas		
Divulgar y cumplir las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente establecidas		
OTROS		
Las demás asignadas por el superior inmediato relacionadas con la obra		

NOTA: Esta autoridad complementa la definida en los procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema de Gestión SST - SG-SST FT-019 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR

VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA

INSTRUCCIONES

1. Revise la hoja de vida con sus soportes
2. Describa en el punto I la competencia requerida (ver competencia del personal FT-019)
3. Confronte la competencia requerida con la competencia real
4. Concluya con SI o NO si con los soportes disponibles el aspirante al cargo o trabajador es competente
5. Plantee conforme su criterio, los temas que deben ser fortalecidos para aumentar la competencia conforme los requisitos de la Empresa

I. COMPETENCIA REQUERIDA			
EDUCACION	ENTRENAMIENTO	HABILIDADES	EXPERIENCIA
CARGO: OFICIOS VARIOS Lecto-escritura, Capacitacion en el nivel trabajador autorizado y con reentrenamiento vigente cuando aplique. Certificado Señalizador vial cuando aplique	**SGSST:** Inducción y actualización del Programa de gestión en Salud, Seguridad y Medio Ambient Inducción y actualización del plan de emergencias **Específicos:** Responsabilidad y Autoridad. Documentación del sistema aplicables a su cargo.	**Comunicación** **Disposición** **Buena Redacción** **Trabajo en equipo** **Habilidad Manual** **Prácticas seguras**	6 meses de experiencia Certificada o referenciada.

II. COMPETENCIA REAL			
EDUCACION	ENTRENAMIENTO	HABILIDADES	EXPERIENCIA
NOMBRE: Yoly Solano Primaria 5° año	Cuenta con lo Requerido para el cargo		
CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO

III. CONCLUSIÓN DEL EVALUADOR			
CUMPLE COMPETENCIA	SI	NO	Capacitar o reevaluar o buscar otra opción

IV. ACCIONES		
ACTIVIDAD	PLAZO (dd/mm/aa)	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

EVALUADOR:	CARGO:	FECHA EVALUACIÓN:	FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN:
Angelica Cuntero	Aux SST	20-08-2025	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	ACTA DE NOTIFICACION DE PELIGROS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	AC- 002
		REVISIÓN: 00

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, de conformidad con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019; el consorcio procedió a notificarle de forma verbal y por escrito al trabajador los riesgos a los cuales está expuesto en el desarrollo de sus labores y medio circundante, de las medidas preventivas que debe cumplir para evitar accidentes y de las normar y procedimientos de la empresa.

Conforme a lo expuesto, Yo ..Yoiv..Soiana..Perez..... identificado con CC N° 1005.476672.. con el cargo de ..Asilia..... trabajador del CONSORCIO VIAS JCSR, tengo por conocimiento la presente acta, que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de mis actividades. De esta manera notifico que he recibido del consorcio amplia y suficiente inducción general y adiestramiento operacional donde se me notifico y explico de manera verbal y por escrito los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo, las normas y procedimientos internos del consorcio y los análisis de riesgos de mis funciones; de igual manera, declaro que he recibido los elementos de protección personal para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir con mis obligaciones especificas en mi contrato de trabajo, las normas y procedimientos de seguridad.

Nuestras actividades están comprometidas con los siguientes peligros y medidas de control:

PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Superficies irregulares, distracción del trabajador	Caidas al mismo nivel	Inspección preventiva del estado del suelo. Orden y limpieza de la zona de paso y de trabajo
Trabajo en alturas (mayor a 1.5 mts) Uso de escaleras, andamios y plataformas temporales, huecos en el lugar de trabajo.	Caida a distinto nivel, muerte	Anclar las escaleras al ascender y descender, uso de arnés de seguridad y anclarse en la línea de vida, verificación y uso adecuado de los andamios, solicitar permiso de trabajo, realizar ats, inpección de elementos de protección contra caidas, señalización de área de trabajo, orden y aseo, comité de orden y aseo.
Manipulación manual de objetos y herramientas en altura. Cargas suspendidas	Caida de objetos	Uso de soga de servicio y contar con bolsa portaherramientas o adiestrar las herramientas, colocar vientos durante el izaje de carga, prohibido estar debajo de la carga.
Tránsito vehicular, maquinaria y vehículos en movimiento	Choque y atropello	Manejo a la defensiva, contar con controlador de tráfico, señalizar la zona de trabajo, prohibido estar en la línea de fuego en maniobra de la maquinaria o vehiculo.
Alta, media y baja tensión	Contacto directo/ indirecto	Aplicar las 5 reglas de oro, tener distancia adecuada durante circuitos, cables y barras energizadas, bloqueo y etiquetado.
Posturas inadecuadas, esfuerzo por la manipulación de cargas, movimientos repetitivos	Sobre esfuerzo por la manipulación de cargas	Rotación de personal, prohibido levantar objetos mayores a 25 kg, uso de equipos de carga a cargas excesivas.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	ACTA DE NOTIFICACION DE PELIGROS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	AC- 002
		REVISIÓN: 00

Radiación UV, radiaciones no ionizante	Lesión o enfermedad por exposición	Uso de capuchones, dotación adecuada y/o uso de bloqueadores
Ruido debido a trabajos con herramientas de golpe, a maquinarias o equipos	Efectos por exposición aniveles superiores al LMP, exposiciones prolongadas	Realizar mantenimiento a los equipos, uso de protección auditiva
Material particulado	Efectos por exposición aniveles superiores al LMP	Realizar mantenimiento a los equipos, uso de protección respiratoria
Vibración debido a trabajos con herramientas de golpe, maquinas o equipos	Niveles superiores a limites permitidos, exposiciones prolongadas	Tomar pausas activas, ejercicios de pausas activas.
Mecanismos móviles sin protección	Atrapamientos	Verificación y uso adecuado de las herramientas y equipos de poder, no manipular equipos encendidos.
Objetos o superficies punzocortantes, herramientas manuales cortantes	Cortes	Uso de guantes de cuero y cortar
Presencia de animales	Mordeduras, picaduras.	verificar los EPP's verificando la ausencia de insectos dentro de los EPP's, No manipular enjambres de abejas
Sustancias irritantes o alergizantes, sustancias corrosivas, sustancias asfixiantes	Contacto, exposición prolongada, exposición aniveles superiores a límites permitidos	Contar con capacitación de las MSDS de los productos químicos, uso de equipos de protección de acuerdo a la MSDS
Impacto de fragmentos y/o particulas sólidas o liquidas o incandescente	Proyecciones	Uso de lentes contra impacto, uso de careta, uso de peto, mangas.

Nota. Recuerde que tiene prohibido realizar cualquier actividad que no ha sido aprobada mediante permiso de trabajo y ats, y se encuentra fuera de sus funciones y competencia.
La presente acta se firma en constancia por las siguientes personas:
El incumplimiento de cualquiera de estas normas de seguridad y salud en el trabajo puede ser tomada como causal de terminación del contrato y se hará seguimiento de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la empresa.
Agradecemos el cumplimiento de cada uno de las medidas de control tomadas para los diferentes peligros identificados anteriormente

DIRECTOR DE OBRA

Angelly Quintero
PROFESONAL SST

Yoiry Salano
TRABAJADOR
CARGO:
Ayudante

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

sorcio Vias JCSR ejecutara la obra CONTRATAR LA MENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA IMA.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

mportante el cumplimiento de la normativa ambiental rte, dado que el inadecuado manejo de los recursos rales puede acarrear sanciones ambientales, por lo erior el suministro y disposicion final de materiales se llevará bo a través de proveedores que cuenten con los permisos bientales, y en caso de requerirse la afectación directa de ecurso natural se tramitará el respectivo tramite ambiental la autoridad competente CORTOLIMA.

MANEJO DE RESIDUOS EN OBRA

principales residuos a manejar en obra son los siguientes:

Residuo	*Almacenamiento*	*Aprovechamiento y/o Disposicion Final*
Aprovechable Pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse en nuevos productos.	En recipiente y/o bolsa de color blanco.	Se entregarán a recicladores de la zona.
No Aprovechable Presentan obstáculos importantes para ser aprovechado	En recipiente y/o bolsa de color negro.	Se entregarán a la empresa de servicios públicos del municipio.
Peligroso Pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente	Se almacenaran en recipiente y/o bolsa de color rojo	Gestor autorizado que preste los servicios de recolección, transporte, tratamiento, disposicion final de residuos peligrosos.
De construcción y demolición de naturaleza inerte generados en obras de excavación y de demolición.	Se almacenan en un area que no interfiera con el tránsito vehicular, ni peatonal.	Los residuos de excavación serán aprovechados en el nivelamiento topográfico de un suelo que sea ambientalmente topográfico de un suelo que sea ambientalmente viable o en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

2

- Cuando se requiera se realizará la instalación de polisombra y velar por su conservación.
- Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, se trabajará en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo.

SEÑALIZACION

- Se realizará cerramiento del area de trabajo con cinta de demarcación o polisombra cuando se requiera.
- Se deben señalizar los puntos criticos.
- Realizar señalizacion en instalaciones temporales.

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

- Los materiales de construcción serán adquiridos a través de empresa que cuente con licencia ambiental y titulo minero.
- Los materiales de construcción deben ser cubiertos y protegidos de la acción del agua y del aire, cuando se requiera se instalarán lonas de tierra para canalizar el agua derivada de las precipitaciones y evitar el arrastre de materiales.

AGUAS SUPERFICIALES Y SANEAMIENTO

- Se debe hacer un consumo responsable del agua en obra.
- El uso de unidades sanitarias se llevará a cabo a través de los existentes en las locaciones, permisos con la comunidad e instalación temporal, se debe velar por que siempre presenten buenas condiciones de orden y aseo.

MANEJO DE LA VEGETACION, FAUNA Y PAISAJE

- En caso de presentarse individuos forestales en conflicto con las obras, para proceder a realizar la tala debe tener aprobación de la autoridad ambiental y presupuesto aprobado para la actividad.
- En caso de afectar un area con cobertura vegetal se deberá restaurar toda el area intervenida mejorando su condición o dejándola como se encontró.

7

VEHÍCULOS

- Las instalaciones temporales y bodegas deben permanecer en buenas condiciones de orden y aseo.
- Las instalaciones temporales deberán contar con equipo de primeros auxilios tales como botiquín y camilla.
- Los vehículos que operen para el Consorcio, tendrán documentos vigentes entre ellos SOAT y Certificado de Tecnomecanica.
- Los vehículos cuando transporten material de obra deben tener protegido su volcó.

ACTIVIDADES DE CIERRE AMBIENTAL

- El alcance de esta actividad se refiere al retiro de todo lo que fue utilizado para el desarrollo del proyecto (almacenes, oficinas, maquinaria, equipos, vehículos, entre otros), así como los residuos generados (no aprovechables, aprovechables, de construcción y demolición).
- El desmantelamiento se llevará a cabo bajo la premisa "las características finales de cada uno de los sitios empleados deben ser iguales o superiores a las que tenía inicialmente".

CONSTANCIA DE INDUCCION

Doy fe de que el CONSORCIO VIAS JCSR, me brindo inducción sobre las medidas de Gestión Ambiental a ejecutar y ha resuelto las inquietudes generadas durante el proceso de inducción para el ingreso a la Organización, a través de folleto de inducción establecido para tal fin, tratando los siguientes temas:

- Cumplimiento de requerimientos legales.
- Manejo de residuos en obra.
- Calidad del Aire
- Señalizacion
- Manejo de materiales de construcción.
- Aguas superficiales y saneamiento.
- Manejo de la vegetación, fauna y paisaje.
- Manejo de instalaciones temporales, equipos y vehículos.
- Cierre Ambiental.

Nombres y Apellidos	Yuri Salgado
No. De Identificación	1088299822
Fecha de Inducción	20/01/2020
Firma de Trabajador	Afiliado

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VI JCBR	GUIA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CORPORATIVA

FECHA (dd/mm/aa): 20-08-25	FACILITADOR: Angelica Q.	FIRMA FACILITADOR: Angelica Q.	
SUPERIOR INMEDIATO: Nelio Giron		FIRMA SUPERIOR INMEDIATO:	
LUGAR: Leticia Tolima	DURACIÓN: 4 Horas		
DIRIGIDO A: Yair Enrique Solano	CARGO: Auxiliar		

Inducción corporativa [X] Reinducción corporativa [ ] Reinducción por cambio de cargo [ ]

TEMA	REALIZADO
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	✓
1.1. Quienes somos	✓
1.2. Hacia dónde vamos	✓
1.3. POLITICAS: Integral Corporativa del Sistema, de prevención de consumo sustancias psicoactivas y de seguridad vial	✓
2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	✓
2.1. Perfil del cargo (funciones)	✓
2.2. Estructura organizacional (Organigrama)	✓
2.3. Plan de calidad	✓
3. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	✓
3.1. Objetivos, metas y programas aplicables al proceso	✓
3.2. Procedimientos aplicables a la actividad	✓
3.3. Formatos aplicables al proceso y otros	✓
4. REQUISITOS LEGALES	✓
4.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
4.2. Reglamento Interno de Trabajo / Ley 1010 de 2006. ACOSO LABORAL	✓
4.3. Copasst	✓
4.4. Requisitos legales SSTA y otros suscritos por la Organización	✓
4.5 Derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales	✓
6. PROGRAMA DE GESTIÓN SGI	✓
5.1. Peligros, riesgos y controles operacionales	✓
5.2. Aspectos e impactos ambientales del proceso	✓
5.3. Controles operacionales (procedimientos de trabajo seguro aplicables)	✓
5.4. Normas en el uso de epp y dotación	✓
5.5. Manejo seguro de sustancias químicas	✓
5.6. Procedimiento para la notificación de incidentes y accidentes de trabajo	✓
5.7. Plan de emergencias (prevención y actuación en caso de..., brigadistas, puntos de encuentro)	✓
5.8. Manejo de residuos	✓
5.9. Vestigios arqueológicos	✓
6. OTROS	✓
6.1. Normas especificas comunidades	✓
7. ENTRENAMIENTO EN CAMPO A CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO (a criterio del superior inmediato y de conformidad con el tipo de trabajo a desarrollar)	✓
7.1. Presentación de los compañeros de trabajo y reconocimiento de su puesto de trabajo.	
7.2. Información especifica de la actividad a desarrollar (Especificaciones de equipos, herramientas y maquinaria a utilizar si aplica)	

FIRMA (s) ASISTENCIA:	FECHA PRÓXIMA REINDUCCIÓN (en caso aplicable):
Yair Enrique Solano Perez	

GU-001. Rev.01

Frecuencia realización: Al ingreso de personal o cuando se requiera re inducción

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCBR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108 REVISIÓN: 00

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Icetida Tolima Fecha: 20 de agosto - 2025.

Nombre: Yoi Solano Edad: 28 Tel: 3203978335

Identificación No: 1006476673 Dirección: Barrio Sol Palma

Empresa: ZRR Cargo: Ayudante

RH: Positiva ARL: Positiva Proceso Proceso inducio

Contacto Emergencia: Mariela Tel/Cel: 3118041690

1. ¿Nuestro objetivo principal en seguridad y salud en el trabajo es?

A. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
X Cero Accidentes y Daños a las personas, ambiente, infraestructura, comunidad y cliente.
C. Entregar la obra en el menor tiempo posible.

2. Responda F si es Falso o V si es Verdadero en los ( ) las siguientes afirmaciones:

A. La política de Seguridad y Salud en el Trabajo busca la prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales (V)
B. La compañía permite el consumo, la posesión, comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas (F)
C. El comité de convivencia laboral debe ejecutar el procedimiento de quejas para notificar casos de presunto de acoso laboral (V)
D. Es obligación del empleador el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo (V)
E. Puedo iniciar o ingresar a realizar actividades SIN previa autorización de mi jefe inmediato y SIN firmar permisos de trabajo y ATS. (F)

3. Encierre en un círculo las actividades que debe realizar antes de iniciar sus labores en obra

Realizar y firmar los permisos de trabajo y ATS correspondientes.

Realizar las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos o herramientas que vaya a utilizar en el día

Asistir a charla diaria de seguridad y salud en el trabajo.

Inspeccionar las condiciones del área de trabajo y señalizar la zona.


4. ¿Cuál es la velocidad máxima de transito de los vehículos y maquinaria en obra? Señale con una X



Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108
		REVISIÓN: 00

5. **Señale en el dibujo que elementos de protección individual usted debe utilizar, mientras realiza sus actividades en obra.**

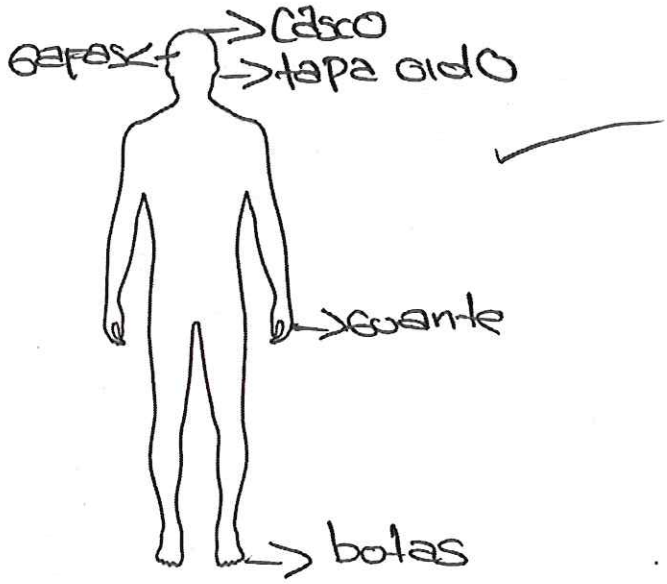

6. **¿Quién direcciona las actividades operativas en obra (nombre y cargo de su jefe directo)?**

Daniel Gamboa.

7. **Encierre en un círculo las responsabilidades que usted tiene como trabajador:**

Procurar el cuidado integral de su salud

Tener EXCELENTE comportamiento en la empresa, con sus superiores, compañeros y personal de la comunidad

Reportar condiciones inseguras y actos inseguros.

Cometer actos inseguros

Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la Empresa


Fumar en obra

Scanned with CamScanner

CORPORATIVA

CONSORCIO VIAS JCBR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108
		REVISIÓN: 00

8.Señale con una X las consecuencias que usted puede sufrir por la exposición de peligros en obra.

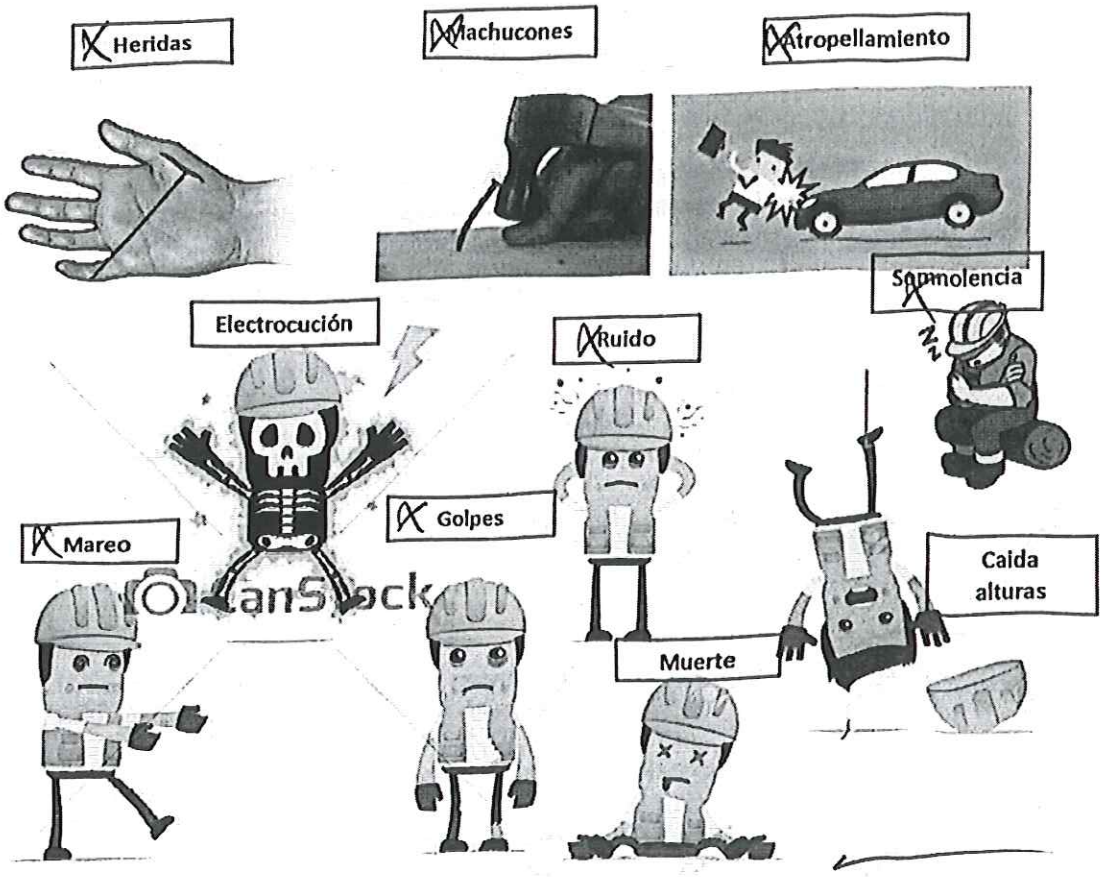

9.Enuncie 5 peligros a los cuales está expuesto:

1. Golpe
2. Mareo
3. Machucones
4. Heridas
5. Ruido

10.En caso de emergencia por sismo usted debe:

A. Conservar la calma, ubicarse en zonas seguras y protegerse de objetos que puedan caerle encima.

B. Perder la calma y salir corriendo.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	EVALUACIÓN INDUCCIÓN CORPORATIVA	CÓDIGO FT 108 REVISIÓN: 00

C. Llamar a un amigo.

11.Mencione el procedimiento a seguir en caso de Accidente de trabajo:

1 Reportar
2 Prestar Primeros Auxilios

12.De acuerdo al perfil de competencias del cargo que va a desarrollar describa las funciones, responsabilidades y alcance en materia de producción y seguridad y salud en el trabajo.

Funciones: * Realizar Mescla de cemento, arena, gravilla.
* Romper Pavimentos

Responsabilidades: * Portar adecuadamente los EPP
* Cumplir las normas de salud y Seguridad en el trabajo

Alcance: Suspender actividades, si estas representa Peligro

13.Marque con una X las faltas graves en seguridad y salud en el trabajo que pueden ocasionarle el despido inmediato de la empresa.

X a. Actos inseguros en trabajos de alto riesgo alturas, espacios confinados y excavaciones.
b. Faltar al trabajo.
X c. Operar maquinaria, equipo o herramienta para el cual no está autorizado.
X d. Realizar o involucrarse en actividades para el cual no está autorizado o no ha sido asignado.
e. Llegar tarde a trabajar.
X f. Presentarse a laborar bajos los efectos de sustancias psicoactivas, asimismo el consumo, la posesión, comercialización y/o distribución en la obra, del mismo.
g. Presentarse con armas blancas o armas de fuego en la obra.
X h. No reportar, reportar extemporáneamente o fingir un accidente de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACION	EXCELENTE (E): ENTRE 15 Y 16 RESPUESTAS ACERTADAS	ACEPTABLE (A): ENTRE 12 Y 14 RESPUESTAS ACERTADAS	INSUFICINETE (I): MENOS DE 11 RESPUESTAS ACERTADAS

Nombre: Yair Solano C.C 1006474675 Firma: Solano

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR

COMPETENCIA DEL PERSONAL

CARGO: Oficios varios	PROCESO: Gestión de obras civiles	CARGO AL QUE REPORTA: Ingeniero residente

1 RESPONSABILIDAD FUNCIONES Y RENDICION DE CUENTAS	2 AUTORIDAD	3 HABILIDADES
Controlar el tráfico vehicular y peatonal y apoyar en los movimientos de los equipos y maquinaria de la obra	Suspender las labores si estas representan peligro para la integridad física de las personas, medio ambiente o para la Empresa.	**Comunicación:** Precisión, oportunidad y claridad en la información que suministra. Permanente comunicación con el superior inmediato y el personal relacionado.
Guiar a los usuarios para el tránsito seguro en los sitios de obra o lugares a donde se haya designado		**Disposición** ; Buena disposición para realizar y cumplir sus labores.
Ubicar señalización reglamentaria, preventiva e informativa en los lugares respectivos de la obra		**Trabajo en equipo:** Participación activa con su grupo de trabajo para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas. Promover y mantener buena ambiente laboral y adecuadas relaciones interpersonales.
Colaborar en el mantenimiento de la señalización en su sitio de trabajo		**Prácticas seguras:** Cumplimiento y divulgación de las normas de salud, seguridad y medio ambiente para la prevención de lesiones, enfermedades e impactos ambientales.
Reportar condiciones de peligro que puedan desencadenar en incidentes, accidentes o impactos ambientales.		
Excavar con el pico y la pala o con otras herramientas siguiendo el nivel o los lineamientos que se le indiquen.		
Cargar y movilizar en carretillas los materiales para la preparación en concreto		
Inspeccionar herramientas y equipos antes de su uso.		
Realizar mezcla de cemento, arena, gravilla u otros materiales siguiendo las especificaciones dadas por el maestro, oficial o supervisor de obra.		
Romper pavimentos y concretos con herramientas manuales,electricas o neumaticas		
Custodia y vigilancia de equipo y maquinaria		
Prestar apoyo a la realización de actividades del equipo de topografía		
Realizar el traslado de herramientas,equipos y materiales para el desarrollo de la obra		
Desarrollar los trabajos asignados con estándares de calidad y seguridad, preservando el medio ambiente		
SGSST		
Asegurar que en el sistema de gestión se implementan y se cumplen las normas de Seguridad y salud en el trabajo.		
Cumplir las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente de la Empresa para prevenir daños a la integridad física, a los bienes materiales o al medio ambiente		
Reportar incidentes, accidentes de trabajo y ambientales ocurridos al personal a su cargo o en su área.		
Procurar el cuidado integral de su salud.		
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.		
Participar en las actividades de capacitación en seguridad , salud en el trabajo y ambiente definidas en el plan de capacitación		
Utilizar y velar por la utilización de los EPI en los frentes de trabajo.		
Cumplir las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente establecidas		
Divulgar y cumplir las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente establecidas		
OTROS		
Las demás asignadas por el superior inmediato relacionadas con la obra		

NOTA: Esta autoridad complementa la definida en los procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema de Gestión SST - SG-SST FT-019 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JOSR

VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA

INSTRUCCIONES

1. Revise la hoja de vida con sus soportes
2. Describa en el punto I la competencia requerida (ver competencia del personal FT-019)
3. Confronte la competencia requerida con la competencia real
4. Concluya con SI o NO si con los soportes disponibles el aspirante al cargo o trabajador es competente
5. Plantee conforme su criterio, los temas que deben ser fortalecidos para aumentar la competencia conforme los requisitos de la Empresa

I. COMPETENCIA REQUERIDA				
	EDUCACION	ENTRENAMIENTO	HABILIDADES	EXPERIENCIA
CARGO: OFICIOS VARIOS	Lecto-escritura, Capacitacion en el nivel trabajador autorizado y con reentrenamiento vigente cuando aplique. Certificado Señalizador vial cuando aplique	**SGSST:** Inducción y actualización del Programa de gestión en Salud, Seguridad y Medio Ambient Inducción y actualización del plan de emergencias **Específicos:** Responsabilidad y Autoridad. Documentación del sistema aplicables a su cargo.	**Comunicación** **Disposición** **Buena Redacción** **Trabajo en equipo** **Habilidad Manual** **Prácticas seguras**	6 meses de experiencia Certificada o referenciada.
II. COMPETENCIA REAL				
	EDUCACION	ENTRENAMIENTO	HABILIDADES	EXPERIENCIA
NOMBRE: Yuly Solorzo	Primaria 5to	Cuenta con lo Requerido para el cargo		
	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO	CUMPLE SI NO

III. CONCLUSIÓN DEL EVALUADOR			
CUMPLE COMPETENCIA	SI	NO	Capacitar o reevaluar o buscar otra opción

III. ACCIONES		
ACTIVIDAD	PLAZO (dd/mm/aa)	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

EVALUADOR:	CARGO:	FECHA EVALUACIÓN:	FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN:
Angelly Cuntes	Aux SST	20-08-2025	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	ACTA DE NOTIFICACION DE PELIGROS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	AC- 002
		REVISIÓN: 00

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, de conformidad con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019; el consorcio procedió a notificarle de forma verbal y por escrito al trabajador los riesgos a los cuales está expuesto en el desarrollo de sus labores y medio circundante, de las medidas preventivas que debe cumplir para evitar accidentes y de las normar y procedimientos de la empresa.

Conforme a lo expuesto, Yo ..Yoiver..Solano..Perez..... identificado con CC N° 1005.476672.. con el cargo de ..Asilia..... trabajador del CONSORCIO VIAS JCSR, tengo por conocimiento la presente acta, que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de mis actividades. De esta manera notifico que he recibido del consorcio amplia y suficiente inducción general y adiestramiento operacional donde se me notifico y explico de manera verbal y por escrito los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo, las normas y procedimientos internos del consorcio y los análisis de riesgos de mis funciones; de igual manera, declaro que he recibido los elementos de protección personal para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir con mis obligaciones especificas en mi contrato de trabajo, las normas y procedimientos de seguridad.

Nuestras actividades están comprometidas con los siguientes peligros y medidas de control:

PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Superficies irregulares, distracción del trabajador	Caidas al mismo nivel	Inspección preventiva del estado del suelo. Orden y limpieza de la zona de paso y de trabajo
Trabajo en alturas (mayor a 1.5 mts) Uso de escaleras, andamios y plataformas temporales, huecos en el lugar de trabajo.	Caida a distinto nivel, muerte	Anclar las escaleras al ascender y descender, uso de arnés de seguridad y anclarse en la línea de vida, verificación y uso adecuado de los andamios, solicitar permiso de trabajo, realizar ats, inpección de elementos de protección contra caidas, señalización de área de trabajo, orden y aseo, comité de orden y aseo.
Manipulación manual de objetos y herramientas en altura. Cargas suspendidas	Caida de objetos	Uso de soga de servicio y contar con bolsa portaherramientas o adiestrar las herramientas, colocar vientos durante el izaje de carga, prohibido estar debajo de la carga.
Tránsito vehicular, maquinaria y vehículos en movimiento	Choque y atropello	Manejo a la defensiva, contar con controlador de tráfico, señalizar la zona de trabajo, prohibido estar en la línea de fuego en maniobra de la maquinaria o vehículo.
Alta, media y baja tensión	Contacto directo/ indirecto	Aplicar las 5 reglas de oro, tener distancia adecuada durante circuitos, cables y barras energizadas, bloqueo y etiquetado.
Posturas inadecuadas, esfuerzo por la manipulación de cargas, movimientos repetitivos	Sobre esfuerzo por la manipulación de cargas	Rotación de personal, prohibido levantar objetos mayores a 25 kg, uso de equipos de carga a cargas excesivas.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	ACTA DE NOTIFICACION DE PELIGROS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	AC- 002 REVISIÓN: 00

Radiación UV, radiaciones no ionizante	Lesión o enfermedad por exposición	Uso de capuchones, dotación adecuada y/o uso de bloqueadores
Ruido debido a trabajos con herramientas de golpe, a maquinarias o equipos	Efectos por exposición aniveles superiores al LMP, exposiciones prolongadas	Realizar mantenimiento a los equipos, uso de protección auditiva
Material particulado	Efectos por exposición aniveles superiores al LMP	Realizar mantenimiento a los equipos, uso de protección respiratoria
Vibración debido a trabajos con herramientas de golpe, maquinas o equipos	Niveles superiores a limites permitidos, exposiciones prolongadas	Tomar pausas activas, ejercicios de pausas activas.
Mecanismos móviles sin protección	Atrapamientos	Verificación y uso adecuado de las herramientas y equipos de poder, no manipular equipos encendidos
Objetos o superficies punzocortantes, herramientas manuales cortantes	Cortes	Uso de guantes de cuero y cortar
Presencia de animales	Mordeduras, picaduras.	verificar los EPP's verificando la ausencia de insectos dentro de los EPP's, No manipular enjambres de abejas
Sustancias irritantes o alergizantes, sustancias corrosivas, sustancias asfixiantes	Contacto, exposición prolongada, exposición aniveles superiores a limites permitidos	Contar con capacitación de las MSDS de los productos químicos, uso de equipos de protección de acuerdo a la MSDS
Impacto de fragmentos y/o partículas sólidas o liquidas o incandescente	Proyecciones	Uso de lentes contra impacto, uso de careta, uso de peto, mangas.

Nota. Recuerde que tiene prohibido realizar cualquier actividad que no ha sido aprobada mediante permiso de trabajo y ats, y se encuentra fuera de sus funciones y competencia.
La presente acta se firma en constancia por las siguientes personas:
El incumplimiento de cualquiera de estas normas de seguridad y salud en el trabajo puede ser tomada como causal de terminación del contrato y se hará seguimiento de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la empresa.
Agradecemos el cumplimiento de cada uno de las medidas de control tomadas para los diferentes peligros identificados anteriormente

DIRECTOR DE OBRA

Angelly Quintero
PROFESONAL SST

Yoiy Salano
TRABAJADOR
CARGO:
Ayudante

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

sorcio Vias JCSR ejecutara la obra CONTRATAR LA MENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA IMA.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

mportante el cumplimiento de la normativa ambiental nte, dado que el inadecuado manejo de los recursos rales puede acarrear sanciones ambientales, por lo erior el suministro y disposicion final de materiales se llevará abo a través de proveedores que cuenten con los permisos bientales, y en caso de requerirse la afectación directa de ecurso natural se tramitará el respectivo tramite ambiental la autoridad competente CORTOLIMA.

MANEJO DE RESIDUOS EN OBRA

principales residuos a manejar en obra son los siguientes:

Residuo	*Almacenamiento*	*Aprovechamiento y/o Disposicion Final*
Aprovechable Pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse en nuevos productos.	En recipiente y/o bolsa de color blanco.	Se entregarán a recicladores de la zona.
No Aprovechable Presentan obstáculos importantes para ser aprovechado	En recipiente y/o bolsa de color negro.	Se entregarán a la empresa de servicios públicos del municipio.
Peligroso Pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente	Se almacenaran en recipiente y/o bolsa de color rojo	Gestor autorizado que preste los servicios de recolección, transporte, tratamiento, disposicion final de residuos peligrosos.
De construcción y demolición de naturaleza inerte generados en obras de excavación y de demolición.	Se almacenan en un area que no interfiera con el tránsito vehicular, ni peatonal.	Los residuos de excavación serán aprovechados en el nivelamiento topográfico de un suelo que sea ambientalmente topográfico de un suelo que sea ambientalmente viable o en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

- Cuando se requiera se realizará la instalación de polisombra y velar por su conservación.
- Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, se trabajará en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo.

SEÑALIZACION

- Se realizará cerramiento del area de trabajo con cinta de demarcación o polisombra cuando se requiera.
- Se deben señalizar los puntos críticos.
- Realizar señalizacion en instalaciones temporales.

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

- Los materiales de construcción serán adquiridos a través de empresa que cuente con licencia ambiental y título minero.
- Los materiales de construcción deben ser cubiertos y protegidos de la acción del agua y del aire, cuando se requiera se instalarán lonas de tierra para canalizar el agua derivada de las precipitaciones y evitar el arrastre de materiales.

AGUAS SUPERFICIALES Y SANEAMIENTO

- Se debe hacer un consumo responsable del agua en obra.
- El uso de unidades sanitarias se llevará a cabo a través de los existentes en las locaciones, permisos con la comunidad e instalación temporal, se debe velar por que siempre presenten buenas condiciones de orden y aseo.

MANEJO DE LA VEGETACION, FAUNA Y PAISAJE

- En caso de presentarse individuos forestales en conflicto con las obras, para proceder a realizar la tala debe tener aprobación de la autoridad ambiental y presupuesto aprobado para la actividad.
- En caso de afectar un area con cobertura vegetal se deberá restaurar toda el area intervenida mejorando su condición o dejándola como se encontró.

VEHÍCULOS

- Las instalaciones temporales y bodegas deben permanecer en buenas condiciones de orden y aseo.
- Las instalaciones temporales deberán contar con equipo de primeros auxilios tales como botiquín y camilla.
- Los vehículos que operen para el Consorcio, tendrán documentos vigentes entre ellos SOAT y Certificado de Tecnomecanica.
- Los vehículos cuando transporten material de obra deben tener protegido su volcó.

ACTIVIDADES DE CIERRE AMBIENTAL

- El alcance de esta actividad se refiere al retiro de todo lo que fue utilizado para el desarrollo del proyecto (almacenes, oficinas, maquinaria, equipos, vehículos, entre otros), así como los residuos generados (no aprovechables, aprovechables, de construcción y demolición).
- El desmantelamiento se llevará a cabo bajo la premisa "las características finales de cada uno de los sitios empleados deben ser iguales o superiores a las que tenía inicialmente".

CONSTANCIA DE INDUCCION

Doy fe de que el CONSORCIO VIAS JCSR, me brindo inducción sobre las medidas de Gestión Ambiental a ejecutar y ha resuelto las inquietudes generadas durante el proceso de inducción para el ingreso a la Organización, a través de folleto de inducción establecido para tal fin, tratando los siguientes temas:

- Cumplimiento de requerimientos legales.
- Manejo de residuos en obra.
- Calidad del Aire
- Señalizacion
- Manejo de materiales de construcción.
- Aguas superficiales y saneamiento.
- Manejo de la vegetación, fauna y paisaje.
- Manejo de instalaciones temporales, equipos y vehículos.
- Cierre Ambiental.

Nombres y Apellidos	[illegible]
No. De Identificación	[illegible]
Fecha de Inducción	[illegible]
Firma de Trabajador	[illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	ACTA REUNION COPASST
	CODIGO AC 001. REV 00

ACTA No. 2.

LUGAR: Icido - Tolima	FECHA: 28/08-25	PROCESO: Reunion mensual

TEMA DE LA REUNIÓN: Reunión mensual de comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVO: Realizar la reunión mensual de COPASST, hacer seguimiento a las reuniones acciones de la reunión anterior y proponer ideas de mejora para el fortalecimiento de la cultura de prevención.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
Daniel Gamboa	Ing. Residente.	
Guillermo Rodriguez	Topografo	
Nelson cardozo	Maestro	Nelson E cardozo
Eliana Quintero	Aux. SST	Angelly Eliana Quintero

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum	11. participación del personal: sugerencias, ideas de mejora por parte del personal.
2. Revisión y aprobación del acta anterior	12. informe general de hallazgos de la lista de chequeo COPASST y propuestas de mejora.
3. Momento de seguridad.	13. Seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del SGSST.
4. Revisión y seguimiento incidentes, accidentes laborales del mes	14. Gestión del cambio
5. Revisión y seguimiento enfermedades laborales.	15. Seguimiento programa de inspecciones y tratamiento de hallazgos
6. Revisión y análisis del ausentismo laboral por enfermedad común del mes.	16. Resultados de Mediciones Ambientales
7. Seguimiento a desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo/bienestar/ de la empresa.	17. Resultados de revisiones gerenciales
8. Planificación de auditorías al SGSST	18. Seguimiento al plan de capacitación del personal
9. Revisión de la política de seguridad y salud en el trabajo	19. Seguimiento a presupuesto para la gestión de seguridad y salud en el trabajo
10. Seguimiento al diseño, implementación y mejora del sistema de gestión de SST	20. Seguimiento a actividades del COPASST.

Si requiere documentar más información puede adjuntar otra hoja.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR

ACTA REUNION COPASST

CODIGO AC 001. REV 00

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Se verifica la asistencia del quorum
2. Se Revisa y Aprueba el acta de designación anterior
3. Se informan actividades de OBra en Pro de SST.
4. NO se Presentaron AT O ET en el mes de Agosto
5. NO se Presentaron Enfermedades laborales en el mes de Agosto
6. NO se Puso Ausentismo laboral Por Enfermedad comun
7. Se Revisan PT, ATS, Procedimientos, e Instructivos Relacionados a OBra y Visual
8. NO se Realizo Auditoria al SG-SST
9. Se Revisan y Aprueban las Politicas SST de la Empresa
10. Se Verifica la implementacion del SG-SST En el mes de Agosto
11.
12. NO se Realizaron Hallazgos al COPASST
13. Se cumplen con las metas y Objetivos del SG-SST
14. Se Garantiza la Gestion del Cambio
15. Se Realizaron las RESPECTIVAS INSPECCIONES sin Hallazgos
16. NO se Realizaron Mediciones Ambientales
17. NO se Realizaron Revisiones de Gerencia
18. Se Realizo y Cumplio el Plan de capacitacion.
19. Se Garantizo el Presupuesto Para la Gestion del SG-SST
20. Se Realizo capacitacion, en cargo Docente y Roles del SG-SST y COPASST.

Si requiere documentar más información puede adjuntar otra hoja.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR	ACTA REUNION COPASST
	CODIGO AC 001. REV 00

COMPROMISOS Y PLANES DE ACCIÓN

No.	Actividad	Responsable	Plazo
1	Capacitación en Riesgos y deberes del los Patronos de acuerdo	Ing. Residente y SST.	Sistemático
2	Se solicita Facodid a Ingenieros en oficina	Residente	Sistemático

Si requiere documentar más información puede adjuntar otra hoja.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VI JCSR	ACTA DE CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	FT-140.Rev00

ACTA DE CONSTITUCIÒN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ACTA No 001

CONSTITUCIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL.

CONSORCIO VIAS JCSR, en el municipio de Lérida Tolima en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto,. a los 03 dias del mes de julio se reunieron el Representante Legal HERNANDO SANABRIA los trabajadores con el fin de constituir el Comité de convivencia laboral de la entidad.

Se procedió a orientar lo estipulado en la Resolución 1352 de 2012 y el Decreto 652 de 2012.

El señor representante legal de la compañía de la compañía informó que sus representantes tanto principales como suplentes son los siguientes

PRINCIPAL Juan Daniel Gamboa Galeano

C.C. 1.110444787

Firma

SUPLENTE Guillermo Rodriguez Machado

C.C. 1110540019

Firma

Igualmente informó que en calidad del presidente del Comité de convivencia laboral Actuará el señor.

Pedro Fernando Arion Sanabria

Se procedió a realizar la votación libre para la elección de los representantes por parte de los trabajadores, quedando elegidos los siguientes:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VI JCSR	ACTA DE CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	FT-140.Rev00 .

PRINCIPAL Wilson Cadena
C.C.

Firma Wilson E Cadena

SUPLENTE

C.C.

Firma

Una vez integrado el comité, de común acuerdo se designó como secretario a Angelly Eliana Quinto

Se estableció que la primera reunión se llevará a cabo el día 27 de OCTUBRE. del 2023.

El comité en pleno solicitó que se dictaran dos horas de capacitación especifica para el desempeño de sus funciones y deberes.

Se dio por terminada la reunión siendo las

PRESIDENTE Diego F. Gruna
C.C. 5'870.901
Firma

SECRETARIO Angelly Eliana Quinto
C.C. 1109386750
Firma Angelly Quinto

REPRESENTATE LEGAL
Hernando Sarabia.
C.C. 93.396.927
Firma

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928830	9	CONSORCIO VIAS JCSR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 9 42 42	IBAGUE-TOLIMA	3138512527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698155919	9489376325	Y	2025/08/11	2025/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$99,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
1	CC	5820803	GIRON DIEGO																		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928830	9	CONSORCIO VIAS JCSR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 9 42 42	IBAGUE-TOLIMA	3138512527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698155919	9489376325	Y	2025/08/11	2025/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$99,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$200	$0	$99,300
TOTAL				1	$99,100	$200	$0	$99,300

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928830	9	CONSORCIO VIAS JCSR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 9 42 42	IBAGUE-TOLIMA	3138512527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1767510447	9490731492	E	2025/09/08	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	2	$5,237,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (6 Afiliados)																						$16,892,000	$2,702,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000		$1,175,800		$0	$0		$5,230,200
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (6 Afiliados)																						$16,892,000	$2,702,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000		$1,175,800		$0	$0		$5,230,200
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																						$16,892,000	$2,702,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000		$1,175,800		$0	$0		$5,230,200
1	CC	1110450648	CARDENAS ANDRES																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
2	CC	1110444787	GAMBOA JUAN																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
3	CC	5938412	NUNGO JOSE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1109386750	QUINTERO ANGELLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1110540018	RODRIGUEZ GUILLERMO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
6	CC	93366027	SANABRIA HERNANDO	X																	25-14	25	$4,745,000	$759,200	EPS005	25	$4,745,000	$189,800	CCF50	25	$4,745,000	$189,800	14-11	25	$4,745,000	6.960%	$330,300	25	$0	$0	SI	$1,469,100
Total	**Afiliados(6)**																						$16,892,000	$2,702,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000	$675,800			$16,892,000		$1,175,800		$0	$0		$5,230,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928830	9	CONSORCIO VIAS JCSR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 9 42 42	IBAGUE-TOLIMA	3138512527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1767510447	9490731492	E	2025/09/08	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	2	$5,237,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,702,800	$3,500	$0	$2,706,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,767,200	$2,300	$0	$1,769,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$707,800	$900	$0	$708,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,175,800	$1,500	$0	$1,177,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,175,800	$1,500	$0	$1,177,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$675,800	$900	$0	$676,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$675,800	$900	$0	$676,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$675,800	$1,000	$0	$676,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$212,000	$300	$0	$212,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$349,800	$500	$0	$350,300
TOTAL				6	$5,230,200	$6,900	$0	$5,237,100

2025/09/10 04:45 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5820803		GIRON SANABRIA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 36 CASA 3 BARRIO SANTA ANA	IBAGUE-TOLIMA	2722619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1789070073	9491994162	I	2025/09/02	2025/09/19	BANCO DE OCCIDENTE	17	$1,235,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	5820803	GIRON DIEGO																		25-14	30	$4,286,420	$685,900	EPS037	30	$4,286,420	$535,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$1,221,800
Total	**Afiliados(1)**																						$4,286,420	$685,900			$4,286,420	$535,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,221,800

2025/09/19 12:37 PM

aportes en línea

lanilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5820803		GIRON SANABRIA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 36 CASA 3 BARRIO SANTA ANA	IBAGUE-TOLIMA	2722619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1789070073	9491994162	I	2025/09/02	2025/09/19	BANCO DE OCCIDENTE	17	$1,235,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$685,900	$7,400	$0	$693,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$685,900	$7,400	$0	$693,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$535,900	$5,800	$0	$541,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$535,900	$5,800	$0	$541,700
TOTAL				1	$1,221,800	$13,200	$0	$1,235,000

PLANILLA PAGADA

2025/09/19 12:37 PM

145

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-22, 12:05:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1075098242

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

Fecha limite de pago: 2025-08-22

PAGADA 22/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SUAREZ CONSTRUCCIONES JSM SAS	**Nombre Sucursal**	LERIDA	**Código Sucursal**	24
Documento	NI901360698	**Dirección**	CR 17 #79 - 48 RINCO DE SAN FRANCISCO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204538192		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	9
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal	SUAREZ MORALES JAIME	**Identificación**	CC14139617		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 2235462	RODRIGUEZ JOHN JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFASUR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 5069687	GARCIA JARAMILLO LUIS ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFASUR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 5071712	ROMERO MONTIEL FERNEY	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFASUR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 80404277	MORENO PINEDA ANDRES ALEJANDRO	01	00	X															0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	NUEVA EPS S.A. CM	$ 949.000	$ 118.700	ARL SURA	$ 949.000	$ 66.100	CAFASUR	$ 10	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 337.000
CC 83248099	CARDOZO NELSON ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFASUR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 93180338	HERNANDEZ SILVA JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	2	2	2	2	PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 11.900	ARL SURA	$ 94.900	$ 6.700	CAFASUR	$ 10	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 34.100
CC 93181145	RAMIREZ POVEDA EDILR ORLANDO	01	00		X														0	2	2	2	2	COLFONDOS	$ 94.900	$ 15.200	SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 11.900	ARL SURA	$ 94.900	$ 6.700	CAFASUR	$ 10	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 34.100
CC 93362284	CUESTA ENCISO ALVARO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFASUR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 1100382471	PALACIO MORENO MIGUEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	CAFASUR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 9.679.800	$ 9.679.800	$ 9.679.800	$ 8.541.030	$ 1.549.100	$ 0	$ 0	$ 1.210.500	$ 674.100	$ 342.300	$ 171.300	$ 257.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.204.400	$ 82.600	$ 4.287.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

926

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

GUSTAVO ADOLFO MAHECHA CANDIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.110.538.245,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 20 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, GUSTAVO ADOLFO MAHECHA CANDIA identificado con CC No. 1110538245, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
ZR CONSTRUCCIONES SAS NIT 900101321	**Fecha de inicio de cobertura: 20/08/2025** **Estado Afiliación: Activo** **Fecha de Retiro: N/A** **Tipo Vinculación: Dependiente** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Ibagué. a los 20 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10_CA_FR01 V.08

MIS_4_1_1_FR15 v_010

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4015352185	2|0|0|8|2|0|2|5

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen	4.Contribución Solidaria
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ D. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐	Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7.Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
MAHECHA (Primer apellido)	CANDIA (Segundo apellido)	GUSTAVO (Primer nombre)	ADOLFO (Segundo nombre)

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo Identificación
CC	1110538245	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento			15.Fecha Nacimiento
	País: COLOMBIA	Departamento:	Municipio:	2|0|0|8|1|9|9|3
COLOMBIA				

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	Si ☐ No ☒
6		Categoria Discapacidad	

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN	21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1423500	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 5 N 83 40 T 3 AP 102 URB LA FLORIDA	2781152	3107904282	MAHECHAGUSTAVO336@GMAIL.COM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
TOLIMA	IBAGUE	COL	Urbana cabecera municipal ☐ Rural dispersa ☐ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de Identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo Identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	País:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	País	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS LA QUINTA - VS LA QUINTA	VSLAQUINTA - VSLAQUINTA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
ZR CONSTRUCCIONES	NIT	900101321	

59.Ubicación				
Dirección	Teléfono fijo o celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio/distrito
CR 8 NO 7 10 ED CAMACOL OOFICINA 405	2730083	LUCHOCONSTRUVIAS@HOTMAIL.COM,DANIELALOPEZG12@GMAIL	TOLIMA	IBAGUE

No de Radicacion
4015352185

II. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

[X] 1. Modificación datos básicos de identificación
[ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
[ ] 3. Actualización documento de identidad
[ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
[ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código [ ]
[ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código [ ]
[ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
[ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
[X] 9. Inicio de relación laboral o Adquisición de condiciones para cotizar
[ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
[ ] 11. Inscripción EPS retorno IPS.
[X] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
[ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
[ ] 14. Traslado [ ] A. Régimen Contributivo
[ ] B. Régimen Subsidiado
[ ] 15. Traslado [ ] A. Mismo Régimen
[ ] B. Diferente Régimen
[ ] 16. Reporte de fallecimiento del cotizante o alguno de familia
[ ] 17. Reporte del traslado de protección al cesante
[ ] 18. Reporte de la calidad de pre Pensionado
[ ] 19. Reporte de la calidad del pensionado
[ ] 20. Ingreso a contabilización solidaria
[ ] 21. Retiro de contabilización solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico Femenino [ ] Masculino [ ]	63. Sexo Identificación F [ ] M [ ] T [ ] No [ ] Otro [ ] Cual	64. Fecha de nacimiento

65. EPS anterior	66. Fecha de Novedad AAAA MM DD	67. Motivo de traslado Código:	68. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
70. [ ] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
71. [ ] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
72. [ ] Declaración de no información del cotizante cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
73. [ ] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. [ ] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
75. [ ] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
76. [ ] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto
77. [ ] Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
78. [ ] Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad

IX. FIRMAS

Gustavo Manchego.

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

ZR CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 900.101.321-8
Calle 8 N° 7-10 Edif. Camacol Ofic.405
Tel. 2730083 312 374 35 70 B/. Bolívar

81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X. ANEXOS

82. [ ] Anexo Copia del documento de identidad: CN [ ] RC. [ ] TI [ ] CC. [ ] PA. [ ] CE. [ ] CD. [ ] SC. [ ] PT. [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [0]

83. [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. [ ] Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. [ ] Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
87. [ ] Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
88. [ ] Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
89. [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
90. [ ] Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	95. Firma del funcionario
96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

N-PYOA-F031 V 1.0-2018

Powered by CamScanner

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YAIR ENRIQUE SOLANO PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.416.673,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 20 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, YAIR ENRIQUE SOLANO PEREZ identificado con CC No. 1005416673, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
ZR CONSTRUCCIONES SAS NIT 900101321	**Fecha de inicio de cobertura: 20/08/2025** **Estado Afiliación: Activo** **Fecha de Retiro: N/A** **Tipo Vinculación: Dependiente** **Clase de Riesgo: 5**

Esta certificación se expide en la ciudad de Ibagué. a los 20 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TE_A_FR17_V_20

MIS_4_1_1_FR15_v_010

183

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de radicado: 73001-00000321-CT

Fecha de radicado: 2 0 0 8 2 0 2 5

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DE TRÁMITE

1. Tipo de trámite: A. Afiliación ( ) B. Reporte de novedades (X)

2. Tipo de afiliación: B. Colectiva ( ) A. Individual: -Cotizante o cabeza de familia (X) -Beneficiario o afiliado adicional ( ) C. Institucional ( ) D. De oficio ( )

3. Régimen: A. Contributivo (X) B. Subsidiado ( )

4. Contribución solidaria: SI ( ) No (X)

5. Tipo de afiliado: A. Cotizante (X) B. Cabeza de familia ( ) C. Beneficiario ( ) D. Afiliado adicional ( )

6. Tipo de cotizante: A. Dependiente (X) B. Independiente ( ) C. Pensionado ( )

7. Código (a registrar por la EPS): EPS048

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional) — A. AFILIACIÓN

8. Apellidos y nombres			
SOLANO	PEREZ	YAIR	ENRIQUE

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	
CC	1005416673	Femenino ( ) Masculino (X)	T ( ) NB ( ) Otro ( ) Cual	F ( ) M (X)

13. Nacionalidad	14. Lugar de nacimiento						15. Fecha de nacimiento
COL	País	COLOMBIA	Departamento	CORDOBA	Municipio	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	2 6 0 8 1 9 9 5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad / Categoría de discapacidad	
			SI ( ) NO (X)

19. Tiene encuesta	20. Clasificación SISBÉN		21. Grupo de población especial
SI ( ) NO (X)	Nivel ( )	Grupo ( )	ND

22. Administradora de riesgos laborales - ARL	23. Administración de pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	PORVENIR	$1.423.500	

26. Residencia			
Dirección: CR 10 # 7 - 02	Teléfono fijo:	Teléfono celular: 3009379848	Correo electrónico:
Departamento: TOLIMA	Municipio / Distrito: IBAGUE	Localidad / Comuna: IBAGUE	Zona: Cabecera municipal ( ) Centro poblado ( ) Rural disperso (X) Resto rural ( )

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo de Documento de	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	
		Femenino ( ) Masculino ( )	T ( ) NB ( ) Otro ( ) Cual	F ( ) M ( )

32. Nacionalidad	33. Lugar de nacimiento				34. Fecha de nacimiento
	País	Departamento		Municipio	D D M M Y Y Y Y

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35.	Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación						41. Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual	País	Departamento	Municipio	
B1															D D M M Y Y Y Y
B2															D D M M Y Y Y Y
B3															D D M M Y Y Y Y
B4															D D M M Y Y Y Y
B5															D D M M Y Y Y Y

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					SI	NO	Nivel	Grupo	SI	NO	Categoría de discapacidad	SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona				Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural disperso	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

	53. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	NI	900101321	1

59. Ubicación				
Dirección	Teléfono fijo o celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio / Distrito

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código [ ]
- [X] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [X] 15. Traslado: [X] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
SOLANO	PEREZ	YAIR	ENRIQUE

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo Identificación	64.Fecha de nacimiento
CC	1005416673	Femenino [ ] Masculino [X]	T [ ] NB [ ] Otros [ ] Cual — F [ ] M [X]	2 6 0 8 1 9 9 5

65.EPS anterior	66. Fecha de novedad	67.Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE	2 0 0 8 2 0 2 5	Código 18	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria.

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad

IX: FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

- [ ] 82. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] [PT]
  Cantidad de documentos de identidad anexos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total anexos: [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la Institución
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación
D D M M A A A A	D D M M A A A A

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1761449609	9491584945	E	2025/09/04	2025/09/08	BANCOLOMBIA	4	$15,519,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: IBAGUE (42 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (42 Afiliados)																																
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (42 Afiliados)																																
1	CC	91012462	ASELAS ANTONIO																		25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
2	CC	7317258	CANO ILBER		X																23100 1	4	EPS017	4	CCF50	4	14-23	4	6.960%	4	SI
3	CC	1110475533	CHINCHILLA FREDY																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
4	CC	1124998591	CUAN IVAN																		23030 1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
5	CC	14249371	DEVIA ORLANDO																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
6	CC	5820784	DIAZ ALVARO	X	X																23020 1	2	EPS002	2	CCF50	2	14-23	2	6.960%	2	SI
7	CC	1110504159	FERREIRA YEISON																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
8	CC	1104951065	FLOREZ KEVIN		X																23030 1	5	EPS041	5	CCF50	5	14-23	5	6.960%	5	SI
9	CC	14233237	GARCIA ALVARO																		25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
10	CC	14254456	GARCIA GABRIEL																		23030 1	30	EPS041	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
11	CC	14295885	GUZMAN JONATHAN																		23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
12	CC	1110481021	HERNANDEZ ANDRES		X																23020 1	1	EPS005	1	CCF50	1	14-23	1	6.960%	1	SI
13	CC	1104707068	HURTADO CAROLINA																		25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
14	CC	80435042	LAITON ALVARO																		25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
15	CC	1098704264	LANCHEROS HYDELBRAN																		23100 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
16	CC	1110494606	LENIS ANDRES																		23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
17	CC	1013605907	LONDOÑO JUAN																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
18	CC	1109383189	LOZANO VICTOR																		23030 1	30	ESSC62	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
19	CC	1110538245	MAHECHA GUSTAVO	X																	23030 1	11	EPS002	11	CCF50	11	14-23	11	6.960%	11	SI
20	CC	14138539	MARROQUIN JOHN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
21	CC	28919894	MARTINEZ SAMANTA																		23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
22	CC	1110570886	MARTINEZ VICTOR																		23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
23	CC	1193049792	MARTINEZ WILSON		X																23030 1	8	EPS017	8	CCF50	8	14-23	8	6.960%	8	SI
24	CC	1007599923	MONROY RONALD																		25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
25	CC	14273322	PEDRAZA LUIS																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
26	CC	14138558	REINA CARLOS																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
27	CC	1110490809	REINOSO ARLEY																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
28	CC	1108998588	RESTREPO YEZID																		23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
29	CC	93395452	RODRIGUEZ LUIS																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI

185

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

17

CONSORCIO VÍAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág 69

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Cultura de Seguridad		RESPONSABLE DE EVENTO: Angelie	
TEMAS TRATADOS: * Responsabilidad compartida * Reporte de Incidentes, y actos Inseguros			
FECHA: 05-04-2025	LUGAR: tramo 17	DURACION: 10 H	FACILITADOR: Angelly
CARGO: ACX SST	EMPRESA: consorcio VIAS JCSR		FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	6820003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.116.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.116.840.618	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	83.248.899	MAESTRO OBRA	Nelson E. Cardozo
5	LUIS TIGREROS	1.116.870.842	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	8.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.235.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.362.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.404.277	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER ÑUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.928.179	AYUDANTE	
14	VICTOR ALFONSO RONDON	1109380472	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	14	No. Trabajadores asistentes	6	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	95%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VIAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo Psicosocial		RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly	
TEMAS TRATADOS: * Principales Factores * Estrategias de prevención e intervención			
FECHA: 04-09-2025	LUGAR: Tramo 17	DURACION: 0 H	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: Consorcio Vias JCSR		FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	8828083	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.840.918	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.248.899	MAESTRO OBRA	
5	LUIS TIGREROS	1.110.878.642	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.969.887	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.442	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.362.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.404.377	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	5.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	5.828.179	AYUDANTE	
14	VICTOR ALFONSO RONDON	1109300472	AYUDANTE	
	Vi			

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	14	No. Trabajadores asistentes	8	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	57.1%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR

REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Pág__ de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Cuidado de ojos

RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly

TEMAS TRATADOS:
* Riesgo y Factores que afectan los ojos.
* Higiene y buenAs Practicas

FECHA: 05-09-2025

LUGAR: tramo 17

DURACION: 6m

FACILITADOR: Angelly

CARGO: Aux SST

EMPRESA: Consorcio Vias Jcse

FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	5830003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.118.444.797	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.118.640.018	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	83.248.099	MAESTRO OBRA	
5	LUIS TIGREROS	1.118.879.842	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	8.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.909.697	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.362.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.362.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.464.277	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.828.179	AYUDANTE	
14	VICTOR ALFONSO RONDON	1109380472	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	14	No. Trabajadores asistentes	10	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	90%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR

REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Pág de

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: M Riesgo Quimico	RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly
TEMAS TRATADOS: * Etiquetado y almacenamiento correcto. * Uso de Guante y Mascarilla	
FECHA: 02-09-2025	LUGAR: Tramo 17
DURACION:	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: Consorcio Vias Jcsr
FIRMA: Angelly	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	8820003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.540.018	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.248.099	MAESTRO OBRA	Nelson E Cardozo.
5	LUIS TIORERO8	1.110.870.642	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	8.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.909.887	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.362.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.404.277	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.828.179	AYUDANTE	
14	VICTOR ALFONSO RONDON	1100300472	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	No. Trabajadores asistentes	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados
14	6	42%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR

REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Pág__ de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Uso Adecuado de Ha de Hard		RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly	
TEMAS TRATADOS: * Recomendaciones para el uso seguro * Errores comunes que se deben evitar.			
FECHA: 01-09-2025.	LUGAR: Piano 17	DURACION: 10M	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: Consorcio Vias JCSR		FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	6830003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.840.816	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	83.248.099	MAESTRO OBRA	Nelson E Cardoza
5	LUIS TIGREROS	1.110.578.642	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	6.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.302.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.238.442	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.382.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.404.277	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	6.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	6.828.178	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	5	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	38%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR

REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Pág__ de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Pausas activas

RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly

TEMAS TRATADOS:
* Estiramiento de cuello
* Respiración profunda y consciente

FECHA: 30-08-25

LUGAR: TRAMO 17

DURACION:

FACILITADOR: Angelly

CARGO: Aux SST

EMPRESA: Consorcio Vias JCSR

FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	5420003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.540.016	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	83.248.099	MAESTRO OBRA	
5	LUIS TIGREROS	1.110.670.642	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.235.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.382.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.464.277	AYUDANTE	Andres
12	JOSE JAVIER RUNGO	5.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	5.823.179	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	5	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	101.

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VÍAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Uso Adecuado de EPP		RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly	
TEMAS TRATADOS: * La importancia del uso de EPP. * Riesgos y enfermedades			
FECHA: 29-08-2025	LUGAR: tramo 17	DURACION: 10m	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: consorcio Vias JCSR.		FIRMA: Angela

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	8820083	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.777	RIO RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.540.818	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.248.099	MAESTRO OBRA	Nelson E. Cardozo
5	LUIS TIGREROS	1.110.870.542	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	6.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	8.969.697	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.362.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.235.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.342.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.464.277	AYUDANTE	Andres
12	JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.828.179	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	7	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	54

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS JCSR

REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Pág__de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo Ergonomico

RESPONSABLE DE EVENTOS: Angelly

TEMAS TRATADOS:
* Posturas Inadecuadas
* Levantamiento y Manipulacion incorrecta de carga

FECHA: 28-08-2025 | LUGAR: Tramo 17 | DURACION: | FACILITADOR: Angelly

CARGO: Aux SST | EMPRESA: Consorcio Vias JCSR | FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	5820003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.118.840.618	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.348.099	MAESTRO OBRA	Nelson E Cardozo
5	LUIS TIGREROS	1.110.870.842	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.362.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.464.377	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	5.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	5.838.179	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	7	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	54%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VÍAS JC8R	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__ de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo biologico		RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly	
TEMAS TRATADOS: Picaduras y Mordeduras			
FECHA: 28-08-2025	LUGAR: Tramo 17	DURACION: 10 M	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: Consorcio via JC8R		FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	8.520.083	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.848.616	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.248.899	MAESTRO OBRA	Nelson E Cardozo
5	LUIS TIOREROS	1.110.878.542	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.238.442	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.342.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.404.277	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	5.828.178	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	7	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	53.1

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VIAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__ de__

1. PLANIFICACIÓN

TEMA DEL EVENTO: Prevención de enfermedades calor y tratamiento físico	RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly
TEMAS TRATADOS: Tipe. de calor, deshidratacion y fracturas	

FECHA: 26-08-2025	LUGAR: Tramo 17	DURACIÓN: 10 M	FACILITADOR: Angelly
ÁREA: SST	EMPRESA: Consorcio Vias JCSR		FIRMA: Angelly

Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
DIEGO GIRON	8020093	DIRECTOR OBRA	
DANIEL GAMBOA	1.118.444.787	ING RESIDENTE	
GUILLERMO RODRIGUEZ	1.118.540.816	TOPOGRAFO	
NELSON CARDOZO	83.248.809	MAESTRO OBRA	Nelson E. Cardozo
LUIS TIGREROS	1.118.879.642	OPERADOR	
FERNEY ROMERO	8.971.712	OFICIAL	
LUIS ANDRES GARCIA	8.949.837	AYUDANTE	
MIGUEL JOSE PALACIOS	1.109.332.471	AYUDANTE	
JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.412	AYUDANTE	
ALVARO CUESTA	93.392.294	AYUDANTE	
ANDRES ALEJANDO MORENO	80.464.277	AYUDANTE	
JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.828.171	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	No. Trabajadores asistentes	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados
13	7	54%

FT-011 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VIAS JCSR

REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Pág 1 de 1

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Plan de emergencia

RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly

TEMAS TRATADOS:
1. Rutas de evacuacion
2. Procedimiento Ante Accidentes

FECHA: 25-08-25 | LUGAR: tramo 17 | DURACION: 10 M | FACILITADOR: Angell

CARGO: Aux SST | EMPRESA: Consorcio Vias JCSR | FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	8820003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.110.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.110.540.818	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.248.099	MAESTRO OBRA	Nelson E Cardozo.
5	LUIS TIGREROS	1.110.878.642	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	5.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	5.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.110.362.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.235.442	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.382.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	88.464.277	AYUDANTE	Andres
12	JOSE JAVIER RUNGO	5.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	5.826.179	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados: 15 | No. Trabajadores asistentes: 10 | % cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados): 99%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VIAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo Ergonomico	RESPONSABLE DE EVENTO: Arcyelly
TEMAS TRATADOS: * Levantamiento Manual de cargas. * Postura Forzada.	

FECHA: 23-08-2025	LUGAR: FRENTE 17	DURACION: 60 M	FACILITADOR: Arcyelly
CARGO: AUXSST	EMPRESA: Consorcio Vias JCSR		FIRMA: Arcyelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	8.520.003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.118.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.118.540.818	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	93.348.899	MAESTRO OBRA	
5	LUIS TIGREROS	1.118.870.842	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	8.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	8.969.687	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.100.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.442	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.342.244	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	88.604.277	AYUDANTE	
12	JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.928.178	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	No. Trabajadores asistentes	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	
13	5		38.1%

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__ de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo Fisico	RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly
TEMAS TRATADOS: *Tipo de Riesgo *Su impacto	

FECHA: 22-08-2025	LUGAR: Tramo 17	DURACION: 10H	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: Consorcio vias JCSR		FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO OIRON	8430003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.118.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.118.548.818	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	83.248.899	MAESTRO OBRA	Nelson E Cardozo
5	LUIS TIGREROS	1.118.870.843	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	6.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	6.969.697	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.199.382.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.230.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	93.382.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.404.277	AYUDANTE	Andres
12	JOSE JAVIER RUNGO	6.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	6.828.178	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	7	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	54%

FT-014 REV 00

Scanned with CamScanner

17

CONSORCIO VÍAS JCSR	REGISTRO ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Pág__de__

1. PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: EPP.		RESPONSABLE DE EVENTO: Angelly	
TEMAS TRATADOS: * Uso Adecuado de EPP * la importancia del uso de los epp			
FECHA: 21-08-25	LUGAR: frente 17	DURACION: 10M	FACILITADOR: Angelly
CARGO: Aux SST	EMPRESA: Consorcio Vias Jcsr		FIRMA: Angelly

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma asistencia
1	DIEGO GIRON	6020003	DIRECTOR OBRA	
2	DANIEL GAMBOA	1.118.444.787	ING RESIDENTE	
3	GUILLERMO RODRIGUEZ	1.118.840.816	TOPOGRAFO	
4	NELSON CARDOZO	83.248.899	MAESTRO OBRA	Nelson E. Cardoz
5	LUIS TIGRERos	1.119.879.542	OPERADOR	
6	FERNEY ROMERO	8.971.712	OFICIAL	
7	LUIS ANDRES GARCIA	8.969.697	AYUDANTE	
8	MIGUEL JOSE PALACIOS	1.119.302.471	AYUDANTE	
9	JHON JAIRO RODRIGUEZ	2.236.462	AYUDANTE	
10	ALVARO CUESTA	83.362.284	AYUDANTE	
11	ANDRES ALEJANDO MORENO	80.464.277	AYUDANTE	Andres
12	JOSE JAVIER RUNGO	8.938.412	OFICIOS VARIOS	
13	JUAN CARLOS MONTEALEGRE	8.828.179	AYUDANTE	

2. ANÁLISIS DE DATOS (Espacio reservado para el responsable de la actividad)

No. Trabajadores programados	13	No. Trabajadores asistentes	8	% cobertura (No. Trabajadores asistentes / No. Programados	60%

Scanned with CamScanner
