DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
&
COMERCIALIZADORA

PROYECTO:

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA EL MESÓN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CHORRERA BLANCA, ESCUELA RURAL MIXTA LOS QUINGOS, ESCUELA RURAL MIXTA EL MESON, ESCUELA RURAL MIXTA HONDURA, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSE DE CAUCA, ESCUELA RURAL MIXTA BELÉN, ESCUELA RURAL MIXTA LOMITAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

INFORME TÉCNICO DE OBRA

CON CORTE DE 20 DE JUNIO DE 2025 A DE 28 DE ENERO DE 2026

ELABORÓ

JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ

Representante Legal CHG

M.P 19202-313563 CAU

MORALES - CAUCA

2025

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO		PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL		FINAL X		01 DE 2025	20/07/2025	28/01/2026
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA EL MESON - RESGUARDO INDIGENA DE HONDURAS MORALES CAUCA					
N° PROCESO CONTRATACION SECOP	001					
CONTRATISTA	DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG S.A.S					
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901645964-1				EXPEDIDA EN	Popayán Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR	310839393993					
SUPERVISOR	WILLIAM BERMUDEZ CAMPO					
	RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA Rector Institución Educativa Indígena El Mesón					
INTERVENTOR	N/A					
No. DE IDENTIFICACIÓN	N/A				EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	N/A					
CDP No.	002-003				CRP No.	002
FORMA DE PAGO	Se otorgará un anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y jurídicos por parte de la Institución Educativa. • El 70% restantes serán pagados por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la interventoría y/o supervisión. • El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de Interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista.• En forma previa a la autorización de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.• Para que se haga efectivo el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra.				PAGO PARCIAL No.	PARCIAL N°1
VALOR CONTRATO INICIAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($132.690.846).					
VALOR ADICIONAL OTRO SI	N/A					

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($132.690.846).

OBJETO DEL CONTRATO

" Adecuación de infraestructura y reparación física de la Institución educativa Indígena el mesón sede escuela rural mixta chorrera blanca, escuela rural mixta los Quingos, escuela rural mixta el Mesón, escuela rural mixta hondura, escuela rural mixta san José de cauca, escuela rural mixta belén, escuela rural mixta lomitas del municipio de morales cauca"

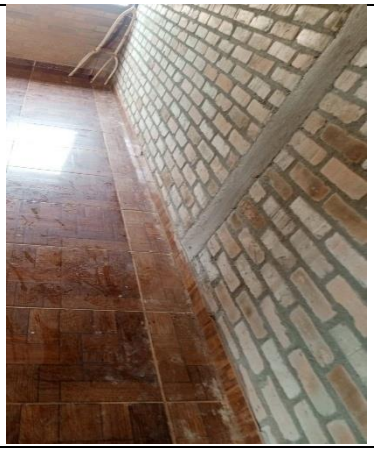
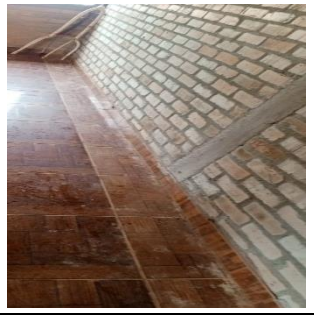
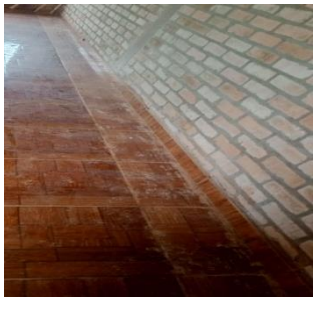
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

N°	1	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**16,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de vidrio.				
ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó el suministro e instalación de dieciocho (18) metros cuadrados de vidrio. • Limpieza y preparación de la superficie de los marcos donde se instalará el vidrio. • Colocación de empaques. • Instalación del vidrio en los vanos correspondientes. • Alineación, nivelación y ajuste del vidrio dentro del marco. • Sellado perimetral para garantizar hermeticidad. • Limpieza final del área de trabajo y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	2	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Piso en Cerámica being de 55.2 x 55.2 cm comercial, trafico 5 antideslizante				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación de un (1) metro cuadrado de piso en cerámica being de 55.2 x 55.2 cm comercial, trafico 5 antideslizante, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Transporte y suministro de materiales. • Trazado y replanteo de modulación de las piezas. • Nivelación y alineación de piezas utilizando separadores para juntas uniformes. • Fraguado inicial y posterior aplicación de boquilla. • Limpieza de excedentes de boquilla. • Revisión de nivel, alineación, juntas y acabado final. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	3	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**16,20**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de guarda escobas H=0,10 M				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación de dieciséis punto veinte (16,20) metros cuadrados de guarda escobas H=0,10 M. • Transporte y suministro de materiales. • Verificación de medidas en sitio y revisión del área. • Limpieza y preparación de la superficie del muro y del borde del piso para garantizar adecuada adherencia. • Colocación de piezas de guarda escobas siguiendo la modulación definida. • Alineación, nivelación y ajuste de las piezas, garantizando continuidad y uniformidad en la altura (0,10 m). • Fraguado inicial y posterior aplicación de boquilla en juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	4	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**1,60**
DESCRIPCION	Excavación en material conglomerado				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la excavación de uno punto sesenta (1,60) metros cuadrados en material conglomerado. • Transporte y suministro de herramientas y equipos. • Delimitación y señalización del área a intervenir. • Verificación en sitio de niveles, alineamientos. • Inicio de excavación mediante medios manuales • Perfilado y conformación de la excavación. • Revisión de cotas, niveles y condiciones finales de la excavación. • Limpieza final del área de trabajo. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	5	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**1,3**
DESCRIPCION	Relleno con material de excavación, compactado manualmente				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el relleno con material de excavación, compactado manualmente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Transporte y suministro de materiales • Extensión y nivelación del material dentro de la excavación. • Compactación del material por medios manuales. • Control de niveles y conformación final del relleno conforme a las cotas requeridas. • Repetición del proceso de colocación y compactación por capas hasta alcanzar el nivel de superficie. • Limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

<table>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"> </td></tr>
<tr><td>N°</td><td>6</td><td>SEDE</td><td colspan="3">BELEN</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>NP-3</td><td>UNIDAD</td><td>M2</td><td>CANTIDAD</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td colspan="5">Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES</td><td colspan="5">En el presente período se ejecutó el solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI de acuerdo con las especificaciones técnicas.
• Transporte y suministro.
• Colocación de bloques de concreto o plástico bajo la parrilla .
• Vaciado concreto de 2000 PSI
Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.</td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	7	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Zapata 0,60x6x0,25 en concreto 3000PSI				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación Zapata 0,60x6x0,25 en concreto 3000PSI, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Transporte y suministro de materiales al sitio. • Excavación manual hasta alcanzar la profundidad, incluyendo perfilado de fondo. • Retiro del material sobrante producto de la excavación. • Nivelación y compactación del fondo de la excavación. • Suministro y colocación de concreto de espesor aproximado de 5 cm. • Armado, amarre y colocación del acero de refuerzo según especificaciones estructurales. • Instalación de formaleta lateral en caso de requerirse, debidamente alineada y nivelada. • Vaciado de concreto de 3000 PSI en la zapata. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	8	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**4,2**
DESCRIPCION	Columneta de 0,20 m x 0,20 m en concreto 3000 PSI				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la construcción de Columneta de 0,20 m x 0,20 m en concreto 3000 PSI, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Transporte y suministro de materiales para construcción de columneta. • Colocación y amarre del acero de refuerzo. • Instalación de la formaleta. • Preparación y vaciado del concreto de 3000 PSI dentro del molde. • Retiro de la formaleta una vez el concreto haya endurecido. • Limpieza final del área y retiro de materiales sobrantes. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

<table>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>N°</td><td>9</td><td>SEDE</td><td colspan="3">BELEN</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>NP-6</td><td>UNIDAD</td><td>ML</td><td>CANTIDAD</td><td>16,2</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td colspan="5">Viga de 0,20 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES</td><td colspan="5">En el presente período se ejecutó la construcción de Viga de 0,20 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
• Transporte y suministro de materiales para la viga de 0,20 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI
• Armado y colocación del acero de refuerzo.
• Instalación de molde en madera, formaleta.
• Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI dentro de la formaleta.
• Retiro de la formaleta una vez el concreto haya endurecido.

Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.</td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"> </td></tr>
<tr><td>N°</td><td>10</td><td>SEDE</td><td colspan="3">BELEN</td></tr>
</table>

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**16,2**
DESCRIPCION	Cinta de amarre de 0,20x 0,15 m en concreto de 3000 PSI				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la construcción de cinta de amarre de 0,20x 0,15 m en concreto de 3000 PSI, especificaciones técnicas. • Transporte y suministro de materiales para la cinta de amarre de 0,20x 0,15 m en concreto 3000 PSI • Armado y colocación del acero de refuerzo. • Instalación de molde en madera, formaleta. • Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI dentro de la formaleta. • Retiro de la formaleta una vez el concreto haya endurecido. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	11	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	NP-8	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Adecuación eléctrica incluye cable, interruptores, caja, tubería etc.				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la instalación de una adecuación eléctrica, especificaciones técnicas. • Revisión y marcación de los puntos eléctricos según requerimientos. • Instalación de tubería. • Colocación de cajas eléctricas para tomas, interruptores y puntos de conexión. • Verificación de continuidad y correcto funcionamiento. • Limpieza final del área y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

<table>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>N°</td><td>12</td><td>SEDE</td><td colspan="3">BELEN</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>NP-9</td><td>UNIDAD</td><td>M2</td><td>CANTIDAD</td><td>20,7</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td colspan="5">Muro en ladrillo común limpio</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES</td><td colspan="5">En el presente periodo se realizó la construcción de Muro en ladrillo común limpio siguiendo especificaciones técnicas.
• Transporte y suministro para Muro en ladrillo común.
• Replanteo y marcación de la ubicación.
• Preparación del mortero de pega.
• Asentado de ladrillos en hiladas, garantizando alineación y nivelación.
• Limpieza de excedentes de mortero para lograr acabado.
• Limpieza final del área.

Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.</td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	13	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	TRANSPORTE	**UNIDAD**	**und**	**CANTIDAD**	**248**
DESCRIPCION	N/A				
ACTIVIDADES	• Cargue de materiales en el punto de origen, utilizando equipos adecuados. • Traslado de los materiales hasta el sitio de obra. • Descargue de materiales en el área designada. • Clasificación y ubicación de los materiales según tipo y uso.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

N°	14	**SEDE**	**BELEN**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**M3**	**CANTIDAD**	**8,0**
DESCRIPCION	Excavación en material conglomerado				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la excavación en material conglomerado en las siguientes zonas: • Delimitación del área a excavar según planos. • Limpieza y despeje del terreno, retirando capa vegetal o material superficial. • Excavación manual. • Perfilado y conformación de taludes. • Retiro, cargue y transporte del material excavado. • Limpieza final del área intervenida. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

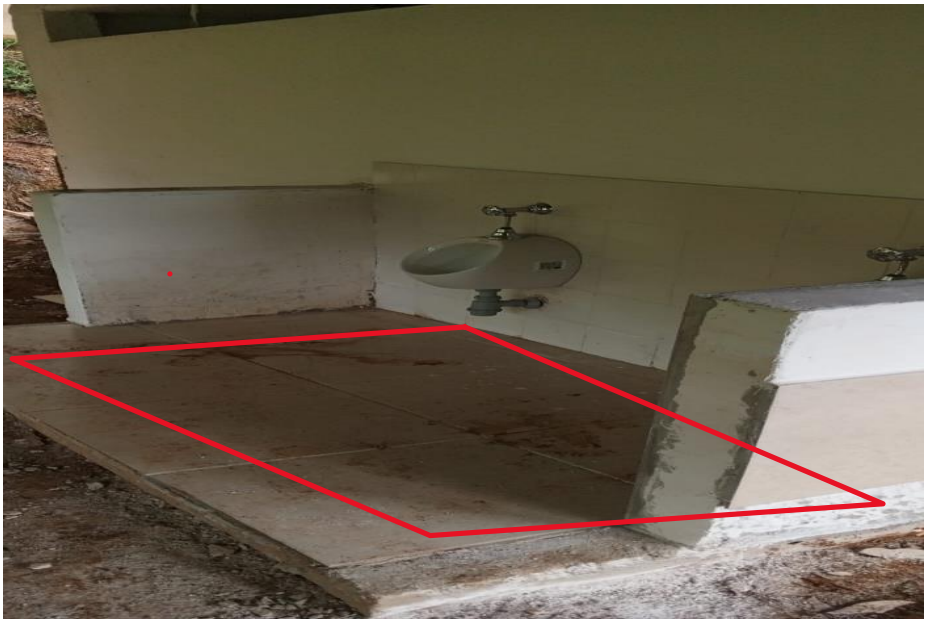
INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	15	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**3,9**
DESCRIPCION	Solado de limpieza E = 0,04 m en concreto de 2000 PSI				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la ejecución del solado de limpieza en concreto de 2000 PSI, con espesor E = 0,04 m en las siguientes áreas: • Humedecimiento del terreno para mejorar la adherencia del concreto. • Preparación y vaciado de concreto de 2000 PSI. • Extendido del concreto hasta alcanzar el espesor de 0,04 m. • Nivelación • Limpieza final del área. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	16	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,0**
DESCRIPCION	Losa de cimentación E= 0,12 m en concreto de 3000 PSI				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la construcción de la losa de cimentación E= 0,12 m en concreto de 3000 PSI. • Transporte y suministro de materiales • Limpieza, nivelación del terreno de apoyo. • Instalación de formaleta perimetral. • Suministro, corte, armado y colocación del acero de refuerzo. • Vaciado de concreto de 3000 PSI. • Extendido y distribución del concreto. • Nivelación y acabado superficial de la losa. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	17	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**3,2**
DESCRIPCION	Columneta de 0,12 m x 0,18 m en concreto 3000 PSI.				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación de tres punto dos (3,2) metros lineales de Columneta de 0,12 m x 0,18 m en concreto 3000 PSI, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Transporte y suministro de materiales para construcción de columneta. • Limpieza y preparación. • Instalación de formaleta. • Vaciado de concreto de 3000 PSI dentro de la formaleta. • Revisión de verticalidad y nivel del elemento. • Retiro de la formaleta una vez el concreto haya fraguado. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

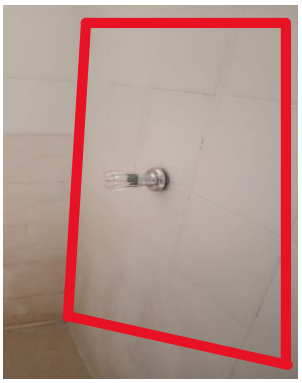
INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	18	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**1,4**
DESCRIPCION	Cinta de amarre de 0,12x 0,12 m en concreto de 3000 PSI				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la construcción la cinta de amarre de 0,12x 0,12 m en concreto de 3000 PSI • Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. • Armado y colocación del acero de refuerzo. • Instalación de formaleta lateral. • Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI. • Nivelación y acabado superficial del elemento. • Limpieza final del área. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	19	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-8	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**3,0**
DESCRIPCION	Muro en ladrillo farol rallado				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la construcción de muro en ladrillo farol rallado • Humedecimiento previo de los ladrillos para mejorar la adherencia. • Preparación del mortero de pega. • Asentado de ladrillo farol rallado en hiladas, garantizando alineación y nivelación. • Instalación adecuada de los ladrillos, respetando su orientación y acabado rallado. • Limpieza final del área. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°	20	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-9	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de puerta metálica de 0,60x 1,8 m, incluye marco, anticorrosivo, pintura. Calibre 20				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de puerta metálica de 0,60x 1,8 m • Verificación de medidas en obra. • Aplicación de base anticorrosiva para protección del material. • Instalación y fijación del marco metálico al vano mediante anclajes adecuados. • Colocación de la hoja de la puerta sobre el marco con bisagras. • Aplicación de pintura de acabado según especificaciones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	21	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-11	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Construcción de caja en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,4x0,4x0,5 incluye losa de fondo, tapa y cañuela				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la Construcción de caja en concreto de 3000 PSI reforzado: • Excavación manual del área. • Limpieza, nivelación y compactación del fondo de la excavación. • Vaciado de concreto de 3000 PSI para los muros laterales. • Construcción y colocación de la tapa en concreto reforzado. • Limpieza final del área. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	22	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-12	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación Sanitario Infantil incluye accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación Sanitario Infantil incluye accesorios, en las siguientes áreas: • Transporte de sanitario, accesorios, entre otros. • Limpieza y preparación. • Instalación de la base del sanitario. • Conexión al punto de desagüe con sello adecuado. • Instalación de accesorios. • Conexión al punto de suministro de agua. • Limpieza final del área y retiro de materiales sobrantes. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				

INFORME DE CONTRATISTA
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO						
N°	23	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**			
ITEM	NP-13	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**2,0**	
DESCRIPCION	Suministro e instalación de lavamanos empotrar línea corriente color blanco.					
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de lavamanos empotrar línea corriente color blanco. • Transporte de lavamanos. • Revisión de puntos hidráulicos existentes. • Instalación del lavamanos en la superficie. • Fijación del lavamanos. • Instalación del desagüe y sifón. • Sellado perimetral con silicona para evitar filtraciones.					
REGISTRO FOTOGRAFICO						

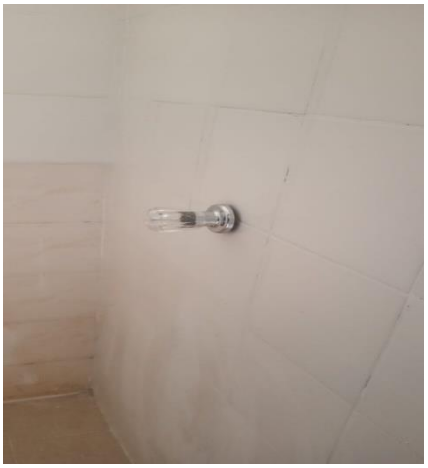
INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	24	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-14	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**2,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de orinal petite línea corriente color blanco				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de de orinal petite. • Transporte de cubierta. • Instalación de soportes, anclajes y accesorios necesarios para la fijación del orinal. • Montaje del orinal tipo petite línea corriente color blanco. • Conexión a la red de suministro de agua • Sellado perimetral para evitar filtraciones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	25	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-15	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion lava trapero con patas				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de instalación lava trapero con patas • Transporte de lava trapero. • Fijación de las patas de soporte. • Montaje del lava trapero. • Conexión a la red de suministro de agua. • Pruebas del flujo de agua. • Sellado en puntos de contacto para evitar filtraciones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	26	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-16	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de ducha.				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de ducha. • Marcación de la ubicación. • Instalación de tuberías y accesorios. • Conexión a la red de suministro de agua. • Sellado de roscas y uniones para garantizar hermeticidad. • Limpieza final del área de trabajo y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	27	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-17	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Instalaciones eléctricas incluye accesorios y regatas				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo las instalaciones eléctricas incluye accesorios y regatas. • Marcación de recorridos para canalizaciones, cajas y dispositivos eléctricos. • Ejecución de regatas en muros. • Suministro e instalación de tubería. • Instalación de dispositivos eléctricos. • Realización de empalmes y conexiones. • Limpieza final del área de trabajo y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					



INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	28	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-18	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Instalaciones hidrosanitarias incluye accesorios, regatas y excavaciones				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo las Instalaciones hidrosanitarias incluye accesorios, regatas y excavaciones. • Trazado de recorridos de tuberías. • Ejecución de regatas y excavaciones. • Suministro e instalación de tuberías y accesorios hidráulicos y sanitarios. • Conexión a redes de agua potable y desagüe. • Realización de empalmes y aseguramiento de uniones herméticas. • Pruebas de presión y funcionamiento para verificar ausencia de fugas. • Limpieza final y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°	29	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-19	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**15,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de enchape piso				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de instalación de enchape piso. • Replanteo y modulación del enchape según el diseño. • Aplicación de mortero. • Colocación de enchape de piso. • Instalación de separadores para uniformidad de juntas. • Limpieza final de la superficie y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	30	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-20	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**11,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación enchape pared 20x20 blanco				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de enchape pared • Limpieza, nivelación y preparación de la superficie. • Replanteo y modulación del enchape según diseño. • Aplicación de mortero. • Colocación de enchape de pared. • Instalación de separadores para uniformidad de juntas. • Sellado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°	31	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-21	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**21,0**
DESCRIPCION	Repello 1: 3 E= 2 cm				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo Repello 1: 3 E= 2 cm. • Limpieza y humedecimiento de la superficie. • Replanteo de niveles y espesores (e= 2 cm). • Preparación de mortero. • Aplicación del repello sobre la superficie. • Afinado y nivelación del mortero para lograr acabado uniforme. • Curado del repello para evitar fisuras. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	32	**SEDE**	**CHORRERA BLANCA**		
ITEM	NP-22	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**1,4**
DESCRIPCION	Piso primario E= 5 cm				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la ejecución de Piso primario E= 5 cm • Limpieza, nivelación y compactación de la superficie. • Replanteo de niveles y espesores (e= 5 cm). • Colocación de capa base si se requiere. • Preparación y extendido del concreto para piso primario. • Nivelación y afinado de la superficie. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	33	**SEDE**	**MESON**		
ITEM	2	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**15,0**
DESCRIPCION	Suministro e Instalación de tejas termo acústicas				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la Instalación de tejas termo acústicas. • Suministro de tejas termoacústicas en sitio. • Instalación de las tejas, asegurando correcta alineación y traslapos. • Fijación mediante tornillería. • Sellado de uniones para garantizar impermeabilidad. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	34	**SEDE**	**MESON**		

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	3	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de caballete termo acústicas				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo suministro e instalación caballete termo acústicas • Transporte de caballetes termoacústicos en sitio. • Instalación de los caballetes sobre la cumbrera. • Fijación mediante tornillería. • Sellado de uniones para garantizar impermeabilidad. • Ajuste y verificación de alineación. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	35	**SEDE**	**MESON**		
ITEM	4	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**10,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de tejas de Eternit y accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de tejas de Eternit y accesorios. • Suministro y disposición de tejas de Eternit. • Instalación de las tejas, asegurando correcta alineación y traslapos. • Fijación mediante tornillería. • Sellado de uniones para garantizar impermeabilidad. • Verificación de alineación. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°	36	**SEDE**	**MESON**		

INFORME DE CONTRATISTA
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	5	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**5,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de caballetes y accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de caballetes y accesorios. • Limpieza, nivelación y preparación de la superficie. • Replanteo y modulación del enchape según diseño. • Aplicación de mortero. • Colocación de enchape de pared. • Instalación de separadores para uniformidad de juntas. • Sellado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	37	**SEDE**	**MESON**		
ITEM	9	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**72,2**
DESCRIPCION	Piso en cerámica being de 55,2 x 55,2 cm uso comercial, trafico 5 antideslizante				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la ejecución de en cerámica being de 55,2 x 55,2 cm uso comercial, trafico 5 antideslizante. • Limpieza, nivelación y preparación de la superficie. • Aplicación de mortero. • Colocación de piso en cerámica beige de 55,2 x 55,2 cm. • Instalación de separadores para uniformidad de juntas. • Limpieza final de la superficie y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°	38	**SEDE**	**MESON**		

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	10	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**13,7**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de guarda escobas H=0,10 m				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de guarda escobas H=0,10 m. • Limpieza y preparación de la superficie de instalación. • Replanteo y marcación de niveles y alineación (H= 0,10 m). • Corte y ajuste de piezas según dimensiones requeridas. • Aplicación de mortero. • Colocación de guarda escobas, garantizando alineación y nivelación. • Sellado y acabado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	39	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**15,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de luminarias led 0,6x 0,6				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de luminarias led 0,6x 0,6. • Marcación de ubicación de luminarias. • Adecuación del espacio en cielo raso. • Instalación y fijación de las luminarias, asegurando correcta alineación. • Conexión al sistema eléctrico y accesorios correspondientes. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	       				
N°	40	**SEDE**	**HONDURAS**		

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	6	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**40,0**
DESCRIPCION	Contrapiso reforzado e= 10 cm 3000 psi				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la construcción de contrapiso reforzado e= 10 cm 3000 psi • Replanteo de niveles y espesores (e= 10 cm). • Colocación de formaletas si se requiere. • Preparación y vaciado de concreto de 3000 PSI. • Nivelación y afinado del contrapiso. • Curado del concreto para garantizar resistencia. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	41	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	7	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**5,65**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de vidrio incoloro				
ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó el suministro e instalación de vidrio incoloro. • Limpieza y preparación de la superficie de los marcos donde se instalará el vidrio. • Colocación de empaques. • Instalación del vidrio en los vanos correspondientes. • Alineación, nivelación y ajuste del vidrio dentro del marco. • Sellado perimetral para garantizar hermeticidad. • Limpieza final del área de trabajo y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	42	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	8	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**3,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de lavamanos colgar color blanco incluye accesorios y grifo mono control corto				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de lavamanos. • Instalación de soportes y anclajes para lavamanos de colgar. • Montaje del lavamanos. • Instalación de grifo mono comando corto y accesorios complementarios. • Conexión a la red de suministro de agua y desagüe. • Sellado de uniones para hermeticidad. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  **NOTA:** La coordinación de la sede solicito verbalmente entregar el tercer lavamanos para instalarlo en otro momento por cuenta de la institución.				
N°	43	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	9	**UNIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**	**3,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalación Orinal blanco incluye accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación Orinal blanco incluye accesorios. • Marcación de ubicación conforme a planos y alturas establecidas. • Instalación de soportes y anclajes para el orinal. • Montaje del orinal color blanco, garantizando nivelación y alineación. • Instalación de accesorios complementarios. • Conexión a la red de suministro de agua y desagüe. • Sellado de uniones para hermeticidad. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	44	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	10	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**18,23**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de teja en fibrocemento				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de teja en fibrocemento. • Suministro y disposición de tejas en fibrocemento en sitio. • Instalación de las tejas, garantizando correcta alineación y traslapos. • Fijación mediante tornillería. • Instalación de cumbreras. • Sellado de uniones para impermeabilidad. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°	45	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	NP.1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**7,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalación punto eléctrico de iluminación sencilla incluye accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de punto eléctrico de iluminación sencilla incluye accesorios. • Marcación de ubicación de luminarias. • Adecuación del espacio en cielo raso. • Instalación y fijación de las luminarias, asegurando correcta alineación. • Conexión al sistema eléctrico y accesorios correspondientes. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	     					
N°	46	**SEDE**	**HONDURAS**			
ITEM	NP.3	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**3,0**	
DESCRIPCION	Suministro e instalación Punto sanitario PVC 2 “incluye accesorios					
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación Punto sanitario PVC 2 “incluye accesorios. • Ejecución de regatas. • Suministro e instalación de tubería PVC de 2” y accesorios. • Conexión al sistema de desagüe existente. • Realización de uniones para garantizar hermeticidad. • Pruebas de funcionamiento para verificar adecuado drenaje y ausencia de fugas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas					
REGISTRO FOTOGRAFICO						
N°	47	**SEDE**	**HONDURAS**			
ITEM	NP.4	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**2,00**	
DESCRIPCION	Suministro e instalación Claraboya No.6 incluye accesorios					
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación Claraboya No.6 incluye accesorios. • Marcación de la ubicación de la claraboya No. 6. • Apertura del vano en cubierta según dimensiones requeridas. • Suministro y disposición de la claraboya y accesorios en sitio. • Instalación y fijación de la claraboya, asegurando correcta alineación. • Sellado perimetral para garantizar impermeabilidad.					

	Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	48	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	NP.5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**3,5**
DESCRIPCION	Suministro e instalación enchape para pared				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de enchape para pared • Limpieza, nivelación y preparación de la superficie. • Replanteo y modulación del enchape según diseño. • Aplicación de mortero. • Colocación de enchape de pared. • Instalación de separadores para uniformidad de juntas. • Sellado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	49	**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	NP.6	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**3,5**
DESCRIPCION	Repello muro 1: 3				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo Repello 1: 3. • Limpieza y humedecimiento de la superficie. • Replanteo de niveles y espesores. • Preparación de mortero. • Aplicación del repello sobre la superficie. • Afinado y nivelación del mortero para lograr acabado uniforme. • Curado del repello para evitar fisuras. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas					
REGISTRO FOTOGRAFICO	 					
N°	50	**SEDE**	**HONDURAS**			
ITEM	NP.7	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**12,0**	
DESCRIPCION	Suministro e instalación Canal lamina galv Cal 20. D=0,61m Inc. Pintura anticorrosiva y de aceite, tapas, boquilla					
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación Canal. • Suministro y disposición de canal en lámina galvanizada Cal. 20 y accesorios. • Instalación y fijación de la canal. • Instalación de tapas, boquillas y elementos complementarios. • Aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado en aceite. • Sellado de uniones para evitar filtraciones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas					
REGISTRO FOTOGRAFICO						
N°	51	**SEDE**	**HONDURAS**			
ITEM	NP.8	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**2,7**	
DESCRIPCION	GBL					

INFORME DE CONTRATISTA
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES	• Se realizo el global de la instalación Canal lamina galv Cal 20. D=0,61m. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	52	**SEDE**	**LOMITAS**		
ITEM	6	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**2,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de puerta metálica batería sanitaria				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de puerta metálica batería sanitaria • Verificación de medidas en obra. • Aplicación de base anticorrosiva para protección del material. • Instalación y fijación del marco metálico al vano mediante anclajes adecuados. • Colocación de la hoja de la puerta sobre el marco con bisagras. • Aplicación de pintura de acabado según especificaciones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	53	**SEDE**	**LOMITAS**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**10,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de vidrio incoloro				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó el suministro e instalación de vidrio incoloro. • Limpieza y preparación de la superficie de los marcos donde se instalará el vidrio. • Colocación de empaques. • Instalación del vidrio en los vanos correspondientes. • Alineación, nivelación y ajuste del vidrio dentro del marco. • Sellado perimetral para garantizar hermeticidad. • Limpieza final del área de trabajo y retiro de residuos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	54	**SEDE**	**LOMITAS**		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**53,4**
DESCRIPCION	Suministro e instalación Teja zinc Arquitectónica Incluye Amarras				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de teja zinc arquitectónica Incluye amarras • Transporte de teja zinc arquitectónica en sitio. • Instalación de las tejas, garantizando alineación y traslapos. • Fijación mediante amarras. • Instalación de remates y elementos complementarios. • Sellado de uniones para impermeabilidad.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	55	**SEDE**	**LOMITAS**		
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**53,4**
DESCRIPCION	Suministro e instalación Caballete Teja zinc Arquitectónica Incluye Amarras				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó la instalación del caballete teja zinc arquitectónica Incluye amarras • Transporte de caballete en teja zinc arquitectónica en sitio. • Instalación del caballete, garantizando traslapos adecuados. • Fijación mediante amarras. • Sellado de uniones para garantizar impermeabilidad. • Verificación de alineación y estabilidad del elemento. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.
REGISTRO FOTOGRAFICO	

N°	56	**SEDE**	**BATERIA SAN JOSE**		
ITEM	-	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**Gbl**
DESCRIPCION	**Construcción batería sanitaria**				
ACTIVIDADES	En el periodo de llevo a cabo la construcción de la batería sanitaria • Excavaciones. • Figurado en instalacion de acero de refuerzo • Construcción de losa, columnas, vigas, muros en mamposteria confinada y repello • Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas • Instalacion de enchape pido y pared • Instalación de cubierta • Instalacion de aparatos sanitarios • Construcción sistema séptico • Instalacion carpintería metalica				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	           				
N°	57	**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**M3**	**CANTIDAD**	**7,7**
DESCRIPCION	Excavación en material conglomerado				
ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó excavación en material conglomerado. • Demarcación de la zona a intervenir. • Excavación manual del material conglomerado. • Cargue, retiro y disposición del material excavado en sitio autorizado. • Control de niveles y cotas de excavación. • Limpieza final del área intervenida. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	58	**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	**M3**	**CANTIDAD**	**5,5**
DESCRIPCION	Relleno con material de excavación, compactado manualmente				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó relleno con material de excavación, compactado manualmente, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Transporte y suministro de materiales • Extensión y nivelación del material dentro de la excavación. • Compactación del material por medios manuales. • Control de niveles y conformación final del relleno conforme a las cotas requeridas. • Repetición del proceso de colocación y compactación por capas hasta alcanzar el nivel de superficie. • Limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°	59	**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**8,8**
DESCRIPCION	Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Transporte y suministro. • Colocación de bloques de concreto o plástico bajo la parrilla. • Vaciado concreto de 2000 PSI Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°	60	**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**8,0**
DESCRIPCION	Zapata 0,8x 0,8x 0,25 m en concreto 3000 PSI				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación Zapata 0,8x 0,8x 0,25 m en concreto 3000PSI, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Transporte y suministro de materiales al sitio. • Excavación manual hasta alcanzar la profundidad, incluyendo perfilado de fondo. • Retiro del material sobrante producto de la excavación. • Nivelación y compactación del fondo de la excavación. • Suministro y colocación de concreto de espesor aproximado de 5 cm. • Armado, amarre y colocación del acero de refuerzo según especificaciones estructurales. • Instalación de formaleta lateral en caso de requerirse, debidamente alineada y nivelada. • Vaciado de concreto de 3000 PSI en la zapata. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°	61	**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**18,8**
DESCRIPCION	Columneta de 0,20 m x 0,22 m en concreto 3000 PSI				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la construcción de Columneta de 0,20 m x 0,20 m en concreto 3000 PSI, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Transporte y suministro de materiales para construcción de columneta. • Colocación y amarre del acero de refuerzo. • Instalación de la formaleta. • Preparación y vaciado del concreto de 3000 PSI dentro del molde. • Retiro de la formaleta una vez el concreto haya endurecido. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
ITEM	62	**UNIDAD**	**Kg**	**CANTIDAD**	**258,6**
DESCRIPCION	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Revisión de planos y especificaciones del acero de refuerzo. • Suministro, corte, doblado y armado del acero No. 3. • Instalación y amarre del refuerzo. • Verificación final y limpieza del área de trabajo. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°	63	**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**18,8**
DESCRIPCION	Muro en ladrillo farol limpio				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la construcción de Muro en ladrillo farol limpio siguiendo especificaciones técnicas. • Transporte y suministro para Muro en ladrillo farol limpio. • Replanteo y marcación de la ubicación. • Preparación del mortero de pega. • Asentado de ladrillos en hiladas, garantizando alineación y nivelación.				

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025

	• Limpieza de excedentes de mortero para lograr acabado. • Limpieza final del área. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.
REGISTRO FOTOGRAFICO	   
	Juan Carlos Chilito Sanchez R.L Diseño Construccion y Comercializadora CHG SAS Nit: 901645904-1

INFORME DE CONTRATISTA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025
