ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

CONTRATO 1380 DE 2025 - REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No 07

PERIODO 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CONSORCIO MYE BOGOTÁ



FEBRERO 2026

Versión 1


CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN N°.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FOLIOS
0	23/02/2026	VERSION INICIAL	28

EMPRESA CONTRATISTA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ING. VILMA ZARATE	ARQ. ANGELICA SIERRA	ARQ. ANGELICA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTORA DE OBRA**	**DIRECTORA DE OBRA**

EMPRESA INTERVENTORA

Revisado por:	Aprobado por:
	
ING. SEBASTIAN BETANCOURT	ARQ. EDUARDO ANDRÉS ACERO CAJIGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 5
1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación 5
1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones 6
1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias. 6
2. ASPECTOS TECNICOS 7
2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo 7
2.1.1. MET 07- 1380-L1-035 8
2.1.2. MET 07 - 1380-L1-036 8
2.1.3. MET 07 - 1380-L1-037 9
3. Componente de calidad 9
3.1.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo 9
3.1.2. Evaluación de la calidad del concreto 23
4. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST 23
4.1. Personal del proyecto 23
4.1.1. Personal SST 24
4.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración 24
4.2. Gestión SST Durante el Periodo 25
5. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL 26
6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL 27
7. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA 28

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales 5
Tabla 2. Valor del Contrato 6
Tabla 3. Garantías del contrato. 6
Tabla 4. Actividades Realizadas durante el Periodo 7
Tabla 5. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 15
Tabla 6. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 15
Tabla 7. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 18
Tabla 8. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 18
Tabla 9. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 21
Tabla 10. Personal Calidad y SST 24
Tabla 11. Personal Profesionales y Plantilla Mínima 24
Tabla 12. Ejecución presupuestal general del contrato 27
Tabla 13. Ejecución Presupuestal por Troncal 27

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Verificación de calidad de elementos metálicos.....10
Ilustración 2. Verificación de calidad de elementos metálicos.....11
Ilustración 3. Verificación de calidad de elementos metálicos.....11
Ilustración 4. Verificación de calidad de elementos metálicos.....12
Ilustración 5. Verificación de calidad de elementos metálicos.....13
Ilustración 6. Verificación de calidad de elementos metálicos.....14
Ilustración 7. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 16
Ilustración 8. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 17
Ilustración 9. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 19
Ilustración 10. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos.....20
Ilustración 11. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos.....22
Ilustración 12. Registros Resultados De Laboratorio Concreto.....23
Ilustración 13. Indicadores SGSST.....25
Ilustración 14. Ejecución Presupuestal por troncal 28

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación

Tabla 1. *Datos Generales*

INFORMACIÓN	CONSULTOR		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	***1380-2025***		***1369 - 2025***	
OBJETO	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1		REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN (LOTE 1 Y LOTE 2), CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. .	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**CONSORCIO MYE BOGOTA**	**Participación**	**CONSORCIO ALIANZA XXI**	**Participación**
	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS S.A.S	45.00%	DAIMCO S.A.S	99.90%
	MR GROUP COL S.A.S	45.00%	DIBENEM S.A.S	0.10%
	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S	10.00%		
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 DE JUNIO DE 2025		16 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE INICIO:	21 DE JULIO DE 2025		21 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**21 DE OCTUBRE DE 2026**		**21 DE OCTUBRE DE 2026**	

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones

Tabla 2. *Valor del Contrato*

CONSULTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$13,750,000,000.00 COP
VALOR ADICIONES	$6,672,853,444.00 COP
VALOR TOTAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO	$20,422,853,444.00 COP

1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias.

Tabla 3. *Garantías del contrato.*

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	**BCH-100044568** De Cumplimiento	Emisión de Pólizas de garantía al contrato 1380-2025	*Cumplimiento del Contrato*	21/07/2025	21/11/2026	$4,125,000,000.00
			Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	21/07/2025	21/05/2029	$1,375,000,000.00
			Estabilidad de la obra	21/05/2026	21/05/2031	$4,125,000,000.00
	BCH-100009725 Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento		*Amparo básico*	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Contratistas y subcontratistas	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Vehículos propios y no propios	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Patronal	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			R.C. Cruzada	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizó la intervención de las siguientes estaciones:

Tabla 4. *Actividades Realizadas durante el Periodo*

No DE ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1380-L1-035	CARRERA DECIMA	PORTAL 20 DE JULIO	MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-036	NQS SUR	PORTAL SUR	MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-037	CALLE 26	PORTAL EL DORADO	MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN	EN EJECUCION

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

2.1.1. MET 07- 1380-L1-035

REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN, en el PORTAL 20 DE JULIO se realiza el reemplazo de los vidrios de la fachada por lamina corte laser.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
CARRERA DECIMA	PORTAL 20 DE JULIO	REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.1.2. MET 07 - 1380-L1-036

REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN, en el PORTAL SUR se realiza el reemplazo de los vidrios de la fachada por lamina corte laser.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NQS SUR	PORTAL SUR	REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

2.1.3. MET 07 - 1380-L1-037

REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN, en el PORTAL EL DORADO se está realizando el reemplazo de los vidrios de la fachada por lamina corte laser.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
CALLE 26	PORTAL EL DORADO	REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		EN EJECUCION

3. Componente de calidad

3.1.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo

En el marco del plan de inspección de calidad de los elementos fabricados e instalados, se siguen los parámetros para la validación de los estándares de aceptación de cada uno de los elementos.

Para todos los ítems del contrato, se siguen tres aspectos de control de calidad, uno de ellos es la verificación visual, en donde se debe validar cada uno de los cordones de soldadura en los elementos que los requieran, como las estructuras metálicas o en los tubos del cerramiento tipo onda. Que estos estén correctamente soldados, sobre todo, que no falte ninguna de las uniones en cada uno de los elementos instalados.

Las validaciones empleadas a los materiales fabricados se harán a una muestra representativa del total del lote, para este caso en particular, se realizarán las inspecciones al 10% de los elementos, como se indica en el plan de inspección de calidad del contrato.

Como segunda medida, se valida la dimensionalidad de los elementos fabricados, se verifica también la ortogonalidad en el montaje de la estructura metálica y en los tubos instalados en el costado oriental en el marco de la ejecución del cerramiento tipo onda, en donde, se toman

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

las medidas longitudinales y transversales, además de las distancias entre los elementos instalados.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico como evidencia de las inspecciones y verificaciones realizadas tanto en taller como en el sitio de la obra.

Ilustración 1. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
Validacion Dimensiones y Longitudes en obra PORTAL 20 DE JULIO













CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.


Ilustración 2. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
Validacion Dimensiones y Longitudes en obra ESTACION CALLE 106



Ilustración 3. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
Validacion Dimensiones y Longitudes en obra PORTAL SUR

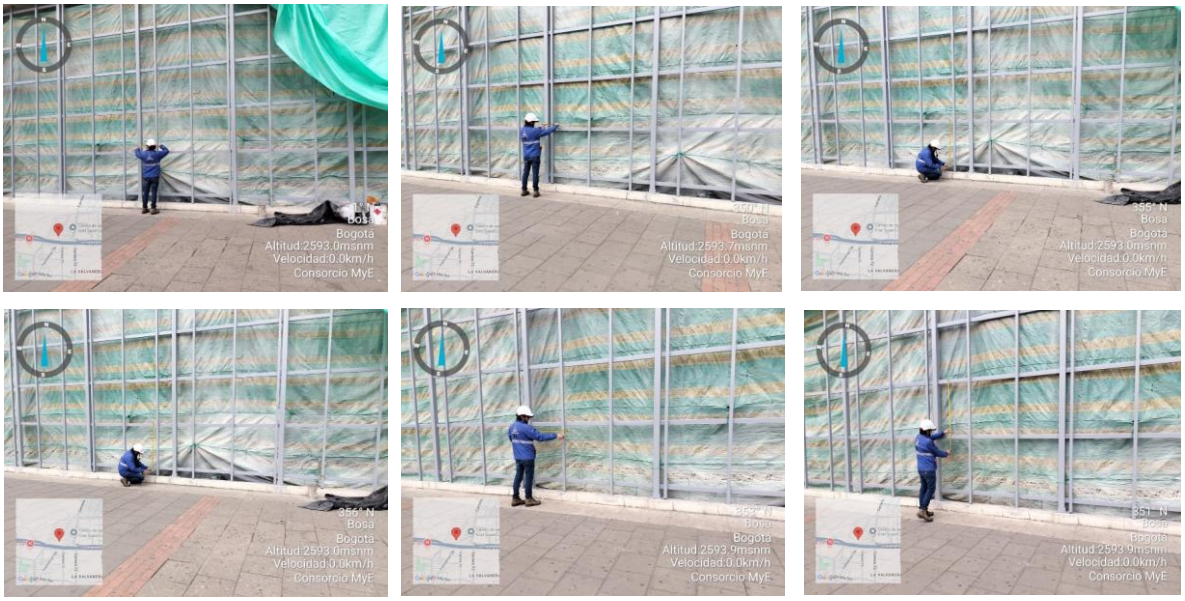

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 4. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN

Validacion Plomo y alineaciones en obra en PORTAL 20 de JULIO



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 5. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN

Validacion Plomo y alineaciones en obra PORTAL SUR



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 6. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

Validacion Plomo y alineaciones en obra en estación CALLE 106



En el marco de las constantes tomas y medidas de calidad e inspección exigidas a los elementos instalados, se realiza lectura de los espesores en la pintura aplicada sobre los elementos metálicos. Esta validación se realiza tanto a la capa aplicada de barrera anticorrosiva, como a la capa final de la pintura de acabado una vez haya secado correctamente, supervisando que los espesores aplicados estén dentro de los permitidos según lo definido en el plan de inspección de calidad y la normativa establecida vigente.

A continuación, se muestra en tablas anexas, las lecturas de los espesores de pintura (en unidad de medida *MILS)*, aplicado de acuerdo con las actividades en cada uno de los frentes activos en el periodo del presente informe y la evidencia fotográfica que corrobora los datos en cada una de las lecturas relacionadas de la siguiente manera:

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Tabla 5. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos

TOMA DE REGISTROS ESPESORES DE PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS				
ESTACIÓN	**ESPICIFICACIÓN**	**ELEMENTO**	**MEDICIÓN {mils}**	**CRITERIO {>6 mils}**
NQS SUR **PORTAL SUR**	**MET-07**	Estructura - Barrera	9.7	Cumple
			8.9	Cumple
			11.7	Cumple
			9.9	Cumple
			11.9	Cumple
			10.3	Cumple
			15.7	Cumple
			11.6	Cumple
			11.9	Cumple
			15.3	Cumple
			9.2	Cumple
			14.8	Cumple
			15.7	Cumple
			9.8	Cumple
			11.4	Cumple

Tabla 6. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos

TOMA DE REGISTROS ESPESORES DE PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS				
ESTACIÓN	**ESPICIFICACIÓN**	**ELEMENTO**	**MEDICIÓN {mils}**	**CRITERIO {>9 mils}**
NQS SUR **PORTAL SUR**	**MET-07**	Estructura - Capa final	15.7	Cumple
			12.0	Cumple
			15.0	Cumple
			13.0	Cumple
			12.1	Cumple
			12.3	Cumple
			19.0	Cumple
			19.3	Cumple
			16.6	Cumple
			16.1	Cumple
			12.1	Cumple
			14.3	Cumple

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 7. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

REGISTRO FOTOGRAFICO EN OBRA MET 07- PORTAL SUR



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 8. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

REGISTRO FOTOGRAFICO EN OBRA MET 07- PORTAL SUR



Con el fin de llevar trazabilidad de los espesores de todos los elementos metálicos a continuación se presentan las mediciones de capa final de recubrimiento de pintura en mils, de la estación San Diego, ítem de las ordenes de trabajo correspondientes al periodo anterior,

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Tabla 7. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos

TOMA DE REGISTROS ESPESORES DE PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS				
ESTACIÓN	**ESPICIFICACIÓN**	**ELEMENTO**	**MEDICIÓN {mils}**	**CRITERIO {>9 mils}**
CARRERA 10 SAN DIEGO	**MET- 11**	Celosías - Capa final	16.2	Cumple
			15.9	Cumple
			16.1	Cumple
			21.7	Cumple
			10.5	Cumple
			18.3	Cumple
			19.1	Cumple
			12.5	Cumple
			24.9	Cumple
			19.1	Cumple
			17.5	Cumple
			23.3	Cumple

Tabla 8. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos

TOMA DE REGISTROS ESPESORES DE PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS				
ESTACIÓN	**ESPICIFICACIÓN**	**ELEMENTO**	**MEDICIÓN {mils}**	**CRITERIO {>9 mils}**
CARRERA 10 SAN DIEGO	**MET- 02**	Celosías - Capa final	15.9	Cumple
			18.3	Cumple
			15.6	Cumple
			13.1	Cumple
			12.5	Cumple
			17.3	Cumple
			12.9	Cumple
			10.8	Cumple
			17.9	Cumple
			18.2	Cumple
			12.7	Cumple

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 9. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

REGISTRO FOTOGRAFICO EN OBRA MET 11- SAN DIEGO



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 10. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

REGISTRO FOTOGRAFICO EN OBRA MET 02- SAN DIEGO



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Con el fin de llevar trazabilidad de los espesores de todos los elementos metálicos a continuación se presentan las mediciones de capa final de recubrimiento de pintura en mils, de la estación Calle 106, ítem MET 03 correspondiente a la ordenes de trabajo del periodo anterior

Tabla 9. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

TOMA DE REGISTROS ESPESORES DE PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS MET 03				
ESTACIÓN	**ESPICIFICACIÓN**	**ELEMENTO**	**MEDICIÓN {mils}**	**CRITERIO {>6 mils}**
CALLE 106	**MET- 03**	Cerramiento - Capa final	30.3	Cumple
			9.1	Cumple
			15.4	Cumple
			12.4	Cumple
			16.2	Cumple
			21.2	Cumple
			13.5	Cumple
			12.7	Cumple
			18.7	Cumple
			14.1	Cumple

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 11. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

REGISTRO FOTOGRAFICO EN OBRA MET 03- CALLE 106



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

3.1.2. Evaluación de la calidad del concreto

En el periodo anterior, Se realizan los procedimientos de control y calidad según los estándares establecidos por la normatividad vigentes. Conforme a ello, para el presente informe, se presentan los resultados de las pruebas realizadas al concreto, los cuales hacen referencia únicamente al frente de obra de la estación calle 106, arrojando los siguientes resultados:

Ilustración 12. *Registros Resultados De Laboratorio Concreto*

CONSORCIO MYE BOGOTA / FUNDIDA DE CONCRETO / 1380-2025									
CONCRETO 3000 PSI ACELERADO A 3 DIAS							RESULTADOS		
ESTACION	SELLO	PROVEEDOR	REMISION	CANT (M3)	SLUMP	UBICACIÓN	3 DIAS	7 DIAS	No. Inf
CALLE 106	7680	COVAL	7803	6,50	5,5"	VIGA ORIENTAL	97,84%	106,73%	805
CALLE 106	7680	COVAL	7803	6,50	5,5"	VIGA ORIENTAL	91,85%	107,65%	805
CALLE 106	7710	COVAL	7833	4,50	6"	VIGA ORIENTAL	103,14%	105,44%	809
CALLE 106	7711	COVAL	7834	4,50	6"	VIGA ORIENTAL	98,16%	104,74%	809
CALLE 106	7754	COVAL	7876	6,00	5"	VIGA ORIENTAL	102,65%	103,88%	811
CALLE 106	7754	COVAL	7877	6,00	6"	VIGA ORIENTAL	98,84%	108,71%	811

4. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST

El Consorcio MYE implementa el Sistema de Gestión de SST (SG-SST) conforme a la normatividad legal y contractual, priorizando la prevención de riesgos laborales, la protección de los trabajadores y la garantía de entornos seguros, dando cumplimiento al 100% el plan de trabajo del SGSST.

4.1. Personal del proyecto

El equipo cuenta con ingenieros de SST, ambientales, inspectores, residentes de obra y personal administrativo, con organigrama y estructura definida para la ejecución del contrato.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

4.1.1. Personal SST

Por parte del componente se indica el siguiente personal de apoyo y de interventoría

Tabla 10. *Personal Calidad y SST*

PROFESIONAL	CARGO
Oscar Ciendua Torres	Ing. de Calidad Y SST – interventoría
Catherine Duque Botero	Ing. de Calidad Y SST
Miguel Ángel Briceño Velosa	Ing. de Calidad Y SST
Tatiana Rocío Ricardo Torres	Inspector Calidad Y SST

4.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración

Tabla 11. *Personal Profesionales y Plantilla Mínima*


N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Daniel Antonio Ávila Navarro	1.020.795.956	Coordinador De Proyecto - Apoyo
2	Jeny Angelica Sierra Mayorga	52.027.642	Director De Proyecto
3	Vilma Zulay Zarate Pérez	68.298.776	Residente De Obra
4	Edward Fabian Martínez Palomino	1.019.104.383	Residente De Obra
5	Miguel Ángel Briceño Velosa	80.029.706	Ing. Calidad SST
6	Katherine Duque Botero	52.849.283	Ing. Calidad SST
7	Jorge Eduardo Rodríguez Martínez	1.032.362.166	Ing. Ambiental
8	Jennifer Astrid Capera Sánchez	1.136.880.609	Ing. Ambiental
9	Paula Milena Gómez Cardenas	1024576217	Inspector De Calidad y SST
10	Liseth Katherine Márquez Ochoa	1.030.599.549	Inspector Ambiental
11	Robert Andrés Torres Rojas	1.024.501.619	Inspector De Obra
12	Sergio Hernán Mateus Useche	1.016.097.191	Inspector De Obra
13	Juan Felipe Cornejo Nieto	1.015.484.496	Auxiliar Administrativo
14	Rafael Antonio Niño Rodríguez	1.121.326.909	Almacenista
15	Anderson Esneyder García Quintero	1.015.476.931	Auxiliar Administrativo

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

4.2. Gestión SST Durante el Periodo

- Afiliación a seguridad social: soportada para todo el personal.
- Comités: COPASST y de Convivencia Laboral constituidos y con acta de reunión mensual.
- Entrega de EPP: realizada con soportes.
- Capacitaciones e inspecciones: ejecutadas según cronograma de capacitación, 6 temas, programados 3 temas, se ejecutó mayor temario a necesidad del proyecto cumpliendo al 200%. Esto con referencia al Cronograma de capacitación.
- Accidentalidad: no se reportaron accidentes, ni incidentes de trabajo.
- Indicadores SG-SST: cumplimiento satisfactorio, en accidentalidad a 0% y cumplimientos al 106% del plan de trabajo.
- Afectación a usuarios: no se presentaron eventos.

Ilustración 13. *Indicadores SGSST*

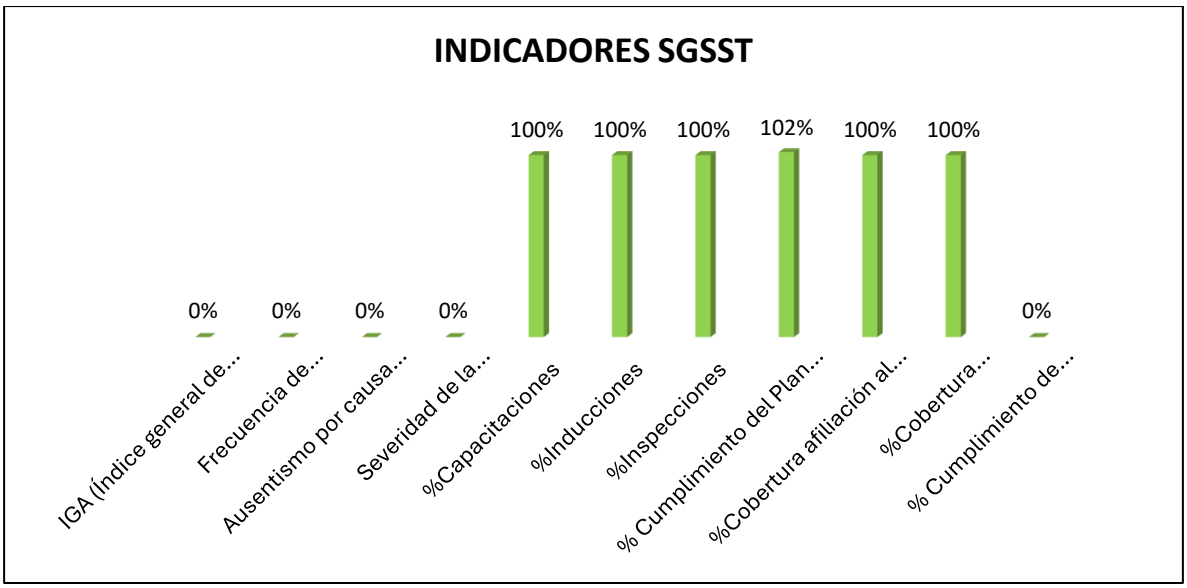

El Consorcio MYE cumple con la implementación del SG-SST, garantizando condiciones de seguridad y salud adecuadas para el personal.

Se evidencian controles efectivos en afiliaciones, inducciones, comités, entrega de EPP, capacitaciones y exámenes médicos.

No se presentaron accidentes, incidentes laborales ni afectaciones a usuarios.

Las actividades técnicas avanzan conforme al cronograma establecido

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

5. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 21 de enero al 20 de febrero de 2026, se desarrollaron actividades de gestión, control y seguimiento ambiental, orientadas al adecuado manejo de residuos y a la implementación de medidas de protección ambiental en las estaciones de Transmilenio asignadas. Dichas acciones se ejecutaron conforme a los lineamientos establecidos, con el propósito de garantizar el desarrollo de las obras bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y responsabilidad ambiental.

En relación con los residuos peligrosos (RESPEL), estos fueron clasificados, rotulados y almacenados temporalmente en condiciones seguras, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Asimismo, se adelantaron las gestiones correspondientes con gestores debidamente autorizados, encontrándose a la espera de su recolección, lo cual garantiza la trazabilidad de la disposición final y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Durante la ejecución de las actividades de campo, se implementaron diversas medidas preventivas y de control, entre las que se destacan: la instalación de cubiertas de protección en pisos y estructuras durante los trabajos de pintura, con el fin de evitar el deterioro o contaminación de superficies; la colocación de barreras en sumideros durante las actividades de fundida de concreto, para prevenir el ingreso de sedimentos a la red de alcantarillado; y la verificación del cumplimiento de los parámetros relacionados con emisiones atmosféricas y niveles de ruido, asegurando que estos no generaran molestias ni afectaciones a la comunidad ni al entorno circundante.

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones al personal, conforme al cronograma establecido en el Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de fortalecer el conocimiento, la prevención y la adecuada respuesta frente a los factores ambientales que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.

De manera complementaria, se efectuaron inspecciones periódicas a los kits de control de derrames, verificando su disponibilidad, correcto estado y ubicación en todos los frentes de trabajo. Durante el periodo evaluado no se presentaron incidentes que requirieran su utilización, lo cual evidencia la efectividad de las medidas preventivas implementadas para el manejo de sustancias peligrosas.

Del 16 de al 20 de enero de 2026 se realizaron trabajos de demolición de separadores en la estación de la calle 106 retirando los separadores y disponiendo en los sitios de disposición final correspondiente, para este periodo se realizo actividades de fundida de concreto en la misma estación mencionada conforme a la elaboración del MET 03 cerramiento tipo onda

Finalmente, se consolidó un registro fotográfico que documenta y respalda las actividades ejecutadas durante el periodo, constituyéndose como evidencia verificable del cumplimiento de las obligaciones ambientales en obra y de la adecuada implementación de las medidas establecidas.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

La ejecución presupuestal que se presenta a continuación corresponde a las órdenes de trabajo finalizadas y debidamente recibidas por la interventoría, las cuales constituyen la base para el cálculo de los valores aquí reportados. La información consignada puede ser verificada en el acta de costos, documento en el que se registran y validan los montos asociados a cada una de las actividades ejecutadas.

Es importante señalar que se suscribió la adición de recursos al contrato por un valor de **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 6,672,853,444.00)**, con lo cual el valor total del contrato asciende a **VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 20,422,853,444.00)**.

Tabla 12. *Ejecución presupuestal general del contrato*

CONCEPTO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICION (Si aplica)	VALOR ACTUAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					%	VALOR EJECUTADO	%	VALOR PENDIENTE
VALOR PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN		$ 11,059,277,729.00	$ 5,367,050,144.00	$ 16,426,327,873.00	48.27%	$ 7,928,347,165.00	51.73%	$ 8,497,980,708.00
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE ADECUACION	24.33%	$ 2,690,722,271.00	$ 1,305,803,300.00	$ 3,996,525,571.00	46.28%	$ 1,849,683,393.00	53.72%	$ 2,146,842,178.00
VALOR TOTAL OBRAS DE ADECUACIÓN - INCLUIDO EL AIU:		$ 13,750,000,000.00	$ 6,672,853,444.00	$ 20,422,853,444.00	47.88%	$ 9,778,030,558.00	52.12%	$ 10,644,822,886.00

Como se observa en la tabla anterior, a la fecha y teniendo en cuenta la adición de recursos, se ha ejecutado el 47.88% del valor total del contrato, correspondiente a **$9,778,030,558.00**, quedando un saldo pendiente por ejecutar de **$10,644,822,866.00**, equivalente al 52.12% del valor contractual.

Tabla 13. *Ejecución Presupuestal por Troncal*


TRONCAL	VALOR EJECUTADO	%	% ACUMULADO
NORTE	$ 3,342,869,807.00	44.78%	44.78%
AMERICAS	$ 2,258,057,575.00	30.25%	75.03%
NQS SUR	$ 854,669,085.00	11.45%	86.47%
CALLE 26	$ 849,998,136.00	11.39%	97.86%
CARRERA DECIMA	$ 159,757,503.00	2.14%	100.00%
CARRERA SEPTIMA	$ -	0.00%	100.00%

De igual manera, se puede observar que, a la fecha de corte, la troncal con mayor inversión corresponde a la troncal NORTE, con una inversión de **$3,342,869,807.00**, equivalente al 42.16% del valor total ejecutado. En segundo lugar, se encuentra la troncal AMERICAS, con **$2,258,057,575.00** (28.48%), seguida de la troncal NQS SUR, con **$1,192,577,027.00** (15.04%). Posteriormente, la troncal CALLE 26 con **$849,998,136.00** (10.72%) y finalmente la troncal CARRERA DECIMA, con **$284,844,620.00** (3.59%). De esta manera, el valor total de la ejecución presupuestal asciende a **$7,928,347,165.00**.

Cabe destacar que, a la fecha, no se han adelantado actividades en las troncales CARRERA SÉPTIMA, toda vez que, no se han emitido órdenes de trabajo para dichos corredores.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 14. Ejecución Presupuestal por troncal

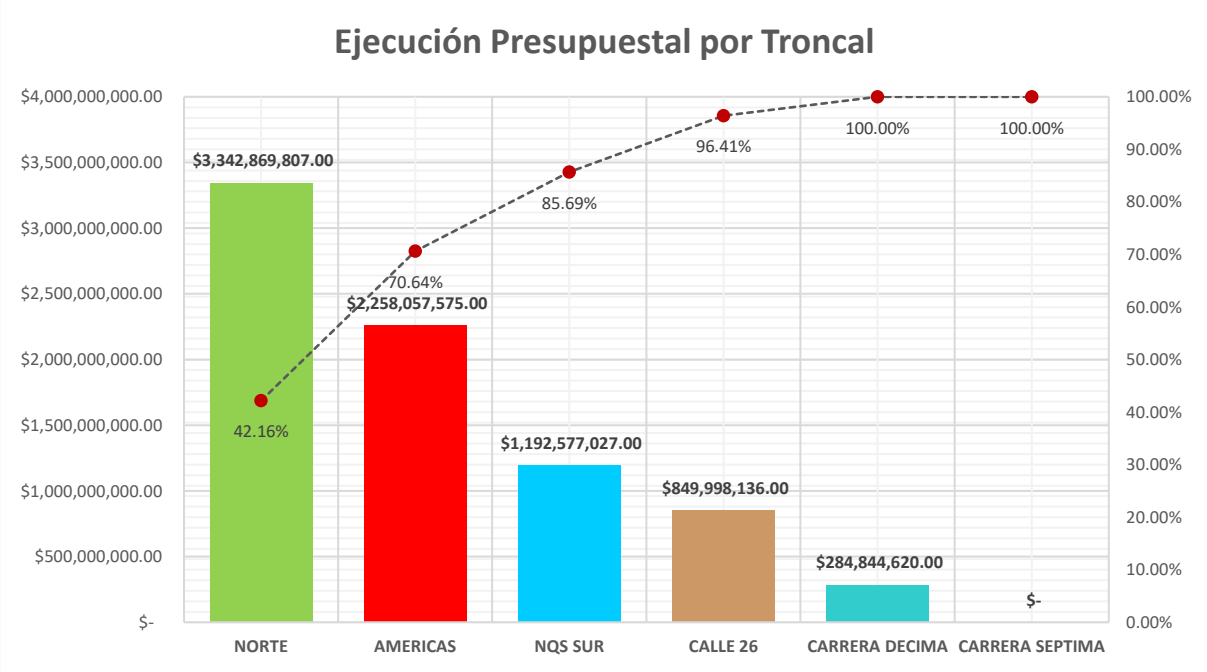

7. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA

Este informe corresponde al Informe Ejecutivo correspondiente **al Periodo No. 07, entre el 21 de enero al 20 de febrero de 2026,** como resumen del Informe Mensual presentado y que se encuentra en los documentos relacionados con el Contrato 1380 de 2025.

Adicionalmente todos los documentos relacionados con el informe Mensual del Contratista Consorcio MYE Bogotá, correspondiente al Periodo No. 07, entre el 21 de enero al 20 de febrero de 2026, se encuentran alojados en la plataforma SECOP II, en los Documentos de Ejecución del contrato 1380 de 2025.

La Interventoría, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.
