INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PGAS

CONTRATO DE OBRA Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima. No: 0 8 7 - 2 0 2 5 Contratista: Consorcio Unidos

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable del contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de " los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 096-2025 Interventoría: Consorcio TAU

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA FINAL ADICIÓN	DURACIÓN (MESES)	VALOR CONTRATO
Consorcio Unidos	13 DE ENERO 2026	30 DE OCTUBRE DE 2026	30 DE OCTUBRE DE 2026	8 MESES Y 21 DIAS	10.214.690.165-

INTERVENTORÍA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (MESES)	VALOR CONTRATO
CONSORCIO TAU	13 DE ENERO 2026	30 DE OCTUBRE DE 2026	8 MESES Y 21 DIAS	958.046.610-

2. AVANCE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR (ES)	RESULTADO	FRECUENCIA MEDICIÓN	CUMPLE: SI / NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Gestión Ambiental del Proyecto	Grupo de Gestión Ambiental y Social	No. de profesionales contratados/ No. de profesionales propuestos × 100	100%	Mensual	si	
	Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales	No. de requerimientos cumplidos/ No. de requerimientos de autoridades × 100	-------	En proceso de inventario forestal	----------	Durante el periodo del informe, la interventoría solicitó mediante el oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-007 con asunto "SOLICITUD INVENTARIO DE INDIVIDUOS ARBOREOS AID" que se encuentran susceptibles de solicitud de permiso o la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados e identificación de árboles y plantas de veda ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta que a la fecha del informe se encontraba en proceso de revisión y elaboración del inventario forestal de los individuos arbóreos por parte del contratista de obra, motivo por el cual no se encontraba en proceso de tramite ni radicación ante la entidad ambiental competente.
	Capacitación Ambiental y Social	No. capacitaciones realizadas/ No. capacitaciones programadas ×100	100%	Mensual	si	Durante el periodo por parte del contratista no realizaron capacitaciones, dado que no se encontraban programadas dentro del cronograma ambiental para la fecha reportada.

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL – PGAS

CONTRATO DE OBRA Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 0 8 7 - 2 0 2 5 Contratista: Consorcio Unidos

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable del contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de " los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 096-2025 Interventoría: Consorcio TAU

2. AVANCE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR (ES)	RESULTADO	FRECUENCIA MEDICIÓN	CUMPLE: SI / NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Componente Abiótico	Manejo Integral de Materiales de Construcción	Volumen certificado por fuente autorizada/ Volumen de material ingresado a obra*100	100%	Mensual	SI	Durante el periodo del informe no se presento ingreso de material pétreo por parte del contratista de obra.
	Manejo del Recurso Hídrico	Vol. Agua certificada para consumo en obra /Vol. Agua consumida durante el mes en obra*100		Mensual	Pendiente por reportar dado a que se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría.	Se reporta, que en el AID del proyecto no se encuentra la presencia de cuerpos de agua cercanos ni acuíferos que sean susceptibles de contaminación por las actividades constructivas de la obra. En cuanto
	Control de Excavaciones y Demoliciones	No. Sitios de disposición autorizados/ No. Sitios de disposición de escombros necesarios*100 Volumen de material dispuesto en sitio autorizado/ Volumen de material para disposición final *100 Volumen reutilizado en obra o por terceros /Volumen de material reutilizable*100 Vol. Descapote reutilizado en el proyecto /Vol. Descapote obtenido y almacenado*100	100%	Mensual	SI	Por parte del contratista entrego los RCD en obra al gestor que se encuentra vigente "La Ponderosa". Por otra parte, se reporta que el contratista de obra genero durante el periodo 60 m3. Sin embargo, no se encuentra pendiente de subsanación en referencia al certificado generado por el gestor de acuerdo al oficio **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría.
	Residuos Sólidos Generados			Mensual	Pendiente por reportar	Pendiente por reportar dado a que se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría
	Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas	No. Permisos de vertimientos obtenidos/ No. Permisos de vertimientos identificados*100 Volumen de residuos líquidos entregados a un gestor autorizado/ Volumen de residuos líquidos generados *100 Volumen sustancias almacenadas correctamente/ Volumen sustancias peligrosas almacenadas*100 No. Emergencias	100%	Mensual	Pendiente por reportar (Sustancias almacenadas), dado a que se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría	Durante el seguimiento mensual de la interventoría no se evidencio en obra la generación de residuos líquidos ni por ende No se presentó disposición.

		atendidas correctamente/ No. Emergencias con sustancias peligrosas*100				
	Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento	Medidas de manejo ambiental aplicadas en el campamento e instalaciones/ Medidas de manejo ambiental necesarias*100 No. Quejas atendidas y cerradas de aire o ruido/ No. Quejas por mala calidad del aire o ruido*100 No. Quejas resueltas calidad del agua/ No. Quejas por mala calidad del agua*100	100%	Mensual	Pendiente por reportar dado a que se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría	Durante el periodo el contratista de obra no ejecutó la instalación de campamento, dado a que se tiene contemplado su construcción para las fechas del siguiente informe.
	Manejo de Maquinaria y Equipos	No. vehículos con revisión Técnico/ No. de Vehículos en el proyecto × 100	3/3× 100 = 100%	Mensual	SI	Vehículos con Tecnomecanica y SOAT vigente.
	Control de la Calidad del Aire y Emisiones	No. quejas atendidas/ No. quejas por mala calidad del aire × 100	100%	Mensual	SI	Durante el periodo no se presentaron quejas por contaminación de aire de MP.
Componente Biótico	Manejo de la Fauna Silvestre	No. Fauna silvestre rescatada y reubicada/ No. Fauna silvestre encontrada en el AID*100	100%	Mensual	SI	Durante el periodo del informe se realizó la identificación de un mamífero dentro del área de influencia del proyecto. En atención a esta situación, el contratista efectuó el trámite correspondiente ante la autoridad ambiental competente, CORTOLIMA, dando cumplimiento oportuno a los lineamientos establecidos
	Manejo de la Vegetación en Obra	No. ind intervenidos con permiso/ No. ind inv. que requieren permiso × 100	100%	Mensual	SI	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se realizó la intervención de ningún individuo del AID.
	Protección Vegetal del Suelo	Área con cobertura vegetal final recibida/ Área de diseño para empradización*100	100%	Mensual	SI	Durante el periodo se reporta que, no se presentó afectación a áreas con cobertura vegetal.

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL – PGAS

CONTRATO DE OBRA Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 087-2025 **Contratista: Consorcio Unidos**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable del contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de " los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 096-2025 Interventoría: Consorcio TAU

2. AVANCE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR (ES)	RESULTADO	FRECUENCIA MEDICIÓN	CUMPLE: SI / NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Gestión Social	Atención a la Comunidad y Autoridades				Pendiente	Se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría
	Información y Participación de la Comunidad				Pendiente	Se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

						Remitido por la interventoría
	Manejo de Infraestructura				Pendiente	Se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría
	Gestión de la Mano de Obra				Pendiente	Se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría
	Protección Patrimonio Arqueológico y Cultural				Pendiente	Se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría

3. CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

AUTORIDAD AMBIENTAL	ACTO ADMINISTRATIVO	ARTÍCULO	REQUERIMIENTO/ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
Corporación autónoma regional del Tolima	Resolución 1331 06 abril de 2017		Permiso de almacenamiento, disposición de escombros, aprovechamiento forestal y se ordenan otras disposiciones	si	

4. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (Kg)	GESTOR AUTORIZADO	DISPOSICIÓN FINAL	FECHA DE ENTREGA	No. REGISTRO O MANIFIESTO GESTOR	SOPORTE ANEXO
							Se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría

5. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSUMO DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN	FUENTE	PERMISO MINERO U OTRO	PERMISO AMBIENTAL	VOL. INGRESADO MES ACTUAL (M3)	USO EN LA OBRA	VOL. ANTERIOR ACUMULADO (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)	SOPORTE ANEXO
							0	No se presentó ingreso de material pétreo por parte de obra.

6. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES (RCD)

TIPO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	GESTOR AUTORIZADO	DISPOSICIÓN FINAL	FECHA DE ENTREGA	PIN y/o Permiso para Disposición de RCD	SOPORTE ANEXO
RCD	Pendiente por definir	60 m3	La Ponderosa	Pendiente por definir	04/03/2026	No aplica PN ambiental	Por parte del contratista entrego los RCD en obra al gestor que se encuentra vigente "La Ponderosa". Por otra parte, se reporta que el contratista de obra genero durante el periodo 60 m3. Sin embargo, no se encuentra pendiente de subsanación en referencia al certificado generado por el gestor de acuerdo al oficio **CONSORCIO-TAU-FASE2-0060** Remitido por la interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL – PGAS

CONTRATO DE OBRA Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 087-2025 **Contratista: Consorcio Unidos**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable del contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de " los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima No: 096-2025 Interventoría: Consorcio TAU

7. DESCRIPCIÓN GESTIÓN SOCIAL

P,Q ó R	DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN	ACCIÓN PARA EL CIERRE DE LA MANIFESTACIÓN	PENDIENTES	SOPORTE ANEXO

7.1 GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA		
PERSONAL	NÚMERO	PORCENTAJE
FORÁNEO		#¡DIV/0!
LOCAL		#¡DIV/0!
TOTAL	0	#¡DIV/0!

7.2 SEGUIMIENTO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL			
HALLAZGOS	MONITOREO	RESCATES	PEMP-BIC

8. ANEXOS

1. Avance de Cronograma de actividades ambiental y social (cumplimiento)
2. Registro fotográfico de la Interventoría
3. Cuadro actualizado Grupo de Gestión Ambiental
4. Conclusiones y recomendaciones de la Interventoría
5. Informes semanales de Interventoría
6. Comunicaciones entre Interventoría y Contratista aspectos ambientales y sociales

Firma: 

Nombre Director de Interventoría:

Firma: 

Nombre Esp. Ambiental Interventoría: Monica Solano

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 01

Contrato de Interventoría No 1251 – 2025 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. "lote (2) Lérida – Tolima".

INFORME MENSUAL No. 01
PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2026

CELEBRADO ENTRE CONSORCIO TAU
Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Entidad	Aprobado	Firma
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Unidad de Infraestructura Física	Ing. **Jenny Milena Pérez Mecón**	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Unidad de Infraestructura Física	Ing. **Pablo Andrés Ruiz Quiroga**	PABLO ANDRES RUIZ Q

Modificaciones			Fecha
Emitido para el Cliente. Versión 001			12/02/26
Ajuste Versión 001			16/03/2026
Elaborado por	**Firma**	**Aprobado por**	**Firma**
Monica Solano Salgar. Ing. Ambiental Interventoría		Ing. Diana Malagon Director de Interventoría	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1. Aspectos Contractuales Contrato De Interventoría 1251 – 2025 4
4. PERSONAL AMBIENTAL REQUERIDO -CONTRATISTA 4
4.1 PERSONAL AMBIENTAL REQUERIDO -INTERVENTORIA 5
5. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA 5
6. ACTIVIDADES INTERVENTORIA 5
7 TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA SST Y AMBIENTAL 5
8 LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES 6
12. INDICADORES AMBIENTALES 7
12. CONCLUSIONES 7
13. REGISTRO FOTOGRAFICO 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual Ambiental de acuerdo a lo contemplado en el **Contrato de Interventoría 096-2025** cuyo objeto referente es **"**Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. "lote (2) Lérida – Tolima".

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **13 de Enero al 12 de Febrero de 2026** de acuerdo a los requerimientos del Anexo Técnico y normatividad ambiental vigente aplicable al contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y control a las actividades contempladas en el componente ambiental para el proyecto de obra No 087-2025 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA – TOLIMA.

2.1. Objetivos específicos

- Cumplir a cabalidad con el alcance del anexo técnico de acuerdo a lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, en referencia al componente ambiental.
- Vigilar y controlar los impactos ambientales y riesgos que se puedan generar durante el desarrollo constructivo del Contrato de Obra No 087-2025.
- Realizar el seguimiento oportuno de los programas y procedimientos propuestos en el PGAS aplicables durante la ejecución del Contrato de Obra No. 087-2025.
- Asegurar el debido cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
- Dar cumplimiento de las licencias y/o permisos ambientales aplicable.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la intervención de las obras



Fuente: Predio de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Google

3.1. Aspectos Contractuales Contrato De Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. 096 – 2025
CONTRATANTE	Consejo Superior de la Judicatura
CONTRATISTA	Consorcio Unidos
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA – TOLIMA.
Valor del contrato:	$ 958.046.610MCTE
PRORROGA 1 - FASE II:	8 MESES Y 21 DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO FASE II	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FASE I	30 DE OCTUBRE DE 2026

4. PERSONAL AMBIENTAL REQUERIDO -CONTRATISTA

CARGO	NOMBRE	FECHA
Profesional ambiental	Liz Murillo	2026

4.1 PERSONAL AMBIENTAL REQUERIDO -INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	FECHA
Profesional ambiental	Monica Solano Salgar	2026

5. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA

Durante el periodo del informe, el contratista de obra, presento y remitió a la interventoría la siguiente información para revisión inicial:

-Documentación correspondiente al gestor de residuos metálicos para su aprovechamiento.

Por otra parte, el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades:

-Disposición de RCD (Demolición) con fines de aprovechamiento por parte del gestor autorizado por la interventoría.
-Recolección de residuos aprovechables (Metálicos y maderables).
-Asistencia a comité de obra.

6. ACTIVIDADES INTERVENTORIA

Para el periodo del informe la interventoría realizo la respectiva revisión contemplados para el proyecto de los planes de gestión contemplados para el contrato de obra y por ende la respectiva revisión de los requerimientos legales normativos aplicables al contrato de obra.

-Revisión de documentación por parte de la interventoría correspondiente al gestor de residuos aprovechables (Metálicos) y soporte de entrega por parte del Consorcio.
-La interventoría reviso y emitió observaciones de la documentación presentada por el contratista de obra la cual fue enviada vía correo en referencia a PGAS.
-Asistencia de manera oportuna a los comités de obra entre las partes interesadas supervisión, obra e interventoría.

7 TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA SST Y AMBIENTAL

Para el presente informe la interventoría realizo las respectivas revisiones de la documentación presentada por el contratista las cuales fueron remitidas mediante correo electrónico:

N.º	Fecha de Emisión	N.º de Oficio	Remitente	Asunto	Responsable
1	CONSORCIO-TAU-110	07/01/2026	Consorcio TAU	Repuesta Certificación comercial de gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL).	AMBIENTAL
2	CONSORCIO-TAU-110	09/1/2026	Consorcio TAU	Observaciones PGIRS.	AMBIENTAL
	CONSORCIO-TAU-FASE2-008	05/02/2026	Consorcio TAU	SOLICITUD PROCEDIMIENTO PARA EL DEMSONTE DE ASBESTO	AMBIENTAL
3	CONSORCIO-TAU-FASE2-007	05/02/2026	Consorcio TAU	SOLICITUD INVENTARIO DE INDIVIDUOS ARBOREOS AID.	AMBIENTAL

8 LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

A continuación, se incluye la tabla de permisos ambientales requeridos para el proyecto:

Permisos, lineamientos o autorizaciones ambientales u otros	Estado	Número de anexo y/o Observación
Registros de elementos de publicidad exterior visual.	No se requiere. Se utilizarán valla móvil.	N. A
Otro tipo de permisos: Apertura y cierre de pin.	No se requiere PIN ambiental, sin embargo, se debe dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.	N. A
Otro tipo de permisos: El permiso para transporte y abastecimiento de combustible en caso de proveerse el	No se requiere	N. A

Permisos, lineamientos o autorizaciones ambientales u otros	Estado	Número de anexo y/o Observación
suministro de combustible por parte del contratista de obra, otorgado por el ente competente.		
Permiso Silvicultural	Aplica	En proceso de inventario forestal
Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, flora y arbolado urbano.	No se requiere	N. A
Plan de manejo de avifauna.	No se requiere	N. A
Ocupación de cauce	No se requiere	N. A
Permiso de vertimiento	No se requiere	N. A

Permiso Silvicultural: Durante el periodo del informe, la interventoría solicitó mediante el oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-007 con asunto "SOLICITUD INVENTARIO DE INDIVIDUOS ARBOREOS AID" que se encuentran susceptibles de solicitud de permiso o la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados e identificación de árboles y plantas de veda ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

De acuerdo a lo anterior, se manifiesta que a la fecha del informe se encontraba en proceso de revisión y elaboración del inventario forestal de los individuos arbóreos por parte del contratista de obra, motivo por el cual no se encontraba en proceso de tramite ni radicación ante la entidad ambiental competente.

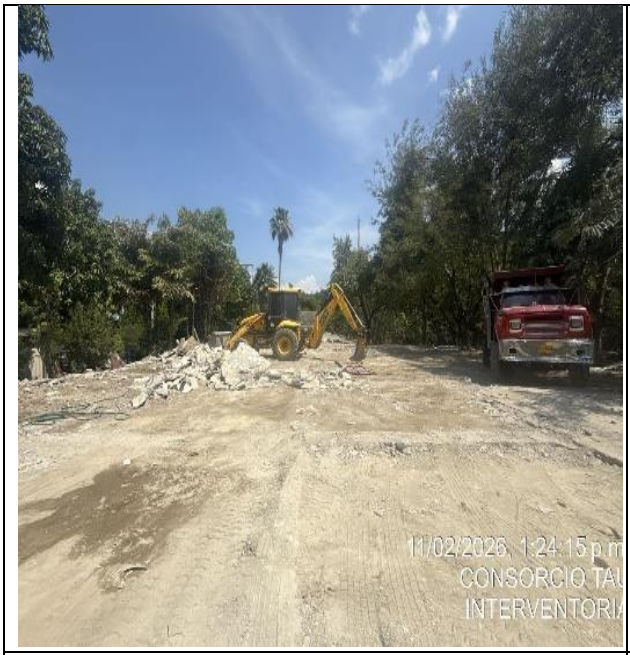
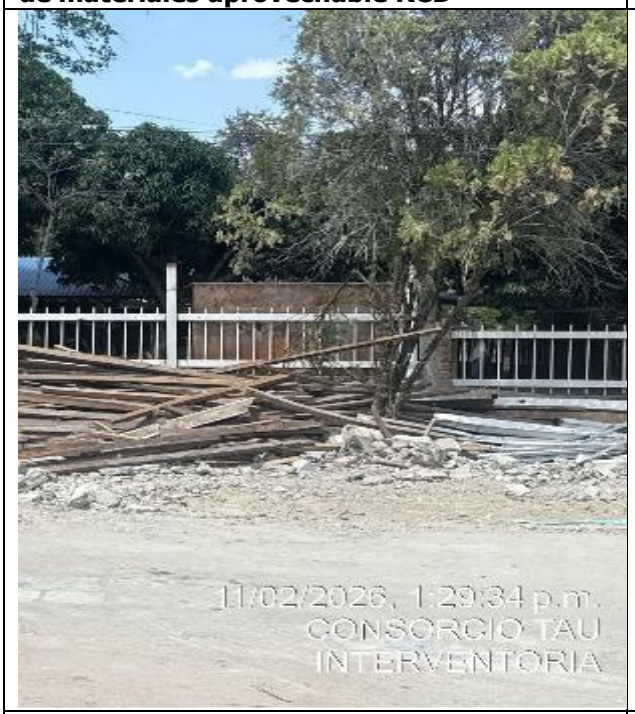
12. INDICADORES AMBIENTALES

Para el periodo del informe, no se realiza reporte de los programas ambientales dado a que a la fecha por pate del contratista no ha presentado la subsanación de los certificados, indicadores ambientales, formato de la entidad y demás información que corresponda por tal razón se presentara en el siguiente informe.

12. CONCLUSIONES

La interventoría seguirá realizando la revisión y verificación de los soportes e información presentada por el contratista de obra acuerdo, con lo establecido contractualmente, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del componente ambiental.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Fotografía 01 Seguimiento Recolección de materiales aprovechable RCD	**Fotografía 02 Seguimiento Recolección de materiales aprovechable RCD**
	
Fotografía 03 Seguimiento Recolección de materiales aprovechable maderables	**Fotografía 04 Seguimiento Recolección de materiales aprovechable RCD**

Ver anexo 01 Correspondencia
