“OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTÁGENA DE INDIAS”.

CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA

LP–CARDIQUE–006–2025.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1

Periodo: 09 de febrero al 08 de marzo del 2026

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTÁGENA DE INDIAS”.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

CMA–CARDIQUE–007–2025.

CONSORCIO INTER CRD CIÉNAGA.

NIT: 902.018.979-6

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO 8
5. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 9
5.1 INFORMACION GENERAL DE CONTRATISTA DE OBRA 9
5.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA 9
5.1.2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 10
5.1.3. CONTROL DE ACTAS DEL CONTRATISTA 11
5.1.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA 11
5.2 INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENTORIA 11
5.2.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA 12
5.2.2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
5.2.3. CONTROL DE ACTAS DE LA INTERVENTORIA 13
5.2.4. ESTADO FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA 13
6. PRESUPUESTO DE OBRA POR FRENTE DE TRABAJO 14
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES 14
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 16
9. COMPONENTE TÉCNICO 21
10. COMPONENTE SST 21
11. COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL 21
12. PERSONAL DE INTERVENTORIA 22
13. CORRESPONDENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO 22
14. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 24
15. CONCLUSIONES 25
16. RECOMENDACIONES 25
17. ANEXOS 26

TABLAS

Tabla 1. Descripción de frentes de trabajo 5
Tabla 2. Información general del contratista 9
Tabla 3. Aspectos contractuales del contratista 9
Tabla 4. Póliza de cumplimiento act de contrato de obra 10
Tabla 5. Control de actas de contrato obra 11
Tabla 6. Información general de la interventoría 11
Tabla 7. Aspectos contractuales del contratista 12
Tabla 8. Póliza de cumplimiento act de contrato de interventoría 13
Tabla 9. Control de actas de contrato de interventoría 13
Tabla 10. Presupuesto por tramos de los frentes de obra 14
Tabla 11. Equipo de trabajo de interventoría 22
Tabla 12. Relación de correspondencias enviadas 24

ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Localización de arroyo calicanto en Cartagena 6
Ilustración 2. Localización de arroyo Chupundun 7
Ilustración 3. Localización de arroyo Ricaurte 7
Ilustración 4. Curva de avance canal calicanto 14
Ilustración 5. Curva de avance canal Chupundun 15
Ilustración 6. Curva de avance canal Ricaurte 15
Ilustración 7. Curva de avance general del proyecto 16
Ilustración 8. Imagen del recorrido 17
Ilustración 9. Reconocimiento del frente 17
Ilustración 10. Acercamiento a predios aledaños 18
Ilustración 11. Socialización del canal chupundun 18
Ilustración 12. Socialización del canal Calicanto 19
Ilustración 13. Levantamiento batimétrico inicial de los canales 20

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, como ente corporativo en su función de realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control sobre proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización vaya encaminada a la defensa y protección y/o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos en lo que respecta a su jurisdicción de la ciénaga de la virgen y los descoles de los caños y canales que vierten sus aguas en esta importante cuerpo de agua.

Por lo tanto, la entidad a través de la licitación pública No. LP-CARDIQUE-006-2025, de conformidad en lo señala en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, convoca licitación pública cuyo objeto es: “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTÁGENA DE INDIAS”. Adjudica al CONSORCIO CARDIQUE C&E identificado con N.I.T. No. 902.019.581-3, para que realice la ejecución de las obras del presente contrato.

Por otro lado, para el seguimiento y control de las actividades que se desarrollaran con ocasión del contrato de obra pública; la entidad contratante (CARDIQUE) de conformidad al régimen jurídico de la contratación estatal, convoca al concurso de méritos No. CMA-CARDIQUE-007-2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIEMTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO; “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTÁGENA DE INDIAS”. Se le adjudicó al CONSORCIO INTER CRD CIÉNAGA, identificada con NIT: No. 902.018.979-6, para que realice las funciones derivadas de sus obligaciones contractuales adquiridas para el presente proyecto.

El siguiente informe describe las actividades ejecutadas en un periodo de 30 días calendario, en el cual se describen las generalidades del proyecto, se presentan los seguimientos realizados al avance físico de las obras, aspectos financieros, sociales y administrativos más relevantes derivados de la ejecución del presente contrato de obra durante el primer Periodo, comprendido entre el nueve (09) de febrero al ocho (08) de marzo del año 2026.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE a través de la Licitación Pública No LP-CARDIQUE-006-2025, adjudica al CONSORCIO CARDIQUE C&E un contrato de obra mediante el cual la entidad contratante busca mitigar el riesgo de posibles inundaciones de las viviendas de algunos de los barrios de los asentamientos que se encuentran cerca al área de los arroyos Calicanto Nuevo, Chupundun y Ricaurte, los que a su vez vierten sus aguas en la Ciénaga de la Virgen, la cual es jurisdicción y competencia directa de CARDIQUE. Es por ello que en el presente proyecto se realizará intervenciones para retirar los sedimentos de los descoles de estos caños hacia la ciénaga de la virgen.

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	LONG. DE INTERVENCIÓN
1	Arroyo Calicanto	Remoción/excavación sobre planchón, dragado y retiro de material en descole de cuerpos de agua	779 metros
2	Arroyo Chupundun		345 metros
3	Arroyo Ricaurte		841 metros

Tabla 1. Descripción de frentes de trabajo

.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra conformado por tres (3) frentes de trabajo que se desarrollarán en la ciudad de Cartagena de Indias, capital de Bolívar, más precisamente en el sector de Olaya. Es importante mencionar que estos barrios son gobernados por la Alcaldía menor de Ciénaga de la virgen y Turística y sus respectivas juntas de acciones comunales locales que trabajan mancomunadamente para lograr llevar el desarrollo económico a todo el sector

- **Ciénaga de la Virgen – Arroyo Calicanto:**

El arroyo Calicanto está ubicado sobre el Sector de Olaya entre los barrios Fredonia y El Pozón, barrio (Invasión) la Bendición de Dios. Con coordenadas **10°25'30.7"N 75°28'49.6"W**

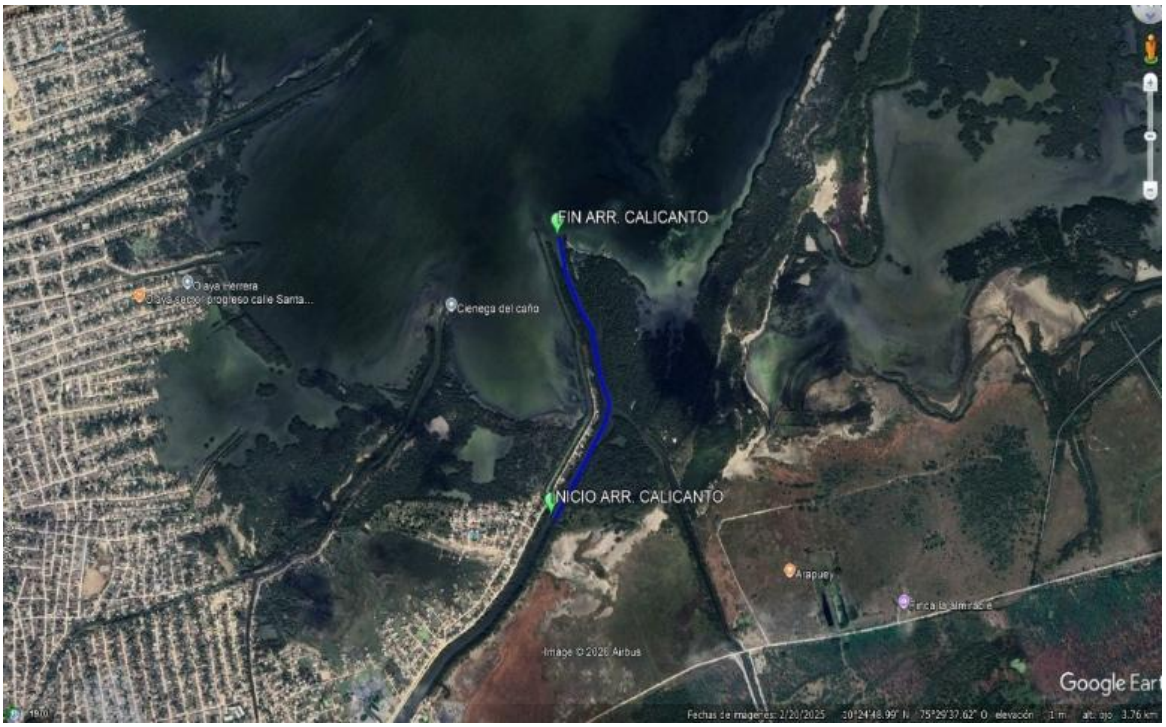


Ilustración 1. Localización de arroyo calicanto en Cartagena

- **Ciénaga de la Virgen – Arroyo Chupundun**

Ubicado entre los barrios Fredonia e Isla de Belén, sobre sector de Olaya. Con coordenadas **10°25'17.3"N 75°28'48.1"W**

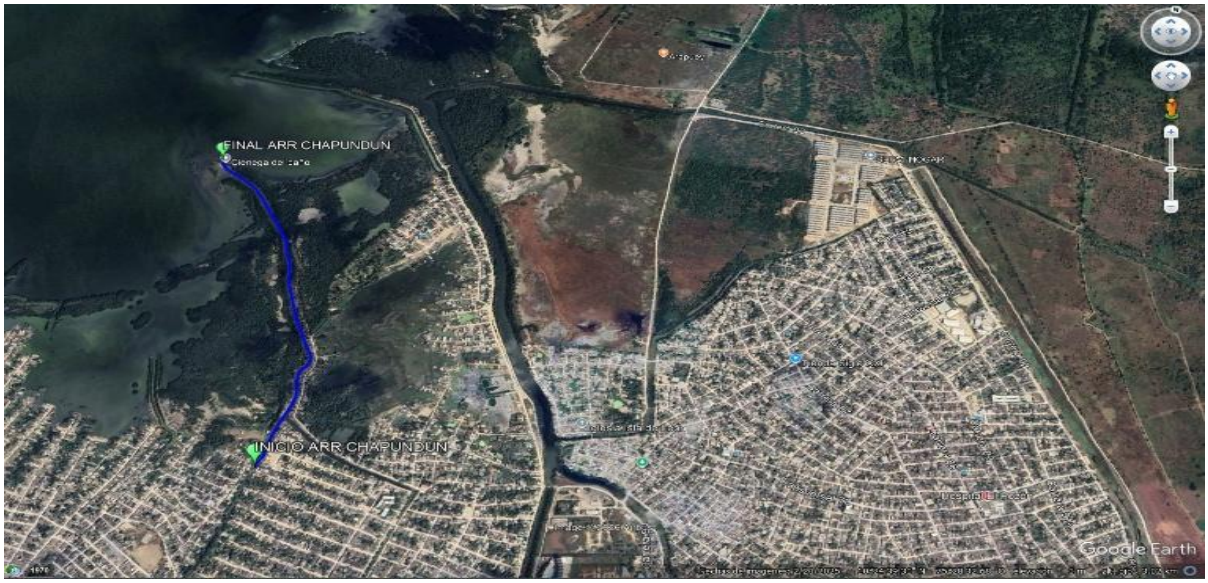


Ilustración 2. Localización de arroyo Chupundun

- **Ciénaga la Virgen – Arroyo Ricaurte**

Ubicado entre los Barrios Ricaurte y 11 de noviembre. Con Coordenadas **10°25'21.9"N 75°29'17.6"W**

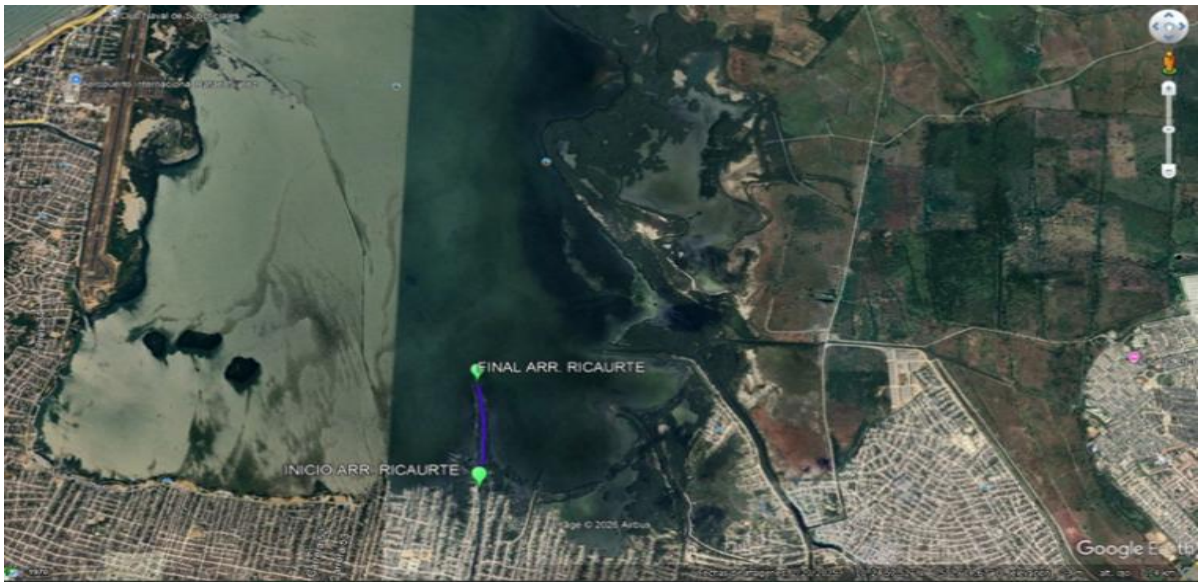


Ilustración 3. Localización de arroyo Ricaurte

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO

De acuerdo con los estudios previos realizados por CARDIQUE, en relación con el frente de obra a intervenir, actualmente en la Ciénaga de la Virgen se puede apreciar zonas de rellenos indiscriminados que con el pasar de los años han generado cambios en la geomorfología del cuerpo de agua en donde se pueden observar pocas profundidades dentro del cuerpo de agua debido a la existencia de sedimentación, colmatación, basuras, vegetación, escombros, entre otros residuos.

Adicionalmente, dadas las mencionadas condiciones en el cuerpo de agua no se presenta el intercambio de flujos, lo cual ponen en riesgos el ecosistema que predomina en la zona, además que en temporadas de fuertes precipitaciones no permiten una evacuación de las crecientes, causando inundaciones y poniendo en riesgo la vida e infraestructura de las comunidades aledañas. Las zonas de mayores afectaciones, para nuestro caso los sectores: Ricaurte, Progreso, Olaya, entre otros.

A continuación, se presenta un listado de las principales actividades a desarrollar en los diferentes frentes de trabajo:

1. Localización, trazado y replanteo.

2. Levantamiento batimétrico sobre área (Incluye levantamiento inicial y final).

3. Excavación manual de material común húmedo.

4. Remoción o excavación mecánica en material común húmedo.

5. Repaleo en material común húmedo.

6. Remoción o excavación mecánica sobre planchón.

7. Repaleo en material común húmedo con transporte en planchón y remolcador (Incluye cargue a volqueta).

8. Dragado hidráulico con draga particular de corte y succión.

9. Transporte de maquinarias a sitio de trabajo (Incluye ida y regreso).

10. Transporte de material a botadero autorizado.

11. Tarifa de recibo de materiales en botadero autorizado.

12. Plan de manejo ambiental e impacto urbano.

5. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1 INFORMACION GENERAL DE CONTRATISTA DE OBRA

La siguiente tabla contempla los datos principales del contratista de obra:

CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E – NIT 902.019.581-3
DIRECCIÓN:	Cartagena, Bolívar
TELÉFONO:	321 838 0666 – 302 347 7745
CORREO:	consorciocardiquece@gmail.com

Tabla 2. Información general del contratista

5.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

CONTRATO No.	LP–CARDIQUE–006–2025
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E
NIT No.	902.019.581-3
REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN ALFREDO BECHARA DE ARCHO
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTÁGENA DE INDIAS".
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 11,985,495,096.26 Pesos, M/CTE
FECHA DE INICIO:	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2026

Tabla 3. Aspectos contractuales del contratista

5.1.2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato en vigencia del contratista se encuentra asegurado por las pólizas de seguro de cumplimiento en favor de la entidad estatal No. 400070360 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 400070358 expedidas el veintitrés (23) de noviembre de 2022, actualizadas de acuerdo con el acta de inicio del contrato el primero (01) de diciembre de 2022, por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. para amparar los siguientes riesgos:

RIESGO	FECHA INICIO		LIMITE POR VIGENCIA
	INICIA	VENCE	
Cumplimiento del contrato.	09/02/2026	08/06/2027	**$ 1.198.549.509,63**
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/02/2026	08/12/2029	**$ 599.274.754,81**
Estabilidad y calidad de la obra	08/12/2026	08/12/2029	**$ 2.397.099.019,25**
Calidad del servicio	**26/10/2026**	26/10/2027	**$ 2.397.099.019,25**
	FECHA INICIO		
	INICIA	VENCE	
Predios, Labores y Operaciones PLO	**09/02/2026**	**08/12/2026**	$ 599.274.754,00

Tabla 4. Póliza de cumplimiento act de contrato de obra

5.1.3. CONTROL DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Hasta el presente periodo se ha firmado el ACTA DE INICIO, como se relaciona en la tabla a continuación:

ACTAS CELEBRADAS		
DESCRIPCION	**FECHA**	**INTERVINIERON**
ACTA DE INICIO	09/02/2026	CONSORCIO CARDIQUE C&E – Franklin Alfredo Bechara CARDIQUE – Ing. Javier Andrés Orozco Montaño

Tabla 5. Control de actas de contrato obra

5.1.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

Durante el presente periodo el contratista no ha suscrito ningún acta ante la entidad.

5.2 INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENTORIA

La siguiente tabla contempla los datos principales del contratista de obra:

NOMBRE:	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CORREO:	consorciointercrdcienaga1@gmail.com
TELEFONO	3014387110
DIRECCIÓN:	Calle 9D No. 52C – 33 Barranquilla – Atlántico

Tabla 6. Información general de la interventoría

5.2.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.	CMA–CARDIQUE–007–2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
NIT No.	902.018.979-6
REPRESENTANTE LEGAL	ESNEIDER VISBAL PACHECO
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMEBINTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN POR RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTÁGENA DE INDIAS".
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 847,013,202.00 Pesos, M/CTE
FECHA DE INICIO:	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2026

Tabla 7. Aspectos contractuales del contratista

5.2.2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato en vigencia del contratista se encuentra asegurado por las pólizas de seguro de cumplimiento en favor de la entidad estatal No. 11-44-101274908 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101087908 expedidas el trece (13) de febrero de 2026, actualizadas de acuerdo con el acta de inicio del contrato el nueve (09) de febrero de 2026, por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. para amparar los siguientes riesgos:

RIESGO	FECHA INICIO		LIMITE POR VIGENCIA
	INICIA	VENCE	
Cumplimiento del contrato.	09/02/2026	1/04/2027	**$** 169.402.640,40
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/02/2026	0/12/2029	**$ 42.350.660,10**
Calidad del servicio	**09/02/2026**	0/12/2027	**$ 127.051.980,30**
RIESGO	FECHA INICIO		LIMITE POR VIGENCIA
	INICIA	VENCE	
Predios, Labores y Operaciones PLO	**09/02/2026**	**0/12/2026**	**$** 350.181.000,00

Tabla 8. Póliza de cumplimiento act de contrato de interventoría

5.2.3. CONTROL DE ACTAS DE LA INTERVENTORIA

Hasta el presente periodo, se ha registrado el ACTA DE INICIO, como se relaciona en la tabla a continuación:

ACTAS CELEBRADAS		
DESCRIPCION	**FECHA**	**INTERVINIERON**
ACTA DE INICIO	09/02/2026	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA – Ing. Esneider Visbal Pacheco CARDIQUE – Ing. Javier Andrés Orozco Montaño

Tabla 9. Control de actas de contrato de interventoría

5.2.4. ESTADO FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

Durante el presente periodo la interventoría no ha suscrito actas ante la entidad.

6. PRESUPUESTO DE OBRA POR FRENTE DE TRABAJO

FRENTE DE OBRA	TIPO DE OBRA	VALOR OBRA
CANAL CHUPUNDUN	Relimpia de canales	$ .910.246.849,81
CANAL CALICANTO		$ .410.745.591,09
CANAL RICAURTE		$ .664.503.958,04
TOTAL		**$ 11.985.496.398,94**

Tabla 10. Presupuesto por tramos de los frentes de obra

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

Durante el periodo reportado en el presente informe, se reportan las actividades de verificación y supervisión a las actividades adelantadas por el contratista de obra CONSORCIO CARDIQUE C&E, a través de su equipo técnico. Estas actividades incluyeron la inspección de la accesibilidad a las zonas de intervención, la verificación del estado de los frentes de obra, las respectivas socializaciones y levantamiento de las actas de vecindad, se realizó la batimetría inicial en los tres canales que hacen parte de la ejecución del proyecto.

- **Canal Calicanto:** En este canal se llevaron a cabo visitas técnicas y de inspección del área de ejecución de las obras, además, se realizó el levantamiento batimétrico inicial sobre el área de trabajo, trazado y replanteo, la cual representa un avance económico para el reporte de avance físico.

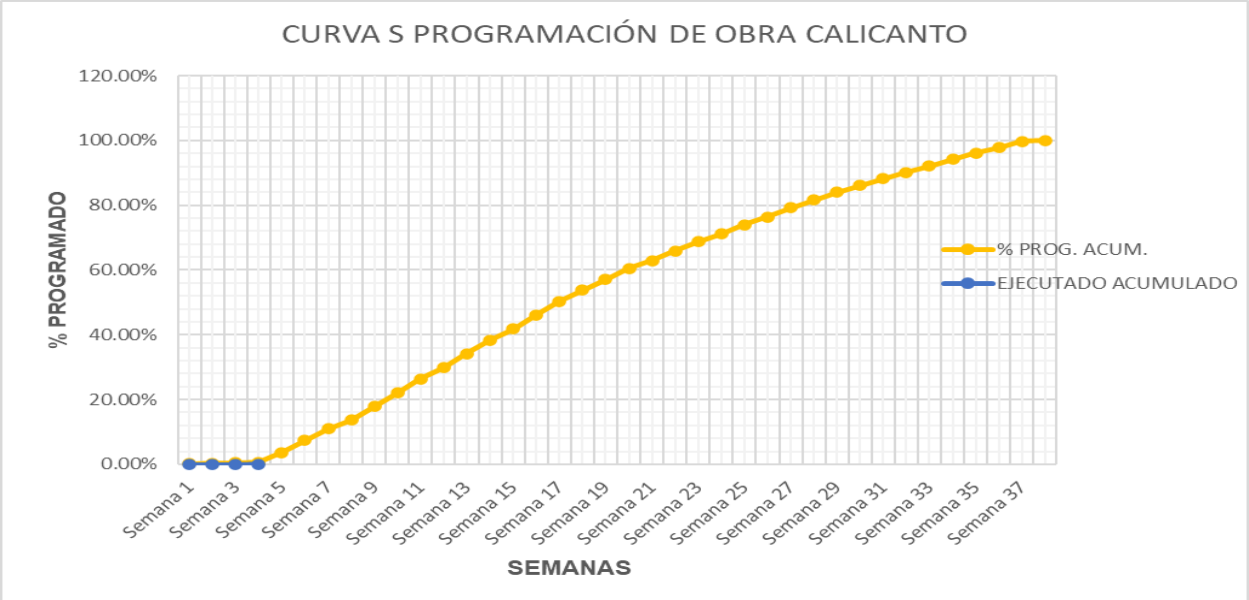


Ilustración 4. Curva de avance canal calicanto

- **Canal Chupundun:** se llevaron a cabo algunas visitas técnicas y de inspección del área de ejecución de las obras, además, se realizó la batimetría inicial en este frente de obra

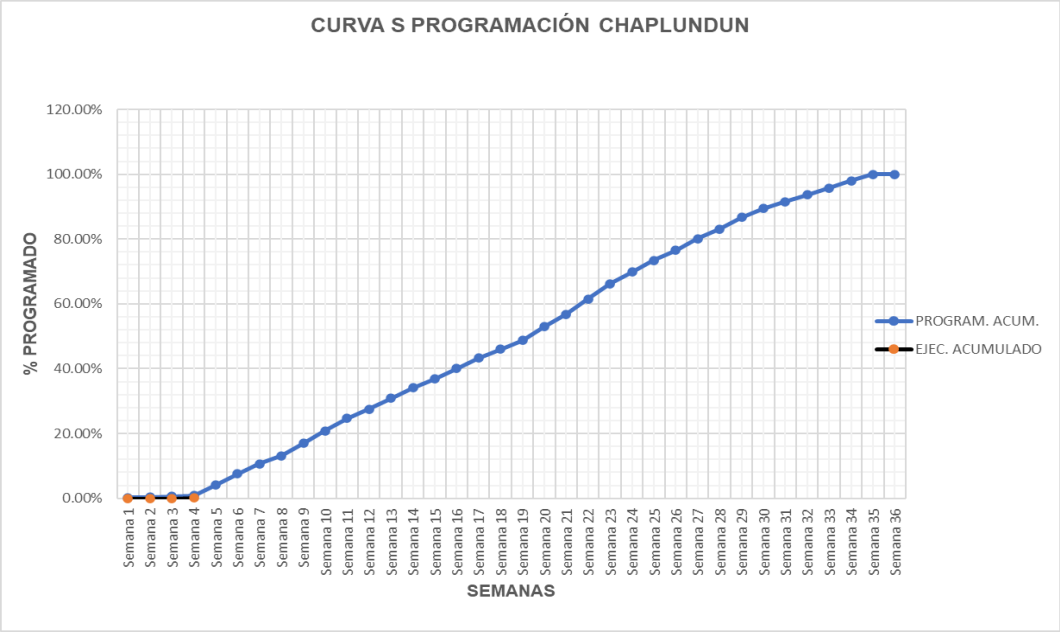


Ilustración 5. Curva de avance canal Chupundun

- **Canal Ricaurte:** Se llevaron a cabo algunas visitas técnicas y de inspección del área de ejecución de las obras, además, se realizó la batimetría inicial en este frente de obra

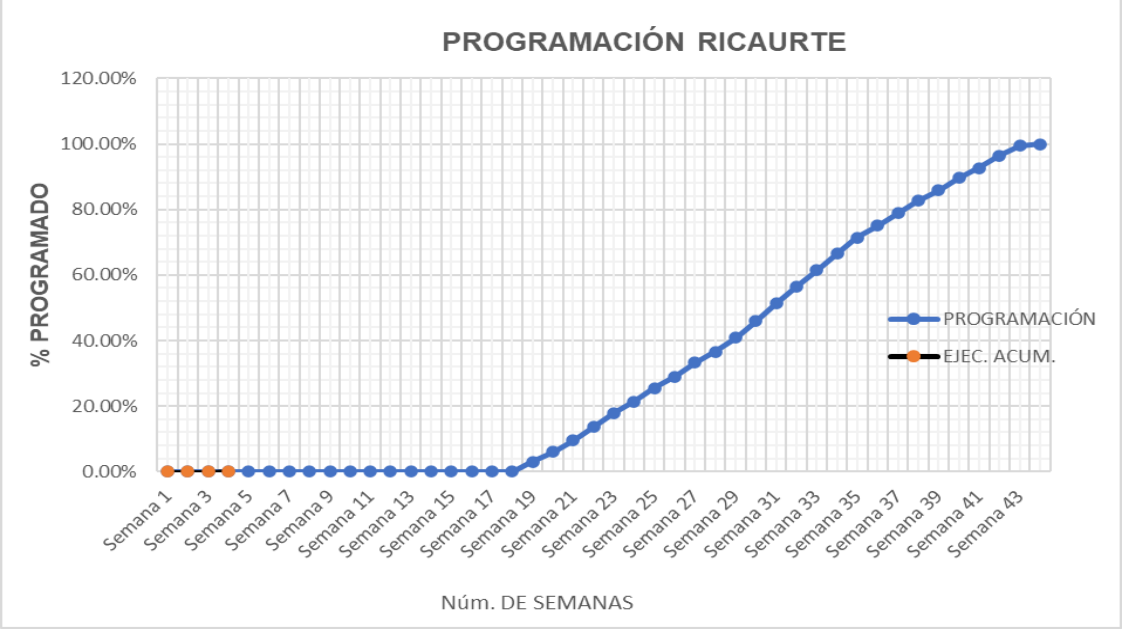


Ilustración 6. Curva de avance canal Ricaurte

A continuación, se representan las gráficas del seguimiento realizado a cada uno de los frentes de obra y del seguimiento general realizado al proyecto macro.

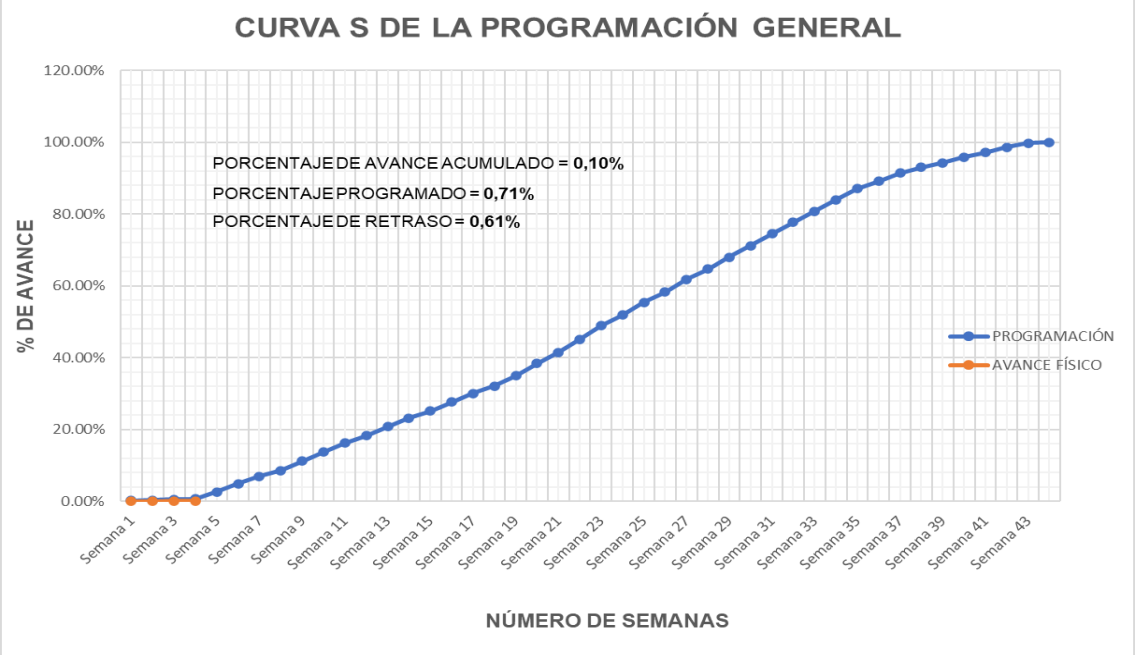


Ilustración 7. Curva de avance general del proyecto

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo evaluado, el contratista no ejecutó muchas actividades que representaran un avance significativo al avance del proyecto, en su lugar se adelantaron actividades importantes del componente social, recorridos de obra para conocer los frentes de obras y se realizó la batimetría inicial en cada uno de los canales a intervenir.

A continuación, se anexan algunas imágenes representativas de las actividades nombradas anteriormente.

Imagen del recorrido inicial que se realizó con algunos lideres comunitarios, esto con el propósito de identificar la ubicación y realizar el reconocimiento técnico del área a intervenir.



Ilustración 8. Imagen del recorrido

Imagen de un recorrido realizado con los profesionales del área ambiental de la entidad contratante, contratista e interventoría.



Ilustración 9. Reconocimiento del frente

Imagen de las actividades realizadas por las profesionales sociales de obra e interventoría, aquí se muestra la actividad de invitación puerta a puerta que

se realizó a la comunidad para que asistieran a las socializaciones de los frentes de obra de Calicanto y Chupundun.



Ilustración 10. Acercamiento a predios aledaños

Imagen de la socialización del frente de obra Chupundun en la biblioteca del barrio Fredonia.




Ilustración 11. Socialización del canal chupundun

Se realizó la reunión de socialización del frente de obra Calicanto en una iglesia del bario La Bendición de Dios.



Ilustración 12. Socialización del canal Calicanto

Imagen de la realización de la batimetría en los tres frentes de obras

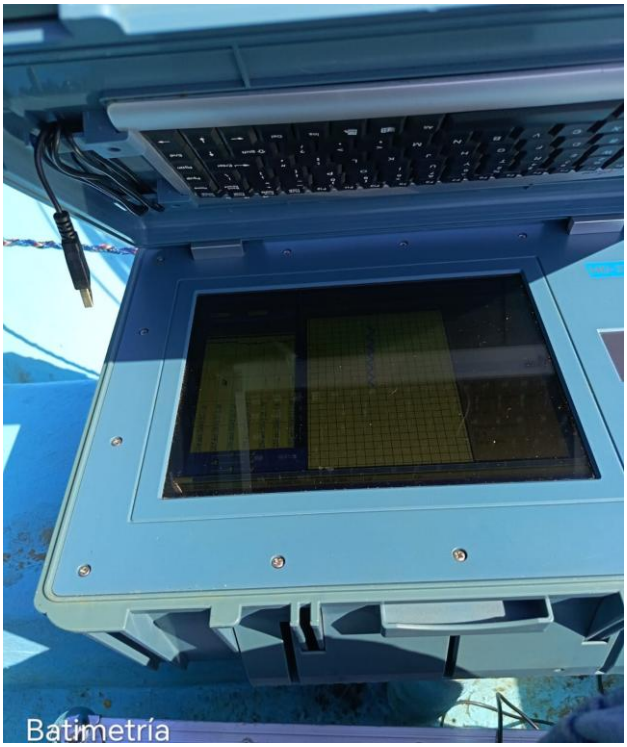

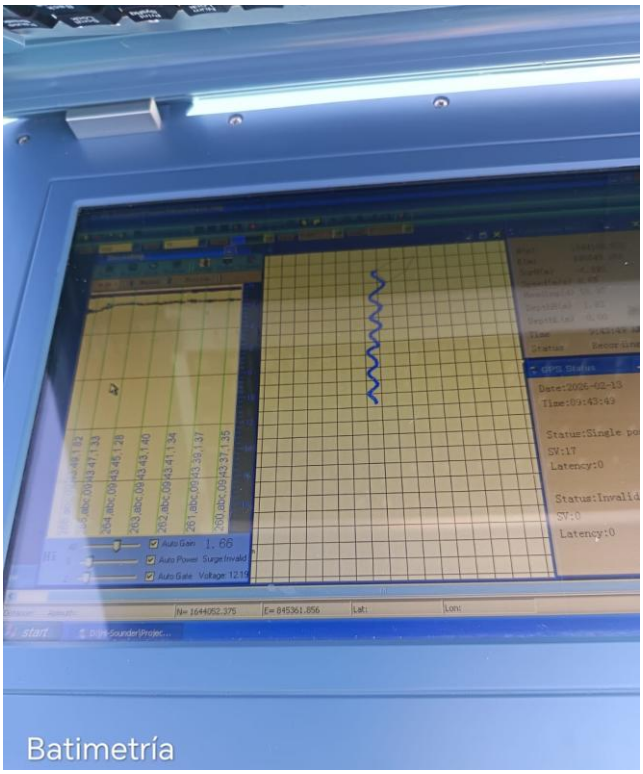




Ilustración 13. Levantamiento batimétrico inicial de los canales

9. COMPONENTE TÉCNICO

Durante el periodo en estudio de este documento la interventoría ha realizado las gestiones pertinentes para el seguimiento y control de acuerdo a las obligaciones contractuales, para lo cual se ha reportado en todos los frentes los avances semanales y se ha requerido al contratista por las situaciones en las que se están realizando procedimientos no acordes a lo estipulados contractualmente. A continuación, se relacionan algunas actividades ejecutadas

Recorridos periódicos de sitios a intervenir

Registros de datos de campo

Acompañamiento en la Socialización del proyecto con la comunidad

Acompañamiento en la Actas de vecindad en la zona activa del proyecto

Acompañamiento en los permisos a predio

Seguimientos semanales de los frentes de obra.

Análisis y revisión a los estudios al PMT, Plan de Calidad, PMA y SSGT.

10. COMPONENTE SST

La interventoría durante este periodo solicito, pago de aportes de seguridad social, exámenes de ingresos, inducciones y entrega de dotación al personal. Cabe resaltar que, durante este periodo, se realizaron actividades preliminares del proyecto.

11. COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL

En este periodo continua la atención oportuna a las solicitudes expuestas por las comunidades del municipio de Cartagena en los canales de la Ciénaga de la Virgen, realizándose reuniones con participaciones y socializaciones de la comunidad, el ente territorial Cardique, Contratista e Interventoría.

La interventoría continua con la revisión del Plan de Gestión Social (PGS) del proyecto presentado por el contratista.

12. PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	
CARGO	**NOMBRE**
Director de Interventoría	EDUARDO AREVALO NEIRA
Residente de Interventoría	YULHANER ENRIQUE OROZCO
Ingeniero especialista hidráulico	GUSTAVO ADOLFO CAMARGO
Profesional o tecnólogo SST	
Profesional Ambiental	HENRY ALBERTO SANTIAGO
Residente social	MARTHA PATRICIA SOBRADO
Topógrafo	
Cadenero	JAVIER GOMEZ REYES

Tabla 11. Equipo de trabajo de interventoría

13. CORRESPONDENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se presenta la relación de los diferentes oficios enviados y recibidos (Anexo 5. Correspondencias enviadas y recibidas)

CONSECUTIVO	ASUNTO	DIRIGIDO	FECHA
CICRDC-001.02.2026	Solicitud de documentación preliminar correspondiente	Consorcio Cardique C&E	02/02/2026
CICRDC-002.02.2026	Observaciones a las Hojas de vidas Presentadas para Los cargos requeridos para el Proyecto	Consorcio Cardique C&E	03/02/2026
CICRDC-003.02.2026	Canales de comunicación de interventoría para	Consorcio Cardique C&E - CARDIQUE	04/02/2026

	recepción y envío de documentación.		
CICRDC-004.02.2026	Reiteración a la Solicitud Para la Entrega de la Documentación Preliminar	Consorcio Cardique C&E	12/02/2026
CICRDC-005.02.2026	Solicitud de medidas y protocolos para el ingreso de maquinaria a las zonas de	Consorcio Cardique C&E	13/02/2026
CICRDC-006.02.2026	Entrega de pólizas contractuales del contrato de interventoría.	CARDIQUE	18/02/2026
CICRDC-007.02.2026	Solicitud de instalación de vallas informativas	Consorcio Cardique C&E	19/02/2026
CICRDC-008.02.2026	Revisión a las hojas de vida entregadas por el contratista	Consorcio Cardique C&E	19/02/2026
CICRDC-009.02.2026	Oficio reiterativo - Solicitud de Actas de Vecindad – Componente Social	Consorcio Cardique C&E	27/02/2026
CICRDC-010.02.2026	Observaciones al Plan de Manejo Ambiental - PMA	Consorcio Cardique C&E	27/02/2026
CICRDC-011.02.2026	Revisión a las hojas de Vida Entregadas por el Contratista (Segunda entrega)	Consorcio Cardique C&E	27/02/2026
CICRDC-012.03.2026	Observaciones a la Programación de la obra y Flujo de caja	Consorcio Cardique C&E	02/03/2026
CICRDC-013.03.2026	Programación y Coordinación de Recorrido – Frentes de obra Chupundun	Consorcio Cardique C&E	02/03/2026

	y Ricaurte.		

Tabla 12. Relación de correspondencias enviadas

14. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el período evaluado, no se ha presentado ninguna dificultad que haya puesto en peligro o haya causado algún trauma considerable a la ejecución de las actividades del proyecto

15. CONCLUSIONES

Durante el primer periodo de ejecución comprendido entre el 09 de febrero y el 08 de marzo de 2026, la interventoría realizó las actividades de seguimiento, verificación y control al contrato de obra cuyo objeto corresponde al mantenimiento y relimpia de los descoles de los canales que descargan hacia la Ciénaga de la Virgen, proyecto contratado por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE.

En el periodo evaluado se adelantaron principalmente actividades preliminares necesarias para el inicio efectivo de las obras, tales como recorridos de reconocimiento en los frentes de trabajo, socialización del proyecto con las comunidades, levantamiento de actas de vecindad y la ejecución de los levantamientos batimétricos iniciales en los canales Calicanto, Chupundun y Ricaurte.

El avance físico reportado durante el periodo corresponde principalmente a la ejecución de las actividades de batimetría inicial y gestiones preliminares, lo cual representa un avance del 0,10 % del total del proyecto, encontrándose por debajo del avance programado para el periodo que corresponde al 0,71 %.

Las actividades desarrolladas han permitido establecer las condiciones iniciales de los canales a intervenir, información que resulta fundamental para la planificación de las actividades de excavación, dragado y retiro de sedimentos contempladas dentro del alcance del contrato de obra.

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones que afectaran de manera significativa la ejecución del contrato ni se registraron incidentes relevantes en materia ambiental, social o de seguridad y salud en el trabajo.

La interventoría ha realizado acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el desarrollo de las actividades sociales y técnicas necesarias para el correcto inicio de la obra.

16. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista fortalecer la programación y planificación de las actividades constructivas, con el fin de incrementar el ritmo de ejecución y recuperar progresivamente el desfase presentado entre el avance programado y el avance ejecutado durante el primer periodo del contrato.

Se sugiere garantizar la disponibilidad oportuna de maquinaria, equipos y personal técnico necesarios para el desarrollo de las actividades de excavación mecánica, dragado y retiro de sedimentos en los diferentes frentes de obra.

Continuar con las actividades de articulación y socialización con las comunidades ubicadas en los sectores de influencia del proyecto, con el

propósito de mantener una adecuada comunicación con los líderes comunitarios y minimizar posibles afectaciones durante la ejecución de las obras.

Mantener el cumplimiento estricto de los planes y programas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y del componente social, garantizando que las actividades constructivas se desarrollen bajo los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y demás instrumentos de gestión del proyecto.

Se recomienda continuar con el seguimiento técnico permanente por parte de la interventoría, verificando las cantidades de obra ejecutadas, la correcta aplicación de los procedimientos constructivos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

Finalmente, se recomienda al contratista dar inicio progresivo a las actividades de intervención física en los canales, priorizando los sectores que presentan mayores niveles de sedimentación, con el fin de garantizar la recuperación de la capacidad hidráulica de los descoles hacia la Ciénaga.

17. ANEXOS

Anexo 1. - Volúmenes según levantamiento Inicial

Anexo 2. – Informe Ambiental Interventoría

Anexo 3. – Informe Social Interventoría

Anexo 4. – Informe SST interventoría

Anexo 5. – Correspondencias enviadas y recibidas

EDUARDO AREVALO NEIRA
CONSORCIO INTER CRD CARDIQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
