4.4.7. CIV 2001342 – CARRERA 6 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 67

El día 07 enero de 2020 se continua con la excavación del cajeo para una estructura de vía de 0.79m.

En la excavación se observa que el material es muy arcilloso por lo cual se programa la visita del especialista de geotecnia y pavimentos de Consultoría y Construcción S.A.S. el ingeniero Juan Moya, quien el día 09 de enero de 2020 en conjunto con los residentes solicita que no se haga el mejoramiento con geocelda ya que se evidencian deformaciones excesivas; se recomienda cambiar el mejoramiento por rajón con un espesor de 35 cm.

El día 14 de enero de 2020 se le hace entrega a la Interventoría de los niveles de subrasante para dar inicio al mejoramiento.

El día 15 de enero de 2020 se inicia la instalación de rajón a ambos costados de la red de alcantarillado existente debido a que esta red está muy superficial.

El día 18 de enero de 2020 se retira material acopiado, se continúa con la instalación de rajón y limpieza de la sub-rasante desde el K0+050 al K0+060.

El día 30 de enero de 2020 se inicia la excavación manual para la renovación de la red de alcantarillado.

Ilustración 52. Excavación de subrasante.



Ilustración 53. Entrega de niveles de subrasante.



Ilustración 54. Instalación de rajón.





4.4.8. CIV 2002009 – CALLE 43-A ENTRE CRA 9 Y CRA 13.

La Alcaldía mediante oficio N° 20195220248591 del 08 de enero de 2020 solicitó a la EAAB una definición de la localización de los pozos más acertada para el proyecto ya que las propuestas dadas en terreno requieren de más tiempo y recursos que el contrato no posee.

El día 03 de enero de 2020 se inicia con la excavación manual para la conexión de las redes domiciliarias, realizando la excavación manual para el pozo ubicado sobre la Carrera 9.

El día 09 de enero de 2020 se hace entrega a la Interventoría de las cajas de transición del costado norte de la vía.

El día 13 de enero de 2020 se realiza la toma de densidades del relleno sobre la red de alcantarillado con resultados del 97%.

El día 14 de enero de 2020, en visita con la EAAB, se observa que en el edificio de la calle 43A #9-98 tiene dos salidas de domiciliarias, por parte del acueducto solo se permite la salida de una domiciliaria por predio, por esto se definió realizar una caja de inspección de 60x60 cm que recibirá las dos salidas del predio, pero entregará en una sola salida a la red principal.

El día 22 de enero de 2020 se hace entrega a la Interventoría de los niveles de sub-rasante desde el K0+010 hasta el K0+055 para dar inicio con la instalación del geotextil y de la geocelda para el mejoramiento de la vía. El día 23 de enero de 2020 se inicia el lleno y compactación del lleno de la geocelda.

El día 28 de enero de 2020 se inicia la instalación de 17cm de sub-base granular desde el K0+015 hasta el K0+045 y la instalación de geotextil y geocelda desde K0+055 a K0+063.2.

El día 30 de enero de 2020 en visita por parte de la EAAB se informa que la caja de 60x60 de transición del edificio calle 43A 9#94 deberá quedar en el andén e inspeccionable, adicional a esto para la red de 4" agua potable se deberá hacer un cárcamo con doble muro, cama de arena y tapa prefabricada.
El día 31 de enero de 2020 se hace entrega a la Interventoría de los niveles de terminado de geocelda desde e K0+045 hasta el K0+055 para liberación

Ilustración 55. Excavación manual de pozo.



Ilustración 56. Toma de densidades en la red de alcantarillado.



Ilustración 57. Entrega de niveles de subrasante.



Ilustración 58. Instalación de geocelda.



4.4.9. CIV 2001775 – CALLE 50A ENTRE CARRERA 13 – VIA CERRADA.

El 13 de enero de 2020 se realizó visita en el CIV 2001775 (Calle 50A entre Carrera 13 y vía cerrada) por parte del Ingeniero Alexander Gómez de la EAAB, en la cual se solicitó por parte de la EAAB realizar las pruebas de anilina frente al predio # 13-58 en los dos tramos de tubería de salida, verificándose la descarga de los mismos en un pozo intermedio de la calle 51 entre carrera 14 y carrera 13. Igualmente, la EAAB solicitó la inspección con cámara de televisión a dichos tramos con el fin de determinar cuál se encuentra en mejor estado y sobre ésta construir el pozo y definir el alineamiento que tendrá la red de alcantarillado, garantizándose la conexión de todos los predios del CIV.

Con respecto a la red de acueducto, la EAAB autorizó dejar la red de 3" PVC que pasa por el costado norte del CIV protegiéndola con cárcamo y garantizando que todos los predios van a quedar conectados a dicha red. Igualmente se debe solicitar el cierre para taponar y dejar fuera de servicio la red HG 2" existente a la altura de la Carrera 13. Por parte de la comunidad hay una solicitud de intervenir los andenes, a la fecha la entidad no ha definido si se van a realizar o no, no se ha podido realizar el cárcamo y avanzar con la estructura de vía ya que de autorizarse la intervención del andén se podría trasladar la red debajo de este y evitar la construcción del cárcamo.

Durante el mes de enero de 2020, continuaron las actividades de excavación mecánica para la estructura de pavimento, la cual está definida en 10 cm de carpeta asfáltica, 15 cm de Base granular tipo B, 18 cm de subbase granular tipo B y 15 cm de geocelda. Igualmente se hizo el retiro en volqueta del material producto de excavación.

Adicionalmente, durante este periodo se realizaron las actividades de instalación de la tubería sanitaria PVC de 10", construcción de domiciliarias en 6" PVC; se ejecutaron las actividades de construcción

de cárcamos de protección de dichas tuberías y se inició la construcción del pozo inicial de dicha red de alcantarillado.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades más significativas ejecutadas en la Calle 50A durante el mes de enero de 2020:

Ilustración 59. Excavación mecánica de la zona de bahía Calle 50A – Carrera 13



Ilustración 60. Excavación manual junto a cárcamo de ETB - costado sur Calle 50A



Ilustración 61. Excavación manual



Ilustración 62. Inicio excavación mecánica para red de alcantarillado de 10”



Ilustración 63. Instalación de tubería PVC 10" Alcantarillado



Ilustración 64. Excavación manual de domiciliarias de alcantarillado.



Ilustración 65. Inicio construcción pozo inicial Calle 50A (placa fondo)



Ilustración 66. Construcción de cárcamo de protección en mampostería para la tubería de alcantarillado PVC 10"



Ilustración 67. Instalación de domiciliarias en tubería PVC 6" alcantarillado.



4.4.10. CIV´S 30000107 -30000106 – 30000105 – 50009286 – 30000104: CARRERA 4A ESTE ENTRE CALLES 45B Y 46.

El 27 de enero de 2020 se dio apertura al frente de Villa del Cerro el cual comprende cinco CIV´S con una longitud total aproximada de 141.2 m.

Una vez implementado el PMT y colocado el cerramiento en polisombra, se iniciaron las actividades en sentido sur-norte por la carrera 4ª este con calle 45B (CIV 30000107) mediante la demolición de la carpeta asfáltica existente, con retroexcavadora y remoción de dicho material en volqueta.

Durante las actividades descritas anteriormente se ha observado la existencia de mangueras de conexiones domiciliarias de acueducto que pasan superficialmente por la vía en sentido occidente-oriente que eran imposibles de localizar ya que los predios no poseen medidores, estas acometidas se han dañado y se han reparado con el fin de evitar daños en la subrasante existente. Respecto a este tema se informó a la interventoría y a la EAAB para que nos definan como proceder para que este tema no nos genere atrasos.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante los 4 días de intervención del mes de enero de 2020:

Ilustración 68. Excavación mecánica - CIV 30000107



Ilustración 69. Excavación mecánica CIV´S 30000107 - 30000106



4.4.11. CIV 2000561 – CALLE 93 ENTRE CALLE 92A Y KR5

Mediante comunicado C.M&A-05-404-18-002-2020 del 08 de enero de 2020, la Interventoría informó que no se estaba a la espera de ningún pronunciamiento o autorización por parte del FDLCH para iniciar este segmento por lo cual podíamos programar su inicio.

El 15 de enero de 2020 se dio apertura del frente ubicado en la calle 93 entre calle 92ª y kra 5, iniciándose actividades de demolición de losas de concreto utilizando una retroexcavadora con martillo y efectuándose la remoción de dicho material en volqueta, actividades que se iniciaron por el costado sur de la calle 93.

En la demolición ejecutada, como se consignó en bitácora de obra, se evidencio que el bordillo existente estaba anclado con refuerzos a la losa en unas partes específicas, por esto durante la demolición resulto afectado, y por lo cual se debe realizar la reconstrucción del mismo.

Igualmente, durante el periodo se realizó demolición manual debido a cercanía de red de gas natural junto a los predios 1-98 y 1-81.

El 24 de enero de 2020 se reiteró por parte de la Interventoría la renovación de las redes de alcantarillado del CIV en respuesta a una solicitud realizada por el Contratista de no efectuar dichas renovaciones teniendo en cuenta la profundidad de las redes y el estado de las mismas.

El 28 de enero de 2020, se realizó igualmente la actividad de excavación mecánica de la estructura de vía, junto con el cargue y retiro de material de demolición de losa de concreto existente.

Ilustración 70. Inicio demolición de losas de concreto costado sur calle 93





Ilustración 71. Retiro de material de demolición zona de bahía.



Ilustración 72. Excavación mecánica para primer tramo de tubería de alcantarillado entre pozos PZ-A y PZ-B





Para este segmento se recibió comunicado de la Interventoría (C.M&A-05-404-18-029-2020 del 23 de enero de 2020) solicitando aclaración respecto a la inspección de CCTV enviada ya que no correspondía con lo encontrado en terreno. Efectivamente, la inspección enviada correspondía a la red de la carrera 5 con calle 93 más no a la calle 93 como tal. A pesar de lo anterior se determinó renovar la red de alcantarillado debido a que la existente se encontraba en material de GRES.

CIV 2001359 – CALLE 66 ENTRE KR5 Y KR6.

Implementado el PMT e instalado el cerramiento el día 13 de enero de 2020 se dio apertura al CIV 2001359 ubicado en la Calle 66 entre Carreras 5 y 6, iniciando con las actividades de demolición de la carpeta asfáltica existente de un promedio aproximado de 11 cm.

El 14 de enero de 2020 se realizó visita al CIV por parte de la EAAB autorizándose el cambio de redes de gres a PVC en 8" respectivamente. Adicionalmente se autorizó suprimir un pozo de inspección en la intersección y cambiar el alineamiento de la red de la calle 66 garantizándose la conexión de la totalidad de domiciliarias. La EAAB solicitó que los sumideros tengan sello hidráulico para evitar olores.

Durante el mes de enero de 2020, posterior a la demolición de carpeta se excavó el CIV con un espesor aproximado de 45 cm efectuándose el retiro de material en volqueta para luego continuar con las excavaciones de la red de alcantarillado. También se realizaron las actividades de limpieza de un sumidero, excavación manual para inicio de la renovación de la red de alcantarillado, un pozo de inspección y excavaciones manuales para redes domiciliarias de alcantarillado

Igualmente se hizo verificación de redes de ETB en la Calle 66 con Carrera 6, donde sale una canalización hacia el costado sur oriental del CIV junto al predio 5-21.

También se realizó la demolición de la tubería de gres de 8" existente, instalación de tubería PVC 8" con relleno en triturado hasta ¾ de tubo y sello con recebo a lomo de tubo.

Ilustración 73. Inicio de actividades de demolición de carpeta asfáltica calle 66 entre kr 5 y 6.



Ilustración 74. Carpeta asfáltica demolida en la totalidad del CIV



Ilustración 75. Excavación mecánica y limpieza de sumidero con protección



Ilustración 76. Excavación manual de lomo de tubo de gres de 8" existente.



Ilustración 77. Instalación de tubería PVC 8" alcantarillado



Ilustración 78. Lleno en recebo de tubería PVC 8" Alcantarillado.



4.4.12. ACCIÓN DE MOVILIDAD CIV 2001675 - CARRERA 9 ENTE CLL54A Y CLL55.

El 09 de enero de 2020, se dio inicio a la acción de movilidad en el costado oriental del CIV 2001675 donde se demolió y reconstruyó el espacio público en concreto a la vista en una longitud de 42 m y con una estructura de 15 cm de subbase granular tipo C y 10 cm de placa de concreto de 3000 PSI, construyéndose en 2 rampas vehiculares la placa en 15 cm de concreto reforzado con hierro de 3/8" cada 25 cm conservándose la capa de subbase granular tipo C de 15 cm.

- Demolición manual y mecánica con martillo eléctrico de la placa de concreto existente en el espacio público con un espesor aproximado de 11 cm, iniciándose desde el costado norte de la Carrera 9.
- Excavación del material existente y reemplazo del mismo con subbase granular tipo C compactada con un espesor de 15 cm.
- Nivelación de cajas de medidores de acueducto existente e instalación de tapas prefabricadas con marco para cajas de aguas negras.
- Toma de ensayo de compactación sobre la subbase granular instalada y chequeo de niveles por parte de la Interventoría.
- Vaciado de concreto de 3000 psi, terminándose la acción de movilidad el 30 de enero de 2020.

A continuación, se presenta registro fotográfico del proceso que se llevó para la reconstrucción de los andenes en la Carrera 9 entre Calles 54A – 55 costado oriental:

Ilustración 79. Demolición de losa de concreto e= 11 cm existente espacio público.





Ilustración 80. Excavación y retiro de material existente debajo de losa de concreto.





Ilustración 81. Extensión y compactación de SBG-C para estructura de espacio público Carrera 9 con Calle 54A





Ilustración 82. Armado de parrillas para refuerzo de rampas vehiculares de 2 predios en refuerzo de 3/8" c/25 cm





Ilustración 83. Instalación de concreto de 3000 PSI, e= 10 cm zona de andén



Ilustración 84. Terminado final espacio público





4.5. INTERVENCIÓN DE REDES

Tabla 8. Resumen intervención de redes

Frente de obra	CIV	Red Principal renovada	Redes de Domiciliarias renovadas	Redes de Sumideros Renovadas	Pozos nuevos	Pozos existentes dentro de segmento	Observaciones
1	2001592	12"	6	0	2	0	Terminado
2	2001762	10"	16	2	2	0	Terminado
3	2001492	12"	11	4	1	2	Terminado
4	2002049	16"	5	1	2	1	Terminado, se renovó red de agua potable
5	2002042	16"	5	1	2	0	Terminado, Se renovó red de agua potable
6	2000384	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
7	2000543	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
8	2001771	10"	7	1	2	1	Terminado
9	2000134	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
10	2001580	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
11	2001469	12"	15	0	1	1	Terminado
12	2001176	12"	7	2	2	1	Terminado
13	2000103	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
14	2000090	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
15	2001790	8"	11	2	0	2	En ejecución
16	2001826	10"	9	-	1	2	En ejecución
17	2000583	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes

Frente de obra	CIV	Red Principal renovada	Redes de Domiciliarias renovadas	Redes de Sumideros Renovadas	Pozos nuevos	Pozos existentes dentro de segmento	Observaciones
18	2000539	-	-	-	-	-	No se intervinieron redes
19	2001818	20"	11	1	2	3	En ejecución
20	2002009	12"	-	-	2	2	En ejecución
21	2001342	10"	-	-	2	3	En ejecución
22	2000608	24"	-	-	-	3	En ejecución
23	2001775	10"	-	-	-	2	En ejecución
24	2000561	10"	-	-	-	3	En ejecución
25	2001359	8"	3	1	2	0	En ejecución
26	2001675	-	-	-	-	-	Andén. No se intervinieron redes
27	30000107	-					En ejecución
28	30000106	-					En ejecución
29	30000105	-					En ejecución
30	50009286	-					En ejecución

4.6. INVENTARIO FORESTAL

Sin novedad.

4.7. ACTAS DE VECINDAD

Al corte del presente informe se tiene el siguiente estado de revisión y aprobación de las actas de vecindad de los siguientes CIV´s:

Tabla 9. Actas de vecindad elaboradas.

#	CIV	DIRECCIÓN	# ACTAS DE VECINDAD	FECHA DE ENTREGA	ESTADO
1	2001762	CLL52B ENTRE TV 3 Y TV 4	68	14/05/2019	Aprobadas
2	2001771	CLL52A ENTRE TV 3 Y TV 4	21	14/05/2019	Aprobadas
3	2001592	CLL58 ENTRE KR 5 Y KR 6	12	14/05/2019	Aprobadas
4	2001492	KR3A ENTRE CL 63 Y CL 64	16	04/06/2019	Aprobadas
5	2001176	KR12 ENTRE CL 68 Y DG 68	10	06/06/2019	Aprobadas
6	2002049	CL42 ENTRE KR13 Y KR13A	14	06/06/2019	Aprobadas

#	CIV	DIRECCIÓN	# ACTAS DE VECINDAD	FECHA DE ENTREGA	ESTADO
7	2002042	CL42 ENTRE KR 13A Y KR 14	4	22/05/2019	Aprobadas
8	2000543	CL 90 ENTRE KR 9A Y KR 10	22	25/06/2019	Aprobadas
9	2000384	CL 93A ENTRE KR 10 Y KR 11	32	25/06/2019	Aprobadas
10	2001580	CL 57 ENTRE KR 8 Y KR 8BIS	15	04/06/2019	Aprobadas
11	2001292	CL 69A ENTRE KR 4 Y KR 5	19	25/06/2019	Aprobadas
12	2000103	KR 13 ENTRE CL 97BIS Y CL 98	4	04/06/2019	Aprobadas
13	2001173N	CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	8	25/06/2019	Aprobadas
14	2001173S	CL 70 ENTRE KR 9 Y KR10A	13	25/06/2019	Aprobadas
15	2001818	CL 48 ENTRE KR 13 Y AV. CARACAS	20	12/07/2019	Aprobadas
16	2000134	KR 13 ENTRE CL 97 Y CL 97BIS	5	02/07/2019	Aprobadas
17	2000090	KR 13 ENTRE CL 98 Y CL 99	20	02/07/2019	Aprobadas
18	2001790	CL 51A ENTRE TV 3 Y KR 6	14	02/07/2019	Aprobadas
19	2001826	CL 48A ENTRE KR 6 Y KR 7	51	02/07/2019	Aprobadas
20	2001326	CL 66 ENTRE KR 7 Y KR 8	72	29/07/2019	Aprobadas
21	2001469	KR 9A ENTRE CL 60 Y CL 61	47	16/07/2019	Aprobadas
22	2002991	VEREDA EL VERJON	10	13/09/2019	Aprobadas
23	2003010	VEREDA EL VERJON	5	13/09/2019	Aprobadas
24	2000539	CL 86 KR 16 Y KR 16A	7	09/10/2019	Aprobadas
25	2000583	KR 13 CL 86A Y CL 87	11	09/10/2019	Aprobadas
26	2002009	CALLE 43A ENTRE KR 9 Y KR 13	26	13/11/2019	Aprobadas
27	2001342	KR 6 ENTRE CL 66 Y CL 67	9	28/11/2019	Aprobadas
28	2000608	TV 5A ENTRE KR 5 Y KR 6	11	11/01/2020	Con observaciones
29	2001775	CALLE 50A CON KR 13	14	17/01/2020	Con observaciones
30	2000561	CALLE 93 ENTRE CL92 Y KR5	12	11/01/2020	Con observaciones
31	2001359	CALLE 66 ENTRE KR5 Y KR6	7	11/01/2020	Aprobadas
32	2001675	CARRERA 9 ENTRE CL 54A Y 55	6	11/01/2020	Aprobadas
33	30000107	KR4A E ENTRE CL 45B Y CL 45C	6	05/02/2020	Por entregar
34	30000106	KR4A E ENTRE CL 45C Y CL 45D	7	05/02/2020	Por entregar
35	30000105	KR4A E ENTRE CL 45D Y TV 4E	7	05/02/2020	Por entregar
36	50009286	KR4A E ENTRE TV 4E Y CL 45F	7	05/02/2020	Por entregar
37	30000104	TV4 E ENTRE CL 45F Y CL 46	7	05/02/2020	Por entregar
38	2001225	CALLE 65A ENTRE KR 13 Y KR14	24	17/01/2020	Con observaciones
39	2001417	CALLE 68 ENTRE KR 1 Y TV 1E	3	17/01/2020	Con observaciones

Mediante oficio C&C-142-142-2018-611 del día 03 de enero de 2020 se informó al residente del predio de la calle 48#6-5 que no se realizará la respectiva acta de vecindad ya que previo al inicio de obras en el segmento CIV 2001826 se surtió todo el proceso para su elaboración sin tener respuesta por parte de ellos si no hasta después de haber iniciado las obras.

4.8. PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTOS

El día 21 de enero de 2020 mediante oficio C&C-142-2018-638 se dio alcance al comunicado C&C-142-2018-604 y respuesta al comunicado C.M&A-05-404-18-006-2020 del 14 de enero de 2020 de Interventoría y N°20205220001091 de la Alcaldía Local de Chapinero en los que solicitaban ampliar la sustentación al concepto de viabilidad técnica, legal y financiera de la solicitud de prorroga con un balance económico que no sobre pase el valor inicial de del contrato y una reprogramación acorde.

4.9. DAÑOS A TERCEROS O REDES DE SERVICIOS

Durante este periodo se presentaron dos daños a la red de gas natural en cruces de la red de 1", las cuales se encontraban sin cinta de advertencia durante las actividades de excavación de vía en los CIV's 2000561 y 2001359.

Tabla 10. Daños a redes de servicio públicos consolidado.

No.	CIV	Servicio	Diámetro	Material	Fecha	No. reporte	Reparación
1	2001762	Agua potable	1,5"	PVC	12-06-2019	1001618575	Contratista
2	2001762	Gas	1"	Polietileno	15-06-2019	101938612	Vanti
3	2001492	Agua potable	3"	Asbesto	26-06-2019	1001622449	Contratista
4	2001492	Gas	1"	polietileno	30-07-2019	101948469	Vanti
5	2001762	Gas	1"	polietileno	09-08-2019	101951947	Vanti
6	2000543	Agua potable	3"	PVC	09-09-2019	1001618575	Contratista
7	2001580	Agua potable	4"	PVC	10-06-2019	Atención directa	Contratista
8	2001771	Gas	1"	polietileno	16-09-2019	101960974	Vanti
9	2001469	Gas	1/2"	polietileno	27-09-2019	101963368	Vanti

No.	CIV	Servicio	Diámetro	Material	Fecha	No. reporte	Reparación
10	2001818	ETB	1”	polietileno	28-11-2019	Atención directa	Contratista
11	2001790	Agua potable	4"	PVC	21-11-2019	Atención directa	Contratista
12	2001469	ETB	3”	Asbesto	04-12-2019	Atención directa	Contratista
13	2001469	ETB	3”	Asbesto	06-12-2019	Atención directa	Contratista
14	2002009	Agua Potable	4”	PVC	03-12-2019	Atención directa	Contratista
15	2001790	Gas	1”	Polietileno	12-12-2019	101977064	Vanti
16	2000561	Gas	1”	Polietileno	28-01-2020	1019846642	Vanti
17	2001359	Gas	1”	Polietileno	30-01-2020	101984545	Vanti

4.10. INCLUSIONES O EXCLUSIONES AL ALCANCE

Mientras se realizaban las actas de vecindad del CIV 2000913 (Calle 80 entre Carreras 8 y 9) se evidencio la presencia de un contratista del IDU que adelantaba trabajados de volanteo informando también sobre la intervención de este segmento vial. Al respecto se envió el día 21 de enero de 2020, mediante oficio C&C-142-2018-633m una solicitud de aclaración a la alcaldía e Interventoría.

La alcaldía solicitó mediante oficio No. 20205220003541 junto con la Interventoría (C.M&A-05-404-18-030-2020) iniciar la intervención de la acción de movilidad del CIV 2001515. Luego de aprobado el PMT en el COI No. 04 del 23 de enero de 2020, el día 28 de enero mientras se instalaba la señalización del PMT, la alcaldía informó que se detuviera la gestión e inicio de actividades ya que habían determinado dejar este CIV para intervención por parte de la unidad de mantenimiento vial.

4.11. ACTIVIDADES ESPECIALES

Sin novedad.

5. SISTEMA DE CALIDAD

5.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA

Toda la comunicación del proyecto es llevada mediante comunicados, direccionados según corresponda el caso, con copia a la Interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Chapinero. Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2020 se relaciona la correspondencia enviada y recibida en los Anexos 2 y 3 del presente informe.

5.2. RELACIÓN DE COMITÉS

Se mantiene una constante comunicación entre CON&CON S.A.S, la Interventoría Consorcio M&A 05 y el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero. A continuación, se presenta un resumen de los comités llevados a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2020, las actividades y compromisos se pueden apreciar en el Anexo 1.

Tabla 11. Relación de comités realizados en el periodo.

NÚMERO	FECHA	TIPO DE COMITÉ	PARTICIPANTES
Comité 37	08-01-20	Técnico/Social/SST-MA	*Con&Con S.A.S *Interventoría Consorcio M&A 05 *FDLCH
Comité 38	14-01-20	Técnico/Social/SST-MA	*Con&Con S.A.S *Interventoría Consorcio M&A 05 *FDLCH
Comité 39	22-01-20	Técnico/Social/SST-MA	*Con&Con S.A.S *Interventoría Consorcio M&A 05 *FDLCH
Comité 40	29-01-20	Técnico/Social/SST-MA	*Con&Con S.A.S *Interventoría Consorcio M&A 05 *FDLCH

5.3. INFORMES MENSUALES

Mensualmente, la Interventoría (Consorcio M&A 05) recibe por parte de Consultoría y Construcción S.A.S., como es su obligación contractual, los informes mensuales correspondientes a cada área, a los cuales se les realizan las observaciones, ajustes y correcciones, si hay lugar a ello, para posteriormente proceder la radicación integral del informe mensual ante la Alcaldía Local de Chapinero.

Tabla 12. Informes Mensuales

NUMERO DE INFORME	PERIODO
1	06 al 31 de marzo de 2019
2	01 al 30 de abril de 2019
3	01 al 31 de mayo de 2019
4	01 al 30 de junio de 2019
5	01 al 31 de julio de 2019
6	01 al 31 de agosto de 2019
7	01 al 30 de septiembre de 2019
8	01 al 31 de octubre 2019
9	01 al 30 de noviembre de 2019
10	01 al 31 de diciembre de 2019
11	01 al 31 de enero de 2020

5.4. EQUIPOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2020, se utilizaron los siguientes equipos:

Tabla 13. Equipos y herramientas de trabajo durante el periodo.

TIPO	CANTIDAD
Vehículo - Camioneta	1
Equipo de cómputo	11
Impresora	2
Cámara (registro fotográfico)	3
Estación total TRIMBLE M3-DR2	1
Nivel TOPCON	1
Nivel KOLIDA	1
Nivel SOKKIA	1
Herramienta menor (Boal)	
Teodolito FOIF DT-205CL	1

TIPO	CANTIDAD
Teodolito SOUTH ET-05	1

5.5. CERTIFICADOS DE MATERIALES

En el Anexo 4 se relaciona listado de ensayos realizados durante este periodo.

5.6. BITÁCORAS DE OBRA

En el Anexo 5 se incluye copia de las bitácoras de cada frente de obra abierto.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. VALOR DEL CONTRATO

Este contrato está contemplado por un valor total de CATORCE MIL DOSCIENTOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($14.200.005.565.oo) M/CTE.

6.2. DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 MESES

- **FECHA DE INICIO:** 06 DE MARZO DE 2019
- **FECHA DE TERMINACIÓN**: 05 DE MARZO DE 2020

6.3. ACTAS DE OBRA

Acta parcial de Obra	Periodo de obra	Radicado a Interventoría	Radicado a Alcaldía	Valor	% Vr acumulado	Fecha de pago
No. 01	06/03/19 a 05/07/19	C&C-142-2018-306 - 08/08/19	C&C-142-2018-317 - 15/08/19	$364.364.354	2.60%	03/09/19
No. 02	06/07/19 a 05/09/19	C&C-142-2018-375 - 20/09/19	C&C-142-2018-386 - 26/09/19	$707.467.143	7.55%	01/10/19

Acta parcial de Obra	Periodo de obra	Radicado a Interventoría	Radicado a Alcaldía	Valor	% Vr acumulado	Fecha de pago
No. 03	06/09/19 a 05/10/19	C&C-142-2018-410 - 16/10/19	C&C-142-2018-386 - 24/10/19	$860.541.672	13.61%	31/10/19
No. 04	06/10/19 a 05/11/19	C&C-142-2018-542 - 18/11/19	C&C-142-2018-543 - 28/11/19	$ 400.470.411	16.43%	25/11/19
No. 05	06/11/19 A 05/12/19	C&C-142-2018-584 - 10/12/19	-	$ 919.184.924	22.90%	13/12/19
No. 06	06/12/19 A 17/12/19	C&C-142-2018-597 - 16/12/19	-	$ 916.803.549	29.36%	20/12/19
Vr. Ejecutado acumulado				$ 4.168.832.353	29.36%	
Vr. total Contrato				$14.200.005.565		
Saldo Contrato				$10.031.173.212	70.64%	

En comité de obra No. 24 del 28 de agosto de 2019 se definió que las actividades de los capítulos de Diagnósticos y Diseños del proyecto son costos directos por lo cual deben llevar IVA. Mientras que las actividades de obra solo se afectarán por el AIU.

7. CONCLUSIONES

Para el final de este periodo se logró la ejecución de la segunda acción especial que fue el andén del CIV 2001675. Y la ejecución en simultaneo de 16 CIV's.

Todos los frentes en ejecución han requerido renovación de redes y por estas razones no se reflejan avances financieros importantes en cada uno de los CIV's.

El contratista solicita tanto a la interventoría como a la Alcaldía Local, que sea más ágil el tema de definiciones en cuanto a intervención de redes de se refiere para que sea más fluido el avance de las obras en esta etapa, sin tantas interrupciones.

Durante este periodo se terminó el CIV 2001469, en total se encuentran terminados 16 segmentos de vía en los cuales está pendiente por ejecutar solamente la demarcación y señalización definitiva.

Consultoría y Construcción SAS mediante comunicado C&C-142-2018-638, radicado el 21 de enero de 2020, realizó la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 142 de 2018, y a la fecha de cierre del presente informe (31 de enero de 2020), la alcaldía Local de Chapinero, informa que se encuentra sin objeciones y que está en el trámite respectivo.

ANEXOS

1. ACTAS DE COMITÉ

MEDINA & RIVERA

ACTA DE REUNION

CODIGO	FO-ON -01
VERSION No	03
FECHA	28/08/2018

CONTRATO No. 142 DE 2018

OBJETO CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.

FECHA 08/01/2020 **HORA DE INICIO** 10:00 A.M

HORA DE FINALIZACION

OBJETIVO DE LA REUNION

Comité de seguimiento N°37 al Contrato de Obra N° 142 de 2018

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACION DE COMPROMISOS PACTADOS

- Reparacion losas CIU 2001771: 20 enero se realizaron trabajos
- Gestion CAS CIU 2001826 y 2002009: la directriz de la entidad es construir los pozos segun propuesta y mas adelante revisar la actividad de l recubrimiento interno mediante CIPP.
- Resultados nucleos asfaltos se deben tomar paneles dado que el lab no da resultados x nucleos.
- Reunion comunidad 2001464: se realizó.
- Inicio 2001775: Se cumplio
- Documentacion subcontratistas: se cumplio
- levantamiento actas vecindad 2001775: se cumplio
- PMTS Villas del rey: se entrego a interventoria para revision, se entrego actualizacion por 5 segmentos viales, dado que 2 CIU requieren modulacion y nos encontramos empalmado al pico
- Señalizacion: 13 enero 2020
- Ajustes reprogramacion: se entrego el dia 3 enero
- Inicio acciones movilidad: 20 enero

ASUNTOS TRATADOS

- Prorroga

La entidad solicita que el requerimiento de prorroga al contrato este muy bien sustentado y soportado tecnicamente, presupuestalmente y con programacion de obra.

- CIU 2001775

Se realizará visita 13 enero por parte de la CAS acerca de la actualizacion de red de acueducto que se encuentra en el segmento PUC 5".

MEDINA & RIVERA	ACTA DE REUNION	CODIGO	FC-DS-01
		VERSION No	02
		FECHA	29/06/2016

- Sobre tramos instalado CIU 7007009
Se presenta material inadecuado para los rellenos de la tubería que se esta instalando
Se solicita cumplir con las especificaciones de los materiales, evitando reprocesos.

- Inactividad de frentes de obra por falta de materiales y maquinaria, se hace un llamado a mejorar la provisión de los recursos e insumos y no caer en bajos rendimientos.
CIU: 7001542: Falta de Tubería
CIU 7001618: Falta de Tirfondo
CIU 7001464: Falta de material de base

- Se evidencia en recorridos de obra personal sin uso adecuado de EPP'S.

- Se solicita mantener actualizadas las carpetas de pruebas en obra

- Se solicita dar un mejor manejo al uso de sustancias químicas.

En general se hace un llamado a cumplir con los requerimientos anexos en los apendices de los componentes en cada de 11 mejorando semana a semana, se aclara que no se esta incumpliendo en los procedimientos, sin embargo, en el desarrollo de la obra si se presentan en ocasiones falencias, que se deberan acatar y corregir en la menor brevedad posible.

- El proximo 20 enero se entregara por parte del contratista propuesta para cierre de estado por desniveles.

- El contratista manifiesta que continuan los impases para la aprobacion de PMTS debido a la falta de firmas de actas de socializacion, por lo cual ni la comunidad ni la JAC han querido realizar dicha aprobacion
CIU'S 7001946, 7001225, 7001417, 7001881, 7001884, 7001627.

- Se ratifica por parte de la entidad y interventoria que se debe iniciar la obra en el frente de obra de 2000501.

- Se informa que a la fecha se encuentran aprobados la totalidad de los diseños de espacio publico.

- Programacion de obra

-/. Programado acumulado: 62,01 %.
/. Ejecutado acumulado: 30,59 %.
/. Atraso: 31,42 %.

Se esta revisando la reprogramacion aporte de proyecto para aprobacion y reestructura los atrasos por ejecucion.

- Con y con SAS informan no estar de acuerdo con la programacion de obra reportada por la interventoria por lo q' informan lo sgte.

o/o Prog. acumulado = 55.39 o/o
o/o Ejecut. acumulado = 29.36 o/o
o/o Diferencia = ~~(26.57 o/o)~~ 26.57 o/o

MEDINA & RIVERA


ACTA DE REUNION

CODIGO	PC-DIS -01
VERSION No	03
FECHA	28/06/2018

COMPROMISOS	REPRESENTANTE DE	FECHA
Presentación APU's CIPP's y cotizaciones	CONYCON	17/01/2020.
Presentación APU's INF's faltantes	CONYCON	10/01/2020 → 22/01/2020
Gestión con Alcalde Actividades Elvegión Prado	(CONYCON)	10/01/2020.
Instalación C.A. 2001469	CONYCON	11/01/2020 → 17/01/20
Visita a 2001775 - Revisión con CAAB	TODAS LAS PARTES	13/01/2020. → ok
Entrega actas vecindad 1225, 1675 1359, 0561, 0000	CONYCON	13/01/2020
Entrega actas de vecindad 1775	CONYCON	15/01/2020
Levantamiento actas de vecindad	CONYCON	11/01/2020 ✓
Envío informe mensual 1110 digital	CONYCON	09/01/2020 ✓
Entrega propuesta arreglo desniveles ast	CONYCON	20/01/2020 ok
Remisión actividades 2001580	CONYCON	10/01/2020 ok

PARTICIPANTES	REPRESENTANTE DE	FIRMA
Abogado Mayor	Abogado Mayor	
OSCAR JAVIER ROJAS SIERRA	ING. FDLCH	
OLIVER BAEZ	FDLCH	
RENPCAD. 6	Conycon AS	
Diana Maritza Prado	Interventoría	Diana M. Prado R.
Diego Andres Romero G.	Interventoría	

PROXIMA REUNION		
FECHA	15/01/2020	
LUGAR	FDLCH	
HORA	10:00 A.M.	

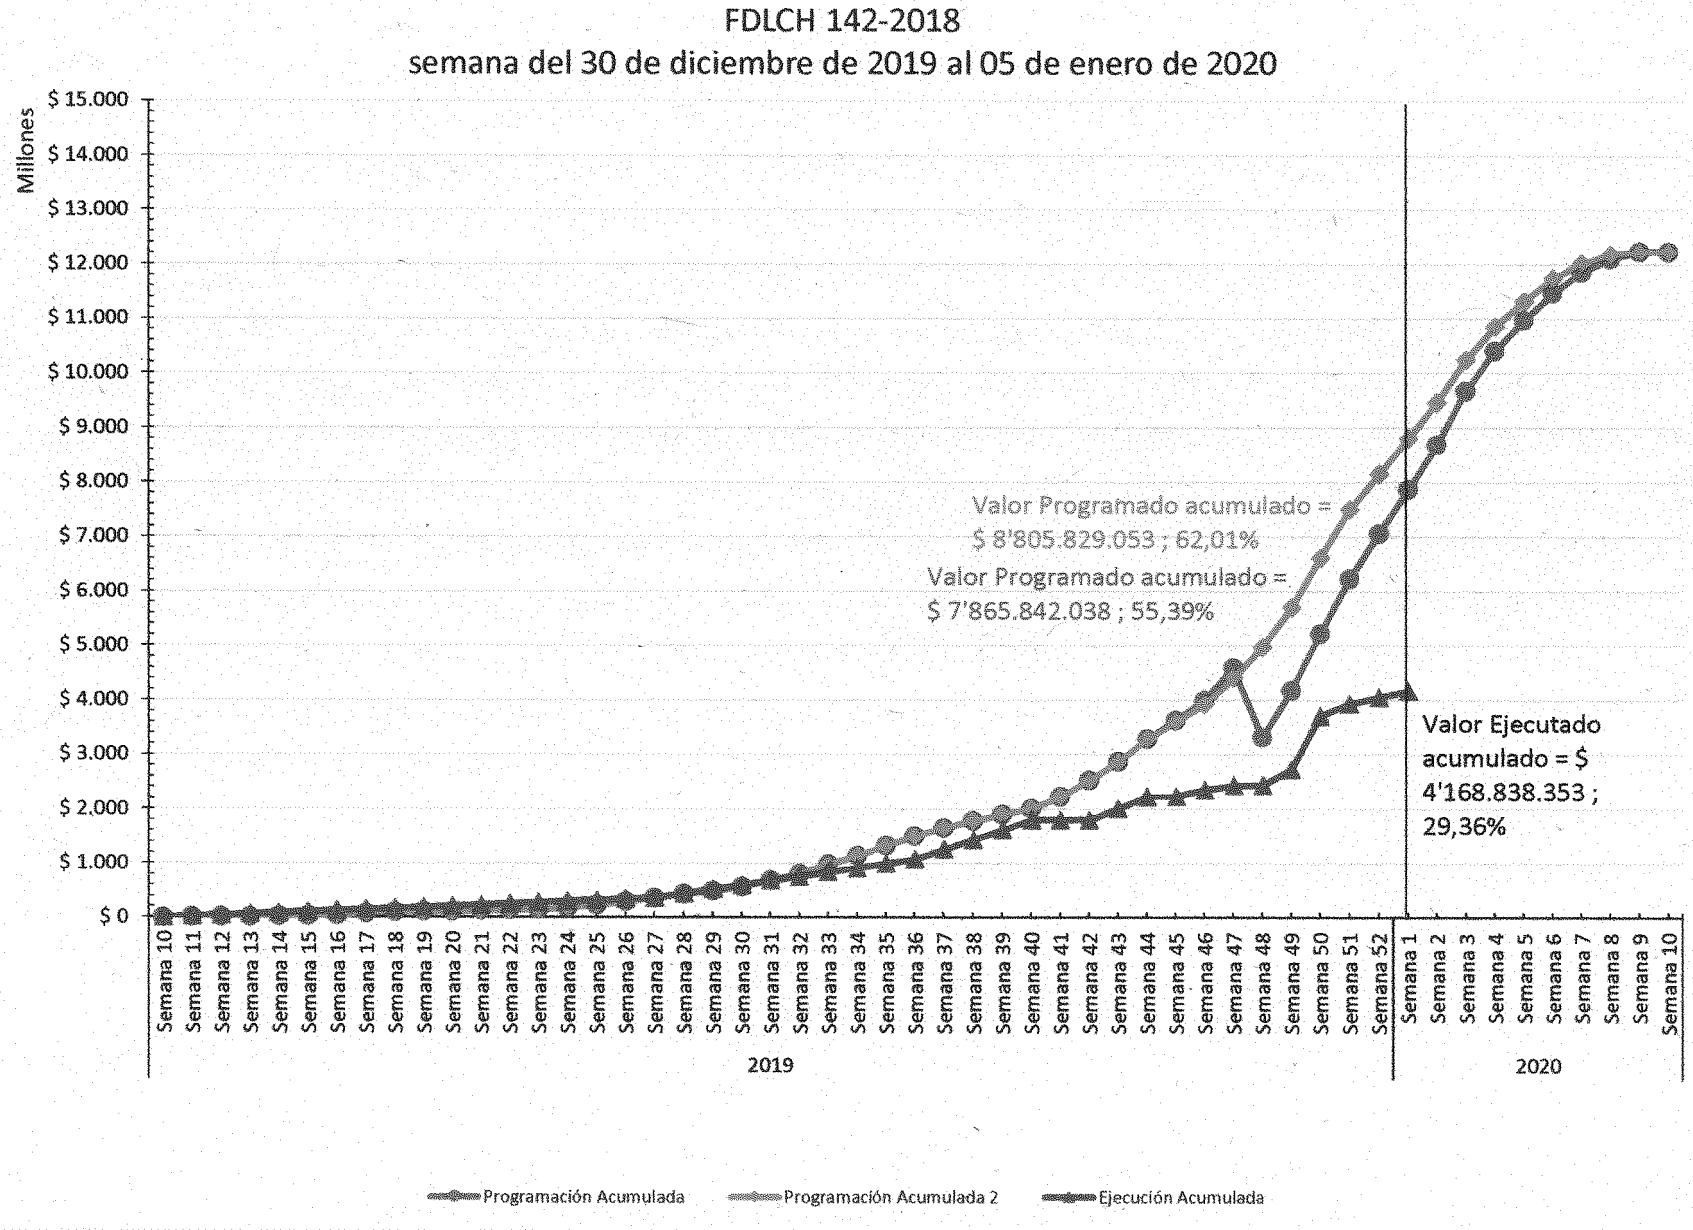
FDLCH 142-2018
semana del 30 de diciembre de 2019 al 05 de enero de 2020
Millones
$ 15.000
$ 14.000
$ 13.000
$ 12.000
$ 11.000
$ 10.000
$ 9.000
$ 8.000
$ 7.000
$ 6.000
$ 5.000
$ 4.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 1.000
$ 0
Valor Programado acumulado = $ 8'805.829.053 ; 62,01%
Valor Programado acumulado = $ 7'865.842.038 ; 55,39%
Valor Ejecutado acumulado = $ 4'168.838.353 ; 29,36%
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
Semana 25
Semana 26
Semana 27
Semana 28
Semana 29
Semana 30
Semana 31
Semana 32
Semana 33
Semana 34
Semana 35
Semana 36
Semana 37
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
2019
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
2020
Programación Acumulada
Programación Acumulada 2
Ejecución Acumulada

MEDINA & RIVERA INGENIEROS LTDA.

ACTA DE REUNION

CODIGO	FC-016 -01
VERSION No	03
FECHA	28/06/2018

CONTRATO No. 142 DE 2018

OBJETO CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.

FECHA 14/01/2020 **HORA DE INICIO** 9:00 A.M.

HORA DE FINALIZACION

OBJETIVO DE LA REUNION

Comité de seguimiento N°38 al Contrato de Obra N° 142 de 2018

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACION DE COMPROMISOS PACTADOS

- Presentacion Apu's : no se cumplio, se reprograma para el proximo 22-ene
- Verjon: Reunion tentativa, revisar si se puede excluir de ds.
- Pavimentacion 2001464: se reprograma el proximo 17-01-20
- Visita 2001775: Se cumplio
- Levantamiento actas vecindad: Se cumplio
- Entrega acta vecindad: Cumplio
- Entrega informe mensual: Se cumplio, pendiente observaciones
- Entrega propuesta desmuebles asfalto: 20-01-20
- reinicio a dudedes 2001580: Se cumplio.

ASUNTOS TRATADOS

- Balance general del contrato:
  - % acumulado programado: 66,63 %
  - % Atraso: 35,52 %
  - % acumulado ejecutado: 31,12 %
  - % Teorico a la fecha: 29,36 %

Los atrasos generados en el desarrollo del contrato en su mayor parte es debido a las actividades de renovacion de Tuberia, alta inversion, poco rendimiento

MEDINA & RIVERA	ACTA DE REUNION	CODIGO	FO-DS-01
		VERSION No	03
		FECHA	25/06/2015

la interventoría manifiesta que la respuesta a solicitud de prorroga del contratista esta basada en mejorar un sustento y sopote Tecnico donde se haga una trazabilidad en el tiempo y quede clara la evidencia del porque de los tiempos perdidos.

la entidad manifiesta que la solicitud de adicion del contrato no es viable debido al objeto contractual a monto agotable y por el estado de avance en el que se encuentra.
la entidad solicita a mas tardar proximo viernes 17 enero de respuesta ala solicitud de prorroga en donde se evidencie el alcance real del contrato.

El contratista de obra se compromete a radicar respuesta el dia de mañana 16 enero de 2020.

la entidad invita a tener en cuenta los factores que pueden llegar afectar al contrato en el tiempo restante incluida la prorroga, por lo tal motivo se debe evaluar el tiempo real que se requiere para terminar el contrato.

- CIU 2001466
Se manifiesta que el compromiso de finalizacion fue para el pasado 11 de enero de 2020, sin embargo, no se ha podido entregar ó finalizar este cliente, se encuentra a nivel de base granular, se tiene previsto instalacion de malla e GRC para el dia jueves 16 enero de 2020.

- CIU 2001580
Se reactivo la segunda fase el pasado 10 enero, se realizo excavaciones y demolicion carpeta asfaltica, se encuentra en correccion de fallos hallados.

- CIU 2000608
Se ha visto rendimientos muy bajos, se lleva la demolición de losas de concreto y retiro de material de (excavacion) demolicion.
Asochivo manifiesta que incursion del canal habil para trafico en momentos

de retiro de material de demolicion y excavacion.

- CIU 2001826
La entidad manifiesta comunicado por la entidad acerca de la finalizacion de este segmento.
Aceria del pozo sobre la cra 7, la entidad manifiesta que se debe construir y posteriormente se revisara el alcance de realizar el revestimiento del tramo pendiente por CIPP. Siendo el caso que no se realice el revestimiento, este tramo puntual la entidad emitira una salvedad para no solicitar recibo ni paz y salvo.

La entidad solicita que los imposes presentados se desarrollen y se definan rapidamente, y la entidad EDLCH definira en ultima instancia cualquier discrepancia presentada.

- CIU 2001975
Se encuentra a nivel de demolicion de cupeta asfaltica, no se ha iniciado excavaciones por reforcaudacia con fallas mecanicas. se debe definir el trazado de la red de alcantarillado Ver bolsa

Vejon:
Se debera programar una socializacion donde se le indique que no es viable realizar la intervencion por media calzada y si en dado caso la comunidad se opone a la intervencion no se ejecutara obra en en la vereda vejon.

La entidad solicita para efectos de prorroga tener en cuenta las lluvias que se presentaran en los meses de abril y mayo. segun estadisticas del IDEAM

El contratista manifiesta que han habido contratiempos a causa de las definiciones de la EAAB.

- 2002009
la entidad solicita tener programacion o visualizar cuando se realizara la construccion de pozo de inspeccion.
Asi como en todos los frentes que se tenga en claro que actividades se deben realizar en la semana.

2/4

MEDINA & RIVERA	ACTA DE REUNION	CODIGO	FC-GS-01
		VERSION No	03
		FECHA	29/06/2018

- La entidad solicita se haga llegar la programacion del PAC, teniendo en cuenta la solicitud de prorroga.

- La entida solicita para el civ 2000608 realizar una informacion a las rotas escolares que la via se encuentra cerrada y no queda habilitado para el paso de vehiculos pesados.

- Informe mensual:
la interventoria tiene plazo de entrega para el dia de mañana 16 enero
El contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones realizadas por la interventoria, se entregara el dia de mañana 16 enero.

- Paquete señalizacion
El contratista continua con la gestion y diseño, por tanto no ha podido dar cumplimiento, se prorroga el compromiso para el proximo 27/01/2020.

- Acciones de movilidad
La entidad solicita anexar la intervencion del civ 2001715 el cual la intervencion obedece a un fresado del segmento.

- La entidad solicita que se de un avance del presupuesto de las acciones de movilidad

- La entidad solicita la renovacion de redes de alcantarillado del civ 2001795 y notificara al acueducto de bogota.

- Se solicita por interventoria realizar una actualizacion del PMT debido a una incoherencia en los sentidos de la señalizacion para el civ 2001359.

Nota 1: En el civ 2001795, no se ha iniciado excavacion para cambio de redes, ya q' la EAAB no ha definido si la red va por el costado de la via como se encuentra actualmente ó por un costado, debido a q' del pozo donde llega esta red, salen 2 redes mas, las cuales solicitaron inspeccion CCTV por la cual remiten las imagenes q' al

realizar esta actividad adicional el frente se puede estar retrasando 2 semanas, por lo q' solicito definición y aclaración al respecto.

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA

ACTA DE REUNION

CODIGO	FC-DIS -01
VERSION No	03
FECHA	28/05/2018

COMPROMISOS	REPRESENTANTE DE	FECHA
Entrega documento viabilidad prórroga	CONYCON- INTERV.	17/01/2020.
Entrega solicitud prórroga	CONYCON	16/01/2020.
Entrega programación PAC	CONYCON - INTERV.	15/01/2020.
Gestión social en CIV 2000608	CONYCON	20/01/2020. → 25/01/20
Entrega Informe mensual impreso #10	CONYCON	16/01/2020.
Entrega Diseños Señalización	CONYCON	27/01/2020.
Entrega Diseños Espacio Público Impreso	CONYCON	24/01/2020
Reparación losas 2001721	CONYCON	03/02/2020.
Presentación APUs INP Faltantes	CONYCON	22/01/2020 → 24/02/2020
Revisión intervención segmentos viales	CONSORCIO H&A	22/01/2020
Instalación E.A. 2001469	CONYCON	17/01/2020. → 31/01/2020
Gestión social 2001469 - Informe predial.	CONYCON	15/01/2020.
Acta visita EAAB a 2001775 y 2001	INTERVENTORIA	16/01/2020.
Revisión intervención E.P 2001775 - Resp. Oficio	FDLCH	17/01/2020
Revisión actualización PMT 2001359	CONYCON	17/01/2020. →
Respuesta a Oficio incumplim. PMT 2001818	CONYCON	24/01/2020.


PARTICIPANTES	REPRESENTANTE DE	FIRMA
RICARDO OYUELA	FDCH	
Ricardo Cortés Acosta	FDCH	
JHOANA SALOMON	FDCH	
OLIVER BAEZ S.	FDLCH	
BAEZ J. PRADO S.	FDLCH	
CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO	INTERVENTORIA	
Diego Romero	Interventoria	
DIANA MARITZA PRADO	INTERVENTORIA	Diana M. Prado R.

PROXIMA REUNION	
FECHA	21/01/2020
LUGAR	FDLCH
HORA	10:00 A.M.

% Programado acumulado 66,63% Avance semanal: 0,44%

% Ejecutado acumulado 31,12%

% Atraso 35,52%

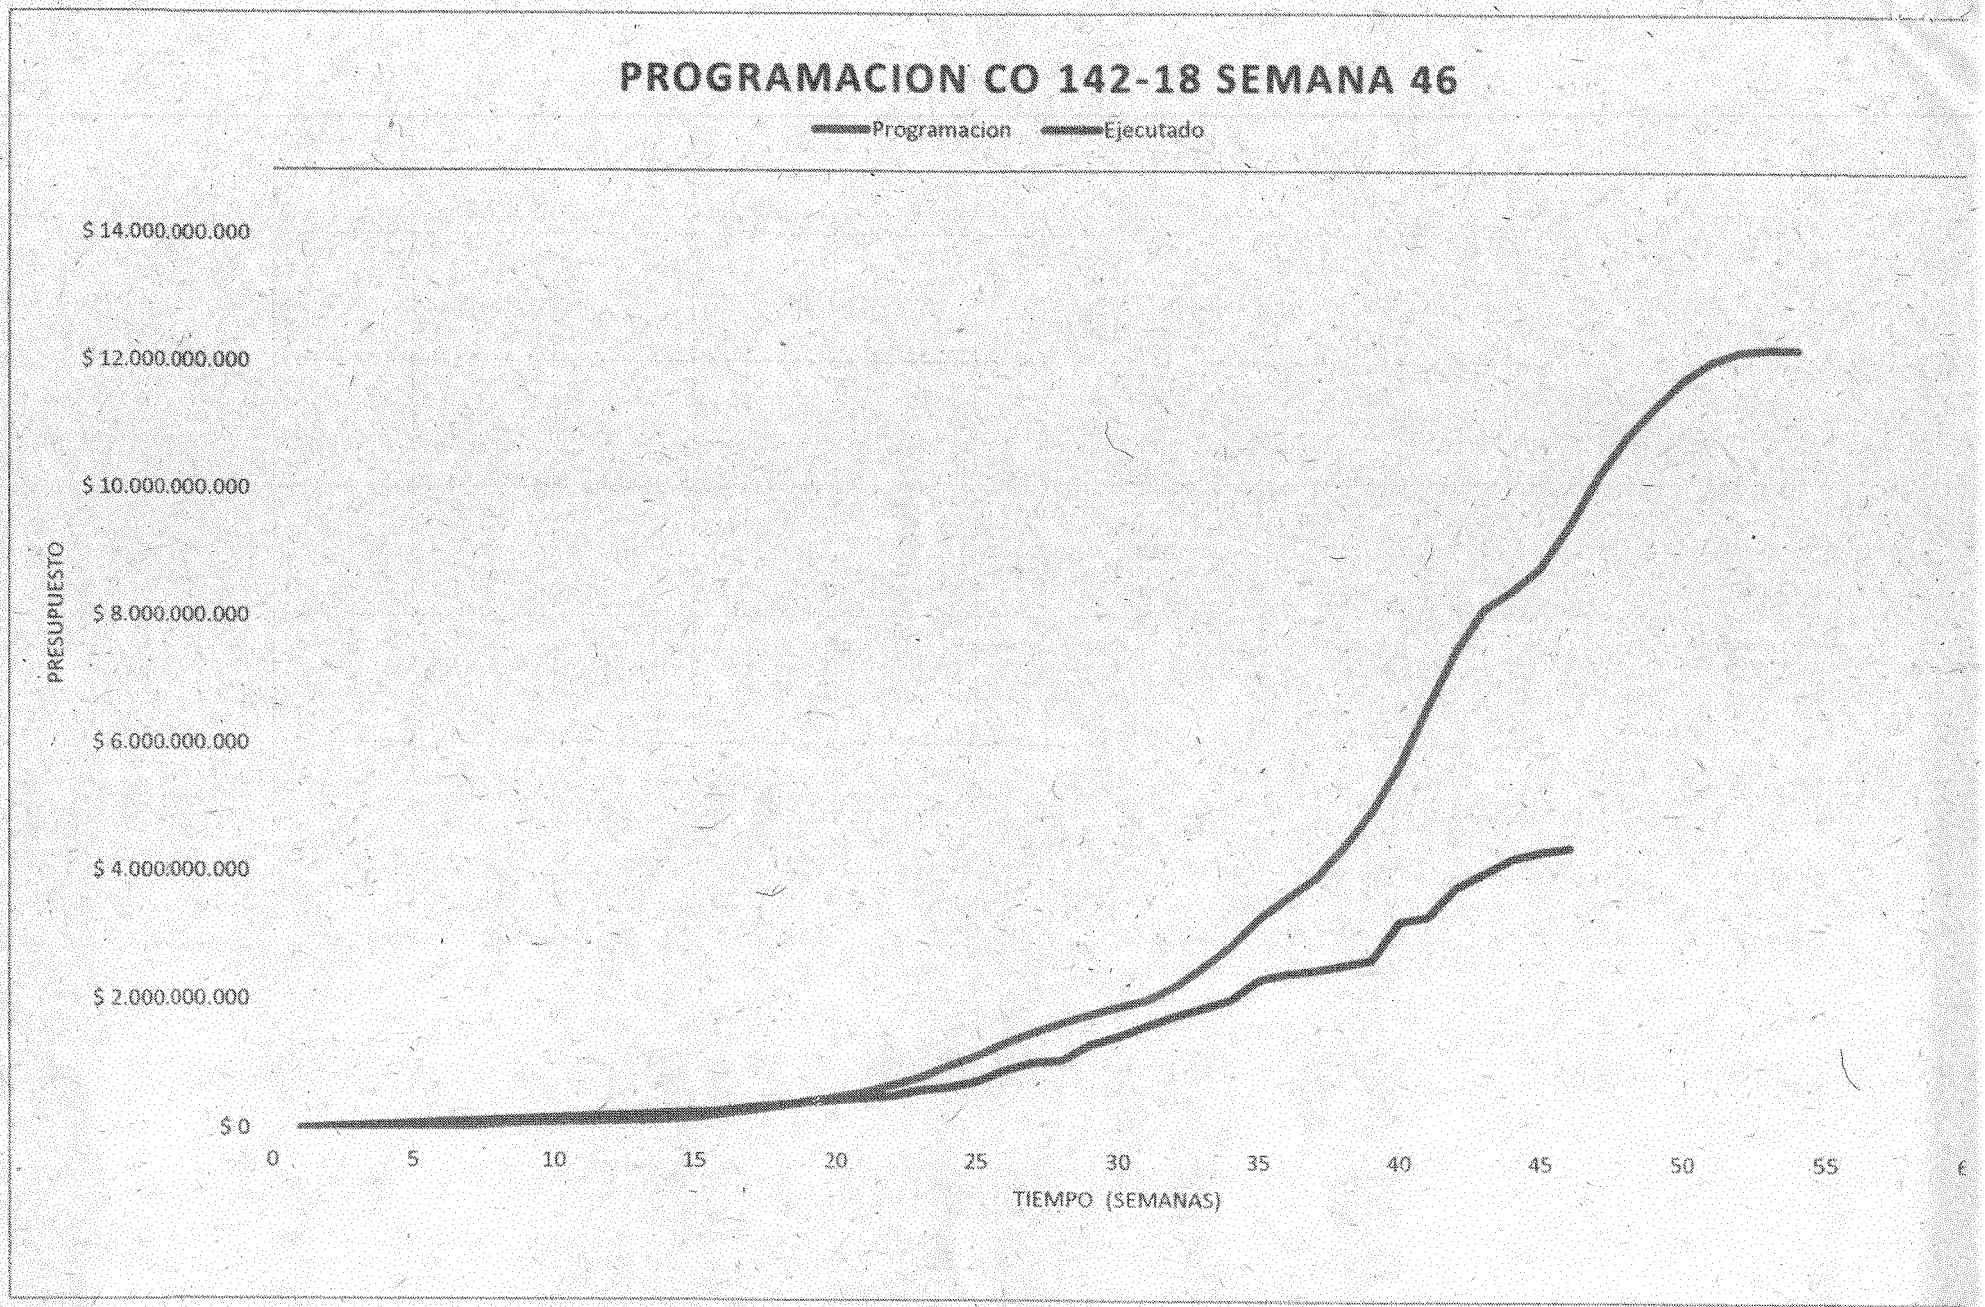

29.36% Cobro Financiero.

MEDINA & RIVERA

ACTA DE REUNION

CODIGO	FO-DIS -01
VERSION No	03
FECHA	28/06/2018

CONTRATO No. 142 DE 2018

OBJETO CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C.

FECHA 22/01/2020 **HORA DE INICIO** 11:00 A.M.

HORA DE FINALIZACION

OBJETIVO DE LA REUNION

Comité de seguimiento N°39 al Contrato de Obra N° 142 de 2018

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACION DE COMPROMISOS PACTADOS

- Entrega de actividad prorroga: Se cumplio, 16 enero
- Entrega PAC: Se cumplio, dia 17 enero
- Gestion social CU 2000608: No se cumplio
- Informe mensual 10 contratista: Se cumplio dia 20 enero, no se hacen observaciones. por tanto no esta aprobado por parte de interventoria.
- Diseños señalizacion: 27-01-20, Entrega diseños C.P: 24-01-20, Reparcheo: 3-02-20
- Presentacion APU DP.: No se cumplió, se reprograma para el proximo 24-01-20
- Revision segmentos viales: Se cumplio, el anexo tecnico manifiesta que no hay salvedades en la intervencion de segmentos viales para intervenirlos.
- Instalacion CA CU 2001469: Se cumplio. 16 enero se instala GRC. quedan Rendidos
- Gestion social CU 2001469: Se cumplio, informando que el 20 enero se habilitaba
- Acta Visita CAMS: Se cumplio
- Revision EP 2001795: Se va a realizar
- Actualizacion PMT 2001359: no se cumplio
- Rta PMT 2001818: 24-01-20.

ASUNTOS TRATADOS

- CU 2001469. la entidad solicita premura en la finalizacion de obra en este segmento, dado que no se ha cumplido las fechas antes cuales el contratista se habia comprometido.
Por tanto se solicita al 24/01/20 este finalizado para proceder con el tramite de prorroga, de lo contrario se iniciara proceso de incumplimiento
- CU 2001775
Se define en comite realizar la construccion de dos pozos para los ramales que salen del pozo adentrandonos al segmento con tal de garantizar la renovacion de red en PVC de todo

el segmento vial.
Se notifica que la entidad realizará la reserva al IDU para la intervención de su espacio público

- CW 2002009: Se define en comité en cuanto a la domiciliaria del edificio con 2 domiciliarias (azul y negras) dejar la caja existente sobre la vía y notificar al edificio sobre la situación para que hagan la corrección teniendo en cuenta la normatividad de la EAAB.

- Acta parcial de obra #7
Se realiza solicitud al contratista de obra comenzar con la realización del acta parcial # 7 con corte al 5 de febrero.

- Corrección Inf Tec 10
Se realizará revisión entre las partes para que se acaten las observaciones realizadas por la interventoría

- Se solicita a interventoría los certificados de calibración de la estación usada por Topografía, dado que los informes de topografía entregados contienen certificado vencido.

- Actualización Ensayos de materiales granulares
Se solicita la presentación periódica de caracterización de materiales teniendo en cuenta la periodicidad según el plan de calidad aprobado
De igual manera la presentación de ensayos de laboratorio a mezclas asfálticas

- Bioriga
la interventoría se encuentra en proceso de revisión de la solicitud y dará respuesta al finalizar la semana.

- Verjon
la entidad manifiesta que la intervención si se realizará por tanto deberá retomar las actividades de socialización del proyecto

Por tanto el contratista realizará citacion a la comunidad en la alcaldia para aclarar nuevamente la intervencion. la entidad citará reunion martes 28, 2:00pm

- Programacion de obra
  - % Programado acumulado: 72,17 %.
  - % Ejecutado acumulado: 32,61 %.
  - % Atraso: 39,55 %.
  - % Avance semanal: 1,48 %.

Se aclara que el avance es con la programacion inicial aprobada, una vez se realice la actualizacion de programacion se tomará en cuenta la reprogramacion.

El contratista manifiesta que los atrasos son motivados por los atrasos que dan lugar a la solicitud de prorroga

- CIU 200 0861


El contratista realiza entrega de oficio con analisis en la profundidad de la red existente de hasta 1,75 m por lo que no ve conveniente la renovacion de la red dado que la estructura es de 30cm.
lo cual la interventoria dara la sustentacion y respuesta a la entidad la cual definira que hacer con la red de alcant.

- CIU 200 1275

Se realizara visita y definicion del cerramo de proteccion de Tuberia dada su superficialidad con el apoyo de la supervision del Fondo.

2/3

MEDINA & RIVERA INGENIERIA TECNOLOGICA S.A.C.	ACTA DE REUNION	CODIGO	FC-DIS -01
		VERSION No	02
		FECHA	28/05/2018

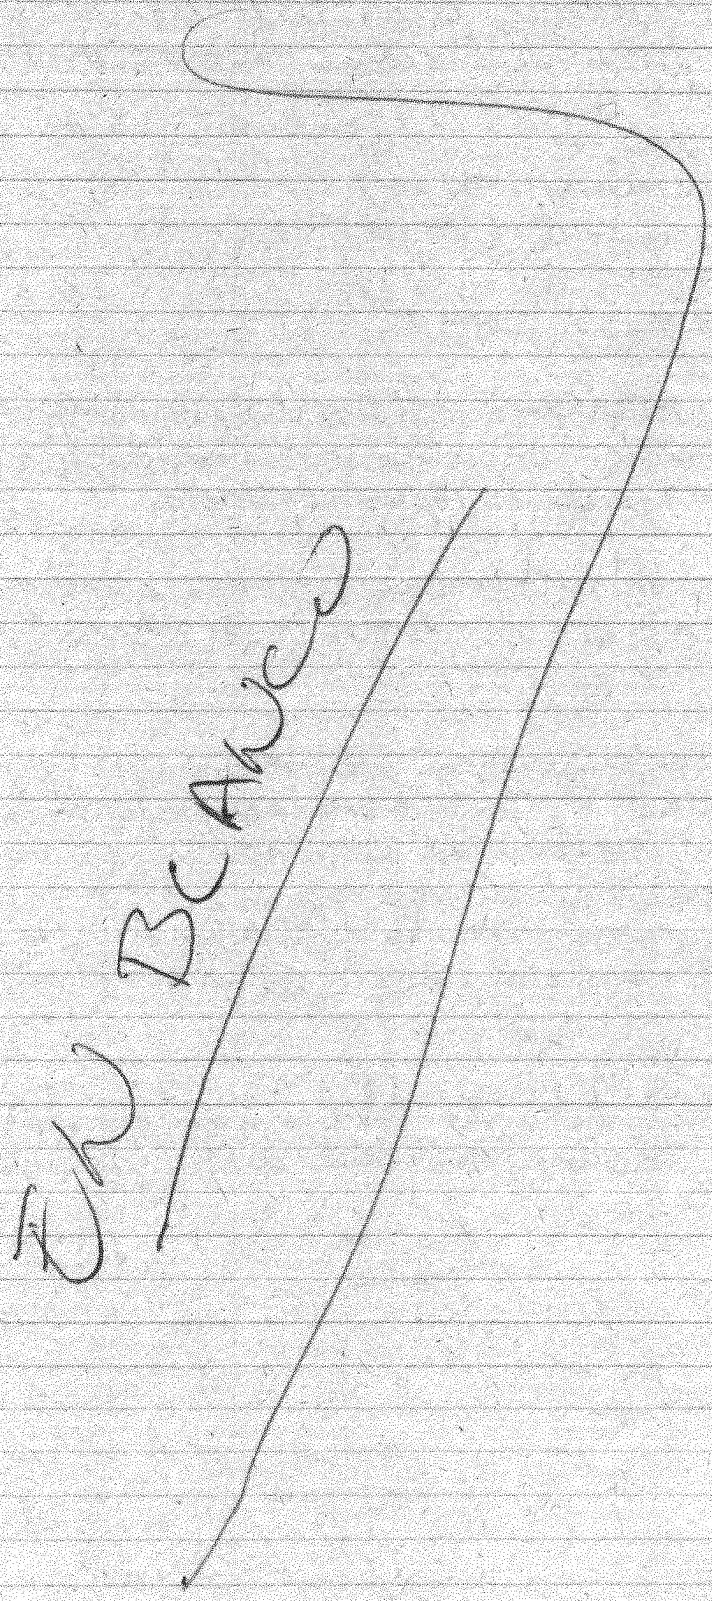

MEDINA & RIVERA

ACTA DE REUNION

CODIGO	FC-015-01
VERSION No	03
FECHA	28/08/2018

COMPROMISOS	REPRESENTANTE DE	FECHA
Concepto aval prórroga contrato	INTERVENT	24/01/2020 ✓
Gestión social CIV 2000608	CONYCON	25/01/2020. ✓
Revisión informe técnico #10	CONYCON - INTERV	22/01/2020. ✓
Entrega APU's INP Faltantes	CONYCON	24/01/2020. ✓
Reunión intervención CIV 2000913	TODAS LAS PARTES	23/01/2020 2p.m. ✓
Entrega CIV 2001469 - Terminación	CONYCON	27/01/2020. A Aprobados
Reunión con comunidad CIV 2001469	CONYCON	23/01/2020 a.m.
(Concepto trabajos hdcos 2002004	FDLCH)	N/A.) NA
Requerimiento a edificio 2002004	INTERV - FDLCH	27/01/2020.)
* Propuesta arreglo desniveles asfalto	CONYCON.	10/02/2020. → ¡OJO!
* Entrega certificados de calibración	CONYCON - INTER	31/01/2020 → ¡OJO!
Entrega caracterización granulares	CONYCON	22/01/2020. ✓
Actualización diseños mezclas asfalt.	CONYCON	31/01/2020. → 7/02/2020
Gestión social en El Vergel - Reunión FDLCH.	FDLCH (CONYCON)	28/01/2020 - 2pm → 30/01/2020 10:00 AM.
Concepto cambio alcant. 2000561	INTERVENTORÍA	24/01/2020.
Reparación - Losa 1741.		3/02/2020 (Iván)


PARTICIPANTES	REPRESENTANTE DE	FIRMA
Oscar Javier Pardo Sáenz	FDLCH	
DIIVER BAEZ	FDLCH	
[illegible]	CONYCON SAS	
Carlos Augusto Fonseca	CONYCON SAS	
ORLANDO RIVERA MORA	INTERVENTORIA	
DIANA MARITZA PRADO	INTERVENTORÍA	Diana M. Prado R
Diego Andres Romero V.	Interventoria	

PROXIMA REUNION	FECHA	29/01/2020
	LUGAR	FDLCH
	HORA	10:00 A.M.

- Programado Acumulado : 72,17%
- Ejecutado Acumulado : 32,61%

Atraso : 39,55%

Avance semanal 1,48%

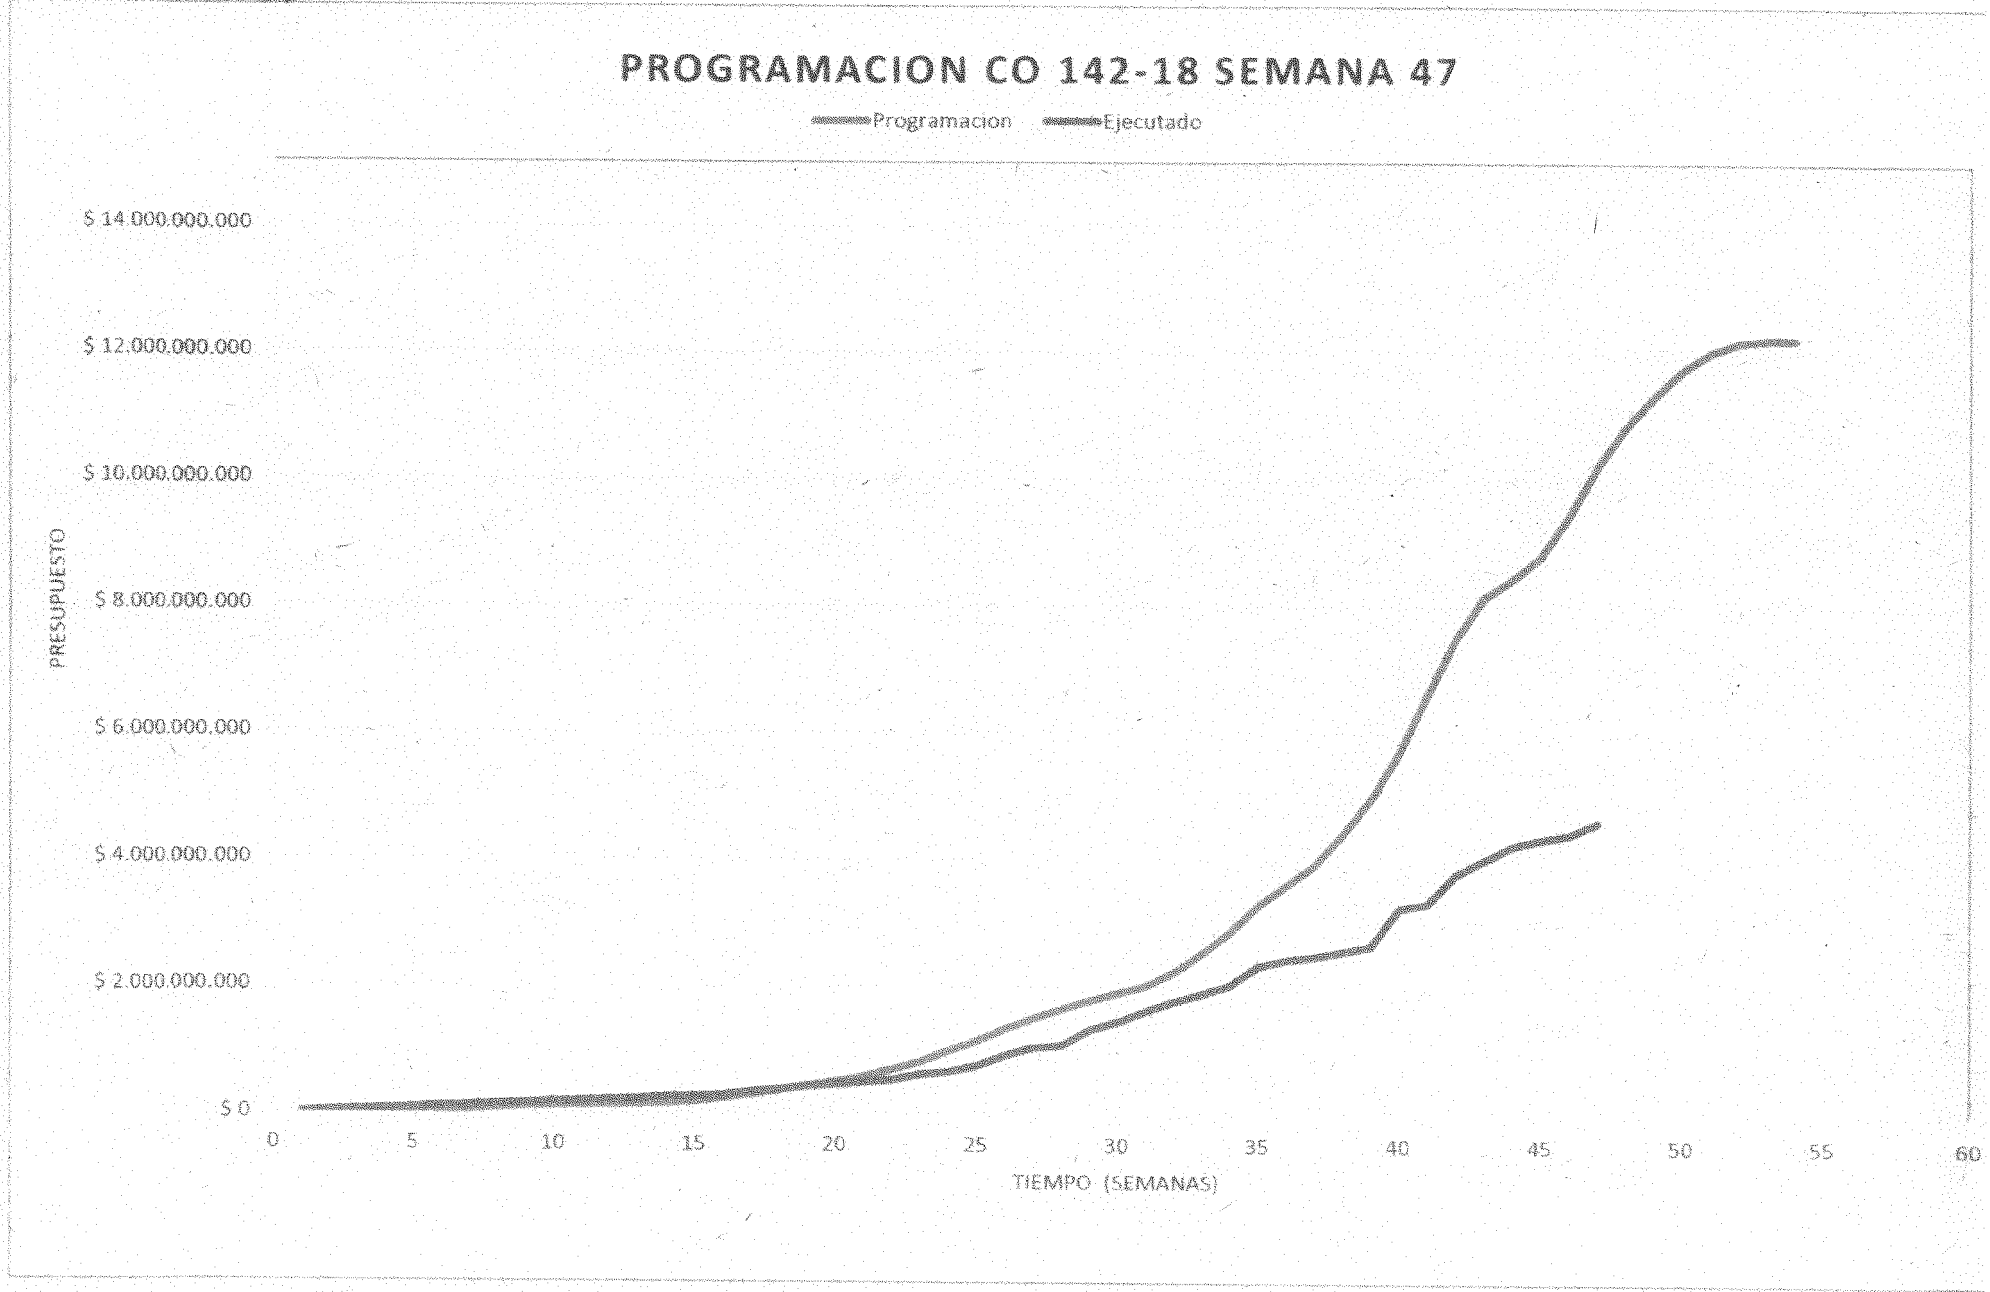

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

ACTA DE REUNION

CODIGO	FC-DIS-01
VERSION No	03
FECHA	28/08/2018

CONTRATO No. 142 DE 2018

OBJETO CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.

FECHA 15/01/2020 **HORA DE INICIO** 9.00 A.M.

HORA DE FINALIZACION

OBJETIVO DE LA REUNION

Definicion intervencion de redes de alcantarillado CIV 2001775

ASUNTOS TRATADOS

En el segmento vial CIV 2001775 ubicado en la calle 50A con Cra 13, se reune el contratista de obra con Scon y la interventoria Consorcio M&AOS, con la finalidad de definir una alternativa rapida y viable que cumpla con los requerimientos de la EAAB de renovar la red de alcantarillado existente la cual se encuentra en material de gres, a tuberia en PVC.

Teniendo en cuenta el trazado existente de la red de alcantarillado para este corredor vial, donde al adentrarnos al segmento por la Cra 50A existe un pozo de inspeccion del cual surgen dos (02) ramales en tuberia de gres de 6" y 8" que desembocan al colector de aguas residuales de 24" ubicado sobre la calle 51 como se pudo constatar mediante prueba de anilina realizada por el contratista de obra.

- Trazado Existente:

