Bogotá, 4 de marzo de 2026

Ingeniero
**ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**
**Interventor**
Ciudad.

**Referencia: Contrato 4023 de 2024.**

**Asunto: Solicitud de prórroga.**

Respetado ingeniero Quintana,

Cordial saludo.

En los archivos anexos a este oficio encuentra los registros de medición de precipitaciones que se han presentado durante los meses de enero y febrero de 2026 en la zona de influencia de ejecución del contrato de la referencia, registro publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Esta alta intensidad en el nivel de precipitaciones que se han presentado, ha hecho que los rendimientos de los trabajos para el mejoramiento de la vía Condagua – Yunguillo no hayan sido los esperados.

Por esta razón les solicitamos que el contrato se prorrogue hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2.026.

Atentamente,



_____
**JAIME EDUARDO GUTIÉRREZ OCAMPO**
**Representante legal**
**Consorcio Landa**

Anexos: lo anunciado.

CC. Dirección territorial Putumayo – Ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas.


IDEAM

# Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (27/01/2026 18:44)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | CONDAGUA [44010090] | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Pluviométrica |
| **Latitud:** | 1.2805 | **Longitud:** | -76.58419444 | **Elevación:** | 500 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGIA M | **Area Operativa:** | Area Operativa 07 - Nariño-P | **Departamento:** | Putumayo |
| **Municipio:** | Mocoa | **Fecha instalacíon:** | 15/04/1981 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/01/2026 00:00-27/01/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencio | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-01-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-02 00:00 | 6 | Preliminar |
| 2026-01-03 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-04 00:00 | 11 | Preliminar |
| 2026-01-05 00:00 | 17 | Preliminar |
| 2026-01-06 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-07 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-08 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-09 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-10 00:00 | 12 | Preliminar |
| 2026-01-11 00:00 | 3.1 | Preliminar |
| 2026-01-12 00:00 | 12 | Preliminar |
| 2026-01-13 00:00 | 5 | Preliminar |
| 2026-01-14 00:00 | 11 | Preliminar |
| 2026-01-15 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-16 00:00 | 33 | Preliminar |
| 2026-01-17 00:00 | 5 | Preliminar |
| 2026-01-18 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-19 00:00 | 67 | Preliminar |
| 2026-01-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-21 00:00 | 83 | Preliminar |
| 2026-01-22 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-23 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-24 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-01-25 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-26 00:00 | 2 | Preliminar |

| | |
|---|---|
| 1/01/2026 | 0 |
| 2/01/2026 | 6 |
| 3/01/2026 | 0 |
| 4/01/2026 | 11 |
| 5/01/2026 | 17 |
| 6/01/2026 | 0 |
| 7/01/2026 | 0 |
| 8/01/2026 | 0 |
| 9/01/2026 | 1 |
| 10/01/2026 | 12 |
| 11/01/2026 | 3,1 |
| 12/01/2026 | 12 |
| 13/01/2026 | 5 |
| 14/01/2026 | 11 |
| 15/01/2026 | 1 |
| 16/01/2026 | 33 |
| 17/01/2026 | 5 |
| 18/01/2026 | 1 |
| 19/01/2026 | 67 |
| 20/01/2026 | 0 |
| 21/01/2026 | 83 |
| 22/01/2026 | 0 |
| 23/01/2026 | 0 |
| 24/01/2026 | 3 |
| 25/01/2026 | 0 |
| 26/01/2026 | 2 |

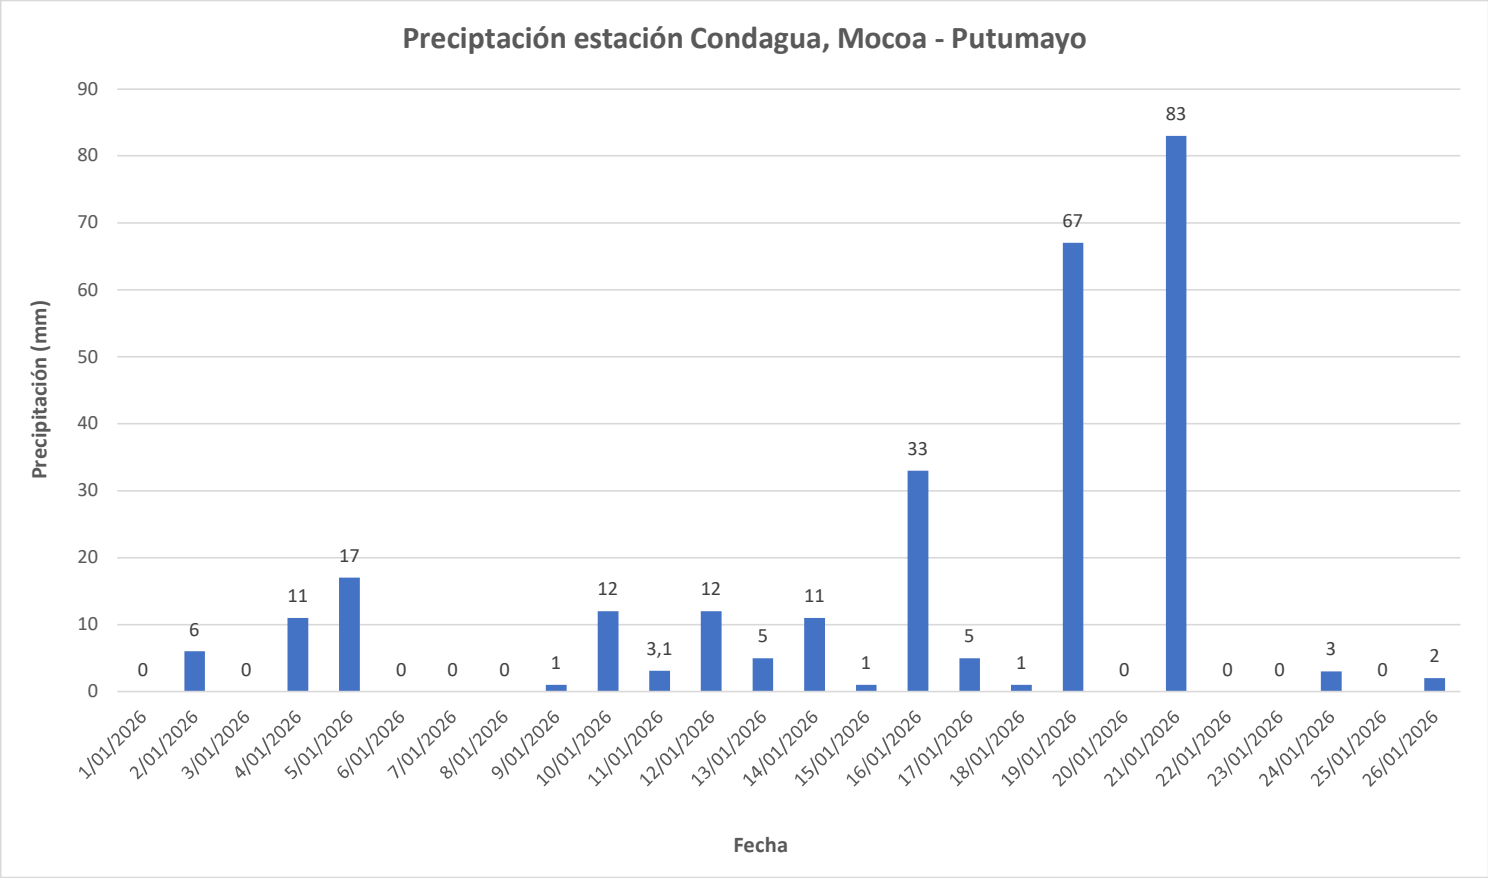


IDEAM

# Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/03/2026 06:28)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | CONDAGUA [44010090] | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Pluviométrica |
| **Latitud:** | 1.2805 | **Longitud:** | -76.58419444 | **Elevación:** | 500 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA M | **Area Operativa:** | Area Operativa 07 - Nariño-P | **Departamento:** | Putumayo |
| **Municipio:** | Mocoa | **Fecha instalacíon:** | 15/04/1981 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/02/2026 00:00-28/02/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencio | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-02-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-02 00:00 | 9 | Preliminar |
| 2026-02-03 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-04 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-05 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-06 00:00 | 43 | Preliminar |
| 2026-02-07 00:00 | 17 | Preliminar |
| 2026-02-08 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-09 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-10 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-11 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2026-02-12 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-13 00:00 | 14 | Preliminar |
| 2026-02-14 00:00 | 6 | Preliminar |
| 2026-02-15 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-02-16 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-17 00:00 | 40 | Preliminar |
| 2026-02-18 00:00 | 9 | Preliminar |
| 2026-02-19 00:00 | 5 | Preliminar |
| 2026-02-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-21 00:00 | 5 | Preliminar |
| 2026-02-22 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-02-23 00:00 | 38 | Preliminar |
| 2026-02-24 00:00 | 106 | Preliminar |
| 2026-02-25 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-26 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-27 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-28 00:00 | 0 | Preliminar |

| | |
|---|---|
| 1/02/2026 | 0 |
| 2/02/2026 | 9 |
| 3/02/2026 | 0 |
| 4/02/2026 | 0 |
| 5/02/2026 | 0 |
| 6/02/2026 | 43 |
| 7/02/2026 | 17 |
| 8/02/2026 | 0 |
| 9/02/2026 | 0 |
| 10/02/2026 | 0 |
| 11/02/2026 | 4 |
| 12/02/2026 | 0 |
| 13/02/2026 | 14 |
| 14/02/2026 | 6 |
| 15/02/2026 | 1 |
| 16/02/2026 | 0 |
| 17/02/2026 | 40 |
| 18/02/2026 | 9 |
| 19/02/2026 | 5 |
| 20/02/2026 | 0 |
| 21/02/2026 | 5 |
| 22/02/2026 | 2 |
| 23/02/2026 | 38 |
| 24/02/2026 | 106 |
| 25/02/2026 | 0 |
| 26/02/2026 | 0 |
| 27/02/2026 | 0 |
| 28/02/2026 | 0 |

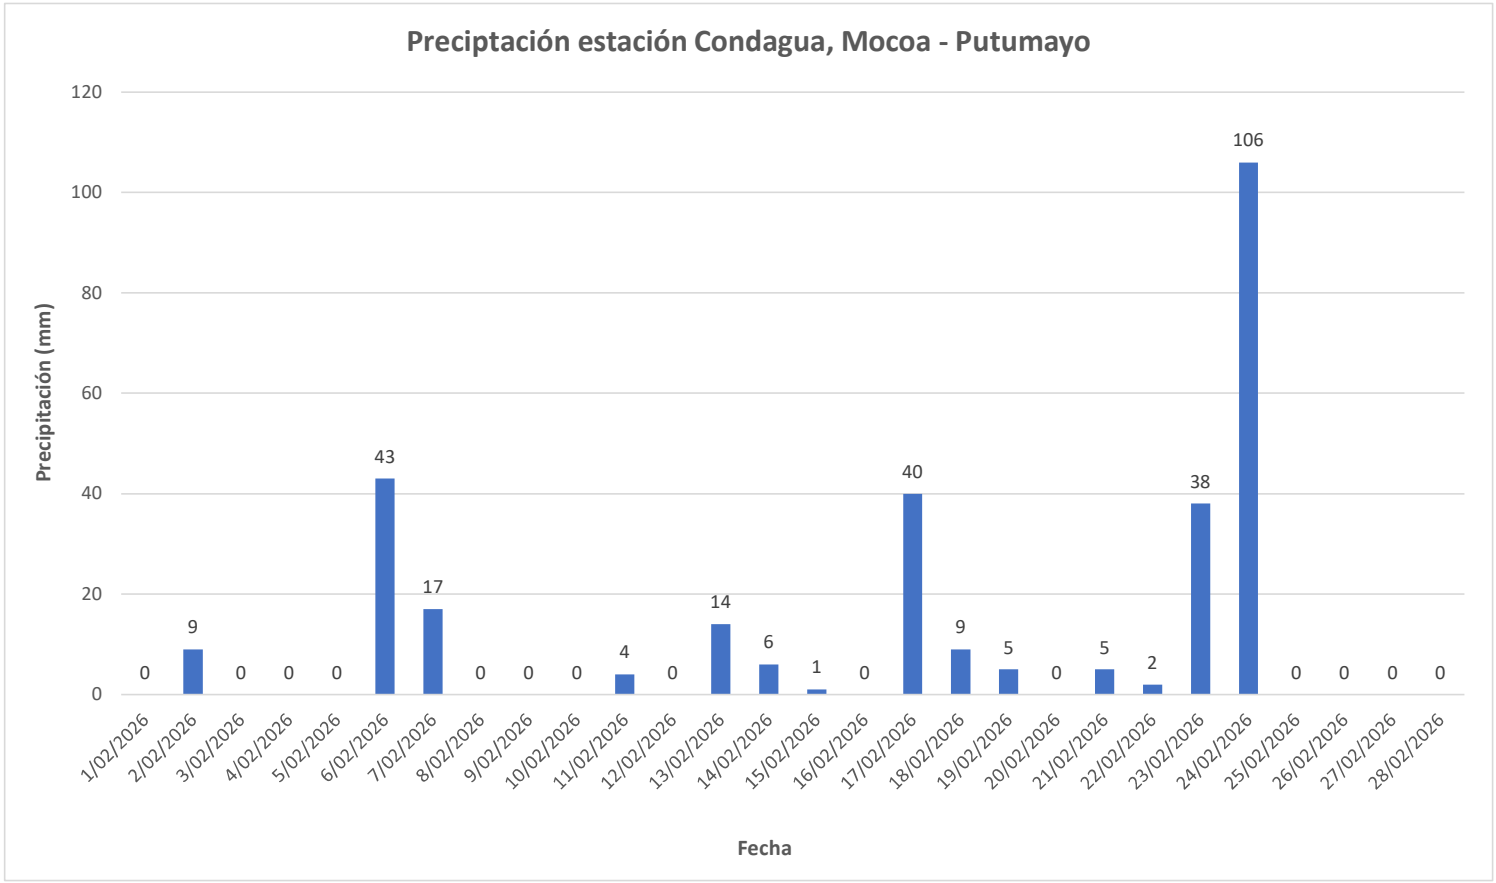

## OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

San Miguel de Agreda de Mocoa, Febrero 26 de 2026

**SOI -GRD – 202602 – 0128**
(Al contestar favor cite este número)

Ingeniero
**RICARDO BURBANO BARCENAS**
Director Invias Territorial Putumayo
Ciudad

Asunto; Solicitud de Apoyo problemática de riesgo en la via Condagua a Yunguillo del Municipio de Mocoa en el marco de la Situación de Calamidad Publica Municipal Decreto 091 de mayo 23 de 2025.

Cordial saludo;

Los **Alcaldes** como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio, y como conductor del desarrollo local, son los directos responsables *"de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción."*

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el Manejo de Desastres es "*el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación*." (Subraya fuera de texto original)

Que del mismo modo el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012, señala: "*la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres".*

Que la precitada norma dispone en el parágrafo 2º del artículo 1º que "*para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos*". Y en su artículo 3º prevé entre otros los siguientes Principios: "**11. *Principio sistémico:*** *"La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinacón de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.* ***12. Principio de coordinación:*** *La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.* ***13. Principio de concurrencia:*** *La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no*



infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

*jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.* ***14. Principio de subsidiariedad:*** *Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.*

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el Manejo de Desastres es *"el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación post-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación"*

De igual forma, la Ley 1523 de 2012 define la emergencia como: *"Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general."*

La autoridad del Resguardo Indígena de Yunguillo reporta que en la noche del 24 de febrero de 2026, entre las 11:00 p.m. y las 12:40 a.m. del 25 de febrero, se presentó un fenómeno natural de alta intensidad consistente en lluvias torrenciales acompañadas de fuertes tormentas, lo cual ocasionó más de ocho (8) derrumbes de gran magnitud sobre la vía terciaria que comunica el Resguardo de Condagua con el Resguardo de Yunguillo, dejándola completamente taponada e intransitable. Situación que mantiene incomunicadas a las comunidades impidiendo el transporte de productos de pan coger, el acceso a servicios de salud, educación, generando un riesgo inminente para la vida, la integridad y la seguridad alimentaria, tal como se muestra en la solicitud de la comunidad.

el Municipio de Mocoa tiene vigente la declaratoria de calamidad pública Municipal para lo cual expidió los decretos 091 de mayo 21 de 2025 y 0223 de Noviembre 18 de 2025 por el cual prorroga la situación de calamidad, asi mismo y dentro del Plan de Acción Especifico ( PAE ) se encuentra incluida la línea:

1.Vias
1.3.Rehabilitacion de puntos Críticos en la via Condagua a Yunguillo

Las nuevas afectaciones causadas por la ola invernal y la magnitud de las mismas que dejan incomunicadas a las comunidades indígenas, requieren de la intervención inmediata con maquinaria para la limpieza de derrumbes como una medida temporal, pero también se requiere de una evaluación de daños y estudios para conocer la solución definitiva a la problemática de riesgo, lo cual se requiere en el término de la distancia.

Teniendo en cuenta que se desborda las capacidades técnicas y financieras del Municipio, y en aras de rehabilitar la única via de acceso entre las comunidades de Yunguillo y Condagua, recurrimos ante su despacho para solicitar el apoyo con:



infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

## OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

1. Maquinaria amarilla para limpieza de derrumbes, desalojo de material y conformación de banca
2. Profesionales idóneos para realizar la visita de verificación, evaluación de daños y necesidades.

La presente solicitud se ampara en los principios de precaución, subsidiariedad y concurrencia de que trata la ley 1523 de 2012.

Anexos: Decreto 091 de Mayo 21 de 2015, Decreto 0223 de 2025 PAE modificado, solicitud de la comunidad de yunguillo.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

**AYLEEN MILENA JACANAMEJOY JAJOY**
Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal

Elaboro: Yasmid Adriana Arcos, P.U.Soigrd



infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
*Ingeniero Civil*
*Especialista en Ingeniería de Vías Terrestres*
*Especialista en geotecnia vial*
*TP 17202225398 CLD*

Mocoa, 25 de Febrero de 2026

CI-4070-2024-OF-052

Señores:
**INVIAS**
**Territorial Putumayo**
**ing José Ricardo Burbano Bárcenas**
**Director Territorial**
Barrio los Angeles
Mocoa

SEÑOR
**JAIME EDUARDO GUTIÉRREZ OCAMPO**
Representante legal
Consorcio Landa
Contratista de obra
pdicumbre@gmail.com

**REFERENCIA:** contrato de interventoría N°4070 de 2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT PUT

**ASUNTO:** Situación del corredor vial Condagua-Yunguillo Municipio de Mocoa.

El Instituto nacional de vías INVIAS, viene desarrollando el contrato de obra No. 4023 DEL 30/09/2024, cuyo objeto es ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEINVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO, y para la supervisión contrato la interventoría N°4070 de 2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT PUT, los contratos tiene acta de inicio el 10 de octubre de 2024 y en este momento se encuentra vigente y con fecha de finalización el día 07 de Marzo de 2026.

En el desarrollo de los contratos anteriormente descritos, se viene atendiendo necesidades (mejoramiento de la vía con material de adición, remoción de derrumbes, excavación de material) en el corredor vial Condagua -Yunguillo del Municipio de Mocoa Putumayo catalogado como vía terciaria a cargo del Instituto nacional de vías INVIAS.

Sin embargo, en el día 24 febrero de 2026 horas de la noche y 25 febrero de 2026 horas de la madrugada, se presentaron fuertes lluvias que han afectado el paso vehicular del corredor vial Condagua -Yunguillo del Municipio de Mocoa Putumayo, el día 25 de febrero de 2026, se hace un recorrido del tramo en donde se identificaron los siguientes puntos




1. **Descripción:** K2+400 derrumbe, material lodo, cierre total de la vía




2. **Descripción:** K2+400 derrumbe, material rocoso con lodo, vegetación, cierre total de la vía




3. **Descripción:** K8+200 derrumbe, material rocoso con lodo, vegetación, cierre total de la vía




4. **Descripción:** caída de poste de electrificación de la empresa de EEP, cierre total de la vía




5. **Descripción:** k08+000 Desprendimiento de roca, material de lodo y vegetación, cierre total de la vía




6. **Descripción:** caída de vegetación, cierre total de la vía




7. **Descripción:** K03+500 desbordamiento de la quebrada la cuscunga




8. **Descripción:** k03+800 Desprendimiento de roca, material de lodo y vegetación, cierre total de la vía




9. **Descripción:** k06+800 Desprendimiento de material de lodo y vegetación, cierre parcial de la vía




10. **Descripción:** k06+900 Desprendimiento de vegetación, cierre parcial de la vía




11. **Descripción:** k13+805 Socavación de vía, cierre total de la vía

Adicional a los once puntos anteriores, en otros puntos del corredor vial, se tiene derrumbes menores, desprendimiento de material vegetal, desplazamiento de material crudo de rio sobre la vía existente, taponamiento de alcantarillas existentes.

Dado lo anterior y la situación actual del corredor vial, las actividades autorizadas por la interventoría son **211,1** remoción de derrumbes y **900.3** Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 m y **600.2.3** excavaciones varias en material común en seco (exclusivo para recuperación de alcantarillas y descoles de cuentas)

ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
*Ingeniero Civil*
*Especialista en Ingeniería de Vías Terrestres*
*Especialista en geotecnia vial*
*TP 17202225398 CLD*

Por último, la interventoría se continua con la evaluación de afectación del corredor vial Condagua-Yunguillo, Municipio de Mocoa, por lo cual considera que la via estara cerrada por el termino no menor a 8 dias, tenien en cuenta las condiciones climaticas a favor, de lo contrario se prorrogaran las actividades para la hablitacion del corredor vial

Atentamente,

**ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**
C.C. 1061.686.538
