CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

CCF-005-2026

Santa Marta, febrero 25 de 2026

Señores:
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
La Ciudad

Referencia: Contrato No. 006 de 2023 – Construcción de Colectores de Alcantarillado Sanitario en la carrera 1era entre calle 29B hasta EBAR Norte en la ciudad de Santa Marta.

ASUNTO: Entrega de Cuenta Acta Parcial N° 16 con sus respectivos soportes.

Respetados Señores:

Por medio de la presente hacemos entrega de la cuenta de Acta Parcial N° 16 con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

Ingeniero Carlos Arrieta Peñaloza
Consorcio Colectores FGP

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERIVICIOS	
A. INFORMACION GENERAL	
Periodo de informe:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
Contrato N°	LP-006-2023
Contratante:	ALCADÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
Nit. Contratante:	891,780,009 - 4
Nombre del Contratista:	CONSORCIO COLECTORES FGP
Nit. Contratista:	901.708.201-2
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
N° de identificación:	92.545.351
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE LA CALLE 29B HASTA EL EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.
Interventoría:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS
Valor del Inicial Contrato:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($24.490.616.158.33)
Acuerdo Modificatorio N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
Supervisor:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Valor Acta:	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 747.653.820,35)
N° CDP:	949 DE 4 ABRIL DE 2025
N° CRP:	2446 DE 21 JULIO DE 2025
Plazo Inicial	HASTA 31 DICIEMBRE 2023
Fecha De Acta De Suspensión No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (15 días de Suspensión)

Fecha De Prórroga 1 Al Acta De Suspensión No. 1	12 DE ENERO DE 2024 (27 días de Suspensión)
Fecha Acta De Reinicio No. 1	FEBRERO 9 DE 2024
Fecha De Acta De Suspensión No. 2	23 DE JULIO DE 2024 (33 días de Suspensión)
Fecha De Prórroga 1 Al Acta De Suspensión No. 2	24 DE AGOSTO DE 2024 (31 días de Suspensión)
Fecha Acta De Reinicio No. 2	SEPTIEMBRE 25 DE 2024
Fecha Prorroga No. 1	OCTUBRE 1 DE 2024 (3 Meses)
Fecha De Suspensión N° 3:	DICIEMBRE 17 DE 2024
Fecha De Ampliacion De Suspensión N° 3:	ENERO 16 DE 2025
Fecha De Ampliacion N° 2 De Suspensión N° 3:	FEBRERO 7 DE 2025
Fecha De Reinicio N° 3:	FEBRERO 21 DE 2025
Fecha Prorroga N° 2:	FEBRERO 24 DE 2025 (3 Meses)
Fecha Prorroga N° 3:	ABRIL 15 DE 2025 (6 Meses + 24 días)
Fecha De Suspensión N° 4:	JUNIO 4 DE 2025
Fecha De Reinicio N° 4:	JUNIO 24 DE 2025
Fecha Prorroga N° 4:	DCIIEMBRE 30 DE 2025 (7 Meses)
Nuevo Plazo De Entrega:	JULIO 31 DE 2026
Resolución De Aprobación Póliza:	219 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2023
Resolución De Aprobación Póliza:	022 DE 12 DE ABRIL DE 2024
Resolución De Aprobación Póliza:	111 DE 15 DE OCTUBRE DE 2024
Resolución De Aprobación Póliza:	030 DE 4 DE MARZO DE 2025
Resolución De Aprobación Póliza:	070 DE 25 DE ABRIL DE 2025
Resolución De Aprobación Póliza:	133 DE 8 DE JULIO DE 2025
Resolución De Aprobación Póliza:	010 DE 27 DE ENERO DE 2026
N° Pago:	16
N° de planilla de pago de Seguridad social:	CERTIFICADO DE PARAFISCALES
Nombre y cargo del supervisor del contrato:	LUIS FELIPE GUTIÉRREZ CASTILLO – Gerente de Infraestructura

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1	Localización, Trazado y Replanteo.
2	Soporte para Cinta Demarcadora.
3	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.
4	Valla móvil - Tipo 4.
5	Maletines o barreras plásticas con medidas de 2 metros de largo, 1 metro de alto, base de 50 cm

6	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m.
7	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m.
8	Demolición de Andén e > 0,075m.
9	Desmonte de Adoquines, Almacenaje y Limpieza.
10	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
11	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
12	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
13	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.
14	Manejo de Aguas Freáticas.
15	Manejo de Aguas Residuales.
16	Entibado Metálico Continuo.
17	Cimentación de Tubería con Material Granular.
18	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.
20	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42".
21	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 2,00 m, Profundidad 4,50m < H ≤ 6,00m.
24	Acero de Refuerzo de 60.000PSI
25	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400
26	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI).
27	Tubería de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21.
28	Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.
29	Instalación de Válvula de Guillotina en HD, Ø=24" (600mm). E.B. x E.B.
30	Construcción de Caja de Inspección en Concreto para Ventosa, 2.5m x 2.5m, Profundidad 1,60m < H ≤ 3,00m.

C. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las actividades establecidas en el contrato.
2. Que los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, serán descontados por la Secretaria de Hacienda Distrital.
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debida y legalmente pagados por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

D. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR			
	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**SI**	**NO**
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	Autorizo que los impuestos que se deban cancelar como contratista para la legalización del mencionado contrato, me sean descontados del valor a cancelar en la presente cuenta de cobro.	X	
3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar	X	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento	X	
5.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el DECIMOSEXTO pago del contrato **LP-006-2023**, por la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL OCHENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($ 889.101.080,15).**

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta el 24 de Febrero del año 2026.

CARLOS ARRIETA PEÑALOZA NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CC 92.545.351 **FIRMA DE QUIEN DECLARA:**	Firma del Contratista
LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO **Gerente de Infraestructura** **Supervisor del Contrato**	*Firma del Supervisor*

Este Formato no podrá ser alterado o modificado sin previa autorización de la Oficina de Sistemas Integrados de Gestión.

CONSORCIO COLECTORES FGP

NIT : 901,708,201 - 2
CALLE 77 N 59 35
BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
3013497069
UNIONESYCONSORCIO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 32

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-24	15:48:27
Expedición	2026-02-24	15:49:45
Vencimiento	2026-03-24	

Cliente	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		
NIT	891,780,009 - 4	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CALLE 14 N 2 - 49	**Teléfono**	4282777
Ciudad	SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	HACIENDA@SANTAMARTA.GOV.CO		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950100	ACTA PARCIAL DE OBRA N°16 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 006-2023 CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRETA PRIMERA ENTTRE LA CALLE 29 HASTA EL EBAR NORTE DE LA CUIDAD DE SANTA MARTA. COMPONENTE OBRA CIVIL COSTO DIRECTO		0.00	0.00	621,055,771.89
2	4130950200	ADMINISTRACION (23%)		0.00	0.00	142,842,827.53
3	4130950300	IMPREVISTOS (2%)		0.00	0.00	12,421,115.44
4	4130950400	UTILIDAD (5%)		0.00	0.00	31,052,788.59
5	4130950100	COMPONENTE SUMINISTROO COSTO DIRECTO		0.00	0.00	69,704,543.03
6	4130950200	ADMINISTRACION SUMINISTRO (17.25%)		0.00	0.00	12,024,033.67

Total Items 6

Total Bruto	889,101,080.15
Total a Pagar	**$ 889.101.080,15**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 32 Vence el 2026-03-24	889.101.080,15

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Nueve Millones Ciento Un Mil Ochenta Pesos M/Cte Con 15/100

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102817623 **aprobado en** 2025-12-10 **hasta el** 2026-12-10, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 29 **al** 500

CUFE :42b940dc5ac1785832c39996b252271185571c9f93587f6fa4568ffd16439c552e6268bf8781468d0ebde143a15d1492

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102817623

(415)7707212489984(8020) 001876410281762 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 0 8 2 0 1	2				

11. Razón social
CONSORCIO COLECTORES FGP

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla — Cód. 2

24. Dirección
CL 77 59 35 OF 912 A

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Barranquilla

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-10 / 06:45:16 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ARRIETA PEÑALOZA CARLOS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 92545351 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO COLECTORES FGP

997. Fecha formalización 2025-12-10/06:45:16

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102817623

(415)7707212489984(8020) 001876410281762 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 0 8 2 0 1	2				

11. Razón social

CONSORCIO COLECTORES FGP

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO COLECTORES FGP CL 77 59 35 OF 912 A	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	29	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 10 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1.1 COLECTOR CENTRO HISTÓRICO														
1	**PRELIMINARES**														
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	ML	1.335,83	$ 3.850,00	$ 5.142.945,50	2.450,23	$ 9.433.385,50	368,32	$ 1.418.032,00	18,50	$ 71.225,00	386,82	$ 1.489.257,00	2.063,41	$ 7.944.128,50
Subtotal					**$ 5.142.945,50**		**$ 9.433.385,50**		**$ 1.418.032,00**		**$ 71.225,00**		**$ 1.489.257,00**		**$ 7.944.128,50**
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**														
2.1	Soporte para Cinta Demarcadora	UN	594,00	$ 24.729,00	$ 14.689.026,00	1.675,00	$ 41.421.075,00	714,00	$ 17.656.506,00	18,00	$ 445.122,00	732,00	$ 18.101.628,00	943,00	$ 23.319.447,00
2.2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte	ML	2.671,66	$ 942,00	$ 2.516.703,72	6.055,46	$ 5.704.243,32	1.508,30	$ 1.420.818,60	37,00	$ 34.854,00	1.545,30	$ 1.455.672,60	4.510,16	$ 4.248.570,72
2.3	Valla móvil - Tipo 4	UN	6,00	$ 250.396,00	$ 1.502.376,00	76,00	$ 19.030.096,00	56,00	$ 14.022.176,00	4,00	$ 1.001.584,00	60,00	$ 15.023.760,00	16,00	$ 4.006.336,00
INP-051	Suministro e Instalacion de Cerramento en Lona Verde, Altura 2,1 mts	ML		$ 57.057,00		1.211,50	$ 69.124.555,50	510,40	$ 29.121.892,80	41,31	$ 2.357.024,67	551,71	$ 31.478.917,47	659,79	$ 37.645.638,03
INP-052	Suministro e Instalacion de Flascher Vial Luminoso Incluye Soporte Tubular de Base	UN		$ 310.219,00		119,00	$ 36.916.061,00	67,00	$ 20.784.673,00		$ -	67,00	$ 20.784.673,00	52,00	$ 16.131.388,00
INP-053	Suministro e Instalacion de Cerramento en Lamina de Zinc, Altura 2,4 mts	ML		$ 154.531,00		135,50	$ 20.938.950,50	113,10	$ 17.477.456,10		$ -	113,10	$ 17.477.456,10	22,40	$ 3.461.494,40
INP-054	Maletines o barreras plasticas con medidas de 2 metros de largo, 1 metro de alto, base de 50 cm	UN		$ 814.495,00		32,00	$ 26.063.840,00	20,00	$ 16.289.900,00	4,00	$ 3.257.980,00	24,00	$ 19.547.880,00	8,00	$ 6.515.960,00
Subtotal					**$ 18.708.105,72**		**$ 219.198.821,32**		**$ 116.773.422,50**		**$ 7.096.564,67**		**$ 123.869.987,17**		**$ 95.328.834,15**
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**														
3.1	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	210,00	$ 8.926,00	$ 1.874.460,00	258,00	$ 2.302.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	258,00	$ 2.302.908,00
3.2	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	363,24	$ 11.319,00	$ 4.111.513,56	2.342,64	$ 26.516.342,16	738,58	$ 8.359.987,02		$ -	738,58	$ 8.359.987,02	1.604,06	$ 18.156.355,14
3.3	Demolición de Concreto Simple	M3	66,00	$ 161.754,00	$ 10.675.764,00	251,20	$ 40.632.604,80	199,24	$ 32.227.866,96		$ -	199,24	$ 32.227.866,96	51,96	$ 8.404.737,84
3.4	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m	M2	9.751,56	$ 35.709,00	$ 348.218.420,33	7.964,63	$ 284.409.079,80	890,27	$ 31.790.651,43		$ -	890,27	$ 31.790.651,43	7.074,36	$ 252.618.428,37
3.5	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m	ML	2.779,89	$ 5.715,00	$ 15.887.043,94	1.882,24	$ 10.756.974,19	879,01	$ 5.023.542,15		$ -	879,01	$ 5.023.542,15	1.003,23	$ 5.733.432,04
3.6	Demolición de Andén e > 0,075m	M2	2.671,66	$ 10.427,00	$ 27.857.398,82	2.265,25	$ 23.619.761,75	1.286,68	$ 13.416.212,36		$ -	1.286,68	$ 13.416.212,36	978,57	$ 10.203.549,39
3.7	Desmonte de Adoquines, Almacenaje y Limpieza	M2	282,30	$ 7.156,00	$ 2.020.703,40	817,80	$ 5.853.812,40	129,12	$ 924.240,96		$ -	129,12	$ 924.240,96	688,68	$ 4.929.571,44
3.8	Desmonte de Tubería de Acueducto y Alcantarillado a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro	ML	950,00	$ 6.152,00	$ 5.844.400,00	968,67	$ 5.959.257,84	112,65	$ 693.022,80		$ -	112,65	$ 693.022,80	856,02	$ 5.266.235,04
INP-055	Demolicion de pavimento en concreto rigido reforzado de espesor 0,40 mts	M2		$ 84.474,00		3.500,00	$ 295.659.000,00	3.466,10	$ 292.795.331,40		$ -	3.466,10	$ 292.795.331,40	33,90	$ 2.863.668,60
Subtotal					**$ 416.489.704,05**		**$ 695.709.740,93**		**$ 385.230.855,08**		**$ -**		**$ 385.230.855,08**		**$ 310.478.885,85**
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**														
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad	M3	4.700,72	$ 64.682,00	$ 304.051.971,04	5.995,87	$ 387.824.631,72	1.941,01	$ 125.548.408,62	137,22	$ 8.875.664,04	2.078,23	$ 134.424.072,66	3.917,64	$ 253.400.558,86
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad	M3	3.133,81	$ 25.749,00	$ 80.692.473,69	13.333,47	$ 343.323.519,03	6.683,85	$ 172.102.453,65	2.011,77	$ 51.801.065,73	8.695,62	$ 223.903.519,38	4.637,85	$ 119.419.999,65

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	870,50	$ 80.053,00	$ 69.686.136,50	1.921,59	$ 153.829.044,27	1.336,89	$ 107.022.055,17	543,84	$ 43.536.023,52	1.880,73	$ 150.558.078,69	40,86	$ 3.270.965,58
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	8.020,92	$ 43.059,00	$ 345.372.794,28	25.154,10	$ 1.083.110.471,37	12.586,17	$ 541.947.894,03	2.692,83	$ 115.950.566,97	15.279,00	$ 657.898.461,00	9.875,10	$ 425.212.010,37
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	1.335,83	$ 38.364,00	$ 51.247.782,12	5.670,98	$ 217.561.476,72	4.362,78	$ 167.373.691,92	573,50	$ 22.001.754,00	4.936,28	$ 189.375.445,92	734,70	$ 28.186.030,80
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	1.335,83	$ 211.505,00	$ 282.534.724,15	6.232,49	$ 1.318.202.797,45	4.924,29	$ 1.041.511.956,45	573,50	$ 121.298.117,50	5.497,79	$ 1.162.810.073,95	734,70	$ 155.392.723,50
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	4.983,41	$ 66.631,00	$ 332.049.591,71	12.842,83	$ 855.730.605,73	8.755,91	$ 583.415.039,21	488,40	$ 32.542.580,40	9.244,31	$ 615.957.619,61	3.598,52	$ 239.772.986,12
Subtotal					**$ 1.465.635.473,49**		**$ 4.359.582.546,29**		**$ 2.738.921.499,25**		**$ 396.005.772,16**		**$ 3.134.927.271,41**		**$ 1.224.655.274,88**
5	**LLENOS**														
5.1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	1.296,13	$ 228.563,00	$ 296.247.361,19	3.826,53	$ 874.602.071,49	1.406,78	$ 321.537.857,14	81,33	$ 18.589.028,79	1.488,11	$ 340.126.885,93	2.338,42	$ 534.475.185,56
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera. Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	2.048,92	$ 94.916,00	$ 194.475.290,72	17.880,41	$ 1.697.136.793,37	7.343,58	$ 697.023.066,43	2.647,09	$ 251.251.194,44	9.990,67	$ 948.274.262,87	7.889,74	$ 748.862.530,50
5.3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio. Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	3.571,72	$ 41.472,00	$ 148.126.371,84	2.035,69	$ 84.424.101,04	-	$ -		$ -	-	$ -	2.035,69	$ 84.424.101,04
5.4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS)	M3	1.950,31	$ 149.399,00	$ 291.374.632,61	2.938,92	$ 439.071.201,12	1.080,60	$ 161.440.559,40		$ -	1.080,60	$ 161.440.559,40	1.858,32	$ 277.630.641,72
Subtotal					**$ 930.223.656,36**		**$ 3.095.234.167,02**		**$ 1.180.001.484,97**		**$ 269.840.223,23**		**$ 1.449.841.708,20**		**$ 1.645.392.458,82**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**														
6.1	Instalación de Tubería de PVC-U 10" PSI 200 RDE 21.	ML	900,00	$ 24.920,00	$ 22.428.000,00	900,00	$ 22.428.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	900,00	$ 22.428.000,00
6.2	Instalación de Accesorios de PVC-U 10" PSI 200 RDE 21.	UN	9,00	$ 64.408,00	$ 579.672,00	9,00	$ 579.672,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 579.672,00
6.3	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=6" E.L, J.R o G.T.	UN	2,00	$ 67.707,00	$ 135.414,00	2,00	$ 135.414,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 135.414,00
6.4	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica. Vástago No Ascendente, Ø=10" E.L, J.R o G.T.	UN	6,00	$ 78.899,00	$ 473.394,00	6,00	$ 473.394,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 473.394,00
6.5	Instalación de Accesorios HD 6". Extremos Bridados.	UN	6,00	$ 141.389,00	$ 848.334,00	6,00	$ 848.334,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 848.334,00
6.6	Instalación de Accesorios HD 8". Extremos Bridados.	UN	20,00	$ 148.276,00	$ 2.965.520,00	20,00	$ 2.965.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.965.520,00
6.7	Instalación de Accesorios HD 10". Extremos Bridados.	UN	33,00	$ 159.038,00	$ 5.248.254,00	33,00	$ 5.248.254,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 5.248.254,00
6.8	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	89,01	$ 18.104,00	$ 1.611.437,04	167,57	$ 3.033.687,28	-	$ -		$ -	-	$ -	167,57	$ 3.033.687,28
6.9	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm).	ML	13,69	$ 23.574,00	$ 322.728,06	48,69	$ 1.147.816,06	-	$ -		$ -	-	$ -	48,69	$ 1.147.816,06
6.10	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm).	ML	8,89	$ 39.041,00	$ 347.074,49	8,89	$ 347.074,49	-	$ -		$ -	-	$ -	8,89	$ 347.074,49
6.11	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm).	ML	22,92	$ 44.402,00	$ 1.017.693,84	22,92	$ 1.017.693,84	-	$ -		$ -	-	$ -	22,92	$ 1.017.693,84

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.12	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 18" (450mm)	ML	12,28	$ 50.809,00	$ 623.934,52	12,28	$ 623.934,52	-	$ -		$ -	-	$ -	12,28	$ 623.934,52
6.13	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 20" (500mm)	ML	48,80	$ 57.537,00	$ 2.807.805,60	54,80	$ 3.153.027,60	-	$ -		$ -	-	$ -	54,80	$ 3.153.027,60
6.14	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24"	ML	51,59	$ 68.347,00	$ 3.526.021,73	51,59	$ 3.526.021,73	-	$ -		$ -	-	$ -	51,59	$ 3.526.021,73
6.15	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 27"	ML	53,64	$ 82.181,00	$ 4.408.188,84	53,64	$ 4.408.188,84	45,00	$ 3.698.145,00		$ -	45,00	$ 3.698.145,00	8,64	$ 710.043,84
6.16	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 33"	ML	753,98	$ 104.740,00	$ 78.971.865,20	792,98	$ 83.056.725,20	53,74	$ 5.628.727,60		$ -	53,74	$ 5.628.727,60	739,24	$ 77.427.997,60
6.17	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42"	ML	215,53	$ 131.383,00	$ 28.316.977,99	286,08	$ 37.586.048,64	267,58	$ 35.155.463,14	18,50	$ 2.430.585,50	286,08	$ 37.586.048,64	-	$ -
Subtotal					$ 154.632.315,31		$ 170.578.808,20		$ 44.482.335,74		$ 2.430.585,50		$ 46.912.921,24		$ 123.665.886,96
7	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS														
7.1	Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor	UN	22,00	$ 391.874,00	$ 8.621.228,00	44,00	$ 17.242.456,00	-	$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 17.242.456,00
Subtotal					$ 8.621.228,00		$ 17.242.456,00		$ -		$ -		$ -		$ 17.242.456,00
8	OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO														
8.1	Reconstrucción de pavimento en concreto e > 0.20, MR=4.1MPa	M2	9.751,56	$ 219.513,00	$ 2.140.593.970,77	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2	Reconstrucción de andén en concreto e > 0.07, f'c = 21MPa	M2	2.671,66	$ 93.372,00	$ 249.458.237,52	2.092,56	$ 195.386.512,32	1.113,99	$ 104.015.474,28		$ -	1.113,99	$ 104.015.474,28	978,57	$ 91.371.038,04
8.3	Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0.20 mts, f'c = 21 MPa	ML	2.779,89	$ 85.263,00	$ 237.021.352,07	1.612,34	$ 137.473.333,78	609,11	$ 51.934.545,93		$ -	609,11	$ 51.934.545,93	1.003,23	$ 85.538.787,85
8.4	Reconstrucción de estructura en adoquín de 0,08 x 0,10 x 0,20 m en concreto	M2	282,30	$ 164.997,00	$ 46.578.653,10	707,30	$ 116.702.378,10	18,81	$ 3.103.593,57		$ -	18,81	$ 3.103.593,57	688,49	$ 113.598.784,53
8.5	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1.00m < H ≤ 1.45m.	UN	2,00	$ 4.756.890,00	$ 9.513.780,00	2,00	$ 9.513.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 9.513.780,00
8.6	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1.80m < H ≤ 3.00m	UN	10,00	$ 5.843.633,00	$ 58.436.330,00	10,00	$ 58.436.330,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 58.436.330,00
8.7	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,50 m, Profundidad 1.80m < H ≤ 3.00m	UN	1,00	$ 8.492.139,00	$ 8.492.139,00	1,00	$ 8.492.139,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.492.139,00
8.8	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,80 m, Profundidad 1.80m < H ≤ 3.00m	UN	12,00	$ 9.359.234,00	$ 112.310.808,00	12,00	$ 112.310.808,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 112.310.808,00
8.9	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,80 m, Profundidad 3.00m < H ≤ 4,50m	UN	5,00	$ 11.181.591,00	$ 55.907.955,00	5,00	$ 55.907.955,00	4,00	$ 44.726.364,00		$ -	4,00	$ 44.726.364,00	1,00	$ 11.181.591,00
8.10	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 2,00 m, Profundidad 3.00m < H ≤ 4,50m.	UN	3,00	$ 13.649.676,00	$ 40.949.028,00	3,00	$ 40.949.028,00	3,00	$ 40.949.028,00		$ -	3,00	$ 40.949.028,00	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.11	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto. Diámetro Interno del Cilindro 2.00 m, Profundidad 4.50m < H ≤ 6.00m.	UN	1,00	$ 15.901.738,00	$ 15.901.738,00	3,00	$ 47.705.214,00	1,00	$ 15.901.738,00	1,00	$ 15.901.738,00	2,00	$ 31.803.476,00	1,00	$ 15.901.738,00
8.12	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 5.0m x 2.5m, Profundidad 3.50m.	UN	2,00	$ 37.846.226,00	$ 75.692.452,00	2,00	$ 75.692.452,00	2,00	$ 75.692.452,00		$ -	2,00	$ 75.692.452,00	-	$ -
8.13	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 7.0m x 3.0m, Profundidad 2.50m.	UN	1,00	$ 64.090.034,00	$ 64.090.034,00	1,00	$ 64.090.034,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 64.090.034,00
8.14	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 1.2m x 1.2m, Profundidad 1.00m < H < 2.00m.	UN	10,00	$ 13.656.027,00	$ 136.560.270,00	10,00	$ 136.560.270,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 136.560.270,00
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR:45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		7.029,97	$ 2.648.441.685,35	545,27	$ 205.422.893,25		$ -	545,27	$ 205.422.893,25	6.484,70	$ 2.443.018.802,11
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		42.921,80	$ 457.044.202,94	26.244,97	$ 279.464.314,05	937,34	$ 9.981.077,52	27.182,31	$ 289.445.391,57	15.739,49	$ 167.598.811,37
INP-033	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR:45 kg/cm2 E=0.25 mts Acelerado a 7 dias (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 482.276,60		3.886,46	$ 1.874.348.040,09	3.777,19	$ 1.821.650.350,75		$ -	3.777,19	$ 1.821.650.350,75	109,27	$ 52.697.689,34
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T.2400	M2		$ 20.710,30		15.006,50	$ 310.789.116,95	8.385,27	$ 173.661.457,28	308,24	$ 6.383.742,87	8.693,51	$ 180.045.200,15	6.312,99	$ 130.743.916,80
INP-036	Instalación de Tubería de PVC-U 8" PSI 200 RDE 21	ML		$ 22.608,30		120,00	$ 2.712.996,00	-	$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 2.712.996,00
INP-037	Construccion de Sumidero para Rejilla de Captación de 0.75 m x 6.25 m con 1.56 < H < 2.20 m	UN		$ 10.544.545,70		5,00	$ 52.722.728,50	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 52.722.728,50
INP-038	Suministro e instalación de Rejilla metalica de Captación de 0.5 m x 1 m para trafico pesado	UN		$ 3.099.883,60		25,00	$ 77.497.095,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 77.497.095,00
Subtotal					**$ 3.251.506.747,46**		**$ 6.482.776.109,03**		**$ 2.816.522.211,11**		**$ 32.266.558,39**		**$ 2.848.788.769,51**		**$ 3.633.987.339,52**
9	**OTRAS ACTIVIDADES**														
9.1	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24.5 Mpa (3500PSI)	M3	21,45	$ 1.044.033,00	$ 22.394.507,85	98,04	$ 102.356.995,32	48,16	$ 50.280.629,28	6,66	$ 6.953.259,78	54,82	$ 57.233.889,06	43,22	$ 45.123.106,26
9.2	Bajante de Operación para Válvulas, Incluye: Tapa Válvula, Tuberia Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza	UN	3,00	$ 427.516,00	$ 1.282.548,00	3,00	$ 1.282.548,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.282.548,00
9.3	Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente.	UN	20,00	$ 197.885,00	$ 3.957.700,00	28,00	$ 5.540.780,00	10,00	$ 1.978.850,00		$ -	10,00	$ 1.978.850,00	18,00	$ 3.561.930,00
9.4	Empalme de Colector a Estación de Bombeo de Aguas Residuales.	UN	1,00	$ 499.702,00	$ 499.702,00	1,00	$ 499.702,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 499.702,00
INP-041	Levantamiento Georeferenciado Para Indentificacion de Redes Existentes, con la metodologia BAMI-I (Buried Asset Management Institute International) y ASCE 38-02 (American Society Of Civil Engineers), con una cobertura de 5 mts de profundidad	M2		$ 25.902,50		7.510,00	$ 194.527.775,00	7.510,00	$ 194.527.775,00		$ -	7.510,00	$ 194.527.775,00	-	$ -
Subtotal					**$ 28.134.457,85**		**$ 304.207.800,32**		**$ 246.787.254,28**		**$ 6.953.259,78**		**$ 253.740.514,06**		**$ 50.467.286,26**

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	**CRUCES MECÁNICOS**														
10.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	363,09	$ 64.682,00	$ 23.485.387,38	353,99	$ 22.896.781,18	353,99	$ 22.896.781,18		$ -	353,99	$ 22.896.781,18	-	$ -
10.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	267,13	$ 94.916,00	$ 25.354.911,08	265,98	$ 25.245.757,68	265,98	$ 25.245.757,68		$ -	265,98	$ 25.245.757,68	-	$ -
10.3	Concreto fluido f'c= 17,5 Mpa (Grouting) para inyección de contacto	M3	10,80	$ 818.546,00	$ 8.840.296,80	10,80	$ 8.840.296,80	10,80	$ 8.840.296,80		$ -	10,80	$ 8.840.296,80	-	$ -
10.4	Pilotes, Zapatas o Placas de fondo en Concreto para Estructuras, f'c = 24 Mpa (3500 PSI)	M3	9,00	$ 921.502,00	$ 8.293.518,00	9,00	$ 8.293.518,00	9,00	$ 8.293.518,00		$ -	9,00	$ 8.293.518,00	-	$ -
10.5	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación (Incluye: Tubería SCH 40 (Camisa de Ø= 36" para alojar tubo de 27")	ML	45,00	$ 396.791,00	$ 17.855.595,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 83.829.708,26**		**$ 65.276.353,66**		**$ 65.276.353,66**		**$ -**		**$ 65.276.353,66**		**$ -**
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 6.362.924.341,99**		**$ 15.419.240.188,28**		**$ 7.595.413.446,59**		**$ 714.664.186,73**		**$ 8.310.077.637,33**		**$ 7.109.162.550,95**
	SUMINISTROS														
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	90,00	$ 96.010,00	$ 8.640.900,00	130,00	$ 12.481.300,00	90,00	$ 8.640.900,00		$ -	90,00	$ 8.640.900,00	40,00	$ 3.840.400,00
2	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm)	m	14,00	$ 138.153,00	$ 1.934.142,00	49,00	$ 6.769.497,00	14,00	$ 1.934.142,00		$ -	14,00	$ 1.934.142,00	35,00	$ 4.835.355,00
3	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm)	m	9,00	$ 207.041,00	$ 1.863.369,00	9,00	$ 1.863.369,00	9,00	$ 1.863.369,00		$ -	9,00	$ 1.863.369,00	-	$ -
4	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm)	m	23,00	$ 253.233,00	$ 5.824.359,00	23,00	$ 5.824.359,00	23,00	$ 5.824.359,00		$ -	23,00	$ 5.824.359,00	-	$ -
5	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 18" (450mm)	m	13,00	$ 327.052,00	$ 4.251.676,00	13,00	$ 4.251.676,00	13,00	$ 4.251.676,00		$ -	13,00	$ 4.251.676,00	-	$ -
6	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 20" (500mm)	m	48,80	$ 456.382,00	$ 22.271.441,60	54,80	$ 25.009.733,60	48,80	$ 22.271.441,60		$ -	48,80	$ 22.271.441,60	6,00	$ 2.738.292,00
7	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24"	m	52,00	$ 584.267,00	$ 30.381.884,00	52,00	$ 30.381.884,00	52,00	$ 30.381.884,00		$ -	52,00	$ 30.381.884,00	-	$ -
8	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 27"	m	54,00	$ 699.588,00	$ 37.777.752,00	54,00	$ 37.777.752,00	54,00	$ 37.777.752,00		$ -	54,00	$ 37.777.752,00	-	$ -
9	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 33"	m	754,00	$ 1.161.632,00	$ 875.870.528,00	794,94	$ 923.427.742,08	794,94	$ 923.427.742,08		$ -	794,94	$ 923.427.742,08	-	$ -
10	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42"	m	216,00	$ 2.545.290,00	$ 549.782.640,00	286,08	$ 728.156.563,20	267,58	$ 681.068.698,20	18,50	$ 47.087.865,00	286,08	$ 728.156.563,20	-	$ -
11	Tubería PVC-U Ø=10" RDE 21 PSI 200	m	900,00	$ 317.079,00	$ 285.371.100,00	900,00	$ 285.371.100,00	900,00	$ 285.371.100,00		$ -	900,00	$ 285.371.100,00	-	$ -
12	Tee HD Ø=10" BxB PN10 RDE 21	un	6,00	$ 1.553.058,00	$ 9.318.348,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13	Tee Reducida HD Ø=10" x 6" BxB PN10 RDE 21	un	1,00	$ 1.553.058,00	$ 1.553.058,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14	Tee HD Ø=8" BxB PN10 RDE 21	un	5,00	$ 968.424,00	$ 4.842.120,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=10" E.B. PN10	un	20,00	$ 1.428.883,00	$ 28.577.660,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=8" E.B. PN10	un	15,00	$ 1.140.886,00	$ 17.113.290,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=6" E.B. PN10	un	6,00	$ 924.085,00	$ 5.544.510,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
18	Reducción HD Ø=10" x 6" BxB PN10	un	1,00	$ 550.278,00	$ 550.278,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	Reducción HD Ø=10" x 8" BxB PN10	un	5,00	$ 698.042,00	$ 3.490.210,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20	Codo PVC 45° 10" gran radio RDE 21	un	2,00	$ 308.129,00	$ 616.258,00	2,00	$ 616.258,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 616.258,00
21	Codo PVC 22,5° 10" gran radio RDE 21	un	3,00	$ 196.689,00	$ 590.067,00	3,00	$ 590.067,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 590.067,00
22	Codo PVC 11,25° 10" gran radio RDE 21	un	4,00	$ 157.243,00	$ 628.972,00	4,00	$ 628.972,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 628.972,00
23	Válvula de compuerta Ø=10" BxB PN10	un	6,00	$ 4.106.179,00	$ 24.637.074,00	6,00	$ 24.637.074,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 24.637.074,00
24	Válvula de compuerta Ø=6" BxB PN10	un	2,00	$ 3.403.971,00	$ 6.807.942,00	2,00	$ 6.807.942,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.807.942,00
25	Collar de Derivación PVC-U 6" x 1/2"	un	22,00	$ 32.348,00	$ 711.656,00	22,00	$ 711.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 711.656,00
INP-003	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Tee Ø=10" BxB PN10 RDE 21	UN		$ 5.183.121,84		6,00	$ 31.098.731,06	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 31.098.731,06
INP-004	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Tee Reducida Ø=10" x 6" BxB PN10 RDE 21	UN		$ 5.183.121,84		1,00	$ 5.183.121,84	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.183.121,84
INP-005	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Tee Ø=8" BxB PN10 RDE 21	UN		$ 2.527.007,18		5,00	$ 12.635.035,88	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 12.635.035,88
INP-006	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida por Acople Universal Ø=10" E.B. PN10	UN		$ 1.798.020,54		20,00	$ 35.960.410,85	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 35.960.410,85
INP-007	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida por Acople Universal Ø=8" E.B. PN10	UN		$ 1.502.588,06		15,00	$ 22.538.820,94	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 22.538.820,94
INP-008	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida por Acople Universal Ø=6" E.B. PN10	UN		$ 1.230.090,86		6,00	$ 7.380.545,13	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 7.380.545,13
INP-009	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Reducción Ø=10" x 6" BxB PN10	UN		$ 2.155.440,75		1,00	$ 2.155.440,75	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.155.440,75
INP-010	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Reducción Ø=10" x 8" BxB PN10	UN		$ 2.199.391,92		5,00	$ 10.996.959,58	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 10.996.959,58
INP-035	Tubería PVC-U Ø=8" RDE 21 PSI 200	ML		$ 241.357,95		120,00	$ 28.962.954,30	-	$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 28.962.954,30
Subtotal					**$ 1.928.951.234,60**		**$ 2.252.218.965,20**		**$ 2.002.813.063,88**		**$ 47.087.865,00**		**$ 2.049.900.928,88**		**$ 202.318.036,32**

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1.2 IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO														
1.1	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	1.100,00	$ 3.850,00	$ 4.235.000,00	1.183,50	$ 4.556.475,00	433,99	$ 1.670.861,50	20,30	$ 78.155,00	454,29	$ 1.749.016,50	729,21	$ 2.807.458,50
Subtotal					**$ 4.235.000,00**		**$ 4.556.475,00**		**$ 1.670.861,50**		**$ 78.155,00**		**$ 1.749.016,50**		**$ 2.807.458,50**
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**														
2.1	Soporte para Cinta Demarcadora	UN	489,00	$ 24.729,00	$ 12.092.481,00	924,00	$ 22.849.596,00	504,00	$ 12.463.416,00	26,00	$ 642.954,00	530,00	$ 13.106.370,00	394,00	$ 9.743.226,00
2.2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte	ML	2.200,00	$ 942,00	$ 2.072.400,00	2.485,50	$ 2.341.341,00	867,98	$ 817.637,16	40,60	$ 38.245,20	908,58	$ 855.882,36	1.576,92	$ 1.485.458,64
2.3	Valla móvil - Tipo 4	UN	6,00	$ 250.396,00	$ 1.502.376,00	18,00	$ 4.507.128,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18,00	$ 4.507.128,00
Subtotal					**$ 15.667.257,00**		**$ 29.698.065,00**		**$ 13.281.053,16**		**$ 681.199,20**		**$ 13.962.252,36**		**$ 15.735.812,64**
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**														
3.1	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	128,00	$ 8.926,00	$ 1.142.528,00	128,00	$ 1.142.528,00	-	$ -		$ -	-	$ -	128,00	$ 1.142.528,00
3.2	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	464,00	$ 11.319,00	$ 5.252.016,00	464,00	$ 5.252.016,00	196,90	$ 2.228.711,10		$ -	196,90	$ 2.228.711,10	267,10	$ 3.023.304,90
3.3	Demolición de Concreto Simple	M3	19,20	$ 161.754,00	$ 3.105.676,80	19,20	$ 3.105.676,80	-	$ -		$ -	-	$ -	19,20	$ 3.105.676,80
3.4	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m	M2	1.360,28	$ 35.709,00	$ 48.574.129,63	139,58	$ 4.984.153,33	-	$ -		$ -	-	$ -	139,58	$ 4.984.153,33
3.5	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m	ML	307,00	$ 5.715,00	$ 1.754.505,00	307,00	$ 1.754.505,00	98,45	$ 562.641,75		$ -	98,45	$ 562.641,75	208,55	$ 1.191.863,25
3.6	Demolición de Andén e > 0,075m	M2	66,00	$ 10.427,00	$ 688.182,00	387,20	$ 4.037.334,40	159,39	$ 1.661.959,53		$ -	159,39	$ 1.661.959,53	227,81	$ 2.375.374,87
3.8	Desmonte de Tubería de Acueducto y Alcantarillado a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro.	ML	200,00	$ 6.152,00	$ 1.230.400,00	525,00	$ 3.229.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	525,00	$ 3.229.800,00
Subtotal					**$ 61.747.437,43**		**$ 23.506.013,53**		**$ 4.453.312,38**		**$ -**		**$ 4.453.312,38**		**$ 19.052.701,15**
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**														
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad	M3	2.941,14	$ 64.682,00	$ 190.238.817,48	2.867,44	$ 185.471.754,08	771,67	$ 49.913.158,94	28,72	$ 1.857.667,04	800,39	$ 51.770.825,98	2.067,05	$ 133.700.928,10
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad	M3	1.960,76	$ 25.749,00	$ 50.467.609,24	4.286,56	$ 110.374.633,44	1.492,50	$ 38.430.382,50	63,19	$ 1.627.079,31	1.555,69	$ 40.057.461,81	2.730,87	$ 70.317.171,63
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	544,65	$ 80.053,00	$ 43.600.866,45	638,15	$ 51.085.821,95	541,09	$ 43.315.877,77	51,70	$ 4.138.740,10	592,79	$ 47.454.617,87	45,36	$ 3.631.204,08
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	3.939,56	$ 43.059,00	$ 169.633.514,04	7.432,96	$ 320.055.824,64	3.180,50	$ 136.949.149,50	143,62	$ 6.184.133,58	3.324,12	$ 143.133.283,08	4.108,84	$ 176.922.541,56
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	1.300,00	$ 38.364,00	$ 49.873.200,00	2.238,68	$ 85.884.719,52	1.422,78	$ 54.583.531,92	81,20	$ 3.115.156,80	1.503,98	$ 57.698.688,72	734,70	$ 28.186.030,80
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	433,00	$ 211.505,00	$ 91.561.665,00	2.238,68	$ 473.492.013,40	1.422,78	$ 300.925.063,90	81,20	$ 17.174.206,00	1.503,98	$ 318.099.269,90	734,70	$ 155.392.723,50
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	4.458,82	$ 66.631,00	$ 297.095.635,42	7.441,82	$ 495.855.908,42	3.620,40	$ 241.230.872,40	101,50	$ 6.763.046,50	3.721,90	$ 247.993.918,90	3.719,92	$ 247.861.989,52
Subtotal					**$ 892.511.307,63**		**$ 1.722.220.675,45**		**$ 865.348.056,93**		**$ 40.860.029,33**		**$ 906.208.086,26**		**$ 816.012.589,19**

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	**LLENOS**														
5.1	Cimentación de Tuberia con Material Granular	M3	851,55	$ 228.563,00	$ 194.632.822,65	2.726,45	$ 623.165.591,35	1.049,63	$ 239.906.581,69	52,74	$ 12.054.412,62	1.102,37	$ 251.960.994,31	1.624,08	$ 371.204.597,04
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera. Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	822,26	$ 94.916,00	$ 78.045.630,16	5.647,03	$ 535.993.499,48	2.136,41	$ 202.779.491,56	143,62	$ 13.631.835,92	2.280,03	$ 216.411.327,48	3.367,00	$ 319.582.172,00
5.3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio. Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	1.679,27	$ 41.472,00	$ 69.642.685,44	258,14	$ 10.705.582,08	-	$ -		$ -	-	$ -	258,14	$ 10.705.582,08
5.4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS)	M3	666,67	$ 149.399,00	$ 99.599.831,33	395,42	$ 59.075.352,58	-	$ -		$ -	-	$ -	395,42	$ 59.075.352,58
Subtotal					**$ 441.920.969,58**		**$ 1.228.940.025,49**		**$ 442.686.073,25**		**$ 25.686.248,54**		**$ 468.372.321,79**		**$ 760.567.703,70**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**														
IMP_6.1	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	ML	200,00	$ 18.104,00	$ 3.620.800,00	200,00	$ 3.620.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 3.620.800,00
IMP_6.2	Instalación de Tuberia de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21	UN	1.100,00	$ 213.796,00	$ 235.175.600,00	1.180,02	$ 252.283.555,92	433,99	$ 92.785.326,04	20,30	$ 4.340.058,80	454,29	$ 97.125.384,84	725,73	$ 155.158.171,08
IMP_6.3	Instalación de Tuberia HD 24", Extremos Bridados	ML	86,00	$ 646.568,00	$ 55.604.848,00	86,00	$ 55.604.848,00	-	$ -		$ -	-	$ -	86,00	$ 55.604.848,00
IMP_6.4	Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.	UN	88,00	$ 687.196,00	$ 60.473.248,00	106,00	$ 72.842.776,00	31,00	$ 21.303.076,00	4,00	$ 2.748.784,00	35,00	$ 24.051.860,00	71,00	$ 48.790.916,00
IMP_6.5	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica. Vástago No Ascendente. Ø=3" E.B	UN	11,00	$ 65.576,00	$ 721.336,00	11,00	$ 721.336,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 721.336,00
IMP_6.6	Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en HD E.B. Ø=3"	UN	11,00	$ 126.733,00	$ 1.394.063,00	11,00	$ 1.394.063,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.394.063,00
IMP_6.7	Instalación de Filtro para Válvula Ventosa.	UN	22,00	$ 85.029,00	$ 1.870.638,00	22,00	$ 1.870.638,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 1.870.638,00
IMP_6.8	Instalación de Válvula de Guillotina en HD. Ø=24" (600mm). E.B. x E.B.	UN	4,00	$ 1.833.987,00	$ 7.335.948,00	4,00	$ 7.335.948,00	2,00	$ 3.667.974,00	1,00	$ 1.833.987,00	3,00	$ 5.501.961,00	1,00	$ 1.833.987,00
Subtotal					**$ 366.196.481,00**		**$ 395.673.964,92**		**$ 117.756.376,04**		**$ 8.922.829,80**		**$ 126.679.205,84**		**$ 268.994.759,08**
7	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**														
9.1	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI)	M3	28,15	$ 1.044.033,00	$ 29.389.528,95	29,68	$ 30.986.899,44	21,42	$ 22.363.186,86	1,45	$ 1.513.847,85	22,87	$ 23.877.034,71	6,81	$ 7.109.864,73
8.1	Reconstrucción de pavimento en concreto e > 0,20, MR=4.1MPa	M2	1.360,28	$ 219.513,00	$ 298.598.474,27	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2	Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa	M2	19,20	$ 93.372,00	$ 1.792.742,40	406,70	$ 37.974.392,40	95,59	$ 8.925.429,48		$ -	95,59	$ 8.925.429,48	311,11	$ 29.048.962,92
8.3	Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa.	ML	1.360,28	$ 85.263,00	$ 115.981.293,64	674,78	$ 57.533.507,14	43,45	$ 3.704.677,35		$ -	43,45	$ 3.704.677,35	631,33	$ 53.828.829,79
IMP_7.5	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m. Profundidad 1,45m < H ≤ 1,80m	UN	4,00	$ 5.102.017,00	$ 20.408.068,00	4,00	$ 20.408.068,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 20.408.068,00
IMP_7.6	Construcción de Caja de Inspección en Concreto para Ventosa, 2.5m x 2.5m, Profundidad 1.60m < H ≤ 3.00m	UN	15,00	$ 14.966.005,00	$ 224.490.075,00	15,00	$ 224.490.075,00	6,00	$ 89.796.030,00	1,00	$ 14.966.005,00	7,00	$ 104.762.035,00	8,00	$ 119.728.040,00
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		175,28	$ 66.033.091,33	-	$ -		$ -	-	$ -	175,28	$ 66.033.091,33

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		15.443,42	$ 164.446.189,19	6.941,72	$ 73.917.517,08		$ -	6.941,72	$ 73.917.517,08	8.501,70	$ 90.528.652,11
Subtotal					**$ 690.660.182,27**		**$ 601.872.202,50**		**$ 198.706.840,77**		**$ 16.479.852,85**		**$ 215.186.693,62**		**$ 386.685.508,88**
8	**OTRAS ACTIVIDADES**														
9.4	Empalme de Colector a Estación de Bombeo de Aguas Residuales.	UN	2,00	$ 499.702,00	$ 999.404,00	2,00	$ 999.404,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 999.404,00
Subtotal					**$ 999.404,00**		**$ 999.404,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 999.404,00**
9	**CRUCES MECÁNICOS**														
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad	M3	352,90	$ 64.682,00	$ 22.826.277,80	350,63	$ 22.679.449,66	350,63	$ 22.679.449,66		$ -	350,63	$ 22.679.449,66	-	$ -
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado	M3	333,00	$ 94.916,00	$ 31.607.028,00	329,16	$ 31.242.550,56	329,16	$ 31.242.550,56		$ -	329,16	$ 31.242.550,56	-	$ -
10.3	Concreto fluido f'c= 17,5 Mpa (Grouting) para inyección de contacto	M3	6,30	$ 818.546,00	$ 5.156.839,80	6,30	$ 5.156.839,80	6,30	$ 5.156.839,80		$ -	6,30	$ 5.156.839,80	-	$ -
10.4	Pilotes, Zapatas o Placas de fondo en Concreto para Estructuras, f'c = 24 Mpa (3500 PSI)	M3	9,00	$ 921.502,00	$ 8.293.518,00	9,00	$ 8.293.518,00	9,00	$ 8.293.518,00		$ -	9,00	$ 8.293.518,00	-	$ -
IMP_9.5	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación [Incluye: Tubería SCH 40 (Camisa de Ø= 32" para alojar tubo de 24")	ML	30,00	$ 6.664.624,00	$ 199.938.720,00	75,00	$ 499.846.800,00	75,00	$ 499.846.800,00		$ -	75,00	$ 499.846.800,00	-	$ -
Subtotal					**$ 267.822.383,60**		**$ 567.219.158,02**		**$ 567.219.158,02**		**$ -**		**$ 567.219.158,02**		**$ -**
	TOTAL OBRA CIVIL DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				**$ 2.741.760.422,51**		**$ 4.574.685.983,91**		**$ 2.211.121.732,05**		**$ 92.708.314,72**		**$ 2.303.830.046,77**		**$ 2.270.855.937,14**
	SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO														
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	200,00	$ 96.010,00	$ 19.202.000,00	200,00	$ 19.202.000,00	200,00	$ 19.202.000,00		$ -	200,00	$ 19.202.000,00	-	$ -
2	Tubería PVC-U Ø=24" RDE 21 PSI 200	m	1.100,00	$ 1.706.439,00	$ 1.877.082.900,00	1.200,32	$ 2.048.272.860,48	1.180,02	$ 2.013.632.148,78	20,30	$ 34.640.711,70	1.200,32	$ 2.048.272.860,48	-	$ -
3	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	un	2,00	$ 12.004.430,00	$ 24.008.860,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4	Niple HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.95m	un	1,00	$ 14.064.976,00	$ 14.064.976,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.00m	un	22,00	$ 24.829.676,00	$ 546.252.872,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6	Niple HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.25m	un	1,00	$ 20.865.274,00	$ 20.865.274,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.30m	un	1,00	$ 27.425.418,00	$ 27.425.418,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.50m	un	1,00	$ 27.686.500,00	$ 27.686.500,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=3.00m	un	3,00	$ 28.902.608,00	$ 86.707.824,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.60m	un	1,00	$ 30.717.327,00	$ 30.717.327,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.90m	un	3,00	$ 31.300.106,00	$ 93.900.318,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=5.70m	un	1,00	$ 37.430.319,00	$ 37.430.319,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13	Yee HD E.B x E.B Ø=24" PN16	un	3,00	$ 24.873.795,00	$ 74.621.385,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14	Tee Reducida HD E.B Ø=24" x 3"	un	11,00	$ 6.489.574,00	$ 71.385.314,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15	Codo HD 11,25° E.B Ø=24"	un	6,00	$ 7.452.892,00	$ 44.717.352,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16	Codo HD 22,50° E.B Ø=24"	un	10,00	$ 8.165.407,00	$ 81.654.070,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17	Codo HD 45° E.B Ø=24"	un	3,00	$ 8.949.172,00	$ 26.847.516,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
18	Codo HD 90° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 9.376.679,00	$ 9.376.679,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=24" E.B. PN16	un	50,00	$ 6.911.382,00	$ 345.569.100,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20	Unión de Desmontaje Autoportante Ø=24" HD PN16	un	4,00	$ 12.055.731,00	$ 48.222.924,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
21	Válvula de compuerta Ø=3" E.B. con Caperuza	un	11,00	$ 1.898.136,00	$ 20.879.496,00	11,00	$ 20.879.496,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 20.879.496,00
22	Válvula Ventosa Ø=3", Triple Acción para Agua Residual E.B. PN16	un	11,00	$ 4.142.298,00	$ 45.565.278,00	11,00	$ 45.565.278,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 45.565.278,00
23	Filtro Anti-olores en PRFV de Alta Resistencia	un	22,00	$ 3.526.942,00	$ 77.592.724,00	22,00	$ 77.592.724,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 77.592.724,00
24	Carbón Activado Cilíndrico o Granular de Alta Microporosidad, Proveniente de Cascara de Coco o Huesos Duros.	kg	480,00	$ 16.929,00	$ 8.125.920,00	480,00	$ 8.125.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -	480,00	$ 8.125.920,00
25	Válvula de Guillotina en HD. Ø=24" (600mm). E.B. x E.B.	un	4,00	$ 70.538.854,00	$ 282.155.416,00	4,00	$ 282.155.416,00	4,00	$ 282.155.416,00		$ -	4,00	$ 282.155.416,00	-	$ -
INP-011	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	UN		$ 19.358.923,55		2,00	$ 38.717.847,11	2,00	$ 38.717.847,11		$ -	2,00	$ 38.717.847,11	-	$ -
INP-012	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.95m	UN		$ 25.365.671,54		1,00	$ 25.365.671,54	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 25.365.671,54
INP-013	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.00m	UN		$ 26.720.832,97		22,00	$ 587.858.325,29	12,00	$ 320.649.995,61		$ -	12,00	$ 320.649.995,61	10,00	$ 267.208.329,68
INP-014	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.25m	UN		$ 27.863.610,09		1,00	$ 27.863.610,09	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 27.863.610,09
INP-015	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.30m	UN		$ 29.607.006,21		1,00	$ 29.607.006,21	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 29.607.006,21
INP-016	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.50m	UN		$ 30.833.289,95		1,00	$ 30.833.289,95	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.833.289,95
INP-017	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=3.00m	UN		$ 31.819.261,62		3,00	$ 95.457.784,85	1,00	$ 31.819.261,62		$ -	1,00	$ 31.819.261,62	2,00	$ 63.638.523,24
INP-018	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.60m	UN		$ 48.761.251,12		1,00	$ 48.761.251,12	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 48.761.251,12

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-019	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.90m	UN		$ 50.079.786,00		3,00	$ 150.239.357,99	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 150.239.357,99
INP-020	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=5.70m	UN		$ 55.179.585,30		1,00	$ 55.179.585,30	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 55.179.585,30
INP-021	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Yee E.B x E.B Ø=24" PN16	UN		$ 50.425.038,00		3,00	$ 151.275.114,01	2,00	$ 100.850.076,01		$ -	2,00	$ 100.850.076,01	1,00	$ 50.425.038,00
INP-022	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Tee Reducida E.B Ø=24" x 3"	UN		$ 19.292.508,46		11,00	$ 212.217.593,09	2,00	$ 38.585.016,93		$ -	2,00	$ 38.585.016,93	9,00	$ 173.632.576,16
INP-023	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 11,25° E.B Ø=24"	UN		$ 16.800.834,58		6,00	$ 100.805.007,45	3,00	$ 50.402.503,73		$ -	3,00	$ 50.402.503,73	3,00	$ 50.402.503,73
INP-024	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 22.5° E.B Ø=24"	UN		$ 17.117.479,93		10,00	$ 171.174.799,25	1,00	$ 17.117.479,93		$ -	1,00	$ 17.117.479,93	9,00	$ 154.057.319,33
INP-025	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 45° E.B Ø=24"	UN		$ 20.780.076,80		8,00	$ 166.240.614,40	8,00	$ 166.240.614,40		$ -	8,00	$ 166.240.614,40	-	$ -
INP-026	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 90° E.B Ø=24"	UN		$ 21.356.231,58		1,00	$ 21.356.231,58	1,00	$ 21.356.231,58		$ -	1,00	$ 21.356.231,58	-	$ -
INP-027	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión Brida por Acople Universal Ø=24" E.B PN16	UN		$ 9.434.769,82		62,00	$ 584.955.728,84	41,00	$ 386.825.562,82		$ -	41,00	$ 386.825.562,82	21,00	$ 198.130.166,22
INP-028	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión de Desmontaje Autoportante Ø=24" PN16	UN		$ 23.023.004,61		6,00	$ 138.138.028,88	4,00	$ 92.092.019,25		$ -	4,00	$ 92.092.019,25	2,00	$ 46.046.009,63
TOTAL SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO					**$ 3.942.057.762,00**		**$ 5.137.840.541,41**		**$ 3.579.646.173,54**		**$ 34.640.711,70**		**$ 3.614.286.885,24**		**$ 1.523.553.656,17**

TOTAL COSTO -COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	$ 6.362.924.341,99	$ 15.419.240.188,28	$ 7.595.413.448,59	$ 714.664.188,73	$ 8.310.077.637,33	$ 7.109.162.550,95
AIU (30%)	$ 1.468.367.155,84	$ 3.558.286.197,29	$ 1.752.787.718,91	$ 164.922.505,09	$ 1.917.710.224,00	$ 1.640.575.973,30
TOTAL COSTO -COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	**$ 6.362.924.341,99**	**$ 15.419.240.188,28**	**$ 7.595.413.448,59**	**$ 714.664.188,73**	**$ 8.310.077.637,33**	**$ 7.109.162.550,95**
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	$ 1.928.951.234,60	$ 2.252.218.965,20	$ 2.002.813.063,88	$ 47.087.865,00	$ 2.049.900.928,88	$ 202.318.036,32
A (17.25%)	$ 283.790.266,92	$ 331.349.911,72	$ 294.656.932,64	$ 6.927.638,99	$ 301.584.571,63	$ 29.765.340,10
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	**$ 1.928.951.234,60**	**$ 2.252.218.965,20**	**$ 2.002.813.063,88**	**$ 47.087.865,00**	**$ 2.049.900.928,88**	**$ 202.318.036,32**
TOTAL COSTO - IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO	$ 2.741.760.422,51	$ 4.574.685.983,91	$ 2.211.121.732,05	$ 92.708.314,72	$ 2.303.830.046,77	$ 2.270.855.937,14
AIU (30%)	$ 632.713.943,66	$ 1.055.696.765,52	$ 510.258.861,24	$ 21.394.226,47	$ 531.653.087,72	$ 524.043.677,80

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	TOTAL COSTO -IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				**$ 2.741.760.422,51**		**$ 4.574.685.983,91**		**$ 2.211.121.732,05**		**$ 92.708.314,72**		**$ 2.303.830.046,77**		**$ 2.270.855.937,14**
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				$ 3.942.057.762,00		$ 5.137.840.541,41		$ 3.579.646.173,54		$ 34.640.711,70		$ 3.614.286.885,24		$ 1.523.553.656,17
	A (17.25%)				$ 579.961.589,72		$ 755.886.987,97		$ 526.643.040,46		$ 5.096.394,69		$ 531.739.435,14		$ 224.147.552,83
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				**$ 3.942.057.762,00**		**$ 5.137.840.541,41**		**$ 3.579.646.173,54**		**$ 34.640.711,70**		**$ 3.614.286.885,24**		**$ 1.523.553.656,17**
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE)				$ 41.862.484,00		$ 41.862.484,00		$ 41.862.484,00				$ 41.862.484,00		$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE)				$ 61.155.437,00		$ 61.155.437,00		$ 61.155.437,00				$ 61.155.437,00		$ -
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (NO MODIFICABLE)				$ 33.371.630,00		$ 33.371.630,00		$ 33.371.630,00				$ 33.371.630,00		$ -
	PERMISOS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA VERTIMIENTOS AUTORIDAD AMBIENTAL						$ 207.357.300,00		$ 207.357.300,00				$ 207.357.300,00		$ -
	VALOR TOTAL				**$ 15.112.083.312,10**		**$ 27.727.732.529,80**		**$ 15.732.741.269,06**		**$ 889.101.080,15**		**$ 16.621.842.349,21**		**$ 11.105.890.180,58**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
COLECTOR BELLAVISTA								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**														
1,1	Localización, Trazado y Replanteo	ML	1.142,00	$ 3.850,00	$ 4.396.700,00	321,55	$ 1.237.967,50	250,06	$ 962.731,00		$ -	250,06	$ 962.731,00	71,49	$ 275.236,50
Subtotal					$ 4.396.700,00		$ 1.237.967,50		$ 962.731,00		$ -		$ 962.731,00		$ 275.236,50
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**														
2,1	Soporte para Cinta Demarcadora	UN	508,00	$ 24.729,00	$ 12.562.332,00	289,30	$ 7.154.099,70	252,00	$ 6.231.708,00		$ -	252,00	$ 6.231.708,00	37,30	$ 922.391,70
2,2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte	ML	2.284,00	$ 942,00	$ 2.151.528,00	668,18	$ 629.425,56	500,12	$ 471.113,04		$ -	500,12	$ 471.113,04	168,06	$ 158.312,52
2,3	Valla móvil - Tipo 4	UN	6,00	$ 250.396,00	$ 1.502.376,00	10,00	$ 2.503.980,00	6,00	$ 1.502.376,00		$ -	6,00	$ 1.502.376,00	4,00	$ 1.001.584,00
Subtotal					$ 16.216.236,00		$ 10.287.485,26		$ 8.205.197,04		$ -		$ 8.205.197,04		$ 2.082.288,22
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**														
3,1	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	1.052,00	$ 8.926,00	$ 9.390.152,00	32,64	$ 291.344,64	-	$ -		$ -	-	$ -	32,64	$ 291.344,64

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.2	Perfilada de Pavimento con Contadora Autopropulsada de Piso.	ML	2.284,00	$ 11.319,00	$ 25.852.596,00	645,94	$ 7.311.394,86	500,12	$ 5.660.858,28		$ -	500,12	$ 5.660.858,28	145,82	$ 1.650.536,58
3.3	Demolición de Andén e > 0,075m.	M2	1.827,20	$ 10.427,00	$ 19.052.214,40	1.017,38	$ 10.608.221,26	927,64	$ 9.672.502,28		$ -	927,64	$ 9.672.502,28	89,74	$ 935.718,98
3.4	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m	ML	2.284,00	$ 5.715,00	$ 13.053.060,00	714,83	$ 4.085.253,45	540,92	$ 3.091.357,80		$ -	540,92	$ 3.091.357,80	173,91	$ 993.895,65
3.5	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m.	M2	7.994,00	$ 35.709,00	$ 285.457.746,00	2.460,43	$ 87.859.494,87	2.177,49	$ 77.755.990,41		$ -	2.177,49	$ 77.755.990,41	282,94	$ 10.103.504,46
3.6	Demolición de Concreto Simple.	M3	86,40	$ 154.540,00	$ 13.352.256,00	5,66	$ 874.696,40	-	$ -		$ -	-	$ -	5,66	$ 874.696,40
3.8	Desmonte de Tubería a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro.	ML	1.250,00	$ 6.152,00	$ 7.690.000,00	321,55	$ 1.978.175,60	250,06	$ 1.538.369,12		$ -	250,06	$ 1.538.369,12	71,49	$ 439.806,48
Subtotal					**$ 373.848.024,40**		**$ 113.008.581,08**		**$ 97.719.077,89**		**$ -**		**$ 97.719.077,89**		**$ 15.289.503,19**
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**														
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad	M3	428,40	$ 64.682,00	$ 27.709.768,80	1.033,34	$ 66.838.497,88	883,30	$ 57.133.610,60		$ -	883,30	$ 57.133.610,60	150,04	$ 9.704.887,28
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	12.062,40	$ 25.749,00	$ 310.594.737,60	2.349,83	$ 60.505.772,67	1.415,37	$ 36.444.362,13		$ -	1.415,37	$ 36.444.362,13	934,46	$ 24.061.410,54
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	70,00	$ 80.053,00	$ 5.603.710,00	65,00	$ 5.203.445,00	-	$ -		$ -	-	$ -	65,00	$ 5.203.445,00
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	13.697,20	$ 43.059,00	$ 589.787.734,80	3.768,93	$ 162.286.356,87	2.843,16	$ 122.423.626,44		$ -	2.843,16	$ 122.423.626,44	925,77	$ 39.862.730,43
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	1.142,00	$ 394.333,00	$ 450.328.286,00	332,05	$ 130.938.272,65	261,72	$ 103.204.832,76		$ -	261,72	$ 103.204.832,76	70,33	$ 27.733.439,89
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	1.142,00	$ 139.808,00	$ 159.660.736,00	332,05	$ 46.423.246,40	261,72	$ 36.590.549,76		$ -	261,72	$ 36.590.549,76	70,33	$ 9.832.696,64
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	2.284,00	$ 66.631,00	$ 152.185.204,00	970,90	$ 64.692.037,90	837,50	$ 55.803.462,50		$ -	837,50	$ 55.803.462,50	133,40	$ 8.888.575,40
Subtotal					**$ 1.695.870.177,20**		**$ 536.887.629,37**		**$ 411.600.444,19**		**$ -**		**$ 411.600.444,19**		**$ 125.287.185,18**
5	**LLENOS**														
5.1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	1.148,51	$ 228.563,00	$ 262.506.891,13	230,91	$ 52.777.482,33	147,36	$ 33.681.043,68		$ -	147,36	$ 33.681.043,68	83,55	$ 19.096.438,65
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera. Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	741,69	$ 94.915,00	$ 70.397.506,35	2.730,40	$ 259.155.916,00	1.953,73	$ 185.438.282,95		$ -	1.953,73	$ 185.438.282,95	776,67	$ 73.717.633,05
5.3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio. Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	1.112,54	$ 41.471,00	$ 46.138.146,34	95,50	$ 3.960.480,50	-	$ -		$ -	-	$ -	95,50	$ 3.960.480,50
5.4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS).	M3	1.598,80	$ 149.399,00	$ 238.859.121,20	607,68	$ 90.786.784,32	497,78	$ 74.367.834,22		$ -	497,78	$ 74.367.834,22	109,90	$ 16.418.950,10
Subtotal					**$ 617.901.665,02**		**$ 406.680.663,15**		**$ 293.487.160,85**		**$ -**		**$ 293.487.160,85**		**$ 113.193.502,30**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**														
6.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm).	ML	858,93	$ 15.693,00	$ 13.479.188,49	264,28	$ 4.147.346,04	187,16	$ 2.937.101,88		$ -	187,16	$ 2.937.101,88	77,12	$ 1.210.244,16
6.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	89,80	$ 19.420,00	$ 1.355.516,00	73,80	$ 1.433.196,00	65,22	$ 1.266.572,40		$ -	65,22	$ 1.266.572,40	8,58	$ 166.623,60

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.2	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm).	ML	155,59	$ 25.287,00	$ 3.934.404,33	157,59	$ 3.984.978,33	150,57	$ 3.807.463,59		$ -	150,57	$ 3.807.463,59	7,02	$ 177.514,74
6.3	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm)	ML	98,86	$ 40.981,00	$ 4.051.381,66	9,69	$ 397.105,89	-	$ -		$ -	-	$ -	9,69	$ 397.105,89
6.4	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm)	ML	434,14	$ 48.087,00	$ 20.876.490,18	43,01	$ 2.068.221,87	-	$ -		$ -	-	$ -	43,01	$ 2.068.221,87
6.5	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24"	ML	125,08	$ 76.967,00	$ 9.627.032,36	12,31	$ 947.463,77	-	$ -		$ -	-	$ -	12,31	$ 947.463,77
6.1	Instalación de Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	ML	900,00	$ 14.163,00	$ 12.746.700,00	314,85	$ 4.459.220,55	250,06	$ 3.541.599,78		$ -	250,06	$ 3.541.599,78	64,79	$ 917.620,77
	Instalación de Accesorios de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	UN	30,00	$ 46.223,00	$ 1.386.690,00	26,00	$ 1.201.798,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.201.798,00
6.11	Instalación de Accesorios HD 6". Extremos Bridados.	UN	40,00	$ 141.388,00	$ 5.655.520,00	38,00	$ 5.372.744,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 5.372.744,00
6.12	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=6" E.B	UN	10,00	$ 115.852,00	$ 1.158.520,00	8,00	$ 926.816,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 926.816,00
Subtotal					**$ 74.271.443,02**		**$ 24.938.890,45**		**$ 11.552.737,65**		**$ -**		**$ 11.552.737,65**		**$ 13.386.152,80**
7	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**														
7.1	Acometida Domiciliaria. Incluye: Suministro e instalación de Tubería Perfilada de 6", Silla Yee de 8x6", Excavación, Relleno y Construcción de Registro Domiciliario. L >= 6 m	UN	85,00	$ 1.298.108,00	$ 110.339.180,00	51,00	$ 66.203.508,00	46,00	$ 59.712.968,00		$ -	46,00	$ 59.712.968,00	5,00	$ 6.490.540,00
7.2	Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor	UN	30,00	$ 391.873,00	$ 11.756.190,00	47,00	$ 18.418.031,00	42,00	$ 16.458.666,00		$ -	42,00	$ 16.458.666,00	5,00	$ 1.959.365,00
7.3	Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor	UN	1,00	$ 730.537,00	$ 730.537,00	1,00	$ 730.537,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 730.537,00
Subtotal					**$ 122.825.907,00**		**$ 85.352.076,00**		**$ 76.171.634,00**		**$ -**		**$ 76.171.634,00**		**$ 9.180.442,00**
8	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**														
8.1	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto. Diámetro Interno del Cilindro 1.20 m. Profundidad 1.00m < H ≤ 1.45m.	UN	12,00	$ 4.712.891,00	$ 56.554.692,00	10,00	$ 47.128.910,00	9,00	$ 42.416.019,00		$ -	9,00	$ 42.416.019,00	1,00	$ 4.712.891,00
8.2	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto. Diámetro Interno del Cilindro 1.20 m. Profundidad 1.45m < H ≤ 1.80m.	UN	12,00	$ 5.098.562,00	$ 61.182.744,00	4,00	$ 20.394.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 20.394.248,00
	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto. Diámetro Interno del Cilindro 1.20 m. Profundidad 1.80m < H ≤ 3.00m	UN	10,00	$ 5.838.451,00	$ 58.384.510,00	3,00	$ 17.515.353,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 17.515.353,00
8.3	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto. Diámetro Interno del Cilindro 1.50 m. Profundidad 1.80m < H ≤ 3.00m	UN	4,00	$ 8.492.142,00	$ 33.968.568,00	3,00	$ 25.476.426,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 25.476.426,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,8	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 2.0m x 2.0m, Profundidad 2.50m	UN	1,00	$ 13.783.693,00	$ 13.783.693,00	1,00	$ 13.783.693,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 13.783.693,00
8,1	Construcción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa	ML	2.284,00	$ 85.263,00	$ 194.740.692,00	714,83	$ 60.948.550,29	540,92	$ 46.120.461,96		$ -	540,92	$ 46.120.461,96	173,91	$ 14.828.088,33
8,11	Construcción de andén en concreto e = 0,07, f'c = 21MPa	M2	1.827,20	$ 93.372,00	$ 170.609.318,40	1.162,73	$ 108.566.425,56	1.089,12	$ 101.693.312,64		$ -	1.089,12	$ 101.693.312,64	73,61	$ 6.873.112,92
8,12	Construcción de pavimento en concreto E = 0,20 m MR=4.1MPa	M2	7.994,00	$ 219.513,00	$ 1.754.786.922,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		2.460,43	$ 926.932.802,52	2.177,49	$ 820.339.090,39		$ -	2.177,49	$ 820.339.090,39	282,94	$ 106.593.712,13
INP-002	Acero de Refuerzo de 60 000PSI	KG		$ 10.648,30		2.643,28	$ 28.146.438,42	1.959,95	$ 20.870.135,59		$ -	1.959,95	$ 20.870.135,59	683,33	$ 7.276.302,84
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400	M2		$ 20.710,30		1.403,73	$ 29.071.669,42	1.037,52	$ 21.487.350,46		$ -	1.037,52	$ 21.487.350,46	366,21	$ 7.584.318,96
Subtotal					**$ 2.344.011.139,40**		**$ 1.277.964.516,22**		**$ 1.052.926.370,03**		**$ -**		**$ 1.052.926.370,03**		**$ 225.038.146,19**
9	**OTRAS ACTIVIDADES**														
9,1	Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente	UN	20,00	$ 197.884,00	$ 3.957.680,00	10,00	$ 1.978.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.978.840,00
9,3	Bajante de Operación para Válvulas, Incluye: Tapa Válvula; Tubería Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza	UN	10,00	$ 512.126,00	$ 5.121.260,00	4,00	$ 2.048.504,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.048.504,00
9,4	Camara De Caida Para Pozo de inspección. Incluye: Tee de 8x6" Y Tubería PVC de Diámetro 160 mm (6")	UN	15,00	$ 442.316,00	$ 6.634.740,00	6,00	$ 2.653.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.653.896,00
Subtotal					**$ 15.713.680,00**		**$ 6.681.240,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.681.240,00**
TOTAL COSTO DIRECTO COLECTOR BELLAVISTA					**$ 5.265.054.972,04**		**$ 2.463.039.049,03**		**$ 1.952.625.352,65**		**$ -**		**$ 1.952.625.352,65**		**$ 510.413.696,38**
	SUMINISTROS DE BELLAVISTA														
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm)	m	859,00	$ 65.736,00	$ 56.467.224,00	960,40	$ 63.132.854,40	859,00	$ 56.467.224,00		$ -	859,00	$ 56.467.224,00	101,40	$ 6.665.630,40
2	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	70,00	$ 96.010,00	$ 6.720.700,00	106,56	$ 10.422.845,60	70,00	$ 6.720.700,00		$ -	70,00	$ 6.720.700,00	36,56	$ 3.702.145,60
3	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm)	m	156,00	$ 138.153,00	$ 21.551.868,00	156,00	$ 21.551.868,00	156,00	$ 21.551.868,00		$ -	156,00	$ 21.551.868,00	-	$ -
4	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm)	m	99,00	$ 207.041,00	$ 20.497.059,00	99,00	$ 20.497.059,00	99,00	$ 20.497.059,00		$ -	99,00	$ 20.497.059,00	-	$ -
5	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm)	m	435,00	$ 253.233,00	$ 110.156.355,00	435,00	$ 110.156.355,00	435,00	$ 110.156.355,00		$ -	435,00	$ 110.156.355,00	-	$ -
6	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24"	m	126,00	$ 584.287,00	$ 73.617.642,00	126,00	$ 73.617.642,00	126,00	$ 73.617.642,00		$ -	126,00	$ 73.617.642,00	-	$ -
7	Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	m	900,00	$ 119.911,00	$ 107.919.900,00	900,00	$ 107.919.900,00	900,00	$ 107.919.900,00		$ -	900,00	$ 107.919.900,00	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8	Tee PVC - U Ø=6" R1	un	30,00	$ 647.419,00	$ 19.422.570,00	30,00	$ 19.422.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 19.422.570,00
9	Union Universal HD Ø=6" R1	un	40,00	$ 233.419,00	$ 9.336.760,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	Válvula de compuerta Ø=6" E.B con Caperuza	un	10,00	$ 1.745.563,00	$ 17.455.630,00	7,00	$ 12.218.941,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 12.218.941,00
11	Collar de Derivación PVC-U 6" x 1/2"	un	30,00	$ 32.348,00	$ 970.440,00	10,00	$ 323.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 323.480,00
12	Collar de Derivación PVC-U 6" x 3/4"	un	10,00	$ 32.649,00	$ 326.490,00	5,00	$ 163.245,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 163.245,00
INP-029	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Union Universal Ø=6" R1	un		$ 452.713,98	$ -	20,00	$ 9.054.279,50	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 9.054.279,50
TOTAL SUMINISTROS DE BELLAVISTA					**$ 443.542.638,00**		**$ 447.581.039,50**		**$ 396.030.748,00**		**$ -**		**$ 396.030.748,00**		**$ 51.550.291,50**
	IMPULSIÓN BELLAVISTA														
1	**PRELIMINARES**														
1-02-1-A	Localización, Trazado y Replanteo	ML	881,00	$ 3.850,00	$ 3.391.850,00	932,80	$ 3.591.280,00	920,80	$ 3.545.080,00		$ -	920,80	$ 3.545.080,00	12,00	$ 46.200,00
Subtotal					**$ 3.391.850,00**		**$ 3.591.280,00**		**$ 3.545.080,00**		**$ -**		**$ 3.545.080,00**		**$ 46.200,00**
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**														
1-03-1-A	Soporte para Cinta Demarcadora	UN	392,00	$ 24.729,00	$ 9.693.768,00	631,00	$ 15.603.999,00	616,00	$ 15.233.064,00		$ -	616,00	$ 15.233.064,00	15,00	$ 370.935,00
1-03-1-B	Cinta Demarcadora, Sin Soporte	ML	1.762,00	$ 942,00	$ 1.659.804,00	1.976,40	$ 1.861.768,80	1.944,80	$ 1.832.001,60		$ -	1.944,80	$ 1.832.001,60	31,60	$ 29.767,20
1-03-2-C	Valla móvil - Tipo 4	UN	4,00	$ 250.396,00	$ 1.001.584,00	7,00	$ 1.752.772,00	7,00	$ 1.752.772,00		$ -	7,00	$ 1.752.772,00	-	$ -
Subtotal					**$ 12.355.156,00**		**$ 19.218.539,80**		**$ 18.817.837,60**		**$ -**		**$ 18.817.837,60**		**$ 400.702,20**
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**														
1-05-1-A	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	50,00	$ 8.926,00	$ 446.300,00	44,00	$ 392.744,00	-	$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 392.744,00
1-05-1-B	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso	ML	1.902,00	$ 11.319,00	$ 21.528.738,00	1.788,36	$ 20.242.446,84	1.776,26	$ 20.105.486,94		$ -	1.776,26	$ 20.105.486,94	12,10	$ 136.959,90
1-05-2-G	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m	ML	80,00	$ 5.715,00	$ 457.200,00	1.558,88	$ 8.908.999,20	1.543,68	$ 8.822.131,20		$ -	1.543,68	$ 8.822.131,20	15,20	$ 86.868,00
1-05-2-F	Demolición de Andén e > 0.075m	M2	64,00	$ 10.427,00	$ 667.328,00	2.068,24	$ 21.565.538,48	2.047,34	$ 21.347.614,18		$ -	2.047,34	$ 21.347.614,18	20,90	$ 217.924,30
1-05-2-D	Demolición de Pavimento Rigido e > 0.175m	M2	1.057,20	$ 35.709,00	$ 37.751.554,80	7.037,64	$ 251.307.086,76	7.008,56	$ 250.268.669,04		$ -	7.008,56	$ 250.268.669,04	29,08	$ 1.038.417,72
1-05-2-A	Demolición de Concreto Simple	M3	19,20	$ 154.540,00	$ 2.967.168,00	6,70	$ 1.035.418,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,70	$ 1.035.418,00
1-05-2-K	Desmonte de Tuberia a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro	ML	400,00	$ 6.152,00	$ 2.460.800,00	811,58	$ 4.992.840,16	801,38	$ 4.930.089,76		$ -	801,38	$ 4.930.089,76	10,20	$ 62.750,40
Subtotal					**$ 66.279.088,80**		**$ 308.445.073,44**		**$ 305.473.991,12**		**$ -**		**$ 305.473.991,12**		**$ 2.971.082,32**

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**														
1-06-1-A	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	422,88	$ 64.682,00	$ 27.352.724,16	1.744,90	$ 112.863.621,80	1.720,92	$ 111.312.547,44		$ -	1.720,92	$ 111.312.547,44	23,98	$ 1.551.074,36
1-06-1-B	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	1.585,80	$ 25.749,00	$ 40.832.764,20	6.570,09	$ 169.173.247,41	6.321,60	$ 162.774.878,40		$ -	6.321,60	$ 162.774.878,40	248,49	$ 6.398.369,01
1-06-1-D	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	443,99	$ 80.053,00	$ 35.542.731,47	63,57	$ 5.088.969,21	-	$ -		$ -	-	$ -	63,57	$ 5.088.969,21
1-06-1-F	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado	M3	1.995,24	$ 43.059,00	$ 85.913.039,16	8.620,19	$ 371.176.761,21	8.532,63	$ 367.406.515,17		$ -	8.532,63	$ 367.406.515,17	87,56	$ 3.770.246,04
1-06-2-A	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	400,00	$ 394.333,00	$ 157.733.200,00	1.059,39	$ 417.752.436,87	1.021,29	$ 402.728.349,57		$ -	1.021,29	$ 402.728.349,57	38,10	$ 15.024.087,30
1-06-2-B	Manejo de Aguas Residuales.	ML	400,00	$ 139.808,00	$ 55.923.200,00	1.059,39	$ 148.111.197,12	1.021,29	$ 142.784.512,32		$ -	1.021,29	$ 142.784.512,32	38,10	$ 5.326.684,80
1-06-4-F	Entibado Metálico Continuo	M2	800,00	$ 66.631,00	$ 53.304.800,00	1.749,04	$ 116.540.284,24	1.739,38	$ 115.896.628,78		$ -	1.739,38	$ 115.896.628,78	9,66	$ 643.655,46
Subtotal					**$ 456.602.458,99**		**$ 1.340.706.517,86**		**$ 1.302.903.431,68**		**$ -**		**$ 1.302.903.431,68**		**$ 37.803.086,18**
5	**LLENOS**														
1-07-1-A	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	762,24	$ 228.563,00	$ 174.219.861,12	1.244,90	$ 284.538.078,70	1.196,51	$ 273.477.915,13		$ -	1.196,51	$ 273.477.915,13	48,39	$ 11.060.163,57
1-07-2-A	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado	M3	544,84	$ 94.915,00	$ 51.713.486,60	5.440,20	$ 516.356.583,00	5.326,92	$ 505.604.611,80		$ -	5.326,92	$ 505.604.611,80	113,28	$ 10.751.971,20
1-07-2-B	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado	M3	817,27	$ 41.471,00	$ 33.893.004,17	1.921,19	$ 79.673.670,49	1.901,11	$ 78.840.932,81		$ -	1.901,11	$ 78.840.932,81	20,08	$ 832.737,68
1-07-3-A	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS)	M3	211,44	$ 149.399,00	$ 31.586.924,56	1.238,00	$ 184.955.962,00	1.167,75	$ 174.460.682,25		$ -	1.167,75	$ 174.460.682,25	70,25	$ 10.495.279,75
INP-043	Relleno fluido de resistencia 3000 PSI de endurecimiento rápido, agregado grueso máximo de 1/2" con slump 9" (Esp =0,40 mts)	M2		$ 456.302,60		1.233,00	$ 562.621.105,80	1.156,46	$ 527.695.704,80		$ -	1.156,46	$ 527.695.704,80	76,54	$ 34.925.401,00
Subtotal					**$ 291.415.278,45**		**$ 1.628.145.399,99**		**$ 1.560.079.846,79**		**$ -**		**$ 1.560.079.846,79**		**$ 68.065.553,20**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**														
3-01-1-C	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	ML	400,00	$ 19.420,00	$ 7.768.000,00	846,60	$ 16.440.972,00	836,58	$ 16.246.383,60		$ -	836,58	$ 16.246.383,60	10,02	$ 194.588,40
2-01-1-C	Instalación de Tubería HD 24", Extremos Bridados	ML	16,00	$ 651.588,00	$ 10.425.408,00	16,00	$ 10.425.408,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 10.425.408,00
2-01-3-X	Instalación de Tubería de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21	ML	400,00	$ 7.065,00	$ 2.826.000,00	1.055,25	$ 7.455.341,25	1.048,10	$ 7.404.826,50		$ -	1.048,10	$ 7.404.826,50	7,15	$ 50.514,75
	Instalación de Tubería de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21	ML	880,00	$ 213.256,00	$ 187.665.280,00	896,00	$ 191.503.888,00	890,26	$ 189.853.286,56		$ -	890,26	$ 189.853.286,56	7,74	$ 1.650.601,44
	Instalación de Accesorios HD 3", Extremos Bridados.	UN	18,00	$ 104.134,00	$ 1.874.412,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Instalación de Accesorios HD 3", Extremos Bridados.	UN	2,00	$ 122.279,00	$ 244.558,00	23,00	$ 2.812.417,00	21,00	$ 2.567.859,00		$ -	21,00	$ 2.567.859,00	2,00	$ 244.558,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2-02-3-W	Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.	UN	35,00	$ 687.197,00	$ 24.051.895,00	35,00	$ 24.051.895,00	29,00	$ 19.928.713,00		$ -	29,00	$ 19.928.713,00	6,00	$ 4.123.182,00
	Instalación de Accesorios de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21	UN	22,00	$ 20.690,00	$ 455.180,00	22,00	$ 455.180,00	18,00	$ 372.420,00		$ -	18,00	$ 372.420,00	4,00	$ 82.760,00
	Instalación de Accesorios de PVC-U 4" PSI 200 RDE 21	UN	1,00	$ 30.084,00	$ 30.084,00	2,00	$ 60.168,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 60.168,00
2-05-1-D	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=3" E.B.	UN	8,00	$ 49.218,00	$ 393.744,00	8,00	$ 393.744,00	2,00	$ 98.436,00		$ -	2,00	$ 98.436,00	6,00	$ 295.308,00
3-05-2-B	Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en HD E.B. Ø=3"	UN	4,00	$ 126.733,00	$ 506.932,00	4,00	$ 506.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 506.932,00
3-05-2-A	Instalación de Filtro para Válvula Ventosa	UN	8,00	$ 74.913,00	$ 599.304,00	8,00	$ 599.304,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 599.304,00
6,1	Instalación de Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	ML		$ 14.163,00		18,00	$ 254.934,00	18,00	$ 254.934,00		$ -	18,00	$ 254.934,00	-	$ -
6,11	Instalación de Accesorios HD 6", Extremos Bridados.	UN		$ 141.388,00		2,00	$ 282.776,00	2,00	$ 282.776,00		$ -	2,00	$ 282.776,00	-	$ -
6.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm)	ML		$ 15.693,00		23,30	$ 365.646,90	23,30	$ 365.646,90		$ -	23,30	$ 365.646,90	-	$ -
	Instalación de Accesorios de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	UN		$ 46.223,00		2,00	$ 92.446,00	2,00	$ 92.446,00		$ -	2,00	$ 92.446,00	-	$ -
INP-049	Instalacion de Tuberia PEAD Diametro de 4" (110 mm) PN10	ML		$ 21.626,80		10,00	$ 216.268,00	10,00	$ 216.268,00		$ -	10,00	$ 216.268,00	-	$ -
INP-050	Instalación de Accesorios AC 4", Extremos Bridados.	UN		$ 135.647,20		2,00	$ 271.294,40	2,00	$ 271.294,40		$ -	2,00	$ 271.294,40	-	$ -
6.1	Instalación de Tubería de PVC-U 10" PSI 200 RDE 21.	ML		$ 24.920,00		142,50	$ 3.551.100,00	132,20	$ 3.294.424,00		$ -	132,20	$ 3.294.424,00	10,30	$ 256.676,00
Subtotal					**$ 236.840.797,00**		**$ 259.739.714,55**		**$ 241.249.713,96**		**$ -**		**$ 241.249.713,96**		**$ 18.490.000,59**
7	**ACOMETIDAS DOMICILIARIA**														
3-04-1-A	Acometida Domiciliaria, Incluye: Suministro e Instalación De Tubería Perfilada De 6", Silla Yee de 6x6", Excavación, Relleno Relleno y Construcción de Registro Domiciliario. L> = 6m	UN	35,00	$ 1.296.108,00	$ 45.433.780,00	104,00	$ 135.003.232,00	101,00	$ 131.108.908,00		$ -	101,00	$ 131.108.908,00	3,00	$ 3.894.324,00
2-04-1-A	Instalación De Acometida Domiciliaria De Acueducto de 1/2". Incluye Exacavacion, Relleno, Suministro E Instalación De Tubería PEAD Accesorios, Cajilla Para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación Del Medidor.	UN	35,00	$ 389.047,00	$ 13.616.645,00	101,00	$ 39.293.747,00	98,00	$ 38.126.606,00		$ -	98,00	$ 38.126.606,00	3,00	$ 1.167.141,00
Subtotal					**$ 59.050.425,00**		**$ 174.296.979,00**		**$ 169.235.514,00**		**$ -**		**$ 169.235.514,00**		**$ 5.061.465,00**
8	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**														
3-03-2-B	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto. Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,45m < H ≤ 1,80m.	UN	4,00	$ 5.098.582,00	$ 20.394.248,00	10,00	$ 50.985.620,00	7,00	$ 35.689.934,00		$ -	7,00	$ 35.689.934,00	3,00	$ 15.295.686,00
3-03-3-A	Construcción de Caja de Inspección en Concreto para Ventosa: 2.5m x 2.5m, Profundidad 1,60m < H ≤ 3,00m.	UN	4,00	$ 16.217.520,00	$ 64.870.080,00	4,00	$ 64.870.080,00	3,00	$ 48.652.560,00		$ -	3,00	$ 48.652.560,00	1,00	$ 16.217.520,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1-11-2-B	Construcción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa	ML	80,00	$ 85.263,00	$ 6.821.040,00	1.571,58	$ 133.997.625,54	1.556,38	$ 132.701.627,94		$ -	1.556,38	$ 132.701.627,94	15,20	$ 1.295.997,60
1-11-2-A	Construcción de andén en concreto e = 0,07, f'c = 21MPa	M2	64,00	$ 93.372,00	$ 5.975.808,00	2.052,24	$ 191.621.753,28	2.031,34	$ 189.670.278,48		$ -	2.031,34	$ 189.670.278,48	20,90	$ 1.951.474,80
1-11-1-A	Construcción de pavimento en concreto e= 0,20, MR=4 1MPa	M2	1.057,20	$ 219.513,00	$ 232.069.143,60	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1-10-1-C	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI)	M3	8,35	$ 612.421,00	$ 5.113.715,35	8,35	$ 5.113.715,35	3,02	$ 1.849.511,42		$ -	3,02	$ 1.849.511,42	5,33	$ 3.264.203,93
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0,2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		3.787,49	$ 1.426.882.863,20	3.746,99	$ 1.411.626.399,34		$ -	3.746,99	$ 1.411.626.399,34	40,50	$ 15.256.463,86
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		25.425,68	$ 270.740.268,34	18.320,25	$ 195.079.518,08		$ -	18.320,25	$ 195.079.518,08	7.105,43	$ 75.660.750,27
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400	M2		$ 20.710,30		3.451,20	$ 71.475.387,36	3.407,39	$ 70.568.069,12		$ -	3.407,39	$ 70.568.069,12	43,81	$ 907.318,24
INP-039	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0,20 mts Acelerado a 7 dias (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 392.359,50		3.531,69	$ 1.385.693.691,99	3.383,47	$ 1.327.536.597,47		$ -	3.383,47	$ 1.327.536.597,47	148,22	$ 58.157.094,53
INP-044	Construcción para separador en concreto estampado de e = 0,10, f'c = 21MPa	M2		$ 187.945,70		165,95	$ 27.870.588,92	30,95	$ 5.197.919,42		$ -	30,95	$ 5.197.919,42	135,00	$ 22.672.669,50
Subtotal					**$ 335.244.034,95**		**$ 3.629.251.593,98**		**$ 3.418.572.415,25**		**$ -**		**$ 3.418.572.415,25**		**$ 210.679.178,73**
9	**OTRAS ACTIVIDADES**														
3-03-5-A	Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente	UN	8,00	$ 197.884,00	$ 1.583.072,00	8,00	$ 1.583.072,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.583.072,00
2-03-1-A	Bajante de Operación para Válvulas. Incluye: Tapa Válvula; Tubería Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza.	UN	4,00	$ 512.126,00	$ 2.048.504,00	4,00	$ 2.048.504,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.048.504,00
INP-040	Suministro e instalacion de empalme en tuberia PEAD de 10" para agua potable existente en interseccion de via, incluye accesorios	UN		$ 48.179.394,90		1,00	$ 48.179.394,90	1,00	$ 48.179.394,90		$ -	1,00	$ 48.179.394,90	-	$ -
INP-042	Suministro e instalacion de Derivacion - Desvio de tuberia de presion de 10" Existente para Agua Potable, incluye accesorios	UN		$ 21.323.244,80		1,00	$ 21.323.244,80	1,00	$ 21.323.244,80		$ -	1,00	$ 21.323.244,80	-	$ -
Subtotal					**$ 3.631.576,00**		**$ 73.134.215,70**		**$ 69.502.639,70**		**$ -**		**$ 69.502.639,70**		**$ 3.631.576,00**
OBRA TOTAL IMPULSION BELLAVISTA					**$ 1.464.810.665,19**		**$ 7.436.529.314,32**		**$ 7.089.380.470,10**		**$ -**		**$ 7.089.380.470,10**		**$ 347.148.844,22**
	SUMINISTRO BELLAVISTA														
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	400,00	$ 96.010,00	$ 38.404.000,00	860,00	$ 64.488.800,00	836,58	$ 80.320.045,80		$ -	836,58	$ 80.320.045,80	43,42	$ 4.168.754,20
	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	un	8,00	$ 24.832.283,00	$ 198.658.264,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Tuberia PVC-U Ø=3" RDE 21 PSI 200	m	400,00	$ 43.819,00	$ 17.527.600,00	1.055,25	$ 46.239.999,75	1.048,10	$ 45.926.893,90		$ -	1.048,10	$ 45.926.893,90	7,15	$ 313.305,85

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2	Tubería PVC-U Ø=24" RDE 21 PSI 200	m	880,00	$ 1.706.439,00	$ 1.501.666.320,00	898,00	$ 1.532.382.222,00	898,00	$ 1.532.382.222,00		$ -	898,00	$ 1.532.382.222,00	-	$ -
3	Unión Brida Por Acople Universal HD Ø=3" R1	un	18,00	$ 141.077,00	$ 2.539.386,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4	Reducción HD E.B Ø = 4" x 3"	un	2,00	$ 251.116,00	$ 502.232,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=24" E.B. PN16	un	22,00	$ 6.911.382,00	$ 152.050.404,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6	Union Universal HD Ø=24" R2	un	1,00	$ 6.248.459,00	$ 6.248.459,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14	Tee Reducida HD E.B Ø=24" x 3"	un	4,00	$ 6.489.574,00	$ 25.958.296,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15	Codo HD 11,25° E.B Ø=24"	un	5,00	$ 7.452.892,00	$ 37.264.460,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16	Codo HD 22,50° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 8.165.407,00	$ 8.165.407,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17	Codo HD 45° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 8.949.172,00	$ 8.949.172,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
18	Codo HD 90° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 9.376.679,00	$ 9.376.679,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	Tee PVC - U Ø=3" Radio Corto	un	22,00	$ 150.021,00	$ 3.300.462,00	22,00	$ 3.300.462,00	18,00	$ 2.700.378,00		$ -	18,00	$ 2.700.378,00	4,00	$ 600.084,00
20	Tee Reducida PVC U 4x3" Radio corto	un	1,00	$ 183.217,00	$ 183.217,00	1,00	$ 183.217,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 183.217,00
21	Válvula de compuerta Ø=3" E.B con Caperuza	un	8,00	$ 1.898.136,00	$ 15.185.088,00	8,00	$ 15.185.088,00	2,00	$ 3.796.272,00		$ -	2,00	$ 3.796.272,00	6,00	$ 11.388.816,00
	Collar de Derivación PVCU 3" x 1/2"	un	35,00	$ 22.476,00	$ 786.660,00	35,00	$ 786.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 786.660,00
22	Válvula Ventosa Ø=3", Triple Acción para Agua Residual E.B. PN16	un	4,00	$ 4.142.298,00	$ 16.569.192,00	4,00	$ 16.569.192,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 16.569.192,00
23	Filtro Anti-olores en PRFV de Alta Resistencia	un	8,00	$ 3.526.942,00	$ 28.215.536,00	8,00	$ 28.215.536,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 28.215.536,00
24	Carbón Activado Cilíndrico o Granular de Alta Microporosidad, Proveniente de Cascara de Coco o Huesos Duros.	kg	180,00	$ 16.929,00	$ 3.047.220,00	180,00	$ 3.047.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -	180,00	$ 3.047.220,00
INP-011	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	UN		$ 19.358.923,55		3,00	$ 58.076.770,66	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 58.076.770,66
INP-013	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.00m	UN		$ 26.720.832,97		8,00	$ 213.766.663,74	7,00	$ 187.045.830,77		$ -	7,00	$ 187.045.830,77	1,00	$ 26.720.832,97
INP-030	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida Por Acople Universal Ø=3" R1	UN		$ 382.342,87		21,00	$ 8.029.200,27	19,00	$ 7.264.514,53		$ -	19,00	$ 7.264.514,53	2,00	$ 764.685,74
INP-031	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Reducción E.B Ø = 4" x 3"	UN		$ 568.402,21		2,00	$ 1.136.804,41	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.136.804,41
INP-027	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida por Acople Universal Ø=24" E.B. PN16	UN		$ 9.434.769,82		22,00	$ 207.564.936,04	14,00	$ 132.086.777,48		$ -	14,00	$ 132.086.777,48	8,00	$ 75.478.158,56
INP-032	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Union Universal Ø=24" R2	UN		$ 8.221.914,72		1,00	$ 8.221.914,72	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.221.914,72

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-022	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Tee Reducida E.B Ø=24" x 3"	UN		$ 19.292.508,46		4,00	$ 77.170.033,85	4,00	$ 77.170.033,85		$ -	4,00	$ 77.170.033,85	-	$ -
INP-023	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 11,25° E.B Ø=24"	UN		$ 16.800.834,58		5,00	$ 84.004.172,88	2,00	$ 33.601.669,15		$ -	2,00	$ 33.601.669,15	3,00	$ 50.402.503,73
INP-024	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 22,5° E.B Ø=24"	UN		$ 17.117.479,93		1,00	$ 17.117.479,93	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 17.117.479,93
INP-025	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 45° E.B Ø=24"	UN		$ 20.780.076,80		1,00	$ 20.780.076,80	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 20.780.076,80
INP-026	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 90° E.B Ø=24"	UN		$ 21.356.231,58		1,00	$ 21.356.231,58	1,00	$ 21.356.231,58		$ -	1,00	$ 21.356.231,58	-	$ -
7	Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	m		$ 118.911,00		18,00	$ 2.140.398,00	18,00	$ 2.140.398,00		$ -	18,00	$ 2.140.398,00	-	$ -
INP-029	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Union Universal Ø=6" R1	un		$ 452.713,98		2,00	$ 905.427,95	2,00	$ 905.427,95		$ -	2,00	$ 905.427,95	-	$ -
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm)	m		$ 65.736,00		23,30	$ 1.531.648,80	23,30	$ 1.531.648,80		$ -	23,30	$ 1.531.648,80	-	$ -
INP-045	Tee Reducida PVC U 6x3" Radio corto	UN		$ 2.146.915,51		2,00	$ 4.293.831,01	2,00	$ 4.293.831,01		$ -	2,00	$ 4.293.831,01	-	$ -
INP-046	Tubería PEAD Diametro de 4" (110 mm) PN10	ML		$ 81.479,37		10,00	$ 814.793,70	10,00	$ 814.793,70		$ -	10,00	$ 814.793,70	-	$ -
INP-047	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Union Garra Tigre Ø=4" PEAD X Universal R1) PN10 RDE 21	UN		$ 566.317,50		2,00	$ 1.132.635,00	2,00	$ 1.132.635,00		$ -	2,00	$ 1.132.635,00	-	$ -
INP-048	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo Ø=3" x 90° E.B	UN		$ 526.342,29		2,00	$ 1.052.684,57	2,00	$ 1.052.684,57		$ -	2,00	$ 1.052.684,57	-	$ -
11	Tubería PVC-U Ø=10" RDE 21 PSI 200	m		$ 317.079,00		142,50	$ 45.183.757,50	132,20	$ 41.917.843,80		$ -	132,20	$ 41.917.843,80	10,30	$ 3.265.913,70
TOTAL SUMINISTRO BELLAVISTA					**$ 2.074.596.054,00**		**$ 2.504.677.858,14**		**$ 2.177.439.931,89**		**$ -**		**$ 2.177.439.931,89**		**$ 327.237.926,25**

TOTAL COSTO -COLECTOR BELLAVISTA	$ 5.265.054.972,04	$ 2.463.039.049,03	$ 1.952.625.352,65	$ -	$ 1.952.625.352,65	$ 510.413.696,38
AIU (30%)	$ 1.215.012.685,86	$ 568.393.626,70	$ 450.605.850,61	$ -	$ 450.605.850,61	$ 117.787.776,09
TOTAL COSTO -COLECTOR BELLAVISTA	**$ 5.265.054.972,04**	**$ 2.463.039.049,03**	**$ 1.952.625.352,65**	**$ -**	**$ 1.952.625.352,65**	**$ 510.413.696,38**
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE BELLAVISTA	$ 443.542.638,00	$ 447.581.039,50	$ 396.030.748,00	$ -	$ 396.030.748,00	$ 51.550.291,50
A (17.25%)	$ 65.254.673,82	$ 65.848.809,65	$ 58.264.651,62	$ -	$ 58.264.651,62	$ 7.584.158,02
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE BELLAVISTA	**$ 443.542.638,00**	**$ 447.581.039,50**	**$ 396.030.748,00**	**$ -**	**$ 396.030.748,00**	**$ 51.550.291,50**

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	TOTAL COSTO - IMPULSIÓN BELLAVISTA				$ 1.464.810.665,19		$ 7.436.529.314,32		$ 7.089.380.470,10		$ -		$ 7.089.380.470,10		$ 347.148.844,22
	AIU (30%)				$ 338.033.230,43		$ 1.716.122.149,46		$ 1.636.010.877,71		$ -		$ 1.636.010.877,71		$ 80.111.271,74
	TOTAL COSTO - IMPULSIÓN BELLAVISTA				**$ 1.464.810.665,19**		**$ 7.436.529.314,32**		**$ 7.089.380.470,10**		**$ -**		**$ 7.089.380.470,10**		**$ 347.148.844,22**
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE BELLAVISTA				$ 2.074.598.054,00		$ 2.504.677.858,14		$ 2.177.439.931,89		$ -		$ 2.177.439.931,89		$ 327.237.926,25
	A (17.25%)				$ 305.218.050,59		$ 368.492.051,62		$ 320.348.305,54		$ -		$ 320.348.305,54		$ 48.143.746,08
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE BELLAVISTA				**$ 2.074.598.054,00**		**$ 2.504.677.858,14**		**$ 2.177.439.931,89**		**$ -**		**$ 2.177.439.931,89**		**$ 327.237.926,25**
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE)				$ 41.862.484,00		$ 41.862.484,00		$ 41.862.484,00				$ 41.862.484,00		$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE)				$ 55.292.403,00		$ 55.292.403,00		$ 55.292.403,00				$ 55.292.403,00		$ -
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (NO MODIFICABLE)				$ 33.371.630,00		$ 33.371.630,00		$ 33.371.630,00				$ 33.371.630,00		$ -
	VALOR TOTAL				**$ 9.378.532.846,23**		**$ 12.982.353.777,98**		**$ 11.746.003.019,63**		**$ -**		**$ 11.746.003.019,63**		**$ 1.236.350.758,35**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA PARA ALIVIO 8")								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**														
INP-056	Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, recuperables, de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared, hasta una profundidad de 5 m. en terreno de arenas	M2		$ 256.295,00	$ -	75,21	$ 19.275.946,95		$ -		$ -		$ -	75,21	$ 19.275.946,95
Subtotal					$ -		$ 19.275.946,95		$ -		$ -		$ -		$ 19.275.946,95
5	**LLENOS**														
INP-057	Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea tamaño de 4" a 6"	M3		$ 286.780,00	$ -	5,95	$ 1.706.341,00		$ -		$ -		$ -	5,95	$ 1.706.341,00
Subtotal					$ -		$ 1.706.341,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.706.341,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**														
INP-058	Instalación de Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Para Acueducto PE 100 PN10 de 200 mm	ML		$ 83.655,00	$ -	525,00	$ 43.918.875,00		$ -		$ -	-	$ -	525,00	$ 43.918.875,00
INP-059	Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en AC E.B. Ø=2"	UN		$ 240.500,00	$ -	1,00	$ 240.500,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 240.500,00
INP-060	Instalación de Accesorios en AC Ø=8"	UN		$ 225.550,00	$ -	16,00	$ 3.608.800,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 3.608.800,00
INP-061	Instalación de Accesorios en Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Para Acueducto PE 100 PN10 de 200 mm	UN		$ 147.550,00	$ -	8,00	$ 1.180.400,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.180.400,00
INP-062	Instalación de Válvula de Compuerta Ø=150 mm BxB	UN		$ 156.975,00	$ -	4,00	$ 627.900,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 627.900,00
INP-063	Instalación de Codo de descarga estacionario de 4" BxB	UN		$ 240.916,00	$ -	2,00	$ 481.832,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 481.832,00
Subtotal					$ -		$ 50.058.307,00		$ -		$ -		$ -		$ 50.058.307,00
7	**OBRAS ACCESORIAS Y UBANISMO**														
INP-064	Concreto simple de 14 Mpa (2.000 PSI) para Solado (Esp. =0,05 m)	M2		$ 58.305,00	$ -	15,34	$ 894.398,70		$ -		$ -	-	$ -	15,34	$ 894.398,70
INP-065	Concreto Impermeabilizado de 28,0 Mpa (4.000 PSI) para losas de fondo	M3		$ 1.345.474,00	$ -	5,67	$ 7.628.837,58		$ -		$ -	-	$ -	5,67	$ 7.628.837,58
INP-066	Concreto Vigas y columnas de Confinamiento de 28,0 Mpa (4.000 PSI)	M3		$ 1.410.474,00	$ -	4,82	$ 6.798.484,68		$ -		$ -	-	$ -	4,82	$ 6.798.484,68
INP-067	Alistado y pendientado de losas y pisos en mortero 1:4 (Esp. =0,05 mts)	M2		$ 31.850,00	$ -	31,36	$ 998.816,00		$ -		$ -	-	$ -	31,36	$ 998.816,00
INP-068	Losa Maciza en concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI) (Esp. =0,20 mts)	M2		$ 282.094,80	$ -	25,10	$ 7.080.579,48		$ -		$ -	-	$ -	25,10	$ 7.080.579,48
INP-069	Placa de Contrapiso en concreto de 21,0 Mpa (3.000 PSI) (Esp. =0,10 mts)	M2		$ 123.955,00	$ -	11,95	$ 1.481.262,25		$ -		$ -	-	$ -	11,95	$ 1.481.262,25
INP-070	Concreto Para Zapatas en Concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI)	M3		$ 1.306.474,00	$ -	1,20	$ 1.567.768,80		$ -		$ -	-	$ -	1,20	$ 1.567.768,80
INP-071	Concreto Para Vigas de Amarre en Concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI)	M3		$ 1.319.474,00	$ -	1,56	$ 2.058.379,44		$ -		$ -	-	$ -	1,56	$ 2.058.379,44
INP-072	Alfajias en Concreto de 3.000 psi de 0,20 x 0,08 mts	M		$ 81.731,00	$ -	3,50	$ 286.058,50		$ -		$ -	-	$ -	3,50	$ 286.058,50
INP-073	Impermeabilizacion con Manto asfaltico y foil de aluminio	M2		$ 110.916,00	$ -	38,45	$ 4.264.720,20		$ -		$ -	-	$ -	38,45	$ 4.264.720,20
INP-074	Muro en Bloque Vibrado Abuzardado por Una Cara de 0,15 mts	M2		$ 163.579,00	$ -	31,74	$ 5.191.997,46		$ -		$ -	-	$ -	31,74	$ 5.191.997,46
INP-075	Pañete de Muro en Mortero 1:4	M2		$ 29.705,00	$ -	31,74	$ 942.836,70		$ -		$ -	-	$ -	31,74	$ 942.836,70
INP-076	Estuco Normal Para Muros Internos	M2		$ 29.146,00	$ -	31,74	$ 925.094,04		$ -		$ -	-	$ -	31,74	$ 925.094,04
INP-077	Pintura Tipo 1 Vinilo Para Muros Internos	M2		$ 27.105,00	$ -	31,74	$ 860.312,70		$ -		$ -	-	$ -	31,74	$ 860.312,70
INP-078	Suministro e Instalacion de Puerta en Aluminio Doble de 4,80 x 3,0, para cuarto electrico, incluye bisagras y cerradura de seguridad	UN		$ 8.126.079,00	$ -	1,00	$ 8.126.079,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.126.079,00
INP-079	Construccion Bajante en Tuberia de Aguas Lluvias PVC de 4"	UN		$ 240.916,00	$ -	1,00	$ 240.916,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 240.916,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-080	Caja para válvulas de ventosa en mamposteria de 0,70mx0,70m, tapa y fondo en concreto según plano de detalle	UN		$ 1.446.490,50	$ -	1,00	$ 1.446.490,50		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.446.490,50
Subtotal					$ -		$ 50.793.032,03		$ -		$ -	-	$ -		$ 50.793.032,03
8	**OTRAS ACTIVIDADES**														
INP-081	Empalme de Tuberia PEAD Impulsion a EBAR Norte	UN		$ 4.525.105,00	$ -	1,00	$ 4.525.105,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.525.105,00
INP-082	Tramites Ante Operador de Red	GLB		$ 16.588.000,00	$ -	1,00	$ 16.588.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 16.588.000,00
INP-083	Certificacion RETIE	GLB		$ 19.604.000,00	$ -	1,00	$ 19.604.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 19.604.000,00
Subtotal					$ -		$ 40.717.105,00		$ -		$ -	-	$ -		$ 40.717.105,00
11	**ESTACION DE BOMBEO**														
INP-084	Suministro e Instalacion Estacion de Bombeo de Aguas Residuales fabricada en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de geometria cilindrica con sus respectivos refuerzos metalicos para garantizar su estabilidad estructural de Diametro: 2,0m y Altura: 3,98m. Incluye Sistema de Cribado de finos fabricada en PRFV, sistema para el izaje de las bombas y lastre en concreto simple de 3000 PSI para control de flotacion. Teniendo en cuenta las presiones y subpresiones que sera sometida la EBAR contara con un espesor de transicion en la parte inferior de 12 mm	UN		$ 338.908.247,60	$ -	1,00	$ 338.908.247,60	1,00	$ 338.908.247,60		$ -	1,00	$ 338.908.247,60	-	$ -
INP-085	Suministro e Instalación Caja de Valvulas fabricada en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de geometria paralelepipedal con sus respectivos refuerzos metálicos para garantizar su estabilidad estructural de Largo: 1,4m, Ancho: 1,3m y Altura: 0,8m	UN		$ 34.692.840,00	$ -	1,00	$ 34.692.840,00	1,00	$ 34.692.840,00		$ -	1,00	$ 34.692.840,00	-	$ -
INP-086	Construcción e instalación múltiple de la impulsión en A.C. para dos bombas sumergibles. Incluye instalación de niples de 150 mm en A.C. ; 2 Yee de Ø200mm x 150 mm en A.C. ;2 codos de A.C. Ø150x90° ;2 codos de A.C. Ø150x45° ; 2 válvulas de guillotina A.C. BxB Ø100, 2 válvulas de retención A.C. BxB Ø150, 2 uniones de desmontaje Ø150. Incluye soldadura, cortes, pintura anticorrosiva y de acabado, todos los pernos, tuercas y empaques necesarios	UN		$ 16.380.000,00	$ -	1,00	$ 16.380.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 16.380.000,00
INP-087	Suministro e Instalacion de Bomba sumergible para aguas residuales con impulsor autolimpiante tipo N. Ideal para bombeo de aplicaciones con agua residual, agua de proceso y cruda. Instalación Semi permanente con codo de descarga anclado al fondo de la estación de bombeo. Motor sumergible eléctrico conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz., con potencia de rateo de 20 hp, corriente nominal de 79A @ 460 VAC, factor de potencia a plena carga 0.91 y eficiencia a plena carga 93.9%. Punto de operación 47.09 L/s, a 21,44 m. Carcaza del motor y de la bomba, Impulsor en hierro endurecido Hard Iron. Aza de izaje, tornillos, tuercas en acero inoxidable AISI 316L y Eje enacero inoxidable AISI 431. (Estos son datos de referencia. La bomba a instalar debe cumplir como mínimo con las mismas condiciones hidráulicas y de eficiencia)	UN		$ 153.153.000,00	$ -	2,00	$ 306.306.000,00	2,00	$ 306.306.000,00		$ -	2,00	$ 306.306.000,00	-	$ -
	RED DE MEDIA TENSION														

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-088	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 mts - 1050 Kg, incluida base autosoportada, cimentación	UN		$ 6.045.000,00	$ -	1,00	$ 6.045.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.045.000,00
INP-089	Apertura de hueco para poste MT y estabilización de terreno con alto nivel freatico de acuerdo a normativa AIR-E	UN		$ 2.168.004,80	$ -	2,00	$ 4.336.009,60		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.336.009,60
INP-090	Hormigonado de poste de 12x1050 kgF al 100% según normativa de AIR-E	UN		$ 1.225.541,20	$ -	1,00	$ 1.225.541,20		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.225.541,20
INP-091	Suministro e instalación de poste de BT 9x1050KgF	UN		$ 7.921.019,60	$ -	1,00	$ 7.921.019,60		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.921.019,60
INP-092	Hormigonado de poste de 9x1050 kgF al 100% según normativa de AIR-E	UN		$ 830.733,80	$ -	1,00	$ 830.733,80		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 830.733,80
INP-093	Suministro e instalacion de armado MT 131 de acuerdo a la normativa de AIR-E	UN		$ 5.528.954,60	$ -	1,00	$ 5.528.954,60		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.528.954,60
INP-094	Suministro e instalacion de retenida aerea	UN		$ 2.590.541,20	$ -	1,00	$ 2.590.541,20		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.590.541,20
INP-095	Suministro e instalacion de cadena de amarre norma AIR-E	UN		$ 4.970.136,60	$ -	2,00	$ 9.940.273,20		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 9.940.273,20
INP-096	Suministro e instalación de pararrayos Tipo Polimencos de 12 KV - 10 KA oxidometalicos aterrizados Homologados. (3 unidades para punto de conexión y 3 para instalación de transformador)	UN		$ 1.045.616,00	$ -	6,00	$ 6.273.696,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 6.273.696,00
INP-097	Suministro e instalación de cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 200 A Con sus fusibles Norma AIR-E	UN		$ 1.361.692,80	$ -	6,00	$ 8.170.156,80		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 8.170.156,80
INP-098	Suministro e instalación de puentes primarios en caliente en cable de Al. incluido conector bimetalico de pistola, etc acorde a normativa AIR-E. En los puntos de conexión	UN		$ 3.748.885,40	$ -	1,00	$ 3.748.885,40		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.748.885,40
INP-099	Suministro e instalación de equipo de medida nivel II, consistente en 3 TC y 3 TP. Caja de medidor, bloque de prueba, cableado de señales, fexconduits y demas accesorios. Avalado por A-IRE incluye certificados de calibracion y pruebas.	UN		$ 87.162.400,00	$ -	1,00	$ 87.162.400,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 87.162.400,00
INP-100	Suministro e instalacion cable 123AAAC 3F	ML		$ 139.430,20	$ -	50,00	$ 6.971.510,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 6.971.510,00
INP-101	Desmonte de poste de BT existente	UN		$ 1.568.320,00	$ -	1,00	$ 1.568.320,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.568.320,00
INP-102	Suministro e instalación de transformador Trifasico en aceite 45 KVA 13200/440 V,bobina en cobre. Tipo poste convencional en aceite. Tpo de refrigeración ONAN Nota. Remitirse a especificaciones tecnicas.	UN		$ 65.402.911,60	$ -	1,00	$ 65.402.911,60		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 65.402.911,60
	EQUIPOS Y ACCESORIOS BAJA TENSIÓN														
INP-103	Suministro e Instalacion de registro de baja tensión tipo SB325 norma AIR-E con tapa e impermebilizado.	UN		$ 11.406.512,00	$ -	3,00	$ 34.219.536,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 34.219.536,00
INP-104	Suministro e instalación de alimentador de Trafo a Transferecia 4 x 1/0THHN Cu	ML		$ 673.176,40	$ -	65,00	$ 43.756.466,00		$ -		$ -	-	$ -	65,00	$ 43.756.466,00
INP-105	Suministro e instalación de alimentador de Planta a Transferencia 4 x 1/0THHN Cu en ducto EMT 3"	ML		$ 1.139.676,20	$ -	8,00	$ 9.117.409,60		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 9.117.409,60
INP-106	Cruce con Topo Para Tuberia De 2x3" PVC- Cruce VIA	ML		$ 1.764.360,00	$ -	12,00	$ 21.172.320,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 21.172.320,00
INP-107	Suministro e Instalacion De Tuberia PVC 2X3"	ML		$ 113.178,00	$ -	30,00	$ 3.395.340,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 3.395.340,00
INP-108	Excavación manual de terreno de 60X40X50	ML		$ 137.529,60	$ -	30,00	$ 4.125.888,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 4.125.888,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-109	Suministro e instalación de bajante en baja tension para acometida principal en tuberia IMC 3"	UN		$ 3.798.571,40	$ -	1,00	$ 3.798.571,40		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.798.571,40
INP-110	Suministro e instalacion de acometidas desde tablero general a transferencia a CCM en cable monopolar THHN de Cu AWG 4N 2(F) + 6(T) a 600 V - 90° aislamiento, incluye tuberia IMC de 2" a 2 mts de longitud, accesorios para fijacion en piso, pared. Conectores bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijacion etc, marcacion acorde a RETIE.	ML		$ 371.818,20	$ -	6,00	$ 2.230.909,20		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.230.909,20
INP-111	Suministro e Instalación de acometidas desde salida de CCM a cada una de las bombas (2 UND) en cable encauchetado 4x8 como conduletas, incluye tuberia IMC 3/4" por 3 metros de longitud, flexiconduit 3/4" tipo coraza, cinta de señalizacion, conectores bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijacion y conexión etc, marcacion acorde a RETIE.	ML		$ 261.079,00	$ -	16,00	$ 4.177.264,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.177.264,00
INP-112	Suministro e Instalación de centro de control de motores 25A - 440 V 60Hz, arrancador suave, luces de indicación, perillas de manual y automatico, visor de parametros, parada de emergencia, botoneras. Incluye certifcado de producto RETIE. Para dos bombas de 25HP	UN		$ 60.257.600,00	$ -	1,00	$ 60.257.600,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 60.257.600,00
INP-113	Suministro e Instalación de tablero general + transferencia automatica autosoportado de (40-100A) ajustable - 440 V 60Hz con contactores trifasicos. Incluye modulo supervisor y protecciones acorde a plano unifilar Incluye certificado de producto RETIE. En lamina galvanizada, color RAL 7030, perilla de uso manual y automatico, analizador de redes para visualizacion de parametros, perilla de red, planta. protección de 50 amp para salida a CCM bombas, protección de 20 amp para salida a transformador seco de 5KVA y. DPS incluido tipo 1+2.	UN		$ 39.592.800,00	$ -	1,00	$ 39.592.800,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.592.800,00
INP-114	Suministro e Instalación de malla de tierra conformada por cuatro varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2/0 empleando soldadura caldweld 115 gr de acuerdo a especificaciones. Incluye 1 registros de inspeccion, barra a tierra equipotencial para conexion.	GLB		$ 14.476.800,00	$ -	1,00	$ 14.476.800,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 14.476.800,00
INP-115	Sumisnitro e Instalación de transformador trifasico seco de 5kva encapsulado, en cobre. Incluye soportes tipo pie amigo, instalador soportado en muro. Aislamiento en resina. Baja - baja 440/220/127	UN		$ 7.841.600,00	$ -	1,00	$ 7.841.600,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.841.600,00
	GRUPO ELECTROGENO														
INP-116	Suministro e Instalacion de planta eléctrica de 35.2kw nominales (standby) - 45kva(Prime) a 440vac. Incluye filtros, precalentador de camisas, breaker, flexible y acoples para el sistema de escape, silenciador, tanque sub-base de 500 litros para una autonomia de 6.9 horas.Incluye: cabina de insonorización en lámina galvanizada (atenuación 75 db a 7m) y acople a planta eléctric, incluye cable de señal 3x16	UN		$ 208.717.600,00	$ -	1,00	$ 208.717.600,00	1,00	$ 208.717.600,00		$ -	1,00	$ 208.717.600,00	-	$ -
INP-117	Suministro e Instalacion de juego de baterias libres de mantenimiento	JUEGO		$ 5.278.000,00	$ -	1,00	$ 5.278.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.278.000,00
INP-118	Suministro e Instalacion de cargador de Baterias tipo industrial	UN		$ 3.770.000,00	$ -	1,00	$ 3.770.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.770.000,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-119	Suministro e Instalacion de tuberia de Combustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida	GLB		$ 2.865.200,00	$ -	1,00	$ 2.865.200,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.865.200,00
INP-120	Suministro e Instalacion de tanque de combustible externo con capacidad para 100 galones para una autonomia adicional de 4 horas - en conjunto con el tanque base de la planta se genera una autonomia de 12 horas al 75% de la carga nominal según ficha técnica. Incluye instalación y tuberia de suministro o retorno	UN		$ 9.635.600,00	$ -	1,00	$ 9.635.600,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.635.600,00
	ACOMETIDAS ELECTRICAS a 220 V ac														
INP-121	Suministro e instalación de tablero de distribucion trifásico de 12 ctos con tapa y espacio para totalizador de 3x30amp, incluye breakers termomagneticos, 2 breakers de 1X20 A y 1 breakers de 2X20 A 1 breakers de 3X30 enchufables Incluye señalizacion y marcacion acordea RETIE	UN		$ 3.620.554,60	$ -	1,00	$ 3.620.554,60		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.620.554,60
INP-122	Suministro e instalación de acometidas desde la salida de transformador baja lado 220V hasta tablero de distribución en cable THHN calibre AWG 3*No 10 (F) +1N°10(N) + 1*No 10(T) de 600V aislamiento, incluye tuberia IMC 3/4" por 3 metros de longitud, flexiconduit de 3/4" tipo coraza, conectores, terminales bimetalicos 3M, cintas. Marcacion acorde a RETIE	ML		$ 155.740,00	$ -	7,00	$ 1.090.180,00		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 1.090.180,00
INP-123	Suministro e instalación de salida electrica monofasica 110 V para lampara de emergencia, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios, marcacion acorde a RETIE. No incluye lampara de emergencia	UN		$ 526.292,00	$ -	2,00	$ 1.052.584,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.052.584,00
INP-124	Suministro e instalación de salida electrica monofasica para iluminacion 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios, incluye 2 mts de cable encauhetado 3*14. Marcacion acorde a RETIE. No incluye luminaria	UN		$ 526.292,00	$ -	5,00	$ 2.631.460,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.631.460,00
INP-125	Suministro e instalación de salida electrica monofasica para interruptor sencillo 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios. Marcacion acorde a RETIE	UN		$ 289.536,00	$ -	1,00	$ 289.536,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 289.536,00
INP-126	Suministro e instalación de salida electrica monofasica para toma 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios, marcacion acorde a RETIE	UN		$ 546.499,20	$ -	3,00	$ 1.639.497,60		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.639.497,60
INP-127	Suministro e instalación de luminaria hermetica cerrada tipo LED 2*18 W. 120 Vac	UN		$ 325.728,00	$ -	5,00	$ 1.628.640,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.628.640,00
INP-128	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo LED 2 6 W	UN		$ 292.552,00	$ -	2,00	$ 585.104,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 585.104,00
	SUMINISTRO DE TELEMANDO Y TELECONTROL														
INP-129	Suministro e instalación de tablero en acero inoxidable para automatización y control remoto para monitoreo y maniobra del sistema (Incluye PLC modulo de salidas y entradas digitales con sistema de control via WEB server)	UN		$ 60.257.600,00	$ -	1,00	$ 60.257.600,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 60.257.600,00

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-130	Suministro e instalación de controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura max de 8 mts, salida 4-20 mA. Proteccion IP68 Marca VEGA equipo modular, incluye cable de 10m	UN		$ 30.110.100,80	$ -	1,00	$ 30.110.100,80		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.110.100,80
INP-131	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios de fijacion	ML		$ 54.891,20	$ -	7,00	$ 384.238,40		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 384.238,40
INP-132	Suministro e Instalacion de UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento de 1,5kva	UN		$ 7.004.961,60	$ -	1,00	$ 7.004.961,60		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.004.961,60
Subtotal					**$ -**		**$ 1.502.726.401,80**		**$ 888.624.687,60**		**$ -**		**$ 888.624.687,60**		**$ 614.101.714,20**
TOTAL OBRA CIVIL IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")					**$ -**		**$ 1.665.277.133,78**		**$ 888.624.687,60**		**$ -**		**$ 888.624.687,60**		**$ 776.652.446,18**
	SUMINISTROS														
INP-133	Codo de descarga estacionario de 4", bridado bajo norma ANSI B16.1-89 tabla 5, en fundición de hierro. Contacto metal - metal con la voluta. No requiere empaque. Kit de anclaje codo de descarga	UN		$ 3.464.678,88	$ -	2,00	$ 6.929.357,75		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.929.357,75
INP-134	Ampliación AC BxB ISO PN10, 100mm x 160mm	UN		$ 1.118.658,80	$ -	2,00	$ 2.237.317,60		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.237.317,60
INP-135	Portaflanche con Brida PEAD 160mm PE100 PN10	UN		$ 1.073.484,72	$ -	7,00	$ 7.514.393,04		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 7.514.393,04
INP-136	Codo de 90° PEAD, 160 mm PE100 PN10	UN		$ 1.148.639,63	$ -	3,00	$ 3.445.918,88		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 3.445.918,88
INP-137	Niple PEAD, 150 mm PN10 2.0 m < L >3.0 m	UN		$ 1.285.646,25	$ -	2,00	$ 2.571.292,50		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.571.292,50
INP-138	Válvula cheque AC, 150 mm Brida x Brida ISO PN10	UN		$ 4.554.249,12	$ -	2,00	$ 9.108.498,25		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 9.108.498,25
INP-139	Válvula de compuerta AC, 150 mm B x B ISO PN10	UN		$ 3.349.129,00	$ -	2,00	$ 6.698.258,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.698.258,00
INP-140	Unión de desmontaje auto portante 150 mm ISO PN10	UN		$ 1.557.314,50	$ -	2,00	$ 3.114.629,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.114.629,00
INP-141	Tee de PEAD PE100 PN 10, de 160 mm x 160 mm	UN		$ 1.236.864,39	$ -	1,00	$ 1.236.864,39		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.236.864,39
INP-142	Niple PEAD, 150 mm PN10 0.20 m < L >0.50 m	UN		$ 994.573,13	$ -	1,00	$ 994.573,13		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 994.573,13
INP-143	Ampliación AC BxB ISO PN10, 160mm x 200mm	UN		$ 2.206.351,88	$ -	1,00	$ 2.206.351,88		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.206.351,88
INP-144	Portaflanche con Brida PEAD 200mm PE100 PN10	UN		$ 1.152.098,50	$ -	1,00	$ 1.152.098,50		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.152.098,50
INP-145	Tubería PEAD 200mm PN 10 PE 100	m		$ 256.146,70	$ -	525,00	$ 134.477.014,88		$ -		$ -	-	$ -	525,00	$ 134.477.014,88
INP-146	Válvula Ventosa Antifraude, doble cámara, triple acción. Bridada d=50 mm (2")	UN		$ 2.232.883,21	$ -	1,00	$ 2.232.883,21		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.232.883,21
INP-147	Codo de PEAD 200mm X 90° Curva Segmentada	UN		$ 1.047.003,81	$ -	3,00	$ 3.141.011,42		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 3.141.011,42
INP-148	Codo de PEAD 200mm X 45° Curva Segmentada	UN		$ 1.075.751,16	$ -	3,00	$ 3.227.253,49		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 3.227.253,49
INP-149	Portaflanche con Brida de PEAD Diámetro 63mm	UN		$ 1.088.689,70	$ -	1,00	$ 1.088.689,70		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.088.689,70
INP-150	Tee en AC de 8" x 2", B x B	UN		$ 2.238.813,71	$ -	1,00	$ 2.238.813,71		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.238.813,71
INP-151	Portaflanche con Brida PEAD 200mm PE100 PN10	UN		$ 1.339.698,50	$ -	2,00	$ 2.679.397,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.679.397,00
Subtotal					**$ -**		**$ 196.294.616,30**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**	-	**$ 196.294.616,30**

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TOTAL SUMINISTROS DE BELLAVISTA					$ -		$ 196.294.616,30		$ -		$ -		$ -		$ 196.294.616,30

TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		$ 1.665.277.133,78	$ 888.624.687,60	$ -	$ 888.624.687,60	$ 776.652.446,18
AIU (30%)		$ 384.294.723,18	$ 205.067.235,60	$ -	$ 205.067.235,60	$ 179.227.487,58
TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		**$ 1.665.277.133,78**	**$ 888.624.687,60**	**$ -**	**$ 888.624.687,60**	**$ 776.652.446,18**
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE MPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		$ 196.294.616,30	$ -	$ -	$ -	$ 196.294.616,30
A (17.25%)		$ 28.879.165,30	$ -	$ -	$ -	$ 28.879.165,30
TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		**$ 196.294.616,30**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 196.294.616,30**
VALOR TOTAL		**$ 1.861.571.750,08**	**$ 888.624.687,60**	**$ -**	**$ 888.624.687,60**	**$ 972.947.062,48**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8	OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO														
INP-152	Suministro e instalacion de Pluvial en concreto reforzado de Diametro 68"	ML		$ 8.955.375,00	$ -	149,20	$ 1.336.141.950,00		$ -		$ -	-	$ -	149,20	$ 1.336.141.950,00
INP-153	Construcción de Caja de Inspección en Concreto de 4.000 psi de 4.5m x 4.5m, Profundidad 1,80 < H ≤ 2,20m	UN		$ 34.428.800,90	$ -	2,00	$ 68.857.601,80		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 68.857.601,80
INP-154	Suministro e Instalacion de Válvula de retención en linea CheckMate UltraFlex de 68" incluye camisa en elastomero de alta densidad	UN		$ 211.108.677,00	$ -	2,00	$ 422.217.354,00	2,00	$ 422.217.354,00		$ -	2,00	$ 422.217.354,00	-	$ -
INP-155	Construcción de sumidero longitudinales en concreto impermeabilizado de 4000 psi, ancho 0.90m profundidad 0.50m incluye formaleta, tapa en concreto con marco metálico de 1 1/2"	M3		$ 1.619.280,00	$ -	17,71	$ 28.677.448,80		$ -		$ -	-	$ -	17,71	$ 28.677.448,80
INP-156	Construccion de sumidero de ventana en concreto impermeabilizado de 4000 psi, incluye acero de refuerzo, formaleta, tapa en concreto con marco metálico de 1 1/2"	UN		$ 8.879.552,50	$ -	3,00	$ 26.638.657,50		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 26.638.657,50
INP-157	Concreto impermeabilizado de 5000 psi, para cabezal de descarga	M3		$ 1.925.001,00	$ -	5,77	$ 11.107.255,77		$ -		$ -	-	$ -	5,77	$ 11.107.255,77
INP-158	Suministro e Instalacion de Criba en Acero Inoxidable de 3,8m x 1,9m	UN		$ 42.237.000,00	$ -	1,00	$ 42.237.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 42.237.000,00
INP-159	Suministro e instalación de Rejilla metalica de Captación de 0,5 m x 1 m para trafico pesado	UN		$ 9.076.366,00	$ -	5,00	$ 45.381.830,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 45.381.830,00
Subtotal					$ -		$ 1.981.259.097,87		$ 422.217.354,00		$ -		$ 422.217.354,00		$ 1.559.041.743,87

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE:TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
PERIODO DEL ACTA:	DEL 30 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N° 10 de Fecha: 18 de Febrero de 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TOTAL OBRA CIVIL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C					$ -		$ 1.981.259.097,87		$ 422.217.354,00		$ -		$ 422.217.354,00		$ 1.559.041.743,87

TOTAL COSTO - PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C		$ 1.981.259.097,87	$ 422.217.354,00	$ -	$ 422.217.354,00	$ 1.559.041.743,87
AIU (30%)		$ 457.213.637,97	$ 97.434.774,00	$ -	$ 97.434.774,00	$ 359.778.863,97
TOTAL COSTO - PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C		**$ 1.981.259.097,87**	**$ 422.217.354,00**	**$ -**	**$ 422.217.354,00**	**$ 1.559.041.743,87**
VALOR TOTAL		**$ 1.981.259.097,87**	**$ 422.217.354,00**	**$ -**	**$ 422.217.354,00**	**$ 1.559.041.743,87**

VALOR TOTAL CENTRO HISTÓRICO	$ 15.112.083.312,10	$ 27.727.732.529,80	$ 15.732.741.269,06	$ 889.101.080,15	$ 16.621.842.349,21	$ 11.105.890.180,58
VALOR TOTAL COLECTOR BELLAVISTA	$ 9.378.532.846,23	$ 12.982.353.777,98	$ 11.746.003.019,63	$ -	$ 11.746.003.019,63	$ 1.236.350.758,35
TOTAL OBRAS	**$ 24.490.616.158,33**	**$ 40.710.086.307,78**	**$ 27.478.744.288,69**	**$ 889.101.080,15**	**$ 28.367.845.368,85**	**$ 12.342.240.938,93**
VALOR TOTAL IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		$ 1.861.571.750,08	$ 888.624.687,60	$ -	$ 888.624.687,60	$ 972.947.062,48
VALOR TOTAL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C		$ 1.981.259.097,87	$ 422.217.354,00	$ -	$ 422.217.354,00	$ 1.559.041.743,87
TOTAL OBRAS ADICIONALES	**$ -**	**$ 3.842.830.847,95**	**$ 1.310.842.041,60**	**$ -**	**$ 1.310.842.041,60**	**$ 2.531.988.806,35**
VALOR TOTAL	**$ 24.490.616.158,33**	**$ 44.552.917.155,73**	**$ 28.789.586.330,29**	**$ 889.101.080,15**	**$ 29.678.687.410,45**	**$ 14.874.229.745,28**

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido;

CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
CONSORCIO COLECTORES FGP
Representante legal
Contratista

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
ARINCO S.A.S.
Representante legal
Interventor

LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO
Gerente de Infraestructura
Supervisor del Contrato

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 1.1	Actividad:	Localización, Trazado y Replanteo.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA			
23	2	2026		Descripcion:	1 PRELIMINARES (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50					ML	18,50
						SUB TOTAL		18,50
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		368,32
						TOTAL		386,82

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	CONSORCIO COLECTORES FGP INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS		ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
23	2	2026	

ITEM:	2.1	Actividad:	Soporte para Cinta Demarcadora.
Descripcion:			2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"				18,00		UN	18,00
							SUB TOTAL	18,00
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	714,00
							TOTAL	732,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023			
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	ITEM: 2.2	Actividad:	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.
23	2	2026		Descripcion:		2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

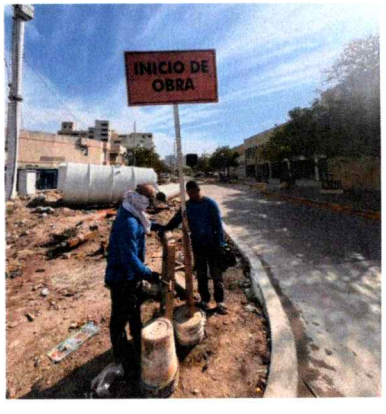
FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50			2,00		ML	37,00
						SUB TOTAL		37,00
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.508,30
						TOTAL		1.545,30

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 2.3	Actividad:	Valla móvil - Tipo 4.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"				4,00		UN	4,00
						SUB TOTAL		4,00
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		56,00
						TOTAL		60,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	INP-051	Actividad:	Suministro e Instalacion de Cerramiento en Lona Verde, Altura 2,1 mts
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:			2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026					

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Zona EBAR Norte - Tuberia Sanitaria de 42"	8,16					ML	8,16
		17,95					ML	17,95
		15,20					ML	15,20
						SUB TOTAL		41,31
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		510,40
						TOTAL		551,71

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
23	2	2026	

ITEM:	INP-054	Actividad:	Maletines o barreras plasticas con medidas de 2 metros de largo, 1 metro de alto, base de 50 cm
Descripcion:			2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"				4,00		UN	4,00
							SUB TOTAL	4,00
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	20,00
							TOTAL	24,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	4.1	Actividad:	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026					

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Excavacion Para Tuberia de 42"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	0,30			M3	22,20
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			0,30		383,40	M3	115,02
						SUB TOTAL		137,22
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.941,01
						TOTAL		2.078,23

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR	
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	
23	2	2026		

ITEM:	4.2	Actividad:	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
Descripcion:			4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Excavacion Para Tuberia de 42"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	2,40			M3	177,60
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			2,20		383,40	M3	843,48
	De la Rotonda a Zona Cerca Oficinas de Puerto Por Toda la Carrera 1C - Estabilizacion Terreno			1,55		335,24	M3	519,62
				1,30		296,30	M3	385,19
				0,90		95,42	M3	85,88
						SUB TOTAL		2.011,77
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		6.683,85
						TOTAL		8.695,62

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	4.3	Actividad:	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026					

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Excavacion Para Tuberia de 42"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	1,65			M3	122,10
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			1,10		383,40	M3	421,74
						SUB TOTAL		543,84
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.336,89
						TOTAL		1.880,73

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 4.4	Actividad:	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Cargue, Retiro y Disposición Final de material proveniente de Excavacion Manual Para Tuberia de 42"							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	0,30			M3	22,20
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			0,30		383,40	M3	115,02
	Cargue, Retiro y Disposición Final de material proveniente de Excavacion Mecánica Para Tuberia de 42"							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	2,40			M3	177,60
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			2,20		383,40	M3	843,48
	De la Rotonda a Zona Cerca Oficinas de Puerto Por Toda la Carrera 1C - Estabilizacion Terreno			1,55		335,24	M3	519,62
				1,30		296,30	M3	385,19
				0,90		95,42	M3	85,88
	Cargue, Retiro y Disposición Final de material proveniente de Excavacion Mecánica en Roca Para Tuberia de 42"							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	1,65			M3	122,10
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			1,10		383,40	M3	421,74
							SUB TOTAL	2.692,83
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	12.586,17
							TOTAL	15.279,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 4.5	Actividad:	Manejo de Aguas Freáticas.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Cantidad	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42" - (Zona de EBAR por problemas de estabilidad)	18,50			31,00		ML	573,50
						SUB TOTAL		573,50
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		4.362,78
						TOTAL		4.936,28

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023			
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	ITEM: 4.6	Actividad:	Manejo de Aguas Residuales.
23	2	2026		Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Cantidad	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42" - (Zona de EBAR por problemas de estabilidad)	18,50			31,00		ML	573,50
						SUB TOTAL		573,50
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		4.924,29
						TOTAL		5.497,79

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR	
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
23	2	2026	

ITEM:	4.7	Actividad:	Entibado Metálico Continuo.
Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Cantidad	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42" - (Zona de EBAR por problemas de estabilidad)	18,50	4,40		6,00		M2	488,40
						SUB TOTAL		488,40
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		8.755,91
						TOTAL		9.244,31

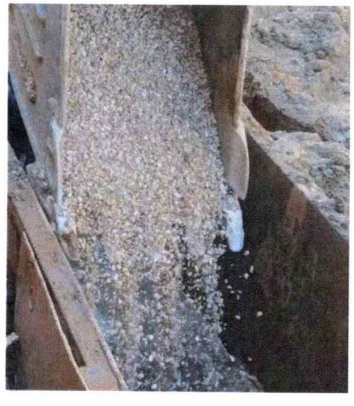
OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	5.1	Actividad:	Cimentación de Tubería con Material Granular.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA				
23	2	2026		Descripcion:	5 LLENOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)		

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Descuento de Tuberia	UND	TOTAL
	**Instalacion de Tuberia de 42"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	2,30	2,30		16,54	M3	81,33
						SUB TOTAL		81,33
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.406,78
						TOTAL		1.488,11

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	5.2	Actividad: Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	5 LLENOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Instalacion de Tuberia de 43"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	4,00	4,25			M3	314,50
	Zona de EBAR por problemas de estabilidad			3,50		383,40	M3	1.341,90
	De la Rotonda a Zona Cerca Oficinas de Puerto Por Toda la Carrera 1C - Estabilizacion Terreno			1,55		335,24	M3	519,62
				1,30		296,30	M3	385,19
				0,90		95,42	M3	85,88
						SUB TOTAL		2.647,09
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		7.343,58
						TOTAL		9.990,67

OBSERVACIONES:

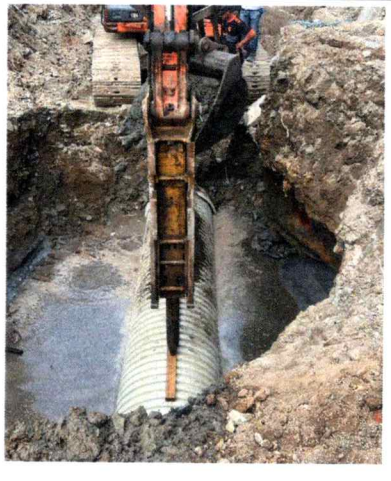
	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
23	2	2026	

ITEM:	6.17	Actividad:	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42".
Descripcion:			6 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50					ML	18,50
						SUB TOTAL		18,50
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		267,58
						TOTAL		286,08

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	8.11	Actividad:	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 2,00 m, Profundidad 4,50m < H ≤ 6,00m.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:			8 OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026					

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme				1,00		UN	1,00
	SUB TOTAL							1,00
	VIENE DE CORTES ANTERIORES							1,00
	TOTAL							2,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	INP-002	Actividad:	Acero de Refuerzo de 60.000PSI
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	8 OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)		
23	2	2026					

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Cantidad Elemento (Un)	Cantidad Tramos (UN)	Cantidad Kg/ M2-Diametro de 1/2" y Kg/ML	UND	TOTAL
	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto - Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme	3,20		68,00		0,996	KG	216,73
		6,25		48,00		0,996	KG	298,80
		4,70		46,00		0,996	KG	215,34
		3,85		42,00		0,996	KG	161,05
		1,20		38,00		0,996	KG	45,42
							SUB TOTAL	937,34
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	26.244,97
							TOTAL	27.182,31

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	INP-034	Actividad: Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		8 OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

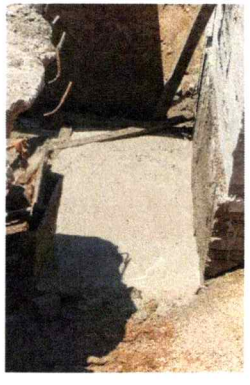
FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Instalacion de Tuberia de 42"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Sanitaria de 42"	18,50	2,30		4,00	170,20	M2	170,20
	Instalacion de Tuberia de 24"							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalme - Tuberia Impulsion de 24"	20,30	1,70		4,00	138,04	M2	138,04
						SUB TOTAL		308,24
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		8.385,27
						TOTAL		8.693,51

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	9.1	Actividad:	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI).
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		9 OTRAS ACTIVIDADES (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026					

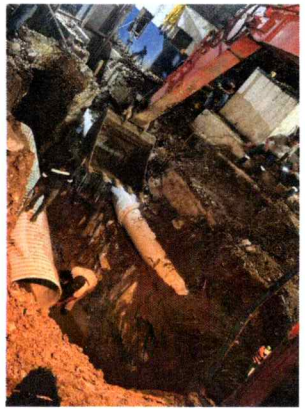
FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Instalacion de Tuberia de 42"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalmes - Tuberia Sanitaria de 42"	1,60	1,30	1,60	2,00		M3	6,66
							SUB TOTAL	6,66
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	48,16
							TOTAL	54,82

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023			
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	ITEM: 10	Actividad:	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42"
23	2	2026		Descripcion:		SUMINISTROS (COLECTOR CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tuberia Sanitaria de 42" - Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Sanitaria Empalmes	18,50					ML	18,50
							SUB TOTAL	18,50
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	267,58
							TOTAL	286,08

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023			
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	ITEM: 4.1	Actividad:	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
23	2	2026		Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Excavacion Para Tuberia de 24"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	0,50			M3	28,72
						SUB TOTAL		28,72
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		771,67
						TOTAL		800,39

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 4.2	Actividad:	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Excavacion Para Tuberia de 24"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	1,10			M3	63,19
							SUB TOTAL	63,19
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	1.492,50
							TOTAL	1.555,69

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 4.3	Actividad:	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	**Excavacion Para Tuberia de 24"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	0,90			M3	51,70
							SUB TOTAL	51,70
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	541,09
							TOTAL	592,79

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
23	2	2026	

ITEM:	4.4	Actividad:	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.
Descripcion:			4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO



LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
	Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
Cargue, Retiro y Disposición Final de material proveniente de Excavacion Manual Para Tuberia de 24"							
Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	0,50			M3	28,72
Cargue, Retiro y Disposición Final de material proveniente de Excavacion Mecanica Material Comun Para Tuberia de 24"							
Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	1,10			M3	63,19
Cargue, Retiro y Disposición Final de material proveniente de Excavacion Mecanica en Roca Para Tuberia de 24"							
Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	0,90			M3	51,70
						SUB TOTAL	143,62
						VIENE DE CORTES ANTERIORES	3.180,50
						TOTAL	3.324,12

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 4.5	Actividad:	Manejo de Aguas Freáticas.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	Area	Cantidad	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30				4,00	ML	81,20
						SUB TOTAL		81,20
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.422,78
						TOTAL		1.503,98

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023			
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	ITEM: 4.6	Actividad:	Manejo de Aguas Residuales.
23	2	2026		Descripcion:		4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)

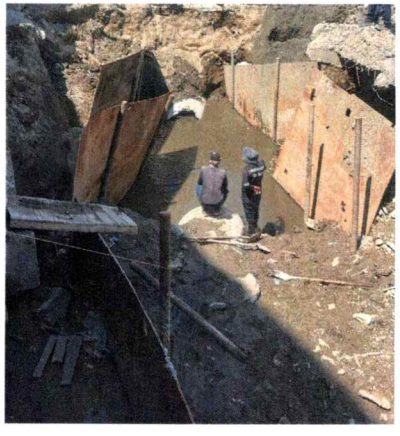
FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	Area	Cantidad	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30				4,00	ML	81,20
						SUB TOTAL		81,20
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.422,78
						TOTAL		1.503,98

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 4.7	Actividad:	Entibado Metálico Continuo.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	4 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Cantidad	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,50		2,00		M2	101,50
						SUB TOTAL		101,50
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		3.620,40
						TOTAL		3.721,90

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR
CONSORCIO COLECTORES FGP	CONSORCIO COLECTORES FGP — INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS		ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S. — ARINCO ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	5.1	Actividad:	Cimentación de Tubería con Material Granular.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	5 LLENOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)		
23	2	2026					

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Descuento de Tuberia	UND	TOTAL
	**Instalacion de Tuberia de 24"**							
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	1,70	1,70		5,92	M3	52,74
						SUB TOTAL		52,74
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.049,63
						TOTAL		1.102,37

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 5.2	Actividad:	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:	5 LLENOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)	
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30	2,83	2,50			M3	143,62
						SUB TOTAL		143,62
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		2.136,41
						TOTAL		2.280,03

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	IMP_6.2	Actividad: Instalación de Tubería de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		6 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30					ML	20,30
						SUB TOTAL		20,30
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		433,99
						TOTAL		454,29

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	IMP_6.4	Actividad: Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		6 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR							
	Niple Pasamuro de 24" L= 2,0 mts				2,00		UN	2,00
	Unión Brida por Acople Universal Ø=24"				1,00		UN	1,00
	Unión Desmontaje de Ø=24"				1,00		UN	1,00
							SUB TOTAL	4,00
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	31,00
							TOTAL	35,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	IMP_6.8	Actividad: Instalación de Válvula de Guillotina en HD, Ø=24" (600mm). E.B. x E.B.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		6 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR							
	Valvula de Guillotina de Ø=24"				1,00		UN	1,00
						SUB TOTAL		1,00
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		2,00
						TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 9.1	Actividad:	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI).
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		7 OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR - Tuberia de Impulsion de 24"	1,70	0,95	0,90			M3	1,45
							SUB TOTAL	1,45
							VIENE DE CORTES ANTERIORES	21,42
							TOTAL	22,87

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM:	IMP_7.6	Actividad: Construcción de Caja de Inspección en Concreto para Ventosa, 2.5m x 2.5m, Profundidad 1,60m < H ≤ 3,00m.
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		7 OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Caja Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR - Tuberia de Impulsion de 24"				1,00		UN	1,00
	SUB TOTAL							1,00
	VIENE DE CORTES ANTERIORES							6,00
	TOTAL							7,00

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
1 de 1		

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL No. 16

CONTRATISTA			INTERVENTOR			
CONSORCIO COLECTORES FGP			ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			
FECHA DE CORTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 006 - 2023	ITEM: 2	Actividad:	Tubería PVC-U Ø=24" RDE 21 PSI 200
D	M	A	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Descripcion:		SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO (IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO)
23	2	2026				

FOTO, ESQUEMA Y/O PLANO	LOCALIZACION	DIMENSIONES DE OBRA EJECUTADA						
		Largo (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	CANTIDAD	Area	UND	TOTAL
	Tramo Entrada a EBAR Norte a Caja Impulsion Dentro EBAR	20,30					ML	20,30
						SUB TOTAL		20,30
						VIENE DE CORTES ANTERIORES		1.180,02
						TOTAL		1.200,32

OBSERVACIONES:

	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS CONTRATISTA	Vo. Bo. INTERVENTORIA
1 de 1	ERWIN CASTRO SALGADO	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	1.1 COLECTOR CENTRO HISTÓRICO												
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	1.335,83	$ 3.850,00	$ 5.142.945,50	2.450,23	$ 9.433.385,50			$ -	$ -	2.450,23	$ 9.433.385,50
Subtotal					**$ 5.142.945,50**		**$ 9.433.385,50**			**$ -**	**$ -**		**$ 9.433.385,50**
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**												
2.1	Soporte para Cinta Demarcadora.	UN	594,00	$ 24.729,00	$ 14.689.026,00	1.675,00	$ 41.421.075,00			$ -	$ -	1.675,00	$ 41.421.075,00
2.2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.	ML	2.671,66	$ 942,00	$ 2.516.703,72	6.055,46	$ 5.704.243,32			$ -	$ -	6.055,46	$ 5.704.243,32
2.3	Valla móvil - Tipo 4.	UN	6,00	$ 250.396,00	$ 1.502.376,00	76,00	$ 19.030.096,00			$ -	$ -	76,00	$ 19.030.096,00
INP-051	Suministro e Instalacion de Cerramiento en Lona Verde, Altura 2,1 mts	ML		$ 57.057,00		1.211,50	$ 69.124.555,50			$ -	$ -	1.211,50	$ 69.124.555,50
INP-052	Suministro e Instalacion de Flascher Vial Luminoso Incluye Soporte Tubular de Base	UN		$ 310.219,00		119,00	$ 36.916.061,00			$ -	$ -	119,00	$ 36.916.061,00
INP-053	Suministro e Instalacion de Cerramiento en Lamina de Zinc, Altura 2,4 mts	ML		$ 154.531,00		135,50	$ 20.938.950,50			$ -	$ -	135,50	$ 20.938.950,50
INP-054	Maletines o barreras plasticas con medidas de 2 metros de largo, 1 metro de alto, base de 50 cm	UN		$ 814.495,00		32,00	$ 26.063.840,00			$ -	$ -	32,00	$ 26.063.840,00
Subtotal					**$ 18.708.105,72**		**$ 219.198.821,32**			**$ -**	**$ -**		**$ 219.198.821,32**
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**												
3.1	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	210,00	$ 8.926,00	$ 1.874.460,00	258,00	$ 2.302.908,00			$ -	$ -	258,00	$ 2.302.908,00
3.2	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	363,24	$ 11.319,00	$ 4.111.513,56	2.342,64	$ 26.516.342,16			$ -	$ -	2.342,64	$ 26.516.342,16

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3.3	Demolición de Concreto Simple.	M3	66,00	$ 161.754,00	$ 10.675.764,00	251,20	$ 40.632.604,80			$ -	$ -	251,20	$ 40.632.604,80
3.4	Demolición de Pavimento Rigido e > 0,175m.	M2	9.751,56	$ 35.709,00	$ 348.218.420,33	7.964,63	$ 284.409.079,80			$ -	$ -	7.964,63	$ 284.409.079,80
3.5	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m.	ML	2.779,89	$ 5.715,00	$ 15.887.043,94	2.829,56	$ 16.170.907,99		-947,32	$ -	-$ 5.413.933,80	1.882,24	$ 10.756.974,19
3.6	Demolición de Andén e > 0,075m.	M2	2.671,66	$ 10.427,00	$ 27.857.398,82	5.990,56	$ 62.463.569,12		-3.725,31	$ -	-$ 38.843.807,37	2.265,25	$ 23.619.761,75
3.7	Desmonte de Adoquines, Almacenaje y Limpieza.	M2	282,30	$ 7.158,00	$ 2.020.703,40	1.347,80	$ 9.647.552,40		-530,00	$ -	-$ 3.793.740,00	817,80	$ 5.853.812,40
3.8	Desmonte de Tuberia de Acueducto y Alcantarillado a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro.	ML	950,00	$ 6.152,00	$ 5.844.400,00	968,67	$ 5.959.257,84			$ -	$ -	968,67	$ 5.959.257,84
INP-055	Demolicion de pavimento en concreto rigido reforzado de espesor 0,40 mts	M2		$ 84.474,00		3.500,00	$ 295.659.000,00			$ -	$ -	3.500,00	$ 295.659.000,00
Subtotal					$ 416.489.704,05		$ 743.761.222,10			$ -	-$ 48.051.481,17		$ 695.709.740,93
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**												
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicion de Humedad.	M3	4.700,72	$ 64.682,00	$ 304.051.971,04	5.995,87	$ 387.824.631,72			$ -	$ -	5.995,87	$ 387.824.631,72
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condicion de Humedad.	M3	3.133,81	$ 25.749,00	$ 80.692.473,69	13.333,47	$ 343.323.519,03			$ -	$ -	13.333,47	$ 343.323.519,03
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	870,50	$ 80.053,00	$ 69.686.136,50	1.573,29	$ 125.946.584,37	348,30		$ 27.882.459,90	$ -	1.921,59	$ 153.829.044,27
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	8.020,92	$ 43.059,00	$ 345.372.794,28	24.466,81	$ 1.053.516.371,79	687,29		$ 29.594.099,58	$ -	25.154,10	$ 1.083.110.471,37
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	1.335,83	$ 38.364,00	$ 51.247.782,12	5.110,98	$ 196.077.636,72	560,00		$ 21.483.840,00	$ -	5.670,98	$ 217.561.476,72
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	1.335,83	$ 211.505,00	$ 282.534.724,15	5.672,49	$ 1.199.759.997,45	560,00		$ 118.442.800,00	$ -	6.232,49	$ 1.318.202.797,45
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	4.983,41	$ 66.631,00	$ 332.049.591,71	12.842,83	$ 855.730.605,73			$ -	$ -	12.842,83	$ 855.730.605,73
Subtotal					$ 1.465.635.473,49		$ 4.162.179.346,81			$ 197.403.199,48	$ -		$ 4.359.582.546,29

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	**LLENOS**												
5.1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	1.296,13	$ 228.563,00	$ 296.247.361,19	3.826,53	$ 874.602.071,49			$ -	$ -	3.826,53	$ 874.602.071,49
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	2.048,92	$ 94.916,00	$ 194.475.290,72	17.880,41	$ 1.697.136.793,37			$ -	$ -	17.880,41	$ 1.697.136.793,37
5.3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	3.571,72	$ 41.472,00	$ 148.126.371,84	2.981,19	$ 123.635.877,04		-945,50	$ -	-$ 39.211.776,00	2.035,69	$ 84.424.101,04
5.4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS).	M3	1.950,31	$ 149.399,00	$ 291.374.632,61	2.938,92	$ 439.071.201,12			$ -	$ -	2.938,92	$ 439.071.201,12
Subtotal					**$ 930.223.656,36**		**$ 3.134.445.943,02**			**$ -**	**-$ 39.211.776,00**		**$ 3.095.234.167,02**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
6.1	Instalación de Tubería de PVC-U 10" PSI 200 RDE 21.	ML	900,00	$ 24.920,00	$ 22.428.000,00	900,00	$ 22.428.000,00			$ -	$ -	900,00	$ 22.428.000,00
6.2	Instalación de Accesorios de PVC-U 10" PSI 200 RDE 21.	UN	9,00	$ 64.408,00	$ 579.672,00	9,00	$ 579.672,00			$ -	$ -	9,00	$ 579.672,00
6.3	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=6" E.L. J.R o G.T.	UN	2,00	$ 67.707,00	$ 135.414,00	2,00	$ 135.414,00			$ -	$ -	2,00	$ 135.414,00
6.4	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=10" E.L. J.R o G.T.	UN	6,00	$ 78.899,00	$ 473.394,00	6,00	$ 473.394,00			$ -	$ -	6,00	$ 473.394,00
6.5	Instalación de Accesorios HD 6", Extremos Bridados.	UN	6,00	$ 141.389,00	$ 848.334,00	6,00	$ 848.334,00			$ -	$ -	6,00	$ 848.334,00
6.6	Instalación de Accesorios HD 8", Extremos Bridados.	UN	20,00	$ 148.276,00	$ 2.965.520,00	20,00	$ 2.965.520,00			$ -	$ -	20,00	$ 2.965.520,00
6.7	Instalación de Accesorios HD 10", Extremos Bridados.	UN	33,00	$ 159.038,00	$ 5.248.254,00	33,00	$ 5.248.254,00			$ -	$ -	33,00	$ 5.248.254,00
6.8	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	89,01	$ 18.104,00	$ 1.611.437,04	167,57	$ 3.033.687,28			$ -	$ -	167,57	$ 3.033.687,28
6.9	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm).	ML	13,69	$ 23.574,00	$ 322.728,06	48,69	$ 1.147.818,06			$ -	$ -	48,69	$ 1.147.818,06

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.10	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14". (355mm).	ML	8,89	$ 39.041,00	$ 347.074,49	8,89	$ 347.074,49			$ -	$ -	8,89	$ 347.074,49
6.11	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16". (400mm).	ML	22,92	$ 44.402,00	$ 1.017.693,84	22,92	$ 1.017.693,84			$ -	$ -	22,92	$ 1.017.693,84
6.12	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 18". (450mm).	ML	12,28	$ 50.809,00	$ 623.934,52	12,28	$ 623.934,52			$ -	$ -	12,28	$ 623.934,52
6.13	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 20". (500mm).	ML	48,80	$ 57.537,00	$ 2.807.805,60	54,80	$ 3.153.027,60			$ -	$ -	54,80	$ 3.153.027,60
6.14	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24".	ML	51,59	$ 68.347,00	$ 3.526.021,73	51,59	$ 3.526.021,73			$ -	$ -	51,59	$ 3.526.021,73
6.15	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 27".	ML	53,64	$ 82.181,00	$ 4.408.188,84	53,64	$ 4.408.188,84			$ -	$ -	53,64	$ 4.408.188,84
6.16	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 33".	ML	753,98	$ 104.740,00	$ 78.971.865,20	792,98	$ 83.056.725,20			$ -	$ -	792,98	$ 83.056.725,20
6.17	Instalación de Tuberia de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42".	ML	215,53	$ 131.383,00	$ 28.316.977,99	267,58	$ 35.155.463,14	18,50		$ 2.430.585,50	$ -	286,08	$ 37.586.048,64
Subtotal					**$ 154.632.315,31**		**$ 168.148.222,70**			**$ 2.430.585,50**	**$ -**		**$ 170.578.808,20**
7	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**												
7.1	Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tuberia PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor.	UN	22,00	$ 391.874,00	$ 8.621.228,00	44,00	$ 17.242.456,00			$ -	$ -	44,00	$ 17.242.456,00
Subtotal					**$ 8.621.228,00**		**$ 17.242.456,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 17.242.456,00**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8	OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO												
8.1	Reconstrucción de pavimento en concreto e > 0,20, MR=4.1MPa.	M2	9.751,56	$ 219.513,00	$ 2.140.593.970,77	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
8.2	Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa.	M2	2.671,66	$ 93.372,00	$ 249.458.237,52	2.092,56	$ 195.386.512,32			$ -	$ -	2.092,56	$ 195.386.512,32
8.3	Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa.	ML	2.779,89	$ 85.263,00	$ 237.021.352,07	2.066,34	$ 176.182.735,78		-454,00	$ -	-$ 38.709.402,00	1.612,34	$ 137.473.333,78
8.4	Reconstrucción de estructura en adoquín de 0,08 x 0,10 x 0,20 m en concreto.	M2	282,30	$ 164.997,00	$ 46.578.653,10	707,30	$ 116.702.378,10			$ -	$ -	707,30	$ 116.702.378,10
8.5	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,00m < H ≤ 1,45m.	UN	2,00	$ 4.756.890,00	$ 9.513.780,00	2,00	$ 9.513.780,00			$ -	$ -	2,00	$ 9.513.780,00
8.6	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m.	UN	10,00	$ 5.843.633,00	$ 58.436.330,00	10,00	$ 58.436.330,00			$ -	$ -	10,00	$ 58.436.330,00
8.7	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,50 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m.	UN	1,00	$ 8.492.139,00	$ 8.492.139,00	1,00	$ 8.492.139,00			$ -	$ -	1,00	$ 8.492.139,00
8.8	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,80 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m.	UN	12,00	$ 9.359.234,00	$ 112.310.808,00	12,00	$ 112.310.808,00			$ -	$ -	12,00	$ 112.310.808,00
8.9	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,80 m, Profundidad 3,00m < H ≤ 4,50m.	UN	5,00	$ 11.181.591,00	$ 55.907.955,00	5,00	$ 55.907.955,00			$ -	$ -	5,00	$ 55.907.955,00
8.10	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 2,00 m, Profundidad 3,00m < H ≤ 4,50m.	UN	3,00	$ 13.649.676,00	$ 40.949.028,00	3,00	$ 40.949.028,00			$ -	$ -	3,00	$ 40.949.028,00
8.11	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 2,00 m, Profundidad 4,50m < H ≤ 6,00m.	UN	1,00	$ 15.901.738,00	$ 15.901.738,00	3,00	$ 47.705.214,00			$ -	$ -	3,00	$ 47.705.214,00
8.12	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 5.0m x 2.5m, Profundidad 3.50m.	UN	2,00	$ 37.846.226,00	$ 75.692.452,00	2,00	$ 75.692.452,00			$ -	$ -	2,00	$ 75.692.452,00
8.13	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 7.0m x 3.0m, Profundidad 2.50m.	UN	1,00	$ 64.090.034,00	$ 64.090.034,00	1,00	$ 64.090.034,00			$ -	$ -	1,00	$ 64.090.034,00
8.14	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 1.2m x 1.2m, Profundidad 1.00m < H < 2.00m.	UN	10,00	$ 13.656.027,00	$ 136.560.270,00	10,00	$ 136.560.270,00			$ -	$ -	10,00	$ 136.560.270,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		7.315,37	$ 2.755.962.176,29		-285,40	$ -	-$ 107.520.482,94	7.029,97	$ 2.648.441.695,35
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		42.921,80	$ 457.044.202,94			$ -	$ -	42.921,80	$ 457.044.202,94
INP-033	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.25 mts Acelerado a 7 dias (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 482.276,60		3.886,46	$ 1.874.348.040,09			$ -	$ -	3.886,46	$ 1.874.348.040,09
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400	M2		$ 20.710,30		15.006,50	$ 310.789.116,95			$ -	$ -	15.006,50	$ 310.789.116,95
INP-036	Instalación de Tuberia de PVC-U 8" PSI 200 RDE 21.	ML		$ 22.608,30		120,00	$ 2.712.996,00			$ -	$ -	120,00	$ 2.712.996,00
INP-037	Construccion de Sumidero para Rejilla de Captación de 0.75 m x 6.25 m con 1.58 < H < 2.20 m	UN		$ 10.544.545,70		7,00	$ 73.811.819,90		-2,00	$ -	-$ 21.089.091,40	5,00	$ 52.722.728,50
INP-038	Suministro e instalación de Rejilla metalica de Captación de 0.5 m x 1 m para trafico pesado	UN		$ 3.099.883,80		42,00	$ 130.195.119,60		-17,00	$ -	-$ 52.698.024,60	25,00	$ 77.497.095,00
Subtotal					**$ 3.251.506.747,46**		**$ 6.702.793.109,97**			**$ -**	**-$ 220.017.000,94**		**$ 6.482.776.109,03**
9	**OTRAS ACTIVIDADES**												
9.1	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI).	M3	21,45	$ 1.044.033,00	$ 22.394.507,85	98,04	$ 102.356.995,32			$ -	$ -	98,04	$ 102.356.995,32
9.2	Bajante de Operación para Válvulas, Incluye: Tapa Válvula, Tuberia Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza.	UN	3,00	$ 427.516,00	$ 1.282.548,00	3,00	$ 1.282.548,00			$ -	$ -	3,00	$ 1.282.548,00
9.3	Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente.	UN	20,00	$ 197.885,00	$ 3.957.700,00	28,00	$ 5.540.780,00			$ -	$ -	28,00	$ 5.540.780,00
9.4	Empalme de Colector a Estación de Bombeo de Aguas Residuales.	UN	1,00	$ 499.702,00	$ 499.702,00	1,00	$ 499.702,00			$ -	$ -	1,00	$ 499.702,00
INP-041	Levantamiento Geoferenciado Para Indentificacion de Redes Existentes, con la metodologia BAM-I (Buried Asset Management Institute International) y ASCE 38-02 (American Society Of Civil Engineers), con una cobertura de 5 mts de profundidad	M2		$ 25.902,50		7.510,00	$ 194.527.775,00			$ -	$ -	7.510,00	$ 194.527.775,00
