PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALES		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 01		ACTA 02		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	LA LINDA	5-ene-26		90 Dias	20-mar-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**														
1,01	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	m2	73,680	$ 11.220,00	$ 826.687,00	3,91	$ 43.870,00		69,77	3,91	$ 43.870,00	0,000	$ 0,00	3,91	$ 43.870,00
1,02	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	120,000	$ 20.369,00	$ 2.444.280,00	127,96	$ 2.606.468,00	7,96		127,96	$ 2.606.468,00	0,000	$ 0,00	127,96	$ 2.606.468,00
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	m2	25,840	$ 11.453,00	$ 295.946,00	19,20	$ 219.898,00		6,64	19,20	$ 219.898,00	0,000	$ 0,00	19,20	$ 219.898,00
1,04	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	m2	10,175	$ 13.720,00	$ 139.594,00	10,60	$ 145.494,00	0,43		10,60	$ 145.494,00	0,000	$ 0,00	10,60	$ 145.494,00
1,05	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	m2	21,920	$ 22.525,00	$ 493.748,00	20,95	$ 471.899,00		0,97	20,95	$ 471.899,00	0,000	$ 0,00	20,95	$ 471.899,00
1,06	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	mL	3,100	$ 33.997,00	$ 105.391,00	3,10	$ 105.391,00	-	-	3,10	$ 105.391,00	0,000	$ 0,00	3,10	$ 105.391,00
1,07	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	mL	41,600	$ 16.196,00	$ 673.754,00	41,60	$ 673.754,00			8,00	$ 129.568,00	0,000	$ 0,00	8,00	$ 129.568,00
1,08	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	m2	4,000	$ 47.864,00	$ 191.456,00	4,00	$ 191.456,00	-	-	4,00	$ 191.456,00	0,000	$ 0,00	4,00	$ 191.456,00
1,09	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2	120,000	$ 17.991,00	$ 2.158.920,00	127,96	$ 2.302.173,00	7,96		127,96	$ 2.302.173,00	0,000	$ 0,00	127,96	$ 2.302.173,00
1,10	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	8,000	$ 28.156,00	$ 225.248,00	11,00	$ 309.716,00	3,00		11,00	$ 309.716,00	0,000	$ 0,00	11,00	$ 309.716,00
1,11	DESMONTE VENTANAS	m2	20,800	$ 17.180,00	$ 357.344,00	20,80	$ 357.344,00	-	-	20,80	$ 357.344,00	0,000	$ 0,00	20,80	$ 357.344,00
1,12	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO. MURO DE BASE Y CONCERTINA	mL	51,300	$ 70.389,00	$ 3.610.956,00	51,30	$ 3.610.956,00			1,60	$ 112.622,00	0,000	$ 0,00	1,60	$ 112.622,00
1,13	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	m2	300,000	$ 5.727,00	$ 1.718.100,00	127,96	$ 732.841,00		172,04	127,96	$ 732.841,00	0,000	$ 0,00	127,96	$ 732.841,00
1,14	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	TON/Km	243,383	$ 12.290,00	$ 2.991.180,00	342,81	$ 4.213.135,00	99,43		342,81	$ 4.213.135,00	0,000	$ 0,00	342,81	$ 4.213.135,00
1,15	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	m2		$ 12.318,00	$ 0,00	36,51	$ 449.693,00	36,51		36,51	$ 449.693,00	0,000	$ 0,00	36,51	$ 449.693,00
1,16	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	m2		$ 59.838,00	$ 0,00	61,91	$ 3.704.523,00	61,91		61,91	$ 3.704.523,00	0,000	$ 0,00	61,91	$ 3.704.523,00
2	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
2,01	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	130,000	$ 266.363,00	$ 34.627.190,00	130,00	$ 34.627.190,00				$ -	111,877	$ 29.799.827,00	111,88	$ 29.799.827,00
2,02	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	13,660	$ 137.887,00	$ 1.883.536,00	13,66	$ 1.883.536,00				$ -	9,550	$ 1.316.821,00	9,55	$ 1.316.821,00
2,03	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	m2	130,000	$ 171.909,00	$ 22.348.170,00	130,00	$ 22.348.170,00			-	$ -	111,877	$ 19.232.620,00	111,88	$ 19.232.620,00
2,04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	24,000	$ 95.822,00	$ 2.299.728,00	24,00	$ 2.299.728,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
2,05	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	und	5,000	$ 50.494,00	$ 252.470,00	5,00	$ 252.470,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
2,06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	mL	20,000	$ 41.714,00	$ 834.280,00	20,00	$ 834.280,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
3	**PISOS Y BASES**						$ 0,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
3,01	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4. E=0.04	m2	72,910	$ 41.349,00	$ 3.014.747,00	72,91	$ 3.014.747,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
4	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**						$ 0,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	m2	72,910	$ 86.420,00	$ 6.300.865,00	72,91	$ 6.300.865,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
4,02	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	m2	31,296	$ 207.686,00	$ 6.499.741,00	31,30	$ 6.499.741,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
4,03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	mL	83,750	$ 98.370,00	$ 8.238.468,00	83,75	$ 8.238.468,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
5	**MAMPOSTERÍA**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
5,01	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	m2	55,100	$ 98.919,00	$ 5.450.437,00	26,64	$ 2.635.202,00		28,46	26,64	$ 2.635.202,00	0,000	$ 0,00	26,64	$ 2.635.202,00
5,02	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M	mL	11,020	$ 60.914,00	$ 671.272,00	10,10	$ 615.231,00		0,92		$ -	10,100	$ 615.231,00	10,10	$ 615.231,00
6	**MUROS**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
6,01	RECUBRIMIENTO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM, UNA CARA	m2	338,232	$ 100.849,00	$ 34.110.359,00	338,23	$ 34.110.359,00	-	-	253,67	$ 25.582.769,00	84,558	$ 8.527.590,00	338,23	$ 34.110.359,00
7	**OBRAS EN CONCRETO**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
7,01	CONCRETO 4000 PSI	m3	0,432	$ 1.069.666,00	$ 462.096,00	0,50	$ 534.833,00	0,07		0,50	$ 534.833,00	0,000	$ 0,00	0,50	$ 534.833,00
7,02	CONCRETO 3500 PSI	m3	0,270	$ 1.344.606,00	$ 363.044,00	1,03	$ 1.384.944,00	0,38	- 0,38	0,27	$ 363.044,00	0,380	$ 510.950,00	0,65	$ 873.994,00
7,03	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	m2	2,250	$ 143.855,00	$ 323.674,00	2,25	$ 323.674,00	-	-	2,25	$ 323.674,00	0,000	$ 0,00	2,25	$ 323.674,00
7,04	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR	mL	20,000	$ 1.261.415,00	$ 25.228.300,00	20,00	$ 25.228.300,00			-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
7,05	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (Incluye rejilla metalica)	mL	48,610	$ 273.975,00	$ 13.317.925,00	11,92	$ 3.265.782,00		36,69	11,92	$ 3.265.782,00	0,000	$ 0,00	11,92	$ 3.265.782,00
7,06	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	m2	0,000	$ 135.461,00	$ 0,00	78,18	$ 10.590.341,00	78,18		70,69	$ 9.575.332,00	7,493	$ 1.015.009,00	78,18	$ 10.590.341,00
8	**ACERO**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Kg	106,010	$ 10.050,00	$ 1.065.401,00	206,22	$ 2.072.471,00	100,21		131,28	$ 1.319.364,00	74,936	$ 753.107,00	206,22	$ 2.072.471,00
8,02	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	m2		$ 19.265,00	$ 0,00	78,18	$ 1.506.138,00	78,18		70,69	$ 1.361.785,00	7,493	$ 144.353,00	78,18	$ 1.506.138,00
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
9,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	m3		$ 48.464,00	$ 0,00	10,71	$ 519.171,00	10,71		10,71	$ 519.171,00	0,000	$ 0,00	10,71	$ 519.171,00
10	**RED SANITARIA**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,01	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 " 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	und	1,000	$ 1.046.636,00	$ 1.046.636,00	1,00	$ 1.046.636,00	-	-	1,00	$ 1.046.636,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.046.636,00
10,02	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	3,000	$ 117.330,00	$ 351.990,00	8,00	$ 938.640,00	5,00		8,00	$ 938.640,00	0,000	$ 0,00	8,00	$ 938.640,00
10,03	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 177.567,00	$ 355.134,00	2,00	$ 355.134,00	-	-	2,00	$ 355.134,00	0,000	$ 0,00	2,00	$ 355.134,00
10,04	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	1,000	$ 143.685,00	$ 143.685,00	1,00	$ 143.685,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,05	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	und	2,000	$ 34.559,00	$ 69.118,00	2,00	$ 69.118,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,06	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	30,000	$ 30.724,00	$ 921.720,00	30,00	$ 921.720,00			19,50	$ 599.118,00	0,000	$ 0,00	19,50	$ 599.118,00
10,07	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	30,000	$ 38.821,00	$ 1.164.630,00	30,00	$ 1.164.630,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,08	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	30,000	$ 65.772,00	$ 1.973.160,00	30,00	$ 1.973.160,00			6,00	$ 394.632,00	0,000	$ 0,00	6,00	$ 394.632,00
10,09	TANQUE SEPTICO INTEGRO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar	und	1,000	$ 4.646.655,00	$ 4.646.655,00	1,00	$ 4.646.655,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11	**RED HIDRÁULICA**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,01	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	und	1,000	$ 56.230,00	$ 56.230,00	1,00	$ 56.230,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	1,000	$ 97.581,00	$ 97.581,00	3,00	$ 292.743,00	2,00		3,00	$ 292.743,00	0,000	$ 0,00	3,00	$ 292.743,00
11,03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	mL	1,000	$ 18.177,00	$ 18.177,00	13,00	$ 236.301,00	12,00		13,00	$ 236.301,00	0,000	$ 0,00	13,00	$ 236.301,00
11,04	RED SUMINISTRO PVC 1"	mL	30,000	$ 28.015,00	$ 840.450,00	30,00	$ 840.450,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,05	RED SUMINISTRO PVC 2"	mL	30,000	$ 28.015,00	$ 840.450,00	30,00	$ 840.450,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,06	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 1.217.146,00	$ 1.217.146,00	1,00	$ 1.217.146,00	-	-	1,00	$ 1.217.146,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.217.146,00
11,07	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	und	1,000	$ 1.061.004,00	$ 1.061.004,00	1,00	$ 1.061.004,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,08	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	und	1,000	$ 61.958,00	$ 61.958,00	1,00	$ 61.958,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12	**RED ELÉCTRICA**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,01	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	und	16,000	$ 201.193,00	$ 3.219.088,00	16,00	$ 3.219.088,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,02	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	$ 241.147,00	$ 241.147,00	1,00	$ 241.147,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	8,000	$ 192.577,00	$ 1.540.616,00	8,00	$ 1.540.616,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	$ 194.693,00	$ 194.693,00	1,00	$ 194.693,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,05	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	mL	500,000	$ 34.245,00	$ 17.122.500,00	500,00	$ 17.122.500,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,06	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	1,000	$ 1.025.788,00	$ 1.025.788,00	1,00	$ 1.025.788,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,07	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE CIELORRASO	mL	400,000	$ 9.938,00	$ 3.975.200,00	400,00	$ 3.975.200,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1,000	$ 1.378.454,00	$ 1.378.454,00	1,00	$ 1.378.454,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,09	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W	und	32,000	$ 180.831,00	$ 5.786.592,00	32,00	$ 5.786.592,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,10	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	und	13,000	$ 143.900,00	$ 1.870.700,00	13,00	$ 1.870.700,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,11	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.	und	2,000	$ 1.624.157,00	$ 3.248.314,00	2,00	$ 3.248.314,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
13	**CIELO RASO**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
13,01	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFILERÍA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	m2	83,750	$ 183.157,00	$ 15.339.362,00	83,75	$ 15.339.362,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
13,02	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO	mL	121,180	$ 42.511,00	$ 5.151.483,00	121,18	$ 5.151.483,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14	**APARATOS SANITARIOS**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,01	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)	und	1,000	$ 604.725,00	$ 604.725,00	1,00	$ 604.725,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,02	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	und	1,000	$ 739.245,00	$ 739.245,00	1,00	$ 739.245,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,03	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	und	1,000	$ 552.804,00	$ 552.804,00	1,00	$ 552.804,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,04	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	2,000	$ 474.196,00	$ 948.392,00	2,00	$ 948.392,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,05	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 156.225,00	$ 156.225,00	1,00	$ 156.225,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,06	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	2,000	$ 157.336,00	$ 314.672,00	2,00	$ 314.672,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,07	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm	und	1,000	$ 307.420,00	$ 307.420,00	1,00	$ 307.420,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,08	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	und	1,000	$ 351.989,00	$ 351.989,00	1,00	$ 351.989,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
15	**PINTURAS**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
15,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	m2	121,180	$ 28.960,00	$ 3.509.373,00	121,18	$ 3.509.373,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
15,02	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR. FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	9,000	$ 31.570,00	$ 284.130,00	9,00	$ 284.130,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
15,03	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	48,610	$ 34.372,00	$ 1.670.823,00	48,61	$ 1.670.823,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16	**CARPINTERIA**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,01	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	1,435	$ 1.112.135,00	$ 1.595.914,00	1,44	$ 1.595.914,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,02	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	2,520	$ 978.953,00	$ 2.466.962,00	2,52	$ 2.466.962,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALES		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 01		ACTA 02		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	LA LINDA	5-ene-26		90 Dias	20-mar-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
16,03	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	m2	6,705	$ 1.055.576,00	$ 7.077.637,00	6,71	$ 7.077.637,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,04	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	m2	2,000	$ 145.005,00	$ 290.010,00	2,00	$ 290.010,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	mL	2,000	$ 826.504,00	$ 1.653.008,00	2,00	$ 1.653.008,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,06	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), FALLEBA, PORTACANDADO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO CICLOPEO	und	1,000	$ 1.703.184,00	$ 1.703.184,00	1,00	$ 1.703.184,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,07	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	m2	4,000	$ 805.654,00	$ 3.222.616,00	4,00	$ 3.222.616,00			-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
16,08	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	m2	20,800	$ 444.944,00	$ 9.254.835,00	20,80	$ 9.254.835,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,09	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	mL	3,100	$ 587.926,00	$ 1.822.571,00	3,10	$ 1.822.571,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,10	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"	m2		$ 330.821,00	$ 0,00	-	$ 0,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
17	**EQUIPAMIENTO FIJO**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
17,01	PLANTA ELECTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS	und	1,000	$ 2.666.007,00	$ 2.666.007,00	1,00	$ 2.666.007,00				$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
17,02	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W. INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	und	1,000	$ 21.614.594,00	$ 21.614.594,00	1,00	$ 21.614.594,00			-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
17,03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V	und	4,000	$ 1.730.715,00	$ 6.922.860,00	2,00	$ 3.461.430,00		2,00		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
18	**TRANSPORTE**										$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
18,01	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	ton/Km	548,756	$ 7.846,00	$ 4.305.537,00	588,41	$ 4.616.686,00	39,66		179,81	$ 1.410.787,00	91,733	$ 719.738,00	271,54	$ 2.130.525,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 332.519.501,00**		**$ 336.069.101,0**				**$ 68.068.184,00**		**$ 62.635.246,00**		**$ 130.703.430,00**
	COSTOS INDIRECTOS														
	ADMINISTRACION	25,0%			$ 83.129.875,00		$ 84.017.275,00				$ 17.017.046,00		$ 15.658.812,00		$ 32.675.858,00
	IMPREVISTOS	0,0%			$ -										
	UTILIDAD	5,0%			$ 16.625.975,00		$ 16.803.455,00				$ 3.403.409,00		$ 3.131.762,00		$ 6.535.172,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%			$ 99.755.850,00		$ 100.820.730,0				$ 20.420.455,00		$ 18.790.574,00		$ 39.211.029,00
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				**$ 432.275.351,00**		**$ 436.889.831,0**				**$ 88.488.639,00**		**$ 81.425.820,00**		**$ 169.914.459,00**
											20,47%		18,84%		39,31%

Ing. Jhon Alexander Henao Rojas
Director de interventoría

Ing. Jesús Loaiza Ramírez
Director de obra

HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
Pensilvania – Caldas		
VEREDA LA LINDA	INFORME DE OBRA No. 2	FECHA:20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.


REF.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.° 003-2025 CONPU-ESEPEN	
OBJETO DEL CONTRATO No.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS	
CONTRATISTA	CONSULTIN PYS SAS	
VALOR INICIAL	**$**	**432.275.351,00**
PLAZO INICIAL	30	DIAS
PLAZO ADICIONAL	60	DIAS
PLAZO FINAL	90	DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	1/12/2025	
FECHA DE VENCIMIENTO	27/03/2026	
PERIODO	DEL: 17/02/2026	HASTA: 20/03/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	83	DIAS
TIEMPO RESTANTE	7	DIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO	
VALOR APROVADO POR INTERVENTORIA	**$ 81.425.820,00**	
VALOR EJECUTADO	**$ 169.914.459,00**	
VALOR POR EJECUTAR	**$ 262.360.892,00**	

AVANCE DEL CONTRATO COSTOS DIRECTOS

	PERIODO	ACUMULADO		PERIODO	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	82,08%	7,13%	OBRA FISICA EJECUTADA (%)	18,84%	20,47%
VALOR DE OBRA	$ 354.830.364,28	$ 30.838.257,43	VALOR DE OBRA	$ 81.425.820,00	$ 88.488.639,00

GRAFICA DE AVANCE DE CONTRATO

AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	7,13%	20,47%	
DURANTE EL PERIODO	82,08%	18,84%	-49,91%
ACUMULADO ACTUAL	89,22%	39,31%	



REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DURANTE EL PERIODO



VALOR ACTA N° 2 CONSULTIN PYS S.A.S	**$**	**81.425.820,00**	**VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA** **$** **81.425.820,00**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a la adecuación menor del puesto de salud en la vereda La Linda, avanzando principalmente en los capítulos de cubierta y desagüe de aguas lluvias, mampostería, muros (recubrimientos), obras en concreto, acero y elementos estructurales del proyecto.

En el capítulo de cubierta y desagüe de aguas lluvias se realizó la instalación de cubierta tipo sándwich, fabricada con inyección de poliuretano expandido de alta densidad, con acabado en ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado, cumpliendo pendientes entre el 15% y 27%. Esta actividad incluyó accesorios de remate, elementos de fijación tipo Panelco y caballete en lámina galvanizada calibre 22 (DS=90), así como todos los elementos requeridos para su correcto montaje. De igual manera, se ejecutó la estructura metálica de soporte, incluyendo procesos de soldadura, aplicación de anticorrosivo y acabado con esmalte.

En el capítulo de mampostería se ejecutaron dinteles en concreto sobre muros de bloque de 0.15 m, incluyendo el suministro e instalación de acero de refuerzo, así como muros tipo cuchilla, garantizando la estabilidad y adecuada conformación de los elementos.

En el capítulo de muros se realizó el recubrimiento en placa de fibrocemento de 8 mm en una cara, conforme a las especificaciones técnicas, asegurando un adecuado acabado y protección de las superficies.

En el capítulo de obras en concreto se desarrollaron actividades de confinamiento de muros y cuchillas mediante concreto de 3.500 PSI, así como la construcción de una placa de contrapiso de 3000 psi.

En el capítulo de acero se realizó el suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo Fy = 60.000 PSI (420 MPa), incluyendo alambre negro, utilizado en el confinamiento de muros y cintas estructurales. Adicionalmente, se instaló malla electrosoldada en la losa de piso, contribuyendo a la resistencia y control de fisuración del elemento.

Finalmente, se llevaron a cabo actividades de transporte de materiales mediante vehículo automotor, garantizando el abastecimiento oportuno para el desarrollo de las actividades en obra.

Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos técnicos establecidos, asegurando la calidad de los materiales y el cumplimiento de los procesos constructivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO

De acuerdo al cronograma de la prorroga N° 2

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato presenta un avance acumulado ejecutado del 39.31%, frente a un 89.22% programado, evidenciando un retraso significativo del -49.91% durante el periodo evaluado. Durante el periodo se tenía previsto ejecutar un 82.08%, sin embargo, solo se alcanzó un 18.84%, lo que impactó directamente el cumplimiento del cronograma general del proyecto. **Cabe aclarar que estos porcentajes se encuentran basados en el cronograma ajustado correspondiente a la prórroga No. 1.**

Este retraso se encuentra asociado principalmente a condiciones climáticas adversas, especialmente por la presencia de lluvias, las cuales han limitado el normal desarrollo de las actividades en obra. Adicionalmente, se han requerido actividades no previstas inicialmente, como la construcción de la placa de contrapiso en toda la infraestructura, lo cual ha incidido de manera directa en los tiempos de ejecución y en los rendimientos de obra.

Actualmente, el contratista se encuentra adelantando las gestiones correspondientes para la aprobación de la prórroga No. 2, con el fin de ajustar el plazo contractual y garantizar la correcta culminación de las obras conforme a los requerimientos técnicos establecidos.


OBSERVACIONES	FIRMAS

El avance físico ejecutado (39.31%) se encuentra considerablemente por debajo del avance programado (89.22%), presentando un retraso del -49.91% con base en el cronograma ajustado de la prórroga No. 1. Esta situación evidencia un incumplimiento significativo frente a las metas establecidas para el periodo evaluado. Si bien se han presentado factores externos como las condiciones climáticas adversas, especialmente las lluvias, también es importante considerar que la ejecución de actividades adicionales no previstas inicialmente, como la construcción de la placa de contrapiso en toda la infraestructura, ha incidido directamente en la disminución de los rendimientos y en el atraso del cronograma. Cabe resaltar que las actividades pendientes corresponden a capítulos con alta incidencia dentro del presupuesto del proyecto, por lo que su ejecución oportuna será clave para la recuperación del atraso evidenciado. En este sentido, cualquier desviación adicional podría afectar de manera significativa el equilibrio entre el avance físico, financiero y el plazo contractual. En consecuencia, se recomienda que el contratista fortalezca su capacidad operativa mediante el incremento de personal en obra, la optimización de frentes de trabajo y una adecuada planificación de recursos técnicos y logísticos. Así mismo, es fundamental realizar una reprogramación detallada de las actividades en el marco de la prórroga No. 2. Adicionalmente, se considera indispensable determinar y actualizar la ruta crítica del proyecto, con el fin de identificar las actividades que inciden directamente en el plazo contractual, priorizar su ejecución y enfocar los recursos en los frentes más críticos, permitiendo así una mejor gestión del tiempo y la recuperación del cronograma.	 INGENIERO JHON ALEXANDER HENAO ROJAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S



	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-024	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:01	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901.717.350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901.462.340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

1,01	1,01	ITEM	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

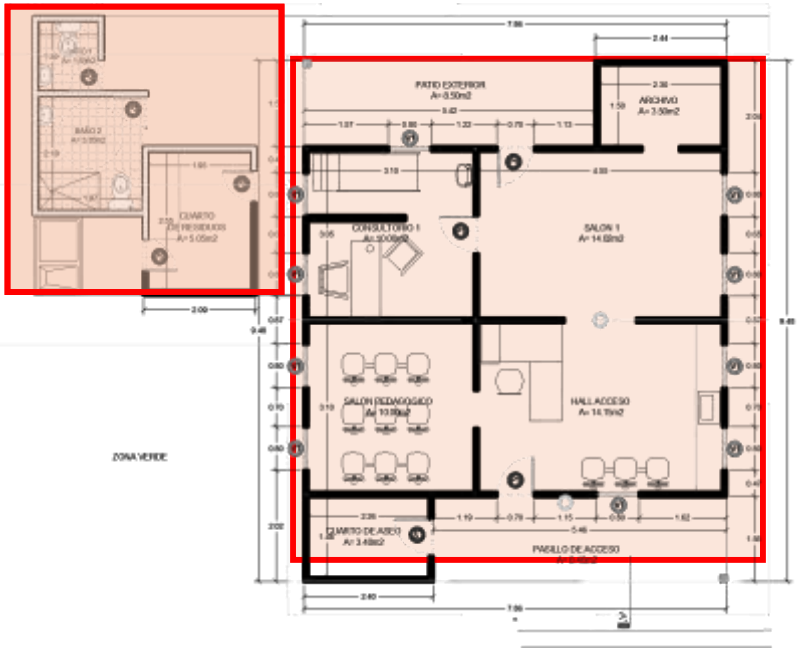


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	BAÑO 1	1,15		1,30		1,50
	BAÑO 2	1,15		2,10		2,42
Subtotal						3,91
TOTAL						0,00

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-025**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											**VERSIÓN:02**	
												PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

1,02	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**ITEM**	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

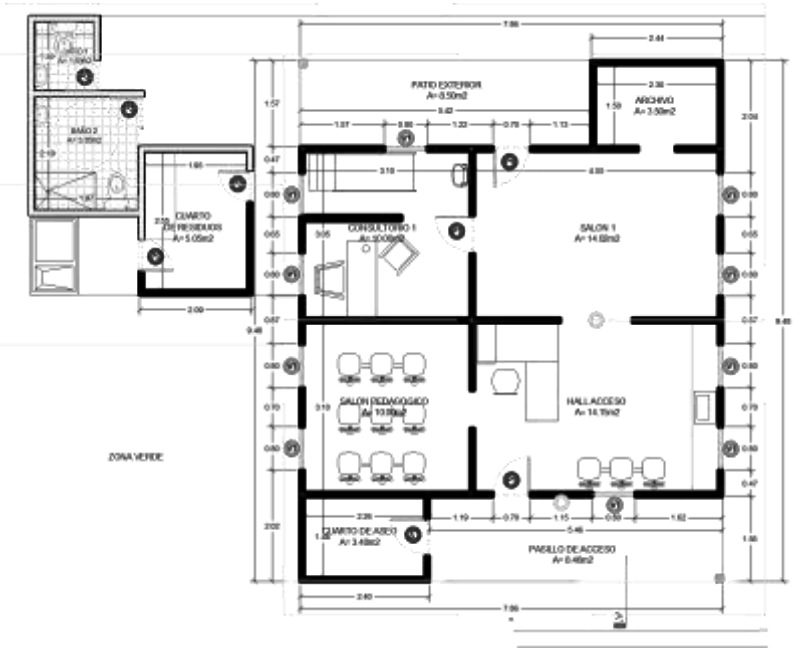


Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	CUBIERTA principal	10,75	9,55		102,66	102,66
	Cubierta baños	4,40	5,75		25,30	25,30
	Subtotal					127,96
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-025	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:02	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU		
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025		

1,03	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

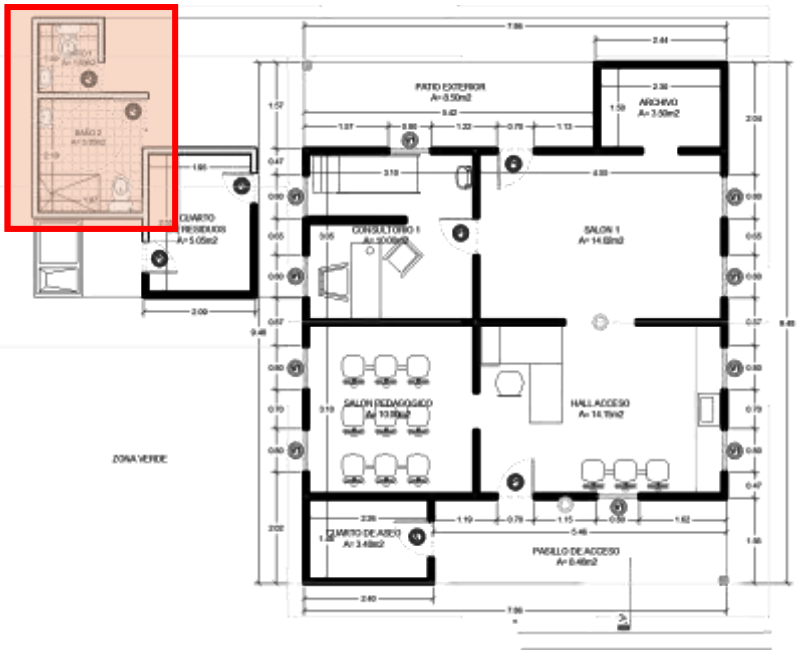


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO 1	1,15	2,00	1,30	2,00	9,80
	BAÑO 2	1,15	2,00	2,10	2,00	13,00
						-
	Puertas se restan	0,90	2,00		(2,00)	- 3,60
	Subtotal					19,20
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-026	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:03	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU		
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025		

1,04	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

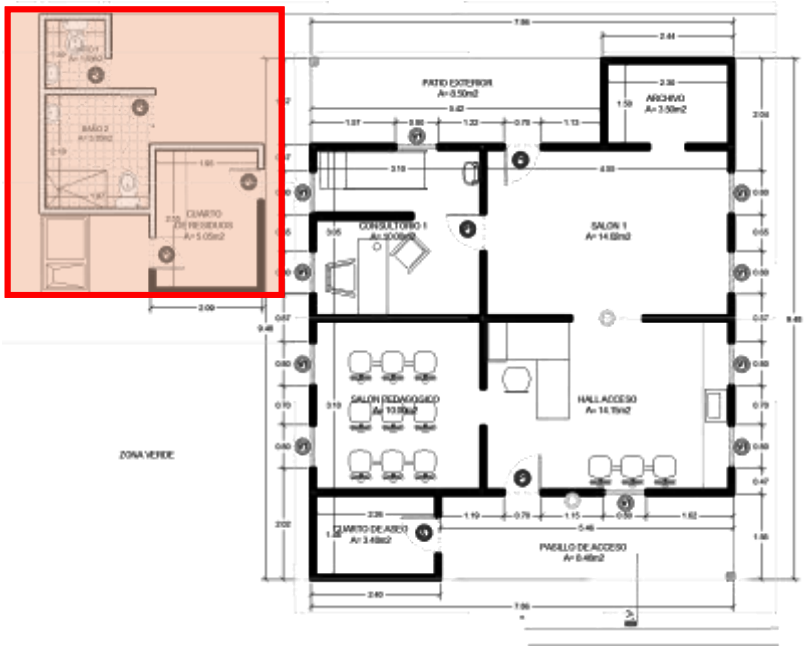


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BODEGA 2	1,95		2,55		4,97
	BAÑO 1	1,15		1,30		1,50
	BAÑO 2	1,97		2,10		4,14
	Subtotal					10,60
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-026	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:03	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU		
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025		

1,05	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

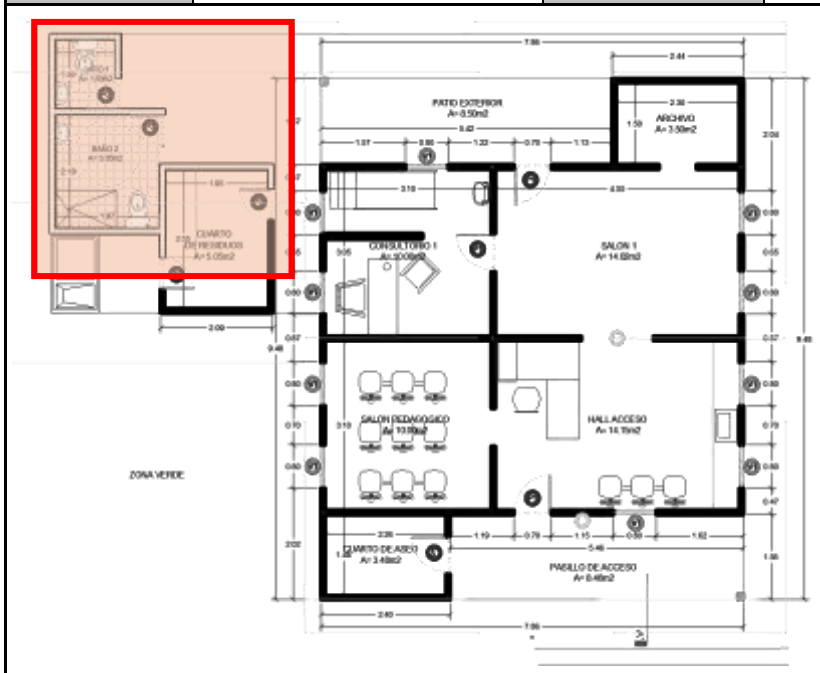

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BODEGA	2,20	2,10	2,70	2,00	20,58
	BAÑO 1	1,30	2,10		1,00	2,73
	BAÑO 2	0,40	2,10		1,00	0,84
	PUERTAS BODEGA	0,80	2,00		2,00	3,20
	Subtotal					20,95
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-027**
		VERSIÓN:04
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

1,06	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**ITEM**	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

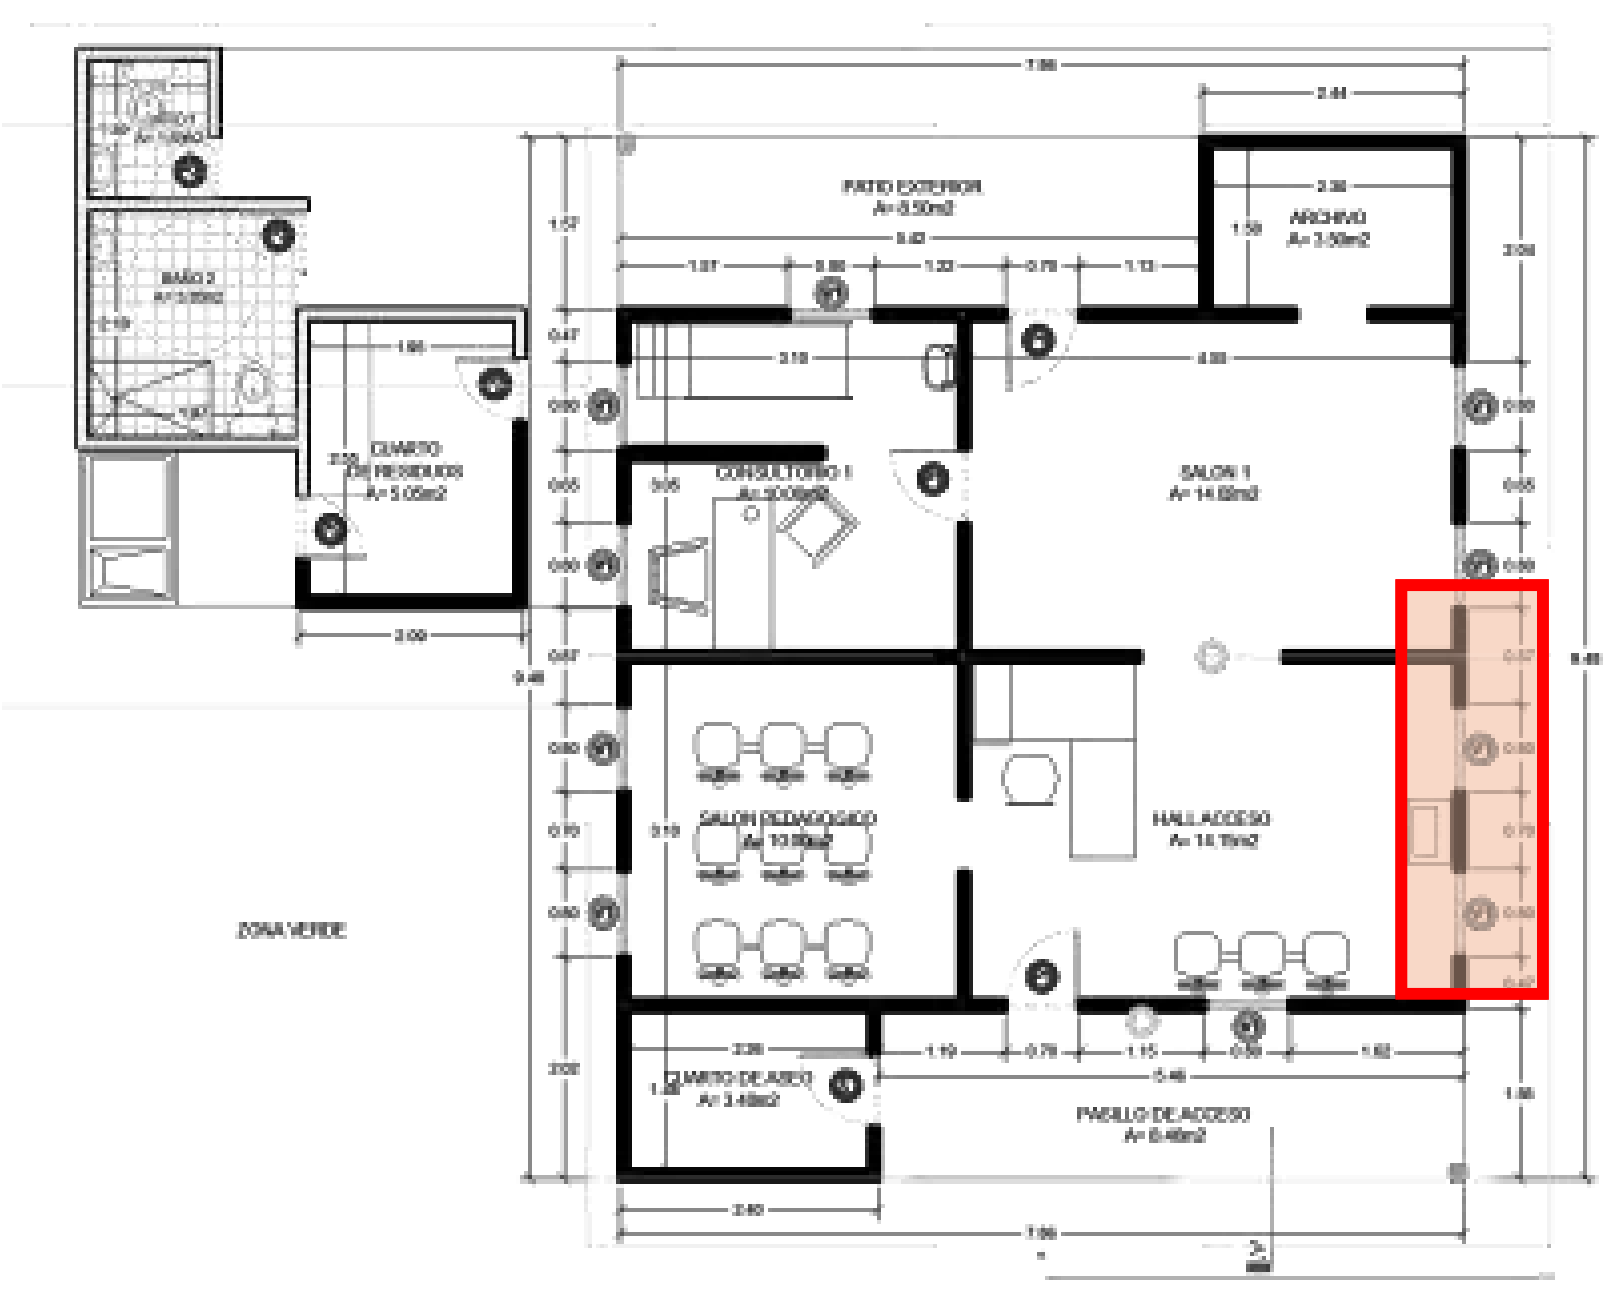

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL ACCESO			3,10		3,10
Subtotal						3,10
TOTAL						**0,00**


0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-028**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											**VERSIÓN:05**	
												PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

1,07	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**ITEM**	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

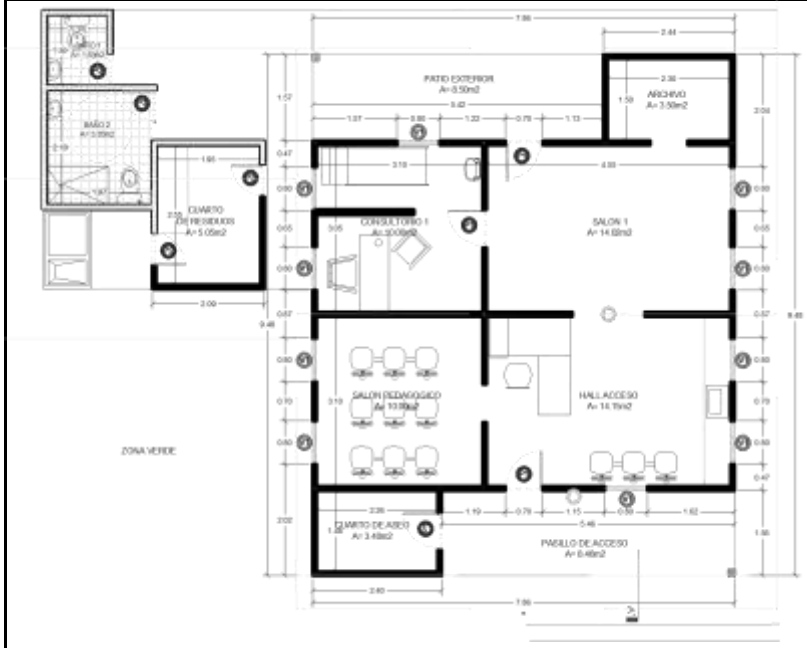


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",			1,60	2,00	3,20
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT			1,60	-	-
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC			1,60	2,00	3,20
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",			1,60	1,00	1,60
	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W			1,60	-	-
	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ			1,60	-	-
	Subtotal					8,00
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-029	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:06	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

1,08	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

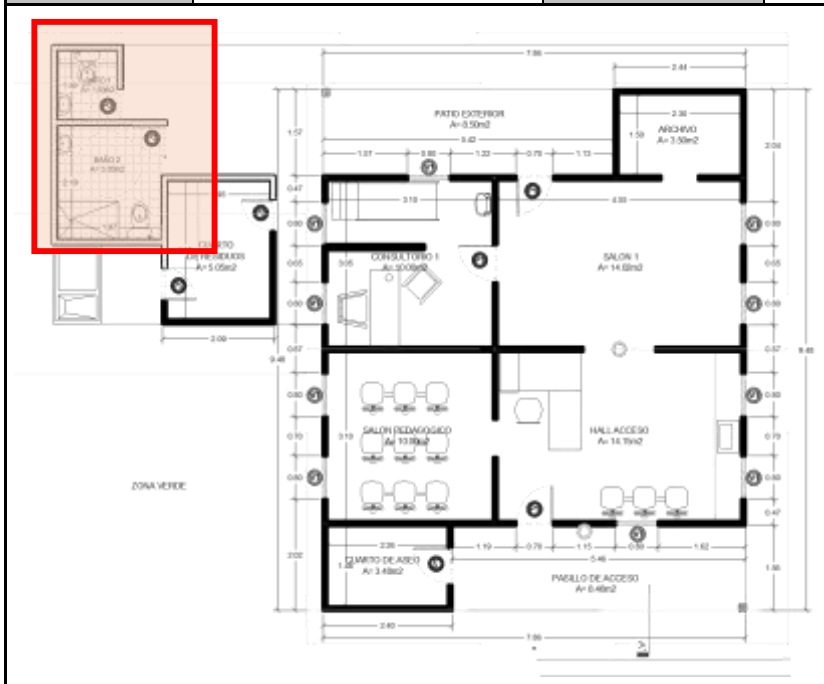

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO 1				2,00	2,00
	BAÑO 2				2,00	2,00
	Subtotal					4,00
	TOTAL					0,00


0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-029**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											**VERSIÓN:06**	
												PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

1,09	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**ITEM**	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

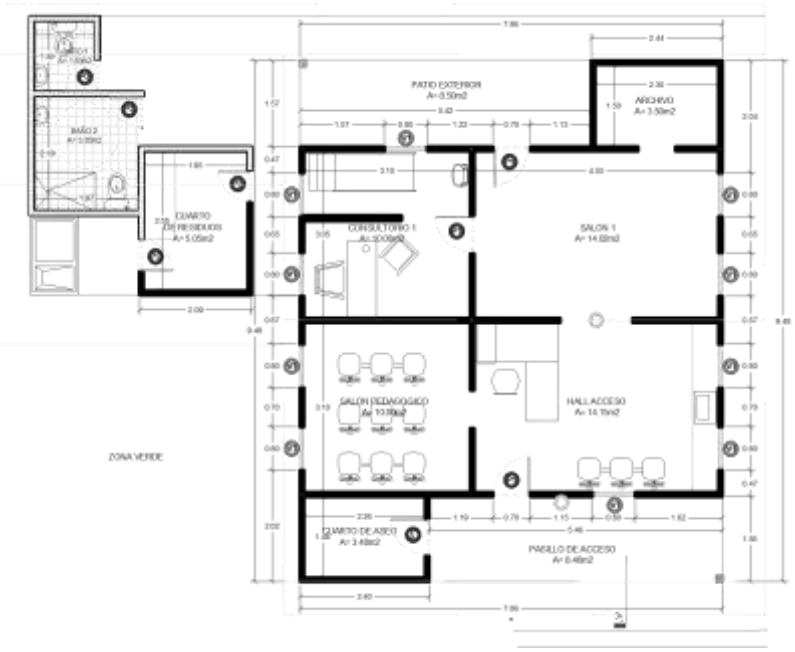


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUBIERTA principal	10,75	9,55		102,66	102,66
	Cubierta baños	4,40	5,75		25,30	25,30
	Subtotal					127,96
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-030	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:07	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA					NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU			
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S					NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025			

1,10	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

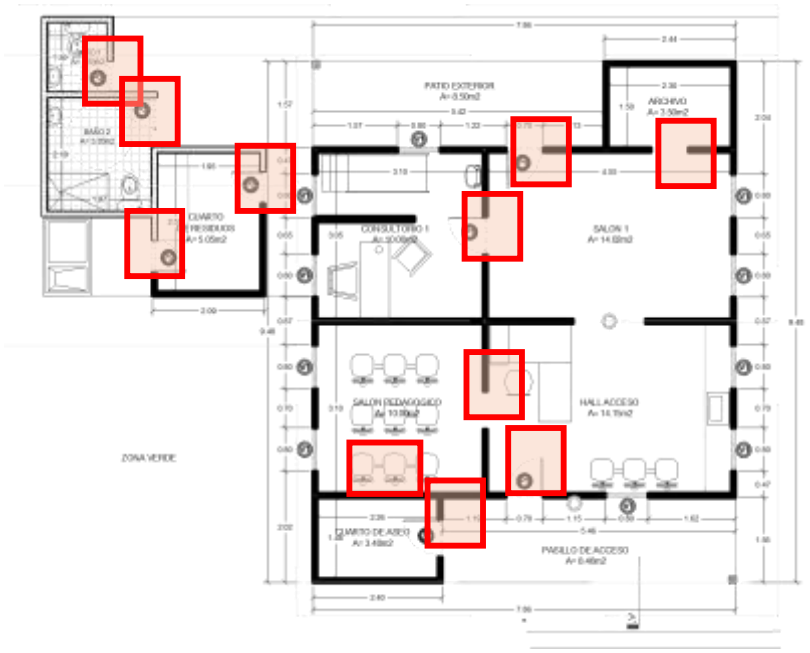


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL ACCESO				1,00	1,00
	ARCHIVO				1,00	1,00
	SALON 1				1,00	1,00
	CONSTULTORIO 1				1,00	1,00
	BODEGA 2				2,00	2,00
	BAÑO 1				1,00	1,00
	BAÑO 2				1,00	1,00
	ACCESO PRINCIPAL				1,00	1,00
	CUARTO DE ASEO				2,00	2,00
	Subtotal					11,00
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-031	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:08	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

1,11	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DESMONTE VENTANAS	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

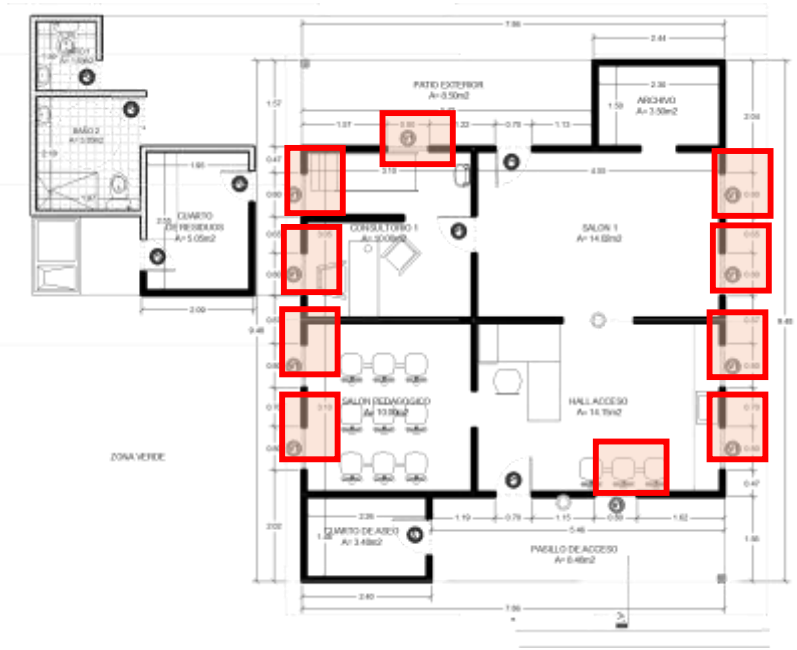


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL ACCESO	2,40	1,00		3,00	7,20
	SALON PEDAGOGICO	1,60	1,00		2,00	3,20
	SALON 1	1,60	1,00		2,00	3,20
	CONSTULTORIO 1	2,40	1,00		3,00	7,20
	Subtotal					20,80
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-031	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:08	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

1,12	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO, MURO DE BASE Y CONCERTINA	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

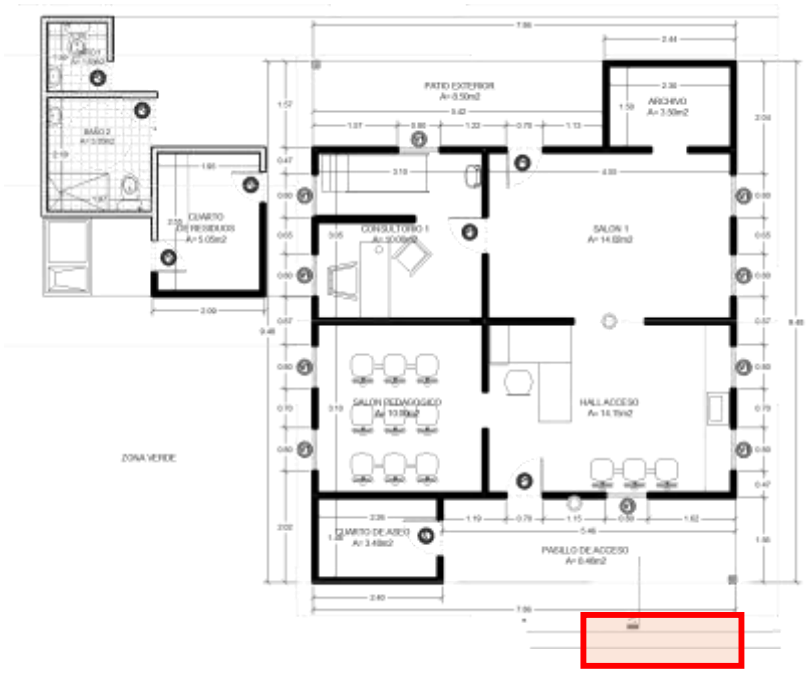

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL			1,60		1,60
	Subtotal					1,60
	TOTAL					0,00


0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-031**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											**VERSIÓN:08**	
												PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

1,13	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**ITEM**	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

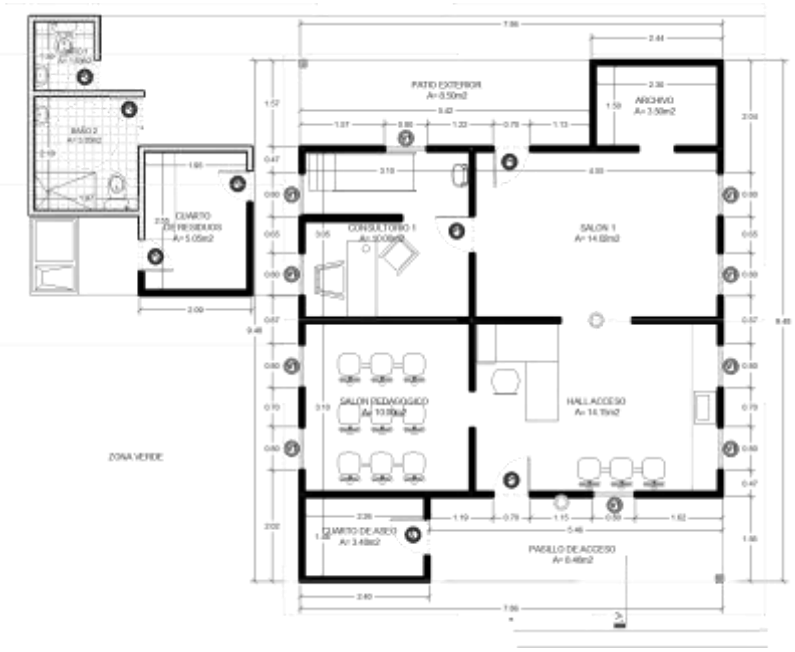

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	AREA CONSULTORIOS	10,75	9,55		102,66	102,66
	AREA BAÑOS	4,40	5,75		25,30	25,30
	Subtotal					127,96
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-031	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				VERSIÓN:08	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		PÁGINA:	Jesús Loaiza Ramírez
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

1,14	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	UNID.	TON/Km	UBICACIÓN	GENERAL

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Coeficiente	Longitud		
	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M		0,072	-		-
	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA		0,0100	-		-
	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO		0,048	-		-
	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO		0,0050	-		-
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M		0,1000	-		-
	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	0,60	0,1500	-		-
	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE	0,05	0,0010	-		-
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS		0,0500	-		-
	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO		0,0100	-		-
	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS		0,0500	-		-
	DESMONTE VENTANAS		0,0500	-		-
	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON		0,0100	-		-
						-
	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M		0,24	-		-
						-
	Subtotal toneladas					0,00
	Distancia desde la cabecera municipal					15,00
	TOTAL					0,00


0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-031	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				VERSIÓN:08	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		PÁGINA:	Jesús Loaiza Ramírez
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	

CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

1,15	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	UNID.	#N/D	UBICACIÓN	GENERAL

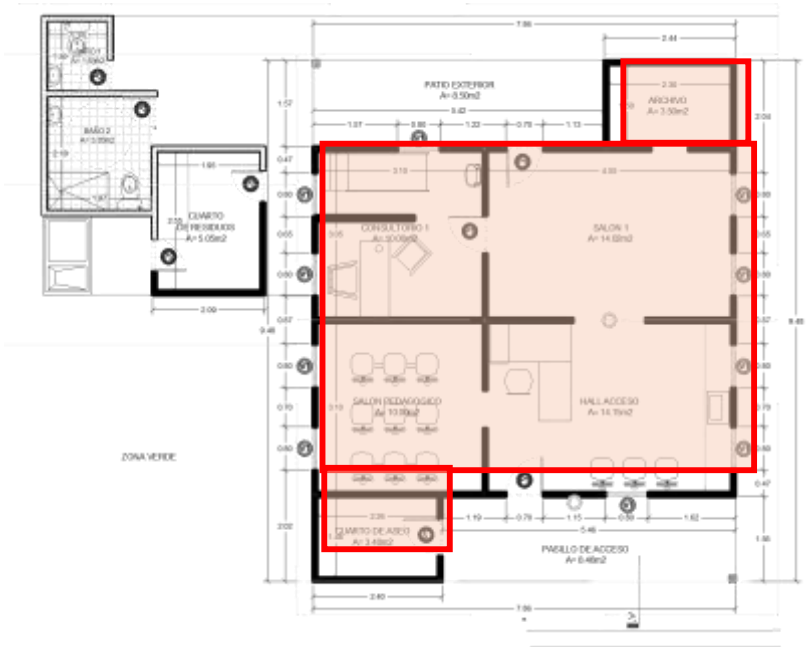

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho		Longitud		
	REVOQUE					
	BODEGA 2	2,20	2,10	2,70	2,00	23,35
	BAÑO 1	1,15	2,10	0,50	2,00	2,42
	BAÑO 2	2,20	2,10	2,10	2,00	19,40
						-
						-
						-
	MORTEROS					-
						-
	BAÑO 1	1,21		1,30		1,57
	BAÑO 2	1,20		2,14		2,57
						-
						-
						-
						-
	PUERTAS 4 (SE QUITAN 8 POR SER POR CARA Y CARA)	0,80	2,00		8,00	12,80
	Subtotal M2					36,51
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS													ACTA PARCIAL-031
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA													VERSIÓN:08
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ				PÁGINA:
														Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

1,16	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	UNID.	#N/D	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho		Longitud		
	ARCHIVO	1,50		2,40		3,60
						-

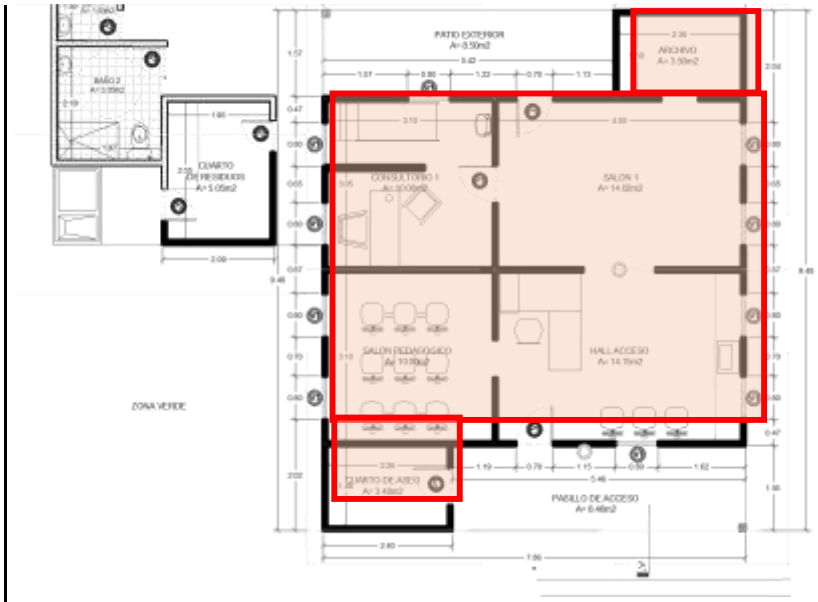

	CENTRAL	6,52		7,86		51,25
	CUARTO DE ASEO	1,48		2,40		3,55
						-
	Baño 1	1,55		1,30		2,02
	BAÑO 1	1,15		1,30		1,50
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal toneladas					61,91
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-032**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											**VERSIÓN:09**	
												PÁGINA:	**1 DE 10**
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

2,01	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**	**ITEM**	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUBIERTA	5,55		13,45		74,65
		5,20		9,55		49,66
	Subtotal					124,31
					Se Paga al 90%	111,88
	TOTAL					**111,88**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				**ACTA PARCIAL-032**	
												VERSIÓN:09	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				**PÁGINA:**	**2 DE 10**
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

2,02	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**	**ITEM**	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUBIERTA			9,55		9,55
	Subtotal					9,55
	TOTAL					**9,55**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-033**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											**VERSIÓN:10**	
												PÁGINA:	**3 DE 10**
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

2,03	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**	**ITEM**	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

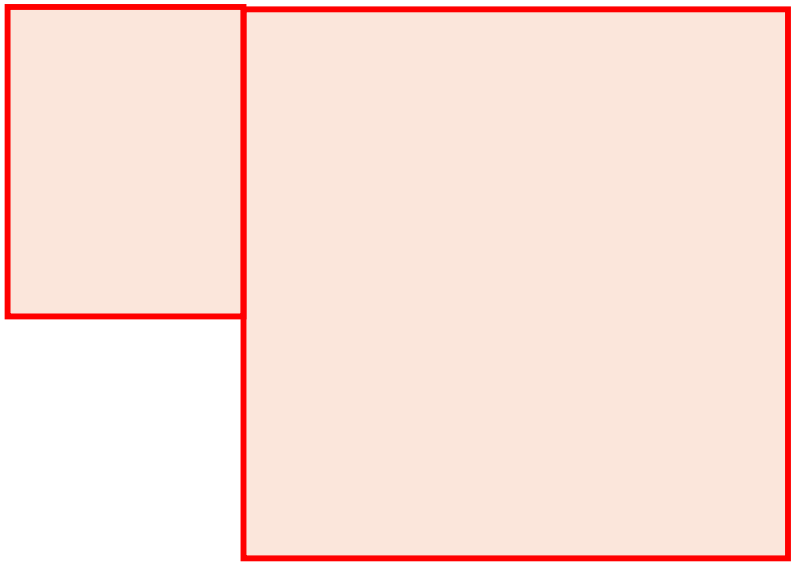

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUBIERTA PRICIPAL	5,55		13,45		74,65
		5,20		9,55		49,66
	Subtotal					124,31
					Se Paga al 90%	111,88
	TOTAL					**111,88**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				**ACTA PARCIAL-034**	
												VERSIÓN:11	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

2,04	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**	**ITEM**	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	CUBIERTA			12,00	2,00	24,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-040**
		VERSIÓN:17
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

2,05	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**	**ITEM**	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUBIERTA				5,00	5,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-056**	
		VERSIÓN:33	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**	

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

2,06	CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS	ITEM	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	FACHADA PRINCIPAL		2,50		4,00	10,00
	FACHADA POSTERIOR		2,50		4,00	10,00
						-
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-035	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:12	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025	

3,01	PISOS y BASES	ITEM	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALÓN	4,55	-	3,05		13,88
	CONSULTORIO	3,10	-	3,05		9,46
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	-	3,10		9,61
	ARCHIVO	2,30	-	1,50		3,45
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55		4,97
	HALL DE ACCESO	4,55		3,10		14,11
	PASILLO ACCESO	5,46	-	1,55		8,46
	BAÑO 1	1,15	-	1,30		1,50
	BAÑO 2	1,97	-	2,10		4,14
	BODEGA	2,26	-	1,48		3,34
	Subtotal					
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				**ACTA PARCIAL-037**	
												VERSIÓN:14	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

4,01	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**ITEM**	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALÓN	4,55	-	3,05		13,88
	CONSULTORIO	3,10	-	3,05		9,46
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	-	3,10		9,61
	ARCHIVO	2,30	-	1,50		3,45
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55		4,97
	HALL DE ACCESO	4,55		3,10		14,11
	PASILLO ACCESO	5,46	-	1,55		8,46
	BAÑO 1	1,15	-	1,30		1,50
	BAÑO 2	1,97	-	2,10		4,14
	BODEGA	2,26	-	1,48		3,34
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-038**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											**VERSIÓN:15**	
												PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

4,02	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**ITEM**	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	BAÑO 1	1,15	2,40	1,30	2	11,76
	BAÑO 2	1,97	2,40	2,10	2	19,54
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

					CONSULTIN P&S SAS							**ACTA PARCIAL-041**	
												VERSIÓN:18	
					MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA							**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

4,03	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**ITEM**	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!


Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	SALÓN	4,55	-	3,05		13,88
	CONSULTORIO	3,10	-	3,05		9,46
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	-	3,10		9,61
	ARCHIVO	2,30	-	1,50		3,45
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55		4,97
	HALL DE ACCESO	4,55		3,10		14,11
	PASILLO ACCESO	5,46	-	1,55		8,46
	BAÑO 1	1,15	-	1,30		1,50
	BAÑO 2	1,97	-	2,10		4,14
	BODEGA	2,26	-	1,48		3,34
	PATIO EXTERIOR	5,42	-	2,00		10,84
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-042	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:19	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

5,01	MAMPOSTERÍA	ITEM	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

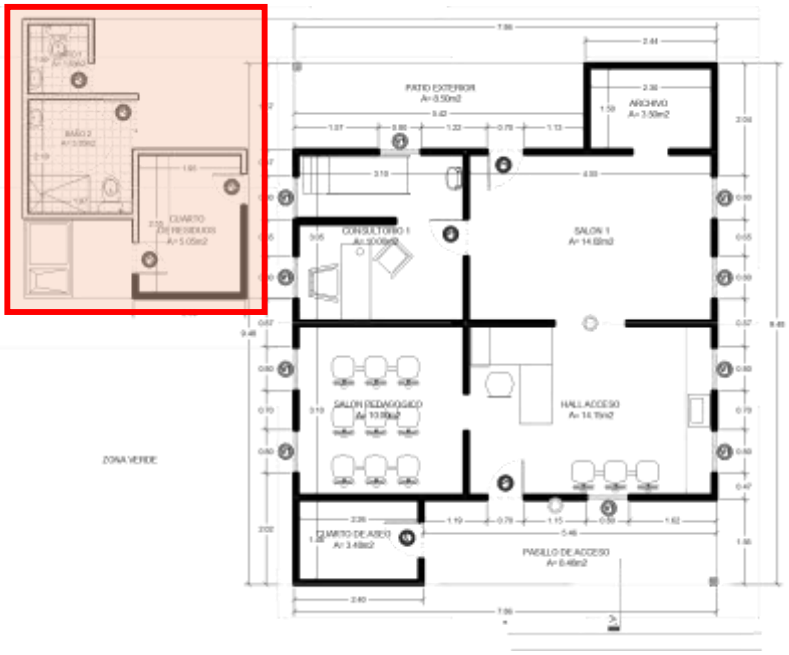

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO 1		2,40	1,50	1,00	3,60
	BAÑO 2		2,40	1,80	1,00	4,32
	CUARTO DE RESIDUOS		2,40	7,80	1,00	18,72
	Subtotal					26,64
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-042
		VERSIÓN:19
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 4 DE 10

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

5,02	MAMPOSTERÍA	ITEM	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

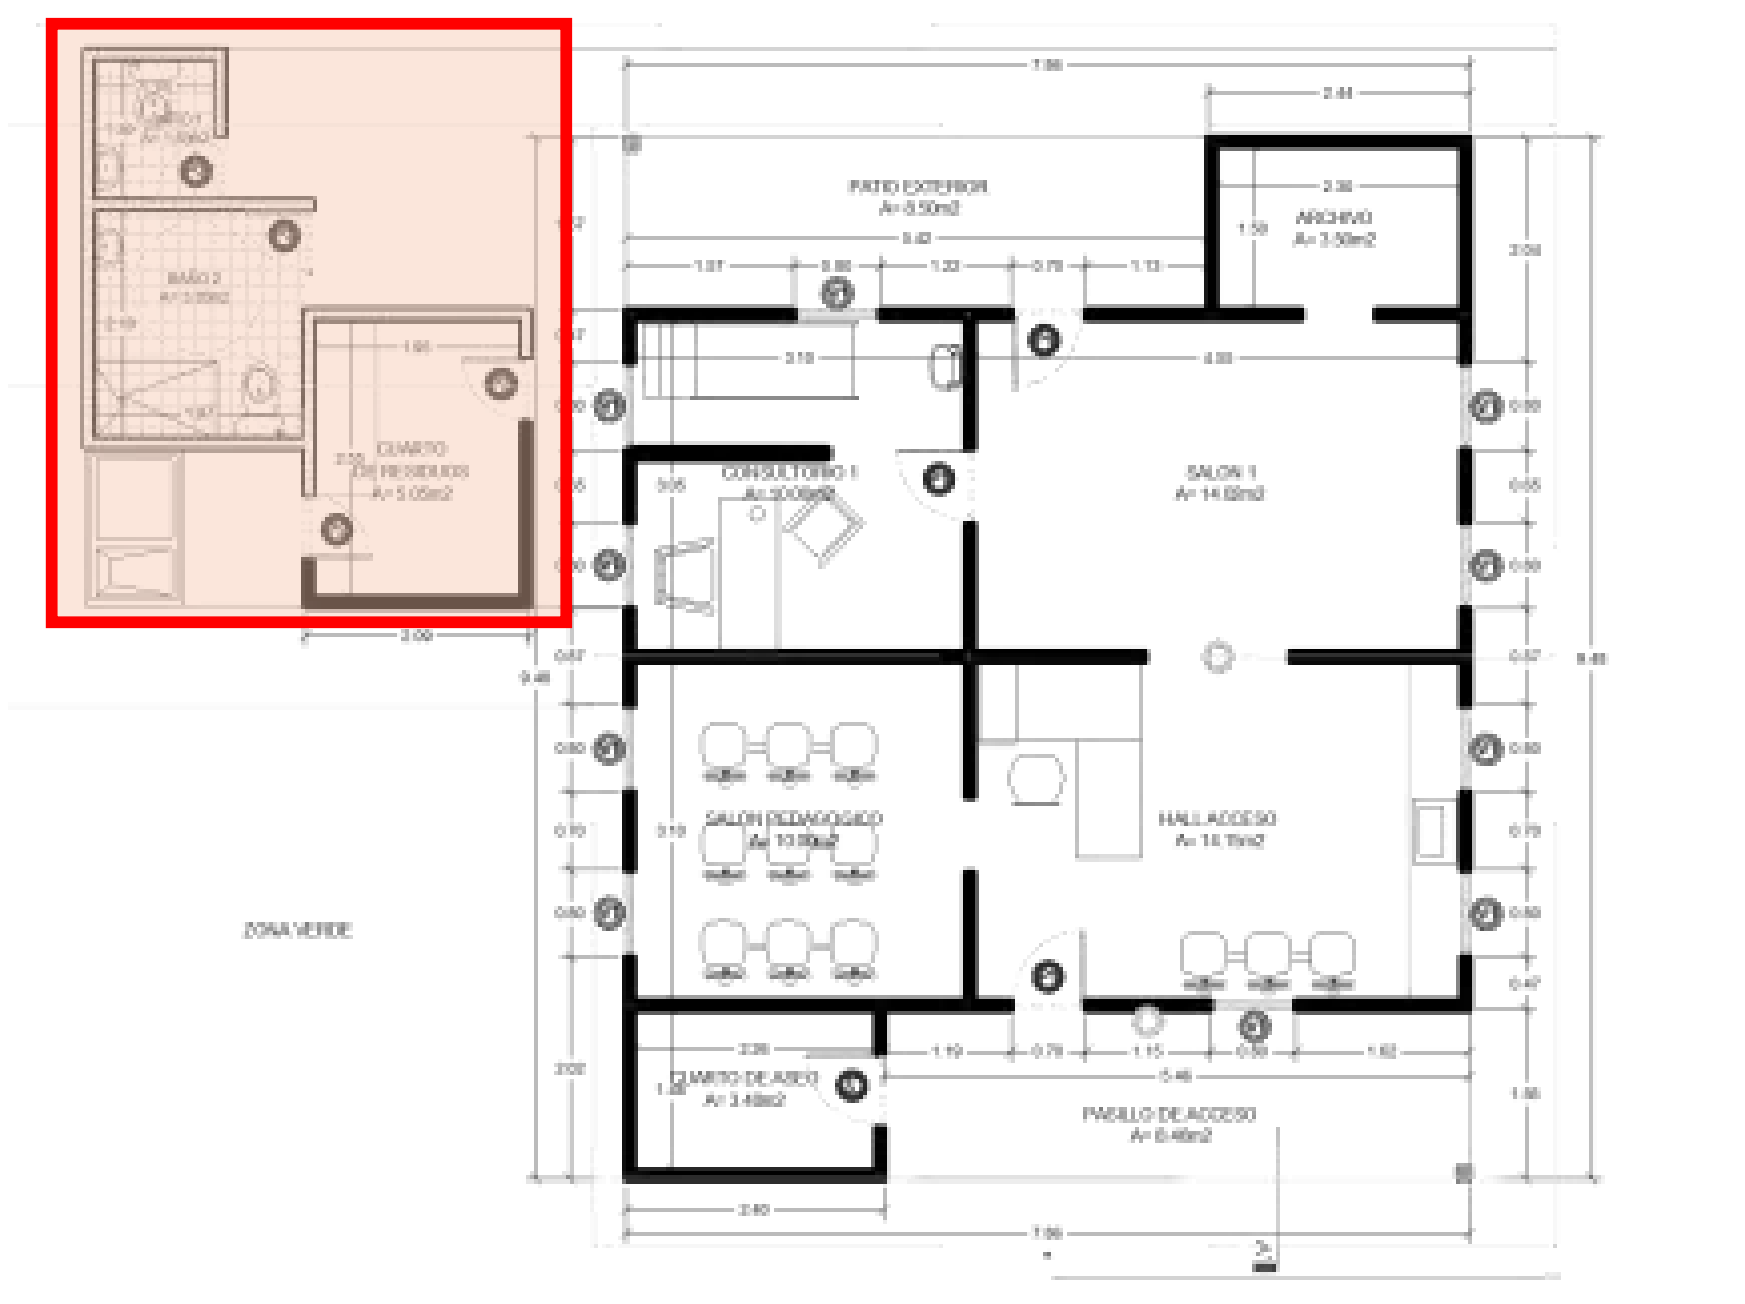


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO 1			2,75		2,75
	BAÑO 2			2,75		2,75
	CUARTO DE RESIDUOS			4,60		4,60
	4,6+2,75+2,75					
Subtotal						10,10
TOTAL						**10,10**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-046**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											**VERSIÓN:23**	
												PÁGINA:	**5 DE 10**
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

6,01	**MUROS**	**ITEM**	RECUBRIMIENTO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM, UNA CARA	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

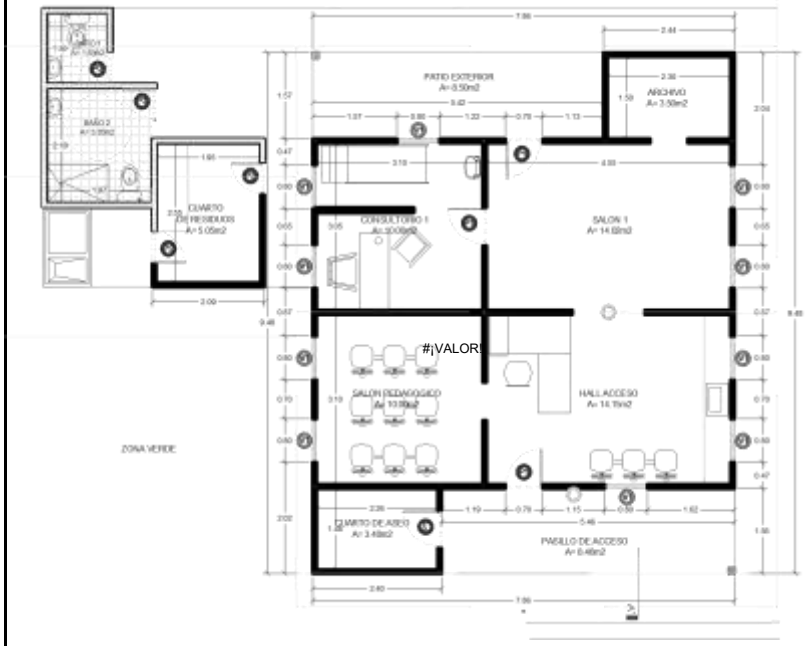


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALÓN	4,55	2,40	3,05	2,00	36,48
	CONSULTORIO	3,10	2,40	3,05	2,00	29,52
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	2,40	3,10	2,00	29,76
	ARCHIVO	2,30	2,40	1,50	2,00	18,24
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	2,40	2,55	2,00	21,60
	HALL DE ACCESO	4,55	2,40	3,10	2,00	36,72
	BAÑO 1	1,15	2,40	1,30	2,00	11,76
	BAÑO 2	1,97	2,40	2,10	2,00	19,54
	BODEGA	2,26	2,40	1,48	2,00	17,95
						-
	FACHADA PRINCIPAL		2,40	11,92	1,00	28,61
	FACHADA IZQUIERDA		2,40	12,88	1,00	30,91
	FACHADA DERECHA		2,40	12,03	1,00	28,87
	FACHADA POSTERIOR		2,40	11,78	1,00	28,27
	Pagado en acta 1			75%		(253,67)
	Subtotal					84,56
	TOTAL					**84,56**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-048	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:25	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

7,01	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	CONCRETO 4000 PSI	UNID.	m3	UBICACIÓN	GENERAL

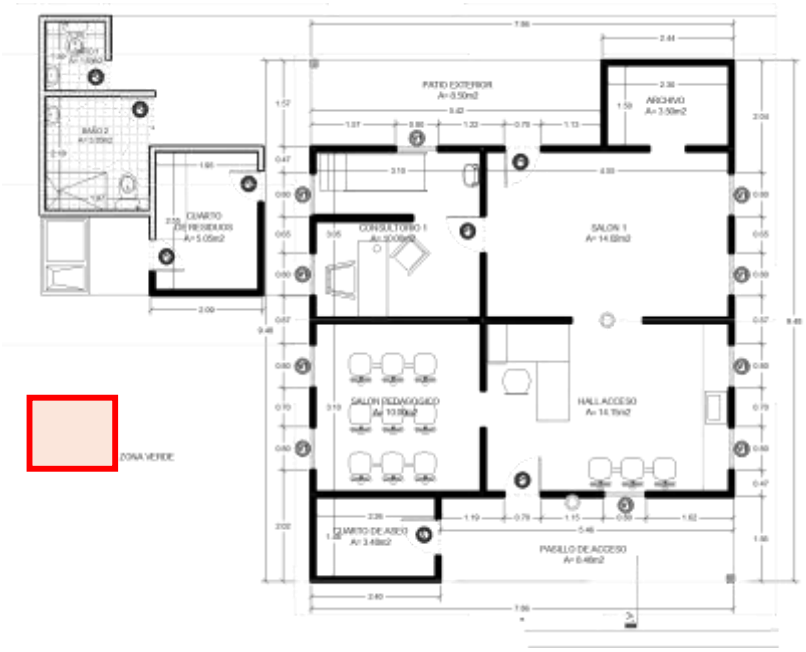


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PARA TANQUE ZAPATA	1,00	0,50	1,00		0,50
	Subtotal					0,50
	TOTAL					

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-049	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:26	
												PÁGINA:	6 DE 10
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

7,02	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	CONCRETO 3500 PSI	UNID.	m3	UBICACIÓN	GENERAL

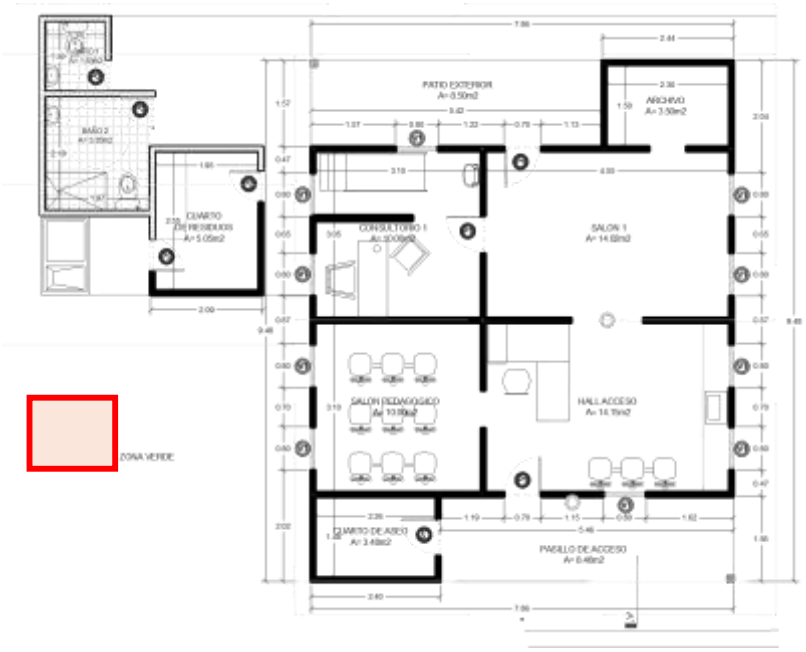

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PARA TANQUE COLUMNA	0,30	0,30	3,00		0,27
	VIGA CINTA	0,10	0,20	19,00		0,38
	Pagado acta 1					(0,27)
	Subtotal					0,38
	TOTAL					0,38

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-049**
		VERSIÓN:26
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

7,03	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

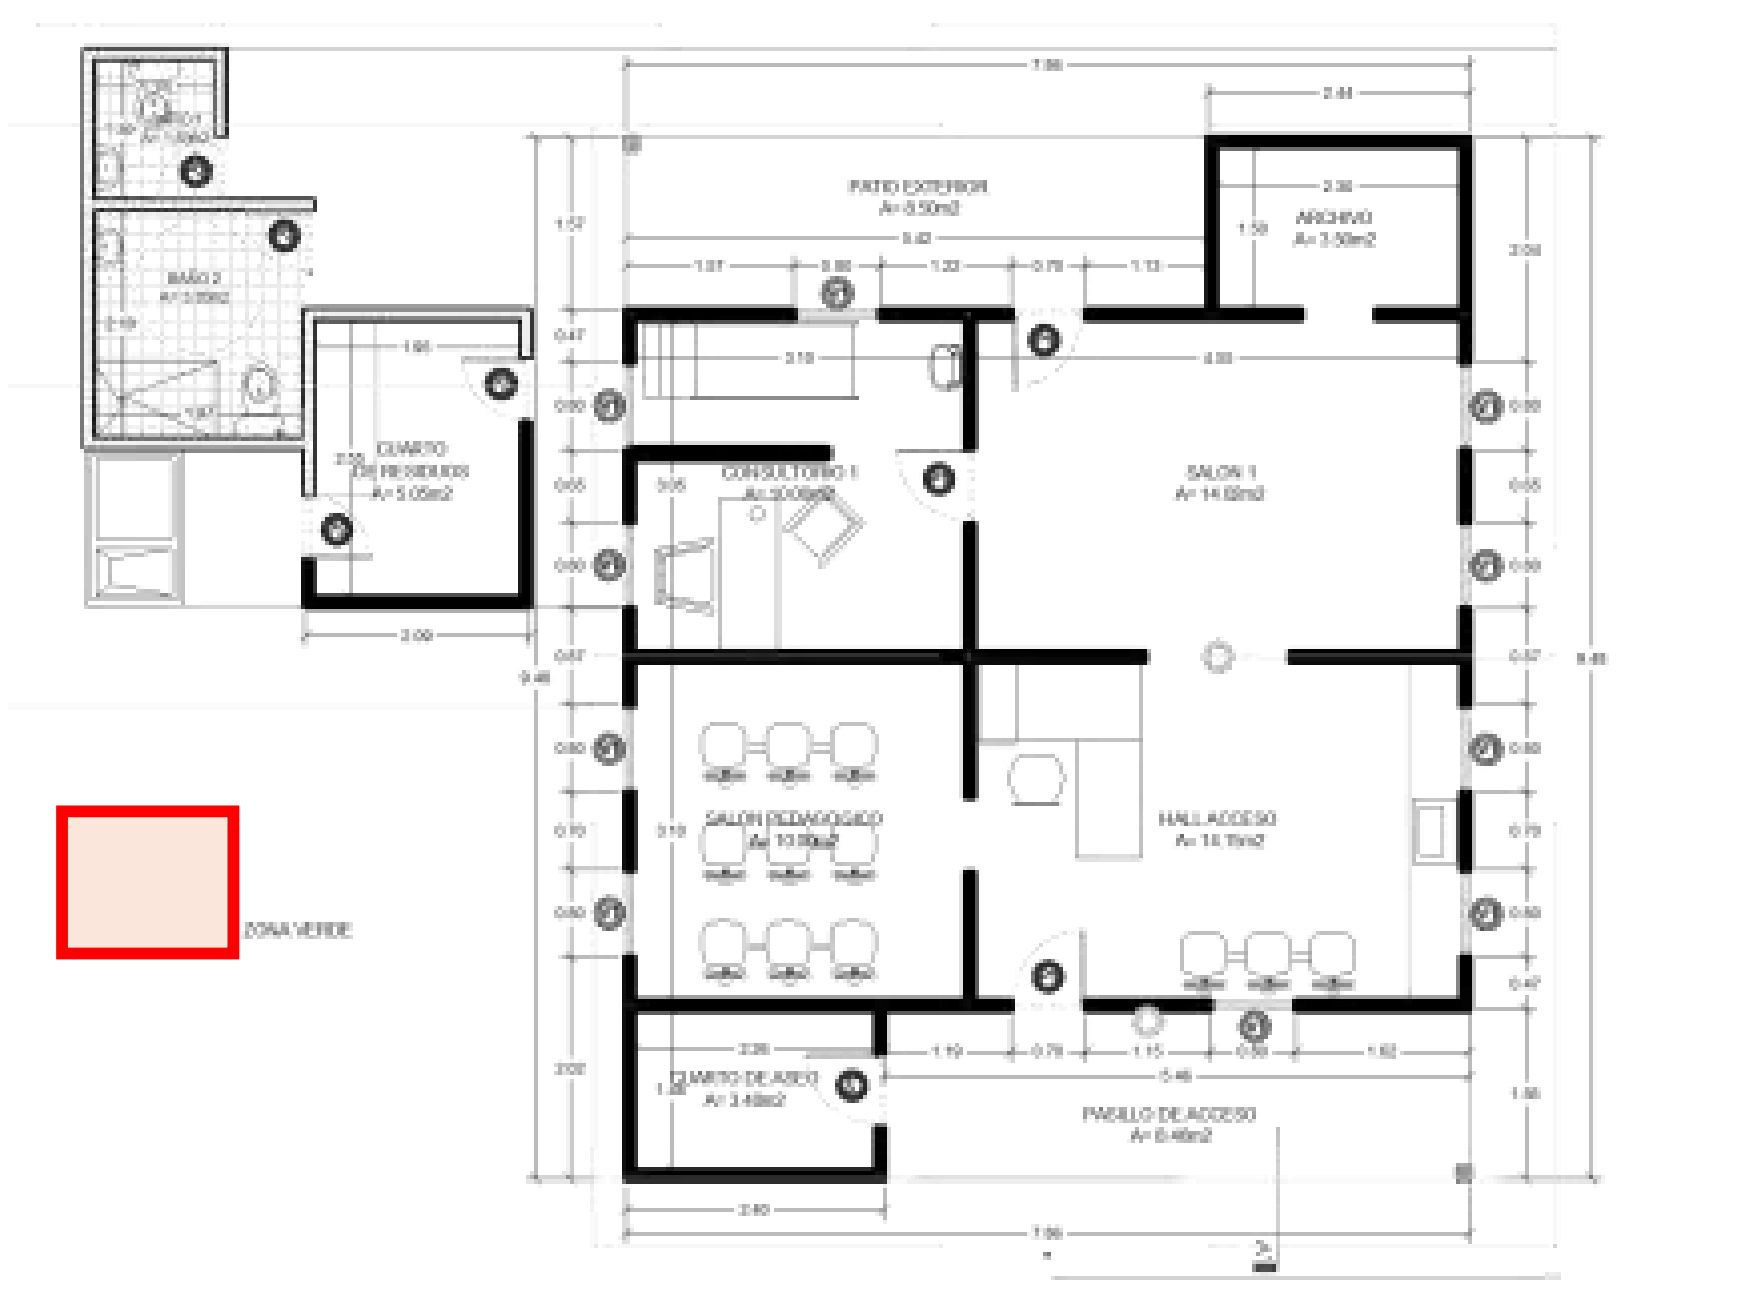

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PARA TANQUE	1,50		1,50		2,25
					Subtotal	2,25
					TOTAL	**0,00**

		0 **Jesús Loaiza R.** **Director de Obra**

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-050
		VERSIÓN:27
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

7,04	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PATIOS			20,00		20,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-050	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:27	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

7,05	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (Incluye rejilla metalica)	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

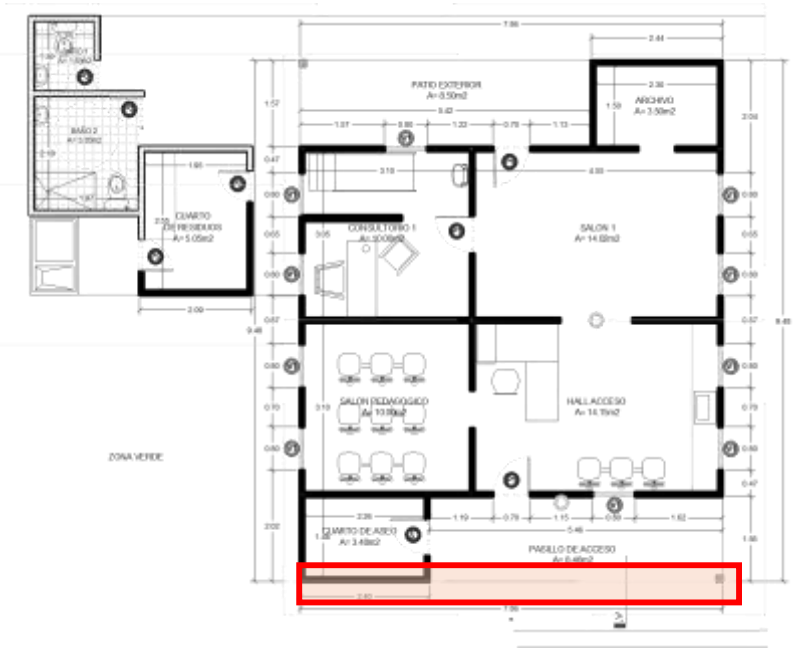

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL			11,92		11,92
	FACHADA IZQUIERDA			12,88		
	FACHADA DERECHA			12,03		
	FACHADA POSTERIOR			11,78		
	Subtotal					11,92
	TOTAL					0,00


0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-050	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:27	
												PÁGINA:	7 DE 10
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	

CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

7,06	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	UNID.	#N/D	UBICACIÓN	GENERAL

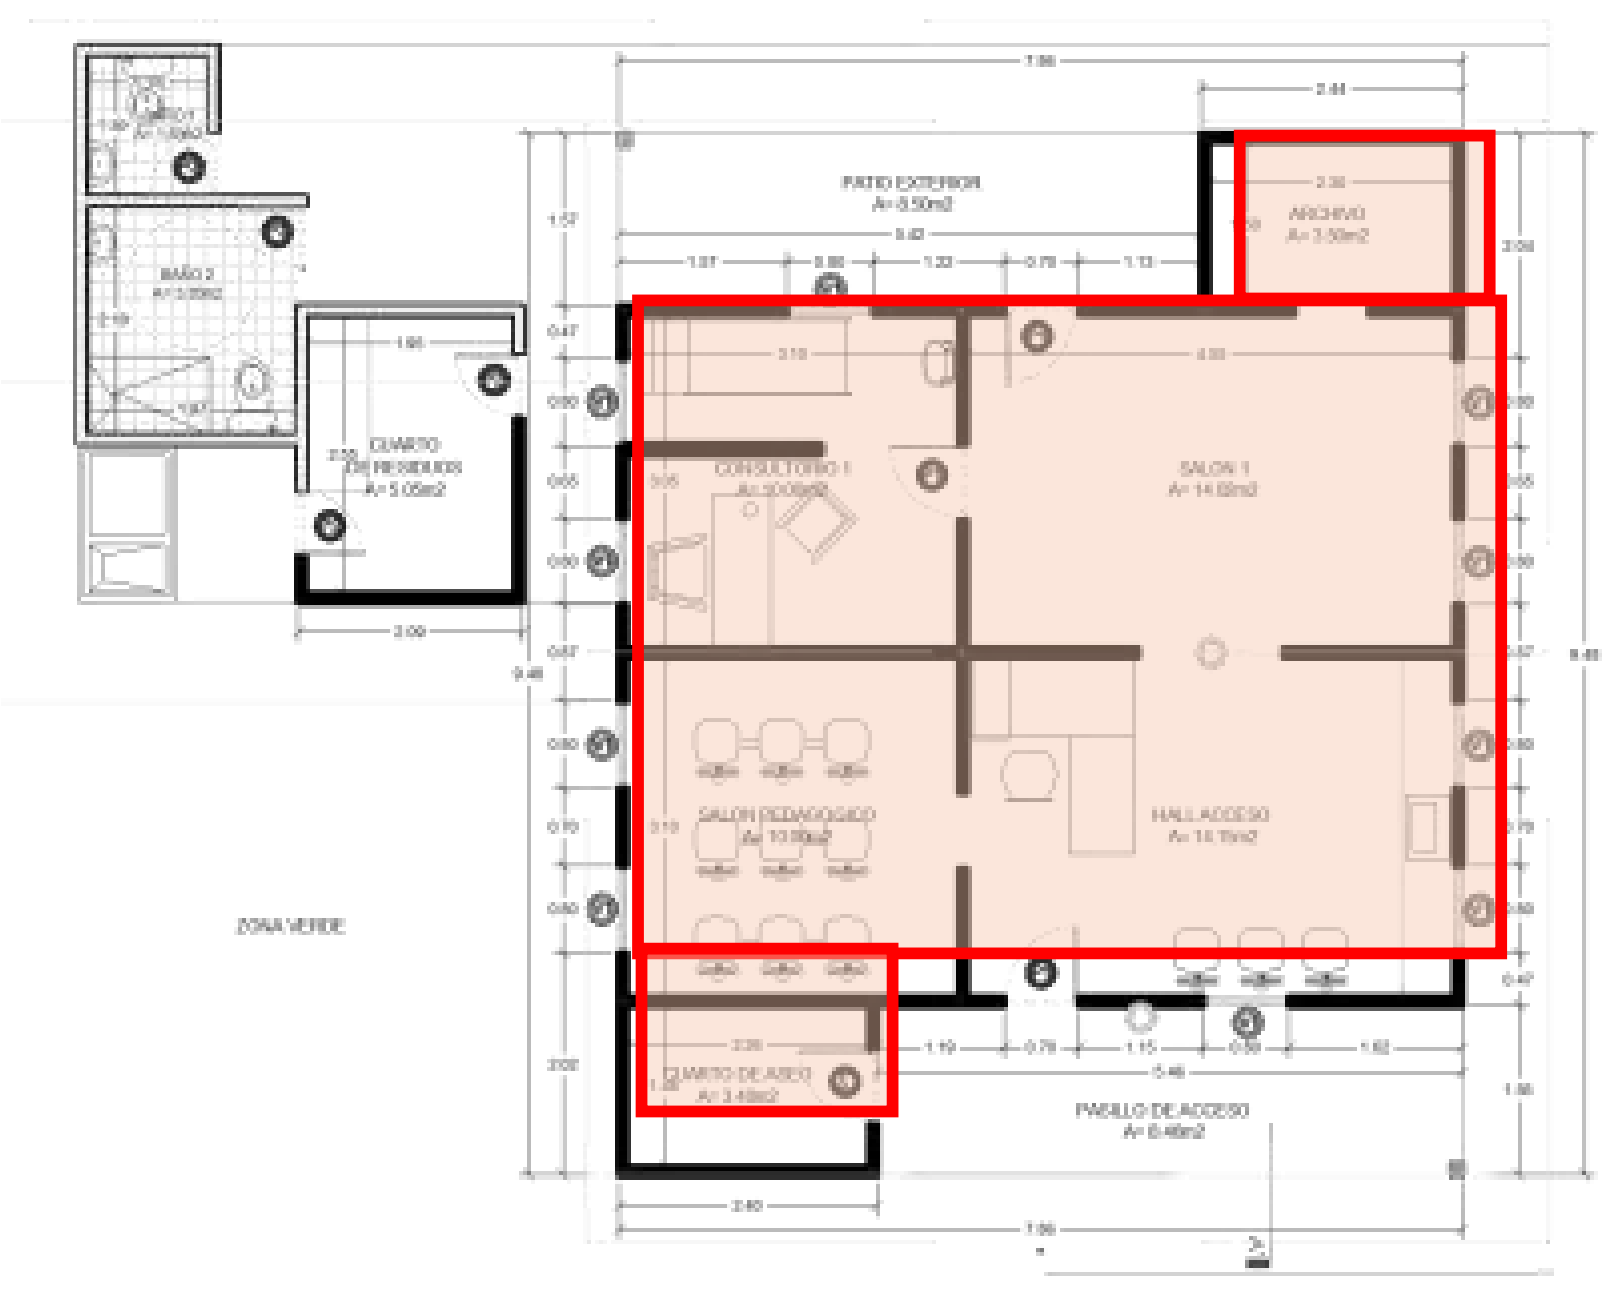


Fecha	Localización	Dimensiones Ancho		Longitud	No Elem.	Medida Total
	ARCHIVO	1,50		2,40		3,60
						-
	CENTRAL	6,50		7,86		51,09
	CUARTO DE ASEO	1,48		2,40		3,55
	Pasillo posterior	1,05		5,00		5,25
	Cuarto residuos	1,90		1,50		2,85
	Baño	1,15		1,30		1,50
	Baño pmr	1,50		1,90		2,85
	Pasillo frente	1,12		5,00		5,62
	anden exterior					1,87
	pagado acta 1					(70,69)
						-
						-
						-
						-
Subtotal toneladas						7,49
TOTAL						**7,49**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

				CONSULTIN P&S SAS								ACTA PARCIAL-051	
				MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA								VERSIÓN:28	
												PÁGINA:	8 DE 10
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA									
INTERVENTOR				HV INGENIERIA				NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA				CONSULTIN P&S				NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

8,01	ACERO	ITEM	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	UNID.	Kg	UBICACIÓN	GENERAL

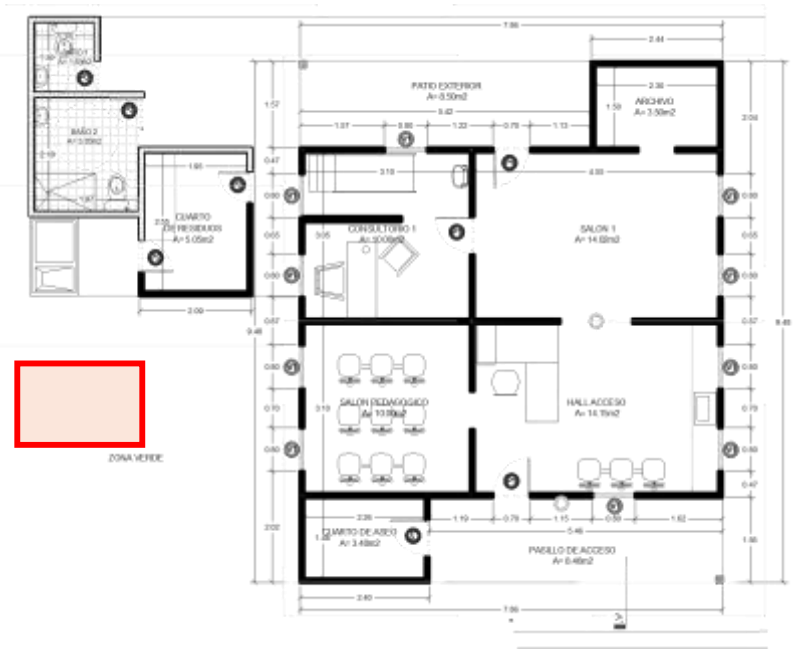

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Diam	Cant	Peso		
	PARA TANQUE					
	ZAPATA TANQUE	5/8	14,40	1,56		22,46
	COLUMNA TANQUE	5/8	18,00	1,56		28,08
	COLUMNA TANQUE	3/8	28,50	0,56		15,96
	PLACA AEREA TANQUE	5/8	42,00	1,56		65,52
	VIGA CINTA	5/8	40,19	1,56		62,70
	VIGA CINTA	3/8	21,85	0,56		12,24
	PAGADO ACTA 1					(131,28)
	Subtotal					74,94
	TOTAL					74,94


0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

				CONSULTIN P&S SAS								ACTA PARCIAL-050	
				MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA								VERSIÓN:27	
												PÁGINA:	9 DE 10
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA									
INTERVENTOR				HV INGENIERIA				NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	

CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

8,02	ACERO	ITEM	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	UNID.	#N/D	UBICACIÓN	GENERAL

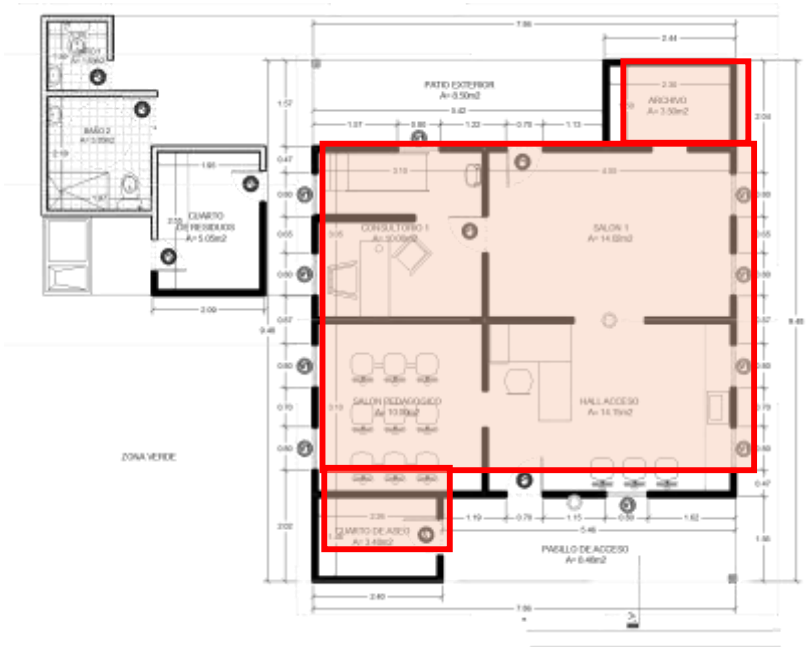

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho		Longitud		
	ARCHIVO	1,50		2,40		3,60
						-
	CENTRAL	6,50		7,86		51,09
	CUARTO DE ASEO	1,48		2,40		3,55
	Pasillo posterior	1,05		5,00		5,25
	Cuarto residuos	1,90		1,50		2,85
	Baño	1,15		1,30		1,50
	Baño pmr	1,50		1,90		2,85
	Pasillo frente	1,12		5,00		5,62
	anden exterior					1,87
	pagado acta 1					(70,69)
						-
						-
						-
						-
	Subtotal toneladas					7,49
	TOTAL					7,49

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS													ACTA PARCIAL-050	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA													VERSIÓN:27	
														PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ				Jesús Loaiza Ramírez	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

9,01	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	UNID.	#N/D	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Excavación para tuberia desague	0,40	0,40	27,00		4,32
						-

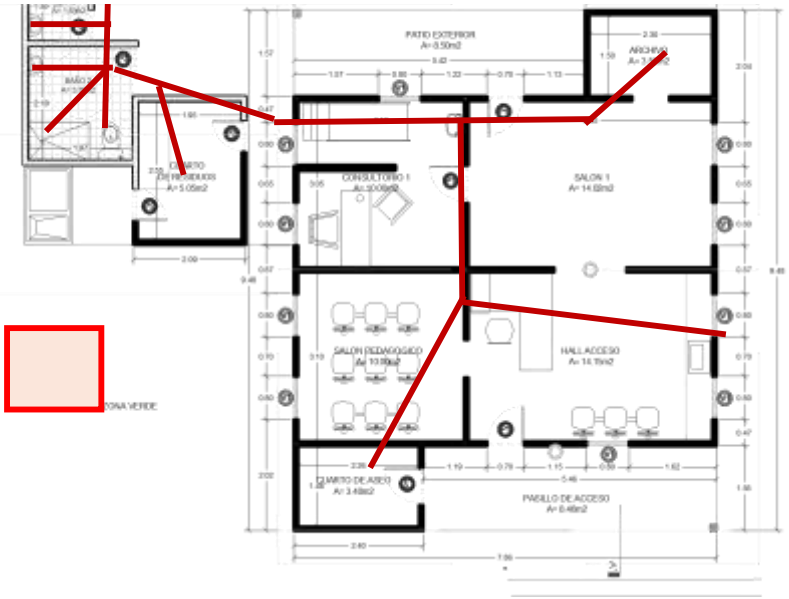

	Zapata tanque de agua	1,00	0,50	1,00		0,50
						-
	Para nivelación de fundido losa	58,25	0,0500			2,91
						-
	carcamo	0,50	0,5000	11,92		2,98
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal toneladas					10,71
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS		**ACTA PARCIAL-054**
			VERSIÓN:31
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

10,01	**RED SANITARIA**	**ITEM**	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

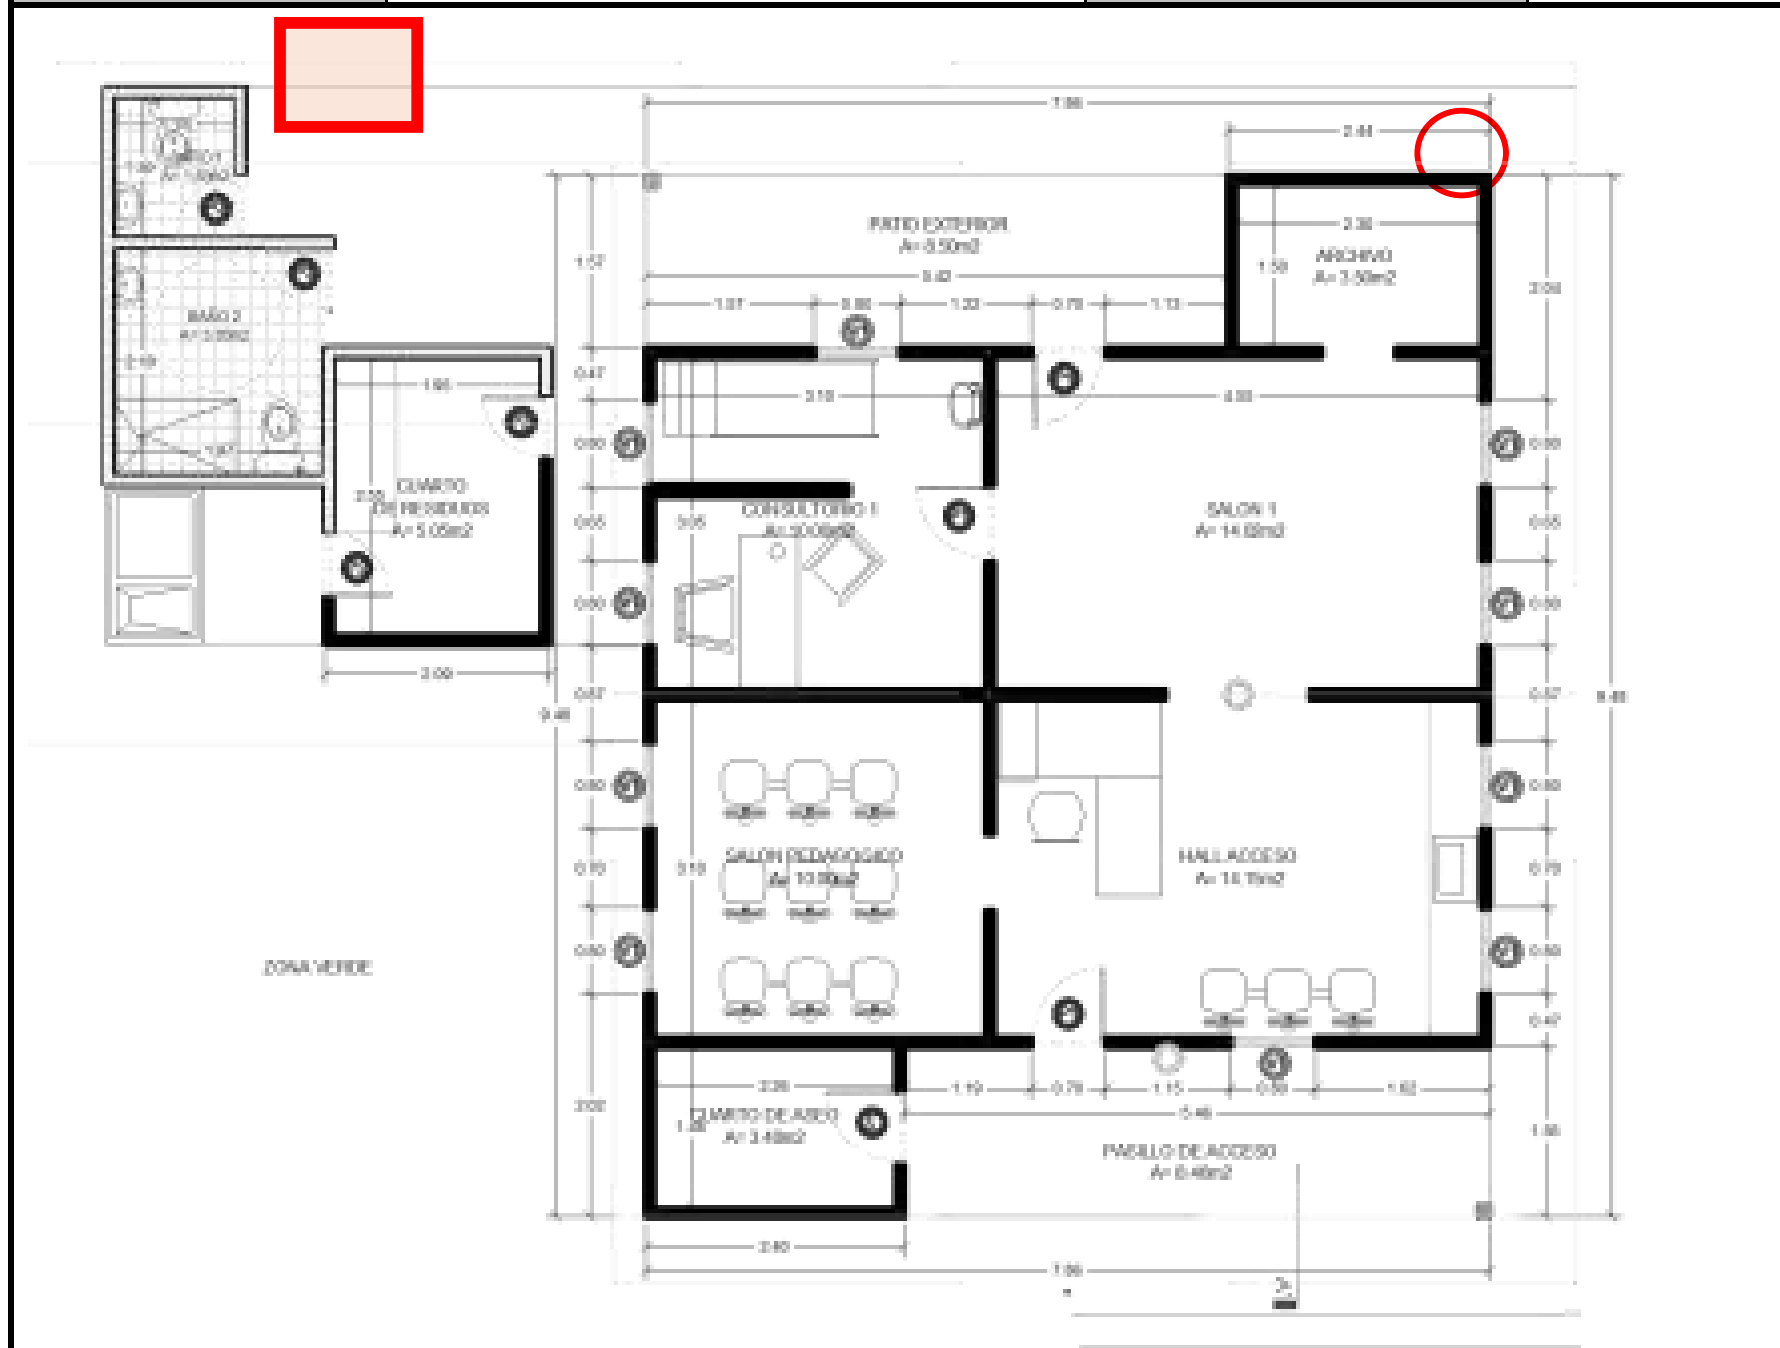


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA POSTERIOR				1,00	1,00
Subtotal						1,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-060	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:37	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

10,02	RED SANITARIA	ITEM	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

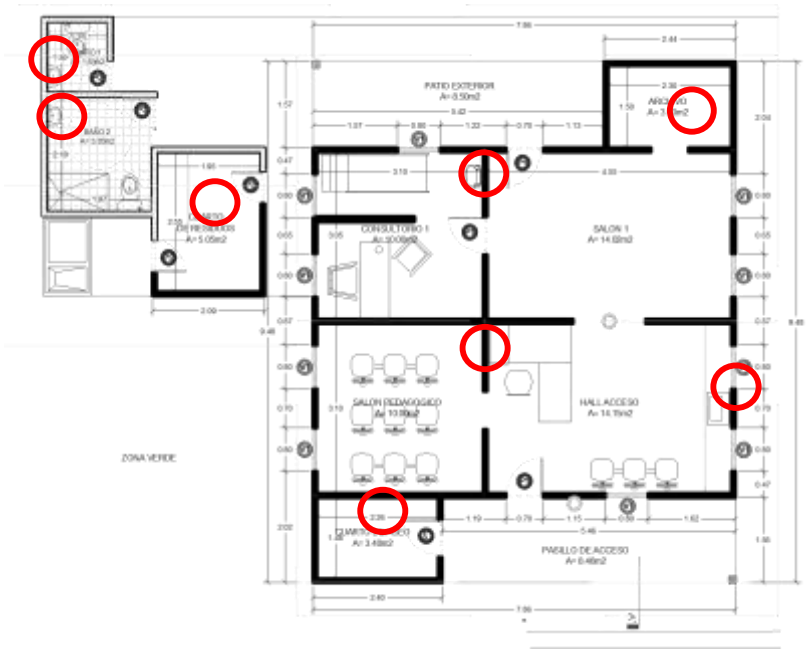

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Lavamanos Consultorios				2,00	2,00
	Rejillas de piso				2,00	2,00
	Lavaplatos				1,00	1,00
	Cuarto de residuos				1,00	1,00
	Baño 1				1,00	1,00
	Baño 2				1,00	1,00
	Subtotal					8,00
	TOTAL					0,00

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-061
		VERSIÓN:38
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

10,03	RED SANITARIA	ITEM	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

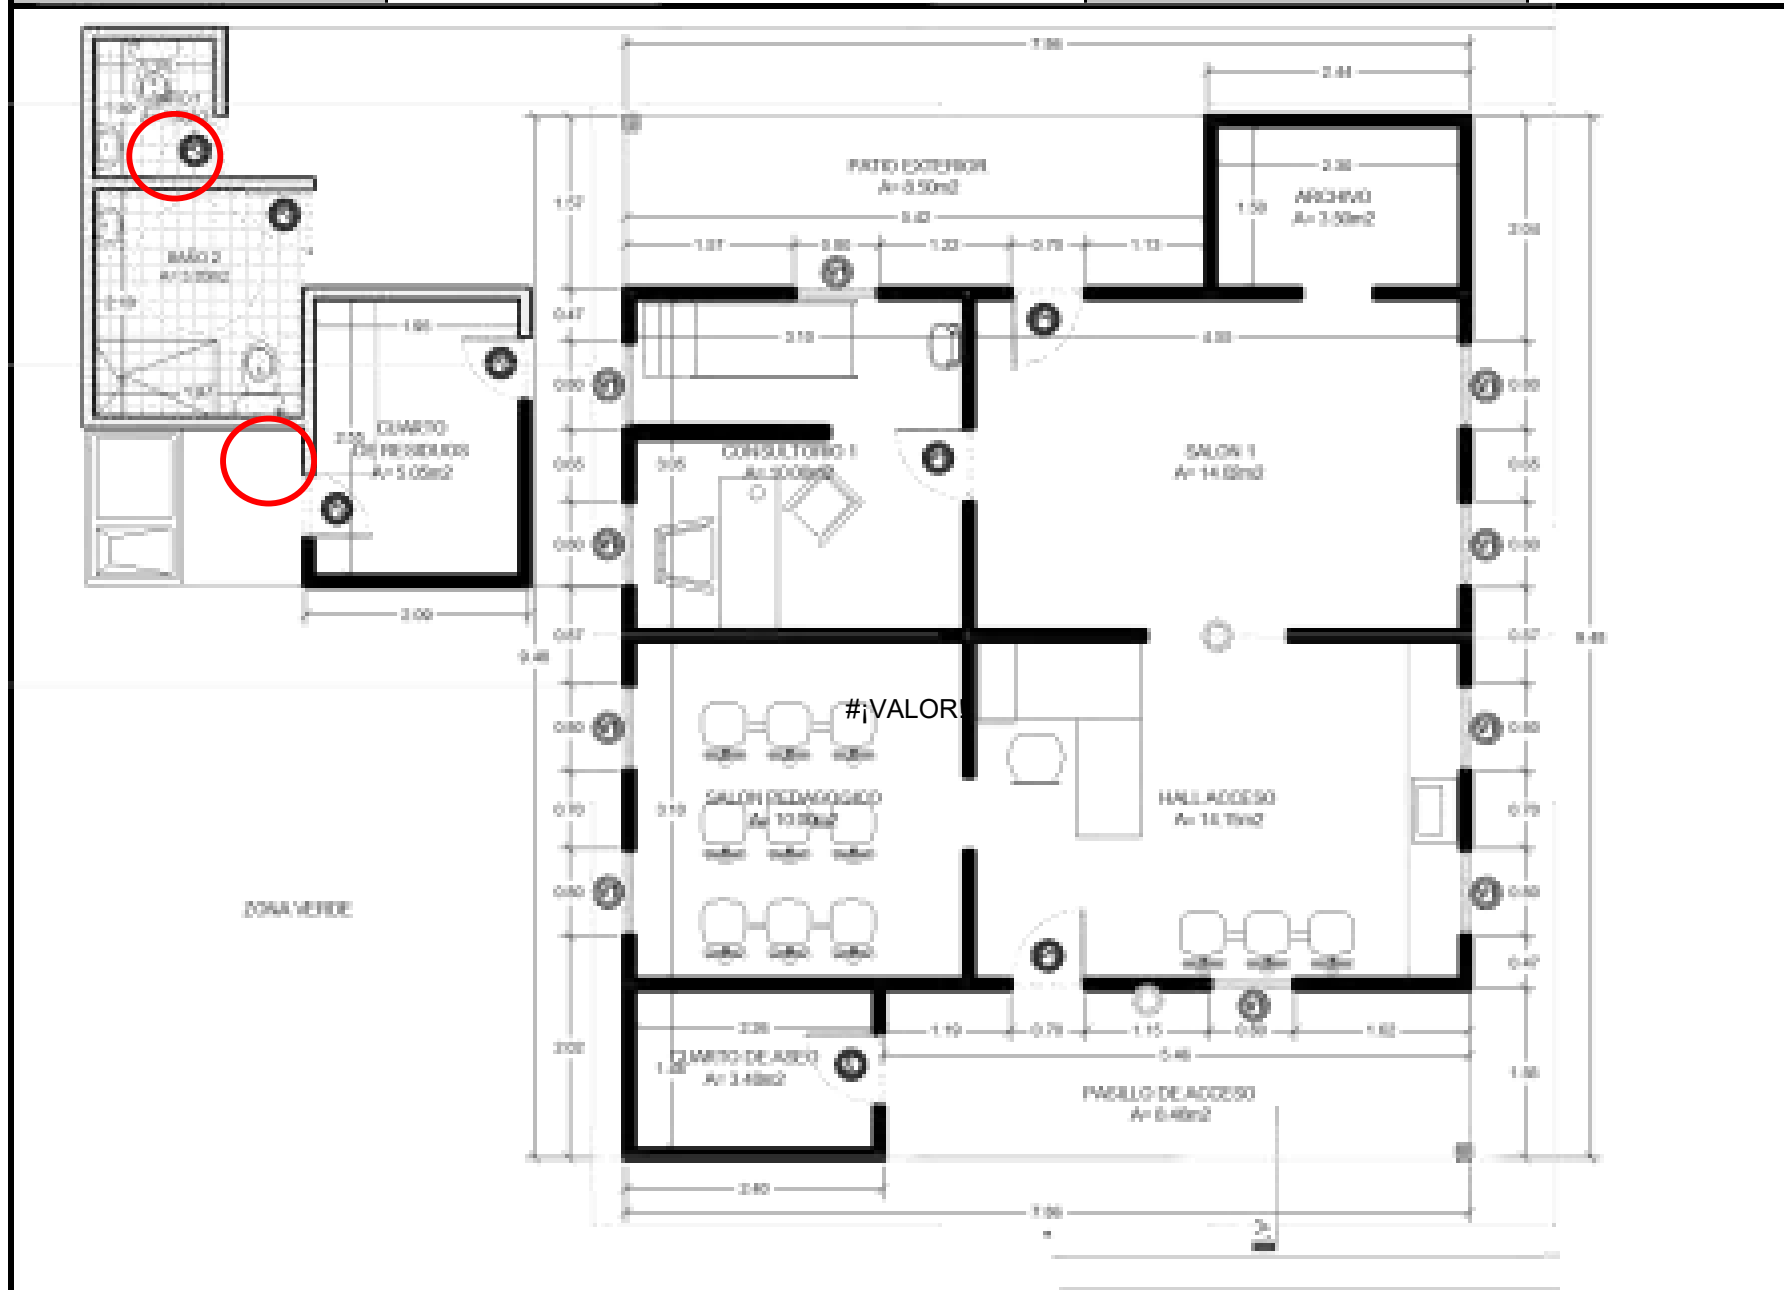

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS				2,00	2,00
Subtotal						2,00
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-062**
		VERSIÓN:39
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

10,04	**RED SANITARIA**	**ITEM**	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	**UNID.**	und	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-039**
		VERSIÓN:16
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

10,05	**RED SANITARIA**	**ITEM**	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS				2,00	2,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS		ACTA PARCIAL-066
			VERSIÓN:43
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

10,06	RED SANITARIA	ITEM	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

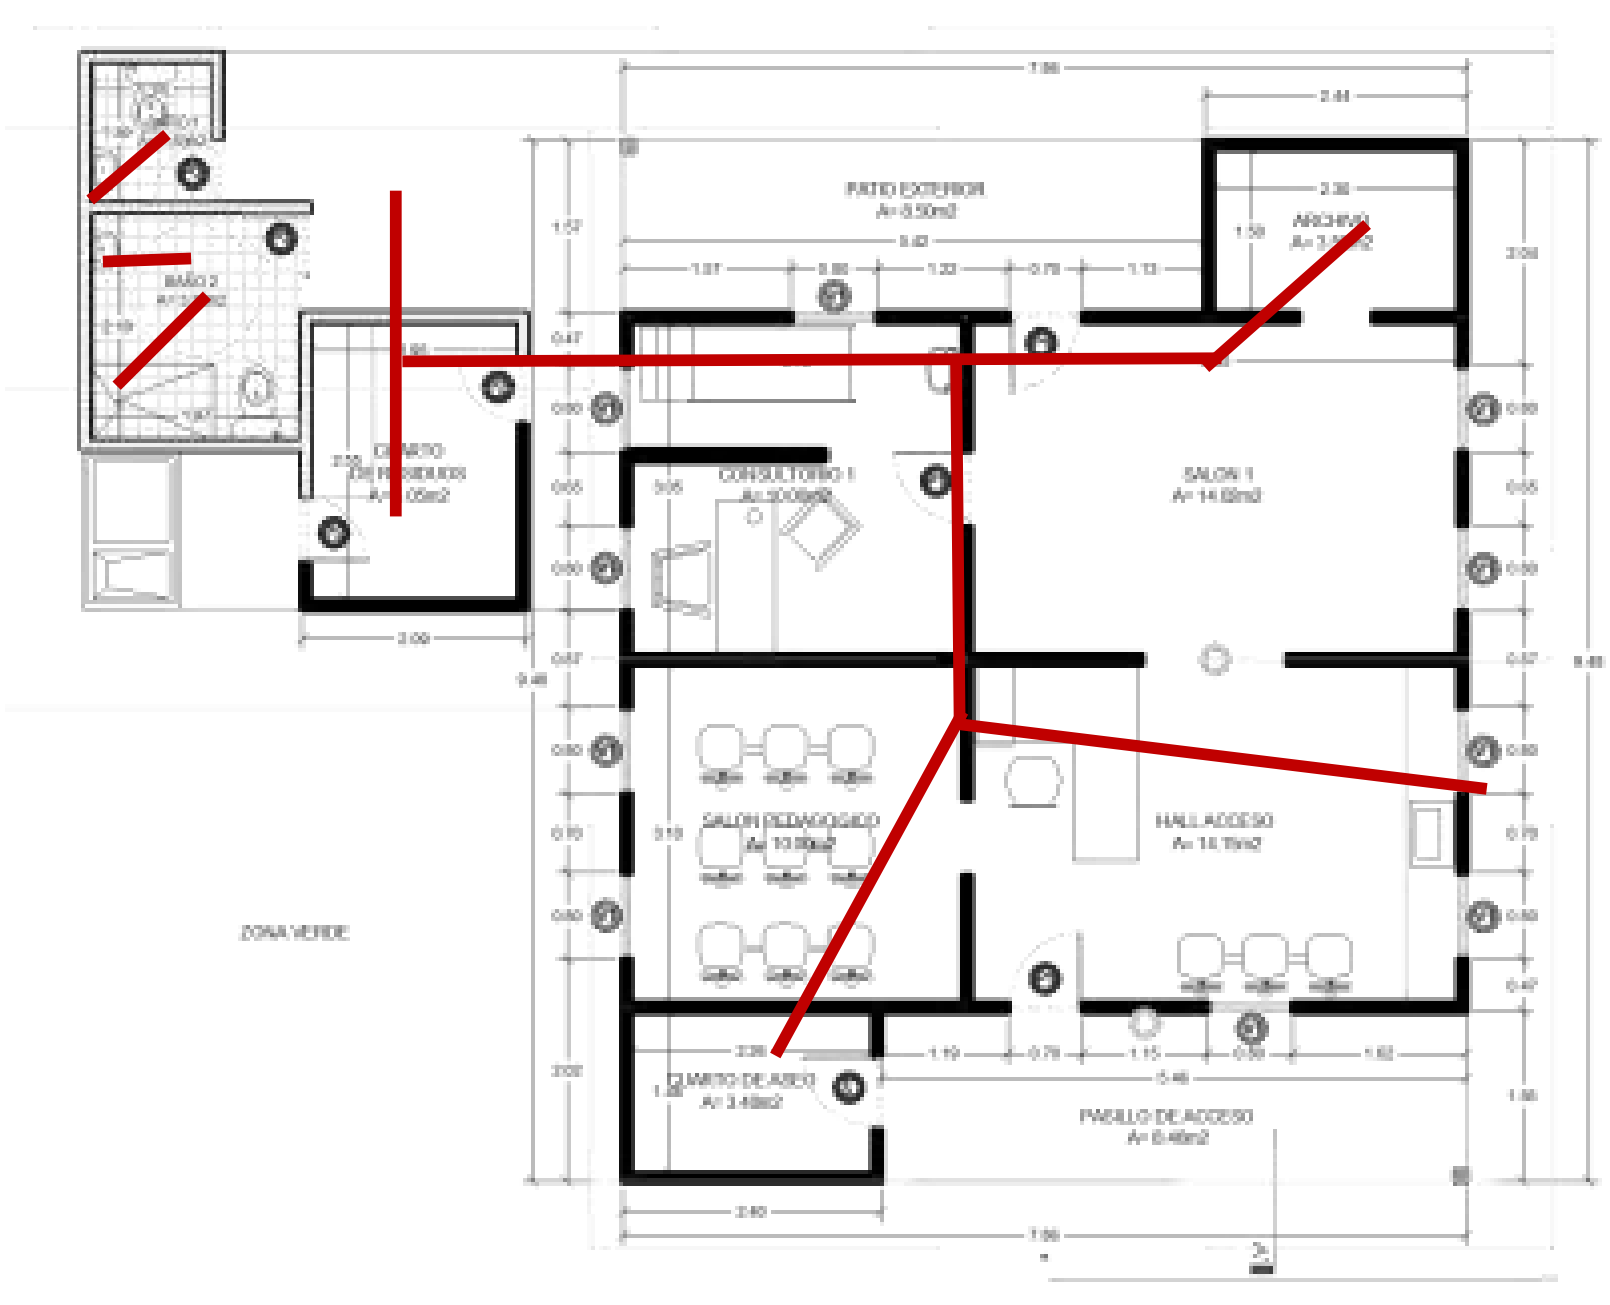

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						-
						-
	Baños			3,00		3,00
	Area central a la fecha			16,50		16,50
Subtotal						19,50
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-067**
		VERSIÓN:44
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

10,07	**RED SANITARIA**	**ITEM**	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				30,00	30,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-068**
		VERSIÓN:45
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

10,08	**RED SANITARIA**	**ITEM**	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

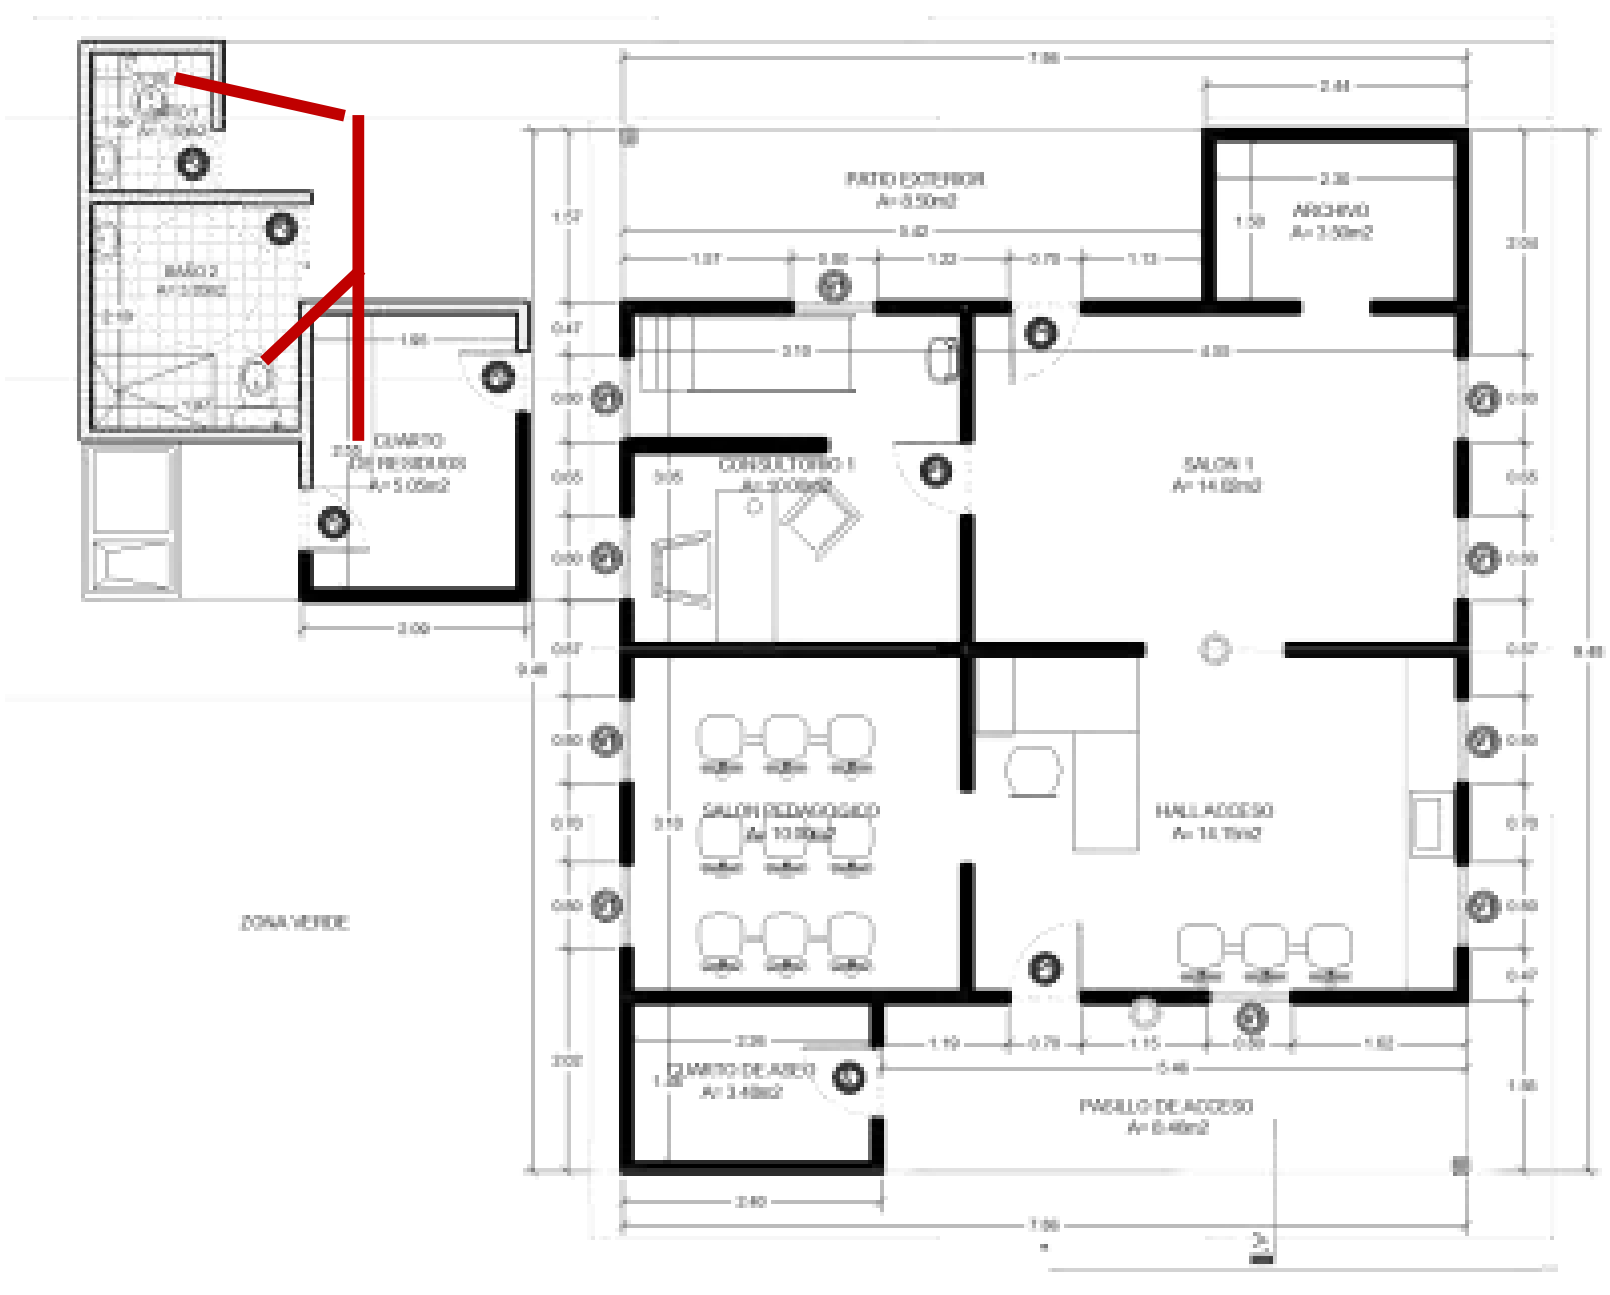

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				6,00	6,00
Subtotal						6,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-068
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA	VERSIÓN:45
		PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

10,09	RED SANITARIA	ITEM	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA POSTERIOR				1,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				**ACTA PARCIAL-058**	
								MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA				**VERSIÓN:35**	**PÁGINA:**
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**			**Jesús Loaiza Ramírez**
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

11,01	**RED HIDRÁULICA**	**ITEM**	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	TANQUE				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-059**
												VERSIÓN:36
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											**PÁGINA:**
FECHA	**DD**	20	**MM**	3	**AA**	2026		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

11,02	**RED HIDRÁULICA**	**ITEM**	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

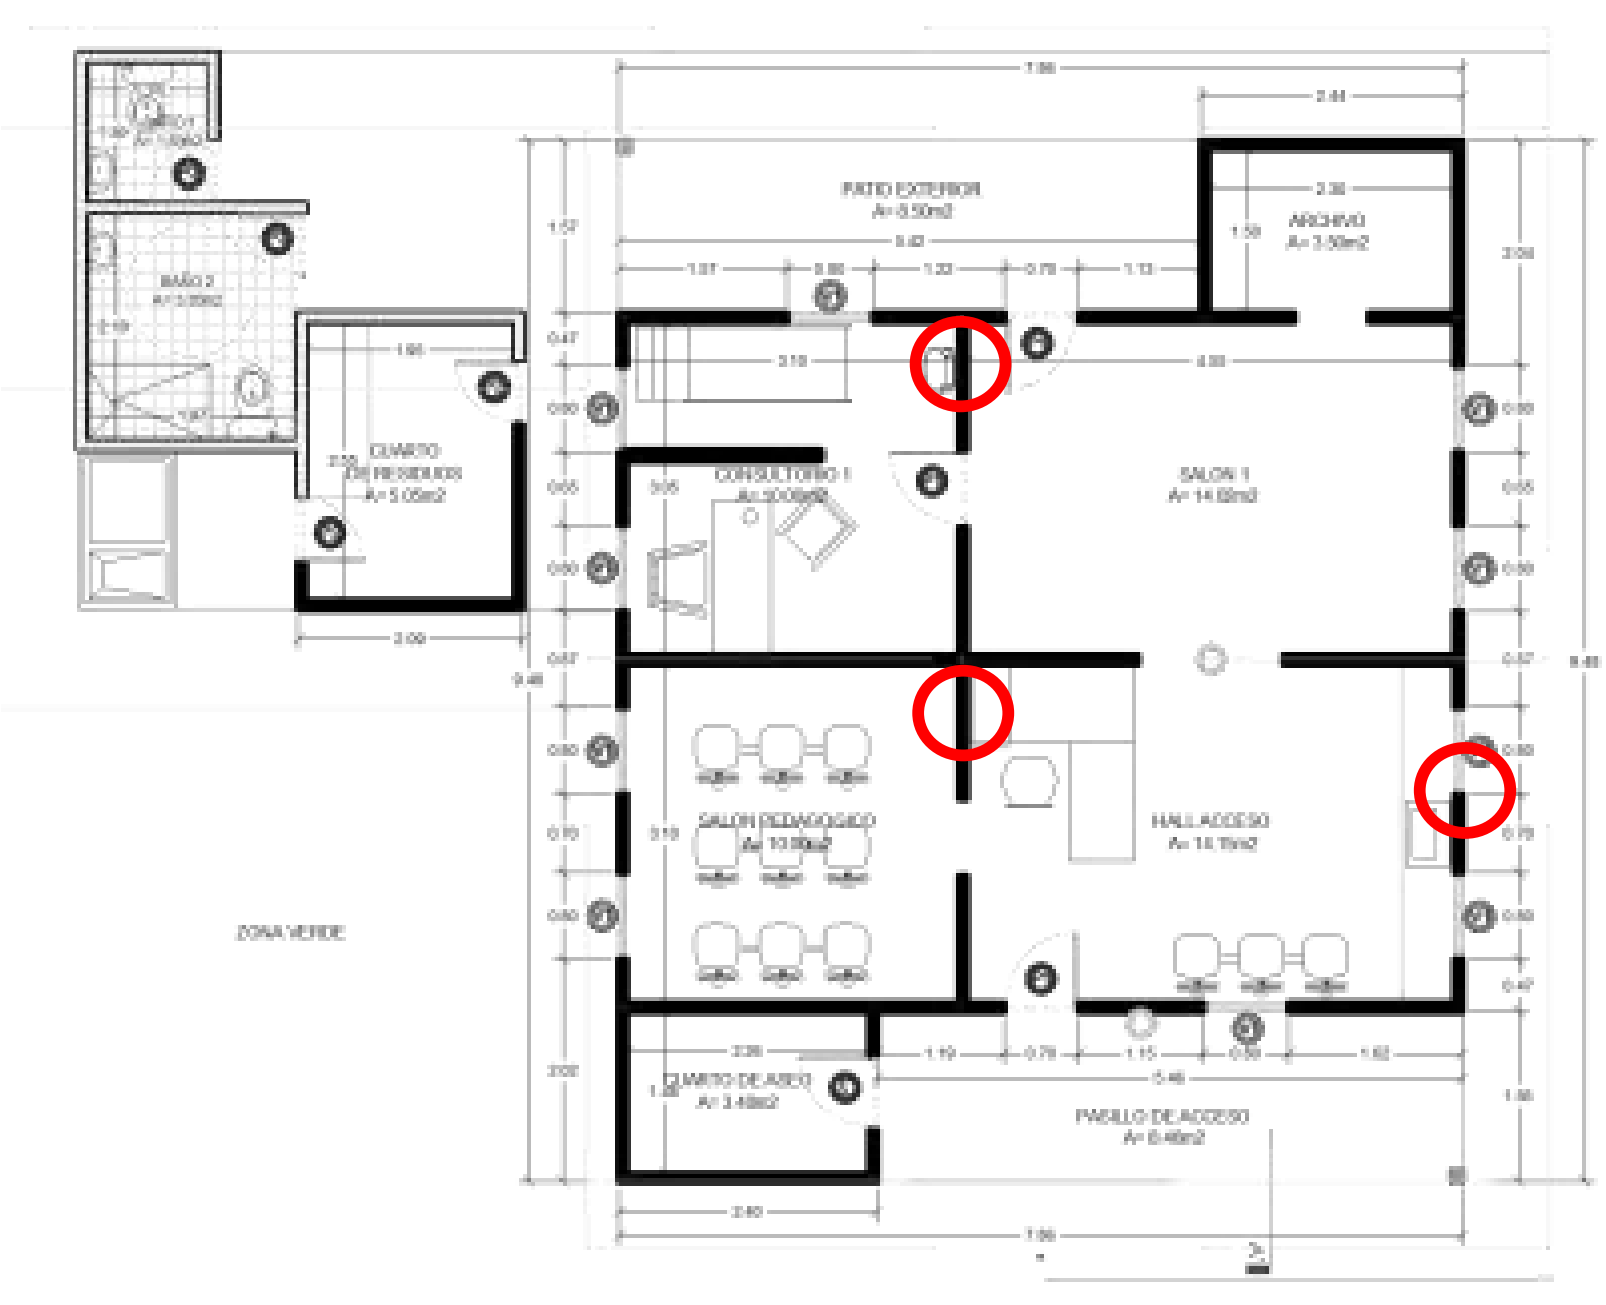


Fecha	Localización	Dimensiones: Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	TANQUE				3,00	3,00
Subtotal						3,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-063	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											VERSIÓN:40	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

11,03	RED HIDRÁULICA	ITEM	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

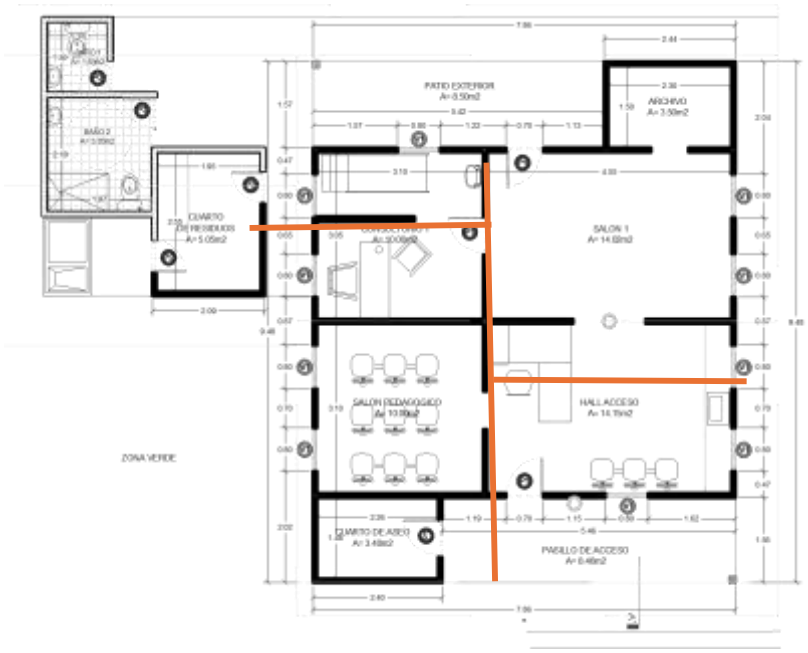

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TANQUE				13,00	13,00
	Subtotal					13,00
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-064**
		VERSIÓN:41
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

11,04	**RED HIDRÁULICA**	**ITEM**	RED SUMINISTRO PVC 1"	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones – Ancho	Dimensiones – Alto	Dimensiones – Longitud	No Elem.	Medida Total
	TODO			30,00		30,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-065
		VERSIÓN:42
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

11,05	RED HIDRÁULICA	ITEM	RED SUMINISTRO PVC 2"	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO			30,00		30,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-070**
		VERSIÓN:47
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

11,06	**RED HIDRÁULICA**	**ITEM**	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

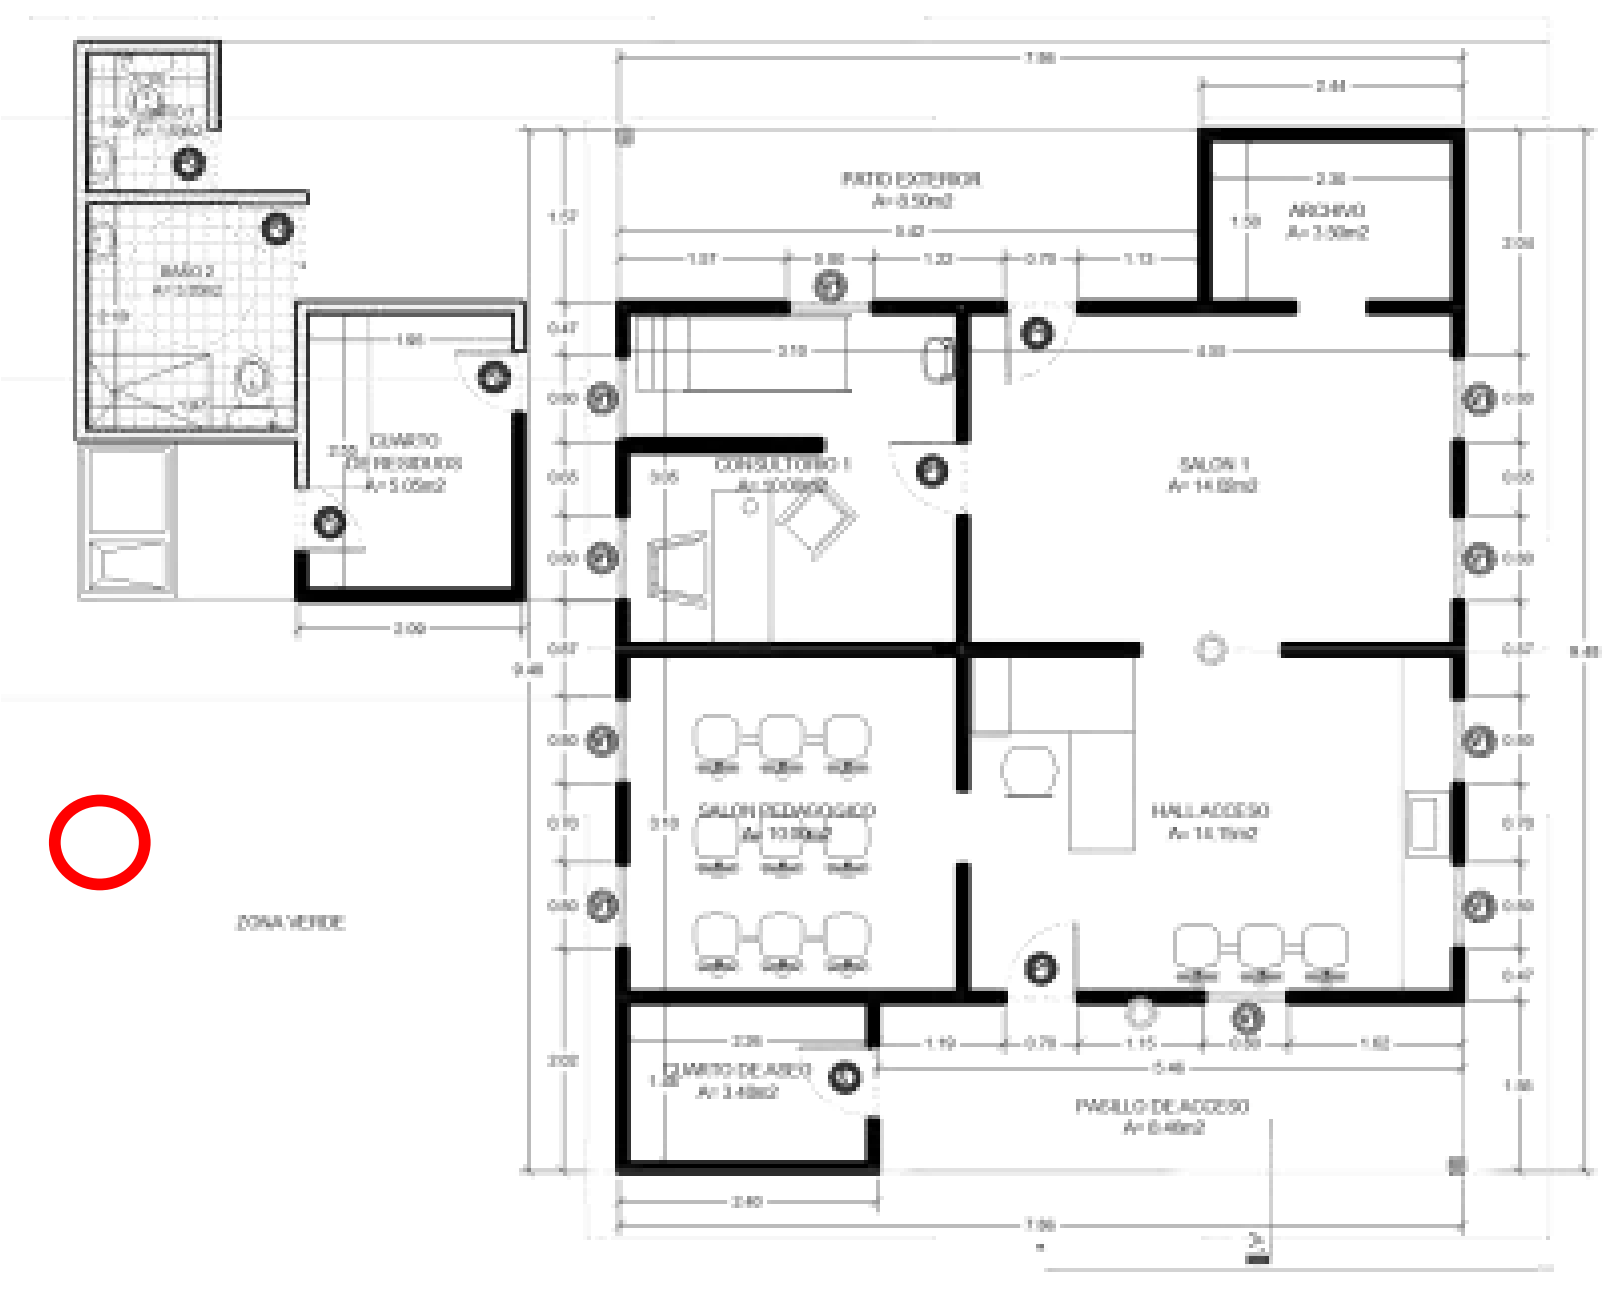

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Ya esta en obra				1,00	1,00
Subtotal						1,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-071	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				VERSIÓN:48	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

11,07	RED HIDRÁULICA	ITEM	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA POSTERIOR				1,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-072	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				VERSIÓN:49	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

11,08	RED HIDRÁULICA	ITEM	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA POSTERIOR				1,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,00

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-075
		VERSIÓN:52
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

12,01	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

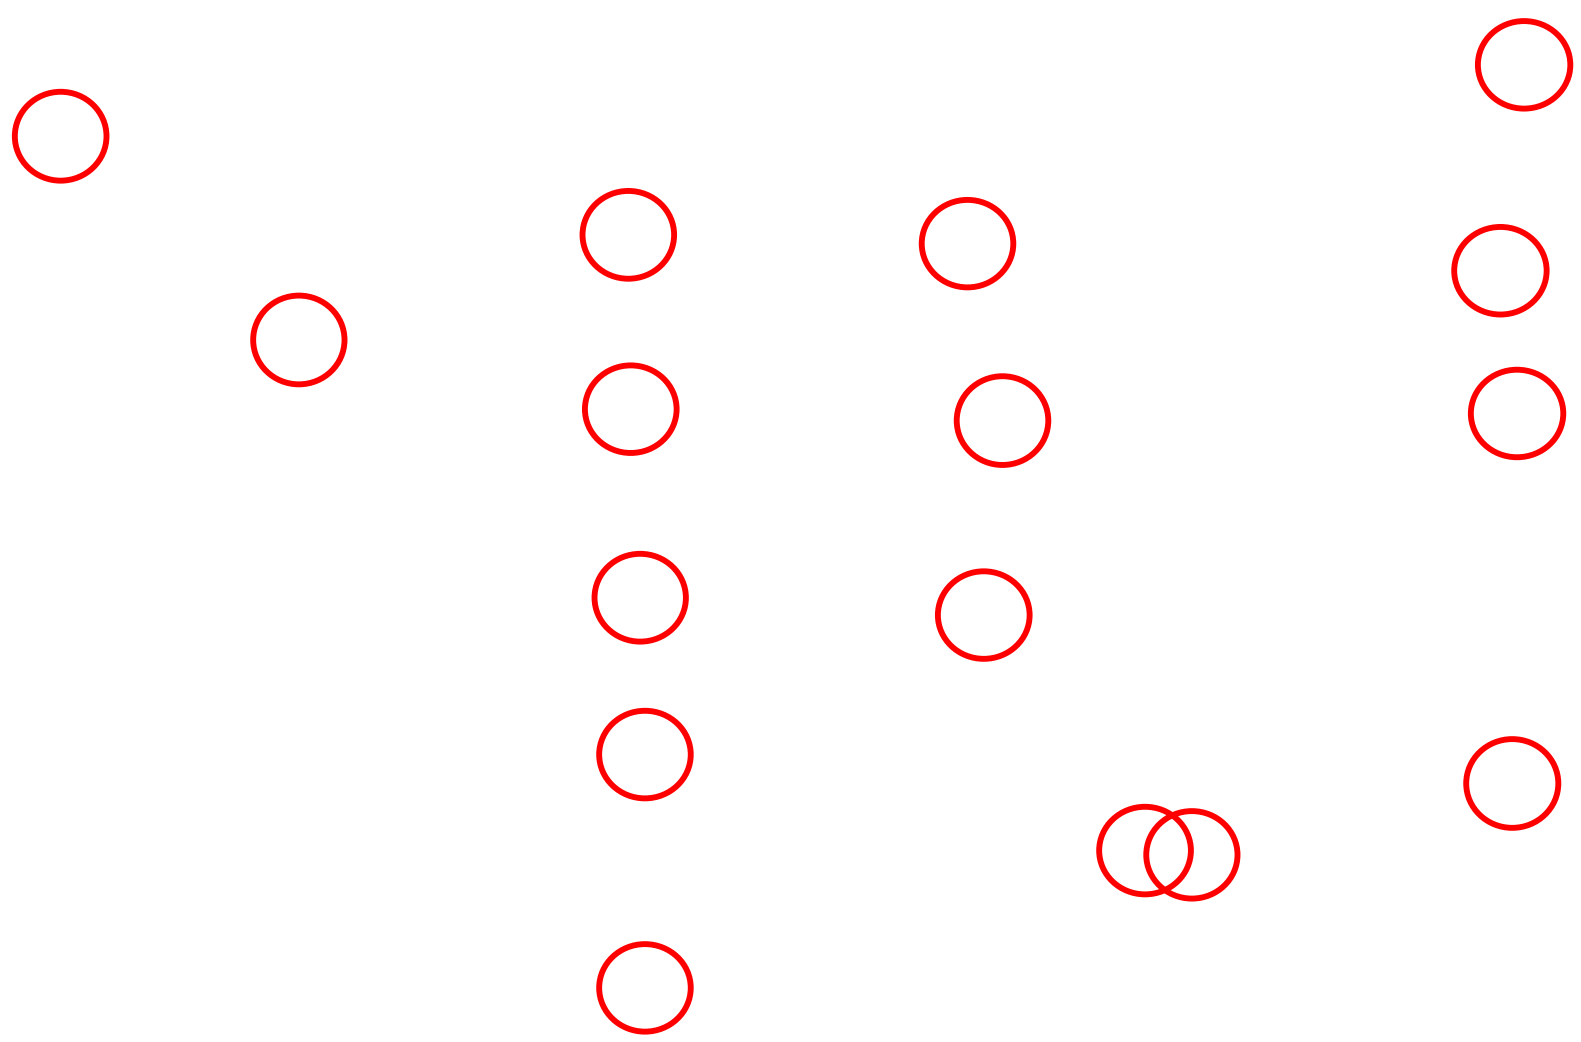

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODOS				16,00	
Subtotal						0,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-076	
								MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA				VERSIÓN:53	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

12,02	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO				1,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,00

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-077**
		VERSIÓN:54
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

12,03	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

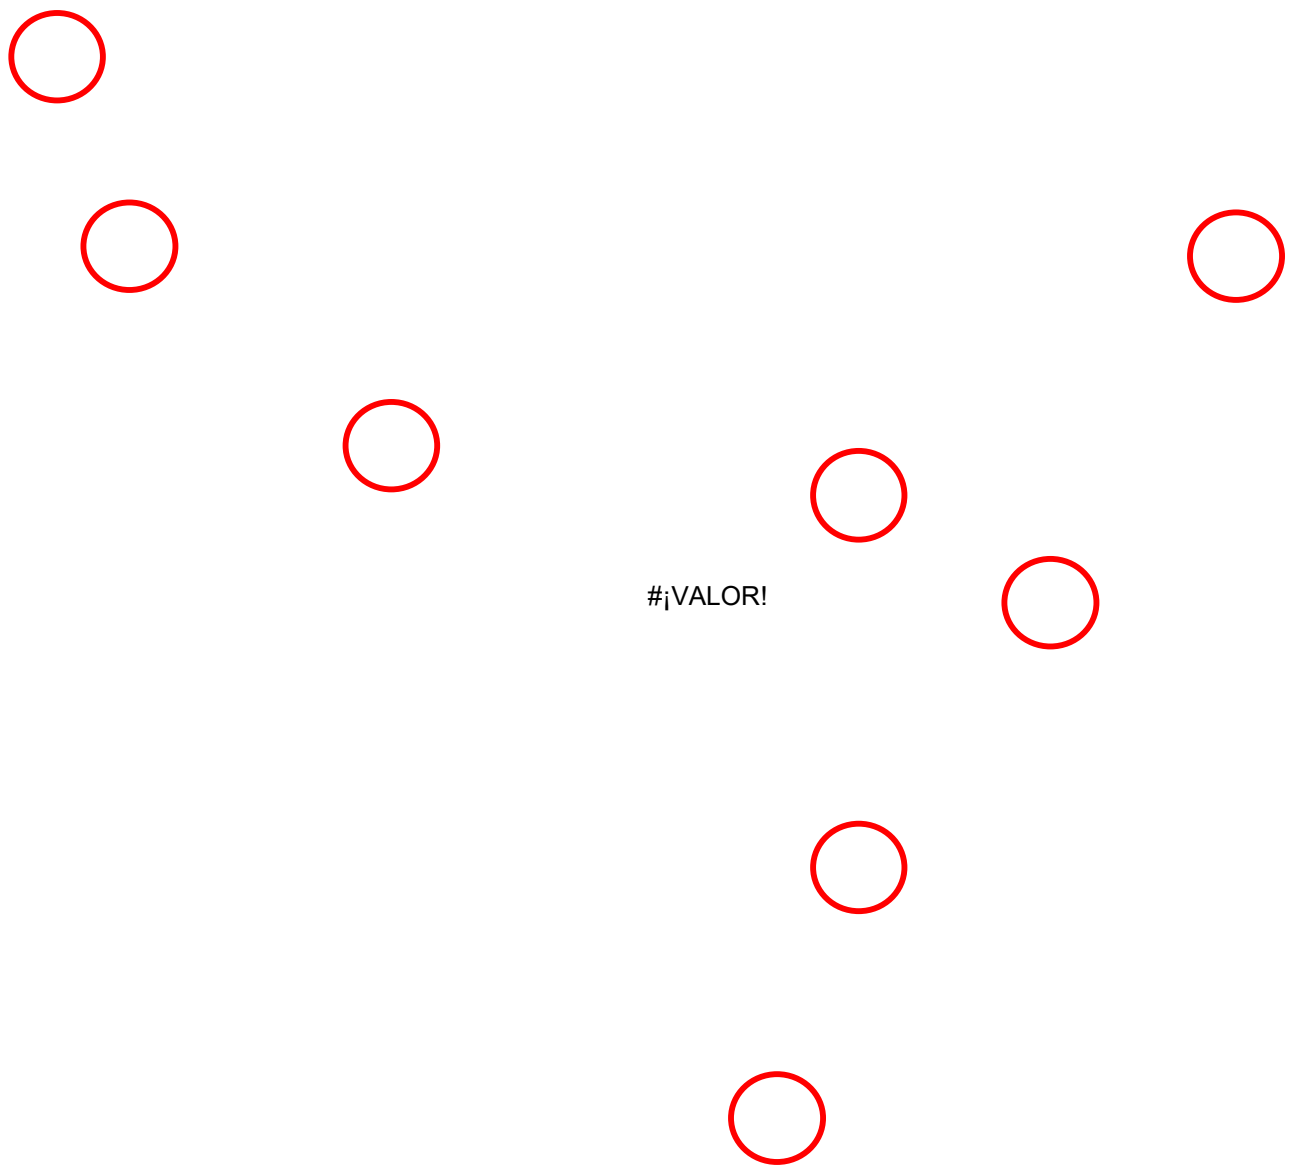

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				8,00	
Subtotal						0,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-077	
												VERSIÓN:54	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

12,04	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				1,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-078**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA											**VERSIÓN:55**	
												PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

12,05	**RED ELÉCTRICA**	**ITEM**	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	TODO				500,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-081**
		VERSIÓN:58
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

12,06	RED ELÉCTRICA	ITEM	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL				1,00	
Subtotal						0,00
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS									**ACTA PARCIAL-084**
										VERSIÓN:61
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA									**PÁGINA:**
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	**Jesús Loaiza Ramírez**

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

12,07	**RED ELÉCTRICA**	**ITEM**	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE CIELORRASO	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				400,00	400,00
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-089
		VERSIÓN:66
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

12,08	RED ELÉCTRICA	ITEM	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PATIO				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-090
		VERSIÓN:67
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

12,09	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

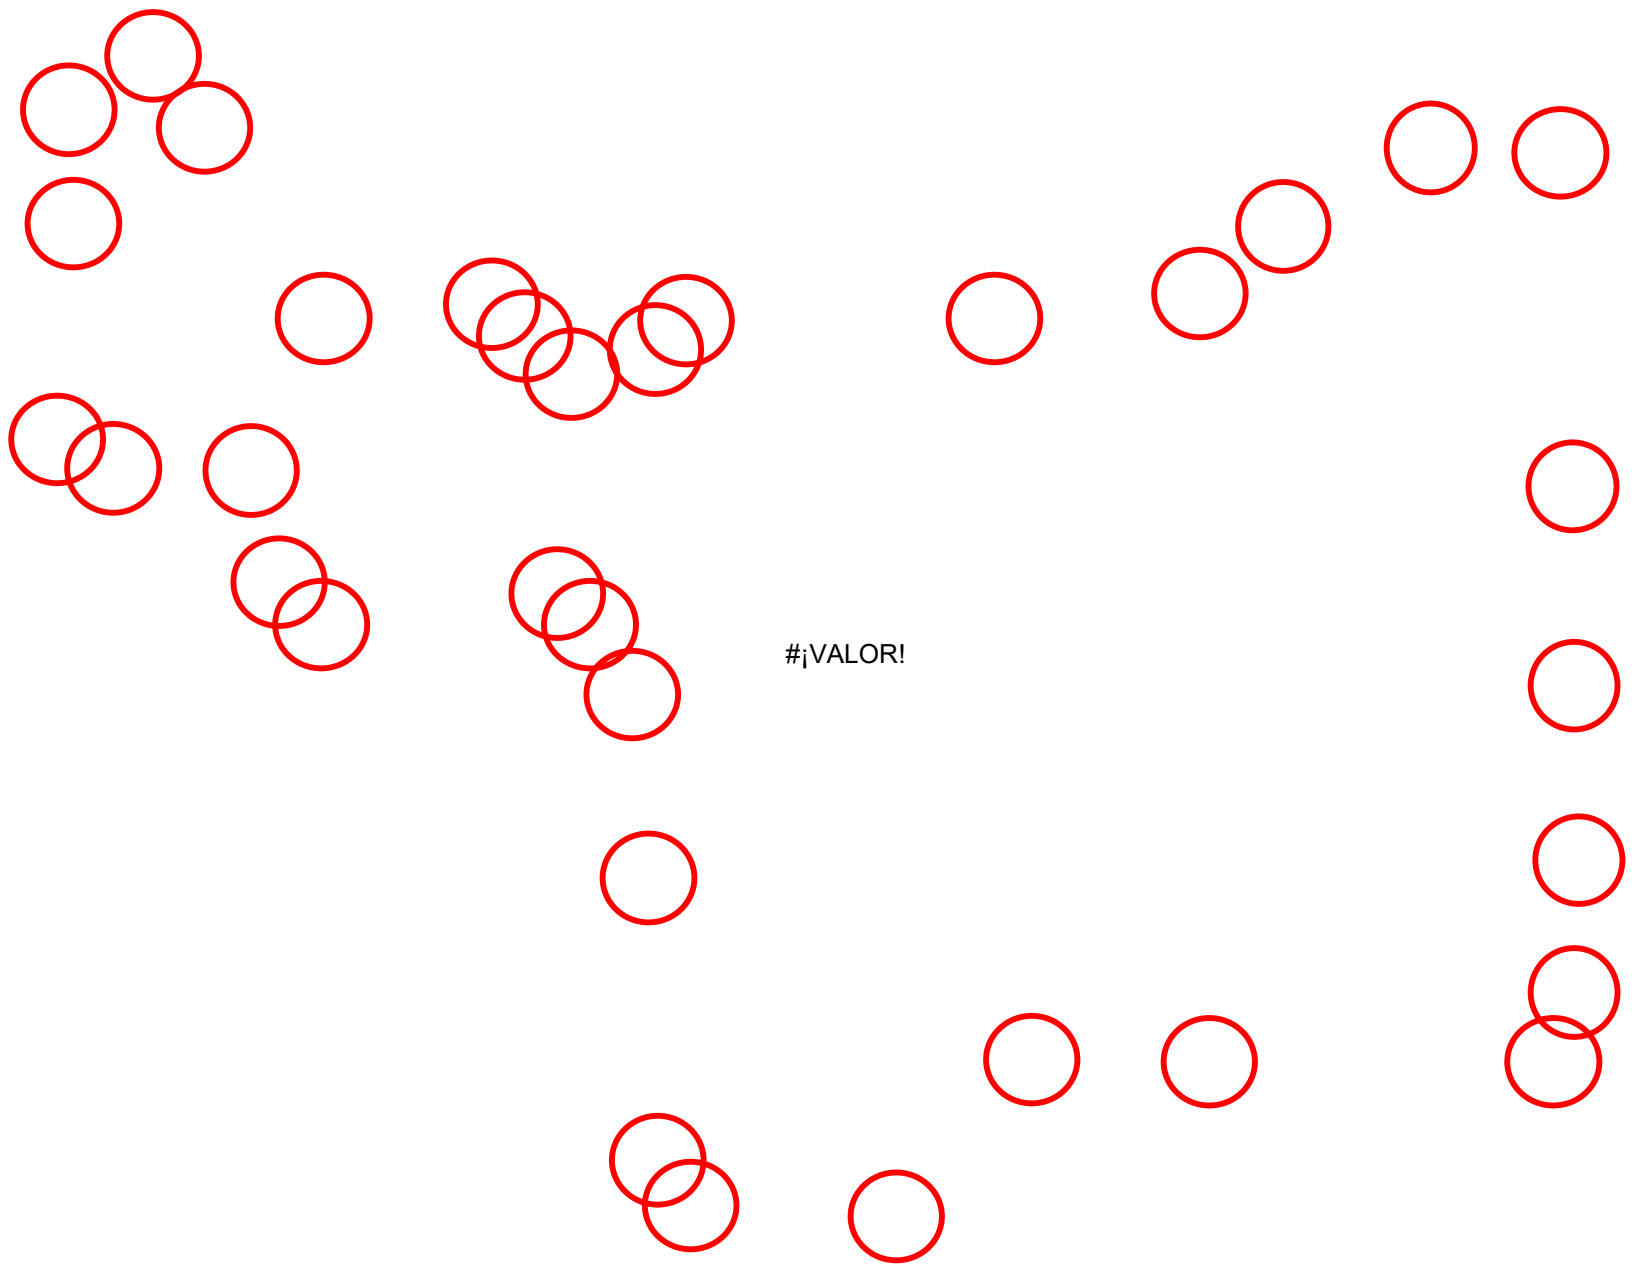

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				32,00	32,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra


	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-091**
		VERSIÓN:68
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

12,10	**RED ELÉCTRICA**	**ITEM**	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

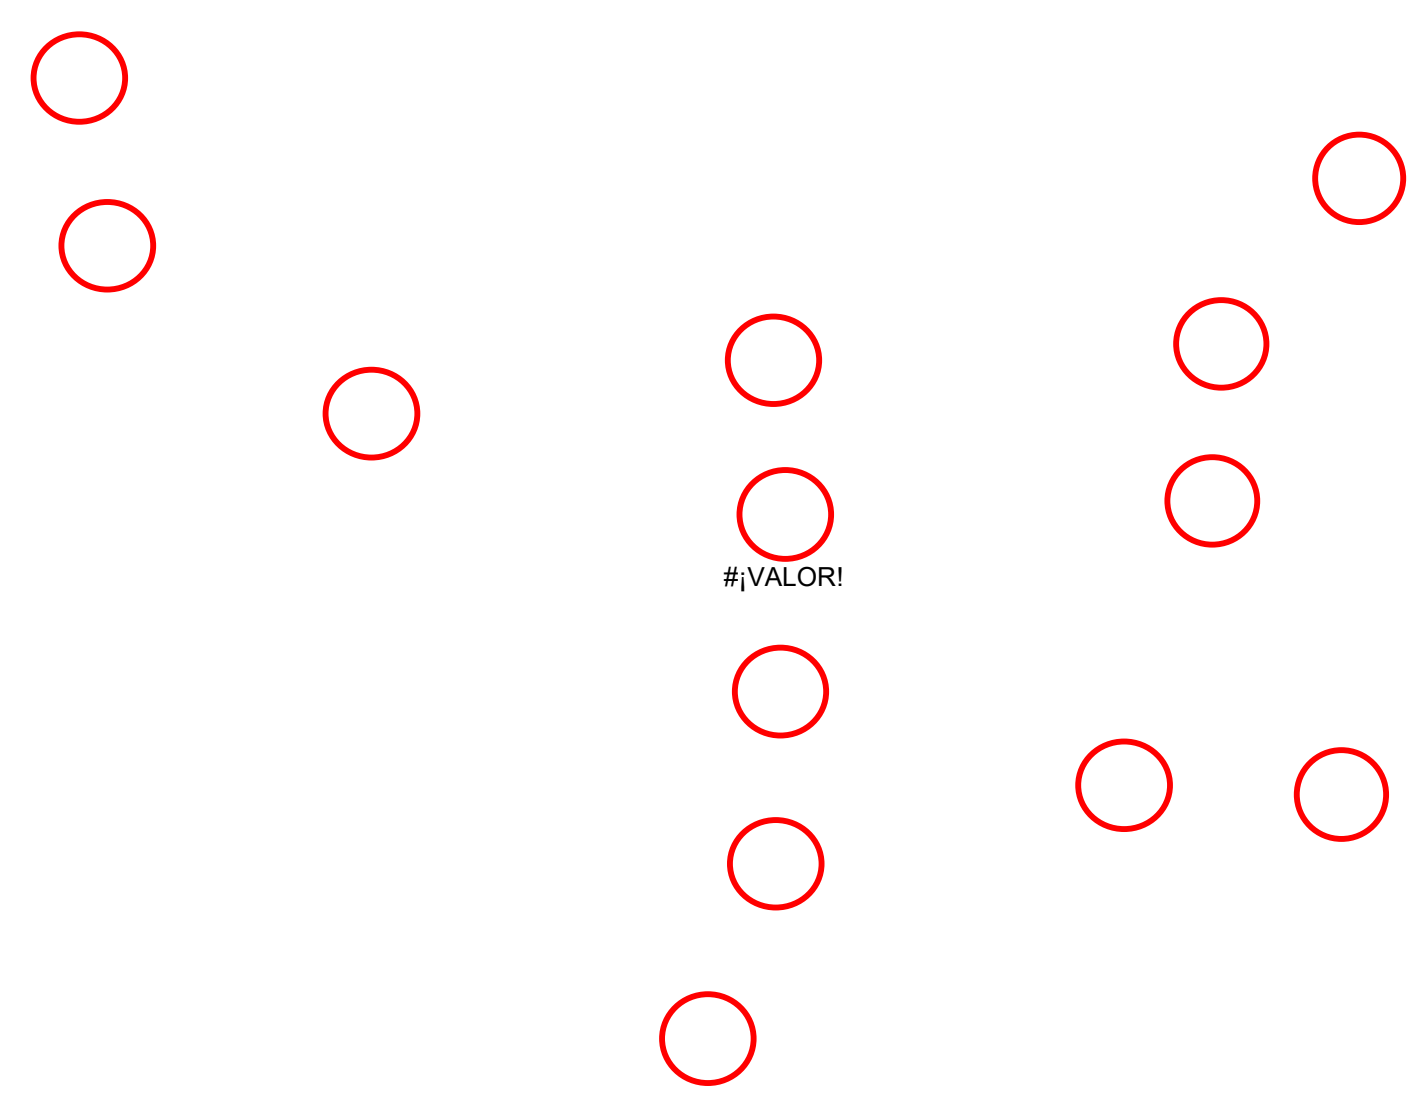

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				13,00	13,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-095
		VERSIÓN:72
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

12,11	RED ELÉCTRICA	ITEM	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL				2,00	2,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										**ACTA PARCIAL-102**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										**VERSIÓN:79**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	**PÁGINA:**	**Jesús Loaiza Ramírez**
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025	

13,01	**CIELO RASO**	**ITEM**	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFILERÍA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALÓN	4,55	-	3,05		13,88
	CONSULTORIO	3,10	-	3,05		9,46
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	-	3,10		9,61
	ARCHIVO	2,30	-	1,50		3,45
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55		4,97
	HALL DE ACCESO	4,55		3,10		14,11
	PASILLO ACCESO	5,46	-	1,55		8,46
	BAÑO 1	1,15	-	1,30		1,50
	BAÑO 2	1,97	-	2,10		4,14
	BODEGA	2,26	-	1,48		3,34
	PATIO EXTERIOR	5,42	-	2,00		10,84
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS									**ACTA PARCIAL-104**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA									**VERSIÓN:81**	
										PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA										
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025	

13,02	**CIELO RASO**	**ITEM**	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	SALÓN	4,55	-	3,05	2,00	15,20
	CONSULTORIO	3,10	-	3,05	2,00	12,30
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	-	3,10	2,00	12,40
	ARCHIVO	2,30	-	1,50	2,00	7,60
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55	2,00	9,00
	HALL DE ACCESO	4,55		3,10	2,00	15,30
	PASILLO ACCESO	5,46	-	1,55	2,00	14,02
	BAÑO 1	1,15	-	1,30	2,00	4,90
	BAÑO 2	1,97	-	2,10	2,00	8,14
	BODEGA	2,26	-	1,48	2,00	7,48
	PATIO EXTERIOR	5,42	-	2,00	2,00	14,84
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										**ACTA PARCIAL-105**	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										**VERSIÓN:82**	
											PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025	

14,01	**APARATOS SANITARIOS**	**ITEM**	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	BAÑO				1,00	1,00
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				ACTA PARCIAL-106	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				VERSIÓN:83	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO								ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA					
INTERVENTOR								HV INGENIERIA		NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA								CONSULTIN P&S		NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

14,02	APARATOS SANITARIOS	ITEM	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO A				1,00	1,00
	Subtotal					
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-107	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:84	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

14,03	APARATOS SANITARIOS	ITEM	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO A				1,00	
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

				CONSULTIN P&S SAS								ACTA PARCIAL-108	
												VERSIÓN:85	
				MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA								PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO													
INTERVENTOR													
CONTRATISTA													

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025	

14,04	APARATOS SANITARIOS	ITEM	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

8

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS				2,00	2,00
	Subtotal					
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-110**
		VERSIÓN:87
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

14,05	APARATOS SANITARIOS	ITEM	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-111**
		VERSIÓN:88
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

14,06	**APARATOS SANITARIOS**	**ITEM**	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS				2,00	2,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS								ACTA PARCIAL-112 VERSIÓN:89
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA								PÁGINA:
FECHA	DD 20	MM 3	AA 2026		CORTE N° 2	ELABORÓ			Jesús Loaiza Ramírez
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA								
INTERVENTOR	HV INGENIERIA		NIT O C.C.	901717350		CONTRATO INTERVENTORIA N°			003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S		NIT O C.C.	901462340		CONTRATO DE OBRA N°			CONPU-002-2025
14,07	APARATOS SANITARIOS	ITEM	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm			UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PATIO				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-113
		VERSIÓN:90
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

14,08	APARATOS SANITARIOS	ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL				1,00	
Subtotal						0,00
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

				CONSULTIN P&S SAS							**ACTA PARCIAL-120**	
											VERSIÓN:97	
				MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA							**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA										
INTERVENTOR		HV INGENIERIA					**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S					**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

15,01	**PINTURAS**	**ITEM**	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALÓN	4,55	-	3,05	2,00	15,20
	CONSULTORIO	3,10	-	3,05	2,00	12,30
	SALÓN PEDAGÓGICO	3,10	-	3,10	2,00	12,40
	ARCHIVO	2,30	-	1,50	2,00	7,60
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55	2,00	9,00
	HALL DE ACCESO	4,55		3,10	2,00	15,30
	PASILLO ACCESO	5,46	-	1,55	2,00	14,02
	BAÑO 1	1,15	-	1,30	2,00	4,90
	BAÑO 2	1,97	-	2,10	2,00	8,14
	BODEGA	2,26	-	1,48	2,00	7,48
	PATIO EXTERIOR	5,42	-	2,00	2,00	14,84
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

					CONSULTIN P&S SAS							**ACTA PARCIAL-120**	
												VERSIÓN:97	
					MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA							**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

15,02	**PINTURAS**	**ITEM**	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**	

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	CUARTO DE RESIDUOS	1,95	-	2,55	2,00	9,00
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

					CONSULTIN P&S SAS							**ACTA PARCIAL-121**	
												VERSIÓN:98	
					MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA							**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

15,03	**PINTURAS**	**ITEM**	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRILICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES), COLOR SEGÚN DISEÑO	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL			11,92		11,92
	FACHADA IZQUIERDA			12,88		12,88
	FACHADA DERECHA			12,03		12,03
	FACHADA POSTERIOR			11,78		11,78
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										**ACTA PARCIAL-122**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										**VERSIÓN:99**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	**PÁGINA:**	**Jesús Loaiza Ramírez**

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

16,01	**CARPINTERIA**	**ITEM**	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	HALL DE ACCESO	0,70	2,05		1	1,44
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										**ACTA PARCIAL-123**	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										**VERSIÓN:100**	
											PÁGINA:	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025	

16,02	**CARPINTERIA**	**ITEM**	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	**UNID.**	**m2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	BAÑO 1	0,60	2,10			1,26
	BAÑO 2	0,60	2,10			1,26
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0


Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS		**ACTA PARCIAL-125**
			VERSIÓN:102
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

16,03	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

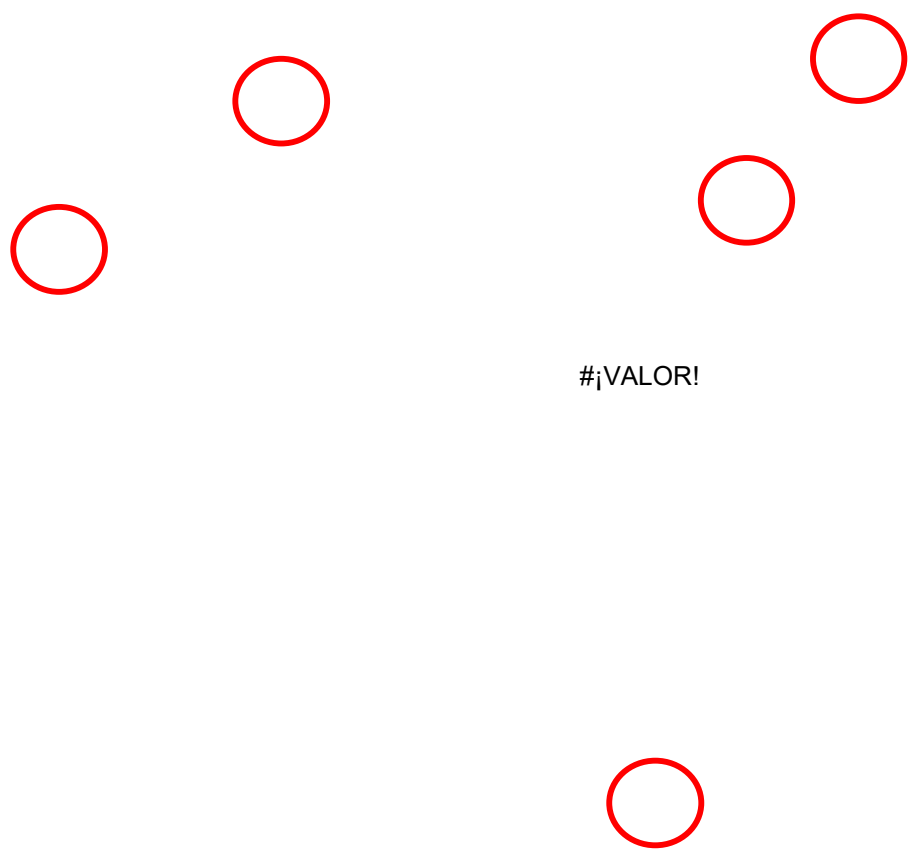

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CONSULTORIO	0,70	2,05		1	1,44
	CUARTO DE RESIDUOS	0,60	2,00		2	2,40
	HALL DE ACCESO	0,70	2,05		1	1,44
	BODEGA	0,70	2,05		1	1,44
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-128	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:105	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025	

16,04	CARPINTERIA	ITEM	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS	1,00	1,00		2,00	2,00
	Subtotal					
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS											**ACTA PARCIAL-130**	
												VERSIÓN:107	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

16,05	**CARPINTERIA**	**ITEM**	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS	**UNID.**	**mL**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	FACHADA PRINCIPAL			2,00		2,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-131
		VERSIÓN:108
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

16,06	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS									ACTA PARCIAL-129	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA									VERSIÓN:106	
										PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA										
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025	

16,07	CARPINTERIA	ITEM	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
		2,00	2,00			4,00
	Subtotal					
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS										ACTA PARCIAL-131	
	MEMORIAS DE CALCULO DE OBRA										VERSIÓN:108	
											PÁGINA:	
FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025	

16,08	CARPINTERIA	ITEM	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL

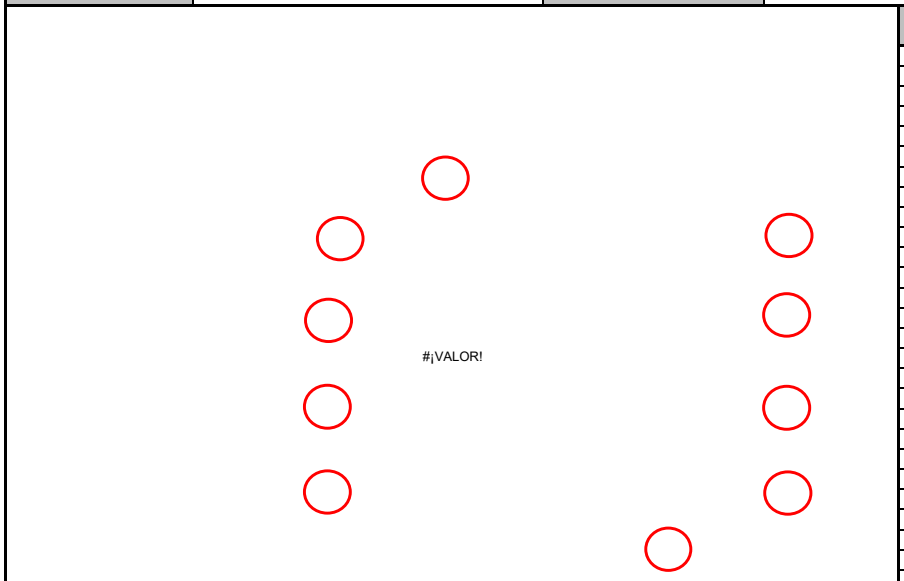

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALÓN	0,80	1,50		2	2,40
	CONSULTORIO	0,80	1,50		3	6,90
	SALÓN PEDAGÓGICO	0,80	1,50		2	4,60
	HALL DE ACCESO	0,80	1,50		3	6,90
	Subtotal					
	TOTAL					0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-133
		VERSIÓN:110
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

16,09	CARPINTERIA	ITEM	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL				3,10	3,10
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	ACTA PARCIAL-130
		VERSIÓN:107
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

17,01	EQUIPAMIENTO FIJO	ITEM	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						0,00

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

								CONSULTIN P&S SAS				**ACTA PARCIAL-131**	
												VERSIÓN:108	
								MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA				**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**20**	**MM**	**3**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**		**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA											
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**		CONPU-002-2025	

17,02	**EQUIPAMIENTO FIJO**	**ITEM**	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

#¡VALOR!

Fecha	**Localización**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**		
	CUBIERTA				1,00	1,00
	Subtotal					
	TOTAL					**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

	CONSULTIN P&S SAS	**ACTA PARCIAL-129**
		VERSIÓN:106
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA:**

FECHA	DD	20	MM	3	AA	2026		CORTE N°	2	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

17,03	EQUIPAMIENTO FIJO	ITEM	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL

#¡VALOR!

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HALL ACCESO				1,00	1,00
	SALON				1,00	1,00
	CONSULTORIO				1,00	1,00
	SALON PEDAGOGICO				1,00	1,00
Subtotal						
TOTAL						**0,00**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

18,01	TRANSPORTE	ITEM	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	UNID.	ton/Km	UBICACIÓN	GENERAL

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Coe Kg/und	Cantidad		
	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO		12,00	111,88		1,342521
	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO		5,00	9,55		0,047750
	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA,		12,00	111,88		1,342521
	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS		6,00	0,00		-
	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04		80,00	0,00		-
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA		25,00	0,00		-
	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA,		85,00	0,00		-
	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR		1,00	0,00		-
	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR		1,00	0,00		-
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15		12,00	0,00		-
	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.		120,00	0,00		-
	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M		120,00	10,10		1,212000
	RECUBRIMIENTO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM, UNA CARA		14,00	84,56		1,183812
	CONCRETO 4000 PSI		2.400,00	0,00		-
	CONCRETO 3500 PSI		2.400,00	0,38		0,912000
	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m		250,00	0,00		-
	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO		65,00	0,00		-
	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y		25,00	0,00		-
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE		1,00	74,94		0,074936
	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2		200,00	0,00		-
	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF		150,00	0,00		-
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"		15,00	0,00		-
	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"		1,00	0,00		-
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"		0,25	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y		0,30	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y		1,50	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y		1,00	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"		0,20	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 1"		0,40	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 2"		1,10	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		0,50	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		1,00	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		2,00	0,00		-
	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E		70,00	0,00		-

1,02

	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3		8,00	0,00		-
	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"		0,70	0,00		-
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,30	0,00		-
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",		0,40	0,00		-
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,10	0,00		-
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No		0,10	0,00		-
	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) +		0,64	0,00		-
	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA		10,00	0,00		-
	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE		0,30	0,00		-
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		5,00	0,00		-
	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W		1,50	0,00		-
	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA		1,00	0,00		-
	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO.		100,00	0,00		-
	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA		14,00	0,00		-
	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO,		0,40	0,00		-
	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)		30,00	0,00		-
	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA		40,00	0,00		-
	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"		4,00	0,00		-
	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y		20,00	0,00		-
	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)		1,00	0,00		-
	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO,		2,00	0,00		-
	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm		15,00	0,00		-
	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE		5,00	0,00		-
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1		1,00	0,00		-
	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE		0,50	0,00		-
	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA		3,00	0,00		-
	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE		2,00	0,00		-
	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA		0,70	0,00		-
	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O		10,00	0,00		-
	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR		30,00	0,00		-
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO		9,00	0,00		-
	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X		50,00	0,00		-
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL		12,00	0,00		-
	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O		15,00	0,00		-
	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M		12,00	0,00		-
	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS		40,00	0,00		-
	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES,		350,00	0,00		-
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V		40,00	0,00		-
	Subtotal					6,1155
	Km desde la cabecera municipal					15,0000
	TOTAL					**91,7331**

0

Jesús Loaiza R.
Director de Obra
