ACTA DE COMITÉ DE OBRA N. 05

FECHA: 16 de marzo de 2026

HORA: 09:30 am

LUGAR: Sitio de la reunión – Oficina de Planeación.

ASISTENTES: Los que intervienen en la presente acta

OBJETO DEL PROYECTO: Mesa técnica de avance y estado del contrato de obra COP-2025-010.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo inicial.
2. Intervención Supervisión
3. Intervención contratista
4. Conclusiones y compromisos

1. Se da inicio a la reunión contando con la presencia del señor **Raúl Popo Carabali**, en calidad de Representante Legal y Contratista del Contrato de Obra Pública N.° COP-2025-010, con objeto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETA" y de la **Ingeniera Kassandra Andrea Orozco Orozco**, Secretaria de Planeación Municipal y de las TIC's, quien actúa como Supervisora del contrato.

2. Una vez presentados los asistentes, la Secretaria de Planeación toma la palabra y manifiesta que el presente comité tiene como finalidad realizar seguimiento al avance del contrato, revisar las condiciones actuales del mejoramiento y evaluar las afectaciones evidenciadas durante la revisión de los sitios, especialmente aquellas ocasionadas por las fuertes lluvias presentadas durante la ejecución y su complejidad al mediar con la comunidad para trabajar sin dificultades.

3. El **Representante Legal del COP-2025-010 Raúl Popo Carabali**, toma la vocería e informa que, durante el desarrollo de las actividades y la inspección detallada de las áreas intervenidas, se identificaron afectaciones no previstas inicialmente en el alcance contractual, las cuales podrían generar daños mayores a futuro si no se atienden de manera oportuna.

En tal sentido, y en concordancia con lo discutido en el Comité de Obra N.° 01,02,03 y 04 se expone la necesidad de **realizar un balance y adicionar al contrato al igual que una prorroga de 12 días,** con el objetivo de prevenir deterioros adicionales, garantizar la correcta evacuación de aguas, recuperar zonas afectadas y asegurar la durabilidad de las obras ejecutadas.

Con el balance de mayores y menores cantidades de obra que se requieran, permitirá garantizar condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad de las obras de arte, y asegurar el cumplimiento de la meta establecida en el proyecto.

La justificación de la necesidad es la siguiente:

- **EN LA VEREDA TROCHA C**

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposición final de sobrantes hasta 5km)

Este ítem aumenta la cantidad en 28.60 m3, de acuerdo con las condiciones metafísicas del lugar, se evidenciaron fallos no contemplados inicialmente lo que incurrió en una mayor excavación buscando terreno firme, con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas lo que implica realizar mayores excavaciones.



RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

Este ítem presenta un aumento en su cantidad debido a la variación de la metafísica a 8.43 m3, ya que de acuerdo con las condiciones naturales de la vía existente a mejorar con la construcción de alcantarillas; se hace necesario realizar los rellenos de los espaldares de las Aletas y algunos sitios con cárcavas en las lateralidades de los sitios a intervenir.



AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA

Este ítem aumenta la cantidad 7.03 m3 toda vez que por implicación de movilidad se debe realizar mayores cantidades de afirmado con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir garanticen una óptima movilidad y cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas, lo que implica realizar mayores cantidades de afirmado



- **EN LA VEREDA ALEMANIA**

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposición final de sobrantes hasta 5km)

Este ítem aumenta la cantidad en 36.38 m3, de acuerdo con las condiciones metafísicas del lugar, se evidenciaron fallos no contemplados inicialmente lo que incurrió en una mayor excavación buscando terreno firme, con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la

escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas lo que implica realizar mayores excavaciones.



RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

Este ítem presenta un aumento en su cantidad debido a la variación de la metafísica a 6.0 m3, ya que de acuerdo con las condiciones naturales de la vía existente a mejorar con la construcción de alcantarillas; se hace necesario realizar los rellenos de los espaldares de las Aletas y algunos sitios con cárcavas en las lateralidades de los sitios a intervenir.



AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA

Este ítem aumenta la cantidad 6.86 m3 toda vez que por implicación de movilidad se debe realizar mayores cantidades de afirmado con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir garanticen una óptima movilidad y cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas, lo que implica realizar mayores cantidades de afirmado.

CONCRETO CLASE F F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS

Este ítem aumenta la cantidad a 0.88 m3 toda vez que por irregularidades del terreno se van mayores cantidades de solado con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir

garanticen una óptima estabilidad y cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas. lo que implica realizar mayores solados.



ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA

El ítem presenta una disminución en su cantidad a 15.64 kg en las visitas realizadas por la supervisión se identificó una variación en la separación entre emparrillados lo que significa como una disminución en su cantidad.



- **EN LA VEREDA LA TIGRERA**

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposición final de sobrantes hasta 5km)

Este ítem aumenta la cantidad en 43.73 m3, de acuerdo con las condiciones metafísicas del lugar, se evidenciaron fallos no contemplados inicialmente lo que incurrió en una mayor excavación buscando terreno firme, con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la

escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas lo que implica realizar mayores excavaciones.



RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

Este ítem presenta un aumento en su cantidad debido a la variación de la metafísica a 20.52 m3, ya que de acuerdo con las condiciones naturales de la vía existente a mejorar con la construcción de alcantarillas; se hace necesario realizar los rellenos de los espaldares de las Aletas y algunos sitios con cárcavas en las lateralidades de los sitios a intervenir.

AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA

Este ítem disminuye la cantidad en 4.5 m3 toda vez que por el terraplén contemplan inicialmente no se fue todo el material contratado lo que indica una disminución en las cantidades de afirmado.

CONCRETO CLASE F F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS

Este ítem aumenta la cantidad a 0.39 m3 toda vez que por irregularidades del terreno se van mayores cantidades de solado con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir garanticen una óptima estabilidad y cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la escorrentía superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas. lo que implica realizar mayores solados.



ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA

El ítem presenta un aumento en su cantidad a 243.17 kg de acuerdo con las visitas realizadas, se determinó una falla en el sitio a implementar la instalación de la tubería, lo que estaba ocasionando una deflexión, por estabilidad de la obra se implementó una protección en los tubos mediante recubrimiento de concreto de 3000 psi y acero interno de manera uniforme, así mismo se complementó el acero planteado inicialmente para muro y aleta, cambiando el muro a aleta, para aumentar su comportamiento de adherencia y compresión entre elementos y garantizando la correcta funcionabilidad de la obra.



CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS

Este ítem aumenta la cantidad a 3.36 m3 toda vez que por el recubrimiento de los tubos y la implementación de las aletas en un costado se van mayores cantidades de concreto con el fin de garantizar que las alcantarillas a construir garanticen una óptima estabilidad y cumplan su funcionalidad como obras de drenaje para el manejo de agua proveniente de la escorrentía

superficial, especialmente lo relacionado a los descoles de las alcantarillas. lo que implica realizar mayores concretos.




CONCLUSIONES Y ACUERDOS:

- Se reconoce la necesidad técnica y funcional de incluir el balance de obra con mayoración, identificados durante la revisión de puntos de ejecución.
- Las afectaciones evidenciadas son consecuencia directa de factores climáticos y condiciones no contempladas inicialmente en el contrato.
- La inclusión de las actividades adicionales permitirá prevenir daños futuros y mejorar la durabilidad de la infraestructura intervenida.

COMPROMISOS:

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entregar balance de obra	CONTRATISTA	16 DE MARZO DE 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO:

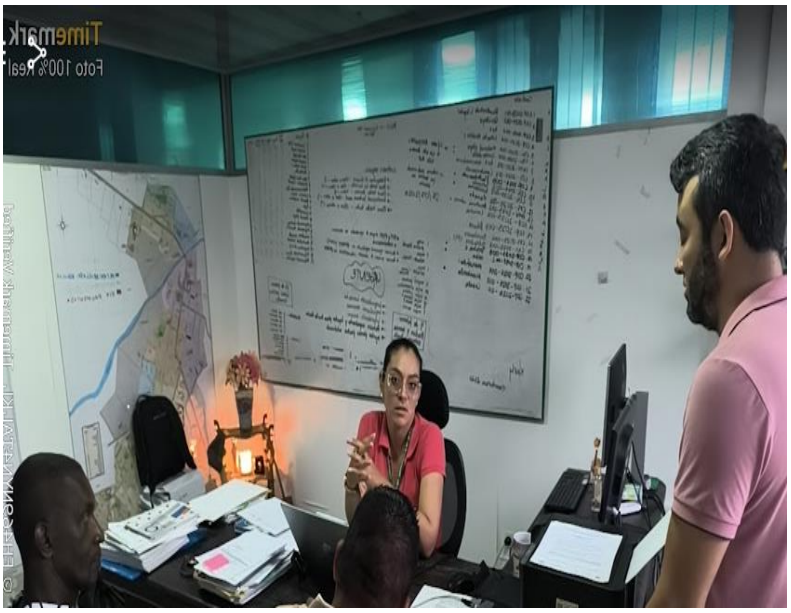

Fotografía 1 Desenlace reunión.

Fotografía 2 Desenlace reunión.

FIRMA DE ASISTENCIA.

Se anexa a esta acta el listado de asistencia.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Libertad y Orden

Tipo de evento: Capacitación [ ] Comité [ ] Otro [X] ¿Cuál? _____ Inicio [ ] Finalización [ ] Hora [ ]

NOMBRE DE EVENTO: Comite Tecnico No. 05

FECHA 16-03-2026 - COP-2025-010

LUGAR: Oficina Planeacion

DEPARTAMENTO: Caqueta

MUNICIPIO: El Doncello

No	Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	No. Documento	Señale con una X la respuesta: Sexo (Mujer, Hombre)	Género (OSIGD*)	Juventud	Identidad étnica (Afrocolombiano, Indígena, Palenquero, Raizal, Rrom, sin identidad étnica)	Población vulnerable (Victima, Discapacidad, Adulto Mayor, Reincorporado / Firmante, Desplazado)	Teléfono	Entidad / Organización / Barrio / Vereda / Inspección	Cargo / Grupo que Representa	Firma o Huella
1	Jaider Eduardo Popo	CC	1044866051	Hombre: X			Afrocolombiano: X		3208[illegible]61	PJC-Caqueta	PJC	
2	Andres Mauricio Lozada	CC	1117515995	Hombre: X					3132354833	Alcaldia	Apoyo Prof.	
3	Kassandra Orozco Orozco	CC	1077477712	Mujer: X					3192991798	Alcaldia	Secretaria planeacion	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

*OSIGD: L: Lesbiana, G: Gay, B: Bisexual, T: Transgénero, T: Transexual, I: Intersexual, Q: Queer, A: Asexual
