INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: STECKERL CARTAGENA USD
Dirección: CRT BOSQUE TV 54 DG 30 MAMONAL CARTAGENA
Teléfono: 3106303250

Fecha Impresión: 2025/12/27
Nro.Remisión: 187288109

Nro.Informe: 145125
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001581X	1936	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001581Y	1973	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001581Z	1992	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582A	1908	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582E	1945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582F	1945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582G	1964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583L	2001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583M	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583N	2010	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583P	1973	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016030	1917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016031	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016032	1964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016033	1889	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016034	1917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016072	1843	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
*Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001349	BFO0016030	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016031	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016032	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016033	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016034	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016072	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001581X	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001581Y	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001581Z	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582A	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582E	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582F	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582G	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583L	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583M	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583N	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583P	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001349	BFO0016030	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016031	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016032	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016033	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016034	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016072	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO001581X	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001581Y	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001581Z	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582A	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582E	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582F	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582G	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583L	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583M	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583N	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583P	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C8001349	BFO0016030	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016031	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016032	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016033	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016034	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016072	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO001581X	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001581Y	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001581Z	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582A	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582E	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582F	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582G	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583L	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583M	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583N	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583P	10.20	1.535	0.92	3.82

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 Página Web: www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 GALAPA
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 2026/01/06
Nro.Remisión: 187293387

Nro.Informe: 146143
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831S	2044	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001831T	2008	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831U	2074	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001831V	2008	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831X	2014	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001831Y	2032	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831Z	2014	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001832A	2014	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001832B	2032	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001832C	2032	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO0018519	2038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO0018520	2050	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO0018521	2050	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO0018522	2074	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO0018523	2062	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO0018524	2056	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001348	BFO001831S	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831T	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831U	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831V	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001832C	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001832B	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001832A	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831Z	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831Y	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831X	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001348	BFO001831S	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831T	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831U	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831V	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001832C	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001832B	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001832A	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831Z	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831Y	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831X	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO00018519	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018520	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018521	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018522	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018523	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018524	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C8001348	BFO001831S	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831T	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831U	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831V	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001832C	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001832B	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001832A	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831Z	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831Y	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831X	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO0018519	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018520	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018521	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018522	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018523	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018524	8.00	0.966	0.73	2.29

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

BITACORA

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

Bitacora de obra

Contrato: 1375-2025
LP-IDER-004-2025

Contratista: Consorcio innovacion y Deporte.

Interventoria: Consorcio Perseverar No. 1389-2025 deportivo cartagena.

Manzanillo.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra.
Contrato No: 1375 - 2025 (LP-IDER-004-2025)
Consorcio Innovacion y Deporte
Fecha: 22-Enero-2026
Manzanillo del Mar.

Clima: soleado/despejado.
Actividades ejecutadas:.
- Firma Acta de inicio.

Stefanny Parra.
Residente de obra.

P&R
Residente interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato No. 1375 -2025 (LP-IDER-004-2025)
Consorcio innovación y Deporte.
fecha: 23, Enero - 2026
Manzanillo del mar
Clima: Soleado / despejado. 8Am a 5Pm.
Actividades Ejecutadas:

- Instalación valla informativa (Estructura).

Personal: 5 Administrativos de obra, 3 Interventora, 4 operativos

Residente de obra
Stefany Parra

Residente de interventoría
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato No 1375 - 2025 (LP-IDER-004-2025)
Consorcio Innovación y deporte.
Fecha: 24 - Enero - 2026
Manzanillo del mar
Clima: Soleado / despejado 8Am a 12 m
Personal: 5 Administrativos obra, 3 Interventoria, 5 operativos
Actividades Ejecutadas:

- Visita de entorno e identificacion de la comunidad.
- Instalación Valla informatica (montaje de lona)
- Conformacion Acceso obra.

- LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCION Y SEGUIMIENTO DE SOPORTES EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST):
SE SOLICITA AL CONTRATISTA CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE CADA VEZ QUE SE VINCULE UNA PERSONA AL PROYECTO, DEBERA REMITIRSE DE MANERA INMEDIATA LOS SOPORTES DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y ARL), PREVIO AL INICIO DE SUS ACTIVIDADES EN OBRA. Y/O PLANILLAS.
- LAS PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEBERAN REMITIRSE A LA INTERVENTORIA A MAS TARDAR EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL CONTROL DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

ATT: MICHAEL ACEVEDO MARTINEZ
PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORIA

Residente de obra
Stefany Parra

PER
Residente interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato No 1375 - 2025 (LP-IDER-004-2025)
Consorcio innovación y deporte.
Fecha: 26-Enero-2026
Manzanillo del mar
Clima: Soleado / Despejado 8 Am a 5 Pm
Personal: 6 Administrativos obra, 3 Interventoría, 5 Operativos

Actividades Ejecutadas:

- Visitas de entorno
- Llegada de equipos y maquinaria
- Instalación bodega.

Maquinaria y equipos
- 1 minicargador.
- 1 contenedor/bodega.
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente Interventoría
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato No 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Consorcio innovacion y deporte
Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 27- Enero - 2026
Mantanillo del mar
Clima: Soleado / Despejado 8 Am a 5 Pm.
Personal: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 5 operativos

Actividades ejecutadas.

- Visita de entorno.
- Ampliación de Acceso a obra
- llegada materiales estructura caubache

Maquinaria y equipo
- 1 minicargador
- 1 contenedor
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefanny Parra

Residente interventoria.
PER

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004 2025)
Contratista: Consorcio Innovación y Deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo Cartagena
Fecha: 28 -Enero-2026
Clima: soleado / despejado. 8 Am a 5 Pm.
Manzanillo del mar.
Personal: 6 Admon de obra, 3 Interventoria, 5 Operativos

Actividades efectuadas.

- Visita de entorno
- Construcción cambuche trabajadores (Estructura)
- Alistamiento campamento obra (limpieza)

Maquinaria y equipo
- 1 minicargador
- 1 contenedor/bodega
- 1 planta electrica
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
IDER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovacion y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena.
Fecha: 29-Enero-2026
Manzanillo del mar
Clima: soleado / Despejado 8:00 Am a 5:00 pm.
Personal: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 6 operativos

Actividades ejecutadas

- llegada materiales Camboche. Cubierta
- Construccion Camboche trabajadores (techo)
- Alistamiento campamento de obra. (Adecuación terreno)

Maquinaria y equipo.

- 1 minicargador
- 1 contenedor/bodega
- 1 planta electrica
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria.
P E R

Bitacora de obra
Contrato : 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista : Consorcio innovación y deporte
Interventoria : Consorcio perseverar deportivo Cartagena
Fecha: 30 -Enero-2026
Manzanillo del mar
Clima: Soleado/despejado de 8 am a 5pm
Personal : 6 admin obra, 3 Interventoria, 6 operativos.

Actividades ejecutadas

- Recibido materiales para estructura cerramiento
- Construcción bancas caucheche trabajadores.
- Alistamiento campamento de obra

Maquinaria y equipos
1 Minicargador
1 Contenedor
1 planta electrica
. Herramienta menor.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
IDER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio Innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 31 - Enero - 2026
Manzanillo del mar
Clima: soleado / despejado 8:00 am a 12:00
Personal: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 9 operativos

Actividades ejecutadas.

- Figurado estructura cerramiento
- Alistamiento campamento de obra.

Maquinaria y equipos
- 1 minicargador
- 1 contenedor
- 1 planta electrica
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
P E R

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio Perseverar deportivo cartagena.
Fecha: 02-febrero-2026.
Manzanillo del mar
Clima: lluvia / Nublado
Personal:

Actividades ejecutadas:

- No se realizan actividades a causa de frente frio en la ciudad.

Maquinaria y equipos
- 1 minicargador
- 1 contenedor/bodega.
- 1 planta electrica
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria.
P E R

Bitacora de obra
Contrato : 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista : Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo Cartagena
Fecha : 03- febrero - 2026
Manzanillo del mar :
clima: lluvia / Nublado.
Personal:

Actividades ejecutadas:

- No se realizan actividades a causa de frente frio en la ciudad.

Maquinaria y equipos
: 1 minicargador
- 1 contenedor
- 1 planta electrica.
- Herramienta menor.

Residente de obra.
Stefany Pana

Residente interventoria
P E R

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 4-febrero-2026
Manzanillo del mar
Clima: Parcialmente nublado. 8:am a 5 Pm
Personal:

Actividades ejecutadas:

- No se realizaron actividades a causa de frente frio en la ciudad.

Maquinaria y equipo
1 mini cargador
1 contenedor
1 planta electrica
- Herramienta menor.

Residente de obra
Stefatany Parra

Residente interventoria.
RER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte.
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 5 - febrero - 2026
Manzanillo del mar
Clima: Parcialmente nublado 8am a 5PM.
Personal: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 12 operativos.

Actividades ejecutadas: :

- Instalación contenedor de obra.
- llegada material laminado cerramiento.
- elaboración estructura cerramiento.

Maquinaria y equipo
1 minicargador • montacargas.
3 contenedor
1 planta electrica
- Herramiento

Observaciones: Visita por parte de la ingeniera Karen (IDER)
Pasantacion Proyecto en obra.

Residente de obra
Stefany parra

Residente interventoria
PER

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovacion y deporte
Interventoria: consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 6-Febrero-2026
Manzanillo del mar
Clima: Nublado / parcialmente nublado 8 am a 5 pm.
Personal: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 9 operativos

Actividades ejecutadas:

- Elaboración estructura cerramiento.
- llegada maquinaria para descapote.

Maquinaria y equipo
3 contenedores
- minicargador
1 planta electrica
- Herramienta menor.
- Bulldozer

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 7- febrero - 2026
Manzanillo del mar
Clima: Parcialmente nublado. 8am a 12pm
Personal: 6 Administrativos obra, 3 interventoria, 10 operativos.

Actividades ejecutadas.

- llegada material a obra Arena y agregados y cemento.
- Descapo del terreno. Cancha #11

Maquinaria y equipo
3 contenedores • minicargador
1 Planta electrica
- Herramienta menor.
• Bulldozer

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoría
PEPE

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (CLP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 9- febrero -2026
Manzanillo del mar
clima: Parcialmente nublado 8.am a 5pm
personal: 6 admon obra, 3 interventoria, 12 operativos

Actividades ejecutadas:

- Descapote cancha F11
- trazado cerramiento. colindante con serena.
- elaboración estructura cerramiento.

Maquinaria y equipo

3 contenedor
1 planta electrica
1 Bulldozer
. Herramienta menor
. minicargador

Residente de obra
stefany parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio Inmaculado y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena.
Fecha: 10-febrero-2026
Manzanillo del mar.
Clima: Despejado/soleado. 8am a 5pm
Personal: 6 administrativo obra, 3 Interventoria, 15 operativos

Actividades ejecutadas:

- Descapo cancha #11.
- excavacion Coramiento
- Descapote cancha multiple.
- llegada vibrocompactador

Maquinaria y equipo.

3 contenedores
1 planta electrica
1 Bulldozer
- Herramento menor
- minicargador
- Vibrocompactador

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria.
PEN

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio Innovación y Deporte
Interventoria: Consorcio perseverar Deportivo Cartagena.
fecha: 11 - febrero - 2025.
Manzanillo del mar
Clima: soleado / despejado. 9:00 Am a 12pm.
Personal: 6 Admon de obra, 3 Interventoria, 15 operativos

Actividades ejecutadas:

- Instalacion estructura cerramiento colindante con serena
- Descapote concha Multiple.
- excavación cerramiento colindante con serena.
- llegada Acero a obra.
- tratado cerramiento colindante via manzanillo.

Maquinaria y equipo.

3 contenedores
1 planta electrica
1 bulldozer
Herramienta menor
• minicargador
• Vibrocompactador

Residente de obra
Stefany Parra

Residente Interventoria.
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato : 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista : Consorcio Innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena.
Fecha: 12 - Febrero - 2026
Manzanillo del mar
clima: soleado / parcialmente nublado. 8:am a 5 pm.
Personal: 6 Adscrito de obra, 3 Interventoria, 18 personas. (OP)

Actividades ejecutadas

- Descapote canchas Voleibol
- Instalación estructura cerramiento. colindante sorena.
- excavacion cerramiento. colindante sorena.
- Retiro material Descapote Volquetes
- Elaboración estretura Cerramiento.
- Figurado Acero estretructura Cimentacion

Maquinaria y equipo.
3 contenedores
1 planta electrica
1 Bulldozer
Herramienta menor
• Vibrocompactador

Observación: Visita geotecnista. - se toman 5 apiques para validaciones complementarias.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria.
P.E.R

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte.
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena
Fecha: 13-febrero-2026
Manzanillo del mar
Clima: soleado / Despejado. 8am - 12pm. - 12:pm a 5pm. tarde
personal: 6 Admon de obra, 3 interventoria, 18 operativos.

Actividades ejecutadas:

- Instalacion estructura cerramiento. colindante serena
- elaboracion estructura. cerramiento. colindante manzanillo.
- instalación laminado cerramiento, colindante serena.
- retiro material volquetas
- localización concha F11.
- Izgrado Acero estructura. Cimentación
- excavacion Nivel Subrasante.

Maquinaria y equipos.
3 contenedors
1 planta electrica
Bulldozer
Herramienta menor
• Vibrocompactador

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportiu Cartagena.
Fecha: 14-febrero.-2026
Manzanillo del mar
clima: Soleado/Despejado 8am - 12pm.
Personal: 6 Admon de obra, 3 Interventoria, 20 personal (OP)

Actividades ejecutadas:

- excavacion nivel subrasante
- excavación cerramiento. colindante manzanillo
- instalacion cerramiento. colindante sacna
- figurado Acero. estructura cimentación
- Conformacion subrasante
- llegada maquinaria retroexcavadora

Maquinaria y equipos
3 contenedores
1 planta electrica
Bullobzar
Herramienta menor
• vibrocompactador
• retroexcavadora (pajonita)

Observaciones:
- Se recibe visita personal representativo del IDER e infraestructura se realiza recorrido general

Residente de obra
Stefany Parra

Residente de interventoria
P.E.N

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte.
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo Cartagena
Fecha: 16 - febrero - 2026
Manzanillo del mar.
Clima: Parcialmente nublado 8am a 1pm - lluvisna/sereno 1pm a 3pm.
Personal: 6 Admon obra, 3 interventoria, 20 operativo
Actividades ejecutadas:

- excavación nivel subrasante
- instalacion estructura cerramiento Colindante muntanillo
- instalacion laminado cerramiento. colindante muntanillo.
- figurado Acero estructura columnas
- Conformación subrasante. c
- limpieza canal

Maquinaria y equipos

3 contenedores
1 planta electrica
Bulldozer
Herramienta menor
• Vibrocompactador
• retroexcavadora
• minicargador

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1375-2025 CLP-IDER-004-2025
Contratista: Consorcio Innovación y deporte
Interventoria: consorcio perseverar deportivo Cartagena.
Fecha: 17- febrero -2026
Manzanillo del mar
clima: soleado / despejado 8:am a 5pm.
Personal: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 20 operativos

Actividades efectuadas:

- Instalacion Ceramicata colindante. manzanillo.
- Conformacion subrasante
- llegada maquinaria a obra.
- figurado Acero estretura. columnas

Maquinaria y equipos

3 contenedores
1 Planta electrica.
Bulldozer
Herramienta menor
• Vibrocompactador
• retroexcavadora
• minicargador.

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato : 1375-2025 (LP - IDER-004-2025)
Contratista : Consorcio innovación y deporte
Interventoria : Consorcio perseverar deportivo Cartagena
Fecha : 18 - Febrero - 2026
Manzanillo del mar
Clima : parcialmente nublado 8am a 5pm.
Personal : 6 Admon obra, 3 Interventoria., 20 operativos

Actividades ejecutadas.

- excavacion cerramiento. colindante manzanillo
- instalacion cerramiento. colindante manzanillo / sabana
- Conformacion subrasante.
- figurado Acero estructura. (dados iluminacion)
- excavacion zapatas cimientos

Maquinaria y equipos

3 Contenedores
1 planta electrica
1 Retroexcavadora.
1 vibrocompactador
• Herramienta menor
• minicargador

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria.
PER

Bitacora de obra
Contrato: 1395 - 2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovación y deporte
Interventoria: Consorcio
Fecha: 19 - febrero - 20
Manzanillo del mar
clima: soleado / despejado 8:00 am a 5:00pm,
Personal: 6 colmon obra, 3 interventoría, 20 operativos

Actividades ejecutadas

- instalación cerramiento. colindante manzanillo.
- Conformacion subrasante
- figurado Acero. estructura. (Datos iluminacion).
- excavación subrasante
- excavación zapatas. canenos

Maquinaria y equipos.
3 contenedores
1 planta electrica.
retroexcavadora
miniargador

- Herramienta menor
- Vibrocompactador.

Residente de obra.
Stefany Parra

Residente interventoria.
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: 1395-2025 (LP-IDER-004-2025)
Contratista: consorcio innovacion y deporte
Interventoria: Consorcio Perseverar deportivo Cartagena
Fecha: 20 - febrero - 2026
Manzanillo del mar
clima: soleado / Despejado 8 am a 5pm.
Personal: 6 Admon obra, 18 operativos, 3 Interventoria.

Actividades ejecutadas:

- Instalacion Cerramiento manzanillo
- Figurado Acero estructura (Dados iluminacion)
- excavacion zapatas Grados
- Conformacion Subrasante.
- Concreto ciclopeo Canerinas

Observacion: Se realiza entrega de 1 Carpa 4x4 Color Blanco a personal motorizado, Con el fin de reubicarce en frente del Campo de Softball

Maquinaria y equipos
3 contenedores
1 planta electrica
1 retroexcavadora
1 mini cargador
- Herramienta menor
- trompo

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato : 1375- 2025 (LP -IDER-004-2025)
Contratista: Consorcio innovacion y deporte
Interventoria: Consorcio perseverar deportivo cartagena.
Fecha: 21 - febrero - 2026
Manzanillo del mar
clima: Soleado / despejado. 8am - 12pm
Personal.: 6 Admon obra, 3 Interventoria, 20 operativos.

Actividades ejecutadas

- figurado Acero estructura. columnas.
- excavacion zapatas gradas
- Conformacion de Subrasante
- Concreto ciclopeo. cimientos.
- Armado zapatas cimientos.

Maquinaria y equipos.
3 contenedores + herramienta menor
1 planta electrica . trompo
1 retroexcavadora
1 mini cargador

Residente de obra
Stefany Parra

Residente interventoria
PER

Powered by CamScanner

ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA Y DE INTERVENTORIA

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

CONSORCIO
PERSEVERAR
DEPORTIVO CARTAGENA

SEGURIDAD SOCIAL OBRA

Medellín, 23 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1051890129	TORRES OROZCO ESNEIDER	24/02/2026		25524717	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/02/2026 09:48:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.142.197, 192.230.104.5, 172.16.42.57

Medellín, 10 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que RICARDO LATORRE RICO identificado(a) con cédula de ciudadanía 79568891 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 11/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE N902016232

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411202

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 10/02/2026 4.22 PM

ARL

Medellin, 25 de febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con documento de identidad **C8850827**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con NIT **C8850827**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2021-10-29	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIOS	0000000001	1	0.522	EN COBERTURA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067290773	CAUSIL TORRES JOSE DAVID	10/02/2026		22247820	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:47:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143449674	PARRA MERCADO STEFANY	10/02/2026		21495518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:49:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 10 de febrero de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que JAIRO LUIS FUENTES VEGA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1002315317 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 02/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

RENTERIA FERIA FRANKLIN C73352251

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - TRABAJADORES INDEPENDIENTES

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C733522512604151305

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 10/02/2026 2.15 PM

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **FUENTES VEGA JAIRO LUIS** identificado(a) con **CC** número **1.002.315.317** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 14 de diciembre de 2021 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 10 de febrero de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
NIT 900.226.715 - 3

CERTIFICA:

El suscrito afliado relacionado a continuación se encuentra o ha estado registrado en la EPS, con los siguientes datos:

Tipo y No. de documento:	CC 1002315317
Nombres:	JAIRO LUIS FUENTES VEGA
Tipo de afiliado:	Cabeza de familia
Fecha de afiliación:	2024-12-01
Estado de afiliación:	Activo
Régimen:	Contributivo
Nivel Sisben:	1
Departamento - Municipio:	BOLIVAR CLEMENCIA

Tipo de Servicio	IPS
IPS Atención	E.S.E. HOSPITAL LOCAL ARJONA

OBSERVACIONES:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

La anterior certifcación se expide y firma el 2026 02-02 a solicitud del interesado y es válida hasta el 2026-03-01

CARLOS TORRES SALAZAR
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

VIGILADO Supersalud

Medellín, 16 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1081923154	DELGADO GIL CESAR ALFONSO	12/02/2026		31318991	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10473904372604759474

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/02/2026 16:31:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.99.113.146, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1049452268	BRITO SOTO IVAN DARIO	02/02/2026		22914815	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:16:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1052734059	OROZCO CAMPO KATRY DEL CARMEN	02/02/2026		xo211153	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:22:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1001898294	GONZALEZ MIRANDA KATHERINE	10/02/2026		20323622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 11:59:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 11 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1128058065	ALVIS OROZCO FRANCISCO	12/02/2026		22165125	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/02/2026 22:03:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.251.217, 192.230.104.1, 172.16.42.57

Medellín, 11 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143327432	PIMENTEL GARCIA SILFREDO	12/02/2026		i2491621	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/02/2026 22:42:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.251.217, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que YERIS JOSE NIEVES SARABIA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1001904199 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.12 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS GUARDO HERRERA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1041993432 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.15 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JORGE LUIS BLANCO MERCADO identificado(a) con cédula de ciudadanía 73007190 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.21 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que GERSON JOEL RUDAS CABALLERO identificado(a) con cédula de ciudadanía 73155110 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.27 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que CRISTIAN CAMILO MARTINEZ AZAN identificado(a) con cédula de ciudadanía 1001969993 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.30 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que YORDIN SEBASTIAN TAPIA BOHORQUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047456502 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.34 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LUIS MANUEL HERNADEZ PEREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1002185800 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.38 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que MANUEL JOSE BUSTAMANTE identificado(a) con cédula de ciudadanía 7143072 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 2.29 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que ALBEIRO BATISTA OTERO identificado(a) con cédula de ciudadanía 9237009 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.15 PM

Medellín, 18 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que RAFAEL ANTONIO ESPITIA ESTRADA identificado(a) con cédula de ciudadanía 70530958 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 19/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 18/02/2026 9.50 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JOSE JAVIER ALVIS OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1007390527 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 10.30 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que AUGUSTO JOSE PEREZ OLACUADA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1042995878 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.13 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JEAN CARLOS BATISTA CASSIANI identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047490391 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.18 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LUIS EDUARDO TEJEDOR VEGA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047490461 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 10.36 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JENSER CORREA BERRIO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047372666 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.23 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN CAMILO PADILLA CANTILLO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047493037 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.02 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que RONNY JOSE JIMENEZ JIMENEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047502141 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 11.57 AM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que MOISES DAVITH LOPEZ BUSTAMANTE identificado(a) con cédula de ciudadanía 1128061929 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 11.55 AM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN MANUEL VIVERO CASTRO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1143325926 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.09 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que WILLIAM MANUEL MATO OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1233913446 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.05 PM

SEGURIDAD SOCIAL

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902016232	4	CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAS DE LEZO MZ 41 LT 17 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3104358808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	52375605	9499498316	E	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$749,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0
1	CC	1007315418	CHICA DIANA	230301	4	$266,667	$42,700	EPS002	4	$266,667	$10,700	CCF08	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$266,667	$1,400	4	$0	$0
2	CC	1047396039	GUERRERO MARIA	230201	11	$1,320,000	$211,200	EPS002	11	$1,320,000	$52,800	CCF08	11	$1,320,000	$52,800	14-11	11	$1,320,000	$6,900	11	$0	$0
3	CC	1100402674	RAMIREZ LUISA	230301	11	$1,466,667	$234,700	EPS002	11	$1,466,667	$58,700	CCF08	11	$1,466,667	$58,700	14-11	11	$1,466,667	$7,700	11	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902016232	4	CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAS DE LEZO MZ 41 LT 17 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3104358808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	52375605	9499498316	E	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$749,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$488,600	$400	$0	$489,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$277,400	$200	$0	$277,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$211,200	$200	$0	$211,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$16,000	$100	$0	$16,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$16,000	$100	$0	$16,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$122,200	$100	$0	$122,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$122,200	$100	$0	$122,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$122,200	$100	$0	$122,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$122,200	$100	$0	$122,300
TOTAL				**3**	**$749,000**	**$700**	**$0**	**$749,700**

ARL

Medellin, 25 de febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con documento de identidad **C8850827**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con NIT **C8850827**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2021-10-29	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIOS	0000000001	1	0.522	EN COBERTURA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143449674	PARRA MERCADO STEFANY	10/02/2026		21495518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:49:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067290773	CAUSIL TORRES JOSE DAVID	10/02/2026		22247820	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:47:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143449674	PARRA MERCADO STEFANY	10/02/2026		21495518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:49:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 19 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143384875	VIANA GARCIA CARLOS ANDRES	20/02/2026		24921819	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/02/2026 21:26:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.61, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1047371916	VALENCIA GARRIDO VICTOR HUGO	02/02/2026		15115823	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:07:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 17 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1047444282	GARCIA LEAL NEY ALBERTO	18/02/2026		m230iB13	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/02/2026 13:54:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.99.113.146, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 16 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1081923154	DELGADO GIL CESAR ALFONSO	12/02/2026		31318991	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10473904372604759474

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/02/2026 16:31:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.99.113.146, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1049452268	BRITO SOTO IVAN DARIO	02/02/2026		22914815	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:16:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1052734059	OROZCO CAMPO KATRY DEL CARMEN	02/02/2026		xo211153	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:22:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1001898294	GONZALEZ MIRANDA KATHERINE	10/02/2026		20323622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 11:59:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

CONSORCIO
PERSEVERAR
DEPORTIVO CARTAGENA

SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902024954	7	CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ANDREA URDANETA PENALOZA	CRA 5 55 15	CARTAGENA-BOLIVAR	3012888648	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	01156614	9501156614	E	2026/02/12	2026/03/09	BANCO AV VILLAS		$1,010,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAULA ANDREA URDANETA PENALOZA (4 Afiliados)																								$3,525,272	$564,100			$3,525,272	$141,100			$3,525,272	$141,100			$3,525,272		$18,700		$0	$0		$865,000
Centro de Trabajo: CARTAGENA (4 Afiliados)																								$3,525,272	$564,100			$3,525,272	$141,100			$3,525,272	$141,100			$3,525,272		$18,700		$0	$0		$865,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																								$3,525,272	$564,100			$3,525,272	$141,100			$3,525,272	$141,100			$3,525,272		$18,700		$0	$0		$865,000
1	CC	1044923572	ACEVEDO MICHAEL	X																	230301	9	$750,000	$120,000	EPS042	9	$750,000	$30,000	CCF08	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	0.522%	$4,000	9	$0	$0	Si	$184,000
2	CC	1143401802	ELLES PEDRO	X																	230301	9	$1,500,000	$240,000	EPS002	9	$1,500,000	$60,000	CCF08	9	$1,500,000	$60,000	14-11	9	$1,500,000	0.522%	$7,900	9	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	73185092	RAMOS ALBERTO	X																	230201	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$21,100	CCF08	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	0.522%	$2,800	9	$0	$0	Si	$129,100
4	CC	1101758588	TELLEZ SERGIO	X																	230301	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF08	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	0.522%	$4,000	9	$0	$0	Si	$184,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																								$525,272	$84,100			$525,272	$21,100			$525,272	$21,100			$525,272		$2,800		$0	$0		$129,100
Centro de Trabajo: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																								$525,272	$84,100			$525,272	$21,100			$525,272	$21,100			$525,272		$2,800		$0	$0		$129,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																								$525,272	$84,100			$525,272	$21,100			$525,272	$21,100			$525,272		$2,800		$0	$0		$129,100
5	CC	1001890587	MERCADO SARAY	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS010	9	$525,272	$21,100	CCF07	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	0.522%	$2,800	9	$0	$0	Si	$129,100
Total			**Afiliados(5)**																					$4,050,544	$648,200			$4,050,544	$162,200			$4,050,544	$162,200			$4,050,544		$21,500		$0	$0		$994,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$648,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$564,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$84,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$21,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$21,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$162,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$21,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$141,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$162,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$30,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$21,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$30,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$81,100
TOTAL				**5**	**$994,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30839055		VILLADIEGO GARCIA PAOLA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 32 # 80d - 81conj Verona	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9498600937	9498600937	I	2026/02/12	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA		$936,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	30839055	VILLADIEGO PAOLA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF08	30	$2,500,000	$50,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	No	$936,500
Total	**Afiliados(1)**																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$2,500,000	$50,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0		$936,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30839055		VILLADIEGO GARCIA PAOLA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 32 # 80d - 81conj Verona	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9498600937	9498600937	I	2026/02/12	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA		$936,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$174,000	$0	$174,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$174,000	$0	$174,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$50,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$50,000	$0	$50,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$0	$312,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$312,500	$0	$312,500
TOTAL				**1**	**$936,500**	**$0**	**$936,500**

ANEXO 8. INFORME SISO Y AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 01

Seguimiento a la implementación del Plan de aseguramiento a la Calidad y Seguridad Industrial.



CONTRATO DE OBRA N° 1375 - 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CARTAGENA - BOLIVAR

PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

ENERO – FEBRERO DE 2026

Dirección: Cra 5 #33-15 Edificio Colseguros, Oficina 501 Barrio el centro – Tel: 3187769570
Email: consorcioperseverardeportivo@gmail.com NIT. No. 902.024.954-7

INTRODUCCIÓN

En el presente informe, contiene las actividades en el periodo del 22 de enero al 22 de febrero del año 2026; para el cumplimiento de los compromisos legales contractuales de **CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA** en la verificación de la implementación del plan de aseguramiento a la calidad y seguridad industrial dentro de la ejecución del **CONTRATO N° 1389 - 2025** cuyo objeto es: **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.**

El contratista realizará la interventoría a las labores de construcción de escenarios deportivos y espacios públicos en el distrito de **Cartagena de indias.**

1. AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES, CONSIDERANDO LA ROTACIÓN DEL PERSONAL

Durante este periodo ingresaron al proyecto 40 colaboradores aportando certificados de afiliaciones y/o pago de planilla de S.S La información fue verificada por la Interventoría a través de las mismas EPS, Fondos de pensiones y Administradoras de riesgos laborales, esto con el fin de verificar la autenticidad de dicha documentación.

Nota: El contratista adjunto planilla de pago de seguridad social mes vencido como lo dice la normativa (Decreto 1406 de 1999 art. 20 y 24 “Toda empresa pequeña o grande cancelaran sus aportes mes vencido”).

A continuación, se describe el personal del proyecto **ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR** ubicada en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar,

PERSONAL OPERATIVO CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE	
NOMBRE Y APELLIDOS	**N° CEDULA**
Esneider Torres Orozco	1051890129
Manuel José Bustamante	7143072
William Mattos Orozco	1233913446
José Vivero Castro	1143325926
Moisés López Bustamante	1128061929
Rony Jiménez Jiménez	1047502141
Juan Padilla Cantillo	1047493037
Jean Carlos Batista Cassiani	1047490391
Jenser correa Berrio	1047372666
Augusto Pérez Olazcuagua	1042995878
Albeiro Batista Otero	9237009
Francisco Alvis Orozco	1128058065
Silfredo Pimentel García	1143327432
Yeris José Nieve Sarabia	1001904199
Juan Carlos Guardo Herrera	1041993432
Jorge Blanco Mercado	73007190
Gerson Rudas Caballero	73155110

Cristian Martínez Asan	1001969993
Yordin Tapia Bohórquez	1047456502
Luis Hernández Pérez	1002185800
Luis Tejedor Vega	1047490461
Rafael Espitia Estrada	70530958
José Alvis Orozco	1007390527
Jairo Fuentes Vega	1002315317

P. ADMINISTRATIVO CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**N° CEDULA**
Ricardo Latorre Rico	Directo De Obra	79568891
Stefany Parra Mercado	Residente De Obra	1143449674
Efraín De Jesús Guerra Malo	Ingeniero eléctrico	8850827
Katri Del Carmen Orozco Ocampo	Profesional HSEQ	1052734059
José David Causil Torres	Maestro De Obra	1067290773
Katherine González Miranda	Trabajadora Social	1001898294
Iván Brito Soto	Almacenista	1049452268

2. PERSONAL DE INTERVENTORIA ASIGNADOS AL PROYECTO

LISTADO DE COLABORADORES INTERNVENTORIA CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**N° CEDULA**
Paola Alejandra Villadiego García	Director De interventoría	XXXXXXXXX
Pedro Claver Elles	Residente De interventoría	XXXXXXX
Michael David Acevedo Martínez	Profesional HSEQ	1044923572
Alejandro Tellez	Topografo	XXXXX

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST

Durante este periodo el Contratista cumplió con la programación que se reporta semanalmente como medidas de intervención HSE para un cumplimiento eficiente de los procesos realizados con las actividades dentro de la construcción. Así mismo el cumplimiento de charlas, capacitaciones, inspecciones en medida de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el plan de trabajo anual SST del CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

4. SEGUIMIENTO A LOS AUTO REPORTES DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO REALIZADO POR LOS TRABAJADORES

Durante este periodo la interventoría realizó inspecciones de área con el objeto verificar el cumplimiento en lo que refiere al Plan de gestión Integral de obras.

INSPECCIONES	FECHA
Tipo de inspección: Inspección Kit de Emergencia **Responsable:** Inspector HSEQ **Hallazgos:** Se realiza inspección de elementos de Emergencias (Botiquín) donde se evidencia su buena ubicación y están en buenas condiciones todos los elementos **Tipo de inspección:** Inspección general de obra (locativa). **Responsable**: Inspector HSEQ **Hallazgos:** Se logra evidenciar que la obra se encuentra muy bien en orden y aseo.	**Fecha**: 24 febrero de 2026

5. REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST

Durante este periodo el contratista realizó las siguientes charlas diaria de seguridad:

TEMA DE CHARLA	FECHA
Uso Obligatorio de los epp	11- febrero -2026
Pausas activas	16 – febrero -2026
Orden y aseo	19- febrero -2026

Nota: El Contratista anexó el registro en las respectivas carpetas adjuntas al envió de este informe.

6. REGISTROS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Durante este periodo el contratista no realizó Inducciones:

TEMA DE CHARLA	FECHA
INDUCCION	13- febrero-2026
INDUCCION	17- febrero - 2026

7. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN: RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

INDICADORES RES. 0312 DE 2019		
NOMBRE INDICADOR	**FORMULA**	**RESULTADO**
8.1 Frecuencia de Accidentalidad	(Número de Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / El número de trabajadores en el mes) * 100	0
8.2 Severidad de Accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0
8.3 Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / número de días de trabajo programado en el mes) *100	0

8. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS DE GESTIÓN, PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ESTÁNDARES, PROTOCOLOS, ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN)

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Charlas de Seguridad</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Acompañamiento visita del distrito</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Inspección de Herramientas y epp en campo</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Supervisión de Actividades</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Señalizaciones zona interior y exterior del proyecto</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Inspeccion de botiquin</td><td>Pausas Activas</td></tr>
</table>

9. REGISTROS DE ENTREGA Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION

El personal del contratista **CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE** cuenta con la dotación (Ropa de Trabajo Adecuada) y los Elementos de Protección Individual (EPI), el personal subcontratado cuenta con dotación: camisa manga larga, Jean y botas y EPIS adecuados y en buenas condiciones para cada una de las actividades a realizar: así mismo cuenta con casco, guantes. Cabe resaltar que el uso de los EPI de los trabajadores es de primordial importancia su uso en cada una de las actividades desarrolladas diariamente en la obra.












Nota: El Contratista anexó el registro de entrega de dotación y EPP de los trabajadores. en cuanto a la entrega de dotación al personal nuevo el contratista manifiesta que Según el código sustantivo del trabajo artículo 230. Suministro de calzado y vestido de labor (Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador). El Contratista anexa el registro de entrega de dotación y EPP de los trabajadores.

Diagrama de flujo inspección daría de los elementos de protección Individual

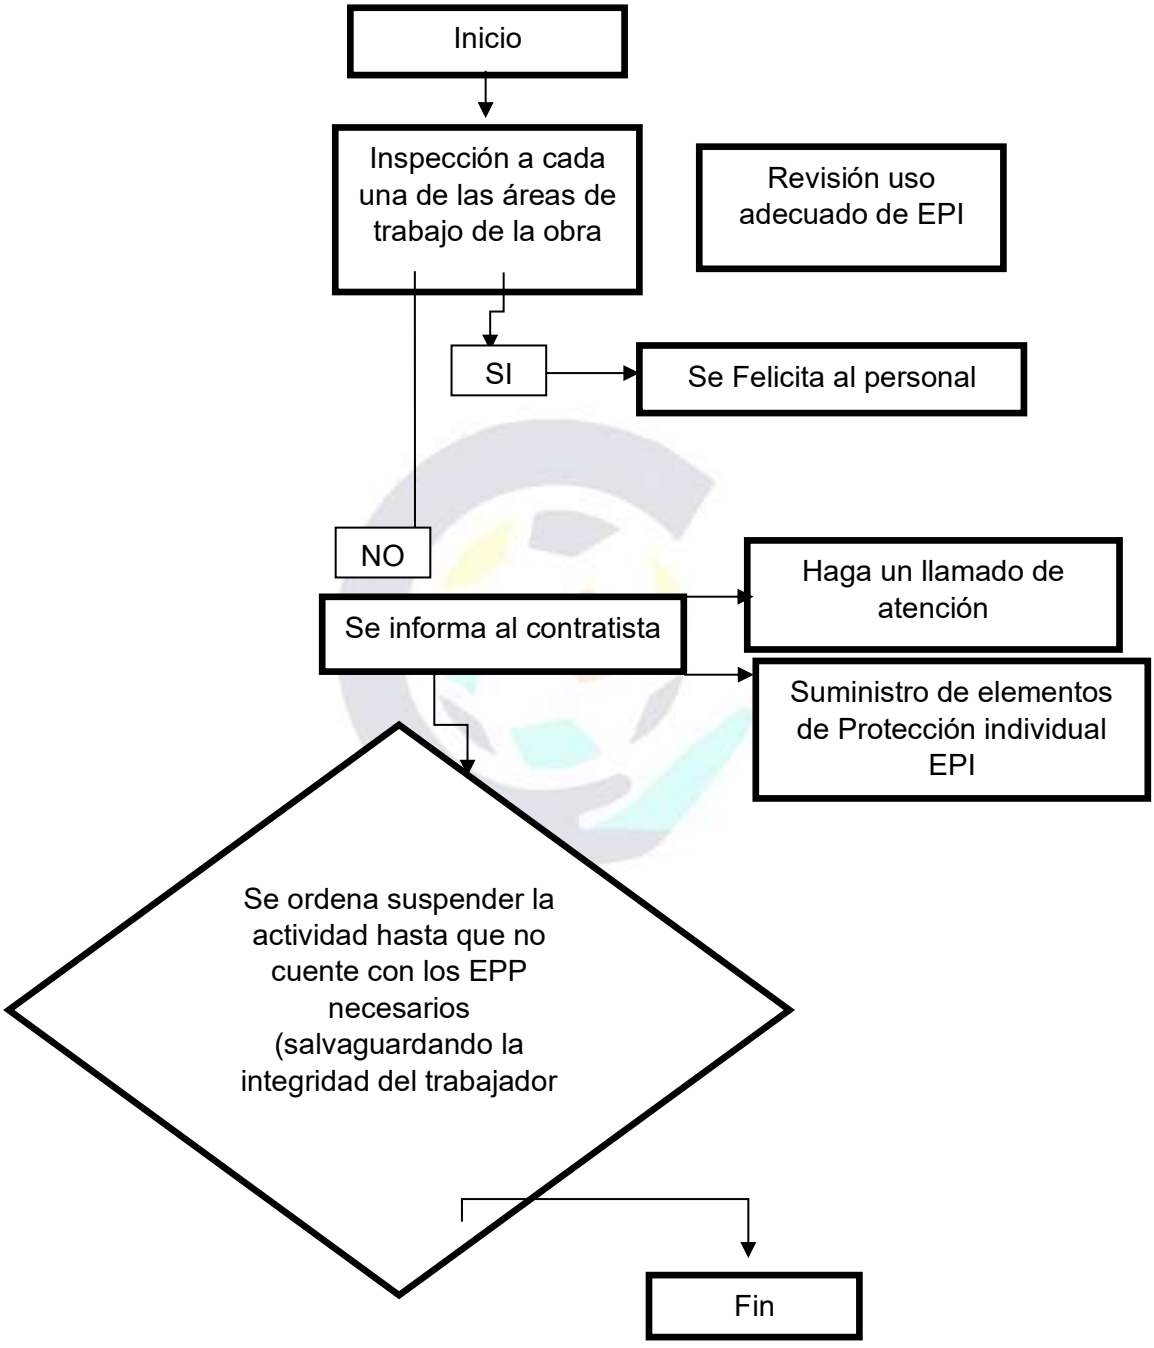

10. REGISTROS DE LAS INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANIPULADAS

Durante este periodo el contratista realizó inspecciones y preoperacional a herramientas y equipos, la cual cumplieron con todos los requerimientos para operar dentro del proyecto ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR.

Nota: El Contratista anexó el registro en las respectivas carpetas adjuntas al envió de este informe.

11. GESTIÓN EN EMERGENCIAS

Durante este periodo por parte del contratista no hubo accidente laboral en la obra parque centenario. Manteniendo el índice de accidentalidad en cero, la prevención de incidentes y accidentes se está llevando a cabalidad de acuerdo los objetivos establecidos en el plan de trabajo.

12. GESTIÓN DE CONTRATISTAS

Durante este periodo el contratista realizó la siguiente gestión:

1. Se les realizó 2 charlas de seguridad.
2. Se les realizó a los trabajadores en la obra sus permisos de trabajo, ATS, preoperacionales.
3. Se validó el pago de planillas de aportes y certificados de afiliación SGSSS del personal contratista.
4. Orientación al personal el uso obligatorio de los epp.
5. Concientización de las áreas de trabajo libres y despejadas en todas las actividades
6. Orientación en la prevención de incidentes y accidentes laborales.
7. Señaléticas en obra.
8. Recomendaciones trabajo seguro en los diferentes recorridos
9. Inspecciones generales de obra, inspecciones a botiquín.

13. GESTIÓN CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

- Se cumplió con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Se garantizó la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia de este periodo.
- Se implementó todos los formatos estipulados en el plan de HSE
- Se promovió entre los trabajadores y contratistas buenas prácticas de gestión ambiental con el fin de que sean aplicadas en el trabajo y en la vida cotidiana.
- Se Ejecutó la programación del plan de trabajo a su totalidad.
- Se anexó todos los registros y se incluyen evidencias fotográficas. Se está cumpliendo con todas las normas de seguridad y Salud en el trabajo
- Se señalizó parcialmente la vía peatonal donde se ejecuta las actividades.
- Se tiene evidencia del Control Diario de personal.
- Se diligenció los formatos de inspección correspondiente a este periodo.
- Se realizaron 2 charlas de seguridad en obra.

14. SOLICITUD Y RECOMENDACIONES.


- Se solicita el acta de conformación del comité paritario de salud y seguridad en el trabajo (COPASST).
- Se solicita el acta de conformación del comité de convivencia laboral (COCOLA).
- Se solicita implementar más charlas de seguridad con énfasis al autocuidado.
- Se recomienda implementar más señaléticas internas en obra.

15. GESTION ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Con base en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y la Normatividad a cumplir, a continuación, se relacionan las actividades principales que el contratista ejecutó en este Periodo. Teniendo como base el Plan Operativo de Control de la Calidad Presentado por el Contratista.

16.1 Valla informativa de la obra: El Contratista CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE ya tiene instalada la valla informativa.

16.2 Bitácora de obra: El contratista CONSORCIO IINOVACION Y DEPORTE mantiene en obra un libro de registro de actividades Identificada con el número y el objeto del contrato de obra y de interventoría. Donde se Registró las firmas en la primera hoja de la bitácora, incluyendo nombre, cargo y matrícula profesional.



MICHAEL ACEVEDO MARTINEZ
SST CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO DE CARTAGENA
INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO INFORME No. 1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

INFORME DE SEGUIMIENTO MESUAL No. 1 AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTRATO No. 1375-2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR.

DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

Contenido

CONTENIDO DE ILUSTRACIÓN 3
1. RESUMEN DEL INFORME 4
2. OBJETIVOS. 5
2.1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 5
2.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE CONTROL DEL RIESGO 5
3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA. 6
3.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 6
4. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 7
4.1. CONTROL DE PERSONAL 7
4.2. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). 7
4.3. INSPECCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS 8
4.4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (CHARLAS) 9
4.4.1. USO OBLIGATORIO DE LOS EPP. 9
4.4.2. PAUSAS ACTIVAS. 10
4.4.3. CHARLAS. 11
4.4.4. SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL AREA 11
4.4.5. PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 13
4.4.6. CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES. 14
4.4.7. MANEJO AMBIENTAL Y DE RESIDUOS. 20
5. CONCLUSIONES. 23
6. ANEXOS. 24

CONTENIDO DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Localización del proyecto. 6
Ilustración 2. Entrega de EPP 7
Ilustración 3. Excavaciones de cimentaciones. 8
Ilustración 4. Señalización perimetral de excavaciones. 8
Ilustración 5. Actividades dentro de la excavación. 9
Ilustración 6. Capacitación de uso obligatorio de EPP. 10
Ilustración 7. Evidencia de pausas activas 10
Ilustración 8. Señales de Inicio de Obra. 11
Ilustración 9. Señal de Fin de Obra. 12
Ilustración 10. Señales Pare y Siga. 12
Ilustración 11. Señales de Uso de EPP en obra. 12
Ilustración 12. Señalización de excavaciones 13
Ilustración 13. Botiquín de primeros auxilios. 13
Ilustración 14. Manejo de residuos. 20

1. RESUMEN DEL INFORME

El sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, es una disciplina que se encarga de la intervención, prevención y mitigación de las condiciones que pueden desencadenar un incidente, accidente o enfermedad laboral por causa de las condiciones de labor, la protección y promoción de la salud de los trabajadores serán encaminadas a la promoción y control de estos factores.

Como parte de la gestión realizada por el CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE en cuanto a la supervisión y control de las actividades en seguridad y salud en el trabajo, está en las inspecciones y controles antes de iniciar con la ejecución de la obra y alinearnos con los planes de gestión, en donde se busca reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo.

En el siguiente informe se hace referencia a la gestión en campo, la parte documental y legal que se debe tener en cuenta para ejecutar actividades en obra, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro, inspecciones de herramientas manuales y equipos, preoperacionales a las mismas con el fin de mitigar los riesgos existentes en los sitios de trabajo teniendo como finalidad un lugar seguro para los trabajadores.

2. OBJETIVOS.

2.1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Garantizar el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el sistema general de riesgos laborales para la protección de la integridad de los empleadores y contratantes de la CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA,

2.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE CONTROL DEL RIESGO.

Realizar seguimiento al programa de control de riesgos con base en el análisis integral de las condiciones de trabajo y salud.

3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.

- CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE.
- NIT: 902.024.954-7
- CLASE RIESGOS: V

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

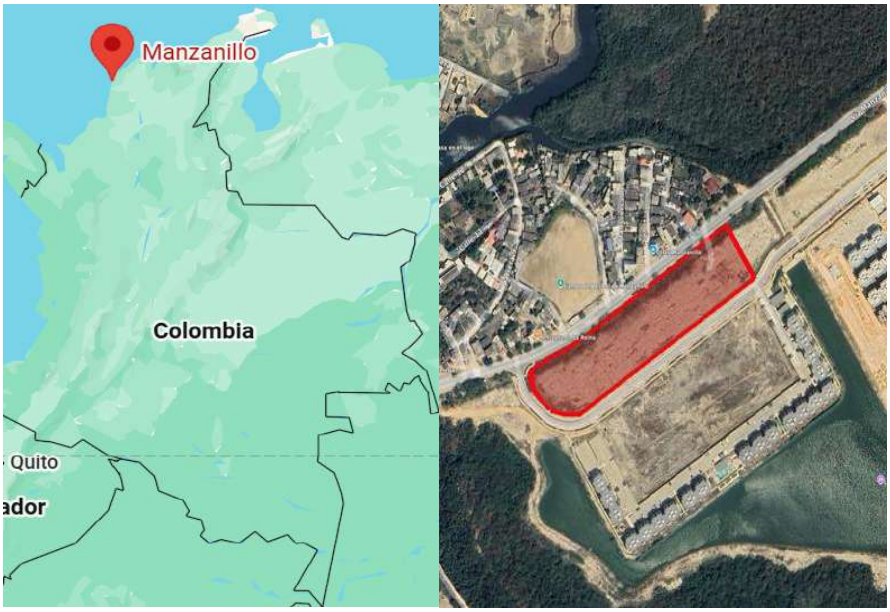


Ilustración 1. Localización del proyecto.

4. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019, se llevaron a cabo los siguientes controles en la CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

4.1. CONTROL DE PERSONAL.

Conforme a la programación y las necesidades operativas del proyecto, se realizó la vinculación del personal necesario para la ejecución de las actividades. En el Anexo 1, se detalla el listado del personal presente en obra y el soporte de su respectivo control de asistencia.

4.2. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP).

Como parte de los controles de intervención en el individuo, se realiza la entrega de dotación y EPP al personal que ingresa al proyecto. Asimismo, se gestiona la reposición de estos elementos según el desgaste y los peligros identificados en campo. Como medida de control, se supervisa de manera permanente el uso adecuado de los mismos y se mantiene el registro documental de cada entrega.



Ilustración 2. Entrega de EPP



Ilustración 3. Excavaciones de cimentaciones.

4.3. INSPECCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS

Durante el periodo reportado, se supervisaron las actividades de excavación para zapatas, verificando el cumplimiento estricto del procedimiento de trabajo seguro. Las inspecciones se centraron en la señalización del área perimetral. Se constató que el personal cuenta con los elementos de protección específicos y que se realizan los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) previo al inicio de cada jornada para mitigar riesgos de derrumbe o caídas a nivel.



Ilustración 4. Señalización perimetral de excavaciones.



Ilustración 5. Actividades dentro de la excavación.

4.4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (CHARLAS)

El programa de capacitación mensual tiene como objetivo fortalecer la cultura del autocuidado y fomentar un interés genuino del personal hacia la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas jornadas están orientadas a la prevención de accidentes mediante la identificación oportuna de peligros. Durante el presente periodo, los temas abordados como medida de control fueron:

4.4.1. USO OBLIGATORIO DE LOS EPP.

Como medida crítica de control en la fuente y el individuo, se mantiene la política de uso obligatorio de EPP durante toda la jornada laboral. Mediante inspecciones diarias de seguridad, se verifica que el personal porte los elementos básicos (casco, botas de seguridad y protección auditiva) y los específicos según la tarea (guantes de vaqueta, protección visual). El incumplimiento de esta norma conlleva a medidas correctivas inmediatas para garantizar la integridad física de los trabajadores.



Ilustración 6. Capacitación de uso obligatorio de EPP.

4.4.2. PAUSAS ACTIVAS.

Como estrategia para prevenir lesiones osteomusculares y mitigar la fatiga física y mental, se ejecutaron jornadas diarias de pausas activas en los diferentes frentes de obra. Estas sesiones, lideradas por el personal de HSEQ, consisten en ejercicios de estiramiento y movilidad articular adaptados a las tareas de carga y postura prolongada. La participación del personal ha sido constante, logrando una reducción en los reportes de molestias físicas al finalizar la jornada laboral.



Ilustración 7. Evidencia de pausas activas

4.4.3. CHARLAS.

Capacitar al personal, a través de charlas es promover el autocuidado y sobre todo estimular el interés de todo el personal frente a la seguridad y salud en el trabajo, encaminado a la prevención de accidente. Dentro de los temas abordados como control frente a la exposición fueron:

- Uso obligatorio de los EPP.
- Ejemplos de accidentes en obra.

4.4.4. SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL AREA

Como medida preventiva, se implementó la señalización con el propósito de identificar y advertir las áreas o situaciones de riesgo. Este sistema permite al personal reconocer y prestar atención a posibles peligros, prohibiciones, obligaciones o indicaciones necesarias para el desarrollo seguro de las labores en obra y en las instalaciones intervenidas. Así mismo, se refuerza la señalización existente mediante cintas y se instalan avisos con el fin de restringir el tránsito de personas en las zonas de intervención.
Se mantienen y se refuerzan algunas señalizaciones existentes:



Ilustración 8. Señales de Inicio de Obra.



Ilustración 9. Señal de Fin de Obra.



Ilustración 10. Señales Pare y Siga.



Ilustración 11. Señales de Uso de EPP en obra.



Ilustración 12. Señalización de excavaciones

4.4.5. PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

En obra se cuenta con un Botiquín de primeros auxilios con el fin de brindar una rápida asistencia a quien lo necesite, causado por un incidente en la obra.



Ilustración 13. Botiquín de primeros auxilios.

4.4.6. CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES.

Durante el periodo comprendido de la ejecución de las actividades no se reportan accidentes ni incidentes de trabajo que afecten la infraestructura de edificaciones y la integridad física y/o moral de los trabajadores involucrados en la realización de sus actividades diarias.

Adjunto indicadores:

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD (RESOLUCIÓN 0312 DE 2019) TOTALIZADO									
Indicadores de Accidentalidad según riesgo Prioritario									
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRÁNSITO		**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**	**Jul.**	**TOTAL**
1	# de Accidentes de Tránsito sin pérdida de tiempo	0	0						**0**
2	# de Accidentes de Tránsito con pérdida de tiempo	0	0						**0**
3	# de días de trabajo perdidos por accidente de tránsito	0	0						**0**
4	# de días de trabajo cargados por accidente de tránsito	0	0						**0**
5	Número de Incidentes de tránsito	0	0						**0**

6	Número de Fatalidades AT	0	0						0
7	**Frecuencia AL**	0	0						0
8	**Severidad AL**	0	0						0
10	**ILI (IFXIS) /100**	0	0						0
ACCIDENTES E INCIDENTES DE RIESGOS MECANICO		**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**	**Jul.**	**TOTAL**
11	# de Accidentes por riesgo Mecánico sin pérdida de tiempo	**0**							**0**
12	# de Accidentes por riesgo Mecánico con pérdida de tiempo	**0**							**0**
13	# de días de trabajo perdidos por accidente	**0**							**0**



	por riesgo Mecánico								
14	# de días de trabajo cargados por accidente por riesgo Mecánico	0							0
15	Número de Incidentes por riesgo Mecánico	0							0
16	Número de Fatalidades AT	0							0
17	**Frecuencia AL**	0							0
18	**Severidad AL**	0							0
19	ILI ((IF x IS) / 1000)	0							0
20	**Mortalidad AL**	0							0
ACCIDENTES E INCIDENTES DE RIESGOS MECANICO		**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**	**Jul.**	**TOTAL**



21	# de Accidentes por Riesgo Electrico sin perdida de tiempo	**0**							**0**
22	# de Accidentes por riesgo Eléctrico con pérdida de tiempo	**0**							**0**
23	# de días de trabajo perdidos por accidente por riesgo Eléctrico	**0**							**0**
24	# de días de trabajo cargados por accidente por riesgo Eléctrico	**0**							**0**
25	Número de Incidente s por riesgo Eléctrico	**0**							**0**
26	Número de Fatalidades AT	**0**							**0**
27	**Frecuencia AL**	**0**							**0**



28	Severidad AL	0							0
29	ILI ((IF x IS) / 1000)	0							0
30	Mortalidad AL	0							0

Se realizó seguimiento a los trabajadores, con respecto al estado de salud y evaluación de los factores de riesgo y se brinó orientación al personal de obra y se lleva a cabo el monitoreo continuo, garantizando el cumplimiento del sistema de gestión HSEQ.

4.4.7. MANEJO AMBIENTAL Y DE RESIDUOS.

El componente ambiental es un factor importante para prevenir, corregir y compensar aspectos e impactos ambientales. Teniendo presente la importancia del manejo ambiental y como parte del seguimiento a realizar a este componente, se realiza seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental entregado y verificando su cumplimiento, en cuanto a los siguientes aspectos:

4.4.7.1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.

En el seguimiento realizado en cuanto a las medidas de manejo de los residuos que se generan se depositan en los puntos de acopio ecológicos de las instalaciones del cliente que se están utilizando en la obra, tal como se evidencia a continuación.



Ilustración 14. Manejo de residuos.

4.4.7.2. MANEJO DE MATERIAL.


Los materiales pétreos juegan un papel importante en el sector de la construcción, ya que estos siempre se utilizan para la ejecución de las actividades propias de la obra, al generar un impacto ambiental significativo la explotación de dichos materiales y como parte de los controles a tener en parte ambiental para minimizar los impactos ambientales se hace la recolección, disposición y evacuación de los residuos.

5. CONCLUSIONES.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de enero y el 21 de febrero de 2026, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato No. 1375-2025 – Construcción del escenario recreo deportivo Manzanillo del Mar, evidenció un adecuado nivel de implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, en especial la Resolución 0312 de 2019.

Se verificó la aplicación de controles operativos orientados a la prevención de riesgos laborales, mediante inspecciones permanentes en campo, ejecución de análisis de trabajo seguro, control del uso de elementos de protección personal, señalización de áreas de riesgo y supervisión de procedimientos de trabajo, particularmente en actividades de excavación, de igual manera, se ejecutaron las charlas de seguridad y pausas activas contribuyeron al fortalecimiento del autocuidado y prevención de accidentes laborales, tal como se evidencia anteriormente.

En términos generales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto presenta cumplimiento satisfactorio, manteniendo controles efectivos para la prevención de accidentes, enfermedades laborales e impactos ambientales.



KATRI OROZCO CAMPO
Profesional en Salud Ocupacional.
1.052.734.059

6. ANEXOS.

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:
		Versión: 01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Ciénaga Bolívar	Manzanillo.	17	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	✓	
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cristian Martinez Arzan	1001869773	Supervisor	
2	Ivan Berto Soto	1041452268	Almacenista	
3	Katherine Gonzalez M.	1001898294	Trabajo social	Katherine G.
4	Esneider Torres Orozco	1051890129	topografo	
5	Yordin	1047456502	AY	
6	Jose Javier Alvis Orozco	1061340321	Inspector	
7	Rafael Espitia	7053958	Rafa	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:
		Versión: 01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena Bolivar	Manzanillo	13	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	✓	
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ALBEIRO BATISTA	92370 09	[illegible]	
2	[illegible] Blanco	73007190	[illegible]	
3	[illegible]	10218500	[illegible]	
4	Luis David Herrera	1002430436	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Francisco Luis Orozco	1122.058065	AY	Orozco
7	Jose A Barrios Matos	1193547355	AY	Jose Barrios
8	Juan Camilo Padilla Castro	1047493037	Ayudante	[illegible]
9	[illegible]	1047502141	AY	[illegible]
10	[illegible]	1143325926	Oficial	[illegible]
11	Aral. Asilar G.	1007319566	AY	Aral.
12	CARLOS Ulana	1143784875	AY	Carlos Ulana
13	Jairo Fuentes	1002313317	A. Topogr	[illegible]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Katri Orozco Campo	Firma:

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Enero 10/2026	
	Versión: 00	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena	dom.	11	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Uso obligatorio de los epp.
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	[illegible] CARLOS	1041993432	AY	
2	[illegible]	1233913[illegible]6	AY	
3	[illegible]	1002185[illegible]	O	
4	Francisco Luis Orozco	1128058065	AY	Francisco
5	[illegible]	1001904199	AY	
6	[illegible]	1047456502	AY	
7	[illegible]	7143072	oficial	
8	[illegible]	1044490391		
9	Juan Camilo Padilla Castillo	1047493037	Ayudante	
10	[illegible]	1047502141	AYU	
11	ALBEIRO BATISTA	9234004	AUX	
12	[illegible]	1029995878	AY	
13	[illegible]	1004390521	Oficial	
14	[illegible]	1143725926	oficial	
15	[illegible]	1001969993	Supervisor	
16	[illegible]	23155110	AU	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Katri Orozco Campo	Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Enero 10/2026
	Versión:	00
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Ygua	Don Manzanillo	16	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion		
Reinduccion		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitacion especifica al cargo		
Otra	✓	Pausas activas

No.	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Hernandez	1002185906	AUX	
2	Juan CARLOS Guardo	1041893432	Y	
3	Juan Camilo padilla	1047493089	Ayudante	
4	Williams cuentas	1233913446	AY	
5	Ronny Jurgens	1047502141	AUX	
6	Agues Fo. Peres	1092499378	AY	
7	ALBEINO BATISTA	92370094	AUX	
8	Francisco Alvis Orozco	1128058065	AY	
9	Yanet Bustamante	1.143 072	Ofi	
10	Yonis Jose Nieves	1001904199	AUX	
11	Juan Carlos Batista Alba	1047495391	AUX	
12	Cristian Martinez Azan	1001969993	Supervisor	
13	Katherine Gonzalez M.	1001898294	Trabajo social	
14	Blanco	73-007190	AY	
15	Cerron Rudese	7715J110	AU	
16	Yordin	10H456502	AU	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Katri Orozco Campo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE	CODIGO FT-SST-001	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena / Bolivar	Bgta (Manzanillo	19	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Orden y aseo
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jon Carlos Batista Ospina	1047490391	Jefe	
2	Jose H Munoz C	1143325926	oficial	
3	Guillermo Cuartas	1233913446	AX	
4	Ronny Quiroga	1047502141	A S	
5	Juan Camilo Padilla Castillo	1047493037	Ayudante	
6	ALBEIRO BATISTA	92374004	AUX	
7	Agustin Peres	1042995878	S	
8	Jesus Carlos	1041997472	AY	
9	Marlon B	7.143 072	Oficios	
10	Jorge Luis B	73003190	Oficios	
11	Cristian Martinez	1001969993	Supervisor	
12	Luis Tejedor	1042490402	HYO	
13	Luis David Herrera	1002143041436	AUX	
14	Cayon Jorge	73155110	AUX	
15	Jenser Correa	1047372666	OF.	
16	Jairo Fuentes	1002313317	A. Topografia	Jairo
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Katherine campo	Firma:

Powered by CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST

CODIGO FT-SST-

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA 12/02/2026

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Katherine Orozco Campo

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PANTALON DE TRABAJO	CAMISA DE TRABAJO	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	BARBUQUEJO	CASCO	TAPABOCAS	GUANTES	TAPACIDOS	BOTAS DE CAUCHO	FIRMA
1	Genzon Rubes		Ayudante		✓							✓		
2	Jorge Blanco		Ayudante		✓							✓		
3	Francisco Ayus		Ayudante		✓						✓			
4	Alberto Bautista		Ayudante		✓						✓			
5	Juan C Portilla		Ayudante		✓							✓		
6	Jorge Blanco		Ayudante											
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

OBSERVACIONES

RECIBE

FIRMA

Powered by CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CODIGO FT-SST

SG-SST

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA 11-02-2026

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Kata Orozco Campo

ENS.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PANTALON DE TRABAJO	CAMISA DE TRABAJO	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	BARBUQUEJO	CASCO	TAPABOCAS	GUANTES	TAPADIDOS	BOTAS DE CAUCHO	FIRMA
1	Luis Hernandez		oficial		✓		✓				✓	✓		
2	Genser correa		ayudante		✓		✓				✓			
3	Juan Carlos Quinto		ayudante		✓		✓				✓			
4	Cristian Martinez		oficial		✓		✓				✓			
5	Yordan tapias		Ayudante		✓		✓							
6	Augusto perez		Ayudante				✓				✓			
7	Andres Lopez		Ayudante				✓				✓			
8	Jeri Nieves		oficial											
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

OBSERVACIONES

FIRMA

RECIBE

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO FT-SST
	SG-SST	
	FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

FECHA 14/02/2026
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Luis Orozco · Campo

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PANTALON DE TRABAJO	CAMISA DE TRABAJO	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	BARBUQUEJO	CASCO	TAPABOCAS	GUANTES	TAPAOIDOS	BOTAS DE CAUCHO	FIRMA
1	William Matos		Ayudante		✓						✓	✓		
2	Manuel Bustamante		Ayudante		✓							✓		
3	Augusto Perez		Ayudante				✓							
4	William Matos		Ayudante								✓			
5	Juan C Batista		Ayudante								✓			
6	Augusto Perez		Ayudante		✓		✓				✓			
7	Moises Lopez		Ayudante		✓						✓			
8	Luis Alvis Orozco		Oficial								✓			
9	Francisco Alvis		Oficial								✓			
10	Juan Viveros		Oficial		✓						✓	✓		
11	Juan Cuello		Ayudante								✓			
12	Luis Hernandez		Oficial								✓			
13	Juan E Padilla		Ayudante								✓			
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

OBSERVACIONES _____

FIRMA _____

RECIBE

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CONCRETADORA	VERSIÓN:001
		ENERO :10/2026

SERIE MARCA ÁREA:

SEMANA DEL: 16 AL: 22 DEL MES: febrero DEL AÑO: 2026

NA: NO APLICA



ITEM	FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Estructura de soporte en buena condicion.				✓												✓					
Llantas				✓												✓					
Ejes				✓												✓					
Se encuentra en buen estado ?				✓												✓					
Mecanismo para vaciado				✓												✓					
Cluthc de giro del trompo				✓												✓					
Encendido del motor				✓												✓					
Control de fugas				✓												✓					
Valvulas				✓												✓					
Balineras y bujes de rotacion				✓												✓					
CONCRETADORA APTA PARA SU USO (SI ó NO)				Si												Si					
INSPECCIONADO POR (NOMBRE)				[signature]																	
SUPERVISADO POR (NOMBRE)				[signature]												[signature]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	**VERSIÓN:001**
		ENERO 10/2026



SIERRA No. **MARCA:** **MODELO:**
SERIE: **ÁREA:**
SEMANA DEL: 16 **AL:** 22 **DEL MES:** febrero **DEL AÑO:** 2026.

B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

HERRAMIENTA	FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			OBSERVACIONES
	B	M	VBR	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Se verificó el voltaje de la sierra Circular ?	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no esté picado, toma, conexiones con puesta a tierra)	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado del accesorio portadiscos	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado e instalación del disco de corte	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de la guarda de protección	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado e instalación del mango	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de los interruptores de contacto	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado del rodaje	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado del cuerpo de la sierra (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓						✓						
Las RPM del disco son mayores que las RPM del sierra?	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado general de la guía de corte	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de la plaqueta de identificación	✓			✓			✓			✓						✓						
Se utilizan adecuadamente los epp s para la labor?	✓			✓			✓			✓						✓						
SIERRA APTA PARA SU USO (SI ó NO)	Si			Si			Si			Si						Si						
INSPECCIONADO POR (NOMBRE)	Edgar Vega			Edgar Vega			Edgar Vega			Luis Tafur												
SUPERVISADO POR (NOMBRE)	Pinilla			Pinilla			Pinilla			Pinilla						Pinilla						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	GS-F-084	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	VERSIÓN:001
		FECHA:10/01/2026

TRONZADORA No. 72864 MARCA: Dewalt MODELO:
SERIE:
SEMANA DEL: 16 AL: 22 DEL MES: febrero DEL AÑO: 2026



HERRAMIENTA	FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			OBSERVACIONES
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Se verificó el voltaje de la tronzadora?	✓			✓									✓			✓						
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no esté picado, toma, conexiones con puesta a tierra)	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado del accesorio portadiscos	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado e instalación del disco de corte	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado de la guarda de protección	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado e instalación del mango	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado de los interruptores de contacto	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado del rodaje	✓			✓						✓			✓			✓						
Las RPM del disco son mayores que las RPM del sierra?	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado general de la guia de corte	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado de la plaqueta de identificación	✓			✓						✓			✓			✓						
Se utilizan adecuadamente los epp s para la labor?	✓			✓						✓			✓			✓						
TRONZADORA APTA PARA SU USO (SI ó NO)	Si									Si												
INSPECCIONADO POR (NOMBRE)																						
SUPERVISADO POR (NOMBRE)																						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN MANUEL VIVERO CASTRO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1143325926 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.09 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que WILLIAM MANUEL MATO OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1233913446 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.05 PM

Medellín, 23 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1051890129	TORRES OROZCO ESNEIDER	24/02/2026		25524717	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/02/2026 09:48:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.142.197, 192.230.104.5, 172.16.42.57

Medellín, 10 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que RICARDO LATORRE RICO identificado(a) con cédula de ciudadanía 79568891 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 11/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE N902016232

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411202

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 10/02/2026 4.22 PM

ARL

Medellin, 25 de febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con documento de identidad **C8850827**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con NIT **C8850827**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2021-10-29	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIOS	0000000001	1	0.522	EN COBERTURA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067290773	CAUSIL TORRES JOSE DAVID	10/02/2026		22247820	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:47:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143449674	PARRA MERCADO STEFANY	10/02/2026		21495518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:49:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 10 de febrero de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que JAIRO LUIS FUENTES VEGA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1002315317 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 02/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

RENTERIA FERIA FRANKLIN C73352251

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - TRABAJADORES INDEPENDIENTES

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C733522512604151305

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 10/02/2026 2.15 PM

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **FUENTES VEGA JAIRO LUIS** identificado(a) con **CC** número **1.002.315.317** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 14 de diciembre de 2021 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 10 de febrero de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
NIT 900.226.715 - 3

CERTIFICA:

El suscrito afliado relacionado a continuación se encuentra o ha estado registrado en la EPS, con los siguientes datos:

Tipo y No. de documento:	CC 1002315317
Nombres:	JAIRO LUIS FUENTES VEGA
Tipo de afiliado:	Cabeza de familia
Fecha de afiliación:	2024-12-01
Estado de afiliación:	Activo
Régimen:	Contributivo
Nivel Sisben:	1
Departamento - Municipio:	BOLIVAR CLEMENCIA

Tipo de Servicio	IPS
IPS Atención	E.S.E. HOSPITAL LOCAL ARJONA

OBSERVACIONES:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

La anterior certifcación se expide y firma el 2026 02-02 a solicitud del interesado y es válida hasta el 2026-03-01

CARLOS TORRES SALAZAR
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

VIGILADO Supersalud

Medellín, 16 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1081923154	DELGADO GIL CESAR ALFONSO	12/02/2026		31318991	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10473904372604759474

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/02/2026 16:31:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.99.113.146, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1049452268	BRITO SOTO IVAN DARIO	02/02/2026		22914815	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:16:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1052734059	OROZCO CAMPO KATRY DEL CARMEN	02/02/2026		xo211153	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:22:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1001898294	GONZALEZ MIRANDA KATHERINE	10/02/2026		20323622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 11:59:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 11 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1128058065	ALVIS OROZCO FRANCISCO	12/02/2026		22165125	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/02/2026 22:03:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.251.217, 192.230.104.1, 172.16.42.57

Medellín, 11 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143327432	PIMENTEL GARCIA SILFREDO	12/02/2026		i2491621	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/02/2026 22:42:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.251.217, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que YERIS JOSE NIEVES SARABIA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1001904199 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.12 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS GUARDO HERRERA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1041993432 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.15 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JORGE LUIS BLANCO MERCADO identificado(a) con cédula de ciudadanía 73007190 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.21 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que GERSON JOEL RUDAS CABALLERO identificado(a) con cédula de ciudadanía 73155110 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.27 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que CRISTIAN CAMILO MARTINEZ AZAN identificado(a) con cédula de ciudadanía 1001969993 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.30 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que YORDIN SEBASTIAN TAPIA BOHORQUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047456502 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.34 PM

Medellín, 11 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LUIS MANUEL HERNADEZ PEREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1002185800 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 12/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 11/02/2026 10.38 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que MANUEL JOSE BUSTAMANTE identificado(a) con cédula de ciudadanía 7143072 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 2.29 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que ALBEIRO BATISTA OTERO identificado(a) con cédula de ciudadanía 9237009 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.15 PM

Medellín, 18 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que RAFAEL ANTONIO ESPITIA ESTRADA identificado(a) con cédula de ciudadanía 70530958 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 19/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 18/02/2026 9.50 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JOSE JAVIER ALVIS OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1007390527 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 10.30 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que AUGUSTO JOSE PEREZ OLACUADA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1042995878 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.13 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JEAN CARLOS BATISTA CASSIANI identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047490391 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.18 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LUIS EDUARDO TEJEDOR VEGA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047490461 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES S.A.S.
N 9 0 1 8 8 3 9 9 6

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 10.36 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JENSER CORREA BERRIO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047372666 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.23 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN CAMILO PADILLA CANTILLO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047493037 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 12.02 PM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que RONNY JOSE JIMENEZ JIMENEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1047502141 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 11.57 AM

Medellín, 17 de february de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que MOISES DAVITH LOPEZ BUSTAMANTE identificado(a) con cédula de ciudadanía 1128061929 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 18/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORES SAS N902015574

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1829901 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS NCP, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TEXTUALES Y GRABACIONES CON ESTENOTIPO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y LA TRASCRIPCIÓN POSTERIOR DE LOS MATERIALES GRABADOS COMO REPORTES DE CORTE (JUDICIALES) O SERVICIOS DE GRABACIÓN DE ESTENOTIPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTENOGRAFÍA, SUBTITULACIÓN EN TIEMPO REAL (ES DECIR, SIMULTÁNEO) DE REUNIONES Y CONFERENCIAS POR TELEVISIÓN EN VIVO Y ACTIVIDADES DE SUBASTADORES INDEPENDIENTES; ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIDAD

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - CARTAGENA 5

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 17/02/2026 11.55 AM

SEGURIDAD SOCIAL

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902016232	4	CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAS DE LEZO MZ 41 LT 17 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3104358808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	52375605	9499498316	E	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$749,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0
1	CC	1007315418	CHICA DIANA	230301	4	$266,667	$42,700	EPS002	4	$266,667	$10,700	CCF08	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$266,667	$1,400	4	$0	$0
2	CC	1047396039	GUERRERO MARIA	230201	11	$1,320,000	$211,200	EPS002	11	$1,320,000	$52,800	CCF08	11	$1,320,000	$52,800	14-11	11	$1,320,000	$6,900	11	$0	$0
3	CC	1100402674	RAMIREZ LUISA	230301	11	$1,466,667	$234,700	EPS002	11	$1,466,667	$58,700	CCF08	11	$1,466,667	$58,700	14-11	11	$1,466,667	$7,700	11	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,053,334	$488,600			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$122,200			$3,053,334	$16,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902016232	4	CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAS DE LEZO MZ 41 LT 17 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3104358808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	52375605	9499498316	E	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$749,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$488,600	$400	$0	$489,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$277,400	$200	$0	$277,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$211,200	$200	$0	$211,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$16,000	$100	$0	$16,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$16,000	$100	$0	$16,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$122,200	$100	$0	$122,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$122,200	$100	$0	$122,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$122,200	$100	$0	$122,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$122,200	$100	$0	$122,300
TOTAL				**3**	**$749,000**	**$700**	**$0**	**$749,700**

ARL

Medellin, 25 de febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con documento de identidad **C8850827**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO** con NIT **C8850827**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2021-10-29	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIOS	0000000001	1	0.522	EN COBERTURA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143449674	PARRA MERCADO STEFANY	10/02/2026		21495518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:49:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067290773	CAUSIL TORRES JOSE DAVID	10/02/2026		22247820	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:47:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143449674	PARRA MERCADO STEFANY	10/02/2026		21495518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 08:49:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 19 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1143384875	VIANA GARCIA CARLOS ANDRES	20/02/2026		24921819	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/02/2026 21:26:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.61, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1047371916	VALENCIA GARRIDO VICTOR HUGO	02/02/2026		15115823	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:07:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 17 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1047444282	GARCIA LEAL NEY ALBERTO	18/02/2026		m230iB13	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/02/2026 13:54:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.99.113.146, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 16 de Febrero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1081923154	DELGADO GIL CESAR ALFONSO	12/02/2026		31318991	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10473904372604759474

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/02/2026 16:31:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.99.113.146, 192.230.104.14, 172.16.42.57

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1049452268	BRITO SOTO IVAN DARIO	02/02/2026		22914815	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:16:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 29 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1052734059	OROZCO CAMPO KATRY DEL CARMEN	02/02/2026		xo211153	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2026 09:22:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.132.171, 192.230.104.3, 172.16.42.57

Medellín, 09 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOLIVAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1001898294	GONZALEZ MIRANDA KATHERINE	10/02/2026		20323622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/02/2026 11:59:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.170.151.172, 192.230.104.2, 172.16.42.57

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Enero 10/2026	
	Versión: 00	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena	dom.	11	02	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Uso obligatorio de los epp.
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	[illegible] CARLOS	1041993432	AY	
2	[illegible]	1233913[illegible]6	AY	
3	[illegible]	1002185[illegible]	O	
4	Francisco Luis Orozco	1128058065	AY	Francisco
5	[illegible]	1001904199	AY	
6	[illegible]	1047456502	AY	
7	[illegible]	7143072	oficial	
8	[illegible]	1044490391		
9	Juan Camilo Padilla Castillo	1047493037	Ayudante	
10	[illegible]	1047502141	AYU	
11	ALBEIRO BATISTA	9234004	AUX	
12	[illegible]	1029995878	AY	
13	[illegible]	1004390521	Oficial	
14	[illegible]	1143725926	oficial	
15	[illegible]	1001969993	Supervisor	
16	[illegible]	23155110	AU	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Katri Orozco Campo	Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Enero 10/2026
	Versión:	00
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Ygua	Don Manzanillo	16	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion		
Reinduccion		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitacion especifica al cargo		
Otra	✓	Pausas activas

No.	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Hernandez	1002185906	AUX	
2	Juan CARLOS Guardo	1041893432	Y	
3	Juan Camilo padilla	1047493089	Ayudante	
4	Williams cuentas	1233913446	AY	
5	Ronny Jurgens	1047502141	AUX	
6	Agues Fo. Peres	1092499378	AY	
7	ALBEINO BATISTA	92370094	AUX	
8	Francisco Alvis Orozco	1128058065	AY	
9	Yanet Bustamante	1.143 072	Ofi	
10	Yonis Jose Nieves	1001904199	AUX	
11	Juan Carlos Batista Alba	1047495391	AUX	
12	Cristian Martinez Azan	1001969993	Supervisor	
13	Katherine Gonzalez M.	1001898294	Trabajo social	
14	Blanco	73-007190	AY	
15	Cerron Rudese	7715J110	AU	
16	Yordin	10H456502	AU	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Katri Orozco Campo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE	CODIGO FT-SST-001	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena / Bolivar	Bgta (Manzanillo	19	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Orden y aseo
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jon Carlos Batista Ospina	1047490391	Jefe	
2	Jose H Munoz C	1143325926	oficial	
3	Guillermo Cuartas	1233913446	AX	
4	Ronny Quiroga	1047502141	A S	
5	Juan Camilo Padilla Castillo	1047493037	Ayudante	
6	ALBEIRO BATISTA	92374004	AUX	
7	Agustin Peres	1042995878	S	
8	Jesus Carlos	1041997472	AY	
9	Marlon B	7.143 072	Oficios	
10	Jorge Luis B	73003190	Oficios	
11	Cristian Martinez	1001969993	Supervisor	
12	Luis Tejedor	1042490402	HYO	
13	Luis David Herrera	1002143041436	AUX	
14	Cayon Jorge	73155110	AUX	
15	Jenser Correa	1047372666	OF.	
16	Jairo Fuentes	1002313317	A. Topografia	Jairo
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Katherine campo	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	CODIGO FT-SST-001
SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Enero 10/2026
	Versión: 00
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena	Dom Manzanillo	16	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion		
Reinduccion		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitacion especifica al cargo		
Otra	✓	Pausas activas

N	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Hernandez	1002185906	AUX	
2	JUAN CARLOS Guardo	1041893432	Y	
3	Juan Camilo padilla	1047493037	Ayudante	
4	William cuentas	1233913446	AV	
5	Ronny Jimenez	1047802141	AUX	
6	Agustin Peñes	1026499378	AV	
7	ALBEIRO BATISTA	92370009	N N	
8	Francisco Alvis Orozco	1128058065	AY	
9	Marvez Bustamante	Y. 143 072	Ofi	
10	Yony Jose Nieves	1001904199	AUX	
11	Juan Carlos Batista Alvarez	1047443391	AUX	
12	Cristian Martinez Azan	1001969993	Supervisor	
13	Katherine Gonzalez M.	1001898294	Trabajo social	
14	Jader BLANCO	73-007190	A/	
15	Cesar Rudas e.	77155110	AU	
16	Yordin	1047456502	AU	
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Katri Orozco campo	

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CONCRETADORA	VERSIÓN:001
		ENERO :10/2026

SERIE MARCA ÁREA:

SEMANA DEL: 16 AL: 22 DEL MES: febrero DEL AÑO: 2026

NA: NO APLICA



ITEM	FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Estructura de soporte en buena condicion.				✓												✓					
Llantas				✓												✓					
Ejes				✓												✓					
Se encuentra en buen estado ?				✓												✓					
Mecanismo para vaciado				✓												✓					
Cluthc de giro del trompo				✓												✓					
Encendido del motor				✓												✓					
Control de fugas				✓												✓					
Valvulas				✓												✓					
Balineras y bujes de rotacion				✓												✓					
CONCRETADORA APTA PARA SU USO (SI ó NO)				Si												Si					
INSPECCIONADO POR (NOMBRE)				[signature]																	
SUPERVISADO POR (NOMBRE)				[signature]												[signature]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	**VERSIÓN:001**
		ENERO 10/2026



SIERRA No. **MARCA:** **MODELO:**
SERIE: **ÁREA:**
SEMANA DEL: 16 **AL:** 22 **DEL MES:** febrero **DEL AÑO:** 2026.

B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

HERRAMIENTA	FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			OBSERVACIONES
	B	M	VBR	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Se verificó el voltaje de la sierra Circular ?	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no esté picado, toma, conexiones con puesta a tierra)	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado del accesorio portadiscos	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado e instalación del disco de corte	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de la guarda de protección	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado e instalación del mango	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de los interruptores de contacto	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado del rodaje	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado del cuerpo de la sierra (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓						✓						
Las RPM del disco son mayores que las RPM del sierra?	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado general de la guía de corte	✓			✓			✓			✓						✓						
Estado de la plaqueta de identificación	✓			✓			✓			✓						✓						
Se utilizan adecuadamente los epp s para la labor?	✓			✓			✓			✓						✓						
SIERRA APTA PARA SU USO (SI ó NO)	Si			Si			Si			Si						Si						
INSPECCIONADO POR (NOMBRE)	Edgar Vega			Edgar Vega			Edgar Vega			Luis Tafur												
SUPERVISADO POR (NOMBRE)	Pinilla			Pinilla			Pinilla			Pinilla						Pinilla						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	GS-F-084	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	VERSIÓN:001
		FECHA:10/01/2026

TRONZADORA No. 72864 MARCA: Dewalt MODELO:
SERIE:
SEMANA DEL: 16 AL: 22 DEL MES: febrero DEL AÑO: 2026



HERRAMIENTA	FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			FECHA			OBSERVACIONES
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Se verificó el voltaje de la tronzadora?	✓			✓									✓			✓						
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no esté picado, toma, conexiones con puesta a tierra)	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado del accesorio portadiscos	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado e instalación del disco de corte	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado de la guarda de protección	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado e instalación del mango	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado de los interruptores de contacto	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado del rodaje	✓			✓						✓			✓			✓						
Las RPM del disco son mayores que las RPM del sierra?	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado general de la guia de corte	✓			✓						✓			✓			✓						
Estado de la plaqueta de identificación	✓			✓						✓			✓			✓						
Se utilizan adecuadamente los epp s para la labor?	✓			✓						✓			✓			✓						
TRONZADORA APTA PARA SU USO (SI ó NO)	Si									Si												
INSPECCIONADO POR (NOMBRE)																						
SUPERVISADO POR (NOMBRE)																						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST

CODIGO FT-SST-

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA 12/02/2026

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Katherine Orozco Campo

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PANTALON DE TRABAJO	CAMISA DE TRABAJO	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	BARBUQUEJO	CASCO	TAPABOCAS	GUANTES	TAPACIDOS	BOTAS DE CAUCHO	FIRMA
1	Genzon Rubes		Ayudante		✓							✓		
2	Jorge Blanco		Ayudante		✓							✓		
3	Francisco Ayus		Ayudante		✓						✓			
4	Alberto Bautista		Ayudante		✓						✓			
5	Juan C Portilla		Ayudante		✓							✓		
6	Jorge Blanco		Ayudante											
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

OBSERVACIONES

RECIBE

FIRMA

Powered by CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CODIGO FT-SST

SG-SST

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA 11-02-2026

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Kata Orozco Campo

ENS.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PANTALON DE TRABAJO	CAMISA DE TRABAJO	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	BARBUQUEJO	CASCO	TAPABOCAS	GUANTES	TAPADIDOS	BOTAS DE CAUCHO	FIRMA
1	Luis Hernandez		oficial		✓		✓				✓	✓		
2	Genser correa		ayudante		✓		✓				✓			
3	Juan Carlos Quinto		ayudante		✓		✓				✓			
4	Cristian Martinez		oficial		✓		✓				✓			
5	Yordan tapias		Ayudante		✓		✓							
6	Augusto perez		Ayudante				✓				✓			
7	Andres Lopez		Ayudante				✓				✓			
8	Jeri Nieves		oficial											
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

OBSERVACIONES

FIRMA

RECIBE

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO FT-SST
	SG-SST	
	FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

FECHA 14/02/2026
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Luis Orozco · Campo

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PANTALON DE TRABAJO	CAMISA DE TRABAJO	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	BARBUQUEJO	CASCO	TAPABOCAS	GUANTES	TAPAOIDOS	BOTAS DE CAUCHO	FIRMA
1	William Matos		Ayudante		✓						✓	✓		
2	Manuel Bustamante		Ayudante		✓							✓		
3	Augusto Perez		Ayudante				✓							
4	William Matos		Ayudante								✓			
5	Juan C Batista		Ayudante								✓			
6	Augusto Perez		Ayudante		✓		✓				✓			
7	Moises Lopez		Ayudante		✓						✓			
8	Luis Alvis Orozco		Oficial								✓			
9	Francisco Alvis		Oficial								✓			
10	Juan Viveros		Oficial		✓						✓	✓		
11	Juan Cuello		Ayudante								✓			
12	Luis Hernandez		Oficial								✓			
13	Juan E Padilla		Ayudante								✓			
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

OBSERVACIONES _____

FIRMA _____

RECIBE

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:
		Versión: 01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Ciénaga Bolívar	Manzanillo.	17	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	✓	
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cristian Martinez Arzan	1001869773	Supervisor	
2	Ivan Berto Soto	1041452268	Almacenista	
3	Katherine Gonzalez M.	1001898294	Trabajo social	Katherine G.
4	Esneider Torres Orozco	1051890129	topografo	
5	Yordin	1047456502	AY	
6	Jose Javier Alvis Orozco	1061340321	Inspector	
7	Rafael Espitia	7053958	Rafa	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE		CODIGO FT-SST-001
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:
		Versión: 01
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
C/gena Bolivar	Manzanillo	13	02	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	✓	
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ALBEIRO BATISTA	92370 09	[illegible]	
2	[illegible] Blanco	73007190	[illegible]	
3	[illegible]	10218500	[illegible]	
4	Luis David Herrera	1002430436	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Francisco Luis Orozco	1122.058065	AY	Orozco
7	Jose A Barrios Matos	1193547355	AY	Jose Barrios
8	Juan Camilo Padilla Castro	1047493037	Ayudante	[illegible]
9	[illegible]	1047502141	AY	[illegible]
10	[illegible]	1143325926	Oficial	[illegible]
11	Aral. Asilar G.	1007319566	AY	Aral.
12	CARLOS Ulana	1143784875	AY	Carlos Ulana
13	Jairo Fuentes	1002313317	A. Topogr	[illegible]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Katri Orozco Campo	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	CODIGO FT-SST-064	
	SG-SST	
	FORMATO DE INSPECCION GENERAL	Fecha: Enero 10/2026
		Version 001
		Pagina 1 de 1

Fecha de realización de la inspección	24/02/2026
Lugar de la inspección:	Manzanillo
Área de trabajo a inspeccionar:	

* SI: CUMPLE TOTALMENTE NO: NO CUMPLE PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en los pasillos, escaleras o áreas comunes (cada cosa en su lugar)?			X		
Se observa organización y aseo en los baños?	X				
Se observa limpieza de equipos/implementos?	X				
Se cuenta con un punto de acopio ?	X				
Se realiza la recoleccion, separacion y disposicion final de acuerdo al codigo de colores ?	X				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.)	X				
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras.?				X	
Las vias de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)?				X	
Se observan pasillos libres de obstáculos?	X				
Techos Presentan Humedad, Deterioro, Grietas?				X	
CONDICIONES DE CARGA FÍSICA					
La posición del monitor es adecuada en las áreas inspeccionadas?				X	
La altura del monitor es igual a la de los ojos?				X	
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio?				X	
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?				X	
La distribución de los puestos de trabajo es adecuada?				X	
Se observa postura adecuada al momento de la inspección?				X	
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?				X	

Powered by CamScanner

CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial?				Y	
Existe buena ventilación / aireación?				Y	
Existe confort auditivo?				Y	
Existe confort térmico?				Y	
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)?		Y			
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?	Y				
Las tomas e interruptores están en buen estado?	Y				
Existe línea o polo a tierra?				Y	
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?				Y	
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?			Y		
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?		Y			
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?			Y		
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	Y				
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?	Y				
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?				Y	
Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?				Y	
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?				Y	
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?				Y	
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?				Y	
SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)				Y	
Se cuenta con buen suministro de energía				Y	
Se cuenta con buen suministro de agua				Y	
Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de líquido)				Y	
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?				Y	
Las zonas dispuestas para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene?				Y	

Powered by CamScanner

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?		Y			
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?		Y			
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	Y				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
En el caso, de manejar productos químicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.	Y				
De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros)	Y				
El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP?	Y				

Powered by CamScanner

ENTORNO AMBIENTAL					
Se cuenta con bombillos ahorradores en las diferentes áreas de trabajo?				X	
Se observa en los puntos de suministro de agua (cisternas y llaves) uso o dispositivos de bajo consumo?				X	
Uso de recipientes debidamente señalizados para el desecho de residuos, según aplique (reciclables, ordinarios, etc.)?	✓				
Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable?				X	
Se realiza mantenimiento al sistema de aire acondicionado?				X	
Se hace separación de residuos de acuerdo a sus caracteristicas orgánicos, papel, peligrosos)?	X				
Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel?				X	
CONDICIONES VEHÍCULOS					
Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehículos?		X			
Los vehículos se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo (limpias)?	X				
Los vehículos cuentan con su respectivo botiquín y extintor para emergencias?	X				
Los vehículos cuentan con la respectiva revisión técnico mecánica vigente?	X				
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehículos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN LA MATRIZ DE RCP Y SOCIALIZARSE CON EL COPASST PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Katherine Orozco Campo.	**FIRMA:**
CARGO: Residente SST.	
NOMBRE:	**FIRMA:**
CARGO:	
NOMBRE:	**FIRMA:**
CARGO:	

Powered by CamScanner

	SG-SST FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CÓDIGO: FT-SST 30 VERSIÓN: 001 ENERO: 10/2026

UBICACIÓN	AREA/PISO	
	SEDE	Manzanillo

ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ANTISEPTICOS				
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	1	07/11/27		
SOLUCIÓN YODADA	1	07/11/27		
EQUIPOS				
FONENDOSCOPIO	0			
TENSIÓMETRO	0			
TERMÓMETRO	1			
MATERIAL DE CURACIÓN				
ALGODÓN	0			
APLICADORES	8			
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	8			
BAJALENGUAS	20			
CURAS	0			
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	1	09/09/2030		
GASAS ESTÉRILES				
GASAS LIMPIAS PAQUETE	4			
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	1	2028-05		
JERINGAS	0			
MICROPORE ROLLO	0			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2	2027/05		
TAPABOCAS				
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1	18/11/2029		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	1	18/11/2029		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1	18/11/2029		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	0			
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	0			
OCLUSOR OCULAR ADULTO	0			
MEDICAMENTOS				
SULFADIAZINA DE PLATA	Frasco			
INSUMOS ADICIONALES				
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)				
GAFAS PROTECTORAS				
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS				
SABANAS DESECHABLES				
TIJERAS DE TRAUMA				
VASOS DESECHABLES				
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS				
CAMILLA DE ATENCIÓN	0			
CAMILLA RIGIDA	1			
COLLAR CERVICAL ADULTO	0			
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP	0			
INMOVILIZADORES DE CUELLO	0			
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	0			
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	0			
LINTERNA	0			
PILAS DE REPUESTO	0			
PLANOS	0			
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA	1			

RESPONSABLE		FECHA DE INSPECCION	MES	DIA	AÑO
			24	2	26
		FIRMA:			

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 01

Seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Ambiental y plan de manejo de tránsito.



CONTRATO DE OBRA N° 1375 - 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CARTAGENA - BOLIVAR

PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

ENERO – FEBRERO DE 2026

Dirección: Cra 5 #33-15 Edificio Colseguros, Oficina 501 Barrio el centro – Tel: 3187769570
Email: consorcioperseverardeportivo@gmail.com NIT. No. 902.024.954-7

INTRODUCCIÓN

En el presente informe, contiene las actividades en el periodo del 22 de enero al 22 de febrero del año 2026; para el cumplimiento de los compromisos legales contractuales de **CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA** en la verificación de la implementación del plan de manejo ambiental y el plan de manejo de transito dentro de la ejecución del **CONTRATO N° 1389 - 2025** cuyo objeto es: **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.**

El contratista realizará la interventoría a las labores de construcción de escenarios deportivos y espacios públicos en el distrito de **Cartagena de indias.**

- **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)**

1. GESTION DOCUMENTAL

1.1 Cumplimiento de Permisos Ambientales.

El Contratista entregó a tiempo los permisos ambientales para desarrollar las actividades del proyecto construcción de escenario recreo deportivo manzanillo del mar.

Nota: El contratista Anexa registros en las respectivas carpetas adjuntas del envió de este informe.

2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el presente periodo enero – febrero ingresaron diferentes materiales e insumos donde se realizaron registro de demarcación de área y almacenamientos de materiales de construcción.

2.1 Registros de Inspecciones Ambientales.

Durante este periodo la interventoría realizó inspecciones de área haciendo seguimiento a los impactos ambientales con el objeto verificar el cumplimiento en lo que refiere al Plan de gestión Integral de obras del contratista de acuerdo con lo establecido en el PMA.

Tipo de inspección: Inspección General de obra.

Responsable: Ingeniera ambiental.

Hallazgos: diariamente se realizada la inspección general en obra se observa que los trabajadores implementan la previa revisión de las herramientas de trabajo, seguimiento a la parte locativa, se implementa el orden y aseo en los diferentes frentes de trabajos.

2.2 Proceso de uso de concreto en obra.

Durante este periodo no se realizaron fundidas utilizando concreto de proveedores cemento ultracen, igualmente se realiza concreto en obra con la ayuda de una mezcladora manual, cumpliendo con los requisitos establecidos para la correcta fabricación de concreto en obra.



1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Durante este periodo en el proyecto se generaron residuos sólidos y fueron entregado a la entidad recolectora PACARIBE, Cabe resaltar que la unidad deportiva campestre cuenta con su punto ecológico.



4.KIT DE DERRAMES

Durante este periodo el contratista no utilizó el kit ante emergencia de derrame que se encuentra en la obra



5. MANEJO DE RCD

Durante este periodo el contratista realizó disposición final de residuos de construcción al botadero autorizado (BIOGER). Se establecen en puntos específicos de acopio para ser evacuados a su disposición.

Nota: El contratista envía pin generador, pin trasportador, resolución del botadero además se encuentra a la espera de la expedición del certificado del botadero para soportarlo a la interventoría.

6. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.

6.1 Registro fotográfico de recolección de residuos peligros y especiales en obra.

En este periodo no se recibió residuos peligrosos o especiales en obra.

6.2 Licencia Ambiental de Recolector de residuos peligrosos.

En este periodo no se recibió residuos peligrosos o especiales en obra.

7. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

7.1 Registro de estado de encerramiento permanente.

El Contratista INNOVACION Y DEPORTE realizó demarcación preventiva con un cerramiento en laminas super board, parales metálicos y además señaléticas en el área a intervenir:









8. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL



Registro fotográfico de las vallas Publicitaria en los parques a intervenir.

9. ORDEN Y ASEO

10. 1 Frentes de Trabajo

Durante este periodo el Contratista realizó las Jornadas de Trabajo actividades de aseo en los frentes de trabajo.

10. TALA Y PODA DE ARBOLES

En el presente periodo el contratista no realizo podas, realiza descapote de terreno y remoción en las zonas a intervenir.

Nota: el contratista adjunta en su carpeta la solicitud y registro fotográfico del presente.

	 
Remoción y limpieza de canal	**baterías de baño (damas y caballeros)**
	
Jornadas de aseo con bobcat	**Jornadas de orden**
	
Evacuación de material	**Campete personal operativo**

MICHAEL ACEVEDO MARTINEZ
SST CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA
INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO INFORME No. 1
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com



CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR, DISTRITO DE CARTAGENA.

Descripción breve

El siguiente documento, mostrara los avances correspondientes, a la situación ambiental, de la obra teniendo en cuenta el periodo de realización de la obra considerando el impacto de las acciones a través del proceso.

Consorcio Innovación y Deportes
Email: innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"

CONTRATO No. 1375 – 2025

INFORME DE EJECUCIÓN No. 1

DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2026.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

NIT. 901974960-3

FEBRERO, 2025

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

Pag

TABLA DE CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 6
2. BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 8
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 10
3.1. Datos generales del contrato 10
3.2. Ubicación e información de la zona del proyecto 10
3.2.1. Limites 11
3.2.2. División Político – Administrativa 11
3.2.3. Categorización Del Municipio 12
3.2.4. Demografía 12
3.3. Componentes del proyecto 13
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 14
4.1. Avance físico 14
5. OBJETIVOS DEL PMA 16
5.1. Objetivo General 16
5.2. Objetivos Específicos 16
6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 18
7. Plan de Intervención 20
7.1. Pautas que se tuvieron en cuenta 20
7.2. Evidencias 21
7.2.1. Control diario de maquinaria y equipos 21
7.2.2. Control diario del personal de obra 21
7.2.3. Control del estado del tiempo 21
7.2.4. Información financiera del contrato de obra 22
7.2.5. Informe de inversión y buen manejo del anticipo 22
7.2.6. Control de aportes a seguridad social y parafiscales 22
7.2.7. Bitácora de obra 22
7.2.8. Registro fotográfico y audiovisual 22
7.3. Evidencias fotográficas 22

7.4. Metas de desempeño 0
7.4.1. Metas Ambientales y Técnicas 0
7.4.2. Metas Sociales y Deportivas 1
7.4.3. Metas Socioeconómicas 1
7.4.4. Metas de Gestión, Seguimiento y Cumplimiento 2
8. SEGURIDAD INDUSTRIAL 3
8.1. Importancia de la Seguridad en el Proyecto 3
8.2. Estrategias Implementadas 4
8.3. Cultura de Seguridad 5
8.4. Resultados y Compromiso Futuro 5
9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 6
9.1. Manejo, transporte y disposición de residuos 6
9.2. Control de material particulado y emisiones 7
9.3. Manejo y disposición de escombros 8
9.4. Registro fotográfico de medidas ambientales adoptadas 8
9.5. Actas y registros internos de control ambiental 9
9.6. Seguimiento y verificación en campo 10
9.7. Evaluación preliminar de desempeño ambiental 10
9.8. Consideraciones para las siguientes fases 11
10. RECOMENDACIONES 12
11. CONCLUSIÓN 14
12. ANEXO 0
12.1. aNEXO 1. Matriz de identificación de aspectos, valoración y determinación de impactos ambientales del PROYECTO CENTRO RECREO DEPORTIVOMANZANILLO DEL MAR 0
12.2. aNEXO 2. 0
Formatos de monitoreo y control 0
12.3. ANEXO 3, Certificado Cantera ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Lista de Figuras

Pag

Figura 1. Ubicación Geográfica del municipio de Cartagena de Indias. 11
Figura 2. División del territorio por unidades comuneras.....12
Figura 3. Matriz poblacional. 13
Figura 4- Levantamiento topográfico y nivel del terreno. 0
Figura 5. Movimiento de suelos. 1
Figura 6. Compactación de suelos. 2
Figura 7. Movimiento de RCD y suelos no aprovechables. 3

Lista de Tablas

Pag

Tabla 1. Datos generales del proyecto..... 10
Tabla 2. Formato de contratación 14
Tabla 3. Formato 1 de Capacitación. 0

1. INTRODUCCIÓN

En el corregimiento de Manzanillo del Mar, en el Distrito de Cartagena de Indias, se desarrolla el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA", correspondiente al Contrato No. 1375-2025.** Esta iniciativa no se limita únicamente a la ejecución de una obra civil, sino que se concibe como una apuesta por el fortalecimiento del espacio público y por el mejoramiento real de la calidad de vida de la comunidad. El proyecto, liderado por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER, busca dotar al sector de un escenario adecuado, seguro y funcional para la práctica del deporte y la recreación, promoviendo la integración social y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

La ejecución está a cargo del CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE, con un valor contractual de **$10.927.307.883 M/CTE** y un plazo de seis (06) meses, comprendido entre el 22 de enero de 2026 y el 22 de julio de 2026. El contrato cuenta con la supervisión del IDER y la interventoría del CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA. Su alcance incluye tanto la construcción del escenario como la implementación de acciones que garanticen su sostenibilidad ambiental y su adecuada articulación con la dinámica social del corregimiento.

El área de intervención se encuentra en una zona costera que presenta condiciones ambientales particulares, como alta salinidad, elevados niveles de humedad y exposición constante al ambiente marino. Estas características influyen directamente en la selección de materiales, en los procesos constructivos y en la durabilidad de la infraestructura. Por esta razón, resulta fundamental la implementación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permita prevenir y controlar los posibles impactos derivados de la obra, asegurando que su desarrollo se realice de manera responsable y acorde con las condiciones del entorno.

El Plan de Manejo Ambiental contempla medidas concretas para el manejo adecuado de residuos sólidos, el control de emisiones de polvo y ruido, la protección del suelo y de los recursos hídricos, así como el uso eficiente de materiales y recursos. Así mismo, se prioriza la selección de insumos resistentes a ambientes de alta salinidad y la adopción de buenas prácticas constructivas que minimicen afectaciones a la comunidad durante la fase de ejecución.

De manera complementaria, el proyecto incluye la dotación de equipos deportivos, entendida como un elemento clave para garantizar que la infraestructura cumpla su propósito social. Esta dotación permitirá que niños, jóvenes y adultos cuenten con

implementos apropiados para la práctica deportiva, fortaleciendo la apropiación del espacio, la convivencia y los hábitos de vida saludable.

Este documento establece el marco técnico y ambiental que orienta la ejecución del proyecto, integrando los componentes constructivos, ambientales y sociales necesarios para que la Construcción del Escenario Recreo Deportivo Manzanillo del Mar se desarrolle de forma organizada, responsable y coherente con la realidad del territorio, aportando al desarrollo sostenible del Distrito de Cartagena y al bienestar de su comunidad.

2. BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

El corregimiento de Manzanillo del Mar, ubicado en la zona norte del Distrito de Cartagena de Indias, enfrenta la necesidad de fortalecer sus espacios públicos y de contar con infraestructura adecuada para la recreación y el deporte. En un territorio con crecimiento poblacional y dinámica turística en expansión, la ausencia de escenarios deportivos formales limita las oportunidades de integración comunitaria, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de hábitos de vida saludable. En este contexto, el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"** se justifica como una intervención estratégica que responde a una demanda social concreta y a la necesidad de consolidar espacios seguros, funcionales y sostenibles.

Durante la etapa de ejecución, el proyecto generará empleo temporal para mano de obra local, dinamizando la economía del corregimiento a través de actividades asociadas a la construcción, suministro de materiales y servicios complementarios. No obstante, su impacto va más allá del periodo constructivo: a mediano y largo plazo, el escenario recreo-deportivo contribuirá a fortalecer el tejido social, brindando un espacio digno para el encuentro comunitario, la formación deportiva y la realización de actividades culturales y recreativas que promuevan la cohesión social.

Adicionalmente, la localización costera de Manzanillo del Mar exige intervenciones planificadas bajo criterios técnicos y ambientales rigurosos. Las condiciones de alta salinidad, humedad y exposición al ambiente marino hacen indispensable una infraestructura diseñada con materiales adecuados y acompañada de un Plan de Manejo Ambiental que garantice la sostenibilidad del proyecto. De esta manera, la obra no solo atiende una necesidad social, sino que también incorpora medidas responsables frente al entorno natural, protegiendo el suelo, optimizando el uso de recursos y minimizando impactos durante su ejecución.

El proyecto también fortalece la articulación entre la administración distrital, la comunidad y los actores locales, promoviendo un modelo de gestión participativa que fomenta la apropiación y el cuidado del espacio público. La dotación de equipos deportivos complementa la infraestructura física, asegurando que el escenario no sea un espacio subutilizado, sino un punto activo de formación, recreación y convivencia.

En términos sociales, la construcción del escenario recreo-deportivo representa una mejora directa en la calidad de vida de los habitantes de Manzanillo del Mar. Proporciona un entorno seguro para niños y jóvenes, reduce factores de riesgo asociados al ocio

improductivo y promueve estilos de vida saludables. Al mismo tiempo, ofrece a la comunidad un espacio digno que fortalece su identidad y sentido de pertenencia.

En consecuencia, esta iniciativa se consolida como una inversión social y ambientalmente responsable, alineada con los principios de sostenibilidad, inclusión y eficiencia en la gestión pública. Más que una obra de infraestructura, constituye una apuesta por el desarrollo integral del corregimiento, contribuyendo al bienestar comunitario y al fortalecimiento del espacio público en el Distrito de Cartagena.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Los siguientes datos corresponden a la formulación de la propuesta y datos que se encuentran dentro del decreto del marco regulatorio indicándose en la siguiente tabla:

3.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	1375-2025
Objeto del Contrato	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.**
Supervisor	KAREN KATHERINE VELÁSQUEZ ROJANO ASESORA DE INFRAESTRUCTURA IDER
Interventor	**CONSORCIO PERSERVAR DEPORTIVO CARTAGENA** NIT No. 902.024.954-7 **ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA** C.C. No. 72.157.731
Contratista	**CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE** NIT No. 902.016.232-4 **ANDREA CATALINA PLAZA SANCHEZ** C.C. No. 1.047.390.437
Valor del Contrato	DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($10.927.307.883) M/CTE
Plazo del Contrato	**SEIS (06) MESES**
Fecha de Inicio	**VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026**
Fecha de Terminación	**VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026**

Tabla 1. Datos generales del proyecto.

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.

3.2. UBICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

Cartagena está ubicada al norte de Colombia, a 10°25'N 75°32'W. Está orientada hacia el mar Caribe al oeste. Al sur se encuentra la Bahía de Cartagena, que tiene dos entradas:

Bocachica (Boca Pequeña) al sur y Boca grande (Boca Grande) al norte. Su línea costera es caracterizada morfológicamente por playas disipativas. La bahía de Cartagena es un estuario con una superficie aproximada de 84 km2.



Figura 1. Ubicación Geográfica del municipio de Cartagena de Indias.

Fuente: instituto geográfico Agustín Codazzi 2001.

3.2.1. LIMITES

Cartagena se encuentra al norte del departamento de Bolívar, a orillas del Mar Caribe, y limita al oriente con los municipios de Santa Catalina y Turbaco, al sur con Arjona, y al norte y occidente con el Mar Caribe.

3.2.2. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA

El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una extensión total de 623 km2. En su conformación político-administrativa se encuentra dividida en tres Localidades de acuerdo con la Ley 768 de 2002 y el Acuerdo 006 de 2003, ellas son: Localidad Histórica y del Caribe Norte, Localidad de la Virgen y Turística y la Localidad Industrial y de la Bahía. La de mayor extensión es la Localidad de la Virgen y Turística (371 Km2), seguida de la localidad Histórica y del Caribe Norte (162 Km2) y la Industrial y de la Bahía (89 Km2) Ver Imagen 2. Las Localidades se dividen en Unidades Comuneras de Gobierno (UCG)

urbanas y rurales, las cuales agrupan a los distintos barrios de la ciudad (183). Hay quince UCG urbanas y quince UCG rurales.

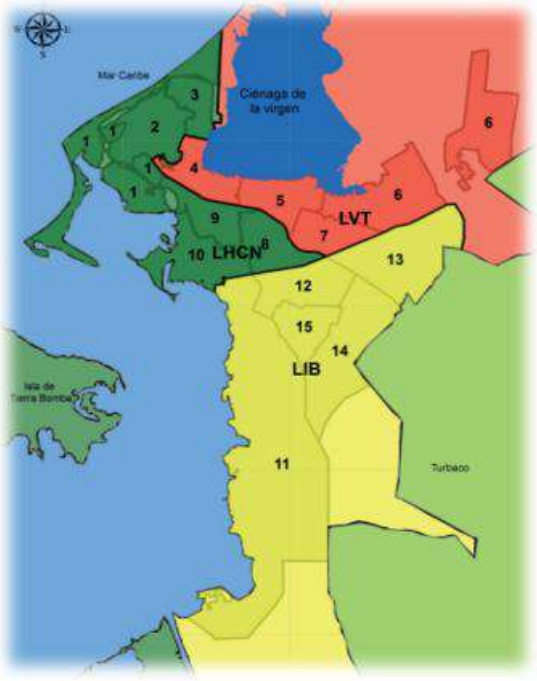


Figura 2. División del territorio por unidades comuneras.

Fuente: Tomado de diagnóstico base para formular líneas base del plan de desarrollo 2020-2023.

3.2.3. CATEGORIZACIÓN DEL MUNICIPIO

CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL siendo la capital del departamento de Bolívar y contando con una población estimada de 1.052.015 habitantes con un gasto público de 271.341.668 correspondiente al 29,00% del gasto presupuestal departamental se categoriza como municipio clase cero.

3.2.4. DEMOGRAFÍA

Uno de los aspectos más importantes al momento de plasmar información asociada a un territorio es la edad de la población ya que surgen múltiples políticas, programas y

destinaciones de presupuestos, es por ello que a continuación se muestran datos ensenados por el Dane en ese aspecto, sabiendo que estos se obtienen de la ponderación de métodos de triangulación, en conjunto con la suma de procesos.

INFORMACIÓNPARATODOS

Características de la población
Indicadores demográficos CNPV 2018 y CG 2005

INDICADORES DEMOGRÁFICOS	Colombia		Bolívar		Cartagena	
	CNPV 2018	CG 2005	CNPV 2018	CG 2005	CNPV 2018	CG 2005
Porcentaje de hombres	48,8%	49,0%	49,6%	50,0%	48,1%	47,9%
Porcentaje de mujeres	51,2%	51,0%	50,4%	50,0%	51,9%	52,1%
Relación de masculinidad	95,5	96,2	98,5	99,9	92,6	92,1
Índice demográfico de deperdencia (60+)	55,9	65,9	62,8	70,6	56,4	59,4
Índice demográfico de envejecimiento (60+)	58,7	29,2	43,4	24,4	48,5	26,5
Índice demográfico de deperdencia (65+)	46,5	61,4	56,9	64,0	50,4	53,7
Índice demográfico de envejecimiento (65+)	40,4	20,5	29,9	17,4	32,7	18,6
Índice de Friz (IF)	115,7	153,6	142.0	174,5	122,5	146,5
Descripción IF	Población madura	Población madura	Población madura	Población joven	Población madura	Población madura
Relación niños mujer	25,6	36,8	32,6	43,3	28,8	33,8
Población entre 0 y 14 años (%)	22,6%	30,7%	26,9%	33,3%	24,3%	29,5%
Población entre 15 y 59 años (%)	64,1%	60,3%	61,4%	58,6%	63,9%	62,7%
Población mayor de 59 años (%)	13,3%	9,0%	11,7%	8,1%	11,8%	7,8%
Población entre 15 y 64 años (%)	68,3%	63,0%	65,0%	61,0%	67,8%	65,1%
Población mayor de 64 años (%)	9,1%	6,3%	8,1%	5,8%	7,9%	5,5%
Personas por hogar (promedio)	3,1	3,9	3,5	4,5	3,4	4,3

Fuente: DANE – CNPV 2018 – CG 2005

Figura 3. Matriz poblacional.

Fuente: Dane Cartagena 2023.

3.3. COMPONENTES DEL PROYECTO

Las consideraciones del proyecto son representadas en valores y cantidades para el desarrollo de cada proceso o actividad planeada y ejecutada. El proyecto presenta sus componentes básicos, constituido en el siguiente presupuesto. **(Anexar Presupuesto)**

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

A continuación, se describen las actividades contempladas en el proyecto que se han desarrollado durante el período descrito en este informe.

CONCEPTO	DETALLE
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. No.
Contrato No.	1375-2025
Valor	$10.927.307.883 DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
Fecha de inicio	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026

Tabla 2. Formato de contratación

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.

4.1. AVANCE FÍSICO

En el marco de la primera etapa del "**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO EN MANZANILLO DEL MAR**", el avance físico se concentró en la adecuación inicial del terreno, desarrollando actividades fundamentales para garantizar la viabilidad técnica de las fases posteriores. Estas labores comprendieron la limpieza general del área intervenida, retiro de material vegetal, residuos y elementos que obstaculizaban la ejecución de la obra, permitiendo contar con una superficie despejada y apta para intervención.

Posteriormente, se ejecutaron trabajos de descapote, consistentes en la remoción de la capa vegetal superficial y material orgánico no apto para cimentación. Esta actividad fue determinante para asegurar condiciones adecuadas de soporte del suelo, evitando futuros asentamientos o fallas estructurales. El material retirado fue manejado conforme a criterios técnicos y ambientales, manteniendo orden y control en el área de trabajo.

Una vez finalizadas las actividades de limpieza y retiro de material inadecuado, se procedió con la modelación y aplanamiento del terreno, ajustando niveles de acuerdo con la topografía previamente levantada. Estas acciones permitieron conformar una superficie regular, con pendientes controladas para facilitar el drenaje natural y prevenir acumulaciones de agua, condición especialmente relevante en el contexto costero de Manzanillo del Mar.

El proceso incluyó cortes y rellenos controlados, así como compactación mecánica del terreno, con el fin de mejorar la capacidad portante del suelo y garantizar estabilidad para la ejecución de las estructuras proyectadas. Este avance físico representa un hito importante dentro del cronograma, ya que establece la base técnica sobre la cual se desarrollarán las siguientes etapas constructivas

5. OBJETIVOS DEL PMA

5.1. OBJETIVO GENERAL

- Garantizar de manera integral los impactos ambientales, sociales y comunitarios derivados de la construcción del escenario recreo deportivo de Manzanillo del Mar, garantizando la sostenibilidad de las obras, la adecuada interacción con el entorno costero, la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, promoviendo a su vez el bienestar, la salud y la apropiación social del espacio por parte de la comunidad.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y evaluar, mediante un diagnóstico ambiental inicial, los impactos potenciales generados por las actividades de alistamiento de la obra, movimientos de tierra, construcción de infraestructura recreo deportiva, instalación de redes, dotación de equipamiento y adecuación de áreas de circulación, sobre los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos del área de influencia del proyecto.

- Establecer programas y medidas ambientales orientados a la prevención, mitigación, control y corrección de impactos asociados a la generación de residuos de construcción y demolición, emisiones de material particulado, niveles de ruido, alteración del suelo y afectaciones temporales al entorno comunitario durante la ejecución de las obras.

- Definir lineamientos técnicos específicos para la ejecución de obras en un entorno con alta salinidad y humedad relativa, priorizando el uso de materiales, recubrimientos y prácticas constructivas que reduzcan procesos de corrosión, deterioro prematuro y riesgos ambientales asociados.

- Implementar criterios de uso eficiente de recursos, especialmente agua, energía, materiales de construcción y maquinaria, con el fin de minimizar la huella ambiental del proyecto y promover prácticas sostenibles durante la fase constructiva.

- Establecer medidas de manejo y protección del componente biótico, incluyendo la conservación de la cobertura vegetal existente y la adecuada implementación de zonas verdes y paisajismo, favoreciendo la adaptación de especies al entorno costero y la funcionalidad ambiental del escenario.

- Diseñar e implementar estrategias de gestión social y comunitaria, orientadas a la comunicación permanente con la comunidad de Manzanillo del Mar, la prevención de conflictos, la generación de empleo temporal y la apropiación social del escenario recreo deportivo como espacio de integración y convivencia.

- Integrar acciones orientadas a la promoción de la salud y el bienestar, reconociendo el escenario deportivo como un instrumento para fomentar la actividad física, reducir el sedentarismo y mejorar las condiciones de recreación y esparcimiento de la población local.

- Establecer medidas de prevención de riesgos ambientales y laborales, garantizando condiciones seguras para los trabajadores, usuarios y comunidad aledaña durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

- Definir un sistema de seguimiento y control, mediante indicadores ambientales y sociales, que permita evaluar la efectividad de las medidas implementadas, realizar ajustes oportunos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del PMA.

- Proponer lineamientos básicos de operación y mantenimiento ambiental, orientados a la conservación de la infraestructura deportiva, las áreas verdes y el equipamiento instalado, asegurando la sostenibilidad de los beneficios ambientales y sociales del proyecto en el mediano y largo plazo.

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA" se justifica por la necesidad real de mejorar las condiciones del espacio público en el corregimiento y de ofrecer a la comunidad un lugar adecuado para la recreación y la práctica deportiva. Manzanillo del Mar es un territorio que ha venido creciendo, tanto en población como en actividad turística, sin que este desarrollo haya estado acompañado de infraestructura suficiente que responda a las necesidades sociales y deportivas de sus habitantes.

Desde el punto de vista ambiental, el corregimiento se encuentra en una zona marino-costera con condiciones particulares como alta salinidad, humedad permanente, fuerte radiación solar y suelos con susceptibilidad a procesos de erosión y drenaje deficiente. Estas características exigen intervenciones bien planificadas y técnicamente controladas, que permitan preparar y adecuar el terreno de manera adecuada, reducir riesgos de degradación del suelo y garantizar que las obras se integren de forma responsable al entorno. El proyecto incorpora estos criterios, buscando que la intervención no genere impactos negativos y, por el contrario, contribuya al ordenamiento y estabilidad del área intervenida.

En el componente social, la construcción del escenario recreo deportivo responde a una necesidad sentida de la comunidad, especialmente de niños, jóvenes y adultos que actualmente no cuentan con espacios formales y seguros para la práctica deportiva. La falta de este tipo de escenarios ha favorecido el uso informal del espacio público y ha limitado las posibilidades de integración comunitaria. Contar con un espacio adecuado permite promover hábitos de vida saludable, fortalecer la convivencia y ofrecer alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre.

El componente deportivo no solo se entiende como una actividad recreativa, sino como una herramienta de transformación social. La práctica deportiva organizada fomenta valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, al tiempo que contribuye a la prevención de problemáticas sociales asociadas al sedentarismo y al ocio no estructurado. En este sentido, el proyecto se convierte en un apoyo directo al bienestar físico y social de la población del corregimiento.

Desde el ámbito socioeconómico, la ejecución de la obra genera empleo temporal para la mano de obra local y dinamiza la economía del sector mediante la contratación de servicios y la compra de materiales. A futuro, el escenario recreo deportivo se proyecta como un espacio que puede albergar actividades deportivas y comunitarias, fortaleciendo

el sentido de pertenencia y aportando a la identidad local sin alterar el equilibrio ambiental del territorio.

En términos de ordenamiento urbano, el proyecto contribuye a organizar y delimitar el uso del suelo, recuperando un área que hoy presenta condiciones de deterioro y falta de funcionalidad. Esta intervención mejora la seguridad, facilita la apropiación comunitaria del espacio y fortalece la gestión del espacio público como un bien colectivo.

En conjunto, el proyecto se concibe como una intervención necesaria y pertinente para Manzanillo del Mar, no solo por la infraestructura que se construye, sino por los beneficios ambientales, sociales y comunitarios que genera. Se trata de una inversión orientada a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer el tejido social y promover un desarrollo más ordenado y sostenible del corregimiento.

7. PLAN DE INTERVENCIÓN

7.1. PAUTAS QUE SE TUVIERON EN CUENTA

En la planificación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA", se adoptó un enfoque integral orientado a garantizar que la intervención se desarrollara bajo criterios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y adecuada planificación técnica. Para ello, se definieron las siguientes directrices:

- Diagnóstico ambiental y del terreno: Se realizó una revisión inicial de las condiciones físicas del área de intervención, identificando características del suelo, niveles, cobertura vegetal existente y posibles factores de riesgo asociados a la condición marino costera del sector. Este análisis permitió anticipar impactos derivados de las actividades de adecuación del terreno y establecer medidas preventivas antes del inicio de la construcción.

- Socialización y articulación comunitaria: Se promovieron espacios de información y diálogo con la comunidad del corregimiento, con el propósito de dar a conocer el alcance del proyecto, resolver inquietudes y fortalecer la apropiación del escenario recreo-deportivo. Esta articulación busca que el espacio responda a necesidades reales y sea valorado como un bien colectivo.

- Prácticas constructivas responsables: Durante la fase de preparación y ejecución de obra, se establecieron lineamientos para el uso racional de materiales, control de emisiones de polvo, manejo adecuado de residuos y optimización del uso de maquinaria, reduciendo impactos sobre el entorno inmediato.

- Manejo y protección del suelo: Considerando las condiciones propias del terreno en Manzanillo del Mar, se priorizó el control técnico del descapote, nivelación y delimitación del área intervenida, con el fin de evitar procesos de erosión, afectaciones por escorrentía y deterioro innecesario de zonas no contempladas dentro del proyecto.

- Seguridad y salud en el trabajo: Se implementaron medidas de señalización, delimitación de zonas de trabajo y protocolos de seguridad industrial para proteger al personal vinculado al proyecto y a la comunidad cercana, minimizando riesgos durante la etapa constructiva.

- Seguimiento y control técnico-ambiental: Se establecieron mecanismos de supervisión y registro que permiten verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas, la correcta disposición de materiales retirados y el control de las condiciones del terreno antes del inicio de las fases estructurales.

Estas directrices permiten que el proyecto avance de manera organizada y responsable, asegurando que cada etapa —desde la adecuación inicial del terreno hasta la construcción del escenario deportivo— se ejecute con criterios técnicos claros, respeto por el entorno y compromiso con la comunidad de Manzanillo del Mar.

7.2. EVIDENCIAS

La ejecución del proyecto quedó respaldada por evidencias metodológicas y técnicas que garantizan la transparencia y trazabilidad de los procesos:

7.2.1. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se documentó el uso de maquinaria pesada y liviana, registrando horas de operación, consumo de combustible y estado técnico, asegurando un uso eficiente y controlado para evitar emisiones innecesarias.

7.2.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevó registro del número de trabajadores activos por día, roles desempeñados y medidas de bioseguridad aplicadas, garantizando tanto el avance programado como la protección de la fuerza laboral.

7.2.3. CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima de Cartagena, caracterizado por altas temperaturas y lluvias intermitentes, fue monitoreado diariamente para prevenir retrasos en obras civiles y ajustar actividades de siembra y paisajismo.

7.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se realizaron reportes periódicos de ejecución presupuestal, reflejando la distribución de recursos en materiales, mano de obra, transporte y medidas ambientales.

7.2.5. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

El anticipo entregado se destinó a la adquisición de insumos iniciales, contratación de personal y adecuaciones preliminares, lo que permitió iniciar el proyecto sin contratiempos y asegurar el cumplimiento de plazos.

7.2.6. CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se garantizó el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, promoviendo condiciones justas y seguras para los trabajadores contratados durante la obra.

7.2.7. BITÁCORA DE OBRA

Se elaboró una bitácora diaria que recopiló los avances, dificultades, decisiones técnicas, hallazgos patrimoniales y medidas correctivas adoptadas, sirviendo como soporte documental de la gestión integral del proyecto.

7.2.8. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL

Cada etapa de la intervención fue documentada con material fotográfico y audiovisual que evidencia el estado inicial de la obra, los avances de obra y la entrega final de los espacios renovados.

7.3. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

En el siguiente listado se adjuntan las evidencias fotográficas de las actividades realizadas en la propuesta



Figura 4- Levantamiento topográfico y nivel del terreno.

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.



Figura 5. Movimiento de suelos.

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.



Figura 6. Compactación de suelos.

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.









Figura 7. Movimiento de RCD y suelos no aprovechables.

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.

7.4. METAS DE DESEMPEÑO

La ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA" se orienta a generar resultados concretos y verificables, acordes con la escala real de la intervención y con las condiciones ambientales y sociales del corregimiento. Las metas planteadas se ajustan a la naturaleza del proyecto —construcción de infraestructura deportiva en zona marino-costera— y se constituyen en indicadores clave para el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del desempeño técnico y social de la obra.

A través de la adecuación del terreno y la construcción del escenario recreo-deportivo en Manzanillo del Mar, se establecen las siguientes metas:

7.4.1. METAS AMBIENTALES Y TÉCNICAS

- Garantizar el 100% de control en el proceso de descapote y nivelación, evitando afectaciones a áreas no contempladas dentro del proyecto y previniendo procesos de erosión superficial.

- Implementar medidas de manejo de escorrentía que permitan reducir en un 70% la posibilidad de encharcamientos en el área intervenida, mediante conformación adecuada de pendientes y drenajes básicos.

- Disponer correctamente el 100% de los residuos vegetales y material removido, asegurando su traslado a sitios autorizados o su aprovechamiento cuando sea técnicamente viable.

- Incorporar especies vegetales adaptadas a condiciones de alta salinidad y radiación solar, garantizando una tasa de supervivencia mínima del 75% durante el primer año, mediante mantenimiento básico y seguimiento.

- Utilizar materiales y elementos constructivos resistentes a ambientes costeros, asegurando condiciones de durabilidad que minimicen intervenciones correctivas prematuras.

7.4.2. METAS SOCIALES Y DEPORTIVAS

- Lograr que el escenario recreo deportivo entre en funcionamiento con 100% de operatividad en sus espacios proyectados, garantizando condiciones de seguridad y accesibilidad básica.

- Promover la participación de al menos 300 beneficiarios directos (niños, jóvenes y adultos del corregimiento) en actividades deportivas y recreativas durante el primer año de operación.

- Fomentar la apropiación comunitaria mediante la conformación de al menos un comité local de acompañamiento o veeduría, que apoye el cuidado y buen uso del espacio.

- Desarrollar jornadas de socialización y sensibilización en las que al menos el 80% de los asistentes adquieran conocimientos básicos sobre el cuidado del escenario y el uso adecuado del espacio público.

7.4.3. METAS SOCIOECONÓMICAS

- Vincular mano de obra local en al menos el 30% de los empleos generados durante la etapa constructiva, priorizando personal del corregimiento o sectores cercanos.

- Generar empleo temporal directo durante la ejecución del proyecto, dinamizando la economía local mediante la contratación de servicios, transporte y suministro de materiales en el Distrito.

- Fortalecer el potencial del escenario como punto de encuentro comunitario, promoviendo la realización de al menos cuatro actividades deportivas o recreativas organizadas en el primer año posterior a su entrega.

7.4.4. METAS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

- Implementar un sistema básico de seguimiento ambiental que permita registrar el manejo de residuos, control del suelo y cumplimiento de medidas preventivas durante la obra.

- Mantener actualizada la bitácora técnica y el registro fotográfico del 100% de las etapas ejecutadas, garantizando trazabilidad y transparencia.

- Cumplir en un 100% con la normativa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo vigente, asegurando que la intervención se desarrolle dentro del marco legal aplicable.

8. SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA", la seguridad industrial y la gestión del riesgo se establecen como componentes fundamentales durante la ejecución de las obras, considerando que las actividades se desarrollan en un entorno comunitario y en una zona con condiciones ambientales particulares propias del sector marino costero.

La intervención no solo implica movimientos de tierra y posteriores actividades constructivas, sino que se realiza en un espacio cercano a viviendas y zonas de circulación local, donde interactúan residentes, trabajadores y población del corregimiento. Por esta razón, la seguridad no se limita al cumplimiento formal de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que se orienta a prevenir incidentes, controlar riesgos operativos y garantizar que cada actividad se ejecute sin afectar la integridad del personal vinculado al proyecto ni de la comunidad aledaña.

Adicionalmente, las condiciones del terreno, la humedad y la exposición a factores climáticos como altas temperaturas y lluvias ocasionales exigen una planificación preventiva que reduzca riesgos asociados a deslizamientos superficiales, inestabilidad temporal del suelo o accidentes derivados del uso de maquinaria. En este sentido, la gestión del riesgo forma parte integral del proceso constructivo, asegurando que la obra avance de manera organizada, controlada y segura.

De esta manera, la seguridad industrial en el proyecto no se concibe únicamente como una obligación normativa, sino como una responsabilidad técnica y social que busca proteger la vida, preservar las condiciones del entorno y garantizar que la construcción del escenario recreo-deportivo se desarrolle bajo estándares adecuados de prevención y control.

8.1. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN EL PROYECTO

- Desde el punto de vista humano, el incumplimiento de medidas de seguridad podría derivar en accidentes graves como caídas, golpes por maquinaria pesada, cortes por herramientas o lesiones por manipulación de materiales de construcción. Esto tendría consecuencias directas en la salud física y emocional de los trabajadores y en la percepción de seguridad de la ciudadanía.

- Desde la perspectiva ambiental, un mal manejo de residuos, combustibles o químicos utilizados en obra podría generar contaminación del suelo, del aire o de

cuerpos de agua cercanos, afectando la biodiversidad urbana y el bienestar de las comunidades.

8.2. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

Conscientes de estos riesgos, el proyecto implementó un conjunto de medidas preventivas y correctivas, entre las que destacan:

- Capacitación constante del personal en el uso de equipos de protección personal (EPP), manejo seguro de maquinaria, manipulación de materiales y protocolos de respuesta ante emergencias

- Dotación de EPP adecuados (casco, guantes, botas, gafas y protección auditiva) para todos los trabajadores en campo.

- Señalización y cerramiento perimetral de las áreas de obra, con el fin de prevenir el ingreso de peatones y turistas a zonas de riesgo.

- Planes de manejo de maquinaria pesada y liviana, regulando horarios de operación para minimizar el ruido y el impacto en la movilidad de los sectores intervenidos.

- Gestión integral de residuos y materiales peligrosos, asegurando su recolección, clasificación y disposición en sitios autorizados, evitando derrames o contaminación accidental.

- Planes de emergencia y primeros auxilios, con brigadas internas de seguridad entrenadas y coordinación con organismos de socorro locales (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil).

- Monitoreo ambiental y ocupacional permanente, con registros en bitácora de obra sobre ruido, emisiones, calidad del aire y condiciones de seguridad laboral.

8.3. CULTURA DE SEGURIDAD

Más allá de la aplicación de normas, el proyecto promovió una cultura de seguridad que fomenta la participación activa de los trabajadores en la identificación de riesgos, la propuesta de mejoras y el cumplimiento de protocolos. Asimismo, se establecieron canales de comunicación directa con las comunidades aledañas, permitiendo que residentes y visitantes estuvieran informados de los avances y restricciones, reduciendo la posibilidad de accidentes por desconocimiento.

8.4. RESULTADOS Y COMPROMISO FUTURO

Hasta la fecha, gracias a este enfoque proactivo, no se han registrado incidentes graves en los espacios intervenidos. La implementación rigurosa de medidas de seguridad ha permitido:

- Proteger la vida y salud de más de 100 trabajadores vinculados en diferentes fases del proyecto.
- Evitar afectaciones ambientales en áreas verdes y zonas de arborización.
- Mantener la continuidad del cronograma sin retrasos significativos asociados a emergencias laborales.

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

La implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el marco del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA" – Contrato No. 1375-2025** se ha desarrollado de manera sistemática, articulada con el avance físico de la obra y en coherencia con las condiciones ambientales propias del entorno marino-costero donde se ejecuta la intervención.

El seguimiento ambiental continúa realizándose mediante verificación directa en campo, inspecciones periódicas, control operativo diario y registro en bitácora de obra. De manera complementaria, la documentación que soporta la implementación del PMA se incorpora mensualmente dentro del informe de obra, garantizando trazabilidad, transparencia y control técnico sobre cada actividad desarrollada.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2026 y el 15 de febrero de 2026, la implementación del PMA se concentró principalmente en el manejo ambiental asociado a la adecuación inicial del terreno, que incluyó actividades de limpieza general, descapote, modelación, cortes y rellenos controlados, compactación mecánica y retiro de residuos de construcción y demolición (RCD). A continuación, se detallan los componentes implementados:

9.1. REGISTRO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Durante la fase inicial de obra se generaron residuos vegetales, material orgánico producto del descapote, suelos no aprovechables y residuos de construcción asociados a actividades preliminares. Las medidas adoptadas incluyeron:

- Clasificación primaria en sitio entre material vegetal, suelo removido y RCD.
- Acopio temporal organizado dentro del área delimitada de intervención.
- Transporte mediante vehículos autorizados hacia sitios de disposición final aprobados.
- Registro de volúmenes retirados y control de manifiestos de disposición.

- El 100% del material vegetal y suelos no reutilizables fue retirado del área de intervención, evitando acumulaciones que pudieran generar procesos de descomposición, malos olores, proliferación de vectores o afectaciones al paisaje.

- En el caso de los RCD, se garantizó su manejo conforme a criterios técnicos, evitando disposición inadecuada en zonas aledañas o afectación del suelo natural.

Estas acciones permitieron mantener el área de trabajo organizada, minimizar riesgos ambientales y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en materia de residuos de construcción.

9.2. EVIDENCIAS DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO Y EMISIONES

Considerando que las actividades de movimiento de tierra, modelación y compactación generan emisión de material particulado, especialmente en condiciones de alta temperatura y viento característicos de la zona costera de Manzanillo del Mar, se implementaron medidas preventivas orientadas al control de polvo y emisiones. Entre las acciones adoptadas se destacan:

- Humectación controlada del terreno en momentos de mayor generación de polvo.

- Control de velocidad de maquinaria dentro del frente de obra.

- Mantenimiento preventivo de equipos para reducir emisiones contaminantes.

- Delimitación del área intervenida para evitar dispersión de material hacia zonas externas.

- El control del material particulado resultó fundamental para proteger la salud de los trabajadores, reducir molestias a la comunidad cercana y prevenir deposición de polvo sobre áreas no intervenidas.

Adicionalmente, el monitoreo visual permanente permitió identificar oportunamente cualquier condición que requiriera refuerzo de las medidas de control.

9.3. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Los escombros generados durante las actividades preliminares fueron manejados bajo criterios de segregación y almacenamiento temporal organizado. Las acciones implementadas incluyeron:

- Identificación del tipo de material.
- Acopio en zonas delimitadas y señalizadas.
- Retiro periódico para evitar acumulación.
- Registro en bitácora de volúmenes y destino final.
- Se evitó la mezcla de escombros con material orgánico o residuos ordinarios, garantizando un manejo diferenciado y técnicamente adecuado.

La correcta disposición de escombros permitió mantener condiciones de seguridad en obra, prevenir obstrucciones en zonas de tránsito y evitar alteraciones en la topografía previamente modelada.

9.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDIDAS AMBIENTALES ADOPTADAS

Cada una de las actividades relacionadas con el manejo ambiental fue documentada mediante registro fotográfico y audiovisual, el cual forma parte integral de las evidencias del presente informe que incluye:

- Estado inicial del terreno antes de intervención.
- Proceso de limpieza y descapote.
- Movimiento de suelos.
- Compactación mecánica.
- Retiro y transporte de material vegetal y RCD.
- Delimitación del área de obra.

Este soporte constituye evidencia verificable de la aplicación de las medidas contempladas en el PMA y permite realizar seguimiento comparativo del antes, durante y después de la intervención.

9.5. ACTAS Y REGISTROS INTERNOS RELACIONADOS CON CONTROLES AMBIENTALES IMPLEMENTADOS

Con el fin de garantizar trazabilidad y control técnico, se mantuvieron actualizados los siguientes instrumentos documentales:

- Bitácora diaria de obra.
- Registros de control de maquinaria y equipos.
- Control de personal vinculado.
- Registro del estado del tiempo.
- Formatos internos de seguimiento ambiental.

- Actas de supervisión e interventoría cuando aplica.

Estos registros permiten evaluar la efectividad de las medidas implementadas, realizar ajustes oportunos y demostrar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

9.6. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN CAMPO

El seguimiento ambiental se ejecutó mediante inspecciones periódicas realizadas por el componente ambiental del proyecto, verificando:

- Que el descapote no afectara áreas externas a la delimitación.
- Que no se presentaran procesos erosivos derivados de cortes o rellenos.
- Que los drenajes naturales no fueran obstruidos.
- Que la compactación del suelo se realizara bajo criterios técnicos adecuados.
- Que no existieran vertimientos ni derrames de combustibles.

Hasta la fecha del presente informe, no se han identificado impactos ambientales significativos derivados de las actividades ejecutadas. Las medidas preventivas han permitido controlar los riesgos asociados al movimiento de tierra y mantener condiciones ambientales estables en el área de intervención.

9.7. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

En coherencia con las metas establecidas en el PMA:

- Se logró el control del 100% del material vegetal removido.
- No se registraron afectaciones a zonas externas al polígono de intervención.
- No se presentaron quejas formales por generación excesiva de polvo o manejo inadecuado de residuos.
- Se mantuvo actualizado el sistema de registro documental ambiental.

Estos resultados evidencian que la implementación del PMA durante la fase inicial del proyecto ha sido técnicamente adecuada y coherente con las condiciones ambientales de Manzanillo del Mar.

9.8. CONSIDERACIONES PARA LAS SIGUIENTES FASES

Para las siguientes etapas constructivas (cimentación, estructuras, redes e instalación de equipamiento), será necesario reforzar:

- Control de ruido por actividades de mayor intensidad.
- Manejo de residuos derivados de formaleta, acero y concreto.
- Control de vertimientos accidentales.
- Protección de áreas verdes y zonas paisajísticas proyectadas.

El componente ambiental continuará articulado con el cronograma físico de obra, garantizando que cada nueva actividad constructiva cuente con su respectiva medida preventiva y control técnico.

10. RECOMENDACIONES

A continuación, se plantean recomendaciones ajustadas a este tipo de proyecto:

- Establecer un plan de mantenimiento preventivo estructural y funcional, que incluya revisión periódica de graderías, cubiertas, cerramientos, superficies deportivas y sistemas eléctricos, considerando el efecto de la salinidad, la humedad y la radiación solar sobre los materiales.

- Implementar un programa de protección contra la corrosión, aplicando tratamientos y revisiones técnicas frecuentes en estructuras metálicas, luminarias y elementos expuestos al ambiente marino para prolongar su vida útil.

- Definir un esquema claro de administración y operación del escenario, asignando responsables del cuidado, control de uso, programación de actividades y manejo de recursos, evitando el deterioro por uso inadecuado o falta de supervisión.

- Promover la apropiación comunitaria del espacio, vinculando a líderes locales, instituciones educativas y organizaciones del corregimiento en actividades deportivas, culturales y recreativas que mantengan activo el escenario y fortalezcan el sentido de pertenencia.

- Regular el uso del equipamiento mediante normas internas, estableciendo horarios, aforos y lineamientos de conservación para prevenir daños en las instalaciones y conflictos entre usuarios.

- Garantizar el mantenimiento de los sistemas de drenaje y manejo de aguas lluvias, especialmente en temporadas de precipitación intensa, para evitar encharcamientos, deterioro de superficies y afectaciones estructurales.

- Fortalecer las medidas de seguridad y señalización, asegurando iluminación adecuada, rutas de evacuación visibles y condiciones seguras para niños, jóvenes y adultos que utilicen el espacio.

- Articular el escenario con programas distritales de deporte y recreación, de manera que su uso sea permanente y organizado, evitando el abandono progresivo de la infraestructura.

- Incorporar criterios de sostenibilidad operativa, promoviendo el uso eficiente de energía y agua, así como la correcta disposición de residuos generados durante eventos o actividades comunitarias.

- Realizar evaluaciones periódicas de impacto social, para medir cómo el escenario contribuye a la cohesión comunitaria, la prevención de problemáticas sociales y el fortalecimiento del tejido social en Manzanillo del Mar.

11. CONCLUSIÓN

La primera fase del proyecto, correspondiente a las actividades de reconocimiento del terreno, levantamiento topográfico, delimitación del área de intervención, gestión de materiales, procesos iniciales de aplanamiento, retiro de material sobrante proveniente de las demoliciones a lugar autorizado, excavaciones, conformación de la subrasante y figurado de acero, permitió establecer las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo seguro y estructuralmente viable del escenario recreo-deportivo.

El levantamiento topográfico detallado proporcionó información precisa sobre cotas, pendientes naturales y características del suelo, lo cual resultó fundamental para definir niveles de corte y relleno, garantizar un adecuado manejo de escorrentías y prevenir riesgos asociados a encharcamientos o inestabilidad superficial. Esta etapa técnica permitió adaptar el diseño a las condiciones reales del terreno, optimizando recursos y reduciendo contingencias posteriores en obra.

Las actividades de delimitación física del área de intervención contribuyeron a organizar el espacio constructivo, controlar el acceso y minimizar impactos sobre zonas aledañas. Esto fue especialmente relevante en un entorno comunitario como Manzanillo del Mar, donde la cercanía con viviendas y áreas de circulación exige orden y control desde el inicio del proyecto.

El proceso de aplanamiento, adecuación del terreno, excavaciones y conformación del terreno permitió generar una superficie estable y homogénea, condición indispensable para la correcta ejecución de cimentaciones y estructuras posteriores. Asimismo, el manejo técnico de cortes y rellenos favoreció la compactación adecuada del suelo, reduciendo riesgos de asentamientos diferenciales en etapas constructivas futuras.

En cuanto a la búsqueda, selección y acopio de materiales, se priorizó la calidad técnica y la compatibilidad con las condiciones ambientales del sector costero, considerando factores como humedad, salinidad y exposición solar. Esta planificación temprana fortalece la durabilidad del proyecto y optimiza los tiempos de ejecución en las siguientes fases.

Desde el enfoque ambiental, la primera fase incorporó medidas de control de material particulado, manejo adecuado de residuos iniciales y prevención de afectaciones al entorno inmediato, sentando las bases para una intervención responsable y organizada.

En términos generales, esta etapa inicial no solo preparó físicamente el terreno, sino que consolidó las condiciones técnicas, ambientales y logísticas necesarias para el desarrollo estructural del escenario recreo-deportivo. La correcta ejecución de esta fase reduce riesgos futuros, mejora la eficiencia constructiva y garantiza que las siguientes etapas del proyecto se desarrollen sobre bases sólidas y técnicamente controladas.

Leonelis Zuñiga Miranda

INGENIERO AMBIENTAL E HIDRÁULICO

12. ANEXO

12.1. ANEXO 1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CENTRO RECREO DEPORTIVOMANZANILLO DEL MAR.

Código: 002	
Versión: 1	
Fecha: 4/02/2026	
Aprobado por: Ingeniera	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PROYECTO CENTRO RECREO DEPORTIVOMANZANILLO DEL MAR

ACTIVIDADES	ASPECTO	IMPACTO	C	P	E	D	M	Ca	IMPORTANCIA AMBIENTAL	CONTROLES ACTUALES	MEDIDAS DE INTERVENCION
Descapote y limpieza de terreno e=10 cm (incluye disposición y retiro final a lugar autorizado)	Remoción de cobertura vegetal y suelo superficial	Pérdida temporal de suelo fértil y alteración del paisaje	-	1	0,7	0,6	0,6	4,74	Moderado	Delimitación del área	Manejo y disposición adecuada del material
Corte de árbol más retiro	Tala de vegetación arbórea	Pérdida de cobertura vegetal y hábitat	-	1	0,8	0,1	0,7	4,22	Moderado	Permisos ambientales	Compensación forestal

Cerramiento en lámina de zinc h=2,0 m, incluye parales y concreto 3000 psi	Instalación temporal de infraestructura	Alteración visual y generación de residuos	-	1	0,5	0,5	0,4	2,9	Moderado	Diseño temporal	Retiro y reciclaje
Desmonte de postes eléctricos existentes	Retiro de infraestructura	Riesgo temporal y residuos	-	0,9	0,6	0,6	0,5	3,51	Moderado	Coordinación con empresa eléctrica	Manejo seguro
Acometida provisional de acueducto	Uso temporal de recurso hídrico	Consumo de agua	-	1	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Medición de consumo	Uso eficiente
Acometida provisional de energía eléctrica e iluminación	Consumo energético temporal	Incremento de demanda energética	-	1	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Instalación certificada	Uso racional
Retiro de material sobrante de demoliciones a lugar autorizado	Generación de residuos	Contaminación si no se gestiona	-	1	0,6	0,7	0,6	4,62	Moderado	Transporte autorizado	Disposición final adecuada
Localización, trazado y replanteo con equipo topográfico	Actividad técnica	Impacto mínimo	+	1	0,3	0,4	0,2	1,62	Irrelevante	Procedimientos técnicos	Precisión y control
Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte (incluye retiro y transporte)	Movimiento masivo de tierras	Alteración del suelo y del paisaje	-	1	0,7	0,6	0,6	4,74	Moderado	Delimitación del área	Manejo y disposición controlada

Conformación de la subrasante, nivelación y compactación con material de sitio	Compactación del suelo	Reducción de permeabilidad y cambios físicos	-	1	0,6	0,6	0,5	3,9	Moderado	Control de humedad	Compactación técnica
Excavación manual en material conglomerado 0,0 m < H ≤ 2,00 m (incluye retiro)	Remoción manual de suelo	Alteración puntual del suelo	-	0,9	0,6	0,5	0,5	3,24	Moderado	Excavación localizada	Relleno y restauración
Relleno compactado con material de afirmado CBR ≥ 15%	Uso de material externo	Modificación del suelo natural	-	1	0,6	0,6	0,6	4,32	Moderado	Control de calidad	Compactación controlada
Relleno en material seleccionado de cantera al 95% PM	Extracción indirecta de recursos	Afectación indirecta de recursos naturales	-	0,8	0,6	0,6	0,6	3,456	Moderado	Proveedor autorizado	Uso eficiente del material
Relleno en material de sitio al 95% PM	Reutilización de suelo	Impacto positivo por reaprovechamiento	+	1	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Clasificación del material	Maximizar reutilización
Concreto ciclópea proporción 40/60 (tamaño máx., piedra 20 cm)	Uso de concreto y agregados	Alteración permanente del suelo	-	1	0,6	0,7	0,6	4,62	Moderado	Dosificación controlada	Optimización de volúmenes
Solado en concreto e=5 cm F'c=2,000 PSI	Uso de concreto	Sellamiento superficial del suelo	-	1	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Planeación de vaciado	Minimizar desperdicios

Concreto para zapatas F'c=4,000 PSI	Conformación de cimentación	Alteración permanente del suelo	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Diseño estructural	Curado adecuado
Concreto para pedestales F'c=4,000 PSI	Conformación estructural	Cambio permanente del suelo	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Supervisión técnica	Control de residuos
Concreto para vigas de cimentación F'c=4,000 PSI	Uso de concreto estructural	Alteración del medio físico	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Control de obra	Optimización del diseño
Concreto para losa de fondo de tanque F'c=4,000 PSI	Sellamiento del suelo	Modificación permanente del suelo	-	1	0,6	0,9	0,6	5,22	Significativo	Diseño impermeable	Control de filtraciones
Impermeabilización de junta con cinta PVC-P	Uso de material sintético	Prevención de filtraciones	+	1	0,5	0,8	0,4	3,8	Moderado	Especificación técnica	Instalación adecuada
Concreto para muros F'c=4,000 PSI baja permeabilidad	Construcción estructural	Alteración permanente del suelo	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Curado y vibrado	Control de calidad
Concreto para muros contenedor de raíz F'c=4,000 PSI	Contención estructural	Modificación del entorno inmediato	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Diseño técnico	Manejo paisajístico
Concreto para columnetas F'c=4,000 PSI	Uso de concreto	Alteración puntual del suelo	-	1	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Supervisión	Optimización de materiales
Concreto para columnas F'c=4,000 PSI	Construcción estructural	Cambio permanente del medio físico	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Control técnico	Gestión de residuos

Concreto para vigas aéreas F'c=4,000 PSI	Uso de concreto estructural	Impacto visual y residuos	-	1	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Planeación	Minimizar desperdicios
Concreto para losa de entrepiso aligerada	Uso de concreto e icopor	Generación de residuos no recuperables	-	1	0,6	0,8	0,7	5,34	Significativo	Diseño estructural	Gestión de residuos
Concreto para placas de gradería F'c=4,000 PSI	Construcción en concreto	Alteración permanente del suelo	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Supervisión	Control de volúmenes
Concreto para muros F'c=4,000 PSI	Construcción estructural	Alteración del medio físico	-	1	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Curado adecuado	Control de calidad
Canal en concreto 0,40 x 0,20 F'c=4,000 PSI	Manejo de aguas	Mejora del drenaje superficial	+	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Diseño hidráulico	Mantenimiento periódico
Placa de contrapiso en concreto F'c=4,000 PSI	Sellamiento del suelo	Reducción de infiltración	-	1,0	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Planeación	Control de ejecución
Corte para dilataciones y sello de junta	Actividad correctiva	Prevención de fisuras	+	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Especificación técnica	Sellado adecuado
Vigueta de confinamiento en concreto	Uso de concreto estructural	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Supervisión	Optimización del diseño
Acero de refuerzo PDR-60	Uso de acero	Consumo de recurso no renovable	-	1,0	0,5	0,8	0,5	4,15	Moderado	Compra certificada	Uso eficiente
Estructura metálica para cubiertas	Uso de acero y soldadura	Impacto visual y generación de residuos	-	1,0	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Pintura anticorrosiva	Manejo de residuos metálicos

Levante de muro en block vibrado No,6 reforzado y relleno en mortero 1:3 H=1,20 m	Uso de mampostería y acero	Consumo de materiales y generación de residuos	-	1,0	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Diseño estructural	Optimizar uso de materiales
Levante muro en bloque vibrado No,5	Uso de mampostería	Alteración del entorno físico	-	1,0	0,6	0,6	0,5	3,9	Moderado	Supervisión de obra	Minimizar desperdicios
Levante muro en bloque vibrado No,6	Uso de mampostería	Cambio permanente del medio construido	-	1,0	0,6	0,6	0,5	3,9	Moderado	Control técnico	Gestión de residuos
Levante muros en bloque No,4	Uso de mampostería	Impacto físico puntual	-	1,0	0,6	0,6	0,4	3,48	Moderado	Planeación	Optimización de cortes
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros internos y externos	Uso de mortero	Generación de polvo y residuos	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Humectación	Limpieza continua
Pañete allanado en mortero 1:4 (filos)	Uso de mortero	Impacto puntual por residuos	-	1,0	0,5	0,5	0,3	2,55	Moderado	Control de mezclas	Minimizar desperdicios
Dilataciones en pañete de fachadas e=1"	Actividad correctiva	Prevención de fisuras	+	1,0	0,5	0,7	0,3	3,15	Moderado	Especificación técnica	Sellado adecuado
Albardilla en concreto 0,20 x 0,06 m	Uso de concreto	Sellamiento superior de muros	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Diseño técnico	Curado adecuado

Mortero de nivelación 1:3 impermeabilizado e=5 cm	Uso de mortero impermeabilizado	Sellamiento superficial	-	1,0	0,5	0,7	0,5	3,85	Moderado	Control de dosificación	Aplicación técnica
Manto asfáltico para impermeabilización	Uso de material asfáltico	Prevención de filtraciones	+	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Especificación del fabricante	Instalación correcta
Cubierta en lámina termoacústica UPVC 2,5 mm	Instalación de cubierta	Mejora de confort térmico	+	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Instalación certificada	Mantenimiento preventivo
Puntos desagües Ø 2" en muro	Instalación sanitaria	Generación puntual de residuos y polvo	-	1,0	0,5	0,6	0,3	2,85	Moderado	Diseño hidráulico aprobado	Manejo adecuado de residuos
Puntos desagües Ø 2" en piso	Instalación sanitaria	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Supervisión técnica	Reparación inmediata
Puntos desagües Ø 4"	Instalación sanitaria	Generación de residuos de obra	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Plan de obra	Gestión de residuos
Puntos ventilación	Instalación sanitaria	Mejora del sistema sanitario	+	1,0	0,5	0,7	0,3	3,15	Moderado	Normativa técnica	Correcta ubicación
Tubería colectora enterrada Ø 2" PVC sanitaria	Instalación de tubería	Alteración temporal del suelo	-	1,0	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Planos aprobados	Relleno y compactación
Tubería colectora enterrada Ø 4" PVC sanitaria	Instalación de tubería	Remoción de suelo	-	1,0	0,6	0,7	0,6	4,62	Moderado	Supervisión de excavación	Restauración del terreno
Tubería ranurada enterrada Ø 6"	Drenaje	Modificación del drenaje superficial	-	1,0	0,6	0,7	0,6	4,62	Moderado	Diseño hidráulico	Control de escorrentía

Tubería colectora Ø 2" PVC ventilación	Ventilación sanitaria	Impacto físico mínimo	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Especificación técnica	Instalación adecuada
Cajas de inspección 0,80 x 0,80 m	Infraestructura sanitaria	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Diseño estructural	Sellado y señalización
Excavación manual de zanja 0,20 x 0,40 m	Excavación	Remoción temporal de suelo	-	1,0	0,7	0,6	0,6	4,74	Moderado	Procedimiento constructivo	Manejo de taludes
Relleno con material seleccionado para zanja	Relleno	Estabilización del suelo	+	1,0	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Compactación controlada	Verificación densidad
Relleno con material de sitio	Relleno	Recuperación del terreno	+	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Supervisión técnica	Compactación adecuada
Retiro de material sobrante a lugar autorizado	Gestión de residuos	Disposición adecuada de residuos	+	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Contrato con botadero	Seguimiento transporte
Punto hidráulico Ø 1/2"	Instalación hidráulica	Consumo de materiales	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Diseño hidráulico	Optimizar materiales
Punto medidor Ø 1"	Instalación hidráulica	Intervención mínima	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Norma técnica	Instalación certificada
Tubería PVC presión Ø 1/2"	Instalación hidráulica	Generación de residuos plásticos	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Almacenamiento adecuado	Recolección residuos
Tubería PVC presión Ø 3/4"	Instalación hidráulica	Impacto físico mínimo	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Supervisión	Uso eficiente
Tubería PVC presión Ø 1"	Instalación hidráulica	Alteración puntual	-	1,0	0,4	0,6	0,4	2,92	Moderado	Diseño aprobado	Control de cortes
Tubería PVC presión Ø 2"	Instalación hidráulica	Remoción puntual de material	-	1,0	0,5	0,6	0,5	3,55	Moderado	Procedimiento técnico	Manejo residuos

Tubería PVC presión Ø 3"	Instalación hidráulica	Impacto localizado	-	1,0	0,5	0,7	0,5	3,85	Moderado	Supervisión	Restitución área
Válvula de compuerta Ø 1/2"	Instalación hidráulica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Norma técnica	Correcta instalación
Válvula de compuerta Ø 3/4"	Instalación hidráulica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Supervisión	Ajuste adecuado
Válvula de compuerta Ø 1"	Instalación hidráulica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Control técnico	Verificación
Válvula de compuerta Ø 2"	Instalación hidráulica	Impacto localizado	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Especificación técnica	Instalación correcta
Sanitario institucional	Equipamiento sanitario	Generación de residuos de empaque	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Proveedor certificado	Disposición empaques
Lavamanos institucional	Equipamiento sanitario	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Supervisión	Manejo residuos
Orinal institucional	Equipamiento sanitario	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Norma técnica	Uso eficiente
Ducha mezcladora	Equipamiento sanitario	Consumo de agua	-	1,0	0,4	0,8	0,4	3,52	Moderado	Dispositivo eficiente	Ahorro hídrico
Lavaplatos de bajo poner	Equipamiento sanitario	Consumo de agua	-	1,0	0,4	0,8	0,4	3,52	Moderado	Grifería eficiente	Uso racional
Lava traperos	Equipamiento sanitario	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,7	0,3	2,73	Moderado	Supervisión	Buen uso
Llave de grifo lavaplatos	Equipamiento sanitario	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,7	0,3	2,73	Moderado	Norma técnica	Instalación correcta
Tubería PVC Ø 3"	Instalación sanitaria	Residuos plásticos	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Manejo residuos	Recolección

Válvula cheque pie Ø 4"	Instalación hidráulica	Impacto localizado	-	1,0	0,4	0,6	0,4	2,92	Moderado	Supervisión	Instalación correcta
Tubería PVC P Ø 1"	Instalación hidráulica	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Norma técnica	Optimización
Tubería acero galvanizado Ø 3"	Instalación hidráulica	Consumo de material metálico	-	1,0	0,5	0,7	0,5	3,85	Moderado	Diseño aprobado	Protección anticorrosiva
Válvula compuerta Ø 3/4"	Instalación hidráulica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Supervisión	Ajuste correcto
Válvula compuerta Ø 3"	Instalación hidráulica	Impacto localizado	-	1,0	0,4	0,6	0,4	2,92	Moderado	Norma técnica	Instalación adecuada
Válvula cheque Ø 3"	Instalación hidráulica	Impacto localizado	-	1,0	0,4	0,6	0,4	2,92	Moderado	Supervisión	Verificación
Equipo de bombeo y presión constante	Equipo electromecánico	Consumo energético	-	1,0	0,6	0,9	0,6	5,22	Significativo	Especificación técnica	Uso eficiente
Tubería drenaje PDT 8"	Drenaje pluvial	Modificación del drenaje	-	1,0	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Diseño hidráulico	Control escorrentía
Aire acondicionado mini Split 2 TR	Climatización	Consumo energético y ruido	-	1,0	0,6	0,9	0,7	5,64	Significativo	Equipo eficiente R410a	Mantenimiento periódico
Adecuación punto de conexión	Intervención eléctrica puntual	Alteración temporal del entorno físico	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	RETIE	Señalización y control
Armado red MT doble terminal MT325	Red eléctrica MT	Riesgo eléctrico y uso de materiales	-	1,0	0,7	0,8	0,6	5,34	Significativo	RETIE, operador red	Personal certificado
Armado red MT fin de línea MT321	Red eléctrica MT	Riesgo eléctrico	-	1,0	0,7	0,8	0,6	5,34	Significativo	RETIE	Protocolos de seguridad

Red monofásica 2H ACSR 1/0 XLPE	Instalación de red aérea	Impacto visual y material	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Diseño aprobado	Trazado óptimo
Poste concreto 12 m 1050 kg	Instalación poste	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,7	0,9	0,6	5,64	Significativo	Diseño estructural	Restauración del terreno
Protecciones y herrajes transformador	Equipos eléctricos	Generación de residuos metálicos	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	RETIE	Manejo de residuos
SPT transformador y red MT	Sistema de puesta a tierra	Mejora de seguridad eléctrica	+	1,0	0,6	0,9	0,4	4,38	Moderado	Norma RETIE	Verificación técnica
Retenida MT a tierra	Estabilidad red	Prevención de fallas	+	1,0	0,5	0,9	0,3	3,75	Moderado	Diseño técnico	Inspección periódica
Transformador 100 KVA	Equipo eléctrico	Impacto visual y ruido leve	-	1,0	0,6	0,9	0,7	5,64	Significativo	Ficha técnica	Encapsulado acústico
Excavación zanja 0,60x0,40 m	Excavación	Remoción temporal del suelo	-	1,0	0,7	0,6	0,6	4,74	Moderado	Procedimiento constructivo	Manejo taludes
Relleno zanja material de sitio	Relleno	Recuperación del terreno	+	1,0	0,6	0,7	0,5	4,2	Moderado	Compactación controlada	Verificación densidad
Bajante en tubería IMC 4"	Canalización eléctrica	Impacto físico mínimo	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	RETIE	Fijación adecuada
Banco ducto PVC 2" + reserva	Canalización	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Planos aprobados	Relleno adecuado
Banco ducto PVC 1" + reserva	Canalización	Impacto localizado	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Supervisión	Compactación
Acometida 3x250 MCM THHN	Acometida eléctrica	Consumo de cobre	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Diseño aprobado	Optimizar longitud
Acometida Serie 8000	Acometida eléctrica	Uso de aluminio	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Norma técnica	Manejo residuos

Acometida 3No,2 Serie 8000	Acometida eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	RETIE	Instalación correcta
Ramal 2No,6 + 1No,10	Ramal eléctrico	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Supervisión	Ordenado cableado
Ramal 3No,12 tubería 3/4"	Ramal eléctrico	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	RETIE	Fijación adecuada
Ramal 3No,12 tubería 1/2"	Ramal eléctrico	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Supervisión	Instalación correcta
Cable encauchetado 3x12	Cableado	Residuos plásticos	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Almacenamiento	Recolección
Tablero general distribución	Equipo eléctrico	Consumo energético indirecto	-	1,0	0,6	0,9	0,6	5,22	Significativo	RETIE	Mantenimiento
Tablero bimetálico 18 circuitos	Equipo eléctrico	Impacto mínimo	-	1,0	0,5	0,8	0,4	3,8	Moderado	Norma técnica	Correcto montaje
Tablero sistema bombeo	Equipo eléctrico	Consumo energético	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño aprobado	Uso eficiente
Caja abonada 8P	Conexión luminarias	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Supervisión	Sellado
Breaker 20A	Protección eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	RETIE	Instalación correcta
Breaker 2x20A	Protección eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	RETIE	Verificación
SPT cable 4/0 Cu	Puesta a tierra	Mejora seguridad eléctrica	+	1,0	0,6	0,9	0,4	4,38	Moderado	RETIE	Medición resistencia
Apantallamiento mástiles	Protección eléctrica	Prevención descargas	+	1,0	0,5	0,9	0,4	4,1	Moderado	Norma técnica	Inspección

Salida iluminación	Instalación eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	RETIE	Ordenamiento
Salida iluminación emergencia	Seguridad	Mejora seguridad	+	1,0	0,4	0,9	0,3	3,54	Moderado	Norma técnica	Pruebas
Salida interruptora	Instalación eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	Supervisión	Instalación correcta
Salida tomacorriente doble	Instalación eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	RETIE	Correcta fijación
Salida tomacorriente GPFI	Seguridad eléctrica	Prevención riesgos	+	1,0	0,4	0,9	0,3	3,54	Moderado	RETIE	Pruebas
Salida tomacorriente 220V	Instalación eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,4	3,22	Moderado	Supervisión	Instalación correcta
Salida luminaria 220V	Iluminación	Impacto visual	-	1,0	0,4	0,8	0,4	3,52	Moderado	Diseño	Orientación
Luminaria empotrar LED 12W	Iluminación	Consumo energético bajo	+	1,0	0,4	0,9	0,3	3,54	Moderado	Eficiencia LED	Mantenimiento
Luminaria hermética LED 70W	Iluminación	Impacto visual nocturno	-	1,0	0,5	0,9	0,4	4,1	Moderado	Diseño lumínico	Control deslumbramiento
Luminaria emergencia LED	Seguridad	Mejora seguridad	+	1,0	0,4	0,9	0,3	3,54	Moderado	Norma técnica	Pruebas
Luminaria aplique LED 12W	Iluminación	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,8	0,3	3,24	Moderado	Supervisión	Orientación
Luminaria alumbrado público 60W	Alumbrado exterior	Impacto visual nocturno	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño lumínico	Minimizar dispersión
Reflector LED 100W	Iluminación deportiva	Impacto visual	-	1,0	0,6	0,9	0,6	5,22	Significativo	Orientación	Control encandilamiento

Luminaria deportiva especializada	Iluminación deportiva	Impacto visual significativo	-	1,0	0,7	0,9	0,7	6,13	Significativo	Estudio lumínico	Direccionamiento
Orientación reflectores	Ajuste iluminación	Reducción impacto visual	+	1,0	0,5	0,9	0,4	4,1	Moderado	Técnico especializado	Calibración
Farol LED 12,000 lm	Alumbrado exterior	Impacto visual	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño	Control altura
Poste tipo Garden	Infraestructura urbana	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño aprobado	Restauración
Reflector LED 300W	Iluminación alta potencia	Impacto visual	-	1,0	0,7	0,9	0,7	6,13	Significativo	Estudio lumínico	Orientación
Reflector LED 400W	Iluminación alta potencia	Impacto visual	-	1,0	0,7	0,9	0,8	6,62	Significativo	Diseño lumínico	Control
Cruceta soporte reflectores	Estructura metálica	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,8	0,3	3,24	Moderado	Diseño estructural	Protección anticorrosiva
Mástil iluminación 22 m	Infraestructura	Impacto visual permanente	-	1,0	0,7	1	0,8	6,92	Significativo	Diseño estructural	Integración paisajística
Zapata concreto poste AP	Cimentación	Alteración puntual suelo	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño	Restauración
Poste fibra vidrio 12 m	Infraestructura	Impacto visual	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño	Integración
Poste fibra vidrio 12 m	Infraestructura	Impacto visual	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño	Integración
Cimentación poste fibra	Cimentación	Alteración puntual suelo	-	1,0	0,6	0,9	0,5	4,8	Moderado	Diseño	Restauración
Medida semidirecta operador red	Medición eléctrica	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Operador red	Instalación certificada

Registro eléctrico 0,40x0,40	Obra civil	Alteración puntual suelo	-	1,0	0,6	0,8	0,4	4,08	Moderado	Diseño	Señalización
Registro eléctrico 0,60x0,60	Obra civil	Alteración puntual suelo	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Diseño	Restauración
Registro eléctrico 0,80x0,80	Obra civil	Alteración puntual suelo	-	1,0	0,6	0,8	0,6	4,92	Moderado	Diseño	Restauración
Riego de imprimación asfáltica	Uso de emulsión asfáltica	Emisión de olores y manejo de químicos	-	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Ficha técnica material	Aplicación controlada
Geomembrana PEAD 30 mils	Material sintético impermeable	Generación de residuos plásticos	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Especificación técnica	Recolecciones sobrantes
Grama sintética tercera generación	Cobertura artificial	Alteración del suelo natural	-	1,0	0,7	0,9	0,6	5,64	Significativo	Diseño aprobado	Manejo de base
Plantilla de piso en concreto	Uso de concreto	Consumo de recursos minerales	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Dosificación controlada	Optimizar volúmenes
Piso cerámico institucional	Acabado duro	Generación de residuos cerámicos	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Supervisión obra	Recolección residuos
Piso cerámico terrazo baño	Acabado especializado	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Especificación técnica	Instalación eficiente
Guarda escoba granito	Acabado pétreo	Uso de recurso mineral	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Diseño aprobado	Minimizar cortes
Guarda escoba cerámica	Acabado	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	Supervisión	Optimizar material
Junta granito pulido	Remate estructural	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	Diseño	Ejecución controlada
Pintura tipo tráfico	Señalización	Emisión leve de VOC	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Ficha técnica	Ventilación

Bordillo en concreto	Elemento urbano	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Diseño estructural	Restauración área
Andén en concreto	Infraestructura peatonal	Sellado del suelo	-	1,0	0,7	0,9	0,6	5,64	Significativo	Diseño aprobado	Drenaje adecuado
Viga cinta confinamiento	Elemento estructural	Uso de concreto y acero	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Planos estructurales	Control de desperdicio
Piso adoquín	Pavimento permeable	Mejora infiltración	+	1,0	0,6	0,8	0,4	4,08	Moderado	Diseño urbano	Correcta instalación
Arena sílice cancha voleibol	Material granular	Modificación superficial del suelo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Selección material	Nivelación adecuada
Alcorque circular D=2,00 m	Espacio verde	Mejora paisajística y permeabilidad	+	1,0	0,7	0,9	0,5	5,15	Significativo	Diseño arquitectónico	Mantenimiento vegetal
Riego de imprimación asfáltica	Uso de emulsión asfáltica	Emisión de olores y manejo de químicos	-	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Ficha técnica material	Aplicación controlada
Geomembrana PEAD 30 mils	Material sintético impermeable	Generación de residuos plásticos	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Especificación técnica	Recolecciones sobrantes
Grama sintética tercera generación	Cobertura artificial	Alteración del suelo natural	-	1,0	0,7	0,9	0,6	5,64	Significativo	Diseño aprobado	Manejo de base
Plantilla de piso en concreto	Uso de concreto	Consumo de recursos minerales	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Dosificación controlada	Optimizar volúmenes
Piso cerámico institucional	Acabado duro	Generación de residuos cerámicos	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Supervisión obra	Recolección residuos
Piso cerámico terrazo baño	Acabado especializado	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Especificación técnica	Instalación eficiente

Guarda escoba granito	Acabado pétreo	Uso de recurso mineral	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Diseño aprobado	Minimizar cortes
Guarda escoba cerámica	Acabado	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	Supervisión	Optimizar material
Junta granito pulido	Remate estructural	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	Diseño	Ejecución controlada
Pintura tipo tráfico	Señalización	Emisión leve de VOC	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Ficha técnica	Ventilación
Bordillo en concreto	Elemento urbano	Alteración puntual del suelo	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Diseño estructural	Restauración área
Andén en concreto	Infraestructura peatonal	Sellado del suelo	-	1,0	0,7	0,9	0,6	5,64	Significativo	Diseño aprobado	Drenaje adecuado
Viga cinta confinamiento	Elemento estructural	Uso de concreto y acero	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Planos estructurales	Control de desperdicio
Piso adoquín	Pavimento permeable	Mejora infiltración	+	1,0	0,6	0,8	0,4	4,08	Moderado	Diseño urbano	Correcta instalación
Arena sílice cancha voleibol	Material granular	Modificación superficial del suelo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Selección material	Nivelación adecuada
Alcorque circular D=2,00 m	Espacio verde	Mejora paisajística y permeabilidad	+	1,0	0,7	0,9	0,5	5,15	Significativo	Diseño arquitectónico	Mantenimiento vegetal
Ventana persiana aluminio 0,80x0,40	Uso de aluminio	Consumo de material industrial	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Especificación técnica	Optimizar cortes
Ventana persiana aluminio 1,50x0,40	Uso de aluminio	Impacto mínimo por instalación	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Supervisión obra	Manejo de residuos

Ventana persiana aluminio 2,00x0,40	Uso de aluminio	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Diseño aprobado	Instalación correcta
Puerta metálica 0,70x2,20	Carpintería metálica	Generación de residuos metálicos	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Ficha técnica	Reciclajes sobrantes
Puerta metálica 0,90x2,20	Carpintería metálica	Impacto mínimo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Control calidad	Manejo residuos
Puerta metálica 1,00x2,20	Carpintería metálica	Impacto mínimo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Especificación	Optimizar montaje
Puerta metálica 1,15x2,20	Carpintería metálica	Impacto mínimo	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Supervisión	Instalación adecuada
Puerta acero inoxidable baño 0,70x1,50	Uso acero inoxidable	Consumo de material industrial	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Norma técnica	Manejos sobrantes
Puerta acero inoxidable baño 1,15x1,50	Uso acero inoxidable	Impacto mínimo	-	1,0	0,4	0,7	0,3	2,94	Moderado	Control calidad	Correcta fijación
Lockers madera RH camerinos	Uso de madera tratada	Consumo de recurso forestal	-	1,0	0,6	0,8	0,5	4,5	Moderado	Especificación RH	Uso eficiente material
Levante de muros en bloque	Uso de materiales pétreos	Generación de polvo y residuos	-	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Procedimiento constructivo	Humectación y orden de obra
Refuerzo en acero 1/2"	Uso de acero	Residuos metálicos	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Almacenamiento adecuado	Recolección y reciclaje
Pañete muros internos	Uso de mortero	Emisión de polvo	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Manual de obra	Humectación previa

Pañete muros externos	Uso de mortero	Material particulado	-	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Supervisión técnica	Aplicación controlada
Dilataciones en fachadas	Uso de sellantes	Residuos menores	-	1,0	0,3	0,6	0,3	2,43	Irrelevante	Ficha técnica	Manejo adecuado
Albardilla en concreto	Uso de concreto	Residuos de mezcla	-	1,0	0,5	0,6	0,4	3,2	Moderado	Dosificación controlada	Optimizar mezclas
Mortero de nivelación	Uso de mortero impermeable	Emisión leve de partículas	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Ficha técnica	Aplicación controlada
Impermeabilización manto asfáltico	Uso de asfalto	Emisión leve de vapores	-	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Procedimiento técnico	Ventilación natural
Cubierta termoacústica UPVC	Uso de láminas plásticas	Residuos plásticos	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Manual instalación	Recolección residuos
Señalización vertical	Uso de acrílico y metal	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Diseño aprobado	Instalación segura
Barandas metálicas	Uso de acero galvanizado	Residuos metálicos	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Procedimiento obra	Recolección y reciclaje
Señalética en acrílico	Uso de acrílico	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Supervisión	Manejo cuidadoso
Canecas metálicas	Uso de acero inoxidable	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Diseño aprobado	Instalación correcta
Cerramiento perimetral	Uso de malla galvanizada	Residuos metálicos	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Especificación técnica	Recolección residuos
Porterías fútbol 11	Elementos deportivos	Impacto mínimo	-	1,0	0,3	0,6	0,2	2,22	Irrelevante	Normativa FIFA	Instalación segura
Mallas deportivas	Uso de fibras sintéticas	Residuos plásticos	-	1,0	0,4	0,6	0,3	2,64	Moderado	Manual instalación	Reutilización

Banderines esquina	Accesorios deportivos	Impacto mínimo	-	1,0	0,2	0,6	0,2	2,08	Irrelevante	Diseño	Instalación segura
Aseo general de obra	Limpieza final	Generación de residuos	-	1,0	0,5	0,7	0,4	3,5	Moderado	Plan de manejo ambiental	Separación residuos
Retiro de escombros	Transporte de residuos	Disposición final	-	1,0	0,6	0,7	0,4	3,78	Moderado	Gestor autorizado	Disposición controlada

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026.

12.2. ANEXO 2.

FORMATOS DE MONITOREO Y CONTROL

Los siguientes formatos son aquellos diseñados para la realización y notificación de cada una de las actividades.

	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO PANILLA ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Código: 001 Versión: 1 Fecha: 16/02/2025 Página: 1 de 1

DEPENDENCIA:	Ambiental			
NOMBRE DE LA CAPACITACION:	manejo forestal de especies endemicas	TIPO DE EVENTO	**Socialización**	
FACILITADOR	Leonelis Zuñiga Miranda			
FECHA:	16 de Febrero de 2026	DURACION: (En horas):	**1**	
LUGAR:	Manzanillo del Mar, Cartagena de Indias.			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	C.C.	UBICACIÓN	TIPO DE VINCULACION				Telefono	FIRMA
				Carrera	Provisional	Libre Nombramiento	Contrato		
1	Willam Matos	1233913446	Manzanillo Calle 25 dic #13				x	3243345953	NA
2	Alberto Batista Arias	9237009	Manzanillo sector Zaragocilla				x	3009937793	NA
3	Juan Manuel Vivero	1143325926	Olaya Sector Fredonoa Calle 7				x	3146594624	NA
4	Jhan Carlos Batista Casiany	1047490391	Manzanillo calle principal				x	3046390325	NA
5	Ravy José Jimenez Jimenez	1047502141	Manzanillo Calle el campo				x	3012753521	NA
6	Juan Camilo Padilla Cantillo	1047493037	Manzanillo Calle 1era				x	3008863046	NA
7	Genser Correa Berrio	1047372666	Barrio Libano Calle 2 de Mayo 48 A318				x	3012531054	NA
8	Moises Lopez Bustamante	1128061929	Olaya Sector la Villa				x	3003818894	NA
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Guia de diligenciamiento formato planilla asistencia actividades de capacitación:

El formato asistencia a capacitaciones será diligenciado en todas las actividades que se realicen en ejecución del Plan Institucional de Capacitación. Es importante que los participantes en las actividades de capacitación impartidas en la entidad registren de manera legible su número de cédula, nombres y apellidos completos, ubicación laboral, tipo de vinculación en la entidad, correo electrónico y firmen su asistencia como constancia de su participación en la actividad a la cual son citados y/o convocados.

1. **Dependencia**: Coloque el nombre de la dependencia de convoca a la capacitación

2. **Nombre de la capacitación**: Registre el tema que se va a capacitar

3. **Facilitador:** Se debe registrar el nombre de la entidad externa o dependencia interna que dará la capacitación

4. **Fecha**: Mes, día y año de realización de la actividad

5. **Lugar**: Sitio dónde se realiza la actividad de capacitación

6. **Tipo de evento**: Especifique en éste espacio si la actividad de capacitación corresponde a un taller, diplomado, seminario, capacitación, etc.,

7. **Duración (en horas)**: Coloque aquí el número de horas que tendrá el tema de capacitación para el cual se está realizando el registro

Tabla 3. Formato 1 de Capacitación.

Fuente: Consorció de Innovación y Deporte 2026

ANEXO 9. ANEXOS DE OBRA

Ventas de Equipos topográficos Calibración
Calle: 68 # 34-05 BARRANQUILLA
Tel: 3153022628-3157243479

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No.:	EP 869
CLIENTE:	ESNEIDER TORRES OROZCO
D.I:	1051890129
DIRECCION:	CLEMENCIA BOLIVAR
TELEFONO:	3216276734
CIUDAD:	BOLIVAR

DESCRIPCIÓN

TIPO:	ESTACION
MARCA:	SANDING
MODELO:	ARC 5PRO
SERIE:	SD65621
MAGNIFICACIÓN:	30X
PRECISION ANGURAR (DIN 18723)	(2 + 2ppm x D) mm

DATOS DE CALIBRACIÓN


FECHA DE RECIBO	25/10/2025
FECHA DE CALIBRACIÓN	26/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	26/04/2026
TEMPERATURA	20.3°c
HUMEDAD RELATIVA	79.5%
METODO CALIBRACIÓN UTILIZADO	Método interno I-LB001
TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN	Estación T.-TOPCON –GPT7501L 1´´
	Nivel A.- SOKKISHA- B1C 32X - S/N: 6906

DISEÑOS A.E, certifica que el equipo descrito fue calibrado de acuerdo a los procedimientos de calibración del Laboratorio, las mediciones realizadas son trazables al sistema internacional de unidades (SI). Este laboratorio demuestra su competencia técnica mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO IEC 17025:2005. La incertidumbre de medición reportada está basada en un factor de cobertura K=2 nivel de confiabilidad del 95% aproximadamente.

Notas:

- Los resultados del presente certificado se refieren únicamente al equipo descrito, al momento y condiciones en que se intervino el equipo.
- El laboratorio no se hace responsable de los perjuicios que puedan ocasionar el uso inadecuado de este certificado y el equipo certificado.
- El laboratorio certifica que el equipo y sus accesorios se entregan en óptimas condiciones de trabajo.
- El presente certificado no debe presentar enmendadura alguna. Prohibida la reproducción total o parcial de este certificado sin la aprobación escrita del laboratorio.

Autorizado por:



EDGAR PINTO MORENO
Director Técnico Laboratorio

Ventas de Equipos topográficos Calibración
Calle: 68 # 34-05 BARRANQUILLA
Tel: 3153022628-3157243479

PTO No.1	FASE 1	FASE 2	PARAMETRO	TOLERANCIA	ERROR
ANG-VERTICAL	90° 00' 00"	269° 59' 14"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 44"
ANG-HORIZONTAL	0° 00' 00"	180° 00' 19"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 19"
ANG-VERTICAL	90° 00' 00"	269° 59´ 14"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 44"
ANG-HORIZONTAL	0° 00' 00"	180° 00' 19"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 19"
LIN-DISTACIA	9.387 m	9.387	9.387 m	0.001 m	0.000 m
LIN-DISTACIA	9.387 m	9.387	9.387 m	0.001 m	0.000 m

DATOS DESPUES DE AJUSTE

PTO No.1	FASE 1	FASE 2	PARAMETRO	TOLERANCIA	ERROR
ANG-VERTICAL	90° 00' 00"	90° 00' 00"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
ANG-HORIZONTAL	0° 00' 00"	180° 00' 00"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
ANG-HORIZONTAL	90° 00' 00"	90° 00' 00"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
ANG-VERTICAL	0° 00' 00"	180° 00' 00"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
LIN-DISTACIA	9.385 m	9.385 m	9.385 m	0.001 m	0.000 m
LIN-DISTANCIA	9.385 m	9.385 m	9.385 m	0.001 m	0.000 m

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Ua	Ub	U= Ua + Ub	U expandida
0	0.002	0.002	+/- 0.004

CONDICIONES DEL EQUIPO

PARAMETROS DE REVISIÓN	OBSERVACIONES
AJUSTE INTERNO	AJUSTADO
AJUSTE EXTERNO	AJUSTADO
LIMPIEZA EXTERNA	NO REQUIERE DE AJUSTE
NIVELES TUBULARES Y ESFERICO	AJUSTADO
AJUSTE EJE VERTICAL Y HORIZONTAL	NO REQUIERE DE AJUSTE
VERTICALIDAD	NO REQUIERE DE AJUSTE
OPTICA GENERAL	NO REQUIERE DE AJUSTE
TORNILLO DE MOVIMIENTO LENTO/FINO	NO REQUIERE DE AJUSTE
SISTEMA DE COMPENSACION	AJUSTADO
EXACTITUD DE CONTEO	AJUSTADO
ANGULO VERTICAL	AJUSTADO
ANGULO HORIZONTAL	AJUSTADO
CONSTANTE DEL PRISMA	NO REQUIERE DE AJUSTES
CONSTANTE DE PPM	NO REQUIERE DE AJUSTES
TECLADO	EN CONDICIONES NORMALES
DISPLAY	EN CONDICIONES NORMALES
PLOMADA LASER/OPTICA	AJUSTADO

Autorizado por:

EDGAR PINTO MORENO
Director Técnico Laboratorio

SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

SEGUIMIENTO MENSUAL No. 1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 21 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO No. 1375-2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE

22 DE FEBRERO DE 2026.

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DEL 22 DE ENERO DE 2026 AL 21 DE FEBRERO DE 2026

1. INTRODUCCION

El presente Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tiene como finalidad, realizar seguimiento a la movilidad peatonal y vehicular, durante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Desde la perspectiva de movilidad, la ejecución de las actividades constructivas implica la movilización periodica de maquinaria pesada, volquetas, camiones transportadores de materiales y personal operativo, asi como maniobras de cargue y descargue en el área de influencia directa del proyecto. Estas dinámicas pueden generar afectaciones temporales temporales sobre la circulación vehicular y peatonal del sector, especialmente en vias locales de acceso al corregimiento de Manzanillo del Mar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la señalizaciones y pedagogías pertinentes con el fin de, garantizar la seguridad vial, manteniendo la continuidad operativa del transito y minimizando interferencias y/o afectaciones en la zona.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Implementar las medidas técnicas necesarias en la ejecución de la "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA", con el fin de controlar la movilidad vehicular y peatonal, garantizando seguridad vial de trabajadores, residentes y usuarios de las vías del área de influencia.

2.2. Objetivo Especifico

- Implementar señalización informativa y reglamentaria conforme a la normatividad vigente.
- Minimizar los riesgos de accidentabilidad como consecuencia a la ejecución de la obra.
- Identificar posibles impactos puedan generar en la movilidad en el corregimiento de Manzanillo del Mar.
- Definir y señalizar áreas de trabajo, almacenamiento de materiales y equipos de trabajo para cada etapa del proyecto.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El proyecto consiste en la construcción de un escenario recreo deportivo de carácter público, que contempla una cancha de futbol 11, futbol 5, cancha multifuncional, cancha de voleibol y baloncesto, zonas de juegos infantiles, zonas de estancia, senderos peatonales, cerramientos, redes eléctricas y espacios complementarios para el encuentro comunitario. Esta infraestructura tiene como finalidad fortalecer la oferta de espacios deportivos y de integración social en el corregimiento de Manzanillo del Mar, consolidándose como un equipamiento urbano estratégico para la comunidad.

Desde la perspectiva de movilidad, la ejecución de las actividades constructivas implicara la movilización periódica de maquinaria pesada, volquetas, vehículos de transporte de materiales, equipos de compactación y personal operativo, así como maniobras de cargue y descargue en el área de influencia directa del proyecto.

En este contexto, el PMT se constituye como el instrumento técnico mediante el cual se establecen las estrategias, medidas y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad vial, mantener la continuidad operativa del transito y minimizar interferencias durante el desarrollo de la obra.

Así mismo, el PMT incorpora un esquema de seguimiento y control que permitirá evaluar el comportamiento del transito durante las diferentes fases constructivas, posibilitando ajustes oportunos en caso de identificarse condiciones de riesgo o congestión no previstas.

En consecuencia, el presente PMT garantiza que la ejecución del proyecto recreo deportivo se desarrolle bajo criterios de seguridad, organización y responsabilidad técnica, asegurando su adecuada articulación con la dinámica vial del sector y protegiendo a todos los actores viales involucrados.

4. MARCO GENERAL

En desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Carta Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y la comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y las personas con discapacidad, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.

Que el artículo 5 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 3 de la ley 1383 del 2010, faculta al ministerio de transporte para reglamentar las características técnicas de la demarcación de toda la infraestructura vial.

Que el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 de 2002, otorgo al Ministerio de transporte la responsabilidad de determinar los elementos y dispositivos de señalización necesarios en obras de construcción.

Que el Ministerio de Transporte mediante la resolución No.001050 del 5 de mayo del 2004, adopto el Manual de señalización Vial- Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, adicionado por las resoluciones 4577 de 2009 y 1236 de 2013.

Que en el año 2008 el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de las políticas prioritarias establecidas en materia de seguridad vial aprobadas en el Plan Nacional de Seguridad Vial (resolución No.4101 de 2014), decidió revisar el manual expedido, con el fin de adoptar a los nuevos desarrollos tecnológicos, al desarrollo vial y modernización de infraestructura de carreteras y calles que ha tenido Colombia, al aumento acelerado del parque automotor, al aumento de viajes urbanos y rurales y a las exigencias de mayor desempeño que debe brindar la señalización vial. Este proyecto cumplirá con el código nacional de tránsito terrestre.

La Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", en el Capitulo VIII del Titulo III, llamado "Trabajos eventuales en la vía pública", tiene consignado lo siguiente:

Artículo 101, Normas para realizar trabajos en la vía pública. Siempre que deben efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y analizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias, e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas.

5. MARCO TEORICO

5.1. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

Es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervengan el espacio público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra. El objetivo del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas o privadas abiertas al público (rurales o urbanas) y en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito.

5.2. CONGESTION VEHICULAR

Habitualmente se entiende como la condición en que existen muchos vehículos circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente, siendo la causa fundamental la fricción entre los vehículos en el flujo de tránsito.

5.3. FLUJO VEHICULAR

Es el número de vehículos que atraviesan una determinada sección de la vía por unidad de tiempo. Esta variable corresponde al flujo promedio en el punto durante el periodo determinado. Por su definición el flujo describe macroscópicamente la circulación.

5.4. CAPACIDAD

Se define como la tasa máxima de flujo que puede soportar una autopista o calle, de manera particular, la capacidad de una infraestructura vial es el máximo número de vehículos que razonablemente pueden pasar por un punto o sección uniforme de un

carril o calzada durante un intervalo de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes de la infraestructura vial, del transito y de los dispositivos de control.

5.5. NIVELES DE SERVICIOS

Es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular, y de su percepción por los conductores y/o pasajeros. Estas condiciones se describen en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de realizar maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial.

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La unidad deportiva se encuentra ubicada en el corregimiento de Manzanillo del Mar, en la Centro Poblado Cr #7c-78.



Ilustración 1. Ubicación del escenario recreo deportivo.

7. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

En el período correspondiente a este informe se realizaron preliminares, movimiento de tierra y cimentaciones, por tanto, fueron utilizadas:

- Volquetas.
- Equipo topográfico (Estacion Total)
- Retroexcavadora.
- Minicargador.
- Vibrocompactador.

Por tal motivo, se requirieron, varias de las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en especial aquellas relacionadas con la movilización de maquinaria pesada, el ingreso y salida de volquetas, las labores de cargue y descargue de materiales y los controles de circulación.

8. TURNO DE TRABAJO

El horario establecido para el proyecto es de Lunes a Viernes de 08:00 am hasta las 5:00 pm y sábado de 08:00 am hasta las 12:00 pm.

9. EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para evitar afectaciones en la programación de la ejecución de la obra, surgio la necesidad de cumplir todo lo contemplado en el Plan de Manejo de Tránsito, con el fin de obtener el avance de estas, también se logró minimizar el impacto de los usuarios de la vía y se garantizó la accesibilidad a los sitios adyacentes al área de influencia directa.

Se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

- Información y divulgación del plan.
- Efectos sobre la circulación del tránsito vehicular.
- Instalación de señales en los desvíos.
- Medidas de señalización vial informativa, preventiva y reglamentaria que alertaron a los conductores de la vía, sobre la restricción a la circulación por motivo del ingreso de materiales, maquinaria y equipos.

9.1. SEÑALIZACION PARA MANEJO DE TRANSITO.

El tiempo de duración de la señalización en el frente de obra es de carácter permanente mientras se ejerce la actividad, para lo cual se considera que es correspondiente al tiempo de ejecución de los trabajos.

Para la instalación, mantenimiento y retiro de los dispositivos de señalización, se tiene en
cuenta los siguientes aspectos:

- Ubicar y conservar adecuadamente las señales durante la ejecución de la obra.
- No obstruir la visibilidad de las señales con equipos o materiales.

- SEÑALIZACION DE INICIO DE OBRA.



Ilustración 2. Señalización de Inicio de Obra

- SEÑALIZACION DE FIN DE OBRA.



Ilustración 3. Señalización de Fin de Obra

- PARE Y SIGA.



Ilustración 4. Señales PARE/SIGA

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la Ley 769 de 2002 y el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, permitió que las actividades se desarrollaran bajo criterios técnicos, de manera que la movilidad vehicular y peatonal durante el desarrollo de las actividades constructivas ejecutadas en el periodo evaluado.

La aplicación de las medidas de señalización, así como la correcta gestión del ingreso y salida de maquinaria, volquetas y equipos de obra, contribuyo a minimizar riesgos de accidentalidad y evitar afectaciones de movilidad entre los habitantes del corregimiento.

En consecuencia, el PMT se consolida como una herramienta fundamental para la gestión integral del tránsito durante la ejecución del proyecto, permitiendo realizar seguimiento continuo y efectuar los ajustes necesarios en las diferentes fases constructivas, garantizando así condiciones seguras y organizadas hasta la culminación de la obra.

LUISA RAMIREZ VERGARA
Ingeniera Civil.
Especialista en Diseño Vial e Ingenieria de Pavimentos.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

innovacionydeporteconsorcio@gmail.com

	CERTIFICADO DE CALIDAD PARA CEMENTO	Código:	F-CC-026
		Versión:	1
		Fecha:	29/04/2024
		Página:	1 de 1

PRODUCTO	CEMENTO ART
PRESENTACIÓN	DATOS DE ACUMULADOS DE DESPACHO
FECHA DEL CERTIFICADO	martes, 20 de enero de 2026
DATOS DEL PROVEEDOR	CEMENTO PAÍS S.A.S Planta Turbaco, Zona Franca Cristalina, km 6, Vereda Aguas Prietas, Vía Campaña Lote B, Manzana 5, Lote I Turbaco, Bolivar
INFORMACIÓN GENERAL	El cemento ART cumple con los requisitos de la Norma Colombiana NTC 121:2023 Los métodos empleados para caracterizar el cemento y verificar el cumplimiento de la norma NTC 121:2023 son los relacionados en el numeral 9 de la misma.
OBSERVACIONES	Los resultados presentados corresponden a las muestras tomadas o acumuladas en la fecha reportada

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

FECHA	A. QUÍMICO	FINURA		Tiempo de Fraguado		RESISTENCIAS			
		NTC 4985	NTC 33	NTC 118		NTC 220			
PARÁMETRO	SO_3	RM325	Blaine	Frag in	Frag fin	1 día	3 días	7 días	28 días
Requisito NTC 121:2023	N/A	N/A	N/A	45-420	N/A	min. 11	min. 22	N/A	N/A
UNIDAD	%	%	cm^2/g	min	min	MPa	MPa	MPa	MPa
25/10/2025	2,47	0,62	4267	140	335	17,7	24,1	31,3	40,8
29/10/2025	2,45	0,55	4418	138	326	16,5	24,5	29,2	37,8
1/11/2025	2,42	0,64	4313	133	347	19,6	28,5	33,6	39,3
5/11/2025	2,39	0,92	4467	133	317	15,7	24,9	29,2	36,2
8/11/2025	2,77	0,67	4402	163	287	16,3	25,0	29,2	37,3
12/11/2025	2,35	0,56	4270	136	325	16,6	26,9	28,1	38,9
15/11/2025	2,48	0,61	4335	145	318	15,0	25,7	28,6	40,1
19/11/2025	2,39	0,63	4328	126	315	16,6	25,7	29,6	39,9
22/11/2025	2,49	0,74	4491	126	324	15,7	24,7	28,8	37,9
24/11/2025	2,41	0,91	4524	150	307	16,4	28,6	31,2	38,6
29/11/2025	2,46	0,70	4441	150	319	17,1	26,1	31,3	39,3
3/12/2025	2,46	0,81	4233	141	332	15,0	24,5	27,8	37,2
4/12/2025	2,59	0,57	4292	139	344	16,1	25,3	28,7	38,9
6/12/2025	2,52	0,50	4212	138	337	16,7	24,9	29,0	39,4
10/12/2025	2,32	0,64	4152	147	334	16,0	27,3	32,3	36,4
13/12/2025	2,47	0,45	4148	152	335	15,6	24,8	30,6	39,1
17/12/2025	2,32	0,47	4382	152	335	16,6	28,0	34,0	37,7
20/12/2025	2,45	0,46	4497	160	330	17,8	27,9	32,1	37,8
27/12/2025	2,43	0,78	4398	158	325	17,9	25,8	30,3	N/D
06/01/2026	2,52	0,56	4396	156	350	16,9	23,6	27,4	N/D
07/01/2026	2,93	0,57	4294	160	348	15,2	24,9	29,2	N/D
10/01/2026	3,08	0,48	4675	162	320	16,1	24,4	N/D	N/D
14/01/2026	2,57	0,47	4989	159	330	17,0	28,8	N/D	N/D
17/01/2026	2,46	0,44	4945	160	325	18,5	N/D	N/D	ND
Datos del periodo	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**23**	**21**	**18**
Promedio	**2,51**	**0,61**	**4411**	**146,84**	**327,71**	**16,61**	**25,86**	**30,07**	**38,48**
Desv Std	0,18	0,14	210,57	11,59	13,97	1,11	1,51	1,69	1,26
Coeficiente de Variación	7,20%	N/D	4,77%	7,89%	4,26%	6,66%	5,83%	5,61%	3,27%

Los resultados de los análisis químicos están calculados en porcentaje en peso.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de producción no disponible

ELABORÓ	Jesus Andres Londoño	FIRMA	
CARGO	Jefe de Control de Calidad		

CEMENTO PAÍS	**CERTIFICADO DE CALIDAD PARA CEMENTO**	**Código:**	F-CC-026
		Versión:	1
		Fecha:	29/04/2024
		Página:	1 de 1

PRODUCTO	**CEMENTO UG**
PRESENTACIÓN	**SACO 50 kg**
FECHA DEL CERTIFICADO	20 de febrero de 2026
DATOS DEL PROVEEDOR	CEMENTO PAÍS S.A.S Planta Turbaco, Zona Franca Cristalina, km 6, Vereda Aguas Prietas, Vía Campaña Lote B, Manzana 5, Lote I Turbaco, Bolivar
INFORMACIÓN GENERAL	El cemento UG cumple con los requisitos de la Norma Colombiana NTC 121:2023 Los métodos empleados para caracterizar el cemento y verificar el cumplimiento de la norma NTC 121:2023 son los relacionados en el numeral 9 de la misma.
OBSERVACIONES	Los resultados presentados son el promedio de las muestras tomadas durante el periodo indicado por el rango de fechas. Se reportan datos de las últimas 7 semanas a partir de la fecha de este certificado. Los resultados individuales pueden variar con respecto del promedio.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

FECHA		**A. QUÍMICO**	**FINURA**		**Tiempo de Fraguado**		**RESISTENCIAS**			
			NTC 4985	**NTC 33**	**NTC 118**		**NTC 220**			
PARÁMETRO		**SO_3**	**RM325**	**Blaine**	**Frag in**	**Frag fin**	**1 día**	**3 días**	**7 días**	**28 días**
Requisito NTC 121:2023		**N/A**	**N/A**	**N/A**	**45-420**	**N/A**	**N/A**	**8,0**	**15,0**	**24,0**
UNIDAD		**%**	**%**	**cm^2/g**	**min**	**min**	**MPa**	**MPa**	**MPa**	**MPa**
7/12/2025	14/12/2025	2,02	5,91	4927	162	327	9,12	15,40	17,96	24,96
15/12/2025	22/12/2025	2,29	5,46	4514	150	300	8,25	15,16	18,96	26,02
23/12/2025	30/12/2025	2,21	5,59	4899	166	320	8,29	15,66	17,65	25,49
31/12/2025	7/01/2026	2,14	6,16	4924	170	330	7,90	15,89	16,69	25,72
8/01/2026	15/01/2026	2,17	5,82	4978	160	320	8,29	14,96	16,89	26,45
16/01/2026	23/01/2026	2,17	5,58	4929	158	325	7,93	15,12	17,15	25,40
24/01/2026	31/01/2026	2,21	5,55	4739	165	330	8,01	15,93	18,05	N/D
Datos totales del periodo		**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**
Promedio general*		2,17	5,72	4844,12	161,45	321,67	8,25	15,45	17,62	25,67
Coeficiente de Variación*		3,8%	4,4%	3,4%	4,0%	3,2%	5,1%	2,5%	4,5%	2,0%

*El promedio general y coeficiente de variación están calculados con la totalidad de los datos del periodo reportado en este certificado
Los resultados de los analisis químicos están calculados en porcentaje en peso.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de producción no disponible

ELABORÓ	Jesus Andres Londoño	**FIRMA**	
CARGO	Jefe de Calidad		

ANTONIO COGOLLO INGENIERIA S.A.S

INGENIERIA CIVIL
Urb. El Recreo CL2 N.80D-23 Telfax: 6618027 - 6816242 Celular: 3157233079
antoniocogollo@hotmail.com ENSAYO DE GRANULOMETRIA Y LIMITES DE ATTERBERG

Para : DISAGRECAR S.A.S
Descripción : TRITURADO CALIZO.(1")

Proyecto : CARACTERIZACION DE MATERIALES.
Localizacion: TURBACO BOLIVAR.
Muestra No: 2
Sondeo No. CANTERA LAS VENTAS.
Fecha: FEB - 13 - 2026

GRANULOMETRIA

P_1 = 8500,00 grs — P_2 = 8449,00 grs

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA
4"			
3 1/2"			
3"			
2 1/2"			
2"			
1 1/2"			
1"	0,0	0,0	100,0
3/4"	3618,0	42,6	57,4
1/2"	4206,0	49,5	8,0
3/8"	341,0	4,0	3,9
No. 4	114,0	1,3	2,6
No. 10	46,0	0,5	2,1
No. 40	0,0	0,0	2,1
No. 100	0,0	0,0	2,1
No. 200	124,0	1,5	0,6
FONDO	51,0	0,6	0,0

LIMITE LIQUIDO


No. DE GOLPES				
RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (grs)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (grs)				
PESO DEL AGUA (grs)				
PESO DEL RECIPIENTE (grs)				
PESO DEL MATERIAL SECO (grs)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				

LIMITE PLASTICO

RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (grs)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (grs)				
PESO DEL AGUA (grs)				
PESO DEL RECIPIENTE (grs)				
PESO DEL MATERIAL SECO (grs)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				

LIMITE LIQUIDO	0,0 %
LIMITE PLASTICO	0,0 %
IND. PLASTICIDAD	0,0 %

I. DE GRUPO	0
A.A.S.H.O.	A-3
U.S.C.	GP

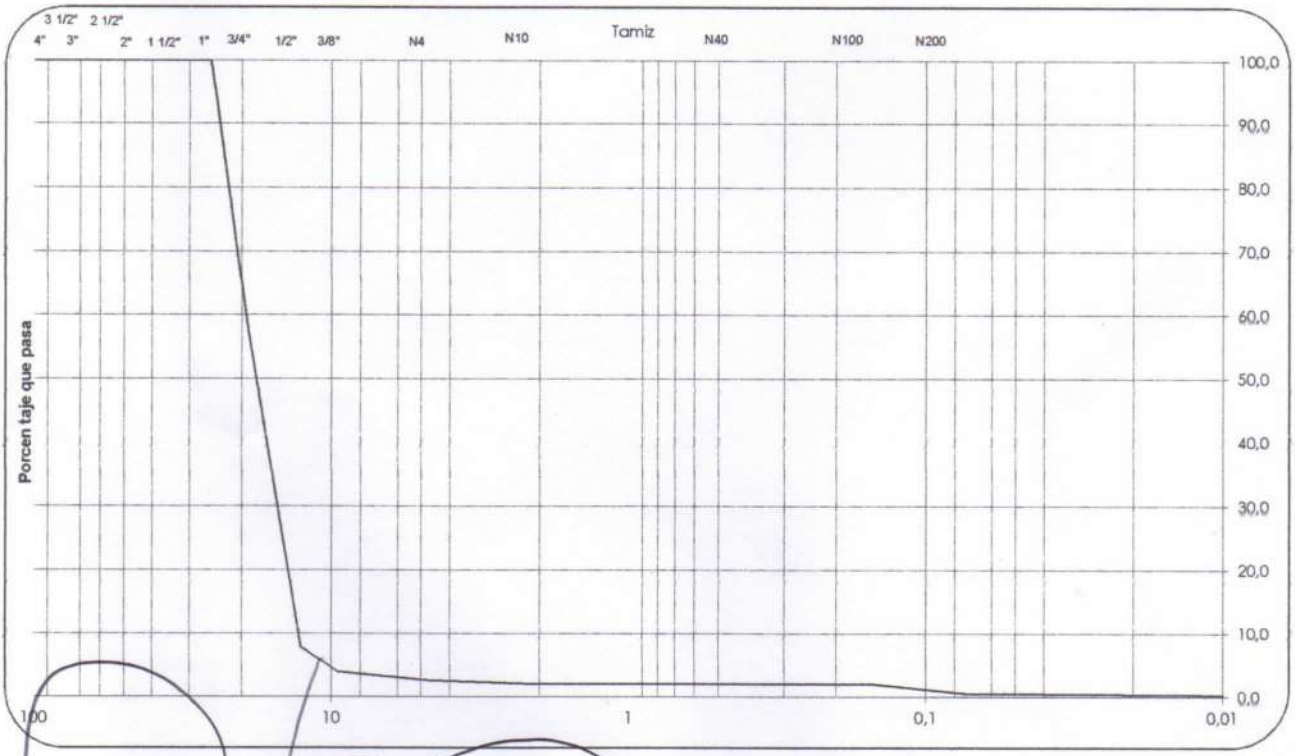

OBSERVACIONES _____

ANTONIO COGOLLO INGENIERIA S.A.S

INGENIERIA CIVIL
Urb. El Recreo Cl.2 N.80D-23 Telfax: 6618027 - 6816242 Celular: 3157233079
antoniocogollo@hotmail.com ENSAYO DE GRANULOMETRIA Y LIMITES DE ATTERBERG

Para : DISAGRECAR S.A.S
Descripción : ZAHORRA AMARILLENTA

Proyecto : CARACTERIZACION DE MATERIALES.
Localizacion: TURBACO BOLIVAR.
Muestra No: 5
Sondeo No. CANTERA LAS VENTAS.
Fecha: FEB -17 2026

GRANULOMETRIA

P_1 = 6353,00 grs P_2 = 4877,00 grs

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA
4"			
3 1/2"			
3"			
2 1/2"			
2"	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	135,0	2,1	97,9
1"	813,0	12,8	85,1
3/4"	419,0	6,6	78,5
1/2"	861,0	13,6	64,9
3/8"	440,0	6,9	58,0
No. 4	787,0	12,4	45,6
No. 10	542,0	8,5	37,1
No. 40	495,0	7,8	29,3
No. 100	258,0	4,1	25,2
No. 200	127,0	2,0	23,2
FONDO	1476,0	23,2	0,0

LIMITE LIQUIDO


No. DE GOLPES	35	28	16
RECIPIENTE No.	1	2	3
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (grs)	58,60	61,10	59,40
PESO RECIP. + MAT. SECO (grs)	55,60	57,10	54,60
PESO DEL AGUA (grs)	3,00	4,00	4,80
PESO DEL RECIPIENTE (grs)	42,40	42,00	38,50
PESO DEL MATERIAL SECO (grs)	13,20	15,10	16,10
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	22,73	26,49	29,81

LIMITE PLASTICO

RECIPIENTE No.	4	5
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (grs)	49,80	45,10
PESO RECIP. + MAT. SECO (grs)	48,20	43,60
PESO DEL AGUA (grs)	1,60	1,50
PESO DEL RECIPIENTE (grs)	39,11	35,25
PESO DEL MATERIAL SECO (grs)	9,09	8,35
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	17,60	17,96

LIMITE LIQUIDO	26,3 %
LIMITE PLASTICO	17,8 %
IND. PLASTICIDAD	8,5 %

I. DE GRUPO	0
A.A.S.H.O.	A-1-b
U.S.C.	GC

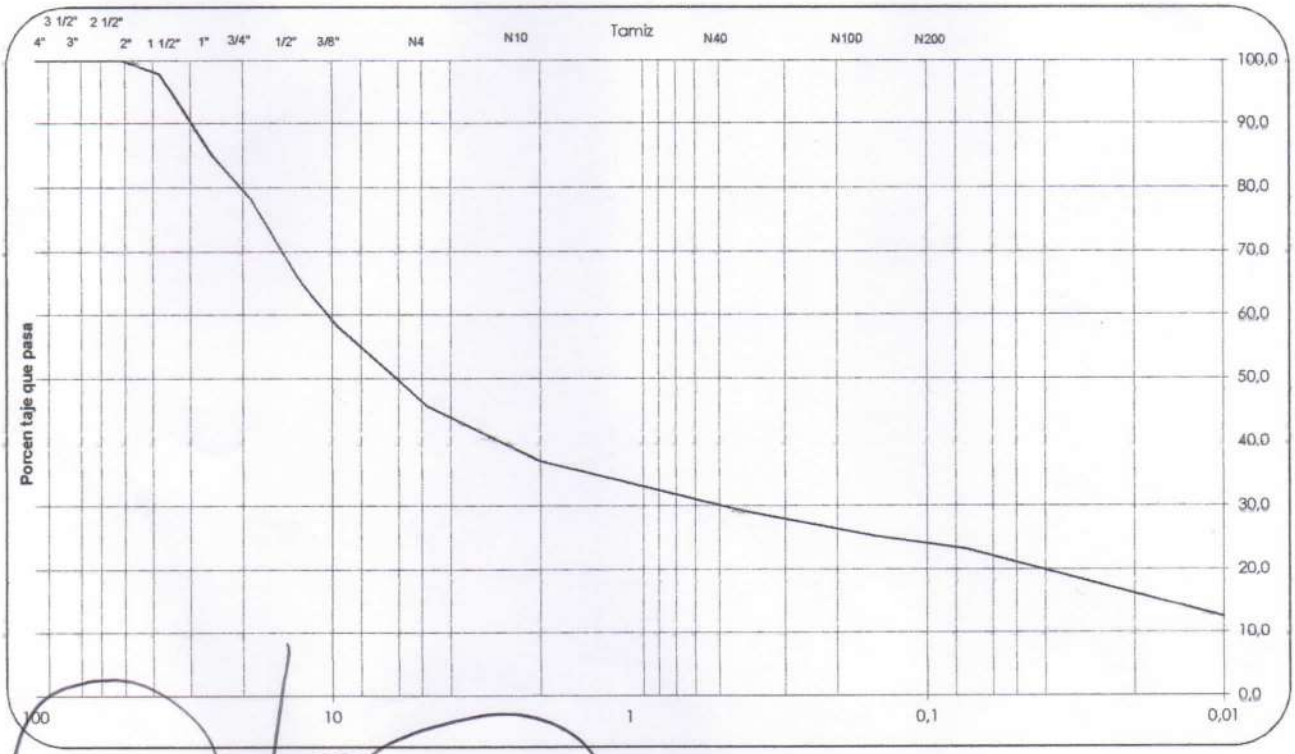

OBSERVACIONES _____

ANTONIO COGOLLO INGENIERIA S.A.S

INGENIERIA CIVIL
Urb. El Recreo CL2 N.80D-23 Telfax: 6618027 - 6816242 Celular: 3157233079
antoniocogollo@hotmail.com ENSAYO DE GRANULOMETRIA Y LIMITES DE ATTERBERG

Para : DISAGRECAR S.A.S
Descripción : TRITURADO CALIZO. (1")

Proyecto : CARACTERIZACION DE MATERIALES.
Localizacion: TURBACO BOLIVAR.
Muestra No: 3
Sondeo No. CANTERA LAS VENTAS.
Fecha: FEB - 13 - 2026

GRANULOMETRIA

	P_1 = 10000,00 grs		P_2 = 10000,00 grs
TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA
4"			
3 1/2"			
3"			
2 1/2"			
2"			
1 1/2"	0,0	0,0	100,0
1"	5008,0	50,1	49,9
3/4"	4336,0	43,4	6,6
1/2"	609,0	6,1	0,5
3/8"	10,0	0,1	0,4
No. 4	0,0	0,0	0,4
No. 10	0,0	0,0	0,4
No. 40	0,0	0,0	0,4
No. 100	0,0	0,0	0,4
No. 200	37,0	0,4	0,0
FONDO	0,0	0,0	0,0

LIMITE LIQUIDO

No. DE GOLPES				
RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (grs)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (grs)				
PESO DEL AGUA (grs)				
PESO DEL RECIPIENTE (grs)				
PESO DEL MATERIAL SECO (grs)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				

LIMITE PLASTICO

RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (grs)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (grs)				
PESO DEL AGUA (grs)				
PESO DEL RECIPIENTE (grs)				
PESO DEL MATERIAL SECO (grs)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				

LIMITE LIQUIDO	0,0 %
LIMITE PLASTICO	0,0 %
IND. PLASTICIDAD	0,0 %

I. DE GRUPO	0
A.A.S.H.O.	A-3
U.S.C.	GP



OBSERVACIONES _____

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22 LAB 041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 GALAPA
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 2025/12/17
Nro.Remisión: 187286120

Nro.Informe: 143284
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472B	1984	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472C	2002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472D	1984	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472E	1954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472F	2002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472X	1948	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472Y	2002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001472Z	1960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473A	1972	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473B	1948	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473C	2002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473D	1984	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473E	1984	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473F	2002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473G	1978	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473H	1984	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001473J	2074	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001348	BFO001472Y	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001472Z	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473A	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473B	0 27	1.24	0 000	0.20	0 007	0 016	0.01	0.01	0 02	0 001	0.48
C8001348	BFO001473C	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473D	0.27	1.24	0.000	0.20	0 007	0.016	0.01	0.01	0 02	0 001	0.48
C8001348	BFO001473E	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473F	0.27	1.24	0 000	0.20	0 007	0.016	0.01	0.01	0 02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473G	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473H	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001473J	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001472X	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001472B	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001472C	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001472D	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48
C8001348	BFO001472E	0 27	1.24	0 000	0.20	0 007	0.016	0.01	0.01	0 02	0.001	0 48
C8001348	BFO001472F	0.27	1.24	0.000	0.20	0.007	0.016	0.01	0.01	0.02	0.001	0.48

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001348	BFO001472Y	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001472Z	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001473A	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001473B	494	621	17.6	SinGrieta	1.26	20251216
C8001348	BFO001473C	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001473D	494	621	17.6	SinGrieta	1.26	20251216
C8001348	BFO001473E	494	621	17.6	SinGrieta	1.26	20251216
C8001348	BFO001473F	494	621	17.6	SinGrieta	1.26	20251216
C8001348	BFO001473G	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001473H	494	621	17.6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001473J	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001472X	494	621	17.6	SinGrieta	1.26	20251216
C8001348	BFO001472B	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001472C	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001472D	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001472E	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216
C8001348	BFO001472F	494	621	17 6	SinGrieta	1 26	20251216

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C8001348	BFO001472Y	8 18	0.970	0 74	2 52
C8001348	BFO001472Z	8 18	0.970	0.74	2.52
C8001348	BFO001473A	8 18	0 970	0.74	2 52
C8001348	BFO001473B	8 18	0.970	0 74	2.52
C8001348	BFO001473C	8 18	0.970	0 74	2.52
C8001348	BFO001473D	8.18	0.970	0.74	2.52
C8001348	BFO001473E	8 18	0.970	0.74	2.52
C8001348	BFO001473F	8.18	0.970	0.74	2.52
C8001348	BFO001473G	8 18	0.970	0 74	2.52
C8001348	BFO001473H	8 18	0 970	0 74	2.52
C8001348	BFO001473J	8 18	0.970	0 74	2.52
C8001348	BFO001472X	8.18	0.970	0.74	2.52
C8001348	BFO001472B	8 18	0 970	0.74	2.52
C8001348	BFO001472C	8 18	0.970	0.74	2.52
C8001348	BFO001472D	8 18	0 970	0 74	2 52
C8001348	BFO001472E	8 18	0.970	0 74	2 52
C8001348	BFO001472F	8 18	0 970	0 74	2 52

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8 1.1, 9 3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: STECKERL CARTAGENA USD
Dirección: CRT BOSQUE TV 54 DG 30 MAMONAL CARTAGENA
Teléfono: 3106303250

Fecha Impresión: 2025/12/27
Nro.Remisión: 187288109

Nro.Informe: 145125
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001581X	1936	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001581Y	1973	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001581Z	1992	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582A	1908	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582E	1945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582F	1945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001582G	1964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583L	2001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583M	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583N	2010	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO001583P	1973	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016030	1917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016031	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016032	1964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016033	1889	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016034	1917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0016072	1843	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
*Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001349	BFO0016030	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016031	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016032	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016033	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016034	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO0016072	0.28	1.18	0.000	0.21	0.005	0.016	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001581X	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001581Y	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001581Z	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582A	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582E	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582F	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001582G	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583L	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583M	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583N	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001349	BFO001583P	0.28	1.19	0.000	0.22	0.006	0.021	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001349	BFO0016030	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016031	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016032	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016033	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016034	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO0016072	489	628	17.52	SinGrieta	1.28	20251221
C8001349	BFO001581X	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001581Y	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001581Z	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582A	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582E	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582F	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001582G	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583L	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583M	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583N	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220
C8001349	BFO001583P	512	643	17.77	SinGrieta	1.26	20251220

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C8001349	BFO0016030	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016031	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016032	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016033	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016034	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO0016072	10.02	1.534	0.83	4.21
C8001349	BFO001581X	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001581Y	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001581Z	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582A	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582E	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582F	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001582G	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583L	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583M	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583N	10.20	1.535	0.92	3.82
C8001349	BFO001583P	10.20	1.535	0.92	3.82

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 Página Web: www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 GALAPA
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 2026/01/06
Nro.Remisión: 187293387

Nro.Informe: 146143
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831S	2044	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001831T	2008	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831U	2074	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001831V	2008	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831X	2014	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001831Y	2032	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001831Z	2014	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001832A	2014	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO001832B	2032	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO001832C	2032	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO0018519	2038	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO0018520	2050	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO0018521	2050	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO0018522	2074	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO0018523	2062	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1 2"(No.4) 6m NTC2289 G60	BFO0018524	2056	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001348	BFO001831S	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831T	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831U	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831V	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001832C	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001832B	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001832A	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831Z	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831Y	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48
C8001348	BFO001831X	0.28	1.19	0.000	0.21	0.004	0.014	0.01	0.01	0.01	0.000	0.48

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001348	BFO001831S	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831T	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831U	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831V	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001832C	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001832B	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001832A	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831Z	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831Y	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO001831X	474	608	17.5	SinGrieta	1.28	20260104
C8001348	BFO00018519	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018520	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018521	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018522	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018523	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105
C8001348	BFO00018524	464	600	18.4	SinGrieta	1.29	20260105

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C8001348	BFO001831S	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831T	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831U	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831V	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001832C	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001832B	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001832A	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831Z	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831Y	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO001831X	7.95	0.972	0.71	2.28
C8001348	BFO0018519	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018520	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018521	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018522	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018523	8.00	0.966	0.73	2.29
C8001348	BFO0018524	8.00	0.966	0.73	2.29

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastian Carmona Restrepo

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 13743006-1

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 25 de octubre del 2025
CLIENTE: ESNEIDER TORRES OROZCO
CEDULA: 1051890129

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: TOPCON	|MODELO:AT-B4
TIPO: NIVEL	SERIAL: JZ9159

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumento	32X
Apertura	30mm
Campo de visión	1°30

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL	
Precisión en mm de nivelación por km. doble	| + 2.0mm
Distancia mínima focal	| 0.5m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	| + 15

AJUSTES REALIZADOS

- El eje vertical perpendicular al plato del aparato (nivel) en buenas condiciones
- El nivel del equipo en sus giros de 0 90 180 270 360 grados sé encontró en su centro
- La línea de nivel en sus giros 0 90 180 270 360 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- Los tornillos tangenciales del equipo se encuentran en optima condición de uso
- El eje del automático no presenta bloque y está en condiciones óptima.

FECHA DE VENCIMIENTO

26 de abril de 2026

X

Aprobado rechazado

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o trasporte del mismo.

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 13743006-1

MARCA: TOPCON	MODELO: AT-B4	
TIPO: NIVEL	SERIAL: JZ 9159	
N° Placa de calibración: EP 792		
DATOS DEL COLIMADOR		
Collimator: Hillier and watts Precision: 0.00	Modelo: TA50	Serial :151170
PreclaIón:0.5seg	Rango: 10min	Alcance ocular :1.140seg
Lectura retículo: **micrómetro**	Distancia máxima 30M a 90 Ft	

TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Exterior	Condiciones
Batería	No aplica
Chequeo del desplaye y del teclado	No aplica
Cobertura externa	Aplica
Lente de la plomada óptica	No aplica
Lentes (ocular - objetivo)	Aplica
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aplica
Mantenimiento *Interno*	*Condiciones*
Ajuste de compensador automático	Aplica
Ajuste de plomada óptica o laser	No aplica
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aplica
Ajuste del nivel tubular	Aplica
Ajuste del retículo	Aplica
Ajuste del sistema de enfoque	Aplica
Colimación del instrumento	Aplica
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo	Aplica
Miras de puntería	Aplica
Resolución	Aplica
Tornillos base nivelante	Aplica

Condiciones de funcionamiento **Excelente**

Novedades presentadas: Ninguna

Observaciones:

Edgar Augusto Pinto Moreno.
TECNICO DE CALIBRACIÓN
CONTACTO: 3153022628-3157243479

ANEXO 10. COMUNICACIONES

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

CONSORCIO
PERSEVERAR
DEPORTIVO CARTAGENA

COMUNICACIONES ENVIADAS

INT-PDP-IDER–220126-1

Cartagena. 22 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Solicitud de información inicial – Contrato de obra No. 1375-2025

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

En atención a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 1389-2025, celebrado con el INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER, y cuyo objeto corresponde a la Interventoría Integral del contrato de obra No. 1375-2025, nos permitimos presentarnos formalmente como CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO, en calidad de interventores del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".**

Con el propósito de adelantar las actividades de revisión, verificación y alistamiento técnico, administrativo y financiero, necesarias para una adecuada planeación y organización del contrato, en concordancia con las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra y las funciones propias de la Interventoría, y en relación a la suscripción del acta de inicio de obra, agradecemos de manera atenta remitir la siguiente información:

1. Cronograma de ejecución y pagos.
2. Hojas de vida del personal profesional y técnico propuesto para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes.
3. Cronograma de obra preliminar, acorde al plazo contractual establecido.
4. Presupuesto definitivo del contrato, correspondiente a la propuesta económica adjudicada.
5. Análisis de precios unitarios (APU) definitivos, asociados a los ítems contractuales.
6. Plan de manejo e inversión del anticipo, teniendo en cuenta que el contrato contempla un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor contractual, para efectos de su revisión por parte de la Interventoría.
7. Pólizas iniciales del contrato de obra, constituidas conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso de selección para la verificación de amparos, valores asegurados y vigencias.

La información solicitada permitirá a esta Interventoría adelantar de manera ordenada la revisión inicial del contrato, estructurar el expediente técnico correspondiente y dejar preparados los insumos necesarios para las siguientes etapas del proyecto, garantizando el cumplimiento de las condiciones contractuales y normativas aplicables.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Agradecemos de antemano su apoyo con la información solicitada y quedamos atentos para coordinar de manera conjunta cualquier aclaración que se requiera en esta etapa inicial del proyecto.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–220126-2

Cartagena. 22 de enero de 2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
Atn. Karen Katherine Velásquez Rojano
infraestructura@ider.gov.co
Asesora Oficina de Infraestructura
Supervisora

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Remisión de solicitud presentada por el Contratista de obra para el inicio de trámites de provisión y suministro de energía eléctrica ante AFINIA S.A. E.S.P.

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

En el marco del Contrato de Interventoría No. 1389-2025, nos permitimos presentarnos formalmente ante el IDER como Interventores del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, encargados del seguimiento técnico, administrativo y contractual del mismo.

En desarrollo de nuestras funciones, nos permitimos remitir la solicitud presentada por el Contratista de obra CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE mediante oficio OFC-001-2026 del 22 de enero de 2026, mediante la cual manifiestan la necesidad de contar con determinada documentación y autorización por parte del propietario del predio, para adelantar el trámite de provisión y suministro del servicio de energía eléctrica ante AFINIA S.A. E.S.P.

De acuerdo con lo indicado por el Contratista, para la realización del trámite mencionado se requiere autorización del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, junto con la siguiente documentación:

- Carta de autorización firmada por el representante legal del DISTRITO DE CARTAGENA o la persona delegada por el mismo.
- Acta de posesión del autorizante.
- Copia de cédula del autorizante.
- Certificado de libertad y tradición del predio donde se ejecutará la obra.

En este sentido, respetuosamente solicitamos el apoyo del IDER para la remisión a esta Interventoría de la documentación anteriormente relacionada, requerida para que el Contratista de obra pueda continuar con el trámite correspondiente ante la empresa prestadora del servicio, necesario para la adecuada ejecución del proyecto.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

La Interventoría permanece atenta a la recepción de la información solicitada y a cualquier coordinación adicional que se requiera dentro del alcance de sus funciones.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Anexos: Oficio 001-2026 CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
Carta de autorización en formato .docx

Copia: Andrea Plaza Sánchez – Representante Legal – CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–270126-1

Cartagena. 27 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
innovacionydeporteconsorcio@gmail.com
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Respuesta a oficio OFC-001-2026: Documentación requerida para el inicio de trámites de provisión y suministro de energía eléctrica ante AFINIA S.A. E.S.P.

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoría, y en el marco de la ejecución del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENSARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, nos permitimos dar respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio OFC No.001-2026 del 22 de enero de 2026, la cual fue remitida al INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - IDER por medio de oficio INT-PDC-220126-2 del 22 de enero de 2026.

En atención a lo anterior, y una vez recibida la respuesta por parte del IDER, se procede a remitir la documentación correspondiente, necesaria para la continuidad de los trámites ante AFINIA S.A. E.S.P., relacionada con la conexión provisional y definitiva del servicio de energía eléctrica del proyecto, a saber:

- Oficio IDER-OFI-00020-2026 donde se autoriza al CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE identificado con NIT 902.016.232-4 y a su Ingeniero EFRAIM DE JESÚS GUERRA MALO C.C. 8.850.827 de C/gena, para realizar los trámites de apertura del proyecto.
- Acta de posesión del autorizante.
- Copia de cédula del autorizante.
- Certificado de libertad y tradición del predio donde se ejecutará la obra.
- Oficio IDER-OFI-00021-2026 dirigido por parte de IDER a la Oficina de Apoyo Logístico y la Secretaria general, mediante el cual se solicita su acompañamiento para el trámite en mención.

Con la remisión de la documentación relacionada, se considera atendida la solicitud formulada mediante el oficio de la referencia. En consecuencia, el CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE podrá continuar con la gestión correspondiente ante AFINIA S.A. E.S.P., conforme a los requisitos establecidos para dicho trámite.

La Interventoría permanecerá atenta a brindar el acompañamiento que se requiera, dentro del alcance de sus funciones contractuales.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Anexos: Oficio IDER-OFI-00020-2026
Acta de posesión director IDER / Copia de la cédula director IDER
Certificado de libertad y tradición manzanillo
Oficio IDER-OFI-00021-2026

Copia: Karen Velásquez Rojano – Supervisora – IDER - infraestructura@ider.gov.co

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–280126-1

Cartagena. 28 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
innovacionydeporteconsorcio@gmail.com
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
Atn. Karen Katherine Velásquez Rojano
infraestructura@ider.gov.co
Asesora Oficina de Infraestructura
Supervisora

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Aprobación del plan de inversión del anticipo – Contrato de obra 1375-2025.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de Interventoría de la referencia mediante el cual se ejerce la Interventoría integral al contrato de obra No. 1375-2025, y una vez revisado el Plan de Manejo e Inversión del Anticipo presentado por el CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE, esta Interventoría se permite informar lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en la CLAUSULA SEXTA – Anticipo y/o pago anticipado del contrato de obra, la cual dispone: *la Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo"*, así como que *"ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor"*, se procedió a realizar la revisión técnica, administrativa y financiera del plan remitido por el contratista (Ilustración 1).

Como resultado de dicha revisión, se verificó que el Plan de Manejo e Inversión del Anticipo, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, equivalente a $2.185.461.576,60 M/CTE, se encuentra debidamente estructurado, guarda coherencia con el objeto contractual y destina los recursos directamente a la ejecución de la obra, conforme a las condiciones contractuales vigentes.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE
CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025

PLAN DE INVERSIÓN

CONSORCIO
INNOVACIÓN Y DEPORTE

		VALOR TOTAL DEL ANTIICPO	$ 2.185.461.576,60
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE**
1	**Personal Obra - Administrativo**		
1.1	Salarios y Jornales	$ 135.000.000,00	6,2%
1.2	Dotación - Elementos EPP	$ 30.000.000,00	1,4%
2	**Materiales y Equipos**		0,0%
2.1	Materiales de Construcción	$ 633.382.899,00	29,0%
2.2	Equipos de Construcción necesarios	$ 119.338.031,00	5,5%
2.3	Herramientas Menores	$ 55.044.824,00	2,5%
2.4	Suministros	$ 1.147.371.556,00	52,5%
3	**Transporte**		0,0%
3.1	Transporte de materiales y equipos	$ 65.324.266,60	3,0%
	TOTAL	$ 2.185.461.576,60	100%

Ilustración 1. Plan de inversión del anticipo suministrado por el contratista de obra.
Fuente: Contratista CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE.

En consecuencia, esta Interventoría, actuando en los términos contractuales y como instancia técnica de la entidad, emite concepto favorable y avala el Plan de Manejo e Inversión del Anticipo, para los fines administrativos y contractuales correspondientes, incluido el trámite de constitución y aprobación del patrimonio autónomo y del contrato de fiducia mercantil por parte del contratista.

La presente aprobación se otorga sin perjuicio del control y seguimiento posterior que ejercerá esta Interventoría sobre la correcta ejecución, legalización, amortización y destinación de los recursos del Anticipo, así como sobre los desembolsos que se realicen con cargo al patrimonio autónomo, de conformidad con lo previsto en el contrato de obra.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Anexos: Programa de Inversión del anticipo Contrato 1375-2025

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–300126-1

Cartagena. 30 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
innovacionydeporteconsorcio@gmail.com
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Respuesta a oficio 002-2026 – Aprobación al programa de ejecución de obra.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de Interventoría de la referencia y en el desarrollo de las actividades del seguimiento y control del contrato de obra No. 1375-2025 cuyo objeto son las **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENSARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, esta Interventoría se permite emitir pronunciamiento respecto al programa de obra adjunto remitido por el Contratista mediante oficio No. 002-2026 del 27 de enero de 2026.

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas a esta Interventoría, particularmente las relacionadas con la revisión y aprobación de la documentación técnica del contrato de obra, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Interventoría No. 1389-2025 CLAUSULA 10, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, la cual establece:

> "*3. Documentos para la revisión, seguimiento y control de obra. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: (…) d) Programa de obra."*

De igual manera, el Contrato de Obra No. 1375-2025 en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Literal I. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, establece expresamente que el Contratista,

> *"2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de Interventoría, el Contratista enviará para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación: (…) d) Programa de obra."*

En atención a lo anterior, y una vez realizada la revisión técnica del Programa de Obra remitido, esta Interventoría manifiesta su aprobación, al verificar que el mismo se encuentra ajustado al plazo contractual, al alcance del objeto del contrato y a una secuencia lógica de actividades que permite el adecuado seguimiento y control del avance físico y financiero del proyecto.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

En consecuencia, el Programa de Obra aprobado se constituye como elemento base para el seguimiento y control de la ejecución del contrato, sin perjuicio de los ajustes que puedan requerirse durante el desarrollo del proyecto, los cuales deberán ser previamente presentados para revisión y aprobación por parte de esta Interventoría, conforme a lo establecido contractualmente (Literal 24, CLAUSULA 10, Contrato de Interventoría).

La aprobación otorgada no exonera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni limita las facultades de control de esta Interventoría.

El presente oficio se remite con copia al INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

Anexos: Programa de obra Contrato 1375-2025 CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

Copia: Karen Velásquez Rojano – Supervisora – Oficina Infraestructura IDER – infraestructura@ider.gov.co

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

CONSORCIO PERSEVERAR
DEPORTIVO CARTAGENA

INT-PDC-IDER–020226-1

Cartagena. 30 de enero de 2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
infraestructura@ider.gov.co
Karen Katherine Velásquez Rojano
Asesora Oficina de Infraestructura
Supervisora

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Remisión de planes de ejecución y pago de obra y de Interventoría.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de Interventoría de la referencia y en el desarrollo de las actividades del seguimiento y control del contrato de obra No. 1375-2025 cuyo objeto son las **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENSARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, esta Interventoría se permite remitir el plan de ejecución y pagos del contrato de Interventoría No. 1389-2025, así como el plan de desembolso del contrato de obra 1375-2025, este último recibido por parte del Contratista CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE, mediante oficio 002-2026 del 27 de enero de 2026.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

Anexos: Plan de desembolso y pagos – CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
Plan de desembolso – CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

Copia: Karen Velásquez Rojano – Supervisora – Oficina Infraestructura IDER – infraestructura@ider.gov.co

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–020226-2

Cartagena. 2 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
innovacionydeporteconsorcio@gmail.com
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Respuesta a oficio 002-2026 – Revisión con observaciones de hojas de vida de personal de obra.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de Interventoría de la referencia y en el desarrollo de las actividades del seguimiento y control del contrato de obra No. 1375-2025 cuyo objeto son las **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENSARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, esta Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales – en especial lo dispuesto en la CLAÚSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR del contrato de Interventoría la cual establece:

> *"3. Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: a) Hojas de vida del personal profesional."*

Así como en atención a lo señalado en el Anexo Técnico de Obra CCE-EICP-IDI-32 LOTE 4, documento que hace parte integral y esencial del contrato, en el cual se definen los requisitos del personal mínimo obligatorio para la ejecución del proyecto, informa lo siguiente:

> *"8.2. Requisitos del personal del Contratista: El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:*

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
1	DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Posgrado en el área de Gerencia de Proyectos.	Experiencia General: No menor de diez (10) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	a) Experiencia Específica: Acreditar la participación, como director de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la Construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de la experiencia a acreditar al menos uno de los proyectos debe estar relacionado con construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o adecuación de unidades deportivas.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

2	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA	Posgrado en el área de Gerencia de Proyectos.	Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	a) Experiencia Específica: Acreditar la participación, como Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a Participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de la experiencia a acreditar al menos uno del proyecto debe estar relacionado con construcción y/o mejoramiento mantenimiento y/o adecuación de unidades deportivas.
3	PROFESIONAL HSEQ	Ingeniero Civil o Industrial o ambiental y sanitario o profesional en salud ocupacional, el profesional deberá acreditar la licencia en seguridad y en salud para el trabajo	N.A	Experiencia General: No menor de tres (3) años, contada partir de la fecha de expedición la licencia en salud.	Acreditar la participación como profesional HSEQ (supervisor y/o residente y/o director y/o coordinador de calidad, seguridad industrial, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo) en por lo menos 2 proyectos de obras civiles.
4	MAESTRO DE OBRA	TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN O AFINES, ACREDITADO POR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNÓLOGA O SUPERIOR CON REGISTRO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN con matrícula profesional vigente.	N.A	Experiencia General: No menor de dos (2) años, contada a partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	Acreditar un (1) año de experiencia como maestro de obra en proyectos de construcción de obras civiles.
5	INGENIERO ELÉCTRICO	Ingeniero Eléctrico o Electrónico.	N.A	Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	Acreditar la participación, como Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de experiencia a acreditar al menos uno de los proyecto debe estar relacionado con RETIE y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de unidades deportivas..

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada."

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Una vez realizada la revisión técnica y documental de las hojas de vida remitidas por el Contratista de obra, esta Interventoría se permite formular las siguientes observaciones, las cuales deberán ser atendidas para efectos de su aprobación:

PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TITULO REQUERIDO	CUMPLE		EXPERIENCIA REQUERIDA	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SÍ	NO		SÍ	NO	
DIRECTOR DE OBRA	Ricardo Latorre Rico	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Arquitectura e Ingeniería	X		Experiencia General: No menor de diez (10) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
		Posgrado en el área de gerencia de proyectos	X		a) Experiencia Específica: Acreditar la participación, como director de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la Construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de la experiencia a acreditar al menos uno de los proyectos debe estar relacionado con construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o adecuación de unidades deportivas.	X		
RESIDENTE DE OBRA	Stefany Parra Mercado	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Arquitectura e Ingeniería	X		Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
		Posgrado en el área de gerencia de proyectos			a) Experiencia Específica: Acreditar la participación, como Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de		X	No certifica experiencias relacionadas con unidades deportivas

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

					obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a Participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de la experiencia a acreditar al menos uno del proyecto debe estar relacionado con construcción y/o mejoramiento mantenimiento y/o adecuación de unidades deportivas.			
INGENIERO ELÉCTRICO	Efraim de Jesus Guerra Malo	Ingeniero electrico o electronico	X		Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
					Acreditar la participación, como Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de experiencia a acreditar al menos uno de los proyecto debe estar relacionado con RETIE y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de unidades deportivas..	X		
PROFESIONAL HSEQ	Katri del Carmen Orozco Campo	Ingeniero Civil o Industrial o ambiental y sanitario o profesional en salud ocupacional, el profesional deberá acreditar la licencia en seguridad y	X		Experiencia General: No menor de tres (3) años, contada partir de la fecha de expedición la licencia en salud.	X		
					Acreditar la participación como profesional HSEQ (supervisor y/o residente y/o director y/o coordinador de calidad, seguridad industrial, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo) en por lo menos 2 proyectos de obras civiles.	X		

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

		en salud para el trabajo						
MAESTRO DE OBRA	Jose David Causil Torres	Técnico o tecnólogo en construcción o afines, acreditado por Institución de Educación Técnica, tecnóloga o superior con registro expedido por el Ministerio de Educación con matricula profesional vigente	X		Experiencia General: No menor de dos (2) años, contada a partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
					Acreditar un (1) año de experiencia como maestro de obra en proyectos de construcción de obras civiles.	X		

Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra debidamente suscrita el acta de inicio del contrato de obra, se solicita al Contratista de obra remitir la subsanación de las observaciones señaladas, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente oficio.

Agradecemos su colaboración y disposición, reiterando la voluntad de esta Interventoría de mantener una comunicación clara, respetuosa y permanente, orientada al adecuado desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

Anexos: Of 002-2026 – Hojas de vida del personal de obra.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–020226-3

Cartagena. 2 de febrero de 2026

Señores
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
María Isabel Mendoza Pernett
Asesora Comercial Fiducia Estructurada

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Aprobación de apertura y continuidad de contrato de fiducia.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.157.731 manifiesto de manera expresa mi aprobación como Interventoría para la apertura de la fiducia y mi conformidad con el contrato remitido por la Fiduciaria Davivienda S.A., autorizando así dar continuidad al proceso y a la formalización del mismo.

En consecuencia, autorizo a Fiduciaria Davivienda S.A. a continuar con los trámites necesarios para la ejecución y puesta en marcha del contrato, de acuerdo con las condiciones allí establecidas.

La presente se expide para los fines pertinentes.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
N.I.T. 902.024.954-7
consorcioperseverardeportivo@gmail.com

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

INT-PDC-IDER–060226-1

Cartagena. 6 de febrero de 2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
Atn. Karen Katherine Velásquez Rojano
infraestructura@ider.gov.co
Asesora Oficina de Infraestructura
Supervisora

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Remisión de hojas de vida del personal de Interventoría.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y en el marco de la ejecución del contrato de Interventoría de la referencia, nos permitimos radicar ante esa Entidad las hojas de vida del personal de Interventoría requerido, para su conocimiento, revisión y archivo correspondiente.

El personal relacionado cumple con los perfiles, experiencia y requisitos exigidos en los documentos contractuales y técnicos del contrato, conforme a lo establecido para la adecuada ejecución de las actividades de Interventoría.

A continuación, se presenta el cuadro resumen del personal remitido, el cual puede ser complementado con la documentación soporte anexa:

PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TITULO REQUERIDO	CUMPLE		REQUERIMIENTO	CUMPLE	
			SÍ	NO		SÍ	NO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Paola Alejandra Villadiego García	Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero de Vías	X		Experiencia general mínimo de 12 años	X	
		Posgrado en el área de gerencia de proyectos	X		Experiencia específica: 5 años de experiencia en interventoría a proyectos de escenarios deportivos	X	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Pedro Claver Elles Royo	Ingeniero Civil o Arquitecto	X		Experiencia general mínimo de 8 años	X	
					Experiencia específica: 3 años de experiencia en interventoría a proyectos de escenarios deportivos	X	

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORÍA	Michael David Acevedo Martínez	Técnico o tecnólogo o profesional en el área SST	X		Experiencia general mínimo de 4 años	X	
					Experiencia específica: 2 años de experiencia en interventoría a proyectos de escenarios deportivos		
TOPOGRAFO	Sergio Alejandro Tellez Pardo	Técnico o tecnólogo o profesional en el área de topografía	X		Experiencia general mínimo de 2 años	X	
					Experiencia específica: 1 año de experiencia en interventoría a proyectos de escenarios deportivos	X	

Los respectivos soportes se adjuntan al presente oficio para los fines pertinentes.

Agradecemos se sirvan acusar recibido y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que esa Entidad considere necesario.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Anexos: Soporte hojas de vida interventoría

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–110226-1

Cartagena. 11 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
innovacionydeporteconsorcio@gmail.com
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Respuesta a oficio 003-2026 – Aprobación de hojas de vida de personal de obra.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de Interventoría de la referencia y en el desarrollo de las actividades del seguimiento y control del contrato de obra No. 1375-2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, esta Interventoría se permite informar lo siguiente:

Mediante oficio No. 002-2026 del 27 de enero de 2026, el Contratista de obra remitió la documentación correspondiente a las hojas de vida del personal, junto con sus respectivos soportes, para revisión por parte de esta Interventoría. Posteriormente, mediante oficio INT-PDC-IDER-020226-2 del 2 de febrero de 2026, esta Interventoría formuló observaciones respecto a la hoja de vida del RESIDENTE DE OBRA, frente a lo cual el Contratista allegó oficio No. 003-2026 del 4 de febrero de 2026 mediante el cual presentó la correspondiente subsanación.

Una vez realizada la revisión técnica y documental de la información aportada, y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico CCE-EICP-IDI32 – Lote 4, esta Interventoría se permite aprobar los perfiles presentados, de la siguiente manera:

PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TITULO REQUERIDO	CUMPLE		EXPERIENCIA REQUERIDA	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SÍ	NO		SÍ	NO	
DIRECTOR DE OBRA	Ricardo Latorre Rico	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Arquitectura e Ingeniería	X		Experiencia General: No menor de diez (10) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

		Posgrado en el área de gerencia de proyectos	X		a) Experiencia Específica: Acreditar la participación, como director de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la Construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de la experiencia a acreditar al menos uno de los proyectos debe estar relacionado con construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o adecuación de unidades deportivas.	X		
RESIDENTE DE OBRA	Stefany Parra Mercado	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Arquitectura e Ingeniería			Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
		Posgrado en el área de gerencia de proyectos	X		a) Experiencia Específica: Acreditar la participación, como Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a Participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de la experiencia a acreditar al menos uno del proyecto debe estar relacionado con construcción y/o mejoramiento mantenimiento y/o adecuación de unidades deportivas.	X		Contratista aporto certificación corregida en la cual manifiesta expresamente experiencia en adecuación de unidades deportivas, subsanando la observación realizada por esta Interventoría

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INGENIERO ELÉCTRICO	Efraim de Jesus Guerra Malo	Ingeniero electrico o electronico	X		Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
					Acreditar la participación, como Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los dos. Dentro de experiencia a acreditar al menos uno de los proyectos debe estar relacionado con RETIE y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de unidades deportivas.	X		
PROFESIONAL HSEQ	Katri del Carmen Orozco Campo	Ingeniero Civil o Industrial o ambiental y sanitario o profesional en salud ocupacional, el profesional deberá acreditar la licencia en seguridad y en salud para el trabajo	X		Experiencia General: No menor de tres (3) años, contada partir de la fecha de expedición la licencia en salud.	X		
					Acreditar la participación como profesional HSEQ (supervisor y/o residente y/o director y/o coordinador de calidad, seguridad industrial, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo) en por lo menos 2 proyectos de obras civiles.	X		
MAESTRO DE OBRA	Jose David Causil Torres	Técnico o tecnólogo en construcción o afines, acreditado por Institución de Educación	X		Experiencia General: No menor de dos (2) años, contada a partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre del presente proceso.	X		
					Acreditar un (1) año de experiencia	X		

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

		Técnica, tecnóloga o superior con registro expedido por el Ministerio de Educación con matricula profesional vigente			como maestro de obra en proyectos de construcción de obras civiles.			

Teniendo en cuenta lo anterior, y verificado el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia general y específica exigidos en los documentos del proceso, esta Interventoría APRUEBA las hojas de vida del personal de obra relacionado anteriormente, para efectos de su vinculación al proyecto.

La presente aprobación se emite en el marco de las obligaciones contractuales de seguimiento y control, sin perjuicio de la verificación permanente del cumplimiento de las funciones asignadas a cada profesional durante la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

Anexos: Of 002-2026 / Of 003-2026 / INT-PDC-IDER-020226-2
Carpeta hojas de vida aprobadas.pdf

Copia: Karen Katherine Velásquez Rojano – IDER – infraestructura@ider.gov.co

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

CONSORCIO PERSEVERAR
DEPORTIVO MANZANILLO

INT-PDC-IDER–130126-1

Cartagena. 13 de febrero de 2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
Atn. Karen Katherine Velásquez Rojano
infraestructura@ider.gov.co
Asesora Oficina de Infraestructura
Supervisora

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Remisión de documentos para revisión, seguimiento y control del contrato de obra.

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

En atención a lo solicitado por esa Entidad y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1389-2025, nos permitimos remitir para su revisión, seguimiento y control, el siguiente paquete documental correspondiente al Contrato de obra 1375-2025:

1. Programa de obra aprobado.
2. Presupuesto definitivo del contrato, correspondiente a la propuesta económica adjudicada.
3. APUS de los ítems contractuales.
4. Documentación de maquinaria y equipos.
5. Pólizas iniciales y actualizadas a acta de inicio del contrato de obra y del contrato de Interventoría.
6. Programa de Gerencia de Proyectos.
7. Plan de Calidad.
8. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Plan de Manejo Ambiental (PMA).

La documentación relacionada se remite en medio digital, debidamente organizada e identificada para su respectiva verificación.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que considere pertinente esa Entidad.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Anexos: Documentación relacionada.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

CONSORCIO PERSEVERAR
DEPORTIVO MANZANILLO

INT-PDC-IDER–130226-2

Cartagena. 13 de febrero de 2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
Atn. Karen Katherine Velásquez Rojano
infraestructura@ider.gov.co
Asesora Oficina de Infraestructura
Supervisora

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Remisión de radicados empresas servicios públicos.

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, esta Interventoría se permite remitir la información presentada por el Contratista de Obra CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE, mediante oficio No. OF-005-2026 del 13 de febrero de 2026, relacionada con los radicados correspondientes a las solicitudes de trámite de disponibilidad técnica y conexión a los servicios públicos de agua y energía, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de esa Entidad

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO MANZANILLO

Anexos: Ofc No. 005-2026

Copia: Andrea Plaza Sánchez – Rep. Legal – CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

INT-PDC-IDER–180226-1

Cartagena. 18 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
innovacionydeporteconsorcio@gmail.com
Andrea Catalina Plaza Sánchez
Representante Legal

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 1389-2025 cuyo objeto es:* ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA."***

Asunto: Organización documental y lineamientos de seguimiento en materia de SST y Gestión Ambiental – Contrato de obra No. 1375-2025-

Cordial saludo,

En desarrollo de las funciones de seguimiento técnico, administrativo y documental que ejerce esta Interventoría sobre el contrato de obra No. 1375-2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"**, nos permitimos precisar los criterios para la entrega y actualización de la información asociada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

La finalidad de esta comunicación es asegurar que la gestión en campo y el soporte documental mantengan correspondencia, facilitando el control contractual y la adecuada consolidación de los informes mensuales.

1. AFILIACIONES Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Con el fin de mantener actualizado el registro del personal activo en obra:

- Las planillas del Sistema de Seguridad Social Integral deberán remitirse a esta Interventoría el mismo día en que se realice su pago, o en todo caso, dentro de la fecha de vencimiento correspondiente.
- Cuando se incorpore personal nuevo al proyecto, deberán enviarse de forma inmediata los soportes de afiliación a salud, pensión y ARL, antes del inicio efectivo de labores.

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO SST

En el marco del control y seguimiento del SG-SST, la siguiente documentación deberá socializarse permanentemente con el Inspector SST de la Interventoría y adjuntarse como soporte en el informe mensual de obra:

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

a) Permisos de trabajo, cuando aplique.
b) Registros de inducción y capacitaciones en SST.
c) Soportes de entrega de dotación.
d) Registros de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
e) Actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos cuando corresponde.

3. PERSONAL VINCULADO A TRAVÉS DE TERCEROS

Cuando el personal en obra dependa laboralmente de un tercero distinto al Contratista principal y los soportes de seguridad social se encuentren a nombre de otra empresa, deberá remitirse:

a) Certificación suscrita por el representante legal de la empresa correspondiente, donde conste la existencia de vínculo contractual con el Contratista de Obra para la ejecución de actividades asociadas al contrato en referencia.
b) Relación del personal asignado al proyecto bajo dicha modalidad.
c) Descripción general de las actividades que desarrolla dicho personal dentro del proyecto.

Esta información permitirá mantener trazabilidad contractual y claridad en la responsabilidad operativa del personal presente en obra.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El seguimiento ambiental continuará realizándose mediante verificación directa en campo; no obstante, la documentación que soporte la implementación del PMA deberá incorporarse mensualmente dentro del informe de obra.

Entre otros, deberán incluirse:

a) Registros de manejo, transporte y disposición de residuos.
b) Evidencias de control de material particulado y emisiones.
c) Manejo y disposición de escombros.
d) Registros fotográficos de las medidas ambientales adoptadas.
e) Actas o registros internos relacionados con controles ambientales implementados.

5. INFORMACIÓN A REMITIR

Con el fin de mantener actualizado el expediente contractual, se solicita remitir a la mayor brevedad:

a) Soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal que ha ingresado al proyecto desde el inicio de actividades hasta la fecha.
b) Soportes SST correspondientes al personal actualmente activo en obra.

En adelante, la información deberá remitirse conforme a los lineamientos aquí establecidos.

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Agradecemos su disposición para mantener la coordinación técnica y documental necesaria para el adecuado desarrollo del proyecto.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA

Copia: Karen Katherine Velásquez Rojano – IDER – infraestructura@ider.gov.co

Dirección: Carrera 5 # 33-15 Ed. Colseguro Oficina 501 Barrio El Centro
NIT: 902.024.954-7
Teléfono: 318 7769570
Correo: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Cartagena - Bolívar

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

CONSORCIO
PERSEVERAR
DEPORTIVO CARTAGENA

COMUNICACIONES RECIBIDAS

OFC No.002-2026

Cartagena de Indias D.T. y C. 27 de enero de 2026

Para:
ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
RL CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
Interventor del contrato **No. 1375-2025**
E-mail: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Ciudad
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-PDP-IDER–220126-1. **–** SOLICITUD DE INFORMACIÓN INICIAL
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Cordial Saludo

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE**, contratista de obra, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de la información solicitada en el asunto relacionado, cumpliendo así con las obligaciones específicas del contratista y lo establecido en el pliego de condiciones del proceso licitatorio que dio origen al contrato de la referencia.

- Plan de Desembolso de pagos.
- Hojas de vida del personal profesional y técnico propuesto para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes.
- Cronograma de obra preliminar, acorde al plazo contractual establecido.
- Presupuesto definitivo del contrato, correspondiente a la propuesta económica adjudicada.
- Análisis de precios unitarios (APU) definitivos, asociados a los ítems contractuales.
- Maquinaria y Equipos
- Plan de manejo e inversión del anticipo, teniendo en cuenta que el contrato contempla un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor contractual, para efectos de su revisión por parte de la Interventoría.
- Pólizas iniciales del contrato de obra, constituidas conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso de selección para la verificación de amparos, valores asegurados y vigencias.
- Pólizas Actualizadas conforme Acta de inicio del contrato de obra
- Plan de Calidad
- Programa de Gerencia de Proyectos

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente

_____

ANDREA PLAZA SANCHEZ
C. C. 1.047.390.437
REP. LEGAL CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

OFC No.003-2026

Cartagena de Indias D.T. y C. 04 de febrero de 2026

Para:
ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
RL CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
Interventor del contrato **No. 1375-2025**
E-mail: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Ciudad
ASUNTO: Respuesta Oficio INT-PDC-IDER–020226-2– Revisión con observaciones de hojas de vida de personal de obra.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Cordial Saludo

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE**, contratista de obra, me dirijo a usted con el fin de remitir la subsanación de las observaciones señaladas en el oficio del asunto, el cual corresponde a lo siguiente:

- Hoja de vida de Residente de Obra con sus respectivos soportes de acuerdo a los estipulado en el Anexo Técnico de Obra CCE-EICP-IDI-32 LOTE 4.

Agradezco su atención y espero una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente

_____
ANDREA PLAZA SANCHEZ
C. C. 1.047.390.437
REP. LEGAL CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

OFC No.004-2026

Cartagena de Indias D.T. y C. 12 de febrero de 2026

Para:
ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
RL CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
Interventor del contrato **No. 1375-2025**
E-mail: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Ciudad
ASUNTO: ENTREGA INFORMACIÓN PRELIMINAR
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Cordial Saludo

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE**, contratista de obra, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de la siguiente información:

- Plan de Manejo Ambiental
- Plane de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Agradezco su atención y espero una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente

_____

ANDREA PLAZA SANCHEZ
C. C. 1.047.390.437
REP. LEGAL CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

CONSORCIO INNOVACION Y DEPORTE
CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025

OFC No.005-2026

Cartagena de Indias D.T. y C. 13 de febrero de 2026

Para:
ALFREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
RL CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
Interventor del contrato **No. 1375-2025**
E-mail: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Ciudad
ASUNTO: REMISIÓN DE RADICADOS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Cordial Saludo

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE**, contratista de obra, me dirijo a usted con el fin de informarle y compartirle que ya fue radicado el trámite ante las siguientes empresas de servicios públicos con el fin de obtener la factibilidad, viabilidad o disponibilidad técnica de servicios (agua, alcantarillado, energía) y la posterior conexión, asegurando que la infraestructura cuente con la prestación de los mismos.

- Radicado Afinia

80041	SIN ASIGNAR	provisional de obra unidad deportiva de manzanillo del mar	CARTAGENA	Carrera 7 #26	50	10/02/2026 23:00:01	Pendiente de revisión	

- Radicado Acuacar



Agradezco su atención

Atentamente

_____
ANDREA PLAZA SANCHEZ
C. C. 1.047.390.437
REP. LEGAL CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

[CÓDIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., martes, 27 de enero de 2026

Oficio IDER-OFI-00020-2026

Señores
AFINIA S.A. E.S.P.
Ciudad

Asunto: **PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
Ref: CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA"

Cordial saludo,

Por medio de la presente autorizo al **CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE** identificado con NIT 902016232-4 y a su Ingeniero **EFRAIM DE JESÚS GUERRA MALO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.850.827 de Cartagena, portador de la Tarjeta Profesional No. BL205-45418, para realizar los trámites de apertura del proyecto descrito en la referencia, hasta la ejecución del mismo, ante AFINIA S.A. E.S.P.

Atentamente,

Campo Elias Theran Humanez
Director IDER

Proyectó:

OFC No.001-2026

Cartagena de Indias D.T. y C. 22 de enero de 2026

Para:
LINA MARGARITA OSIO RODRIGUEZ
RL CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA
Interventor del contrato **No. 1375-2025**
E-mail: consorcioperseverardeportivo@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA ANTE AFINIA.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1375-2025 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Cordial Saludo

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE**, contratista de obra, solicito respetuosamente remitir la documentación y la autorización requerida para tramitar la provisión y suministro del servicio de energía eléctrica en el predio donde se desarrollará la obra referenciada previamente.

Para llevar a cabo el mencionado proceso, requerimos de la autorización por parte del propietario del predio, en este caso, el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, para realizar los trámites administrativos en nombre del mismo. Por tanto, requerimos que nos sea remitida la siguiente documentación:

- Carta de autorización firmada por el representante legal del Distrito de Cartagena o la persona delegada por el mismo.
- Acta de posesión del autorizante.
- Copia de cédula del autorizante.
- Certificado de libertad y tradición del predio donde se ejecutará la obra.

Agradezco su atención y espero una respuesta favorable a esta solicitud.


Atentamente

_____

ANDREA PLAZA SANCHEZ
C. C. 1.047.390.437
REP. LEGAL CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE

ANEXO 11. PROGRAMACIÓN DE OBRA Y BALANCE PRESUPUESTAL


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
0		**PROGRAMACION MANZANILLO-3**	**120 días**	**jue 22/01/26**
1		**1 PRELIMINARES**	**33 días**	**jue 22/01/26**
2		1.1 Gestion social y alistamiento del proyecto	12 días	jue 22/01/26
3		1.2 Descapote y limpieza de terreno e=10cm (incluye disposición y retiro final a lugar autoizado).	3 días	lun 9/02/26
4		1.3 Corte de arbol mas retiro.	2 días	mar 17/02/26
5		1.4 Cerramiento en Lamina de zinc h=2.0 m, incluye parales 2" x 2" y concreto 3000 psi.	6 días	lun 9/02/26
6		1.5 Desmonte de postes electricos existentes.	0,5 días	mar 10/02/26
7		1.6 Acometida provisional de acueducto.	15 días	jue 12/02/26
8		1.7 Acometida provisional de energia electrica e iluminación.	1 día	lun 9/02/26
9		1.8 Retiro de material sobrante proveniente de las demoliciones a lugar autorizado. (Incluye cargue, disposición final y derecho de cantera).	1 día	jue 12/02/26
10		1.9 Localización, trazado y replanteo de estructuras metalicas, cubiertas y campos con equipo topográfico.	15 días	mar 17/02/26
11		**2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS**	**64 días**	**vie 13/02/26**
12		2.1 Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte (incluye retiro y transporte).	5 días	vie 13/02/26
13		2.2 Conformación de la subrasante, incluye nivelación de terreno con material de sitio y compactación del mismo con maquina.	4 días	lun 16/02/26
14		2.3 Excavación manual en material conglomerado de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de húmedad, incluye reitro hasta lugar autorizado.	8 días	mar 17/02/26
15		2.4 Relleno compactado con material de afirmado CBR ≥ 15%. (suministro, humedecimiento y compactación).	5 días	mié 13/05/26
16		2.5 Relleno en material seleccionado de cantera al 95%PM. Incluye suministro, transporte, extensión y compactación.	5 días	mié 6/05/26
17		2.6 Relleno en material de sitio al 95%PM. Incluye extensión y compactación.	8 días	mar 14/04/26
18		**3 CIMENTACION**	**47 días**	**vie 27/02/26**
19		3.1 Concreto ciclopeo de proporción 40/60 (tamaño maximo de piedra 20cm).	6 días	lun 9/03/26
20		3.2 Solado en concreto e=5 cm, F'c=2.000 PSI (14 MPa).	6 días	vie 27/02/26
21		3.3 Concreto para zapatas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	7 días	mar 17/03/26
22		3.4 Concreto para pedestales, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	8 días	vie 27/03/26
23		3.5 Concreto para vigas de cimentación, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	10 días	vie 10/04/26
24		3.6 Concreto para losa de fondo tanque, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	5 días	mar 17/03/26

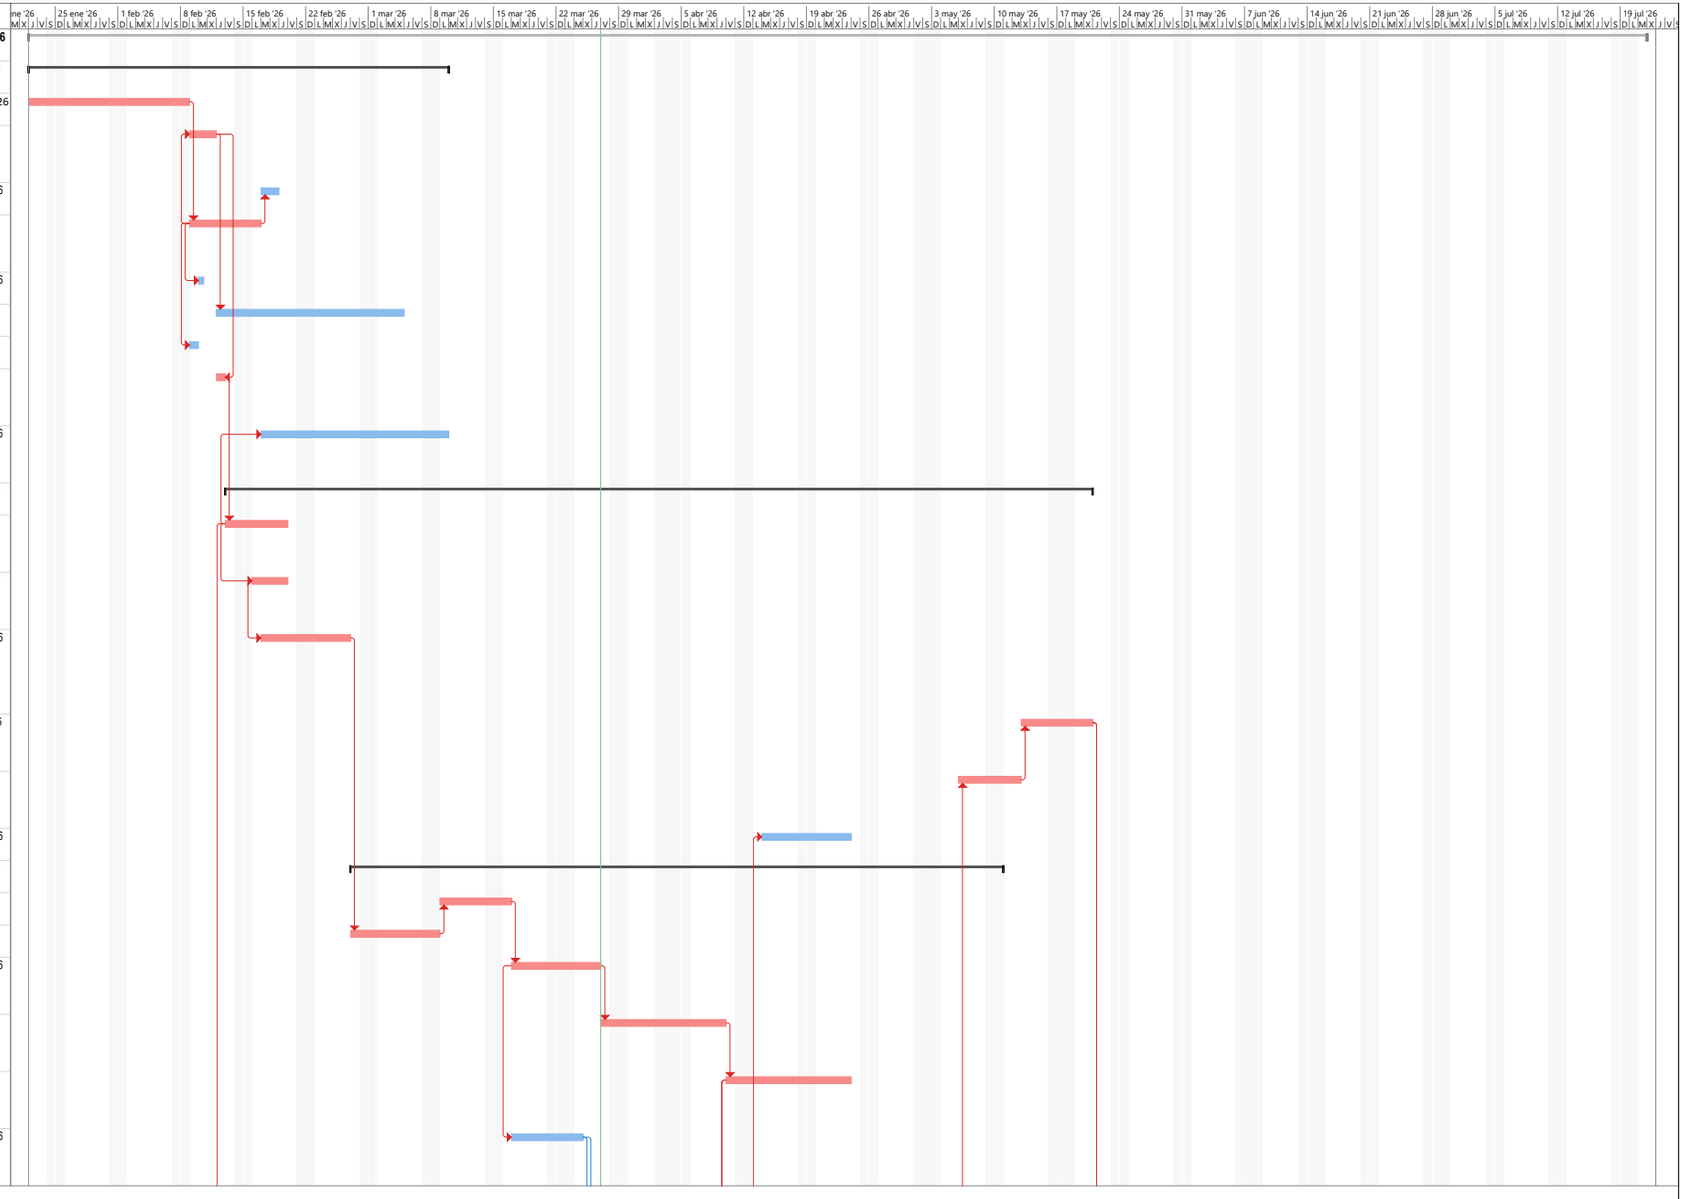

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: vie 27/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
25		3.7 Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 150 mm de anchura.	1 día	mar 24/03/26
26		3.8 Concreto para muros, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa) baja permeabilidad. Incluye curado y vibrado, según diseños.	8 días	mié 25/03/26
27		3.9 Concreto para muros contenedor de raiz, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	5 días	lun 4/05/26
28		**4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**	**89 días**	**vie 13/02/26**
29		4.1 Concreto para columnetas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	5 días	mié 20/05/26
30		4.2 Concreto para columnas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	12 días	mar 14/04/26
31		4.3 Concreto para vigas aereas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	10 días	vie 17/04/26
32		4.4 Concreto para losa de entrepiso F'c=4.000 PSI (24,5 MPa) e=0.12m aligerada con casetones de icopor no recuperable H=0.33m. Incluye curado y vibrado, según diseños.	10 días	mar 21/04/26
33		4.5 Concreto para placas de gradería, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa) e=0.12m con malla electrosoldada 6mm 10x10. Incluye curado y vibrado, según diseños.	15 días	mié 22/04/26
34		4.6 Concreto para muros, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	10 días	vie 17/04/26
35		4.7 Canal en concreto de 0.40 x 0.20 de F'c=4.000 PSI (28 MPa) baja permeabilidad. Incluye curado y vibrado, según diseños.	25 días	jue 21/05/26
36		4.8 Placa de contrapiso en concreto F'c=4.000 PSI (28 MPa) e=0.12m. Incluye curado, vibrado y acero de refuerzo según diseños.	15 días	mié 22/04/26
37		4.9 Corte para dilataciones en concreto y sello de junta.	8 días	jue 14/05/26
38		4.10 Vigueta de confinamiento en concreto S=0,15x0,20m, f'c=4.000 PSI (21 MPa), para Dinteles. Incluye encofrado, vibrado y curado según diseños.	8 días	mar 14/04/26
39		4.11 Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 MPa	15 días	vie 13/02/26
40		4.12 Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica para cubiertas. Perfileria ASTM A572 Gr50 y ASTM A37. Soldadura e70xx. Incluye cerchas, correas, tensores, anclajes y accesorios, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte 3 mils.	12 días	jue 14/05/26
41		**5 MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS**	**22 días**	**lun 4/05/26**
42		5.1 Levante de muro en block vibrado No.6, reforzado con acero 1/2" @0.40 y relleno en mortero 1:3. H=1.20m	8 días	lun 4/05/26
43		5.2 Levante muro en bloque vibrado No.5	3 días	mié 6/05/26
44		5.3 Levante muro en bloque vibrado No.6	6 días	lun 11/05/26
45		5.4 Levante muros en bloque No.4	6 días	lun 11/05/26
46		5.5 Pañete allanado en mortero 1:4 para muros internos y externos.	12 días	lun 11/05/26
47		5.6 Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de puertas, ventanas y muros).	7 días	jue 21/05/26
48		5.7 Dilataciones en pañete de fachadas, e=1 pulgada.	8 días	vie 15/05/26

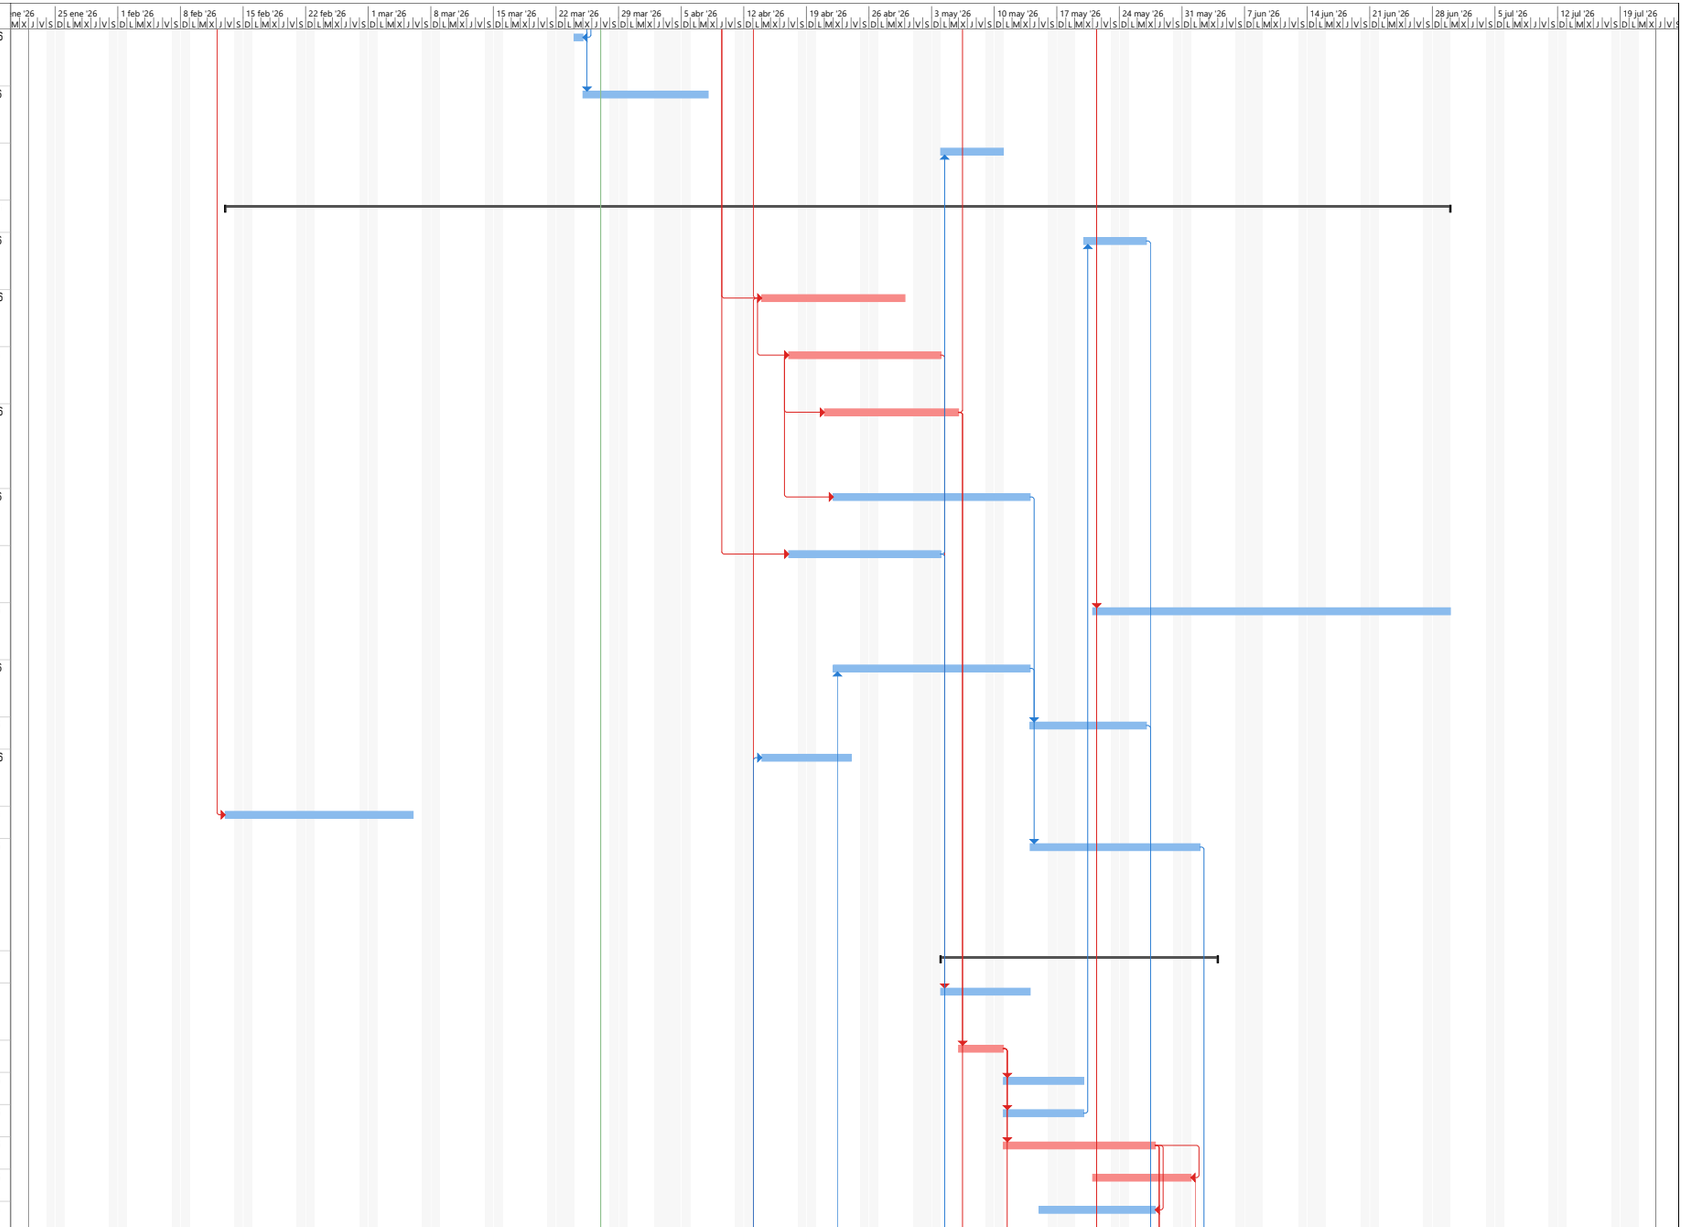

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: vie 27/03/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
49		5.8 Albardilla en concreto de 0.20 x 0.06m	5 días	jue 28/05/26
50		**6 CUBIERTAS**	**23 días**	**mié 6/05/26**
51		6.1 Mortero de nivelación 1:3 impermeabilizado e=5cm.	5 días	mié 6/05/26
52		6.2 Suministro e instalación de manto asfaltico para impermeabilización, incluye limpieza de superficie y aplicación de imprimante.	8 días	mié 13/05/26
53		6.3 Suministro, transporte e instalación de cubierta en lámina termoacústica UPVC 2.5 mm, incluye accesorios de anclaje y conexiones.	5 días	mar 2/06/26
54		**7 INSTALACIONES HIDRAULICOSANITARIAS Y ESPECIALES**	**41 días**	**lun 11/05/26**
55		7.1 Puntos desagües ø 2" en muro.	3 días	mié 27/05/26
56		7.2 Puntos desagües ø 2" en piso.	1 día	mié 27/05/26
57		7.3 Puntos desagües ø 4".	2 días	lun 25/05/26
58		7.4 Puntos ventilación.	1 día	vie 29/05/26
59		7.5 Tubería colectora enterrada de ø 2" PVC sanitaria.	2 días	lun 25/05/26
60		7.6 Tubería colectora enterrada de ø 4" PVC sanitaria.	3 días	mié 20/05/26
61		7.7 Tubería ranurada enterrada ø 6".	3 días	jue 14/05/26
62		7.8 Tubería colectora de ø 2" PVC ventilación. G63	2 días	mié 27/05/26
63		7.9 Cajas de inspección de 0.80×0.80 m.	5 días	jue 14/05/26
64		7.10 Excavación manual de zanja de 0.20x0.40m para tubería enterrada.	3 días	lun 11/05/26
65		7.11 Relleno con material seleccionado para zanja de tuberías.	2 días	mié 27/05/26
66		7.12 Relleno con material de sitio.	2 días	mié 27/05/26
67		7.13 Retiro de material sobrante proveniente de las demoliciones a lugar autorizado. (Incluye cargue, disposición final y derecho de cantera).	1 día	vie 29/05/26
68		7.14 Punto hidráulicos Ø 1/2".	4 días	jue 4/06/26
69		7.15 Punto medidor Ø 1".	1 día	jue 28/05/26
70		7.16 Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1/2".	3 días	lun 1/06/26
71		7.17 Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 3/4".	2 días	jue 28/05/26
72		7.18 Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1".	4 días	vie 22/05/26
73		7.19 Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 2".	2 días	mié 20/05/26
74		7.20 Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 3".	3 días	jue 14/05/26
75		7.21 Válvulas de compuerta de ø 1/2".	1 día	jue 4/06/26
76		7.22 Válvulas de compuerta de ø 3/4".	1 día	lun 1/06/26
77		7.23 Válvulas de compuerta de ø 1".	1 día	jue 28/05/26
78		7.24 Válvulas de compuerta de ø 2".	1 día	vie 22/05/26
79		7.25 Suministro e instalación de sanitario de tanque referencia institucional.	3 días	mar 7/07/26
80		7.26 Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer referencia institucional, incluye grifería tipo push, sifón y accesorios.	3 días	mar 7/07/26
81		7.27 Suministro e instalación de orinal referencia institucional, incluye grifería de push y accesorios.	3 días	mar 7/07/26

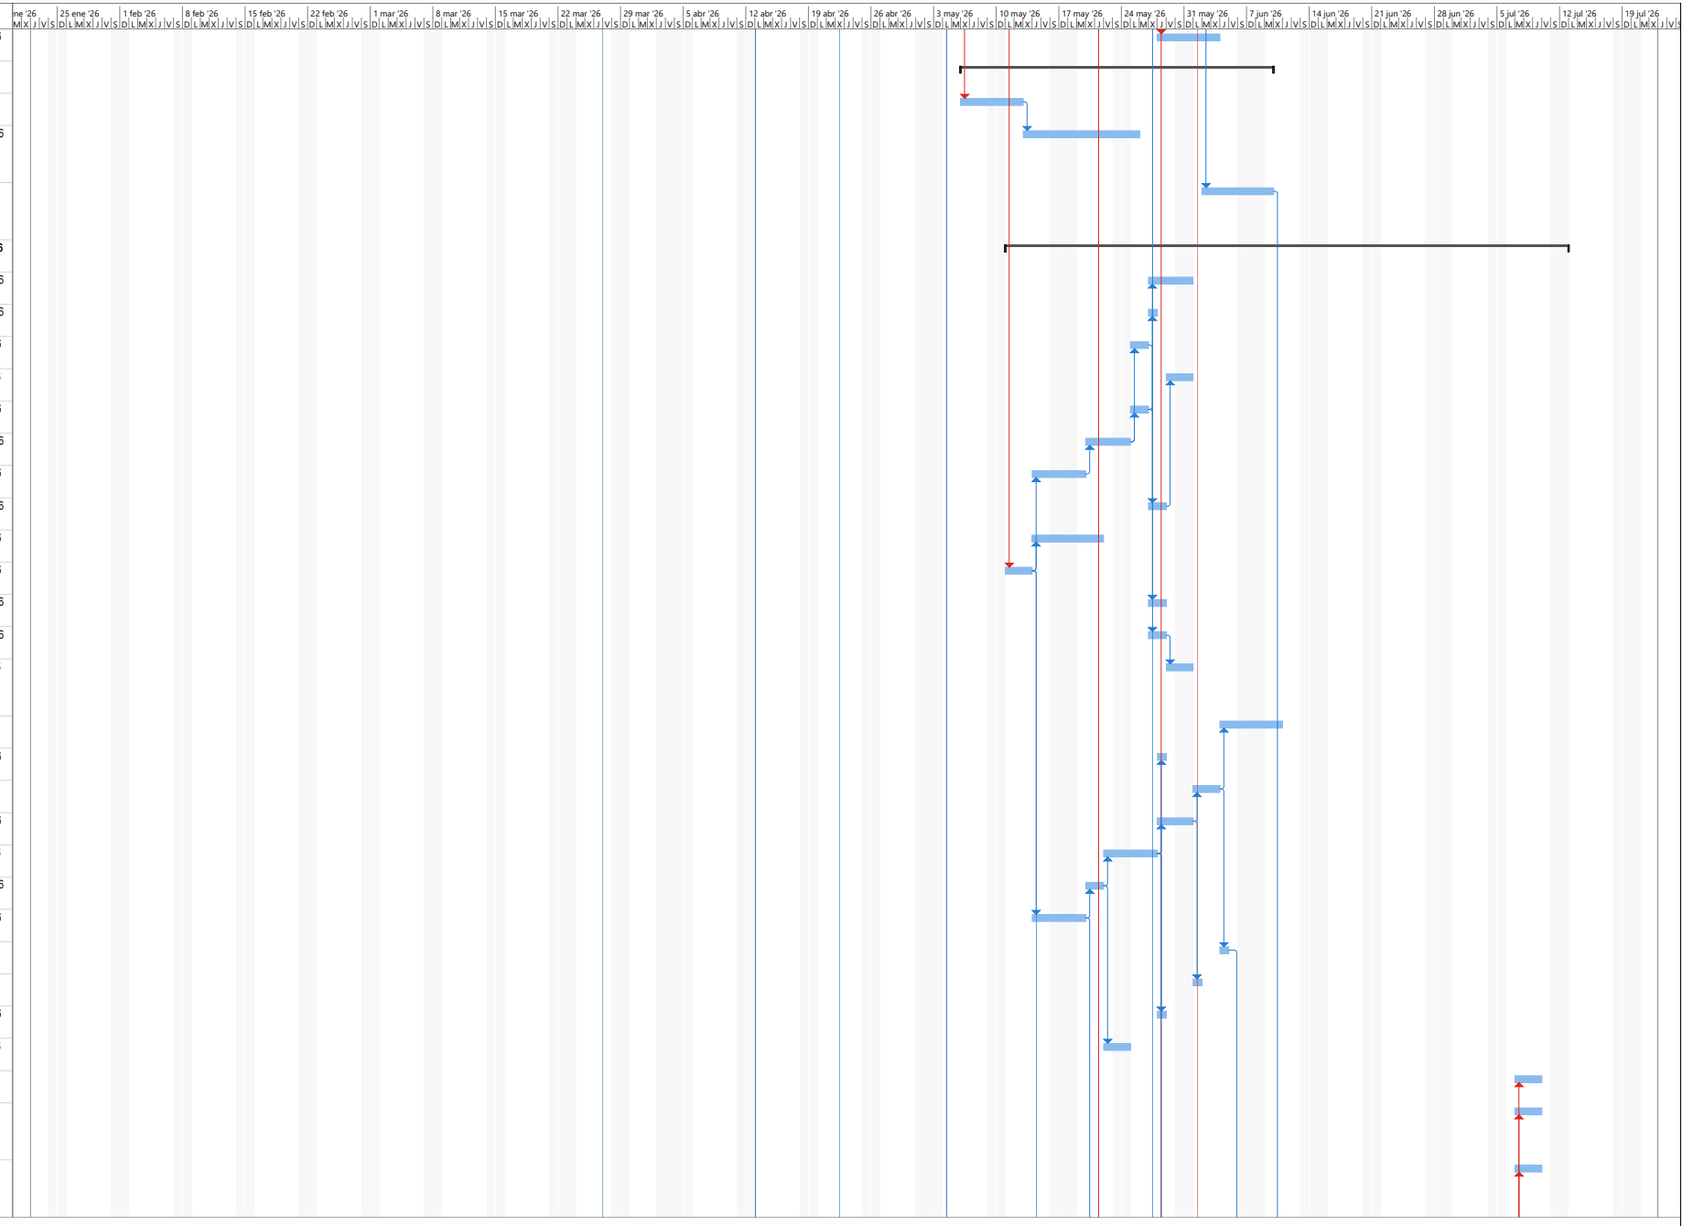


Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: vie 27/03/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
82		7.28 Suministro e instalación de ducha mezcladora.	1 día	mar 7/07/26
83		7.29 Suministro e instalación de lavaplatos de bajoponer según referencia arquitectónica, incluye sifón y accesorios.	1 día	mar 7/07/26
84		7.30 Suministro e instalación de lavatraperos.	1 día	mar 7/07/26
85		7.31 Suministro e instalación de llave de grifo para lavaplatos.	1 día	mar 7/07/26
86		7.32 Suministro e instalación de tubería PVC de ø3".	1 día	mié 20/05/26
87		7.33 Suministro e instalación de valvula cheque Pie De ø4".	1 día	jue 21/05/26
88		7.34 Suministro e instalación de tubería PVC P de ø1".	1 día	jue 28/05/26
89		7.35 Suministro e instalación tubería acero galvanizado de ø3".	1 día	vie 22/05/26
90		7.36 Suministro e instalación valvula de compuerta de ø3/4".	1 día	lun 25/05/26
91		7.37 Suministro e instalación valvula de compuerta de ø3".	1 día	mar 26/05/26
92		7.38 Suministro e instalación de valvula cheque de ø3".	1 día	mié 27/05/26
93		7.39 Suministro e instalación de equipo de bombeo y presión constante.	15 días	jue 14/05/26
94		7.40 Suministro e Instalación de tubería de drenaje PDT 8". Incluye extendido, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	15 días	jue 14/05/26
95		7.41 Suministro, transporte e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 TR (24.000 btuh) con fan coil de lujo y condensadora de descarga horizontal para trabajar con refrigerante ecológico R410a a 220V/1F/60Hz para R410a, incluye tubería	15 días	vie 19/06/26
96		**8 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**91 días**	**vie 27/02/26**
155		**9 PISOS**	**85 días**	**jue 12/03/26**
156		9.1 Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica.	8 días	mié 22/04/26
157		9.2 Suministro e instalación de geomembrana impermeable PEAD de 30 Mils (e=0.75mm).	8 días	vie 24/04/26
158		9.3 Suministro, transporte e instalación de grama sintetica de tercera generación hilo 11 mm, altura 50 mm color verde en fibra artificial de polietileno, fibrilado, estabilizado con protección U.V. color verde de tercera generación, en fibra artificial de po	30 días	mar 31/03/26
159		9.4 Plantilla de piso F'c=4.000 PSI (21 MPa), espesor e=0.08m. Incluye refuerzo en malla electrosoldada.	10 días	lun 4/05/26
160		9.5 Piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8 de uso institucional.	5 días	jue 18/06/26
161		9.6 Piso en cerámica terrazo o similar de 0.60x0.60 o similar para baño.	5 días	jue 25/06/26
162		9.7 Guardaescoba en granito pulido H=0.10m para muros.	5 días	vie 3/07/26
163		9.8 Guardaescoba en ceramica H=0.10m para muros.	5 días	vie 3/07/26
164		9.9 Junta en granito pulido fundido para remates en pasillos.	3 días	vie 10/07/26
165		9.10 Pintura tipo trafico para piso según color especificado.	15 días	mié 27/05/26
166		9.11 Bordillo en concreto F'c=3500 PSI a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 m	45 días	jue 12/03/26

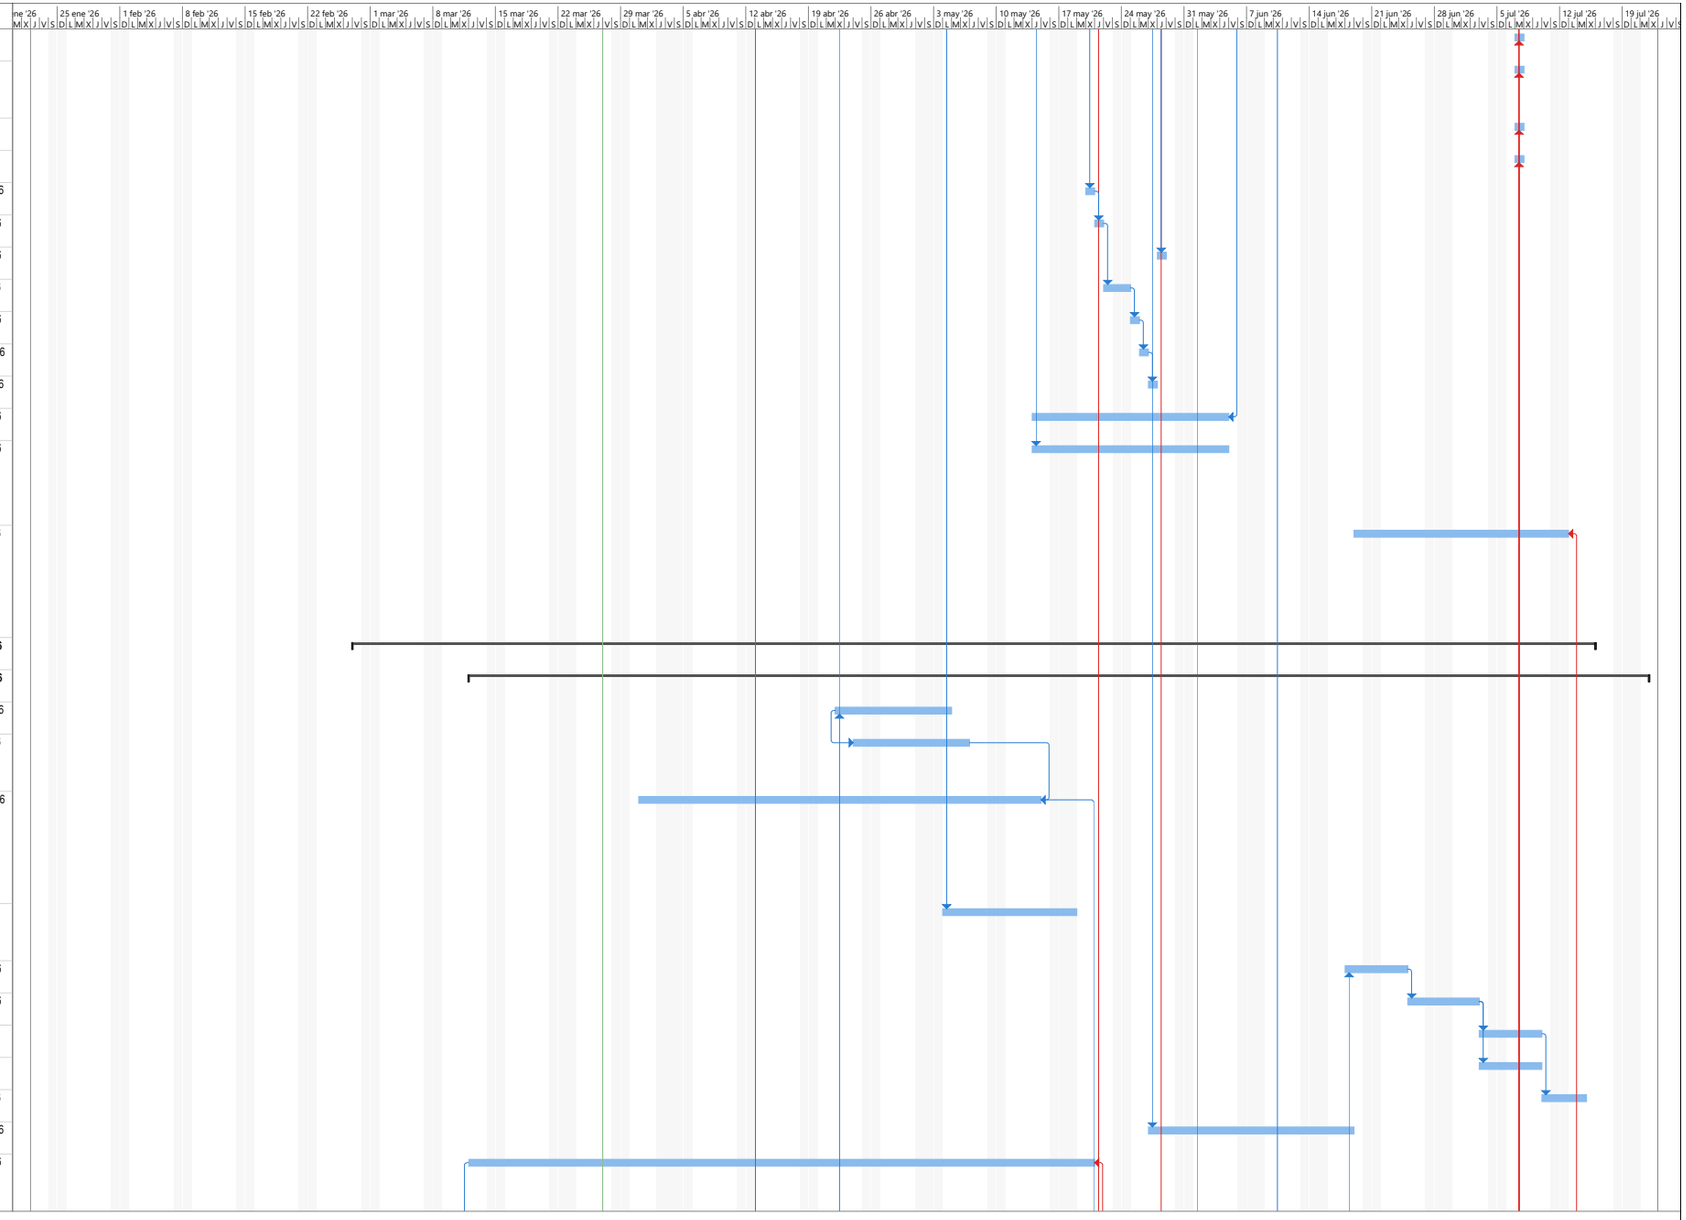


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
167		9.12 Anden en concreto F'c=3.000 PSI (21 MPa), espesor e=10 cm. Incluye junta de dilatación y refuerzo.	60 días	mar 7/04/26
168		9.13 Viga cinta de confinamiento de 0.10x0.20 m fundido en sitio, en concreto 3.000 PSI (21 MPa) para Losetas. Incluye refuerzo según diseño.	6 días	mar 14/04/26
169		9.14 Piso en adoquin rectangular 0.06 x 0.24 x 0.08, color según diseño arquitectónico. Incluye suministro e instalación y relleno de arena.	40 días	jue 21/05/26
170		9.15 Suministro e instalación de arena silice para cancha de volybol	8 días	mié 22/04/26
171		9.16 Suministro e instalación de alcorque circular D=2.00m según diseño arquitectónico	60 días	jue 16/04/26
172		**10 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**	**30 días**	**mar 26/05/26**
173		10.1 Suministro e instalacion de ventana tipo persina con marco en perfil de aluminio color según especificación arquitectónica de 0.80 x 0.40m.	15 días	jue 18/06/26
174		10.2 Suministro e instalacion de ventana tipo persina con marco en perfil de aluminio color según especificación arquitectónica de 1.50 x 0.40m.	15 días	jue 18/06/26
175		10.3 Suministro e instalacion de ventana tipo persina con marco en perfil de aluminio color según especificación arquitectónica de 2.00 x 0.40m.	15 días	jue 18/06/26
176		10.4 Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 0.70x.2.20m.	15 días	jue 18/06/26
177		10.5 Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 0.90x.2.20m.	15 días	jue 18/06/26
178		10.6 Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 1.00x.2.20m.	30 días	mar 26/05/26
179		10.7 Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 1.15x.2.20m.	30 días	mar 26/05/26
180		10.8 Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable para división de baño de 0.70x1.50m. Incluye pasador, bisagras y accesorios necesarios.	30 días	mar 26/05/26
181		10.9 Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable para división de baño de 1.15x1.50m. Incluye pasados, bisagras y accesorios necesarios.	30 días	mar 26/05/26
182		10.10 Suministro e instalación de lockers para camerinos en madera RH, ancho entre 0.50 y 0.80 alto=2.40m. Color según especificación arquitectónica, con puerta abatible en parte superior y cojín parte inferior	30 días	mar 26/05/26
183		**11 ACABADOS EN MUROS Y CIELO**	**34 días**	**jue 28/05/26**
184		11.1 Aplicación de estuco muros interiores	8 días	mié 24/06/26
185		11.2 Aplicación de revoque fino impermeabilizado de acabado para muros exteriores. Color según especificación arquitectónica	7 días	lun 1/06/26
186		11.3 Pintura de vinilo tipo I, 3 manos para muros interiores.	4 días	mar 7/07/26

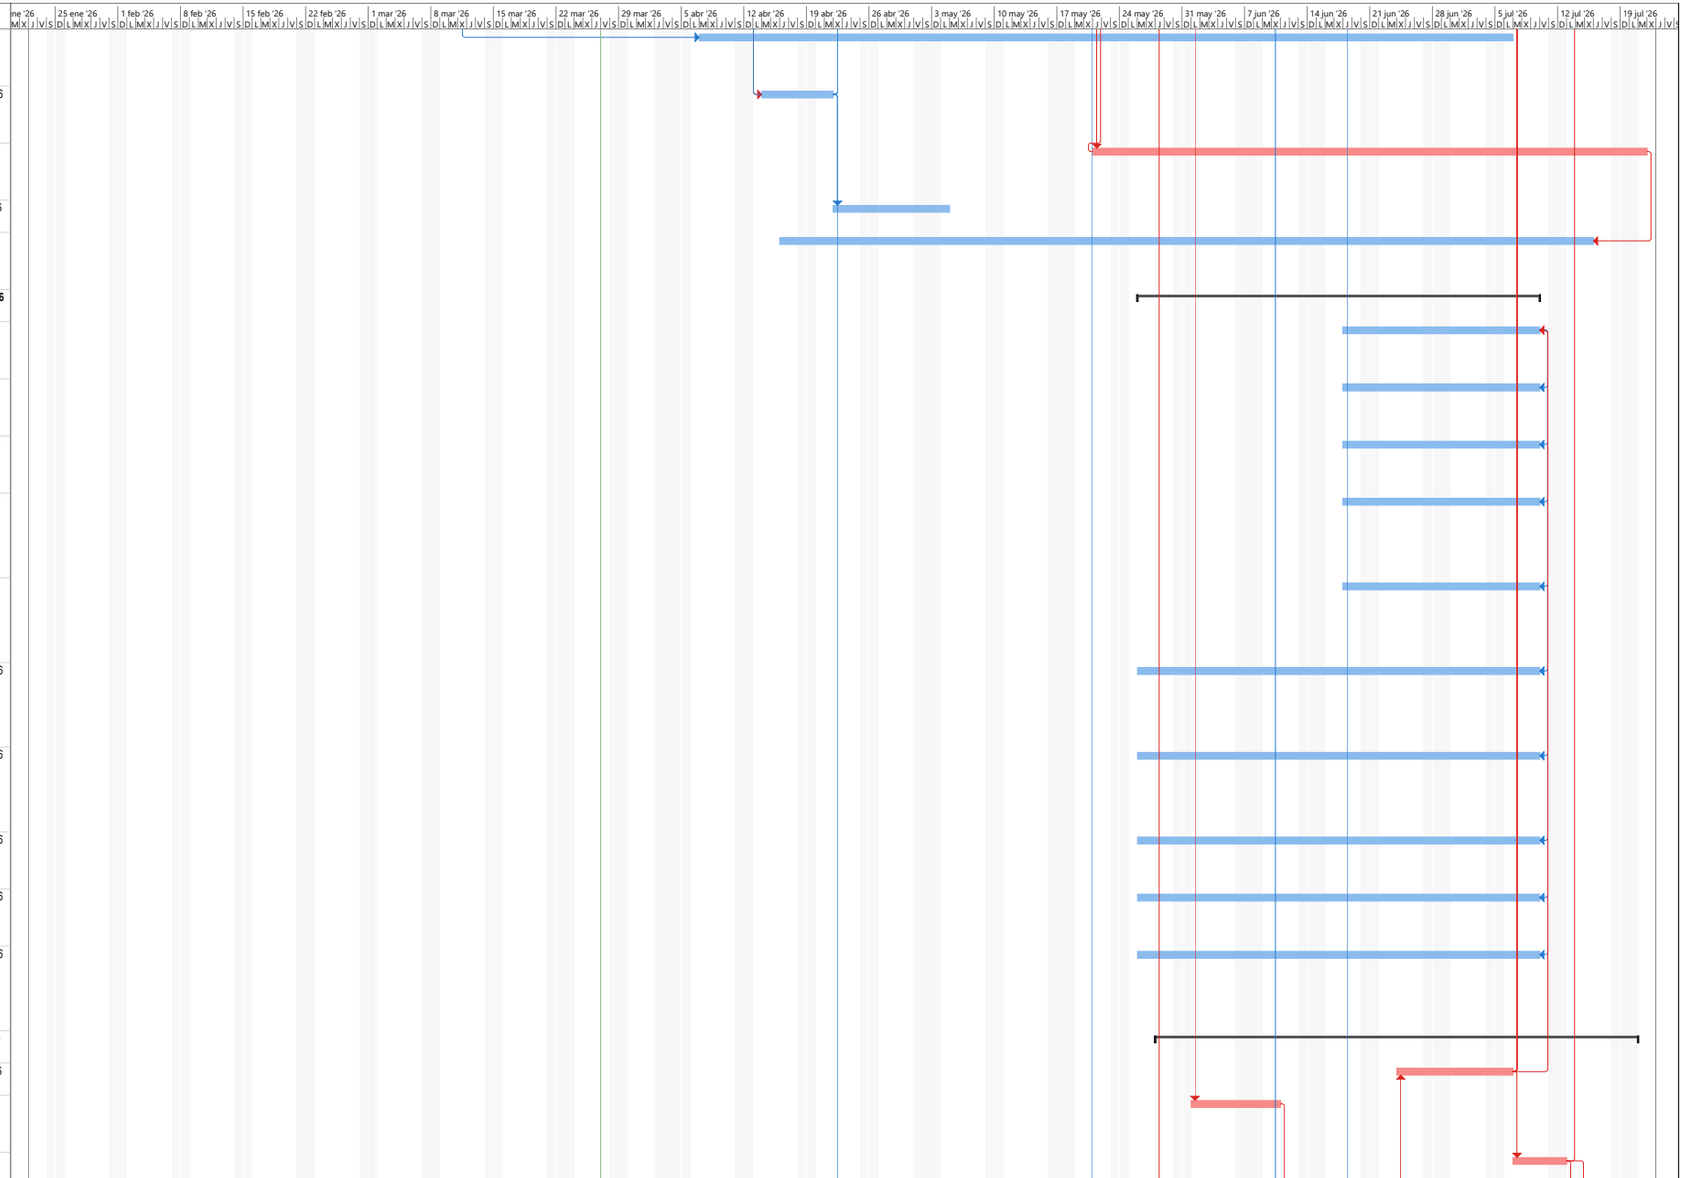

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: vie 27/03/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
187		11.4 Ceramica para pared de baño, color según especificación arquitectónica, dimensión 0.09x0.27m.	5 días	jue 28/05/26
188		11.5 Ceramica para pared de baño, color según especificación arquitectónica, dimensión 0.30x0.30m.	8 días	jue 4/06/26
189		11.6 Pintura en Koraza o similar para exteriores, dos manos a una altura hasta h=5m	5 días	lun 13/07/26
190		11.7 Cielo raso en drywal 1/2" hasta una altura de 3.50m, incluye estructura y accesorios.	8 días	jue 11/06/26
191		11.8 Pintura de vinilo tipo II, 2 manos para cielo raso.	2 días	mié 24/06/26
192		11.9 Suministo e instalación de espejo flotante de 2.50 x 0.90.	15 días	lun 22/06/26
193		**12 SEÑALIZACION Y BARANDAS**	**25 días**	**vie 29/05/26**
194		12.1 Suministro e instalación de señalización vertical para gradería, con poste metalico y estructura superior en acrilico, según especificación arquitectónica.	25 días	vie 29/05/26
195		12.2 Suministro e instalación de baranda en tuberia circular de acero galvanizado, h=1.10m, con pasamanos superior e intermedio y elementos verticales de soporte, incluye accesorios y elementos de anclaje y pintura.	15 días	mié 10/06/26
196		12.3 Suministro e instalación de señaletica de pared en acrilico con dilatadores, incluye accesorios necesarios de 0.30 x 0.20.	15 días	mar 16/06/26
197		12.4 Suministro e instalación de señaletica de pared en acrilico para identificador de espacio de 0.60 x 1.80.	15 días	mar 16/06/26
198		**13 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS**	**42 días**	**lun 6/04/26**
199		13.1 Suministro e instalación de caneca con soporte en acero inoxidable, medidas del tanque de 0,75m de altura x 0,50m de diámetro, con perforaciones en su circunferencia de 3/8" de diámetro.	30 días	lun 6/04/26
200		13.2 Cerramiento perimetral en malla modular de 2x2,5 m en alambre de 5 mm galvanizado y recubierto con resina de poliéster en sistema de inmersión. Fijada en tubería con abrazadera en acero galvanizado recubierta en PVC, según planos de diseño. Altura max 3,8	30 días	mié 22/04/26
201		13.3 Suministro e instalación de portería con medidas fifa en aluminio para futbol 11.	30 días	lun 6/04/26
202		13.4 Suministro e instalación de juego de mallas profesionales para porteria.	30 días	lun 6/04/26
203		13.5 Suministro e instalación de banderines de tiro de esquina.	30 días	lun 6/04/26
204		**14 OTROS**	**115 días**	**jue 29/01/26**
205		14.1 Aseo, limpieza general y retiro de escombros	15 días	mar 30/06/26
206		14.2 Retiro de material sobrante. Incluye disposición a botadero autorizado	115 días	jue 29/01/26

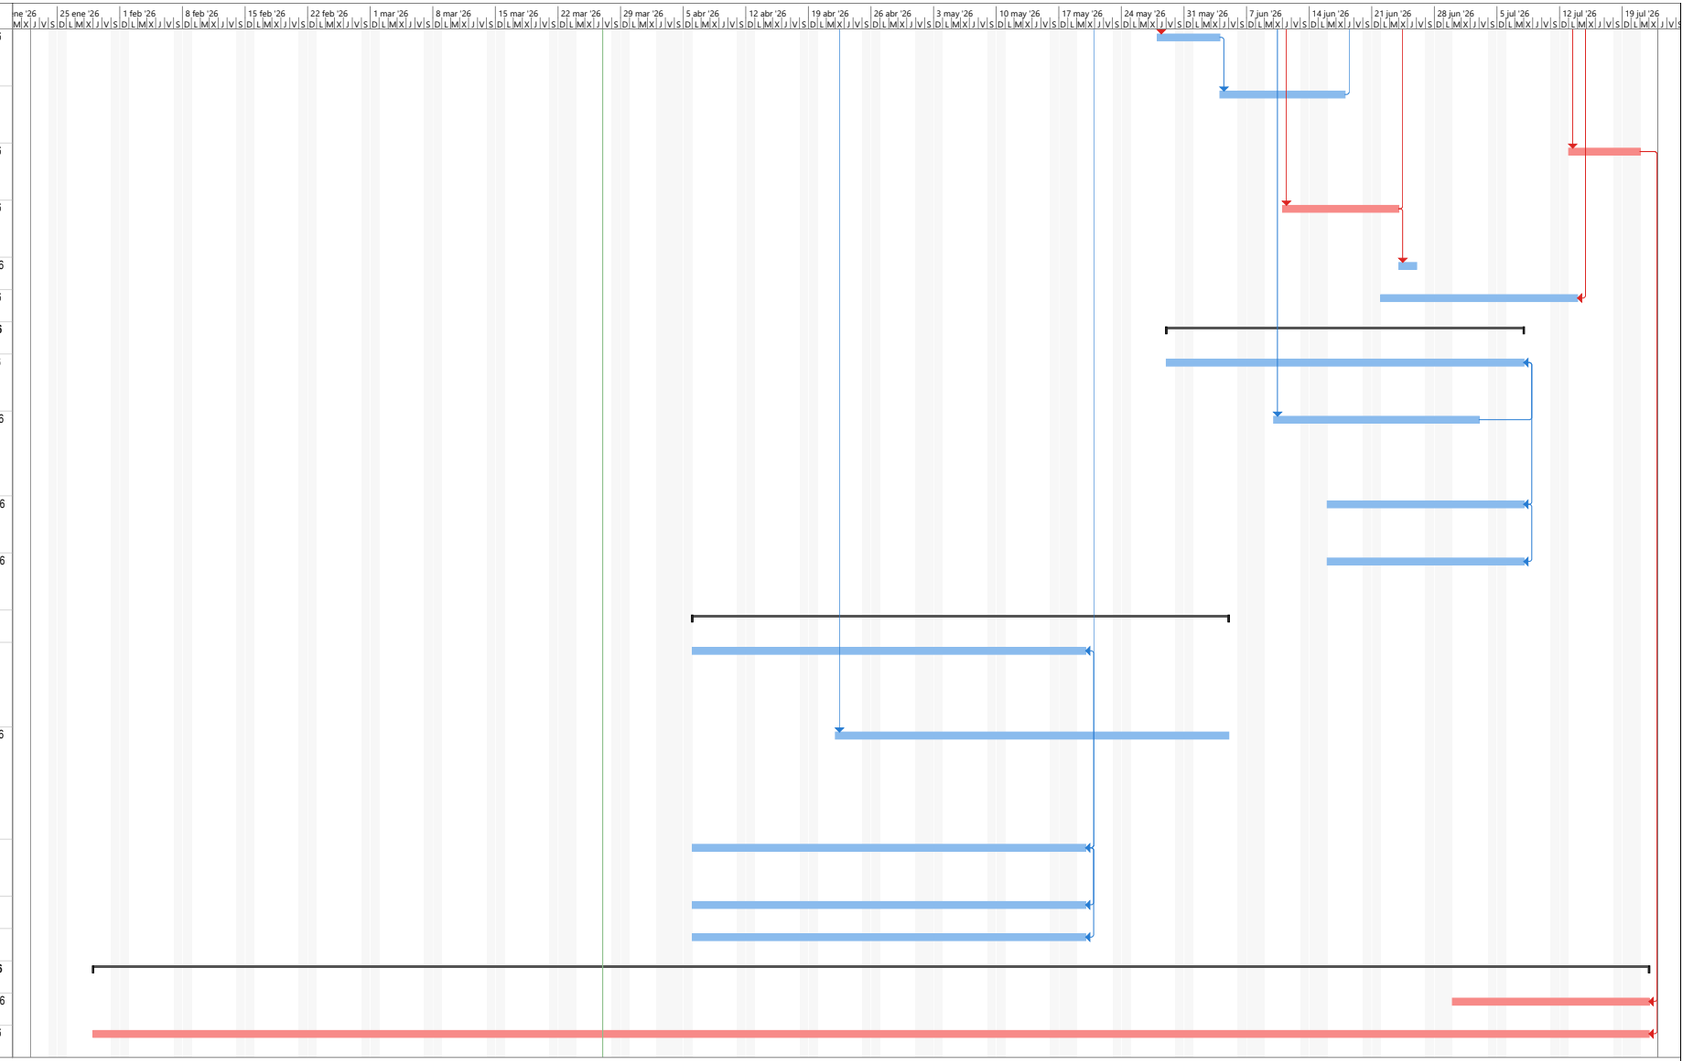

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: vie 27/03/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de **Propuesta Económica** de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR, DISTRITO DE CARTAGENA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1,0 PRELIMINARES								
1,1				Descapote y limpieza de terreno e=10cm (incluye disposición y retiro final a lugar autoizado).	M2	25.329,88	$ 13.589,00	$ 344.207.739,00
1,2				Corte de arbol mas retiro.	UND	3,00	$ 258.284,00	$ 774.852,00
1,3				Cerramiento en Lamina de zinc h=2.0 m, incluye parales 2" x 2" y concreto 3000 psi.	M	829,44	$ 85.679,00	$ 71.065.590,00
1,4				Desmonte de postes electricos existentes.	UND	1,00	$ 1.121.103,00	$ 1.121.103,00
1,5				Acometida provisional de acueducto.	UND	1,00	$ 1.344.924,00	$ 1.344.924,00
1,6				Acometida provisional de energia electrica e iluminación.	UND	1,00	$ 6.375.780,00	$ 6.375.780,00
1,7				Retiro de material sobrante proveniente de las demoliciones a lugar autorizado. (Incluye cargue, disposición final y derecho de cantera).	M3	8,00	$ 119.840,00	$ 958.720,00
1,8				Localización, trazado y replanteo de estructuras metalicas, cubiertas y campos con equipo topográfico.	M2	25.329,88	$ 3.494,00	$ 88.502.601,00
Subtotal								**$ 514.351.309,00**
2,0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS								
2,1				Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte (incluye retiro y transporte).	M3	4.129,60	$ 104.675,00	$ 432.265.880,00
2,2				Conformación de la subrasante, incluye nivelación de terreno con material de sitio y compactación del mismo con maquina.	M2	25.332,10	$ 8.301,00	$ 210.281.762,00
2,3				Excavación manual en material conglomerado de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de húmedad, incluye reitro hasta lugar autorizado.	M3	192,34	$ 35.160,00	$ 6.762.674,00
2,4				Relleno compactado con material de afirmado CBR ≥ 15%. (suministro, humedecimiento y compactación).	M3	250,00	$ 154.871,00	$ 38.717.750,00
2,5				Relleno en material seleccionado de cantera al 95%PM. Incluye suministro, transporte, extensión y compactación.	M3	987,00	$ 188.131,00	$ 185.685.297,00
2,6				Relleno en material de sitio al 95%PM. Incluye extensión y compactación.	M3	89,80	$ 16.622,00	$ 1.492.656,00
Subtotal								**$ 875.206.019,00**
3,0 CIMENTACION								
3,1				Concreto ciclopeo de proporción 40/60 (tamaño maximo de piedra 20cm).	M3	90,96	$ 487.708,00	$ 44.361.920,00
3,2				Solado en concreto e=5 cm, F'c=2.000 PSI (14 MPa).	M2	151,61	$ 44.782,00	$ 6.789.399,00
3,3				Concreto para zapatas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	50,18	$ 1.217.135,00	$ 61.075.834,00
3,4				Concreto para pedestales, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	5,48	$ 1.777.261,00	$ 9.739.390,00
3,5				Concreto para vigas de cimentación, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	88,61	$ 1.344.653,00	$ 119.149.702,00
3,6				Concreto para losa de fondo tanque, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	4,46	$ 1.232.771,00	$ 5.498.159,00
3,7				Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 150 mm de anchura.	M	16,90	$ 73.752,00	$ 1.246.409,00
3,8				Concreto para muros, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa) baja permeabilidad. Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	5,07	$ 1.845.772,00	$ 9.358.064,00
3,9				Concreto para muros contenedor de raiz, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	24,00	$ 1.574.709,00	$ 37.793.016,00
Subtotal								**$ 295.011.893,00**
4,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS								
4,1				Concreto para columnetas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	1,39	$ 1.777.261,00	$ 2.470.393,00
4,2				Concreto para columnas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	14,14	$ 1.777.261,00	$ 25.130.471,00
4,3				Concreto para vigas aereas, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	48,98	$ 1.869.362,00	$ 91.561.351,00
4,4				Concreto para losa de entrepiso F'c=4.000 PSI (24,5 MPa) e=0.12m aligerada con casetones de icopor no recuperable H=0.33m. Incluye curado y vibrado, según diseños.	M2	224,02	$ 498.724,00	$ 111.724.150,00
4,5				Concreto para placas de gradería, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa) e=0.12m con malla electrosoldada 6mm 10x10. Incluye curado y vibrado, según diseños.	M2	416,90	$ 419.887,00	$ 175.050.890,00
4,6				Concreto para muros, F'c=4.000 PSI (24,5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños.	M3	16,87	$ 1.758.192,00	$ 29.660.699,00
4,7				Canal en concreto de 0.40 x 0.20 de F'c=4.000 PSI (28 MPa) baja permeabilidad. Incluye curado y vibrado, según diseños.	M	200,00	$ 721.312,00	$ 144.262.400,00
4,8				Placa de contrapiso en concreto F'c=4.000 PSI (28 MPa) e=0.12m. Incluye curado, vibrado y acero de refuerzo según diseños.	M2	1.821,98	$ 214.501,00	$ 390.816.532,00
4,9				Corte para dilataciones en concreto y sello de junta.	M	237,00	$ 24.858,00	$ 5.891.346,00
4,10				Vigueta de confinamiento en concreto S=0,15x0,20m, f'c=4.000 PSI (21 MPa), para Dinteles. Incluye encofrado, vibrado y curado según diseños.	M	27,27	$ 147.978,00	$ 4.035.360,00
4,11				Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa	KG	20.638,00	$ 11.170,00	$ 230.526.460,00
4,12				Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica para cubiertas. Perfileria ASTM A572 Gr50 y ASTM A37. Soldadura e70xx. Incluye cerchas, correas, tensores, anclajes y accesorios, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte 3 mils.	KG	9.119,90	$ 31.857,00	$ 290.532.654,00
Subtotal								**$ 1.501.662.706,00**
5,0 MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS								
5,1				Levante de muro en block vibrado No.6, reforzado con acero 1/2" @0.40 y relleno en mortero 1:3. H=1.20m	M2	236,41	$ 180.356,00	$ 42.637.962,00
5,2				Levante muro en bloque vibrado No.5	M2	142,86	$ 137.324,00	$ 19.618.107,00
5,3				Levante muro en bloque vibrado No.6	M2	62,61	$ 158.630,00	$ 9.931.824,00
5,4				Levante muros en bloque No.4	M2	174,04	$ 133.348,00	$ 23.207.886,00
5,5				Pañete allanado en mortero 1:4 para muros internos y externos.	M2	759,02	$ 40.545,00	$ 30.774.466,00
5,6				Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de puertas, ventanas y muros).	M	192,20	$ 21.470,00	$ 4.126.534,00

5,7				Dilataciones en pañete de fachadas, e=1 pulgada.	M	420,75	$ 9.859,00	$ 4.148.174,00
5,8				Albardilla en concreto de 0.20 x 0.06m	M	103,46	$ 197.096,00	$ 20.391.552,00
Subtotal								**$ 154.836.505,00**
6,0 CUBIERTAS								
6,1				Mortero de nivelación 1:3 impermeabilizado e=5cm.	M2	224,02	$ 74.851,00	$ 16.768.121,00
6,2				Suministro e instalación de manto asfaltico para impermeabilización, incluye limpieza de superficie y aplicación de imprimante.	M2	224,02	$ 117.289,00	$ 26.275.082,00
6,3				Suministro, transporte e instalación de cubierta en lámina termoacústica UPVC 2.5 mm, incluye accesorios de anclaje y conexiones.	M2	324,76	$ 217.607,00	$ 70.670.049,00
Subtotal								**$ 113.713.252,00**
7,0 INSTALACIONES HIDRAULICOSANITARIAS Y ESPECIALES								
7,1				Puntos desagües ø 2" en muro.	UND	28,00	$ 110.020,00	$ 3.080.560,00
7,2				Puntos desagües ø 2" en piso.	UND	10,00	$ 102.375,00	$ 1.023.750,00
7,3				Puntos desagües ø 4".	UND	15,00	$ 150.603,00	$ 2.259.045,00
7,4				Puntos ventilación.	UND	6,00	$ 90.394,00	$ 542.364,00
7,5				Tubería colectora enterrada de ø 2" PVC sanitaria.	M	39,87	$ 44.073,00	$ 1.757.191,00
7,6				Tubería colectora enterrada de ø 4" PVC sanitaria.	M	55,49	$ 65.545,00	$ 3.637.092,00
7,7				Tubería ranurada enterrada ø 6".	M	41,61	$ 92.026,00	$ 3.829.202,00
7,8				Tubería colectora de ø 2" PVC ventilación. G63	M	32,00	$ 41.636,00	$ 1.332.352,00
7,9				Cajas de inspección de 0.80×0.80 m.	UND	6,00	$ 917.037,00	$ 5.502.222,00
7,10				Excavación manual de zanja de 0.20x0.40m para tubería enterrada.	M	136,97	$ 25.971,00	$ 3.557.248,00
7,11				Relleno con material seleccionado para zanja de tuberías.	M	136,97	$ 45.035,00	$ 6.168.444,00
7,12				Relleno con material de sitio.	M	136,97	$ 31.166,00	$ 4.268.807,00
7,13				Retiro de material sobrante proveniente de las demoliciones a lugar autorizado. (Incluye cargue, disposición final y derecho de cantera).	M3	6,25	$ 119.840,00	$ 749.000,00
7,14				Punto hidráulicos Ø 1/2".	UND	45,00	$ 87.440,00	$ 3.934.800,00
7,15				Punto medidor Ø 1".	UND	1,00	$ 297.917,00	$ 297.917,00
7,16				Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1/2".	M	27,50	$ 21.083,00	$ 579.783,00
7,17				Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 3/4".	M	11,37	$ 24.700,00	$ 280.839,00
7,18				Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1".	M	47,27	$ 29.976,00	$ 1.416.966,00
7,19				Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 2".	M	29,42	$ 61.112,00	$ 1.797.915,00
7,20				Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 3".	M	36,57	$ 107.083,00	$ 3.916.025,00
7,21				Válvulas de compuerta de ø 1/2".	UND	2,00	$ 125.791,00	$ 251.582,00
7,22				Válvulas de compuerta de ø 3/4".	UND	1,00	$ 156.574,00	$ 156.574,00
7,23				Válvulas de compuerta de ø 1".	UND	1,00	$ 191.266,00	$ 191.266,00
7,24				Válvulas de compuerta de ø 2".	UND	6,00	$ 338.790,00	$ 2.032.740,00
7,25				Suministro e instalación de sanitario de tanque referencia institucional.	UND	15,00	$ 1.072.088,00	$ 16.081.320,00
7,26				Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer referencia institucional, incluye grifería tipo push, sifón y accesorios.	UND	17,00	$ 1.072.732,00	$ 18.236.444,00
7,27				Suministro e instalación de orinal referencia institucional, incluye grifería de push y accesorios.	UND	8,00	$ 1.035.029,00	$ 8.280.232,00
7,28				Suministro e instalación de ducha mezcladora.	UND	1,00	$ 400.227,00	$ 400.227,00
7,29				Suministro e instalación de lavaplatos de bajoponer según referencia arquitectónica, incluye sifón y accesorios.	UND	1,00	$ 273.062,00	$ 273.062,00
7,30				Suministro e instalación de lavatraperos.	UND	1,00	$ 291.478,00	$ 291.478,00
7,31				Suministro e instalación de llave de grifo para lavaplatos.	UND	1,00	$ 276.940,00	$ 276.940,00
7,32				Suministro e instalación de tubería PVC de ø3".	M	3,00	$ 107.083,00	$ 321.249,00
7,33				Suministro e instalación de valvula cheque Pie De ø4".	UND	2,00	$ 1.643.257,00	$ 3.286.514,00
7,34				Suministro e instalación de tubería PVC P de ø1".	M	6,00	$ 29.976,00	$ 179.856,00
7,35				Suministro e instalación tubería acero galvanizado de ø3".	M	6,00	$ 197.577,00	$ 1.185.462,00
7,36				Suministro e instalación valvula de compuerta de ø3/4".	UND	2,00	$ 156.574,00	$ 313.148,00
7,37				Suministro e instalación valvula de compuerta de ø3".	UND	2,00	$ 638.459,00	$ 1.276.918,00
7,38				Suministro e instalación de valvula cheque de ø3".	UND	2,00	$ 778.963,00	$ 1.557.926,00
7,39				Suministro e instalación de equipo de bombeo y presión constante.	UND	2,00	$ 36.752.297,00	$ 73.504.594,00
7,40				Suministro e Instalación de tubería de drenaje PDT 8". Incluye extendido, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	79,00	$ 142.962,00	$ 11.293.998,00
7,41				Suministro, transporte e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 TR (24.000 btuh) con fan coil de lujo y condensadora de descarga horizontal para trabajar con refrigerante ecológico R410a a 220V/1F/60Hz para R410a, incluye tubería, gases y accesorios necesarios para la presurización puesta en marcha del equipo.	UND	4,00	$ 3.611.154,00	$ 14.444.616,00
Subtotal								**$ 203.767.668,00**
7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS								
8,1				Adecuacion punto de conexión.	UND	1,00	$ 3.891.571,00	$ 3.891.571,00
8,2				Armado red MT doble terminal MT325.	UND	1,00	$ 4.977.280,00	$ 4.977.280,00
8,3				Armado red MT fin de linea MT321.	UND	1,00	$ 2.656.436,00	$ 2.656.436,00
8,4				Suministro e instalacion de red monofasica 2H ACSR 1/0 XLPE ecologico.	M	25,00	$ 82.549,00	$ 2.063.725,00
8,5				Suministro e instalacion de poste de concreto de 12x1050kg, incluye transporte, hincado, aplomado y cimentación.	UND	1,00	$ 6.865.142,00	$ 6.865.142,00

8,6				Suministro e instalacion de protecciones y herrajes para transformador.	UND	1,00	$ 4.165.279,00	$ 4.165.279,00
8,7				Suministro e instalacion de SPT para transformador y red MT.	UND	2,00	$ 1.371.880,00	$ 2.743.760,00
8,8				Suministro e instalacion de retenida MT a tierra.	UND	1,00	$ 1.399.992,00	$ 1.399.992,00
8,9				Suministro e instalacion de transformador 2F-120/240/13200V 100KVA.	UND	1,00	$ 49.069.419,00	$ 49.069.419,00
8,10				Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad.	M	998,00	$ 88.357,00	$ 88.180.286,00
8,11				Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación.	M	998,00	$ 72.731,00	$ 72.585.538,00
8,12				Bajante en tuberia IMC 4", incluye capacete y accesorios.	M	6,00	$ 590.449,00	$ 3.542.694,00
8,13				Banco de ducto 2" PVC conduit + reserva 2".	M	783,00	$ 55.490,00	$ 43.448.670,00
8,14				Banco de ducto 1" PVC conduit + reserva 3/4" PVC.	M	2.016,00	$ 35.239,00	$ 71.041.824,00
8,15				Acometida en 2(3x250 MCM THHN/THWN Cu)+1 No.2T Cu.	M	52,00	$ 1.363.448,00	$ 70.899.296,00
8,16				Acometida en 2No.1/0 Serie 8000+1No.2T Cu desnudo.	M	691,00	$ 146.355,00	$ 101.131.305,00
8,17				Acometida en 3No.2 Serie 8000+1No.4T Cu.	M	385,00	$ 125.632,00	$ 48.368.320,00
8,18				Ramal en 2No.6+1No.10 Cu THHN/THWN.	M	1.600,00	$ 78.547,00	$ 125.675.200,00
8,19				Ramal en 3No.12 LH en tuberia 3/4" PVC SCH40 /EMT.	M	50,00	$ 76.799,00	$ 3.839.950,00
8,20				Ramal en 3No.12 LH en tuberia 1/2" PVC SCH40 /EMT.	M	80,00	$ 66.818,00	$ 5.345.440,00
8,21				Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 AGW.	M	980,00	$ 30.177,00	$ 29.573.460,00
8,22				Tablero General de Distribucion y Control de Iluminacion, incluye una trabsferencia automatica de 500A, motorizada, 2 totalizadores de entradas de 400A, Breakers de protecciones para tableros secundatios, 7 de 2x50A, 25ka, 1 de 2x100A 25ka, 1 de 2x40A 25kA, 1 de 30A 25kA, DPS, 3 de 20A 25kA, 6 contactores de 70A, 2 de 40A, 8 pulsadores para encentido y apagado de iluminacion deportiva exterior, iluminacion interior del gabinete con sistema de encendido automatico, gabinete certificado en lámina cold roled y pintura electróstatica, espacios para entradas de acometidas y platicas de entradas en totalizadores para conexion con terminales bimetalicos.	UND	1,00	$ 48.084.669,00	$ 48.084.669,00
8,23				Suministro y montaje de tablero bimetalico de 18 circuitos bifasico, barraje min 125A, marquillado de acuerdo a reglamento técnico RETIE.	UND	1,00	$ 1.314.954,00	$ 1.314.954,00
8,24				Suministro y montaje de tablero de distribucion para sistema de bombeo, incluye totalizador de 2x70A, 2 totalizadores secundarios 2x40A, gabinete en lamina cold roled, pintura electrostatica.	UND	1,00	$ 10.812.182,00	$ 10.812.182,00
8,25				Suministro e instalacion de caja de abonado 8P para conexionado de luminarias.	UND	15,00	$ 1.166.242,00	$ 17.493.630,00
8,26				Suministro e instalacion de breaker enchufable 20A.	UND	15,00	$ 40.559,00	$ 608.385,00
8,27				Suministro e instalacion de breaker enchufable 2x20A.	UND	3,00	$ 104.990,00	$ 314.970,00
8,28				Suministro e instalacion de SPT en cable 4/0 cu desnudo, incluye, soldadura cadweld, varilla de puesta a tierra, pletina de puesta a tierra.	UND	1,00	$ 16.140.935,00	$ 16.140.935,00
8,29				Suministro e instalacion de sistema de apantallamiento para mastiles de iluminacion.	UND	6,00	$ 6.671.400,00	$ 40.028.400,00
8,30				Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios.	UND	87,00	$ 383.336,00	$ 33.350.232,00
8,31				Salida para iluminacion de emergencia en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios.	UND	18,00	$ 409.623,00	$ 7.373.214,00
8,32				Salida para interruptor sencillo en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF , incluye accesorios.	UND	28,00	$ 396.998,00	$ 11.115.944,00
8,33				Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios.	UND	14,00	$ 387.214,00	$ 5.420.996,00
8,34				Salida para tomacorriente GPFI en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF , incluye accesorios.	UND	6,00	$ 425.677,00	$ 2.554.062,00
8,35				Salida para tomacorriente 220V en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.10 LSHF , incluye accesorios.	UND	1,00	$ 549.977,00	$ 549.977,00
8,36				Salida para luminaria 220V en tuberia PVC 1", cable 2No.10 LSHF +12T, incluye accesorios.	UND	56,00	$ 258.586,00	$ 14.480.816,00
8,37				Suministro e instalacion de luminaria de empotrar/sobreponer 12w tipo panel / bala Led downlight, garantia minima 2 años.	UND	28,00	$ 184.210,00	$ 5.157.880,00
8,38				Suministro e instalacion de luminaria hermetica led plana 70W AC 85 265V 6500K.	UND	25,00	$ 206.211,00	$ 5.155.275,00
8,39				Suministro e instalacion de luminaria de emergencia Led autonomia min 3H.	UND	18,00	$ 255.535,00	$ 4.599.630,00
8,40				Suministro e instalacion de luminaria de aplique led 12w, 6500k.	UND	6,00	$ 252.605,00	$ 1.515.630,00
8,41				Suministro e instalacion de luminaria tipo alumbrado publico, 60w, 150 lm/w, 9000lm, 5000k, 50.000hrs, 5 años de garantia, inclinacion 150°x90°, CRI 80.	UND	66,00	$ 1.259.090,00	$ 83.099.940,00
8,42				Suministro e instalacion de Reflector Led 100w, 25.000 hrs.	UND	4,00	$ 341.514,00	$ 1.366.056,00
8,43				Suministro e instalacion luminaria especializada en escenarios deportivos exteriores led SMD3030/3050, Flujo 173.900Lm, 5000K, 100-277VAC, FP 0,95, THD15%, Vida Util 100.000 Hrs, IP66, IK08, EFIC driver superior a 93%, DPS 10KV, 5 años de garantia, Rertificacion RETILAP y UL. PC.	UND	36,00	$ 19.105.050,00	$ 687.781.800,00
8,44				Orientación de refletores deportivos.	UND	36,00	$ 647.205,00	$ 23.299.380,00
8,45				Suministro e instalación de farol led 12.000 Lm, 150Lm/w, 5000K, VU 100.000 hrs, 100-277VAC, IP66, 5 años de Garantia.	UND	19,00	$ 3.599.070,00	$ 68.382.330,00
8,46				Suministro e instalacion de poste alumbrado publico TIPO GARDEN, altura 5 a 6 mts, incluye pernos de anclaje.	UND	19,00	$ 3.101.465,00	$ 58.927.835,00
8,47				Suministro e instalacion de reflector 300W Led, 170Lm/w, 53100lm, MIN 25° apertura.	UND	20,00	$ 2.567.042,00	$ 51.340.840,00
8,48				Suministro e instalacion de reflector 400W Led, 170Lm/w, 71200lm, MIN 25° apertura.	UND	8,00	$ 3.309.769,00	$ 26.478.152,00
8,49				Suministro e instalación de cruceta soporte para reflectores.	UND	16,00	$ 549.014,00	$ 8.784.224,00
8,50				Suministro e Instalacion de mastil de lluminacion altura 22 mts, capacidad de 8 reflectores, incluye transporte, linea de vida.	UND	6,00	$ 55.632.696,00	$ 333.796.176,00
8,51				Zapata en concreto para poste de alumbrado publico.	UND	19,00	$ 765.645,00	$ 14.547.255,00
8,52				Suministro e instalacion de poste alumbrado publico en fibra de vidrio de 12m x 510Kg.	UND	29,00	$ 4.785.061,00	$ 138.766.769,00
8,53				Suministro e instalacion de poste alumbrado publico en fibra de vidrio de 12m x 510Kg.	UND	17,00	$ 4.409.965,00	$ 74.969.405,00
8,54				Cimentación en concreto para poste de alumbrado publico en fibra.	UND	55,00	$ 658.517,00	$ 36.218.435,00
8,55				Suministro e instalacion de medida semidirecta para operador de red.	UND	1,00	$ 21.773.082,00	$ 21.773.082,00
8,56				Registro electrico de 0.40x0.40m en mampostería reforzada, incluye tapa en concreto con angulos metalicos.	UND	82,00	$ 784.463,00	$ 64.325.966,00
8,57				Registro electrico de 0.60x0.60m en mampostería reforzada, incluye tapa en concreto con angulos metalicos.	UND	14,00	$ 1.061.406,00	$ 14.859.684,00
8,58				Registro electrico de 0.80x0.80m en mampostería reforzada, incluye tapa en concreto con angulos metalicos.	UND	4,00	$ 1.416.479,00	$ 5.665.916,00
Subtotal								**$ 2.681.919.613,00**

9,0 PISOS								
9,1				Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica.	M2	4.473,60	$ 13.446,00	$ 60.152.026,00
9,2				Suministro e instalación de geomembrana impermeable PEAD de 30 Mils (e=0.75mm).	M2	4.473,60	$ 36.209,00	$ 161.984.582,00
9,3				Suministro, transporte e instalación de grama sintetica de tercera generación hilo 11 mm, altura 50 mm color verde en fibra artificial de polietileno, fibrilado, estabilizado con protección U.V. color verde de tercera generación, en fibra artificial de polietileno, monofilamento extruido, grosor de fibras mayor o igual de 250 micras, ancho fibra mayor o igual a 1,4 mm, fibrilado, estabilizado con protección uv, de y altura 50 mm estabilizado, incluye imprimación densa, con material bituminoso para mayor adherencia.	M2	5.416,60	$ 242.629,00	$ 1.314.224.241,00
9,4				Plantilla de piso F'c=4.000 PSI (21 MPa), espesor e=0.08m. Incluye refuerzo en malla electrosoldada.	M2	212,83	$ 143.063,00	$ 30.448.098,00
9,5				Piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8 de uso institucional.	M2	95,43	$ 144.379,00	$ 13.778.088,00
9,6				Piso en cerámica terrazo o similar de 0.60x0.60 o similar para baño.	M2	98,07	$ 115.971,00	$ 11.373.276,00
9,7				Guardaescoba en granito pulido H=0.10m para muros.	M	114,74	$ 93.267,00	$ 10.701.456,00
9,8				Guardaescoba en ceramica H=0.10m para muros.	M	9,73	$ 53.612,00	$ 521.645,00
9,9				Junta en granito pulido fundido para remates en pasillos.	M	58,24	$ 71.784,00	$ 4.180.700,00
9,10				Pintura tipo trafico para piso según color especificado.	M2	660,00	$ 66.214,00	$ 43.701.240,00
9,11				Bordillo en concreto F'c=3500 PSI a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 m	M	763,48	$ 124.069,00	$ 94.724.200,00
9,12				Anden en concreto F'c=3.000 PSI (21 MPa), espesor e=10 cm. Incluye junta de dilatación y refuerzo.	M2	1.528,00	$ 141.287,00	$ 215.886.536,00
9,13				Viga cinta de confinamiento de 0.10x0.20 m fundido en sitio, en concreto 3.000 PSI (21 MPa) para Losetas. Incluye refuerzo según diseño.	M	793,00	$ 132.562,00	$ 105.121.666,00
9,14				Piso en adoquin rectangular 0.06 x 0.24 x 0.08, color según diseño arquitectónico. Incluye suministro e instalación y relleno de arena.	M2	7.739,14	$ 108.690,00	$ 841.167.127,00
9,15				Suministro e instalación de arena silice para cancha de volybol	M3	255,20	$ 1.952.171,00	$ 498.194.039,00
9,16				Suministro e instalación de alcorque circular D=2.00m según diseño arquitectónico	UND	40,00	$ 2.476.424,00	$ 99.056.960,00
Subtotal								**$ 3.505.215.880,00**
10,0 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA								
10,1				Suministro e instalacion de ventana tipo persina con marco en perfíl de aluminio color según especificación arquitectónica de 0.80 x 0.40m.	UND	1,00	$ 217.606,00	$ 217.606,00
10,2				Suministro e instalacion de ventana tipo persina con marco en perfíl de aluminio color según especificación arquitectónica de 1.50 x 0.40m.	UND	1,00	$ 317.235,00	$ 317.235,00
10,3				Suministro e instalacion de ventana tipo persina con marco en perfíl de aluminio color según especificación arquitectónica de 2.00 x 0.40m.	UND	15,00	$ 388.399,00	$ 5.825.985,00
10,4				Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 0.70x.2.20m.	UND	2,00	$ 1.124.839,00	$ 2.249.678,00
10,5				Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 0.90x.2.20m.	UND	1,00	$ 1.406.700,00	$ 1.406.700,00
10,6				Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 1.00x.2.20m.	UND	9,00	$ 1.582.212,00	$ 14.239.908,00
10,7				Suministro e instalación de puerta metalica. Marco en tubería metalica, lamina cold roller de acero, incluye cerradura y pintura electrostatica según especificación arquitectónica de 1.15x.2.20m.	UND	2,00	$ 1.793.608,00	$ 3.587.216,00
10,8				Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable para división de baño de 0.70x1.50m. Incluye pasador, bisagras y accesorios necesarios.	UND	10,00	$ 1.192.104,00	$ 11.921.040,00
10,9				Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable para división de baño de 1.15x1.50m. Incluye pasados, bisagras y accesorios necesarios.	UND	4,00	$ 2.396.424,00	$ 9.585.696,00
10,10				Suministro e instalación de lockers para camerinos en madera RH, ancho entre 0.50 y 0.80 alto=2.40m. Color según especificación arquitectónica, con puerta abatible en parte superior y cojín parte inferior	UND	32,00	$ 2.675.263,00	$ 85.608.416,00
Subtotal								**$ 134.959.480,00**
11,0 ACABADOS EN MUROS Y CIELO								
11,1				Aplicación de estuco muros interiores	M2	353,09	$ 48.392,00	$ 17.086.731,00
11,2				Aplicación de revoque fino impermeabilizado de acabado para muros exteriores. Color según especificación arquitectónica	M2	195,33	$ 46.223,00	$ 9.028.739,00
11,3				Pintura de vinilo tipo I, 3 manos para muros interiores.	M2	353,09	$ 23.147,00	$ 8.172.974,00
11,4				Ceramica para pared de baño, color según especificación arquitectónica, dimensión 0.09x0.27m.	M2	52,02	$ 198.003,00	$ 10.300.116,00
11,5				Ceramica para pared de baño, color según especificación arquitectónica, dimensión 0.30x0.30m.	M2	149,44	$ 133.710,00	$ 19.981.622,00
11,6				Pintura en Koraza o similar para exteriores, dos manos a una altura hasta h=5m	M2	195,33	$ 35.892,00	$ 7.010.784,00
11,7				Cielo raso en drywal 1/2" hasta una altura de 3.50m, incluye estructura y accesorios.	M2	193,51	$ 114.809,00	$ 22.216.690,00
11,8				Pintura de vinilo tipo II, 2 manos para cielo raso.	M2	193,51	$ 17.991,00	$ 3.481.438,00
11,9				Suministo e instalación de espejo flotante de 2.50 x 0.90.	UND	5,00	$ 993.928,00	$ 4.969.640,00
Subtotal								**$ 102.248.734,00**
12,0 SEÑALIZACION Y BARANDAS								
12,1				Suministro e instalación de señalización vertical para gradería, con poste metalico y estructura superior en acrilico, según especificación arquitectónica.	UND	11,00	$ 464.953,00	$ 5.114.483,00
12,2				Suministro e instalación de baranda en tuberia circular de acero galvanizado, h=1.10m, con pasamanos superior e intermedio y elementos verticales de soporte, incluye accesorios y elementos de anclaje y pintura.	M	62,00	$ 452.615,00	$ 28.062.130,00
12,3				Suministro e instalación de señaletica de pared en acrilico con dilatadores, incluye accesorios necesarios de 0.30 x 0.20.	UND	26,00	$ 56.797,00	$ 1.476.722,00
12,4				Suministro e instalación de señaletica de pared en acrilico para identificador de espacio de 0.60 x 1.80.	UND	5,00	$ 784.085,00	$ 3.920.425,00
Subtotal								**$ 38.573.760,00**
13,0 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS								
13,1				Suministro e instalación de caneca con soporte en acero inoxidable, medidas del tanque de 0,75m de altura x 0,50m de diámetro, con perforaciones en su circunferencia de 3/8" de diámetro.	UND	10,00	$ 1.869.896,00	$ 18.698.960,00
13,2				Cerramiento perimetral en malla modular de 2x2,5 m en alambre de 5 mm galvanizado y recubierto con resina de poliéster en sistema de inmersión. Fijada en tubería con abrazadera en acero galvanizado recubierta en PVC, según planos de diseño. Altura max 3,8 m. (Incluye tapas en polipropileno resistentes a rayos UV y bases soportes y anclajes expansivos con tuercas y arandelas).	m2	170,00	$ 472.169,00	$ 80.268.730,00
13,3				Suministro e instalación de portería con medidas fifa en aluminio para futbol 11.	UND	2,00	$ 5.291.717,00	$ 10.583.434,00
13,4				Suministro e instalación de juego de mallas profesionales para porteria.	UND	1,00	$ 3.421.730,00	$ 3.421.730,00
13,5				Suministro e instalación de banderines de tiro de esquina.	UND	4,00	$ 72.681,00	$ 290.724,00
Subtotal								**$ 113.263.578,00**

14,0 OTROS								
14,1				Aseo, limpieza general y retiro de escombros	M2	12.665,72	$ 6.986,00	$ 88.482.727,00
14,2				Retiro de material sobrante. Incluye disposición a botadero autorizado	M3	890,10	$ 119.840,00	$ 106.669.584,00
Subtotal								**$ 195.152.311,00**
SUBTOTAL OBRAS CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR, DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.								**$ 10.429.882.708,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR, DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		$	10.429.882.708,00
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	0,70%	$	56.160.907,00
TRAMITES, ESTUDIOS, PERMISOS Y DESCARGO DE OPERADOR DE RED	1,00%	$	80.229.867,00
ACOMETIDA DE LINEA DE AGUA POTABLE	0,50%	$	40.114.933,00
ACOMETIDA DE LINEA DE ALCANTARILLADO	1,00%	$	80.229.867,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1,00%	$	80.229.867,00
AJUSTE Y/O PROFUNDIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2,00%	$	160.459.734,00
VALOR TOTAL CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR, DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		**$**	**10.927.307.883,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

ANDREA CATALINA PLAZA SANCHEZ
Rep legal CONSORCIO INNOVACIÓN Y DEPORTE
