


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1							
2		**REMODELACIÓN BAÑOS ANTONIO NARIÑO**	**$ 396,832,755.00**	**90 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/07/26**	
3		**Remodelación Integral Bateria Baños Piso 6 - Hombres y Mujeres**	**$ 44,570,545.00**	**26 días**	**lun 2/03/26**	**lun 6/04/26**	
4		Localicación y Replanteo	$ 97,914.00	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	
5		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	$ 376,107.00	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	25
6		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	$ 556,892.00	4 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26	
7		Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	$ 71,485.00	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	6FC-2 días
8		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	$ 20,909.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	6FC-2 días
9		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	$ 435,981.00	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	6FC-2 días
10		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de	$ 601,772.00	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	6FC-2 días
11		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	$ 114,962.00	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	6FC-2 días
12		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	$ 203,956.00	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	6FC-2 días
13		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	$ 90,756.00	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	6FC-2 días
14		Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	$ 0.00	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	
15		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	$ 328,804.00	4 días	jue 5/03/26	mar 10/03/26	24FC-2 días
16		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	$ 39,452.00	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	6FC-2 días
17		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	$ 66,656.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	6FC-2 días
18		Desmonte de Secador de manos**	$ 38,693.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	6FC-2 días
19		Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	$ 906,081.00	4 días	jue 5/03/26	mar 10/03/26	24FC-2 días
20		Demolicion enchape de piso e=2cm*	$ 215,975.00	5 días	jue 5/03/26	mié 11/03/26	24FC-2 días
21		Desmonte Aparatos Sanitarios	$ 303,800.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	6FC-2 días
22		DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	$ 22,405.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	6FC-2 días
23		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	$ 249,396.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	6FC-2 días
24		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	$ 103,062.00	2 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26	23
25		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	$ 169,450.00	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	15
26		Protección de Extractor de Olores.	$ 51,548.00	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	4
27		AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	$ 527,675.00	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	40FC-5 días
28		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 3 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	$ 831,663.00	6 días	mié 4/03/26	mié 11/03/26	7FC-2 días
29		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	$ 33,683.00	4 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	28FC-2 días
30		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de	$ 1,177,659.00	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	28FC-2 días
31		POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40	$ 232,877.00	6 días	mar 10/03/26	mar 17/03/26	30FC-5 días

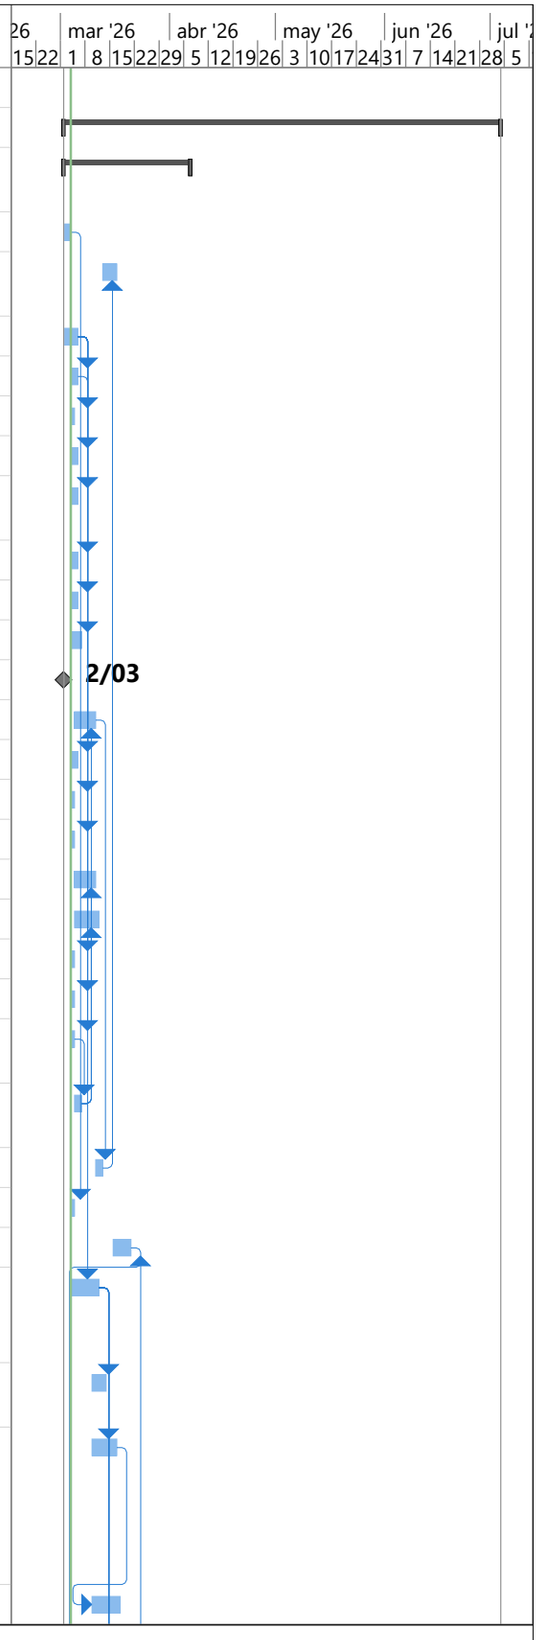


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32			SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	$ 514,677.00	4 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	28FC-2 días
33			SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	$ 823,220.00	4 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	28FC-2 días
34			Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	$ 211,777.00	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	28FC-2 días
35			SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	$ 518,471.00	4 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	28FC-2 días
36			DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	$ 166,529.00	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	28FC-2 días
37			Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	$ 146,460.00	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	28FC-2 días
38			MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	$ 0.00	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	
39			Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **	$ 0.00	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	
40			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	$ 2,604,377.00	8 días	mié 11/03/26	vie 20/03/26	37FC-4 días
41			PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	$ 199,341.00	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	37FC-1 día
42			Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	$ 110,404.00	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	37FC-1 día
43			Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	$ 710,055.00	8 días	lun 16/03/26	mié 25/03/26	37FC-1 día
44			Win de Aluminio Blanco**	$ 165,647.00	8 días	lun 16/03/26	mié 25/03/26	37FC-1 día
45			PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar piso	$ 2,073,983.00	15 días	lun 9/03/26	vie 27/03/26	27FC-10 días
46			Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	$ 4,607,185.00	15 días	jue 5/03/26	mié 25/03/26	43FC-15 días
47			Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	$ 760,768.00	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	48FC-3 días
48			ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	$ 249,401.00	8 días	lun 16/03/26	mié 25/03/26	40FC-5 días
49			Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	$ 398,844.00	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	48FC-3 días
50			PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar muros	$ 6,399,102.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	46FC-12 días
51			Pintura vinilo Techo(2 manos) **	$ 267,102.00	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26	40FC-2 días
52			Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	$ 448,335.00	4 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26	37FC-4 días
53			Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	$ 118,860.00	5 días	mié 11/03/26	mar 17/03/26	37FC-4 días
54			LAVAMANOS NOVARA CRNA **	$ 1,739,844.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
55			Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	$ 1,504,066.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
56			DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA (Dalia Grival)	$ 333,539.00	10 días	mar 10/03/26	lun 23/03/26	50FC-15 días
57			Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 1,328,600.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
58			Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 5,156,038.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
59			Reinstalación de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	$ 365,890.00	2 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26	58FC-2 días

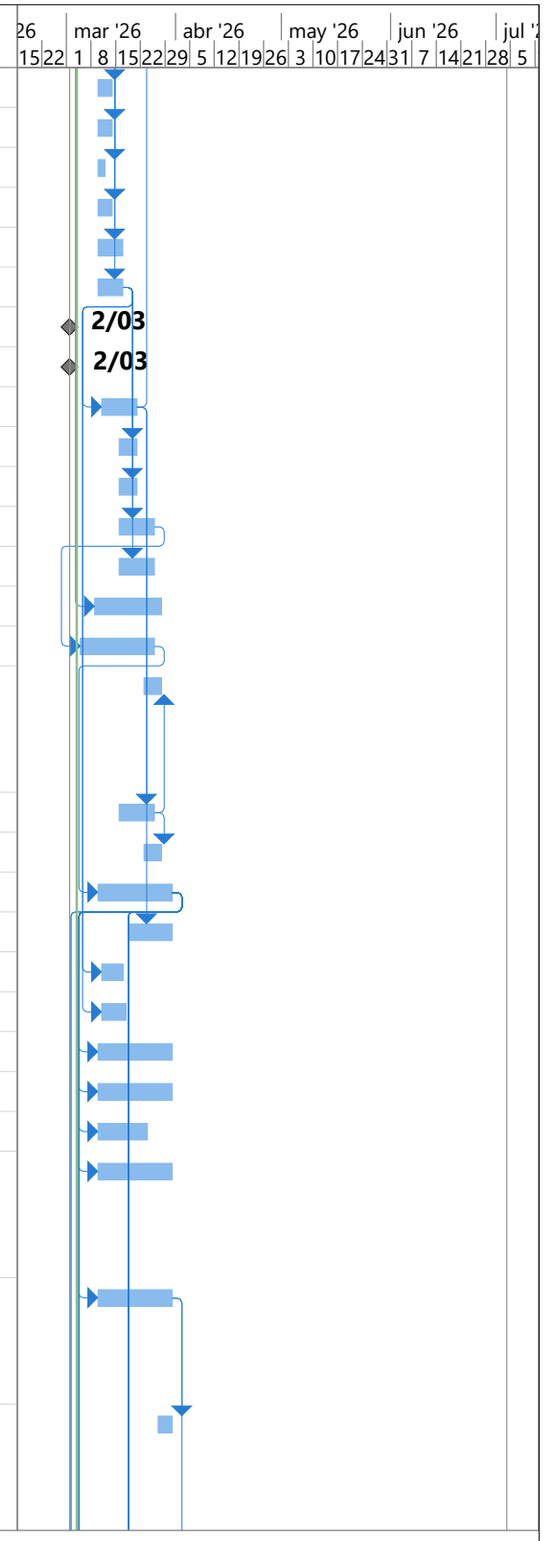


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
60		Reinstalación de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	$ 301,484.00	2 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26	58FC-2 días
61		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	$ 1,872,005.00	17 días	mar 10/03/26	mié 1/04/26	50FC-15 días
62		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	$ 352,317.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
63		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	$ 476,605.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
64		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	$ 466,064.00	15 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
65		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	$ 0.00	0 días	mar 10/03/26	mar 10/03/26	50FC-15 días
66		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	$ 0.00	0 días	mar 10/03/26	mar 10/03/26	50FC-15 días
67		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	$ 59,774.00	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	50FC-15 días
68		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	$ 161,922.00	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	50FC-15 días
69		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	$ 87,252.00	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	50FC-15 días
70		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	$ 66,286.00	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	50FC-15 días
71		LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	$ 102,048.00	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26	50FC-15 días
72		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	$ 31,415.00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	50FC-15 días
73		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	$ 191,690.00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	50FC-15 días
74		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	$ 609,555.00	10 días	mar 24/03/26	lun 6/04/26	50FC-15 días
75		**Remodelación Integral Bateria Baños Piso 5 - Hombres y Mujeres**	**$ 61,697,521.00**	**41 días**	**mar 24/03/26**	**mar 19/05/26**	
76		Localicación y Replanteo	$ 97,935.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	
77		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	$ 376,107.00	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26	
78		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	$ 556,892.00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	
79		Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	$ 71,485.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
80		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	$ 20,909.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	
81		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	$ 272,488.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
82		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de	$ 0.00	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	
83		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	$ 0.00	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	
84		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	$ 203,956.00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	80FC-2 días
85		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	$ 610,786.00	3 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	80FC-2 días
86		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	$ 328,804.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
87		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	$ 52,603.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
88		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	$ 0.00	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	80FC-2 días
89		Desmonte de Secador de manos**	$ 38,693.00	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	80FC-2 días
90		Protección de Extractor de Olores.	$ 51,548.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días

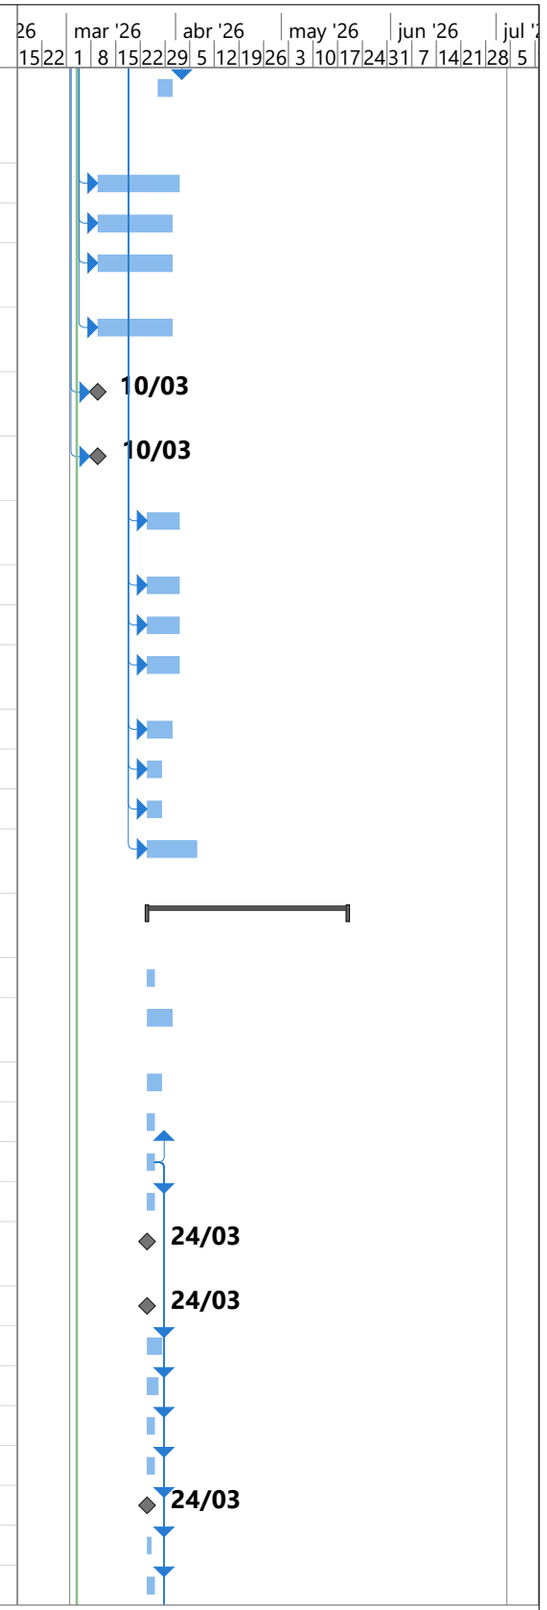


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
91		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	$ 142,512.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
92		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	$ 103,062.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
93		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	$ 169,450.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
94		Desmonte Aparatos Sanitarios	$ 390,600.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
95		DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	$ 22,405.00	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	80FC-2 días
96		Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	$ 906,081.00	6 días	mar 24/03/26	mar 31/03/26	80FC-2 días
97		Demolicion enchape de piso e=2cm*	$ 215,975.00	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26	80FC-2 días
98		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 1 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	$ 831,663.00	5 días	jue 26/03/26	mié 1/04/26	97FC-3 días
99		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	$ 33,683.00	5 días	jue 26/03/26	mié 1/04/26	97FC-3 días
100		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de	$ 1,177,659.00	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	97FC-3 días
101		AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	$ 527,675.00	6 días	mar 24/03/26	mar 31/03/26	
102		SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	$ 514,677.00	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	97FC-3 días
103		SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	$ 823,220.00	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	97FC-3 días
104		DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	$ 166,529.00	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	97FC-3 días
105		Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	$ 211,777.00	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	97FC-3 días
106		SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	$ 518,471.00	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	97FC-3 días
107		Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	$ 760,768.00	8 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26	97FC-3 días
108		Pintura vinilo Techo(2 manos) **	$ 267,102.00	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	
109		Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	$ 717,336.00	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	106FC-2 días
110		Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	$ 169,800.00	4 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26	106FC-2 días
111		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	$ 2,604,377.00	9 días	lun 30/03/26	jue 9/04/26	106FC-2 días
112		PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	$ 0.00	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26	
113		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	$ 110,404.00	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	106FC-2 días
114		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	$ 710,055.00	8 días	lun 30/03/26	mié 8/04/26	106FC-2 días
115		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	$ 7,566,271.00	14 días	jue 26/03/26	mar 14/04/26	114FC-10 días
116		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	$ 146,460.00	8 días	lun 30/03/26	mié 8/04/26	106FC-2 días
117		Win de Aluminio Blanco**	$ 165,647.00	5 días	vie 17/04/26	jue 23/04/26	118FC-5 días
118		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	$ 2,073,983.00	15 días	vie 3/04/26	jue 23/04/26	111FC-5 días

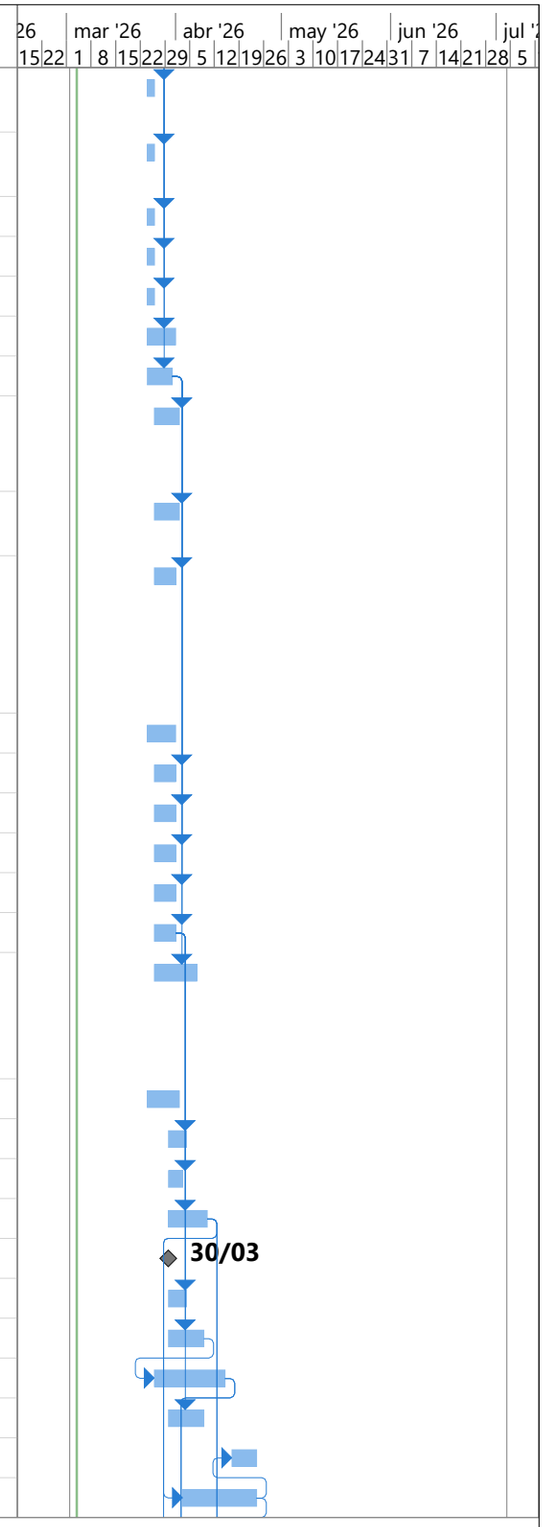


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
119		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 1,328,600.00	15 días	mié 8/04/26	mar 28/04/26	115FC-5 días
120		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	$ 6,399,102.00	15 días	vie 17/04/26	jue 7/05/26	118FC-5 días
121		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 10,312,076.00	15 días	mar 28/04/26	lun 18/05/26	120FC-8 días
122		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	$ 1,675,842.00	15 días	mié 8/04/26	mar 28/04/26	115FC-5 días
123		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	$ 1,504,066.00	15 días	mar 28/04/26	lun 18/05/26	120FC-8 días
124		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	$ 352,317.00	15 días	mar 28/04/26	lun 18/05/26	120FC-8 días
125		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	$ 476,605.00	15 días	mar 28/04/26	lun 18/05/26	120FC-8 días
126		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	$ 466,064.00	15 días	mar 28/04/26	lun 18/05/26	120FC-8 días
127		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	$ 0.00	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	120FC-8 días
128		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	$ 0.00	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	120FC-8 días
129		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	$ 59,774.00	8 días	mar 28/04/26	jue 7/05/26	120FC-8 días
130		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	$ 161,922.00	8 días	mar 28/04/26	jue 7/05/26	120FC-8 días
131		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	$ 87,252.00	8 días	mar 28/04/26	jue 7/05/26	120FC-8 días
132		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	$ 66,286.00	8 días	mar 28/04/26	jue 7/05/26	
133		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	$ 249,401.00	6 días	vie 3/04/26	vie 10/04/26	111FC-5 días
134		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	$ 398,844.00	5 días	mié 8/04/26	mar 14/04/26	111FC-2 días
135		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	$ 12,596,862.00	15 días	vie 10/04/26	jue 30/04/26	111
136		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	$ 31,415.00	4 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	120
137		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	$ 191,690.00	4 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	120
138		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	$ 609,555.00	8 días	vie 8/05/26	mar 19/05/26	120
139		**Remodelación Integral Bateria Baños Piso 4 - Hombres y Mujeres**	**$ 61,923,064.00**	**37 días**	**lun 20/04/26**	**mar 9/06/26**	
140		Localicación y Replanteo	$ 97,935.00	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	148
141		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	$ 376,107.00	5 días	mié 29/04/26	mar 5/05/26	155FC-1 día
142		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	$ 556,892.00	4 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	155FC-1 día
143		Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	$ 71,485.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
144		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	$ 20,909.00	2 días	lun 27/04/26	mar 28/04/26	
145		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	$ 272,488.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
146		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de	$ 0.00	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	144FC-1 día

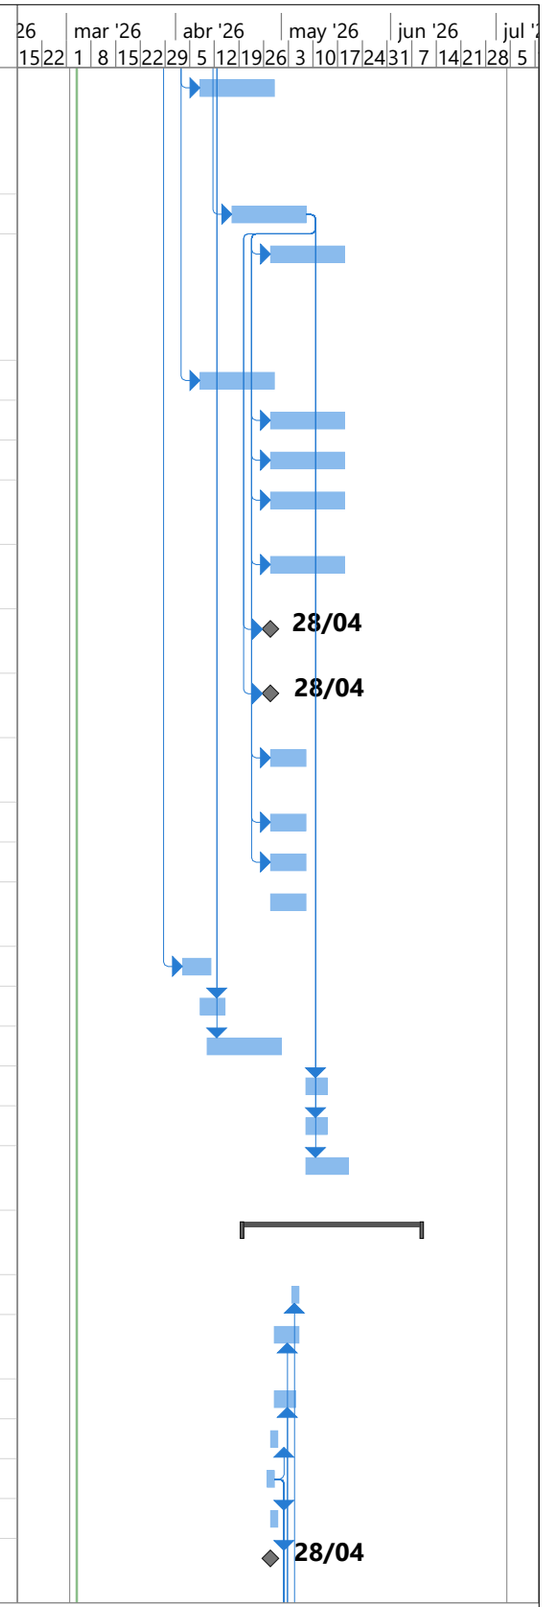


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
147			Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	$ 0.00	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	144FC-1 día
148			Desmonte y retiro de red electrica Interna**	$ 203,956.00	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	144FC-1 día
149			Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	$ 610,786.00	3 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	144FC-1 día
150			Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	$ 328,804.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
151			Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	$ 52,603.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
152			DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	$ 0.00	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	144FC-1 día
153			Desmonte de Secador de manos**	$ 38,693.00	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	144FC-1 día
154			Protección de Extractor de Olores.	$ 51,548.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
155			Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	$ 142,512.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
156			Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	$ 103,062.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
157			DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	$ 169,450.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
158			Desmonte Aparatos Sanitarios	$ 390,600.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
159			DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	$ 22,405.00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	144FC-1 día
160			Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	$ 906,081.00	5 días	mar 28/04/26	lun 4/05/26	144FC-1 día
161			Demolicion enchape de piso e=2cm*	$ 215,975.00	4 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	144FC-1 día
162			Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 1 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	$ 831,663.00	5 días	mié 29/04/26	mar 5/05/26	161FC-3 días
163			Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	$ 33,683.00	5 días	mié 29/04/26	mar 5/05/26	161FC-3 días
164			Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de	$ 1,177,659.00	4 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	161FC-3 días
165			AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	$ 527,675.00	6 días	lun 20/04/26	lun 27/04/26	
166			SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	$ 514,677.00	4 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	161FC-3 días
167			SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	$ 823,220.00	4 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	161FC-3 días
168			DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	$ 166,529.00	4 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	167FC-2 días
169			Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	$ 211,777.00	4 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	161FC-3 días
170			SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	$ 518,471.00	4 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	161FC-3 días
171			Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	$ 760,768.00	8 días	mié 29/04/26	vie 8/05/26	161FC-3 días
172			Pintura vinilo Techo(2 manos) **	$ 267,102.00	7 días	lun 20/04/26	mar 28/04/26	
173			Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	$ 896,670.00	5 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	171FC-2 días
174			Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	$ 169,800.00	4 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	171FC-2 días
175			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	$ 2,604,377.00	9 días	jue 7/05/26	mar 19/05/26	171FC-2 días
176			PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	$ 0.00	0 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26	171FC-2 días

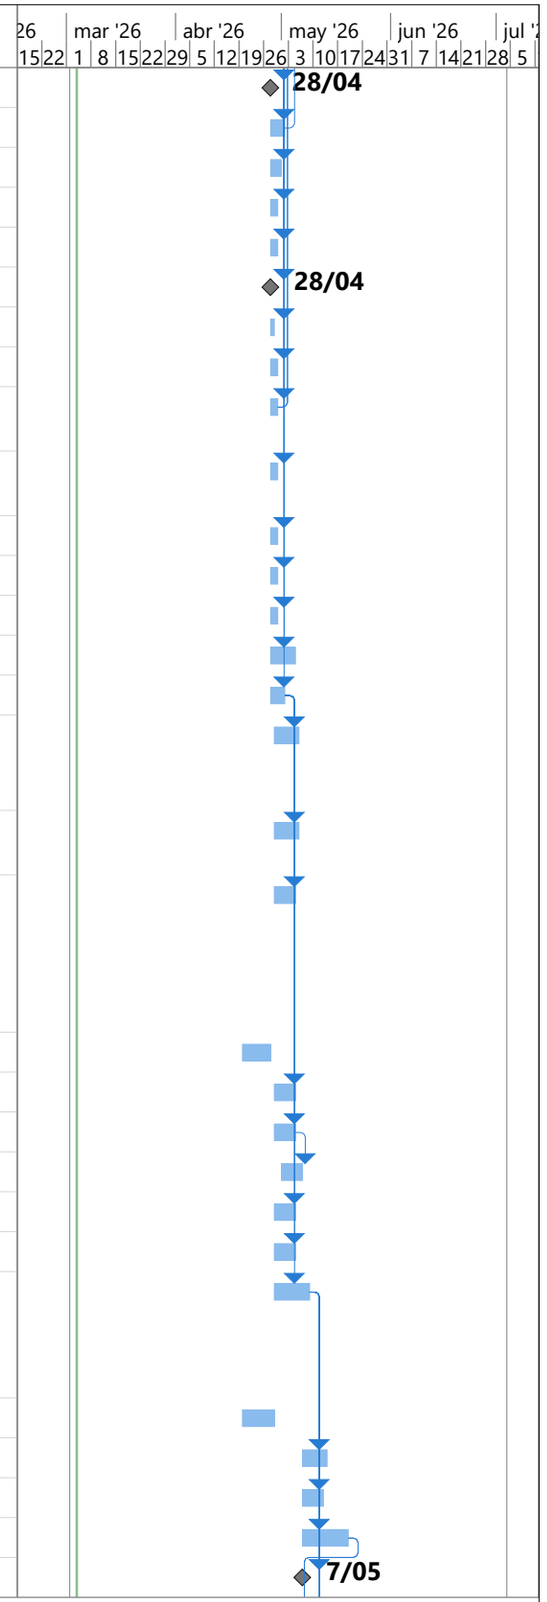


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
177		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	$ 110,404.00	5 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	171FC-2 días
178		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	$ 710,055.00	8 días	mié 13/05/26	vie 22/05/26	175FC-5 días
179		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	$ 7,566,271.00	14 días	mié 13/05/26	lun 1/06/26	178FC-8 días
180		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	$ 146,460.00	8 días	jue 7/05/26	lun 18/05/26	171FC-2 días
181		Win de Aluminio Blanco**	$ 165,647.00	5 días	lun 1/06/26	vie 5/06/26	182FC-4 días
182		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	$ 2,073,983.00	15 días	vie 15/05/26	jue 4/06/26	179FC-12 días
183		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 1,328,600.00	15 días	mar 19/05/26	lun 8/06/26	179FC-10 días
184		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	$ 6,399,102.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
185		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 10,312,076.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
186		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	$ 1,675,842.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
187		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	$ 1,504,066.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
188		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	$ 352,317.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
189		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	$ 476,605.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
190		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	$ 466,064.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
191		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	$ 0.00	0 días	mié 20/05/26	mié 20/05/26	179FC-9 días
192		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	$ 44,474.00	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	179FC-9 días
193		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	$ 59,774.00	8 días	vie 29/05/26	mar 9/06/26	184FC-8 días
194		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	$ 161,922.00	8 días	vie 29/05/26	mar 9/06/26	184FC-8 días
195		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	$ 87,252.00	8 días	vie 29/05/26	mar 9/06/26	184FC-8 días
196		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	$ 66,286.00	8 días	vie 29/05/26	mar 9/06/26	184FC-8 días
197		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	$ 249,401.00	6 días	jue 7/05/26	jue 14/05/26	171FC-2 días
198		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	$ 398,844.00	5 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	171FC-2 días
199		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	$ 12,598,597.00	15 días	mié 13/05/26	mar 2/06/26	175FC-5 días
200		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	$ 31,415.00	4 días	vie 29/05/26	mié 3/06/26	184FC-8 días
201		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	$ 191,690.00	4 días	vie 29/05/26	mié 3/06/26	184FC-8 días
202		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	$ 609,555.00	8 días	vie 29/05/26	mar 9/06/26	184FC-8 días
203		**Remodelación Integral Bateria Baños Piso 2 - Hombres y Mujeres**	**$ 61,043,558.00**	**31 días**	**mié 13/05/26**	**mié 24/06/26**	
204		Localicación y Replanteo	$ 97,935.00	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26	207FC-5 días
205		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	$ 376,107.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días

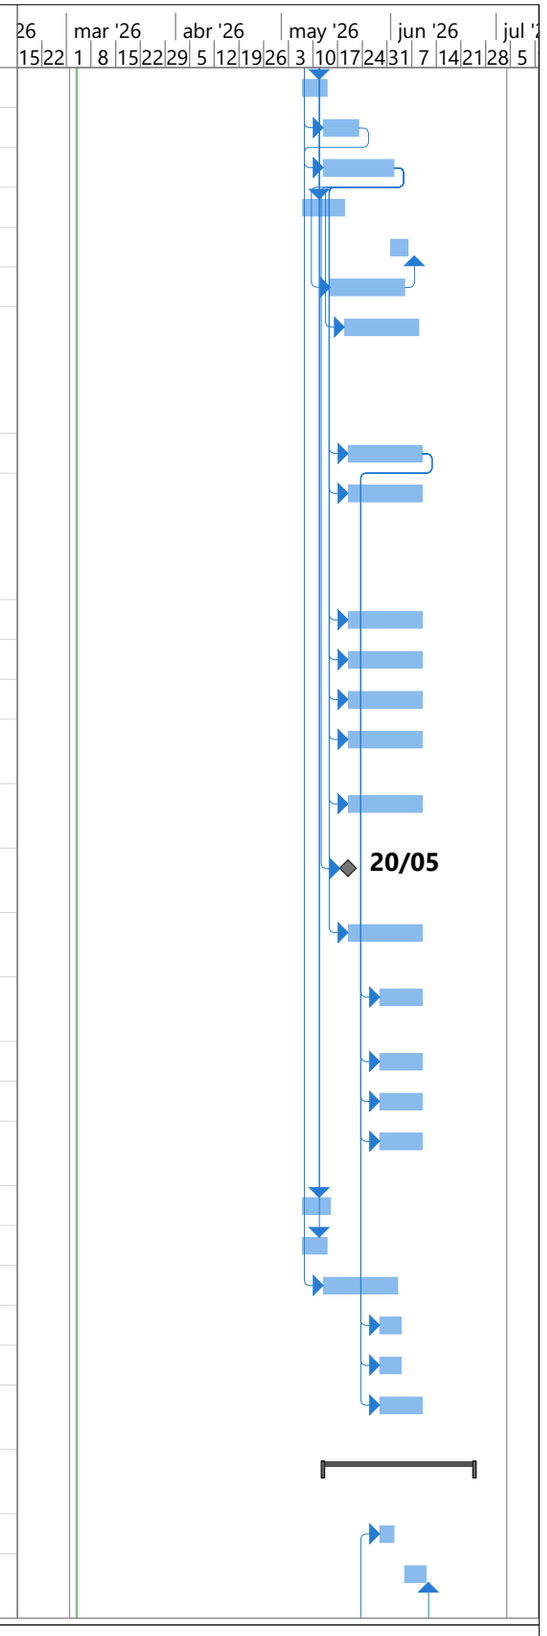


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
206		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	$ 556,892.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
207		Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	$ 71,485.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
208		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores	$ 20,909.00	4 días	vie 29/05/26	mié 3/06/26	
209		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	$ 272,488.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
210		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de	$ 0.00	0 días	mié 3/06/26	mié 3/06/26	208FC-1 día
211		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	$ 0.00	0 días	mié 3/06/26	mié 3/06/26	208FC-1 día
212		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	$ 203,956.00	4 días	mié 3/06/26	lun 8/06/26	208FC-1 día
213		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	$ 610,786.00	3 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26	208FC-1 día
214		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	$ 328,804.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
215		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	$ 52,603.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
216		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	$ 0.00	0 días	mié 3/06/26	mié 3/06/26	208FC-1 día
217		Desmonte de Secador de manos**	$ 38,693.00	1 día	mié 3/06/26	mié 3/06/26	208FC-1 día
218		Protección de Extractor de Olores.	$ 51,548.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
219		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	$ 142,512.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
220		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	$ 103,062.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
221		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	$ 0.00	0 días	mié 3/06/26	mié 3/06/26	208FC-1 día
222		Desmonte Aparatos Sanitarios	$ 390,600.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
223		DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	$ 22,405.00	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	208FC-1 día
224		Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	$ 906,081.00	5 días	mié 3/06/26	mar 9/06/26	208FC-1 día
225		Demolicion enchape de piso e=2cm*	$ 215,975.00	4 días	mié 3/06/26	lun 8/06/26	208FC-1 día
226		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 1 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	$ 831,663.00	5 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26	225FC-2 días
227		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	$ 33,683.00	5 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26	225FC-2 días
228		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de	$ 1,177,659.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
229		AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	$ 527,675.00	6 días	mié 13/05/26	mié 20/05/26	
230		SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	$ 514,677.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
231		SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	$ 823,220.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
232		DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	$ 166,529.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
233		Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	$ 211,777.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
234		SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	$ 518,471.00	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	225FC-2 días
235		Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	$ 760,768.00	5 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26	225FC-2 días

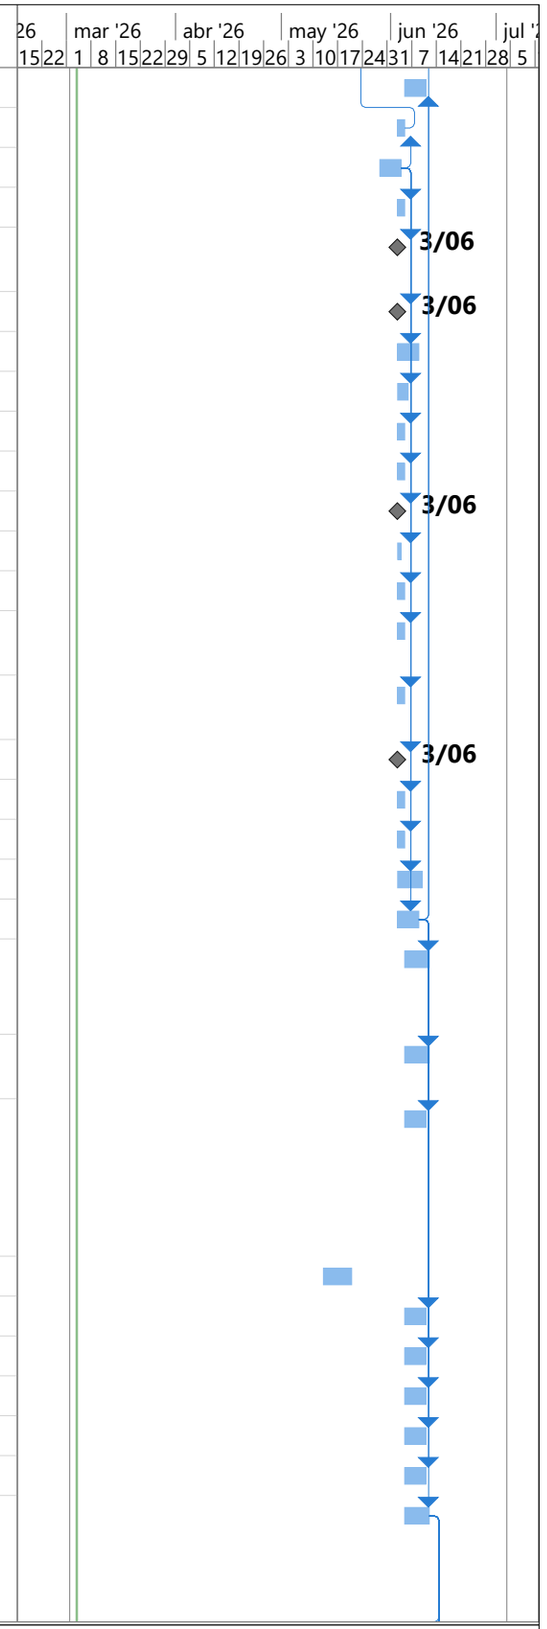

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
236		Pintura vinilo Techo(2 manos) **	$ 267,102.00	6 días	lun 8/06/26	lun 15/06/26	235FC-4 días
237		Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	$ 796,169.00	5 días	lun 8/06/26	vie 12/06/26	235FC-4 días
238		Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	$ 169,800.00	4 días	lun 8/06/26	jue 11/06/26	235FC-4 días
239		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	$ 2,604,377.00	8 días	lun 8/06/26	mié 17/06/26	235FC-4 días
240		PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	$ 0.00	0 días	lun 8/06/26	lun 8/06/26	235FC-4 días
241		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	$ 110,404.00	5 días	lun 8/06/26	vie 12/06/26	235FC-4 días
242		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	$ 710,055.00	8 días	jue 11/06/26	lun 22/06/26	239FC-5 días
243		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	$ 7,566,271.00	14 días	vie 5/06/26	mié 24/06/26	242FC-12 días
244		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	$ 146,460.00	8 días	lun 8/06/26	mié 17/06/26	235FC-4 días
245		Win de Aluminio Blanco**	$ 165,647.00	5 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	246FC-5 días
246		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	$ 2,073,983.00	15 días	mar 2/06/26	lun 22/06/26	239FC-12 días
247		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 1,328,600.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
248		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	$ 6,399,102.00	15 días	mar 2/06/26	lun 22/06/26	239FC-12 días
249		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	$ 10,312,076.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
250		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	$ 1,675,842.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
251		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	$ 1,504,066.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
252		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	$ 352,317.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
253		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	$ 476,605.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
254		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	$ 466,064.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
255		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	$ 0.00	0 días	jue 4/06/26	jue 4/06/26	243FC-15 días
256		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	$ 44,474.00	15 días	jue 4/06/26	mié 24/06/26	243FC-15 días
257		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	$ 59,774.00	8 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26	243FC-15 días
258		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	$ 161,922.00	8 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26	243FC-15 días
259		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	$ 87,252.00	8 días	jue 11/06/26	lun 22/06/26	246FC-8 días
260		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	$ 66,286.00	8 días	mié 13/05/26	vie 22/05/26	
261		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	$ 249,401.00	6 días	lun 8/06/26	lun 15/06/26	235FC-4 días
262		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	$ 398,844.00	5 días	lun 8/06/26	vie 12/06/26	235FC-4 días
263		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	$ 12,598,597.00	15 días	mié 3/06/26	mar 23/06/26	246FC-14 días
264		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	$ 31,415.00	4 días	mar 16/06/26	vie 19/06/26	246FC-5 días
265		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	$ 191,690.00	4 días	mar 16/06/26	vie 19/06/26	246FC-5 días

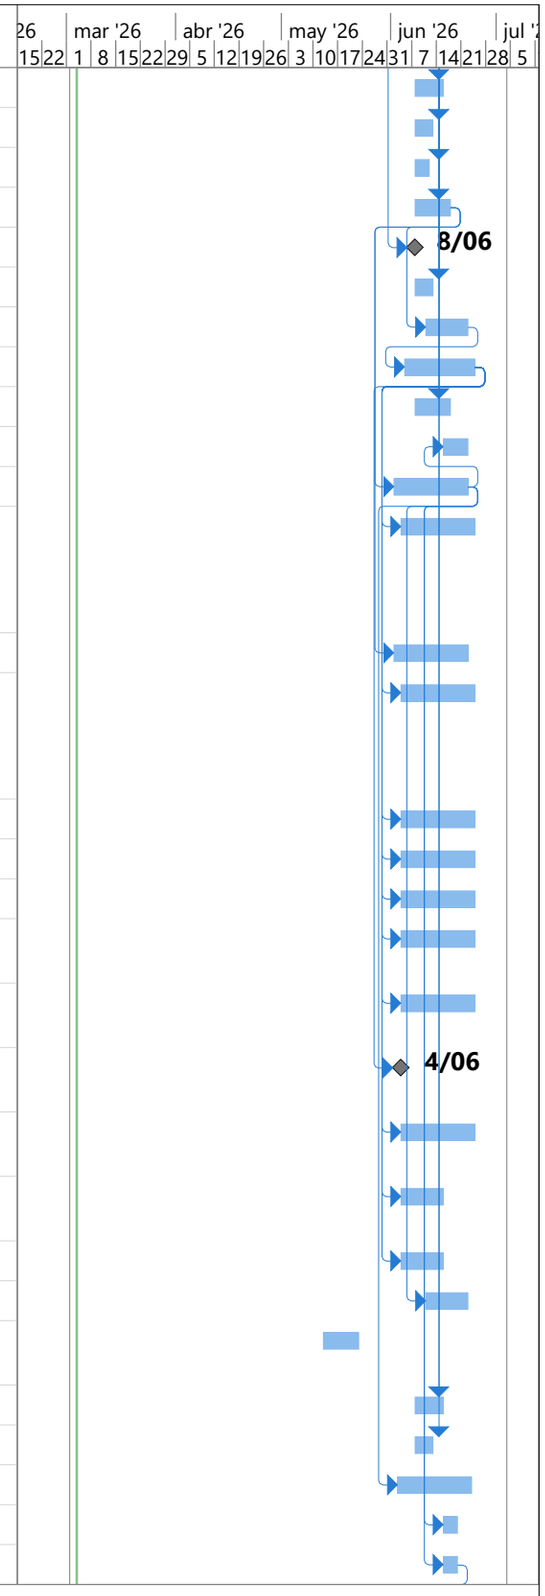

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
266		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	$ 0.00	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	265FC-5 días
267		**Insonorización Ventanas Piso 3 y 4 - Muro Divisorio Ediles**	**$ 76,499,373.00**	**84 días**	**mar 10/03/2**	**vie 3/07/26**	
268		Suministro e instalación de ventanas termoacústico vidrio sellado, marco en aluminio sistema (EUROPEO CORREDERA O BATIENTE)	$ 58,846,985.00	84 días	mar 10/03/26	vie 3/07/26	
269		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	$ 625,480.00	15 días	lun 1/06/26	mié 1/07/26	268FC-25 días
270		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	$ 928,153.00	15 días	lun 25/05/26	vie 26/06/26	268FC-30 días
271		DESMONTE VENTANA PERSIANA OF.DIRECC. GENERAL	$ 8,652,182.00	35 días	lun 6/04/26	jue 18/06/26	268FC-65 días
272		Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	$ 896,544.00	48 días	lun 6/04/26	mié 1/07/26	268FC-65 días
273		MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9	$ 913,453.00	25 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26	
274		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	$ 185,906.00	8 días	lun 25/05/26	mié 3/06/26	273FC-5 días
275		Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	$ 106,919.00	5 días	jue 4/06/26	mié 10/06/26	274
276		GUARDAESCOBA PORCELANATO BOUT. GIORDANO	$ 149,487.00	4 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26	275
277		Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	$ 5,194,264.00	19 días	lun 25/05/26	jue 18/06/26	273FC-5 días
278		**COSTOS FIJOS ACTIVIDADES AMBIENTALES**	**$ 2,130,082.00**	**90 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/07/26**	
279		COSTOS FIJOS ACTIVIDADES AMBIENTALES	$ 2,130,082.00	90 días	lun 2/03/26	vie 3/07/26	
280		**RELACIÓN COSTOS INDIRECTOS AIU**	**$ 88,968,612.00**	**90 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/07/26**	
281		**ADMINISTRACIÓN**	$ 70,624,568.00	**90 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/07/26**	
282		**IMPREVISTOS**	$ 3,057,341.00	**90 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/07/26**	
283		**UTILIDAD**	$ 15,286,703.00	**90 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/07/26**	

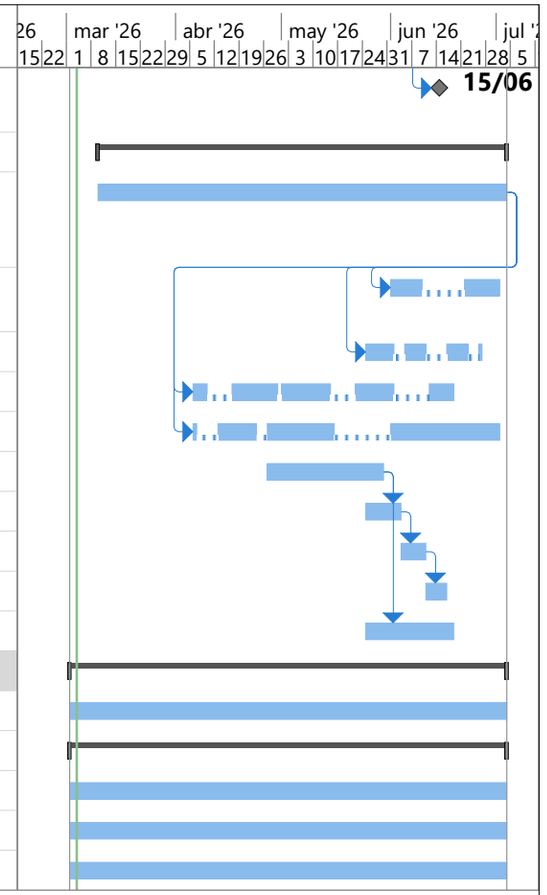

Arq. Amparo Hernandez Ayure
Representante Legal
