NUMERO DEL INFORME: 8

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO DEL (13/01/2026) AL (31/01/2026)

OBJETO/PROYECTO:

"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA".

CONTRATANTE

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Elaboro	Reviso	Aprobó
Residente interventoría. Residente SST interventoría. Residente Ambiental Interventoría.	Director de Interventoría	

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Información General de la OBRA**
   - **1.1.** Descripción general de la OBRA
   - **1.2.** Localización de la OBRA
   - **1.3.** Información básica de los contratos
     - **1.3.1.** Contrato de Obra
     - **1.3.2.** Contrato de Interventoría

2. **Informe Técnico del Seguimiento al Contrato de OBRA**
   - **2.1.** Control de ejecución
     - **2.1.1.** Análisis de cada una de las actividades de obra programadas de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas
   - **2.2.** Control y seguimiento a licencias, permisos, servicios públicos
   - **2.3.** Seguimiento al estado del tiempo
   - **2.4.** Control del material en obra
   - **2.5.** Control de ensayos de laboratorio
   - **2.6.** Control de equipos en obra
   - **2.7.** Control de entrega y cambios de estudios y diseños

3. **Informe de monitoreo y seguimiento social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, de los contratos de ejecución de OBRA**
   - **3.1.** Informe social
     - **3.1.1.** Actividades de la interventoría tendientes al monitoreo y seguimiento social, de los contratos de ejecución de OBRA
     - **3.1.2.** Relación de las actividades del contratista de obra del componente social
     - **3.1.3.** Otras actividades propias de gestión social de la obra
     - **3.1.4.** Consolidado de gestión social
     - **3.1.5.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría
   - **3.2.** Informe ambiental
     - **3.2.1.** Programas del Plan de Acción ambiental de la OBRA
     - **3.2.2.** Programa de capacitaciones y/o inducciones realizadas
     - **3.2.3.** Plan de monitoreo y seguimiento (Formato indicadores)
     - **3.2.4.** Seguimiento al presupuesto ambiental (Formato vigente)
     - **3.2.5.** Observaciones y recomendaciones de la interventoría
   - **3.3.** Informe de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST
     - **3.3.1.** Actividades realizadas en el componente de Salud y Seguridad en el Trabajo - SST
     - **3.3.2.** Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (contratista de obra)
     - **3.3.3.** Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (interventoría de obra)

4. **Informe administrativo de seguimiento al contrato de OBRA**
   - **4.1.** Control del personal del contratista de obra asociado al proyecto (administrativo y técnico) y de su pago de seguridad social integral
   - **4.2.** Control del cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra frente a la subcontratación
   - **4.3.** Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de obra y su mitigación
   - **4.4.** Control a los compromisos definidos en los comités de obra
   - **4.5.** Correspondencia enviada y recibida
   - **4.6.** Copia de la Bitácora

5. Informe Financiero y Contable

5.1. Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra
5.2. Relación de pagos y amortización de anticipo (si aplica) del contrato de obra
5.3. Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de obra (si aplica)
5.4. Relación de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones.
5.5. Relación de los imprevistos causados, demostrados y facturados.

6. Informe Jurídico

6.1. Relación de reclamaciones
6.2. Relación de sanciones
6.3. Control al estado de las garantías del contrato de Obra

7. Registro Fotográfico del avance de la obra

8. Recomendaciones y conclusiones generales de la Interventoría sobre el desarrollo del contrato de Obra


9. Anexos

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA:

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

La E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO ASÍS, celebra el contrato de obra No INV002-2025, el cual tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA”.
Teniendo como propósito principal realizar la construcción de unos de los hospitales más modernos del oriente del departamento de Antioquia dentro de su categoría en el municipio de san francisco con servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, sala de parto, esterilización y vacunación. Lo anterior, con el fin de garantizar los servicios en materia de salud de la población.

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

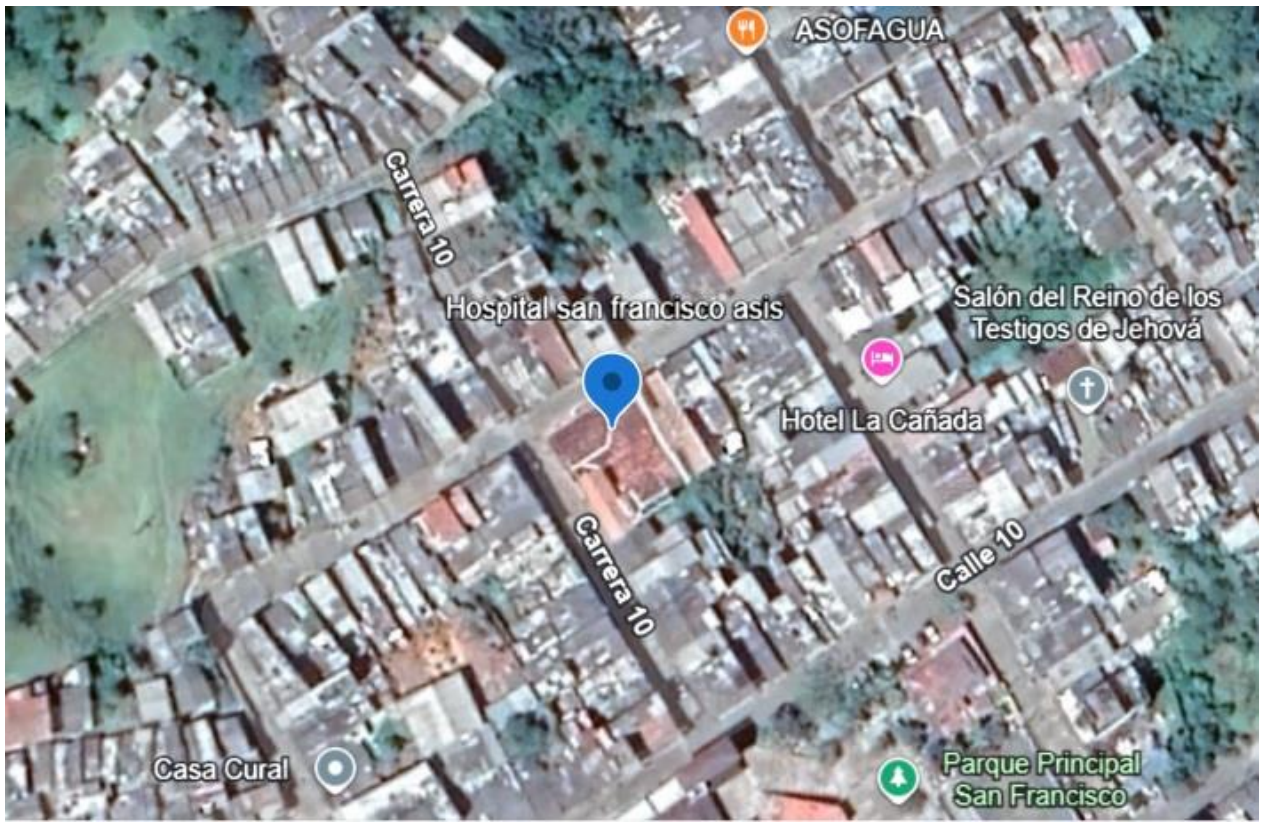

1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATO DE OBRA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	INV002-2025
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO
NIT:	901957619-4
REPRESENTENTE LEGAL:	EDILBERTO DE JESUS LOPEZ CORREA
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	07-07-2025
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07-02-2026
PLAZO ACTUAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	20-12-2025
ACTA DE REINICIO N°1	13-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	02-03-2026
VALOR INICIAL:	$5.980.082.711
VALOR ACTUAL:	$5.980.082.711
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	INV004-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA
NIT:	900.911.841-1
REPRESENTENTE LEGAL:	ELOY EDUARDO PALACIO RAMIREZ
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	07-07-2025
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07-02-2026
PLAZO ACTUAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE SUPENSIÓN N°1	20-12-2025
ACTA DE REINICIO N°1	13-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	02-03-2026
VALOR INICIAL:	$407.958.255
VALOR ACTUAL:	$407.958.255
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:

2.1.1. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS ACTIVIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS:

.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN - ACTIVIDAD	UNIDAD	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	OBSERVACIONES
1	**CIELO FALSOS**				
1,01	Suministro, transporte y construcción de Cielo rasos en Dry wall ., lámina de 1,22x2,44 mt. a junta perdida. Estructura en lamina galvanizada, incluye cuelgas y todos los elementos para fijación	M2	80%	95%	Las actividades se encuentran en atraso de acuerdo a la programación de obra por que se necesita realizar las instalaciones de los equipos en importación para finalizar la actividad
2	**ACABADOS**				
2,01	S/I de mediacaña en pvc para cielo raso	ml	0%	95%	Las actividades se encuentran en atraso de acuerdo a la programación de obra por que se necesita realizar las instalaciones de los equipos en importación para finalizar la actividad
2,02	S/I de guarda camilla en pvc, color a escoger, sistema clip, incluye terminales.	ml	0%	95%	Las actividades se encuentran en atraso de acuerdo a la programación de obra por que se necesita realizar las instalaciones de los equipos en importación para finalizar la actividad
2,03	Protectores de pared tipo esquinero, mismo material y color de guarda camilla	ml	0%	95%	Las actividades se encuentran en atraso de acuerdo a la programación de obra por que se necesita realizar las instalaciones de los equipos en importación para finalizar la actividad
2,04	S/I de lamina de plomo para puertas y cielo rasos, inlcuye elementos de fijacion.	M2	0%	95%	Las actividades se encuentran en atraso de acuerdo a la programación de obra por que se necesita realizar las instalaciones de los equipos en importación para finalizar la actividad
2,05	Piso vinilo conductivo	m2	0%	95%	Las actividades se encuentran en atraso de acuerdo a la programación de obra por qué se necesita realizar las instalaciones de los equipos en importación para finalizar la actividad
2,07	dinteles en concreto	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
3	**ESTUCO Y PINTURA**				
3,01	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
3,02	Pintura para interiores tipo biosida o lavable sobre muros y Cielo falso en Drywall. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
3,03	Pintura acrílica para exteriores tipo Koraza de Pintuco en fachada. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
4	**PISOS**				
4,01	Suministro, transporte e instalación de PISO EN BALDOSA DE GRANO, incluye mortero de nivelación, pulida y brillada	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

4,02	Suministro, transporte y construcción de Zócalo Media caña de piso y boca puerta en grano pulido.	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5	**CARPINTERIA METÁLICA**				
5,01	Suministro, transporte e instalación de Puerta PA1 0,9 m x 2.40m en Aluminio y vidrio, vacunación.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,02	Suministro, transporte e instalación de Puerta PA2 1.40m x 2.40m en aluvidrio 2 alas, acceso ppal. Piso	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,03	Suministro, transporte e instalación de Puerta PA3 1.80m x 2.40m en aluvidrio 2 alas, acceso ppal. Piso.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,04	Suministro, transporte e instalación de Puerta PA4 1.50 x 2.40m en lámina Galvanizada Cal 18 , 2 alas, incluye visores en aluminio y vidrios. acceso Urgencia.	Un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,05	Suministro, transporte e instalación de Puerta Tipo persiana aluminio	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,06	Suministro, transporte e instalación de Ventana V1 .60 x .60m dos cuerpos horizontales fijo-basculante	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,07	Suministro, transporte e instalación de Ventana V2 .60 x .60m dos cuerpos horizontales fijo-basculante	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,08	Suministro, transporte e instalación de Ventana V3 1,10 x .60m dos cuerpos horizontales fijo-basculante	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,09	Suministro, transporte e instalación de Ventana V5 1.50m x .60m horizontal 2 cuerpos fijo-basculante	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,10	Suministro, transporte e instalación de Ventana V6 1.50m x .60m horizontal 2 cuerpos fijo-basculante	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,11	Suministro, transporte e instalación de Ventana V7 3.30m x .60m horizontal 4 cuerpos, 2 basculantes 2 fijos	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,12	Suministro, transporte e instalación de Ventana V9 1.80m x 1.80m 6 cuerpos, 1 basculante 5 fijos	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,13	Suministro, transporte e instalación de Sobre marco MT1 en persiana aluminio 1.00m x 1.48m, instalado sobre puerta PA6 en fachada sur.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,14	S/I de ventanas corredizas en vidrio 5mm color natural y marcos en aluminio anodizado color natural con sistema de pisavidrios a presion, incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalacion	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
5,15	Suministro, fabricación, instalación y transporte de puerta vehicular levadiza de 3.41 mts de ancho X 2.40 mts de alto. Puerta de 4 modulos, elaborada en tubería rectangular de 76mm X 38mm CAL 18 en su marco perimetral y en su parte interna lámina CAL 18 en C de 10cm de diámetro según diseño elegido. con refuerzo interno en tubería cuadrada de ¾ CAL 18. Herrjes completos (rieles, bisagras, rodamientos, Y resortes) acabados finales en pintura epoxica y color final deseado por el cliente.	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

6	**CARPINTERIA EN MADERA**				
6,01	Suministro, transporte e instalación de Puerta P1 .70m x 2.10m en Madecor, Ventilada con marco lámina galvanizada y chapa	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,02	Suministro, transporte e instalación de Puerta P2 .80m x 2.10m en Madecor, Lisa, con marco lámina galvanizada y chapa	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,03	Suministro, transporte e instalación de Puerta P3 .80m x 2.10m en Madecor, marco lámina galvanizada con Visor	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,04	Suministro, transporte e instalación de Puerta P4 .90m x 2.10m en Madecor, Lisa, con marco lamina galvanizada y chapa	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,05	Suministro, transporte e instalación de Puerta P5 .90m x 2.10m en Madecor, ventilada, marco lamina galvanizada y chapa	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,06	Suministro, transporte e instalación de Puerta P6 .90m x 2.10m en Madecor, marco lamina galvanizada con Visor	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,07	Suministro, transporte e instalación de Puerta P7 .90m x 2.10m en Madecor, ventilada, marco lamina galvanizada	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
6,08	Suministro, transporte e instalación de Puerta P9 1.00m x 2.10m en Madecor, marco lámina galvanizada	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
7	**MESONES Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE**				
7,01	Suministro, transporte e instalación de Pozuelo de aseo en Acerinox H=.50m	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
7,02	Suministro, transporte e instalación de Mesones Acerinox	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
8	**MESONES OTROS MATERIALES**				
8,01	S/I de meson en granito con ancho de 30cm hasta 50cm.	m	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9	**OBRAS HIDROSANITARIAS - APARATOS SANITARIOS -**				
9,01	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos Blanco con pedestal.	un	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,02	Grifería Para Pozuelos	un	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,03	Grifería Lavamanos de pared Tipo PUSH	un	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,04	Grifería Ducha de pared	un	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,05	Ducha Eléctrica Tipo Boccherini, no incluye salida eléctrica	un	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,06	Extractores para Baños	Und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
9,07	Suministro e instalación de sanitario aquajet color blanco tipo institucional o similar.	Und.	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,08	Suministro e instalación de Sanitario para personas con movilidad reducida.	Und	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación
9,09	Suministro e instalacion de teleduchas	Und	0%	100%	Esta actividad esta en atraso ya que están a la espera de acabados finales en las áreas de instalación

9,10	Suministro, transporte e instalación de tanque elevado de almacenamiento de 2000lts, con accesorios en pvc, para instalación	Und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10	**RED CONTRA INCENDIOS**				
10,01	Suministro e instalación de Gabinete clase III	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,02	Rociador pendiente K = 5.6, D = 1/2", respuesta rápida, temperatura ordinaria (inlcuye 6 de repuesto por sistema)	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	TUBERÍAS				
10,03	Acero Carbono SCH 10 - 4"	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,04	Acero Carbono SCH 10 - 2 1/2"	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,05	Acero Carbono SCH 10 - 2"	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,06	Acero Carbono SHC 10 - 1 1/4"	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,07	Acero Carbono SHC 40 - 1"	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	ACCESORIOS				
10,16	Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,17	Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,18	Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,19	TEE° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,2	Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2"x1 1/4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,21	Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"x2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,22	Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2 1/2" x 1 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,23	Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"x2 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,24	Codo roscado ASTM A-197, Hierro maleable, Clase 150, ASME B 16.3, roscado 1"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,25	Reducción copa ASTM A-197, Hierro maleable, Clase 150, ASME B 16.3, roscado 1" x 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,26	Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,27	Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,28	Snap Let ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 1 1/4" x 1"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	UNIONES				
10,24	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,25	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,26	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,27	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 1 1/4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	SOPORTES				
10,28	Soporte tipo colgante empotrado en concreto 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,29	Soporte sísmico longitudinal 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

10,30	Soporte sísmico lateral 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,31	Soporte tipo colgante empotrado en concreto 2 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,32	Soporte sísmico longitudinal 2 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,33	Soporte sísmico lateral 2 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,34	Soporte tipo colgante empotrado en concreto 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,35	Soporte sísmico longitudinal 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,36	Soporte sísmico lateral 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,37	Soporte tipo colgante empotrado en concreto 1 1/4""	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	VÁLVULAS				
10,38	Valvula cheque, Swing, 300 WWP, A536 Body, Trim, Bronze, UL/FM 4"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,39	Válvula siamesa (conexión de bomberos)	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,40	Estación de control 2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	RED DE EXTINCIÓN				
10,41	Detectores de humo de Direccionables.	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,42	Bases estandar para detectores humo y termicos direccionables	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,43	Estacion manual direccionable doble acción.	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,44	Protector para estaciòn Manual (Stopper)	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,45	ALtavoz/visible multicandela direccionable	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,46	Modulo de monitoreo Direccionable para recibir señales de contacto seco de válvulas de vástago, y sensores de flujo.	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,47	Central de alarma contra incendios direccionable	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,48	Cable FPLR de 2X16 AWG. (cable de (4) lazos)	m	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	EQUIPOS				
10,49	Bomba centrifuga de Turbina Vertical, UL/FM, capacidad nominal de 250 Gpm @ 150 Psi, 3000 RPM, atrasmisión por engranaje de angulo recto, descarga 4", (incluye manómetros descarga, válvula desaireadora de 3/4")	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,50	Motor de combustión interna a diésel de 80 HP @ 1760 RPM, UL/FM, (incluye rack de baterías, heater voltage requeriments: 115 VAC 1360 Watt, 230 VAC opcional)	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,51	Tablero de control UL/FM, 12VDC - 110 VAC - 60 HZ, gabinete NEMA 2	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,52	Bomba Jockey multi etapas vertical, accionada por motor eléctrico de 2.0 HP, 220 - 440 Voltios, capacidad nominal de 10 Gpm @ 160 Psi	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,53	Tablero de control UL/FM, 460 - 480 VAC, gabinete NEMA 2	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,54	Tanque de combustible de 120 gal con sus respectivos accesorios	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,55	Válvula de alivio principal de 4", 150# Inlet / 150# Outlet	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,56	Cono visor de flujo de 4"x 6", 150# Flange	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,57	Medidor de flujo (caudalimetro) ranurado, MCA, rango 0 - 1250 gpm	UND	70%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
	VÁLVULAS				

10,50	Valvula de corte, OS&Y, cuerpo Hierro dúctil ASTM A-536, vástago latón ASTM B16, bridada, UL/FM 4	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,51	Válvula de corte tipo mariposa con cierre supervisado, ASTM A-536, ranurada, UL/FM	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,52	Válvula de retención tipo cheque, ASTM A-536, ranurada, UL/FM 4"	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,53	Estación de control, ASTM A-536, extremos ranurados, incluye sensor de flujo, válvula de prueba y drenaje, Manómetro de 0-300 psi, Válvula de alivio de presión calibrada a 175 psi, UL /FM 2"	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,54	Válvula de retención tipo cheque, ASTM A-536, ranurada, UL/FM 2"	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,55	Válvula de corte tipo mariposa con cierre supervisado, ASTM A-536, ranurada, UL/FM 2"	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,56	Válvula de corte, OS&Y, ASTM B62, roscada, UL/FM 1 1/4"	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,57	Válvula de retención tipo cheque, ASTM B62, roscado, UL/FM 1 1/4"	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
10,58	Cabezal de pruebas (se estima material de salida)	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	COMPLEMENTARIOS				
10,59	Conexión líneas de sensado (INCLUYE MATERIALES)	GB	0%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,60	Conexión eléctrica tableros de control.	GB	0%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,61	Materiales electricos	GB	0%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,62	Conexión equipo de acuerdo a NFPA 20 PERSONAL CERTIFICADO	GB	0%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
10,63	Programación y puesta en marcha bajo NFPA20	GB	0%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	TABLEROS PRINCIPALES				
11,01	Suministro, transporte e instalacion de Tablero de Transferencia automática de 500A de acuerdo a diagrama Unifilar.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,02	Suministro, transporte e instalacion de Tablero general principal para protecciones de acuerdo a diagrama Unifilar.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,03	Suministro, transporte e instalacion de Tablero Para BYPASS CIR REGULADO, De acuerdo a diagrama Unifilar.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,04	Suministro, transporte e instalacion de Tablero Para BYPASS CIR CRÍTICO, De acuerdo a diagrama Unifilar.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,05	Suministro, transporte e instalacion de Tablero Para BYPASS CIR NORMAL, De acuerdo a diagrama Unifilar.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN				
11,06	tablero de 60 circuitos trifásico 5 hilos con espacio para totalizador	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,07	tablero electrico trifásico 36 circuitos con espacio para totalizador , puerta y llave	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,08	tablero central de gases 24 circuitos trifásico 5 hilos con totalizador llave y puerta	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	TABLEROS DE AISLAMIENTO				
11,09	Tablero aislamiento sala de partos 7.5 kva con 8 circuitos y monitor de aislamiento	UND	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar

11,10	Tablero de aislamiento reanimacion 3.0 kva con 8 circuitos y monitor de aislamiento	UND	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,11	Instalacion localizador de fallas, modulo de tierras, localizador remoto dentro de sala de cirugia, modulo de tierras, cableado , conexionado, de cada uno de los interruptores de acuerdo a diagrama unifilar. Tablero de aislamiento, incluye localizador (quirofanos)	UND	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,12	tablero control rci 12circuitos trifásico 5 hilos con totalizador llave y puerta	UND	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
	SALIDAS				
11,13	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente BLANCO DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL 20 AMP. . incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,14	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida detomacorriente doble con polo a tierra GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO. incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,15	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida detomacorriente doble con polo a tierra GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO. incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,16	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de Toma REGULADO, incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,17	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de Toma GFCI, incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,18	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de Toma Trifásico 220V, incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,19	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente TIERRA AISLADA . Incluyendo cajas, ducto de EMT, de 3/4", conductor decobre 3No12 AWG, LSHF (Conductor N1 y N°2), toma corriente conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.doble con polo a tierra, 20 A, 120V - Incluye tomas Grado Hopitalario - Color Rojo (Cableado con Conductor de Bajas Perdidas)	Un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

11,20	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de Toma Normal Antivandálico 20A, incluyendo ducto de EMT de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, LSHF, siete hilos, conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás.	Un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,21	Suministro e instalacion de cto RAMAL PARA TOMACORRIENTES, en ccf 1#12+1#12+1#12 HF FR LS en tuberia EMT de ½". Incluye accesorios EMT, elementos de fijacion y marcacion.	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	SUBESTACIÓN				
11,23	Tanque de almacenamiento ACPM 120 Litros	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
11,24	Adecuación cuarto planta electrica para correcto montaje y funcionamiento.(Exhosto,bateria,y accesorios, tubería de salida de humo).	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
	LUMINARIA				
11,26	Luminaria LED hermética 2x25w T-8, IP 65 para uso interior, con balasto electrónico multivoltaje 100-240V, difusor en policarbonato, color 6500K, fabricada por por SYLVANIA o equivalente, Con Certificacion Retilap.	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,27	luminaria led hermética 80w, dl high flux para uso interior, con balasto electrónico multivoltaje 100-240v, chasis en policarbonato, color 5000k, fabricada por sylvania o equivalente, con certificacion retilap. (incluye clavija y cable encuauchetado).	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,28	led panel rd 24w dl 100-240 sp, panel led de sobreponer, fabricada por por sylvania o equivalente, con certificacion retilap. luminaria - circular 24630	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,29	led panel rd 24w dl 100-240 sp, panel led de sobreponer, fabricada por por sylvania o equivalente, con certificacion retilap. luminaria - circular	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,30	led panel sq40 100-240 sp, pr, fabricada por por sylvania o equivalente, con certificacion retilap. luminaria	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,31	suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia led 9w-110w	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,32	led tortuga 10w(p26243)- luminaria led para iluminación exterior.	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,33	suministro, transporte e instalación de luminaria de evacuacion , con aviso luminoso led 120v.120v, autonomia de 1 hora led emerg aviso p33718	UND	0%	100%	Esta actividad presenta atraso ya que se necesita que la actividad de cielo falso esten al 100%
11,34	Salida de iluminacion a 120 volts en ccf 1#12+1#12+1#12 HF FR LS en tuberia EMT de ½". Incluye caja octagonal tipo rawelt con tapa, accesorios EMT, elementos de fijacion, conectores tipo rosca, prensa estopa, y terminacion en cable encauchetado 3x16. En el promedio de la salida se debe tener en cuenta la longitud del ramal.(No incluye luminaria)	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	APANTALLAMIENTO				
11,35	Suministro, transporte e instalación de cable aluminio, alambron de 8mm	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

11,36	Punta captadora Franklin de 0,60m. De altura en aluminio aleación 6201 de ø 15.87mm,. Abrazadera para fijación de cable. No se permitirá el material instalado de no demostrarse la aleación del aluminio solicitada.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,37	Electrodo de puesta a tierra en Varilla de Cobre ø5/8"x2.40	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,38	Pozo de inspección metálico para puestas a tierra de 30x30cm, con tapa circular atornillable según detalle mostrado en planos, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 2.40m.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,39	Bajantes en tubería IMC Ø1" desde cubierta hasta el terreno por las columnas.	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,4	Conductor de Cu desnudo # 1/0 AWG viajando por las bajantes de los pararrayos hasta sótano	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,41	Grapa derivación en T de Acero inoxidable para soportar el conductor sólido en las derivaciones sobre muro de concreto aprobadas para intemperie.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,42	Grapa derivación en T de Acero inoxidable bimetálica para conexión entre el conductor sólido ø8mm en Aluminio y el cable 1/0 Cu AWG para las bajantes a la malla de tierra.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,43	Interconexión en cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG enterrado bajo piso a 0.60m de profundidad en el terreno.	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,44	Conexión desde Malla de Tierra al barraje equipotencial principal ubicado de la subestación en 1Ø1"IMC con 1#2/0 AWG desnudo, Incluye bornas de compresión	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,45	vía de chispas para interconexión entre la varilla de tierra de la bajante de pararrayos contra descargas atmosféricas en la cubierta y la malla de puesta a tierra general. Tensión alterna de respuesta 1 kv, Intensidad nominal de descarga 100 ka, con electrodos de tungsteno y cobre, con protección envolvente con resina epóxica marca Obo Bettermann ó Dehn+Söhn. Incluye elementos de conexión eléctrica.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,46	Aisladores ø 3.5 mm para soportar el conductor sólido al muro de concreto aprobados para intemperie.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,47	Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2/0 AWG. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	ACOMETIDAS PARCIALES				
11,48	Suministro e instalacion de Alimentador para UPS Y TP-R, en 3#1/0+1#1/0+1#4 AWG por carcamo. Incluye terminables ponchables.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,49	6No 4/0 HFRR-LS+2No2/0 HFFR-LS +1No/0AWG Cu Desnudo TMG-IMC 4" Tipo pesado con Boquilla Metálica.	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,50	3n°2+1n°2+1n6 en tubería emt de 2" (tablero normal sotano)(tablero normal piso 1) (tablero normal piso 2)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,51	3n°6+1n°6+1n8 en tubería emt 1 1/2" (tablero para red degulada)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,52	3n°4+1n°4+1n°6 en tubería emt de 2" (tablero de aire acondicionado)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

11,53	3n°8+1n°4+1n°6 en tubería emt de 2" (tab aislado sala de partos)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,54	3n°6+1n°6+1n8 en tubería emt de 1" (tablero central de gases)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,55	3n°4+1n°4+1n6 en tubería 2" (tablero general de iluminacion vital)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,56	3n°6+1n°6+1n8 en tubería de 1 1/2" (tablero critico piso 1)	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	RED EXTERNA				
11,57	Poste fibra de vidrio 14m 750kgf monolítico	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,58	Suministro, transporte e instalación de estructura según Normas de EPM, accesorios, Retenida en MT	UN	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,59	Suministro, transporte e instalación de estructura FL-331 según Normas de EPM, Adecuacion de Punto de Conexión.	UN	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,60	transformador 3f 150kva 13200v 220-127v convencional aceite mineral (4)	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,61	Cable cobre 12awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c negro (6)	Ml	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,62	Cable aaac 77.4kcmil ames monopolar cubierto xlpe/hdpe 15kv 90°c negro/gris (6)	Ml	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,64	Carcamo 40 x 60 Cm de Prof con excavación rellenos y compactación, incluye Elaboracion de Tapas METALICAS	ML	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
	INTERRUPTORES				
11,66	Suministro e instalacion de control de iluminacion con temporizador horario, 6 telerruptores y pulsadores sin retenida.	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,67	Suministro e instalación de salida para timbre aviso pacintes, en tubería galvanazada	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,68	Salida para toma para ducha en baño, incluye toma a prueba de humedad, la caja de acuerdo al retie y todos los elementos para su correcto funcionamiento eléctrico	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,69	Interruptor termomagnético 1 x 20 A	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,70	Interruptor termomagnético 2 x 20 A	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,71	Salida para suiche sencillo de una palanca, incluyendo el suiche, la caja plástica de 4X4, la tubería PVC de 3/4" la alambrada en 3No 12 cobre libre de halógenos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento eléctrico.	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,72	Salida para suiche doble de dos palanca, incluyendo el suiche, la caja plástica 4X4", la tubería PVC de 3/4", la alambrada en 4No 12 cobre libre de halógenos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento eléctrico.	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS				
11,75	Gabinete de comunicaciones RACK	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,83	Barra de tierra TMGB en cuarto técnico, para derivación de tierra del cuarto de telecomunicaciones. Incluye 2 metros de cable de cobre 1/0 para equipotencializar la TMGB con el sistema de tierra, terminal electroplatiadas doble ojo # 1/0.	Un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

11,84	Suministro e instalación de salida de Datos UTP Categorpia 6A, Libre de halógenos, por pared. Incluye caja 12x12 metálica + tapa, Jack cat 6A, face plate sencillo, adaptadores terminales, curvas, tornillos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación.	Un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,85	Ducto metálico cerrado de 20 x 8 cm. con dos divisiones y accesorios de montaje en sistema de repisa en muro.	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
11,86	Suministro, transporte e instalación de acometida en 9No250KCMIL+3No4/0 AWG THWN Al serie AA8000 en tuberia 2 IMC 4", incluye conectores bimetalicos, cinta bandy, hevillas bandy y demas elementos para su correcta instalación	ml	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,87	Suministro, transporte e instalación de acometida en 9No250KCMIL+3No4/0 AWG THWN Al serie AA8000 en tuberia 2 PVC 4", incluye conectores bimetalicos y demas elementos para su correcta instalación. NO INCLUYE BRECHA	ml	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
	PUERTAS ESPECIALES ELECTRICA				
11,88	Puerta en subestación eléctrica, Puerta Con cerradura Antipático, Acorde a Norma Codensa CTS548-1Doble Plegable - CTS502-4 Señal preventiva, Acorde a Lineamientos de la NTC 2050 y Retie. (Doble)	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	TRAMITES				
11,89	Certificacion RETIE de uso FINAL	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,90	Certificacion RETIE de Distribucion	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,91	Certificacion RETILAP	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,92	Elaboracion de planos AS-BUILD	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
11,93	Ejecucion de tramites ante el operador de red para energizacion del proyecto. No inclye cargos ante el Operador.	Un	0%	100%	Esta actividad se encuentra en tramite
12	**OTROS**				
12,1	Suministro, transporte e instalación elevador electrohidráulico para PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, de 1,0m x 1,4m x 2.2m / altura 3,2 m, 3 paradas, capacidad 300 Kg., incluye sistema de tracción conformado por un cilindro hidráulico de acción indirecta por cadenas para el izaje de la cabina. El cilindro es accionado mediante unidad de potencia hidráulica con tanque de 5 galones, motor de 3.0 HP., a 220 V, bomba, electroválvula de descenso y líneas de presión y válvula paracaídas de seguridad	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13	**REDES DE GASES MEDICINALES**				
13,01	Tubería de cobre L Flexible	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,02	Tubería cobre tipo L 1/2"	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,03	Tubería cobre tipo L 3/4"	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,04	Tubería cobre tipo L 1"	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,05	Tubería cobre tipo L 11/4"	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,06	Suministro, transporte e instalación Caja de control zonal en aluminio tapa acrílica, válvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para mano vacuómetro, 2 gases	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,07	Suministro, transporte e instalación de válvula de bola 4 tornillos y soldada en sus adaptadores según norma NFPA99/2021, 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

13,08	Suministro, transporte e instalación de válvula de bola 4 tornillos y soldada en sus adaptadores según norma NFPA99/2021, 1"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,09	Suministro, transporte e instalación de válvula de bola 4 tornillos y soldada en sus adaptadores según norma NFPA99/2021, Válvula sensor de 1/2"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,10	Cuelgas en aluminio y esparragos 3/8"	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,11	Suministro, transporte e instalación de alarma sonora y visual con sensores de estado solido cumple norma NFPA 99/2021, 2 Gases	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,12	Suministro, transporte e instalación de Alarma maestra 10 PR, cumple norma	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,13	Toma QC Oxigeno	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,14	Toma QC VACIO	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,15	Suministro e instalación de bomba de vacío medicinal dúplex de 2 hp, cumple nlnorma NFPA99	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
13,16	Suministro e instalación de manifold de oxígeno medicinal semiautomático 2x8	un	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
14	**BARANDAS**				
14,01	Barandas para escaleras y rampas	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
15	**REVOQUES Y ENCHAPES**				
15,01	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
15,02	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.(BAÑOS-ASEOS- SAPICADEROS)	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
15,03	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PISO ANTIDESLIZANTE, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
15,4	Suministro, transporte y construcción de MAMPOSTERIA de Muros en Ladrillo de E=.15m H=2,56	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
16	**TANQUE SEPTICO**				
16,01	Excavación manual	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
16,02	Relleno con material seleccionado	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
16,03	Concreto de f'c=28mpa	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17	**TANQUE RCI**				
17,01	Excavación a Mánual	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,02	Relleno con material seleccionado	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,03	Concreto de f'c=28mpa	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

17,04	Suministro e instalación de cinta pvc v-15	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,05	Suministro e instalación de escalera metalica prefabricada. Escalones ø 1" cada 0.35 m.	Und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,06	Tapas de inspección	Und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,07	FORMALETERÍA METALICA PARA PAREDES DE EXCAVACIONES DE TANQUE SUBTERRANEO	M2/DÍA	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,08	ENTIBADO EN MADERA PARA ESTABILIZACION TEMPORAL DE TALUDES Y EXCAVACIONES PROFUNDAS, SEGÚN CONDICIONES DE SUELO.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
17,12	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). E=0.05 M, para solado. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
18	**MURO DE CERRAMIENTO**				
18,01	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²), para Vaciado columnas .20x.20 CERRAMIENTO . Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
18,02	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²), para Vaciado vigas de CONFINAMIENTO 0,20 x 0,20. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
18,03	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²), para Vaciado vigas de CIMENTACIÓN 0,25 x 0,30. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
18,04	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²), para Vaciado zapatas 1x1x0.35. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
19	**ANDÉN PERIMETRAL**				
19,01	PLANTILLA EN CONCRETO Para andén perimetral DE 3000 PSI. E=0,10 M , JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
20	**ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS**				
20,1	Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 60000 PSI	kg	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
20,2	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA D-188. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P	**NO PREVISTOS**				

N.P.1	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²), para MICROPILOTES D=0,20M para cimentación . Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.2	Suministro e instalacion de tubería Pvc de 4" para aguas lluvias.	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.3	Construcción de PISO EN MORTERO 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.4	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL EXTERIORES, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento	m2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.5	Suministro, transporte y colocación de placa en superboar (fibrocemento o equivalente) de e= 8 mm (una cara), estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20 con separación entre parales de 40.6cm, con refuerzo en área vertical cada 3.66 m de altura, tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de ½" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura acrílica para exteriores, se pagará en su ítem respectivo.	m2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 15000 LITROS , CON ACCESORIOS EN PVC, PARA INSTALACIÓN	und	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.7	Construcción de LOSA FACIL en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.8	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CONCRETO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.9	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CONCRETO DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

N.P.10	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.11	CONCRETO PARA CALADOS EN CATALÁN AL 80%, espesor 0.15 m, con bloque en concreto tipo catalán de 10x15x30 cm., color blanco, textura lisa con agregados cerámicos, calidad Indural o equivalente, que cumpla norma NTC 4026 y 4076. Incluye concreto de 17.5 Mpa para grouting (cada bloque intermedio y se llenan los dos huecos), mortero de pega 0,25:1:4 (cal:cemento:arena) espesor max=0.01 m, para ranurado o revite de ambas caras, (diseño y aprobación de mezcla para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Icontec 451,296 y Astm C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modulada, según diseño con pegas horizontales y verticales con un espesor de 1 cm. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y el hidrófugo antigraffiti, se pagará en su ítem respectivo.	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.12	Construcción de LAGRIMAL en concreto de 21 Mpa. y un ESPESOR DE 6 cm., impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras a ambos lados del muro y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye refuerzo.	ml	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	GABINETES Y CELDAS DE SUBESTACION				
N.P.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE EQUIPOS B.T. PARA PROTECCIONES CON MEDIDAS DE 120X80X30, INCLUYE BRAKER DE 3X100 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
N.P.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE AIRES ACONDICIONADOS B.T. PARA PROTECCIONES, CON MEDIDAS DE 170X80X30, INCLUYE BRAKER DE 3X500 AMP.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar

	Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.				
N.P.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE TOMACORRIENTES Y LUCES NORMALES B.T. PARA PROTECCIONES , CON MEDIDAS DE 170X80X30, INCLUYE BRAKER DE 3X275 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
N.P.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE TRANSFERENCIA BT PARA PROTECCIONES , CON MEDIDAS DE 150X80X30, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 100 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
N.P.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE RAMAL CRITICO BT PARA PROTECCIONES , CON MEDIDAS DE 120X80X30, INCLUYE BREAKER DE 3X75 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
N.P.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE RAMAL VITAL BT PARA PROTECCIONES , CON MEDIDAS DE 120X80X30, INCLUYE BREAKER DE 3X75 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
N.P.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE BY-PASS DE 6 KVA BT PARA PROTECCIONES SALA DE PARTO, CON MEDIDAS DE 70X50X20, INCLUYE BREAKER DE 2X60 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
N.P.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE BY-PASS DE 6 KVA BT PARA PROTECCIONES DE REANIMACION, CON MEDIDAS DE 70X50X20, INCLUYE BREAKER DE 2X60 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	70%	100%	Se encuentran en fabricación según diagrama unifilar
	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS				
N.P.21	ACOMETIDA ELECETRICA PARA TRANSFERENCIAS SISTEMA ESENCIAL Y NORMAL DESDE TOTALIZADOR PPAL EN GABINETE PPAL AL CONTACTOR DE RED NORMAL DE LA TRANSFERENCIA Y DEL PUNTO Común DE LA TRANSFERENCIA AL BARRAJE CORRESPONDIENTE EN EL GAB. PPAL Y DEL CONTACOR DE EMERGENCIA HASTA LA PLANTA DE EMERGENCIA EN CABLE 4X4/0 + 1X2/0 TIERRA	ML	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	TABLERO DE AISLAMIENTO PARA SALA DE PARTOS				
N.P.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO TIPO SALA DE CIRUGIAS CON TRAFO DE AISLAMIENTO MONOFASICO DE 5 KVA,TENSION PRIMARIA 208 V, TENSION SECUNDARIA 120 V, INTERIOR DE 100 AMP. PARA ALOJAR INTERRUPTORES TIPO PLUG-ON, PARA SALA DE PARTOS	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	MALLA DE PUESTA A TIERRA				
N.P.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA CON 6 VARILLAS DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTRS CABLE DESNUDO No. 2/0	GL	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES				
N.P.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 42 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	**UN**	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

N.P.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 12 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X30 AMP	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 3X30 AMP	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCION DIFERENCIAL CONTRA FALLAS A TIERRA, SENSIBILIDAD MINIMA O MENOR DE 30 Ma, tipo "AC", CORRIENTE NOMINAL 30 AMP.	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS				
N.P.30	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS **MINISPLITT DE 3/4 DE TONELADA** Y CABLE THW 3XNo.12 AWG (220 Volt.)	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.31	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS **MINISPLITT DE 1 TONELADA** Y CABLE THW 3XNo.12 AWG (220 Volt.)	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.32	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS **MINISPLITT DE 1-1/2 TONELADA** Y CABLE THW 3XNo.12 AWG (220 Volt.)	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.33	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS **MINISPLITT DE 2 TONELADAS** Y CABLE 3X No. 12 AWG (220V)	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.34	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS **TIPO CASETTE 2-1/2 TONELADAS** Y CABLE 3X No. 10 awg	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.35	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS **TIPO PAQUETE DE 5 TONELADA** CABLE 3X No. 10 AWG	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.36	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA **CANALIZACION DE SEÑAL** DE AIRES ACONDICIONADOS, CABLE VEHICULAR 4X No.16 AWG	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT,UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1", CAJAS 4X4 EMT,UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METALICA DE 3/4" (FLEXI METALICO)PARA CONEXIÓN FINAL DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METALICA DE 1" (FLEXI METALICO) PARA CONEXIÓN FINAL DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

	UPS				
N.P.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 6 KVA BIFASICA 220/220-110 V FACTOR DE POTENCIA 1, AUTONIMIA 6 MINUTOS, BATERIAS INTERNAS, PARA TABLERO DE AISLAMIENTO SALA DE PARTOY SALA DE REANIMACION	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 20 KVA PARA ZONA ADMINISTRATIVA ONLINE, CON TRF DE AISLAMIENTO (TABLERO REGULADO)	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES				
N.P.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES DE EMERGENCIA	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.44	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	VOZ Y DATOS				
N.P.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS, EN CABLE UTP CAT 6A, TUBERIA EMT DE 3/4"	UN	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE VOS Y DATOS, ESTA INCLUYE : RACK, ORGANIZADOR HORIZONTAL, PACH PANEL Y ACCESORIOS	GL	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
	PLANTA DE EMERGENCIA				
N.P.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 150 KVA, CON CABINA INSONORA, CON SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, DIMENSIONES (mm): 3300 x 980 x 2100, Y CAMISAS PRECALENTADORAS.	UN	0%	100%	Retraso en la cadena de suministro internacional y procesos de nacionalización
N.P.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CIELITICA, CABLE THW No.8 LSHF AWG (NO INCLUYE LAMPARA CIELITICA)	MTS	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente
N.P.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EXTRACTORES DE BAÑOS (NO INCLUYE EXTRACTORES)	UND	100%	100%	Esta actividad se completó correctamente

2.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Resolución de licencia de construcción No SP-005-2023	24 JULIO DE 2023	24 JULIO DE 2025
Prorroga a Resolución de licencia de construcción No SP-005-2023	25 JULIO DE 2025	25 JULIO DE 2026

2.3. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO:

En este periodo no se registraron lluvias y la obra cuenta con cubierta para no trazar las diferentes actividades ver anexo estado del clima.

2.4. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA:

Descripción de material	Tipo de Inspección	Cumple normativa si/no
Tubería cobre rígida (red gases medicinales)	Física en obra	si
Estuco en muros	Física en obra	si
Caja de control (red gases medicinales)	Física en obra	si
Alarma (red gases medicinales)	Física en obra	si
Tomas de oxígeno y vacío (red gases medicinales)	Física en obra	si
Tubería Acero Carbono SCH 10 (red RCI)	Física en obra	si
Tubería mt	Física en obra	si
Tubería pvc eléctrica	Física en obra	si
Cajas pvc	Física en obra	si
Baldosa en granito	Física en obra	si
Acero	Física en obra	si
Cemento usos general	Física en obra	si

Todos los materiales que el contratista utiliza para realizar las actividades de revoque, red de gases medicinales, red RCI, red eléctrica, estuco, construcción de tanque en concreto cumplen con la normativa que se pide en las especificaciones técnicas de los apu´s contractuales ver anexos.

2.5. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

Durante este periodo el contratista mando a realizar los ensayos de laboratorio de los materiales pétreos, concretos y bases granulares para el próximo periodo ya tendremos la información de todos los ensayos y anexar los resultados obtenidos.

.

2.6. CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA:

A la fecha del presente informe no se encuentran equipos en obra.

2.7. CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

A la fecha del presente informe no se realizan cambios de estudios y diseños.

3. INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA:

3.1. INFORME SOCIAL:

3.1.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA TENDIENTES AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Durante este periodo se realizó una socialización de avance de obra ante el concejo municipal de san francisco Antioquia.

3.1.2. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA DEL COMPONENTE SOCIAL:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA GESTIÓN SOCIAL:

Durante el mes de enero de 2026, el componente de acompañamiento social continuó desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del proyecto, mediante la ejecución de actividades de seguimiento, apoyo y articulación entre la comunidad y el equipo técnico de obra. Estas acciones permitieron mantener un canal de comunicación activo y transparente con los habitantes del área de influencia directa, fortaleciendo la confianza y el sentido de pertenencia hacia la nueva infraestructura hospitalaria.

El trabajo social adelantado durante este periodo se orientó a consolidar la relación de cooperación y diálogo con los diferentes grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Social. De esta manera, se aseguró la continuidad de las estrategias de participación ciudadana, información comunitaria y atención a la población, promoviendo un ejercicio constructivo de corresponsabilidad social.

Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante enero se destacan:

- **Acompañamiento en frentes de trabajo y visitas de campo:** se realizaron recorridos de verificación para observar la correcta aplicación de las medidas socioambientales y atender en tiempo real las observaciones o inquietudes de los residentes del sector.

- **Socialización de avances del proyecto:** se llevaron a cabo jornadas informativas y de diálogo con la comunidad, donde se compartieron los progresos constructivos, el cumplimiento de cronogramas y las acciones ambientales en curso, asegurando un proceso transparente y participativo.

- **Gestión y atención de PQRSFD:** se brindó respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y sugerencias presentadas por la comunidad, consolidando un canal de comunicación efectivo y de confianza mutua.

- **Promoción del empleo local:** se continuó fomentando la vinculación de mano de obra de la zona, contribuyendo al desarrollo económico del municipio y a la generación de oportunidades laborales en el entorno inmediato del proyecto.

  Estas actividades reflejan la continuidad de una **gestión social activa, inclusiva y orientada al diálogo permanente**, reafirmando el compromiso del consorcio y la interventoría con el bienestar de la comunidad y el desarrollo armónico del proyecto.

2. ACTIVIDADES PRELIMINARES DE LA GESTIÓN:

Desde el componente social, se ha mantenido el compromiso de documentar de manera precisa las condiciones iniciales de los predios y áreas colindantes a la obra, a través del levantamiento y seguimiento de las actas de vecindad y de entorno. Esta herramienta constituye un mecanismo de prevención y control que permite evidenciar el estado físico y social de los inmuebles cercanos al proyecto, garantizando transparencia y respaldo técnico ante cualquier eventualidad.

Durante el mes de enero de 2026, se dio continuidad al proceso mediante la verificación, actualización y custodia de las actas previamente diligenciadas, asegurando su vigencia y pertinencia frente al avance constructivo. Estas acciones fueron desarrolladas de manera conjunta entre el equipo social y el área técnica, fortaleciendo la trazabilidad documental y el relacionamiento con la comunidad vecina.

Entre las principales actividades realizadas durante este periodo se destacan:

- **Revisión de las actas de vecindad existentes**, con el fin de identificar posibles cambios en las condiciones estructurales o físicas de los inmuebles cercanos a los frentes de obra.
- **Seguimiento a las actas de entorno vigentes**, verificando que las zonas públicas y áreas de acceso continúen en condiciones adecuadas, sin afectaciones por las actividades constructivas.
- **Custodia y actualización del archivo documental**, asegurando la correcta conservación y disponibilidad de la información como respaldo ante la interventoría y las entidades competentes.

Estas gestiones reflejan la importancia de mantener un control sistemático sobre las condiciones del entorno y los predios colindantes, permitiendo prevenir controversias, fortalecer la confianza de la comunidad y dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan de Manejo Socioambiental del proyecto.

N° DE ACTAS DE VECINDAD ABIERTAS	N° DE ACTAS DE ENTORNOS	N° ACTAS DE VECINDAD EN SEGUIMIENTO	N° ACTAS DE VENCIDAD EN SEGUIMIENTO CERRADAS
1	2	1	0

4.1 Seguimiento actas de vecindad y actas de entorno:

Durante el mes de enero de 2026, se continuó con el proceso de seguimiento a los predios colindantes registrados en las actas de vecindad, con el propósito de verificar el estado actual de las viviendas y edificaciones cercanas a la zona de intervención. Esta actividad busca detectar oportunamente posibles afectaciones estructurales o alteraciones derivadas de las labores constructivas, garantizando la aplicación de medidas preventivas y correctivas en caso de ser necesarias.

Desde el componente social, se mantuvo el acompañamiento constante al área técnica durante las diligencias de verificación, asegurando la adecuada gestión documental y el registro detallado de

cada observación levantada en campo. Este trabajo articulado permite fortalecer el control interno y dar respuesta oportuna a las inquietudes manifestadas por la comunidad.

De igual manera, se consolidó un sistema de seguimiento participativo, en el cual se promueve la presencia activa de los vecinos y representantes comunitarios durante los

recorridos de inspección, fortaleciendo la transparencia y la confianza mutua entre el proyecto y los habitantes del área de influencia directa.

Estas acciones ratifican el compromiso del consorcio con la trazabilidad, la gestión responsable y la participación ciudadana, en cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan de Manejo Socioambiental, asegurando un control efectivo sobre las condiciones del entorno urbano y social adyacente a la obra.

Fecha	Dirección	Nombre del propietario	Observaciones	Estado
29/07/2025	Carrera 10 #9-25 (primer piso y Escaleras)	Aldemar López	- De la inspección se concluye por opinión del propietario que la vivienda está presentando problemas de filtración de agua en el baño conjunto al muro de contención que colinda con el hospital y además hay presencia de humedad en las escaleras que conducen al segundo y tercer piso.	Abierta
Total	1			

4.2 Actas de entorno:

El acta de entorno continúa siendo una herramienta esencial dentro de la gestión socioambiental del proyecto, pues permite registrar y documentar el estado físico y funcional del espacio público que podría verse afectado por las distintas fases del proceso constructivo. Este instrumento facilita la trazabilidad de las condiciones iniciales del sector y constituye un respaldo técnico frente a las posibles variaciones que puedan derivarse del desarrollo de las obras.

Durante el mes de enero de 2026, no se efectuaron nuevos levantamientos de actas de entorno; sin embargo, se mantuvo un proceso constante de seguimiento, revisión y control sobre las actas previamente elaboradas, verificando la estabilidad de las áreas registradas y la vigencia de los registros existentes. Dicho seguimiento se realizó de manera coordinada entre el componente social y el área técnica, garantizando la continuidad del monitoreo preventivo.

El control desarrollado permitió corroborar que las actividades constructivas se ejecutan conforme a los lineamientos ambientales y sociales establecidos, evitando afectaciones en zonas de tránsito peatonal, andenes, vías y espacios públicos colindantes.

En conjunto, estas acciones evidencian la importancia de mantener una observación permanente sobre el entorno urbano y paisajístico, asegurando la conservación de las condiciones originales del espacio público y reforzando la transparencia en la gestión socioambiental.

Fecha	Dirección/Calle	Estado
29/07/2025	Cr 10	Abierta
29/07/2025	Calle 9	Abierta

´

4.3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD:

Durante el mes de enero de 2026, el programa de comunicación y relacionamiento comunitario continuó fortaleciéndose como un componente esencial del Plan de Gestión Socioambiental, orientado a garantizar que la comunidad mantenga un acceso constante, claro y veraz a la información relacionada con el desarrollo del proyecto “Ejecución de la Construcción de la Segunda Etapa de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís”

Más que un proceso informativo unidireccional, este programa promueve una estrategia de comunicación participativa y bidireccional, en la que la comunidad tiene la posibilidad de expresar sus inquietudes, expectativas y aportes, generando así una interacción directa y constructiva entre los habitantes del área de influencia y el equipo responsable de la obra.

Para el cumplimiento de este objetivo, se han mantenido y optimizado diversos canales de difusión y mecanismos de comunicación, entre los que se destacan:

- **Carteleras informativas** ubicadas en puntos estratégicos de la obra, actualizadas con los avances, cronogramas y novedades del proyecto.
- **Material impreso y piezas gráficas** (volantes, boletines y afiches) con lenguaje claro y accesible para todos los públicos.
- **Señalización visible y educativa** dentro del área de intervención, que orienta a los trabajadores, visitantes y comunidad en general sobre normas de seguridad y comportamiento ambiental.
- **Puntos de atención ciudadana**, donde se reciben comentarios, sugerencias y solicitudes, garantizando una atención personalizada y continua.

Estas acciones han permitido consolidar un entorno de diálogo y confianza mutua, donde la comunidad no solo se mantiene informada, sino que también participa activamente en el seguimiento del proceso constructivo. De esta forma, el programa reafirma el compromiso del proyecto con la transparencia, la participación social y la construcción de relaciones sostenibles con el territorio.

3. Punto de atención a la comunidad:

Durante el mes de enero de 2026, el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) continuó consolidándose como un canal de comunicación directa, permanente y accesible entre la comunidad del área de influencia y el equipo responsable del proyecto. Este espacio cumple una función esencial dentro de la estrategia de participación ciudadana, ya que garantiza que las inquietudes, solicitudes, sugerencias y comentarios de los habitantes sean atendidos de manera ágil, clara y efectiva.

El PAC se encuentra ubicado estratégicamente en el acceso principal del frente de obra, lo que facilita la interacción presencial con los ciudadanos y promueve un flujo constante de información. Adicionalmente, se mantienen canales virtuales de atención, como la línea móvil con servicio de WhatsApp (301 508 9736) y el correo electrónico consorciohsanfrancisco@gmail.com

Mediante los cuales se brinda acompañamiento y soporte a los residentes del municipio, garantizando cobertura y disponibilidad continua.

Durante el mes, se registró la visita de ciudadanos interesados en los procesos de vinculación laboral, quienes se acercaron de manera voluntaria para entregar sus hojas de vida y manifestar su disposición de participar en las labores del proyecto. Este proceso no solo fortalece el componente social, sino que también promueve la inclusión de mano de obra local, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio.

La gestión del PAC sigue siendo un pilar fundamental para mantener la transparencia, el diálogo y la confianza entre el consorcio ejecutor, la interventoría y la comunidad beneficiaria, reafirmando el compromiso institucional con una comunicación participativa y una ejecución responsable del proyecto.

Horarios de atención:

- Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

	
PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD	

	
CARTELERA INFORMATIVA MES DE ENERO	

4. Buzón de sugerencias:

El buzón de sugerencias se mantiene como uno de los principales mecanismos de participación y comunicación ciudadana implementados dentro del proyecto, fortaleciendo el diálogo directo entre la comunidad y las diferentes instancias responsables, tales como la entidad contratante, la interventoría y el contratista. Este medio garantiza la posibilidad de presentar de manera confidencial y permanente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), así como cualquier tipo de observación o comentario relacionado con la ejecución de la obra.

Durante el mes de enero de 2026, el buzón permaneció disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, asegurando el libre acceso de los habitantes del área de influencia para manifestar sus inquietudes. La revisión y verificación periódica del contenido fue realizada por el equipo social del proyecto, con acompañamiento de la interventoría, a fin de identificar oportunamente cualquier comunicación recibida y garantizar su correcta gestión y respuesta dentro de los plazos establecidos.

Este procedimiento refuerza la política de transparencia, participación y atención ciudadana, pilares fundamentales en el relacionamiento con la comunidad y en la construcción de confianza mutua.

Es importante señalar que, hasta la fecha, no se han registrado comunicaciones formales a través de este mecanismo, lo cual evidencia un clima de conformidad general con las actividades desarrolladas y una comunicación efectiva mediante los demás canales establecidos, como el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y las jornadas presenciales de socialización.

5. Pieza de Divulgación:

Durante el mes de enero de 2026, se mantuvo activa la estrategia de divulgación y comunicación comunitaria, orientada a garantizar que la información sobre el desarrollo de la obra sea transmitida de forma clara, oportuna y accesible a toda la población del área de influencia. Los materiales de divulgación comprenden un conjunto de recursos gráficos y físicos diseñados para comunicar los avances, actividades en curso, medidas socioambientales y temas de interés general relacionados con el proyecto.

Estas herramientas se constituyen en un puente de comunicación directa entre el equipo de obra y la comunidad, fomentando la transparencia, el diálogo constante y la confianza mutua. Además, contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes, quienes se mantienen informados sobre las transformaciones positivas que la ejecución del proyecto genera en su territorio.

Durante este periodo, se continuó con la implementación de una estrategia comunicativa permanente, basada en la actualización y distribución de diferentes piezas informativas, entre las cuales se destacan:

- **Carteleras informativas:** ubicadas en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y en el frente de obra, actualizadas con información sobre avances constructivos, cronogramas, medidas de seguridad y gestión ambiental.

- **Afiches y pendones:** elaborados con mensajes alusivos al cuidado ambiental, la seguridad laboral y la convivencia responsable entre la comunidad y el personal de obra.
- **Boletines impresos y digitales:** compartidos con líderes comunitarios y representantes del hospital, con el fin de mantener un flujo informativo formal sobre los progresos alcanzados.
- **Material educativo y de sensibilización:** dirigido tanto a trabajadores como a vecinos del área de influencia, reforzando valores de responsabilidad ambiental y respeto por el entorno social.

Estas acciones han permitido consolidar una comunicación efectiva y transparente, fortaleciendo la relación entre el proyecto y la comunidad, y asegurando la continuidad de un proceso informativo participativo, acorde con los lineamientos del Plan de Manejo Socioambiental.

Valla informativa del proyecto:







6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:


El componente de Participación Comunitaria busca impulsar, dentro del marco de la gestión socioambiental, acciones orientadas a promover la inclusión, la concertación y la toma conjunta de decisiones entre la comunidad y los responsables del proyecto. Uno de los mecanismos más relevantes en este proceso ha sido la conformación y acompañamiento de veedurías ciudadanas en el municipio, las cuales se convierten en garantes de transparencia y control social.


Las reuniones sostenidas con la veeduría representan un espacio fundamental para el fortalecimiento del tejido comunitario, pues permiten consolidar la confianza entre los habitantes, estimular el ejercicio de ciudadanía activa y dinamizar procesos colectivos en torno al proyecto. Durante este mes se sostuvo una reunión con la veeduría socializando el porcentaje de avance de la obra.


En este escenario, se han generado diversos encuentros y diálogos con la población como parte del acompañamiento social, con el doble propósito de mantenerlos informados sobre los avances de la obra y de fomentar la construcción participativa de decisiones. De esta manera, se asegura una participación efectiva en la que la comunidad es reconocida como un actor clave en la transformación social y territorial derivada de la ejecución del proyecto.

7. Generación de empleo General:

PROYECTO	N° PERSONAS VINCULADAS EN EL MES	N° PERSONAS QUE SE RETIRAN EN EL MES	N° PERSONAS DE MANO DE OBRA CALIFICADA	N° PERSONAS DE MANO NO CALIFICADA	N° HOMBRES	N° MUJERES	N° PERSONAS EMPLEADAS DE LA COMUNIDAD
Hospital San Francisco FASE 2	**21**	**2**	**8**	**9**	**19**	**3**	**11**

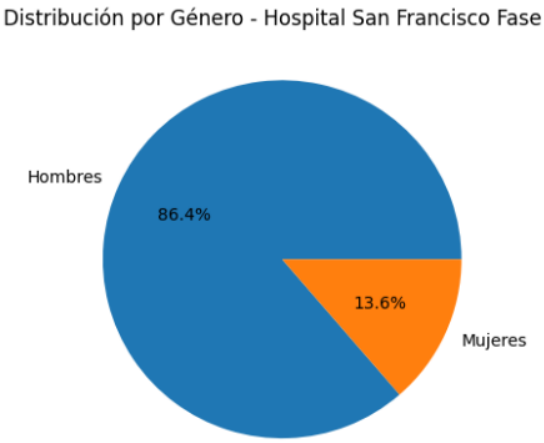
Distribución por Género - Hospital San Francisco Fase 2
Hombres
86.4%
13.6%
Mujeres

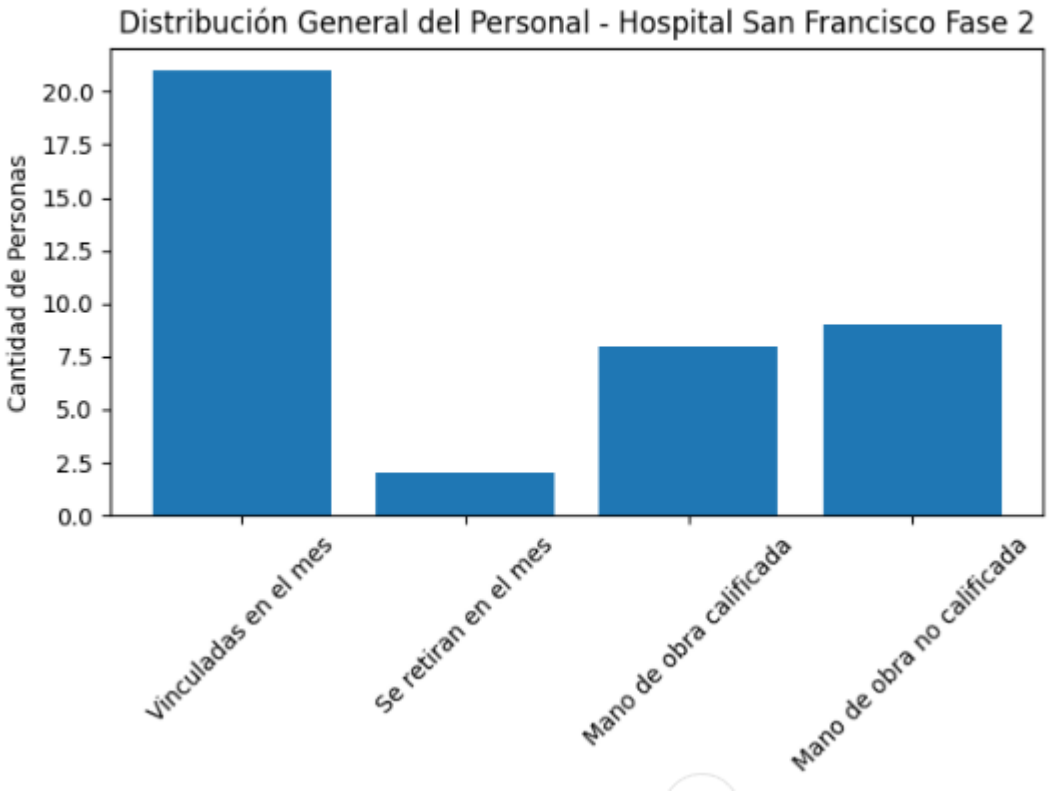
Distribución General del Personal - Hospital San Francisco Fase 2
Cantidad de Personas
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Vinculadas en el mes
Se retiran en el mes
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

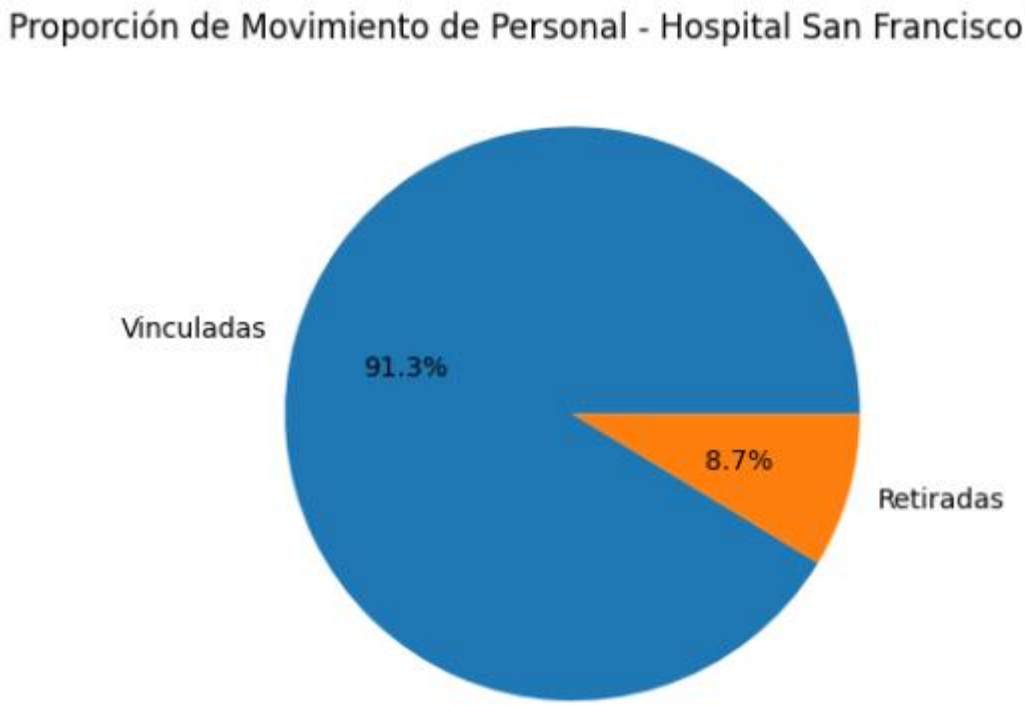
Proporción de Movimiento de Personal - Hospital San Francisco Fase 2
Vinculadas
91.3%
8.7%
Retiradas

Generación de empleo por géneros activos:

Genero	Cantidad
Masculino	19
Femenino	2
Total	21

8. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 31 de enero de 2026, el proyecto continuó avanzando en la implementación de las acciones contempladas dentro del Plan de Gestión Socioambiental, consolidando los compromisos adquiridos con la comunidad, las autoridades locales y las entidades de control. Las actividades desarrolladas durante este mes se orientaron tanto al fortalecimiento del relacionamiento social como al cumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales establecidos.

Entre las acciones más representativas se destacan las siguientes:

• **Fortalecimiento de la comunicación comunitaria:** se mantuvo actualizada la cartelera del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), incluyendo información reciente sobre el progreso de las obras, los cronogramas de trabajo y las medidas preventivas implementadas. Este espacio sigue siendo una herramienta clave para garantizar el flujo de información y la transparencia en el desarrollo del proyecto, consolidando la confianza y el sentido de pertenencia de la comunidad.

• **Avance sostenido en el componente constructivo:** las actividades ejecutadas durante enero se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos técnicos, de seguridad y ambientales previamente definidos. Se evidenció un progreso continuo en los frentes de obra, bajo una planificación eficiente y un manejo responsable de los recursos materiales y humanos, lo que contribuye a mantener el ritmo proyectado en la ejecución física.

• **Continuidad en la articulación social:** se promovieron espacios de diálogo y acercamiento con los habitantes del área de influencia, con el fin de atender inquietudes, compartir información actualizada y fortalecer la interacción entre la comunidad y el equipo de obra. Estas jornadas contribuyeron a consolidar un ambiente de cooperación, respeto y corresponsabilidad frente al desarrollo de la infraestructura hospitalaria.

En conjunto, las acciones realizadas durante el mes de enero reflejan la consolidación de una gestión integral que articula los avances técnicos con el componente social y ambiental, reafirmando el compromiso del proyecto con un desarrollo equilibrado, sostenible y participativo.

9. GESTION AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 31 de enero de 2026, el proyecto continuó avanzando en la implementación de las acciones contempladas dentro del Plan de Gestión Socioambiental, consolidando los compromisos adquiridos con la comunidad, las autoridades locales y las entidades de control. Las actividades desarrolladas durante este mes se orientaron tanto al fortalecimiento del relacionamiento social como al cumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales establecidos.

Entre las acciones más representativas se destacan las siguientes:

• **Fortalecimiento de la comunicación comunitaria:** se mantuvo actualizada la cartelera del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), incluyendo información reciente sobre el progreso de las obras, los cronogramas de trabajo y las medidas preventivas implementadas. Este espacio sigue siendo una herramienta clave para garantizar el flujo de información y la transparencia en el desarrollo del proyecto, consolidando la confianza y el sentido de pertenencia de la comunidad.

• **Avance sostenido en el componente constructivo:** las actividades ejecutadas durante octubre se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos técnicos, de seguridad y ambientales previamente definidos. Se evidenció un progreso continuo en los frentes de obra, bajo una planificación eficiente y un manejo responsable de los recursos materiales y humanos, lo que contribuye a mantener el ritmo proyectado en la ejecución física.

• **Continuidad en la articulación social:** se promovieron espacios de diálogo y acercamiento con los habitantes del área de influencia, con el fin de atender inquietudes, compartir información actualizada y fortalecer la interacción entre la comunidad y el equipo de obra. Estas jornadas contribuyeron a consolidar un ambiente de cooperación, respeto y corresponsabilidad frente al desarrollo de la infraestructura hospitalaria.

En conjunto, las acciones realizadas durante el mes de octubre reflejan la consolidación de una gestión integral que articula los avances técnicos con el componente social y ambiental, reafirmando el compromiso del proyecto con un desarrollo equilibrado, sostenible y participativo.

11.1 Programa para el manejo integral de residuos sólidos (Ordinarios, reciclajes, RCD):

Durante el mes de enero de 2026, en el marco de la ejecución de las actividades constructivas del proyecto “Ejecución de la Construcción de la Segunda Etapa de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís”, se dio continuidad a la gestión integral de los residuos sólidos generados en los diferentes frentes de obra.

Los residuos identificados corresponden a distintas tipologías, tales como escombros, restos de concreto y mortero, empaques plásticos, fragmentos de madera, cartón, chatarra metálica y residuos de materiales de instalación, los cuales son clasificados desde la fuente conforme a su naturaleza y potencial de aprovechamiento.

Durante este periodo, se reforzaron las labores de segregación, recolección y almacenamiento temporal, asegurando que cada tipo de residuo sea manejado según los lineamientos técnicos establecidos en el Plan de Manejo Socioambiental (PMSA). Esta organización ha permitido optimizar los procesos logísticos internos, minimizar los riesgos ambientales y facilitar la correcta disposición final ante los gestores autorizados.

De manera complementaria, se continuó implementando la estrategia de aprovechamiento de materiales reutilizables, especialmente de madera de estibas, cartones y elementos metálicos, promoviendo prácticas de reciclaje y economía circular dentro del proyecto. Estas acciones contribuyen a reducir la generación de residuos no aprovechables y a fomentar el compromiso ambiental tanto del personal de obra como de la comunidad circundante.

Así mismo, se mantuvo la supervisión permanente del punto de acopio temporal, ubicado en la zona del semisótano (garaje de ambulancias), espacio destinado para la clasificación, almacenamiento y control de residuos sólidos provenientes de labores de revoque, excavación y acabados. Dicho punto fue inspeccionado periódicamente para garantizar condiciones de orden, limpieza y seguridad, evitando dispersión de materiales y afectaciones al entorno.

Estas acciones evidencian el compromiso del proyecto con una gestión ambiental responsable y sostenible, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, la minimización de impactos negativos y la incorporación de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de la obra hospitalaria.

En este ítem también se abordó un llamado por parte de la comunidad en la cual estaba teniendo afectación por el punto de acopio provisional del material proveniente de excavación las cuales en momento de lluvia se estaba moviendo calle abajo generando la obstrucción de rejillas y sumideros.

PROGRAMA	MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS
Manejo de residuos Ordinarios	Para el presente informe se cuenta con el punto ecológico el cual cuenta con canecas de color verde, negro y blanco) con su respectiva bolsa, según lo establecido en la Resolución No. 2184de 2019. Se realizará semanalmente una adecuada separación en la fuente de los residuos generados en la obra y en el área administrativa. Los residuos sólidos ordinarios generados por las actividades del personal de obra, son entregados directamente al prestador de servicios públicos de aseo que funciona en la zona: La empresa de servicios públicos SERVI.
Manejo de residuos sólidos reciclables	Para el manejo de los residuos sólidos aprovechables, se dispuso de un punto de acopio en las instalaciones del campamento de obra. Estos acopios se encuentran en condiciones óptimas para su almacenamiento temporal y posterior entrega a recuperadores de la zona.

11.2 Manejo de Residuos de Construcción

Durante el mes de enero de 2026, se continuó fortaleciendo la implementación de estrategias de manejo integral de residuos generados en el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Manejo Socioambiental (PMSA).

Una de las acciones más relevantes durante este periodo fue el seguimiento al proceso de aprovechamiento de las estibas remanentes de la primera etapa del proyecto. Dichos elementos, tras un proceso de revisión y selección, fueron entregados progresivamente a miembros de la comunidad del área de influencia, promoviendo su reutilización con fines domésticos y productivos. Esta práctica ha contribuido al fortalecimiento del tejido social y al fomento de una cultura de reaprovechamiento de materiales, en coherencia con los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental del consorcio.

De igual manera, se mantuvo operativo el punto de acopio temporal ubicado en el área proyectada para el semisótano (zona destinada al garaje de ambulancias). Este espacio ha sido acondicionado para garantizar el almacenamiento controlado, ordenado y seguro de los residuos generados por labores como revoque, instalaciones y movimientos de tierra, asegurando condiciones adecuadas de salubridad, limpieza y control ambiental.

Durante este mes, se reforzó la señalización y delimitación del punto de acopio, implementando barreras de contención y señalización preventiva, lo cual ha permitido mejorar la trazabilidad de los residuos y evitar la dispersión de materiales dentro del área de trabajo. Además, se continuó promoviendo la segregación en la fuente y la capacitación al personal operativo sobre el manejo adecuado de los residuos, fortaleciendo la corresponsabilidad en las prácticas de sostenibilidad.

Estas acciones consolidan el compromiso del proyecto con una gestión ambiental eficiente, transparente y orientada a la economía circular, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la reducción progresiva de impactos asociados a la generación de residuos en obra.

11.3 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante el mes de enero de 2026, se mantuvo el control sobre las principales fuentes de contaminación atmosférica y acústica derivadas de las actividades constructivas del proyecto, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa nacional vigente en materia de calidad del aire y ruido ambiental.

En cuanto a las emisiones difusas de material particulado (polvo), se identificó que su generación continúa asociada principalmente a las labores de canchado, nivelación de superficies, mezcla de materiales y transporte interno de insumos, así como a los procesos de instalación del sistema eléctrico. Estas actividades, por su naturaleza, tienden a liberar partículas al ambiente, las cuales pueden afectar la salud de los trabajadores y de la comunidad si no se controlan adecuadamente.

Para mitigar estos impactos, se reforzaron las medidas de humectación periódica en las áreas críticas de trabajo, especialmente en zonas de corte, excavación y tránsito vehicular. De igual manera, se implementaron barreras físicas y señalización preventiva en los frentes más expuestos, con el fin de minimizar la dispersión del polvo y delimitar las zonas de riesgo ambiental.

Respecto a la contaminación acústica, se realizó seguimiento a las fuentes emisoras de ruido, principalmente la operación de maquinaria pesada, equipos de compactación y herramientas de demolición, verificando que los niveles se mantuvieran dentro de los límites permisibles establecidos por la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente. Para ello, se continuó aplicando el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos, lo que ha permitido reducir las emisiones sonoras y prolongar su vida útil.

Adicionalmente, se promovió entre el personal la utilización de protectores auditivos y se efectuaron recordatorios sobre los horarios de operación establecidos para evitar molestias a la comunidad aledaña.

Estas acciones consolidan el compromiso del proyecto con la prevención de impactos atmosféricos y acústicos, garantizando que el desarrollo de las obras se realice bajo criterios de sostenibilidad, salud ocupacional y respeto por la calidad de vida de los habitantes del entorno.

11.3.1 Control de Emisiones de Gases y Material Particulado:

Programa	***Medidas de manejo***
Control de Emisiones de Material Particulado	En las labores de barrido, se realiza el humedecimiento previo de la zona, así como la humectación en las actividades de corte y demolición.

11.3.2 Control de Ruido:

Durante el mes de enero de 2026, las actividades constructivas continuaron desarrollándose bajo un estricto control de los niveles de ruido generados en los diferentes frentes de trabajo, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El monitoreo acústico permitió garantizar que las emisiones sonoras se mantuvieran dentro de los límites permisibles, previniendo posibles afectaciones a la salud ocupacional del personal expuesto y reduciendo las molestias a la comunidad circundante. De esta manera, se preservó un entorno de trabajo más seguro, confortable y armónico con las condiciones urbanas del sector.

Para lograrlo, se aplicaron medidas preventivas y correctivas de carácter técnico y organizativo, entre las cuales se destacan:

- **Programación de actividades de alto impacto sonoro** en horarios de menor afluencia comunitaria, evitando perturbaciones en las zonas residenciales adyacentes.
- **Delimitación de áreas críticas** mediante señalización preventiva y barreras físicas que ayudan a disminuir la propagación del sonido.
- **Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos**, reduciendo vibraciones y ruidos mecánicos.
- **Capacitación y sensibilización del personal operativo** sobre el uso adecuado de herramientas y la importancia de mantener los niveles de ruido controlados durante las labores diarias.

Estas acciones han permitido fortalecer la gestión ambiental en el componente acústico, garantizando la convivencia armónica entre el desarrollo constructivo y la comunidad local, en coherencia con los lineamientos del Plan de Manejo Socioambiental del proyecto.

.

Programa	***Medidas de manejo***
Control de Ruido	Durante este periodo el personal utilizó los elementos de protección auditiva a cargo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. El uso de protectores respiratorios por parte del personal expuesto a material particulado.

10. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA:

Programa	Medidas de manejo	Anexo o Formatos
Manejo de Maquinaria, Vehículos y equipos en la obra	En el formato del parque automotor se relacionaron los vehículos que fueron utilizados durante el mes de enero, se utilizó una volqueta durante este periodo, donde se relaciona la documentación correspondiente al SOAT y la revisión técnico-mecánica.	*Anexo 2. Parque automotor utilizado y documentación maquinaria y equipos*

11. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA:

Durante el mes de enero de 2026, se mantuvo la ejecución de medidas orientadas al uso racional y eficiente de los recursos hídricos y energéticos, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Manejo Socioambiental del proyecto. Estas acciones buscan optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales, reducir el desperdicio y fortalecer las prácticas sostenibles dentro del área de obra.

Entre las estrategias aplicadas durante este periodo se destacan las siguientes:

• **Control y registro del consumo de agua utilizada en actividades constructivas**, priorizando su uso únicamente en procesos indispensables y promoviendo la reutilización de aguas lluvias para labores de limpieza general, humectación de vías y control de material particulado.

• **Uso responsable de la energía eléctrica**, fomentando el apagado de luminarias, herramientas y equipos durante los tiempos de inactividad, así como el aprovechamiento de la iluminación natural en espacios de trabajo diurno, contribuyendo a la eficiencia energética del proyecto.

• **Capacitaciones y recordatorios al personal operativo sobre buenas prácticas de ahorro**, tanto de agua como de energía, incentivando la adopción de hábitos sostenibles y el sentido de corresponsabilidad ambiental en las labores diarias.

• **Optimización de equipos eléctricos y mecánicos**, verificando su correcto funcionamiento y mantenimiento para garantizar un mejor rendimiento energético y reducir emisiones indirectas de CO_2 asociadas al consumo eléctrico.

• **Promoción de la cultura del ahorro y sostenibilidad**, integrando estas prácticas dentro de las charlas de sensibilización ambiental y los espacios de formación continua del personal de obra.

Estas medidas reflejan la consolidación de una gestión ambiental eficiente y responsable, orientada a garantizar que la ejecución del proyecto hospitalario se realice bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia de recursos y compromiso con la reducción de la huella ambiental del proceso constructivo.

Programa	Medidas de manejo	Anexo o Formatos
Uso eficiente de energía y agua	Para la contribución en el ahorro y uso eficiente de la energía, el proyecto cuenta con luminarias Led en el campamento administrativo. Para el ahorro y uso eficiente del agua, se continuaron las inspecciones regulares en campo, donde se verificó el uso eficiente del agua.	*Anexo 3. Factura de servicios públicos (Energía)*

12. PROGRAMA PARA EL ORDEN Y ASEO EN CAMPAMENTO:

Durante el mes de enero de 2026, se continuó con la implementación del Programa de Orden y Aseo en obra, como parte fundamental del componente de gestión ambiental y de seguridad industrial del proyecto “Ejecución de la Construcción de la Segunda Etapa de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís”.

Este programa tiene como propósito mantener un entorno de trabajo seguro, limpio y organizado, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades constructivas y contribuyendo a la prevención de accidentes, la eficiencia operativa y el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Durante este periodo, se reforzaron las labores de mantenimiento y control, destacándose las siguientes acciones:

• **Recolección diaria y disposición adecuada de residuos y escombros generados en los diferentes frentes de trabajo**, evitando su acumulación y asegurando la limpieza constante de las áreas intervenidas.

• **Clasificación y organización de materiales de construcción**, destinando zonas específicas para almacenamiento temporal, con señalización visible que facilita la ubicación y control de los insumos.

• **Acondicionamiento permanente de pasillos, accesos y áreas comunes**, garantizando la libre circulación del personal y la maquinaria, y reduciendo los riesgos asociados a tropiezos u obstrucciones.

• **Supervisión y seguimiento periódico al cumplimiento de las normas de orden y aseo**, mediante recorridos de control liderados por el equipo de gestión socioambiental y de seguridad, con retroalimentación al personal operativo.


• **Sensibilización al personal sobre la importancia de mantener los espacios de trabajo en condiciones adecuadas de limpieza**, como parte del compromiso colectivo hacia la seguridad, la productividad y el respeto por el entorno.

Estas medidas han permitido consolidar una cultura de disciplina y corresponsabilidad ambiental dentro del proyecto, mejorando el desempeño operativo y fortaleciendo la imagen positiva de la obra frente a la comunidad y las entidades de control.

Programa	Medidas de manejo	Anexo o Formatos
Orden y aseo	Para mantener un orden y limpieza dentro del campamento se dan las directrices para el desarrollo de la limpieza diaria en obra, con ello se conforma una cuadrilla de limpieza.	*Registro fotográfico.*

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ordinarios, reciclables, especiales, RCD y peligrosos)

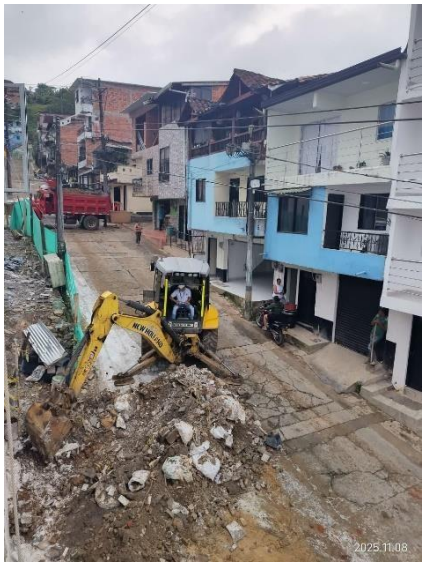	
SELECCIÓN Y SEPARACION DE RESIDUOS RCD	

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA	
	

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	
	
Cubrimiento de material en obra	Depósito de materiales

PROGRAMA PARA EL ORDEN Y ASEO EN OBRA	
	
	
Limpieza orden y aseo	

ELABORO INFORME

ARQ. DARWIN ARIEL FERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA CONTRATIST

ANEXO 1:	*Factura de servicios públicos (Energía, agua e internet).*

14. **ANEXOS:**



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P.

NIT 900.657.172-3
Calle 11 N° 09 - 61 / Tel 832 3002
Email: gerencia@esp-sanfrancisco-antioquia.gov.co
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

FACTURA Nro: 0000322326

TOTAL A PAGAR 42.664,00

FECHAS DE PAGO

Periodo: Noviembre 2025
Fecha SIN Recargo 19 / 12 / 2025
Fecha CON Recargo 27 / 12 / 2025

DATOS DE USUARIO

CÓDIGO: 001 - 0000104502 **USO:** 1
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS **CUENTAS VEN:**
DIRECCIÓN: Cl 9 No.10-24 **ESTRATO:** Unico


RESUMEN DE TU FACTURA DEL MES

ACUEDUCTO	ASEO	ALCANTARILLADO	OTROS	TOTAL
26.531	0	16.133	0	42.664,00

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA

Consumos: 30 Dias
Del 01 / 11 / 2025 al 30 / 11 / 2025
Promedio últimos 6 meses 0
Promedio estrato 22



LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS

Lectura Anterior (m3): 64
Lectura Actual (m3): 0
Consumos (m3): 0

Liquidación de Consumo

Básico:
Complementario:
Suntuario:

VALOR FACTURADO

Total Consumo:	
Recargo Mora:	353
Cargo Fijo	13.089
Deuda Venc:	13.089
Subsidio/Sobreprecio:	0
TOTAL ACUEDUCTO	**26.531**

ALCANTARILLADO

LINEA PARA REPORTE DE DAÑOS
3153745700

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO P10 XII

Liquidación de Vertimiento

Básico:
Complementario:
Suntuario:

10 DIC 2025
OFICINA SAN FRANCISCO
PAGADO

Total Consumo:	
Recargo Mora:	215
Cargo Fijo	7.959
Deuda Venc:	7.959
Subsidio/Sobreprecio:	0
TOTAL ALCANTARILLADO	**16.133**

ASEO

Frecuencia Semanal de Recolección
Organicos: Lunes y Viernes
Inservibles: Miercoles
Reciclaje: Miercoles

Tasa de Aseo:

Total Aseo :	0
Recargo Mora:	0
Deudas Vencidas:	0
Subsidio/Sobreprecio:	
TOTAL ASEO	**0**


OTROS

Concepto	#/Cuotas	Cuota	Saldo

Otros meses:	0
Deuda Otros:	0
Recargos otros:	0
TOTAL OTROS	**0**

AMIGO USUARIO, CUALQUIER INQUIETUD, RECLAMO SEA POR CONSUMO O DAÑO POR FAVOR DIRIGIRSE A LA OFICINA DE LA ESP EN LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA, DESPUÉS DE ESTE TIEMPO SE DA POR ACEPTADA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTE DOCUMENTO.

Representante Legal

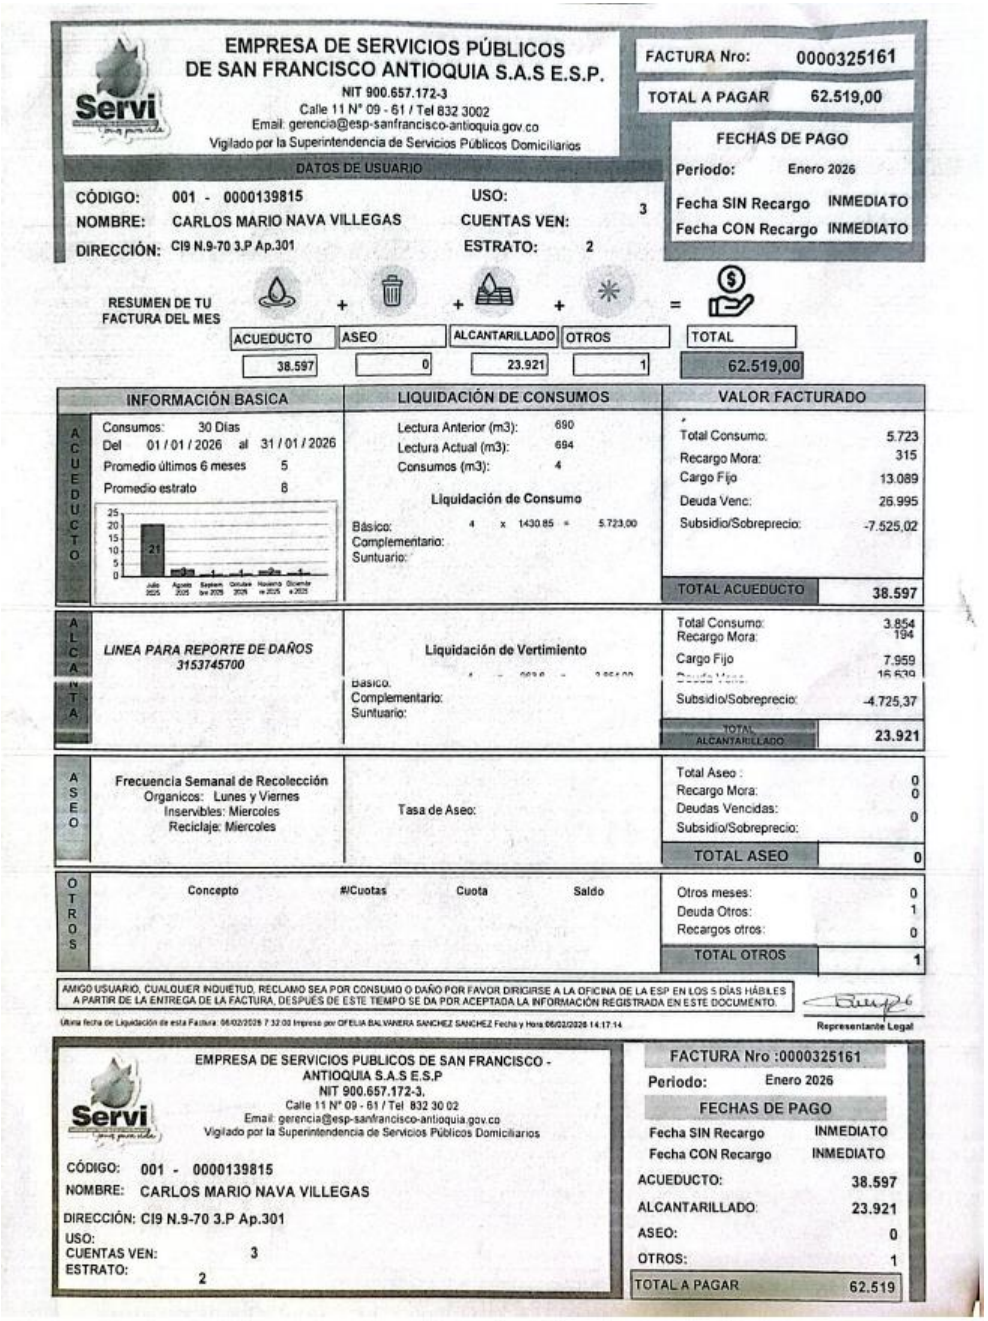

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P.
NIT 900.657.172-3
Calle 11 N° 09 - 61 / Tel 832 3002
Email: gerencia@esp-sanfrancisco-antioquia.gov.co
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

FACTURA Nro: 0000325161
TOTAL A PAGAR 62.519,00

FECHAS DE PAGO
Periodo: Enero 2026
Fecha SIN Recargo INMEDIATO
Fecha CON Recargo INMEDIATO

DATOS DE USUARIO
CÓDIGO: 001 - 0000139815
NOMBRE: CARLOS MARIO NAVA VILLEGAS
DIRECCIÓN: CI9 N.9-70 3.P Ap.301
USO: 3
CUENTAS VEN:
ESTRATO: 2

RESUMEN DE TU FACTURA DEL MES

ACUEDUCTO	ASEO	ALCANTARILLADO	OTROS	TOTAL
38.597	0	23.921	1	62.519,00

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
ACUEDUCTO	Consumos: 30 Días Del 01 / 01 / 2026 al 31 / 01 / 2026 Promedio últimos 6 meses 5 Promedio estrato 8 Lectura Anterior (m3): 690 Lectura Actual (m3): 694 Consumos (m3): 4 Liquidación de Consumo Básico: 4 x 1430.85 = 5.723,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 5.723 Recargo Mora: 315 Cargo Fijo 13.089 Deuda Venc: 26.995 Subsidio/Sobreprecio: -7.525,02 TOTAL ACUEDUCTO 38.597
ALCANTARILLADO	LINEA PARA REPORTE DE DAÑOS 3153745700 Liquidación de Vertimiento Básico: Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 3.854 Recargo Mora: 194 Cargo Fijo 7.959 Subsidio/Sobreprecio: -4.725,37 TOTAL ALCANTARILLADO 23.921
ASEO	Frecuencia Semanal de Recolección Organicos: Lunes y Viernes Inservibles: Miercoles Reciclaje: Miercoles Tasa de Aseo:	Total Aseo : 0 Recargo Mora: 0 Deudas Vencidas: 0 Subsidio/Sobreprecio: TOTAL ASEO 0
OTROS	Concepto #/Cuotas Cuota Saldo	Otros meses: 0 Deuda Otros: 1 Recargos otros: 0 TOTAL OTROS 1

AMIGO USUARIO, CUALQUIER INQUIETUD, RECLAMO SEA POR CONSUMO O DAÑO POR FAVOR DIRIGIRSE A LA OFICINA DE LA ESP EN LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA, DESPUÉS DE ESTE TIEMPO SE DA POR ACEPTADA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTE DOCUMENTO.

Representante Legal

Ultima fecha de Liquidación de esta Factura: 06/02/2026 7:32:00 Impresa por OFELIA BALVANERA SANCHEZ SANCHEZ Fecha y Hora 06/02/2026 14:17:14

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA S.A.S E.S.P
NIT 900.657.172-3.
Calle 11 N° 09 - 61 / Tel 832 30 02
Email: gerencia@esp-sanfrancisco-antioquia.gov.co
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CÓDIGO: 001 - 0000139815
NOMBRE: CARLOS MARIO NAVA VILLEGAS
DIRECCIÓN: CI9 N.9-70 3.P Ap.301
USO:
CUENTAS VEN: 3
ESTRATO: 2

FACTURA Nro :0000325161
Periodo: Enero 2026
FECHAS DE PAGO
Fecha SIN Recargo INMEDIATO
Fecha CON Recargo INMEDIATO
ACUEDUCTO: 38.597
ALCANTARILLADO: 23.921
ASEO: 0
OTROS: 1
TOTAL A PAGAR 62.519

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE LA GESTIÓN:

Desde el componente social, se estableció desde el inicio de la obra el levantamiento de actas de vecindad y de entorno de los predios colindantes al proyecto, función en la cual el equipo social ha brindado acompañamiento permanente y custodia de los documentos generados.

3.1.3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo coordinar con el contratista mitigar la emisión de polvo generado por las canchadas en los muros internos se recomienda instalar lona verde en las ventanas para que el polvo no afecte a las casas vecinas.

3.2. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST:

Durante este periodo se verifico y garantizo que el contratista cumpliera con la normatividad y requisitos legales vigentes asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las diferentes actividades en obra.

3.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST

DATOS GENERALES	
Contratista: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO	**Contrato de Obra:** INV002-2025
Interventoría: CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA	**Contrato de Interventoría:** INV004-2025
Periodo reportado: Mes: ENERO Año**:** 2026	
Objeto del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA	

ACTIVIDADES EN OBRA: REVOQUE, GASES MEDICINALES, ELECTRICOS, RCI, ESTUCO, EXCAVACIÓN, ENCHAPE, TANQUE RCI, INSTALACION DE VENTANAS Y ORDEN Y ASEO

ITEM	REQUISITO SST.	OBSERVACIONES	FOTO	ANEXO
1.1.1	Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, el Contratista tuvo disponible como responsable del SG SST para el proyecto a **Jennifer Presiga (Residente SST) y Marlyn Ciro (Auxiliar de Obra).** **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría tuvo disponible como responsable del SG SST para el proyecto a **Plutarco García (Residente SST) y Karen Ciro (Auxiliar SST de Interventoría)**	No aplica	No aplica
1.1.2	Asignación de responsabilidades en SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, el Contratista tuvo disponible como responsable del SG SST para el proyecto a **Jennifer Presiga (Residente SST) y Marlyn Ciro (Auxiliar de Obra).** **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría tuvo disponible como responsable del SG SST para el proyecto a **Plutarco García (Residente SST) y Karen Ciro (Auxiliar SST de Interventoría)**	No Aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 1 Asignación y entrega de Responsabilidades SST a todo el personal **INTERVENTORIA:** Anexo 1 Asignación y entrega de Responsabilidades SST a todo el personal
1.1.3	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista** invirtió aproximadamente $ 8.500.000 en los siguientes rubros para la implementación del SG SST del proyecto: • Elementos de protección • Dotación • Exámenes Médicos.	No Aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 2 presupuesto SST¨ solicitar al contratista **INTERVENTORIA:** Anexo 2 presupuesto SST¨ solicitar a

		INTERVENTORIA: Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **la Interventoría** invirtió aproximadamente $600.000 en los siguientes rubros para la implementación del SG SST del proyecto: • Elementos de protección • Dotación • Exámenes Médicos		interventoría
1.1.4	Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** tiene vinculado 39 trabajadores, los cuales todos están afiliados a la seguridad social (EPS, ARL, AFP, CCF). **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** tiene vinculado 3 trabajadores, los cuales todos están afiliados a la seguridad social (EPS, ARL, AFP, CCF).	No Aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 3 Planilla de pago de Seguridad Social del mes de septiembre 2025 que se paga en septiembre 2025 **INTERVENTORIA:** Anexo 3 Planilla de pago de Seguridad Social del mes de septiembre 2025 que se paga en agosto 2025
1.1.5	Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no presentan trabajos de alto riesgo **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría**,** no presentan trabajos de alto riesgo	No Aplica	**CONTRATISTA:** No Aplica porque no realizamos actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 del 2003. **INTERVENTORIA:** No Aplica porque no realizamos actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 del 2003.
1.1.6	Conformación COPASST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** cumple con la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), de acuerdo con los requisitos legales vigentes. El comité está debidamente constituido, con actas de elección, funciones definidas y evidencias de su funcionamiento, garantizando la participación activa de los trabajadores en el SG-SST.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 4 Conformación del COPASST **INTERVENTORIA:** Anexo 4 Conformación del COPASST

		Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **La interventoría**, Se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST en su modalidad de Vigía, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de garantizar la participación de los trabajadores en las acciones de prevención y control de riesgos laborales**.**		
1.1.7	Capacitación COPASST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** cumple con la realización de capacitaciones dirigidas al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), fortaleciendo las competencias de sus integrantes en la identificación de riesgos, medidas de prevención, investigación de incidentes y promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones garantizan el adecuado desempeño del comité dentro del SG-SST. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **La Interventoría,** Se llevaron a cabo las capacitaciones del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, con el fin de fortalecer sus funciones en la identificación, prevención y control de riesgos laborales.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 5 Capacitación del COPASST **INTERVENTORIA:** Anexo 5 Capacitación del COPASST
1.1.8	Conformación Comité de Convivencia	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** cumple con la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, en concordancia con la normatividad vigente. El comité está debidamente integrado, cuenta con actas de elección y desarrolla actividades orientadas a la prevención, promoción y manejo de situaciones de acoso laboral, garantizando un ambiente de trabajo respetuoso y armonioso**.**	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 6 Conformación del comité **INTERVENTORIA:** Anexo 6 Conformación del comité

		INTERVENTORIA: Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **La Interventoría**, Se conformó el Comité de Convivencia Laboral en su modalidad de Vigía, en cumplimiento de la normatividad vigente, con el propósito de promover la sana convivencia, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de las relaciones laborales.		
1.2.1	Programa Capacitación promoción y prevención PYP	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** presenta la evidencia de las capacitaciones de acuerdo al plan de trabajo. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría**,** presenta la evidencia de las capacitaciones de acuerdo al plan de trabajo	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 7 programa PYP **INTERVENTORIA:** Anexo 7 programa PYP
1.2.2	Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** presenta los documentos de inducción del personal ingresado en obra. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría**,** presenta los documentos de inducción del personal ingresado en obra.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 8 Inducción y Reinducción **INTERVENTORIA:** Anexo 8 Inducción y Reinducción
1.2.3	Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, el Contratista tuvo disponible como responsable del SG SST para el proyecto a **Jennifer Presiga (Residente SST).** **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría tuvo disponible como responsable del SG SST para el proyecto a **Plutarco García (Residente SST)**	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 9 responsable SG-SST **INTERVENTORIA:** Anexo 9 responsable SG-SST
	Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** El	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 10 Política SG-SST

2.1.1	SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	contratista cumple con la elaboración, firma y fecha de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Dicha política ha sido comunicada al COPASST y a todos los niveles de la organización, asegurando su conocimiento, apropiación y aplicación como lineamiento estratégico en materia de seguridad y salud en el trabajo. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026,** la Interventoría, La interventoría, a pesar de contar con menos de diez (10) trabajadores, cumple con la obligación de contar con la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La política está firmada, fechada y divulgada al Vigía y a todos los trabajadores, garantizando su conocimiento y aplicación como lineamiento estratégico de la organización.		**INTERVENTORIA:** Anexo 10 Política SG-SST
2.2.1	Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** cuenta con los objetivos del SG-SST definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas establecidas, debidamente documentados y revisados periódicamente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026,** la **Interventoría**, cuenta con los objetivos del SG-SST definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas establecidas, debidamente documentados y revisados periódicamente	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 11 Objetivos definidos, claros, revisados del SG-SST **INTERVENTORIA:** Anexo 11 Objetivos definidos, claros, revisados del SG-SST
	Evaluación e identificación de prioridades	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente	No aplica	No aplica

2.3.1		**INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026,** la **Interventoría**, Realizó la evaluación e identificación de prioridades en el SG-SST para el equipo de interventoría, conformado por tres trabajadores de oficina. Dado que no se desarrollan actividades de alto riesgo, se priorizaron aspectos relacionados con ergonomía en los puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de iluminación y ventilación, uso de equipos de cómputo, manejo de documentos y factores psicosociales asociados a la carga laboral.		
2.4.1	Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026,** la **Interventoría**, Se elaboró el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se identificaron los objetivos, metas, responsables, recursos y cronograma de actividades. El documento fue revisado y aprobado con la respectiva firma de responsabilidad.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 12 Plan de trabajo Anual. **INTERVENTORIA:** Anexo 12 plan de trabajo Anual.
2.5.1	Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Se gestionó el archivo y retención documental del SG-SST conforme a la normatividad vigente.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 13 Archivo o retención documental **INTERVENTORIA:** Anexo 13 Archivo o retención documental

2.6.1	Rendición sobre el desempeño	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Se efectuó la rendición sobre el desempeño del SG-SST, evaluando el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores, y estableciendo acciones de mejora.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 14 Rendición sobre el desempeño **INTERVENTORIA:** Anexo 14 Rendición sobre el desempeño
2.7.1	Matriz legal	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, En la revisión efectuada por la interventoría se evidenció que la empresa dispone de la Matriz Legal organizada y actualizada. Se recomienda continuar con su actualización periódica y el seguimiento al cumplimiento de los requisitos normativos allí consignados.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 15 Matriz legal **INTERVENTORIA:** Anexo 15 Matriz legal
2.8.1	Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, Se definieron mecanismos	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 16 Mecanismos de comunicación, SG-SST **INTERVENTORIA:** Anexo 16 Mecanismos de comunicación, SG-SST

		de comunicación y el auto reporte en el SG-SST, fomentando la participación activa y la prevención de riesgos.		
2.9.1	Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Efectuó la identificación y evaluación para la adquisición de productos y servicios en el SG-SST está establecida conforme a criterios de seguridad y salud.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 17 Identificación y evaluación para la adquisición de productos y servicios en el SG-SST **INTERVENTORIA:** Anexo 17 Identificación y evaluación para la adquisición de productos y servicios en el SG-SST
2.10.1	Evaluación y selección de proveedores y contratistas	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, La evaluación y selección de proveedores y contratistas está establecida conforme a criterios de seguridad, salud y cumplimiento legal.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 18 Evaluación y selección de proveedores y contratistas **INTERVENTORIA:** Anexo 18 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
2.11.1	Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 19 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST **INTERVENTORIA:** Anexo 19 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST

		INTERVENTORIA: Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, La evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST está documentada y orientada a asegurar la efectividad y mejora continua del sistema.		
3.1.1	Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no presenta la documentación que evidencia el perfil sociodemográfico del personal en obra. • Plan de acción: El contratista en cabeza del personal SST presentara en el periodo del próximo informe la documentación que respalde el perfil sociodemográfico del personal en obra. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, se realiza la elaboración del perfil sociodemográfico del personal de la interventoría.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 20 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud **INTERVENTORIA:** Anexo 20 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud
3.1.2	Actividades de Promoción y Prevención en Salud	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Las actividades de Promoción y Prevención en Salud están establecidas en el SG-SST, con enfoque en el autocuidado, la prevención de enfermedades y el bienestar de los trabajadores. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Las actividades de Promoción y Prevención en Salud están establecidas en el SG-SST, con enfoque en el autocuidado, la prevención de enfermedades y el bienestar de los trabajadores.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 21 Actividades de Promoción y Prevención en Salud **INTERVENTORIA:** Anexo 21 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
	Información al médico de los perfiles de cargo	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** se realiza la descripción del cargo al personal del contratista	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 22 Información al médico de los perfiles de cargo

3.1.3		**INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, se realiza la descripción del cargo al personal de la interventoría.		**INTERVENTORIA:** Anexo 22 Información al médico de los perfiles de cargo
3.1.4	Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-Periodicidad Comunicación al Trabajador	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista** se realiza la elaboración de los exámenes de ingreso del personal del contratista **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, se realiza la elaboración de los exámenes de ingreso del personal de la interventoría.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 23 Evaluaciones médicas ocupacionales **INTERVENTORIA:** Anexo 23 Evaluaciones médicas ocupacionales
3.1.5	Custodia de Historias Clínicas	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** La custodia corresponde exclusivamente a la IPS; el contratista solo conserva los conceptos de aptitud médica, garantizando la confidencialidad de la información. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, La custodia de las historias clínicas ocupacionales está asegurada bajo principios de confidencialidad y normatividad vigente.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 24 Custodia de Historias Clínicas **INTERVENTORIA:** Anexo 24 Custodia de Historias Clínicas
3.1.6	Restricciones y recomendaciones médico laborales	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** se realiza la elaboración de los exámenes de ingreso del personal en obra. Se presenta una restricción médico-laboral vigente para un trabajador, la cual ha sido tenida en cuenta en la asignación de sus funciones, garantizando el cumplimiento de las recomendaciones médicas emitidas. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría se realiza la elaboración de los exámenes de ingreso del personal de la interventoría y entre los mismo no se presentan restricciones para el personal de interventoría.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 25 Restricciones y recomendaciones médico laborales **INTERVENTORIA:** Anexo 25 Restricciones y recomendaciones médico laborales
	Estilos de vida y entornos saludables	**CONTRATISTA:**	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 26 Estilos de vida y entornos

3.1.7	(controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no presenta la documentación que evidencia el perfil sociodemográfico del personal en obra. • Plan de acción: El contratista en cabeza del personal SST presentara en el periodo del próximo informe la documentación que respalde el perfil sociodemográfico del personal en obra. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, se realiza la elaboración del perfil sociodemográfico del personal de la interventoría, conjunto a ello, se realiza socialización de la política de sustancia psicoactivas		saludables **INTERVENTORIA:** Anexo 26 Estilos de vida y entornos saludables.
3.1.8	Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** cumple con el suministro de agua potable para los trabajadores, dispone de servicios sanitarios en condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento, y asegura la recolección y disposición adecuada de basuras, garantizando así el cumplimiento de los requisitos de salubridad y bienestar laboral**.** **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la interventoría no realiza residuos en obra, por lo tanto, no son requeridos los certificados de disposición.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 27 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras **INTERVENTORIA:** Anexo 27 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
3.1.9	Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** realiza la eliminación adecuada de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados en sus actividades, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y laboral vigente. Este proceso se desarrolla bajo criterios de seguridad, higiene y sostenibilidad, minimizando riesgos para la salud de los trabajadores y el entorno. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, En la **Interventoría**, solo se generan residuos sólidos ordinarios de oficina (papel, cartón y basuras comunes), los cuales son dispuestos adecuadamente a través del servicio de recolección municipal. No se generan residuos líquidos ni gaseosos	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 28 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos **INTERVENTORIA:** Anexo 28 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

3.2.1	Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, Durante el periodo evaluado se presentó (1) accidente asociado a las actividades del contratista. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, no se presentan accidentes ni enfermedades laborales en el personal de la interventoría.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 29 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. **INTERVENTORIA:** Anexo 29 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
3.2.2	Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, cumple con la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos, siguiendo los lineamientos del SG-SST y la normatividad vigente. Durante el periodo evaluado presentó (1) accidente asociado a las actividades del contratista. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, no se presentan accidentes ni enfermedades laborales en el personal de la interventoría.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 30 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales **INTERVENTORIA:** Anexo 30 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
3.2.3	Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** lleva a cabo el registro y análisis estadístico de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST. Durante el periodo evaluado presentó (1) accidente asociado a las actividades del contratista. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, En la interventoría no se han presentado accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, por lo cual no se generan registros ni análisis estadísticos	No Aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 31 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales **INTERVENTORIA:** Anexo 31 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales
3.3.1	Medición de la frecuencia de la accidentalidad	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026. el Contratista,** realiza la medición del índice de frecuencia de la accidentalidad como parte del análisis estadístico del SG-SST. Durante el periodo evaluado presentó (1) accidente asociado a las actividades del contratista.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 32 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

		INTERVENTORIA: Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, **durante el período evaluado** no se presentaron accidentes de trabajo **ni enfermedades laborales. En consecuencia, la** medición del índice de frecuencia de accidentalidad corresponde a cero (0)**.**		**INTERVENTORIA:** Anexo 32 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
3.3.2	Medición de la severidad de la accidentalidad	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Durante el periodo evaluado presentó (1) accidente asociado a las actividades del contratista. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Este resultado refleja que no se generaron días de incapacidad laboral atribuibles a accidentes, lo cual evidencia un adecuado control de riesgos y cumplimiento de las medidas preventivas implementadas por el contratista.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 33 Medición de la severidad de la accidentalidad **INTERVENTORIA:** Anexo 33 Medición de la severidad de la accidentalidad
3.3.3	Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Durante el período evaluado **no se registraron casos de mortalidad por accidentes de trabajo**, razón por la cual el índice correspondiente se mantiene en **cero (0)**. Este resultado evidencia el control efectivo de los riesgos críticos y la implementación de medidas de prevención que han permitido salvaguardar la vida e integridad de los trabajadores. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, confirma que **no se presentaron casos de mortalidad por accidentes de trabajo**, manteniéndose el indicador en **cero (0)**. Esto evidencia el cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista en el marco del SG-SST.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 34 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo **INTERVENTORIA:** Anexo 34 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo

3.3.4	Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista, r**ealizó la medición del indicador de prevalencia de enfermedad laboral, encontrando que durante el período evaluado **no se presentaron casos de enfermedad laboral** en su personal. En consecuencia, el indicador se mantiene en **cero (0)**, reflejando la adecuada gestión preventiva en el marco del SG-SST. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría,** durante el período evaluado, **no se presentaron casos de enfermedad laboral** en el personal del contratista. El indicador de prevalencia se mantiene en **cero (0)**, lo que evidencia el cumplimiento de las acciones preventivas y de control en el marco del SG-SST**.**	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 35 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral **INTERVENTORIA:** Anexo 35 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
3.3.5	Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** realizó la medición del indicador de incidencia de enfermedad laboral. Durante este tiempo **no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral**, por lo cual el indicador se mantiene en **cero (0)**. Este resultado evidencia la efectividad de las acciones de promoción y prevención implementadas en el marco del SG-SST. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, realizó la medición del indicador de incidencia de enfermedad laboral. Durante este tiempo **no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral**, por lo cual el indicador se mantiene en **cero (0)**. Este resultado evidencia la efectividad de las acciones de promoción y prevención implementadas en el marco del SG-SST.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 36 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral **INTERVENTORIA:** Anexo 36 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
	Medición del ausentismo por causa medica	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Durante el período evaluado se presentó un **(1) casos de ausentismo por causa**	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 37 Medición del ausentismo por causa medica

3.3.4		**médica**, los cuales fueron gestionados oportunamente y documentados en el marco del SG-SST. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **01 al 19 de diciembre 2025**, la **Interventoría**, No se registraron incapacidades médicas ni ausentismo por esta causa, por lo que el indicador se mantiene en **cero (0)**.		**INTERVENTORIA:** Anexo 37 Medición del ausentismo por causa medica
3.3.5	Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** En el período evaluado **no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral**, por lo cual el indicador se mantiene en **cero (0)**. Esto refleja un control adecuado frente a los riesgos ocupacionales identificados. ● **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Tampoco se registraron casos nuevos de enfermedad laboral, manteniéndose igualmente el indicador en **cero (0)**.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 38 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral **INTERVENTORIA:** Anexo 38 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
3.3.6	Medición del ausentismo por causa medica	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Durante el período evaluado se presentaron un **(1) casos de ausentismo por causa médica**, los cuales fueron gestionados oportunamente y documentados en el marco del SG-SST. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Durante el período evaluado no se presentaron incapacidades médicas ni ausencias laborales relacionadas con enfermedad o accidente de trabajo, por lo cual el indicador de ausentismo por causa médica se mantiene en **cero (0%)**.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 39 Medición del ausentismo por causa medica **INTERVENTORIA:** Anexo 39 Medición del ausentismo por causa medica

4.1.1	Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista, a**plicó la **metodología del SG-SST** para identificar, evaluar y valorar los riesgos derivados de sus actividades, documentando los resultados en la matriz de riesgos y estableciendo las medidas de prevención y control correspondientes. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026,** la **Interventoría,** Se aplicó la metodología definida en el SG-SST, identificando los peligros en cada actividad, valorando la probabilidad y consecuencia, y priorizando los riesgos para su control.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 40 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos **INTERVENTORIA:** Anexo 40 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
4.1.2	. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, identificación de peligros se realizó de manera participativa, involucrando a los diferentes niveles de la empresa, lo que permitió un reconocimiento más completo de las condiciones de riesgo presentes.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 41 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa **INTERVENTORIA:** Anexo 41 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
	Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**clasificadas como carcinógenas ni con toxicidad aguda en las actividades desarrolladas, por	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 42 Identificación de sustancias carcinógenas o con toxicidad aguda **INTERVENTORIA:**

4.1.3		lo cual no se requiere control específico en este aspecto **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Durante la revisión no se encontraron sustancias clasificadas como carcinógenas ni con toxicidad aguda en las actividades desarrolladas, por lo cual no se requiere control específico en este aspecto.		Anexo 42 Identificación de sustancias carcinógenas o con toxicidad aguda
4.1.4	Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026** la **Interventoría**, no ejecuta directamente estas mediciones, pero se verifica que el contratista sea quien las programe y ejecute con personal competente cuando las condiciones de la obra lo requieran. Durante el periodo evaluado no se reportaron mediciones por parte del contratista.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 43 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos **INTERVENTORIA:** Anexo 43 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
4.2.1	Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Durante la revisión se constató que, a partir de los riesgos identificados en la obra, se aplicaron medidas de prevención y control orientadas a minimizar la exposición de los trabajadores. Estas acciones incluyeron la adopción de prácticas seguras y la disposición de elementos de protección personal según la actividad desarrollada.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 44 Implementación de medidas de prevención y control **INTERVENTORIA:** Anexo 44 Implementación de medidas de prevención y control

4.2.2	Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Se constató que los trabajadores aplican las medidas establecidas, reforzando el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Se realizó seguimiento a la aplicación de las medidas preventivas establecidas, evidenciando que los trabajadores cumplen con las disposiciones de seguridad y utilizan los elementos de protección personal asignados. No se reportaron incumplimientos durante el periodo evaluado.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 45 Verificación de la aplicación de medidas de prevención y control **INTERVENTORIA:** Anexo 45 Verificación de la aplicación de medidas de prevención y control
4.2.3	Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista** El contratista desarrolla y mantiene actualizados los documentos necesarios para la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando su aplicación y divulgación entre los trabajadores. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, En el periodo evaluado no se generaron nuevos procedimientos, instructivos, fichas o protocolos. Se mantienen vigentes los ya establecidos por el contratista, los cuales son verificados por la interventoría durante el desarrollo de las actividades.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 46 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos **INTERVENTORIA:** Anexo 46 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
	Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST.	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Se realizaron inspecciones a las instalaciones, maquinaria y equipos con la participación del COPASST, verificando condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dichas inspecciones aplican tanto al personal propio como al contratista, con el fin de identificar riesgos, establecer acciones correctivas y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos vigentes	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 47 Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos con participación del COPASST **INTERVENTORIA:** Anexo 47 Objetivos definidos, claros, revisados del SG-SST

4.2.4		**INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, realizó la inspección de instalaciones, maquinaria y equipos con la participación del vigía de SST, dado que no aplica la conformación de COPASST por el número de trabajadores**.**		
4.2.5	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** Se ejecutan actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el buen estado, funcionamiento seguro y continuidad operativa. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, No aplica, ya que corresponde a actividades que deben ejecutar los responsables de operación y mantenimiento de la empresa, fuera del alcance de la interventoría.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 48 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas **INTERVENTORIA:** Anexo 48 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas
4.2.6	Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** verifica la entrega y uso adecuado de los EPP a trabajadores, contratistas y subcontratistas, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría,** verifica la entrega y uso adecuado de los EPP a trabajadores, contratistas y subcontratistas, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 49 Entrega y verificación de Elementos de Protección Personal (EPP) **INTERVENTORIA:** Anexo 49 Entrega y verificación de Elementos de Protección Personal (EPP)

5.1.1	Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, dispone de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, diseñado para garantizar la protección de los trabajadores, la continuidad operativa y la atención oportuna frente a cualquier eventualidad	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 50 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias **INTERVENTORIA:** Anexo 50 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
5.1.2	Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, cuenta con una brigada de prevención conformada, capacitada y dotada, preparada para atender situaciones de emergencia de manera eficiente.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 51 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada **INTERVENTORIA:** Anexo 51 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
6.1.1	Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 52 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa **INTERVENTORIA:** Anexo 52 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la

		INTERVENTORIA: Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, Se realiza la definición de los indicadores del SG-SST conforme a las condiciones, necesidades y características propias de la empresa, permitiendo medir el cumplimiento de los objetivos, la eficacia de las acciones implementadas y la mejora continua del sistema		empresa
6.1.2	La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, adelanta auditorías internas del SG-SST por lo menos una vez al año, con el fin de verificar el cumplimiento normativo, la eficacia del sistema y la identificación de oportunidades de mejora	. No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 53 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año **INTERVENTORIA:** Anexo 53 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
6.1.3	Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, La alta dirección realiza la revisión anual del SG-SST, teniendo en cuenta los resultados de la auditoría, con el fin de evaluar el desempeño del sistema y definir acciones de mejora.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 54 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría **INTERVENTORIA:** Anexo 54 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría
	Planificaciones auditorias con el	**CONTRATISTA:**	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 55 Planificaciones auditorias con

6.1.4	COPASST	Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**La auditoría interna se programará al cumplir el primer año del SG-SST, conforme a la normatividad vigente. **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, El COPASST está conformado y en funcionamiento. La auditoría interna se programará al cumplir el primer año del SG-SST, conforme a la normatividad vigente.		el COPASST **INTERVENTORIA:** Anexo 55 Planificaciones auditorias con el COPASST
7.1.1	Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026, el Contratista,** no se alcanza a implementar para el periodo en mención. • Plan de acción: Para el próximo mes, se empezará a implementar en obra junto con su evidencia correspondiente **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, define acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST, orientadas a controlar los riesgos, corregir desviaciones y fortalecer la mejora continua del sistema.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 56 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST **INTERVENTORIA:** Anexo 56 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
7.1.2	Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** La alta dirección realizó la revisión inicial del SG-SST y definió acciones de mejora orientadas a fortalecer la documentación, consolidar el plan de capacitaciones y programar la primera auditoría interna al cumplir el año de implementación **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, establece acciones de mejora derivadas de la revisión de la alta dirección, con el propósito de optimizar el desempeño del SG-SST y asegurar su mejora	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 57 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección **INTERVENTORIA:** Anexo 57 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección

		continua.		
7.1.3	Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** En el periodo se presentaron dos accidentes laborales de carácter leve, los cuales fueron gestionados oportunamente con la ARL. Como acciones de mejora se reforzaron las medidas de prevención, la socialización de protocolos de seguridad y el seguimiento a las condiciones de trabajo**.** **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, define e implementa acciones de mejora con base en los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, orientadas a prevenir la recurrencia y fortalecer la gestión en seguridad y salud en el trabajo.	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 58 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales **INTERVENTORIA:** Anexo 58 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
7.1.4	Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	**CONTRATISTA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, **el Contratista,** elaboró el plan de mejoramiento con base en las observaciones de la ARL y la revisión interna. Se implementaron medidas correctivas enfocadas en fortalecer la prevención de accidentes, mejorar la documentación del SG-SST y reforzar la capacitación del personal**.** **INTERVENTORIA:** Durante el periodo del **13 al 31 de enero 2026**, la **Interventoría**, elabora el Plan de Mejoramiento e implementa las medidas y acciones correctivas solicitadas por las autoridades competentes y la ARL, garantizando el cumplimiento normativo y la mejora del SG-SST	No aplica	**CONTRATISTA:** Anexo 59 Plan de mejoramiento y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL **INTERVENTORIA:** Anexo 59 Plan de mejoramiento y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL

3.2.2. ROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (CONTRATISTA DE OBRA)

Para hacerle seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo – SST, es necesario diligenciar los siguientes formatos:

VERIFICACIÓN MENSUAL
REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

N° del contrato:	**INV002-2025**	**Empresa Contratista:**	**Consorcio Obra san francisco**
Objeto de contrato:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA		
Nombre del responsable:	EDILBERTO DE JESUS LOPEZ CORREA		
Fecha de verificación:	13/01/2026 AL 31/01/2026	**N° Licencia en SST:**	


Verificación previa ingreso del trabajador	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**	**PLAN DE ACCION (Cuando no cumple)**			
	SI= 5 - 3	**NO= 0**	**NA= 5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**SEGUIMIENTO**
El contratista tiene afilados al Sistema de Seguridad Social, en la clase de riesgo que corresponda a todos sus trabajadores. (Se debe verificar el pago por el periodo trabajado)	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
El personal cuenta con inducción en SST, para el contrato especifico (Según las normas y entrenamiento para el oficio). Y la respectiva evaluación.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Se cuenta con examen médico de ingreso, periódico para el cargo a ocupar realizado por un profesional competente.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA

Cuando deba ejecutar tareas de alto riesgo Alturas, se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio. En caso de actividades de alturas se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Soldadura, Espacios Confinados, Eléctricos) se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. En caso de actividades de espacios confinados se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Solicitar registro de entrega de EPP. Se evidencia entrega y Uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar (Ficha técnica del fabricante o proveedor).	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Cuenta con contrato laboral y fotocopia de la cédula. Nota: No se permitirá la subcontratación a través de cooperativas, empresas temporales, o personas naturales	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Verificación de ejecución del contrato								
Realiza oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, define y monitorea los planes de acción			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
Cuenta con personal formado en SST según las especificaciones del contrato y la resolución 0312 de 2019.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Matriz de Peligros actualizada que identifique los peligros y riesgos relacionados con la tarea a realizar, su valoración y control implementado.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA

Realiza seguimiento al cronograma o plan anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo (debe incluir actividades de control para los riesgos prioritarios) y encontrarse acorde y aplicable para las actividades desarrolladas en el contrato)	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y este se encuentra publicado en lugares visibles en donde los trabajadores lo identifiquen fácilmente en la obra.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Se consolidan indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra. Se realiza el análisis estadístico.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
Se cuenta con control adecuado de vehículos que ingresan a la obra (Seguridad social, soat, licencias de operación según aplique)	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Asiste a las actividades convocadas por la alcaldía en el tema de SST.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Los frentes de Obra cuentan orden y aseo de manera adecuada	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
El programa de inspecciones de seguridad definido según los riesgos prioritarios (Maquinas, herramientas, materiales, equipos, instalaciones locativas, equipo de protección personal), se define e implementa en la obra.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
El programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos que se usan en desarrollo del contrato se implementa de manera adecuada.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Están señalizados y rotulados los recipientes que contienen sustancias o productos químicos incluyendo los envases donde se realicen transvases y se tiene establecido e identificar un sitio de almacenamiento seguro para los mismos.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Si requiere el uso de sustancias químicas, deberá Mantener disponibles las Fichas Técnicas u Hojas de Seguridad de las Sustancias o Productos Químicos. Y el respectivo registro de uso y manipulación.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA

Las condiciones de seguridad para el almacenamiento de líquidos inflamables (gasolina y ACPM), es suficiente y adecuado y cuanta con la matriz de compatibilidad.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
El plan de emergencia para el proyecto cumple con lo requerido (se evidencia la capacitación de la brigada, procedimientos en caso de emergencia, señalización adecuada, etc.)	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Se tiene el registro de la socialización al personal del plan de emergencia	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Las conexiones eléctricas, cuenten con protección y están debidamente instaladas.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Cuentan con botiquín de primeros auxilios dotado de acuerdo con los riesgos y la cantidad adecuada.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
En la obra el contratista tiene el control de los extintores y están ubicados estratégicamente de acuerdo con la obra.	**5**			NA	NA	NA	NA	NA
Tareas de Alto Riesgo - Tareas críticas								
Existen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o críticas, identificadas, visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias, firmados. Se cuenta con el registro del personal según actividad a realizar.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
Cuenta con la capacitación, entrenamiento y certificación de las personas que realizan tareas de alto riesgo: Para trabajos en alturas y espacios confinados capacitación y concepto de aptitud médica según Resolución 1409 de 2012.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
Los equipos y EPP para las tareas de alto riesgo están certificados y cumplen con lo establecido en la Norma. Realizan inspecciones.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
Cuenta con el programa de protección contra caídas y lo implementa.				NA	NA	NA	NA	NA
Los andamios o estructuras para trabajar en alturas estén en perfecto estado de seguridad; anclados sobre una superficie sólida y segura y que estén certificados.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA
Actividades post retiro de personal								

Cuentan con paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.			**5**	NA	NA	NA	NA	NA

Puntaje Obtenido			***0***			
PUNTAJE FINAL	**155**	**PTOS**	**PORCENTAJE FINAL**	**100,00%**	**%**	**CONVENCIONES** > 80%OPTIMO ENTRE 50-80 % MEDIO < 50% NO CUMPLE
Nombre del Interventor			**Nombre del Contratista o Responsable Jennifer Julieth Presiga**			
cc **firma**			**cc** **1.128.407.715** **firma** 			
Fecha: 31/01/2026						

3.2.3. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (INTERVENTORÍA DE OBRA)

- Dentro del alcance del proyecto se contemplan tareas catalogadas como alto riesgo, tales como trabajo en alturas, soldadura y labores en espacios confinados. Hasta la fecha, únicamente se ha ejecutado trabajo de soldadura, para el cual se han implementado los controles respectivos. Las demás actividades de alto riesgo aún no se han iniciado, por lo tanto, sus controles se aplicarán conforme se programe su ejecución
-
- Ya se cuenta con el registro de entrega y uso de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para las tareas a ejecutar, garantizando que cada trabajador dispone del equipo adecuado y lo utiliza correctamente en el desarrollo de sus actividades
- A la fecha no se ha presentado ningún evento de este tipo, por lo tanto, no se requiere anexar reportes.
- A la fecha no se ha presentado ningún evento de este tipo, por lo tanto, no se requiere anexar reportes
- En este periodo no se presentaron ni accidentes ni incidentes de trabajo en el proyecto

4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA:

4.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Cuadro que dé cuenta del personal de la obra, las novedades laborales presentadas durante el mes y la verificación del estado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral; con los análisis, observaciones y conclusiones de la interventoría.

Periodo de Cotización	N° Planilla	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
agosto	79460835	RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO	Director de obra	45%
agosto	79460835	DARWIN ARIEL FERNANDEZ TENJO	Ingeniero o arquitecto Residente de obra	100%
agosto	79460835	JENNIFER YULIETH PRESIGA JARAMILLO	Profesional SST	90%
agosto	79460835	JOSE ALBERTO DIAZ AGRESOTT	Contador Publico	45%
agosto	79460835	JUAN PABLO SEGURA MEZA	Tecnólogo en construcciones civiles	80%
agosto	794608 35	EDWIN NORBEY GALLEGO HENAO	Almacenista	100%
agosto	79460835	FREIDER AUGUSTO AGUDELO	Celador	100%
agosto	79460835	LYZ MARLYN CIRO MEJIA	Auxiliar SST	45%

FO-G-006_Personal_Biodata_V1

4.2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

Durante este periodo el contratista no a presentado los contratos de las actividades subcontratadas.

4.3. INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

Para el próximo informe el contratista entrega la documentación de la materialización de riesgos previsibles en obra.

4.4. CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

Descripción	Fechas
Acta de reunión n°1	10-07-2025
Acta de reunión n°2	18-07-2025
Acta de reunión n°3	25-07-2025
Acta de reunión n°4	31-07-2025
Acta de reunión n°5	12-08-2025
Acta de reunión n°6	28-08-2025
Acta de reunión n°7	19-09-2025
Acta de reunión n°8	26-09-2025
Acta de reunión n°9	03-10-2025
Acta de reunión n°10	10-10-2025

.
(Se adjuntan como anexos copia legible de las actas).

4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

Descripción	Radicado
Canales de comunicación	ESE_HOSPITAL–INTER_SF–2025-0000
Solicitud de información	ESE_HOSPITAL–INTER_SF–2025-0001
Solicitud de información	ESE_HOSPITAL–INTER_SF–2025-0002
Autorización cambio profesional residente interventoría.	ESE_HOSPITAL–INTER_SF–2025-0003
Citación a reunión.	ESE_HOSPITAL–INTER_SF–2025-0005

(ver anexo).

4.6. COPIA DE LA BITÁCORA:
Ver anexo.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:
Durante este periodo el contratista presento un acta parcial #3 de obra por él 82,79%**.**

5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:
El contrato de obra no aplica anticipo.

5.3. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA:
El contrato de obra no aplica anticipo.

5.4. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

Las retenciones que le aplican al contratista de obra en el pago del acta parcial #1,#2 y #3 son: Retención en la fuente a título de renta por obra, Retención en la fuente a título de estampilla prohospital, Retención en la fuente a título de contribución especial de obra, Retención en la fuente a título de ICA (actividad RUT 4112).

5.5. RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

Durante este periodo no se ha presentado imprevistos que atrasen la ejecución del proyecto

6. INFORME JURÍDICO:

6.1. RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

Durante este periodo no el contratista no presenta ninguna reclamación legal.

6.2. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

Cuadros que dan cuenta de las condiciones iniciales y el estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad, relacionadas con la ejecución del contrato de obra.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**	
SEGURO DEL ESTADO S.A NIT:860.009.578-6	53-44-101039452	Cumplimiento	20/06/2025	20/05/2026	$598.008.271,10
		Calidad del servicio	20/06/2025	20/05/2026	$598.008.271,10
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/06/2025	20/05/2026	$598.008.271,10
		Estabilidad y calidad de la obra	20/06/2025	20/05/2026	$598.008.271,10
		Prestaciones sociales	20/06/2025	20/01/2029	$299.004.135,55

POLIZA DE RCE					
Nombre Aseguradora	**No Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**	
SEGURO DEL ESTADO S.A NIT:860.009.578-6	53-44-101039452	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		GASTOS MEDICOS	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/06/2025	20/05/2025	$299.004.135,55

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:

	
Aplicación de estuco en muros	Instalaciones de estructura cielo falso
	
Pulida piso en granito	Instalación bomba de vacío

	
Aplicación de pintura en muros	Aplicación de estuco en muros


8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

- Durante el mes evaluado, el contratista ejecutó las actividades programadas con un avance físico aproximado del 87,85%, acorde con lo establecido en el cronograma de obra y cumpliendo en gran medida con las metas programadas.
- Los procesos constructivos ejecutados cumplen con las especificaciones técnicas y normativas aplicables, evidenciándose un control de calidad adecuado en materiales, procedimientos y acabados.
- La gestión administrativa y documental del contrato se encuentra actualizada, lo que garantiza la trazabilidad de las actividades realizadas.
- Se mantiene un adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, sin registrarse incidentes de gravedad.
- Los retrasos menores identificados corresponden principalmente a que se inició actividades de obra una semana después de la firma de acta de inicio lo cual no representa, hasta la fecha, un riesgo significativo para el cumplimiento del plazo contractual.
- La relación entre contratista, interventoría y supervisor del contrato ha sido fluida, permitiendo resolver de manera oportuna las situaciones presentadas.


Atentamente,



ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ
Director de Interventor
Fecha de elaboración:31-01-2026



JOSE MANUEL BARROZO ALMANZA
Residente Interventor
Fecha de elaboración:31-01-2026



PLUTARCO GARCIA VALENCIA.
Residente sst Interventor
Fecha de elaboración:31-01-2026

9. ANEXOS
