	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 0159-2023
LP-006-2023
LP-MSBV-008-2023

Contratista: CONSORCIO PROVIDENCIA
CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA
CONSORCIO L&S

Contrato de Interventoría No. 5053-2023

Interventoría: CONSORCIO INGECON-INCO

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INFORME MENSUAL No. 20

MES O PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3490 de fecha 08 DE AGOSTO 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Resumen mensual Estado General del Proyecto – MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 159-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2025

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 14.100.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 14.100.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 5.287.335.876,80
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 3.920.927.313,60

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	M	4.980
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box culvert - Alcantarillas	UD	16

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	M	385,85	4886,65
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box culvert - Alcantarillas	UD	0	2

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 13.218.339.697,00		$ 13.218.339.697,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 84.516.798,00		$ 84.516.798,00
BOLSA DE AJUSTE	$ 528.733.588,00		$ 528.733.588,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 67.230.000,00	$ 12.773.700,00	$ 80.003.700,00
PAGA	$ 56.222.821,00		$ 56.222.821,00
PMT	$ 132.183.396,00		$ 132.183.396,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.087.226.300,00	$ 12.773.700,00	$ 14.100.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 567.608.013,00	$ -	$ 567.608.013,00	$ 11.805.467.565,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 567.608.013,00	$ -	$ 567.608.013,00	$ 11.805.467.565,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 13.218.339.697,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 11.805.467.565,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 89,31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 34

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado con bermacunetas. Abscisa K5+080.



Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado con bermacunetas. Abscisa K5+290.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST Y AMBIENTAL

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.20

CONSORCIO INGECON-INCO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DEL 2023

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
VICENTE URZOLA BADEL **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**ANGELA DAVILA MORALES** **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**LUIS GONZALEZ OZUNA** **SUPERVISOR INVIAS TERRITORIAL CÓRDOBA**

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN. 6

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 8

2.1 LOCALIZACIÓN. 9

2.2 Inventario y estado inicial de la vía. 12

2.3 Características técnicas del proyecto. 15

2.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA 20

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 21

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 24

3.2.1 MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023: 24

3.2.2 MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023: 32

3.2.3 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023: 33

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 33

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA 34

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL 38

4.1 Informe semanal - MEPI-MN1-IN-15-FR-3. 38

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 39

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 40

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-8 41

4.5 Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10. 42

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 43

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12..... 44

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-1445

4.9 Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2 46

4.10 Seguimiento al Programa de inversiones - MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 47

4.11 Actas de comité de obra - MEPI-MN-IN-14-FR-1 y MEPI-MN-IN-14-FR-2 48

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 49

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 49

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 50

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES. 55

5.3.1 INFORMES ESPECIALISTAS. 55

5.3.2 INFORMES PROFESIONALES. 56

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 57

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 58

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA..... 64

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 65

6.1 Equipo y vehiculos contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-5. 65

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7. 66

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9. 67

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13..... 68

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15..... 69

6.6 Otros documentos de seguimiento mensual:..... 70

- Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. 70
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado - MEPI-MN-IN-9-FR-2. 71
- Seguimiento al Plan de Cargas - MEPI-MN-IN-9-FR-3. 72

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 73

8 ANEXOS. 78

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 78

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 80

8.3 BITACORA DE OBRA. 83

1 INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa – "COLOMBIA RURAL", por lo cual, suscribieron el convenio No. 2286 de 2023 con el municipio de Planeta Rica con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", el convenio No. 2217 de 2023 con el municipio de los Córdoba con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", y el convenio No. 2222 de 2023 con el municipio de San Bernardo Del Viento con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", todos con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2023, luego se realizaron las prórroga #1 hasta el 31 de diciembre de 2024 y posteriormente se realizaron las prorroga #2 hasta 31 de diciembre de 2025, los cuales buscan realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad.

Por su parte, los municipios adelantaron los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública de las obras consistentes en el AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, LOS CORDOBA Y SAN BERNARDO DEL VIENTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL, los contratos derivados de cada uno de los convenios antes mencionados, a continuación, se relaciona la información general de los contratos.

ENTIDAD CONTRATANTE	No. DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
MUNICIPIO PLANETA RICA	159-223	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO	$14.100.000.000

		ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA	LP-006-2023	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$6.140.057.707
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	LP-MSBV-008-2023	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$2.115.723.321

Por parte del Instituto Nacional de Vías, mediante resolución 4606 del 15 de diciembre del 2023, se adjudicó el contrato No. 5053-2023 al CONSORCIO INGECON – INCO, representada legalmente por ANGELA MARIA DAVILA MORALES, para ejecutar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

La cual realizará la Interventoría siguiendo los parámetros técnicos establecidos en el manual de interventoría versión 2022 y los documentos contractuales.

La orden para el inicio de la interventoría fue dada por el INVÍAS, mediante Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085, de fecha 28 de diciembre de 2023, el plazo inicial es hasta el 31 de diciembre de 2023, se realizó una prórroga #1 hasta el 31 de diciembre de 2024, se realizó prorroga #2 hasta 31 de julio de 2025 y posteriormente se realizó prorroga #3 hasta 31 de octubre de 2025.

El proyecto se desarrolla en la Jurisdicción de la territorial Córdoba, entidad que ejerce la supervisión al contrato de interventoría a traves del ingeniero Luis

Gonzalez Ozuna, y el gestor técnico para el proyecto el ingeniero Luis Guillermo Torres Hernandez.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto en ejecución es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1" para el cumplimiento de las obras en los siguientes municipios, de acuerdo a lo descrito en cada uno de los anexos técnicos de obra:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023**: La vía de Planeta Rica - Providencia, ubicada en el departamento de Córdoba, el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, en la zona rural del municipio de Planeta Rica, que busca optimizar la transitabilidad de la población, con un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto de piezas prefabricadas, colocación de afirmado material para mejoramiento, instalación de señales verticales de tránsito y línea de demarcación con pintura en frio, construcción de obras hidráulicas como son 10 Box Coulvert de 1,00mX1,00mX8m y 6 boxculvert de 2,00mX2,00mX8m.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**: La vía que comunica de Barranquillita con la vereda El Mango, en la zona rural del municipio de los Córdoba, a través de la construcción de un pavimento rígido con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1.421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berma-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto. Construcción de obras hidráulicas: 6 box coulvert de 1,00mX1,00m y L= 6m. De igual manera, se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frio. El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero Fy= 4200 MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**: La construcción de la vía que conduce desde la intersección de la vía que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento - Moñitos y que es una de los principales corredores ecoturísticos de municipio, esto debido a que es un sector de playas que a su vez es muy apetecido por los turistas y comercial del municipio. El proyecto consta de 780m, en concreto rígido, lo que permitiría tener una superficie de rodadura de buena calidad en todas las épocas del año, además de que es una solución real a las problemáticas de movilidad de la población y sus costos de mantenimientos serían muy bajos a largo plazo.

2.1 LOCALIZACIÓN.

La ejecución de los proyectos se realizará en el departamento de Córdoba, el cual está situado en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al este con los departamentos de Sucre y Bolívar, y al sur y oeste con el departamento de Antioquia, el área de influencia directa de los proyectos está en los municipios de Planeta Rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento:



Imagen 1. Localización de los municipios a intervenir con los proyectos dentro del departamento de Córdoba

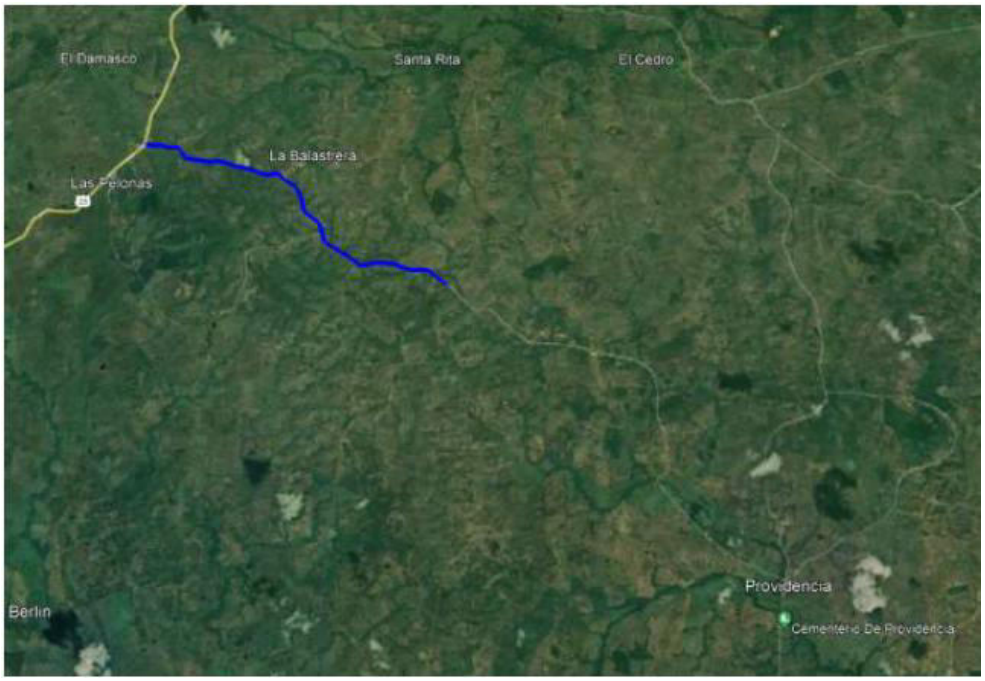


Imagen 2. Localización del tramo a intervenir en el municipio de Planeta Rica departamento de Córdoba

VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA			
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COORDENADAS	
		N	W
INICIO	K0+000	8°26´52´´	75°30´32´´
FIN	K5+064	8°25´32´´	75°28´32´´
ALCANTARILLA TRIPLE	K3+540	8°25´57´´	75°29´12´´
BOXCULVERT 2x1	K3+610	8°25´56´´	75°29´10´´
BOXCULVERT 2x1.5	K3+920	8°25´54´´	75°29´01´´
CONSTRUIR ALETA Y MURO	K4+190	8°25´50´´	75°28´53´´



Imagen 3. Localización del tramo a intervenir en el municipio de Los Córdoba departamento de Córdoba

VIA LOS CORDOBA - BARRANQUILLITA			
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COORDENADAS	
		N	W
INICIO - TRAMO 1	K0+000	8°52´35´´	76°20´35´´
FIN - TRAMO 1	K2+325.3	8°51´26´´	76°20´25´´
BOXCULVERT 2x1	K0+990	8°52´21´´	76°20´29´´
BOXCULVERT 2x1	K1+720	8°51´46´´	76°20´27´´
BOXCULVERT 2x1	K2+207	8°51´30´´	76°20´26.12´´
INICIO - TRAMO 2	k2+680	8°51´15´´	76°20´26´´
FIN - TRAMO 2	K3+040	8°51´4.57´´	76°20´27.39´´



Imagen 4. Localización del tramo a intervenir en el municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba

VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO - RIMINI			
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COORDENADAS	
		N	W
INICIO	K0+000	9°20´09´´	76°03´33´´
FIN	K0+680	9°20´26´´	76°03´42´´
BOXCULVERT 1.5x1.5 DOBLE	K0+685	9°20´26´´	76°03´42´´

2.2 Inventario y estado inicial de la vía.

A continuación, se describe el inventario y estado inicial de las vías objeto de los proyectos en cada uno de los Municipios:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023**: La vía rural que comunica de Planeta Rica - Providencia, ubicada en el departamento de Córdoba "*se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura. Los productores no cuentan con vías óptimas para transportar sus productos al casco rural del Municipio y demás veredas circunvecinas. La longitud total de la vía a intervenir en pavimento rígido suma 4980 metros.*"

	
Estado inicial. Abscisa K0+090.	Estado actual. Abscisa K0+090.
	
Estado inicial. Abscisa K1+000.	Estado actual. Abscisa K1+000.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**: La vía a intervenir que comunica a la vereda Barranquillita con la vereda El Mango del municipio Los Córdoba, "*se caracteriza por presentar una topografía ondulada, se encuentra en afirmado y en mal estado lo que afecta de manera directa la transitabilidad vehicular. Dicho tramo vial cuenta una considerable presencia de baches, lodo, desgaste de la capa de rodadura y se evidencia la ausencia de estructuras superficiales de captación y recolección de aguas lluvias. En virtud de lo anterior, los productores de esa región, no cuentan con vías óptimas para transportar sus productos al casco rural del Municipio y demás veredas circunvecinas*."

	
Estado inicial. Abscisa K0+000	Estado actual. Abscisa K0+000 (Inicio)

	
Estado inicial. Abscisa K2+322	Estado actual. Abscisa K2+322

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**: La vía que conduce desde la intersección que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento – Moñitos, "*la infraestructura vial actual es deficiente, dado que a pesar de que se encuentra en afirmado este se encuentra deteriorado en todos los 780 metros lo que obliga a invertir varias veces recursos al año para su mantenimiento, adicionalmente, en verano genera gran cantidad de material particulado lo que afecta la salud de las poblaciones cercanas además del sector hotelero.*"

	
Estado inicial. Abscisa K0+000	Estado actual. Abscisa K0+000

	
Estado inicial. Abscisa K0+360	Estado actual. Abscisa K0+360

2.3 Características técnicas del proyecto.

Las obras objeto de esta interventoría se ejecutan en los municipios de Planeta Rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, estos proyectos cuentan con una etapa de revisión y/o ajustes a los diseños iniciales, la cual deberá ser realizada por los especialistas de cada contratista. Una vez entregados los diseños definitivos, estos fueron aprobados parcialmente por la interventoría, dando inicio a la ejecución de actividades físicas de los proyectos, en ciertos tramos definidos.

- **Objeto y alcance.**

El objeto de los contratos de obra es:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

  Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". Cuyo alcance comprende;


  ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)


  ETAPA 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.


El presente proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento de la vía planeta rica – providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la granjita hasta el corregimiento de Providencia, en la zona rural del municipio de Planeta Rica, que busca optimizar la transitabilidad de la población, con un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.

Construcción de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construcción de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

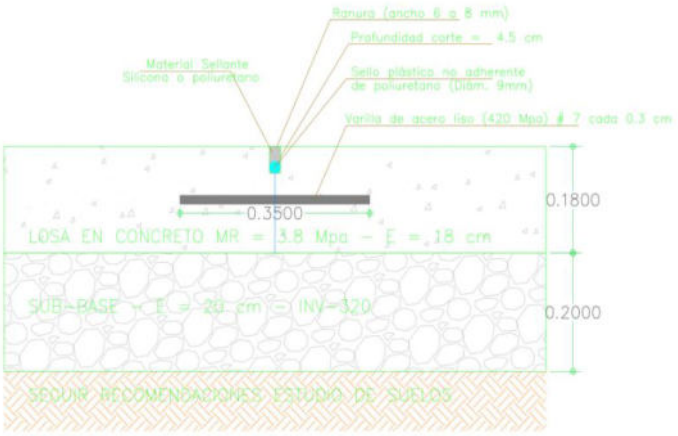

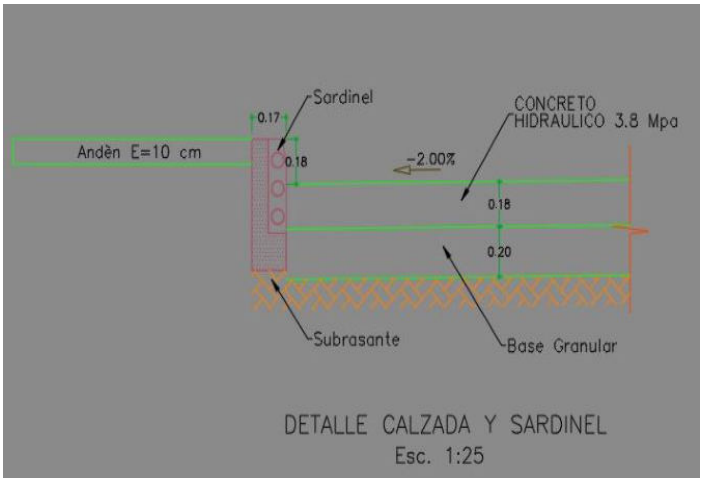

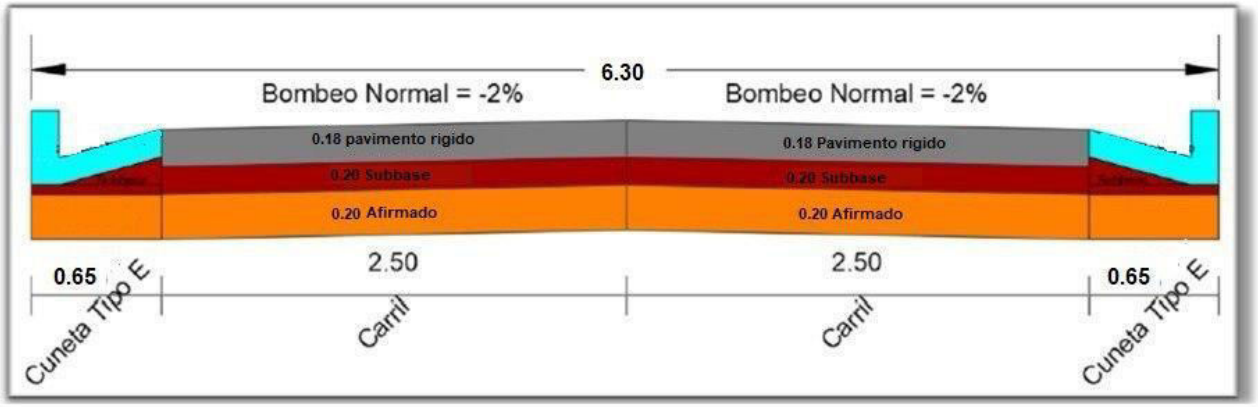

- **Alcance físico actual – Contrato de obra No.159-2023:**

Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde se intervendrán 5080 ml de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0,18 m, incluye bermacunetas. Solo se intervendrán 3 obras hidráulicas: 1 box coulvert de 2.0 m x 1.0 m, 2.0 m x 1.5m, 3.0 m x 3.0 m y L = 6 m. Demarcación horizontal a lo largo de todo el pavimento rígido intervenido y la instalación de 96 señales verticales a lo largo del tramo construido, instalación de filtro francés, muro de contención,

reconstrucción de aletas y mantenimiento en dos obras de arte existentes, incluyendo obras complementarias y de protección.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

  Objeto: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DELOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Cuyo alcance comprende:

  ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

  ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

  El presente proyecto consiste en el "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", y busca facilitar la movilidad vehicular y el adecuado desplazamiento de las escorrentías superficiales en la vía que comunica a Barranquillita con la vereda El Mango, en la zona rural del municipio de Los Córdoba a través de la construcción de un pavimento con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1.421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berma-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto.


  Construcción de obras hidráulicas: 6 box coulvert de 1.00 m x 1.00m y L= 6m.

  De igual manera se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frio.

  El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero Fy= 4200 MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO



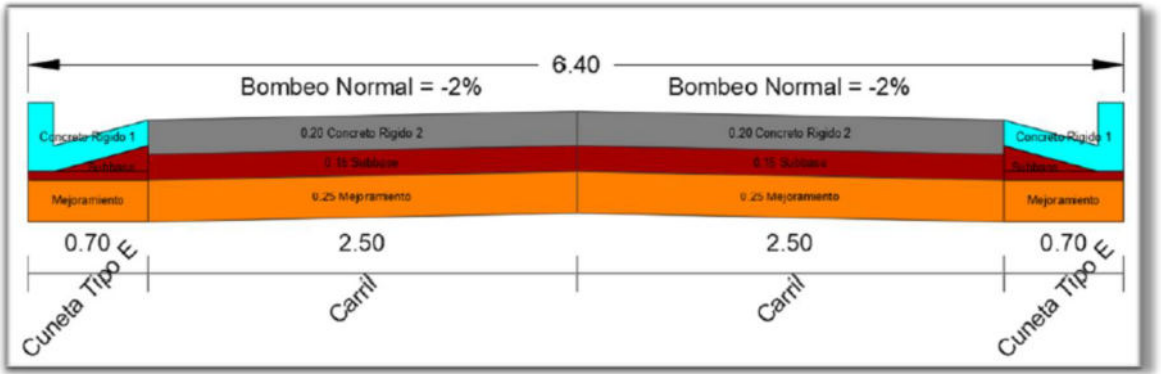

Alcance físico actual – Contrato de obra No. LP-006-2023:

Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde no se ejecutarán las cantidades de la construcción de un muro de contención, y se interviene de 2685 ml de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0,20 m, incluye cuneta y bordillo. Solo se intervinieron 3 obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2.00 m x 1.00 m y L = 6.5 m. Instalación de 15.6ml de barandas metálicas en las obras de arte intervenidas, Demarcación horizontal a lo largo de todo el pavimento rígido intervenido y la instalación de 52 señales verticales a lo largo del tramo construido, incluyendo obras complementarias y de protección.

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

  Objeto*: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL.* Cuyo alcance comprende:


  ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS


  ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

El proyecto consta de 780 ml en concreto rígido, lo que permitiría tener una superficie de rodadura de buena calidad en todas las épocas del año, además de que es una solución real a las problemáticas de movilidad de la población y sus costos de mantenimientos serían muy bajos a largo plazo.

Construcción de obras hidráulicas: 1 box coulvert de 1.50 m x 1.50m doble y L= 8m.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

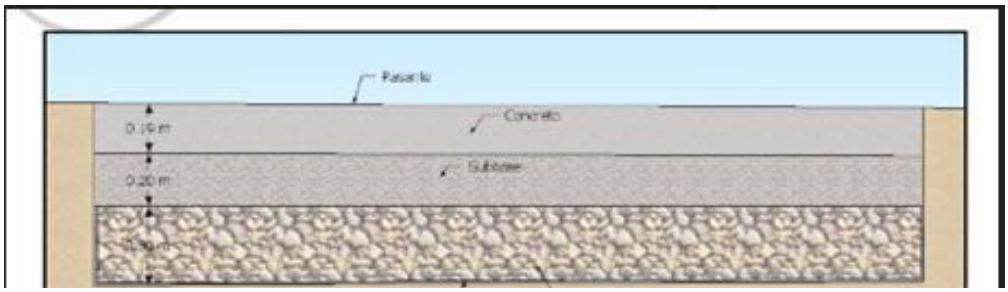

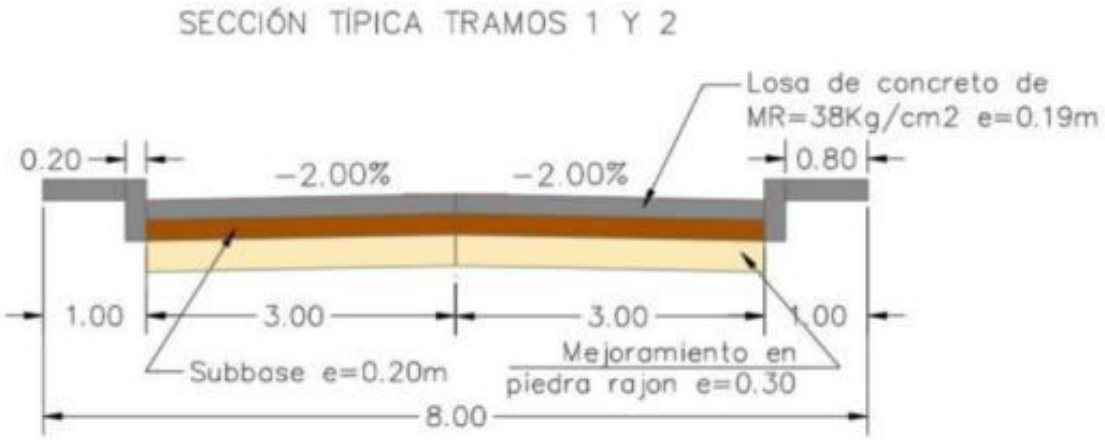

Lo anterior apegado a la norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Instituto de Norma Técnicas ICONTEC.
- American Society for Testing and Materials ASTM.
- American Concrete Institute ACI.
- Portland Cement Association PCA.

Alcance físico actual – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023:

Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde se interviene 687.7 ml de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0,19 m,

incluye bordillo. Solo se intervino 1 obras hidráulicas: 1 box coulvert de 1.50 m x 1.50 m doble y L = 6.0 m. Demarcación horizontal a lo largo de todo el pavimento rígido intervenido, la instalación de 22 señales verticales a lo largo del tramo construido y la instalación de filtro francés, incluyendo obras complementarias y de protección.

2.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA

La firma de los CONTRATISTAS DE OBRA está compuesta de la siguiente manera:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023		
CONSORCIO PROVIDENCIA		
INTEGRANTES	**%**	**ORIGEN**
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO	5%	COLOMBIA
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	85%	COLOMBIA
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	COLOMBIA

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023		
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
INTEGRANTES	**%**	**ORIGEN**
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN	10%	COLOMBIA
E INGCARQ S.A.S	90%	COLOMBIA

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023		
CONSORCIO L&S		
INTEGRANTES	**%**	**ORIGEN**
LA COMERCIALA S.A.S	50%	COLOMBIA
SIS ORGANIZATION S.A.S	50%	COLOMBIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

Tabla 4 INFORMACION CONTRATO DE OBRA 0159-2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIDENCIA**	**NIT:**	**901.764.629 - 9**
INTEGRANTES (CONSORCIO):	**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%**		
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**		
FECHA DE INICIO:	**28 de diciembre de 2023.**	**No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:**	**Acta No.1**
VALOR INICIAL:	**$ 14.100.000.000,00**		
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**		
ADICIÓN 1:	**$ 0,00**		
ADICIÓN NN:	**$ 0,00**		
VALOR ACTUAL:	**$ 14.100.000.000,00**		
ANTICIPO	**40% de la etapa 2 del contrato**		
ANTICIPO OTORGADO:	**$ 5.287.335.878,80**		
ANTICIPO AMORTIZADO:	**$2.262.849.290,4**		
SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 3.024.486.588,56**		
PLAZO INICIAL:	**Hasta 31 de diciembre de 2023**		
TOTAL, PRÓRROGAS:	**1 (uno)**		
PRÓRROGA 1:	**Hasta 20 de diciembre de 2024**		
PRÓRROGA 2:	**Hasta 31 de diciembre de 2024**		

PRÓRROGA 3:	**Hasta 20 de julio de 2025**
PRÓRROGA 4:	**Hasta 31 de octubre de 2025**
SUSPENSIÓN 1:	**29/12/2023**
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	**29/01/2024**
REINICIO 1:	**01/02/2024**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**31 de octubre de 2025**

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

Tabla 5. INFORMACION CONTRATO DE OBRA LP-006-2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA**	**NIT:**	**901.168.925 - 2**
INTEGRANTES (CONSORCIO):	**MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10% INGCARQ S.A.S 90%**		
OBJETO:	**MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**		
FECHA DE INICIO:	**29 de diciembre de 2023.**	**No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:**	**Acta No.1**
VALOR INICIAL:	**$ 6.140.057.707,00**		
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**		
ADICIÓN 1:	**$ 0,00**		
ADICIÓN NN:	**$ 0,00**		
VALOR ACTUAL:	**$ 6.140.057.707,00**		
ANTICIPO	**30% del contrato**		
ANTICIPO OTORGADO:	**$ 1.842.017.312,10**		
ANTICIPO AMORTIZADO:	**$ 1.842.017.312,10**		
SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 0,00**		
PLAZO INICIAL:	**Hasta 31 de diciembre de 2023**		
TOTAL, PRÓRROGAS:	**1 (uno)**		
PRÓRROGA 1:	**Hasta 30 de noviembre de 2024**		
PRÓRROGA 2:	**Hasta 20 de diciembre de 2024**		
PRÓRROGA 3:	**Hasta 31 de diciembre de 2024**		
PRÓRROGA 4:	**Hasta 31 de mayo de 2025**		
SUSPENSIÓN 1:	**29/12/2023**		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	**29/01/2024**		
REINICIO 1:	**01/02/2024**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**31 de mayo de 2025**		

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

Tabla 6. INFORMACION CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO L&S**	**NIT:**	**901.765.372 - 6**
INTEGRANTES (CONSORCIO):	**LA COMERCIALA S.A.S 50% SIS ORGANIZATION S.A.S 50%**		
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**		
FECHA DE INICIO:	**28 de diciembre de 2023.**	**No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:**	**Acta No.1**
VALOR INICIAL:	**$ 2.115.723.321,00**		
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**		
ADICIÓN 1:	**$ 0,00**		
ADICIÓN NN:	**$ 0,00**		
VALOR ACTUAL:	**$ 2.115.723.321,00**		
ANTICIPO	**30% del valor básico del contrato**		
ANTICIPO OTORGADO:	**$ 634.716.996,30**		
ANTICIPO AMORTIZADO:	**$164.899.083,30**		
SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 469.817.913,00**		
PLAZO INICIAL:	**Hasta 31 de diciembre de 2023**		
TOTAL, PRÓRROGAS:	**04**		
PRÓRROGA 1:	**Hasta 27 de octubre de 2024**		
PRÓRROGA 2:	**Hasta 20 de diciembre de 2024**		
PRÓRROGA 3:	**Hasta 31 de diciembre de 2024**		
PRÓRROGA 4:	**Hasta 28 de febrero de 2025**		
PRÓRROGA 5:	**Hasta 30 de abril de 2025**		
PRÓRROGA 6:	**Hasta 31 de mayo de 2025**		
SUSPENSIÓN 1:	**29/12/2023**		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	**29/01/2024**		
REINICIO 1:	**01/02/2024**		
SUSPENSIÓN 2:	**16/03/2024**		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	**16/04/2024**		
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	**01/05/2024**		
REINICIO 2:	**14/05/2024**		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**27 de julio de 2024**		

FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	**31 de mayo de 2025**

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

A fecha del corte del presente informe se realizaron las siguientes actividades para cada uno de los contratos:

3.2.1 MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:

- **SEMANA No.83: del 29/08/2025 al 04/09/2025**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo:

- El dia 30 de agosto 2025 se presentaron lluvias a partir de 2:00 a.m. a 5:00 a.m.

- El dia 01 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 10:00 p.m. a 12:00 a.m.

- El dia 02 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.

- El dia 03 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 4:00 a.m. a 6:00 a.m.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta k4+200 y desde k5+050 a k5+850.

• Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

• Se realiza acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera jomeve en cienaga de oro.

• Se realiza acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

• La interventoría realiza chequeo topográfico para verificar niveles y volúmenes de subbase granular.

• Para la intervención y construcción del pavimento rígido mr38 (tramo II) se realizan las siguientes actividades:
Se realiza colocación de rieles desde la abscisa k5+200 a k5+620 (carril derecho).
Se realiza chequeo y verificación de rieles para garantizar bombeo transversal y longitudinal del pavimento rígido a construir.
Se realiza replanteo para respetar la modulación de las losas y se localiza con topografía las juntas en los tramos curvos para garantizar la deflexión.
Se verifican ancho y espesores para el pavimento rígido a construir a lo largo del tramo desde la abscisa k5+200 a k5+620 (carril derecho).
Se verifica dimensiones de las canastillas garantizando ancho para dovelas con longitud de 35cm, separación centro a centro de 30 cm y altura de ubicación de dovela de 9cm.
Se verifican dovelas de 1" con una longitud de 35cm.
Se verifica acero longitudinal de ½" con una longitud de 85cm espaciados cada 1,2cm.
Se realiza fundida de pavimento rígido mr-38 premezclado, desde la abscisa k5+200 a k5+620 (carril derecho).
Se realiza prueba slump en obra para verificar asentamiento del concreto.
Se toman muestras de concreto (viguetas) para ensayos de resistencia.
Se realiza vibrado del concreto a lo largo de los tramos fundidos.
Se realiza texturizado y acabado final de las losas de concreto.
Se aplicó antisol a lo largo del tramo de pavimento rígido construido.
Se realiza corte cada 3m en las juntas de dilatación del tramo de pavimento rígido mr38 construido.
Se realiza limpieza y sello de la junta de dilatación del pavimento construido.

• Se adelantan visitas para suscribir cierre de actas de vecindad en el primer tramo intervenido.

• El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales. el contratista de obra informa que recibió notificación del municipio donde se archiva el proceso.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados:

- CINGE-INV-5053-0250-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-098-2025 (diseño estructural boxculvert 3x3).

- CINGE-INV-5053-0250-25 Respuesta oficio OFI-CONS-0100-2025. Orden de operación No.26.

- **SEMANA No.84: del 05/09/2025 al 11/09/2025.**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo:

- El dia 05 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 2:00 a.m. a 5:00 a.m.

- El dia 06 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.

- El dia 08 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

- El dia 11 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta k4+200 y desde k5+050 a k5+850.

• Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

• Se realiza acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera jomeve en cienaga de oro.

• Se realiza acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

• La interventoría realiza chequeo topográfico para verificar niveles y volúmenes de subbase granular.

• Para la intervención y construcción del pavimento rígido mr38 (tramo ii) se realizan las siguientes actividades:
Se realiza colocación de rieles desde la abscisa k5+620 a k5+820 (carril derecho).

Se realiza chequeo y verificación de rieles para garantizar bombeo transversal y longitudinal del pavimento rígido a construir.
Se realiza replanteo para respetar la modulación de las losas y se localiza con topografía las juntas en los tramos curvos para garantizar la deflexión.
Se verifican ancho y espesores para el pavimento rígido a construir a lo largo del tramo desde la abscisa k5+620 a k5+820 (carril derecho).
Se verifica dimensiones de las canastillas garantizando ancho para dovelas con longitud de 35cm, separación centro a centro de 30 cm y altura de ubicación de dovela de 9cm.
Se verifican dovelas de 1" con una longitud de 35cm.
se verifica acero longitudinal de ½" con una longitud de 85cm espaciados cada 1,2cm.
Se realiza fundida de pavimento rígido mr-38 premezclado, desde la abscisa k5+620 a k5+820 (carril derecho).
Se realiza prueba slump en obra para verificar asentamiento del concreto.
Se toman muestras de concreto (viguetas) para ensayos de resistencia.
Se realiza vibrado del concreto a lo largo de los tramos fundidos.
Se realiza texturizado y acabado final de las losas de concreto.
Se aplicó antisol a lo largo del tramo de pavimento rígido construido.
Se realiza corte cada 3m en las juntas de dilatación del tramo de pavimento rígido MR38 construido.
Se realiza limpieza y sello de la junta de dilatación del pavimento construido.

• Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.

• Se realiza fundida de bermacunetas con concreto de 3000 psi premezclado en el lado derecho del tramo 2.

• Se adelantan visitas para suscribir cierre de actas de vecindad en el primer tramo intervenido.

• Se realiza rellenos en los espaldares de las bermacunetas a lo largo del pavimento rígido construido.

• Se realizan protecciones con piedra pegada en diferentes sectores para evitar socavaciones.

• El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales. el contratista de obra informa que recibió notificación del municipio donde se archiva el proceso.

• Igualmente, en el transcurso de la semana no se enviaron por correo electrónico comunicados.

- **SEMANA No.85: del 12/09/2025 al 18/09/2025**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo:

- El dia 14 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta k4+200 y desde k5+050 a k5+850.

• Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

• Se realiza acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera jomeve en cienaga de oro.

• Se realiza acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

• Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.

• Se realiza fundida de bermacunetas con concreto de 3000 psi premezclado en el lado derecho del tramo 2.

• Se realiza rellenos en los espaldares de las bermacunetas a lo largo del pavimento rígido construido.

• Se realizan protecciones con piedra pegada en diferentes sectores para evitar socavaciones.

• Se adelantan visitas para suscribir cierre de actas de vecindad en el primer tramo intervenido.

• El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales. el contratista de obra informa que recibió notificación del municipio donde se archiva el proceso.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados:

- CINGE-INV-5053-0253-25 Remisión informe mensual No. 19 correspondiente al periodo de agosto 2025.

- CINGE-INV-5053-0255-25 Certificado de ingresos rendimientos cuenta del anticipo contrato 159 de 2023.

- **SEMANA No.86: del 19/09/2025 al 25/09/2025.**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo:

- El dia 21 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

- El dia 24 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta k4+200 y desde k5+050 a k5+850.

• Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

• Se realiza acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera jomeve en cienaga de oro.

• Se realiza acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

• Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.

• Se realiza fundida de bermacunetas con concreto de 3000 psi premezclado en el tramo 2.

• Se realiza rellenos en los espaldares de las bermacunetas a lo largo del pavimento rígido construido.

• Se realizan protecciones con piedra pegada en diferentes sectores para evitar socavaciones.

• Se realizan cortes, demoliciones y retiro de escombros de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.

• Se realiza limpieza, perforación en las losas para anclar el acero, armado e instalación de parrilla en las losas a reparar.

• Se realiza fundida de pavimento rígido MR38 premezclado para reparación de 8 losas fracturadas.

• Se adelantan visitas para suscribir cierre de actas de vecindad en el primer tramo intervenido.

• El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales. el contratista de obra informa que recibió notificación del municipio donde se archiva el proceso.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados:

- CINGE-INV-5053-0258-25 Respuesta radicado No. 2025S-VBOG-065622 atención observaciones informes trimestrales sociales No.6.

- **SEMANA No.87: del 26/09/2025 al 02/10/2025.**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo:

- El dia 26 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- El dia 28 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- El dia 30 de septiembre 2025 se presentaron lluvias a partir de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

- El dia 01 de octubre 2025 se presentaron lluvias a partir de 4:00 a.m. a 7:00 a.m., desde 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y desde 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

- El dia 02 de octubre 2025 se presentaron lluvias a partir de 2:00 a.m. a 4:00 a.m.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta k4+200 y desde k5+050 a k5+850.

• Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

• Se realiza fundida de bordillos de bermacunetas con concreto de 3000 psi en el tramo 2.

• En el boxculvert 4.8x2 ubicado en la abscisa k4+200 y en la alcantarilla triple ubicada en la abscisa k3+540, se ejecutan atraques hidráulicos con el propósito de desviar el flujo de la corriente del arroyo, permitiendo el desarrollo seguro y eficiente

de las actividades constructivas previstas en el sector. se avanza con las labores de excavación, relleno, el mejoramiento del terreno mediante pedraplén, y la construcción del solado aguas arriba, como preparación para la ejecución de la solera de protección.

• Se realiza rellenos en los espaldares de las bermacunetas a lo largo del pavimento rígido construido.

• Se realizan protecciones con piedra pegada en diferentes sectores para evitar socavaciones.

• Se realizan cortes, demoliciones y retiro de escombros de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.

• Se realiza limpieza, perforación en las losas para anclar el acero, armado e instalación de parrilla en las losas a reparar.

• Se realiza fundida de pavimento rígido mr38 premezclado para reparación de 14 losas fracturadas.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados:

- CINGE-INV-5053-0266-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-005-2025 (diseño estructural muro K4+200).

- CINGE-INV-5053-0270-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-093-2025 Y OFI-CONS-104-2025 Informe SST Julio y agosto 2025.

- CINGE-INV-5053-0271-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-092-2025– Informe ambiental Julio 2025.

3.2.2 MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:

Para este periodo no aplica, finalizo el 31 de mayo de 2025.

3.2.3 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:

Para este periodo no aplica, finalizo el 31 de mayo de 2025.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

  Se encuentran revisados y aprobados los precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

- **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

  Se encuentran revisados y aprobados los precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

- **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

  Se encuentran revisados y aprobados los precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra 159-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 20	**$ 11.805.467.565,00**
Valor Obra Básica en el mes 20	**$ 567.608.013,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$0,00**
Valor total Iva	**$ 0,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	**89.31%**
Porcentaje programado acumulado obra básico	**92.20%**

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 89.31%, vs avance programado del 92.20%, presentando atraso del -2.89% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista aumentar el ritmo de trabajo, para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. Adicionalmente, la Alcaldía cerró mediante comunicado remitido al consorcio providencia el proceso sancionatorio de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que se superaron las causales que lo originaron.

- **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-006-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado	**$ 5.873.079.611,00**
Valor Obra Básica	**$ 121.979.194,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$0,00**
Valor total Iva	**$ 0,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	**100.00%**
Porcentaje programado acumulado obra básico	**100.00%**

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y las reparaciones en diferentes losas que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

- **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-MSBV-008-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado	**$ 2.008.640.979,00**
Valor Obra Básica	**$10.405.137,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$ 0,00**
Valor total Iva	**$ 0,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	**100.00%**
Porcentaje programado acumulado obra básico	**100.00%**

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y la instalación de señales verticales, que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

Actividades ejecutadas en el periodo del presente informe:

- Se realizaron los informes semanales.
- Reuniones de comité de obra con Invias, contratista y administración municipal.
- Seguimiento técnico (verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del residente de Interventoría, verificación del avance de obra, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, verificación de la disponibilidad de recursos físicos de equipos y maquinaria).
- Seguimiento administrativo (verificación de pagos de salud pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, Otros).
- Verificar el estado y funcionamiento de toda la maquinaria.
- Observar el desempeño del personal del contratista exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional según

corresponda en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo y personal de obra de acuerdo a las actividades ejecutadas.

- Labores de verificación topográfica y de calidad de materiales a usar. Control y verificación del PAGA de la Obra.
- Registro de Bitácora.
- Registro fotográfico para demostrar los avances de obra y los procesos de cada de una actividad contractuales desarrolladas por el contratista.
- Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas.
- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato de obra dentro del presupuesto de tiempo e inversión previstos originalmente.

Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Seguimiento a los trámites en proceso:

Corresponde a realizar el control y seguimiento a los trámites como licencias, permisos, autorizaciones referentes a los componentes técnico, ambiental y social, que realiza el contratista para los tramos en intervención.

- Revisión y seguimiento de documentos contractuales (programa de inversión y PAGA).
- Revisión de los balances parciales del proyecto.
- Revisión de las observaciones del contratista en los tramos a intervenir.
- Reuniones y comités de obra.
- Definición de las estructuras hidráulicas a intervenir en los diferentes corredores viales.

Adicionalmente, la Interventoría hace vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, presupuestal y ambiental, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL

Se anexa al informe los siguientes formatos suscritos por los responsables, siguiendo el orden establecido en el Manual de interventoría Versión 2022.

4.1 Informe semanal - MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 83 del 29/08/2025 al 4/09/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No.: 159-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025

VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14.100.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$ 5.287.335.878,80
VALOR AMORTIZADO:	$ 3.920.927.313,60
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.366.408.565,20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No.: 5053-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025

VALOR INICIAL:	$ 2.219.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.219.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.218.339.697,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.173.365.511,00	84,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.595.478.198,00	87,72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 422.112.687,00	3,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.253.369.211,00	79,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.675.481.898,00	82,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 422.112.687,00	2,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 208.556.739,00	1,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 357.618.646,00	2,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 22 de abril 2025 al 17 de julio de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 869.269.074,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 17 DE JULIO DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°3. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.982.435.767,00	89,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.982.435.767,00	89,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13/08/2025
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 119.262.538,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.287.335.878,96
Amortizado total $	$ 3.920.927.313,60
Saldo total $	$ 1.366.408.565,36

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ 0,17
Acumulado:	$ 0,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 84,53%
Meta Física Ejecutada % 87,72%
Avance o Atraso Físico % 3,19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1			Prog	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
					Ejec	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
* Obra	GL	1			Prog	$ 13.218.339.697,00			$ 11.173.365.511,00	84,53%
					Ejec	$ 11.595.478.198,00			$ 11.595.478.198,00	87,72%
* Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	$ 169.033.596,00			$ 169.033.596,00	75,00%
					Ejec					
* Programa de Manejo de Transito	GL	1			Prog	$ 132.183.396,00			$ 132.183.396,00	
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	si	1
Carrotanque	si	1
Vibrocompactador	si	1
Retroexcavadora	si	1
Mezcladora de concreto	si	1
Vibrador de concreto	si	1
Cortadora de pavimento	si	1
Volqueta de 6m3	si	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V5, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO.
SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA.
SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 30 DE AGOSTO 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 2:00 A.M. A 5:00 A.M.

- EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 10:00 P.M. A 12:00 A.M.

- EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 12:00 A.M. A 2:00 A.M.

- EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 4:00 A.M. A 6:00 A.M.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA K4+200 Y DESDE K5+050 A K5+850.

• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

• LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE SUBBASE GRANULAR.

• PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 (TRAMO II) SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K5+200 A K5+620 (CARRIL DERECHO).
SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.
SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.
SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K5+200 A K5+620 (CARRIL DERECHO).
SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.
SE VERIFICAN DOVELAS DE 1" CON UNA LONGITUD DE 35CM.
SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½" CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.
SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K5+200 A K5+620 (CARRIL DERECHO).
SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.
SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.
SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.
SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.
SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO.
SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO.
SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.

• SE ADELANTAN VISITAS PARA SUSCRIBIR CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD EN EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO.

• EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST Y AMBIENTALES. EL CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DONDE SE ARCHIVA EL PROCESO.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0250-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-098-2025 (diseño estructural boxculvert 3x3).

- CINGE-INV-5053-0250-25 Respuesta oficio OFI-CONS-0100-2025. Orden de operación No.26.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+800 A K5+950.


• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+620 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BERMACUNETAS 3000PSI DESDE K5+050 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO TRAMO (INCLUYENDO OBRA DE ARTE) Y DEMAS DOCUMENTOS PENDIENTES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+060.



Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+290.



Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+480.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 84 del 5/09/2025 al 11/09/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No. 159-2023 — VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,80
VALOR AMORTIZADO: $ 3.920.927.313,60
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.366.408.565,20

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023 — VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.219.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.218.339.697,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.433.360.657,00	86,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.722.267.336,00	88,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 288.906.679,00	2,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.513.364.357,00	81,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.802.271.036,00	83,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 288.906.679,00	2,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 259.995.146,00	1,97%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 126.789.138,00	0,96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 22 de abril 2025 al 17 de julio de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 869.269.074,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 17 DE JULIO DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°3. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.997.659.400,00	90,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.997.659.400,00	90,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13/08/2025
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 119.262.538,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.287.335.878,96
Amortizado total $	$ 3.920.927.313,60
Saldo total $	$ 1.366.408.565,36

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ 0,17
Acumulado:	$ 0,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 86,50%
Meta Física Ejecutada % 88,68%
Avance o Atraso Físico % 2,19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1			Prog	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
					Ejec	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
* Obra	GL	1			Prog	$ 13.218.339.697,00			$ 11.433.360.657,00	86,50%
					Ejec	$ 11.722.267.336,00			$ 11.722.267.336,00	88,68%
* Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	$ 169.033.596,00			$ 169.033.596,00	75,00%
					Ejec					
* Programa de Manejo de Transito	GL	1			Prog	$ 132.183.396,00			$ 132.183.396,00	
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	si	1
Carrotanque	si	1
Vibrocompactador	si	1
Retroexcavadora	si	1
Mezcladora de concreto	si	1
Vibrador de concreto	si	1
Cortadora de pavimento	si	1
Volqueta de 6m3	si	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE / CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA / VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V5, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 2:00 A.M. A 5:00 A.M.

- EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 1:00 A.M. A 6:00 A.M.

- EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 6:00 A.M. A 8:00 A.M.

- EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 6:00 A.M. A 8:00 A.M.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA K4+200 Y DESDE K5+050 A K5+850.

• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

• LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE SUBBASE GRANULAR.

• PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 (TRAMO II) SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K5+620 A K5+820 (CARRIL DERECHO).
SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.
SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.
SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K5+620 A K5+820 (CARRIL DERECHO).
SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.
SE VERIFICAN DOVELAS DE 1" CON UNA LONGITUD DE 35CM.
SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½" CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.
SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K5+620 A K5+820 (CARRIL DERECHO).
SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.
SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.
SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.
SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.
SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO.
SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO.
SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.

• SE REALIZAN EXCAVACIONES, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACATACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE RIELES Y ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE BERMACUNETAS EN EL TRAMO 2.

• SE REALIZA FUNDIDA DE BERMACUNETAS CON CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN EL LADO DERECHO DEL TRAMO 2.

• SE ADELANTAN VISITAS PARA SUSCRIBIR CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD EN EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO.

• SE REALIZA RELLENOS EN LOS ESPALDARES DE LAS BERMACUNETAS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.

• SE REALIZAN PROTECCIONES CON PIEDRA PEGADA EN DIFERENTES SECTORES PARA EVITAR SOCAVACIONES.

• EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST Y AMBIENTALES. EL CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DONDE SE ARCHIVA EL PROCESO.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA NO SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO COMUNICADOS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+800 A K5+950.


• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+620 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BERMACUNETAS 3000PSI DESDE K5+050 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO TRAMO (INCLUYENDO OBRA DE ARTE) Y DEMAS DOCUMENTOS PENDIENTES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción Bermacunetas 3000PSI premezclado. Abscisa K5+380.



Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+710.



Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+820.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 85 del 12/09/2025 al 18/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No. 159-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025

VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14.100.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$ 5.287.335.878,80
VALOR AMORTIZADO:	$ 3.920.927.313,60
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.366.408.565,20

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025

VALOR INICIAL:	$ 2.219.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.219.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.218.339.697,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.684.890.001,00	88,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.790.435.915,00	89,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 105.545.914,00	0,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.764.893.701,00	83,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.870.439.615,00	84,19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 105.545.914,00	0,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 251.529.344,00	1,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 68.168.579,00	0,52%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 22 de abril 2025 al 17 de julio de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 869.269.074,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 17 DE JULIO DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°3. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.012.883.033,00	90,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.012.883.033,00	90,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13/08/2025
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 119.262.538,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.287.335.878,96
Amortizado total $	$ 3.920.927.313,60
Saldo total $	$ 1.366.408.565,36

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ 0,17
Acumulado:	$ 0,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88,40%
Meta Física Ejecutada % 89,20%
Avance o Atraso Físico % 0,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1			Prog	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
					Ejec	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
* Obra	GL	1			Prog	$ 13.218.339.697,00			$ 11.684.890.001,00	88,40%
					Ejec	$ 11.790.435.915,00			$ 11.790.435.915,00	89,20%
* Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	$ 169.033.596,00			$ 169.033.596,00	75,00%
					Ejec					
* Programa de Manejo de Transito	GL	1			Prog	$ 132.183.396,00			$ 132.183.396,00	
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	si	1
Carrotanque	si	1
Vibrocompactador	si	1
Retroexcavadora	si	1
Mezcladora de concreto	si	1
Vibrador de concreto	si	1
Cortadora de pavimento	si	1
Volqueta de 6m3	si	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V5, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 6:00 A.M. A 11:00 A.M.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA K4+200 Y DESDE K5+050 A K5+850.

• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

• SE REALIZAN EXCAVACIONES, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACATACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE RIELES Y ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE BERMACUNETAS EN EL TRAMO 2.

• SE REALIZA FUNDIDA DE BERMACUNETAS CON CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN EL LADO DERECHO DEL TRAMO 2.

• SE REALIZA RELLENOS EN LOS ESPALDARES DE LAS BERMACUNETAS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.

• SE REALIZAN PROTECCIONES CON PIEDRA PEGADA EN DIFERENTES SECTORES PARA EVITAR SOCAVACIONES.

• SE ADELANTAN VISITAS PARA SUSCRIBIR CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD EN EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO.

• EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST Y AMBIENTALES. EL CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DONDE SE ARCHIVA EL PROCESO.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0253-25 Remisión informe mensual No. 19 correspondiente al periodo de agosto 2025.

- CINGE-INV-5053-0255-25 Certificado de ingresos rendimientos cuenta del anticipo contrato 159 de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.


• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE BERMACUNETAS 3000PSI EN EL TRAMO 2.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO TRAMO (INCLUYENDO OBRA DE ARTE) Y DEMAS DOCUMENTOS PENDIENTES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción empedrados de protección. Abscisa K3+580.



Construcción bordillos de Bermacunetas 3000PSI premezclado. Abscisa K5+250.



Construcción Bermacunetas 3000PSI premezclado. Abscisa K5+780.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 86 del 19/09/2025 al 25/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No. 159-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,80
VALOR AMORTIZADO: $ 3.920.927.313,60
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.366.408.565,20

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2.219.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.218.339.697,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.936.419.345,00	90,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.800.457.015,00	89,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (135.962.330,00)	-1,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.016.423.045,00	85,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.880.460.715,00	84,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (135.962.330,00)	-0,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 251.529.344,00	1,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.021.100,00	0,08%

	X	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 22 de abril 2025 al 17 de julio de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 869.269.074,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 17 DE JULIO DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°3. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.028.106.666,00	91,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.028.106.666,00	91,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13/08/2025
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 119.262.538,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.287.335.878,96
Amortizado total $	$ 3.920.927.313,60
Saldo total $	$ 1.366.408.565,36

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ 0,17
Acumulado:	$ 0,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90,30%
Meta Física Ejecutada % 89,27%
Avance o Atraso Físico % -1,03%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1			Prog	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
					Ejec	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
* Obra	GL	1			Prog	$ 13.218.339.697,00			$ 11.936.419.345,00	90,30%
					Ejec	$ 11.800.457.015,00			$ 11.800.457.015,00	89,27%
* Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	$ 169.033.596,00			$ 169.033.596,00	75,00%
					Ejec					
* Programa de Manejo de Transito	GL	1			Prog	$ 132.183.396,00			$ 132.183.396,00	
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	si	1
Carrotanque	si	1
Vibrocompactador	si	1
Retroexcavadora	si	1
Mezcladora de concreto	si	1
Vibrador de concreto	si	1
Cortadora de pavimento	si	1
Volqueta de 6m3	si	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE / CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA / VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V5, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 5:00 A.M. A 9:00 A.M.

- EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 8:00 A.M. A 9:00 A.M.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA K4+200 Y DESDE K5+050 A K5+850.

• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

• SE REALIZAN EXCAVACIONES, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACATACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE RIELES Y ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE BERMACUNETAS EN EL TRAMO 2.

• SE REALIZA FUNDIDA DE BERMACUNETAS CON CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN EL TRAMO 2.

• SE REALIZA RELLENOS EN LOS ESPALDARES DE LAS BERMACUNETAS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.

• SE REALIZAN PROTECCIONES CON PIEDRA PEGADA EN DIFERENTES SECTORES PARA EVITAR SOCAVACIONES.

• SE REALIZAN CORTES, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS LOSAS QUE PRESENTAN FRACTURAS EN EL TRAMO 1.

• SE REALIZA LIMPIEZA, PERFORACIÓN EN LAS LOSAS PARA ANCLAR EL ACERO, ARMADO E INSTALACIÓN DE PARRILLA EN LAS LOSAS A REPARAR.

• SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN DE 8 LOSAS FRACTURADAS.

• SE ADELANTAN VISITAS PARA SUSCRIBIR CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD EN EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO.

• EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST Y AMBIENTALES. EL CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DONDE SE ARCHIVA EL PROCESO.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0258-25 Respuesta radicado No. 2025S-VBOG-065622 atención observaciones informes trimestrales sociales No.6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.


• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE BERMACUNETAS 3000PSI EN EL TRAMO 2.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO TRAMO (INCLUYENDO OBRA DE ARTE) Y DEMAS DOCUMENTOS PENDIENTES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Demolición losas fracturadas. Abscisa K1+580.



Construcción bordillos de Bermacunetas 3000PSI. Abscisa K5+220.



Construcción bordillos de Bermacunetas 3000PSI. Abscisa K5+360.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 87 del 26/09/2025 al 2/10/2025. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No. 159-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,80
VALOR AMORTIZADO: $ 3.920.927.313,60
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.366.408.565,20

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2.219.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 14.100.000.000,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.219.000.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.218.339.697,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.187.948.689,00	92,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.805.467.565,00	89,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (382.481.124,00)	-2,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.267.952.389,00	87,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.885.471.265,00	84,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (382.481.124,00)	-2,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 251.529.344,00	1,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.010.550,00	0,04%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 22 de abril 2025 al 17 de julio de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 869.269.074,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 17 DE JULIO DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°3. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.043.330.299,00	92,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.043.330.299,00	92,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.223.633,00	0,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13/08/2025
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 119.262.538,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.287.335.878,96
Amortizado total $	$ 3.920.927.313,60
Saldo total $	$ 1.366.408.565,36

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ 0,17
Acumulado:	$ 0,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92,20%
Meta Física Ejecutada % 89,31%
Avance o Atraso Físico % -2,89%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1			Prog	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
					Ejec	$ 80.003.700,00			$ 80.003.700,00	0,57%
* Obra	GL	1			Prog	$ 13.218.339.697,00			$ 12.187.948.689,00	92,20%
					Ejec	$ 11.805.467.565,00			$ 11.805.467.565,00	89,31%
* Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	$ 169.033.596,00			$ 169.033.596,00	75,00%
					Ejec					
* Programa de Manejo de Transito	GL	1			Prog	$ 132.183.396,00			$ 132.183.396,00	
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	si	1
Carrotanque	si	1
Vibrocompactador	si	1
Retroexcavadora	si	1
Mezcladora de concreto	si	1
Vibrador de concreto	si	1
Cortadora de pavimento	si	1
Volqueta de 6m3	si	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE / CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA / VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V5, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M.

- EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M.

- EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M.

- EL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 4:00 A.M. A 7:00 A.M., DESDE 3:00 P.M. A 5:00 P.M. Y DESDE 7:00 P.M. A 11:00 P.M.

- EL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 2:00 A.M. A 4:00 A.M.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA K4+200 Y DESDE K5+050 A K5+850.

• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

• SE REALIZA FUNDIDA DE BORDILLOS DE BERMACUNETAS CON CONCRETO DE 3000 PSI EN EL TRAMO 2.

• EN EL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200 Y EN LA ALCANTARILLA TRIPLE UBICADA EN LA ABSCISA K3+540, SE EJECUTAN ATRAQUES HIDRÁULICOS CON EL PROPÓSITO DE DESVIAR EL FLUJO DE LA CORRIENTE DEL ARROYO, PERMITIENDO EL DESARROLLO SEGURO Y EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PREVISTAS EN EL SECTOR. SE AVANZA CON LAS LABORES DE EXCAVACIÓN, RELLENO, EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE PEDRAPLÉN, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOLADO AGUAS ARRIBA, COMO PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA SOLERA DE PROTECCIÓN.

• SE REALIZA RELLENOS EN LOS ESPALDARES DE LAS BERMACUNETAS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.

• SE REALIZAN PROTECCIONES CON PIEDRA PEGADA EN DIFERENTES SECTORES PARA EVITAR SOCAVACIONES.

• SE REALIZAN CORTES, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS LOSAS QUE PRESENTAN FRACTURAS EN EL TRAMO 1.

• SE REALIZA LIMPIEZA, PERFORACIÓN EN LAS LOSAS PARA ANCLAR EL ACERO, ARMADO E INSTALACIÓN DE PARRILLA EN LAS LOSAS A REPARAR.

• SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN DE 14 LOSAS FRACTURADAS.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0266-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-005-2025 (diseño estructural muro K4+200).

- CINGE-INV-5053-0270-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-093-2025 Y OFI-CONS-104-2025 Informe SST Julio y agosto 2025.

- CINGE-INV-5053-0271-25 Respuesta comunicado OFI-CONS-092-2025– Informe ambiental Julio 2025.

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.


• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS DE PROTECCIÓN EN EL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200 Y EN LA ALCANTARILLA TRIPLE UBICADA EN LA ABSCISA K3+540.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO TRAMO (INCLUYENDO OBRA DE ARTE) Y DEMAS DOCUMENTOS PENDIENTES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reparación losas fracturadas. Abscisa K1+661.



Demolición losas fracturadas. Abscisa K1+990.



Atraque hidraulico aguas arriba alcantarilla triple. Abscisa K3+540.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Revisión y aprobación de documentos contractuales. 2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares. 3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.	FIRMA NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES** Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO No. 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5053 - 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INGECON-INCO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
MOTONIVELADORA	LIUGONG 4165D	3.7M	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
MINICARGADOR	CASE CR220B	1.5M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
PAJARITA	CASE 580N	0.67M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
VIBROCOMPACTADOR	SD-100D	7TON	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA	UPP086	15M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA	CHEVROLET BSF842	15M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			TOTAL ACTIVO	6	6	0	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	150	83,3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	30	16,7%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se avanza con construcción de bermacunetas 3000PSI y construcción de pavimento rigido MR38.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DANIELA ALVAREZ ACUÑA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-357437COR

Firma
Nombre: VICENTE URZOLA BADEL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202215754COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE RICARDO RUIZ HOYOS	15677277	DIRECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 2.000.000	$ 139.200	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 80.000	PORVENIR	1746197240	$ 320.000	$ 80.000	N/A	N/A	
2	GUSTAVO ALFONSO MONTES CALDERON	1100691991	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PROTECCION	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
3	LUIS ANTONIO YANEZ HERNANDEZ	1003305026	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
4	NESTOR LUIS SALGADO RAMOS	1003359117	TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
5	MARIA ALEJANDRA COGOLLO PADILLA	1064999603	RESIDENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUDTOTAL	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
6	LUISA FERNANDA SIERRA MARTINEZ	1066724677	AUXILIAR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PROTECCION	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
7	MARIA CAMILA TANO HOYOS	1066748940	SOCIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
8	CARRASCAL OCHOA ANGIE DANIELA	1066750679	SISO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
9	CARLOS RAMIREZ	1003309075	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
10	BEDOYA QUINTERO CARELIS ALEJANDRA	1006575053	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	1746197240	$ 52.000	COLPENSIONES	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
11	SARMIENTO ESPEJO JOSE	1038100533	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	COLPENSIONES	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
12	MARTINEZ VANESSA	1062434781	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PROTECCIÓN	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
13	SOTO KAROL	1066726313	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PROTECCIÓN	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
14	ALMARIO OVIEDO WILMER ALBERTO	1066732611	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	COLFONDOS	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
15	ALMARIO OVIEDO WILSON DAVID	1066732613	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	COLFONDOS	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
16	COGOLLO MIRANDA JUAN FRANCISCO	1066736685	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PROTECCIÓN	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
17	PAYARES SOTO DANIEL ANTONIO	1066739185	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
18	TORRES NAFER	1066743622	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PROTECCIÓN	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
19	GUZMAN MURILLO LUIS ANTONIO	1066745206	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
20	MIRANDA ANUAR	1067283107	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
21	REYES ARRIETA VICTOR ALFONSO	1067293338	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUDTOTAL	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
22	MENDEZ RUIZ ALVARO JOSE	1067929146	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUDTOTAL	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
23	ZAPATA PRADO MARIO ALBERTO	11106403	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
24	ZAPA BRAVO EDINSON	1192761933	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
25	RUIZ ARRIETA NELIS JUDITH	1192929076	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	1746197240	$ 52.000	PROTECCIÓN	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
26	ALMARIO JULIO JHON LUIS	15669981	MAESTRO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
27	ARROYO WILFRIDO	15677181	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PORVENIR	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
28	TRUJILLO SAENZ ROBERT EMIRO	15679922	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	COLFONDOS	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
29	GONZALEZ SOTO HERNANY	6662166	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PROVDENCIA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUAL SER	1746197240	$ 52.000	PROTECCIÓN	1746197240	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA NO HA PRESENTADO LAS PLANILLAS PAGADAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE DE 2025.

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio Mario Pompilio sinesterra, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio Mario Pompilio Sinesterra; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio Mario Pompilio Sinesterra, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 159-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	.000270	COLOMBIA RURAL CONVENIO 2286 DE 2023 - INVIAS	2.3.2.01.01.001-03-02	NACIÓN	159-2023	$ 14.100.000.000,00	$ 4.297.681.716,00
			TOTAL			$ 14.100.000.000,0	$ 4.297.681.716,0

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 14.100.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Cobro parcial	feb-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
2	Cobro parcial	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
3	Cobro parcial	abr-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
4	Cobro parcial	may-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
5	Cobro parcial	jun-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
6	Cobro parcial	jul-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
7	Cobro parcial	ago-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
8	Cobro parcial	sep-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
9	Cobro parcial	oct-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
10	Cobro parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 14.100.000.000,00	$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
11	Cobro parcial	dic-24	$ 5.657.123.226,00	$ -	$ 5.657.123.226,00	$2.262.849.290,40	$3.394.273.935,60	$3.024.486.588,56	000270 - 26 marzo de 2024	$ 8.442.876.774,00	$ 8.442.876.774,00	-	-	-	SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°1 EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024
12	Cobro parcial	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 8.442.876.774,00	$ 8.442.876.774,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
13	Cobro parcial	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 8.442.876.774,00	$ 8.442.876.774,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
14	Cobro parcial	mar-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 8.442.876.774,00	$ 8.442.876.774,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
15	Cobro parcial	abr-25	$ 3.275.925.984,00	$ -	$ 3.275.925.984,00	$1.310.370.393,60	$1.965.555.590,40	$1.714.116.194,96	000270 - 26 marzo de 2024	$ 5.166.950.790,00	$ 5.166.950.790,00	-	-	-	SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°2 EL DIA 21 DE ABRIL DE 2025
16	Cobro parcial	may-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 5.166.950.790,00	$ 5.166.950.790,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
17	Cobro parcial	jun-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 5.166.950.790,00	$ 5.166.950.790,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
18	Cobro parcial	jul-25	$ 869.269.074	$ -	$ 869.269.074	$ 347.707.629,60	$ 521.561.444,40	################	000270 - 26 marzo de 2024	$ 4.297.681.716,00	$ 4.297.681.716,00	-	-	-	SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°3 EL DIA 17 DE JULIO DE 2025
19	Cobro parcial	ago-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 4.297.681.716,00	$ 4.297.681.716,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
20	Cobro parcial	sep-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	$ 4.297.681.716,00	$ 4.297.681.716,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
TOTALES			**$ 9.802.318.284,00**		**$ 9.802.318.284,00**					**$ 4.297.681.716,00**	**$ 4.297.681.716,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
BASICO TOTAL DE OBRA:	$ 9.802.318.284,00	$ -	**$ 9.802.318.284,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS:	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ -	$ -	**$ -**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 9.802.318.284,00**		**$ 9.802.318.284,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	22	22	22	24	21	19	24	22	24	24	22	24	24	19	24	24	24	24	24	24	20	24	24	23	24	22	24	22	24	22		686
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Lluvias intensas	2	2	2	0	3	5	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	0	2	0	2		34
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DANIELA ALVAREZ ACUÑA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-357437COR

Firma
Nombre: VICENTE URZOLA BADEL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202215754COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	11/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	99,0%	SI	K3+100 IZQUIERDA AFIRMADO
2	11/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	101,4%	SI	K3+200 DERECHA AFIRMADO
3	11/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	96,0%	SI	K3+300 IZQUIERDA AFIRMADO
4	11/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	97,0%	SI	K3+400 DERECHA AFIRMADO
5	13/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	99,0%	SI	K3+100 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR
6	13/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	97,2%	SI	K3+200 DERECHA SUBBASE GRANULAR
7	13/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	99,3%	SI	K3+300 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR
8	13/12/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	96,2%	SI	K3+400 DERECHA SUBBASE GRANULAR
9	7/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN	E - 414	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	106,0%	SI	CUNETAS CARRIL IZQUIERDO
10	8/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN	E - 414	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	97,0%	SI	CUNETAS CARRIL IZQUIERDO
11	10/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN	E - 414	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	108,0%	SI	CUNETAS CARRIL DERECHO
12	2/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	94,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL IZQUIERDO
13	3/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	95,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL IZQUIERDO
14	5/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	98,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL IZQUIERDO
15	6/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	94,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO
16	7/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	101,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO
17	9/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	130,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO
18	11/12/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	75% (7 DIAS)	112,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	12/08/2025	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	95,20%	SI	K5+550 DERECHA SUBBASE GRANULAR
2	12/08/2025	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	95,40%	SI	K5+650 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR
3	12/08/2025	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	97,10%	SI	K5+750 EJE SUBBASE GRANULAR

DURANTE EL PRESENTE PERIODO, EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA PRESENTADO LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUELLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE OCTUBRE DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.003.700,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.003.700,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 1.410.000.000,00	19	10	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 5.640.000.000,00	19	10	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 2.820.000.000,00	19	10	2023	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 24.001.110,00	31	12	2023	31	12	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 4.230.000.000,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400052428

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N.D

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la perdida	$ 705.000.000,00	19	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400052429 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N.D

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 1.410.000.000,00	18	7	2025	30/04/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 5.640.000.000,00	18	7	2025	30/04/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 2.820.000.000,00	18	7	2025	31	10	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 24.001.110,00	31	10	2025	31	10	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 4.230.000.000,00	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400052428

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la perdida	$ 705.000.000,00	18	7	2025	31	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400052429 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

El contratista de obra presentó la actualización de pólizas según prorroga 4 y el municipio no ha presentado la resolución de aprobación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

FECHA DE INICIO: 28/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI -- X N ------ APROBADO: SI ------- NO ------ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:
Durante el mes no se tenian programadas auditorias de calidad.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI ------ NO -- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- N -------

OBSERVACIONES:
Durante el mes no se contaron ensayos y medicion.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2025
(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes del presente informe no se han realizado ensayos y calibración de equipos.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 159 **DE** 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 **DE** 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 5

JUSTIFICACIÓN Se solicita la redistribución de los recursos del plan de inversión del anticipo N° 4, en razón a que se hace necesario incluir los SETENTA MILLONES ($70,000,000,00), que se reintegraron a la cuenta de Fiducia.

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 435.500.013,06	$ 777.450.024,80	$ 1.399.500.065,27		$ 2.612.450.103,13	59,04%
2	PAGO DE MANO DE OBRA	$ -				$ -	0,00%
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON SUS REPUESTOS	$ -	$ -	$ -		$ -	0,00%
4	TRANSPORTE	$ 217.750.006,53	$ 746.800.020,89	$ 848.000.000,00		$ 1.812.550.027,42	40,96%
5							
TOTAL		**$ 653.250.019,58**	**$ 1.524.250.045,69**	**$ 2.247.500.065,27**	**$ -**	**$ 4.425.000.130,55**	**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante Legal CONSORCIO PROVIDENCIA
Contratista

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal CONSORCIO INGECON - INCO
Interventor

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 3-1-119640 **DE** 2024 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 003003712 **BANCO** BOGOTA SUCURSAL: BOGOTÁ D.C
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 40 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 4.425.000.130,55 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSION DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 468	25-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 26.200.301,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 469	25-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 40.951.311,00	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016380	14-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 57.900,02	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016539	25-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 1.080.598,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016199	3-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 1.366.001,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016456	19-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 1.124.598,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016122	28-ago-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 915.000,01	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016496	23-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 990.598,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP 14	26-sep-24	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 174.621.367,80	4	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.1	15-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 88.386.504,88	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. PROFORMA	No.1	15-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 136.612.745,46	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 478	9-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 22.939.566,22	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 479	9-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 35.854.749,33	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 470	27-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 21.509.417,61	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 471	27-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 33.619.416,75	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 480	22-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 18.584.298,62	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 481	22-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 29.149.952,76	4	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.11868	21-oct-24	FERRETERIA LA TRONCAL	$ 319.792.101,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. PROFORMA	No.2	2-nov-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 277.425.721,20	4	TRANSPORTE
	No.2	2-nov-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 179.490.497,29	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP26	12-dic-24	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 426.351.254,47	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP25	17-dic-24	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 71.601.053,04	1	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.3	3-dic-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 93.844.193,33	1	COMPRA DE MATERIALES
	No.3	3-dic-24	JDC INGENIERIA SAS	$ 145.048.307,03	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP25	27-feb-25	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 125.765.937,00	4	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.4	28-feb-25	JDC INGENIERIA SAS	$ 294.621.682,92	1	COMPRA DE MATERIALES
	No.4	28-feb-25	JDC INGENIERIA SAS	$ 455.375.818,21	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP41	11-mar-25	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 360.656.040,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ18846	11-mar-25	FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS	$ 342.652.431,04	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP42	28-mar-25	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 69.300.060,39	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	C049	4-abr-25	LUARQUIN CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 394.812.675,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	C050	4-abr-25	LUARQUIN CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 209.385.000,00	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ20775	28-ago-25	FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS	$ 8.924.485,44	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ20839	28-ago-25	FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS	$ 7.787.878,15	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ20900	28-ago-25	FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS	$ 362.079,14	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP45	4-sep-25	INVERSIONES D&P5 S.A.S	$ 7.838.587,44	4	TRANSPORTE
			VALOR TOTAL:	**$ 4.425.000.130,55**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 2.612.450.103,13	$ 2.612.450.103,13	$ -	$ 2.612.450.103,13	$ (0,00)
2	PAGO MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON SUS REPUESTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	TRANSPORTE	$ 1.812.550.027,42	$ 1.804.711.439,97	$ 7.838.587,44	$ 1.812.550.027,41	$ -
	TOTALES	**$ 4.425.000.130,55**	**$ 4.417.161.543,11**	**$ 7.838.587,44**	**$ 4.425.000.130,55**	**$ (0,00)**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JULIO) : $ 4.035.275,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 4.035.275,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 4.035.275,00	-	De septiembre 2024 a julio de 2025	13/08/2025	$ 4.035.275,00

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
Rendimientos Financieros generados desde septiembre 2024 hasta julio 2025, un total transferido de $ 4,035,275.00

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista: CONSORCIO PROVIDENCIA
Matrícula Profesional No.:25202-151814

Firma:
Nombre: ANGELA DAVILA MORALES
Representante Legal o su Apoderado
Interventor : CONSORCIO INGECON - INCO
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.10 Seguimiento al Programa de inversiones - MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPYMIN1-IN-E-ITR-1
VERSIÓN	0
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva a la numeración)

CONTRATO No: 189-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 565 DE 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO INGECONSULTA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses, semanas o días calendario)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Relativa a la suscripción del acta de inicio)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Relativa a la suscripción del acta de inicio) (Incluir en el cuadro del actual)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 14.100.000.000,00 (Números enteros solamente)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.100.000.000,00
PLAZO ACUMULADO: 21.09 MESES (En meses, semanas o días calendario)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/10/2025 (Relativa a las suscripciones, actas, otrosíes)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/10/2025 (Relativa a la suscripción del acta de reanudación)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / PROGRAMADO TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25
EXPLANACIONES	$123.340	0,93%	$121.774	% P	0,82%	0,31%										2,12%									
				$ P	$92.227	$41.113										$26.643,67									
				$ E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=68M	$272.647	2,06%	$0	% P	0,82%	0,82%	0,82%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,19%	0,42%	0,47%						
				$ P	$2.165	$65.810	$65.810	$64.611	$37.954	$29.643	$33.257					$3.868,66	$13.295,22	$74.727,43	$62.456,61						
				$ E													$1.811,00	$10.477,00							
				% E													0,14%	0,79%							
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 2X2(L=68)	$411.914	3,12%	$0	% P	0,00%	0,49%	3,79%	3,65%	3,36%	3,36%	2,13%	0,73%				0,00%	0,00%	0,42%	2,39%						
				$ P	$2.852	$34.407	$93.073	$111.942	$34.006	$34.006	$24.354	$8.574				$5.956,66	$19.261,80	$87.238,45	$123.443,39						
				$ E													$1.811,00	$10.477,00							
				% E													0,14%	0,79%							
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5X3	$12.243.642	92,63%	$3.687.469	% P		0,64%	11,01%	11,24%	14,00%	10,28%	10,06%	10,47%	11,24%	11,48%	7,14%	2,74%	4,10%	8,92%	12,25%	7,29%	8,97%	2,34%	3,20%	3,27%	1,78%
				$ P		$481.342	$1.495.705	$1.495.705	$1.897.207	$1.424.331	$1.737.776	$1.394.570	$1.485.992	$943.697	$362.066,39	$806.259,60	$1.179.568,50	$1.729.110,90	$1.928.482,66	$1.165.818,67	$361.923,76	$439.676,05	$405.665,69	$234.662,62	
				$ E			$1.495.705	$1.495.705	$1.897.207	$1.424.331	$1.737.776	$1.394.570	$1.485.992	$943.697	$362.066,39	$806.259,60	$1.179.568,50	$1.729.110,90	$1.928.482,66	$1.165.818,67	$361.923,76	$439.676,05	$405.665,69	$234.662,62	
				% E			1,43%	1,43%	1,81%	1,36%	1,66%	1,33%	1,42%	0,90%	0,35%	0,77%	1,13%	1,65%	1,84%	1,11%	0,35%	0,42%	0,39%	0,22%	
TRANSPORTE	$102.696	0,78%	$479.670	% P	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%												
				$ P	$11.737	$14.671	$11.737	$11.737	$14.671	$14.671	$11.737	$14.671	$11.737												
				$ E	$11.737	$14.671	$11.737	$11.737	$14.671	$14.671	$11.737	$14.671	$11.737												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$64.100	0,48%	$0	% P								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0,48%			0,90%
				$ P								$2.013	$19.066	$28.022	$21.997							$64.100,48			$78.192,84
				$ E																					
				% E																					
ITEMS NO PREVISTOS				% P																			1,36%	0,95%	0,43%
				$ P																			$192.850,34	$813.707,80	$717.535,55
				$ E																			$192.850,34	$813.707,80	
				% E																			1,36%	4,06%	
				% P																					
				$ P																					
				$ E																					
				% E																					
				% P																					
				$ P																					
				$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 13.218.359,70	100,00%	32,45%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ -	0,00%																							

ETAPA DE AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS

Programación Inicial — Prorroga N°1 — Prorroga N°2 — Prorroga N°3 — Prorroga N°4 — Reprogramación N°1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,75%	5,65%	12,44%	12,46%	14,64%	11,92%	13,61%	10,75%	11,98%	7,98%	3,99%	8,30%	10,18%	14,47%	7,78%	8,97%	3,22%	4,64%	9,23%	7,86%	
	VALOR $/Inv/da Prevol	30	$93.940	$667.451	$1.644.691	$1.646.497	$1.935.027	$1.533.332	$1.798.713	$1.421.947	$1.586.007	$973.594	$396.630	$938.699	$1.341.646	$1.912.646	$1.028.492	$1.186.819	$426.409	$612.926	$1.219.282	$1.038.281	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,75%	6,40%	18,24%	30,70%	45,34%	56,86%	70,47%	81,22%	92,82%	100,80%	49,87%	58,41%	68,58%	80,63%	87,61%	96,78%	100,00%	82,86%	92,09%	100,00%	
	VALOR $/Inv/da Prevol	30	$93.940	$761.431	$2.411.122	$4.057.620	$5.993.146	$7.526.478	$9.215.191	$10.736.739	$12.242.746	$13.216.339,79	$6.469.416,63	$7.324.415,63	$8.666.062,39	$10.578.668,80	$11.606.488,86	$12.792.308,43	$13.218.309,79	$10.988.555,28	$12.187.840,68	$13.216.309,79	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,92%	4,75%	8,47%	8,48%	11,12%	13,62%	10,68%	3,29%	8,99%	5,58%	1,98%	1,33%	3,01%	6,47%	4,26%		
	VALOR $/Inv/da Prevol	30	$0	$0	$0	$13.539	$254.129	$628.126	$828.287	$1.093.844	$1.470.099	$1.800.043	$1.312.756	$404.604	$728.161	$282.104	$179.412	$197.723	$682.221	$847.468			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	2,07%	6,79%	13,95%	21,93%	32,45%	46,06%	56,15%	59,44%	68,43%	73,93%	74,88%	75,53%	78,54%	85,02%	89,21%		
	VALOR $/Inv/da Prevol	30	$0	$0	$0	$13.539	$267.677	$895.803	$1.724.090	$2.818.934	$4.289.034	$6.089.078	$7.401.835	$8.806.439	$9.791.600	$10.073.704	$10.253.116	$10.450.839	$11.133.060	$11.980.528	$12.807.660	$13.216.309,79		

- Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
- Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
- ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 60.003,70	$ 60.003,70	0,57%
OBRAS DE COMPESACION AMBIENTAL Y DE COMPLEMENTARIAS	$ 84.516,80	$ -	%
- BOLSA DE AJUSTE	$ 526.734,05	$ -	%
- PAGA	$ 99.200,80	$ -	%
- PMT	$ 132.183,80	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 881.990,55		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 14.100.000,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		**$ 11.880.471,27**	**84,29%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

	PROGRAMADO	EJECUTADO
$	$ Valor	$ Valor
%	% Programado	% Ejecutado

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: **ENRO CARLOS BARGIÑO CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 20202-151814

Aprueba Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante legal o apoderado del interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA/OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP/MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** N/A **DE** N/A (numeración del acta) — **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** N/A

SEGUIMIENTO No. 3 (Si la numeración debe ser consecutiva a la última emitida, aunque del acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 159-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°3286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5003 DE 2025 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INSPECCION INCO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Ej: meses sumar meses, mes/año)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 05/12/2023 (Indique la suspensión vce comenzando con el número del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.190.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.190.000.000,00 (Sumar contrato inicial)

PLAZO ACUMULADO: 21,09 MESES (Ej: meses sumar los números sin sumarlos)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL) OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor Programado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	Dic-23	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25
EXPLANACIONES	$123.340	0,93%	$121.774	% P			0,82%	0,11%									0,74%									
				$ P			$92.237	$41.103									$92.647									
				$ E						$5.393	$18.394	$17.417	$7.410													
				% E						0,05%	0,20%	0,62%	0,06%				0,04%									
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L<6M	$272.647	2,06%	$64.826	% P			0,00%	0,00%	0,64%	0,28%	0,22%	0,40%					0,04%	0,13%	0,27%	0,47%						
				$ P			$2.160	$66.910	$64.811	$37.864	$29.643	$53.257					$5.668,88	$13.256,22	$74.727,43	$82.464,81						
				$ E														$ 5.668,88	$ 20.925,10							
				% E														0,02%	0,12%							
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 2X2(L<6M)	$411.914	3,12%	$82.431	% P			0,00%	0,00%	0,72%	0,80%	0,20%	0,26%	0,49%	0,16%			0,04%	0,13%	0,24%	0,38%				0,38%		
				$ P			$2.852	$66.467	$93.073	$111.942	$34.906	$34.906	$66.254	$21.574			$5.906,46	$19.251,22	$67.230,43	$129.442,97						
				$ E														$13.256,22	$80.973,65							
				% E														0,05%	0,18%							
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5X3	$12.243.642	92,63%	$9.606.928	% P			0,00%	0,64%	11,01%	11,24%	14,00%	13,78%	13,08%	10,47%	11,04%	7,14%	2,74%	6,10%	8,93%	13,01%	2,78%	6,97%	2,74%	3,45%	0,07%	1,73%
				$ P			$0	$481.342	$1.465.271	$1.465.760	$1.457.297	$1.434.331	$1.728.776	$1.384.370	$1.465.992	$943.997	$362.964,39	$806.259,20	$1.179.048,36	$1.720.116,20	$1.028.492,96	$1.105.616,57	$361.929,76	$439.076,95	$455.845,69	$234.662,62
				$ E				$606.812	$1.465.760	$1.465.760	$1.457.297	$1.434.331	$1.728.776	$1.384.370	$1.465.992	$1.887.961	$1.250.961	$2.057.221	$3.236.269	$4.956.385	$5.984.878	$6.090.495	$6.529.572	$6.985.418	$7.441.263	
				% E				0,11%	0,26%	0,26%	0,26%	0,25%	0,31%	0,25%	0,26%	0,34%	0,22%	0,36%	0,57%	0,87%	1,06%	1,08%	1,15%	1,24%	1,32%	
TRANSPORTE	$102.696	0,78%	$479.670	% P			0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
				$ P			$11.737	$14.671	$11.737	$11.737	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671	$14.671
				$ E				$26.408	$38.145	$49.882	$64.553	$79.224	$93.895	$108.566	$123.237	$137.908	$152.579	$167.250	$181.921	$196.592	$211.263	$225.934	$240.605	$255.276	$269.947	$284.618
				% E				0,19%	0,27%	0,35%	0,46%	0,56%	0,66%	0,77%	0,87%	0,97%	1,08%	1,18%	1,28%	1,39%	1,49%	1,59%	1,70%	1,80%	1,90%	2,01%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$64.100	0,48%	$0	% P														0,15%	1,25%	0,45%						0,53%
				$ P							$2.613			$10.066	$20.025	$31.997										$78.192,84
				% E																						
ITEM NO PREVISTOS																				1,36%	0,16%	0,43%				
																				$182.666,74	$813.767,80	$717.035,65				
																				1,44%	1,44%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 13.218.339,70	100%	78,34%																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																										

SUSPENSION DE OBRA No.1

ETAPA DE AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS

Prorroga N°1 — Programación Inicial — Ejecución — Prorroga N°2 — Prorroga N°3 — Reprogramación N°1 — Prorroga N°4

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación ente el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA.1.
5. Para los contratos en los cuales se hayan modificado los ítems de obra vía no se pueden asociar con GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE CURVA	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,73%	0,83%	12,44%	12,48%	14,64%	11,02%	13,81%	10,70%	11,39%	7,36%	3,90%	6,93%	10,15%	14,47%	7,73%	8,87%	3,22%	4,64%	3,23%	7,05%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$88.888	$467.451	$1.644.691	$1.666.497	$1.931.527	$1.522.312	$1.736.713	$1.421.647	$1.494.607	$973.884	$536.655	$933.685	$1.341.646	$1.912.066	$1.038.482	$1.166.619	$428.930	$613.926	$1.219.393	$1.330.291	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		0,00%	0,73%	0,83%	13,24%	25,72%	40,36%	51,38%	65,19%	75,89%	87,28%	94,64%	98,54%	105,47%	115,62%	130,09%	137,82%	146,69%	149,91%	154,55%	157,78%	164,83%	164,83%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$88.888	$556.339	$2.201.030	$3.867.528	$5.798.055	$7.320.367	$9.057.080	$10.478.727	$11.973.334	$12.947.218	$13.483.873	$14.417.558	$15.759.204	$17.671.270	$18.709.752	$19.876.371	$20.305.301	$20.919.227	$22.138.620	$23.468.911	$23.468.911
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,92%	4,75%	6,27%	8,24%	11,12%	10,28%	7,58%	6,98%	3,58%	7,58%	7,92%	3,01%	8,47%	4,23%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$11.238	$254.152	$428.674	$953.731	$1.053.944	$1.430.900	$1.498.942	$1.283.764	$1.076.197	$1.104.694	$594.197	$1.262.742	$1.321.752	$503.291	$1.407.406	$697.486		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%	6,78%	13,05%	21,03%	32,45%	46,86%	56,15%	68,44%	72,02%	74,06%	75,33%	78,34%	85,92%	89,31%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$11.238	$267.478	$696.303	$1.720.499	$2.815.934	$4.285.834	$5.698.975	$7.421.460	$8.791.480	$9.518.281	$9.787.686	$10.355.429	$11.227.360	$11.505.468				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
* ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO	$ 80.003,70	$ 80.003,70	0,07%
* OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 84.036,88	$ -	%
* BOLSA DE AJUSTE	$ 526.720,08	$ -	%
	$ -		
* PAGA	$ 56.222,82	$ -	%
	$ -		
* PMT	$ 132.183,43	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 881.660,90	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 14.190.660,90	$ 11.886.471,42	94,39%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 25202-151814

Aprueba Firma: _____
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153796 CLD

Original: Anexo para el cierre de la cuenta. (Liquidación Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor e Dirección Territorial

4.11 Actas de comité de obra - MEPI-MN-IN-14-FR-1 y MEPI-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/09/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: SE ENTREGÓ EL DIA 7 DE ABRIL 2024.
HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ LA HOJA DE VIDA .
MAQUNARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA:APROBADO V3.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: ENTREGARON.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: ENTREGARON.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Proposiciones y varios

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/09/2025 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños:

Diseño de pavimentos: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 25 de junio de 2025. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño geométrico: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 05 de junio de 2025. Se devolverá el dia 12 con observaciones. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño hidráulico, Pendiente por entregar, correspondiente al box K5+900 se entregará el día 27 de junio de 2025. No se cumple con el compromiso, se entregará el día 09 de julio de 2025. No se cumple con el compromiso, el contratista se compromete a entregarlo el 16 de julio de 2025. No se cumple, se entregará el 22 de julio de 2025. Se hizo entrega el dia 23 de julio, se encuentra aprobado.
Diseño estructural: El contratista entrego el diseño del box K5+900, se devuelve parte de la interventoria.
PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoria aprobo, fue remitido a la entidad. PAGA se remitio al INVIAS
CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentaci´no completa para su tramite. se debe entregar a mas tardar el 10 de junio de 2025. El contratista no cumplio. El contratista radico el dia 18 de junio de 2025. Esta pendiente la radicación de los informes tecnicos que acompañan la solicitud, los cuales se entregaran el 26 de junio de 2025. Copia del radicado de la información al municipio el dia 4 de julio de 2025. No se cumplio, se entregará el 16 de julio de 2025. Se entregó el dia 17 de julio a la acladia para su revisión y radicación. La alcaldia manifiesta que el dia 1 de agosto radicara en la CVS. Se radicó el documento y se entregaron los autos de apertura con los recibos de pago para iniciar el tramite. el contratista manifiesta que la proxima semana se hará la visita. La visita esta confirmada para el 5 de septiembre de 2025.

2. Estado de los documentos de inicio:
A continuación se listan los documentos y su estado:

APU: ENTREGADO.
PROGRAMACION: ENTREGADO.
HOJA DE VIDA: ENTREGADO.
MAQUNARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.
PMT: ENTREGADO.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: ENTREGADO.
FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRA SUBBASE GRANULAR Y JOMEVE QUE SUMINITRA AFIRMADO.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: ENTREGADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.
FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra:

En relación a la ejecución de la obra, se terminaron el 100% de los dos box ubicados en las abscisas K3+610 y K3+920 incluyendo los rellenos laterales. Se termino el 100% del pavimento costado derecho y costado izquierdo se completo lo pendiente hasta la absicsa K4+200. Se termino la actividad de bordillo, y finalizó hasta el K4+200 pendiente reparación de 30 metros en el K3+190 aproximadamente. El contratista finalizo las actividades de bermacuneta hasta el K4+200. En seguimiento al plan de contingencia, el mismo se ha venido cumpliendo por parte del contratista. Esta semana hubo avance de relleno lateral. el contratista cuenta con material para realizar la actividad, sin embargo no se cumplio con la fecha prevista de terminación de esta actividad, se propone terminarlo para la semana del 8 de septiembre . Se le recuerda al contratista que el contrato actualmente va hasta el 31 de octubre de 2025, al igual que la prorroga de la interventoria que ya se encuentra aprobada por parte INVIAS. El contratista tambien retomo actividades de piedra pegada en el sector K5+300 , para evitar socavaciones, actividad que realizará durante los proximo 15 dias.
Para la intervención del tramo 2 el consorcio providencia finalizo el suministro, extendida y compactacion de afirmado entre las abscisas K5+050 hasta K5+820, tambien se extendio, instalo, compacto material de subbase desde K5+050 hasta la K5+820, y pavimento desde el K5+050 hasta k5+820, se terminó tambien la actividad de cunetas desde el K5+050 hasta el K5+820, esta semana se continuno con la consturcción de losas desde la abscisa K5+200 hasta la K5+620 carril derecho. El contratista finalizará el próximo martes 9 de septiembre para finalizar e n la k5+820, la reparacion de losas, se iniciara el 1 de septiembre de 2025 para una duración de 20 dias. el contratista no inicio, iniciará una vez termine el pavimento de la K5+820.

Scanned with CamScanner

Actualmente el contrato tiene un % programado de 84,53% frente a un ejecutado de 87,72%, avance de 3,19%, datos con base en la reprogramación a raiz de la prorroga 4, hasta el 31 de octbure de 2025, a la fecha no se presenta atraso, se hizo la entrega de la reprogramación de prorroga 4.

El contratista esta adecuando el desevio vehicular para trabajar en el box ubicado en el K5+900,

Se presenta cierre parcial con controladores de trafico, en acopio tienen 28 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio.

Frente a la PQR de Ocensa, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del alquiler de volqueta, el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del acopio, el contratista remitio respuesta y se atenderá el 15 de septiembre de 2025.

Frente a la PQR del hielo, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del bodega, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

El contratista presentó acta de recibo parcial con corte desde el 22 de abril al 17 de julio de 2025, esta aprobada por parte de interventoria, por valor de $ 869,269,074. ya fue pagada por el municipio, sin embargo, se presentó pago erroneo porque la deducción fue mayor. el cual fue pagado por la entidad y quedo saldado el valor.

Se presentó una PQR de Julio Arce, solicitando qeu se validará la afinidad entre las personas que están vinculadas laboralmente con el consorcio y los integrantes de la veeduria. El contratsista esta preparando la respuesta y se dara respuesta el 8 de agosto de 2025. No se cumplió, el contratista lo atenderá el 20 de agosto de 2025. el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

El especialista de estructuras de la interventoria solicita mesa de trabajo para revisar el diseño del k5+900, se esta a la espera de la confirmación.

El contratista esta en conciliación conjuntamente con la interventoria, del balance del contrato, con el fin de hacer el cierre de cantidades y validar la meta fisica definitiva, el balance se entregara el 9 de septiembre de 2025. Con base a dicho balance se verificara el tiempo restante del contrato para el cumplimiento de la meta fisica.

4. Proposiciones y varios:

Respecto al componente SST: el contratista remitio inofrmación y esta aprobado informes hasta el mes de junio de 2025.y esta en revisión por parte de la interventoria el mes de julio, el dia 4 de septiembre se da respuesta, el informe de agosto se entregará el dia 8 de septiembre de 2025, se hicieron capacitación sobre que es peligro.

Respecto al componente ambiental: el contratista remitio información hasta julio de 2025, esta en revisión de la interventoria este último . Informe aprobado hasta junio 2025. el informe de agosto se entregará el dia 8 de septiembre de 2025.

Respecto al componente social: el contratista remitio información y esta aprobado informes hasta el mes de julio de 2025, el informe de agosto se entregará el dia 8 de septiembre de 2025, se continuo con levantamiento de actas de vecindad en el segundo tramo.

En campo se encuentran 34 personas, de estas corresponden a 12 personas mano de obra no calificada, toda correspondiente al area de influencia directa, y se cuenta con 8 mujeres, de las cuales 3 son de área de influencia y 5 son profesionales. Se están haciendo las actas de cierre del tramo terminado.

El contratista entrego los rendimientos financieros del anticipo hasta julio de 2025 por valor de $ 4,035,275. , se presento orden de operacion 25 para compra dematerial, orden aprobada pro la interventoria y presento orden 26 por transporte, esta ultima en revision por parte de la interventoria, con las presentes ordenes se completaria el giro del recurso disponible de anticipo, por lo cual, se podria hacer el cierre.

El municipio remitio reintegro de rendimientos hasta junio de 2025 pendiente el envio del soporte para informar a la subdireccion financiera.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/09/2025 (Día / Mes / Año)

Falto mayo por un problema al interior del banco.
Asiste a la reunión por parte del contratista, la ing Daniela residente de obra, tecnico del contratista, profesional SST, profesional social y apoyo.

El anticipo se realizo el desembolso por parte de la entidad a la cuenta de la fiducia, el contratista ha presentado 24 ordenes de operacion, se han aprobado 17 ordenes correspondiente al pago de la planta de concreto, ferreteria y transporte, a la fecha se ha desembolsado 4170 millones aproximadamente. El contratista presento orden de operación para ultimo desembolso de anticipo y se encuentra en revisión por parte de interventoria.

El contratista manifiesta que sobre el proceso de presunto incumplimiento recibieron comunicado de la alcaldia en el cual se archiva el proceso, por lo cual, se solicita la remisión del documento para verificación de la interentoria, el contratista lo radicará el dia 04-09-2025.

El contratista se compromete a cumplir con todos los puntos de la presente acta.
la interventoria solicito al contratista la actualiización de las pólizas segun prorroga nO. 4, se entregaran 30 de julio de 2025. no se cumplio, el contratista lo entregará el dia 6 de agosto de 2025. El contratista de obra remitió actualización de polizas el dia de hoy.

A raiz de fuertes lluvias el fin de semana pasado, lo cual tambien genero afectación de la alcantarilla triple, razon por la cual, la interventoria solicito al contratista validar nuevamente la capacidad hidráulica de dicha alcantarilla para validar si sigue vigente las actividades de mantenimiento o realmente se requiere realizar cambio de dicha estructura, este concepto el contratista lo tramitara el 27 de agosto de 2025. El contratista de obra lo presentará 01 de septiembre de 2025. El contratista remitira el concepto el dia 4 de septiembre de 2025.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/09/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ver compromisos en temas desarrollados	Según puntos anteriores	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 10/09/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Camila Toro Hoyos	Profe. Social	Consorcio Plaideria	
Angie Carrascal	SST	Cons. Providencia	
Marcelo Gil G.	Prof Social	Cons Ingecon	
Carlos Begoya G.	Ing. Civil	Cons. Providencia	
Daniela Ruiz	Ing Civil Residente	Cons Providencia	
Angela M. Davila	Dir. Interventoria	Cons. Ingecon_Inco	
Vicente Urzola B.	Res. Interventoria	C. Ingecon Inco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÈ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: SE ENTREGÓ EL DIA 7 DE ABRIL 2024.
HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ LA HOJA DE VIDA .
MAQUNARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA:APROBADO V3.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: ENTREGARON.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: ENTREGARON.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Proposiciones y varios

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños:

Diseño de pavimentos: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 25 de junio de 2025. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño geométrico: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 05 de junio de 2025. Se devolverá el dia 12 con observaciones. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño hidráulico, Pendiente por entregar, correspondiente al box K5+900 se entregará el día 27 de junio de 2025. No se cumple con el compromiso, se entregará el día 09 de julio de 2025. No se cumple con el compromiso, el contratista se compromete a entregarlo el 16 de julio de 2025. No se cumple, se entregará el 22 de julio de 2025. Se hizo entrega el dia 23 de julio, se encuentra aprobado.
Diseño estructural: El contratista entrego el diseño del box K5+900, se devuelve parte de la interventoria.
PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoria aprobo, fue remitido a la entidad. PAGA se remitio al INVIAS
CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentaci´no completa para su tramite. se debe entregar a mas tardar el 10 de junio de 2025. El contratista no cumplio. El contratista radico el dia 18 de junio de 2025. Esta pendiente la radicación de los informes tecnicos que acompañan la solicitud, los cuales se entregaran el 26 de junio de 2025. Copia del radicado de la información al municipio el dia 4 de julio de 2025. No se cumplio, se entregará el 16 de julio de 2025. Se entregó el dia 17 de julio a la acladia para su revisión y radicación. La alcaldia manifiesta que el dia 1 de agosto radicara en la CVS. Se radicó el documento y se entregaron los autos de apertura con los recibos de pago para iniciar el tramite. el contratista manifiesta que la proxima semana se hará la visita. La visita esta confirmada para el 5 de septiembre de 2025.Se cuenta con las dos resoluciones de la CVS con una compensación de 100 arboles pro cada uno.

2. Estado de los documentos de inicio:
A continuación se listan los documentos y su estado:

APU: ENTREGADO.
PROGRAMACION: ENTREGADO.
HOJA DE VIDA: ENTREGADO.
MAQUNARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.
PMT: ENTREGADO.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: ENTREGADO.
FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRA SUBBASE GRANULAR Y JOMEVE QUE SUMINITRA AFIRMADO.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: ENTREGADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.
FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra:

En relación a la ejecución de la obra, se terminaron el 100% de los dos box ubicados en las abscisas K3+610 y K3+920 incluyendo los rellenos laterales. Se termino el 100% del pavimento costado derecho y costado izquierdo hasta la absicsa K4+200. Se termino la actividad de bordillo hasta el K4+200. El contratista finalizo las actividades de bermacuneta hasta el K4+200. En seguimiento al plan de contingencia, el mismo se ha venido cumpliendo por parte del contratista. Esta semana no hubo avance de relleno lateral, el contratista cuenta con material para realizar la actividad, sin embargo no se cumplio con la fecha prevista de terminación de esta actividad, se propone terminarlo para la semana del 8 de octubre. Se le recuerda al contratista que el contrato actualmente va hasta el 31 de octubre de 2025, al igual que la prorroga de la interventoria que ya se encuentra aprobada por parte INVIAS, el municipio manifesto disponibilidad de recursos para pagar la interventoria el mes adicional de prorroga que necesita el contrato para su culminación. El contratista tambien retomo actividades de piedra pegada en el sector K5+300 , para evitar socavaciones, actividad que continua durante los proximo 15 dias.
Para la intervención del tramo 2 el consorcio providencia finalizo el suministro, extendida y compactacion de afirmado entre las abscisas K5+050 hasta K5+820, tambien se extendio, instalo, compacto material de subbase desde K5+050 hasta la K5+820, y pavimento desde el K5+050 hasta k5+820, se terminó tambien la actividad de cunetas desde el K5+050 hasta el K5+820, el contratista esta ajustando los estudios y diseñso del box ubicado en el K5+900 para iniciar su construcción.

Actualmente el contrato tiene un % programado de 90,3% frente a un ejecutado de 89,27%, atraso de 1,03%, datos con base en la reprogramación a raiz de la prorroga 4, hasta el 31 de octbure de 2025, a la fecha se presenta atraso debido a que no se ha dado inicio a las actividades de las obras hidraulicas.

Scanned with CamScanner

En relación a lo anterior, el contratista no terminara las obras dentro del plazo pactado, por lo cual, se requiere una prorroga del contrato aproximadamente pro un mes y medio, situación qeu sera presentada pro el contratista el 1 de octubre de 2025. Las obras a que se hace referencia corresponden a la aleta del box en el k4+200 y su prologración mediante un murod e contención, y al box 3 x 3 ubicado en el k5+900 nuevo tramo intervenido, asi como la ejecución del pavimento colindante en dicha abscisa, incluyendo la construcción de filtro frances 200 ml para evacuación de agua.

El contratista esta adecuando el desevio vehicular para trabajar en el box ubicado en el K5+900,

Se presenta cierre parcial con controladores de trafico, en acopio tienen 28 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio.

Frente a la PQR de Ocensa, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del alquiler de volqueta, el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del acopio, el contratista no remitio respuesta y se atenderá el 26 de septiembre de 2025.

Frente a la PQR del hielo, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del bodega, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

A la fecha no se han presentado mas tramite de actas de obra.

El dia de hoy se realizó comite de veeduria en el cual se hizo recorrido de obra con la comunidad, los cuales manfiestaron conformidad con las obras ejecutadas.

El contratista conciliio balance con interventoria, en el cual se garantiza la ejecución de la totalidad de la meta fisica de pavimento del contrato y se incluyen tres box completos.

4. Proposiciones y varios:

Respecto al componente SST: el contratista remitirá el día 26 de septiembre el pago de la planilla de obra de los meses de julio y agosto , de no recibirse dichas evidencias, se suspendran laboores por el riesgo que implica para SST para sus trabajadores. El informe de agosto de 2025, eesta en revisión de la interventoria.

Respecto al componente ambiental: el contratista remitio información hasta julio de 2025, esta en revisión de la interventoria este último . Informe aprobado hasta junio 2025. el informe de agosto se entregará el dia 8 de septiembre de 2025. No se cumplio. El informe de agosto de 2025, se enviaran el 2 de octubre de 2025.

Respecto al componente social: el contratista remitio información y esta aprobado informes hasta el mes de julio de 2025, el informe de agosto esta aprobado, se entregaron las actas de cierre de vecindad de la balaestrera 1.

En campo se encuentran 34 personas, de estas corresponden a 12 personas mano de obra no calificada, toda correspondiente al area de influencia directa, y se cuenta con 8 mujeres, de las cuales 3 son de área de influencia y 5 son profesionales. Se están haciendo las actas de cierre del tramo terminado.

El contratista entrego los rendimientos financieros del anticipo hasta julio de 2025 por valor de $ 4,035,275. ,se presento orden de operacion 25 para compra de materiales, orden aprobada pro la interventoria y presento orden 26 por transporte, aprobada para tramite, con las presentes ordenes se completaria el giro del recurso disponible de anticipo, por lo cual, se podria hacer el cierre.

El municipio remitio reintegro de rendimientos hasta junio de 2025 pendiente el envio del soporte para informar a la subdireccion financiera. Falto mayo por un problema al interior del banco.
Asiste a la reunión por parte del contratista, la ing Daniela residente de obra, tecnico del contratista.

El anticipo se realizo el desembolso por parte de la entidad a la cuenta de la fiducia, el contratista ha presentado 26 ordenes de operacion, se han aprobado 19 ordenes correspondiente al pago de la planta de concreto, ferreteria y transporte, a la fecha se ha desembolsado 4170 millones

Scanned with CamScanner

aprobado 19 órdenes correspondiente al pago de la planta de concreto, ferretería y transporte, a la fecha se ha desembolsado 4170 millones aproximadamente. El contratista presento orden de operación para ultimo desembolso de anticipo y se encuentra aprobadas por parte de interventoria.

El contratista remitio cierre del proceso de presunto incumplimiento recibieron comunicado de la alcaldia.

El contratista se compromete a cumplir con todos los puntos de la presente acta.
la interventoria solicito al contratista la actualiización de las pólizas segun prorroga nO. 4, se entregaran 30 de julio de 2025. no se cumplio, el contratista lo entregará el dia 6 de agosto de 2025. El contratista de obra remitió actualización de polizas el dia 1 de octubre de 2025.

Se aclara por parte del INVIAS que el hecho de hacer el tramite de prórroga del contrato, no significa que la prorroga del contrato quede avalada, ya que se debe hacer el tramtie ante el comite de contratacion del Instituto, por lo anterior, se solicita agilizar los procesos para cumplir con el plazo actual del contrato, esto es, hasta el 31 de octubre de 2025.

A continuación se continua con recorrido en obra por parte del contratista, interventoria, INVIAS y delegado del municipio.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/09/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ver compromisos en temas desarrollados	Según puntos anteriores	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 2/10/2025 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jorge Isaac Gil M.	Sec Inter.	Alcaldía	
David Perez Hoyos	Apoyo. Supervisión	Alcaldía.	
Angela Maria Dávila M	Directora Interventoría	Consorcio Ingeo-Inv	
Luis Gonzalez O.	Prof. esp.	INVIAS	
Daniela Alvarez A.	Residente Obra.	Cons Inv.	
Marcelo Gil G.	Profesional Social	Cons. Ingecon	
Vicente Urzola B.	Res. Interventoría	C. Ingecon Inco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 7 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**5053 de 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INGECON-INCO**	**NIT:**	**901.783.007-9**
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• **INGENIERIA Y CONSULTORIA INGE CON S.A.S 90%** • **INGENIERIA Y CONSULTORIA CM S.A.S 10%**		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1**		
FECHA DE INICIO:	**28 de diciembre de 2023**	**No. de Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085**	**SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR**
VALOR INICIAL:	**$ 2.219.000.000,00**		
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**		
ADICIÓN 1:	**$ 0,00**		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	**$ 2.219.000.000,00**		
ANTICIPO	**$ 932.352.941,00**		
ANTICIPO OTORGADO:	**$ 0.00**		
ANTICIPO EN CUENTA:	**$ 0,00**		
ANTICIPO AMORTIZADO:	**$ 0,00**		
SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 0,00**		
PLAZO INICIAL:	**Hasta el 31 de diciembre de 2023**		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	**Hasta el 31 de diciembre de 2024**		

PRÓRROGA 2:	**Hasta el 31 de julio de 2025**
PRÓRROGA 3:	**Hasta el 31 de octubre de 2025**
SUSPENSIÓN 1:	**29/12/2023**
REANUDACIÓN 1:	**01/02/2024**
MODIFICACIÓN:	**N/A**
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	**31 de octubre de 2025**

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

La interventoría hizo seguimiento a los contratos de obra de acuerdo a lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS donde se establecen las siguientes, actividades administrativas, técnicas, ambientales y sociales, en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025:

Actividades Administrativas:

- Revisión por parte de los especialistas de la interventoría de los informes técnicos de la revisión a los estudios y diseños presentados durante el presente periodo del proyecto del contrato No. 159-2023 del municipio de Planeta rica.

- Revisión para aprobación de la documentación exigida en los pliegos de condiciones de los contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica.

- Revisión de la información necesaria para la liquidación de los contratos de obra No. LP-006-2023 del municipio de Los Córdoba y No. LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento.

- La interventoría entregó al Invias Territorial Córdoba informes semanales contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica.

- Entrega de informes y documentación generada en desarrollo del proyecto a las secretarias de infraestructura y planeación de los municipios.

Actividades Técnicas:

- Verificación y control de los materiales utilizados en la obra del proyecto de Planeta rica.

- Verificación de procedimientos constructivos de acuerdo con los diseños aprobados.

- Medición de las cantidades ejecutadas y reporte de avance de ejecución.

- Toma de muestras de ensayos de laboratorio de las actividades ejecutadas.

- La interventoría llevó el registro diario de obra (Bitácora), donde queda consignado en detalle las actividades realizadas por el contratista, registro diario del clima las 24 horas y otras situaciones que se relacionen con el Proyecto.

- Control de personal y de equipos en la obra.

- Verificación del cumplimiento de los planes de manejo de tráfico en las obras.

Actividades Ambientales y SST:

- La interventoría realiza la revisión y la inspección de señalización provisional en cada frente de obra.

- La interventoría realiza inspección y verificación de las afiliaciones a la seguridad social del personal de cada frente de obra.

- La interventoría verifica las inspecciones necesarias a los equipos y herramientas de cada frente de obra.

- La interventoría realiza inspección y verificación de dotación de elementos de protección personal en cada frente de obra.

- La interventoría de igual manera en este periodo también cumple con las solicitudes a los contratistas del pago de la seguridad social y soporte de pago de la planilla de aportes, por medio de comunicados.

- Plan de mejora para control de tráfico mediante utilización de paleteros en los frentes de obra de Planeta rica y los Córdoba.

- Verificar las afiliaciones del personal de cada frente de obra.

Con el fin de dar un resumen de la gestión ambiental realizada por interventoría a los proyectos de Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, se tiene lo siguiente:

➢ **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

- El contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, en el mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista a la fecha solo ha presentado los informes ambientales hasta el mes de julio del 2025. Pendiente agosto y septiembre 2025.

➢ **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

- El contrato LP-006-2023 del municipio de los córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente el cierre de informes ambientales y balance ambiental con sus respectivos soportes.

➢ **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

- El contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente el cierre de informes ambientales y balance ambiental con sus respectivos soportes.

Con el fin de dar un resumen de la gestión social realizada por interventoría a los proyectos de Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, se tiene lo siguiente**:**

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

  - El contratista Presentó el informe social del periodo de septiembre de 2025, la cual fue aprobado por interventoría.

  - En el mes de septiembre el contratista a través del componente social se realizaron las siguientes charlas:

    Charla: Charla Trabajo en Equipo dirigida al equipo de trabajo
    Charla: Charla Participación Comunitaria, trabajo en equipo, liderazgo y acciones por la seguridad vial (veeduría ciudadana)

  - Se desarrolló el Comité de veeduría correspondiente al mes de septiembre de 2025, con el fin de informar el avance de las obras y a su vez generar un espacio de conversación con los miembros de la veeduría para escuchar sus inquietudes, solicitudes y aportes.

  - En conjunto; veeduría, contratista e interventoría realizó recorrido en obra (tramo 2) para identificar los avances de esta.

  - En el periodo reportado se gestiona y presentan las siguientes PQRS:

    - Solicitud por Jorge Luis Arango quintero, pago arrendamiento centro de acopio de material de subbase. El contratista realizó acuerdo de pago con el señor Jorge Luis, desde la interventoría se hace seguimiento y se espera que se haga el respectivo pago para darle cierre al trámite a la mayor brevedad.

    - Solicitud pago liquidación laboral de la señora Paola Yulieth Pacheco García por la vinculación laboral al Consorcio Providencia desde el 13 de enero de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2025.

- Solicitud pago liquidación laboral de la señora Luisa Fernanda Sierra Martínez por la vinculación laboral al Consorcio Providencia desde el 04 de julio de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2025.

- Durante el periodo el Consorcio Providencia hizo entrega de 42 actas de vecindad de cierre (tramo Balastrera 1), con las cuales se verifica el estado actual de estos. Las actas de vecindad fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

➢ **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

- Actualmente se encuentra gestionando la información para la entrega final del proyecto.

➢ **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

- Actualmente se encuentra gestionando la información para la entrega final del proyecto.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

5.3.1 INFORMES ESPECIALISTAS.

Para el presente informe, se cuenta con revisión de informes por parte de los especialistas de la Interventoria.

MARIA CAMILA ARENA DE LA HOZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Ing.
ANGELA MARIA DÁVILA MORALES
Representante Legal
CONSORCIO INGECON – INCO
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
Calle 148 No. 7G–42, Barrio Cedro Golf
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 5053 de 2023. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1.

Asunto: Comunicado OFI-CONS-123-2025 Estructural box culvert 3.00x3.00 – R2.

Respetada Ing. Dávila:


Por medio de la presente, se remite informe de revisión del diseño estructural de la obra señalada en el asunto, así:

Ítem	Observación
Características del suelo • Capacidad de carga. Capacidad de carga. Se insiste en reporta capacidad de carga admisible, sin diferenciar la capacidad en los estados límite de resistencia, evento extremo y servicio según lo establecido en la CCP-14 , lo cual se puede evidenciar en la siguiente imagen: 2.4. Características del suelo Capacidad de trabajo: Qa=20.00Tf/m2 a una profundidad de desplante de 4.00m, según estudio de suelos. En el documento denominado *Concepto técnico "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT 3.0x3.0 EN LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA."*, se evidencia reporte de lo solicitado que debe ser validado por el Especialista en Geotecnia de la Interventoría e implementado por el Especialista Estructural en el análisis y diseño. Por lo anterior, se reitera la observación.	• Capacidad de carga. ***Sin atender***. No se realiza ajuste de capacidad de carga según dimensiones del box culvert en estudio. En el documento se sigue haciendo referencia a capacidades de box culvert con 2.00 m de base.

MARIA CAMILA ARENA DE LA HOZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

Ítem	Observación
Casos de carga • General. Se deben considerar los casos de carga contemplados en la Sección 3 de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14, los cuales contemplan para el caso en estudio la carga muerta (DC), la carga por la carpeta de rodadura, cargas por empuje vertical del suelo (EV), carga por empuje horizontal del terreno (EH), carga viva vehicular más impacto (LL+IM), sobrecarga por carga viva (LS), carga por flujo de agua (WA), carga sísmica por empuje lateral del suelo (EQ_{ae}) y carga sísmica por inercia de muro y relleno (EQ_{ir}), estás últimas (EQ), determinadas según lineamientos establecidos en la Sección 11 de la CCP-14. • Carga de viento según Reglamento NSR-10. No aplica al caso en estudio. • Sismo. Los parámetros sísmicos deben ser seleccionados según lo establecido para el efecto en la CCP-14, reiterando que el Reglamento NSR-10 ***no aplica*** al análisis y diseño de estructuras como las del caso en estudio. Adicionalmente, se recuerda que para el caso del box culvert no se requiere análisis sísmico, toda vez que corresponde a una estructura enterrada y para el caso de las aletas el análisis sísmico debe seguir lo dispuesto en la Sección 11 de la CCP-14. • Definición, determinación y asignación de cargas. En la memoria debe quedar expresamente indicada la definición de cada uno de los casos de carga considerados, la determinación de las cargas correspondientes y su asignación al modelo de análisis.	• General. Atendido. Se cambió el software de análisis y diseño, toda vez que el empleado inicialmente (CypeCAD) no contemplaba criterios de análisis y diseño de la AASHTO LRFD y CCP-14. • Carga de viento según Reglamento NSR-10. Atendido. • Sismo. ***Sin atender***. • Definición. Atendido. . Se cambió el software de análisis y diseño, toda vez que el empleado inicialmente (CypeCAD) no contemplaba criterios de análisis y diseño de la AASHTO LRFD y CCP-14.
Parámetros Sísmicos de Diseño • General. Deben ser definidos según lo establecido en la CCP-14 por el Especialista en Geotecnia del Contratista e incluidos en el Estudio de Suelos. • Ángulo de fricción del relleno. Revisar el valor adoptado, toda vez que los materiales utilizados habitualmente como rellenos no presentan ángulo de fricción interna igual a cero ($\phi = 0°$). • Capacidad de carga. Debe ser establecida en los términos de la CCP-14.	• General. ***Sin atender***. • Ángulo de fricción del relleno. Atendido. • Capacidad de carga. ***Sin atender***. • Módulo de reacción vertical. Atendido. . Se cambió el software de análisis y diseño, toda vez que el empleado inicialmente (CypeCAD) no contemplaba criterios de análisis y diseño de la AASHTO LRFD y CCP-14. En el software empleado en esta oportunidad estos parámetros no son requeridos.

MARIA CAMILA ARENA DE LA HOZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

Ítem	Observación
• Módulo de reacción vertical. Debe ser revisado e incluir las respectivas unidades en la que se presenta el valor determinado por el Especialista en Geotecnia del Contratista.	
Método de análisis y diseño • Software. Validar que el software utilizado contemple de manera integral las disposiciones de análisis y diseño de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14 o en su defecto las AASHTO LRFD 2012/2014.	• Software. Atendido. . Se cambió el software de análisis y diseño, toda vez que el empleado inicialmente (CypeCAD) no contemplaba criterios de análisis y diseño de la AASHTO LRFD y CCP-14.
Datos de entrada	Teniendo En Cuenta Que Se Emplea Otro Software De Análisis Y Diseño, Se Presentan Observaciones A La Entrada De Datos, Así: • Capacidades De Carga. No se encuentran debidamente soportadas Por Estudio de Suelos. • Constantes Sísmicas. No se encuentran debidamente soportadas por Estudio de Suelos. • Constantes de diseño. El refuerzo secundario puede ser #3 y cumple con los requerimientos de resistencia y servicio. La separación máxima definida para acero principal y segundario no se ajusta a lo dispuesto por la CCP-14 y redunda en el sobredimensionamiento de las cuantías de refuerzo. Se debe ajustar lo pertinente y optimizar el diseño. • Constantes carga de suelo. El Kmiu = 0.14 no corresponde a ningún tipo de material. 
Aleta	• Carga actuante y estabilidad. No se presentan los respectivos reportes. • Constantes de diseño. No se presentan. • Diseño. Solo se presentan los reportes con solicitaciones. Se deben presentar reportes de siseño para los estados límite de resistencia y evento extremo.

MARIA CAMILA ARENA DE LA HOZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

Ítem	Observación
Análisis y diseño box y aletas	Debe ser revisado en su totalidad de acuerdo con la implementación de las observaciones planteadas en el presente documento.
Planos • Implantación. Se debe incluir implantación topográfica del box culvert para establecer alturas de relleno y así validar las cargas correspondientes. • Geometría aletas. Revisar dimensiones, toda vez que lo que se mide en planta no es consistente con lo presentado en secciones transversales. Adicionalmente, evaluar la conveniencia de integrar las aletas al box culvert y la consideración de solera para evitar problemas de socavación. • Formato. Se solicita que los planos sean remitidos en formato CAD parara facilitar y agilizar el proceso de revisión.	• Implantación. ***Sin atender y/o aclarar***. • Geometría aletas. Atendido, sin emabrgo, se debe revisar de Acuerdo con la implementación de las observaciones planteadas en el presente documento.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda requerir al Contratista la revisión y atención de las observaciones planteadas en el presente documento, emitiendo respuesta escrita a cada una.



MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
INGENIERA CIVIL
MIC – Estructuras
M.P: 25202-236260

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGENIERIA Y CONSULTORIA
INGECON SAS

ELABORÓ	**REVISÓ**
YOVANY ALBERTO ELORZA	Ing. ANGELA MARIA DAVILA
PROFESIONAL AMBIENTAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3
2 OBJETIVOS 3
3 LOCALIZACION 4
4 GENERALIDADES 4
4.1 Información contrato de interventoría 4
4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 5
4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL MES 5
4.3.1 CTO.159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA 5
4.3.2 CTO. LP 006 de 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 8
5 CONCLUSIONES 8

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito realizar acompañamiento, verificación y seguimiento al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental presentado por los contratistas de obra a cada uno de los municipios a cargo y la implementación de este desde las diferentes actividades desarrolladas por el contratista de obra durante el período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2025 en los en los municipios de Planeta Rica, Los Córdobas y San Bernardo del viento.

2 OBJETIVOS

- Presentar el informe de actividades realizadas durante el desarrollo del contrato de obra No. LP 008 de 2023, No.159-2023 y No. LP 006-2023 en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2025, tendientes a garantizar la ejecución del proyecto.

- Mostrar el reporte de la vigilancia y control adelantado por la Interventoría en cuanto a la gestión ambiental realizada por lo contratistas de obra.

- Verificar que la totalidad de las actividades del Contratista en materia ambiental, se realicen en dirección al cumplimiento del contrato, leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales y guías vigentes.

3 LOCALIZACION

El proyecto a ejecutar se localiza en los municipios de Planeta Rica, Los Cordobas y San Bernardo del Viento.

imagen 1. Localización del proyecto



4 GENERALIDADES

4.1 Información contrato de interventoría

CONTRATANTE:	CONSORCIO INGECON-INCO
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($2.219.000.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
ORDEN DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGAS:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ADICIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DEL 2025

4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023		
CONSORCIO PROVIDENCIA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO	5%	COLOMBIA
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	85%	COLOMBIA
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	COLOMBIA

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023		
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN	10%	COLOMBIA
E INGCARQ S.A.S	90%	COLOMBIA

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023		
CONSORCIO L&S		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
LA COMERCIALA S.A.S	50%	COLOMBIA
SIS ORGANIZATION S.A.S	50%	COLOMBIA

4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL MES

4.3.1 CTO.159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA

El contratista en comunicado OFI-CONS-092-2025 del 12 de agosto del 2025, presenta el informe de julio del 2025.

Mediante comunicado OFI-CONS-104-2025 del 22 de septiembre del 2025, el contratista presenta el informe de agosto del 2025.

Asi mismo, en resolución 1085 del 22 de septiembre del 2025, la CVS otorgo permiso de ocupación de cauce del Box-Coulvert con aleta y muro de contención y resolución 1095 del 22 de septiembre del 2025, permiso de ocupación de cauce para la Alcantarilla triple aguas arriba en la abscisa K3+540.

ACTIVIDADES DE OBRA

Se contaron con paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

Se realizo acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera Jomeve en ciénaga de oro.

Se realizo acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

Se realiza fundida de pavimento rígido mr-38 premezclado, desde la abscisa k5+200 a k5+620 (carril derecho).

Se toman muestras de concreto (viguetas) para ensayos de resistencia

Se realiza limpieza y sello de la junta de dilatación del pavimento construido.

Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.


Se realizan cortes, demoliciones y retiro de escombros de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.

Se realiza limpieza, perforación en las losas para anclar el acero, armado e instalación de parrilla en las losas a reparar.

Se realiza fundida de pavimento rigido mr38 premezclado para reparación de 8 losas fracturadas

Se realiza seguimiento a las actividades ambientales:


PUNTO ECOLÓGICO
RESIDUOS NO APROVECHABLES
RESIDUOS APROVECHABLES
PLÁSTICO - CARTÓN - VIDRIO
PAPEL - METALES

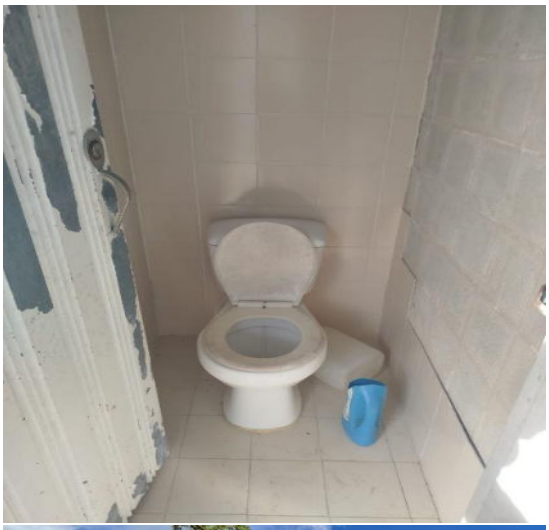






9/09/25 10:29 a.m.
Vía - providencia


8/09/25 3:33 p.m.
Vía - providencia





CTO. LP-MSBV-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, en comunicado 129-2025 del 19 de agosto del 2025, remitió los informes ambientales pendientes de abril y mayo del 2025, estando pendiente la entrega del balance ambiental con el cierre de las actividades con sus respectivos soportes.

A corte del mes de septiembre del 2025, el contratista no ha presentado el Balance ambiental.

4.3.2 CTO. LP 006 de 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, mediante correo del 29 de julio del 2025 presento el Balance ambiental, el cual, se encuentra en revisión de la interventoría.

5 CONCLUSIONES

Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita y el contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente la entrega de informes ambientales y balance ambiental con sus respectivos soportes.

El contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, en el mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista a la fecha solo ha presentado los informes ambientales hasta el mes de marzo del 2025.

DAVID GUILLERMO TAMAYO GUERRERO

INFORME HIDRÁULICO

DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DE LOS MUROS DE CONTENCION UBICADOS EN LOS k3 + 980 Y EN EL K4 +190 DE LA VIA A PROVIDENCIA

Fecha del informe: 1 de septiembre de 2025
Ubicación del proyecto: MUNICIPIO DE PLANETA RICA, TRAMO PROVIDENCIA, CONSORCIO PROVIDENCIA

ELABORADO POR: CONSORCIO INGECON – INCO

1 DE SEPTIEMBRE 2025

1. ANTECEDENTES

Durante el desarrollo del contrato en el tramo Via Providencia, y de acuerdo a solicitud realizada por parte de la Alcaldia Municipal de Planeta Rica, actuando como ordenador del gasto, se solicito la ejecución de un tramo vial, que inicialmente no hacia parte de lo establecido en las metas físicas pero estaba incorporando dentro del tramo a intervenir, según lo informado por el contratista se hace necesario una solución hidráulica en la abscisa K5+900 con el fin de minimizar riesgos de desbordamiento, erosión y daños en la estructura vial a ejecutarse, por lo cual el Consorcio Providencia plantea la ejecución de un box coulvert de 3x3, asi mismo se plantea en manejo del as aguas lluvias en aproximadamente 800 metros de pavimento rigido a ejecutarse, de acuerdo a lo anterior, se recibió para revisión la información que se describe a continuación:

Que se compone del informe de la siguiente información:

ANEXO 1 análisis de la cuenca

ANEXO 2 hidro estadística estación planeta rica

ANEXO 3 Curvas IDF Hietograma

ANEXO 4 Datos originales estación Planeta rica

ANEXO 5 HECRAS Muro

ANEXO 6 Mapas

ANEXO 7 Topografía

ANEXO 8 Planos Red Pluvial

El presente informe corresponde a la verificación de la información aportada por el Consorcio Providencia.

Una vez revisada la información presentada identificada como estructura E1, no se identifica con una ubicación localizada sobre la vía solo se mencionan las coordenadas de dicha estructura 1423358 Norte y 846617 este, donde se plantea el reemplazo de una alcantarilla doble por un box coulvert de dimensión 3*3 y de una longitud de 6 m que cruza la vía en dicho punto.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se verifican las condiciones de la hidrología de la zona donde se identifica que la información hidrológica para el diseño fue obtenida de la estación PLANETA RICA,

lo anterior debido a que la totalidad de las dos cuencas a estudiar se encuentran dentro del polígono de Thiessen correspondiente a esta estación.

Variables de Diseño	Análisis
Numero de Estructura	Estructura E-1
Abscisas de localizacion de estrcuturas	-
Tipo de estructura	Box Culvert
Formato	Aleta-Aleta
Área de Drenaje	CUENCA A-1
Caudal de diseño (Desing Flow) (m3/s)	16.658
Geometría del canal (Channel Type)	-
Ancho de la base del canal a la salida (Botton Width) (m)	2.00
Relación del talud del canal (Side Slope)	1.5H / 1.0V
Pendiente del canal aguas abajo (Channel Slope) (m/m)	0.004
Coeficiente de rugosidad del canal (Mannig's Channel)	0.040
Cota a la salida de la estructura (Channel Invert Elevation) (msnm)	68.94
Abscisa de la estructura respecto a la vía (First Roadway Station)	-
Longitud de la cresta (Crest Leght) (m)	6.00
Cota de la corona de la vía (Crest Elevation) (msnm)	71.90
Material carpeta de la estructura (Roadway Suerface)	Paved
Ancho de la estructura sobre la vía (Top Width) (m)	5.00
Diametro (Diameter) (mm)	N/A
Ancho de la estructura (Span) (mm)	2500
Altura de la estructura (Rise) (mm)	2500
Coeficiente de rugosidad de la estructura(Mannin's)	0.02
Tipo de estructura (Culvert Type) = Side – Tapered	Box Culvert
Angulo entre salida del agua y aleta (Tapered Inlet Edge) (26-45°)	45°
Ancho final de aletas (Face Width) (mm)	3780
Talud de las aletas (Side Taper 4:1 to 6:1)	4.00
Abscisa a la entrada de la estructura (Inlet Station)	K0+000.00
Cota a la entrada de la estructura (Inlet Elevation) (msnm)	69.00
Abscisa a la salida de la estructura (Outlet Station)	K0+006.00
Cota a la salida de la estructura (Outlet Elevation) (msnm)	68.94
Numero de Estructuras	1
Pendiente de la estructura (Slope) (m/m)	0.010

Tabla Elaborada por Consorcio Providencia

Se aprueban entonces los parámetros del estudio hidrológico, el cual da como resultado un caudal de 20.86 m3/s, por lo tanto, se define que la estructura existente no tiene la capacidad por lo tanto debe ser reemplazada por una de mayor capacidad, lo siguiente es definir la sección del box coulvert a construir.

Caudal de Descarga (m3/s)		Elevacion Entrada (msnm)	Profundidad de Control (m)		Tipo de Flujo	Tipo de Profundidad Calculada (m)				Velocidad Calculada (m/s)	
Entrada	Box		Entrada	Salida		Normal	Critica	Salida	Aguas Abajo	Salida	Aguas Abajo
Estructura E-1											
0	0	69	0	0	0-NF	0	0	0	0	0	0
2.66	2.66	69.83	0.71	0.83	1-S1t	0.39	0.43	0.8	0.8	1.1	1.03
5.31	5.31	70.25	1.04	1.25	1-S1t	0.61	0.68	1.15	1.15	1.54	1.24
7.97	7.97	70.58	1.37	1.58	1-S1t	0.81	0.9	1.4	1.4	1.89	1.38
10.62	10.62	70.87	1.66	1.87	1-S1t	1	1.08	1.61	1.61	2.19	1.49
13.28	13.28	71.13	1.92	2.13	1-S1t	1.17	1.26	1.8	1.8	2.46	1.58
15.93	15.93	71.38	2.17	2.38	1-S1t	1.34	1.42	1.96	1.96	2.71	1.65
18.59	18.59	71.6	2.41	2.6	1-S1t	1.5	1.58	2.1	2.1	2.95	1.72
20.86	20.86	71.79	2.6	2.79	1-S1t	1.63	1.7	2.22	2.22	3.14	1.77
23.9	23.9	72.03	2.85	3.03	1-S1t	1.81	1.86	2.36	2.36	3.38	1.83
26.55	26.55	72.26	3.26	3.24	5-S1t	1.97	2	2.48	2.48	3.58	1.88

Tabla Elaborada por Consorcio Providencia

Ya identificado el caudal se establece mediante el programa HY8, que la sección requerida es la de 3*3, por lo que se define para la estructura E1 que esta es la sección requerida, valorando el caudal pico que se podría presentar, la cual se recomienda su aprobación y sea construida.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta, la información aportada por el Consorcio Providencia, y una vez valorada por esta Interventoría, se aprueban los diseños presentados correspondientes a reemplazo de alcantarilla por una estructura de mayor capacidad, en este caso box coulvert de 3*3 de 6 metros de longitud, se hace necesario realizar el diseño estructural para que sea presentado al especialista de interventoria, teniendo en cuenta las condiciones aquí planteadas.

Adicionalmente, se comparten con Consorcio Providencia los siguientes aspectos:

- La determinación de los caudales se desarrolló por el modelo precipitación – escorrentía por el método racional ya que las áreas aferentes que afectan el proyecto son menores a 250 Ha.

- El análisis pluviométrico se realizó en función del periodo de retorno seleccionado, el cual obedece a un valor de 25 años para las estructuras tipo box culvert y 50 años para el análisis de sensibilidad.

- La determinación de la geometría de las estructuras hidráulicas tipo box culvert se realizó con base en las dimensiones tipo de la última actualización de 2023 de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS.

- La cota de fondo de la estructura hidráulica tipo box culvert fue definida con base en la cota de fondo del canal natural existente en la zona de salida, con el fin de asegurar una adecuada continuidad hidráulica y evitar desniveles que puedan generar efectos negativos como depósitos de sedimentos, erosión regresiva o pérdida de eficiencia en el descole. Esta metodología permite garantizar que la estructura opere de manera eficiente bajo las condiciones actuales del terreno, facilitando la transición del flujo entre la obra y el cauce receptor, y minimizando impactos en el entorno inmediato.


- Con base en los antecedentes observados en el tramo vial cercano a la estructura hidráulica, y considerando los niveles de inundación reportados durante eventos de precipitación extrema, se concluye que existe un riesgo potencial de desbordamiento de las escorrentías y afectación directa a la vía. Por lo tanto, se recomienda que, en el desarrollo del diseño geométrico definitivo, se contemple que la rasante del eje de diseño de la vía se sitúe al menos 50 cm por encima del nivel máximo de inundación estimado, con el fin de prevenir anegamientos, garantizar la operatividad del corredor vial en condiciones críticas y proteger la infraestructura ante eventos hidrológicos extremos. Este criterio debe integrarse como una medida de adaptación y mitigación ante el riesgo de inundación en este tramo específico.

- La longitud de la estructura hidráulica tipo box culvert es de 3.00x3.00 y fue definida en 6 metros, considerando que el ancho actual de la vía es de aproximadamente de 5 metros, según lo reportado. Esta longitud permite cubrir el ancho de calzada y disponer una adecuada zona de transición y apoyo estructural.

- En caso de requerirse algún ajuste en el proceso constructivo, se debe realizar la validación correspondiente con el consultor y su posterior remisión a la interventoría para su aval final, con el fin de garantizar siempre, la correcta verificación de la capacidad hidráulica.

Sin otro particular,

CORDIALMENTE,



DAVID GUILLERMO TAMAYO GUERRERO
Especialista en Recursos Hídricos
C.c. 79.799.948

5.3.2 INFORMES PROFESIONALES.

NIT. 901.783.007-9

INFORME EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DEL 2023

PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Directora de Interventoría	Supervisor del INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
Bogotá - Colombia

1 INTRODUCCIÓN.

Durante el periodo, correspondiente al 1 al 30 de septiembre de 2025, en el presente informe se presentan las principales actividades desarrolladas por la dirección de la Interventoría en el cumplimiento de sus funciones para el contrato de interventoría No. 5053 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1 y que tiene a cargo el seguimiento y control de tres contratos de obra:

- Contrato de obra No. 159 de 2023. Contratista: Consorcio Providencia. Contratante: Municipio de Planeta Rica
- Contrato de obra No. LP-006 DE 2023. Contratista: Consorcio Pavimiento Via Barranquillita. Contratante: Municipio de Los Cordobas.
- Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023. Contratista: Consorcio L&S. Contratante: Municipio de San Bernardo del Viento.

2. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las obligaciones correspondientes al cargo de director de Interventoría para el contrato de interventoria No. 5053 de 2023.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Durante el presente periodo, la dirección de interventoría:

- Se realiza solicitud formal de cumplimiento de forma de pago del contrato de interventoría.

- Se atienden requerimientos de la entidad, respecto a información de avance de cada uno de los contratos.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta conjunta suscrita entre el instituto y la alcaldía de Los Cordobas.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta conjunta suscrita entre el instituto y la alcaldía de San Bernarndo del Viento.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta conjunta suscrita entre el instituto y la alcaldía de Planeta Rica.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta del anticipo del contrato de obra de obra consorcio Providencia.

- Se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de Consorcio Providencia (Planeta Rica) correspondiente a la etapa de obra.

- Se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de Consorcio Providencia (Planeta Rica) correspondiente a los estudios y diseños del nuevo tramo designado por la alcaldía para completar la meta física del contrato, tramo que se encuentra dentro del corredor del contrato.

- Se realiza seguimiento a actividades desarrolladas por el contratista Consorcio Pavimento Via Barranquillita (Los Cordobas) correspondiente a la etapa de recibo de obra.

- Se realiza seguimiento a actividades en campo desarrolladas por el contratista Consorcio L&S (San Bernardo del Viento) correspondiente a la etapa de recibo de obra.

- Programó, desarrolló y lidero los comités semanales de seguimiento realizados conjuntamente con el consorcio providencia.

NIT. 901.783.007-9

- Revisó y verificó las actas de costos presentadas al Instituto correspondientes al contrato de Interventoría.

- Atendió los requerimientos realizados por el instituto, tales como comunicados y/o convocatorias a reuniones y mesas de trabajo.

- Dio cumplimiento a las obligaciones en materia legal, técnica, ambiental social, SST establecidas en el Manual de Interventoría.

- Requirió a cada uno de los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones establecidas tanto en el contrato como en el convenio, de acuerdo a los lineamientos del Instituto.

- Participo en comités con la comunidad de Providencia (Planeta Rica) para darles claridad sobre aspectos relevantes de la obra.

- Suscribió cheques para giros de recursos para el pago de actas de recibo parcial de obra para el contrato de Consorcio Providencia.

ANGELA MARIA DAVILA M
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
TP 17202-153798 CLD

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA **FECHA:**

DD	MM	AA
30	09	2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 5053 de 2023


Desde: 01 09 2025 Hasta: 30 09 2025

Nombre: Vicente Carlos Urzola Badel Cargo: Residente de Interventoría

No.	Actividades realizadas durante el mes de septiembre 2025	Observaciones
1	Elaboración de diferente comunicados remitidos al contratista	Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra. Donde se registran los diferentes requerimientos para el seguimiento y desarrollo del proyecto.
2	Diligenciamiento de bitácora de obra	se registraron las actividades diarias, equipos utilizados, observaciones, indicaciones, registros de lluvias, etc. del mes de septiembre de 2025.
3	Revisión de cantidades de obra	Se revisan las cantidades ejecutadas durante el periodo de 01 al 30 de septiembre de 2025.
4	Revisión del balance de obra	Se revisa balance de obra, en archivos editables previo para firma de los representantes legales y para envío los documentos de las cuentas por pagar.
5	Actualización de cantidades de obra	De manera diaria se lleva el control de las cantidades de obra, tomados del registro diario de las actividades ejecutadas en obra, por lo que se actualiza el consolidado de las cantidades ejecutadas.
7	Control de avance de obra.	Se entrega de manera semanal el control de los avances de obra con respecto a la inversión programada aprobada, el cual quedaron registrado en los informes semanales: No. 83 . No. 84 . No. 85 . No. 86 y 87
8	Elaboración del informe mensual de interventoría	Se realiza informe mensual mes de septiembre 2025, con anexos, que entrega al INVIAS.

9	Recorridos diario a la vía	Se realiza visita permanente en los corredores viales, se ejecutaron: Construcción de bermacunetas, suministro, extendida y compactación de subbase granular, y construcción de pavimento rigido MR38, etc..

No.	Actividades realizadas durante el mes de septiembre 2025	Observaciones
10	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	Se revisa los ensayos de control de caracterización de afirmado y subbase granular; en el mes de septiembre 2025.
11	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	Los resultados se registran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.
12	Se realiza registro fílmico y fotografías de avance	Se presenta el registro del frente de obra.
13	APU no previsto	Se presentaron apu de item no previstos y se firma acta de pactación de precios.

Firma: 

Vicente Urzola Badel
T.P: 22202215754COR

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

SEPTIEMBRE 2025

PROYECTO: CONTRATO INTERVENTORIA N. 5053 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

El alcance de los programas a implementar dentro de la gestión social estipulados en el PAGA – Componente social se encuentra a continuación:

1. Subprograma y/o Proyecto: Atención a la Comunidad
2. Subprograma y/o Proyecto: Información y Divulgación.
3. Subprograma y/o Proyecto: Cultura Vial y Participación Comunitaria.
4. Subprograma y/o Proyecto: Inclusión Social con perspectiva de género y transversalización
5. Subprograma y/o Proyecto: Infraestructura de predios
6. Subprograma y/o Proyecto: Contratación de mano de obra con enfoque de género de derecho y diferencial.
7. Subprograma y/o Proyecto: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

1. SUBPROGRAMA Y/OPROYECTO: DE ATENCION A LA COMUNIDAD

El contratista del proyecto Pavimento Vía Providencia permanece con la instalación de buzón móvil en el área de influencia del proyecto, en aras de garantizar la atención oportuna a los ciudadanos a las quejas, reclamos, solicitudes y peticiones que surjan en el marco del proyecto.

INDICADOR DE GESTIÓN

A fecha el consorcio Providencia ha recibido ocho (8) PQRS, de las cuales CINCO (5) se les dio respuesta, (1) se encuentran en tramité y (2) ingresaron recientemente, se espera que el contratista tramita en los tiempos establecidos.

INDICADOR	UND	%	OBSERVACIONES
Número de solicitudes recibidas/Número de solicitudes respondidas satisfactoriamente	8	%	Se espera atención oportuna por parte del contratista en caso dado de presentarse PQRS.

Procesos de atención PQRS a la fecha por atender:

1. Solicitud por Jorge Luis Arango quintero, pago arrendamiento centro de acopio de material de

subbase. El contratista realizó acuerdo de pago con el señor Jorge Luis, desde la interventoría se hace seguimiento y se espera que se haga el respectivo pago para darle cierre al trámite a la mayor brevedad.

2. Solicitud pago liquidación laboral de la señora Paola Yulieth Pacheco García por la vinculación laboral al Consorcio Providencia desde el 13 de enero de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2025.
3. Solicitud pago liquidación laboral de la señora Luisa Fernanda Sierra Martínez por la vinculación laboral al Consorcio Providencia desde el 04 de julio de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2025.

4. SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a las actividades de información y divulgación dirigidas a las comunidades de los proyectos y/o contratos asociados a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

El consorcio Providencia a través de grupo de WhatsApp extiende la invitación para el desarrollo del comité de la veeduría correspondiente al mes de septiembre de 2025.

SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO: CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA.

Capacitaciones y/o charlas

En el mes de septiembre el contratista Consorcio Providencia a través del componente social realizó las siguientes charlas:

1. Charla: Charla Trabajo en Equipo dirigida al equipo de trabajo
2. Charla: Charla Participación Comunitaria, trabajo en equipo, liderazgo y acciones por la seguridad vial (veeduría ciudadana)

Reuniones - Comités con la veeduría ciudadana

El Consorcio Providencia, realizó comité con la veeduría ciudadana correspondiente al mes de septiembre de 2025, con el fin de informar el avance de las obras y a su vez generar un espacio de conversación con los miembros de la veeduría para escuchar sus inquietudes, solicitudes y

aportes. Además, se realizó recorrido en obra (tramo 2) para identificar los avances de esta.

SUBPROGRAMA/PROYECTO: INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN.

Se hace seguimiento a la permanencia o aumentó a la vinculación de hombres y mujeres del área de influencia en igualdad de condiciones, toda vez que se requiere de la participación a los habitantes de la población de manera equitativa, promoviendo el empleo temporal, lo cual contribuye a mejorar las condiciones económicas de las comunidades.

Espacios educativos para la inclusión social

Durante el periodo el contratista Consorcio Providencia no adelantó charlas asociadas a la inclusión social.

5. SUBPROGRAMA/PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

Levantamiento de Actas de Vecindad

Durante el periodo el Consorcio Providencia hizo entrega de 42 actas de vecindad de cierre (tramo Balastrera 1), con las cuales se verifica el estado actual de estos. Las actas de vecindad fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

INDICADOR DE GESTIÓN

Actas de vecindad levantadas de inicio	Corredor	Total
59 tramos 1 y 2 - Providencia	*Vereda Providencia del municipio de Planeta Rica – Córdoba	59 actas levantadas y aprobadas
Actas de vecindad levantadas de cierre	**Corredor**	**Total**
42 actas tramo 1 (La Balastrera 1)	La Balastrera 1	42 actas levantadas y aprobadas.

6. SUBPROGRAMA/PROYECTO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHO Y DIFERENCIAL.

Se hace seguimiento a la permanencia o aumento a la contratación de mano de obra con enfoque de género, es decir la participación de mujeres cabeza de hogar, jóvenes, personas en situación de discapacidad y miembros de las comunidades indígenas, toda vez que se requiere la

participación de la población diferencial, lo que permite visibilizar el reconocimiento de derechos y eliminación de barreras, obstáculos, discriminación, prejuicios e imaginarios que impiden el acceso y garantía y capacidad para hacer un ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones y oportunidades.

7. SUBPROGRAMA/PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA CON COMUNIDADES ÉTNICAS.

En el mes de septiembre, no se adelantaron gestiones asociadas a la identificación de comunidades indígenas, ya que en los periodos pasados el contratista realizó la gestión respectiva, cuya indagación realizada a través de las entidades competentes no certificaron presencia de comunidades indígenas localizadas en el área directa de intervención del proyecto donde se tuviera que adelantar proceso de consulta previa.

OBSERVACIONES:



- En el transcurso del periodo se solicita el cumplimiento de actividades asociadas a los programas y/ proyectos descritos en el PAGA – Componente Social.
- Seguimiento a la entrega del informe social por parte del contratista, el cual debe ser entregado de manera mensual en los formatos autorizados por INVIAS, con sus respetivos soportes
- De manera permanente se dispone la participación para el acompañamiento y seguimiento a las actividades programadas por parte del contratista.



LEIDY MARCELA GIL GONZÁLEZ
Profesional Social – Interventoría
Registro Profesional: 26035741

INFORME TOPOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023

Título Documento	**INFORME TOPOGRAFICO DE INTERVENTORÍA**	
Responsable de elaboración	**Nombre:**	**ERIK DAVID CUADRADO LÓPEZ**
Cargo: Topógrafo	**Firma:**	
Responsable por revisión	**Nombre:**	**VICENTE URZOLA BADEL**
Cargo: Ingeniero residente	**Firma:**	
Responsable de Aprobación	**Nombre**	**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Cargo: Directora Interventoría	**Firma:**	
Fecha:	**SEPTIEMBRE – 2025**	

INFORME MENSUAL TOPOGRAFICO No 20.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

OBJETIVOS

El objetivo del Estudio Topográfico es proporcionar información básica y necesaria basada en informes recopilados y evaluados, en data topográfica tomada en campo y procesada en gabinete de la topografía, cartografía, elementos estructurales, y demás de la zona materia del estudio.

INTRODUCCION

EL CONSORCIO INGECON-INCO, presenta al Instituto Nacional de Vías, el ***Informe Mensual deTopografía No 20,*** *correspondiente al periodo comprendido entre el* ***01 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2025****, el cual contiene las actividades realizadas por la comisión topográfica y el seguimiento efectuado por la misma a las actividades topográficas realizadas por los contratistas de obra en los diferentes frentes de trabajo que componen el alcance del objeto contractual del contrato de Interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.*



LOCALIZACIÓN

El contrato de interventoría se encuentra enmarcado en la ejecución, administrado por el Instituto nacional de vías – INVIAS. Las actividades topográficas se desarrollan en diferentes vías de la zona rural del departamento de Córdoba. Para la fecha del presente informe los proyectos donde se desarrollaron las actividades topográficas son la Siguientes: Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba.



Figura 1. Ubicación frentes de trabajo.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

Es el conjunto de operaciones y procedimientos utilizados para determinar la posición de puntos sobre la superficie contemplando las elevaciones que tiene el terreno, sobre un plano de referencia. No se considera la verdadera forma de la tierra, sino que se supone esta como en una superficie plana; en caso de tomar medidas de ángulos, estos se consideran planos.

NIVELACION GEOMETRICA SIMPLE: *Es aquella en la cual desde un punto o una sola posición del aparato se puede conocer las cotas o elevaciones de los diferentes puntos que deseamos nivelar. En este se sitúa el nivel en el punto más conveniente el cual ofrezca mejores condiciones de visibilidad.se va leyendo la mira sobre los puntos. Las diferencias de lectura de mira darán el desnivel entre los puntos.*

NIVELACION GEOMETRICA COMPUESTA: *Es una cadena de mediciones simples. Con la única diferencia que el aparato se plantara más de una vez, es necesario tomar una serie de puntos intermedios (de cambio), obteniéndose el desnivel entre cada dos consecutivos. Los puntos cuyo desnivel se desea conocer serán los extremos del camino a recorrer (itinerario) y deben estar materializados en el terreno de acuerdo con el tiempo que vayan a ser utilizados (mojón, estaca, accidente natural o artificial, etc.) y ser fácilmente localizables.*

CONCEPTOS CLAVES.

Altura instrumental: *Es aquella elevación del nivel o equipo de medición utilizado, a partir de una superficie de referencia conocida.*

Cota: *Es la altura entre un punto y un determinado nivel de referencia.*

Puntos de cambio: *Es un punto intermedio en el cual se hacen dos referencias, una adelante y una hacia atrás.*

Vista adelante: *Es la lectura que se toma en el punto el cual queremos saber su elevación, generalmente se usa cuando se hace un punto de cambio.*

Vista atrás: *Es una lectura realizada sobre el BM o un punto de referencia fija.*

Vista intermedia: *Es la lectura que se le realiza a puntos cuya altura queremos saber.*

ECUACIONES.

Cálculo de alturas instrumentales:

$$Hi = BM + Vista\ atras$$

Cálculo de cotas: *Para el cálculo de cotas se utiliza la siguiente ecuación.*

$$V1 = Hi - Vista\ intermedia$$

Como se realizaron punto de cambios para poder calcular sus cotas se utilizó la siguiente ecuación:

$$PC = Hi - V.adelante$$

EQUIPOS UTILIZADOS.

Nivel Topcon AT - G6: *Equipo encargado de medir los desniveles que existen en un terreno entre determinados puntos que se encuentran en diferentes alturas.*



Figura 2. Nivel topográfico.

Trípode: *Se utiliza para sostener el nivel o la estación total, consta de tres patas plegables y graduables.*



Figura 3. Trípode

Mira: *Se utiliza para medir distancias verticales a un punto determinado que está ubicado en el terreno.*



Figura 4. Mira topográfica.

Cinta métrica: *Con este instrumento se pueden medir las distancias horizontales del terreno.*



Figura 5. Cinta métrica.

RADIACION.

El método de radiación es el método comúnmente empleado en levantamientos de superficies de mediana y gran extensión, en zonas topográficas accidenta con vegetación espesa. Este método se apoya en una poligonal base previamente levantada a partir de cuyos vértices se hacen radiacionesa fin de determinar la ubicación o coordenadas (X, Y, H) desde un punto fijo para situar los puntos de relleno y detalles. Tomando nota de las lecturas acimutales, cenitales, distancia de los diferentes puntos y la altura del instrumento. Los datos previos que requiere el método son las coordenadas del punto de estación y el acimut (o las coordenadas, que permitirán deducirlo) de al menos una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos topográficos anteriores, estos datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo, si los resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden estar en cualquier sistema, estos datos previos podrán ser arbitrarios.

Radiación Simple: *Consiste en hacer un barrido horizontal con el anteojo de la estación, para realizarla medición de todos los puntos que constituyan la superficie a medir. Esté método tiene la necesidadde exigir visibilidad desde el punto de estacionamiento a todos aquellos puntos que definan la superficie a estudiar o levantar.*

Radiación Compuesta: *Esto se realiza tomando lecturas de los ángulos horizontales, distancia entre puntos y altura instrumental. Con diferencia a el sistema de levantamiento por radiación es simple, que se toman puntos por lo general fuera de la poligonal (deltas) que sirven de transición para lograr una visualización del terreno cuando se encuentran obstáculos que no permitan la visibilidad de la zona y se emplea si el área de terreno es relativamente pequeña.*

CONCEPTOS CLAVES.

Angulo de deflexión: *Es el ángulo que forma una línea de una poligonal con la prolongación de una línea inmediatamente anterior. Los ángulos de deflexión se consideran positivos (+) cuando la poligonal deflacta hacia la derecha y negativos (-) cuando deflacta a la izquierda.*

Azimut: *Es en ángulo medida respecto a un norte real o arbitrario en sentido de las manecillas del reloj en un rango de 0°-360°. Se usa para determinar orientaciones en un sistema de triangulación.*

Coordenadas: *Conjunto de puntos y valores que permiten definir de manera precisa la ubicación de un en el espacio, generalmente sobre los ejes "X" y "Y" y si se requiere un espacio tridimensional se utiliza el "Z".*

Distancias: *Es una medida longitudinal que separa 2 o más puntos.*

Mojón: *Construcción realizada en la superficie terrestre a fin de materializar e indicar la posición de un punto en el terreno.*

Poligonales: *Es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones son determinadas a partir de mediciones en campo.*

Poligonal Abierta: *Las líneas no regresan al punto de partida.*

Poligonal Cerrada: *Las líneas regresan al punto de partida, formándose así un polígono cerrado geométrica y analíticamente.*

Rumbo: *Es el ángulo medido con respecto al meridiano Norte -Sur tomando en el sentido Este-Oesteen un rango de 0°-90°.*

ECUACIONES.

Los cálculos de coordenadas de un punto radiado, P, desde una determinada estación, E, se realiza mediante el paso de coordenadas polares (azimut y distancia reducida) a rectangulares (coordenadas ΔX, ΔY)

$$X_c = X_a + D_{ac} * Sen\ (Azimut_{ac})$$

$$Y_c = Y_a + D_{ac} * Cos\ (Azimut_{ac})$$

EQUIPOS UTILIZADOS.

Estación total GEOMAX ZOOM 10: *Este instrumento se utiliza para medir distancias y ángulos, acimuts, también guarda información en tiempo real.*



Figura 6. Estación total

Jalones: *Se utiliza para determinar la localización de un punto en el terreno o para indicar la direcciónde un punto a otro.*



Figura 7. Jalón

Prisma: *Se utiliza para devolver la señal enviada por el láser de la estación total y así obtener las coordenadas del ponto donde este se encuentra.*



Figura 8. Prisma.

Estacas de madera: *Son objetos largos y afilados que se clavan en el suelo, se usan intención demarcar de los deltas o puntos de interés para la nivelación.*



Figura 9. Estaca de madera.

Pintura y brocha: *Una brocha es un instrumento que tiene cerdas unidas por medio de un mango que se utiliza para pintar, mientras que la pintura es una sustancia o producto de textura líquida o espesa con que se da color a una cosa, permitiendo que la demarcación se observe con mayor claridad.*



Figura 10. Pintura y Brocha.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Actividad realizada: Nivelación y Replanteo topográfico.

La nivelación y el levantamiento topográfico es la ubicación de todos los puntos necesarios para poder materializar los ejes principales del proyecto en el terreno, así como los linderos del mismo. La nivelación se inicia tomando unpunto de referencia conocido, este puede ser un lindero, una carretera, la esquina de una construcción, entre otros.

Luego de haber replanteado o trazados los ejes, y verificar que todo estuviera acorde a lo que está diseñado, se procede a realizar las actividades de conformación de calzada existente y excavación de la explanación

La conformación de calzada existente y las excavaciones de la explanación, comprende el conjunto de actividades necesarias para la remoción de terreno natural, adicional al desmonte, limpieza y descapote, con el fin de alcanzar las cotas requeridas del Proyecto.Esto también incluye las tareas de desagüe, bombeo, drenado, entibado y apuntalamiento (si se requiere) que sea necesario realizar. Además, incluye la correcta disposición del material excavado en los lugares autorizados. Se entenderá por líneas de excavación, las líneas límite horizontal, verticalo inclinadas, acotadas en los planos, definiendo las dimensiones de las secciones longitudinales y transversales de las excavaciones.

Este chequeo se realiza por medio de una nivelación, es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Entendiéndose por elevación o altitud a la distancia vertical medida desde una superficie de referencia hasta el punto considerado.

Luego de tener abscisa da la vía nos guiamos con la cartera del diseño, y usando un nivel topográfico. Se realiza el chequeo de la vía, tomando las cotas de los laterales y los ejes en cada una de las abscisas, esto con el fin de comprobar si se está haciendo el corte de manera adecuada.

ANEXO CARTERAS TOPOGRAFICAS.

- **Cartera de chequeo AFIRMADO frente de obra Planeta Rica – Vía Providencia.**

Se realizo verificación de niveles de SUBBASE borde DERECHO Y EJE Desde el K5+050 hasta K5+430.

CARTERA DE SUBBASE, FRENTE PLANETA RICA - VIA PROVIDENCIA.													
ABS	COTAS DE RASANTE			COTAS DE SUBBASE			ALTURA SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
K5+050		75.500	75.445		75.300	75.245		0.20	0.20	0.20	2.75	0.00	0.00
K5+060		75.550	75.495		75.350	75.295		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+070		75.605	75.550		75.405	75.350		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+080		75.660	75.605		75.460	75.405		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+090		75.715	75.660		75.515	75.460		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+100		75.770	75.715		75.570	75.515		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+110		75.785	75.730		75.585	75.530		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+120		75.880	75.825		75.680	75.625		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+130		75.930	75.875		75.730	75.675		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+140		75.975	75.920		75.775	75.720		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+150		76.055	76.000		75.855	75.800		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+160		76.090	76.035		75.890	75.835		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+170		76.138	76.083		75.938	75.883		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+180		76.215	76.160		76.015	75.960		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+190		76.300	76.245		76.100	76.045		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+200		76.400	76.345		76.200	76.145		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+210		76.500	76.445		76.300	76.245		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+220		76.590	76.535		76.390	76.335		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+230		76.700	76.645		76.500	76.445		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+240		76.890	76.835		76.690	76.635		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+250		77.160	77.105		76.960	76.905		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+262		78.660	78.610		78.460	78.410		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+274		79.680	79.630		79.480	79.430		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+286		80.540	80.490		80.340	80.290		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+298		81.140	81.090		80.940	80.890		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+310		81.460	81.410		81.260	81.210		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+322		81.780	81.730		81.580	81.530		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+334		82.040	81.990		81.840	81.790		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+346		82.285	82.235		82.085	82.035		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+358		82.575	82.525		82.375	82.325		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+370		82.865	82.815		82.665	82.615		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+382		83.155	83.105		82.955	82.905		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+394		83.445	83.395		83.245	83.195		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+406		83.750	83.700		83.550	83.500		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+418		84.250	84.200		84.050	84.000		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+430		84.860	84.810		84.660	84.610		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
													192.50

FIRMA: _____

TOPOGRAFO - INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO

- **Cartera de chequeo SUBBASE frente de obra Planeta Rica – Vía Providencia.**

Se realizo verificación de niveles de SUBBASE borde DERECHO y EJE, Desde el K5+430 hasta K5+850.

CARTERA DE SUBBASE, FRENTE PLANETA RICA - VIA PROVIDENCIA.													
ABS	COTAS DE RASANTE			COTAS DE SUBBASE			ALTURA SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
K5+430		84.860	84.810		84.660	84.610		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	0.00
K5+442		85.610	85.560		85.410	85.360		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+454		86.470	86.420		86.270	86.220		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+466		87.350	87.300		87.150	87.100		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+478		88.340	88.290		88.140	88.090		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+490		89.210	89.160		89.010	88.960		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+502		89.460	89.410		89.260	89.210		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+514		89.260	89.210		89.060	89.010		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+526		88.490	88.440		88.290	88.240		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+538		87.790	87.740		87.590	87.540		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+550		87.120	87.070		86.920	86.870		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+562		86.560	86.510		86.360	86.310		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+574		86.070	86.020		85.870	85.820		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+586		85.580	85.530		85.380	85.330		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+598		85.310	85.260		85.110	85.060		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+610		84.970	84.920		84.770	84.720		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+622		84.480	84.430		84.280	84.230		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+634		83.860	83.810		83.660	83.610		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+658		83.210	83.160		83.010	82.960		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+670		82.520	82.470		82.320	82.270		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+682		81.690	81.640		81.490	81.440		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+694		80.820	80.770		80.620	80.570		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+706		79.600	79.550		79.400	79.350		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+718		78.430	78.380		78.230	78.180		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+730		77.200	77.150		77.000	76.950		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+742		75.830	75.780		75.630	75.580		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+754		74.640	74.590		74.440	74.390		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+766		73.730	73.680		73.530	73.480		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+778		73.170	73.120		72.970	72.920		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+790		72.710	72.660		72.510	72.460		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+802		72.390	72.340		72.190	72.140		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+814		72.200	72.150		72.000	71.950		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+826		72.120	72.070		71.920	71.870		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+838		72.040	71.990		71.840	71.790		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
K5+850		71.960	71.910		71.760	71.710		0.20	0.20	0.20	2.75	0.55	5.50
													187.00

FIRMA

TOPOGRAGO INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO

- **REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE OBRA PLANETA RICA / PROVIDENCIA**

.









REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

INFORME SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

CONSORCIO INGECO-INCO

ELABORÓ	**REVISÓ**
Ing. ANGIE VERSOLATTO G.	Ing. ANGELA MARIA DAVILA
INSPECTORA SST	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Tabla Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1 ALCANCE DE INFORME 4
2 LOCALIZACION 5
3 GENERALIDADES 5
3.1 Información contrato de interventoría 5
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 5
4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST 6
4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTAS 6
4.1.1 CTO LP-006 DE 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 6
4.1.2 CTO. 159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA 7
4.1.3 CTO LP-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO 13
4.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA 14
4.2.1 Política SG – SST 14
4.2.2 Estado de personal e ingresos 15
4.2.3 Vehículos 17
4.2.4 Indicadores al SG-SST 17
5 CONCLUSIONES 18

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito realizar acompañamiento, verificación y seguimiento del SG-SST de los contratistas de obra y la implementación de este en las diferentes actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 al 30 septiembre del 2025 en los municipios de los Córdobas, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

A su vez continuar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa Ingeniería Y Consultoría INGECON SAS con el fin de brindar a los trabajadores un ambiente laboral que sea adecuado, cómodo y eficiente, para poder cumplir a cabalidad con las tareas designadas de manera óptima, segura y confiable y mitigar al máximo los peligros a los que se encuentran expuestos.

1 ALCANCE DE INFORME

a) Informe mensual SST de interventoría etapa de obra.

b) Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.

c) Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por los contratistas de obra, donde se verifique el cumplimiento de las actividades de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.

d) Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

e) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral.

f) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social Integral.

2 LOCALIZACION

El proyecto a ejecutar se localiza en los municipios de los Córdobas, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

3 GENERALIDADES

3.1 Información contrato de interventoría

CONTRATANTE:	CONSORCIO INGECON-INCO
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($2.219.000.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
ORDEN DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGAS:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ADICIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	31 OCTUBRE DEL 2025

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023		
CONSORCIO PROVIDENCIA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO	5%	COLOMBIA
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	85%	COLOMBIA
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	COLOMBIA

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023		
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN	10%	COLOMBIA
E INGCARQ S.A.S	90%	COLOMBIA

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023		
CONSORCIO L&S		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
LA COMERCIALA S.A.S	50%	COLOMBIA
SIS ORGANIZATION S.A.S	50%	COLOMBIA

4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST

En el presente informe queda evidenciado el seguimiento que viene realizando la interventoría en el periodo del presente informe, adicionalmente se plasma la gestión que viene realizando cada contratista.

4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTAS.

4.1.1 CTO LP-006 DE 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, para el mes del presente informe realizo las reparaciones a las losas fisuradas.

El contratista tiene pendiente atender las observaciones expuestas en comunicado CING-INV-5053-0182-25 para el informe SST de abril del 2025, no se evidencia las planillas de seguridad social, así mismo, en el informe del mes de mayo del 2025 no se adjunta la planilla de seguridad social del personal que relacionan

A corte del mes de julio, el contratista no ha presentado lo solicitado por interventoría.

4.1.2 CTO. 159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA

Se contaron con paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

Se realizo acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera Jomeve en ciénaga de oro.

Se realizo acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

Se realiza fundida de pavimento rígido mr-38 premezclado, desde la abscisa k5 +200 a k5+620 (carril derecho).

Se toman muestras de concreto (viguetas) para ensayos de resistencia

Se realiza limpieza y sello de la junta de dilatación del pavimento construido.

Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.

se realizan cortes, demoliciones y retiro de escombros de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.

se realiza limpieza, perforación en las losas para anclar el acero, armado e instalación de parrilla en las losas a reparar.

se realiza fundida de pavimento rigido mr38 premezclado para reparación de 8 losas fracturadas

4.1.2.1 Política de SG-SST

El contratista presenta la política de seguridad y salud en el trabajo, prevención de alcohol, tabaco y drogas, las cuales se encuentran publicados en la bodega y fueron socializados a todo el personal vinculado, a través de la inducción SST, se evidencia a continuación.



CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9

POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **CONSORCIO PROVIDENCIA** en sus operaciones de construcción reconoce la importancia del talento humano y se compromete desde el más alto nivel de la organización a:

Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de casa una de las obras que construimos, establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales que puedan surgir en cada una de ellas.

Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los demás requisitos aplicables.

Nuestra política es publicada, divulgada e implementada para asegurar que siga siendo pertinente a medida que se evalúa el desempeño del sistema gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para logarlo, la organización destina los recursos necesarios a nivel económico, tecnológico y el talento humano; con el fin de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación, mediante la mejora continua de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Atentamente,
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C n° 78.034.207 de cerete, Cordoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629-9

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9

Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, reconoce, que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos, que requiere atención en promover entornos de trabajo seguros y hábitos saludables, fomentando el bienestar de sus trabajadores, mediante la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.

La Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas, aplica a todas las personas funcionarios, contratistas, subcontratistas, proveedores directos e indirectos, clientes y visitantes que ingresen y/o permanezcan a la entidad. Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar su efectivo, en igual trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello, la coordinación armónica, así como la formulación y adopción de políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales.

Desarrollo de entornos protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas
La entidad promoverá actividades de sensibilización y de capacitación para los colaboradores, propendiendo por la creación de hábitos y estilos de vida saludables en relación al daño que causa el cigarrillo, bebidas alcohólicas y/o energizantes y sustancias psicoactivas las cuales afectan la salud del individuo y su entorno.

Establecerá medidas preventivas mediante acciones y estrategias de información y educación a sus colaboradores y divulgará esta política a todos los interesados de la organización.

Atentamente,
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C n° 78.034.207 de cerete, Cordoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629-9

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

4.1.2.2 Estado del personal e ingresos

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra laborando para el periodo reportado en obra:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ACTIVO O RETIRADO
José Antonio Sarmiento Espejo	1.038.100.533	Op. Retroexcavadora	6-oct-24	Activo
Eduardo Hoyos Hernández	1.066.746.105	Obrero	01-febre-25	Activo
Robert Emiro Trujillo	15.679.922	obrero	23-ago-25	Activo
Néstor Luis Salgado	1.003.359.117	Topógrafo	5-jun-24	Activo
José Ricardo Ruiz	15.677.277	Dir. Obra	19-jun-24	Activo
Angie Daniela Carrascal	1.066.750.679	SST	30-may-24	Activo
Paola Pacheco García	1.006.726.167	Aux.SST	1.febre-25	Activo
Álvaro José Méndez	1.067.929.146	Op. Vibro compactador		Activo
Luis Antonio Yánez Hernández	1.003.305.026	Cadenero	20-jun-24	Activo
María Camila Tano Hoyos	1.066.748.940	Trabajadora social	20-jun-24	Activo
Luisa Fernanda Sierra	1.066.724.677	Monitora ambiental	20-jun-24	Activo
Daniela Álvarez Acuña	1.066.746.321	Residente obra	02-ago-25	Activo

Jesús Alberto Sierra Moreno	**1.066.720.747**	**Ayudante**	**13-junio-25**	**Activo**
Luis Carlos zapata prado	**11.106.704**	**Obrero**	**17-ago-25**	**Activo**
Carelis Bedoya	**1.006.575.053**	**Ing. administrativa**	**07-junio-07**	**Activo**
Estefany acosta	**1.138.076.010**	**Aux sst**	**07-junio-25**	**Activo**
Melissa lambraño	**1.003.190.690**	**Residente de obra**	**06-ago--25**	**activo**
Gleydis Hernández Trujillo	1.067.293.235	Controladora vial	1-febre-25	Activo
Elizabeth Agames roso	1.133.814.120	Controladora vial	1-febre-25	Activo
Juan Osorio	**15.667.899**	**maestro**	**01-ago-25**	**Activo**
Edickson piñeres	**15.672.097**	**Oficial**	**01-ago-25**	**Activo**
Eufray Bravo Arroyo	**1.064.190.392**	**Ayudante**	**21-ago-25**	**Activo**
David Martínez	**1.064.186.800**	**Oficial**	**01-ago-25**	**Activo**
Víctor Martínez	**1.066.743.723**	**Oficial**	**05-ago-25**	**Activo**
Everney perdomo	**1.003.308.176**	**Ayudante**	**06-ago-25**	**Activo**

Dentro del informe se adjunta la planilla del mes de agosto del 2025 en Anexo 1, dado que el contratista no ha presentando el informe del mes de septiembre del 2025.

4.1.2.3 Programa de Capacitaciones

El contratista no ha presentado las capacitaciones del mes de septiembre, por lo tanto, se reportan las actividades de agosto del 2025:

TEMA DE CAPACITACIONES	FECHA DE CAPACITACIONES
Uso de epp adecuado	04-08-25
Riesgo físico	09-08-25
Operaciones segura de maquinaria	12-08-25
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	16-08-25
Prevención de riesgos químicos	19-08-25
Responsabilidades y acciones en caso de accidentes viales	23-08-25
Riesgo mecánico	25-08-25
Manejo seguro de herramientas	30-08-25

En el anexo 2, se adjunta las actas de capacitación realizadas en el mes de agosto del 2025.

4.1.2.4 Maquinaria

Se evidencio el ingreso de la siguiente maquinaria, relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4:

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MOTONIVELADORA	LIUGONG 4165D	3.7M	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MINICARGADOR	CASE CR220B	1.5M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
PAJARITA	CASE 580N	0.67M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	SD-100D	7TON	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA	UPP086	15M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA	CHEVROLET BSF842	15M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

En el anexo 3, se adjunta los preoperacionales de los vehículos y maquinarias reportados en el mes de agosto del 2025.

4.1.2.5 INDICADORES SG-SST

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de septiembre del 2025, por lo cual, se reportan los indicadores a corte del mes de agosto del 2025:

Indicadores de gestión	Descripción	Formula	Real periodo actual	Real periodo año anterior	Real acumulado	Análisis
Número de accidentes (AT)	Número total de accidentes de trabajo con lesiones a los trabajadores (con y sin días perdidos)	No de accidentes	0	0	0	En el periodo del 15 al 30 de Diciembre de 2024 no se presentaron accidente de trabajo.
Índice de frecuencia de accidentes con días perdidos LTIFR	Describe el número de accidentes de trabajo con tiempo perdido	(Accidentes con tiempo perdido/Horas Hombres Trabajadas) *200000	0	0	0	
Frecuencia de accidentalidad (FA)	Describe el número de accidentes de trabajo que se presentan por cada 100 trabajadores	(No. De AT/No. De trabajadores) *100	0	0	0	
Severidad de accidentalidad(FS)	Describe cuantos días perdidos por accidentes de trabajo se	((No. De días perdidos +No de días cargados) /promedio de	0	0	0	

Indicadores de gestión	Descripción	Formula	Real periodo actual	Real periodo año anterior	Real acumulado	Análisis
	presentan por cada 100 trabajadores	trabajadores) *100				
Prevalencia de la enfermedad laboral (EL)	Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo determinado	((No. De casos nuevos + antiguos) /promedio de trabajadores) * 100000	0	0	0	
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo determinado	(No. De casos nuevo/promedio de trabajadores) * 100000	0	0	0	
Ausentismo general	Establece el número de días de ausencia por incapacidad médica laboral o común en el mes con respecto al número de días de trabajo programados	(Días de ausencia por incapacidad/ número de días de trabajo programados) * 100	0	0	0	En el periodo del 15 de diciembre al 30 de diciembre de 2024 no se presentaron ausentismo por parte de nuestros trabajadores

4.1.2.6 Inspecciones

Se evidencio durante el periodo el uso de los EPP por parte del personal, pese a que dentro de la gestión documental esta pendiente las actas de entrega de EPP firmadas por todo el personal.

El contratista cuenta con una bodega ubicada en la balastrera 1, la cual, se evidencia la implementación del punto de emergencia.

Así mismo, la instalación de señalización preventiva en el frente de obra, en el anexo 4 – Formatos de inspecciones.

















4.1.3 CTO LP-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, a corte del presente informe el contratista tiene pendiente de presentar los informes SST del mes de abril

y mayo del 2025 con las respectivas planillas de seguridad social, asi mismo, de presentar el informe de cierre con los paz y salvo del personal.

4.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

Se realizó seguimiento a las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta la normatividad del decreto 1072 de 2015 y 1443 de 2014 en cuanto a los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST.

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA en el SG-SST, como el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

1. Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

2. Hacer: Implementación de las medidas planificadas.


3.Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.


4. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes:

4.2.1 Política SG – SST

La interventoría Consorcio ingecon-inco, cuenta con las políticas al SG-SST, política de plan de emergencia y acoso laboral, las cuales, han sido socializadas en las inducciones y divulgadas en las oficinas ubicada en Planeta Rica, como se evidencia a continuación:

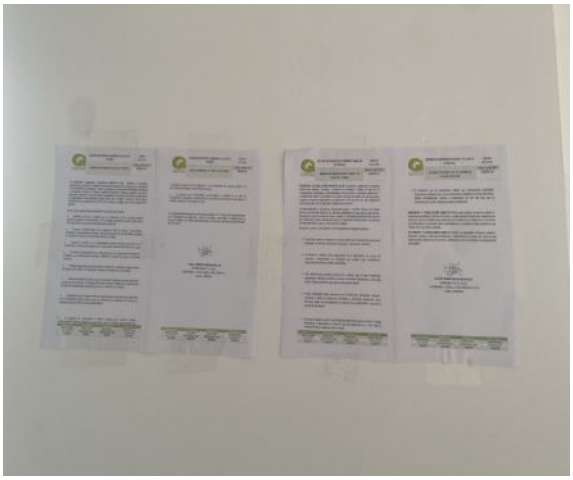

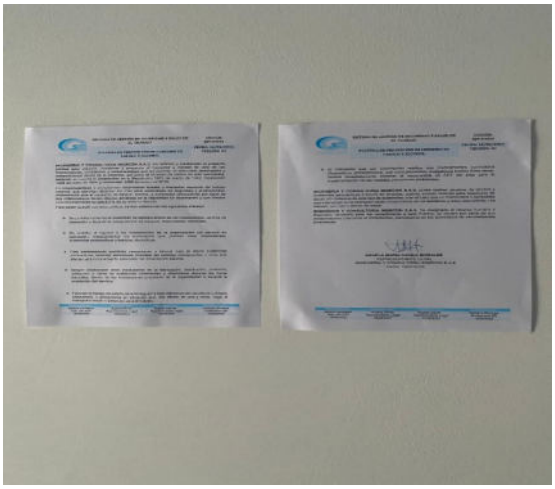

4.2.2 Estado de personal e ingresos

Para el periodo del presente informe la interventoría cuenta con el siguiente personal, el cual, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7:

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																														% Dedicación en el mes
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ANGELA MARIA DAVILA MORALES	42160437	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 10.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
VICENTE CARLOS URZOLA BADEL	1103094267	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 5.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA	26035741	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
ALVARO EMILIO ABAD RAMOS	1066729376	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS	1023865222	TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
ANGIE KATHERINE VERSOLATTO GONZALEZ	1110547301	SISO	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%

En el anexo 4, se presenta las planillas SS.

4.2.2.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

La interventoría ha evaluado y dado prioridad a los factores de riesgo utilizando una matriz de riesgo, identificando las condiciones de riesgo asociadas a las actividades planificadas en cada área y etapa del proyecto. Además, se han establecido medidas de intervención específicas para mitigar cada riesgo identificado. Se remite en el anexo 5.

Por lo tanto, se vienen realizando las siguientes medidas:

- La interventoría desde el área SG-SST realizo las siguientes capacitaciones:

  - Primeros auxilios viales - Pasos para actuar ante un accidente de tránsito
  - Hábitos saludables, higiene del sueño, higiene postural y pausas activas

- **Seguimientos Pausas activas**. La interventoría realiza pausas activas diarias en horario de 10:30 am y 3:30 pm.





- **Implementación al plan de emergencias**

Las oficinas ubicadas en el municipio de los Córdobas y Planeta Rica, cuenta con sus respectivos extintor, botiquín y camillas.



Oficina Planeta Rica



Oficina Planeta Rica

4.2.3 Vehículos.

La interventoría relaciona los siguientes vehículos y presenta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría.

EQUIPOS Y VEHICULOS	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEHÍCULO	RENAULT DUSTER GNS432	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LRS 75G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Se presenta los preoperacionales en el anexo 6.

4.2.4 Indicadores al SG-SST

En cumplimiento a lo establecido en la resolución 0312 del 2019, la interventoría viene realizando la medición de los indicadores de frecuencia, los cuales, se presentan en el anexo 7.

5 CONCLUSIONES

Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita y el contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente la entrega de informes SST con los respectivos paz y salvo y planillas de seguridad social.

El contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, en el mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista ha venido presentando documentación del personal, pero no han presentado las planillas de seguridad social del periodo del presente informe, situación que ha sido reportada por la interventoría en reiterados comunicados y comités de seguimiento.

ANEXO 1. PLANILLA SS PLANETA RICA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901764629
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PROVIDENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 67 -5-40	TELÉFONO:	7615894
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7986438801**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		8					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/16					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 774.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 774.500	$ 3.900	$ 778.400
230301	230301-PORVENIR	18	$ 3.410.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.200	$ 0	$ 3.410.600	$ 17.200	$ 3.427.800
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 660.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 660.700	$ 3.400	$ 664.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.412.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 1.412.400	$ 7.200	$ 1.419.600
SUBTOTALES:										**$ 6.258.200**	**$ 31.700**	**$ 6.289.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.100	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 350.100	$ 1.800	$ 0	$ 351.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 178.000	$ 900	$ 0	$ 178.900
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.213.300	$ 0	$ 11.200	$ 0	$ 2.213.300	$ 11.200	$ 0	$ 2.224.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 356.000	$ 1.800	$ 0	$ 357.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.305.400	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 1.305.400	$ 6.600	$ 0	$ 1.312.000
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 487.300	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 487.300	$ 2.500	$ 0	$ 489.800
SUBTOTALES:													**$ 4.890.100**	**$ 24.800**	**$ 0**	**$ 4.914.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.723.000	$ 2.723.000	$ 13.700	$ 0	$ 2.736.700
SUBTOTALES:									**$ 2.723.000**	**$ 13.700**	**$ 0**	**$ 2.736.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	33	$ 1.565.800	$ 7.900	$ 1.573.700
SUBTOTALES:			**$ 1.565.800**	**$ 7.900**	**$ 1.573.700**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	33	$ 1.175.500	$ 6.000	$ 1.181.500
PASENA	PASENA - SENA	18	$ 475.200	$ 2.400	$ 477.600
SUBTOTALES:			**$ 1.650.700**	**$ 8.400**	**$ 1.659.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003190690	LAMBRANO ESTRADA MELISSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	06																230201-PROTECCION	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	25	$ 1.186.250	$ 148.300	$ 0	$ 148.300	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250	5612002	$ 82.600	25	$ 1.186.250	CCF16-COMFACOR	$ 47.500	$ 0	$ 35.600	$ 0	$ 0
2	CC 1003305026	YANES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1003305702	ARGUMEDO MEZA FERNANDO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	06	22															230201-PROTECCION	17	$ 806.650	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.100	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	17	$ 806.650	$ 100.900	$ 0	$ 100.900	14-11 - ARL SURA	17	$ 806.650	5612002	$ 56.200	17	$ 806.650	CCF16-COMFACOR	$ 32.300	$ 0	$ 24.200	$ 0	$ 0
4	CC 1003308176	PERDOMO DE HOYOS EVERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	06																25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	MUTUAL SER EPS-S	25	$ 1.186.250	$ 148.300	$ 0	$ 148.300	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250	5612002	$ 82.600	25	$ 1.186.250	CCF16-COMFACOR	$ 47.500	$ 0	$ 35.600	$ 0	$ 0
5	CC 1003310040	ESPINOSA MEJIA CARLOS QUINTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	20	22															230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 17.800	$ 0	$ 17.800	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	5612002	$ 10.000	3	$ 142.350	CCF16-COMFACOR	$ 5.700	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 0
6	CC 1003359117	SALGADO RAMOS NESTOR LUIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
7	CC 1006575053	BEDOYA QUINTERO CARELIS ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

Planilla de Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901764629
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PROVIDENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 67 -5-40	TELÉFONO:	7615894
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7986438801**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1006726167	PACHECO PAOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 1038100533	SARMIENTO ESPEJO JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 1064186800	MARTINEZ MURILLO DAVID JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01																231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
11	CC 1064190392	BRAVO ARROYO EUFRAY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	20																230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 521.950	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	5612002	$ 36.400	11	$ 521.950	CCF16-COMFACOR	$ 20.900	$ 0	$ 15.700	$ 0	$ 0
12	CC 1066720592	REQUENE PRADO ROGER APOLINAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
13	CC 1066720747	SIERRA MORENO JESUS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
14	CC 1066721585	ORTEGA MARTINEZ MIGUEL DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	20																230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 521.950	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	5612002	$ 36.400	11	$ 521.950	CCF16-COMFACOR	$ 20.900	$ 10.500	$ 15.700	$ 0	$ 0
15	CC 1066722223	MERCADO BERASTEGUI JOEL DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	06	19															230301-PORVENIR	14	$ 664.300	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.300	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	14	$ 664.300	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-11 - ARL SURA	14	$ 664.300	5612002	$ 46.300	14	$ 664.300	CCF16-COMFACOR	$ 26.600	$ 13.300	$ 20.000	$ 0	$ 0
16	CC 1066723995	GOES CUELLO JOSE CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01	15															231001-COLFONDOS	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	MUTUAL SER EPS-S	15	$ 711.750	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 711.750	5612002	$ 49.600	15	$ 711.750	CCF16-COMFACO	$ 28.500	$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0
17	CC 1066724677	SIERRA MARTINEZ LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
18	CC 1066727147	SANCHEZ BARRIOS LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		13															230301-PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	13	$ 616.850	$ 77.200	$ 0	$ 77.200	14-11 - ARL SURA	13	$ 616.850	5612002	$ 43.000	13	$ 616.850	CCF16-COMFACOR	$ 24.700	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0
19	CC 1066743723	MARTINEZ MURILLO VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	05																230301-PORVENIR	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.233.700	$ 154.300	$ 0	$ 154.300	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.233.700	5612002	$ 85.900	26	$ 1.233.700	CCF16-COMFACOR	$ 49.400	$ 0	$ 37.100	$ 0	$ 0
20	CC 1066746105	HOYOS HERNANDEZ EDUARDO SEGUNDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
21	CC 1066746321	ALVAREZ ACUNA DANIELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	02																230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.376.050	$ 172.100	$ 0	$ 172.100	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.376.050	5612002	$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF16-COMFACOR	$ 55.100	$ 0	$ 41.300	$ 0	$ 0
22	CC 1066748940	TANO HOYOS MARIA CAMILA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
23	CC 1066750679	CARRASCAL OCHOA ANGIE DANIELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
24	CC 1067293235	HERNANDEZ TRUJILLO GLEDYS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
25	CC 1067929146	MENDEZ RUIZ ALVARO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
26	CC 11106704	ZAPATA PRADO LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
27	CC 1133814120	AGAMEZ ROZO ELIZABETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

Planilla NO Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901764629
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PROVIDENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 67 -5-40	TELÉFONO:	7615894
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7986438801**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
28	CC 1138076010	ACOSTA GONZALEZ ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
29	CC 15667899	OSORIO ARROYO JUAN ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
30	CC 15672097	ZUNIGA PINERES EDICKSON ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5612002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
31	CC 15672432	SERPA PASTRANA LUIS MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	06	16															25-14 COLPENSIONES	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 521.950	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	5612002	$ 36.400	11	$ 521.950	CCF16-COMFACOR	$ 20.900	$ 0	$ 15.700	$ 0	$ 0
32	CC 15677277	RUIZ HOYOS JOSE RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	5612002	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
33	CC 15679922	TRUJILLO SAENZ ROBERT EMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	19																231001-COLFONDOS	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	12	$ 569.400	$ 71.200	$ 0	$ 71.200	14-11 - ARL SURA	12	$ 569.400	5612002	$ 39.700	12	$ 569.400	CCF16-COMFACOR	$ 22.800	$ 0	$ 17.100	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 17.174.300

Planilla NO Pagada

ANEXO 2. CAPACITACIONES AMBIENTAL -SST

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:	X	CAPACITACION:		REUNION:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2		4-08-25.		
DURACIÓN:	15 min.				
TEMA:	Uso de EPP adecuado.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	24				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado.
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesús Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G.
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya Q.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2.		4-08-25.		
DURACIÓN:	15 min.				
TEMA:	Uso de epp adecuado.				
EXPOSITOR:	Angie Carrasco.				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	Jose Carlos G.
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene.
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefania Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Victor Martinez
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	Daniela
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	JOEL DE JESUS MERCADO
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño E.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	EVERNEY Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:	X	REUNION:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Bolastrera 2.		9-08-25.		
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Riesgo Físico.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	29.				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesús Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya D.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:	X.	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Barbosa Sta.		9-08-25.		
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Riesgo Físico.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	JOSE C. GOES G.
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefania Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Victor Martinez
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	Daniela Alv
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	Joel Mercado
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	Everney Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:	X	REUNION:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Barbastro 2.		12-08-25.		
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Operaciones Segura de maquinaria.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal.				
TOTAL ASISTENCIA:	20.				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento.
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesús Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya Q.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2. 12-08-25.				
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Operaciones Segura de maquinaria.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	Jose Carlos G.
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefanía Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Victor Alfonso
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	Joel Mercado
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño E.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	Everney Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:		REUNION:	
INDUCCION:	X	REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2		26-03-25.		
DURACION:	20 min				
TEMA:	Induccion de seguridad y salud en el trabajo.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	29.				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento.
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado.
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Rojas
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesus Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G.
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya Q.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCION:	X	REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Bolostrcia 2		16-08-23.		
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Induccion de seguridad y salud en el trabajo.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson E.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	JOSE CARLOS GOES
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene.
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefania Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Victor Alfonso
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	Daniela
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	Joel Mercado
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño-t.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	EVERNEY Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:	X	REUNION:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2.		19-08-25.		
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Prevención de Riesgos Quimicos.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	16.				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento.
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesus Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G.
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carlis Bedoya Q.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2. 29-08-25.				
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Prevención de riesgos Químicos.				
EXPOSITOR:	Angel Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	EDickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	JOSE Carlos Goes.
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefanía Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Víctor Alfonso
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	Daniela Alvarez
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	Joel Mercado
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño E.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	EVERNEY Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:	X	CAPACITACION:		REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2. 23-08-25.				
DURACIÓN:	15 min.				
TEMA:	Responsabilidades y acciones en caso de accidentes viales.				
EXPOSITOR:	Augie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	29.				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Arenas
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesús Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames.
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G.
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya Q.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:		REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2. 23-08-25.				
DURACIÓN:	15 min.				
TEMA:	Responsabilidades y acciones en caso de accidentes viales.				
EXPOSITOR:	Augie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	Jose Carlos G
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene.
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefania Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Victor Alfonso
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	Daniela
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	Joel Mercado
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño E.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	Everney Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:	X	REUNION:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2			25-08-25	
DURACION:	20 min.				
TEMA:	Riesgos Mecanico.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	16.				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado.
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesús Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya Q

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X.	REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2.		25-08-25.		
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Riesgon Mecanico.				
EXPOSITOR:	Angel Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	Jose Carlos.
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefania Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Victor Alfonso
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	Daniela Alvarez
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	JOEL MERCADO
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño E.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	EVERNEY Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACION:	X	REUNION:	
INDUCCION:		REINDUCCION:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2.			30-08-25.	
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Manejo seguro de Herramientas.				
EXPOSITOR:	Angie Carrascal				
TOTAL ASISTENCIA:	20				

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO	1.038.100.533	OP.RETROEXCAVADORA	Jose Sarmiento
2	NESTOR LUIS SALGADO	1.003.359.117	TOPOGRAFO	Nestor Salgado
3	JOSE RICARDO RUIZ	15.677.277	DIR.OBRA	
4	ALVARO JOSE MENDEZ	1.067.929.146	OP.VIBROCOMPACTADOR	Alvaro Mendez
5	LUIS ANTONIO YANEZ	1.003.305.026	CADENERO	Luis Antonio
6	LUISA FERNANDA SIERRA	1.066.724.677	MONITORA AMBIENTAL	Luisa Sierra
7	MARIA CAMILA TANO	1.066.748.940	PROF.SOCIAL	Maria Camila Tano Hoyos
8	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ	1.066.746.105	OBRERO	Eduardo Hoyos
9	LUIS FERNANDO SANCHEZ	1.066.727.147	OBRERO	Luis Sanchez
10	JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO	1.066.720.747	AYUDANTE	Jesus Sierra Moreno
11	GLEYDIS HERNANDEZ TRUJILLO	1.067.293.235	CONTROLADORA VIAL	Gleydis Hernandez
12	ELIZABETH AGAMES ROSO	1.133.814.120	CONTROLADORA VIAL	Elizabeth Agames
13	PAOLA PACHECO GARCIA	1.006.726.167	AUX SST	Paola Pacheco G
14	LUIS CARLOS ZAPATA PRADO	11.106.704	OFICIAL	Luis Zapata
15	JUAN ANTONIO OSORIO ARROYO	15.667.899	MAESTRO	Juan Osorio A
16	CARELIS BEDOYA QUINTERO	1.006.575.053	ING ADMINISTRATIVA	Carelis Bedoya Q.

FIRMA EXPOSITOR

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9	REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: May-2023
		Version: 3.0

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	
CIUDAD Y FECHA:	Balastrera 2. 30-08-25.				
DURACIÓN:	20 min.				
TEMA:	Manejo Seguro de Herramientas.				
EXPOSITOR:	Angie Carvajal				
TOTAL ASISTENCIA:					

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
17	EDICKSON ENRIQUE ZÚÑIGA PIÑERES	15.672.097	OFICIAL	Edickson Z.
18	DAVID JOSÉ MARTÍNEZ MURILLO	1.064.186.800	OFICIAL	David Martinez
19	JOSÉ CARLOS GOES CUELLO	1.066.723.995	AYUDANTE	Jose Goez.
20	ROGER APOLINAR REQUENE PRADO	1.066.720.592	AYUDANTE	Roger Requene.
21	ESTEFANÍA ACOSTA GONZÁLEZ	1.138.076.010	AUX.SST	Estefania Acosta
22	VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ MURILLO	1.066.743.723	OFICIAL	Víctor Alfonso
23	DANIELA ÁLVAREZ ACUÑA	1.066.746.321	RESIDENTE DE OBRA	
24	MIGUEL DARÍO ORTEGA	1.066.721.585	AYUDANTE	Miguel Ortega
25	LUIS MANUEL SERPA PASTRANA	15.672.432	OFICIAL	Luis Serpa Pastrana
26	JOEL DE JESÚS MERCADO	1.066.722.223	AYUDANTE	JOEL MERCADO
27	MELISSA LAMBRAÑO	1.003.190.690	RESIDENTE OBRA	Melissa Lambraño E.
28	EVERNEY PERDOMO DE HOYOS	1.003.308.176	AYUDANTE	EVERNEY Perdomo
29	FERNANDO JOSÉ ARGUMEDO MEZA	1.003.305.702	AYUDANTE	Fernando Argumedo

FIRMA EXPOSITOR

ANEXO 3 - PREOPERACIONALES PLANETA RICA MAQUINARIA

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA	VERSION 01	CODIGO SAF-FOR-114	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:		**PLACAS:**		**MODELO:**	2024.
INSPECCIONADO POR:	Angie Carrascal			**MARCA:**	Ingersol Rands
LOCALIZACION:	Balastera 2.				

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	N.A										
	* Cinturón de seguridad		.	X		X		X		X		X
	Extintor de incendios 10 lbs PQS			X		X		X		X		X
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso			X		X		X		X		X
	Pito			X		X		X		X		X
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓	
ITEM			INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
	HOROMETRO											
	ESTAMBAI											
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: **si** ___ **no** X **Fecha de Corrección:** _____

REVISÒ: **NOMBRE/APELLIDOS** Alvaro Mendez

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA	VERSION 01	CODIGO SAF-FOR-114	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:		**PLACAS:**		**MODELO:**	2024.
INSPECCIONADO POR:	Angie Carrascal			**MARCA:**	Ingersol Rands
LOCALIZACION:	Balastrera 2.				

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.	
	ÍTEM	**CANTIDAD**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
LUCES	*** De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** De trabajo traseras (Trabajo nocturno)**		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	***Cabina antivuelo (R.O.P.S)**	N.A										
	*** Cinturón de seguridad**		.	X		X		X		X		X
	Extintor de incendios 10 lbs PQS			X		X		X		X		X
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-**aceite motor**-		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Alarma de retroceso**			X		X		X		X		X
	Pito			X		X		X		X		X
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Espejo retrovisor central (convexo)**			X		X		X		X		X
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	*** Estado de cilindro (amortiguadores)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Dirección (terminales, bomba hidráulica)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Mando de estacionamiento (emergencia)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Motor**		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Freno de servicio**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Resguardos**		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓	
ITEM			**INC**	**FNL**	**INC**	**FNL**	**INC**	**FNL**	**INC**	**FNL**	**INC**	**FNL**
	HOROMETRO											
	ESTAMBAI											
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: **si** ___ **no** X **Fecha de Corrección:** _____

REVISÒ: **NOMBRE/APELLIDOS** Alvaro Mendez

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA	VERSION 01	CODIGO SAF-FOR-114	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:		PLACAS:		MODELO:	2024.
INSPECCIONADO POR:	Angie Carrascal			MARCA:	Ingersol Rands
LOCALIZACION:	Balastrera 2.				

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	N.A										
	* Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X
	Extintor de incendios 10 lbs PQS			✓		✓		✓		✓		✓
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso			X		X		X		X		X
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓	
ITEM			INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
	HOROMETRO											
	ESTAMBAI											
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no X **Fecha de Corrección:** _____

REVISÒ: **NOMBRE/APELLIDOS** Alvaro Mendez

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR			
	VIGENCIA	VERSION 01	CODIGO SAF-FOR-114	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:		**PLACAS:**	**MODELO:**	2024
INSPECCIONADO POR:	Angie Carrascal		**MARCA:** Ingersol Rands	
LOCALIZACION:	Balastrera 2.			

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** De trabajo traseras (Trabajo nocturno)**		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	***Cabina antivuelo (R.O.P.S)**	N.A										
	*** Cinturón de seguridad**		.	X		X		X		X		X
	Extintor de incendios 10 lbs PQS			✓		✓		✓		✓		✓
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-**aceite motor**-		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Alarma de retroceso**			X		X		X		X		X
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Espejo retrovisor central (convexo)**			X		X		X		✓		✓
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Estado de cilindro (amortiguadores)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Dirección (terminales, bomba hidráulica)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Mando de estacionamiento (emergencia)**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Motor**		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Freno de servicio**		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Resguardos**		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓	
ITEM			INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
	HOROMETRO											
	ESTAMBAI											
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no X **Fecha de Corrección:** _____

REVISÒ: **NOMBRE/APELLIDOS** Alvaro Mendez

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA			
	VIGENCIA	VERSION	CODIGO SAF-FOR-117	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: **EQUIPO No.** SBON Case.

LOCALIZACION:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia															
Dirección/suspensión (Terminales)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS															
Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión	36	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de levante hidraulicos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Descarga (gato, pivote, pasadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															
ITEM		INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
HOROMETRO															
ESTANBAI															
Fuera de servicio: si no X	**Fecha de Corrección:**						**Resp. Corrección:**								
REVISÒ:		**NOMBRE/APELLIDOS**													
OBSERVACIONES:		JOSE SANTIESTEBAN													

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA			
	VIGENCIA	VERSION	CODIGO SAF-FOR-117	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: **EQUIPO No.** SBON Case.

LOCALIZACION:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	4	✓		✓		/		/		✓		✓			
CABINA															
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia															
Dirección/suspensión (Terminales)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS															
Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión	36	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de levante hidraulicos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Descarga (gato, pivote, pasadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															
ITEM		INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
HOROMETRO															
ESTANBAI															
Fuera de servicio: si **no** X	**Fecha de Corrección:**						**Resp. Corrección:**								
REVISÒ:		**NOMBRE/APELLIDOS**													
OBSERVACIONES:		JOSE SANTIAGO													

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA			
	VIGENCIA	VERSION	CODIGO SAF-FOR-117	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: **EQUIPO No.** SBON Case.

LOCALIZACION:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	4	✓		✓		/		/		✓		✓			
CABINA															
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia															
Dirección/suspensión (Terminales)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS															
Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión	36	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de levante hidraulicos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Descarga (gato, pivote, pasadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															
ITEM		INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
HOROMETRO															
ESTANBAI															

Fuera de servicio: si no X **Fecha de Corrección:** **Resp. Corrección:**

REVISÒ: **NOMBRE/APELLIDOS**

OBSERVACIONES: JOSE SARMIENTO.

CONSORCIO PROVIDENCIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA			
	VIGENCIA	VERSION	CODIGO SAF-FOR-117	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: **EQUIPO No.** SBON Case.

LOCALIZACION:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia															
Dirección/suspensión (Terminales)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS															
Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión	36	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de levante hidraulicos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Descarga (gato, pivote, pasadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															
ITEM		INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL	INC	FNL
HOROMETRO															
ESTANBAI															
Fuera de servicio: si no X	**Fecha de Corrección:**						**Resp. Corrección:**								
REVISÓ:		**NOMBRE/APELLIDOS**													
OBSERVACIONES:		JOSE SANTIESTEBAN													

ANEXO 4 - INSPECCIONES DE OBRA

CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:9' 1.764.629-9	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO y CONDICIONES DESEGURIDAD EN OBRA	Código: SAF-FOR-101
		Fecha: ENE 2024
		Versión: 02

FECHA:	8 - agosto - 2025.	LUGAR:	Balastrera 2.
CONTRATO:	Consorcio Providencia	RESPONSABLE:	Angie Carrascal

Marque con una X corresponda

Gestión de la Obra	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra a disposición dentro de la obra.	X			
Se realizan llamados de atención, y se encuentra registro dentro de la obra	X			
Se cuenta con jefe de seguridad e inspectores dentro de la obra.	X			
Existe registros de que se ha impartido formación o capacitación a los trabajadores.	X			
Instalaciones de Bienestar de los Trabajadores	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Se dispone de vestidor para los trabajadores adecuado y separado por sexo.			X	
Se dispone de sitios de aseos adecuados y suficientes para los trabajadores.			X	
Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza y orden.			X	
Se dispone de casino adecuado para los trabajadores.			X	
Señalización de Obra	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Existe señalización de entrada a la obra.	X			
Existe señalización de obligatorio uso de EPP	X			
Existe señalización de prohibido fumar.	X			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios.	X			
Existe señalización de los equipos contra incendios.	X			
En caso de presencia de Líneas de Alta Tensión, existe señalización.	X			
Existe señalización de advertencia por presencia de camiones, grúas ..etc.	X			
Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.	X			
Equipos de Emergencia	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Existen suficientes extintores en la obra.	X			
Los extintores son adecuados al riesgo a proteger.	X			
Existe botiquín en la obra.	X			
El botiquín está equipado de forma adecuada.	X			
Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.	X			
Acopios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Los acopios de material tienen zona reservada y demarcada.	X			
Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamientos.			X	
Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.	X			
Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.	X			
Trabajos en Altura (Mas de 1.50mts)	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura.			X	
Plataformas, andamios y pasarelas protegidas por barandillas >= 90 cm.			X	
Trabajos en altura realizados con redes de seguridad.			X	
Trabajos en altura utilizan arnés de seguridad.			X	
Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.			X	
Pasarelas tienen un ancho >= 60 cm y barandillas.			X	
Instalación Eléctrica Provisional de Obra	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra.			X	
Las conexiones eléctricas están protegidas de la lluvia y daños por terceros	X			
El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro.	X			
Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada.	X			
Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro. Y conexiones con clavijas en todas las tomas	X			
Las zonas en tensión del cuadro eléctrico están protegidas contra contactos eléctricos directos.			X	
La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general.			X	
Equipos en general	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Escaleras de mano en buen estado, con zapatas antideslizantes.	X			
trompo de mezcla dispone de polo a tierra.	X			
Trompo de mezcla dispone de protecciones en los órganos de transmisión.	X			
Pequeñas herramientas eléctricas disponen de doble aislamiento.	X			

	SEGURIDAD EN OBRA			Fecha: ENE 2024
Equipos de Protección Individual	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.	X			
En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad.	X			
El personal emplea calzado de seguridad.	X			
El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.	X			
El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.	X			
El personal con riesgo de caída en altura emplea arnes de seguridad.	X			
El personal de manipulación de cargas emplea protección lumbar.	X			
Orden y Limpieza	**SI**	**NO**	**N.A.**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares.	X			
Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.	X			
Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas.	X			
Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos.	X			
Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.	X			
Otros	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL OBSERVADOR:				
SST	Angie Carrascal Ochoa	1066750679		

ANEXO 5 - PLANILLAS SS INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783007	9	CONSORCIO INGECON - INCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 148 7G 42 BARRIO CEDRO GOLF	MONTERIA-CORDOBA	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817353165	9492753392	E	2025/10/02	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$4,262,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066729376	ABAD RAMOS ALVARO EMILIO		X															X	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$1,318,715	$52,800	14-7	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	Si	$206,500
2	CC	1010035275	CAICEDO HERNANDEZ CRISTHIAN ALBERTO																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF16	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
3	CC	26035741	GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA																		231001	30	$3,750,000	$600,000	EPS037	30	$3,750,000	$150,000	CCF16	30	$3,750,000	$150,000	14-7	30	$3,750,000	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,161,000
4	CC	1005663357	JIMENEZ URZOLA JULIO ALEJANDRO																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	1103094267	URZOLA BADEL VICENTE CARLOS																		25-14	30	$5,150,000	$824,000	EPS002	30	$5,150,000	$206,000	CCF16	30	$5,150,000	$206,000	14-7	30	$5,150,000	$358,500	30	$0	$0	Si	$1,594,500
Total	**Afiliados(5)**																						$13,669,400	$2,187,200			$13,669,400	$546,800			$14,418,715	$576,800			$13,669,400	$951,600		$0	$0		$4,262,400

2025/10/06 04:53 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783007	9	CONSORCIO INGECON - INCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 148 7G 42 BARRIO CEDRO GOLF	MONTERIA-CORDOBA	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817353165	9492753392	E	2025/10/02	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$4,262,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$2,187,200	$0	$0	$2,187,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$824,000	$0	$0	$824,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$91,200	$0	$0	$91,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$672,000	$0	$0	$672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$951,600	$0	$0	$951,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$951,600	$0	$0	$951,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$576,800	$0	$0	$576,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$576,800	$0	$0	$576,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$546,800	$0	$0	$546,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$172,800	$0	$0	$172,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$374,000	$0	$0	$374,000
TOTAL				**5**	**$4,262,400**	**$0**	**$0**	**$4,262,400**

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGELA MARIA DAVILA MORALES identificado(a) con CC 42160437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1825462681	9492801217	E	2025-10-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$10,000,000	$1,600,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$10,000,000	$50,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$10,000,000	$50,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$10,000,000	$696,000
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$10,000,000	$400,000
EPS	SANITAS	30	4%	$10,000,000	$400,000

Este certificado se expide el día 2025-10-07 a las 04:34.

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGIE KATHERINE VERSOLATTO GONZALEZ identificado(a) con CC 1110547301 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1825462681	9492801217	E	2025-10-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,500,000	$240,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$1,500,000	$104,400
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,500,000	$60,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,500,000	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-10-07 a las 04:36.

Certificado de Aportes

Se certifica que ERIK DAVID CUADRADO LOPEZ identificado(a) con CC 1072531302 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1825462681	9492801217	E	2025-10-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,100,000	$336,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,100,000	$146,200
CCF	COMFACOR	30	4%	$2,100,000	$84,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$2,100,000	$84,000

Este certificado se expide el día 2025-10-07 a las 04:38.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS identificado(a) con CC 1023865222 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1825462681	9492801217	E	2025-10-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$1,423,500	$7,500
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-10-07 a las 04:39.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIRO FERNANDO ESPINEL MEDELLIN identificado(a) con CC 19065078 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1825462681	9492801217	E	2025-10-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$2,287,000	$12,000
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$2,287,000	$91,500
EPS	SANITAS	30	4%	$2,287,000	$91,500

Este certificado se expide el día 2025-10-07 a las 04:42.

ANEXO 6 – MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

EMPRESA	FECHA DE CREACION	ELABORADOR POR	APROBADO POR	CARGOS INVOLUCRADOS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS	CLASE DE RIESGO	CONTROL DE CAMBIOS
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	ene-23	YENIFER ALEJANDRA SUAREZ MONICO PGR	BEATRIZ GONZALEZ ESP.SG-SST	INGENIERO RESIDENTE TECNICO, ENCARGADO SST, AMBIENTAL, PROFESIONAL SOCIAL, TOPOGRAFO, INSPECTOR, DIRECTOR INTERVENTORIA	Interventoria	Los cargos clave en un proyecto incluyen al Ingeniero Residente Técnico, quien supervisa la obra y coordina recursos; al Encargado de SST, encargado de implementar y controlar normas de seguridad; al Responsable Ambiental, quien gestiona los impactos ambientales y el cumplimiento de normativas; al Profesional Social, que maneja la relación con la comunidad; al Topógrafo, que realiza los levantamientos y control de cotas; al Inspector, quien verifica la calidad y cumplimiento de especificaciones; y al Director de Interventoría, responsable de la gestión integral, asegurando el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto.	IV	1. Se cambia la estructura total del documento.

SEDE	VERSION	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	MODIFICADO POR
OFICINA PRINCIPAL-BOGOTA	2	9/05/2023	CATALINA MONTOYA PGR.

RUTINARIA	PELIGRO-FACTOR DE RIESGO		RIESGOS	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES EXISTENTES									VALORACION DEL RIESGO	EXISTE UN REQUISITO LEGAL ASOCIABLE	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
	CLASIFICACION	DESCRPCION			FUNTE	MEDIO	INDIVIDUO	Nivel de la Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (NP=NE*ND)	Interpretación del nivel de probabilidad	Significado del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo (NR)	Significado del Nivel de Riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo		ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS			EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
																						CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS	CONTROL OPERACIONAL	PROCEDIMIENTOS Y PLANES PARA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	
	1. Biológico	1.1 Virus	1. Enfermedad por factores biológicos, de origen laboral	Infección Respiratoria Aguda, enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	NA	Limpieza de las áreas de trabajo	* Uso del tapabocas * Lavado de manos frecuente * Desinfección del puesto de trabajo o áreas comunes	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	N/A	Prevención peligros biológicos	Esquema de vacunación	Publicación de carteleras informativas sobre la Prevención. Recordar de lavados de las manos	Mascarillas KN95
	1. Biológico	1.2 Bacterias	1. Enfermedad por factores biológicos, de origen laboral	Dolor abdominal, escalofrios,diarrea, fiebre, vómitos, nauseas y dolor muscular	NA	Limpieza de las áreas de trabajo	* Uso del tapabocas * Lavado de manos frecuente * Desinfección del puesto de trabajo o áreas comunes	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	N/A	Prevención peligros biológicos	Esquema de vacunación	Publicación de carteleras informativas sobre la Prevención. Recordar de lavados de las manos	Mascarillas KN95
	1. Biológico	1.7 Mordeduras	1. Enfermedad por factores biológicos, de origen laboral	Contacto con animales (avispas, abejas, arañas, serpientes, perros)	NA	NA	Uso de EPP (guantes de seguridad, camisa manga larga, botas plásticas y de seguridad).	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o una situación mejorable con con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	Si	NA	NA	Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos seguros de exposición al riesgo (manejo seguro de animales y control de plagas).	Prevención peligros biológicos	Realizar cuadro de vacunación al personal expuesto, para disminuir su vulnerabilidad	Señalizar y demarcar áreas de trabajo donde se encuentre presente el riesgo. capacitación a manejo de riesgo biológico.	Dotar a los trabajadores de equipo de protección personal como: guantes, mascarillas, mono gafas y batas, mangas o ropa protectora.
	1. Biológico	1.6 Picaduras	1. Enfermedad por factores biológicos, de origen laboral	Contacto con animales (avispas, abejas, arañas, serpientes, perros)	Control de plagas mediante fumigación y repelentes en áreas de trabajo. Mantenimiento de áreas limpias y libres de acumulación de agua estancada (donde los	Uso de ventiladores o sistemas de aire acondicionado que desincentiven la presencia de insectos.	Uso de equipo de protección personal (EPP) como ropa de manga larga, guantes y repelentes de insectos en la piel y ropa. Capacitación sobre la identificación de insectos y artrópodos peligrosos y	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o una situación mejorable con con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	Si	NA	NA	Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos seguros de exposición al riesgo (manejo seguro de animales y control de plagas).	Prevención peligros biológicos	Realizar cuadro de vacunación al personal expuesto, para disminuir su vulnerabilidad	Señalizar y demarcar áreas de trabajo donde se encuentre presente el riesgo. capacitación a manejo de riesgo biológico.	Dotar a los trabajadores de equipo de protección personal como: guantes, mascarillas, mono gafas y batas, mangas o ropa protectora.
	2. Biomecánico	2.1 Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	2. Enfermedad osteomuscular de origen laboral	Molestias cervicales, abdominales trastornos en la zona lumbar de la espalda y alteraciones del sistema circulatorio y servicio	NA	Programa de medicina preventiva SVE	Pausas activas Exámenes médicos ocupacionales (profesiograma)	6	3	18	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	180	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	SI	NA	NA	NA	1. Patologias osteomusculares 2. Acondicionamiento físico 3. Alimentación saludables 4. Practicas seguras de trabajo 5. Ergonomía de puesto de trabajo 6. Manipulación de cargas 7. Pausas activas	EMO, seguimiento al SVE, continuidad al programa de capacitación	NA	NA
	2. Biomecánico	2.3 Movimiento repetitivo	2. Enfermedad osteomuscular de origen laboral	Tendinitis, Túnel Carpiano	Uso prolongado del mouse y teclado, sostenimiento prolongado del teléfono , documentación.	Capacitación Autocuidado Pausas activas	Pausas activas Exámenes Ocupacional (Profesiograma)	6	3	18	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	180	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	SI	NA	NA	NA	1. Patologias osteomusculares 2. Acondicionamiento físico 3. Alimentación saludables 4. Practicas seguras de trabajo 5. Ergonomía de puesto de trabajo 6. Manipulación de cargas 7. Pausas activas	EMO, seguimiento al SVE, continuidad al programa de capacitación	NA	NA
	5. Físico	5.2 Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	5. Enfermedad visual por exceso o defecto de iluminancia.	Fatiga visual, disminución de la capacidad visual.	Ninguno	Ninguno	Exámenes Médicos Ocupacionales (Profesiograma) Pausas activas visuales	6	3	18	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	180	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	SI	NA	NA	Instalar iluminarias en el sitio de trabajo	Cuidado de los ojos pausas activas visuales	Mediciones ambientales	NA	NA
	5. Físico	5.7 Radiaciones no ionizantes	14. Trabajadores con deficiente percepción de riesgos viales.	Fatiga Visual Visión borrosa Lagrimeo Dolor ocular Sequedad y rojez	Ninguno	Charla de autocuidado	Pausas activas visuales	6	3	18	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	180	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	SI	NA	NA	Mantenimiento de los computadores	Cuidado de los ojos pausas activas visuales	NA	NA	NA
	5. Físico	5.4 Temperaturas extremas (calor y frío)	5. ATEL por atmosféricos extremos.	Hipotermia, Sabañones, Espasmos musculares y rigidez, Golpe de calor,Agotamiento por calor, Deshidratación	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP Capacitaciones Hidratación	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	Mantenimiento de los computadores	Capacitación en primeros auxilios para reconocer signos de hipotermia y congelación. Capacitación para reconocer signos de agotamiento o golpe de calor y aplicar primeros auxilios.	Procedimientos seguros de trabajo Programación de tareas en horarios adecuados	NA	NA
	5. Físico	5.1 Ruido (de impacto, intermitente , continuo)	5. Enfermedad auditiva de origen laboral.	Tinitis Estrés y ansiedad Dificultad para comunicarse Distracción	Mantenimiento de equipos	Diseño de espacios	Uso de EPP Rotacion de tareas Capacitacion Descansos periodicos	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	Mantenimiento regular	Sensibilización sobre el ruido Uso de epp Porcedimiento de trabajo seguro Reconocimiento de sintomas	Programación de tarea Mediciones	NA	Protectores auditivos
	8. Psicosocial	8.4 Condiciones de la tarea	8. Comunicación deficiente.	Ansiedad, aumento de la preocupación por el núcleo familiar, estrés, depresión, miedo.	Periodos de descanso	Bateria de riesgo psicosocial Programa de riesgo psicosocial	Capacitación en manejo del estrés Actividades de integración Empleado del mes(Motivacional)	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	NA	*Programa de Vigilancia Epidemiológico Factores Psicosociales (aplicación de la bateria Psicosocial)	NA	Se recomienda analizar la carga laboral en los sitios de trabajo y realizar actividades para evitar el estrés	NA
	8. Psicosocial	8.3 Caracteristicas del grupo social	8. Ausencia de trabajo en equipo.	Ansiedad, aumento de la preocupación por el núcleo familiar, estrés, depresión, miedo.	Periodos de descanso	Bateria de riesgo psicosocial Programa de riesgo psicosocial	Capacitación en manejo del estrés Actividades de integración Empleado del mes(Motivacional)	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	NA	*Programa de Vigilancia Epidemiológico Factores Psicosociales (aplicación de la bateria Psicosocial)	NA	Se recomienda analizar la carga laboral en los sitios de trabajo y realizar actividades para evitar el estrés	NA
	6. Locativo	6.7 Condiciones de orden y aseo	6. ATEL por condiciones de orden y aseo en el lugar de trabajo.	Golpes, heridas, traumas osteomusculares (esguinces, luxaciones, fisuras, fracturas)	Ninguno	Orden y aseo en los puestos de trabajo.	Charlas enfocadas con temas de orden y aseo de los puestos de trabajo (Cronogramas de capacitación) Programa de orden y aseo	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	NA	Charlas enfocadas con temas de orden y aseo de los puestos de trabajo (Cronogramas de capacitación)	Inspecciones áreas de trabajo programa de orden y aseo	NA	NA
	6. Locativo	6.5 Sistemas y medios de almacenamiento	6. ATEL por almacenamiento adecuado.	Caidas, golpes, aplastamiento	Diseño de almacenamiento y etiquetado claro	Inspecciones regulares	Uso de epp adecuados	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control especifico	SI	NA	NA	Diseño de almacenamiento	Manejo seguro de materiales Reconocimiento de riesgos	Procedimientos de almacenamiento	Planes de emergencia	Guantes y ropa de protección Calzado de seguridad
	6. Locativo	6.3 Servicios (cantina, Vestier, suministro de agua)	6. Indisponibilidad de agua potable y espacios sanitarios.	Deshidratación	Suministro de agua potable Instalaciones adecuadas	Ubicacción accesible, mantenimiento de instalaciones	Promocion de la hidratacion Capacitaciones	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	Instalaciones de agua potable Baños adecuados	Higiene y salud:	Inspecciones regulares	NA	Equipos de hidratación
	6. Locativo	6.6 Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel)	6. ATEL por condiciones de orden y aseo en el lugar de trabajo.	Golpes, heridas, traumas osteomusculares (esguinces, luxaciones, fisuras, fracturas)	Ninguno	Orden y aseo en los puestos de trabajo.	Charlas enfocadas con temas de orden y aseo de los puestos de trabajo (Cronogramas de capacitación) Programa de orden y aseo	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	NA	Charlas enfocadas con temas de orden y aseo de los puestos de trabajo (Cronogramas de capacitación)	Inspecciones áreas de trabajo programa de orden y aseo	NA	NA

SI	3. Eléctrico	3.5 Conexiones eléctricas	3. Exposición a condiciones inseguras eléctricas	Corto circuito, Quemaduras, heridas, muerte.	Mantenimiento y revisión del conexionado eléctrico.	3. Contacto indirecto con fuentes de electricidad	Charlas enfocadas al riesgo eléctrico (Cronogramas de capacitación)	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser conceibible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	NA	Prevención peligro condiciones de seguridad 5 reglas de oro, choque eléctrico, consecuencias de los accidentes eléctricos entre otras	Inspecciones diarias 5 reglas de oro	Instructivo riesgo eléctrico	NA
	9. Públicos	9.1 Raponeo, robos, atracos, fleteo, intoxicación	9. Exposición a zonas de trabajo aledañas a intereses públicos y políticos.	Heridas, contusiones, fracturas, golpes, muerte	Ninguno	Programa de riesgo publico	Capacitación Riesgo Público (Cronogramas de capacitación)	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser conceibible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	NA	Programa de riesgo publico	NA	Informar a los trabajadores del número de teléfono de la policía y capacitarlos que hacer en caso de atraco	NA
	9. Públicos	9.2 Secuestro, extorción, atentados	9. Exposición a zonas de trabajo objeto de grupos al margen de la ley.	Secuestro, extorción, atentados terroristas	NA	Acompañamiento de líderes políticos y sociales y fuerza publica	*Protocolo de riesgo publico *Acompañamiento cuadrante de la policía * Campañas * Capacitación en riesgo publico	10	2	20	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	60	1200	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	SI	NA	NA	Programa de riesgo publico	Capacitar Señalizar o advertir Acompañamiento cuadrante de la policía, líderes sociales y fuerza publico	NA	NA	NA
	4. Fenómenos naturales	4.5 Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	4. Materialización de emergencia (Inundación, terremoto, etc.)	Heridas graves	Ninguno	Ruta de evacuación Plan de emergencias Medevac	Capacitación a la brigada de emergencia (Cronogramas de capacitación)	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	NA	Rutas de emergencia - plano de Evacuación - alarma. Brigadas de emergencias	Inspecciones equipos de emergencias	Planes de emergencia, en las instalaciones y fuera de ellas, divulgación de los procedimientos, simulacros	Sistema reflectivo para identificación, suministro de pitos, ruta de evacuación equipos de primeros auxilios
	4. Fenómenos naturales	4.1 Sismos o terremotos	4. Materialización de emergencia (Inundación, terremoto, etc.)	Heridas graves. Muerte, politraumatismos, fracturas	Ninguno	Ruta de evacuación Plan de emergencias Medevac	Capacitación a la brigada de emergencia (Cronogramas de capacitación)	10	2	20	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	60	1200	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	SI	NA	NA	NA	Rutas de emergencia - plano de Evacuación - alarma. Brigadas de emergencias	Inspecciones equipos de emergencias	Planes de emergencia, en las instalaciones y fuera de ellas, divulgación de los procedimientos, simulacros	Sistema reflectivo para identificación, suministro de pitos, ruta de evacuación equipos de primeros auxilios
	4. Fenómenos naturales	4.2 Vientos y vendavales	4. Materialización de emergencia (Inundación, terremoto, etc.)	Heridas graves. Muerte, politraumatismos, fracturas	Ninguno	Ruta de evacuación Plan de emergencias Medevac	Capacitación a la brigada de emergencia (Cronogramas de capacitación)	10	2	20	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	60	1200	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	SI	NA	NA	NA	Rutas de emergencia - plano de Evacuación - alarma. Brigadas de emergencias	Inspecciones equipos de emergencias	Planes de emergencia, en las instalaciones y fuera de ellas, divulgación de los procedimientos, simulacros	Sistema reflectivo para identificación, suministro de pitos, ruta de evacuación equipos de primeros auxilios
	4. Fenómenos naturales	4.3 Inundación, desbordamiento de cuerpos hídricos	4. Materialización de emergencia (Inundación, terremoto, etc.)	Heridas graves. Muerte, politraumatismos, fracturas	Ninguno	Ruta de evacuación Plan de emergencias Medevac	Capacitación a la brigada de emergencia (Cronogramas de capacitación)	10	2	20	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	60	1200	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	SI	NA	NA	NA	Rutas de emergencia - plano de Evacuación - alarma. Brigadas de emergencias	Inspecciones equipos de emergencias	Planes de emergencia, en las instalaciones y fuera de ellas, divulgación de los procedimientos, simulacros	Sistema reflectivo para identificación, suministro de pitos, ruta de evacuación equipos de primeros auxilios
	4. Fenómenos naturales	4.4 Derrumbe	4. Materialización de emergencia (Inundación, terremoto, etc.)	Heridas graves. Muerte, politraumatismos, fracturas	Ninguno	Ruta de evacuación Plan de emergencias Medevac	Capacitación a la brigada de emergencia (Cronogramas de capacitación)	10	2	20	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	60	1200	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	SI	NA	NA	NA	Rutas de emergencia - plano de Evacuación - alarma. Brigadas de emergencias	Inspecciones equipos de emergencias	Planes de emergencia, en las instalaciones y fuera de ellas, divulgación de los procedimientos, simulacros	Sistema reflectivo para identificación, suministro de pitos, ruta de evacuación equipos de primeros auxilios
	4. Fenómenos naturales	4.6 Incendio forestales	4. Materialización de emergencia (Inundación, terremoto, etc.)	Heridas graves. Muerte, politraumatismos, fracturas	Ninguno	Ruta de evacuación Plan de emergencias Medevac	Capacitación a la brigada de emergencia (Cronogramas de capacitación)	10	2	20	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	60	1200	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	SI	NA	NA	NA	Rutas de emergencia - plano de Evacuación - alarma. Brigadas de emergencias	Inspecciones equipos de emergencias	Planes de emergencia, en las instalaciones y fuera de ellas, divulgación de los procedimientos, simulacros	Sistema reflectivo para identificación, suministro de pitos, ruta de evacuación equipos de primeros auxilios
	10. Químico	10.8 Material particulado	7. Exposición a ambiente de trabajo con proyección de particulas.	Alergias, dermatitis, asfixia, asma	N/A	N/A	Uso de EPI y capacitacion	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser conceibible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	SI	NA	NA	Programa de riesgo químicos bajo el sistema globalmente armonizado y listado de productos químicos	*Desarrollar capacitación en: -Identificación de factor de riesgo químico y su reporte. -La importancia del reporte de los incidentes y accidentes de trabajo. *Desarrollar e implementar matriz de elementos de protección personal. * Divulgar fichas de datos de [illegible]	NA	Etiquetado de productos químicos	Guantes, tapabocas
	7. Mecánico	7.4 Zona de operación	7. Lugar de trabajo expuesto a partes en movimiento.	Golpes	NA	Inspecciones de armas	Capacitaciones y uso de epp	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Diseño Ergonométrico	Uso Seguro de Herramientas Mantenimiento	Procedimientos de Trabajo: Inspecciones regulares	NA	Uso de guantes, gafas de seguridad, protección auditiva y calzado adecuado segùn el tipo de herramienta utilizada
	11. Tecnológico	11.1 Explosión	11. Exposición a lugar de trabajo con oxígeno, fuentes de calor y elementos combustibles-comburentes-explosivos-gases comprimidos.	Lesiones físicas Lesiones auditivas Efectos psicológicos Inhalación de gases tóxicos Heridas por presión	NA	NA	Capacitaciones	6	1	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Sistema de alarma	Manejo de Materiales Peligrosos Reconocimiento de Riesgos	Protocolos de Manejo Controles de Acceso	Planes de Evacuación Entrenamiento en Primeros Auxilios	Uso de EPP como trajes de protección química, guantes y gafas de seguridad.
	12. Trabajo en alturas	12.1 Trabajos en alturas inferiores a 2 metros	12. Exposición a caídas con o sin diferencia de nivel.	Caídas, golpes o contusiones, caídas severas, lesiones por impacto	Mantenimiento regular Accesorios de seguridad Equipos de elevación Diseño de la estructura	Zona de trabajo segura Iluminación adecuada condiciones del entorno	Capacitacion Uso de EPP Chaequeo de salud Supervision	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Estructuras Segura Barandillas y Redes de Seguridad:	Técnicas de Trabajo Seguro	Supervisión Inspecciones Previas	Plan de Respuesta a Caídas Equipos de Rescate	Arneses y Cuerdas de Seguridad
	12. Trabajo en alturas	12.2 Trabajos en alturas superiores a 2 metros	12. Exposición a caída de objetos de altura.	Caídas, golpes o contusiones, caídas severas, lesiones por impacto	Mantenimiento regular Accesorios de seguridad Equipos de elevación Diseño de la estructura	Zona de trabajo segura Iluminación adecuada condiciones del entorno	Capacitacion Uso de EPP Chaequeo de salud Supervision	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Estructuras Segura Barandillas y Redes de Seguridad:	Técnicas de Trabajo Seguro	Supervisión Inspecciones Previas	Plan de Respuesta a Caídas Equipos de Rescate	Arneses y Cuerdas de Seguridad
	14. Tránsito y transporte	14.1 Uso de vehículos (conductor, acompañante, pasajero)	14. Suministro de vehículos con deficiente mantenimiento, y en mal estado.	Lesiones y fatalidades	Diseño vial Controles de acceso Sistema de monitoreo	Zonas de seguridad Señalización adecuada	Capacitaciones Uso de EPP Promoción Chequeo de salud	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Diseño Vial Seguro Mantenimiento de Infraestructura:	Educación Vial Conducción Defensiva	Políticas de Tránsito Inspección de Vehículos	Planes de Emergencia Vial Simulacros de Respuesta	Chalecos Reflectantes
	14. Tránsito y transporte	14.2 Paso de vehículos	14. Conductores con malas prácticas de seguridad vial.	Lesiones y fatalidades	Diseño vial Controles de acceso Sistema de monitoreo	Zonas de seguridad Señalización adecuada	Capacitaciones Uso de EPP Promoción Chequeo de salud	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Diseño Vial Seguro Mantenimiento de Infraestructura:	Educación Vial Conducción Defensiva	Políticas de Tránsito Inspección de Vehículos	Planes de Emergencia Vial Simulacros de Respuesta	Chalecos Reflectantes
	14. Tránsito y transporte	14.3 Desplazamiento como peatón	14. Trabajadores con deficiente percepción de riesgos viales.	Lesiones y fatalidades	Diseño vial Controles de acceso Sistema de monitoreo	Zonas de seguridad Señalización adecuada	Capacitaciones Uso de EPP Promoción Chequeo de salud	6	2	12	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	25	300	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	SI	NA	NA	Diseño Vial Seguro Mantenimiento de Infraestructura:	Educación Vial Conducción Defensiva	Políticas de Tránsito Inspección de Vehículos	Planes de Emergencia Vial Simulacros de Respuesta	Chalecos Reflectantes

ANEXO 7 – PREOPERACIONALES INTERVENTORIA

INGECON	**FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO**	**SST-3-PA-133**
		Versión 1

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE 2025

CIUDAD: PLANETA RICA - CÓRDOBA

PLACA : JNS432

SEDE: PLANETA RICA


MARCA : RENAULT DUSTER

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura.

✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.

N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE	57883	57903	57930	57965	58036	58070	
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgasté excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MOTOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción								
Firma y C.C. de quien diligencia	**VICENTE CARLOS URZOLA BADEL** **C.C: 1.103.094.267 Corozal - Sucre**								
Firma y C.C. Área SST									

Observaciones:

INGECON	**FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO**	**SST-3-PA-133** **Versión 1**

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2025

CIUDAD: PLANETA RICA - CÓRDOBA


PLACA : JNS432

SEDE: PLANETA RICA

MARCA : RENAULT DUSTER

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura.
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
N/A : No Aplica


			KILOMETRAJE	**57776**	**57798**	**57817**	**57835**	**57854**	**57883**	
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgasté excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MOTOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción									
Firma y C.C. de quien diligencia	**VICENTE CARLOS URZOLA BADEL** **C.C: 1.103.094.267 Corozal - Sucre**									
Firma y C.C. Área SST										

Observaciones:

INGECON	**INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS Y CONDUCTORES**	**SST-3-PA-133** **Versión 1**

Fecha: 27/09/2025	KM:58070	Tipo de vehículo: Renault Duster	Serial motor:9FBHSR595MM767389	
Modelo: 2021	Color: Gris	Marca: Renault	Placa:JNS432	N° Tarjeta de Propiedad:10030449661
N° Seguro Obligatorio SOAT:Si		Fecha Vencimiento SOAT: 15 / 01 / 2026		Tipo de Combustible: Gasolina
Extracto del Contrato:		Fecha vencimiento Revisión Tecno mecánica N/A / /		N° Seguro Responsabilidad Civil:Si
N° Tarjeta operación		Fecha vencimiento Tarjeta Operación / /		Fecha Vencimiento SRC / /
Nombre propietario: Ingenieria y Consultoria Ingecon SAS				Cedula o Nit:
Nombre del conductor: Vicente Carlos Urzola Badel		Cedula: 1.103.094.267 de Corozal - Sucre		N° Licencia de transito: 1103094267

DESCRIPCION	Cant	B	M	N/A
Estado parabrisas				
Vidrió frontal		✓		
Limpia-parabrisas derecho		✓		
Limpia-parabrisas izquierdo		✓		
Lavaparabrisas		✓		
Estado de presentación				
Aseo		✓		
Latas		✓		
Pintura		✓		
Tapetes		✓		
Estado de comodidad				
Aire acondicionado		✓		
Silletería		✓		
Luz interior		✓		
Radio		✓		
Televisor				✓
D.V.D				✓
Estado de luces				
Luces auxiliares		✓		
Luces principales		✓		
Luces altas		✓		
Luces bajas		✓		
Direccional izq. Delantera		✓		
Direccional der. Delantera		✓		
Direccional izq. Trasera		✓		
Direccional der. Trasera		✓		
Luces de parqueo		✓		
Luz freno		✓		
Luz reverso		✓		
Luz placa		✓		
Estado espejo				
Lateral derecho		✓		
Lateral izquierdo		✓		
Retrovisor interno		✓		
Estado llantas				
Delantera derecha		✓		
Delantera izquierda		✓		
Trasera derecha		✓		
Trasera izquierda		✓		
Rines		✓		
Elementos de constate Mantenimiento				
Aceite		✓		
Cables de alta		✓		
Correa ventilador		✓		
Estado batería		✓		



DESCRIPCION	Cant	B	M	N/A
Elementos de Mantenimiento				
Filtro de aire		✓		
Liquido frenos		✓		
Liquido refrigerante		✓		
Tapa tanque combustible		✓		
Tapas recipientes volcó		✓		
Instrumentos				
Luces del tablero		✓		
Nivel combustible		✓		
Holómetro		✓		
Tacómetro		✓		
Velocímetro		✓		
Indicador de aceite		✓		
Indicador de temperatura		✓		
Elementos, Equipo y sistemas de Seguridad				
Pito		✓		
Alarma de reversa		✓		
Alarma bloqueo central		✓		
Sistema de frenos		✓		
Cinturón de seguridad		✓		
Puertas (Cierres)		✓		
Seguros de puertas		✓		
Barra antivuelco		✓		
Sistema PSG		✓		
Dirección hidráulica		✓		
Bolsa de aire o airbag		✓		
Vidrios del parabrisas frontal		✓		
Película de seguridad del Vidrios		✓		
Ventanillas		✓		
Apoya cabezas		✓		
Chaleco refractivo		✓		
Conos o triángulos refractivos		✓		
Tacos		✓		
Gato		✓		
Cruceta-copa rueda		✓		
Juego de herramientas		✓		
Extintor ABC		✓		
Fecha Vencimiento extintor.	31/01/2026			
Botiquín				
* **Gel, gaza, toalla, guantes.**		✓		
* **Tapaboca, bisturi, mechera.**		✓		
* **Condón, alcohol.**		✓		
*				
Requerimientos adicionales				
Kit ambiental / Anti derrame				✓

Observaciones:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Quien Inspecciona / Entrega	Quien Inspecciona / Recibe	VoBo. Administrativo/Técnico/Otros
Firma	Firma	Firma
Nombre: Vicente Carlos Urzola Badel	Nombre	Nombre
C.C. 1.103.094.267 de Corozal - Sucre	C.C.	C.C.
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo:	Cargo:

ANEXO 8 – INDICADORES INTERVENTORIA

INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 02
Fecha: 18/01/2023

TIPO DE INDICADOR ESTRUCTURA	RESULTADO	META PLANEADA
		0% CUMPLIMIENTO


1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1.Nombre del indicador	Frecuencia de accidentalidad
2. Definición del indicador	Conocer el numero de eventos de accidentes laborales presentados durante el periodo
3. Formula	(N de accidentes presentados en el mes / N de trabajadores en el mes)*100
4. Periocidad	Mensual
5. Meta	0%
6. Limite inferior meta	NA
7. Responsable	Profesional SST

2. DATOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N de accidentes presentados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
N de trabajadores en el mes	9	9	0	0	0	0	0	0	0			
META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR

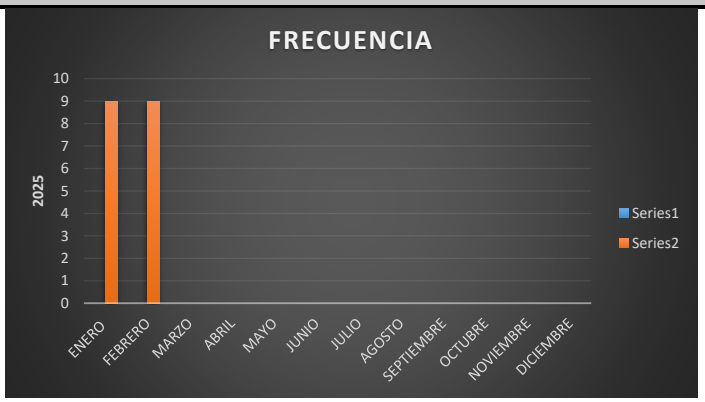

3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 02
Fecha: 18/01/2023

TIPO DE INDICADOR ESTRUCTURA	RESULTADO	META PLANEADA
		0% CUMPLIMIENTO

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1.Nombre del indicador	Severidad de accidentalidad
2. Definición del indicador	Conocer el numero de días de ausencia por incapacidad laboral
3. Formula	(N total de días de incapacidad por AT + N de días cargados por el mes) / N de trabajadores en el mes) *100
4. Periocidad	Mensual
5. Meta	0%
6. Limite inferior meta	NA
7. Responsable	Profesional SST

2. DATOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N total de días de incapacidad por AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
N de días cargados por el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
N de trabajadores en el mes	9	9	9	9	9	8	8	8	7			
META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

	INDICADORES DEL SG-SST	**Versión: 02** **Fecha: 18/01/2023**
TIPO DE INDICADOR **ESTRUCTURA**	**RESULTADO**	**META PLANEADA** **0% CUMPLIMIENTO**

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
1.Nombre del indicador	Proporción de accidentes mortales
2. Definición del indicador	Conocer el numero de eventos de accidentes laborales que originaron la muerte
3. Formula	(N de accidentes mortales / N accidentes de trabajo en el año) *100
4. Periocidad	Anual
5. Meta	0%
6. Limite inferior meta	NA
7. Responsable	Profesional SST

2. DATOS	
CONCEPTO	**Enero 2025 -Diciembre 2026**
N total de días de incapacidad por AT	0
N de días cargados por el mes	0
META	0%
CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

	INDICADORES DEL SG-SST	**Versión: 02** **Fecha: 18/01/2023**
TIPO DE INDICADOR **ESTRUCTURA**	**RESULTADO**	**META PLANEADA** **0% CUMPLIMIENTO**

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
1.Nombre del indicador	Prevalencia de la enfermedad laboral
2. Definición del indicador	Numero de enfermedades laborales calificadas y en reconocimiento durante el periodo
3. Formula	(N de funcionarios con enfermedad laboral reconocida + N de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento) / promedio de trabajadores en el periodo *100
4. Periocidad	Anual
5. Meta	0%
6. Limite inferior meta	NA
7. Responsable	Profesional SST

2. DATOS	
CONCEPTO	**Enero 2025 -Diciembre 2026**
N de funcionarios con enfermedad laboral reconocida	0
N de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento	0
promedio de trabajadores en el periodo	9%
META	0%
CUMPLIMIENTO	0%

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

	INDICADORES DEL SG-SST	**Versión: 02** **Fecha: 18/01/2023**
TIPO DE INDICADOR **ESTRUCTURA**	**RESULTADO**	**META PLANEADA** **0% CUMPLIMIENTO**

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
1.Nombre del indicador	Incidencia de la enfermedad laboral
2. Definición del indicador	Numero de enfermedades laborales en reconocimiento durante el periodo
3. Formula	(N de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento / promedio de trabajadores en el periodo *100
4. Periocidad	Anual
5. Meta	0%
6. Limite inferior meta	NA
7. Responsable	Profesional SST

2. DATOS	
CONCEPTO	**Enero 2025 -Diciembre 2026**
N de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento	0
promedio de trabajadores en el periodo	9%
META	9%
CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 02
Fecha: 18/01/2023

TIPO DE INDICADOR ESTRUCTURA	RESULTADO	META PLANEADA
		0% CUMPLIMIENTO


1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1.Nombre del indicador	Ausentismo de salud
2. Definición del indicador	Conocer la proporción de días perdidos por causa medica relacionados con los días programados para laborar
3. Formula	(Días de ausencia por causa medica / (Días de trabajo programados en el mes * N de trabajadores en el mes))* 100
4. Periocidad	Mensual
5. Meta	0%
6. Limite inferior meta	NA
7. Responsable	Profesional SST Recursos Humanos

2. DATOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Días de ausencia por causa medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Días de trabajo programados en el mes	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
N de trabajadores en el mes	9	9	9	9	9	8	8	8	7			
META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	267%	267%	267%	267%	267%	300%	300%	300%	343%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR

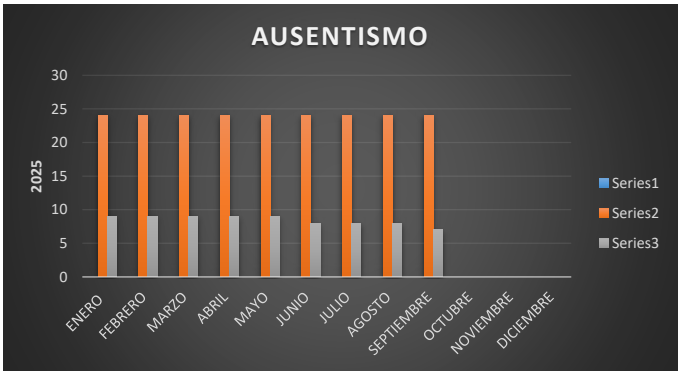


3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

	INDICADORES DEL SG-SST	**Versión: 02** **Fecha: 18/01/2023**
TIPO DE INDICADOR **ESTRUCTURA**	**RESULTADO**	**META PLANEADA** **90% CUMPLIMIENTO**

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
1.Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
2. Definición del indicador	Numero de AC-AP-AM identificadas
3. Formula	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas)*100
4. Periocidad	Mensual
5. Meta	95%
6. Limite inferior meta	90%
7. Responsable	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (o responsable del área de gestión de calidad o mejora continua).

2. DATOS			
CONCEPTO	**Primer semestres**	**Segundo semestre**	**Tercer trimestre**
Acciones ejecutadas			
Acciones planificadas			
META	90%	190%	290%
CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGENIERIA Y CONSULTORIA
INGECON SAS

ELABORÓ	**REVISÓ**
YOVANY ALBERTO ELORZA	Ing. ANGELA MARIA DAVILA
PROFESIONAL AMBIENTAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3
2 OBJETIVOS 3
3 LOCALIZACION 4
4 GENERALIDADES 4
4.1 Información contrato de interventoría 4
4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 5
4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL MES 5
4.3.1 CTO.159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA 5
4.3.2 CTO. LP 006 de 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 8
5 CONCLUSIONES 8

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito realizar acompañamiento, verificación y seguimiento al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental presentado por los contratistas de obra a cada uno de los municipios a cargo y la implementación de este desde las diferentes actividades desarrolladas por el contratista de obra durante el período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2025 en los en los municipios de Planeta Rica, Los Córdobas y San Bernardo del viento.

2 OBJETIVOS

- Presentar el informe de actividades realizadas durante el desarrollo del contrato de obra No. LP 008 de 2023, No.159-2023 y No. LP 006-2023 en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2025, tendientes a garantizar la ejecución del proyecto.

- Mostrar el reporte de la vigilancia y control adelantado por la Interventoría en cuanto a la gestión ambiental realizada por lo contratistas de obra.

- Verificar que la totalidad de las actividades del Contratista en materia ambiental, se realicen en dirección al cumplimiento del contrato, leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales y guías vigentes.

3 LOCALIZACION

El proyecto a ejecutar se localiza en los municipios de Planeta Rica, Los Cordobas y San Bernardo del Viento.

imagen 1. Localización del proyecto



4 GENERALIDADES

4.1 Información contrato de interventoría

CONTRATANTE:	CONSORCIO INGECON-INCO
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($2.219.000.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
ORDEN DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGAS:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ADICIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DEL 2025

4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023		
CONSORCIO PROVIDENCIA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO	5%	COLOMBIA
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	85%	COLOMBIA
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	COLOMBIA

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023		
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN	10%	COLOMBIA
E INGCARQ S.A.S	90%	COLOMBIA

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023		
CONSORCIO L&S		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
LA COMERCIALA S.A.S	50%	COLOMBIA
SIS ORGANIZATION S.A.S	50%	COLOMBIA

4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL MES

4.3.1 CTO.159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA

El contratista en comunicado OFI-CONS-092-2025 del 12 de agosto del 2025, presenta el informe de julio del 2025.

Mediante comunicado OFI-CONS-104-2025 del 22 de septiembre del 2025, el contratista presenta el informe de agosto del 2025.

Asi mismo, en resolución 1085 del 22 de septiembre del 2025, la CVS otorgo permiso de ocupación de cauce del Box-Coulvert con aleta y muro de contención y resolución 1095 del 22 de septiembre del 2025, permiso de ocupación de cauce para la Alcantarilla triple aguas arriba en la abscisa K3+540.

ACTIVIDADES DE OBRA

Se contaron con paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

Se realizo acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera Jomeve en ciénaga de oro.

Se realizo acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

Se realiza fundida de pavimento rígido mr-38 premezclado, desde la abscisa k5+200 a k5+620 (carril derecho).

Se toman muestras de concreto (viguetas) para ensayos de resistencia

Se realiza limpieza y sello de la junta de dilatación del pavimento construido.

Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.


Se realizan cortes, demoliciones y retiro de escombros de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.

Se realiza limpieza, perforación en las losas para anclar el acero, armado e instalación de parrilla en las losas a reparar.

Se realiza fundida de pavimento rigido mr38 premezclado para reparación de 8 losas fracturadas

Se realiza seguimiento a las actividades ambientales:


PUNTO ECOLÓGICO
RESIDUOS NO APROVECHABLES
RESIDUOS APROVECHABLES
PLÁSTICO - CARTÓN - VIDRIO
PAPEL - METALES

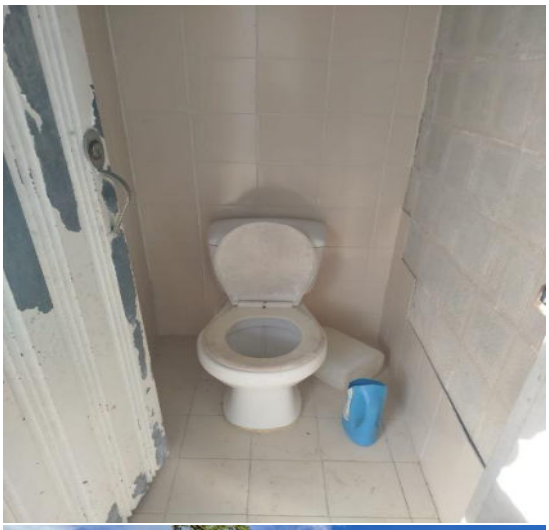






9/09/25 10:29 a.m.
Vía - providencia


8/09/25 3:33 p.m.
Vía - providencia





CTO. LP-MSBV-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, en comunicado 129-2025 del 19 de agosto del 2025, remitió los informes ambientales pendientes de abril y mayo del 2025, estando pendiente la entrega del balance ambiental con el cierre de las actividades con sus respectivos soportes.

A corte del mes de septiembre del 2025, el contratista no ha presentado el Balance ambiental.

4.3.2 CTO. LP 006 de 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, mediante correo del 29 de julio del 2025 presento el Balance ambiental, el cual, se encuentra en revisión de la interventoría.

5 CONCLUSIONES

Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita y el contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente la entrega de informes ambientales y balance ambiental con sus respectivos soportes.

El contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, en el mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista a la fecha solo ha presentado los informes ambientales hasta el mes de marzo del 2025.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Teniendo claro que los contratistas de obras tienen una relación directa con los municipios y que, por consiguiente, según sus contratos, no están obligados a realizar cobros mensuales, y se basan en los avances de obra, por lo tanto, no se presentan actas de cobro mensuales por avance de obra, continuación, se presenta en el siguiente cuadro los precios contractuales.

CONTRATO DE OBRA	VALOR BASICO	VALOR TOTAL	% AVANCE	VALOR EJECUTADO
159-2023 PLANETA RICA	$ 13.218.339.697,00	$ 14.100.000.000,00	89.31%	$ 11.805.467.565,0
LP-006-2023 LOS CÓRDOBA	$ 5.873.079.611,00	$ 6.140.057.707,00	100%	$ 5.873.079.611,00
LP-MSBV-008-2023 SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 2.008.640.979,00	$ 2.115.723.321,00	100%	$ 2.008.640.979,00
TOTALES OBRA:		**$ 22.355.781.028,00**		
TOTALES INTERVENTORIA:		**$ 2.219.000.000,00**		

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A corte del presente informe se presentó un riesgo financiero que pudo afectar la ejecución del contrato de Interventoria para el acompañamiento en la ejecución de los contratos de obra. En cumplimiento con lo estipulado dentro del Manual de Interventoría 2022, se incluye la matriz de riesgos y oportunidades correspondiente al contrato de Interventoría.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA	
											INVIAS	PROPONENTE Y/O INTERVENTOR
1	General	Externo	Selección - Ejecucion	Riesgo Economico - Riesgo Operacional	**Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial** en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	Impacto económico al Interventor	2	2	4	Riesgo Bajo		**X**
2	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra,** de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto económico al Interventor	2	5	7	Riesgo Alto		**X**
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor**. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	2	4	6	Riesgo Alto		**X**
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR,** de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Demora en la ejecución de las obras del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio		**X**
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA,** la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	2	4	6	Riesgo Alto		**X**

6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA**, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. **Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado**. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.	2	5	7	Riesgo Alto		**X**
7	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra** ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.	3	2	5	Riesgo Medio		**X**
8	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimimiento a la señalización** preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio		**X**
9	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra** que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	3	4	7	Riesgo Alto		**X**
10	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra**. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto	3	5	8	Riesgo Alto		**X**
11	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor**, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.	2	4	6	Riesgo Alto		**X**
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional - Económico	**Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual**, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,	3	2	5	Riesgo Medio		**X**
13	Especifico	Interno	Planeación - Selección	Económico	**Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría**. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un proceso independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva	1	4	5	Riesgo Medio	**X**	**X**

14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas**: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	x	
15	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Ambiental - Operacional	**Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales,** autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo		x
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto		x
17	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos	3	4	7	Riesgo Alto		x
18	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Sociales o Politicos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto	x	x
19	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	1	3	4	Riesgo Bajo	x	x

CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
Implementacion de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual
Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el Interventor.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventor	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el plazo estipulado. Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de preconstrucción (Estudios), para verificar entregas parciales y entrega total de los estudios. Requerimientos escritos al Interventor.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la ejecución del contrato.	la Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejcución de las obras con respecto a los diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato.

El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.	Permanente en la ejecución de la obra.
Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.
El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente	Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario.
El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión.	Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor
Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente.	Permanente en la ejecución de la obra.
Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría	2	2	4	Riesgo Bajo	SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia	Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal de la Entidad de la Planeación, Estructuración, procesos de Selección, Evaluación y Adjudicación	Al inicio de la etapa de planeación	A la terminación de la etapa de selección	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría.	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto

Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente
La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciónes 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Cominidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al INVIAS.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios INVIAS	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	permanente

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIEGO EXTREMO
6, 7	RIEGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCION
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para el presente informe de interventoría del mes de septiembre de 2025 se han cargado al sistema del aplicativo CIFRA los informes semanales de los contratos de obra de los contratistas Consorcio Providencia – Contrato de obra No. 159-2023 Municipio de Planeta Rica, Consorcio Pavimento Vía Barranquillita – Contrato de obra No. Lp-006-2023 Municipio de los Córdoba y Consorcio L&S – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023 Municipio de San Bernardo del Viento.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1 Equipo y vehiculos contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DEL 2025

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5053-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGECON-INCO

CONTRATO DE OBRA No. 0159-2023 LP-006-2023 LP-MSBV-008-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA; CONSORCIO PAVIMENTOS BARRANQUILLITA; CONSORCIO L&S

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEHÍCULO	RENAULT DUSTER GLS194	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LRS 75G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LQY 88F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ANGELA MARÍA DAVILA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202153798CLD

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: .SEPTIEMBRE 2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.: 159-2023 (2286-2023)
LP-006-2023 (2217-2023)
LP-MSBV-008-2023 (2222-2023)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA - MUNICIPIO PLANETA RICA
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA - MUNICIPIO LOS CORDOBA
CONSORCIO L&S - MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANGELA MARIA DAVILA MORALES	42160437	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 10.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	67%		$ 6.700.000	$ 696.000	V	SANITAS	9492801217	$ 400.000	PROTECCIÓN	9492801217	$ 1.600.000	$ 400.000	N.A	N.A	
2	VICENTE CARLOS URZOLA BADEL	1103094267	RESIDENTE INTERVENTORIA SOCIAL	$ 5.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 5.150.000	$ 358.500	V	SALUDTOTAL	9492753392	$ 206.000	COLPENSIONES	9492753392	$ 824.000	$ 206.000	N.A	N.A	
3	GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA	26035741	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.750.000	$ 261.100	V	NUEVA EPS	9492753392	$ 150.000	COLFONDOS	9492753392	$ 600.000	$ 150.000	N.A	N.A	
4	ALVARO EMILIO ABAD RAMOS	1066729376	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		100%		$ 569.400	$ 39.700	V	NUEVA EPS	9492753392	$ 22.800	PORVENIR	9492753392	$ 91.200	$ 52.800	N.A	N.A	
5	JAIRO FERNANDO ESPINEL MEDELLIN	19065078	CONDUCTOR	$ 2.287.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.287.000	$ 12.000	V	SANITAS	9492801217	$ 91.500	PORVENIR	9492801217	$ 141.300	$ 91.500	N.A	N.A	
6	JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS	1023865222	TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 569.400	$ 6.800	I	SANITAS	9492801217	$ 52.000	PORVENIR	9492801217	$ 20.800	$ 52.000	N.A	N.A	
7	CAICEDO HERNANDEZ CRISTHIAN ALBERTO	1010035275	INSPECTOR SISO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.200.000	$ 61.300	V	SALUDTOTAL	9492753392	$ 35.200	PORVENIR	9492753392	$ 140.800	$ 35.200	N.A	N.A	
8	JIMENEZ URZOLA JULIO ALEJANDRO	1005663357	INSPECTOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.000.000	$ 139.200	V	SALUDTOTAL	9492753392	$ 80.000	PORVENIR	9492753392	$ 320.000	$ 80.000	N.A	N.A	
9	ERIK DAVID CUADRADO LOPEZ	1072531302	TOPOGRAFO	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.100.000	$ 146.200	V	SALUDTOTAL	9492801217	$ 84.000	PORVENIR	9492801217	$ 336.000	$ 84.000	N.A	N.A	
10	MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ	1078367738	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 3.660.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60%		$ 1.464.000	$ -	V	SANITAS	9493025810	$ 463.400	COLPENSIONES	9493025810	$ 593.200	$ -	N.A	N.A	
11	YOVANY ALBERTO ELORZA	75094590	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3.660.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27%		$ 1.464.000	$ -	V	SURA	90512289	$ 200.000	COLPENSIONES	90512289	$ 256.000	$ -	N.A	N.A	
12	DAVID GUILLERMO TAMAYO GUERRERO	1078367738	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 3.538.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	58%		$ 1.415.200	$ -	V	ALIANZA SALUD	9492801274	$ 178.000	COLPENSIONES	9492801274	$ 227.800	$ 8.600	N.A	N.A	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 41.192.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/09/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: 159-2023 (2286-2023); LP-006-2023 (2217-2023); LP-MSRV-008-2023 (2222-2023)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA - MUNICIPIO PLANETA RICA; CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA : MUNICIPIO LOS CORDOBA; CONSORCIO L&S - MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 142.600.000,00	$ 142.600.000,00
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 570.400.000,00	$ 570.400.000,00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.204.800.000,00	$ 1.204.800.000,00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 301.200.000,00	$ 301.200.000,00
2024	1248724	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.119.582.395,00	$ 1.119.582.395,00
			TOTAL			**$ 2.219.000.000,00**	**$ 2.219.000.000,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.219.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	28 dic 2023 y desde 1 a 29 de Feb/2024	$ 26.147.000,00	$ 4.967.930,00	$ 31.114.930,00	$ -	$ 31.114.930,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 111.485.070,00	$ 2.187.885.070,00	5/03/2024	
2	Desde 1 a 31 de Marzo de 2024	$ 38.790.580,00	$ 7.370.210,00	$ 46.160.790,00	$ -	$ 46.160.790,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 65.324.280,00	$ 2.141.724.280,00	5/04/2024	
3	Desde 1 a 30 de Abril de 2024	$ 42.143.500,00	$ 8.007.265,00	$ 50.150.765,00	$ -	$ 50.150.765,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 15.173.515,00	$ 2.091.573.515,00	3/05/2024	
4	Desde 1 a 31 de Mayo de 2024	$ 61.465.580,00	$ 11.678.460,00	$ 73.144.040,00	$ -	$ 15.173.515,00 $ 57.970.525,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ - $ 512.429.475,00	$ 2.018.429.475,00	5/06/2024	
5	Desde 1 a 30 de Junio de 2024	$ 99.955.280,00	$ 18.991.503,00	$ 118.946.783,00	$ -	$ 118.946.783,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 393.482.692,00	$ 1.899.482.692,00	5/07/2024	
6	Desde 1 a 31 de Julio de 2024	$ 97.794.500,00	$ 18.580.955,00	$ 116.375.455,00	$ -	$ 116.375.455,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 277.107.237,00	$ 1.783.107.237,00	5/08/2024	
7	Desde 1 a 31 de Agosto de 2024	$ 110.977.900,00	$ 21.085.801,00	$ 132.063.701,00	$ -	$ 132.063.701,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 145.043.536,00	$ 1.651.043.536,00	5/09/2024	
8	Desde 1 a 30 de Septiembre de 2024	$ 111.651.500,00	$ 21.213.785,00	$ 132.865.285,00	$ -	$ 132.865.285,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 12.178.251,00	$ 1.518.178.251,00	4/10/2024	
9	Desde 1 a 31 de octubre de 2024	$ 111.651.500,00	$ 21.213.785,00	$ 132.865.285,00	$ -	$ 12.178.251,00 $ 120.687.034,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ - $ 1.084.112.966,00	$ 1.385.312.966,00	5/11/2024	
10	Desde 1 a 30 de noviembre de 2024	$ 111.651.501,00	$ 21.213.785,00	$ 132.865.286,00	$ -	$ 132.865.286,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 951.247.680,00	$ 1.252.447.680,00	2/12/2024	
11	Desde 1 a 31 de diciembre de 2024	$ 111.651.500,00	$ 21.213.785,00	$ 132.865.285,00	$ -	$ 132.865.285,00	$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	$ 818.382.395,00	$ 1.119.582.395,00	2/12/2024	
12	Desde 1 a 31 de enero de 2025	$ 111.651.500,00	$ 21.213.785,00	$ 132.865.285,00	$ -	$ 132.865.285,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 986.717.110,00	$ 986.717.110,00	31/01/2025	
13	Desde 1 a 28 de febrero de 2025	$ 50.522.500,00	$ 9.599.275,00	$ 60.121.775,00	$ -	$ 60.121.775,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 926.595.335,00	$ 926.595.335,00	28/02/2025	
14	Desde 1 a 31 de marzo de 2025	$ 107.519.140,00	$ 20.428.637,00	$ 127.947.777,00	$ -	$ 127.947.777,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 798.647.558,00	$ 798.647.558,00	31/03/2025	
15	Desde 1 a 30 de abril de 2025	$ 111.226.700,00	$ 21.133.073,00	$ 132.359.773,00	$ -	$ 132.359.773,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 666.287.785,00	$ 666.287.785,00	30/04/2025	
16	Desde 1 a 31 de mayo de 2025	$ 120.145.140,00	$ 22.827.577,00	$ 142.972.717,00	$ -	$ 142.972.717,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 523.315.068,00	$ 523.315.068,00	31/05/2025	
17	Desde 1 a 30 de junio de 2025	$ 100.220.620,00	$ 19.041.918,00	$ 119.262.538,00	$ -	$ 119.262.538,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 404.052.530,00	$ 404.052.530,00	30/06/2025	
18	Desde 1 a 31 de julio de 2025	$ 73.881.640,00	$ 14.037.512,00	$ 87.919.152,00	$ -	$ 87.919.152,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 316.133.378,00	$ 316.133.378,00	31/07/2025	
19	Desde 1 a 31 de agosto de 2025	$ 73.881.640,00	$ 14.037.512,00	$ 87.919.152,00	$ -	$ 87.919.152,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 228.214.226,00	$ 228.214.226,00	31/08/2025	
20	Desde 1 a 30 de septiembre de 2025	$ 73.881.640,00	$ 14.037.512,00	$ 87.919.152,00	$ -	$ 87.919.152,00	$ -	1248724 de fecha 31-12-2024.	$ 140.295.074,00	$ 140.295.074,00	30/09/2025	
TOTALES		**$ 1.746.810.861,00**	**$ 331.894.065,00**	**$ 2.078.704.926,00**	**$ -**	**$ 2.078.704.926,00**	**$ -**		**$ 140.295.074,00**	**$ 140.295.074,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 58.643.640,00	$ 11.142.292,00	$ 69.785.932,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 15.238.000,00	$ 2.895.220,00	$ 18.133.219,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 73.881.640,00	$ 14.037.512,00	$ 87.919.152,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma

Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

FECHA DE INICIO: 28/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE OCTUBRE DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.219.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 221.900.000,00	29/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.109.500.000,00	26/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 443.800.000,00	26/12/2023	31/12/2024
Calidad del servicio	30%	$ 665.700.000,00	31/12/2028	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301347

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 221.900.000,00	29/12/2023	3/08/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.109.500.000,00	29/12/2023	3/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 443.800.000,00	29/12/2023	3/2/2027
Calidad del servicio	30%	$ 665.700.000,00	3/2/2024	3/2/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301347

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURSO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025
(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 221.900.000,00	3	2	2024	30/04/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.109.500.000,00	3	2	2024	30/04/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 443.800.000,00	3	2	2024	31	10	2028
Calidad del servicio	30%	$ 665.700.000,00	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301347

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURSO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Actualización de la poliza de acuerdo a la Prorroga #3.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ANGELA DAVILA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798CLD

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO

FECHA DE INICIO: 28/12/2023 (Indicar día. mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE OCTUBRE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 159-2023 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

CONTRATO DE OBRA No: LP-006-2023 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-008-2023 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: CONSORCIO L&S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI -X- NO ------ APROBADO: SI -X- NO ------ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

FECHA 30/09/2025
(Día / Mes / Año)

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Rep. Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2220220400 5COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros documentos de seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

JUSTIFICACIÓN:
N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3	**NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE PERIODO NO SE HA TRAMITADO EL ANTICIPO.**						%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1 1de 1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023
(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** ..... - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: .....

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE PERIODO NO SE HA DESEMBOLSADO EL ANTICIPO.					

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado - MEPI-MN-IN-9-FR-2.**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MER-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS X **No.** 3 (Si la suspensión se debe tener en cuenta nuevamente conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS TERCIARIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CIENEGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 929/3 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: DE

CONTRATO DE OBRA No.: 159 DE 2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

CONTRATO DE OBRA No.: LB-0296-2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO LB

CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

PLAZO INICIAL: Juedes el 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión vías ampliamente con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.218.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.218.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 21,09 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 19/9/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

PERSONAL

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso Mes/Mes	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2024 FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	PROYECCION 2025 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																																
1	1	Director de Interventoría	$ 9.650.000,00		3,00	$ 28.700.000					1,00	$ 9.650.000	1,00	$ 9.650.000	1,00	$ 9.650.000

- **Seguimiento al Plan de Cargas - MEPI-MN-IN-9-FR-3.**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MER-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS X **No.** 3 (Si la suspensión se debe tener en cuenta nuevamente conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS TERCIARIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CIENEGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 929/3 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: DE

CONTRATO DE OBRA No.: 159 DE 2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

CONTRATO DE OBRA No.: LB-0296-2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO LB

CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

PLAZO INICIAL: Juedes el 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión vías ampliamente con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.218.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.218.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 21,09 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 19/9/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

PERSONAL

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso Mes/Mes	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2024 FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	PROYECCION 2025 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																																
1	1	Director de Interventoría	$ 9.650.000,00		3,00	$ 28.700.000					1,00	$ 9.650.000	1,00	$ 9.650.000	1,00	$ 9.650.000

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONSORCIO PROVIDENCIA – CONTRATO DE OBRA No. 159 DE 2023.

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra 159-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 20	$ 11.805.467.565,00
Valor Obra Básica en el mes 20	**$ 567.608.013,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$0,00**
Valor total Iva	**$ 0,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	**89.31%**
Porcentaje programado acumulado obra básico	**92.20%**

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 89.31%, vs avance programado del 92.20%, presentando atraso del -2.89% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista aumentar el ritmo de trabajo, para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. El consorcio providencia solicitará una prórroga hasta el 15 de diciembre de 2025, con el objetivo de terminar el 100% de las obras objeto del contrato, y hacer entrega oficial a la entidad contratante, lo cual se revisará por parte de la Interventoria y el municipio.

Se solicita al Consorcio Providencia, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento a la programación de obra aprobada, y avanzar en las actividades de ejecución de obra, y considerando que el contrato de obra vence el dia 31 de octubre de 2025, con el fin de terminar las metas físicas en el menor tiempo posible.

Se avanza con la reparación de las losas de concreto MR38 que presentan fisuras transversales en el tramo 1, cumpliendo un 60% en las reparaciones, dicha actividad la ejecutan a un buen ritmo de trabajo, teniendo como fecha de terminación la segunda semana del mes de octubre de 2025.

Para el box coulvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900, el contratista hizo entrega de los diseños hidráulicos, los cuales fueron aprobados por la Interventoria, y realizó la entrega de los diseños estructurales, los cuales fueron revisados por la Interventoria y se solicitaron unas subsanaciones para aprobación, lo cual se encuentra en proceso por parte del consorcio providencia.

Para el muro de contención ubicado en la abscisa K4+200, el contratista hizo entrega de los diseños estructurales y geotécnico, los cuales fueron revisados por la Interventoria y se solicitaron unas subsanaciones para aprobación, lo cual se encuentra en proceso por parte del consorcio providencia.

La Interventoria solicitó al consorcio providencia que agilicen las subsanaciones correspondientes al box coulvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900 y al muro de contención ubicado en la abscisa K4+200, con el fin de avanzar con la ejecución, teniendo en cuenta que el contrato de obra vence el 31 de octubre de 2025.

De acuerdo con las condiciones climáticas y las lluvias registradas, y con base en los videos tomados en sitio, se evidencian las condiciones actuales de la alcantarilla triple ubicada en la abscisa K3+540, la cual presenta insuficiencia hidráulica. Por lo anterior, se solicitó al consorcio providencia realizar la verificación correspondiente con el especialista hidráulico, a fin de ratificar o, en su defecto, ajustar la propuesta de intervención previamente planteada para esta obra de arte, garantizando que la solución adoptada responda adecuadamente a las condiciones hidráulicas reales y a los criterios técnicos y normativos vigentes. Pendiente por entregar.

El dia 27 de agosto de 2024, se dio apertura a la audiencia de presunto incumplimiento, en el desarrollo de la misma, se presentó por parte del apoderado del contratista, un informe de descargos y presentación de pruebas solicitando desistimiento del proceso, la aseguradora presentó sus descargos y se suspendió la audiencia para dar paso al análisis de pruebas, la cual se está a la espera de la reanudación por parte del municipio. De igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones SST y ambientales. Adicionalmente, la Alcaldía cerró mediante comunicado remitido al consorcio providencia el proceso sancionatorio de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que se superaron las causales que lo originaron.

El municipio presentó la solicitud del permiso de ocupación de cauce para el proyecto ante la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y del San

Jorge "CVS", con el fin de avanzar en la ejecución de actividades, y la entidad ambiental expide las resoluciones de permiso de ocupación de cauce para que puedan avanzar con las intervenciones correspondientes, solicitando unas compensaciones ambientales de 100 arboles por cada obra de arte.

El contratista de obra, ha constituido el encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el municipio ha realizado el giro del recurso correspondiente, el cual tiene como destinación exclusiva la etapa de obra. La Interventoria está autorizando los desembolsos correspondientes que cuenten con toda la documentación legalizada con sus soportes, logrando desembolsar más de 4417 millones de pesos aproximadamente. Se requiere cerrar la cuenta y liquidar la fiducia.

Se realiza reunión de avance mensual con participación de la veeduría ciudadana, comunidad, contratista de obra e Interventoria, con el fin de dar a conocer los avances técnicos que se han tenido en el desarrollo del proyecto y aclarar dudas e inquietudes de los asistentes.

Se han presentado las afiliaciones riesgos profesionales del personal vinculado a la obra. Pendiente entrega de las planillas pagadas del presente periodo.

Se ha cumplido con la señalización preventiva y temporal de obra.

A la fecha, el municipio ha consignado los rendimientos financieros de la cuenta convenio desde el año 2023 hasta el mes de diciembre 2024, y desde enero a abril de 2025 y julio de 2025. Pendiente mayo, agosto y septiembre de 2025.

A la fecha, el contratista de obra ha gestionado con la fiducia, la devolución de los rendimientos financieros generados desde septiembre 2024 hasta julio 2025, para un total transferido de $ 4,035,275.00.

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023.

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-006-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado	**$ 5.873.079.611,00**
Valor Obra Básica	**$ 121.979.194,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$0,00**
Valor total Iva	**$ 0,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	**100.00%**
Porcentaje programado acumulado obra básico	**100.00%**

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y las reparaciones en diferentes losas que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

CONSORCIO L&S – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-MSBV-008-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado	**$ 2.008.640.979,00**
Valor Obra Básica	**$10.405.137,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$ 0,00**
Valor total Iva	**$ 0,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	**100.00%**
Porcentaje programado acumulado obra básico	**100.00%**

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y la instalación de señales verticales, que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

8 ANEXOS.

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**
CINGE-INV-5053-0250-25	2025-09-04	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-090-2025 (diseño estructural boxculvert 3x3).
CINGE-INV-5053-0251-25	2025-09-04	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-0100-2025 orden de operación No. 26
CINGE-INV-5053-0252-25	2025-09-04	CONSORCIO L&S	MAN
CINGE-INV-5053-0253-25	2025-09-12	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	INTERVENTORÍA TÉCNI
CINGE-INV-5053-0254-25	2025-09-15	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	RAMIENTO EN PAVIMENT
CINGE-INV-5053-0255-25	2025-09-16	CONSORCIO PROVIDENCIA	Certificado de ingresos rendimientos anticipo
CINGE-INV-5053-0256-25	2025-09-22	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Reiteración entrega informe de reparación de losas en etapa de recibo de obra
CINGE-INV-5053-0257-25	2025-09-22	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe de reparación de losas contrato LP 006-2023.
CING-INV-5053-0258-25	2025-09-22	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Respuesta radicado No. 2025S-VBOG-065622 atención observaciones Informes Trimestrales Sociales No. 6
CING-INV-5053-0258-25	2025-09-22		Respuesta radicado No. 2025S-VBOG-065622 atención observaciones Informes Trimestrales Sociales No. 6
CINGE-INV-5053-0260-25	2025-09-23	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Rendimientos cuenta conjunta del convenio 2217 de 2023
CINGE-INV-5053-0261-25	2025-09-23	CONSORCIO L&S	Certificado de integro de rendimientos cuenta conjunta del convenio 2222 de 2023
CINGE-INV-5053-0262-25	2025-09-23	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Certificado de integro de rendimientos cuenta conjunta del convenio 2222 de 2023
CINGE-INV-5053-0265-25	2025-09-30	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Rendimientos cuenta conjunta del convenio 2217 de 2023
CINGE-INV-5053-0266-25	2025-09-30	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-005-2025. Diseño estructural
CINGE-INV-5053-0267-25	2025-09-30	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe de reparación de las 18 losas según informe hallazgo por Contraloria en contrato LP 006-2023.

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Bogota D.C.

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Asunto: **Remisión informe de reparación de las 18 losas según informe hallazgo por Contraloria en contrato LP 006-2023.**

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente, se remite para su conocimiento, informe de reparación de losas de concreto rígido en el tramo Barranquillita correspondiente al contrato de obra No. LP 006-2023 del convenio interadministrativo No, 2217 de 2023 suscrito entre el municipio de los Cordobas y el INIVAS con el fin de atender los requerimientos de la Contraloria General de la Nación mediante informe de hallazgo.

Cordialmente,

ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0266-25

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Ingeniero
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".
Asunto: **Respuesta comunicado OFI-CONS-005-2025 (diseño estructural muro K4+200).**

Cordial saludo,

En atención al comunicado No. OFI-CONS-0005-2025, mediante el cual se remite el diseño estructural del muro ubicado en el K4+200, y una vez realizada la revisión técnica por parte de nuestro especialista, se presenta la siguiente observación:

"Para efectos de validar algunos de los parámetros contemplados dentro de los diseños estructurales remitidos para revisión, es necesaria la entrega del o de los estudios de suelos elaborados para cada punto en particular o las recomendaciones dadas por el Geotecnista para cada punto en particular."

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su pronta respuesta, asi mismo, reiteramos la posibilidad de un espacio para realizar mesa de trabajo entre pares estructurales de las estructuras pendientes de aprobación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la pronta respuesta.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

Lo enunciado: Informe especialista estructural interventoria.
cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Doctora
YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ
Subdirectora Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1".

Asunto: **Rendimientos cuenta conjunta del convenio 2217 de 2023**

Respetada doctora:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, remite los comprobantes de operación de los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta del convenio 2217 de 2023 suscrito con el Municipio de Los Cordobas e INVIAS en los siguientes periodos:

- Rendimientos Financieros generados en agosto 2025, un total transferido de $ 104.305,00

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

_____
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2025

Doctora
YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ
Subdirectora Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1".

Asunto: **Rendimientos cuenta conjunta del convenio 2222 de 2023**

Respetada doctora:

Mediante el presente comunicado, se informa que se recibió el memorando No. 2025S-VBOG-053254, en el cual se adjunta una carpeta comprimida con los certificados de los ingresos de la operación de los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta del convenio 2222 de 2023 suscrito con el Municipio de San Bernardo del Viento e INVIAS en los siguientes periodos:

- Rendimientos Financieros generados en mayo y junio 2025, un total transferido de $ 731.435,79

- Rendimientos Financieros generados en marzo y abril 2025, un total transferido de $ 1.083.461,34

- Rendimientos Financieros generados en enero, febrero 2025, un total transferido de $ 1.212.069,61

- Rendimientos Financieros generados en septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024, un total transferido de $ 1.158.626,12

- Rendimientos Financieros generados en febrero hasta agosto 2024, un total transferido de $ 7.141.632,44

- Rendimientos Financieros generados en noviembre y diciembre 2023, un total transferido de $ 1.372.913,83

Sin embargo, no se ha podido abrir la carpeta ya que aparece lo siguiente:



Por lo cual, solicitamos nuevamente el envio de los documentos adjuntos.

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Fecha: 2025-07-29 06:29:46
Radicado: 2025S-VBOG-053254
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-053254
Fecha: 2025-07-29 06:29:46

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INGECON - INCO
CLL 148 No 7G - 42 BARRIO CEDRO GOLF
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-080902

Cordial saludo,

En atención a la solicitud contemplada en el memorando del asunto, me permito informar que fueron tramitados los Documentos de Recaudo de Ingresos Presupuestales, para su verificación se envía copia de cada uno de ellos con los valores correspondientes a los rendimientos financieros.

Cordialmente,



CARLOS FERNEY JARAMILLO MARIN
COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS

Proyectado por: ADRIANA MARCELA CANTILLO ZUÑIGA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2025

Doctora
YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ
Subdirectora Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1".

Asunto: **Rendimientos cuenta conjunta del convenio 2217 de 2023**

Respetada doctora:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, remite los comprobantes de operación de los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta del convenio 2217 de 2023 suscrito con el Municipio de Los Cordobas e INVIAS en los siguientes periodos:

- Rendimientos Financieros generados en agosto 2025, un total transferido de $ 104.305,00

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 22 de septiembre del 2025

Ing.
MARTHA HELENA ROMERO MORENO
Subdirectora de Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogotá, D.C - Colombia

Referencia: Contrato de interventoría No. LP 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1"

Asunto: **Respuesta radicado No. 2025S-VBOG-065622 atención observaciones Informes Trimestrales Sociales No. 6**

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta al comunicado No. ***2025S-VBOG-049896*** dando trámite a las observaciones emitidas por la entidad en relación con los informes trimestrales sociales No. 6 de los proyectos "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." LP-MSBV-008-2023, "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". LP-006-2023, "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". Contrato LP-159-2023. Con las siguientes subsanaciones:

Informe Trimestral No 6, Contrato LP-006-2023 (Municipio los Córdobas)

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 (Matriz de Cumplimiento de Actividades Sociales) del proyecto "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". LP-006-2023, con las fechas correspondientes al trimestre No. 6 (1 de mayo al 31 julio de 2025). Sin embargo, solo se reportan actividades hasta el 31 de mayo de 2025, ya que el proyecto finalizó contractualmente en esta fecha. Es de aclarar que se encuentra en espera la agenda

para el espacio de socialización de cierre del proyecto con la comunidad y cierre con la veeduría ciudadana.

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance de Estado Social del Proyecto con fecha (1 de mayo al 31 de julio de 2025) marcado con tipo de informe (Parcial) en relación con el informe trimestral No. 6

Informe Trimestral No 6 Contrato No 159-2023 (Municipio de Planeta Rica):

- Se reporta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (Pre-Acta Mensual de Inversión Social) enumerada de acuerdo con lo descrito en el manual MASPS-MN1-IN-3 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y BALANCE GESTION SOCIAL CTO OBRA ***"La numeración de estas pre-actas, y específicamente del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente".*** El acta de recibo parcial cobrado en este periodo por el contratista corresponde a la # 3.

Informe Trimestral No 6 Contrato LP-MSBV-008-2023 (Municipio de San Bernardo del Viento):

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 (Matriz de Cumplimiento de Actividades Sociales) del proyecto *"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." LP-MSBV-008-2023.* con las fechas correspondientes al trimestre No. 6 (1 de mayo al 31 julio de 2025). Sin embargo, solo se reportan actividades hasta el 31 de mayo de 2025, ya que el proyecto finalizó contractualmente en esta fecha. Es de aclarar que se encuentra en espera la agenda para el espacio de socialización de cierre del proyecto con la comunidad y cierre con la veeduría ciudadana.

- Se reporta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (Pre-Acta Mensual de Inversión Social) enumerada de acuerdo con lo descrito en el manual MASPS-MN1-IN-3 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y BALANCE GESTION SOCIAL CTO OBRA ***"La numeración de estas pre-actas, y específicamente del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente".*** El acta de recibo parcial cobrado en este periodo por el contratista corresponde a la # 5.

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance de Estado Social del Proyecto con fecha (1 de mayo al 31 de julio de 2025) marcado con tipo de informe (Parcial) en relación con el informe trimestral No. 6

Una vez revisadas y subsanadas las observaciones por el área encargada, se emite visto bueno y aprobación por la dirección de Interventoría - Consorcio Ingecon Inco.

Nota: Se adjuntan los links (drive) donde se encuentran los informes trimestrales sociales No.6 de los proyectos de referencia, en el cual se encuentran adjuntos los formatos subsanados.

Informes trimestrales N°6 subsanado:

https://drive.google.com/drive/folders/1GLOxDdfEllAZ06U542xdVqWbiumuf_FM?usp=sharing

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Anexo. Lo enunciado

Bogotá D.C., 22 de septiembre del 2025

Ing.
MARTHA HELENA ROMERO MORENO
Subdirectora de Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogotá, D.C - Colombia

Referencia: Contrato de interventoría No. LP 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1"

Asunto: **Respuesta radicado No. 2025S-VBOG-065622 atención observaciones Informes Trimestrales Sociales No. 6**

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta al comunicado No. ***2025S-VBOG-049896*** dando trámite a las observaciones emitidas por la entidad en relación con los informes trimestrales sociales No. 6 de los proyectos "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." LP-MSBV-008-2023, "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". LP-006-2023, "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". Contrato LP-159-2023. Con las siguientes subsanaciones:

Informe Trimestral No 6, Contrato LP-006-2023 (Municipio los Córdobas)

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 (Matriz de Cumplimiento de Actividades Sociales) del proyecto "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". LP-006-2023, con las fechas correspondientes al trimestre No. 6 (1 de mayo al 31 julio de 2025). Sin embargo, solo se reportan actividades hasta el 31 de mayo de 2025, ya que el proyecto finalizó contractualmente en esta fecha. Es de aclarar que se encuentra en espera la agenda

para el espacio de socialización de cierre del proyecto con la comunidad y cierre con la veeduría ciudadana.

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance de Estado Social del Proyecto con fecha (1 de mayo al 31 de julio de 2025) marcado con tipo de informe (Parcial) en relación con el informe trimestral No. 6

Informe Trimestral No 6 Contrato No 159-2023 (Municipio de Planeta Rica):

- Se reporta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (Pre-Acta Mensual de Inversión Social) enumerada de acuerdo con lo descrito en el manual MASPS-MN1-IN-3 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y BALANCE GESTION SOCIAL CTO OBRA ***"La numeración de estas pre-actas, y específicamente del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente".*** El acta de recibo parcial cobrado en este periodo por el contratista corresponde a la # 3.

Informe Trimestral No 6 Contrato LP-MSBV-008-2023 (Municipio de San Bernardo del Viento):

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 (Matriz de Cumplimiento de Actividades Sociales) del proyecto *"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." LP-MSBV-008-2023.* con las fechas correspondientes al trimestre No. 6 (1 de mayo al 31 julio de 2025). Sin embargo, solo se reportan actividades hasta el 31 de mayo de 2025, ya que el proyecto finalizó contractualmente en esta fecha. Es de aclarar que se encuentra en espera la agenda para el espacio de socialización de cierre del proyecto con la comunidad y cierre con la veeduría ciudadana.

- Se reporta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (Pre-Acta Mensual de Inversión Social) enumerada de acuerdo con lo descrito en el manual MASPS-MN1-IN-3 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y BALANCE GESTION SOCIAL CTO OBRA ***"La numeración de estas pre-actas, y específicamente del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente".*** El acta de recibo parcial cobrado en este periodo por el contratista corresponde a la # 5.

- Se ajusta el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance de Estado Social del Proyecto con fecha (1 de mayo al 31 de julio de 2025) marcado con tipo de informe (Parcial) en relación con el informe trimestral No. 6

Una vez revisadas y subsanadas las observaciones por el área encargada, se emite visto bueno y aprobación por la dirección de Interventoría - Consorcio Ingecon Inco.

Nota: Se adjuntan los links (drive) donde se encuentran los informes trimestrales sociales No.6 de los proyectos de referencia, en el cual se encuentran adjuntos los formatos subsanados.

Informes trimestrales N°6 subsanado:

https://drive.google.com/drive/folders/1GLOxDdfEllAZ06U542xdVqWbiumuf_FM?usp=sharing

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Anexo. Lo enunciado

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Bogota D.C.

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Asunto: **Remisión informe de reparación de losas contrato LP 006-2023.**

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente, se remite para su conocimiento, informe de reparación de losas de concreto rígido en el tramo Barranquillita correspondiente al contrato de obra No. LP 006-2023 del convenio interadministrativo No, 2217 de 2023 suscrito entre el municipio de los Cordobas y el INIVAS.

Con el presente informe, se cumplen las actividades necesarias para el recibo a satisfacción del contrato en mención, una vez se termine de realizar la demarcación horizontal establecida en el contrato con el fin de dar por finalizada el cumplimiento de la meta física del contrato y atender los requerimientos de la Contraloria General de la Nación mediante informe de hallazgo.

Cordialmente,

ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2025

Ingeniero:
CESAR AUGUSTO RÍOS
Representante legal
CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Asunto: **Reiteración entrega informe de reparación de losas de pavimento rígido MR3**.

Respetado ingeniero:

Como es de su conocimiento se finalizó por parte del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita la realización de las reparaciones requeridas, por lo que, esta interventoría solicita nuevamente la entrega del informe de reparación con los soportes de calidad con el fin de dar trámite satisfactorio para el recibo de obra.

Por lo anteriormente expuesto se solicita la entrega del informe en un plazo no mayor a un (1) día hábil.

Cordialmente,

ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2025

Ingeniero
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Certificado de ingresos rendimientos cuenta del anticipo contrato 159 de 2023**

Respetado doctor:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, remite el soporte de ingreso de los rendimientos financieros generados en la cuenta del anticipo del contrato 159 de 2023 suscrito con el municipio de Planeta Rica:

- Rendimientos Financieros generados desde septiembre 2024 hasta julio 2025, un total transferido de $ 4,035,275.00

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025

Ingeniero:
CESAR AUGUSTO RÍOS
Representante legal
CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Losas de pavimento rígido MR38 en observación**.

Respetado ingeniero:

Teniendo en cuenta que se han ejecutado las actividades de reparación de las losas de pavimento rígido MR38 que presentaban grietas transversales, y que adicionalmente el Consorcio Pavimento Vía Barranquillita realizó labores de limpieza y sellado de fisuras superficiales utilizando materiales elastoméricos compatibles con el concreto, por lo que, esta interventoría procede a realizar un inventario técnico detallado de las losas intervenidas.

Por lo anterior, se detallan las ubicaciones de las losas selladas con sus coordenadas de referencia:

TRAMO 1			
N° LOSAS	**ABSCISA**	**CARRIL**	**COORDENADA**
1	K0+035.5	IZQUIERDO	8°52´34´´N 76°20´35´´W
2	K0+86.3	IZQUIERDO	8°52´33´´N 76°20´34´´W
3	K0+108.1	IZQUIERDO	8°52´32´´N 76°20´34´´W

4	K0+237.4	IZQUIERDO	8°52´28´´N 76°20´34´´W
5	K0+297.6	DERECHO	8°52´26´´N 76°20´33´´W
6	K0+515.5	DERECHO	8°52´19´´N 76°20´34´´W
7	K0+531.8	DERECHO	8°52´19´´N 76°20´34´´W
8	K0+589.7	IZQUIERDO	8°52´17´´N 76°20´34´´W
9	K0+593.1	IZQUIERDO	8°52´17´´N 76°20´33´´W
10	K0+612.6	IZQUIERDO	8°52´16´´N 76°20´33´´W
11	K0+627.1	IZQUIERDO	8°52´16´´N 76°20´33´´W
12	K0+706.8	IZQUIERDO	8°52´13´´N 76°20´33´´W
13	K0+742.2	IZQUIERDO	8°52´12´´N 76°20´34´´W
14	K0+814.2	DERECHO	8°52´11´´N 76°20´33´´W
15	K0+944.4	IZQUIERDO	8°52´08´´N 76°20´30´´W
16	K1+362.1	DERECHO	8°51´55´´N 76°20´33´´W
17	K1+569.1	IZQUIERDO	8°51´50´´N 76°20´30´´W
18	K1+581.2	IZQUIERDO	8°51´49´´N 76°20´29´´W

19	K1+622.8	IZQUIERDO	8°51´48´´N 76°20´28´´W
20	K1+640.7	IZQUIERDO	8°51´48´´N 76°20´28´´W
21	K1+808	IZQUIERDO	8°51´43´´N 76°20´26´´W
22	K2+028.5	IZQUIERDO	8°51´36´´N 76°20´26´´W
23	K2+111.1	DERECHO	8°51´33´´N 76°20´26´´W
24	K2+139.8	IZQUIERDO	8°51´32´´N 76°20´26´´W
25	K2+145.7	IZQUIERDO	8°51´32´´N 76°20´26´´W

TRAMO 2			
N° LOSAS	**ABSCISA**	**CARRIL**	**COORDENADA**
1	K0+128.6	IZQUIERDO	8°51´11´´N 76°20´25´´W
2	K0+167	IZQUIERDO	8°51´10´´N 76°20´25´´W
3	K0+182.1	IZQUIERDO	8°51´10´´N 76°20´25´´W
4	K0+196.2	IZQUIERDO	8°51´09´´N 76°20´25´´W
5	K0+327.9	IZQUIERDO	8°51´05´´N 76°20´26´´W

Se relaciona registro fotográfico del estado actual de algunas de las losas selladas:



El objetivo de dicho inventario es dejar en estado de observación las losas tratadas con sello, con el fin de establecer un protocolo de seguimiento periódico que permita verificar su comportamiento estructural y funcional en el tiempo, garantizando así la durabilidad del pavimento y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

De igual manera, se solicitan las líneas de demarcación horizontal con pintura en frio y el aseo general de la obra.

Por lo anteriormente expuesto y una vez ejecutadas las actividades pendientes se solicita la entrega del informe de reparación con los soportes de calidad requeridos en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. Esta interventoría considera procedente la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra,

dejando constancia de que la entidad contratante deberá realizar seguimiento técnico periódico a los elementos intervenidos, con el fin de verificar su funcionalidad y comportamiento estructural en el tiempo. En caso de presentarse fallas atribuibles a deficiencias en la ejecución, se advierte que podrán hacerse efectivas las pólizas de estabilidad de la obra, conforme a lo estipulado en el contrato de obra.

Cordialmente,



ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025

Ingeniero:
LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del contrato de interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Montería

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1".

Asunto: **Remisión informe mensual No. 19 correspondiente al periodo de agosto 2025.**

Respetado ingeniero:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, se permite remitir el informe mensual No. 19 correspondiente al periodo de agosto de 2025, para su revisión y aprobación, el cual se encuentra en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1xdjpl4UlY3nAUzjTER_du727Dr3TZ1w5?usp=sharing

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2025

Señores:
HABIB CHAAR SAKR
Representante Legal
Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Corrección instalación de señales verticales.**

Cordial Saludo,

De acuerdo con el recorrido realizado sobre el tramo vial objeto del contrato, se constató la instalación de las señales verticales conforme al diseño aprobado. No obstante, se identificaron algunas señales cuya ubicación no corresponde con el sentido de circulación establecido, lo cual podría generar confusión en los usuarios de la vía.

Por lo anterior, se solicita realizar la reubicación de dichas señales, garantizando su correcta disposición conforme a la normativa vigente y al sentido de tránsito correspondiente. Esta corrección es necesaria para asegurar la funcionalidad y seguridad del sistema de señalización.

Se evidencia con registro fotográficos las señales verticales a reubicar, como son:

















Durante la verificación en sitio, se evidenció que algunas señales verticales instaladas no cumplen con las especificaciones establecidas en el presupuesto del contrato de obra, particularmente en cuanto a sus dimensiones.

Por lo anterior, se solicita al contratista realizar el reemplazo inmediato de dichas señales por unidades que cumplan con las medidas estipuladas en el contrato,

específicamente 75x75 cm, conforme a lo indicado en el ítem correspondiente del presupuesto oficial y en cumplimiento del Manual de Señalización Vial del INVÍAS.





Adicionalmente, se requiere ejecutar labores de aseo y limpieza general en la zona intervenida, incluyendo retiro de residuos, escombros y materiales sobrantes, con el fin de dejar la obra en condiciones óptimas para su entrega formal a la entidad contratante. Realizar esta actividad desde abscisa K0+000 a K0+690 calzada completa.









Tal como se informo previamente en campo, se deben instalar los stickers de identificación de las señales verticales.


Adicionalmente, se solicita tomar medidas para proteger los individuos arbóreos de la compensación, ya que se evidenció que se esta viendo afectados por material vegetal. Por lo anterior, es preciso la entrega del informe de la compensación con la geoferrenciación de los individuos sembrados.

Se solicita al contratista de obra tomar las acciones necesarias para atender de manera inmediata las actividades pendientes identificadas en el tramo vial intervenido. Para ello, se establece como plazo máximo el día 08 de septiembre de 2025 para notificar formalmente el cumplimiento de lo requerido.

En caso de no atender oportunamente lo solicitado, se procederá a elevar la situación ante la entidad contratante, con el fin de iniciar el proceso sancionatorio correspondiente, conforme a lo estipulado en el contrato, por incumplimiento en la entrega a satisfacción del proyecto. Se reitera que toda demora presentada es de entera responsabilidad del contratista de obra.

Agradecemos su atención y pronta gestión de las actividades mencionadas.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2025

Ingeniero
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".
Asunto: **Respuesta oficio OFI-CONS-0100-2025. Orden de operación No. 26**

Cordial saludo,

De acuerdo a su oficio OFI-CONS-0100-2025, mediante el cual el contratista remite orden de operación No.26, una vez revisado esta interventoría se permite manifestar que:

INVERSIONES D&P5 SAS identificados con **NIT 901798929-1: correspondiente a:**

"Ítem 4 del plan de inversión: **TRANSPORTE DE MATERIALES**

FACTURA No. IDP45 por valor de $ 13.160.000,00
VALOR RETENIDO 1%: $131.600,00

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 13.028.400,00 "

Es importante, resaltar que el valor que se aprueba para ser cargado en la plataforma es $ 7.838.587,5 ya que es el valor correspondiente al saldo del plan de inversión reprogramación No. 5 para TRANSPORTE DE MATERIALES.

Una vez revisada, se autoriza su trámite con la salvedad anterior, por lo cual, se solicita subirla con la documentación completa aquí aprobada en la plataforma del encargo fiduciario. Una vez realizadas las transacciones, se solicita iniciar con el proceso de liquidación de la cuenta del anticipo, según lo establece el manual de interventoria y supervisión del INVIAS.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2025

Ingeniero
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Respuesta comunicado OFI-CONS-098-2025 (diseño estructural boxculvert 3x3).**

Cordial saludo,

En atención al comunicado No. OFI-CONS-098-2025, mediante el cual se remite atención de observaciones a los diseños estructurales correspondientes al box culvert 3x3 del tramo Loma de Piedra, y una vez realizada la revisión técnica por parte de nuestro especialista, se presentan las observaciones pertinentes.

Ítem	Observación
Aprobaciones previas. La revisión del componente estructural y su eventual no aprobación solo será válida para construcción si se cuenta con la aprobación de ***todos*** los estudios requeridos que para el caso particular corresponde a los componentes hidráulico y geotécnico.	Sin comentario por parte del Contratista, por lo que se da por recibida y aceptada la salvedad planteada.
Descripción • NSR-10. Se debe retirar el Reglamento NSR-10 de la normatividad técnica de referencia para diseño, toda vez que la misma ***no aplica*** al análisis y diseño de puentes y/o estructuras viales.	• NSR-10. Atendido.
Características del suelo • Capacidad de carga. Para el análisis y diseño de las estructuras en estudio se debe contar con el reporte de capacidad de carga del suelo de fundación en los estados límite de resistencia, evento extremo y servicio, establecidas de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14. En virtud de lo anterior, se solicita incluir en la próxima entrega el Estudio de Suelos desarrollado para el análisis y diseño de las estructuras en cuestión.	• Capacidad de carga. ***Sin atender***. Se insiste en reporta capacidad de carga admisible, sin diferenciar la capacidad en los estados límite de resistencia, evento extremo y servicio según lo establecido en la CCP-14 , lo cual se puede evidenciar en la siguiente imagen: 2.4. Caracteristicas del suelo Capacidad de trabajo: Qa=20.00Tf/m2 a una profundidad de desplante de 4.00m, según estudio de suelos. En el documento denominado *Concepto técnico "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT 3.0x3.0 EN LA VÍA*

Ítem	Observación
	QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA." Se evidencia reporte de lo solicitado que debe ser validado por ele Especialista en Geotecnia de la Interventoría e implementado por el Especialista Estructural en el análisis y diseño. Por lo anterior, se reitera la observación.
Clasificación operacional y zona de desempeño sísmico • I. Aclarar a qué corresponde el coeficiente I = 2.00 que se indica en este aparte de la memoria, toda vez que la CCP-14 no lo contempla. De acuerdo al grupo de uso y verificando la zona de determinar otros fuentes, I = 2.00.	• I. Atendido.
Casos de carga • General. Se deben considerar los casos de carga contemplados en la Sección 3 de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14, los cuales contemplan para el caso en estudio la carga muerta (DC), la carga por la carpeta de rodadura, cargas por empuje vertical del suelo (EV), carga por empuje horizontal del terreno (EH), carga viva vehicular más impacto (LL+IM), sobrecarga por carga viva (LS), carga por flujo de agua (WA), carga sísmica por empuje lateral del suelo (EQ_{ae}) y carga sísmica por inercia de muro y relleno (EQ_{ir}), estás últimas (EQ), determinadas según lineamientos establecidos en la Sección 11 de la CCP-14. • Carga de viento según Reglamento NSR-10. No aplica al caso en estudio. • Sismo. Los parámetros sísmicos deben ser seleccionados según lo establecido para el efecto en la CCP-14, reiterando que el Reglamento NSR-10 ***no aplica*** el análisis y diseño de estructuras como las del caso en estudio. Adicionalmente, se recuerda que para el caso del box culvert no se requiere análisis sísmico, toda vez que corresponde a una estructura enterrada y para el caso de las aletas el análisis sísmico debe seguir lo dispuesto en la Sección 11 de la CCP-14. • Definición, determinación y asignación de cargas. En la memoria debe quedar expresamente indicada la definición de cada uno de los casos de carga considerados, la determinación de las cargas	• General. ***Sin atender***. • Carga de viento según Reglamento NSR-10. ***Sin atender***. • Sismo. ***Sin atender***. • Definición. ***Sin atender***.

Ítem	Observación
correspondientes y su asignación al modelo de análisis.	
Parámetros Sísmicos de Diseño • General. Deben ser definidos según lo establecido en la CCP-14 por el Especialista en Geotecnia del Contratista e incluidos en el Estudio de Suelos. • Ángulo de fricción del relleno. Revisar el valor adoptado, toda vez que los materiales utilizados habitualmente como rellenos no presentan ángulo de fricción interna igual a cero ($\phi = 0°$). • Capacidad de carga. Debe ser establecida en los términos de la CCP-14. • Módulo de reacción vertical. Debe ser revisado e incluir las respectivas unidades en la que se presenta el valor determinado por el Especialista en Geotecnia del Contratista.	• General. ***Sin atender***. • Ángulo de fricción del relleno. ***Sin atender***. • Capacidad de carga. ***Sin atender***. • Módulo de reacción vertical. ***Sin atender***.
Método de análisis y diseño • Análisis modal espectral. No aplica al caso en estudio. • Software. Validar que el software utilizado contemple de manera integral las disposiciones de análisis y diseño de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14 o en su defecto las AASHTO LRFD 2012/2014.	• Análisis modal espectral. Atendido. Se eliminó la referencia al análisis modal espectral. • Software. ***Sin aclarar o atender***.
Análisis y diseño.	Debe ser revisado en su totalidad de acuerdo con la implementación de las observaciones planteadas en el presente documento.
Planos • Implantación. Se debe incluir implantación topográfica del box culvert para establecer alturas de relleno y así validar las cargas correspondientes. • Geometría aletas. Revisar dimensiones, toda vez que lo que se mide en planta no es consistente con lo presentado en secciones transversales. Adicionalmente, evaluar la conveniencia de integrar las aletas al box culvert y la consideración de solera para evitar problemas de socavación.	• Implantación. ***Sin atender***. • Geometría aletas. ***Sin atender o aclarar***. Finalmente, se solicita que los planos sean remitidos en formato CAD parara facilitar y agilizar el proceso de revisión.

Con base en lo anterior, se solicita la subsanación de cada uno de los puntos señalados en el menor tiempo posible, con el fin de no afectar el cronograma establecido y poder avanzar con el desarrollo de las actividades del proyecto, para ello se propone una mesa de trabajo para aclaración de las observaciones aquí presentadas, atentos a la disponibilidad del contratista para agendar reunión.

Cabe resaltar que el contrato de obra tiene como fecha límite de ejecución el 31 de octubre de 2025, por lo que resulta indispensable atender estas observaciones con prontitud.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la pronta respuesta.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

Lo enunciado: Informe especialista estructural interventoria.
cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
Cons.	**Fecha**	**Asunto**	**Entidad**
OFI-CONS-102-2025	2025-09-09	Aclaración sobre inhabilidades para integrar la veeduría ciudadana del proyecto.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-099-2025	2025-09-02	ACTUALIZACION DE POLIZAS.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-100-2025	2025-09-08	ORDEN DE OPERACION 26	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-101-2025	2025-09-08	Acta parcial de actas de vecindad de cierre- balastrera 1 .	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-103-2025	2025-09-08	Remisión de notificación enviada por la Alcaldía Municipal - Acto administrativo No. 118 de 25/03/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA
2025S-VBOG-065622	2025-09-08	Respuesta al Radicado No 2025E-VUVRAZ-093943 Remisión informes Trimestrales No 6 Del Componente Social , Contrato De Interventoría No. LP 5053 de 2023.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-105-2025	2025-09-10	Informe mes de agosto del 2025 del componente social	CONSORCIO PROVIDENCIA
2025S-VBOR-067015	2025-09-12	Solicitud de informe actualizado de reparaciones y acta de recibo definitivo convenio 2217 de 2023 municipio de los Córdobas.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
17-09-2025	2025-09-17	SOLICITUD TRANSFERENCIA VIA SEBRA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-104-2025	2025-09-23	informe de SST del mes de septiembre del 2025	CONSORCIO PROVIDENCIA
2025S-VBOG-070194	2025-09-23	Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-002056 Colombia Rural Municipios de Los Córdoba, Planeta Rica y San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba CI 5053 2023 CO LP-006-23; CO-159-23; CO LP MSBV 008 23	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VCOR-070747	2025-09-24	Solicitud informe de presunto incumplimiento para solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio municipio de los Córdobas, Consorcio pavimento vía barranquillita.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VCOR-070748	2025-09-24	Solicitud informe de presunto incumplimiento para solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio municipio de San Bernardo del Viento. Consorcio L&S	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VBOG-071599	2025-09-26	Devolución Radicado 2025E-VUVRAZ-106307	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-109-2025	2025-09-26	ENTREGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - JULIO.	CONSORCIO PROVIDENCIA
GDI-2025-098	2025-09-29	Estructural box culvert 2.000x1.00 del K3+530 - RO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
GDI-2025-099	2025-09-29	Estructural box culvert 2.000x1.50 del K3+830 - RO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
GDI-2025-100	2025-09-29	Estructural muro de contención H= 3.50 del K4+120 - RO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

29-9-25 35196

GESTIÓN, DISEÑO E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT. 901.238.933-8

GDI-2025-100

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2025

Ing.
ANGELA MARIA DÁVILA MORALES
Representante Legal
CONSORCIO INGECON – INCO
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
Calle 148 No. 7G–42, Barrio Cedro Golf
Ciudad

Fecha 29-9-25 Hora 8:17
Núm. de folios 3
Firma

Referencia: **Contrato de Interventoría 5053 de 2023. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1**

Asunto: **Estructural muro de contención H = 3.50 del K4+120 – R0**

Respetada Ing. Dávila:

Por medio de la presente, se remite informe de revisión del diseño estructural de la obra señalada en el asunto, así:

Ítem	Observación
Aprobaciones previas	La revisión del componente estructural y su eventual no aprobación solo será válida para construcción si se cuenta con la aprobación de ***todos*** los estudios requeridos que para el caso particular corresponde a los componentes hidráulico y geotécnico.
Concepto geotécnico	• Parámetros sísmicos. No se reporta esta información en el documento, por lo que se debe requerir la validación de los datos adoptados por el Especialista Estructural en el análisis y diseño de la estructura del asunto, lo cual debe contar con la respectiva revisión y Aprobación del especialista en Geotecnia de la Interventoría. • Capacidad de carga. No se reportan capacidades de carga para el muro en cuestión.
Diseño del muro - Parámetros	• Normas. La descripción correcta para la CCP-14 es ***Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD***, no existe Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes vigente. • Concreto. No se indican parámetros de resistencia para el concreto estructural y pobre.
Solicitaciones de carga y verificaciones geotécnicas	Se presenta dimensionamiento y parámetros generales que no son consistentes en muchos aspectos con lo

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

Ítem	Observación
	presentado en el anexo, por lo que se recomienda excluir esta información de la memoria y solo hacer referencia a lo indicado en el anexo.
Anexos	• Datos de Entrada – Constantes del suelo. Como se puede evidenciar, se adoptan constantes para la capacidad del suelo que no cuentan soporte desde el área de geotecnia. Por lo anterior, es importante complementar lo pertinente. Adicionalmente, se asigna un peso específico para el material de relleno que es bajo en relación con el peso específico de relleno compactado. El ángulo de fricción internada adoptado no corresponde al que usualmente se considera para un relleno para estructuras. El PGA y Perfil de Suelo debe estar acuerdo con lo que sobre el particular se indique en el estudio de Suelos.

GEOMETRIA DEL MURO	
Longitud Total del Muro, LTM (m)	10
Altura Máxima del Muro, Hmáx Muro (m)	3,5
Altura Mínima del Muro, Hmín Muro (m)	3,5
Ancho de Corona del Vástago, AC (m)	0,3
Proyección Trasera Vástago, BZ (m)	0,1
Proyección Delantera Vástago, BD (m)	0
Longitud Total de la Zapata, LTZ (m)	2,5
Longitud de la Zarpa Delantera, LZD (m)	0,4
Espesor de la Zapata, Hzap (m)	0,4
Sección en Estudio (a diseñar)	LTM2
CONSTANTES DEL SUELO	
Resistencia Suelo F Lim de Resistencia (t/m2)	33
Resistencia Suelo E Lim Evento Extrem (t/m2)	73
Resistencia Suelo Esf Lim de Servicio (t/m2)	24
Peso Específico Suelo de Relleno (t/m3)	1,6
Ángulo Inclinación Talud Relleno β (grados)	0
Áng Fricción Interna Suelo Relleno ϕ'f (grados)	24
Áng Fricción Interna Suelo Cimentac. ϕ'f (grados)	24
Áng Rozamiento terreno - zapata δ (grados)	0
Altura de Suelo sobre Zarpa Del , Hszd (m)	0
Peso Especif. Suelo sobre Zarpa Del (t/m3)	1,8
Altura Libre entre Tope de Muro y Relleno (m)	0
Altura Nivel Freático desde fondo zapata, Hnf(m)	0
CONSTANTES SÍSMICAS	
Coeficiente Aceleración Pico Horiz. PGA	0,1
Clase de Sitio (Clase de Suelo)	D
SOBRECARGA VEHICULAR (obligatoria en proximidad vías)	
Definición del Tipo de Muro	Vinculado a Puente o Vía
Distancia respaldo muro a borde tráfico (m)	0

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia

comercial@gdiconsultores.co

(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

Ítem	Observación
	• Diseño – Recubrimiento. Se debe utilizar 7.50 cm. – Separación máxima entre barras. Debe ser definida con base en lo establecido en la CCP-14. El valor adoptado es bajo e injustificado. – Diámetro refuerzo secundario. El refuerzo secundario para el box y las aletas puede ser #3. – General. Ajustar de acuerdo con la implementación de las observaciones planteadas en el presente documento.
Planos	• PL 2/3. Se debe revisar la implantación del muro y validar de alienarlo en forma recta. En la localización se debe identificar con claridad bordes de zarpa y vástago. • PL 3/3. En la sección transversal se debe indicar la rasante de la vía para validar condiciones de carga. • General. Realizar ajustes de acuerdo con loa implementación de las observaciones planteadas en el presente documento.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda requerir al Contratista la revisión y atención de las observaciones planteadas en el presente documento, emitiendo respuesta escrita a cada una.

Cordialmente,

JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA

Firmado digitalmente por JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Fecha: 2025.09.27 10:47:48 -05'00'

JAVIER JOSÉ CARRILLO ORTEGA
MiC – Estructuras

Anexo: N.A.

Copia: Archivo correspondencia

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

29-9-25 [illegible]

GESTIÓN, DISEÑO E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT. 901.238.933-8

GDI-2025-099

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2025

INGECON LTDA
RECIBIDO
Fecha: 29-9-25 Hora: 8:17
Folios:
Firma:

Ing.
ANGELA MARIA DÁVILA MORALES
Representante Legal
CONSORCIO INGECON – INCO
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
Calle 148 No. 7G–42, Barrio Cedro Golf
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría 5053 de 2023. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1**



Asunto: **Estructural box culvert 2.00x1.50 del K3+830 – R0**

Respetada Ing. Dávila:



Por medio de la presente, se remite informe de revisión del diseño estructural de la obra señalada en el asunto, así:

Ítem	Observación
Aprobaciones previas	La revisión del componente estructural y su eventual no aprobación solo será válida para construcción si se cuenta con la aprobación de ***todos*** los estudios requeridos que para el caso particular corresponde a los componentes hidráulico y geotécnico.
Concepto geotécnico	• Parámetros sísmicos. No se reporta esta información en el documento, por lo que se debe requerir la validación de los datos adoptados por el Especialista Estructural en el análisis y diseño de la estructura del asunto, lo cual debe contar con la respectiva revisión y Aprobación del especialista en Geotecnia de la Interventoría.
Diseño del box culvert - Parámetros	• Normas. La descripción correcta para la CCP-14 es ***Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD***, no existe Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes vigente. • Concreto. No se indican parámetros de resistencia para el concreto estructural y pobre.
Análisis Estructural	En este aparte se indica que el análisis y diseño se realizó para dos condiciones de carga, una sin relleno y otra con relleno, sin emabrgo solo se remite resultados de la condición sin relleno.

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

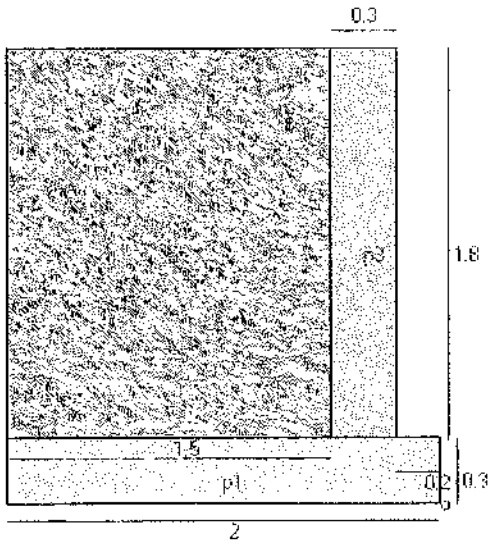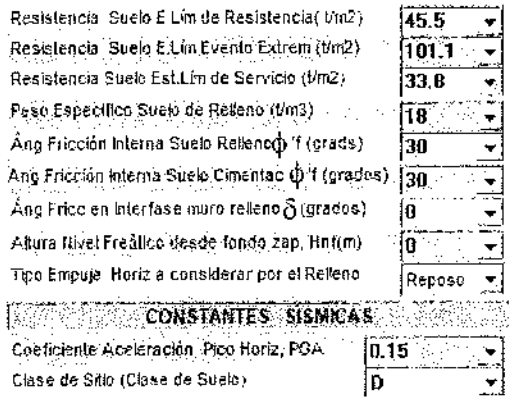Item	Observación
	Por lo anterior, se solicita aclarar, cuál es la condición aplicable a la estructura en estudio.
Anexos	• Datos de Entrada – Dimensionamiento. Se debe justificar una zarpa 2.00 m para un muro de 1.60 m de altura.  – Datos del suelo y del relleno. Se adoptan los valores indicados en la siguiente imagen:  Las capacidades de carga del suelo en los estados límite de resistencia, evento y servicio no corresponden a los indicados en el Concepto Geotécnico.

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

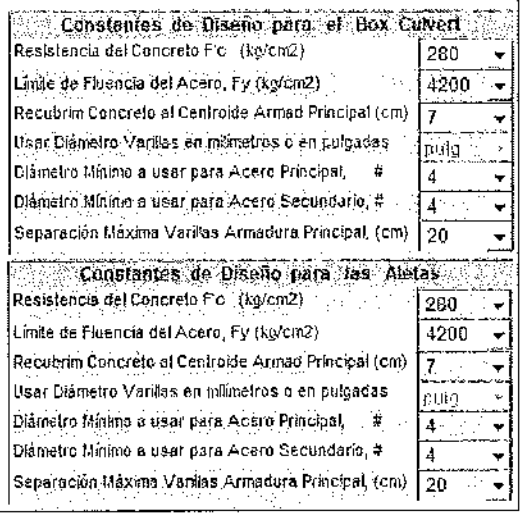Item	Observación
	El peso específico del suelo de relleno (18 Ton/m³) es erróneo y debe ser ajustado a un valor entre 1.80 y 2.00 Ton/m³. El Tipo de Perfil de Suelo debe ser validado por el Especialista en Geotecnia. – Constante para la modificación de la carga del suelo. Se adoptan los valores indicados en la siguiente imagen:  Tipo de Box (según condiciones de relleno): Bajo Terraplén Ancho Horizontal de la Zanja Bd (= Bc para terrapl): 7 Coeficiente Kmiu, según material del relleno: 0.14 Relleno Compactado a lo largo de los laterales del box: No Compactado Lo anterior evidencia las siguientes inconsistencias, a saber: (i) En principio, el box culvert en estudio queda en zanja y no bajo terraplén, por lo anterior, es importante que en la implantación se incluya corte transversal en el que se identifique la rasante de la vía; (ii) El ancho de la zanja para la construcción del muro es muy alta; (iii) El Kmiu debe ser el correspondiente a material de relleno a colocar y (iv) El relleno a colocar debe ser compactado. Por lo anterior, se deben revisar y ajustar todas la variables antes señaladas. – Constantes de diseño. El Diseñador adopta lo siguiente:  Constantes de Diseño para el Box Culvert Resistencia del Concreto F'c (kg/cm2): 280 Límite de Fluencia del Acero, Fy (kg/cm2): 4200 Recubrim Concreto al Centroide Armad Principal (cm): 7 Usar Diámetro Varillas en milímetros o en pulgadas: pulg Diámetro Mínimo a usar para Acero Principal, #: 4 Diámetro Mínimo a usar para Acero Secundario, #: 4 Separación Máxima Varillas Armadura Principal, (cm): 20 Constantes de Diseño para las Aletas Resistencia del Concreto F'c (kg/cm2): 280 Límite de Fluencia del Acero, Fy (kg/cm2): 4200 Recubrim Concreto al Centroide Armad Principal (cm): 7 Usar Diámetro Varillas en milímetros o en pulgadas: pulg Diámetro Mínimo a usar para Acero Principal, #: 4 Diámetro Mínimo a usar para Acero Secundario, #: 4 Separación Máxima Varillas Armadura Principal, (cm): 20

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Observación</th></tr>
<tr><td></td><td>El recubrimiento debe ser 7.50 cm.

La separación máxima debe ser definida con base en lo establecido en la CCP-14. El valor adoptado es bajo e injustificado.

El refuerzo secundario para el box y las aletas puede ser #3.</td></tr>
<tr><td>Diseño</td><td>Según reporte de diseño, se evidencia que el espaciamiento del refuerzo debe ser revisado y el espesor de las placas y/o muros debe ser incrementado para cumplir criterios de cortante, así:

<table>
<tr><th>Mi.</th><th>Posic(m)</th><th>Mu(t m)</th><th>As(cm2)</th><th>Arm.Sug</th><th>Vu(t)</th><th>Vu/Vr (Chec)</th></tr>
<tr><td>m1</td><td>0</td><td>-0.42</td><td>10.07</td><td>1#4 @ 0.12</td><td>14.78</td><td>0.86 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.15</td><td>-6.34</td><td>7.51</td><td>1#4 @ 0.16</td><td>12.86</td><td>0.74 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.4</td><td>-3.63</td><td>6.49</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>9.64</td><td>0.56 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.65</td><td>-1.52</td><td>2.34</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>6.42</td><td>0.37 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.9</td><td>1.87</td><td>2.89</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>3.21</td><td>0.18 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.15</td><td>2.27</td><td>3.51</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-0.01</td><td>0 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.4</td><td>1.87</td><td>2.89</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-3.22</td><td>0.18 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.65</td><td>-1.52</td><td>2.34</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-6.44</td><td>0.37 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.9</td><td>-3.63</td><td>6.49</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-9.66</td><td>0.55 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>2.15</td><td>-6.34</td><td>7.51</td><td>1#4 @ 0.16</td><td>-12.87</td><td>0.74 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>2.3</td><td>-8.42</td><td>10.07</td><td>1#4 @ 0.12</td><td>-14.79</td><td>0.86 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0</td><td>-0.42</td><td>10.07</td><td>1#4 @ 0.12</td><td>-43.8</td><td>2.51 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.15</td><td>-2.91</td><td>4.51</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-36.32</td><td>2.08 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.330</td><td>2.57</td><td>3.90</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-27.26</td><td>1.56 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.526</td><td>6.3</td><td>7.46</td><td>1#4 @ 0.16</td><td>-18.64</td><td>1.06 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.712</td><td>8.41</td><td>10.06</td><td>1#4 @ 0.12</td><td>-10.15</td><td>0.58 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.9</td><td>8.96</td><td>10.75</td><td>1#4 @ 0.11</td><td>-2.09</td><td>0.12 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.090</td><td>8.02</td><td>9.67</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>7.05</td><td>0.4 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.275</td><td>5.64</td><td>6.66</td><td>1#4 @ 0.19</td><td>13.02</td><td>0.75 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.462</td><td>1.89</td><td>2.92</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>20.08</td><td>1.16 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.8</td><td>-8.11</td><td>9.69</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>31.95</td><td>1.83 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.8</td><td>-8.11</td><td>9.69</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>31.95</td><td>1.83 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0</td><td>8.42</td><td>10.07</td><td>1#4 @ 0.12</td><td>43.8</td><td>2.51 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.15</td><td>2.91</td><td>4.51</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>36.32</td><td>2.08 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.330</td><td>-2.57</td><td>3.90</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>27.26</td><td>1.56 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.526</td><td>-6.3</td><td>7.46</td><td>1#4 @ 0.16</td><td>18.64</td><td>1.06 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.712</td><td>-8.41</td><td>10.06</td><td>1#4 @ 0.12</td><td>10.15</td><td>0.58 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.9</td><td>-8.96</td><td>10.75</td><td>1#4 @ 0.11</td><td>2.09</td><td>0.12 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.088</td><td>-8.02</td><td>9.67</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>-7.05</td><td>0.4 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.275</td><td>-5.64</td><td>6.66</td><td>1#4 @ 0.19</td><td>-13.02</td><td>0.75 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.462</td><td>-1.89</td><td>2.92</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-20.08</td><td>1.15 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.65</td><td>3.1</td><td>6.28</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-32.02</td><td>1.83 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.8</td><td>8.11</td><td>9.69</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>-31.96</td><td>1.83 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0</td><td>8.11</td><td>9.69</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>-18.85</td><td>1.08 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.15</td><td>6.46</td><td>7.65</td><td>1#4 @ 0.16</td><td>-18.71</td><td>1.07 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.4</td><td>2.56</td><td>3.96</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-18.49</td><td>1.06 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.65</td><td>-1.58</td><td>2.43</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-6.62</td><td>0.38 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.9</td><td>-2.28</td><td>3.52</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-5.01</td><td>0.29 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.15</td><td>-3.06</td><td>5.86</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-4.79</td><td>0.27 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.4</td><td>-2.28</td><td>3.52</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-4.56</td><td>0.26 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.65</td><td>-1.58</td><td>2.43</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>-2.96</td><td>0.17 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.9</td><td>2.56</td><td>3.96</td><td>1#4 @ 0.2</td><td>8.92</td><td>0.51 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>2.15</td><td>6.46</td><td>7.65</td><td>1#4 @ 0.16</td><td>9.14</td><td>0.52 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>2.3</td><td>8.11</td><td>9.69</td><td>1#4 @ 0.13</td><td>9.28</td><td>0.53 Ok</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia

comercial@gdiconsultores.co

(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

Item	Observación
	No obstante, el diseño del box y de la aleta debe ser revisado de acuerdo con lo indicado en el presente documento.
Planos	• General. Realizar ajustes de acuerdo con loa implementación de las observaciones planteadas en el presente documento. • PL3 – Sección Longitudinal. Se debe indicar la rasante para validar alturas de relleno. Se indica un mejoramiento, sin embargo, no se especifica espesor.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda requerir al Contratista la revisión y atención de las observaciones planteadas en el presente documento, emitiendo respuesta escrita a cada una.

Cordialmente,

JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA

Firmado digitalmente por JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Fecha: 2025.09.27 09:33:45 -05'00'

JAVIER JOSÉ CARRILLO ORTEGA
MIC – Estructuras

Anexo: N.A.

Copia: Archivo correspondencia

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

29-9-25 [illegible]

GESTIÓN, DISEÑO E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT. 901.238.933-8

GDI-2025-098

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2025

29-9-25 8:16.

Ing.
ANGELA MARIA DÁVILA MORALES
Representante Legal
CONSORCIO INGECON – INCO
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
Calle 148 No. 7G-42, Barrio Cedro Golf
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría 5053 de 2023. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1**



Asunto: **Estructural box culvert 2.00x1.00 del K3+530 – R0**

Respetada Ing. Dávila:



Por medio de la presente, se remite informe de revisión del diseño estructural de la obra señalada en el asunto, así:

Item	Observación
Aprobaciones previas	La revisión del componente estructural y su eventual no aprobación solo será válida para construcción si se cuenta con la aprobación de ***todos*** los estudios requeridos que para el caso particular corresponde a los componentes hidráulico y geotécnico.
Concepto geotécnico	• Parámetros sísmicos. No se reporta esta información en el documento, por lo que se debe requerir la validación de los datos adoptados por el Especialista Estructural en el análisis y diseño de la estructura del asunto, lo cual debe contar con la respectiva revisión y Aprobación del especialista en Geotecnia de la Interventoría.
Análisis Estructural	En este aparte se indica que el análisis y diseño se realizó para dos condiciones de carga, una sin relleno y otra con relleno, sin emabrgo solo se remite resultados de la condición sin relleno. Por lo anterior, se solicita aclarar, cuál es la condición aplicable a la estructura en estudio.
Diseño del box culvert - Parámetros	• Dimensionamiento. Las dimensiones de las aletas que se muestran en este aparte son diferentes a las mostradas en los datos de entrada del software de análisis y diseño utilizado. Por lo anterior, se solicita revisar y ajustar con base en lo planteado en el presente documento.

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

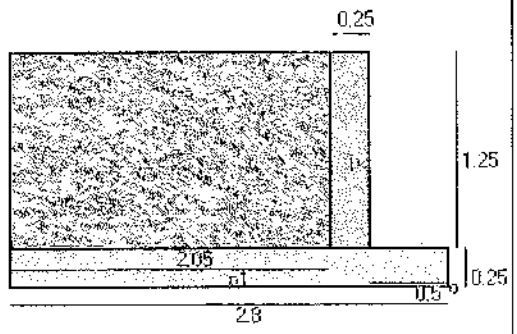Item	Observación
	• Normas. La descripción correcta para la CCP-14 es ***Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD***, no existe Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes vigente. • Concreto. No se indican parámetros de resistencia para el concreto estructural y pobre.
Anexos	• Datos de Entrada – Dimensionamiento. Es diferente del presentado en el cuerpo de la memoria, por lo que se debe revisar y ajustar lo pertinente. Adicionalmente, se debe justificar una zarpa 2.80 m para un muro de 1.25 m de altura.   – Datos del suelo y del relleno. Se adoptan los valores indicados en la siguiente imagen: Resistencia Suelo E Lim de Resistencia(t/m2) 45.5 Resistencia Suelo E.Lim Evento Extrem (t/m2) 101.1 Resistencia Suelo Est.Lim de Servicio (t/m2) 33.8 Peso Especifico Suelo de Relleno (t/m3) 18 Ang Fricción Interna Suelo Relleno ϕ 'f (grads) 30 Ang Fricción Interna Suelo Cimentac ϕ 'f (grados) 30 Ang Fricc en interfase muro relleno δ (grados) 0 Altura Nivel Freático desde fondo zap, Hnf(m) 0 Tipo Empuje Horiz a considerar por el Relleno Reposo CONSTANTES SISMICAS Coeficiente Aceleración Pico Horiz, PGA 0.15 Clase de Sitio (Clase de Suelo) D

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

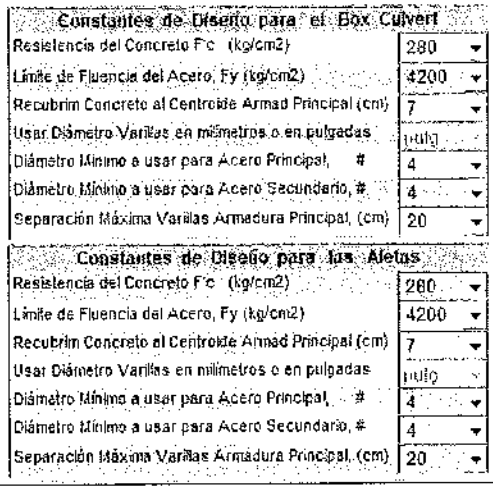Ítem	Observación
	Las capacidades de carga del suelo en los estados límite de resistencia, evento y servicio no corresponden a los indicados en el Concepto Geotécnico. El peso específico del suelo de relleno (18 Ton/m³) es erróneo y debe ser ajustado a un valor entre 1.80 y 2.00 Ton/m³. El Tipo de Perfil de Suelo debe ser validado por el Especialista en Geotecnia. – Constante para la modificación de la carga del suelo. Se adoptan los valores indicados en la siguiente imagen:  Tipo de Box (según condiciones de relleno): Bajo Terraplén Ancho Horizontal de la Zanja Bd (= Bc para terrapl): 7 Coeficiente Kmiu, según material del relleno: 0.14 Relleno Compactado a lo largo de las laterales del box: No Compactado Lo anterior evidencia las siguientes inconsistencias, a saber: (i) En principio, el box culvert en estudio queda en zanja y no bajo terraplén, por lo anterior, es importante que en la implantación se incluya corte transversal en el que se identifique la rasante de la vía; (ii) El ancho de la zanja para la construcción del muro es muy alta; (iii) El Kmiu debe ser el correspondiente a material de relleno a colocar y (iv) El relleno a colocar debe ser compactado. Por lo anterior, se deben revisar y ajustar todas la variables antes señaladas. – Constantes de diseño. El Diseñador adopta lo siguiente:  Constantes de Diseño para el Box Culvert Resistencia del Concreto F'c (kg/cm2): 280 Límite de Fluencia del Acero, Fy (kg/cm2): 4200 Recubrim Concreto al Centroide Armad Principal (cm): 7 Usar Diámetro Varillas en milímetros o en pulgadas: pulg Diámetro Mínimo a usar para Acero Principal, #: 4 Diámetro Mínimo a usar para Acero Secundario, #: 4 Separación Máxima Varillas Armadura Principal, (cm): 20 Constantes de Diseño para las Aletas Resistencia del Concreto F'c (kg/cm2): 280 Límite de Fluencia del Acero, Fy (kg/cm2): 4200 Recubrim Concreto al Centroide Armad Principal (cm): 7 Usar Diámetro Varillas en milímetros o en pulgadas: pulg Diámetro Mínimo a usar para Acero Principal, #: 4 Diámetro Mínimo a usar para Acero Secundario, #: 4 Separación Máxima Varillas Armadura Principal, (cm): 20

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia

comercial@gdiconsultores.co

(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

<table>
<tr><th>Item</th><th>Observación</th></tr>
<tr><td></td><td>El recubrimiento debe ser 7.50 cm.

La separación máxima debe ser definida con base en lo establecido en la CCP-14. El valor adoptado es bajo e injustificado.

El refuerzo secundario para el box y las aletas puede ser #3.</td></tr>
<tr><td>Diseño</td><td>Según reporte de diseño, se evidencia que el espaciamiento del refuerzo debe ser revisado y el espesor de las placas y/o muros debe ser incrementado para cumplir criterios de cortante, así:

<table>
<tr><th>Mi.</th><th>Posic(m)</th><th>Mu(t-m)</th><th>As(cm2)</th><th>Arm.Sug</th><th>Vu(t)</th><th>Vu/Vr (Chcq</th></tr>
<tr><td>m1</td><td>0</td><td>-5.63</td><td>8.48</td><td>1#4@0.14</td><td>14.09</td><td>1 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.125</td><td>-3.87</td><td>5.85</td><td>1#4@0.2</td><td>12.51</td><td>0.89 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.375</td><td>-1.13</td><td>2.22</td><td>1#4@0.2</td><td>9.38</td><td>0.66 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.625</td><td>1.78</td><td>3.53</td><td>1#4@0.2</td><td>6.25</td><td>0.44 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>0.875</td><td>2.96</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>3.12</td><td>0.22 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.125</td><td>3.35</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-0.01</td><td>0 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.375</td><td>2.96</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-3.14</td><td>0.22 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.625</td><td>1.78</td><td>3.53</td><td>1#4@0.2</td><td>-6.27</td><td>0.44 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>1.875</td><td>-1.13</td><td>2.22</td><td>1#4@0.2</td><td>-9.4</td><td>0.67 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>2.125</td><td>-3.87</td><td>5.85</td><td>1#4@0.2</td><td>-12.53</td><td>0.89 Ok</td></tr>
<tr><td>m1</td><td>2.25</td><td>-5.63</td><td>8.48</td><td>1#4@0.14</td><td>-14.09</td><td>1 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0</td><td>-5.53</td><td>8.48</td><td>1#4@0.14</td><td>-32</td><td>2.27 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.125</td><td>-2.77</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-25.9</td><td>1.84 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.25</td><td>-1.41</td><td>2.78</td><td>1#4@0.2</td><td>-19.95</td><td>1.41 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.375</td><td>-1.81</td><td>3.69</td><td>1#4@0.2</td><td>-14.16</td><td>1 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.5</td><td>-2.78</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-8.52</td><td>0.6 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.625</td><td>-3.06</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-3.02</td><td>0.21 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.75</td><td>-2.64</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>3.95</td><td>0.28 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>0.875</td><td>-1.56</td><td>3.07</td><td>1#4@0.2</td><td>7.6</td><td>0.53 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1</td><td>-1.72</td><td>3.4</td><td>1#4@0.2</td><td>12.54</td><td>0.89 Ok</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.25</td><td>-5.5</td><td>8.44</td><td>1#4@0.15</td><td>22.16</td><td>1.57 NO</td></tr>
<tr><td>m2</td><td>1.25</td><td>-5.5</td><td>8.44</td><td>1#4@0.15</td><td>22.16</td><td>1.57 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0</td><td>5.53</td><td>8.48</td><td>1#4@0.14</td><td>32</td><td>2.27 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.125</td><td>2.77</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>25.9</td><td>1.84 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.25</td><td>1.41</td><td>2.78</td><td>1#4@0.2</td><td>19.95</td><td>1.41 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.375</td><td>1.81</td><td>3.69</td><td>1#4@0.2</td><td>14.16</td><td>1 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.5</td><td>2.78</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>8.52</td><td>0.6 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.625</td><td>3.06</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>3.02</td><td>0.21 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.75</td><td>2.64</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-3.95</td><td>0.28 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>0.875</td><td>1.56</td><td>3.07</td><td>1#4@0.2</td><td>-7.6</td><td>0.53 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1</td><td>1.72</td><td>3.4</td><td>1#4@0.2</td><td>-12.54</td><td>0.89 Ok</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.125</td><td>3.02</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-22.23</td><td>1.58 NO</td></tr>
<tr><td>m3</td><td>1.25</td><td>5.5</td><td>8.44</td><td>1#4@0.15</td><td>-22.16</td><td>1.57 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0</td><td>5.5</td><td>8.44</td><td>1#4@0.15</td><td>-18.47</td><td>1.31 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.125</td><td>4.11</td><td>6.24</td><td>1#4@0.2</td><td>-18.39</td><td>1.3 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.375</td><td>-0.51</td><td>1</td><td>1#4@0.2</td><td>-18.19</td><td>1.29 NO</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.625</td><td>-2.56</td><td>5.1</td><td>1#4@0.2</td><td>-6.36</td><td>0.45 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>0.875</td><td>-3.35</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-4.79</td><td>0.34 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.125</td><td>-4.90</td><td>7.53</td><td>1#4@0.16</td><td>-4.6</td><td>0.33 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.375</td><td>-3.35</td><td>5.21</td><td>1#4@0.2</td><td>-4.41</td><td>0.31 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.625</td><td>-2.56</td><td>5.1</td><td>1#4@0.2</td><td>-2.84</td><td>0.2 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>1.875</td><td>-0.51</td><td>1</td><td>1#4@0.2</td><td>8.99</td><td>0.64 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>2.125</td><td>4.11</td><td>6.24</td><td>1#4@0.2</td><td>9.18</td><td>0.66 Ok</td></tr>
<tr><td>m4</td><td>2.25</td><td>5.5</td><td>8.44</td><td>1#4@0.15</td><td>9.27</td><td>0.66 Ok</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

Ítem	Observación
	No obstante, el diseño del box y de la aleta debe ser revisado de acuerdo con lo indicado en le presente documento.
Planos	• General. Realizar ajustes de acuerdo con loa implementación de las observaciones planteadas en el presente documento. • PL3 – Sección Longitudinal. Se debe indicar la rasante para validar alturas de relleno. Se indica un mejoramiento, sin emabrgo, no se especifica espesor.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda requerir al Contratista la revisión y atención de las observaciones planteadas en el presente documento, emitiendo respuesta escrita a cada una.

Cordialmente,

JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Firmado digitalmente por JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Fecha: 2025.09.27 09:31:28 -05'00'

JAVIER JOSÉ CARRILLO ORTEGA
MIC – Estructuras

Anexo: N.A.

Copia: Archivo correspondencia

Carrera 54 No. 106 -18 / Of. 513
Bogotá - Colombia
comercial@gdiconsultores.co
(57) (1) 373 88 44
317 642 10 17

26-9-25

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 25 de septiembre de 2025.

OFI-CONS-109-2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

26-9-25 7:56

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - JULIO.

Estimados Señores,

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, remitir para su conocimiento y archivo los siguientes documentos:

- Soporte de pago de la planilla de seguridad social del mes de julio de 2025.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación.

Atentamente,

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901764629
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO PROVIDENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 67 -5-40	TELÉFONO:	7615834
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112522010		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DIAS DE MORA:	45				
FECHA PAGO (mes/día/año):	2025/09/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN;		2508361100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 206,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 7,900	$ 0	$ 285,800	$ 7,900	$ 273,900
231001	231001- COLFONDOS	2	$ 201,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 8,000	$ 0	$ 281,000	$ 8,000	$ 269,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 650,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 24,200	$ 0	$ 850,800	$ 24,200	$ 875,000
230301	230301- PORVENIR	28	$ 4,587,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 130,200	$ 0	$ 4,587,600	$ 130,200	$ 4,717,800
SUBTOTALES:											$ 5,005,200	$ 170,000	$ 6,133,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS007	EPS007-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2,723,600	$ 0	$ 77,300	$ 0	$ 2,723,600	$ 77,300	$ 0	$ 2,800,900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237,400	$ 0	$ 6,800	$ 0	$ 237,400	$ 6,800	$ 0	$ 244,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 777,400	$ 0	$ 22,100	$ 0	$ 777,400	$ 22,100	$ 0	$ 799,500
ESS024	ESS024-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237,400	$ 0	$ 6,800	$ 0	$ 237,400	$ 6,800	$ 0	$ 244,200
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 469,600	$ 0	$ 13,400	$ 0	$ 469,600	$ 13,400	$ 0	$ 483,000
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 231,400	$ 0	$ 6,600	$ 0	$ 231,400	$ 6,600	$ 0	$ 238,000
SUBTOTALES:													$ 4,676,800	$ 133,000	$ 0	$ 4,809,800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	28		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2,804,800	$ 2,804,800	$ 74,000	$ 0	$ 2,878,800
SUBTOTALES:									$ 2,804,800	$ 74,000	$ 0	$ 2,878,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF18	CCF18-COMFACOR	28	$ 1,497,400	$ 42,500	$ 1,539,900
SUBTOTALES:			$ 1,497,400	$ 42,500	$ 1,539,900

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
ICBF	PACOF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	28	$ 1,124,200	$ 32,800	$ 1,158,200
SENA	PASENA - SENA	28	$ 749,500	$ 21,500	$ 770,800
SUBTOTALES:			$ 1,873,700	$ 53,300	$ 1,927,800

DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	ING. EXTRA TRABAJANDO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PSP SUBSISTENCIA	PSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003300836	YANER STRANGO LUIS ANTONIO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 170,800	$ 0	$ 170,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	5612002	$ 89,100	30	$ 1,423,500	SCCF18-COMFACOR	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
2	CC 1003300845	CLETO DIAZ JAIDER ANDRES	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO		10														230301-PORVENIR	10	$ 474,500	$ 76,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76,000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 474,500	$ 59,400	$ 0	$ 59,400	14-11 - ARL SURA	10	$ 474,500	5612002	$ 33,100	10	$ 474,500	SCCF18-COMFACOR	$ 19,000	$ 9,500	$ 14,300	$ 0	$ 0
3	CC 1003362117	CALDERO MARCOS NESTOR LUIS	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1,423,500	$ 170,800	$ 0	$ 170,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	5612002	$ 89,100	30	$ 1,423,500	SCCF18-COMFACOR	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
4	CC 1006575182	ARROYA CUNTERO CARLOS ALEJANDRA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO	07															25-14 COLPENSIONES	24	$ 1,138,800	$ 182,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182,300	NUEVA EPS CM	24	$ 1,138,800	$ 142,400	$ 0	$ 142,400	14-11 - ARL SURA	24	$ 1,138,800	5612002	$ 71,300	24	$ 1,138,800	SCCF18-COMFACOR	$ 45,600	$ 22,800	$ 34,200	$ 0	$ 0
5	CC 1008720187	VACHECO PAGLA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1,423,500	$ 170,800	$ 0	$ 170,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	5612002	$ 89,100	30	$ 1,423,500	SCCF18-COMFACOR	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
6	CC 1038100535	NARVAEZ CASTRO JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 170,800	$ 0	$ 170,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	5612002	$ 89,100	30	$ 1,423,500	SCCF18-COMFACOR	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
7	CC 1064166803	MARTINEZ MURILLO DAVID JOSE	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO	04	13														231001-COLFONDOS	7	$ 332,150	$ 53,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53,200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	7	$ 332,150	$ 41,600	$ 0	$ 41,600	14-11 - ARL SURA	7	$ 332,150	5612002	$ 20,800	7	$ 332,150	SCCF18-COMFACOR	$ 13,300	$ 6,700	$ 10,000	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901764579
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO PROVIDENCIA CORDOBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 67 - 5 - 46	TELÉFONO:	7825884
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112522010	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES:	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	45		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2508361100

DATOS DE LOS COTIZANTES DETALLE APORTES SEGURIDAD SOCIAL

| | DATOS DEL COTIZANTE | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901704529
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PROVIDENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 67 - 5-48	TELÉFONO:	7815584
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112522010	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DIAS DE MORA:	15		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	250930110

INFORMACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	EXTRANJERO	ACTUALMENTE PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
27	CC 1067263455	TRUJILLO DAZA LUIS MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		10														23030 1-PORVENIR	30	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 474.500	$ 59.400	$ 0	$ 59.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 474.500	5012002	$ 33.100	30	$ 474.500	CCF16-COMFACOR	$ 19.000	$ 9.500	$ 14.300	$ 0	$ 0
28	CC 1007250335	HERNANDEZ TRUJILLO SILSYS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23100 1-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5012002	$ 98.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
29	CC 1027929146	MUÑOZ ALVARO JOSE	CUPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23030 1-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5012002	$ 98.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
30	CC 1027254315	BARRA ALMARIO JUAN JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		15														23030 1-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	15	$ 711.750	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 711.750	5012002	$ 49.800	15	$ 711.750	CCF16-COMFACOR	$ 28.500	$ 14.300	$ 21.400	$ 0	$ 0
31	CC 11108734	ZAMATA PRADO LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		10														23020 1-PROTECCION	10	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000	ESSC24-COOSALUD ES	10	$ 474.500	$ 59.400	$ 0	$ 59.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 474.500	5012002	$ 33.100	10	$ 474.500	CCF16-COMFACOR	$ 19.000	$ 9.500	$ 14.300	$ 0	$ 0
32	CC 1103814129	HERNANDEZ ROZO CLEMENTH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23030 1-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5012002	$ 98.100	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
33	CC 1138078010	ACOSTA CONTRERAS ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	07															25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	MUTUAL SER EPS-S	24	$ 1.138.800	$ 142.400	$ 0	$ 142.400	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	5012002	$ 78.300	24	$ 1.138.800	CCF16-COMFACOR	$ 44.800	$ 22.800	$ 34.200	$ 0	$ 0
34	CC 15613725	MARTINEZ SALCEDO FABIO MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		15														23030 1-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	15	$ 711.750	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 711.750	5012002	$ 48.600	15	$ 711.750	CCF16-COMFACOR	$ 28.500	$ 14.300	$ 21.400	$ 0	$ 0
35	CC 15867889	OSORIO ARROYO JUAN ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	04	10														25-14 COLPENSIONES	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 332.150	$ 41.600	$ 0	$ 41.630	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	5012002	$ 23.200	7	$ 332.150	CCF16-COMFACOR	$ 13.300	$ 6.700	$ 10.000	$ 0	$ 0
36	CC 15872687	DUMOA PINEDA EDGARDO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	04	10														23030 1-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	7	$ 332.150	$ 41.600	$ 0	$ 41.600	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	5012002	$ 23.230	7	$ 332.150	CCF16-COMFACOR	$ 13.300	$ 6.700	$ 10.000	$ 0	$ 0
37	CC 1087277	RUIZ ROYCE JOSE RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																23030 1-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	5012002	$ 139.000	30	$ 2.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
38	CC 1090001685	HERRERA PONTE ROBERTO MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		10														23030 1-PORVENIR	10	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 474.500	$ 59.400	$ 0	$ 59.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 474.500	5012002	$ 33.100	10	$ 474.500	CCF16-COMFACOR	$ 19.000	$ 9.500	$ 14.300	$ 0	$ 0
39	PT 8561538	BLANCO PEÑA CARLOS ALEJANDRO	CUPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	07	10														25-14 COLPENSIONES	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	MUTUAL SER EPS-S	9	$ 427.050	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-11 - ARL SURA	9	$ 427.050	5012002	$ 29.800	9	$ 427.050	CCF16-COMFACOR	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.900	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 17.110.700

26-9-25 [illegible] 21

Fecha: 2025-09-26 06:11:57
Radicado: 2025S-VBOG-071599
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-071599
Fecha: 2025-09-26 06:11:57

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 148 No 7 G 42
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

26-9-25 7:56

ASUNTO: Devolución Radicado 2025E-VUVRAZ-106307

Respetado ANGELA MARIA DAVILA MORALES

De acuerdo al memorando del asunto me permito hacer devolución debido a:

- No presenta el numero de indentificación ni el nombre completo.

Atentamente;

MARIO DELFIN ORTIZ JIMENEZ
Coordinador Grupo Presupuesto e Ingresos

Proyectado por: WILMAR OTAVO PLAZAS
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

24-9-25 8:28:09

Fecha: 2025-09-24 08:06:21
Radicado: 2025S-VCOR-070748
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Nestor Elean Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-09-24T08:06:26-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validado

Al contestar cite este radicado: 2025S-VCOR-070748
Fecha: 2025-09-24 08:06:21

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
CALLE 148 No 7G-42 BARRIO CEDRO GOLF
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Solicitud informe de presunto incumplimiento para solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio municipio de San Bernardo del Viento. Consorcio L&S

En el deber que nos asiste, en las labores de supervisión del convenio 2222-2023 y del contrato de interventoría 5053-2023 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Ingecon Inco y en atención al informe correspondiente al mes de agosto de 2025, donde se indica:

"Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita y el contrato LPMSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente la entrega de informes SST con los respectivos paz y salvo y planillas de seguridad"

En consecuencia, y con fundamento en las obligaciones contractuales de la interventoría, se solicita comedidamente presentar ante el ente contratante el informe de presunto incumplimiento, con la respectiva solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, toda vez que ya han pasado más de tres (03) meses de terminado el contrato de Obra.

Lo anterior, so pena de incurrir la interventoría en posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
DIRECTOR TERRITORIAL (E)

Proyectado por: THALIA ANAYA SOTO
Revisado por: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Aprobado por:

Copia Interna a: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (1120300)
Copia Externa a: NAVONAZAR GONZÁLEZ TORDESILLA ()

INGECON SAS
RECIBIDO
Fecha: 24-9-25 Hora: 8:28
No. de folios: 2
Firma:
El recibido de esta comunicación no implica aceptación

INVIAS

Nestor Elean Lemus Villadiego, DIRECTOR TERRITORIAL
2025-09-24T08:06:32-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN - 11078166

NBTD-7OAG-OF1O-TY78-K175-8719-1919-19

24/09/2025 08:06:32 COT -05

Fecha: 2025-09-24T08:06:32-05:00
Nestor Elean Lemus Villadiego
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
1800012 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
INVIAS

Fecha: 2025-09-24 08:05:27
Radicado: 2025S-VCOR-070747
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2025S-VCOR-070747
Fecha: 2025-09-24 08:05:27

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
CALLE 148 No 7G-42 BARRIO CEDRO GOLF
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Solicitud informe de presunto incumplimiento para solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio municipio de Los Córdobas, Consorcio pavimento vía Barranquillita.

En el deber que nos asiste, en las labores de supervisión del convenio 2217-2023 y del contrato de interventoría 5053-2023 suscrito entre el Instituto y el Consorcio Ingecon Inco y en atención al informe correspondiente al mes de agosto de 2025, donde se indica:

"Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita y el contrato LPMSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente la entrega de informes SST con los respectivos paz y salvo y planillas de seguridad"

En consecuencia, y con fundamento en las obligaciones contractuales de la interventoría, se solicita comedidamente presentar ante el ente contratante el informe de presunto incumplimiento, con la respectiva solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, toda vez que ya han pasado más de tres (03) meses de terminado el contrato de Obra.

Lo anterior, so pena de incurrir la interventoría en posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Fecha: 24-9-25 Hora: 8:29
Folios: 3

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
DIRECTOR TERRITORIAL (E)

Proyectado por: THALIA ANAYA SOTO
Revisado por: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Aprobado por:

Copia Interna a: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (1120300)

INVIAS
Nestor Eliecer Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-409-247[illegible]Documento Firmado
Digitalmente.Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Copia Extema a: TESORERIA TESORERIA ()

INVIAS
Nestor Elean Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-09-24T08:05:34-05:00,Documento Firmado
Digitalmente, Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN - 11078166

NBTD-7OAG-OF1O-TPW0-T175-8719-1418-84

24/09/2025 08:05:41 COT -05

Fecha: 2025-09-24T08:05:32-05:00
Néstor Elean Lemus Villadiego
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
1000012 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
INVIAS

23-9-25 [illegible]

Fecha: 2025-09-22 21:14:52
Radicado: 2025S-VBOG-070194
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-22T21:14:39-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-070194
Fecha: 2025-09-22 21:14:52

RECIBIDO
Fecha: 23-9-25 Hora: 7:33
No. de folios: 4

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INGECON - INCO
CLL 148 No 7G - 42 BARRIO CEDRO GOLF
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-002056 Colombia Rural Municipios de Los Córdobas, Planeta Rica y San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba CI 5053 2023 CO LP-006-23; CO-159-23; CO LP MSBV 008 23

Respetada Ingeniera Dávila:

En atención al radicado 2025E-VUVRAZ-002056 del 9 de enero de 2025, mediante el cual el Contrato de Interventoría 5053-2023, a cargo del CONSORCIO INGECON-INCO, remite documentación ambiental de los contratos de obra LP-006-23; 159-23; LP MSBV 008 23, al respecto esta subdirección precisa lo siguiente:

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado CING-INV-5053-0008-25 y tras la verificación de la documentación ambiental allegada en su versión corregida, se informa que las observaciones formuladas mediante el oficio No. 2024S-VBOG-087125 han sido debidamente aclaradas. Lo anterior en relación con los Informes de Estado Ambiental No. 1 y No. 2, así como sus respectivos anexos, los cuales corresponden al seguimiento y control de la gestión ambiental de los contratos de obra mencionados.

Por otra parte, se recibe el Informe Estado Ambiental de Proyectos No 3 – Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 (periodo reportado: 01/08/2024 -31/10/2024). Al respecto los formatos se encuentran firmados por las partes, por lo cual se asume plena responsabilidad de la veracidad de la información contenida, así como de sus anexos.

-Contrato obra Los Córdobas: No presentó informes mensuales de agosto, septiembre y octubre 2024.

-Contrato obra San Bernardo del Viento: No presentó informes mensuales de agosto, septiembre y octubre 2024.

En relación con los permisos ambientales, se reporta la obtención de los permisos correspondientes, incluyendo el Permiso de Ocupación de Cauce (POC) y el de aprovechamiento forestal. Adicionalmente, se informa que se encuentran en trámite dos permisos POC adicionales.

INVIAS
Martha Helena Ramón Molino, SUBDIRECTORA (E)
2025-06-27T21:14:29-05:00, Documento Firmado Digitalmente, Escane el Código QR Para Validarlo

Se sugiere que, en el próximo Informe de Estado Ambiental del Proyecto, en el numeral 3.3, correspondiente al seguimiento a permisos ambientales, se actualice en el apartado de observaciones el estado actual de los permisos que se encuentran en trámite.

Dentro de los anexos, se allegan los siguientes formatos:

-Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 - Matriz de Cumplimiento Ambiental de PMA o PAGA, firmado por las partes en el que se reporta el cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en el documento PAGA, el cual se encuentra soportado con los anexos documentales y fotográficos.

-Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-2 y 3 PIA y Pre-Actas Mensuales No. 7, 8 y 9, las cuales reportan un valor total de la Gestión Ambiental de $0 (cero); toda vez que durante el periodo reportado no se reportaron actividades objeto de reconocimiento por el rubro ambiental. (CO Los Cordobas y Planeta Rica)

-Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-2 y 3 PIA y Pre-Actas Mensuales 5, 6 y 7 no vienen firmadas por las partes. Reportan un valor total de la Gestión Ambiental de $0 (cero); toda vez que durante el periodo reportado no se reportaron actividades objeto de reconocimiento por el rubro ambiental. (CO San Bernardo del Viento).

De lo expuesto, se concluye que es necesario allegar la información faltante o realizar los ajustes requeridos, con el fin de que la gestión durante la ejecución del proyecto cumpla con los documentos mínimos exigidos para ser remitidos en esta etapa.

Se requiere a la interventoría allegar la siguiente documentación:

Todos los informes mensuales del avance de la gestión ambiental de los contratos de obra en cuestión, que se encuentran pendientes de entrega a la fecha, con concepto de aprobación por parte de la Interventoría.

-Allegar la Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental firmadas.

-El PIA en su versión 2, en el caso se requieran actividades objeto de reconocimiento por el rubro ambiental.

En cuantos a los permisos que se encuentran en trámite y en espera del pronunciamiento por parte de las Autoridades Ambientales competentes se recomienda seguir adelantando las gestiones necesarias para la obtención de dichos permisos.

Por último, y de acuerdo con las fechas de finalización de los contratos (20/12/2024), se recuerda que para surtir el trámite de Balance Ambiental se deben allegar los anexos mínimos exigidos en el Balance Ambiental, los cuales son indispensables para emitir concepto de NO objeción por parte de esta Dependencia, y adelantar el trámite de liquidación respectivo, principalmente los siguientes:

-Anexo No. 4. Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que el contrato de obra. No presenta Procesos en curso).

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-22T21:14:08-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

-Anexo No. 5. Paz y Salvo de Proveedores.

-Anexo No. 7. Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos y pendientes ambientales por concepto de las actividades del proyecto.

-Anexo No. 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposición final de residuos ordinarios y peligrosos.

La Interventoría debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su área de influencia.

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: DANILO JOSE VILLAZON ESCOBAR
Revisado por: JUAN DAVID OIDOR MARQUEZ – COORDINADOR AMBIENTAL
INGRID ELIANA BOGOYA GIL – REVISIÓN JURÍDICA
MONICA CLAUDIA MARCELA VARELA ACEVEDO . REVISIÓN JURÍDICA
Aprobado por:

Copia Interna a: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO (1000012), WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (1120300)
Copia Externa a:

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-22T21:14:56-05:00,Documento Firmado
Digitalmente, Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

22/09/2025 21:15:02 COT -05

E8TD-7OAG-OF1O-TB1E-T175-8593-7027-05

Fecha: 2025-09-22T21:14:57-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110360 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

23-9-25

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 22 de septiembre 2025.

OFI-CONS-104-2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARÍA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

Referencia: Contrato de Obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: informe de SST del mes de septiembre del 2025

Estimados señores.

Me dirijo a ustedes como representante del consorcio providencia con la finalidad de remitir el informe del mes de septiembre del 2025 con sus respectivos documentación para su posterior revisión y aprobación:

- Informe de SST del mes de septiembre del 2025

23-9-25 7:32

EMIRO CARLOS BURGUIL CUBILLOS
C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
Obraprovidencia1@gmail.com

17-9-25 [illegible]

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

Los córdobas, Septiembre 16 de 2025.

Señores
BANCO DE BOGOTA
Montería – Córdoba

ASUNTO: SOLICITUD TRANSFERENCIA VIA SEBRA

Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito respetuosamente realizar transferencia vía sebra a nombre de la DIRECCION DEL TESORO NACIONAL identificado con NIT Nº 899999090-2, al código de portafolio de INVIAS 270, código de operación 137 en la cuenta corriente N.º 61011094 del banco de la república por valor de: ciento cuatro mil trescientos cinco pesos ($104.305); con cargo a la Cuenta Corriente N.º 315220483 del MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS identificado con NIT 800096761-0 denominada AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Lo anterior para realizar el reintegro de los RENDIMIENTOS FINANCIEROS generados durante el mes de agosto de 2025.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
CC. 42.160.437
INTERVENTOR

[illegible]
Fecha: 17-9-25 Hora: 8:01
No. de folios: 2
Firma:

VIVIANA PILAR VERGARA VALVERDE
CC. 1.067.844.308.
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

16 de septiembre de 2025

¡Buen día!

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CERTIFICACION BANCARIA

BANCO DE BOGOTA – BANCA OFICIAL MONTERIA, NIT 860.002.964-4 informa que: El MUNICPIO DE LOS CORDOBAS – CORDOBA identificado con el NIT.800.096.761-0, se encuentra vinculado en la oficina 315 – C.C. ALAMEDAS DEL SINÚ con el siguiente producto:

Cuenta corriente con rendimientos financieros, exenta de gravámenes financieros No **315220483** denominada AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Abierta desde el día 13 de junio de 2023, en estado **ACTIVA**, desde su apertura ha generado los siguientes rendimientos financieros:

MES	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
ENERO		$2,611,471	$531,888
FEBRERO		$2,444,033	$315,750
MARZO		$ 2,011,232	$246,703
ABRIL		$1,239,156	$101.,40
MAYO		$1,280,927	$104,434
JUNIO		$1,240,060	$101,070
JULIO		$1,277,674	$104,464
AGOSTO		$1,276,220	$104,305
SEPTIEMBRE	$841,230	$1,223,396	
OCTUBRE	$2,608,185	$1,187,343	
NOVIEMBRE	$2,525,130	$1,040,646	
DICIEMBRE	$2,610,355	$715,217	

Se expide en Montería el día 16 de septiembre de 2025

Banco de Bogotá
OF/BANCA OFICIAL MONTERIA
EJECUTIVO COMERCIAL

Cordialmente,
Banco de Bogotá

Mejor banco en Colombia 2023: Global Finance Great Place To Work 2023 Sustainability Yearbook 2023 EFR 2023

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 601 332 0101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor

12-9-25 35056

Fecha: 2025-09-11 08:34:20
Radicado: 2025S-VCOR-067015
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Nestor Elean Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-09-11T08:34:24-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VCOR-067015
Fecha: 2025-09-11 08:34:20

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 12-9-25 Hora: 8:16
No. de folios: 3
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
CALLE 148 No 7G-42 BARRIO CEDRO GOLF
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Solicitud de informe actualizado de reparaciones y acta de recibo definitivo convenio 2217 de 2023 municipio de los Córdobas.

En el deber que nos asiste en la supervisión de los convenios suscritos con los municipios, en particular con el convenio 2217-2023 cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA" y en atención al Oficio No. 2024S-VCOR-073389 del 8 de octubre de 2024 y solicitudes posteriores realizadas en visitas técnicas, mediante los cuales se solicitó a esta interventoría requerir al contratista la reparación de las 18 losas fisuradas identificadas en la visita realizada el 30 de septiembre de 2024 por la Contraloría General de la República y a través de constantes solicitudes de cumplimiento de los compromisos pactados, me permito reiterar el requerimiento y solicitar la siguiente información complementaria.

Teniendo en cuenta que el contrato amparado en el Convenio 2217 de 2023 finalizó el 31 de mayo de 2025, y que las reparaciones de las losas por acta de visita previa tenían como fecha de cumplimiento el día 15 de junio de 2025, se solicita lo siguiente:

- Remitir el informe detallado de las reparaciones efectuadas a las 18 losas fisuradas que fueron identificadas por la Contraloría General de la República.
- Presentar un informe actualizado de todas las reparaciones ejecutadas a la fecha dentro del contrato de obra derivado del convenio 2217.
- Enviar copia del Acta de recibo previo y el Acta de entrega y recibo Definitivo del contrato de obra.

Lo anterior con el fin de dar cierre a los compromisos adquiridos y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de interventoría.

Agradezco su atención y pronta respuesta;

Cordialmente,

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
DIRECTOR TERRITORIAL (E)

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Nestor Eliaan Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-09-11T08:34:24-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

Proyectado por: THALIA ANAYA SOTO
Revisado por: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Aprobado por:

Copia Interna a: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ (1120301), WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (1120300)
Copia Externa a: TESORERIA TESORERIA ()

INVIAS

Nestor Elean Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-09-11T08:34:24-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN - 11078166

WBTD-7OAG-OF1O-TMC3-G175-7597-6709-56

11/09/2025 08:34:30 COT -05

Fecha: 2025-09-11T08:34:26-05:00
Nestor Elean Lemus Villadiego
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
1000012 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
IINVIAS

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba, 9 de septiembre del 2025

OFI-CONS-105-2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONALDE VÍAS.

ASUNTO: Informe mes de agosto del 2025 del componente social

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación:

- Informe mes de agosto del 2025 del componente social.

INGECON S.A.S
INTERVENTORIAS
Fecha: 10-9-25 Hora: 3:21
No. de folios: 1
Firma:
Firma de quien recibe que corresponde a la empresa

Atentamente,

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

8-9-25 [illegible]

Fecha: 2025-09-08 00:34:26
Radicado: 2025S-VBOG-065622
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Marlon Helena Romero Montes,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T00:34:26-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-065622
Fecha: 2025-09-08 00:34:26

INGECONSULTORIA
RECIBIDO
Fecha: 8-9-25 Hora: 9:08
No. de folios: 4
Firma:
El recibido de este documento no implica su aprobación

SEÑOR(A):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
CALLE 148 No 7G-42 BARRIO CEDRO GOLF
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al Radicado No 2025E-VUVRAZ-093943 Remisión Informes Trimestrales No 6 Del Componente Social, Contrato De Interventoría No. LP 5053 de 2023.

Respetada Ingeniera Dávila.

En respuesta al radicado No. 2025E-VUVRAZ-093943. con fecha de 28/08/2025, concerniente al Contrato de interventoría No. LP 5053 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1" mediante el cual la interventoría remite a esta dependencia los informe trimestral No 06 del componente social, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de julio de 2025, los siguientes contratos, Contrato LP-MSBV-008-2023 (Municipio de San Bernardo del Viento), Contrato LP-006-2023 (Municipio los Córdobas), Contrato No 159-2023 (Municipio de Planeta Rica) la Subdirección informa lo siguiente:

Informe Trimestral No 6, Contrato LP-006-2023 (Municipio los Córdobas): Se realizó la verificación documental enviada, junto con los respectivos anexos relacionados con las actividades sociales, evidenciando las siguientes inconsistencias:

- **MASPS-MN1-IN-2-FR-3 (Matriz de Cumplimiento de Actividades Sociales):** Se presentan inconsistencias en las fechas del período, ya que se relaciona únicamente el mes de mayo, sin corresponder a un informe trimestral. Además, la fecha del documento no concuerda con el período reportado.
- **MASPS-MN1-IN-3-FR-2 (Balance de Estado Social del Proyecto):** El tipo de informe está marcado como **CIERRE**, y el período reportado corresponde únicamente al mes de mayo, lo cual no se ajusta al carácter trimestral del informe. La fecha también presenta inconsistencias.

Informe Trimestral No 6 Contrato No 159-2023 (Municipio de Planeta Rica): Se realizó la verificación documental enviada, junto con los respectivos anexos relacionados con las actividades sociales, evidenciando la siguiente inconsistencia:

INVIAS
Martha Helena Romero Munoz,SUBDIRECTORA DE, 20250709-081034-225-05-00,Documento Firmado Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

- **MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (Pre-Acta Mensual de Inversión Social):** Se encuentra relacionada como **Pre-Acta de Inversión Social No. 3**, sin claridad sobre su correspondencia con el informe trimestral.

Informe Trimestral No 6 Contrato LP-MSBV-008-2023 (Municipio de San Bernardo del Viento): Se realizó la verificación documental enviada, junto con los respectivos anexos relacionados con las actividades sociales, evidenciando las siguientes inconsistencias:

- **MASPS-MN1-IN-2-FR-3 (Matriz de Cumplimiento de Actividades Sociales):** Las fechas del período corresponden únicamente al mes de mayo, sin ajustarse al informe trimestral. La fecha del documento también presenta inconsistencias.
- **MASPS-MN1-IN-3-FR-6 (Pre-Acta Mensual de Inversión Social):** Se relaciona como Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 5, sin claridad sobre su integración en el informe trimestral.
- **MASPS-MN1-IN-3-FR-2 (Balance de Estado Social del Proyecto):** El tipo de informe está marcado como CIERRE, y el período reportado corresponde únicamente al mes de mayo, lo cual no se ajusta al carácter trimestral del informe. La fecha también presenta inconsistencias.

Observaciones:

Se evidencia que algunos soportes de los informes remitidos corresponden a balances mensuales, cuando lo requerido es el Balance Social Trimestral, el cual debe incluir la trazabilidad completa del período correspondiente y sus respectivos anexos.

Subsanaciones:

Se solicita subsanar las observaciones mencionadas y remitir la documentación corregida en un plazo máximo de ocho (08) días calendario.

Nota:

Se deja constancia de la presente salvedad con el fin de avanzar, en conjunto con el contratista, en la radicación del PAGA y en el desarrollo de todas las actividades asociadas, dentro de los plazos establecidos. Lo anterior, con el propósito de evitar posibles incumplimientos.

Recomendación Adicional

Se recuerda que toda documentación radicada por la interventoría a la entidad debe presentarse con oficio remisorio, indicando que la información enviada ha sido revisada y aprobada

Lo anterior se enmarca en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en el Manual de Interventoría y el Manual de Contratación, que competen a los Gestores Sociales y a las funciones del Servicio Social (SS), sin perjuicio de las acciones que se adelanten desde la supervisión.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: LUIS FERNANDO GARCIA CESPEDES
Revisado por: HILDUARA BARRERA M. Coordinadora Social.
Aprobado por:

Copia Interna a: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO (1000012)
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno, SUBDIRECTORA DE, 2025-09-08T00:34:29-05:00, Documento Firmado Digitalmente, Escanee el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

08/09/2025 00:34:42 COT -05

WBTD-7OAG-OF1O-TDRG-L175-7309-6820-95

Fecha: 2025.09.08T00:34:31-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1100500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

8-9-25

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 – 9

Planeta Rica, Córdoba. 04 de septiembre de 2025.

OFI-CONS-103-2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Calle 148 N° 7G – 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá – Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: Remisión de notificación enviada por la Alcaldía Municipal – Acto Administrativo No. 118 de 25/03/2025

Estimados Señores,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y con el propósito de mantenerlos informados sobre las comunicaciones oficiales relacionadas con el contrato, me permito remitirles copia de la notificación suscrita el supervisor del contrato, mediante la cual se comunica el Acto Administrativo No. 118 del 25 de marzo de 2025, a través del cual se da por terminado un proceso de incumplimiento contractual.

INGECON GAS
RECIBIDO
Fecha: 8-9-25 Hora: 9:06
No. de folios: 1
Firma:
El recibido de esta documento no implica su aceptación

Atentamente,

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 – 9
obraprovidencia1@gmail.com

8-9-25

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 – 9

Planeta Rica, Córdoba. 03 de septiembre de 2025.

OFI-CONS-101-2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON – INCO
ANGELA MARÍA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 7G – 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá – Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: Acta parcial de actas de vecindad de cierre – Balastrera 1.

Estimados señores,

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del consorcio PROVIDENCIA, con el propósito de presentar la siguiente documentación para su posterior estudio y aprobación: - Actas de vecindad de cierre -Tramo 1 – Balastrera 1.

Nota: Se entrega acta parcial con la relación de actas de vecindad del tramo 1 – Balastrera 1, y se continúa avanzando en el levantamiento de actas de vecindad de cierre del tramo 2 - Balastrera 2, una vez se cuente con el levantamiento de todas las actas de cierre se realiza una nueva entrega.

Atentamente,

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 – 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO
Fecha: 8-9-25 Hora: 9:06
No. de folios: 3
Firma:
La recibido de este documento no implica su aceptación

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba 26 de agosto del 2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON – INCO

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Mediante el presente se relaciona el inventario inicial del proyecto tramo 1 – Balastrera 1:

Puente-Balastrera 1
Casa 1-Nora Vertel
Casa 2-Estelita Bertel
Casa 3-Alex Vertel
Casa 4-Angela Sierra
Casa 5-Luz Milena Montes
Casa 6-Jorge Moreno
Casa 7-Bernardo Chávez - (Carlos Salas)
Casa 8-Libardo Gómez
Casa 9-Mirleht Martínez
Casa 10- Yessica Padilla -(Luis Cuello)
Casa 11- Cesar Espitia
Casa 12- Denis Caseres
Iglesia 13- Edis Caseres
Casa 14-Luz Elena Izquierdo
Casa 15-Juan Pablo Mercado
Casa 16-Santa María Mercado
Casa 17-Rosmery Guzmán
Casa 18-Yenis Del Carmen Albarado
Casa 19-Alba Mercado
Casa 20 -Eduardo Caseres
Colegio 21 – Frankil Arráez
Casa 22- Melys Pérez
Casa 23- Antonio Herrera
Casa 24- Luis Atilano
Casa 25 -Verónica Prado
Casa 26- Carmen Atilano - (Lina prado)

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 – 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Casa 27-Nayibe Ricardo
Casa 28- Carmen Moreno
Casa 29-Roside Tirado
Casa 30- Ana Padilla
Casa 31 Ivan Peñate
Cabildo indígena Zenú 32- Tomas Mercado
Casa 33- Verónica González
Casa 34-Cesar Espitia
Casa 35-Joel Mercado
Casa 36-Aracelis Moreno
Casa 37-Marlobis Alean
Casa 38-Veronica González-(Luis)
Casa 39-Jhon Edwin Diaz
Casa 40-Elquin González
Casa 41-Luis Miguel Reyes

Total, de construcciones Balastrera - 1: 42

Atentamente.

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

8-9-25

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 03 de septiembre de 2025.

OFI-CONS-100-2025

Señor(es):
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INGECON-INCO

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: ORDEN DE OPERACIÓN 26

Cordial saludo,

Yo, EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, identificado con la cedula de ciudadanía N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba, actuando como Representante Legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, identificada con NIT. 901.764.629 – 9, me dirijo ante ustedes para solicitarles formalmente la revisión y posterior aprobación de la Factura emitida por **INVERSIONES D&P5 S.A.S.**, identificada con NIT. 901.798.929 – 1, por concepto de **transporte** de TRITURADO, proveniente de la cantera GRUPO AGREGAR (Siberia) ubicada en el municipio de Montería.

Atentamente,

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 – 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 8-9-25 Hora: 9:05
No. de folios: 10
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 – 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

INVERSIONES D&P5 S.A.S.
NIT 901798929-1
calle 68 n 6 - 10 -25, Montería, Córdoba, C.P. 230001
Tel: +57(314)554-6293
juanferdiaz1921@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. IDP45
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO PROVIDENCIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 67 5 40, Colombia, Montería, Córdoba, 230001		03/09/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3157381975	**NIT** 901764629-9	03/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TRANSPORTE DE MATERIALES (Transporte de Triturado proveniente de la cantera Siberia, ubicada en el municipio de Montería y recibida en el centro de acopio del consorcio ubicado en la balastrera 1.)	Servicio	$235.000	56		$13.160.000

Trece millones ciento sesenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-09-03 14:45:51-05:00
Validación DIAN: 2025-09-03 14:46:52-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 1f4423a95acb46282165bfeb7e8b613da2d2f516df16dfe384077ab181c502552c81881b28b78f86d8b82fb30c74c2f1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$13.160.000
Total	$13.160.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089532730 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° IDP40 hasta IDP1000 con vigencia hasta 2026-02-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

GRUPO AGREGAR S.A.S

Nit. 900.482.075 - 4

DIA	MES	AÑO
7	06	2021

VALE DE ENTREGA DE MATERIAL

40705

Cliente: CONSTRUCTORA [illegible]

Tipo de Material Arrastre 3"

Volumen 10 M³

Placa del Vehiculo WPX 562

Firma y Sello de quien recibe	Nombre y Cédula de quien recibe
	C.C.N°

DESPACHADOR

NOTA: Una vez retirado el material de la cantera no se acepta reclamo en calidad y cantidad

CARTERA

GRUPO AGREGAR S.A.S

NIT. 900.482.075 - 4

DIA	MES	AÑO
01	05	25

VALE DE ENTREGA DE MATERIAL

40785

Cliente: Consorcio Montería

Tipo de Material: Bitudet 3/4"

Volumen: 14 m3 — K 4215

Placa del Vehículo: TPX 563

Firma y Sello de quien recibe

Nombre y Cédula de quien recibe

C.C. Nº

PACHADOR:

Una vez retirado el material de la cantera no se acepta reclamo en calidad y volumen

CARTERA

GRUPO AGREGAR S.A.S

Nit. 900.432.075 - 4

DIA	MES	AÑO
28	06	2021

VALE DE ENTREGA DE MATERIAL

No. 40787

Cliente: Colanta - Rafaduk

Tipo de Material Afirmado 3" P-127

Volumen 14 M³

Placa del Vehiculo WPS - 563

Firma y Sello de quien recibe	Nombre y Cédula de quien recibe
	C.C. Nº

DESPACHADOR:

NOTA: Una vez retirado el material de la cantera no se acepta reclamo en calidad y volumen

Cantera

GRUPO AGREGAR S.A.S

Nit. 900.432.975 - 4

VALE DE ENTREGA DE MATERIAL

40791

DIA	MES	AÑO
23	Dic	2021

Cliente:

Tipo de Material

Volumen:

Placa del Vehiculo

Firma y Sello de quien recibe

Nombre y Cédula de quien recibe

DESPACHADOR:

NOTA: Una vez retirado el material de la cantera no se aceptan reclamos por cantidad y calidad.

CANTERA

Certificado
Bancario

Montería, 13 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES D&P5 S.A.S. identificado(a) conNIT 901798929, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	56900007152	2024/02/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

2005

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14980735161

(415)7707212489984(8020) 000001498073516 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 8 9 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES D&P5 S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 68 N 6-10-25 CONJUNTO PICACHO

42. Correo electrónico JUANFERDIAz1921@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 2 9 1 9 5 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	2 0 2 4 0 1 3 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 09 / 17 : 27: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ TORRES YENY ANDREA

985. Cargo REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 20-02-2024 11:45:38AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980735161

(415)7707212489984(8020) 000001498073516 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 8 9 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 3 1 3 1	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 2 0 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980735161

(415)7707212489984(8020) 000001498073516 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 8 9 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 8 0 0 5 1 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	TORRES	YENY	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 5 5 6 3 6 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	PABA	JUAN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADA

2-9-25

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 28 de agosto de 2025.

OFI-CONS-099-2025

Señor(es):
CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS.

Estimados Señores:

Mediante la presente, me dirijo a usted en calidad de representante legal CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación para su posterior estudio y aprobación:

- Pólizas actualizadas de acuerdo con prórroga N°4

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 2-9-25 Hora: 8:00
No. Orden: 9
Firma:
El recibido de esta comunicación no implica su aprobación

Atentamente.

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
194563	BOGOTA	11		15	400052429	5

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
11 / 8 / 2025	18 / 7 / 2025	00:00	31 / 10 / 2025	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 67 N 5-40, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157381975

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9	TELÉFONO	3157381975
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	705,000,000.00	705,000,000.00	705,000,000.00	557,047.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 557,047,00	$ 0,00	$ 105.838,93	$ 662.885,93	Día - Mes - Año 23/08/2025	901764629

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 705,000,000,00	SETECIENTOS CINCO MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEIF AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4841	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APE
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 606 8017
313 793 3900
defensornacionaldeseguros@amoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|08|NT-RC-CUMP1|D001 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D001
AMACIAS

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD Día - Mes - Año	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052429	5	BOGOTA	11 8 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE Día - Mes - Año	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA Día - Mes - Año	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO
18 7 2025	00:00	31 10 2025	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 67 N 5-40, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157381975

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901,764,629 - 9	TELÉFONO	3157381975
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000,000,000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 10 2025 SEGUN LO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (04) DE FECHA 18 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON PRORROGA No. 02 CON FECHA DE 19 DE DICIEMBRE 2024 Y DE ACUERDO CON PRORROGA No. 03 CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE 2024 SE AJUSTA VIGENCIA HASTA 20 DE JULIO DE 2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENCION No 1 DE FECHA 29 DEL DICIEMBRE DE 2023, AMPLICACION A LA SUSPENSION No 1 DEL 29 DE ENERO 2024, ACTA DE REINICIO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024, PRORROGA No 1 DE 01 DE FEBRERO DE 2024 DEL CONTRATO No 159.2023 , DEJANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº 159.2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº 159.2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No.159-2023, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASEGURADO: CONSORCIO PROVIDENCIA; SE TENDRA A MUNICIPIO DE PLANETA RICA 800096765-1 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT 800215807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PLANETA RICA 800096765-1 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT 800215807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A MUNICIPIO DE PLANETA RICA 800096765-1 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052429	5	BOGOTA	Día - Mes - Año 11 8 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
18 7 2025	00:00	31 10 2025	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 67 N 5-40, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157381975

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9	TELÉFONO	3157381975
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

INVIAS NIT 800215807-2 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052429

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	662,886.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
23/08/2025	$ 662.885,93

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 11 DE 2,025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU PÓLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
194564	BOGOTA	11		30	400052428	5

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
11 / 8 / 2025	18 / 7 / 2025	00:00	31 / 10 / 2030	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 67 N 5-40, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157381975

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 67 N 5-40, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157381975

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 10 2025 SEGUN LO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (04) DE FECHA 18 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2025	30/04/2026	1,410,000,000.00	1,081,644.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/07/2025	31/10/2028	2,820,000,000.00	2,228,166.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/07/2025	30/04/2026	5,640,000,000.00	4,326,575.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/10/2025	31/10/2030	4,230,000,000.00	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2025	31/10/2030	23,970,000.00	0.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 7,636,405.00	$ 0.00	$ 1,450,916.95	$ 9,087,321.95	23/08/2025	901764629

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 14,123,970,000.00	CATORCE MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SEIF AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4841	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11,04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AMPARAS
04/02/2025|1307|NT-PI05|NT-CUMP-ESTATAL6|D001 07/03/2025|1307|PI05|CL-CUMP-ESTATAL5|D001

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052428	5	BOGOTA	11 /8 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 18 /7 /2025	00:00 Horas del 31 /10 /2030	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT	901.764.629 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 67 N 5-40, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3157381975
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765 - 1
DIRECCIÓN	CARRERA 17 NO. 5-13 PARQUE PRINCIPAL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765 - 1
DIRECCIÓN	CARRERA 17 NO. 5-13 PARQUE PRINCIPAL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON PRORROGA No. 02 CON FECHA DE 19 DE DICIEMBRE 2024 Y DE ACUERDO CON PRORROGA No. 03 CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE 2024 SE AJUSTA VIGENCIA HASTA 20 DE JULIO DE 2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENCION No 1 DE FECHA 29 DEL DICIEMBRE DE 2023, AMPLICACION A LA SUSPENSION No 1 DEL 29 DE ENERO 2024, ACTA DE REINICIO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024, PRORROGA No 1 DE 01 DE FEBRERO DE 2024 DEL CONTRATO No 159.2023 , DEJANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº 159.2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº 159.2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.159-2023, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS",

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PROVIDENCIA CONFORMADO POR:
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 78.034.207 5%
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 901234686-5 85%
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 901249383-4 10%

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	9,087,322.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
23/08/2025	$ 9,087,321,95

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 11 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052428, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT : 901.764.629 - 9
Asegurado : MUNICIPIO DE PLANETA RICA
NIT : 800.096.765 - 1

Se expide la presente certificación a los 11 días del mes de Agosto de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONSORCIO PROVIDENCIA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023.

Foto 1. Construcción pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K5+060.	Foto 2. Construcción pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K5+290.
	

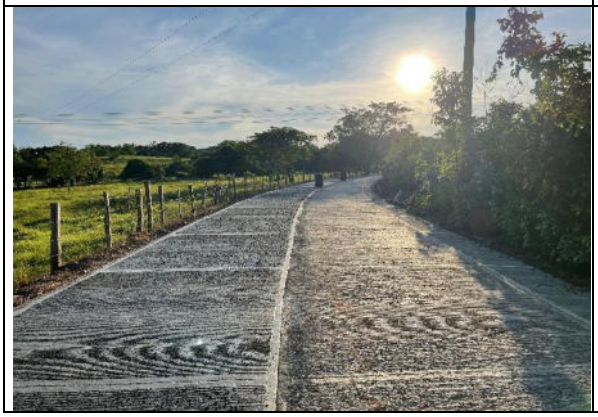
Foto 3. Construcción pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K5+480.	Foto 4. Construcción Bermacunetas 3000PSI premezclado. Abscisa K5+380.
	

Foto 5. Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+710.	Foto 6. Construcción pavimento rigido MR38 premezclado. Abscisa K5+820.
	
Foto 7. Construcción empedrados de protección. Abscisa K3+580.	Foto 8. Construcción bordillos de Bermacunetas 3000PSI premezclado. Abscisa K5+250.
	

Foto 9. Construcción Bermacunetas 3000PSI premezclado. Abscisa K5+780.	Foto 10 Demolición losas fracturadas. Abscisa K1+580.
	
Foto 11. Construcción bordillos de Bermacunetas 3000PSI. Abscisa K5+220.	Foto 12. Construcción bordillos de Bermacunetas 3000PSI. Abscisa K5+360.
	

8.3 BITACORA DE OBRA.

* 01 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: lluvias de 10:00pm a 12:00am
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza adecuación y recompactación de subbase granular en el carril derecho.
Se realiza instalación de rieles en el carril derecho para construcción de pavimento.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para construcción de pavimento.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000 psi en el carril izquierdo del tramo II.

Directa obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 02 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: lluvias a partir de 12:00a. a 2:00 am.
se mantiene señalización preventiva en obra
Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza fundida de pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas K5+317 a K5+437 Carril derecho.
Se toman muestras de concreto para en

Sayos de resistencia.
Se realiza fundida de bordillos de las bermaconetas en el nuevo tramo.
Se realiza excavaciones, adecuación de Subbas.
Se grawlar para las bermaconetas en el Carril derecho.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para las bermaconetas.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 03 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Lluvias a partir de 4:00am a 6:00 am
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los Vehículos que Circulan por los tramos en intervención.
Se realiza adecuación y recompactación de Subbase grawlar en el Carril derecho.
Se realiza instalación de niples en el Carril derecho para Construcción de pavimento rigido en el nuevo tramo.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para Construcción de pavimento rígido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 04 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene Señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza adecuación y recompactación de Subbase granular para Construcción de pavimento rígido en el Carril derecho.
Se realiza instalación de rieles para Construcción de pavimento rígido.
Se realiza excavaciones, adecuación de Subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para bermaswetas.
Se realiza fundida de Pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas Km437 a Km620 Carril derecho.

Residente Interventoría
Vicente Ugalde B.

Proveedor.

* 05 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Lluvias a partir 2:00am a 5:00am.
Se mantiene Señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza adecuación de Subbase granular e instalación de rieles para Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para Construcción de bordillos para las bermaswetas.

Se realiza adecuación de Subbase granular e instalación de acero de refuerzo para bermas cunetas.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director Obra

* 06 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: lluvias a partir 1:00 am a 6:00 am.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que Circulan por los tramos en intervención.
Se realiza fundida de pavimento rígido MR 38 premezclado entre las abscisas Km620 a Km695 Carril derecho.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.
Se realiza fundida de bordillos. con Concreto 3000psi.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director Obr

* 07 de ~~septiembre~~ 2025
Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director obr

* 08 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Lluvias 6:00 am a 8:00 am.
Se mantiene señalización preventiva en obra
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza fundida de pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas K5+695 a K5+761 Carril derecho.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000psi para bermas cunetas.
Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Director obr.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 09 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Seco
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza adecuación de subbase granular e instalación de rieles para construcción de pavimento rígido.
Se realiza excavaciones, adecuación de subbase granular e instalación de acero de refuerzo para construcción de bermas cunetas.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bordillos de las bermas cunetas.

Scanned with CamScanner

Se realiza fundida de pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas Km5+761 a Km5+820 carril derecho.
Se realiza fundida de 20m³ de bermas-cunetas 3000 psi premezclado.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 10 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza excavaciones, adecuación de subbase granular e instalación de acero de refuerzo para bermas-cunetas.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos.

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 11 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: lluvias moderadas de 6:00am a 8:00am
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los Vehículos que circulan por-

Scanned with CamScanner

los tramos en intervención.
Se realiza excavaciones, adecuación de Subbase granular e instalación de rieles y acero de refuerzo para bermanuetas.
Se realiza fundida de bermanuetas con Concreto 3000ps premezclado.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director obr

* 12 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Nublado.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehiculos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza excavaciones, adecuación de subbase granular e instalación de rieles y acero de refuerzo para bermanuetas.
Se realizan protecciones con piedra pegada para evitar socavaciones.
Se realizan cortes en las losas fisuradas para demolición y reparaciones.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director obr.

* 13 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan excavaciones, adecuación de Sub-base granular e instalación de mallas y acero de refuerzo para bermas-cunetas.
Se realizan protecciones con piedra pegada para evitar socavaciones.
Se realizan cortes en las losas fisuradas para realizar demoliciones y reparaciones.
Se realiza fundida de bermas-cunetas con concreto 3000psi premezclado.

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Vizola B.

* 14 de septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco. Lluvias 6:00am a 11:00 am.
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Vizola B.

* 15 de septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantienen señales preventivas en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar el tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza empedrados de protección para evitar socavaciones.

Industrias Macro

Scanned with CamScanner

Se realiza instalación de nicles y acero de refuerzo para bordillos de bermacunetas.
Se realiza cortes en las losas fisuradas para demolición y reparaciones.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000psi. en el tramo 2.

Director obr

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 16 de septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantienen señales preventivas en obra.
Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan empedrados para protección y evitar socavaciones.
Se realizan cortes en losas fisuradas para demolición y reparaciones.
Se realiza instalación de nicles y acero de refuerzo para bordillo de bermacunetas
Se realiza fundida de bordillos con Concreto 3000 psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 17 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan empedrados de protección para evitar socavaciones.
Se realizan cortes en las losas fisuradas para demolición y reparaciones.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de las bermas-cunetas.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000psi en el tramo 2.
Se toman muestras de concreto para ensayo de resistencia.

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 18 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan empedrados de protección para evitar socavaciones.
Se realizan cortes en las losas fisuradas para demolición y reparaciones.
Se realizó instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de las bermas-cunetas.

Se realiza fundida de bordillos con concreto de 3000psi en el tramo 2.
Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.


* 19 de septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco
Se utilizan señales preventivas en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza instalación de viales y acero de refuerzo para bordillos de box coulverts.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000psi en el tramo 2.
Se realiza toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia.
Se realiza empedrado de protección para evitar socavaciones.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 20 de septiembre 2025.
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.


Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza instalación de mallas y acero de refuerzo para bordillos de berma cunetas.
Se realiza empedrados de protección para evitar socavaciones.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000 psi en el tramo 2.



Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director obra

* 21 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Lluvias desde 5:00 am a 9:00 am.
No se realizan actividades en obra (Domingo).



Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director obra

* 22 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan anclajes con acero de refuerzo, instalación de parilla y fundida de 8 losas que presentaban fisuras, utilizando concreto Mezcla Premezclado.

Industrias Macro

Scanned with CamScanner

Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de berma cuneta.
Se realiza fundida de bordillos 3000psi en el tramo 2.
Se realizan empedrados de protección para evitar socavaciones.
Se continúa con las demoliciones de las losas que presentan fracturas.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Dirección

* 23 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza demoliciones de las losas que presentan fracturas.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de berma cuneta.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000 psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.
Se realizan empedrados de protección para evitar socavaciones.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Dirección

* 24 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: lluvias de 8:00am a 9:00am.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan demoliciones de las losas que presentan fracturas.
Se realizan empedrados de protección para evitar socavaciones.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de bermas cunetas.
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Piedra Gris

* 25 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan demoliciones de las losas que presentan fracturas.
Se realizan empedrados de protección para evitar socavaciones.
Se rializa instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de bermacunetas
Se realiza fundida de bordillos con concreto 3000psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para

Scanned with CamScanner

ensayos de resistencia.
Se realiza acopio de materiales granulares.
Se realiza limpieza y aseo general en obra.
Se realiza Visita tecnica con participacion del Supervisor de Invias, municipio, Contratista de obra e interventoria con el fin de Verificar los avances de obra y el Cumplimiento de los Compromisos pactados.
Se realiza Reunión con Veeduría Ciudadana Con el fin de dar a conocer los avances del proyecto y aclarar dudas e inquietudes.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 26 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: lluvias de 10:00am a 12:00pm
Se mantiene Señalización Preventiva en obra
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehiculos que Circulan por los tramos en intervención.
Se realizan demoliciones de losas de pavimento que presentan fracturas.
Se realiza empedrados de proteccion para evitar Socavaciones.
Se realiza instalación de rieles y acero de refuerzo para bordillos de las bermas cunetas.
Se realiza fundida de bordillos con

Concreto 3000psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 27 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Sno.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.
Se realizan empedrados de protección para evitar Socavaciones.
Se realiza instalación de ales y acero de refuerzo para bordillos de las bermas cunetas
Se realiza fundida de bordillos con Concreto 3000 psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.
Se realiza fundida de 15 reparaciones de pavimento rígido MR38 premezclado en el tramo 1.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 28 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: lluvias de 10:00 am a 12:00 pm.
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 29 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehiculos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza corte en las losas que presentan fracturas para demolición en el tramo 1.
Se realiza instalación de nides y acero de refuerzo para bordillos de banquetas.
Se realiza fundida de bordillos 3000psi en el tramo 2.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.
Se realiza atraques con sacos de arena para retener el agua del arroyo con el fin de instalar tubería para la salida del agua, bombear agua retenida y avanza con la construcción de la Solera de protección en el Km+200.

Residente Interventor
Vicente Urzola B.

Supervisor.

* 30 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: lluvias de 5:00pm a 7:00 pm.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para Controlar tráfico de los Vehiculos que circulan por los tramos en intervención.
Se realiza corte de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.
Se realiza bombeo de agua retenida

en el boxculvert del Km200.

Se realizó figuración y armado de acero de refuerzo para losa de protección en el boxculvert Km200.

Residente Interventoría
Vicente Orzola B.
