| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 0159-2023
LP-006-2023
LP-MSBV-008-2023

**Contratista:** CONSORCIO PROVIDENCIA
CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA
CONSORCIO L&S

**Contrato de Interventoría No.** 5053-2023

**Interventoría:** CONSORCIO INGECON-INCO

**Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**

**INFORME MENSUAL No.** 22

**MES O PERIODO:** DICIEMBRE DE 2025

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | |
| 2.1 | Localización | | |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | |
| **3** | **INFORMACION CONTRATO DE OBRA** | | |
| 3.1 | Información general del contrato | | |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | |
| 5.1 | Información general del contrato | | |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | |
| **8** | **Anexos** | | |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**Resolución de designación No. 3490 de fecha 08 DE AGOSTO 2023**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# Resumen mensual Estado General del Proyecto – MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** 5 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

**CONTRATO DE OBRA No.:** 159-2023

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
**FECHA DE INICIO:** 28 DE DICIEMBRE DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 DE DICIEMBRE DE 2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 05 DE DICIEMBRE DE 2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025
**PLAZO ACUMULADO:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 14.100.000.000,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 14.100.000.000,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 5.287.335.876,96
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 4.909.469.652,80

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | M | 4.980 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Box culvert - Alcantarillas | UD | 16 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | M | 0 | 4886,65 |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Muro | M | 30 | 30 |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | Obras de arte | UD | 0 | 2 |
| Otros (Especificar cuales) | Box culvert - Alcantarillas | UD | 0 | 2 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 13.747.073.285,00 | | $ 13.747.073.285,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 84.516.798,00 | | $ 84.516.798,00 |
| BOLSA DE AJUSTE | $ - | | $ - |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 67.230.000,00 | $ 12.773.700,00 | $ 80.003.700,00 |
| PAGA | $ 56.222.821,00 | | $ 56.222.821,00 |
| PMT | $ 132.183.396,00 | | $ 132.183.396,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | $ - | | $ - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 14.087.226.300,00 | $ 12.773.700,00 | $ 14.100.000.000,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 262.396.169,00 | $ - | $ 262.396.169,00 | $ 12.565.469.848,00 |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | $ 262.396.169,00 | $ - | $ 262.396.169,00 | $ 12.565.469.848,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 13.747.073.285,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 12.565.469.848,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 91,40%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 34

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de pavimento rigido MR38 premezclado con bermacunetas. Abscisa K5+050.



Construcción de pavimento rigido MR38 premezclado con bermacunetas. Abscisa K5+370.

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**La actual modificación se presenta por variación en cantidades de obra, debido a la actualización de un tramo a intervenir, lo cual implicó la revisión de nuevos estudios y diseños. De igual manera se hace necesario, la inclusión de ítems no previstos con el objetivo de ejecutar el objeto contractual. El acta de fijación de precios es la numero 2 y se suscribe el dia 18 de septiembre de 2025. Los recursos se trasladaron de la partida presupuestal llamada bolsa de ajuste, y se redistribuyeron en mayores cantidades de obra necesarias para garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento, incluyendo obras hidraulicas.**

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.22

CONSORCIO INGECON-INCO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DEL 2023**

PERIDO: DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **VICENTE URZOLA BADEL**<br>**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** | **ANGELA DAVILA MORALES**<br>**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** | **LUIS GONZALEZ OZUNA**<br>**SUPERVISOR INVIAS**<br>**TERRITORIAL CÓRDOBA** |

**TABLA DE CONTENIDO**

1 INTRODUCCIÓN. ..... 6

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 8

2.1 LOCALIZACIÓN. ..... 9

2.2 Inventario y estado inicial de la vía. ..... 12

2.3 Características técnicas del proyecto. ..... 15

2.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA ..... 20

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA. ..... 21

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. ..... 24

3.2.1 MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023: 24

3.2.2 MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023: ..... 27

3.2.3 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023: ..... 27

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS ..... 27

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA ..... 28

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ..... 32

4.1 Informe semanal - MEPI-MN1-IN-15-FR-3. ..... 32

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-4. ..... 33

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6. ..... 34

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ..... 35

4.5 Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10. ..... 36

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11. ..... 37

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12..... 38

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-1439

4.9 Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2 ..... 40

4.10 Seguimiento al Programa de inversiones - MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 ..... 41

4.11 Actas de comité de obra - MEPI-MN-IN-14-FR-1 y MEPI-MN-IN-14-FR-2 42

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 43

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. ..... 43

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ..... 44

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES. ..... 50

5.3.1 INFORMES ESPECIALISTAS. ..... 50

5.3.2 INFORMES PROFESIONALES. ..... 51

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC ..... 52

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS ..... 53

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA..... 59

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 60

6.1 Equipo y vehiculos contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-5. 60

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7. ..... 61

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9. ..... 62

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13..... 63

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15..... 64

6.6 Otros documentos de seguimiento mensual:..... 65

- Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. ..... 65
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado - MEPI-MN-IN-9-FR-2. ..... 66
- Seguimiento al Plan de Cargas - MEPI-MN-IN-9-FR-3. ..... 67

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ..... 68

8 ANEXOS. ..... 73

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. ..... 73

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO. ..... 75

8.3 BITACORA DE OBRA. ..... 77

# 1 INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa – "COLOMBIA RURAL", por lo cual, suscribieron el convenio No. 2286 de 2023 con el municipio de Planeta Rica con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", el convenio No. 2217 de 2023 con el municipio de los Córdoba con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", y el convenio No. 2222 de 2023 con el municipio de San Bernardo Del Viento con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", todos con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2023, luego se realizaron las prórroga #1 hasta el 31 de diciembre de 2024 luego se realizaron las prorroga #2 hasta 31 de diciembre de 2025, y posteriormente se realizaron las prorroga #3 hasta 30 de junio de 2026 los cuales buscan realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad.

Por su parte, los municipios adelantaron los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública de las obras consistentes en el AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, LOS CORDOBA Y SAN BERNARDO DEL VIENTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL, los contratos derivados de cada uno de los convenios antes mencionados, a continuación, se relaciona la información general de los contratos.

| ENTIDAD CONTRATANTE | No. DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO PLANETA RICA | 159-223 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL | $14.100.000.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |
| MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA | LP-006-2023 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $6.140.057.707 |
| MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | LP-MSBV-008-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $2.115.723.321 |

Por parte del Instituto Nacional de Vías, mediante resolución 4606 del 15 de diciembre del 2023, se adjudicó el contrato No. 5053-2023 al CONSORCIO INGECON – INCO, representada legalmente por ANGELA MARIA DAVILA MORALES, para ejecutar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

La cual realizará la Interventoría siguiendo los parámetros técnicos establecidos en el manual de interventoría versión 2022 y los documentos contractuales.

La orden para el inicio de la interventoría fue dada por el INVÍAS, mediante Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085, de fecha 28 de diciembre de 2023, el plazo inicial es hasta el 31 de diciembre de 2023, se realizó una prórroga #1 hasta el 31 de diciembre de 2024, se realizó prorroga #2 hasta 31 de julio de 2025, se realizó prorroga #3 hasta 31 de octubre de 2025, se realizó prorroga #4 hasta 31 de diciembre de 2025 y posteriormente se realizó prorroga #5 hasta 27 de enero de 2025.

El proyecto se desarrolla en la Jurisdicción de la territorial Córdoba, entidad que ejerce la supervisión al contrato de interventoría a traves del ingeniero Luis Gonzalez Ozuna, y el gestor técnico para el proyecto el ingeniero Luis Guillermo Torres Hernandez.

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto en ejecución es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1" para el cumplimiento de las obras en los siguientes municipios, de acuerdo a lo descrito en cada uno de los anexos técnicos de obra:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023**: La vía de Planeta Rica - Providencia, ubicada en el departamento de Córdoba, el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, en la zona rural del municipio de Planeta Rica, que busca optimizar la transitabilidad de la población, con un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto de piezas prefabricadas, colocación de afirmado material para mejoramiento, instalación de señales verticales de tránsito y línea de demarcación con pintura en frio, construcción de obras hidráulicas como son 10 Box Coulvert de 1,00mX1,00mX8m y 6 boxculvert de 2,00mX2,00mX8m.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**: La vía que comunica de Barranquillita con la vereda El Mango, en la zona rural del municipio de los Córdoba, a través de la construcción de un pavimento rígido con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1.421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berma-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto. Construcción de obras hidráulicas: 6 box coulvert de 1,00mX1,00m y L= 6m. De igual manera, se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frio. El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero Fy= 4200 MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**: La construcción de la vía que conduce desde la intersección de la

vía que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento - Moñitos y que es una de los principales corredores ecoturísticos de municipio, esto debido a que es un sector de playas que a su vez es muy apetecido por los turistas y comercial del municipio. El proyecto consta de 780m, en concreto rígido, lo que permitiría tener una superficie de rodadura de buena calidad en todas las épocas del año, además de que es una solución real a las problemáticas de movilidad de la población y sus costos de mantenimientos serían muy bajos a largo plazo.

## 2.1 LOCALIZACIÓN.

La ejecución de los proyectos se realizará en el departamento de Córdoba, el cual está situado en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al este con los departamentos de Sucre y Bolívar, y al sur y oeste con el departamento de Antioquia, el área de influencia directa de los proyectos está en los municipios de Planeta Rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento:

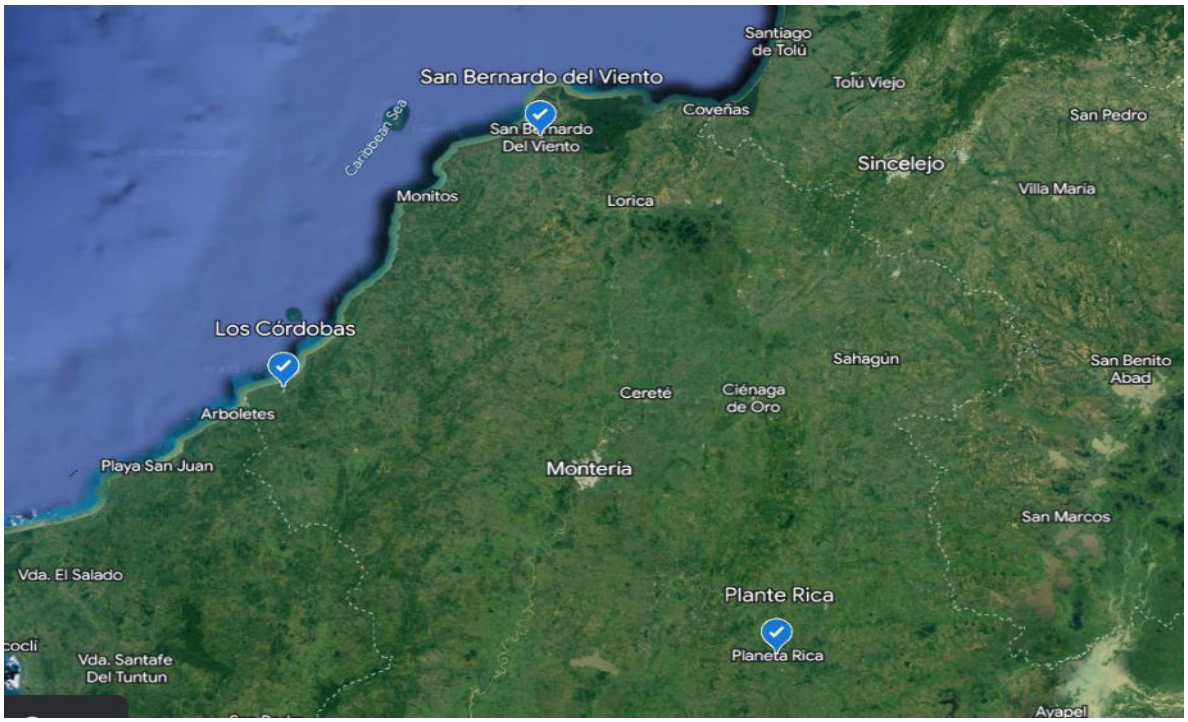



Imagen 1. Localización de los municipios a intervenir con los proyectos dentro del departamento de Córdoba

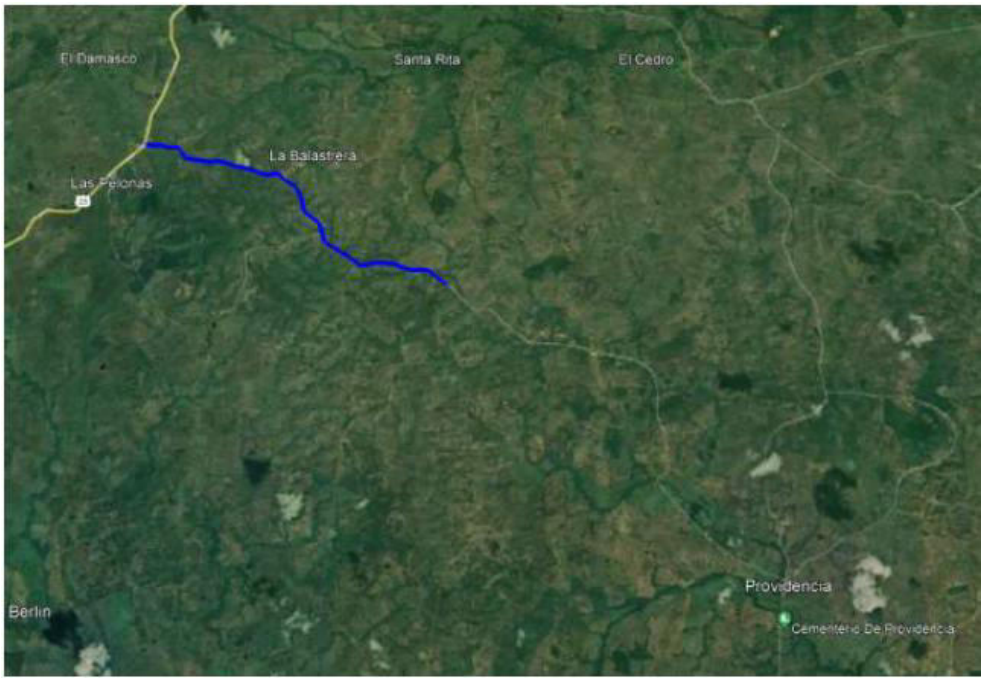



Imagen 2. Localización del tramo a intervenir en el municipio de Planeta Rica departamento de Córdoba

| VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | COORDENADAS | |
| | | N | W |
| INICIO | K0+000 | 8°26´52´´ | 75°30´32´´ |
| FIN | K5+064 | 8°25´32´´ | 75°28´32´´ |
| ALCANTARILLA TRIPLE | K3+540 | 8°25´57´´ | 75°29´12´´ |
| BOXCULVERT 2x1 | K3+610 | 8°25´56´´ | 75°29´10´´ |
| BOXCULVERT 2x1.5 | K3+920 | 8°25´54´´ | 75°29´01´´ |
| CONSTRUIR ALETA Y MURO | K4+190 | 8°25´50´´ | 75°28´53´´ |




Imagen 3. Localización del tramo a intervenir en el municipio de Los Córdoba departamento de Córdoba

| VIA LOS CORDOBA - BARRANQUILLITA | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | COORDENADAS | |
| | | N | W |
| INICIO - TRAMO 1 | K0+000 | 8°52´35´´ | 76°20´35´´ |
| FIN - TRAMO 1 | K2+325.3 | 8°51´26´´ | 76°20´25´´ |
| BOXCULVERT 2x1 | K0+990 | 8°52´21´´ | 76°20´29´´ |
| BOXCULVERT 2x1 | K1+720 | 8°51´46´´ | 76°20´27´´ |
| BOXCULVERT 2x1 | K2+207 | 8°51´30´´ | 76°20´26.12´´ |
| INICIO - TRAMO 2 | k2+680 | 8°51´15´´ | 76°20´26´´ |
| FIN - TRAMO 2 | K3+040 | 8°51´4.57´´ | 76°20´27.39´´ |




Imagen 4. Localización del tramo a intervenir en el municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba

| VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO - RIMINI | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | COORDENADAS | |
| | | N | W |
| INICIO | K0+000 | 9°20´09´´ | 76°03´33´´ |
| FIN | K0+680 | 9°20´26´´ | 76°03´42´´ |
| BOXCULVERT 1.5x1.5 DOBLE | K0+685 | 9°20´26´´ | 76°03´42´´ |

## 2.2 Inventario y estado inicial de la vía.

A continuación, se describe el inventario y estado inicial de las vías objeto de los proyectos en cada uno de los Municipios:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023**: La vía rural que comunica de Planeta Rica - Providencia, ubicada en el departamento de Córdoba "*se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura. Los productores no cuentan con vías óptimas para transportar sus productos al casco rural del Municipio y demás veredas circunvecinas. La longitud total de la vía a intervenir en pavimento rígido suma 4980 metros.*"

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado inicial. Abscisa K0+090. | Estado actual. Abscisa K0+090. |
|  |  |
| Estado inicial. Abscisa K1+000. | Estado actual. Abscisa K1+000. |

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**: La vía a intervenir que comunica a la vereda Barranquillita con la vereda El Mango del municipio Los Córdoba, "*se caracteriza por presentar una topografía ondulada, se encuentra en afirmado y en mal estado lo que afecta de manera directa la transitabilidad vehicular. Dicho tramo vial cuenta una considerable presencia de baches, lodo, desgaste de la capa de rodadura y se evidencia la ausencia de estructuras superficiales de captación y recolección de aguas lluvias. En virtud de lo anterior, los productores de esa región, no cuentan con vías óptimas para transportar sus productos al casco rural del Municipio y demás veredas circunvecinas*."

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado inicial. Abscisa K0+000 | Estado actual. Abscisa K0+000 (Inicio) |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado inicial. Abscisa K2+322 | Estado actual. Abscisa K2+322 |

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**: La vía que conduce desde la intersección que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento – Moñitos, "*la infraestructura vial actual es deficiente, dado que a pesar de que se encuentra en afirmado este se encuentra deteriorado en todos los 780 metros lo que obliga a invertir varias veces recursos al año para su mantenimiento, adicionalmente, en verano genera gran cantidad de material particulado lo que afecta la salud de las poblaciones cercanas además del sector hotelero.*"

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado inicial. Abscisa K0+000 | Estado actual. Abscisa K0+000 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado inicial. Abscisa K0+360 | Estado actual. Abscisa K0+360 |

## 2.3 Características técnicas del proyecto.

Las obras objeto de esta interventoría se ejecutan en los municipios de Planeta Rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, estos proyectos cuentan con una etapa de revisión y/o ajustes a los diseños iniciales, la cual deberá ser realizada por los especialistas de cada contratista. Una vez entregados los diseños definitivos, estos fueron aprobados parcialmente por la interventoría, dando inicio a la ejecución de actividades físicas de los proyectos, en ciertos tramos definidos.

- **Objeto y alcance.**

El objeto de los contratos de obra es:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

  Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". Cuyo alcance comprende;


  *ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)*


  *ETAPA 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.*


El presente proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento de la vía planeta rica – providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la granjita hasta el corregimiento de Providencia, en la zona rural del municipio de Planeta Rica, que busca optimizar la transitabilidad de la población, con un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.

Construcción de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construcción de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.

## ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

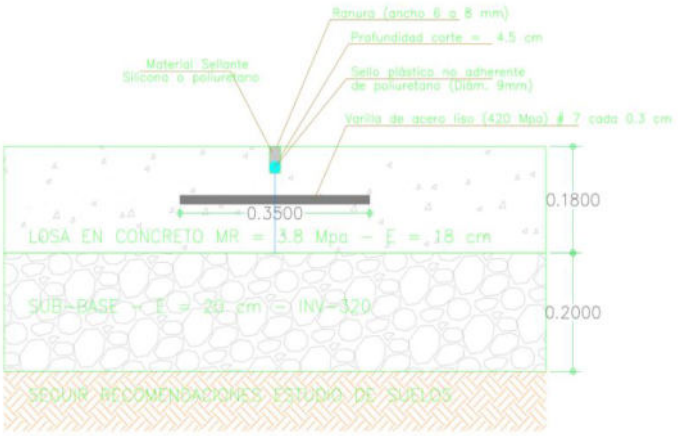

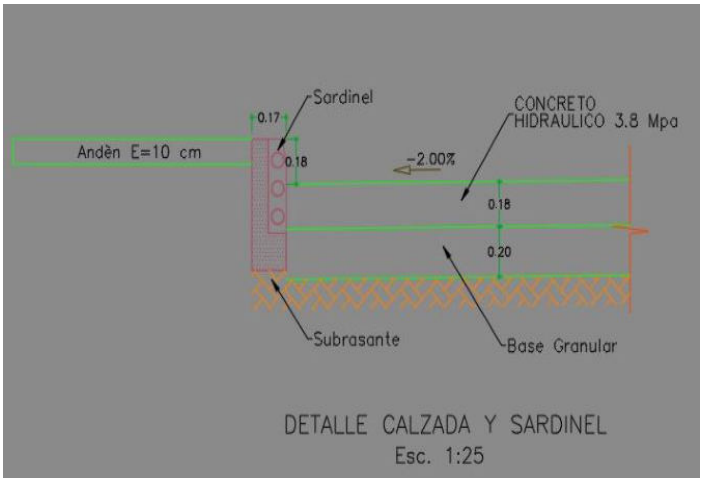
- **Alcance físico actual – Contrato de obra No.159-2023:**

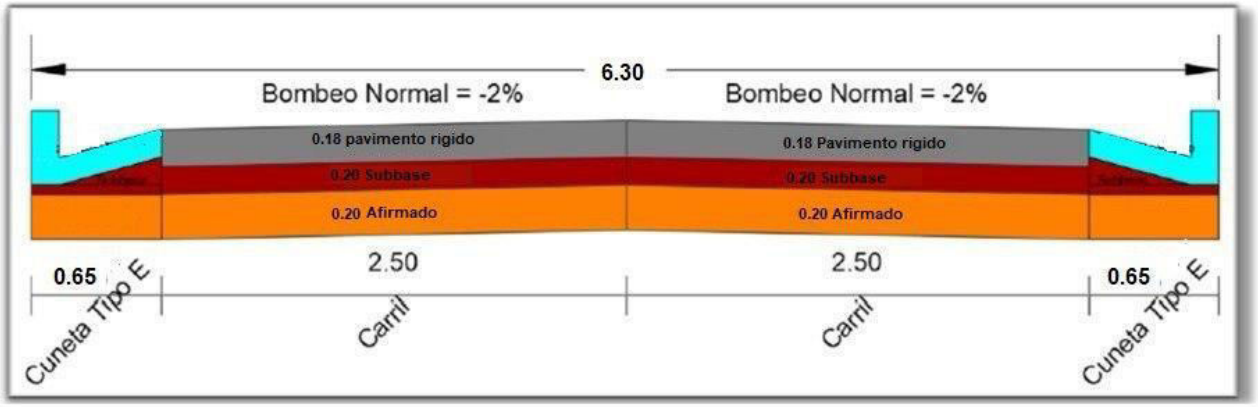Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde se intervendrán 5162 ml de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0,18 m, incluye bermacunetas. Solo se intervendrán 3 obras hidráulicas: 1 box coulvert de 2.0 m x 1.0 m, 2.0 m x 1.5m, 3.0 m x 3.0 m y L = 6 m. Demarcación horizontal a lo largo de todo el pavimento rígido intervenido y la instalación de 96 señales verticales a lo largo del tramo construido, instalación de filtro francés, muro de contención,

reconstrucción de aletas y mantenimiento en dos obras de arte existentes, incluyendo obras complementarias y de protección.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

  Objeto: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DELOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Cuyo alcance comprende:

  *ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS*

  *ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.*

  El presente proyecto consiste en el "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", y busca facilitar la movilidad vehicular y el adecuado desplazamiento de las escorrentías superficiales en la vía que comunica a Barranquillita con la vereda El Mango, en la zona rural del municipio de Los Córdoba a través de la construcción de un pavimento con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1.421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berma-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto.


  Construcción de obras hidráulicas: 6 box coulvert de 1.00 m x 1.00m y L= 6m.

  De igual manera se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frio.

  El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero Fy= 4200 MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**



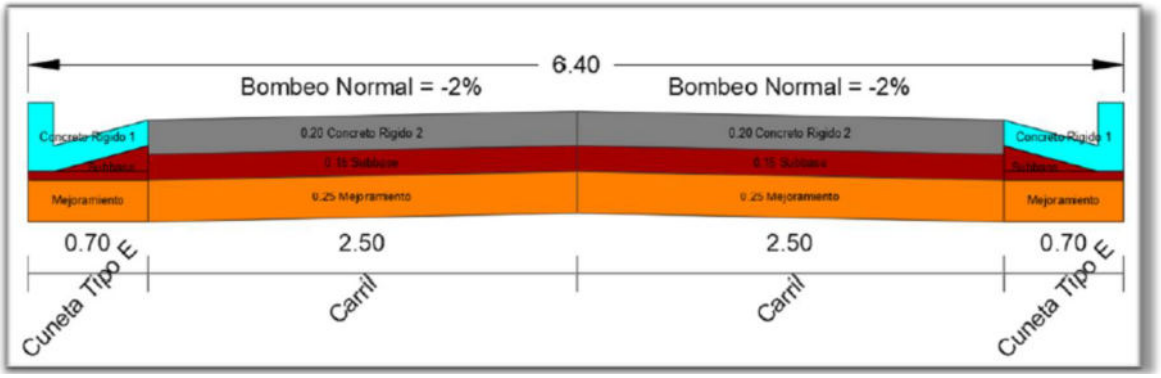


**Alcance físico actual – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde no se ejecutarán las cantidades de la construcción de un muro de contención, y se interviene de 2685 ml de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0,20 m, incluye cuneta y bordillo. Solo se intervinieron 3 obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2.00 m x 1.00 m y L = 6.5 m. Instalación de 15.6ml de barandas metálicas en las obras de arte intervenidas, Demarcación horizontal a lo largo de todo el pavimento rígido intervenido y la instalación de 52 señales verticales a lo largo del tramo construido, incluyendo obras complementarias y de protección.

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

  Objeto*: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL.* Cuyo alcance comprende:


  *ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS*


  *ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO*

El proyecto consta de 780 ml en concreto rígido, lo que permitiría tener una superficie de rodadura de buena calidad en todas las épocas del año, además de que es una solución real a las problemáticas de movilidad de la población y sus costos de mantenimientos serían muy bajos a largo plazo.

Construcción de obras hidráulicas: 1 box coulvert de 1.50 m x 1.50m doble y L= 8m.

**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**

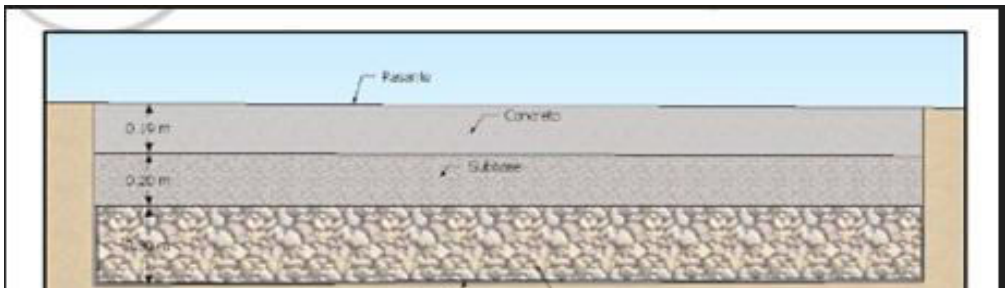

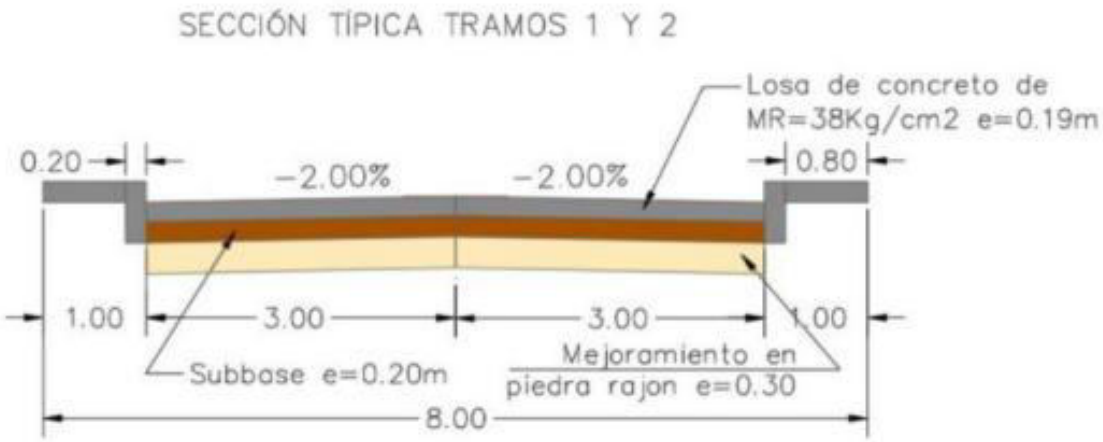
Lo anterior apegado a la norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Instituto de Norma Técnicas ICONTEC.
- American Society for Testing and Materials ASTM.
- American Concrete Institute ACI.
- Portland Cement Association PCA.

**Alcance físico actual – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde se interviene 687.7 ml de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0,19 m,

incluye bordillo. Solo se intervino 1 obras hidráulicas: 1 box coulvert de 1.50 m x 1.50 m doble y L = 6.0 m. Demarcación horizontal a lo largo de todo el pavimento rígido intervenido, la instalación de 22 señales verticales a lo largo del tramo construido y la instalación de filtro francés, incluyendo obras complementarias y de protección.

## 2.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA

La firma de los CONTRATISTAS DE OBRA está compuesta de la siguiente manera:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

**Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.**

| CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PROVIDENCIA | | |
| **INTEGRANTES** | **%** | **ORIGEN** |
| EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO | 5% | COLOMBIA |
| BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S | 85% | COLOMBIA |
| KAP CONSTRUCCIONES S.A.S | 10% | COLOMBIA |

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

**Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA**

| CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA | | |
| **INTEGRANTES** | **%** | **ORIGEN** |
| MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN | 10% | COLOMBIA |
| E INGCARQ S.A.S | 90% | COLOMBIA |

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

**Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S**

| CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023<br>CONSORCIO L&S | | |
|---|---|---|
| **INTEGRANTES** | **%** | **ORIGEN** |
| LA COMERCIALA S.A.S | 50% | COLOMBIA |
| SIS ORGANIZATION S.A.S | 50% | COLOMBIA |

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

**Tabla 4 INFORMACION CONTRATO DE OBRA 0159-2023.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | **CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO PROVIDENCIA** | **NIT:** | **901.764.629 - 9** |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO):** | **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5%<br>BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85%<br>KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%** | | |
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **28 de diciembre de 2023.** | **No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:** | **Acta No.1** |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 14.100.000.000,00** | | |
| **VALOR ADICIONES:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN 1:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN NN:** | **$ 0,00** | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 14.100.000.000,00** | | |
| **ANTICIPO** | **40% de la etapa 2 del contrato** | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | **$ 5.287.335.878,96** | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | **$4.909.469.662,80** | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | **$ 377.866.216,16** | | |
| **PLAZO INICIAL:** | **Hasta 31 de diciembre de 2023** | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | **5 (Cinco)** | | |
| **PRÓRROGA 1:** | **Hasta 20 de diciembre de 2024** | | |
| **PRÓRROGA 2:** | **Hasta 31 de diciembre de 2024** | | |
| **PRÓRROGA 3:** | **Hasta 20 de julio de 2025** | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA 4:** | **Hasta 31 de octubre de 2025** |
| **PRÓRROGA 5:** | **Hasta 27 de enero de 2026** |
| **SUSPENSIÓN 1:** | **29/12/2023** |
| **AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:** | **29/01/2024** |
| **REINICIO 1:** | **01/02/2024** |
| **SUSPENSIÓN 2:** | **23/10/2025** |
| **AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 2:** | **04/11/2025** |
| **AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN 2:** | **20/11/2025** |
| **AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN 2:** | **27/11/2025** |
| **REINICIO 2:** | **05/12/2025** |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | **27 de enero de 2026** |

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023**:

**Tabla 5. INFORMACION CONTRATO DE OBRA LP-006-2023.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | **CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA** | **NIT:** | **901.168.925 - 2** |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO):** | **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10%<br>INGCARQ S.A.S 90%** | | |
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **29 de diciembre de 2023.** | **No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:** | **Acta No.1** |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 6.140.057.707,00** | | |
| **VALOR ADICIONES:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN 1:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN NN:** | **$ 0,00** | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 6.140.057.707,00** | | |
| **ANTICIPO** | **30% del contrato** | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | **$ 1.842.017.312,10** | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | **$ 1.842.017.312,10** | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | **$ 0,00** | | |
| **PLAZO INICIAL:** | **Hasta 31 de diciembre de 2023** | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | **1 (uno)** | | |
| **PRÓRROGA 1:** | **Hasta 30 de noviembre de 2024** | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA 2:** | **Hasta 20 de diciembre de 2024** |
| **PRÓRROGA 3:** | **Hasta 31 de diciembre de 2024** |
| **PRÓRROGA 4:** | **Hasta 31 de mayo de 2025** |
| **SUSPENSIÓN 1:** | **29/12/2023** |
| **AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:** | **29/01/2024** |
| **REINICIO 1:** | **01/02/2024** |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | **31 de mayo de 2025** |

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023**:

**Tabla 6. INFORMACION CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | **CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO L&S** | **NIT:** | **901.765.372 - 6** |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO):** | **LA COMERCIALA S.A.S 50%<br>SIS ORGANIZATION S.A.S 50%** | | |
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **28 de diciembre de 2023.** | **No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:** | **Acta No.1** |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 2.115.723.321,00** | | |
| **VALOR ADICIONES:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN 1:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN NN:** | **$ 0,00** | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 2.115.723.321,00** | | |
| **ANTICIPO** | **30% del valor básico del contrato** | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | **$ 634.716.996,30** | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | **$164.899.083,30** | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | **$ 469.817.913,00** | | |
| **PLAZO INICIAL:** | **Hasta 31 de diciembre de 2023** | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | **04** | | |
| **PRÓRROGA 1:** | **Hasta 27 de octubre de 2024** | | |
| **PRÓRROGA 2:** | **Hasta 20 de diciembre de 2024** | | |
| **PRÓRROGA 3:** | **Hasta 31 de diciembre de 2024** | | |
| **PRÓRROGA 4:** | **Hasta 28 de febrero de 2025** | | |
| **PRÓRROGA 5:** | **Hasta 30 de abril de 2025** | | |
| **PRÓRROGA 6:** | **Hasta 31 de mayo de 2025** | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | **29/12/2023** | | |

| | |
|---|---|
| **AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:** | **29/01/2024** |
| **REINICIO 1:** | **01/02/2024** |
| **SUSPENSIÓN 2:** | **16/03/2024** |
| **AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:** | **16/04/2024** |
| **AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:** | **01/05/2024** |
| **REINICIO 2:** | **14/05/2024** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | **27 de julio de 2024** |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:** | **31 de mayo de 2025** |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

A fecha del corte del presente informe se realizaron las siguientes actividades para cada uno de los contratos:

### 3.2.1 MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:

- **SEMANA No.91: del 05/12/2025 al 11/12/2025**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo: no se presentan lluvias durante la semana.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial.

• Seguido al boxculvert 4.8x2 ubicado en la abscisa k4+200, se avanza con las labores de excavaciones y retiro de material sobrante, mejoramiento con pedraplen, relleno para estructuras con recebo, fundida de solado, figuración - armado de acero de refuerzo y fundida con concreto premezclado de los cimientos del muro de contención. se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

• Se realizan rellenos laterales compactados a lo largo del pavimento rígido construido en el tramo 1.

• El dia 05 de diciembre de 2025 se realiza reinicio de obra n°2, una vez se subsanan las causales que dieron origen a la suspensión n°2.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados:

- CINGE-INV-5053-0294-25 Respuesta comunicados OFI-CONS-115-2025 y OFI-CONS-129-2025 (informe mes de septiembre y octubre de 2025 del componente social).

- CINGE-INV-5053-0295-25 Solicitud de evaluación hidráulica para instalación de filtros.

- CINGE-INV-5053-0296-25 Solicitud actualización de pólizas de acuerdo a reinicio N°2.

- CINGE-INV-5053-0297-25 Solicitud reprogramación de obra de acuerdo a solicitud de prórroga #5.

- **SEMANA No.92: del 12/12/2025 al 18/12/2025.**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo: no se presentan lluvias durante la semana.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial.

• Seguido al boxculvert 4.8x2 ubicado en la abscisa k4+200, se avanza con las labores de figuración - armado de acero de refuerzo e instalación de formaleteria para la pantalla del muro de contención.

• Se realizan rellenos laterales compactados a lo largo del pavimento rígido construido en el tramo 1.

• Se realiza adecuación de desvío para intervención del boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa k5+900.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados.

- CING-INV-5053-0299-25 Remisión informe trimestral No 7 del Componente Social

- **SEMANA No.93: del 19/12/2025 al 25/12/2025**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo: no se presentan lluvias durante la semana.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial.

• Se realiza recorrido técnico por los tramos viales, con participación del supervisor de invias, contratista de obra e Interventoria con el fin de verificar los avances de obra y establecer medidas para avanzar con el desarrollo del proyecto con el fin de terminar en el tiempo estipulado para su ejecución.

• Seguido al boxculvert 4.8x2 ubicado en la abscisa k4+200, se avanza con las labores de figuración - armado de acero de refuerzo, instalación de formaleteria y fundida de pantalla del muro de contención con concreto premezclado 4000psi.

• Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

• Se solicita que se retomen las actividades de rellenos laterales compactados a lo largo del pavimento rígido construido.

• Se realiza cerramiento y trazado preliminar de boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa k5+900.

• Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados.

- CING-INV-5053-0301-25 Revisión reprogramación de obra.

- **SEMANA No.94: del 26/12/2025 al 01/01/2026**

Las actividades desarrolladas durante la presente semana son:

• Estado del tiempo: no se presentan lluvias durante la semana.

• Se mantiene instalación de señales preventivas en el corredor vial.

• Seguido al boxculvert 4.8x2 ubicado en la abscisa k4+200, se avanza con las labores de desencofrado de la pantalla del muro de contención, relleno lateral compacto e instalación de filtro.

• Se solicita que se retomen las actividades de rellenos laterales compactados a lo largo del pavimento rígido construido.

• Se avanza con las excavaciones y demolición de la alcantarilla existente para la construcción del boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa k5+900.

• Igualmente, en el transcurso de la semana no se enviaron por correo electrónico comunicados.

### 3.2.2 MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:

Para este periodo no aplica, finalizo el 31 de mayo de 2025.

### 3.2.3 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:

Para este periodo no aplica, finalizo el 31 de mayo de 2025.

## 3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

  Se encuentran revisados y aprobados los precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

- **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

  Se encuentran revisados y aprobados los precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

- **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

  Se encuentran revisados y aprobados los precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

## 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra 159-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

| Valor Total ejecutado acumulado al mes 22 | $ 12.565.469.848,00 |
|---|---|
| **Valor Obra Básica en el mes 22** | **$ 262.396.169,00** |
| **Valor Básico Estudios y Diseños** | **$0,00** |
| **Valor total Iva** | **$ 0,00** |
| **Porcentaje ejecutado acumulado obra básico** | **91.40%** |
| **Porcentaje programado acumulado obra básico** | **91.45%** |

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 91.40%, vs avance programado del 91.45%, presentando atraso del -0.05% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #4, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista aumentar el ritmo de trabajo, para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. El municipio adelantó las gestiones correspondientes y se tramitó la adición de $115.000.000 necesarios que permitan cubrir los costos de interventoría asociados a la prórroga #5, hasta el 27 de enero de 2026.

- **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-006-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

| **Valor Total ejecutado acumulado** | **$ 5.873.079.611,00** |
|---|---|
| **Valor Obra Básica** | **$0,00** |
| **Valor Básico Estudios y Diseños** | **$0,00** |
| **Valor total Iva** | **$ 0,00** |
| **Porcentaje ejecutado acumulado obra básico** | **100.00%** |
| **Porcentaje programado acumulado obra básico** | **100.00%** |

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y las reparaciones en diferentes losas que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

- **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-MSBV-008-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

| **Valor Total ejecutado acumulado** | **$ 2.008.640.979,00** |
|---|---|
| **Valor Obra Básica** | **$0,00** |
| **Valor Básico Estudios y Diseños** | **$ 0,00** |
| **Valor total Iva** | **$ 0,00** |
| **Porcentaje ejecutado acumulado obra básico** | **100.00%** |
| **Porcentaje programado acumulado obra básico** | **100.00%** |

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y la instalación de señales verticales, que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

Actividades ejecutadas en el periodo del presente informe:

- Se realizaron los informes semanales.
- Reuniones de comité de obra con Invias, contratista y administración municipal.
- Seguimiento técnico (verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del residente de Interventoría, verificación del avance de obra, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, verificación de la disponibilidad de recursos físicos de equipos y maquinaria).
- Seguimiento administrativo (verificación de pagos de salud pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, Otros).
- Verificar el estado y funcionamiento de toda la maquinaria.
- Observar el desempeño del personal del contratista exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional según

corresponda en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo y personal de obra de acuerdo a las actividades ejecutadas.

- Labores de verificación topográfica y de calidad de materiales a usar. Control y verificación del PAGA de la Obra.
- Registro de Bitácora.
- Registro fotográfico para demostrar los avances de obra y los procesos de cada de una actividad contractuales desarrolladas por el contratista.
- Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas.
- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato de obra dentro del presupuesto de tiempo e inversión previstos originalmente.

Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Seguimiento a los trámites en proceso:

Corresponde a realizar el control y seguimiento a los trámites como licencias, permisos, autorizaciones referentes a los componentes técnico, ambiental y social, que realiza el contratista para los tramos en intervención.

- Revisión y seguimiento de documentos contractuales (programa de inversión y PAGA).
- Revisión de los balances parciales del proyecto.
- Revisión de las observaciones del contratista en los tramos a intervenir.
- Reuniones y comités de obra.
- Definición de las estructuras hidráulicas a intervenir en los diferentes corredores viales.

Adicionalmente, la Interventoría hace vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, presupuestal y ambiental, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto.

# 4 REPORTES EJECUCION MENSUAL

Se anexa al informe los siguientes formatos suscritos por los responsables, siguiendo el orden establecido en el Manual de interventoría Versión 2022.

## 4.1 Informe semanal - MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/12/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 91 del 5/12/2025 al 11/12/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml, muro de contención en concreto.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No. 159-2023 — VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2026 — VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,96
VALOR AMORTIZADO: $ 4.909.469.662,80
SALDO POR AMORTIZAR: $ 377.866.216,16

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023 — VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 115.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.334.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.747.073.285,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 13.722.337.856,00 | 99,82% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 12.464.461.260,00 | 90,67% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (1.257.876.596,00) | -9,15% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 13.802.341.556,00 | 97,89% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 12.544.464.960,00 | 88,97% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (1.257.876.596,00) | -8,92% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 315.940.005,00 | 2,30% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 161.387.581,00 | 1,17% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 18 de julio 2025 al 09 de octubre de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 2.471.355.873,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°4. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE A LA FECHA, EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO REPROGRAMACIÓN SEGUN PRORROGA NO. 5

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.104.224.831,00 | 94,83% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.104.224.831,00 | 94,83% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 15.223.633,00 | 0,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 15.223.633,00 | 0,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | x | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/12/2025
PERIODO FACTURADO: dic-25
VALOR FACTURA: $ 50.336.761,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 5.287.335.878,96 |
| Amortizado total $ | $ 4.909.469.662,80 |
| Saldo total $ | $ 377.866.216,16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | $ 0,17 |
| Acumulado: | $ 0,17 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,82%
Meta Física Ejecutada % 90,67%
Avance o Atraso Físico % -9,15%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____2023 | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | GL | 1 | | | Prog | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| | | | | | Ejec | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| * Obra | GL | 1 | | | Prog | $ 13.747.073.285,00 | | | $ 13.722.337.856,00 | 99,82% |
| | | | | | Ejec | $ 12.464.461.260,00 | | | $ 12.464.461.260,00 | 90,67% |
| * Obras de compensación ambiental y PAGA | GL | 1 | | | Prog | $ 169.033.596,00 | | | $ 169.033.596,00 | 75,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * Programa de Manejo de Transito | GL | 1 | | | Prog | $ 132.183.396,00 | | | $ 132.183.396,00 | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Motoniveladora | si | 1 |
| Carrotanque | si | 1 |
| Vibrocompactador | si | 1 |
| Retroexcavadora | si | 1 |
| Mezcladora de concreto | si | 1 |
| Vibrador de concreto | si | 1 |
| Cortadora de pavimento | si | 1 |
| Volqueta de 6m3 | si | 1 |
| **Total** | | 8 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE / CIENAGA DE ORO | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA / VIA A MONTERIA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

**OBSERVACIONES:** LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA VS, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SE CUENTA CON DOS RESOLUCIONES AMBIENTALES POR PARTE DE LA CVS, LAS CUALES REQUIEREN COMPENSACIÓN DE 100 INDIVIDUIOS ARBOREOS CADA UNO.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 30 | 25 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 14 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 6 | 11 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 16 | 7 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

**OBSERVACIONES:** EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO: NO SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL.

• SEGUIDO AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200, SE AVANZA CON LAS LABORES DE EXACACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN, RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, FUNDIDA DE SOLADO, FIGURACIÓN - ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDIDA CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LOS CIMIENTOS DEL MURO DE CONTENCIÓN. SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

• SE REALIZAN RELLENOS LATERALES COMPACTADOS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO EN EL TRAMO 1.

• ELDIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REALIZA REINICIO DE OBRA N°2, UNA VEZ SE SUBSANAN LAS CAUSALESQUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN N°2.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0294-25 Respuesta comunicados OFI-CONS-115-2025 y OFI-CONS-129-2025 (informe mes de septiembre y octubre de 2025 del componente social).

- CINGE-INV-5053-0295-25 Solicitud de evaluación hidráulica para instalación de filtros.

- CINGE-INV-5053-0296-25 Solicitud actualización de pólizas de acuerdo a reinicio N°2.

- CINGE-INV-5053-0297-25 Solicitud reprogramación de obra de acuerdo a suscripción de prórroga #5.

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POSTERIOR AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO TRAMO (INCLUYENDO OBRA DE ARTE) Y DEMAS DOCUMENTOS PENDIENTES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Excavacion y mejoramiento con pedraplen para la construcción del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Armado e instalación de acero de refuerzo para los cimientos del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Fundida de cimientos con concreto premezclado del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 92 del 12/12/2025 al 18/12/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml, construcción de muro de contención en concreto.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
INTEGRANTES: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
CONTRATO No. 159-2023 — VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2026 — VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,96
VALOR AMORTIZADO: $ 4.909.469.662,80
SALDO POR AMORTIZAR: $ 377.866.216,16

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023 — VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 115.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.334.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.747.073.285,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 12.479.895.938,00 — 90,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 12.498.051.946,00 — 90,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 18.156.008,00 — 0,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 80.003.700,00 — 0,57%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 12.559.899.638,00 — 89,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 12.578.055.646,00 — 89,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ 18.156.008,00 — 0,13%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 24.735.429,00 — 0,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 33.590.686,00 — 0,24%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 18 de julio 2025 al 09 de octubre de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 2.471.355.873,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°4. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 2.139.224.831,00 — 96,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 2.139.224.831,00 — 96,40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 35.000.000,00 — 1,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 35.000.000,00 — 1,58%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/12/2025
PERIODO FACTURADO: dic-25
VALOR FACTURA: $ 50.336.761,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 5.287.335.878,96 |
| Amortizado total $ | $ 4.909.469.662,80 |
| Saldo total $ | $ 377.866.216,16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | $ 0,17 |
| Acumulado: | $ 0,17 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90,78%
Meta Física Ejecutada % 90,91%
Avance o Atraso Físico % 0,13%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____2023 | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | GL | 1 | | | Prog | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| | | | | | Ejec | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| * Obra | GL | 1 | | | Prog | $ 13.747.073.285,00 | | | $ 12.479.895.938,00 | 90,78% |
| | | | | | Ejec | $ 12.498.051.946,00 | | | $ 12.498.051.946,00 | 90,91% |
| * Obras de compensación ambiental y PAGA | GL | 1 | | | Prog | $ 169.033.596,00 | | | $ 169.033.596,00 | 75,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * Programa de Manejo de Transito | GL | 1 | | | Prog | $ 132.183.396,00 | | | $ 132.183.396,00 | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Motoniveladora | si | 1 |
| Carrotanque | si | 1 |
| Vibrocompactador | si | 1 |
| Retroexcavadora | si | 1 |
| Mezcladora de concreto | si | 1 |
| Vibrador de concreto | si | 1 |
| Cortadora de pavimento | si | 1 |
| Volqueta de 6m3 | si | 1 |
| **Total** | | 8 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: CANTERA JOMEVE / CIENAGA DE ORO | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |
| UBICACIÓN: CANTERA SIBERIA / VIA A MONTERIA | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |

**OBSERVACIONES:** LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA VS, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SE CUENTA CON DOS RESOLUCIONES AMBIENTALES POR PARTE DE LA CVS, LAS CUALES REQUIEREN COMPENSACIÓN DE 100 INDIVIDUOS ARBOREOS CADA UNO.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 30 | 25 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 14 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 6 | 11 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 16 | 7 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

**OBSERVACIONES:** EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

- ESTADO DEL TIEMPO: NO SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.
- SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL.
- SEGUIDO AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200, SE AVANZA CON LAS LABORES DE FIGURACIÓN - ARMADO DE ACERO DE REFUERZO E INSTALACIÓN DE FORMALETERIA PARA LA PANTALLA DEL MURO DE CONTENCIÓN.
- SE REALIZAN RELLENOS LATERALES COMPACTADOS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO EN EL TRAMO 1.
- SE REALIZA ADECUACIÓN DE DESVÍO PARA INTERVENCIÓN DEL BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.
- IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS.

- CING-INV-5053-0299-25 Remisión informe trimestral No 7 del Componente Social

- SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POSTERIOR AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200.
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.
- EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Rellenos laterales a lo largo del pavimento rigido construido, ubicado en la abscisa K2+500.**



**Armado e instalación de acero de refuerzo y formaleteria de la pantalla del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Adecuación de desvio para intervención de boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900.**

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 26/12/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 93 del 19/12/2025 al 25/12/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml, construcción de muro de contención en concreto.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 159-2023 — VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2026 — VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,96
VALOR AMORTIZADO: $ 4.909.469.662,80
SALDO POR AMORTIZAR: $ 377.866.216,16

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO
INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
CONTRATO No. 5053-2023 — VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 115.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.334.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.747.073.285,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 12.512.026.414,00 | 91,02% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 12.550.438.198,00 | 91,30% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 38.411.784,00 | 0,28% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 12.592.030.114,00 | 89,31% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 12.630.441.898,00 | 89,58% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 38.411.784,00 | 0,27% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 32.130.476,00 | 0,23% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 52.386.252,00 | 0,38% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 18 de julio 2025 al 09 de octubre de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 2.471.355.873,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°4. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.174.224.831,00 | 97,98% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.174.224.831,00 | 97,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 35.000.000,00 | 1,58% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 35.000.000,00 | 1,58% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/12/2025
PERIODO FACTURADO: dic-25
VALOR FACTURA: $ 50.336.761,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 5.287.335.878,96 |
| Amortizado total $ | $ 4.909.469.662,80 |
| Saldo total $ | $ 377.866.216,16 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | $ 0,17 |
| Acumulado: | $ 0,17 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 91,02%
Meta Física Ejecutada % 91,30%
Avance o Atraso Físico % 0,28%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____2023 | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | GL | 1 | | | Prog | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| | | | | | Ejec | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| * Obra | GL | 1 | | | Prog | $ 13.747.073.285,00 | | | $ 12.512.026.414,00 | 91,02% |
| | | | | | Ejec | $ 12.550.438.198,00 | | | $ 12.550.438.198,00 | 91,30% |
| * Obras de compensación ambiental y PAGA | GL | 1 | | | Prog | $ 169.033.596,00 | | | $ 169.033.596,00 | 75,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * Programa de Manejo de Transito | GL | 1 | | | Prog | $ 132.183.396,00 | | | $ 132.183.396,00 | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Motoniveladora | si | 1 |
| Carrotanque | si | 1 |
| Vibrocompactador | si | 1 |
| Retroexcavadora | si | 1 |
| Mezcladora de concreto | si | 1 |
| Vibrador de concreto | si | 1 |
| Cortadora de pavimento | si | 1 |
| Volqueta de 6m3 | si | 1 |
| **Total** | | 8 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA JOMEVE<br>CIENAGA DE ORO | PERMISO MINERO:<br>LICENCIA AMBIENTAL: | SI<br>SI | X<br>X | NO<br>NO |
| UBICACIÓN: | CANTERA SIBERIA<br>VIA A MONTERIA | PERMISO MINERO:<br>LICENCIA AMBIENTAL: | SI<br>SI | X<br>X | NO<br>NO |

**OBSERVACIONES:** LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI X | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI X | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA VS, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SE CUENTA CON DOS RESOLUCIONES AMBIENTALES POR PARTE DE LA CVS, LAS CUALES REQUIEREN COMPENSACIÓN DE 100 INDIVIDUOS ARBOREOS CADA UNO.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 30 | 25 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 14 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 6 | 11 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 16 | 7 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

**OBSERVACIONES:** EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO: NO SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL.

• SE REALIZA RECORRIDO TÉCNICO POR LOS TRAMOS VIALES, CON PARTICIPACIÓN DEL SUPERVISOR DE INVIAS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA CON EL FIN DE VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRA Y ESTABLECER MEDIDAS PARA AVANZAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON EL FIN DE TERMINAR EN EL TIEMPO ESTIPULADO PARA SU EJECUCIÓN.

• SEGUIDO AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200, SE AVANZA CON LAS LABORES DE FIGURACIÓN - ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE FORMALETERIA Y FUNDIDA DE PANTALLA DEL MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO 4000PSI.

• SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

• SE SOLICITA QUE SE RETOMEN LAS ACTIVIDADES DE RELLENOS LATERALES COMPACTADOS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.

• SE REALIZA CERRAMIENTO Y TRAZADO PRELIMINAR DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS.

- CING-INV-5053-0301-25 Revisión reprogramación de obra.

• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.


• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE FILTRO Y RELLENO LATERAL PARA EL MURO DE CONTENCIÓN POSTERIOR AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200.

• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Fundida con concreto premezclado 4000PSI de la pantalla del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Fundida con concreto premezclado 4000PSI de la pantalla del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Visita técnica supervisor de invias - Boxculvert 3x3 a intervenir ubicado en la abscisa K5+900.**

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/01/2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA | SEMANA No.: 94 (Numeración consecutiva) del 26/12/2025 al 1/01/2026 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

META FISICA INICIAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construccion de 6 box coulvert de 2x2 L=8m.
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio.
META FISICA ACTUAL: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 6 metros con una resistencia MR 38, instalación de cuneta y bordillo en concreto.
Construccion de obras hidráulicas: 3 box coulvert de 2x1,5 L= 6m, 2x1,0 L= 6m y 3x3 L= 6m, mantenimiento de alcantarilla triple y reconstrucción de aleta de box existente. Instalación de filtro frances 400 ml
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frio

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La via rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PROVIDENCIA<br>EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10% | | INTERVENTOR: | CONSORCIO INGECON INCO | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10% | |
| CONTRATO No. | 159-2023 | VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000,00 | CONTRATO No. | 5053-2023 | VALOR INICIAL: $ 2.219.000.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 28/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 28/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ 115.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 14.100.000.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.334.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 27/01/2026 | VALOR ANTICIPO: $ 5.287.335.878,96 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 27/01/2026 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: $ 4.909.469.662,80 | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: $ 377.866.216,16 | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 14.100.000.000,00 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 2.219.000.000,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.747.073.285,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 12.571.306.385,00 | 91,45% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 12.565.469.848,00 | 91,40% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (5.836.537,00) | -0,04% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 12.651.310.085,00 | 89,73% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 12.645.473.548,00 | 89,68% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (5.836.537,00) | -0,04% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 59.279.971,00 | 0,43% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 15.031.650,00 | 0,11% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA
PERIODO FACTURADO: Del 18 de julio 2025 al 09 de octubre de 2025
VALOR ACTA O FACTURA: $ 2.471.376.873,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTÓ ACTA PARCIAL DE OBRA N°4. DE IGUAL MANERA, ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.219.000.000,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2.219.000.000,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 44.775.169,00 | 2,02% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 44.775.169,00 | 2,02% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13/08/2025
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 119.262.538,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 5.287.335.878,96 |
| **Amortizado total $** | $ 4.909.469.662,80 |
| **Saldo total $** | $ 377.866.216,16 |

| **INDICADOR I/C** | |
|---|---|
| **En el mes:** | **$ 0,18** |
| **Acumulado:** | $ 0,18 |

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 91,45%
Meta Física Ejecutada % 91,40%
Avance o Atraso Físico % -0,04%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ___2023 | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | GL | 1 | | | Prog | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| | | | | | Ejec | $ 80.003.700,00 | | | $ 80.003.700,00 | 0,57% |
| * Obra | GL | 1 | | | Prog | $ 13.747.073.285,00 | | | $ 12.571.306.385,00 | 91,45% |
| | | | | | Ejec | $ 12.565.469.848,00 | | | $ 12.565.469.848,00 | 91,40% |
| * Obras de compensación ambiental y PAGA | GL | 1 | | | Prog | $ 169.033.596,00 | | | $ 169.033.596,00 | 75,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * Programa de Manejo de Transito | GL | 1 | | | Prog | $ 132.183.396,00 | | | $ 132.183.396,00 | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Motoniveladora | si | 1 |
| Carrotanque | si | 1 |
| Vibrocompactador | si | 1 |
| Retroexcavadora | si | 1 |
| Mezcladora de concreto | si | 1 |
| Vibrador de concreto | si | 1 |
| Cortadora de pavimento | si | 1 |
| Volqueta de 6m3 | si | 1 |
| Total | | 8 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica - Providencia
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA JOMEVE<br>CIENAGA DE ORO | PERMISO MINERO: SI X NO<br>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO | | |
| UBICACIÓN: | CANTERA SIBERIA<br>VIA A MONTERIA | PERMISO MINERO: SI X NO<br>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO | | |

**OBSERVACIONES:** LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:** LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V5, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 30 | 25 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 14 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 6 | 11 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 16 | 7 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

**OBSERVACIONES:** EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y SE REALIZAN REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA. SE REALIZÓ REUNIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN CON LA VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:** PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES TRIMESTRALES TANTO DEL COMPONENTE SOCIAL COMO DEL COMPONENTE AMBIENTAL, ASI COMO LOS PAGAS DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE OBRA.


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

- ESTADO DEL TIEMPO: NO SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.
- SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL.
- SEGUIDO AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200, SE AVANZA CON LAS LABORES DE DESENCOFRADO DE LA PANTALLA DEL MURO DE CONTENCIÓN, RELLENO LATERAL COMPACTO E INSTALACIÓN DE FILTRO.
- SE SOLICITA QUE SE RETOMEN LAS ACTIVIDADES DE RELLENOS LATERALES COMPACTADOS A LO LARGO DEL PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.
- SE AVANZA CON LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIÓN DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.
- IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA NO SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO COMUNICADOS.

- SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K5+820 A K5+950.
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE K5+820 HACIA MAYORES EN EL CARRIL DERECHO.
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE FILTRO Y RELLENO LATERAL PARA EL MURO DE CONTENCIÓN POSTERIOR AL BOXCULVERT 4.8X2 UBICADO EN LA ABSCISA K4+200.
- SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT 3X3 UBICADO EN LA ABSCISA K5+900.
- EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Instalación de filtro longitudinal en el muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Relleno lateral compacto en el muro de contención ubicado en la abscisa K4+200.**



**Excavaciones y demolición de alcantarilla existente para la construcción del Boxculvert 3x3 a intervenir ubicado en la abscisa K5+900.**

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.
2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.
3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 5 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CONTRATO No.** 159-2023

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5053 - 2023

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INGECON-INCO

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MOTONIVELADORA | LIUGONG 4165D | 3.7M | VIA PROVIDENCIA | I | I | I | I | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | A | A | I | A | A | A |
| MINICARGADOR | CASE CR220B | 1.5M3 | VIA PROVIDENCIA | I | I | I | I | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | A | A | I | A | A | A |
| PAJARITA | CASE 580N | 0.67M3 | VIA PROVIDENCIA | I | I | I | I | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | A | A | I | A | A | A |
| VIBROCOMPACTADOR | SD-100D | 7TON | VIA PROVIDENCIA | I | I | I | I | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | A | A | I | A | A | A |
| VOLQUETA | UPP086 | 15M3 | VIA PROVIDENCIA | I | I | I | I | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | A | A | I | A | A | A |
| VOLQUETA | CHEVROLET BSF842 | 15M3 | VIA PROVIDENCIA | I | I | I | I | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | A | A | I | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TOTAL ACTIVO | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INACTIVO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 186 | 100,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 96 | 51,6% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 90 | 48,4% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** Se avanza con construcción de muro de contención en la abscisa K4+200.

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DANIELA ALVAREZ ACUÑA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-357437COR

Firma
Nombre: VICENTE URZOLA BADEL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202215754COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 31/12/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No:** 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** dic-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JOSE RICARDO RUIZ HOYOS | 15677277 | DIRECTOR | $ 2.000.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 2.000.000 | $ 139.200 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 80.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 320.000 | $ 80.000 | N/A | N/A | |
| 2 | GUSTAVO ALFONSO MONTES CALDERON | 1100691991 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCION | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 3 | LUIS ANTONIO YANEZ HERNANDEZ | 1003305026 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 4 | NESTOR LUIS SALGADO RAMOS | 1003359117 | TOPOGRAFO | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 5 | MARIA ALEJANDRA COGOLLO PADILLA | 1064999603 | RESIDENTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | SALUDTOTAL | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 6 | LUISA FERNANDA SIERRA MARTINEZ | 1066724677 | AUXILIAR | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCION | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 7 | MARIA CAMILA TANO HOYOS | 1066748940 | SOCIAL | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 8 | CARRASCAL OCHOA ANGIE DANIELA | 1066750679 | SISO | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 9 | CARLOS RAMIREZ | 1003309075 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 10 | BEDOYA QUINTERO CARELIS ALEJANDRA | 1006575053 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | SANITAS | 1746197240 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 11 | SARMIENTO ESPEJO JOSE | 1038100533 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 12 | MARTINEZ VANESSA | 1062434781 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCIÓN | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 13 | SOTO KAROL | 1066726313 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCIÓN | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 14 | ALMARIO OVIEDO WILMER ALBERTO | 1066732611 | OFICIAL | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | COLFONDOS | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 15 | ALMARIO OVIEDO WILSON DAVID | 1066732613 | OFICIAL | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | COLFONDOS | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 16 | COGOLLO MIRANDA JUAN FRANCISCO | 1066736685 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCIÓN | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 17 | PAYARES SOTO DANIEL ANTONIO | 1066739185 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 18 | TORRES NAFER | 1066743622 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCIÓN | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 19 | GUZMAN MURILLO LUIS ANTONIO | 1066745206 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 20 | MIRANDA ANUAR | 1067283107 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 21 | REYES ARRIETA VICTOR ALFONSO | 1067293338 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | SALUDTOTAL | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 22 | MENDEZ RUIZ ALVARO JOSE | 1067929146 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | SALUDTOTAL | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 23 | ZAPATA PRADO MARIO ALBERTO | 11106403 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 24 | ZAPA BRAVO EDINSON | 1192761933 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 25 | RUIZ ARRIETA NELIS JUDITH | 1192929076 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA EPS | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCIÓN | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 26 | ALMARIO JULIO JHON LUIS | 15669981 | MAESTRO | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 27 | ARROYO WILFRIDO | 15677181 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PORVENIR | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 28 | TRUJILLO SAENZ ROBERT EMIRO | 15679922 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | COLFONDOS | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 29 | GONZALEZ SOTO HERNANY | 6662166 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONSORCIO PROVDENCIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | MUTUAL SER | 1746197240 | $ 52.000 | PROTECCIÓN | 1746197240 | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

EL CONTRATISTA DE OBRA A LA FECHA NO HA PRESENTADO LAS PLANILLAS PAGADAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE DE 2025.

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio Mario Pompilio sinesterra, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio Mario Pompilio Sinesterra; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio Mario Pompilio Sinesterra, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUSILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No:** 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | .000270 | COLOMBIA RURAL<br>CONVENIO 2286 DE 2023 - INVIAS | 2.3.2.01.01.001-03-02 | NACION | 159-2023 | $ 14.100.000.000,00 | $ 1.826.325.843,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 14.100.000.000,0** | **$ 1.826.325.843,0** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 14.100.000.000,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | Cobro parcial | feb-22 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 2 | Cobro parcial | mar-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 3 | Cobro parcial | abr-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 4 | Cobro parcial | may-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 5 | Cobro parcial | jun-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 6 | Cobro parcial | jul-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 7 | Cobro parcial | ago-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 8 | Cobro parcial | sep-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 9 | Cobro parcial | oct-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 10 | Cobro parcial | nov-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 14.100.000.000,00 | $ 14.100.000.000,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 11 | Cobro parcial | dic-24 | $ 5.657.123.226,00 | $ - | $ 5.657.123.226,00 | $ 2.262.849.290,40 | $ 3.394.273.935,60 | $ 3.024.486.588,56 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 8.442.876.774,00 | $ 8.442.876.774,00 | - | - | - | SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°1 EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 12 | Cobro parcial | ene-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 8.442.876.774,00 | $ 8.442.876.774,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 13 | Cobro parcial | feb-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 8.442.876.774,00 | $ 8.442.876.774,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 14 | Cobro parcial | mar-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 8.442.876.774,00 | $ 8.442.876.774,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 15 | Cobro parcial | abr-25 | $ 3.275.925.984,00 | $ - | $ 3.275.925.984,00 | $ 1.310.370.393,60 | $ 1.965.555.590,40 | $ 1.714.116.194,96 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 5.166.950.790,00 | $ 5.166.950.790,00 | - | - | - | SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°2 EL DIA 21 DE ABRIL DE 2025 |
| 16 | Cobro parcial | may-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 5.166.950.790,00 | $ 5.166.950.790,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 17 | Cobro parcial | jun-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 5.166.950.790,00 | $ 5.166.950.790,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 18 | Cobro parcial | jul-25 | $ 869.269.074 | $ - | $ 869.269.074 | $ 347.707.629,60 | $ 521.561.444,40 | $ 1.366.408.565,36 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 4.297.681.716,00 | $ 4.297.681.716,00 | - | - | - | SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°3 EL DIA 17 DE JULIO DE 2025 |
| 19 | Cobro parcial | ago-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 4.297.681.716,00 | $ 4.297.681.716,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 20 | Cobro parcial | sep-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 4.297.681.716,00 | $ 4.297.681.716,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 21 | Cobro parcial | oct-25 | $ 2.471.355.873 | $ - | $ 2.471.355.873 | $ 988.542.349,2 | $ 1.482.813.523,80 | $ 377.866.216,16 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 1.826.325.843,00 | $ 1.826.325.843,00 | - | - | - | SE PRESENTO ACTA PARCIAL N°4 EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 |
| 22 | Cobro parcial | nov-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 1.826.325.843,00 | $ 1.826.325.843,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| 23 | Cobro parcial | dic-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 000270 - 26 marzo de 2024 | $ 1.826.325.843,00 | $ 1.826.325.843,00 | - | - | - | EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO |
| **TOTALES** | | | **$ 12.273.674.157,00** | | **$ 12.273.674.157,00** | | | | | **$ 1.826.325.843,00** | **$ 1.826.325.843,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BASICO TOTAL DE OBRA: | $ 12.273.674.157,00 | $ - | **$ 12.273.674.157,00** |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS: | $ - | $ - | **$ -** |
| REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) | $ - | $ - | **$ -** |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ - | **$ -** |
| **VALOR TOTAL** | **$ 12.273.674.157,00** | | **$ 12.273.674.157,00** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.5 Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No:** 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** dic-25

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5053 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: DANIELA ALVAREZ ACÚÑA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-357437COR

Firma
Nombre: VICENTE URZOLA BADEL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202215754COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.6 Resumen ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** dic-25

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 1 | 11/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 99,0% | SI | K3+100 IZQUIERDA AFIRMADO |
| 2 | 11/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 101,4% | SI | K3+200 DERECHA AFIRMADO |
| 3 | 11/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 96,0% | SI | K3+300 IZQUIERDA AFIRMADO |
| 4 | 11/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 97,0% | SI | K3+400 DERECHA AFIRMADO |
| 5 | 13/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 99,0% | SI | K3+100 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR |
| 6 | 13/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 97,2% | SI | K3+200 DERECHA SUBBASE GRANULAR |
| 7 | 13/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 99,3% | SI | K3+300 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR |
| 8 | 13/12/2024 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 96,2% | SI | K3+400 DERECHA SUBBASE GRANULAR |
| 9 | 7/12/2024 | ENSAYO A COMPRESIÓN | E - 414 | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 106,0% | SI | CUNETAS CARRIL IZQUIERDO |
| 10 | 8/12/2024 | ENSAYO A COMPRESIÓN | E - 414 | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 97,0% | SI | CUNETAS CARRIL IZQUIERDO |
| 11 | 10/12/2024 | ENSAYO A COMPRESIÓN | E - 414 | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 108,0% | SI | CUNETAS CARRIL DERECHO |
| 12 | 2/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 94,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL IZQUIERDO |
| 13 | 3/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 95,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL IZQUIERDO |
| 14 | 5/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 98,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL IZQUIERDO |
| 15 | 6/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 94,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO |
| 16 | 7/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 101,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO |
| 17 | 9/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 130,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO |
| 18 | 11/12/2024 | ENSAYO A FLEXION | E - 414 (38 MPA) | PROVIDENCIA | 1 | 75% (7 DIAS) | 112,00% | SI | PAVIMENTO RIGIDO MR38 - CARRIL DERECHO |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| 1 | 12/08/2025 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 95,20% | SI | K5+550 DERECHA SUBBASE GRANULAR |
| 2 | 12/08/2025 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 95,40% | SI | K5+650 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR |
| 3 | 12/08/2025 | DENSIDADES IN SITU | E - 161 | PROVIDENCIA | 1 | 95% | 97,10% | SI | K5+750 EJE SUBBASE GRANULAR |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

DURANTE EL PRESENTE PERIODO, EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA PRESENTADO LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) | 12 (Mes) | 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**FECHA DE INICIO:** 28 DE DICIEMBRE DE 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 14.100.000.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 14.100.000.000,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 80.003.700,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 80.003.700,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 1.410.000.000,00 | 19/10/2023 | 30/06/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | $ 5.640.000.000,00 | 19/10/2023 | 30/06/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 2.820.000.000,00 | 19/10/2023 | 31/12/2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 30 | $ 24.001.110,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 4.230.000.000,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 400052428

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** N.D

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10% del valor de la perdida | $ 705.000.000,00 | 19/10/2023 | 31/12/2023 |
| Otros | | | Día/Mes/Año | Día/Mes/Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 400052429 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** N.D

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 1.410.000.000,00 | 18/7/2025 | 30/04/2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | $ 5.640.000.000,00 | 18/7/2025 | 30/04/2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 2.820.000.000,00 | 18/7/2025 | 31/10/2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 30 | $ 24.001.110,00 | 31/10/2025 | 31/10/2030 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 4.230.000.000,00 | 31/10/2025 | 31/10/2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 400052428

**Certificado de modificación o anexo No.:** .5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10% del valor de la perdida | $ 705.000.000,00 | 18/7/2025 | 31/10/2025 |
| Otros | | | Día/Mes/Año | Día/Mes/Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 400052429 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

El contratista de obra presentó la actualización de pólizas según prorroga 4 y el municipio no ha presentado la resolución de aprobación. Pendiente actualización de pólizas según prorroga 5.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/12/2025
(Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023
(Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**FECHA DE INICIO:** 28/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5053-2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:**

## 1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI -- X N ------ APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

**OBSERVACIONES:**

## 2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

**OBSERVACIONES:**
Durante el mes no se tenian programadas auditorias de calidad.

## 3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI **X** -- NO ------ APROBADO: SI ------- NO -- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- N -------

**OBSERVACIONES:**
Durante el mes no se contaron ensayos y medicion.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

## 4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

## 5. QUEJAS Y RECLAMOS

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Durante el mes del presente informe no se han realizado ensayos y calibración de equipos.

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.9 Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-2-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FECHA | 31 | 12 | 2025 |
| | | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL**

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 159 **DE** 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053 **DE** 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 5

**JUSTIFICACIÓN:** Se solicita la redistribución de los recursos del plan de inversión del anticipo N° 4, en razón a que se hace necesario incluir los SETENTA MILLONES ($70,000,000,00), que se reintegraron a la cuenta de Fiducia.

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | $ 435.500.013,06 | $ 777.450.024,80 | $ 1.399.500.065,27 | | $ 2.612.450.103,13 | 59,04% |
| 2 | PAGO DE MANO DE OBRA | $ - | | | | $ - | 0,00% |
| 3 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON SUS REPUESTOS | $ - | $ - | $ - | | $ - | 0,00% |
| 4 | TRANSPORTE | $ 217.750.006,53 | $ 746.800.020,89 | $ 848.000.000,00 | | $ 1.812.550.027,42 | 40,96% |
| 5 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 653.250.019,58** | **$ 1.524.250.045,69** | **$ 2.247.500.065,27** | **$ -** | **$ 4.425.000.130,55** | **100%** |

**NOTAS:**

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante Legal CONSORCIO PROVIDENCIA
Contratista

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal CONSORCIO INGECON - INCO
Interventor

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** **MES:** DICIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 3-1-119640 **DE** 2024 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 003003712 **BANCO** BOGOTA SUCURSAL: BOGOTÁ D.C
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 40 %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 4.425.000.130,55 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053 de 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSION DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 468 | 25-sep-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 26.200.301,00 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 469 | 25-sep-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 40.951.311,00 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ016380 | 14-sep-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 57.900,02 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ016539 | 25-sep-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 1.080.598,50 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ016199 | 3-sep-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 1.366.001,50 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ016456 | 19-sep-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 1.124.598,50 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ016122 | 28-ago-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 915.000,01 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ016496 | 23-sep-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 990.598,50 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP 14 | 26-sep-24 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 174.621.367,80 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. PROFORMA | No.1 | 15-oct-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 88.386.504,88 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. PROFORMA | No.1 | 15-oct-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 136.612.745,46 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 478 | 9-oct-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 22.939.566,22 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 479 | 9-oct-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 35.854.749,33 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 470 | 27-sep-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 21.509.417,61 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 471 | 27-sep-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 33.619.416,75 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 480 | 22-oct-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 18.584.298,62 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | FEN 481 | 22-oct-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 29.149.952,76 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. PROFORMA | No.11868 | 21-oct-24 | FERRETERIA LA TRONCAL | $ 319.792.101,00 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. PROFORMA | No.2 | 2-nov-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 277.425.721,20 | 4 | TRANSPORTE |
| | No.2 | 2-nov-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 179.490.497,29 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP26 | 12-dic-24 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 426.351.254,47 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP25 | 17-dic-24 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 71.601.053,04 | 1 | TRANSPORTE |
| FACT. PROFORMA | No.3 | 3-dic-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 93.844.193,33 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| | No.3 | 3-dic-24 | JDC INGENIERIA SAS | $ 145.048.307,03 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP25 | 27-feb-25 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 125.765.937,00 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. PROFORMA | No.4 | 28-feb-25 | JDC INGENIERIA SAS | $ 294.621.682,92 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| | No.4 | 28-feb-25 | JDC INGENIERIA SAS | $ 455.375.818,21 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP41 | 11-mar-25 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 360.656.040,00 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ18846 | 11-mar-25 | FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS | $ 342.652.431,04 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP42 | 28-mar-25 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 69.300.060,39 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | C049 | 4-abr-25 | LUARQUIN CONSTRUCCIONES S.A.S | $ 394.812.675,00 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | C050 | 4-abr-25 | LUARQUIN CONSTRUCCIONES S.A.S | $ 209.385.000,00 | 4 | TRANSPORTE |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ20775 | 28-ago-25 | FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS | $ 8.924.485,44 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ20839 | 28-ago-25 | FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS | $ 7.787.878,15 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | CCJ20900 | 28-ago-25 | FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS | $ 362.079,14 | 1 | COMPRA DE MATERIALES |
| FACT. ELECTRONICA DE VENTA | IDP45 | 4-sep-25 | INVERSIONES D&P5 S.A.S | $ 7.838.587,44 | 4 | TRANSPORTE |
| | | | **VALOR TOTAL:** | **$ 4.425.000.130,55** | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | $ 2.612.450.103,13 | $ 2.612.450.103,13 | $ - | $ 2.612.450.103,13 | $ (0,00) |
| 2 | PAGO MANO DE OBRA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON SUS REPUESTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4 | TRANSPORTE | $ 1.812.550.027,42 | $ 1.804.711.439,97 | $ 7.838.587,44 | $ 1.812.550.027,41 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 4.425.000.130,55** | **$ 4.417.161.543,11** | **$ 7.838.587,44** | **$ 4.425.000.130,55** | **$ (0,00)** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (SEPTIEMBRE) :** $ 4.039.469,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 4.039.469,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.039.469,00 | - | De septiembre 2024 a septiembre de 2025 | 13/08/2025 | $ 4.039.469,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
Rendimientos Financieros generados desde septiembre 2024 hasta septiembre 2025, un total transferido de $ 4,039,469.00

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista: CONSORCIO PROVIDENCIA
Matrícula Profesional No.:25202-151814

Firma:
Nombre: ANGELA DAVILA MORALES
Representante Legal o su Apoderado
Interventor : CONSORCIO INGECON - INCO
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.10 Seguimiento al Programa de inversiones - MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SUBGUIA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-SINT-SUG-FR-1 |
| VERSIÓN | 0 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/12/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES**

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 4 (No. debe llevar en forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 1106-2023

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 1053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INSPECCION VIAL 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Día, mes y año en números)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 28/12/2023 (Día, mes y año en números)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023 (Incluir la fecha de suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 14.100.000.000,00 (Valor en números incluido IVA)

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 14.100.000.000,00

**PLAZO ACUMULADO:** 21,69 MESES (En meses antes de reducirse en suspensión)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 13/12/2025 (Incluidas las adiciones, prórrogas y suspensiones efectuadas hasta la fecha)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 01/10/2025 (Incluir la fecha de reanudación que corresponda con el periodo del acta)

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADO Miles de pesos | | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 |
| EXPLANACIONES | $123.349 | 0,93% | 1,13% | %P | 0,49% | 0,31% | | | | | | | | | | 0,19% | | | | | | | | | | | | |
| | $154.995 | | $154.995 | $ E | $92.227 | $45.113 | | | $16.655 | $34.971 | $31.479 | $11.623 | | | | $55.643,87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | Reprogramación N°1 | | | | | | 0,00% | | | |
| ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6M | $272.667 | 2,06% | 0,50% | % P | 0,00% | 0,50% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | |
| | $68.553 | | $68.553 | $ E | $2.146 | $65.918 | $64.631 | | $37.654 | $29.643 | $53.257 | | | | | $3.068,98 | $13.295,72 | $74.727,43 | $62.486,81 | | | | | | $13.295,72 | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE BOX CDULVERT 2X2(L=6M) | $411.914 | 3,12% | 2,70% | % P | 0,00% | 0,49% | 0,70% | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | |
| | $371.452 | | $371.452 | $ E | $2.852 | $66.497 | $93.073 | | $111.342 | $34.006 | $54.006 | $59.254 | $61.374 | Prorroga N°2 | | $5.956,46 | $19.251,92 | $87.230,45 | $129.443,87 | | | | | | $19.251,92 | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | 0,24% | 0,38% | 0,58% | | | | | | 0,24% | | | |
| PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5X3 | $12.243.642 | 92,63% | 77,51% | % P | | 3,64% | 11,01% | 11,24% | 14,00% | 10,78% | 13,06% | 10,47% | 11,24% | 7,14% | 2,74% | 2,74% | 6,10% | 8,92% | 13,57% | 7,78% | 8,87% | 2,74% | 3,25% | 3,65% | 1,78% | 3,65% | 3,65% | |
| | $10.654.894 | | $10.654.894 | $ E | | $491.342 | $1.456.271 | $1.488.765 | $1.857.287 | $1.424.331 | $1.726.775 | $1.384.370 | $1.486.862 | $943.897 | $362.866,39 | $362.866,39 | $806.269,60 | $1.179.135,99 | $1.728.118,66 | $1.028.462,04 | $1.185.818,67 | $361.829,78 | $430.674,66 | $483.695,49 | $234.683,62 | $483.543,67 | | |
| | | | | % E | | | | | 1,54% | 3,37% | 4,31% | 8,66% | 11,12% | 13,62% | 13,98% | 13,98% | 2,66% | 4,54% | 6,66% | 6,70% | 6,83% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | |
| TRANSPORTE | $102.666 | 0,78% | 4,59% | % P | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $613.467 | | $627.426 | $ E | $11.737 | $14.671 | $11.737 | | $11.737 | $14.671 | $11.737 | $14.671 | $11.737 | Prorroga N°3 | | | | | | | | | | | $147.000 | | | |
| | | | | % E | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | | | | | | | | | | | | 1,00% | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $64.100 | 0,48% | 0,00% | % P | | | | | | | | 0,02% | 0,08% | 0,15% | 0,24% | | | | | | | 0,48% | | | 0,39% | 0,39% | 0,39% | |
| | $105.626 | | $0 | $ E | Prorroga N°1 | | | | | | | $2.013 | $10.066 | $20.025 | $31.597 | | | | | | | $64.100,48 | | | $78.192,84 | $39.096,42 | $78.192,84 | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS NO PREVISTOS | $708.844 | | 3,10% | % P | | | | | Preparación Inicial | | | | | | | | | | | | | | 1,38% | 6,16% | 6,90% | 1,52% | 4,68% | |
| | $706.844 | | $405.964 | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prorroga N°4 | $193.850,34 | $613.797,80 | $965.593,70 | $266.893,78 | $614.859,39 | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,90% | 6,05% | 6,05% | 1,91% | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prorroga N°5 | | |
| | | | | $ P | | | $188.041 | $333.797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 13.218.339,19 | 100,00% | 89,59% | | ETAPA DE AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUSPENSIÓN | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 13.747.073,20 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 6,66% | 9,75% | 9,66% | 12,44% | 12,46% | 14,64% | 11,52% | 13,61% | 10,75% | 11,39% | 7,38% | 3,69% | 6,35% | 10,15% | 14,47% | 7,79% | 8,87% | 3,22% | 4,64% | 3,22% | 8,86% | 8,84% | 1,84% | 8,55% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $88.360 | $887.401 | $1.644.691 | $1.646.497 | $1.935.527 | $1.523.332 | $1.798.713 | $1.421.847 | $1.506.007 | $975.884 | $299.632 | $839.606 | $1.341.646 | $1.912.646 | $1.029.492 | $1.169.819 | $426.630 | $612.936 | $1.219.393 | $1.216.443 | $1.216.448 | $244.479 | $1.179.767 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 6,66% | 9,75% | 9,66% | 19,24% | 26,75% | 45,24% | 56,86% | 70,47% | 81,23% | 92,62% | 100,00% | 49,37% | 55,41% | 65,56% | 80,03% | 87,81% | 96,78% | 100,00% | 92,95% | 94,20% | 97,52% | 97,52% | 91,45% | 100,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $88.360 | $796.421 | $2.411.122 | $4.057.620 | $5.993.146 | $7.516.479 | $9.315.191 | $10.736.739 | $12.242.746 | $13.218.630 | $6.465.610,49 | $7.324.410,93 | $8.665.962,29 | $10.578.608,80 | $11.608.100,96 | $12.782.309,43 | $13.218.939,76 | $10.963.855,20 | $12.187.948,63 | $13.404.387,85 | $13.404.387,85 | $12.271.166,28 | $13.747.073,28 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 6,66% | 6,66% | 6,66% | 6,66% | 6,19% | 1,92% | 4,78% | 8,27% | 8,26% | 11,12% | 13,62% | 10,98% | 3,29% | 6,99% | 6,69% | 1,99% | 1,33% | 3,61% | 5,67% | 4,29% | 3,62% | 3,63% | 1,91% | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.536 | $264.139 | $656.134 | $926.287 | $1.093.844 | $1.470.000 | $1.800.042 | $1.332.784 | $439.197 | $924.604 | $728.101 | $262.104 | $179.312 | $387.733 | $592.231 | $567.664 | $497.806 | $497.806 | $262.196 | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 6,66% | 6,66% | 6,66% | 6,66% | 6,19% | 2,03% | 4,78% | 13,06% | 21,31% | 32,45% | 46,06% | 56,15% | 59,44% | 66,43% | 73,02% | 74,99% | 76,33% | 78,34% | 85,02% | 89,31% | 92,93% | 96,56% | 98,47% | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.536 | $277.677 | $933.810 | $1.720.098 | $2.813.934 | $4.284.934 | $6.084.976 | $7.417.660 | $7.856.876 | $8.781.480 | $9.510.581 | $9.781.685 | $9.957.996 | $10.345.729 | $11.237.960 | $11.805.468 | $12.303.274 | $12.800.479 | $13.062.675 | | |

Los provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Recuerde IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 80.003,70 | $ 80.003,70 | 0,57% |
| OBRAS DE COMPESACION AMENTAL Y OTRAS COMPLEMENTARIAS | $ 64.516,00 | $ - | % |
| * BOLSA DE AJUSTE | $ 529.733,50 | $ - | % |
| * PAGA | $ 58.222,50 | $ - | % |
| * PMT | $ 132.183,30 | $ - | % |
| - | $ - | $ - | % |
| - | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 881.660,00 | | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ 14.100.000,00 | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | | $ 12.445.473,68 | 89,68% |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Incluir los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $/0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| | Valor | Valor |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma
Nombre: **ENRIO CARLOS BARIQUE CUELLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 20202-151814

Aprueba Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-F-9-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |
| FECHA | 31/12/2025 (Día/ Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTIVA: DIRECCIÓN DE LAS REGIONALES — AGENCIA TERRITORIAL: CÓRDOBA — ACTA DE DEFINICIÓN PARCIAL DE OBRA No.: N/A — DE: N/A — VIA DE BASE ACTA DEFINIDA PARCIAL DE OBRA: N/A

SEGUIMIENTO No.: 6
(La numeración debe ser consecutiva independiente del número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1056/2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°1056 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 0003 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 22 DICIEMBRE DE 2023 (Incluir dia, mes y año de terminación)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Incluir dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 08/10/2023
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 14.189.999.999,00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 14.189.999.999,00

PLAZO ACUMULADO: 21 DE DICIEMBRE (No incluir dias de suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/12/2025 (Incluidas las suspensiones, incluir dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 01/12/2025
VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA ACUM. Millns de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / Valor Ejecutado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millns de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millns de pesos | % Ejecutado | Dic-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 |
| EXPLANACIONES | $123.340 | 0,93% | $ 148.160 | 1,10% | | | 0,62% | 0,31% | | | | | | | | | 0,16% | | | | | | | | | | | | |
| | $154.980 | | | 1,17% | | | $82.327 | $45.153 | | $0,00 | $11.208 | $69.747 | $1.48 | | | | $25.543,67 | | | | | | | | | $0,00 | | | |
| ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6M | $379.647 | 2,99% | $ 88.593 | 0,56% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | |
| | $88.593 | | | | | | $0,00 | $40.918 | $32.431 | $10.264 | $16.641 | $21.157 | | | | | $11.586,45 | $11.586,45 | $14.207,45 | $0,00 | | | | | | $0,00 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT 2X2(L=6M) | $411.914 | 3,13% | $ 393.073 | 2,70% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | |
| | $371.422 | | | | | | $2.552 | $64.497 | $93.073 | $111.952 | $34.026 | $34.009 | $36.224 | $14.374 | | | $9.996,46 | $19.261,92 | $67.335,45 | $129.441,46 | | | | | | $0,00 | | | |
| PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS 2.5XD | $12.940.940 | 92,69% | $ 9.691.564 | 77,91% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | $11.536.556 | | | $10.654.699 | | | $480.761 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $1.480.764 | $480.761 |
| TRANSPORTE | $103.498 | 0,76% | $ 627.436 | 4,56% | | | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,59% | 0,11% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | $613.487 | | | | | | $11.737 | $14.871 | $11.737 | $11.737 | $14.871 | $11.737 | $14.871 | $11.737 | | | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $11.737 | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $64.100 | 0,48% | $ 0 | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | $100.626 | | | $0 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $39.592,47 | $39.592,47 | $39.592,47 |
| ITEM NO PREVISTOS | $706.644 | | | 5,10% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $39.592,47 | $79.185,94 | $79.185,94 |
| | $706.644 | | | $435.984 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $39.592,47 | $79.185,94 | $79.185,94 |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 13.218.339,70 | 100% | 69,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 13.747.073,29 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSION DE OBRA No.1
ETAPA DE AJUSTES ESTUDOS Y DISEÑOS
SUSPENSION
Prorroga N°1
Programación Inicial
Ejecución
Prorroga N°2
Prorroga N°3
Prorroga N°4
Prorroga N°5

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los fines de mes trimestres en Año 000
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Biometro de inversiones se refiere mensualmente al Valor básico de la obra (sin tener en cuenta reajustes o ITA )
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se suelan asumir por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

| EJE DE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | $ Valor | |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 0,73% | 0,00% | 12,44% | 12,48% | 14,64% | 11,62% | 13,67% | 19,75% | 11,39% | 7,36% | 3,69% | 0,38% | 0,00% | 10,15% | 14,47% | 7,75% | 9,97% | 3,32% | 4,64% | 0,23% | 0,56% | 0,56% | 1,84% | 0,55% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $99.940 | $97.457 | $1.644.987 | $1.648.447 | $1.934.647 | $1.533.712 | $1.807.212 | $2.607.667 | $1.504.787 | $972.544 | $486.812 | $49.844 | $0 | $1.340.846 | $1.910.806 | $1.023.402 | $1.316.678 | $438.318 | $612.936 | $30.736 | $74.362 | $74.362 | $243.474 | $72.767 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $99.940 | $197.397 | $1.842.384 | $3.490.831 | $5.425.478 | $6.959.190 | $8.766.402 | $11.374.069 | $12.878.856 | $13.851.400 | $14.338.212 | $14.388.056 | $14.388.056 | $15.728.902 | $17.639.708 | $18.663.110 | $19.979.788 | $20.418.106 | $21.031.042 | $21.105.778 | $21.180.140 | $21.254.502 | $21.497.976 | $21.570.743 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 4,00% | 4,70% | 13,00% | 21,30% | 23,40% | 26,60% | 30,30% | 31,10% | 31,10% | 38,90% | 49,00% | 54,90% | 63,00% | 72,60% | 79,50% | 84,30% | 89,30% | 94,30% | 98,30% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.539 | $554.139 | $628.126 | $829.207 | $1.693.844 | $1.479.909 | $1.690.042 | $1.330.795 | $435.197 | $604.604 | $739.101 | $982.154 | $776.212 | $997.733 | $683.231 | $497.699 | $487.606 | $497.699 | $497.606 | $382.396 | $141.606 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 4,00% | 4,70% | 13,00% | 21,30% | 23,40% | 26,60% | 30,30% | 31,10% | 31,10% | 38,90% | 49,00% | 54,90% | 63,00% | 72,60% | 79,50% | 84,30% | 89,30% | 94,30% | 98,30% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.539 | $567.678 | $695.692 | $1.725.898 | $2.919.934 | $4.399.844 | $6.089.975 | $7.421.680 | $7.856.877 | $8.761.480 | $9.519.581 | $9.781.695 | $9.557.896 | $10.383.629 | $11.237.860 | $11.855.468 | $12.393.074 | $12.393.074 | $12.388.470 | | |

* Las proiciones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluir IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN | $ 89.600,70 | $ 89.600,70 | 100% |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y COMPLEMENTARIAS | $ 89.600,70 | $ - | % |
| SOLSA DE AJUSTE | $ 500.119,00 | $ - | % |
| PAGA | $ 38.000,00 | $ - | % |
| PAT | $ 100.500,00 | $ - | % |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 867.820,30 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO ( B' ) | $ - | $ - | % |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CUADRO 1 | $ 14.189.999,00 | $ 12.665.675,71 | 89,26% |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO CUADRO 1 INCLUIDO IVA | $ - | | |

(Provisiones: Estudios, diseños, revisión, ajustes, actualización y/o modificación; Obras de compensación ambiental y complementarias; Polizas; Otros que identifique el interventor)

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprobó: Firma

Nombre: **ENRIO CARLOS BARCIA CUBILLOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 25252-151513

Aprobó: Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. 17252-153798 CLD

## 4.11 Actas de comité de obra - MEPI-MN-IN-14-FR-1 y MEPI-MN-IN-14-FR-2

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/12/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: SE ENTREGÓ EL DIA 7 DE ABRIL 2024.
HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ LA HOJA DE VIDA .
MAQUNARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA:APROBADO V3.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: ENTREGARON.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: ENTREGARON.

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Proposiciones y varios

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

**1. Estado de estudios y diseños:**

Diseño de pavimentos: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 25 de junio de 2025. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño geométrico: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 05 de junio de 2025. Se devolverá el dia 12 con observaciones. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño hidráulico, Pendiente por entregar, correspondiente al box K5+900 se entregará el dia 27 de junio de 2025. No se cumple con el compromiso, se entregará el dia 09 de julio de 2025. No se cumple con el compromiso, el contratista se compromete a entregarlo el 16 de julio de 2025. No se cumple, se entregará el 22 de julio de 2025. Se hizo entrega el dia 23 de julio, se encuentra aprobado. Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores
Diseño estructural: El contratista entrego el diseño del box K5+900, se devuelve parte de la interventoria. El contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones, el cual se compromete a entregar el 21 de octubre de 2025. La subsanación de muro de contención la remite el consorcio providencia el dia 17 de octubre de 2025. Se aprobo parcialmente el muro de contención, pendiente ajustar planos. Se aprobo el box coulvert 3x3 ubicado en el K5+900.
PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoria aprobo, fue remitido a la entidad. PAGA se remitio al INVIAS
CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación completa para su tramite. se debe entregar a mas tardar el 10 de junio de 2025. El contratista no cumplio. El contratista radico el dia 18 de junio de 2025. Esta pendiente la radicación de los informes tecnicos que acompañan la solicitud, los cuales se entregaran el 26 de junio de 2025. Copia del radicado de la información al municipio el dia 4 de julio de 2025. No se cumplio, se entregará el 16 de julio de 2025. Se entregó el dia 17 de julio a la aciadia para su revisión y radicación. La alcaldia manifiesta que el dia 1 de agosto radicara en la CVS. Se radicó el documento y se entregaron los autos de apertura con los recibos de pago para iniciar el tramite. el contratista manifiesta que la proxima semana se hará la visita. La visita esta confirmada para el 5 de septiembre de 2025.Se cuenta con las dos resoluciones de la CVS con una compensación de 100 arboles pro cada uno.

**2. Estado de los documentos de inicio:**
A continuación se listan los documentos y su estado:
APU: ENTREGADO.
PROGRAMACION: ENTREGADO.
HOJA DE VIDA: ENTREGADO.
MAQUNARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.
PMT: ENTREGADO.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: ENTREGADO.
FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRA SUBBASE GRANULAR Y JOMEVE QUE SUMINITRA AFIRMADO.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: ENTREGADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.
FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

**3. Estado de la etapa de ejecución de obra:**

En relación a la ejecución de la obra, se terminaron el 100% de los dos box ubicados en las abscisas K3+610 y K3+920 incluyendo los rellenos laterales. Se termino el 100% del pavimento costado derecho y costado izquierdo hasta la absicsa K4+200. Se termino la actividad de bordillo hasta el K4+200. El contratista finalizo las actividades de bermacuneta hasta el K4+200. Esta semana hubo avance de relleno lateral, el contratista cuenta con material para realizar la actividad, sin embargo no se cumplio con la fecha prevista de terminación de esta actividad, se propone terminarlo para la última semana de diciembre. Se le recuerda al contratista que el contrato actualmente va hasta el 13 de diciembre de 2025, esta en tramite de suscripcion de firmas la prorroga por 45 dias calendario, al igual que la prorroga de la interventoria que ya se encuentra aprobada por parte INVIAS.

El contratista tambien retomo actividades en el K4+200 construccion del muro, El contrastista termino actividades de mejoramiento de las soleras de la alcantarilla triple ubicada en el K3+540, asi como el mejoramiento y mantenimiento de las soleras en el box existente K4+200, se reconstruyo aleta del box K4+200. Esta semana el contratista iniciará actividades en el box coulvert del K5+900.

Actualmente el contrato tiene un % programado de 99,82 % frente a un ejecutado de 90,67%, atraso de 9,15%, datos con base en la reprogramación a raiz de la prorroga 4, hasta el 13 de diciembre de 2025, con la suscripción de la prorroga 5 se debebrá presentar

Scanned with CamScanner

reprogramación, que deberá ser entregada el dia 16 de diciembre de 2025.

Se hicieron reparaciones de las losas para un total de 42 losas reparadas. Se hará un recorrido el dia 17 de diciembre de 2025 para verificar que se haya cumplido el 100% de las reparaciones y cerrar a satisfacción dicha actividad.

El contratista retomo actividades en el K5+900, se autoriza inicio de las actividades de construcción del box coluverrt 3x3.

NO se presentan cierre parciales, en acopio tienen 144 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio.

Frente a la PQR de Ocensa, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del alquiler de volqueta, el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del acopio, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del hielo, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del bodega, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del pago del hielo y la bodega por el mes de agosto, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR de liquidación de Paola Pacheco y la liquidación de Luisa Sierra se les enviara el formato de liquidación para su firma y posterior pago, se deberá realizar antes del 15 de octubre 2025. El consorcio providencia manifiesta que se presentó el formato de liquidación para revisión, se encuentra pendiente el pago, el cual se realizará para el dia 24 de octubre de 2025. El contratista no cumplio, sigue pendiente para su cierre, se da un ultimatum previo a la solicitud de afectacion de la poliza hasta el dia 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR a John Luis Armario, maestro de obra, quien reclama pago de presetacion de servicios de mano de obra, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR sobre liquidación de Elizabeth Agamez, quien reclama liquidación desde el 25 de octubre, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR sobre liquidación de Gledys Hernandez, quien reclama liquidación desde el 30 de septiembre de 2025, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

**4. Proposiciones y varios:**

Respecto al componente SST: el contratista entregó informe del mes de octubre de 2025, pendiente respuesta por parte de la interventoria

Respecto al componente ambiental: el contratista remitio infomre agosto y septiembre, pendiente respuesta por parte de la interventoria, pendiente entrega del mes de octubre, fecha maxima de entrega 18 de diciembre de 2025.

Respecto al componente social: el contratista presenta infomres hasta octubre, los mismos se encuenttran aprobados, se realizará comite de veeduria el 18 de diciembre de 2025, pendiente cierre de PQRs
En campo se encuentran 18 personas, de estas corresponden a 10 personas mano de obra no calificada, toda correspondiente al area de influencia directa, y se cuenta con 6 mujeres, de las cuales 1 son de área de influencia y 5 son profesionales. .

El contratista no ha entregado0 los rendimientos financieros hasta la fecha del cierre . A la espera que la fiducia entregue el cierre.

Asiste a la reunión por parte del contratista, la ing Jose Luis Ruiz Directo de obra.

el contratista se compromete a cumplir con todos los puntos de la presente acta.

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/12/2025 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Ver compromisos en temas desarrollados | Según puntos anteriores | Contratista |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Angela M. Daza M. | Director Interv. | C. Ingeco-Luc | |
| Vicente Urzola B. | Res. Interventoría | C. Ingecon Luco | |
| Marcela Gil G. | Prof Social | C. Ingecon Luco | |
| Maria Camila Tarazona | Prof. Social | Consorcio Providencia | |
| José Rojas | Director de Obra | Consorcio Prov. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 18/12/2025
(Día / Mes / Año)



**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: PENDIENTE POR ENTREGAR LA REPROGRAMACIÓN SEGUN PRORROGA 5
HOJA DE VIDA: SE SUBSANO
MAQUNARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA:APROBADO V3.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: ENTREGARON.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: ENTREGARON.

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Estado de la etapa de estudios y diseños

2. Estado de los documentos de inicio

3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra

4. Proposiciones y varios

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

**1. Estado de estudios y diseños:**

Diseño de pavimentos: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 25 de junio de 2025. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño geométrico: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 05 de junio de 2025. Se devolverá el dia 12 con observaciones. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño hidráulico, Pendiente por entregar, correspondiente al box K5+900 se entregará el día 27 de junio de 2025. No se cumple con el compromiso, se entregará el día 09 de julio de 2025. No se cumple con el compromiso, el contratista se compromete a entregarlo el 16 de julio de 2025. No se cumple, se entregará el 22 de julio de 2025. Se hizo entrega el dia 23 de julio, se encuentra aprobado. Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores
Diseño estructural: El contratista entrego el diseño del box K5+900, se devuelve parte de la interventoria. El contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones, el cual se compromete a entregar el 21 de octubre de 2025. La subsanación de muro de contención la remite el consorcio providencia el dia 17 de octubre de 2025. Se aprobo parcialmente el muro de contención, pendiente ajustar planos. Se aprobo el box coulvert 3x3 ubicado en el K5+900.
PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoria aprobo, fue remitido a la entidad. PAGA se remitio al INVIAS
CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación completa para su tramite. se debe entregar a mas tardar el 10 de junio de 2025. El contratista no cumplio. El contratista radico el dia 18 de junio de 2025. Esta pendiente la radicación de los informes tecnicos que acompañan la solicitud, los cuales se entregaran el 26 de junio de 2025. Copia del radicado de la información al municipio el dia 4 de julio de 2025. No se cumplio, se entregará el 16 de julio de 2025. Se entregó el dia 17 de julio a la acladia para su revisión y radicación. La alcaldia manifiesta que el dia 1 de agosto radicara en la CVS. Se radicó el documento y se entregaron los autos de apertura con los recibos de pago para iniciar el tramite. el contratista manifiesta que la proxima semana se hará la visita. La visita esta confirmada para el 5 de septiembre de 2025.Se cuenta con las dos resoluciones de la CVS con una compensación de 100 arboles pro cada uno.

**2. Estado de los documentos de inicio:**
A continuación se listan los documentos y su estado:
APU: ENTREGADO.
PROGRAMACION: ENTREGADO.
HOJA DE VIDA: ENTREGADO.
MAQUNARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.
PMT: ENTREGADO.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: ENTREGADO.
FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRA SUBBASE GRANULAR Y JOMEVE QUE SUMINITRA AFIRMADO.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: ENTREGADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.
FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

**3. Estado de la etapa de ejecución de obra:**

En relación a la ejecución de la obra, se terminaron el 100% de los dos box ubicados en las abscisas K3+610 y K3+920 incluyendo los rellenos laterales. Se termino el 100% del pavimento costado derecho y costado izquierdo hasta la absicsa K4+200. Se termino la actividad de bordillo hasta el K4+200. El contratista finalizo las actividades de bermacuneta hasta el K4+200. Esta semana hubo avance de relleno lateral, el contratista cuenta con material para realizar la actividad, sin embargo no se cumplio con la fecha prevista de terminación de esta actividad, se propone terminarlo para la última semana de diciembre. Se le recuerda al contratista que el contrato actualmente va segun proroga 5 hasta el 27 de enero de 2026, al igual que el plazo de la interventoria

El contratista tambien retomo actividades en el K4+200 construccion del muro se ejecuto la viga de cimentación y se encuentra armando el acero del muro para realizar el vaciado el dia 20 de diciembre, se realizaron actividades de mejoramiento y mantenimiento de las soleras en el box existente K4+200, se reconstruyo aleta del box K4+200.

El contrastista termino actividades de mejoramiento de las soleras de la alcantarilla triple ubicada en el K3+540, asi como .

Scanned with CamScanner

Esta semana el contratista adelanto actividades de via de desvio para la ejecución del box coulvert del K5+900.

Actualmente el contrato tiene un % programado de 100 % frente a un ejecutado de 90,91%, atraso de 9,09%, datos con base en la reprogramación a raiz de la prorroga 4, hasta el 13 de diciembre de 2025, con la suscripción de la prorroga 5 se debe presentar reprogramación, su entrega estaba programada para el dia 16 de diciembre de 2025, fecha que no se cumplio, el contratista la entregara el 22 de diciembre de 2025.

Se hicieron reparaciones de las losas para un total de 42 losas reparadas. Segun programación se hizo un recorrido el dia 17 de diciembre de 2025 para verificar que se haya cumplido el 100% de las reparaciones y cerrar a satisfacción dicha actividad, sin embarog, se evidencio qeu de las 42 mencionadas fueron reparadas a satisfacción pero se presentan en el primer tramo 12 losas mas para reparación, el contratista las debebrá atender antes del 15 de enero de 2026.

NO se presentan cierre parciales, en acopio tienen 144 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio.

Frente a la PQR de Ocensa, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del alquiler de volqueta, el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del acopio, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del hielo, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del bodega, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del pago del hielo y la bodega por el mes de agosto, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR de liquidación de Paola Pacheco y la liquidación de Luisa Sierra se les enviara el formato de liquidación para su firma y posterior pago, se deberá realizar antes del 15 de octubre 2025. El consorcio providencia manifiesta que se presentó el formato de liquidación para revisión, se encuentra pendiente el pago, el cual se realizará para el dia 24 de octubre de 2025. El contratista no cumplio, sigue pendiente para su cierre, se da un ultimatum previo a la solicitud de afectacion de la poliza hasta el dia 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR a John Luis Armario, maestro de obra, quien reclama pago de presetacion de servicios de mano de obra, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR sobre liquidación de Elizabeth Agamez, quien reclama liquidación desde el 25 de octubre, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR sobre liquidación de Gledys Hernandez, quien reclama liquidación desde el 30 de septiembre de 2025, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

**4. Proposiciones y varios:**

Respecto al componente SST: el contratista entregó informe del mes de octubre de 2025, pendiente respuesta por parte de la interventoria

Respecto al componente ambiental: el contratista remitio infomre agosto y septiembre, pendiente respuesta por parte de la interventoria, pendiente entrega del mes de octubre, fecha maxima de entrega 18 de diciembre de 2025.

Respecto al componente social: el contratista presenta infomres hasta octubre, los mismos se encuenttran aprobados, se realizó comite de veeduria el 18 de diciembre de 2025 no se presentaron novedades en el mismo, siguen pendiente cierre de PQRs
En campo se encuentran 18 personas, de estas corresponden a 10 personas mano de obra no calificada, toda correspondiente al area de influencia directa, y se cuenta con 6 mujeres, de las cuales 1 son de área de influencia y 5 son profesionales. .

El contratista no ha entregado0 los rendimientos financieros hasta la fecha del cierre . A la espera que la fiducia entregue el cierre. Se entregará el dia 19 de diciembre de 2025.

Se solicita la entrega de un balance del contrato con el fin de validar recursos para finalizar actividades de ejecución, en dicho balance se debe tener presente el recurso para el pago final de la CVS. Se entregara el dia 24 de diciembre de 2025.

Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores el cual será entrega el 24 de diciembre de 2025.

Asiste a la reunión por parte del contratista, la ing Daniela Alvarez Residente de obra y Camila Tano.

Se deben presentar polizas para el proximo 26 de diciembre de 2025.

el contratista se compromete a cumplir con todos los puntos de la presente acta.

Scanned with CamScanner

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)



| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Ver compromisos en temas desarrollados | Según puntos anteriores | Contratista |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 23/12/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Daniela Alvarez | Apoyo Derecho de Obra | Cons Providencia | |
| Hna Camila Toro Hoyos | Plafe. Social | Consorcio Providencia | Hna Camila Toro |
| Marcela Gil | Prof Social | Cons Ingecon | |
| Angela María Dávila M. | Directora Interventor. | C. Ingecon - Inv | |
| Vicente Urzola B. | Res. Interventoría | C. Ingecon Inco | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 23/12/2025
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**



ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: EL CONTRATISTA REMITIO REPROGRAMACI´NO EL DIA 23-12-20225
HOJA DE VIDA: SE SUBSANO
MAQUNARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA:APROBADO V3.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: ENTREGARON.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: ENTREGARON.

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Proposiciones y varios

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

**1. Estado de estudios y diseños:**

Diseño de pavimentos: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 25 de junio de 2025. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño geométrico: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 05 de junio de 2025. Se devolverá el dia 12 con observaciones. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño hidráulico, Pendiente por entregar, correspondiente al box K5+900 se entregará el día 27 de junio de 2025. No se cumple con el compromiso, se entregará el dia 09 de julio de 2025. No se cumple con el compromiso, el contratista se compromete a entregarlo el 16 de julio de 2025. No se cumple, se entregará el 22 de julio de 2025. Se hizo entrega el dia 23 de julio, se encuentra aprobado. Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores. Se entregará el dia 30 de diciembre de 2025,
Diseño estructural: El contratista entrego el diseño del box K5+900, se devuelve parte de la interventoria. El contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones, el cual se compromete a entregar el 21 de octubre de 2025. La subsanación de muro de contención la remite el consorcio providencia el dia 17 de octubre de 2025. Se aprobo parcialmente el muro de contención, pendiente ajustar planos. Se aprobo el box coulvert 3x3 ubicado en el K5+900.
PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoria aprobo, fue remitido a la entidad. PAGA se remitio al INVIAS
CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación completa para su tramite. se debe entregar a mas tardar el 10 de junio de 2025. El contratista no cumplio. El contratista radico el dia 18 de junio de 2025. Esta pendiente la radicación de los informes tecnicos que acompañan la solicitud, los cuales se entregaran el 26 de junio de 2025. Copia del radicado de la información al municipio el dia 4 de julio de 2025. No se cumplio, se entregará el 16 de julio de 2025. Se entregó el dia 17 de julio a la acladia para su revisión y radicación. La alcaldia manifiesta que el dia 1 de agosto radicara en la CVS. Se radicó el documento y se entregaron los autos de apertura con los recibos de pago para iniciar el tramite. el contratista manifiesta que la proxima semana se hará la visita. La visita esta confirmada para el 5 de septiembre de 2025.Se cuenta con las dos resoluciones de la CVS con una compensación de 100 arboles pro cada uno.

**2. Estado de los documentos de inicio:**
A continuación se listan los documentos y su estado:
APU: ENTREGADO.
PROGRAMACION: ENTREGADO.
HOJA DE VIDA: ENTREGADO.
MAQUNARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.
PMT: ENTREGADO.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: ENTREGADO.
FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRA SUBBASE GRANULAR Y JOMEVE QUE SUMINITRA AFIRMADO.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: ENTREGADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.
FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

**3. Estado de la etapa de ejecución de obra:**

En relación a la ejecución de la obra, se terminaron el 100% de los dos box ubicados en las abscisas K3+610 y K3+920 incluyendo los rellenos laterales. Se termino el 100% del pavimento costado derecho y costado izquierdo hasta la absicsa K4+200. Se termino la actividad de bordillo hasta el K4+200. El contratista finalizo las actividades de bermacuneta hasta el K4+200. Esta semana no hubo avance de relleno lateral, el contratista cuenta con material para realizar la actividad, sin embargo no se cumplio con la fecha prevista de terminación de esta actividad, se propone terminarlo para la última semana de diciembre. Se le recuerda al contratista que el contrato actualmente va segun proroga 5 hasta el 27 de enero de 2026, al igual que el plazo de la interventoria, se remitio el dia de reprogramación No. 5 para revisión de la interventoria.

El contratista realiza actividades en el K4+200 construccion del muro, el dia 22 de diciembre de 2025, se inicio fundición y finaliza el dia 23 de diciembre de 2025, se realizaron actividades de mejoramiento y mantenimiento de las soleras en el box existente K4+200, se reconstruyo aleta del box K4+200.

El contrastista termino actividades de mejoramiento de las soleras de la alcantarilla triple ubicada en el K3+540, y esta pendiente atención de socavación aguas abajo costado derecho, la cual estará lista para el ultima semana de diciembre.

Scanned with CamScanner

Esta semana el contratista adelanto actividades de via de trazado geometrico del box K5+900 respecto al pavimento vial
Actualmente el contrato tiene un % programado de 100 % frente a un ejecutado de 91,30%, atraso de 8,70%, datos con base en la reprogramación a raiz de la prorroga 4, ya que la reprogramación segun prorroga 5 esta en revisióin de la interventoria.

Se hicieron reparaciones de las losas para un total de 42 losas reparadas. Segun programación se hizo un recorrido el dia 17 de diciembre de 2025 para verificar que se haya cumplido el 100% de las reparaciones y cerrar a satisfacción dicha actividad, sin embarog, se evidencio qeu de las 42 mencionadas fueron reparadas a satisfacción pero se presentan en el primer tramo 12 losas mas para reparación, el contratista las debebrá atender antes del 15 de enero de 2026.

NO se presentan cierre parciales, en acopio tienen 144 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio.

Frente a la PQR de Ocensa, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del alquiler de volqueta, el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del acopio, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del hielo, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del bodega, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del pago del hielo y la bodega por el mes de agosto, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR de liquidación de Paola Pacheco y la liquidación de Luisa Sierra se les enviara el formato de liquidación para su firma y posterior pago, se deberá realizar antes del 15 de octubre 2025. El consorcio providencia manifiesta que se presentó el formato de liquidación para revisión, se encuentra pendiente el pago, el cual se realizará para el dia 24 de octubre de 2025. El contratista no cumplio, sigue pendiente para su cierre, se da un ultimatum previo a la solicitud de afectacion de la poliza hasta el dia 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR a John Luis Armario, maestro de obra, quien reclama pago de presetacion de servicios de mano de obra, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR sobre liquidación de Elizabeth Agamez, quien reclama liquidación desde el 25 de octubre, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

Frente a la PQR sobre liquidación de Gledys Hernandez, quien reclama liquidación desde el 30 de septiembre de 2025, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025.

**4. Proposiciones y varios:**

Respecto al componente SST: el contratista entregó informe del mes de octubre de 2025, pendiente respuesta por parte de la interventoria

Respecto al componente ambiental: el contratista remitio infomre agosto y septiembre, pendiente respuesta por parte de la interventoria, pendiente entrega del mes de octubre, fecha maxima de entrega 18 de diciembre de 2025. No se envio, el contratista lo remitirá el 24 de diciembre de 2025.

Respecto al componente social: el contratista presenta infomres hasta octubre, los mismos se encuenttran aprobados, se realizó comite de veeduria el 18 de diciembre de 2025 no se presentaron novedades en el mismo, siguen pendiente cierre de PQRs

En campo se encuentran 18 personas, de estas corresponden a 10 personas mano de obra no calificada, toda correspondiente al area de influencia directa, y se cuenta con 6 mujeres, de las cuales 1 son de área de influencia y 5 son profesionales. .

El contratista no ha entregado0 los rendimientos financieros hasta la fecha del cierre . A la espera que la fiducia entregue el cierre. Se entregará el dia 19 de diciembre de 2025. El contratista hizo la gestión con la fiducia el pasado 19 de diciembre y esta en espera de respuesta,

Se solicita la entrega de un balance del contrato con el fin de validar recursos para finalizar actividades de ejecución, en dicho balance se debe tener presente el recurso para el pago final de la CVS. Se entregara el dia 24 de diciembre de 2025.

Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores el cual será entrega el 24 de diciembre de 2025.

Asiste a la reunión por parte del contratista, la ing Jose Guzman Director de obra y Camila Tano.

Se solcita la entreag de las planillas de pago de parafiscales de los meses de septiembre y octubre de 2025. El contratista lo entregará el 26 de diciembre de 2025,

Se deben presentar polizas para el proximo 26 de diciembre de 2025.

Scanned with CamScanner

FECHA: 23/12/2025 (Día / Mes / Año)



| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Ver compromisos en temas desarrollados | Según puntos anteriores | Contratista |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 30/12/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Valentina Falcón | ingeniera de apoyo | Con Providencia | Valentina Falcón |
| Carelis Bedoya | Ing. civil apoyo | Consorcio Providencia | Carelis Bedoya |
| Maria Camila Tano Reyes | Profe. Social | Consorcio Providencia | Mª Camila Tano |
| Joseph Rincones | Director obra | Cons S Prov. | |
| Marcela Gil G | Prof Social | Cons. Ingeconstruc | |
| Vicente Urzola B. | Res. Interventoría | C. Ingeconluco | |
| Angela María Pinto | Dire. Interventoría | C. Ingeconluco | |
| Luis González O. | prof. esp. | INVIAS | Luis González O. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**



ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON - INCO

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: EL CONTRATISTA REMITIO REPROGRAMACI´NO EL DIA 23-12-20225
HOJA DE VIDA: SE SUBSANO
MAQUNARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA:APROBADO V3.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: ENTREGARON.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: ENTREGARON.

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Estado de la etapa de estudios y diseños

2. Estado de los documentos de inicio

3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra

4. Proposiciones y varios

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

**1. Estado de estudios y diseños:**

Diseño de pavimentos: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 25 de junio de 2025. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño geométrico: Del nuevo tramo, se remitio subsanado el dia 05 de junio de 2025. Se devolverá el dia 12 con observaciones. La interventoria aprueba y autoriza iniciar actividades en el tramo a partir del dia 02 de julio de 2025.
Diseño hidráulico, Pendiente por entregar, correspondiente al box K5+900 se entregará el día 27 de junio de 2025. No se cumple con el compromiso, se entregará el día 09 de julio de 2025. No se cumple con el compromiso, el contratista se compromete a entregarlo el 16 de julio de 2025. No se cumple, se entregará el 22 de julio de 2025. Se hizo entrega el dia 23 de julio, se encuentra aprobado. Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores. Se entregará el dia 30 de diciembre de 2025,
Diseño estructural: El contratista entrego el diseño del box K5+900, se devuelve parte de la interventoria. El contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones, el cual se compromete a entregar el 21 de octubre de 2025. La subsanación de muro de contención la remite el consorcio providencia el dia 17 de octubre de 2025. Se aprobo parcialmente el muro de contención, pendiente ajustar planos. Se aprobo el box coulvert 3x3 ubicado en el K5+900. El contratista remitio las correcciones, se revisaran por parte de laa interventoria
PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoria aprobo, fue remitido a la entidad. PAGA se remitio al INVIAS
CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación completa para su tramite. se debe entregar a mas tardar el 10 de junio de 2025. El contratista no cumplio. El contratista radico el dia 18 de junio de 2025. Esta pendiente la radicación de los informes tecnicos que acompañan la solicitud, los cuales se entregaran el 26 de junio de 2025. Copia del radicado de la información al municipio el dia 4 de julio de 2025. No se cumplio, se entregará el 16 de julio de 2025. Se entregó el dia 17 de julio a la aciadia para su revisión y radicación. La alcaldia manifiesta que el dia 1 de agosto radicara en la CVS. Se radicó el documento y se entregaron los autos de apertura con los recibos de pago para iniciar el tramite. el contratista manifiesta que la proxima semana se hará la visita. La visita esta confirmada para el 5 de septiembre de 2025.Se cuenta con las dos resoluciones de la CVS con una compensación de 100 arboles por cada uno.

**2. Estado de los documentos de inicio:**
A continuación se listan los documentos y su estado:
APU: ENTREGADO.
PROGRAMACION: ENTREGADO.
HOJA DE VIDA: ENTREGADO.
MAQUNARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.
PMT: ENTREGADO.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: ENTREGADO.
FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRA SUBBASE GRANULAR Y JOMEVE QUE SUMINITRA AFIRMADO.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: ENTREGADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.
FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

**3. Estado de la etapa de ejecución de obra:**

En relación a la ejecución de la obra, se terminaron el 100% de los dos box ubicados en las abscisas K3+610 y K3+920 incluyendo los rellenos laterales. Se termino el 100% del pavimento costado derecho y costado izquierdo hasta la absicsa K4+200. Se termino la actividad de bordillo hasta el K4+200. El contratista finalizo las actividades de bermacuneta hasta el K4+200. Esta semana no hubo avance de relleno lateral, el contratista cuenta con material para realizar la actividad, sin embargo no se cumplio con la fecha prevista de terminación de esta actividad, se propone terminarlo para el 15 de enero. Se le recuerda al contratista que el contrato actualmente va segun proroga 5 hasta el 27 de enero de 2026, al igual que el plazo de la interventoria, se remitio el dia de reprogramación No. 5 para revisión de la interventoria.

El contratista realiza actividades en el K4+200 construccion del muro, finalizo la actividad de fundición, ya se desencofro, se estan iniciando actividades del filtro del espaldar del muro, se finalizaron actividades de mejoramiento y mantenimiento de las soleras en el box existente K4+200, se reconstruyo aleta del box K4+200.

El contrastista termino actividades de mejoramiento de las soleras de la alcantarilla triple ubicada en el K3+540, y esta pendiente atención de socavación aguas abajo costado derecho, la cual estará lista para el 15 de enero de 2026.

Scanned with CamScanner

Esta semana el contratista adelanto actividades de trazado geometrico del box K5+900 respecto al pavimento vial
Actualmente el contrato tiene un % programado de 91,45 % frente a un ejecutado de 91,4%, atraso de 0,05%, datos con base en la reprogramación a raiz de la prorroga 5.

Se hicieron reparaciones de las losas para un total de 42 losas reparadas. Segun programación se hizo un recorrido el dia 17 de diciembre de 2025 para verificar que se haya cumplido el 100% de las reparaciones y cerrar a satisfacción dicha actividad, sin embarog, se evidencio qeu de las 42 mencionadas fueron reparadas a satisfacción pero se presentan en el primer tramo 12 losas mas para reparación, el contratista las debebrá atender antes del 15 de enero de 2026.

NO se presentan cierre parciales, en acopio tienen 144 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio.

Frente a la PQR de Ocensa, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del alquiler de volqueta, el contratista remitio respuesta y se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del acopio, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del hielo, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del bodega, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR del pago del hielo y la bodega por el mes de agosto, se atendió el requerimiento y se cerro a satisfacción con dicha entidad.

Frente a la PQR de liquidación de Paola Pacheco y la liquidación de Luisa Sierra se les enviara el formato de liquidación para su firma y posterior pago, se deberá realizar antes del 15 de octubre 2025. El consorcio providencia manifiesta que se presentó el formato de liquidación para revisión, se encuentra pendiente el pago, el cual se realizará para el dia 24 de octubre de 2025. El contratista cumplio, ya se cuenta con paz y salvo, con lo cual se cierra.

Frente a la PQR a John Luis Armario, maestro de obra, quien reclama pago de presetacion de servicios de mano de obra, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025. continua pendiente, el contraitsta manifiesta que esta en revisión de la documentación.

Frente a la PQR sobre liquidación de Elizabeth Agamez, quien reclama liquidación desde el 25 de octubre, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025. No se cumplio, el contraitsta a mas tardar la pagara el 15 de enero.

Frente a la PQR sobre liquidación de Gledys Hernandez, quien reclama liquidación desde el 30 de septiembre de 2025, se deberá realizar atención de la misma antes del 24 de diciembre de 2025. No se cumplio, el contraitsta a mas tardar la pagara el 15 de enero.

**4. Proposiciones y varios:**

Respecto al componente SST: el contratista entregó informe del mes de octubre de 2025, pendiente respuesta por parte de la interventoria

Respecto al componente ambiental: el contratista remitio infomre agosto, septiembre y octubre, pendiente respuesta por parte de la interventoria,.

Respecto al componente social: el contratista presenta infomres hasta octubre, los mismos se encuenttran aprobados, se realizó comite de veeduria el 18 de diciembre de 2025 no se presentaron novedades en el mismo, siguen pendiente cierre de PQRs. se realizo charla con el equipo de trabajo respecto a inclusión social y diversidad.

En campo se encuentran 18 personas, de estas corresponden a 10 personas mano de obra no calificada, toda correspondiente al area de influencia directa, y se cuenta con 6 mujeres, de las cuales 1 son de área de influencia y 5 son profesionales. .

El contratista no ha entregado0 los rendimientos financieros hasta la fecha del cierre . A la espera que la fiducia entregue el cierre. Se entregará el dia 19 de diciembre de 2025. El contratista hizo la gestión con la fiducia y emitio información para tramite de la interventoria,

Se solicita la entrega de un balance del contrato con el fin de validar recursos para finalizar activdades de ejecución, en dicho balance se debe tener presente el recurso para el pago final de la CVS. Se entregara el dia 24 de diciembre de 2025. No se cumplio, se entregará el 31 de diciembre de 2025.

Se solicita la entrega de concepto sobre necesidad del filtro en el K5+900 hacia menores el cual será entrega el 24 de diciembre de 2025. No se cumplio, el contratista lo entregará el 5 de enero de 2026.

Asiste a la reunión por parte del contratista, la ing Daniela Alvarez.

Se solcita la entreag de las planillas de pago de parafiscales de los meses de septiembre y octubre de 2025. El contratista la entregó el 29 de diciembre de 2025,

Scanned with CamScanner

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Ver compromisos en temas desarrollados | Según puntos anteriores | Contratista |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 9/01/2026 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Daniela Alva L. | Apoyo Dirección Obra | Cons Prov | |
| Angela M. Dávila | Director Interventa | Cons. Ingeniería | |
| Marcela Gil G. | Prof Social | Cons Ingeniería | |
| Vicente Urzola B. | Res. Interventoría | C. Ingeniería LTDA | |



Scanned with CamScanner

# 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

**Tabla 7 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **5053 de 2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO INGECON-INCO** | **NIT:** | **901.783.007-9** |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | • **INGENIERIA Y CONSULTORIA INGE CON S.A.S 90%**<br>• **INGENIERIA Y CONSULTORIA CM S.A.S 10%** | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **28 de diciembre de 2023** | **No. de Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085** | **SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR** |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 2.219.000.000,00** | | |
| **VALOR ADICIONES:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN 1:** | **$ 0,00** | | |
| **ADICIÓN N:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 2.219.000.000,00** | | |
| **ANTICIPO** | **$ 932.352.941,00** | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | **$ 0.00** | | |
| **ANTICIPO EN CUENTA:** | **$ 0,00** | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | **$ 0,00** | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | **$ 0,00** | | |
| **PLAZO INICIAL:** | **Hasta el 31 de diciembre de 2023** | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | **4 (cuatro)** | | |
| **PRÓRROGA 1:** | **Hasta el 31 de diciembre de 2024** | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA 2:** | **Hasta el 31 de julio de 2025** |
| **PRÓRROGA 3:** | **Hasta el 31 de octubre de 2025** |
| **PRÓRROGA 4:** | **Hasta el 27 de enero de 2026** |
| **SUSPENSIÓN 1:** | **29/12/2023** |
| **REANUDACIÓN 1:** | **01/02/2024** |
| **MODIFICACIÓN:** | **N/A** |
| **SUSPENSIÓN 2:** | **23/10/2025** |
| **REANUDACIÓN 2:** | **05/12/2025** |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | **27 de enero de 2026** |

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

La interventoría hizo seguimiento a los contratos de obra de acuerdo a lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS donde se establecen las siguientes, actividades administrativas, técnicas, ambientales y sociales, en el periodo de diciembre de 2025:

**Actividades Administrativas**:

- Revisión por parte de los especialistas de la interventoría de los informes técnicos de la revisión a los estudios y diseños presentados durante el presente periodo del proyecto del contrato No. 159-2023 del municipio de Planeta rica.

- Revisión para aprobación de la documentación exigida en los pliegos de condiciones de los contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica.

- Revisión de la información necesaria para la liquidación de los contratos de obra No. LP-006-2023 del municipio de Los Córdoba y No. LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento.

- La interventoría entregó al Invias Territorial Córdoba informes semanales contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica.

- Entrega de informes y documentación generada en desarrollo del proyecto a las secretarias de infraestructura y planeación de los municipios.

**Actividades Técnicas**:

- Verificación y control de los materiales utilizados en la obra del proyecto de Planeta rica.

- Verificación de procedimientos constructivos de acuerdo con los diseños aprobados.

- Medición de las cantidades ejecutadas y reporte de avance de ejecución.

- Toma de muestras de ensayos de laboratorio de las actividades ejecutadas.

- La interventoría llevó el registro diario de obra (Bitácora), donde queda consignado en detalle las actividades realizadas por el contratista, registro diario del clima las 24 horas y otras situaciones que se relacionen con el Proyecto.

- Control de personal y de equipos en la obra.

- Verificación del cumplimiento de los planes de manejo de tráfico en las obras.

**Actividades Ambientales y SST**:

- La interventoría realiza la revisión y la inspección de señalización provisional en cada frente de obra.

- La interventoría realiza inspección y verificación de las afiliaciones a la seguridad social del personal de cada frente de obra.

- La interventoría verifica las inspecciones necesarias a los equipos y herramientas de cada frente de obra.

- La interventoría realiza inspección y verificación de dotación de elementos de protección personal en cada frente de obra.

- La interventoría de igual manera en este periodo también cumple con las solicitudes a los contratistas del pago de la seguridad social y soporte de pago de la planilla de aportes, por medio de comunicados.

- Plan de mejora para control de tráfico mediante utilización de paleteros en los frentes de obra de Planeta rica y los Córdoba.

- Verificar las afiliaciones del personal de cada frente de obra.

Con el fin de dar un resumen de la gestión ambiental realizada por interventoría a los proyectos de Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, se tiene lo siguiente:

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

- El contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, en el mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista a la fecha solo ha presentado los informes ambientales hasta el mes de octubre del 2025. Pendiente diciembre 2025.

- **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

- El contrato LP-006-2023 del municipio de los córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente el cierre de informes ambientales y balance ambiental con sus respectivos soportes.

- **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

- El contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025, quedando pendiente el cierre de informes ambientales y balance ambiental con sus respectivos soportes.

Con el fin de dar un resumen de la gestión social realizada por interventoría a los proyectos de Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, se tiene lo siguiente**:**

- **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

  - En el mes de diciembre el contratista a través del componente social se realizó la siguiente charla:
    Charla Inclusión Social y diversidad dirigida al equipo de trabajo
  - Se realizó comité con la veeduría ciudadana, con el fin de informar el avance de las obras y a su vez generar un espacio de conversación con los miembros de la veeduría para escuchar sus inquietudes, solicitudes y aportes.
  - En el periodo reportado se reciben a través de la alcaldía municipal y correo institucional las siguientes PQRS:
    Solicitud realizada por el señor Jhon Luis Armario solicitando el pago por concepto de prestación de servicios de mano de obra asociada a las actividades que se vienen realizando en la obra.
    Solicitud realizada por la señora Elizabeth Agamez Rozo, solicitando pago de liquidación laboral, en el cargo de controladora vial, vinculada desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 25 de octubre de 2025. Por lo cual la interventoría realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de esta obligación.
    Solicitud realizada por Gledys Hernández Trujillo, solicitando pago de liquidación laboral, en el cargo de controladora vial, vinculada desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. Por lo cual la interventoría realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de esta obligación.
  - Por otro lado, se da respuesta de manera satisfactoria a la solicitud de pago liquidación laboral de la señora Paola Yulieth Pacheco García por la vinculación laboral al Consorcio Providencia desde el 13 de enero de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2025 y de la señora Luisa Fernanda Sierra Martínez por la vinculación laboral al Consorcio Providencia desde el 04 de julio de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2025.

- **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

- Actualmente se encuentran gestionando la información para la entrega final del proyecto.

- El consorcio Vía Barranquillita y la alcaldía municipal a través de WhatsApp y correo electrónico extiende la invitación la institucionalidad y comunidad para que asistan a la socialización de cierre del proyecto (entrega formal del proyecto).

- El consorcio vía Barranquillita en conjunto con la Administración Municipal de los córdobas, con el acompañamiento de la Interventoría realizó la entrega formal del proyecto a la comunidad, con el desarrollo de un espacio de socialización de cierre del proyecto, en el cual se contó con la participación de la administración municipal, la veeduría ciudadana, la interventoría y comunidad en general. Este espacio tuvo como objetivo informar y dar a conocer a la comunidad del área de influencia, el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del contrato de obra, escuchar a la comunidad y hacer entrega formal del proyecto. Se finaliza el espacio concluyendo (las partes) que ha sido un proyecto de valor y de impacto social para los habitantes de la zona debido a que se logró mejorar el acceso y la transitabilidad de las comunidades (en menor tiempo) desde la zona hasta el casco urbano, el ingreso de medios de transporte para el desplazamiento de productos agrícolas, ingreso del sistema de transporte escolar, lo que permite mejorar la presencia de NNA en las jornadas escolares, ingreso de transporte para la ventas de productos de la canasta familiar entre otros productos y servicios de interés de la comunidad. Por estas razones la comunidad y las partes interesadas reciben y firman el acta de entrega a satisfacción que avalan la ejecución de las obras realizadas en el marco del proyecto.

- En el marco de la socialización de cierre del proyecto vía Barranquillita del municipio de los Córdobas, la veeduría ciudadana con el acompañamiento y supervisión del área social de la interventoría firmó acta de paz y salvo ya que la obra se ejecutó al 100% de acuerdo con los tiempos establecidos y las especificaciones técnicas del contrato, así mismo se deja constancia de paz y salvo por concepto de vinculación de trabajadores u otros servicios que se pudiesen prestar desde la comunidad en función de las actividades realizadas por el contratista.

- **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

- Actualmente se encuentran gestionando la información para la entrega final del proyecto.

- El consorcio L&S y a través de grupo de WhatsApp y correo electrónico extiende la invitación la institucionalidad y comunidad para que asistan a la socialización de cierre del proyecto (entrega formal del proyecto).

- El consorcio L&S en conjunto con la Administración Municipal de San Bernardo del Viento, con el acompañamiento de la Interventoría realizó la entrega formal del proyecto a la comunidad, con el desarrollo de un espacio de socialización de cierre del proyecto, en el cual se contó con la participación de la administración municipal, la veeduría ciudadana, la interventoría y comunidad en general. Este espacio tuvo como objetivo informar y dar a conocer a la comunidad del área de influencia, el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del contrato de obra, escuchar a la comunidad y hacer entrega formal del proyecto. Se finaliza el espacio concluyendo (las partes) que ha sido un proyecto de valor y de impacto social para los habitantes de la zona debido a que se logró mejorar el acceso y la transitabilidad de las comunidades y turistas ya que es una zona aledaña a las playas de San Bernardo del Viento. Por estas razones la comunidad y las partes interesadas reciben y firman el acta de entrega a satisfacción que avalan la ejecución de las obras realizadas en el marco del proyecto.

- En el marco de la socialización de cierre del proyecto vía Rimini del municipio de San Bernardo del Viento, la veeduría ciudadana con el acompañamiento y supervisión del área social de la interventoría firmó acta de paz y salvo ya que la obra se ejecutó al 100% de acuerdo con los tiempos establecidos y las especificaciones técnicas del contrato, así mismo se deja constancia de paz y salvo por concepto de vinculación de trabajadores u otros servicios que se pudiesen prestar desde la comunidad en función de las actividades realizadas por el contratista.

## 5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

### 5.3.1 INFORMES ESPECIALISTAS.

Para el presente informe, no se cuenta con revisión de informes por parte de los especialistas de la Interventoria.

## 5.3.2 INFORMES PROFESIONALES.

**NIT. 901.783.007-9**

# INFORME EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DEL 2023

PERIODO 05 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|
| Directora de Interventoría | Supervisor del INVIAS |

**Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385**
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
**Bogotá - Colombia**

# 1 INTRODUCCIÓN.

Durante el periodo, correspondiente al 5 al 31 de diciembre de 2025, en el presente informe se presentan las principales actividades desarrolladas por la dirección de la Interventoría en el cumplimiento de sus funciones para el contrato de interventoría No. 5053 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1 y que tiene a cargo el seguimiento y control de tres contratos de obra:

- Contrato de obra No. 159 de 2023. Contratista: Consorcio Providencia. Contratante: Municipio de Planeta Rica
- Contrato de obra No. LP-006 DE 2023. Contratista: Consorcio Pavimiento Via Barranquillita. Contratante: Municipio de Los Cordobas.
- Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023. Contratista: Consorcio L&S. Contratante: Municipio de San Bernardo del Viento.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las obligaciones correspondientes al cargo de director de Interventoría para el contrato de interventoría No. 5053 de 2023.

## 3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Durante el presente periodo, la dirección de interventoría:

- Se atienden requerimientos de la entidad, respecto a información de avance de cada uno de los contratos, para el caso del contrato de Planeta Rica, avance de obra, para el caso de Los Cordobas y San Bernardo, avance en la etapa de liquidación de los contratos.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta conjunta suscrita entre el instituto y la alcaldía de Los Cordobas.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta conjunta suscrita entre el instituto y la alcaldía de San Bernardo del Viento.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta conjunta suscrita entre el instituto y la alcaldía de Planeta Rica.

- Se hace gestión frente a la solicitud de rendimientos financieros de la cuenta del anticipo del contrato de obra de obra consorcio Providencia.

- Se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de Consorcio Providencia (Planeta Rica) correspondiente a la etapa de obra.

- Se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de Consorcio Providencia (Planeta Rica) correspondiente a etapa de obra del nuevo tramo designado por la alcaldía para completar la meta física del contrato, tramo que se encuentra dentro del corredor del contrato.

- Programó, desarrolló y lidero los comités semanales de seguimiento realizados conjuntamente con el consorcio providencia.

- Atendió los requerimientos realizados por el instituto, tales como comunicados y/o convocatorias a reuniones y mesas de trabajo.

- Dio cumplimiento a las obligaciones en materia legal, técnica, ambiental social, SST establecidas en el Manual de Interventoría.

- Requirió a cada uno de los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones establecidas tanto en el contrato como en el convenio, de acuerdo a los lineamientos del Instituto.

- Participo en comités con la comunidad de Providencia (Planeta Rica) para darles claridad sobre aspectos relevantes de la obra.

**NIT. 901.783.007-9**

- Suscribió cheques para giros de recursos para el pago de actas de recibo parcial de obra para el contrato de Consorcio Pavimento Via Barranquillita.

- Suscribió cheques para giros de recursos para el pago de actas de recibo parcial de obra para el contrato de Consorcio L&S.

- Gestiono y tramito acta de reanudación del contrato de obra consorcio Providencia.

- Gestiono y tramito acta de reanudación del contrato de interventoría teniendo en cuenta la suspensión del contrato de obra.

- Gestiono y tramito prórroga del contrato de obra consorcio Providencia.

- Gestiono y tramito prórroga del contrato de interventoría teniendo en cuenta lo requerido por el Consorcio Providencia.

ANGELA MARIA DAVILA M
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
TP 17202-153798 CLD

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA** **FECHA:**

| DD | MM | AA |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 5053 de 2023**

Desde: 05 12 2025 Hasta: 31 12 2025

Nombre: Vicente Carlos Urzola Badel Cargo: Residente de Interventoría

| No. | Actividades realizadas durante el mes de diciembre 2025 | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | Elaboración de diferente comunicados remitidos al contratista | Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra. Donde se registran los diferentes requerimientos para el seguimiento y desarrollo del proyecto. |
| 2 | Diligenciamiento de bitácora de obra | se registraron las actividades diarias, equipos utilizados, observaciones, indicaciones, registros de lluvias, etc. del mes de diciembre de 2025. |
| 3 | Revisión de cantidades de obra | Se revisan las cantidades ejecutadas durante el periodo de de diciembre de 2025. |
| 4 | Revisión del balance de obra | Se revisa balance de obra, en archivos editables previo para firma de los representantes legales y para envío los documentos de las cuentas por pagar. |
| 5 | Actualización de cantidades de obra | De manera diaria se lleva el control de las cantidades de obra, tomados del registro diario de las actividades ejecutadas en obra, por lo que se actualiza el consolidado de las cantidades ejecutadas. |
| 7 | Control de avance de obra. | Se entrega de manera semanal el control de los avances de obra con respecto a la inversión programada aprobada, el cual quedaron registrado en los informes semanales:<br>No. 91 .<br>No. 92 .<br>No. 93 .<br>No. 94 |
| 8 | Elaboración del informe mensual de interventoría | Se realiza informe mensual mes de diciembre 2025, con anexos, que entrega al INVIAS. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Recorridos diario a la vía | Se realiza visita permanente en los corredores viales, se ejecutaron: Construcción de muro de contención en la abscisa K4+200, etc.. |

| No. | Actividades realizadas durante el mes de diciembre 2025 | Observaciones |
|---|---|---|
| 10 | Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos | Se revisa los ensayos de control de caracterización de afirmado y subbase granular; en el mes de diciembre 2025. |
| 11 | Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos | Los resultados se registran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. |
| 12 | Se realiza registro fílmico y fotografías de avance | Se presenta el registro del frente de obra. |
| 13 | APU no previsto | Se presentaron apu de item no previstos y se firma acta de pactación de precios. |

Firma: _____

Vicente Urzola Badel
T.P: 22202215754COR

**INFORME DE GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA**

**DICIEMBRE DE 2025**

PROYECTO: CONTRATO INTERVENTORIA N. 5053 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

El alcance de los programas a implementar dentro de la gestión social estipulados en el PAGA – Componente social se encuentra a continuación:

1. Subprograma y/o Proyecto: Atención a la Comunidad
2. Subprograma y/o Proyecto: Información y Divulgación.
3. Subprograma y/o Proyecto: Cultura Vial y Participación Comunitaria.
4. Subprograma y/o Proyecto: Inclusión Social con perspectiva de género y transversalización
5. Subprograma y/o Proyecto: Infraestructura de predios
6. Subprograma y/o Proyecto: Contratación de mano de obra con enfoque de género de derecho y diferencial.
7. Subprograma y/o Proyecto: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

## 1. SUBPROGRAMA Y/OPROYECTO: DE ATENCION A LA COMUNIDAD

El contratista del proyecto Pavimento Vía Providencia permanece con la instalación de buzón móvil en el área de influencia del proyecto, en aras de garantizar la atención oportuna a los ciudadanos a las quejas, reclamos, solicitudes y peticiones que surjan en el marco del proyecto.

### INDICADOR DE GESTIÓN

A fecha el consorcio Providencia ha recibido once (11) PQRS, de las cuales ocho (8) se les ha dado respuesta y (3) ingresaron recientemente, se espera que el contratista tramita en los tiempos establecidos.

| INDICADOR | UND | % | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Número de solicitudes recibidas/Número de solicitudes respondidas satisfactoriamente | 11 | % | Se espera atención oportuna por parte del contratista en caso dado de presentarse PQRS. |

Procesos de atención PQRS a la fecha por atender:

1. En el mes de noviembre 2025 ingresó una PQRS, a través de la alcaldía municipal, por el señor Jhon Luis Armario solicitando el pago por concepto de prestación de servicios de mano de obra

asociada a las actividades que se vienen realizando en la obra.

2. En el mes de noviembre de 2025 ingresó PQRS, a través de correo institucional de la interventoría por la señora Elizabeth Agamez Rozo, solicitando pago de liquidación laboral, en el cargo de controladora vial, vinculada desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 25 de octubre de 2025. Por lo cual la interventoría realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de esta obligación.
3. En el mes de noviembre de 2025 ingresó PQRS, a través de correo institucional de la interventoría por Gledys Hernández Trujillo, solicitando pago de liquidación laboral, en el cargo de controladora vial, vinculada desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. Por lo cual la interventoría realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de esta obligación.

## 4. SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento a las actividades de información y divulgación dirigidas a las comunidades de los proyectos y/o contratos asociados a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

El consorcio Providencia a través de grupo de WhatsApp extiende la invitación para el desarrollo del comité de la veeduría correspondiente al mes de diciembre de 2025.

## SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO: CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA.

***Capacitaciones y/o charlas***

En el mes de diciembre el contratista Consorcio Providencia a través del componente social realizó la siguiente charla:

**Equipo de trabajo**

Diversidad e Inclusión Social

***Reuniones - Comités con la veeduría ciudadana***

El Consorcio Providencia, realizó comité con la veeduría ciudadana el dia jueves 18 de diciembre, con el fin de informar el avance de las obras y a su vez generar un espacio de conversación con los miembros de la veeduría para escuchar sus inquietudes, solicitudes y aportes.

**SUBPROGRAMA/PROYECTO: INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN.**

Se hace seguimiento a la permanencia o aumentó a la vinculación de hombres y mujeres del área de influencia en igualdad de condiciones, toda vez que se requiere de la participación a los habitantes de la población de manera equitativa, promoviendo el empleo temporal, lo cual contribuye a mejorar las condiciones económicas de las comunidades.

**Espacios educativos para la inclusión social**

Durante el periodo el contratista Consorcio Providencia realizó charla asociada a la Diversidad y la Inclusión Social con el equipo de trabajo en obra.

**5. SUBPROGRAMA/PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS**

**Levantamiento de Actas de Vecindad**

Durante el periodo el Consorcio Providencia no realizó visitas para la realización de actas de vecindad.

Se reporta cuadro con las actas de vecindad iniciales y de cierre que hasta la fecha se han elaborado.

**INDICADOR DE GESTIÓN**

| **Actas de vecindad de inicio** | **Corredor** | **Total** |
|---|---|---|
| 59 tramos 1 y 2 – Providencia. | *Vereda Providencia del municipio de Planeta Rica – Córdoba | 59 actas levantadas y aprobadas |
| **Actas de vecindad de cierre** | **Corredor** | **Total** |
| 42 actas tramo 1 (La Balastrera 1) | La Balastrera 1 | 42 actas levantadas y aprobadas. |

**6. SUBPROGRAMA/PROYECTO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHO Y DIFERENCIAL.**

Se hace seguimiento a la permanencia o aumento a la contratación de mano de obra con enfoque de género, es decir la participación de mujeres cabeza de hogar, jóvenes, personas en situación de discapacidad y miembros de las comunidades indígenas, toda vez que se requiere la

participación de la población diferencial, lo que permite visibilizar el reconocimiento de derechos y eliminación de barreras, obstáculos, discriminación, prejuicios e imaginarios que impiden el acceso y garantía y capacidad para hacer un ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones y oportunidades.

**7. SUBPROGRAMA/PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA CON COMUNIDADES ÉTNICAS.**

En el mes de diciembre, no se adelantaron gestiones asociadas a la identificación de comunidades indígenas, ya que en los periodos pasados el contratista realizó la gestión respectiva, cuya indagación realizada a través de las entidades competentes no certificaron presencia de comunidades indígenas localizadas en el área directa de intervención del proyecto donde se tuviera que adelantar proceso de consulta previa.

**OBSERVACIONES:**

- Durante el periodo se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades asociadas a los programas y/ proyectos descritos en el PAGA – Componente Social.
- Seguimiento a la entrega del informe social por parte del contratista, el cual debe ser entregado de manera mensual en los formatos autorizados por INVIAS, con sus respetivos soportes
- De manera permanente se dispone la participación para el acompañamiento y seguimiento a las actividades programadas por parte del contratista.

**LEIDY MARCELA GIL GONZÁLEZ**
Profesional Social – Interventoría
Registro Profesional: 26035741

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS**

# INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

05 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

**INGENIERIA Y CONSULTORIA**
**INGECON SAS**

| **ELABORÓ** | **REVISÓ** |
|---|---|
| YOVANY ALBERTO ELORZA | Ing. ANGELA MARIA DAVILA |
| PROFESIONAL AMBIENTAL | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |

**Contenido**

1 INTRODUCCIÓN ..... 3
2 OBJETIVOS ..... 3
3 LOCALIZACION ..... 4
4 GENERALIDADES ..... 4
4.1 Información contrato de interventoría ..... 4
4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... 5
4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL MES ..... 6
4.3.1 CTO.159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA ..... 6
4.3.2 CTO. LP 006 de 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ..... 9
5 CONCLUSIONES ..... 10

# 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito realizar acompañamiento, verificación y seguimiento al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental presentado por los contratistas de obra a cada uno de los municipios a cargo y la implementación de este desde las diferentes actividades desarrolladas por el contratista de obra durante el período comprendido entre el 05 al 31 de diciembre del 2025 en los en los municipios de Planeta Rica, Los Córdobas y San Bernardo del viento.

# 2 OBJETIVOS

- Presentar el informe de actividades realizadas durante el desarrollo del contrato de obra No. LP 008 de 2023, No.159-2023 y No. LP 006-2023 en el periodo comprendido entre el 05 al 31 de diciembre del 2025, tendientes a garantizar la ejecución del proyecto.

- Mostrar el reporte de la vigilancia y control adelantado por la Interventoría en cuanto a la gestión ambiental realizada por lo contratistas de obra.

- Verificar que la totalidad de las actividades del Contratista en materia ambiental, se realicen en dirección al cumplimiento del contrato, leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales y guías vigentes.

# 3 LOCALIZACION

El proyecto a ejecutar se localiza en los municipios de Planeta Rica, Los Cordobas y San Bernardo del Viento.

imagen 1. Localización del proyecto




# 4 GENERALIDADES

## 4.1 Información contrato de interventoría

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | CONSORCIO INGECON-INCO |
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1 |
| VALOR DEL CONTRATO: | DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($2.219.000.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| ORDEN DE INICIO: | 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| PRORROGAS: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| ADICIONES: | N/A |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIONES: | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024<br>23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACION: | 27 DE ENERO DEL 2026 |

## 4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

| CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PROVIDENCIA | | |
| INTEGRANTES | % | ORIGEN |
| EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO | 5% | COLOMBIA |
| BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S | 85% | COLOMBIA |
| KAP CONSTRUCCIONES S.A.S | 10% | COLOMBIA |

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA

| CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA | | |
| INTEGRANTES | % | ORIGEN |
| MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN | 10% | COLOMBIA |
| E  INGCARQ S.A.S | 90% | COLOMBIA |

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

| CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO L&S | | |
| INTEGRANTES | % | ORIGEN |
| LA COMERCIALA S.A.S | 50% | COLOMBIA |
| SIS ORGANIZATION S.A.S | 50% | COLOMBIA |

## 4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL MES

### 4.3.1 CTO.159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA

El contratista en comunicado OFI-CONS-128-2025 del 05 de noviembre del 2025, presenta el informe ambiental correspondiente al periodo de septiembre del 2025 y remite la actualización del PAGA en su V6.0 teniendo en cuenta la resolución 1085 del 22 de septiembre del 2025, la CVS otorgo permiso de ocupación de cauce del Box-Coulvert con aleta y muro de contención y resolución 1095 del 22 de septiembre del 2025, permiso de ocupación de cauce para la Alcantarilla triple aguas arriba en la abscisa K3+540.

El contratista en comunicado OFI-CONS-142-2025 del 26 de diciembre del 2025, presenta el informe ambiental correspondiente al mes de octubre del 2025.

**ACTIVIDADES DE OBRA**

Se contaron con paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

Se realizo acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera Jomeve en ciénaga de oro.

Se realizo acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

Se realiza fundida de pavimento rígido mr-38 premezclado, desde la abscisa k5+200 a k5+620 (carril derecho).

Se toman muestras de concreto (viguetas) para ensayos de resistencia

Se realiza limpieza y sello de la junta de dilatación del pavimento construido.

Se realizan excavaciones, suministro, extendida y compactación de subbase granular, instalación de rieles y acero de refuerzo para construcción de bermacunetas en el tramo 2.

Se realizan cortes, demoliciones y retiro de escombros de las losas que presentan fracturas en el tramo 1.

Se realiza limpieza, perforación en las losas para anclar el acero, armado e instalación de parrilla en las losas a reparar.

Se realiza fundida de pavimento rigido mr38 premezclado para reparación de 8 losas fracturadas

Se realiza seguimiento a las actividades ambientales:










ENTRADA
SALIDA DE
VOLQUETAS


DESVIO
FIN
DE
OBRA


PUNTO ECOLOGICO
RESIDUOS APROVECHABLES
PLASTICO - CARTON - VIDRIO
PAPEL - METALES




FJY-33H



**CTO. LP-MSBV-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO**

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, en comunicado 129-2025 del 19 de agosto del 2025, remitió los informes ambientales pendientes de abril y mayo del 2025.

En comunicado CING-INV-5053-0272-2 del 02 de octubre del 2025, se dio concepto de aprobación a los informes ambientales de abril y mayo del 2025, se solicito al contratista presentar el Balance ambiental de acuerdo a lo establecido en el manual de interventoría INVIAS 2022.

Consorcio L&S presenta en correo del 16 de diciembre del 2025, documentos de liquidación, donde adjuntan un informe final PAGA, pero lo adjuntando no corresponde al formato de Balance ambiental y tampoco cuenta con los soportes de cierre al PAGA, por lo tanto, fue de vuelto por la interventoría.

### 4.3.2 CTO. LP 006 de 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, mediante correo del 29 de julio del 2025 presento el Balance ambiental.

# 5 CONCLUSIONES

Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdobas a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita y el contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, ya finalizaron actividades en el mes de mayo del 2025.

Para el contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento, se verificó la entrega y posterior aprobación de los informes ambientales pendientes de abril y mayo de 2025; no obstante, se mantiene como requerimiento pendiente la presentación del Balance Ambiental en el formato establecido por el Manual de Interventoría INVIAS 2022, junto con los soportes de cierre del PAGA, los cuales no fueron aportados correctamente en la documentación de liquidación remitida en diciembre de 2025 y, por tanto, fueron devueltos.

El contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, en el mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista a la fecha el contratista presento los informes ambientales correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2025, así como la actualización del PAGA versión 6.0, ajustada a la normatividad ambiental vigente y a las resoluciones emitidas por la CVS para la ocupación de cauce de las obras hidráulicas proyectadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS**

# INFORME SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

05 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

**CONSORCIO INGECO-INCO**

| **ELABORÓ** | **REVISÓ** |
|---|---|
| Ing. ANGIE VERSOLATTO G. | Ing. ANGELA MARIA DAVILA |
| INSPECTORA SST | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |

## Tabla Contenido

INTRODUCCIÓN ..... 3
1 ALCANCE DE INFORME ..... 4
2 LOCALIZACION ..... 5
3 GENERALIDADES ..... 5
3.1 Información contrato de interventoría ..... 5
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... 5
4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST ..... 6
4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTAS. ..... 6
4.1.1 CTO LP-006 DE 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ..... 6
4.1.2 CTO. 159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA ..... 6
4.1.3 CTO LP-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO 13
4.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA ..... 14
4.2.1 Política SG – SST ..... 14
4.2.2 Estado de personal e ingresos ..... 15
4.2.3 Vehículos. ..... 17
4.2.4 Indicadores al SG-SST ..... 17
5 CONCLUSIONES ..... 17

## INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito realizar acompañamiento, verificación y seguimiento del SG-SST de los contratistas de obra y la implementación de este en las diferentes actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 05 al 31 de diciembre del 2025 en los municipios de los Córdobas, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

A su vez continuar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa Ingeniería Y Consultoría INGECON SAS con el fin de brindar a los trabajadores un ambiente laboral que sea adecuado, cómodo y eficiente, para poder cumplir a cabalidad con las tareas designadas de manera óptima, segura y confiable y mitigar al máximo los peligros a los que se encuentran expuestos.

# 1 ALCANCE DE INFORME

a) Informe mensual SST de interventoría etapa de obra.

b) Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.

c) Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por los contratistas de obra, donde se verifique el cumplimiento de las actividades de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.

d) Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

e) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral.

f) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social Integral.

# 2 LOCALIZACION

El proyecto a ejecutar se localiza en los municipios de los Córdobas, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

# 3 GENERALIDADES

## 3.1 Información contrato de interventoría

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | CONSORCIO INGECON-INCO |
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1 |
| VALOR DEL CONTRATO: | DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($2.219.000.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| ORDEN DE INICIO: | 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| PRORROGAS: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| ADICIONES: | N/A |
| SUSPENSIONES: | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024 |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACION: | 27 DE ENERO DEL 2026 |

## 3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

| CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PROVIDENCIA | | |
| INTEGRANTES | % | ORIGEN |
| EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO | 5% | COLOMBIA |
| BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S | 85% | COLOMBIA |
| KAP CONSTRUCCIONES S.A.S | 10% | COLOMBIA |

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA

| CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA | | |
| INTEGRANTES | % | ORIGEN |
| MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN | 10% | COLOMBIA |
| E INGCARQ S.A.S | 90% | COLOMBIA |

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

| CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023 | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO L&S | | |
| INTEGRANTES | % | ORIGEN |
| LA COMERCIALA S.A.S | 50% | COLOMBIA |
| SIS ORGANIZATION S.A.S | 50% | COLOMBIA |

# 4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST

En el presente informe queda evidenciado el seguimiento que viene realizando la interventoría en el periodo del presente informe, adicionalmente se plasma la gestión que viene realizando cada contratista.

## 4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTAS.

### 4.1.1 CTO LP-006 DE 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, fue presentado las planillas de seguridad y paz y salvo.

### 4.1.2 CTO. 159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA

El contratista continuo con las actividades de instalación de señales preventivas en el corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta a k3+540.

Se contaron con paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

Se realizo acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera Jomeve en ciénaga de oro.

Se realizo acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

Se realiza armado e instalación de acero de refuerzo para 200 ml de bordillos para bermacunetas.

Se realiza fundida de 200 ml con concreto premezclado 3000psi para bordillos de bermacunetas.

Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Se realizan excavaciones, instalación de geotextil y tubo perforado y suministro de triturado para la construcción de 73ml de filtro entre las abscisas k3+540 a k3+610.

#### 4.1.2.1 Política de SG-SST

El contratista presenta la política de seguridad y salud en el trabajo, prevención de alcohol, tabaco y drogas, las cuales se encuentran publicados en la bodega y fueron socializados a todo el personal vinculado, a través de la inducción SST, se evidencia a continuación.



CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9

POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **CONSORCIO PROVIDENCIA** en sus operaciones de construcción reconoce la importancia del talento humano y se compromete desde el más alto nivel de la organización a:

Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de casa una de las obras que construimos, establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales que puedan surgir en cada una de ellas.

Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los demás requisitos aplicables.

Nuestra política es publicada, divulgada e implementada para asegurar que siga siendo pertinente a medida que se evalúa el desempeño del sistema gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para logarlo, la organización destina los recursos necesarios a nivel económico, tecnológico y el talento humano; con el fin de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación, mediante la mejora continua de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Atentamente,
**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C n° 78.034.207 de cerete, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629-9

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencial@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9

Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, reconoce, que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos, que requiere atención en promover entornos de trabajo seguros y hábitos saludables fomentando el bienestar de sus trabajadores, mediante la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.

La Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas, aplica a todas las personas funcionarios, contratistas, subcontratistas, proveedores directos e indirectos, clientes y visitantes que ingresen y/o permanezcan a la entidad. Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar su efectivo, en igual trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello, la coordinación armónica, así como la formulación y adopción de políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales.

Desarrollo de entornos protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas
La entidad promoverá actividades de sensibilización y de capacitación para los colaboradores, propendiendo por la creación de hábitos y estilos de vida saludables en relación al daño que causa el cigarrillo, bebidas alcohólicas y/o energizantes y sustancias psicoactivas las cuales afectan la salud del individuo y su entorno.

Establecerá medidas preventivas mediante acciones y estrategias de información y educación a sus colaboradores y divulgará esta política a todos los interesados de la organización.

Atentamente,
**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C n° 78.034.207 de cerete, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629-9

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencial@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

### 4.1.2.2 Estado del personal e ingresos

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra laborando para el periodo reportado en obra:

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | ACTIVO O RETIRADO |
|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Sarmiento Espejo | 1.038.100.533 | Op. Retroexcavadora | 06-10-24 | | Activo |
| **Eduardo Hoyos Hernández** | **1.066.746.105** | **Obrero** | **05-12-25** | | **Activo** |
| Robert Emiro Trujillo Sáez | 15.679.922 | Obrero | 23-08-25 | | Activo |
| José Ricardo Ruiz | 15.677.277 | Dir. Obra | 19-06-24 | | Activo |
| Angie Daniela Carrascal | 1.066.750.679 | SST | 30-04-24 | | Activo |
| María Camila Tano Hoyos | 1.066.748.940 | Trabajadora social | 20-06-24 | | Activo |
| **Daniela Álvarez acuña** | **1.066.746.321** | **Residente obra** | **05-12-25** | | **Activo** |
| **Jesús Alberto Sierra Moreno** | **1.066.720.747** | **Ayudante** | **13-06-25** | **30-12-25** | **Retiro** |
| Carelis Bedoya Quintero | 1.006.575.053 | Ing. administrativa | 07-07-25 | | Activo |
| Estefanía acosta González | 1.138.076.010 | Aux sst | 07-07-25 | | Activo |
| **Eufray Bravo** | **1.064.190.392** | **ayudante** | **12-12-25** | | **Activo** |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | ACTIVO O RETIRADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Melissa Lambraña | 1.003.190.690 | Residente obra | 06-08-25 | | Activo |
| **Jorge Luis Hernández Gómez** | **1.067.885.979** | **Oficial** | **12-12-25** | | **Activo** |
| **Miguel Darío Ortega Martínez** | **1.066.721.585** | **Ayudante** | **12-12-25** | | **Activo** |
| **Jose Carlos Goez Cuello** | **1.066.723.995** | **Ayudante** | **12-12-25** | | **Activo** |
| **Brayan Alfonso Padilla Martínez** | **1.067.292.005** | **Ayudante** | **12-12-25** | | **Activo** |

Dentro del informe el contratista e adjunta la planilla del mes de diciembre del 2025 en Anexo 1.

### 4.1.2.3 Programa de Capacitaciones

El contratista presenta las capacitaciones realizadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 4. Capacitaciones

| TEMA DE CAPACITACIONES | FECHA DE CAPACITACIONES |
|---|---|
| La importancia del uso de los epp | 08-12-25 |
| Peligros en la conducción | 15-12-25 |
| Protección ocular cuidado de la vista | 16-12-25 |
| Ergonomía | 20-12-25 |
| Que son las paradas de emergencia | 22-12-25 |
| Que es la gestión de accidente | 26-12-25 |
| Riesgo eléctrico | 29-12-25 |

En el anexo 2, se adjunta las actas de capacitación realizadas en el mes de diciembre del 2025.

### 4.1.2.4 Maquinaria

Se evidencio el ingreso de la siguiente maquinaria, relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4:

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MOTONIVELADORA | LIUGONG 4165D | 3.7M | VIA PROVIDENCIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MINICARGADOR | CASE CR220B | 1.5M3 | VIA PROVIDENCIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| PAJARITA | CASE 580N | 0.67M3 | VIA PROVIDENCIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VIBROCOMPACTADOR | SD-100D | 7TON | VIA PROVIDENCIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VOLQUETA | UPP086 | 15M3 | VIA PROVIDENCIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VOLQUETA | CHEVROLET BSF842 | 15M3 | VIA PROVIDENCIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En el anexo 3, se adjunta los preoperacionales de los vehículos y maquinarias reportados en el mes de diciembre del 2025.

### 4.1.2.5 INDICADORES SG-SST

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de diciembre del 2025:

| Indicadores de gestión | Descripción | Formula | Real periodo actual | Real periodo año anterior | Real acumulado | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de accidentes (AT) | Número total de accidentes de trabajo con lesiones a los trabajadores (con y sin días perdidos) | No de accidentes | 0 | 0 | 0 | En el periodo del 15 al 30 de Diciembre de 2025 no se presentaron accidente de trabajo. |
| Índice de frecuencia de accidentes con días perdidos LTIFR | Describe el número de accidentes de trabajo con tiempo perdido | (Accidentes con tiempo perdido/Horas Hombres Trabajadas) *200000 | 0 | 0 | 0 | |
| Frecuencia de accidentalidad (FA) | Describe el número de accidentes de trabajo que se presentan por cada 100 trabajadores | (No. De AT/No. De trabajadores) *100 | 0 | 0 | 0 | |
| Severidad de accidentalidad(FS) | Describe cuantos días perdidos por accidentes de trabajo se presentan por cada 100 trabajadores | ((No. De días perdidos +No de días cargados) /promedio de trabajadores) *100 | 0 | 0 | 0 | |

| Indicadores de gestión | Descripción | Formula | Real periodo actual | Real periodo año anterior | Real acumulado | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de la enfermedad laboral (EL) | Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo determinado | ((No. De casos nuevos + antiguos) /promedio de trabajadores) * 100000 | 0 | 0 | 0 | |
| Incidencia de la enfermedad laboral | Número de casos nuevos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo determinado | (No. De casos nuevo/promedio de trabajadores) * 100000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausentismo general | Establece el número de días de ausencia por incapacidad médica laboral o común en el mes con respecto al número de días de trabajo programados | (Días de ausencia por incapacidad/ número de días de trabajo programados) * 100 | 0 | 0 | 0 | En el periodo del 15 de diciembre al 30 de diciembre de 2024 no se presentaron ausentismo por parte de nuestros trabajadores |

### 4.1.2.6 Inspecciones

Se evidencio durante el periodo el uso de los EPP por parte del personal, pese a que dentro de la gestión documental está pendiente las actas de entrega de EPP firmadas por todo el personal.

El contratista cuenta con una bodega ubicada en la balastrera 1, la cual, se evidencia la implementación del punto de emergencia.

Así mismo, la instalación de señalización preventiva en el frente de obra, en el **anexo 4 – Formatos de inspecciones.**








CASE


CAMILLA DE EMERGENCIA
BOTIQUIN
EXTINTOR








### 4.1.3 CTO LP-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

El contratista finalizo actividades el 31 de mayo del 2025, el contratista presenta en correo del 16 de diciembre del 2025, paz y salvo y planilla de seguridad social, aun así, no se evidencia un informe que detalle el cierre de las actividades del SG-SST, un consolidado de todo el personal laborado y sus respectivo retiro, se presente un análisis de cómo son indicadores de accidentalidad de todo el periodo ejecutado adjuntando la certificación de la ARL que justifique que no se contó con accidente o enfermedades laborales, cumplimiento al cronograma de actividades del SG-SST con los soportes de las capacitaciones, consolidado de entrega de EPP e inducciones y notificaciones de riesgos.

No se evidencia el paz y salvo del siguiente personal:

- Agámez Andy
- Bejarano Harry
- Castillo Iván
- Urzola William

## 4.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

Se realizó seguimiento a las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta la normatividad del decreto 1072 de 2015 y 1443 de 2014 en cuanto a los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST.

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA en el SG-SST, como el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

**1. Planificar:** Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

**2. Hacer:** Implementación de las medidas planificadas.


**3.Verificar:** Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.


**4. Actuar:** Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes:

### 4.2.1 Política SG – SST

La interventoría Consorcio ingecon-inco, cuenta con las políticas al SG-SST, política de plan de emergencia y acoso laboral, las cuales, han sido socializadas en las inducciones y divulgadas en las oficinas ubicada en Planeta Rica, como se evidencia a continuación:

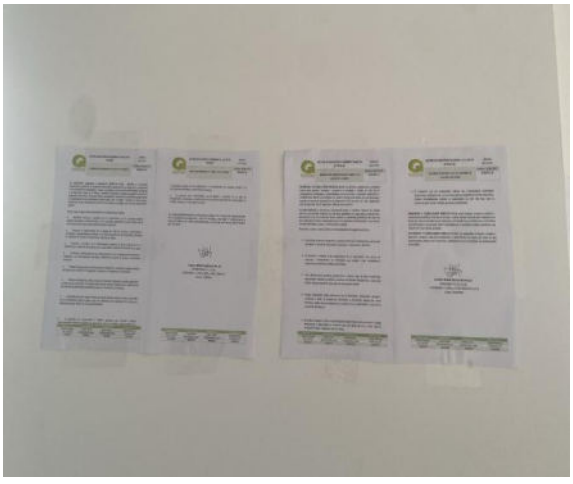

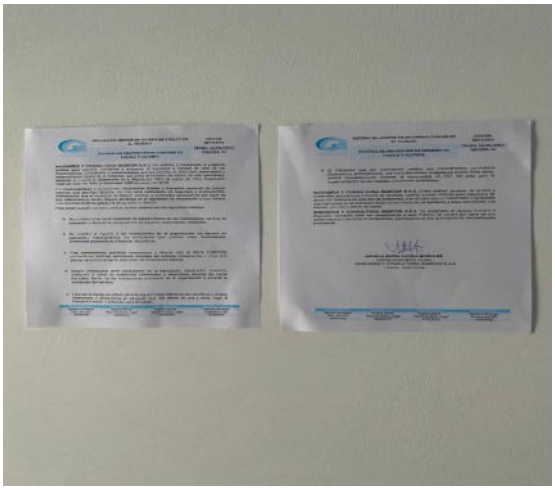

### 4.2.2 Estado de personal e ingresos

Para el periodo del presente informe la interventoría cuenta con el siguiente personal, el cual, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7:

| Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| ANGELA MARIA DAVILA MORALES | 42160437 | DIRECTOR INTERVENTORIA | $ 10.000.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 100% |
| VICENTE CARLOS URZOLA BADEL | 1103094267 | RESIDENTE INTERVENTORIA | $ 5.150.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 100% |
| GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA | 26035741 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 3.750.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 100% |
| JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS | 1023865222 | TECNICO ADMINISTRATIVO | $ 1.300.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 100% |
| ANGIE KATHERINE VERSOLATTO GONZALEZ | 1110547301 | SISO | $ 3.000.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 100% |

En el anexo 4, se presenta las planillas SS.

#### 4.2.2.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

La interventoría ha evaluado y dado prioridad a los factores de riesgo utilizando una matriz de riesgo, identificando las condiciones de riesgo asociadas a las actividades planificadas en cada área y etapa del proyecto. Además, se han establecido medidas de intervención específicas para mitigar cada riesgo identificado. Se remite en el anexo 5.

Por lo tanto, se vienen realizando las siguientes medidas:

- La interventoría desde el área SG-SST realizo las siguientes capacitaciones:
    - Primeros auxilios viales - Pasos para actuar ante un accidente de tránsito
    - Hábitos saludables, higiene del sueño, higiene postural y pausas activas

- **Seguimientos Pausas activas**. La interventoría realiza pausas activas diarias en horario de 10:30 am y 3:30 pm.





- **Implementación al plan de emergencias**

Las oficina ubicada en el municipio de Planeta Rica, cuenta con sus respectivos extintor, botiquín y camillas.



Oficina Planeta Rica



Oficina Planeta Rica

### 4.2.3 Vehículos.

La interventoría relaciona los siguientes vehículos y presenta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría.

| EQUIPOS Y VEHICULOS | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULO | RENAULT DUSTER GNS432 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MOTOCICLETA | MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LRS 75G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

Se presenta los preoperacionales en el anexo 6.

### 4.2.4 Indicadores al SG-SST

En cumplimiento a lo establecido en la resolución 0312 del 2019, la interventoría viene realizando la medición de los indicadores de frecuencia, los cuales, se presentan en el anexo 7.

## 5 CONCLUSIONES

Para el contrato LP-006 de 2023 del municipio de Los Córdobas, se evidenció la finalización de las actividades el 31 de mayo de 2025, así como la presentación de las planillas de seguridad social y los respectivos paz y salvo, sin observarse novedades relevantes pendientes en materia de seguridad y salud en el trabajo para el cierre contractual.

En el contrato 159 de 2023 del municipio de Planeta Rica, se constató la continuidad de las actividades de obra, incluyendo la instalación de señalización preventiva, control de tráfico, acopio de materiales. En materia de SG-SST, el contratista cuenta con políticas de seguridad y salud en el trabajo debidamente socializadas, un programa de capacitaciones ejecutado durante el mes de diciembre de 2025 y registros de personal activo y retirado. Así mismo, se evidenció el uso de elementos de protección personal, la implementación de señalización preventiva y la existencia de un punto de emergencia en la bodega de obra.

Finalmente, para el contrato LP-008 de 2023 del municipio de San Bernardo del Viento, si bien el contratista presentó paz y salvo y planillas de seguridad social, no se evidencia un informe integral de cierre del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya el consolidado del personal vinculado y retirado, el análisis de los indicadores de accidentalidad de todo el periodo contractual, la

certificación de la ARL que respalde la inexistencia de accidentes o enfermedades laborales, el cumplimiento del cronograma de actividades del SG-SST con sus respectivos soportes, ni el consolidado de entrega de EPP, inducciones y notificaciones de riesgos. Adicionalmente, se encuentra pendiente la presentación del paz y salvo del personal relacionado, lo cual constituye un requisito indispensable para el cierre administrativo y técnico del contrato.

## ANEXO 1. PLANILLA SS PLANETA RICA

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901764629 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CL 67 -5-40 | TELÉFONO: | 7615894 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **6002531100** | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | enero | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/01/07 | | | | | |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 683.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 683.400 | $ 0 | $ 683.400 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 372.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 372.100 | $ 0 | $ 372.100 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 1.975.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.975.400 | $ 0 | $ 1.975.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.258.700** | **$ 0** | **$ 3.258.700** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 154.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 154.300 | $ 0 | $ 0 | $ 154.300 |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 937.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 937.400 | $ 0 | $ 0 | $ 937.400 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 290.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 290.700 | $ 0 | $ 0 | $ 290.700 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 735.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 735.700 | $ 0 | $ 0 | $ 735.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.546.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.546.100** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 16 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.417.800 | $ 1.417.800 | $ 0 | $ 0 | $ 1.417.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.417.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.417.800** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 16 | $ 815.300 | $ 0 | $ 815.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 815.300** | **$ 0** | **$ 815.300** |

## TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16 | $ 612.100 | $ 0 | $ 612.100 |
| PASENA | PASENA - SENA | 11 | $ 290.000 | $ 0 | $ 290.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 902.100** | **$ 0** | **$ 902.100** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1003190690 | LAMBRANO ESTRADA MELISSA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1006575053 | BEDOYA QUINTERO CARELIS ALEJANDRA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1038100533 | SARMIENTO ESPEJO JOSE ANTONIO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1064190392 | BRAVO ARROYO EUFRAY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 19 | $ 901.550 | $ 144.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.300 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 19 | $ 901.550 | $ 112.700 | $ 0 | $ 112.700 | 14-11 - ARL SURA | 19 | $ 901.550 | 5612002 | $ 62.800 | 19 | $ 901.550 | CCF16-COMFACOR | $ 36.100 | $ 18.100 | $ 27.100 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1066720747 | SIERRA MORENO JESUS ALBERTO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC24-COOSALUD ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1066721585 | ORTEGA MARTINEZ MIGUEL DARIO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 19 | $ 901.550 | $ 144.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.300 | EPS037-NUEVA EPS | 19 | $ 901.550 | $ 112.700 | $ 0 | $ 112.700 | 14-11 - ARL SURA | 19 | $ 901.550 | 5612002 | $ 62.800 | 19 | $ 901.550 | CCF16-COMFACOR | $ 36.100 | $ 18.100 | $ 27.100 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1066723995 | GOES CUELLO JOSE CARLOS | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 19 | $ 901.550 | $ 144.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.300 | NUEVA EPS CM | 19 | $ 901.550 | $ 112.700 | $ 0 | $ 112.700 | 14-11 - ARL SURA | 19 | $ 901.550 | 5612002 | $ 62.800 | 19 | $ 901.550 | CCF16-COMFACOR | $ 36.100 | $ 0 | $ 27.100 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 1066746105 | HOYOS HERNANDEZ EDUARDO SEGUNDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 26 | $ 1.233.700 | $ 197.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 197.400 | EPS037-NUEVA EPS | 26 | $ 1.233.700 | $ 154.300 | $ 0 | $ 154.300 | 14-11 - ARL SURA | 26 | $ 1.233.700 | 5612002 | $ 85.900 | 26 | $ 1.233.700 | CCF16-COMFACOR | $ 49.400 | $ 24.700 | $ 37.100 | $ 0 | $ 0 |

Planilla de Pago



**Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901764629 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CL 67 -5-40 | TELÉFONO: | 7615894 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6002531100** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | enero | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/01/07 | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | TOTAL APORTE | | | | |
| 9 | CC 1066746321 | ALVAREZ ACUNA DANIELA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 26 | $ 1.233.700 | $ 197.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 197.400 | EPS002-SALUD TOTAL | 26 | $ 1.233.700 | $ 154.300 | $ 0 | $ 154.300 | 14-11 - ARL SURA | 26 | $ 1.233.700 | 5612002 | $ 85.900 | 26 | $ 1.233.700 | CCF16-COMFACOR | $ 49.400 | $ 0 | $ 37.100 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1066748940 | TANO HOYOS MARIA CAMILA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1066750679 | CARRASCAL OCHOA ANGIE DANIELA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1067292005 | PADILLA MARTINEZ BRAYAN ALFONSO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 19 | $ 901.550 | $ 144.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.300 | EPS037-NUEVA EPS | 19 | $ 901.550 | $ 112.700 | $ 0 | $ 112.700 | 14-11 - ARL SURA | 19 | $ 901.550 | 5612002 | $ 62.800 | 19 | $ 901.550 | CCF16-COMFACOR | $ 36.100 | $ 18.100 | $ 27.100 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1067885979 | HERNANDEZ GOMEZ JORGE LUIS | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 19 | $ 901.550 | $ 144.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.300 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 19 | $ 901.550 | $ 112.700 | $ 0 | $ 112.700 | 14-11 - ARL SURA | 19 | $ 901.550 | | $ 62.800 | 19 | $ 901.550 | CCF16-COMFACOR | $ 36.100 | $ 0 | $ 27.100 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1138076010 | ACOSTA GONZALEZ ESTEFANIA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 15677277 | RUIZ HOYOS JOSE RICARDO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 5612002 | $ 139.200 | 30 | $ 2.000.000 | CCF16-COMFACOR | $ 80.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 15679922 | TRUJILLO SAENZ ROBERT EMIRO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 8.940.000** |

Planilla NO Pagada

## ANEXO 2. CAPACITACIONES AMBIENTAL -SST

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | X | CAPACITACION: | | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| CIUDAD Y FECHA: | Balastrera 2. | | 3-12-25. | | |
| DURACION: | 15 min. | | | | |
| TEMA: | Importancia del uso de las Epp. | | | | |
| EXPOSITOR: | Ange Carrascal | | | | |
| TOTAL ASISTENCIA: | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | | CAPACITACION: | X | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| CIUDAD Y FECHA: | Balastrera L. 15-12-25. | | | | |
| DURACION: | 20 min. | | | | |
| TEMA: | Peligros en la Conduccion | | | | |
| EXPOSITOR: | Angel Carrascal | | | | |
| TOTAL ASISTENCIA: | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | X | CAPACITACION: | | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| CIUDAD Y FECHA: | Bulevar Sur 16-12-25. | | | | |
| DURACION: | 20 min. | | | | |
| TEMA: | Proteccion ocular Cuidado de la vista. | | | | |
| EXPOSITOR: | Angie Carvajal | | | | |
| TOTAL ASISTENCIA: | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | | CAPACITACION: | X | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | Balastrera b. | | 10 - 12 - 23. | | |
| **DURACION:** | 15 min. | | | | |
| **TEMA:** | Ergonomia. | | | | |
| **EXPOSITOR:** | Angie Carrascal | | | | |
| **TOTAL ASISTENCIA:** | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | X | CAPACITACION: | | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| *CIUDAD Y FECHA:* | Balastrera 2. 22-12-23. | | | | |
| *DURACION:* | 20 min. | | | | |
| *TEMA:* | Que son las paradas de emergencia. | | | | |
| *EXPOSITOR:* | Auga Carrascal | | | | |
| *TOTAL ASISTENCIA:* | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | JOSE SARMIENTO |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | Maria Camila Tano Hoyos |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | Estefania Acosta |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | Eduardo Hoyos |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | ROBERT TRUJILLO |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | Jesus Sierra |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | Carlis Bedoya. |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | Daniela Alvarez |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | Melissa Lambraño E. |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | Miguel Ortega |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | JOSE CARLOS GOEZ |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | BRAYAN PADILLA |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | | CAPACITACION: | X | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| CIUDAD Y FECHA: | Bylastrera 2. | | 26-12-23 | | |
| DURACION: | 20 min | | | | |
| TEMA: | Que es la gestion de accidente. | | | | |
| EXPOSITOR: | Angie Carrascal | | | | |
| TOTAL ASISTENCIA: | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | Maria Camila Tano Hoyos |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | Estefania Acosta |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | Eduardo Hoyos |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | ROBERT TRUJILLO |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | Jesus Sierra |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | Melissa Lambraño E. |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | JOSE CARLOS GOEZ |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | BRAYAN PADILLA |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:901.764.629-9 | REGISTRO DE AISITENCIA A CAPACITACION Y FORMACION | Codigo: SAF-FOR-004 |
|---|---|---|
| | | Fecha: May-2023 |
| | | Version: 3.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLA: | X | CAPACITACION: | | REUNION: | |
| INDUCCION: | | REINDUCCION: | | OTROS: | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | Barrastrera 2. | | 29-12-25. | | |
| **DURACION:** | 15 min. | | | | |
| **TEMA:** | Riesgo electrico | | | | |
| **EXPOSITOR:** | Angie Carrascal | | | | |
| **TOTAL ASISTENCIA:** | 15. | | | | |

1. Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2. Se encuentra en buenas condiciones de salud, no presente síntomas asociadas a Covid-19 (tos, secreciones nasales, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar)
3. Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentar síntomas asociados a covid-19
4. Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a Covid -19.
5. Manifiesta que la empresa a realizado la toma de temperatura con el fin de hacer seguimiento al estado de salud.
6. Manifestar si presenta alguna sintomatología asociada a COVID 19 si presenta indíquelas en las observaciones

| No | NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SARMIENTO ESPEJO | 1.038.100.533 | OP.RETROEXCAVADORA | Jose Sarmiento |
| 2 | JOSE RICARDO RUIZ | 15.677.277 | DIR.OBRA | |
| 3 | MARIA CAMILA TANO | 1.066.748.940 | PROF.SOCIAL | Maria Camila Tano Hoyos |
| 4 | ESTEFANIA ACOSTA GONZALES | 1.138.076.010 | AUX SST | Estefania Acosta |
| 5 | EDUARDO HOYOS HERNANDEZ | 1.066.746.105 | OBRERO | Eduardo Hoyos |
| 6 | ROBERT EMIRO TRUJILLO SAEZ | 15.679.922 | OBRERO | ROBERT TRUJILLO |
| 7 | JESÚS ALBERTO SIERRA MORENO | 1.066.720.747 | AYUDANTE | Jesus Sierra |
| 8 | CARELIS BEDOYA QUINTERO | 1.006.575.053 | ING ADMINISTRATIVA | Carelis Bedoya Q. |
| 9 | DANIELA ALVAREZ ACUÑA | 1.066.746.321 | RESIDENTE OBRA | Daniela Alv |
| 10 | EUFRAY BRAVO | 1.064.190.392 | AYUDANTE | Eufray |
| 11 | MELISSA LAMBRAÑO | 1.003.190.690 | RESIDENTE OBRA | Melissa Lambraño E. |
| 12 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 1.067.885.979 | OFICIAL | Jorge Hernandez |
| 13 | MIGUEL DARIO ORTEGA MARTINEZ | 1.066.721.585 | AYUDANTE | Miguel Ortega |
| 14 | JOSE CARLOS GOEZ CUELLO | 1.066.723.995 | AYUDANTE | Jose Carlos Goez |
| 15 | BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTINEZ | 1.067.292.005 | AYUDANTE | Brayan Padilla |

FIRMA EXPOSITOR

Scanned with CamScanner

## ANEXO 3 - PREOPERACIONALES PLANETA RICA

| CONSORCIO PROVIDENCIA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA | | | |
| | VIGENCIA | VERSION | CODIGO<br>SAF-FOR-117 | CONSECUTIVO |

**DEPENDENCIA:**

**INSPECCIONADO POR:** Angie Camacal **EQUIPO No.** 580N Case.

**LOCALIZACION:** Balastiera 2.

| ITEM | CANT. | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUCES** | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Frontales | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| traseras de trabajo (reflector) | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Direccionales delanteras de parqueo (Giro) | 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Direccionales traseras de parqueo (Giro) | 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| De Stop y señal trasera | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alarma de retroceso | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Pito | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Freno de servicio | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Freno de emergencia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/suspensión (Terminales) | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cinturón de seguridad | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extintor de incendios (10 lbs) PQS | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Asiento en buena condición | 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Indicadores (hidráulico-voltimetro) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor-refrigerante-orometro, aire) | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Escaleras y pasamanos (cabina/trompo) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bateria y cables | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLANTAS** | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Sn cortaduras progundas y sin abultamientos | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Pasadores, suspensión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control fugas de aire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brazos de levante hidraulicos | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Grapas y anclaje de chasis | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Descarga (gato, pivote, pasadores) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje de Toma de fuerza | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | NA | | N.A | | | |
| Manguera de agua y de alta presión | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | (A.A | | N.A | | | |
| Vo.Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL |
| **HOROMETRO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTANBAI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fuera de servicio: si** | **no** X | **Fecha de Corrección:** | | | | | **Resp. Corrección:** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REVISÓ:** | | **NOMBRE/APELLIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | JOSE SORIANO | | | | | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA | | | |
| | VIGENCIA | VERSION | CODIGO<br>SAF-FOR-117 | CONSECUTIVO |

**DEPENDENCIA:**

**INSPECCIONADO POR:** ANGIE Gamboa — **EQUIPO No.** 580N CASE

**LOCALIZACION:** Bolastrera 2

| ITEM | CANT. | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUCES** | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Frontales | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| traseras de trabajo (reflector) | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Direccionales delanteras de parqueo (Giro) | 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Direccionales traseras de parqueo (Giro) | 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| De Stop y señal trasera | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alarma de retroceso | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Pito | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Freno de servicio | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Freno de emergencia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/suspensión (Terminales) | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cinturón de seguridad | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extintor de incendios (10 lbs) PQS | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Asiento en buena condición | 6 | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores (hidráulico-voltimetro) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor-refrigerante-orometro, aire) | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Escaleras y pasamanos (cabina/trompo) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bateria y cables | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sn cortaduras progundas y sin abultamientos | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasadores, suspensión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control fugas de aire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brazos de levante hidraulicos | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Grapas y anclaje de chasis | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Descarga (gato, pivote, pasadores) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje de Toma de fuerza | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | | |
| Manguera de agua y de alta presión | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | | |
| Vo.Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL |
| **HOROMETRO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTANBAI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fuera de servicio:** si no X | **Fecha de Corrección:** | | | | | **Resp. Corrección:** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REVISÒ:** | | **NOMBRE/APELLIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | JOF Solucionado. | | | | | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO PROVIDENCIA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA | | | |
| | VIGENCIA | VERSION | CODIGO<br>SAF-FOR-117 | CONSECUTIVO |

DEPENDENCIA:
INSPECCIONADO POR: Angie Carrascal — EQUIPO No. 580N CASE
LOCALIZACION: Bolastico 2

| ITEM | CANT. | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| **LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frontales | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| traseras de trabajo (reflector) | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Direccionales delanteras de parqueo (Giro) | 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Direccionales traseras de parqueo (Giro) | 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| De Stop y señal trasera | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| Alarma de retroceso | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Pito | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Freno de servicio | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Freno de emergencia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/suspensión (Terminales) | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cinturón de seguridad | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extintor de incendios (10 lbs) PQS | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Asiento en buena condición | 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Indicadores (hidráulico-voltimetro) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor-refrigerante-orometro, aire) | 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Escaleras y pasamanos (cabina/trompo) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bateria y cables | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sn cortaduras progundas y sin abultamientos | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasadores, suspensión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control fugas de aire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brazos de levante hidraulicos | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Grapas y anclaje de chasis | 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Descarga (gato, pivote, pasadores) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje de Toma de fuerza | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | | |
| Manguera de agua y de alta presión | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | N.A | | | |
| Vo.Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL | INC | FNL |
| **HOROMETRO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTANBAI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fuera de servicio:** si no X | **Fecha de Corrección:** | | | | | **Resp. Corrección:** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REVISÒ:** | | **NOMBRE/APELLIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | Jose Ormeño G. | | | | | | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

## ANEXO 4 - INSPECCIONES DE OBRA

| CONSORCIO PROVIDENCIA NIT:9° 1.764.629-9 | INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO y CONDICIONES DESEGURIDAD EN OBRA | Código: SAF-FOR-101 |
|---|---|---|
| | | Fecha: ENE 2024 |
| | | Versión: 02 |

| FECHA: | 10-12-25. | LUGAR: | Balustrera 2. |
|---|---|---|---|
| CONTRATO: | Consorcio providencia | RESPONSABLE: | Angie Carrascal |

Marque con una X corresponda

| Gestión de la Obra | SI | NO | N.A. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra a disposición dentro de la obra. | X | | | |
| Se realizan llamados de atención, y se encuentra registro dentro de la obra | X | | | |
| Se cuenta con jefe de seguridad e inspectores dentro de la obra. | X | | | |
| Existe registros de que se ha impartido formación o capacitación a los trabajadores. | X | | | |
| **Instalaciones de Bienestar de los Trabajadores** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Se dispone de vestidor para los trabajadores adecuado y separado por sexo. | | | X | |
| Se dispone de sitios de aseos adecuados y suficientes para los trabajadores. | | | X | |
| Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza y orden. | | | X | |
| Se dispone de casino adecuado para los trabajadores. | | | X | |
| **Señalización de Obra** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Existe señalización de entrada a la obra. | X | | | |
| Existe señalización de obligatorio uso de EPP | X | | | |
| Existe señalización de prohibido fumar. | X | | | |
| Existe señalización de los equipos de primeros auxilios. | X | | | |
| Existe señalización de los equipos contra incendios. | X | | | |
| En caso de presencia de Lineas de Alta Tensión, existe señalización. | X | | | |
| Existe señalización de advertencia por presencia de camiones, grúas ..etc. | X | | | |
| Existe separación de las zonas de paso de vehiculos y peatones. | | | X | |
| **Equipos de Emergencia** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Existen suficientes extintores en la obra. | X | | | |
| Los extintores son adecuados al riesgo a proteger. | X | | | |
| Existe botiquín en la obra. | X | | | |
| El botiquín está equipado de forma adecuada. | X | | | |
| Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible. | X | | | |
| **Acopios** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Los acopios de material tienen zona reservada y demarcada. | | X | | |
| Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamientos. | | X | | |
| Los acopios de material pesado no se apilan en alturas. | | | X | |
| Los acopios no obstaculizan el paso de vehiculos o personas. | X | | | |
| **Trabajos en Altura (Mas de 1.50mts)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura. | | | X | |
| Plataformas, andamios y pasarelas protegidas por barandillas >= 90 cm. | | | X | |
| Trabajos en altura realizados con redes de seguridad. | | | X | |
| Trabajos en altura utilizan arnés de seguridad. | | | X | |
| Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas. | | | X | |
| Pasarelas tienen un ancho >= 60 cm y barandillas. | | | X | |
| **Instalación Eléctrica Provisional de Obra** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra. | | | X | |
| Las conexiones eléctricas están protegidas de la lluvia y daños por terceros | | | X | |
| El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro. | | | X | |
| Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada. | | | X | |
| Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro. Y conexiones con clavijas en todas las tomas | | | X | |
| Las zonas en tensión del cuadro eléctrico están protegidas contra contactos eléctricos directos. | | | X | |
| La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general. | | | X | |
| **Equipos en general** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Escaleras de mano en buen estado, con zapatas antideslizantes. | | | X | |
| trompo de mezcla dispone de polo a tierra. | X | | | |
| Trompo de mezcla dispone de protecciones en los órganos de transmisión. | X | | | |
| Pequeñas herramientas eléctricas disponen de doble aislamiento. | X | | | |
| Las pequeñas herramientas eléctricas son adecuadas para el uso que se les da. | X | | | |
| Herramientas manuales en buen estado. | X | | | |

Scanned with CamScanner

## SEGURIDAD EN OBRA

Fecha: ENE 2024

| Equipos de Protección Individual | SI | NO | N.A. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza. | X | | | |
| En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad. | X | | | |
| El personal emplea calzado de seguridad. | X | | | |
| El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad. | X | | | |
| El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva. | X | | | |
| El personal con riesgo de caída en altura emplea arnes de seguridad. | | | X | |
| El personal de manipulación de cargas emplea protección lumbar. | | | X | |
| **Orden y Limpieza** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **OBSERVACIONES** |
| Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares. | X | | | |
| Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos. | X | | | |
| Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas. | X | | | |
| Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos. | X | | | |
| Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos. | X | | | |
| Otros | SI | NO | N.A. | OBSERVACIONES |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**NOMBRE Y FIRMA DEL OBSERVADOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SST | Angie Carrascal | 7066730679 | |

Scanned with CamScanner

## ANEXO 5 - PLANILLAS SS INTERVENTORIA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901783007 | 9 | CONSORCIO INGECON - INCO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 148 7G 42 BARRIO CEDRO GOLF | MONTERIA-CORDOBA | 4672384 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2026-01 | 2037790328 | 9496972239 | E | 2026/01/05 | 2025/12/26 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,666,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1010035275 | CAICEDO HERNANDEZ CRISTHIAN ALBERTO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 5 | $366,667 | $44,100 | EPS002 | 5 | $366,667 | $0 | CCF16 | 5 | $366,667 | $0 | 14-7 | 5 | $366,667 | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $44,100 |
| 2 | CC | 1010035275 | CAICEDO HERNANDEZ CRISTHIAN ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 25 | $1,833,334 | $293,400 | EPS002 | 25 | $1,833,334 | $73,400 | CCF16 | 25 | $1,833,334 | $73,400 | 14-7 | 25 | $1,833,334 | $127,700 | 25 | $0 | $0 | Si | $567,900 |
| 3 | CC | 26035741 | GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 4 | $500,000 | $60,000 | EPS037 | 4 | $500,000 | $0 | CCF16 | 4 | $500,000 | $0 | 14-7 | 4 | $500,000 | $0 | 4 | $0 | $0 | Si | $60,000 |
| 4 | CC | 26035741 | GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 26 | $3,250,000 | $520,000 | EPS037 | 26 | $3,250,000 | $130,000 | CCF16 | 26 | $3,250,000 | $130,000 | 14-7 | 26 | $3,250,000 | $226,200 | 26 | $0 | $0 | Si | $1,006,200 |
| 5 | CC | 1005663357 | JIMENEZ URZOLA JULIO ALEJANDRO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 5 | $333,334 | $40,100 | EPS002 | 5 | $333,334 | $0 | CCF16 | 5 | $333,334 | $0 | 14-7 | 5 | $333,334 | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $40,100 |
| 6 | CC | 1005663357 | JIMENEZ URZOLA JULIO ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 25 | $1,666,667 | $266,700 | EPS002 | 25 | $1,666,667 | $66,700 | CCF16 | 25 | $1,666,667 | $66,700 | 14-7 | 25 | $1,666,667 | $116,100 | 25 | $0 | $0 | Si | $516,200 |
| 7 | CC | 1103094267 | URZOLA BADEL VICENTE CARLOS | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 5 | $858,334 | $103,100 | EPS002 | 5 | $858,334 | $0 | CCF16 | 5 | $858,334 | $0 | 14-7 | 5 | $858,334 | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $103,100 |
| 8 | CC | 1103094267 | URZOLA BADEL VICENTE CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 25 | $4,291,667 | $686,700 | EPS002 | 25 | $4,291,667 | $171,700 | CCF16 | 25 | $4,291,667 | $171,700 | 14-7 | 25 | $4,291,667 | $298,800 | 25 | $0 | $0 | Si | $1,328,900 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,100,003 | $2,014,100 | | | $13,100,003 | $441,800 | | | $13,100,003 | $441,800 | | | $13,100,003 | $768,800 | | $0 | $0 | | $3,666,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901783007 | 9 | CONSORCIO INGECON - INCO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 148 7G 42 BARRIO CEDRO GOLF | MONTERIA-CORDOBA | 4672384 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2026-01 | 2037790328 | 9496972239 | E | 2026/01/05 | 2025/12/26 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,666,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $2,014,100 | $0 | $0 | $2,014,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $580,000 | $0 | $0 | $580,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $789,800 | $0 | $0 | $789,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $644,300 | $0 | $0 | $644,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $768,800 | $0 | $0 | $768,800 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 4 | $768,800 | $0 | $0 | $768,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $441,800 | $0 | $0 | $441,800 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 4 | $441,800 | $0 | $0 | $441,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $441,800 | $0 | $0 | $441,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $130,000 | $0 | $0 | $130,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $311,800 | $0 | $0 | $311,800 |
| **TOTAL** | | | | **4** | **$3,666,500** | **$0** | **$0** | **$3,666,500** |

# Certificado de Aportes

Se certifica que ANGELA MARIA DAVILA MORALES identificado(a) con CC 42160437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2025-12 | 2026-01 | 2046770548 | 9496993438 | E | 2025-12-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $10,000,000 | $1,600,000 |
| AFP | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $10,000,000 | $50,000 |
| AFP | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 30 | | $10,000,000 | $50,000 |
| ARL | SEGUROS BOLIVAR | 30 | 6.96% | $10,000,000 | $696,000 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4% | $10,000,000 | $400,000 |
| EPS | SANITAS | 30 | 4% | $10,000,000 | $400,000 |

Este certificado se expide el día 2026-01-20 a las 06:31.

# Certificado de Aportes

Se certifica que JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS identificado(a) con CC 1023865222 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2025-12 | 2026-01 | 2046770548 | 9496993438 | E | 2025-12-30 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 25 | 16% | $1,186,250 | $189,800 |
| AFP | PORVENIR | 5 | 16% | $237,250 | $38,000 |
| ARL | SEGUROS BOLIVAR | 25 | 0.522% | $1,186,250 | $6,200 |
| ARL | SEGUROS BOLIVAR | 5 | 0% | $237,250 | $0 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 25 | 4% | $1,186,250 | $47,500 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 5 | 4% | $237,250 | $9,500 |
| EPS | SANITAS | 25 | 4% | $1,186,250 | $47,500 |
| EPS | SANITAS | 5 | 4% | $237,250 | $9,500 |

Este certificado se expide el día 2026-01-20 a las 06:34.

# Certificado de Aportes

Se certifica que JAIRO FERNANDO ESPINEL MEDELLIN identificado(a) con CC 19065078 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2025-12 | 2026-01 | 2046770548 | 9496993438 | E | 2025-12-30 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| ARL | SEGUROS BOLIVAR | 14 | 0.522% | $1,067,267 | $5,600 |
| ARL | SEGUROS BOLIVAR | 16 | 0% | $1,219,734 | $0 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 14 | 4% | $1,067,267 | $42,700 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 16 | 4% | $1,219,734 | $48,800 |
| EPS | SANITAS | 14 | 4% | $1,067,267 | $42,700 |
| EPS | SANITAS | 16 | 4% | $1,219,734 | $48,800 |

Este certificado se expide el día 2026-01-20 a las 06:36.

## 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Teniendo claro que los contratistas de obras tienen una relación directa con los municipios y que, por consiguiente, según sus contratos, no están obligados a realizar cobros mensuales, y se basan en los avances de obra, por lo tanto, no se presentan actas de cobro mensuales por avance de obra, continuación, se presenta en el siguiente cuadro los precios contractuales.

| CONTRATO DE OBRA | VALOR BASICO | VALOR TOTAL | % AVANCE | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| 159-2023 PLANETA RICA | $ 13.747.073.285,00 | $ 14.100.000.000,00 | 91.40% | $ 12.565.469.848,0 |
| LP-006-2023 LOS CÓRDOBA | $ 5.873.079.611,00 | $ 6.140.057.707,00 | 100% | $ 5.873.079.611,00 |
| LP-MSBV-008-2023 SAN BERNARDO DEL VIENTO | $ 2.008.640.979,00 | $ 2.115.723.321,00 | 100% | $ 2.008.640.979,00 |
| **TOTALES OBRA:** | | **$ 22.355.781.028,00** | | |
| **TOTALES INTERVENTORIA:** | | **$ 2.334.000.000,00** | | |

## 5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A corte del presente informe se presentó un riesgo financiero que pudo afectar la ejecución del contrato de Interventoria para el acompañamiento en la ejecución de los contratos de obra. En cumplimiento con lo estipulado dentro del Manual de Interventoría 2022, se incluye la matriz de riesgos y oportunidades correspondiente al contrato de Interventoría.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | INVIAS | PROPONENTE Y/O INTERVENTOR |
| 1 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | **Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial** en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR | Impacto económico al Interventor | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X |
| 2 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra,** de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto económico al Interventor | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | | X |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor**. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | X |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR,** de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Demora en la ejecución de las obras del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA,** la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA**, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. **Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado**. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | | **X** |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo por la la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra** ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | **X** |
| 8 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimimiento a la señalización** preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | **X** |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra** que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | | **X** |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra**. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | | **X** |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor**, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | **X** |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional - Económico | **Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual**, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados, | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | **X** |
| 13 | Especifico | Interno | Planeación - Selección | Económico | **Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría**. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un proceso independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría. | Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | **X** | **X** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | **Expedición y/o modificación de normas**: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | x | |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Ambiental - Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales,** autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | x |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | **Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | | x |
| 17 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | **Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | | x |
| 18 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras. | Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | x | x |
| 19 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de Corrupción | **Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | x | x |

| CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|
| RARO | 1 |
| IMPROBABLE | 2 |
| POSIBLE | 3 |
| PROBABLE | 4 |
| CASI CIERTO | 5 |

**IMPACTO DEL RIESGO**

| CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTROFICO | 5 |

| TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| Implementacion de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. | Mensual |
| Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos. | Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra. |
| Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios |
| Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el Interventor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el plazo estipulado. Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de preconstrucción (Estudios), para verificar entregas parciales y entrega total de los estudios. Requerimientos escritos al Interventor. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios |
| Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | Al final de la ejecución del contrato. | la Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejcución de las obras con respecto a los diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor, Supervisores y/o Gestores | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. | Permanente en la ejecución de la obra. |
| Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. | La correspondiente a la medición de cada tipo de obra. |
| El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario |
| El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente | Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario. |
| El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor, Supervisores y/o Gestores | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión. | Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor |
| Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente. | Permanente en la ejecución de la obra. |
| Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual. |
| Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Personal de la Entidad de la Planeación, Estructuración, procesos de Selección, Evaluación y Adjudicación | Al inicio de la etapa de planeación | A la terminación de la etapa de selección | Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría. | Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual |
| Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | Permanente |
| La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciónes 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal |
| El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario |
| Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |
| Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Cominidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al INVIAS. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios INVIAS | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | permanente |

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO |
| 6, 7 | RIEGO ALTO |
| 5 | RIESGO MEDIO |
| 2, 3, 4 | RIESGO BAJO |
| 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE |

| CATEGORIA DEL RIESGO | |
|---|---|
| TIPO | CONVENCION |
| GENERAL | G |
| ESPECIFICO | E |

## 5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para el presente informe de interventoría del mes de diciembre de 2025 se han cargado al sistema del aplicativo CIFRA los informes semanales de los contratos de obra de los contratistas Consorcio Providencia – Contrato de obra No. 159-2023 Municipio de Planeta Rica, Consorcio Pavimento Vía Barranquillita – Contrato de obra No. Lp-006-2023 Municipio de los Córdoba y Consorcio L&S – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023 Municipio de San Bernardo del Viento.

# 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## 6.1 Equipo y vehiculos contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DEL 2025

**PROYECTO:** COLOMBIA RURAL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5053-2023

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INGECON-INCO

**CONTRATO DE OBRA No.** 0159-2023 LP-006-2023 LP-MSBV-008-2023

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA; CONSORCIO PAVIMENTOS BARRANQUILLITA; CONSORCIO L&S

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHÍCULO | RENAULT DUSTER JNS432 | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MOTOCICLETA | MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LRS 75G | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MOTOCICLETA | MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LQY 88F | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ANGELA MARÍA DAVILA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202153798CLD

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 31/12/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053 DE 2023
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** .DICIEMBRE 2025
**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

**CONTRATO DE OBRA No.:** 159-2023 (2286-2023)
LP-006-2023 (2217-2023)
LP-MSBV-008-2023 (2222-2023)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA - MUNICIPIO PLANETA RICA
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA - MUNICIPIO LOS CORDOBA
CONSORCIO L&S - MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

**NOMBRE ARL:** SEGUROS BOLIVAR
**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

**Días del Mes**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | % Dedicación en el mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA MARIA DAVILA MORALES | 42160437 | DIRECTOR INTERVENTORIA | $ 10.000.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 58% |
| 2 | VICENTE CARLOS URZOLA BADEL | 1103094267 | RESIDENTE INTERVENTORIA | $ 5.150.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 80% |
| 3 | GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA | 26035741 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 3.750.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 80% |
| 4 | JAIRO FERNANDO ESPINEL MEDELLIN | 19065078 | CONDUCTOR | $ 2.287.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 80% |
| 5 | JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS | 1023865222 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | $ 1.423.500 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 80% |
| 6 | CAICEDO HERNANDEZ CRISTHIAN ALBERTO | 1010035275 | INSPECTOR SISO | $ 2.200.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 80% |
| 7 | JIMENEZ URZOLA JULIO ALEJANDRO | 1005663357 | INSPECTOR | $ 2.000.000 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 80% |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 26.810.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**1. SEGURIDAD SOCIAL** / **PARAFISCALES**

| No. | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 10.000.000 | $ 696.000 | V | SANITAS | 9496993438 | $ 400.000 | PROTECCIÓN | 9496993438 | $ 1.600.000 | $ 400.000 | N.A | N.A | |
| 2 | | $ 4.291.667 | $ 298.800 | V | SALUDTOTAL | 9496972239 | $ 171.700 | COLPENSIONES | 9496972239 | $ 686.700 | $ 171.700 | N.A | N.A | |
| 3 | | $ 3.250.000 | $ 226.200 | V | NUEVA EPS | 9496972239 | $ 130.000 | COLFONDOS | 9496972239 | $ 520.000 | $ 130.000 | N.A | N.A | |
| 4 | | $ 1.067.267 | $ 5.600 | V | SANITAS | 9496993438 | $ 42.700 | PORVENIR | 9496993438 | $ - | $ 42.700 | N.A | N.A | |
| 5 | | $ 1.186.250 | $ 6.200 | I | SANITAS | 9496993438 | $ 47.500 | PORVENIR | 9496993438 | $ 189.800 | $ 47.500 | N.A | N.A | |
| 6 | | $ 1.833.334 | $ 127.700 | V | SALUDTOTAL | 9496972239 | $ 73.400 | PORVENIR | 9496972239 | $ 293.400 | $ 73.400 | N.A | N.A | |
| 7 | | $ 1.666.667 | $ 116.100 | V | SALUDTOTAL | 9496972239 | $ 66.700 | PORVENIR | 9496972239 | $ 266.700 | $ 66.700 | N.A | N.A | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/12/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

**CONTRATO DE OBRA No:** 159-2023 (2286-2023)<br>I.P-006-2023 (2217-2023)<br>I.P-MSRV-008-2023 (2222-2023) **CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA - MUNICIPIO PLANETA RICA<br>CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA - MUNICIPIO LOS CORDOBA<br>CONSORCIO L&S - MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1433723 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 11 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 142.600.000,00 | $ 142.600.000,00 |
| 2023 | 1433723 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 570.400.000,00 | $ 570.400.000,00 |
| 2023 | 1433723 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | 11 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 1.204.800.000,00 | $ 1.204.800.000,00 |
| 2023 | 1433723 | C-2402-0600-13-0-2402112-02 | 11 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 301.200.000,00 | $ 301.200.000,00 |
| 2024 | 1248724 | C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 | 10 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 1.119.582.395,00 | $ 1.119.582.395,00 |
| | | | TOTAL | | | **$ 2.219.000.000,00** | **$ 2.219.000.000,00** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 2.219.000.000,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 2023 y desde 1 a 29 de Feb/2024 | $ 26.147.000,00 | $ 4.967.930,00 | $ 31.114.930,00 | $ - | $ 31.114.930,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 111.485.070,00 | $ 2.187.885.070,00 | 5/03/2024 | |
| 2 | Desde 1 a 31 de Marzo de 2024 | $ 38.790.580,00 | $ 7.370.210,00 | $ 46.160.790,00 | $ - | $ 46.160.790,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 65.324.280,00 | $ 2.141.724.280,00 | 5/04/2024 | |
| 3 | Desde 1 a 30 de Abril de 2024 | $ 42.143.500,00 | $ 8.007.265,00 | $ 50.150.765,00 | $ - | $ 50.150.765,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 15.173.515,00 | $ 2.091.573.515,00 | 3/05/2024 | |
| 4 | Desde 1 a 31 de Mayo de 2024 | $ 61.465.580,00 | $ 11.678.460,00 | $ 73.144.040,00 | $ - | $ 15.173.515,00<br>$ 57.970.525,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ -<br>$ 512.429.475,00 | $ 2.018.429.475,00 | 5/06/2024 | |
| 5 | Desde 1 a 30 de Junio de 2024 | $ 99.955.280,00 | $ 18.991.503,00 | $ 118.946.783,00 | $ - | $ 118.946.783,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 393.482.692,00 | $ 1.899.482.692,00 | 5/07/2024 | |
| 6 | Desde 1 a 31 de Julio de 2024 | $ 97.794.500,00 | $ 18.580.955,00 | $ 116.375.455,00 | $ - | $ 116.375.455,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 277.107.237,00 | $ 1.783.107.237,00 | 5/08/2024 | |
| 7 | Desde 1 a 31 de Agosto de 2024 | $ 110.977.900,00 | $ 21.085.801,00 | $ 132.063.701,00 | $ - | $ 132.063.701,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 145.043.536,00 | $ 1.651.043.536,00 | 5/09/2024 | |
| 8 | Desde 1 a 30 de Septiembre de 2024 | $ 111.651.500,00 | $ 21.213.785,00 | $ 132.865.285,00 | $ - | $ 132.865.285,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 12.178.251,00 | $ 1.518.178.251,00 | 4/10/2024 | |
| 9 | Desde 1 a 31 de octubre de 2024 | $ 111.651.500,00 | $ 21.213.785,00 | $ 132.865.285,00 | $ - | $ 12.178.251,00<br>$ 120.687.034,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ -<br>$ 1.084.112.966,00 | $ 1.385.312.966,00 | 5/11/2024 | |
| 10 | Desde 1 a 30 de noviembre de 2024 | $ 111.651.501,00 | $ 21.213.785,00 | $ 132.865.286,00 | $ - | $ 132.865.286,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 951.247.680,00 | $ 1.252.447.680,00 | 2/12/2024 | |
| 11 | Desde 1 a 31 de diciembre de 2024 | $ 111.651.500,00 | $ 21.213.785,00 | $ 132.865.285,00 | $ - | $ 132.865.285,00 | $ - | 1433723 de fecha 27-12-2023. | $ 818.382.395,00 | $ 1.119.582.395,00 | 2/12/2024 | |
| 12 | Desde 1 a 31 de enero de 2025 | $ 111.651.500,00 | $ 21.213.785,00 | $ 132.865.285,00 | $ - | $ 132.865.285,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 986.717.110,00 | $ 986.717.110,00 | 31/01/2025 | |
| 13 | Desde 1 a 28 de febrero de 2025 | $ 50.522.500,00 | $ 9.599.275,00 | $ 60.121.775,00 | $ - | $ 60.121.775,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 926.595.335,00 | $ 926.595.335,00 | 28/02/2025 | |
| 14 | Desde 1 a 31 de marzo de 2025 | $ 107.519.140,00 | $ 20.428.637,00 | $ 127.947.777,00 | $ - | $ 127.947.777,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 798.647.558,00 | $ 798.647.558,00 | 31/03/2025 | |
| 15 | Desde 1 a 30 de abril de 2025 | $ 111.226.700,00 | $ 21.133.073,00 | $ 132.359.773,00 | $ - | $ 132.359.773,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 666.287.785,00 | $ 666.287.785,00 | 30/04/2025 | |
| 16 | Desde 1 a 31 de mayo de 2025 | $ 120.145.140,00 | $ 22.827.577,00 | $ 142.972.717,00 | $ - | $ 142.972.717,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 523.315.068,00 | $ 523.315.068,00 | 31/05/2025 | |
| 17 | Desde 1 a 30 de junio de 2025 | $ 100.220.620,00 | $ 19.041.918,00 | $ 119.262.538,00 | $ - | $ 119.262.538,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 404.052.530,00 | $ 404.052.530,00 | 30/06/2025 | |
| 18 | Desde 1 a 31 de julio de 2025 | $ 73.881.640,00 | $ 14.037.512,00 | $ 87.919.152,00 | $ - | $ 87.919.152,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 316.133.378,00 | $ 316.133.378,00 | 31/07/2025 | |
| 19 | Desde 1 a 31 de agosto de 2025 | $ 91.012.880,00 | $ 17.292.447,20 | $ 108.305.327,00 | $ - | $ 108.305.327,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 207.828.051,00 | $ 207.828.051,00 | 31/08/2025 | |
| 20 | Desde 1 a 30 de septiembre de 2025 | $ 85.651.860,00 | $ 16.273.815,40 | $ 101.925.475,00 | $ - | $ 101.925.475,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 105.902.576,00 | $ 105.902.576,00 | 30/09/2025 | |
| 21 | Desde 1 a 22 de octubre de 2025 | $ 46.694.000,00 | $ 8.871.860,00 | $ 55.565.860,00 | $ - | $ 55.565.860,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ 50.336.716,00 | $ 50.336.716,00 | 22/10/2025 | |
| 22 | Desde 5 a 28 de diciembre de 2025 | $ 42.299.761,00 | $ 8.036.954,59 | $ 50.336.716,00 | $ - | $ 50.336.716,00 | $ - | 1248724 de fecha 31-12-2024. | $ - | $ - | 28/12/2025 | |
| | **TOTALES** | **$ 1.864.705.882,00** | **$ 354.294.118,19** | **$ 2.219.000.000,00** | **$ -** | **$ 2.219.000.000,00** | **$ -** | | **$ -** | **$ -** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 36.537.520,00 | $ 6.942.129,00 | $ 43.479.649,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 5.762.241,00 | $ 1.094.826,00 | $ 6.857.066,00 |
| PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL** | $ 42.299.761,00 | $ 8.036.955,00 | $ 50.336.716,00 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma

Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

**FECHA DE INICIO:** 28/12/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 2.219.000.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 2.219.000.000,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 221.900.000,00 | 29/12/2023 | 30/06/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 1.109.500.000,00 | 26/12/2023 | 30/06/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 443.800.000,00 | 26/12/2023 | 31/12/2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 665.700.000,00 | 31/12/2028 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100301347

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/12/2023

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 221.900.000,00 | 29/12/2023 | 3/08/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 1.109.500.000,00 | 29/12/2023 | 3/08/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 443.800.000,00 | 29/12/2023 | 3/2/2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 665.700.000,00 | 3/2/2024 | 3/2/2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100301347

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURSO S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025
(Día / Mes / Año)

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 221.900.000,00 | 3 | 2 | 2024 | 30/04/2026 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 1.109.500.000,00 | 3 | 2 | 2024 | 30/04/2026 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 443.800.000,00 | 3 | 2 | 2024 | 31 | 10 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 665.700.000,00 | 31 | 10 | 2025 | 31 | 10 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100301347

**Certificado de modificación o anexo No.:** 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURSO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

Actualización de la poliza de acuerdo a la Prorroga #3. Pendiente actualización de pólizas según prorroga #4.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ANGELA DAVILA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798CLD

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**FECHA DE INICIO:** 28/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE DICIEMBRE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE OBRA No:** 159-2023 (Indicar número y año)
**CONTRATISTA:** CONSORCIO PROVIDENCIA

**CONTRATO DE OBRA No:** LP-006-2023 (Indicar número y año)
**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

**CONTRATO DE OBRA No:** LP-MSBV-008-2023 (Indicar número y año)
**CONTRATISTA:** CONSORCIO L&S

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI --X--- NO ------ APROBADO: SI -X---- NO ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: _____

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO -------

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** _____

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

**OBSERVACIONES:**

FECHA 31/12/2025
(Día / Mes / Año)

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Rep. Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2220220400 5COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 6.6 Otros documentos de seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5053 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGECON-INCO

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

**JUSTIFICACIÓN:**
N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | **NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE PERIODO NO SE HA TRAMITADO EL ANTICIPO.** | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **100%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 1de 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5053 DE 2023
(Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** ..... - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** .....

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE PERIODO NO SE HA DESEMBOLSADO EL ANTICIPO. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____):** $ - 
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado - MEPI-MN-IN-9-FR-2.**

FECHA 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS TERCIARIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**PLAN DE CARGAS INICIAL**

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 159 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO L&S
CONTRATO DE OBRA No.: LP-008-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA

PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/10/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.219.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.334.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 21,69 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/12/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 115.000.000,00

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal | Prima Regional | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha: Participación (h-mes) | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoria | $ 6.900.000,00 | | 3,00 | $ 20.700.000 | | | | |
| 2 | 3 | Residente de Interventoria | $ 5.150.000,00 | | 9,00 | $ 46.350.000 | | | | |
| 3 | 1 | Profesional social | $ 3.750.000,00 | | 3,00 | $ 11.250.000 | | | | |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | | | | $ 21.000.000 | | | | |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | | PERSONAL TECNICO | | | | | | | | |
| | 3 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 6,00 | $ 12.000.000 | | | | |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | | 2,00 | $ 4.400.000 | | | | |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| | 1 | Técnico administrativo | $ 1.250.000,00 | | 3,00 | $ 3.750.000 | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 119.450.000 | | | | |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2,36 | | | | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 281.902.000 | | | | |

**2024**

| CARGO / OFICIO | FEBRERO H-M | FEBRERO VALOR | MARZO H-M | MARZO VALOR | ABRIL H-M | ABRIL VALOR | MAYO H-M | MAYO VALOR | JUNIO H-M | JUNIO VALOR | JULIO H-M | JULIO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 |
| Residente de Interventoria | 0,00 | $ - | 0,77 | $ 3.965.500 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,57 | $ 8.085.500 | 2,36 | $ 12.154.000 | 3,00 | $ 15.450.000 |
| Profesional social | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,56 | $ 2.100.000 | 1,00 | $ 3.750.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,59 | $ 3.599.000 | | $ - |
| Especialista en Estructuras | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista Ambiental | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,19 | $ 1.155.000 | 0,38 | $ 2.318.000 | | $ - |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,57 | $ 3.477.000 | | $ - |
| Especialista en Diseño Geométrico | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| PERSONAL TECNICO | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Inspector | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,90 | $ 1.800.000 |
| Inspector SST | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 8.150.000,00 | $ | 12.115.500,00 | $ | 13.300.000,00 | $ | 19.590.500,00 | $ | 33.998.000,00 | $ | 31.350.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 19.234.000,0 | $ | 28.592.580,0 | $ | 31.388.000,0 | $ | 46.233.580,0 | $ | 80.235.280,0 | $ | 73.986.000,0 |

| CARGO / OFICIO | AGOSTO H-M | AGOSTO VALOR | SEPTIEMBRE H-M | SEPTIEMBRE VALOR | OCTUBRE H-M | OCTUBRE VALOR | NOVIEMBRE H-M | NOVIEMBRE VALOR | DICIEMBRE H-M | DICIEMBRE VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 |
| Residente de Interventoria | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 |
| Profesional social | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Estructuras | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista Ambiental | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Diseño Geométrico | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| PERSONAL TECNICO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Inspector | 2,87 | $ 5.740.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 3,00 | $ 6.000.000 |
| Inspector SST | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 35.290.000,00 | $ | 35.550.000,00 | $ | 35.550.000,00 | $ | 35.550.000,00 | $ | 35.550.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 83.284.400,0 | $ | 83.898.000,0 | $ | 83.898.000,0 | $ | 83.898.000,0 | $ | 83.898.000,0 |

**PROYECCION 2025**

| CARGO / OFICIO | ENERO H-M | ENERO VALOR | FEBRERO H-M | FEBRERO VALOR | MARZO H-M | MARZO VALOR | ABRIL H-M | ABRIL VALOR | MAYO H-M | MAYO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 |
| Residente de Interventoria | 3,00 | $ 15.450.000 | 0,80 | $ 4.120.000 | 2,66 | $ 13.699.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 |
| Profesional social | 1,00 | $ 3.750.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 4.880.000 |
| Especialista en Estructuras | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 3.050.000 |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - |
| Especialista Ambiental | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,70 | $ 4.270.000 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,70 | $ 4.270.000 |
| Especialista en Diseño Geométrico | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 4.880.000 |
| PERSONAL TECNICO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Inspector | 3,00 | $ 6.000.000 | 1,54 | $ 3.080.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 2,91 | $ 5.820.000 | 3,00 | $ 6.000.000 |
| Inspector SST | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 35.550.000,00 | $ | 17.550.000,00 | $ | 33.799.000,00 | $ | 35.370.000,00 | $ | 56.900.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 83.898.000,0 | $ | 41.418.000,0 | $ | 79.765.640,0 | $ | 83.473.200,0 | $ | 134.284.000,0 |

| CARGO / OFICIO | JUNIO H-M | JUNIO VALOR | JULIO H-M | JULIO VALOR | AGOSTO H-M | AGOSTO VALOR | SEPTIEMBRE H-M | SEPTIEMBRE VALOR | OCTUBRE H-M | OCTUBRE VALOR | TOTAL H-M | TOTAL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 21,00 | $ 144.900.000,00 |
| Residente de Interventoria | 2,00 | $ 10.300.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 42,16 | $ 217.124.000,00 |
| Profesional social | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 15,56 | $ 58.350.000,00 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | | $ - | 0,25 | $ 1.525.000 | | $ - | 0,15 | $ 915.000 | | $ - | 1,79 | $ 10.919.000,00 |
| Especialista en Estructuras | | $ - | 0,55 | $ 3.355.000 | | $ - | 0,15 | $ 915.000 | | $ - | 1,20 | $ 7.320.000,00 |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| Especialista Ambiental | | $ - | 0,50 | $ 3.050.000 | | $ - | | $ - | | $ - | 1,77 | $ 10.793.000,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | | $ - | 0,50 | $ 3.050.000 | | $ - | | $ - | | $ - | 1,77 | $ 10.797.000,00 |
| Especialista en Diseño Geométrico | | $ - | 0,40 | $ 2.440.000 | | $ - | | $ - | | $ - | 1,20 | $ 7.320.000,00 |
| PERSONAL TECNICO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| Inspector | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 34,22 | $ 68.440.000,00 |
| Inspector SST | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 18,00 | $ 39.600.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 21,00 | $ 26.250.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 26.400.000,00 | $ | 34.670.000,00 | $ | 21.250.000,00 | $ | 23.080.000,00 | $ | 21.250.000,00 | $ | 601.813.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 62.304.000,0 | $ | 81.821.200,0 | $ | 50.150.000,0 | $ | 54.468.800,0 | $ | 50.150.000,0 | $ | 1.420.278.680,0 |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | |
| | 12 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 210.000,00 | Dia | | $ 2.520.000 | | | | |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | |
| | 6,00 | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato | $ 5.750.000,00 | Mes | | $ 34.500.000 | | | | |
| | 6,00 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | | $ 3.900.000 | | | | |
| | 3,00 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.250.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 18.750.000 | | | | |
| | 3,00 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 600.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 1.800.000 | | | | |
| | 3,00 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.250.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 3.750.000 | | | | |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | |
| | 3,00 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.350.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 4.050.000 | | | | |
| | 3,00 | Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografías, videos, | $ 500.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 1.500.000 | | | | |
| | 3,00 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax correo, internet, etc) | $ 650.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 1.950.000 | | | | |
| | 3,00 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 150.000,00 | Según comprobante | | $ 450.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | |
| * SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | | $ 73.170.000 | | | | |
| * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | | | | | | $ 355.072.000 | | | | |
| * PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | $ 1.509.633.882 | | | | |
| * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | | | | | | $ 1.864.705.882 | | | | |
| * IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | | $ 354.294.118 | | | | |
| * COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | | $ 2.219.000.000 | | | | |

**2024**

| CONCEPTO | FEBRERO H-M | FEBRERO VALOR | MARZO H-M | MARZO VALOR | ABRIL H-M | ABRIL VALOR | MAYO H-M | MAYO VALOR | JUNIO H-M | JUNIO VALOR | JULIO H-M | JULIO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaticos Director y/o Especialistas | 2,00 | $ 420.000 | 2,00 | $ 420.000 | 2,00 | $ 420.000 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 0,86 | $ 4.945.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,57 | $ 9.027.500 | 2,47 | $ 14.202.500 | 3,00 | $ 17.250.000 |
| Motocicletas | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 650.000 | 1,90 | $ 1.235.000 |
| Trabajo de topografía | | $ - | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 |
| Ensayos de Laboratorio | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,76 | $ 456.000 |
| Oficina/Campamento | 0,43 | $ 537.500 | 0,50 | $ 625.000 | 0,92 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| OTROS COSTOS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Transportes aereos y/o terrestres | 0,33 | $ 445.500 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 1.350.000 | | $ - | | $ - |
| Edicion de informes, papeleria | 1,00 | $ 500.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,79 | $ 395.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 |
| Comunicaciones | 0,10 | $ 65.000 | 0,12 | $ 78.000 | 0,17 | $ 110.500 | 0,13 | $ 84.500 | 0,45 | $ 292.500 | 0,45 | $ 292.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | $ - | | | | | | | | | | |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 6.913.000 | $ | 10.198.000 | $ | 10.755.500 | $ | 15.232.000 | $ | 19.720.000 | $ | 23.808.500 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 26.147.000 | $ | 38.790.580 | $ | 42.143.500 | $ | 61.465.580 | $ | 99.955.280 | $ | 97.794.500 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 26.147.000 | $ | 38.790.580 | $ | 42.143.500 | $ | 61.465.580 | $ | 99.955.280 | $ | 97.794.500 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 4.967.930 | $ | 7.370.210 | $ | 8.007.265 | $ | 11.678.460 | $ | 18.991.503 | $ | 18.580.955 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 31.114.930 | $ | 46.160.790 | $ | 50.150.765 | $ | 73.144.040 | $ | 118.946.783 | $ | 116.375.455 |

| CONCEPTO | AGOSTO H-M | AGOSTO VALOR | SEPTIEMBRE H-M | SEPTIEMBRE VALOR | OCTUBRE H-M | OCTUBRE VALOR | NOVIEMBRE H-M | NOVIEMBRE VALOR | DICIEMBRE H-M | DICIEMBRE VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaticos Director y/o Especialistas | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 |
| Motocicletas | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 |
| Trabajo de topografía | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 |
| Ensayos de Laboratorio | 0,90 | $ 540.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 |
| Oficina/Campamento | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| OTROS COSTOS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Transportes aereos y/o terrestres | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Edicion de informes, papeleria | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 |
| Comunicaciones | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | | | | | | |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | $ 42 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 27.693.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.542 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 110.977.900 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.542 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 110.977.900 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.542 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 21.085.801 | $ | 21.213.785 | $ | 21.213.785 | $ | 21.213.785 | $ | 21.213.793 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 132.063.701 | $ | 132.865.285 | $ | 132.865.285 | $ | 132.865.286 | $ | 132.865.335 |

**2025**

| CONCEPTO | ENERO H-M | ENERO VALOR | FEBRERO H-M | FEBRERO VALOR | MARZO H-M | MARZO VALOR | ABRIL H-M | ABRIL VALOR | MAYO H-M | MAYO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaticos Director y/o Especialistas | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 3,00 | $ 17.250.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 |
| Motocicletas | 3,00 | $ 1.950.000 | 2,54 | $ 1.651.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 |
| Trabajo de topografía | 1,00 | $ 6.250.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 |
| Ensayos de Laboratorio | 1,00 | $ 600.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 |
| Oficina/Campamento | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| OTROS COSTOS | | | | | | | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Edicion de informes, papeleria | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 |
| Comunicaciones | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | | | | | | |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 27.753.500 | $ | 9.104.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 111.651.500 | $ | 50.522.500 | $ | 107.519.140 | $ | 111.226.700 | $ | 162.037.500 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 111.651.500 | $ | 50.522.500 | $ | 107.519.140 | $ | 111.226.700 | $ | 162.037.500 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 21.213.785 | $ | 9.599.275 | $ | 20.428.637 | $ | 21.133.073 | $ | 30.787.125 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 132.865.285 | $ | 60.121.775 | $ | 127.947.777 | $ | 132.359.773 | $ | 192.824.625 |

| CONCEPTO | JUNIO H-M | JUNIO VALOR | JULIO H-M | JULIO VALOR | AGOSTO H-M | AGOSTO VALOR | SEPTIEMBRE H-M | SEPTIEMBRE VALOR | OCTUBRE H-M | OCTUBRE VALOR | | TOTAL H-M | TOTAL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaticos Director y/o Especialistas | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 4,00 | $ 840.000 | 0,00 | $ - | | 10,000 | $ 2.100.000 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 2,00 | $ 11.500.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | | 40,900 | $ 252.425.000 |
| Motocicletas | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 2,16 | $ 1.404.000 | 2,10 | $ 1.365.000 | 2,00 | $ 1.300.000 | | 38,440 | $ 29.055.000 |
| Trabajo de topografía | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | | 13,500 | $ 103.125.000 |
| Ensayos de Laboratorio | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | | 11,660 | $ 8.796.000 |
| Oficina/Campamento | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | | 16,050 | $ 22.312.500 |
| OTROS COSTOS | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,000 | $ - |
| Transportes aereos y/o terrestres | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 2.700.000 | 0,00 | $ - | | 1,330 | $ 4.495.500 |
| Edicion de informes, papeleria | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | | 8,190 | $ 4.695.000 |
| Comunicaciones | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | | 6,100 | $ 4.725.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,000 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | $ - |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | $ - |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 21.503.500 | $ | 15.753.500 | $ | 15.207.500 | $ | 18.708.500 | $ | 15.103.500 | | $ | 431.729.500 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 83.807.500 | $ | 97.574.700 | $ | 65.357.500 | $ | 73.177.300 | $ | 65.253.500 | | $ | 1.852.008.180 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | | | $ | 12.697.702,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 83.807.500 | $ | 97.574.700 | $ | 65.357.500 | $ | 73.177.300 | $ | 65.253.500 | | $ | 1.864.705.882 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 15.923.425 | $ | 18.539.193 | $ | 12.417.925 | $ | 13.903.687 | $ | 12.398.165 | $ - | $ | 354.294.118 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 99.730.925 | $ | 116.113.893 | $ | 77.775.425 | $ | 87.080.987 | $ | 77.651.665 | | $ | 2.219.000.000 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS $ -

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISION, TIENE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE PRORROGA DE SU PLAZO: CONTRATO 159-2023, PLAZO HASTA EL 31/10/2025, PLAZOS QUE COMO SE OBSERVA, SUPERA EL 31 DE JULIO DE 2025, POR LO CUAL, Y BASADOS EN LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL COMUNICADO CING-INV-5053-0187-25, SE SOLICITA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025, AJUSTANDO PLAN DE CARGAS, SEGUN LO REQUERIDO.

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante Legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: Luis Gonzalez Ozuna
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

- **Seguimiento al Plan de Cargas - MEPI-MN-IN-9-FR-3.**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/12/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS TERCIARIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 159 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO L&S
CONTRATO DE OBRA No.: LP-008-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA

PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/10/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.219.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.334.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 21,69 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/12/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 115.000.000,00

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal | Prima Regional | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha: Participación (h-mes) | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoria | $ 6.900.000,00 | | 3,00 | $ 20.700.000 | | | | |
| 2 | 3 | Residente de Interventoria | $ 5.150.000,00 | | 9,00 | $ 46.350.000 | | | | |
| 3 | 1 | Profesional social | $ 3.750.000,00 | | 3,00 | $ 11.250.000 | | | | |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | | | | $ 21.000.000 | | | | |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.100.000,00 | | | | | | | |
| | | PERSONAL TECNICO | | | | | | | | |
| | 3 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 6,00 | $ 12.000.000 | | | | |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | | 2,00 | $ 4.400.000 | | | | |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| | 1 | Técnico administrativo | $ 1.250.000,00 | | 3,00 | $ 3.750.000 | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 119.450.000 | | | | |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2,36 | | | | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 281.902.000 | | | | |

2024

| CARGO / OFICIO | FEBRERO H-M | VALOR | MARZO H-M | VALOR | ABRIL H-M | VALOR | MAYO H-M | VALOR | JUNIO H-M | VALOR | JULIO H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 |
| Residente de Interventoria | 0,00 | $ - | 0,77 | $ 3.965.500 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,57 | $ 8.085.500 | 2,36 | $ 12.154.000 | 3,00 | $ 15.450.000 |
| Profesional social | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,56 | $ 2.100.000 | 1,00 | $ 3.750.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,59 | $ 3.599.000 | | $ - |
| Especialista en Estructuras | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista Ambiental | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,19 | $ 1.155.000 | 0,38 | $ 2.318.000 | | $ - |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,57 | $ 3.477.000 | | $ - |
| Especialista en Diseño Geométrico | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| PERSONAL TECNICO | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Inspector | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,90 | $ 1.800.000 |
| Inspector SST | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 8.150.000,00 | $ | 12.115.500,00 | $ | 13.300.000,00 | $ | 19.590.500,00 | $ | 33.998.000,00 | $ | 31.350.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 19.234.000,0 | $ | 28.592.580,0 | $ | 31.388.000,0 | $ | 46.233.580,0 | $ | 80.235.280,0 | $ | 73.986.000,0 |

| CARGO / OFICIO | AGOSTO H-M | VALOR | SEPTIEMBRE H-M | VALOR | OCTUBRE H-M | VALOR | NOVIEMBRE H-M | VALOR | DICIEMBRE H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 |
| Residente de Interventoria | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 |
| Profesional social | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Estructuras | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista Ambiental | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Diseño Geométrico | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| PERSONAL TECNICO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Inspector | 2,87 | $ 5.740.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 3,00 | $ 6.000.000 |
| Inspector SST | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 35.290.000,00 | $ | 35.550.000,00 | $ | 35.550.000,00 | $ | 35.550.000,00 | $ | 35.550.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 83.284.400,0 | $ | 83.898.000,0 | $ | 83.898.000,0 | $ | 83.898.000,0 | $ | 83.898.000,0 |

PROYECCION 2025

| CARGO / OFICIO | ENERO H-M | VALOR | FEBRERO H-M | VALOR | MARZO H-M | VALOR | ABRIL H-M | VALOR | MAYO H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 |
| Residente de Interventoria | 3,00 | $ 15.450.000 | 0,80 | $ 4.120.000 | 2,66 | $ 13.699.000 | 3,00 | $ 15.450.000 | 3,00 | $ 15.450.000 |
| Profesional social | 1,00 | $ 3.750.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 4.880.000 |
| Especialista en Estructuras | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 3.050.000 |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - |
| Especialista Ambiental | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,70 | $ 4.270.000 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,70 | $ 4.270.000 |
| Especialista en Diseño Geométrico | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 4.880.000 |
| PERSONAL TECNICO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Inspector | 3,00 | $ 6.000.000 | 1,54 | $ 3.080.000 | 3,00 | $ 6.000.000 | 2,91 | $ 5.820.000 | 3,00 | $ 6.000.000 |
| Inspector SST | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 35.550.000,00 | $ | 17.550.000,00 | $ | 33.799.000,00 | $ | 35.370.000,00 | $ | 56.900.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 83.898.000,0 | $ | 41.418.000,0 | $ | 79.765.640,0 | $ | 83.473.200,0 | $ | 134.284.000,0 |

| CARGO / OFICIO | JUNIO H-M | VALOR | JULIO H-M | VALOR | AGOSTO H-M | VALOR | SEPTIEMBRE H-M | VALOR | OCTUBRE H-M | VALOR | | TOTAL H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoria | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | 1,00 | $ 6.900.000 | | 21,00 | $ 144.900.000,00 |
| Residente de Interventoria | 2,00 | $ 10.300.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | 1,00 | $ 5.150.000 | | 42,16 | $ 217.124.000,00 |
| Profesional social | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | 1,00 | $ 3.750.000 | | 15,56 | $ 58.350.000,00 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,00 | $ - |
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | | $ - | 0,25 | $ 1.525.000 | | $ - | 0,15 | $ 915.000 | | $ - | | 1,79 | $ 10.919.000,00 |
| Especialista en Estructuras | | $ - | 0,55 | $ 3.355.000 | | $ - | 0,15 | $ 915.000 | | $ - | | 1,20 | $ 7.320.000,00 |
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,00 | $ - |
| Especialista Ambiental | | $ - | 0,50 | $ 3.050.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,77 | $ 10.793.000,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | | $ - | 0,50 | $ 3.050.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,77 | $ 10.797.000,00 |
| Especialista en Diseño Geométrico | | $ - | 0,40 | $ 2.440.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | 1,20 | $ 7.320.000,00 |
| PERSONAL TECNICO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,00 | $ - |
| Inspector | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | | 34,22 | $ 68.440.000,00 |
| Inspector SST | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | | 18,00 | $ 39.600.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,00 | $ - |
| Técnico administrativo | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | | 21,00 | $ 26.250.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 26.400.000,00 | $ | 34.670.000,00 | $ | 21.250.000,00 | $ | 23.080.000,00 | $ | 21.250.000,00 | | $ | 601.813.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | | 2,36 | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | $ | 62.304.000,0 | $ | 81.821.200,0 | $ | 50.150.000,0 | $ | 54.468.800,0 | $ | 50.150.000,0 | | $ | 1.420.278.680,0 |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | |
| | 12 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 210.000,00 | Dia | | $ 2.520.000 | | | | |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | |
| | 6,00 | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato | $ 5.750.000,00 | Mes | | $ 34.500.000 | | | | |
| | 6,00 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | | $ 3.900.000 | | | | |
| | 3,00 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.250.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 18.750.000 | | | | |
| | 3,00 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 600.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 1.800.000 | | | | |
| | 3,00 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.250.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 3.750.000 | | | | |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | |
| | 3,00 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.350.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 4.050.000 | | | | |
| | 3,00 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 500.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 1.500.000 | | | | |
| | 3,00 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax correo, internet, etc) | $ 650.000,00 | Según comprobante por mes | | $ 1.950.000 | | | | |
| | 3,00 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 150.000,00 | Según comprobante | | $ 450.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | |
| * | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | $ 73.170.000 | | | | |
| * | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | | | | $ 355.072.000 | | | | |
| * | | PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | $ 1.509.633.882 | | | | |
| * | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | | | | $ 1.864.705.882 | | | | |
| * | | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | $ 354.294.118 | | | | |
| * | | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | $ 2.219.000.000 | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

2024

| CONCEPTO | FEBRERO H-M | VALOR | MARZO H-M | VALOR | ABRIL H-M | VALOR | MAYO H-M | VALOR | JUNIO H-M | VALOR | JULIO H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| VIATICOS | | | | | | | | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | 2,00 | $ 420.000 | 2,00 | $ 420.000 | 2,00 | $ 420.000 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 0,86 | $ 4.945.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,57 | $ 9.027.500 | 2,47 | $ 14.202.500 | 3,00 | $ 17.250.000 |
| Motocicletas | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 650.000 | 1,90 | $ 1.235.000 |
| Trabajo de topografía | | $ - | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 | 0,50 | $ 3.125.000 |
| Ensayos de Laboratorio | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,76 | $ 456.000 |
| Oficina/Campamento | 0,43 | $ 537.500 | 0,50 | $ 625.000 | 0,92 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| OTROS COSTOS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Transportes aereos y/o terrestres | 0,33 | $ 445.500 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 1.350.000 | | $ - | | $ - |
| Edición de informes | 1,00 | $ 500.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,79 | $ 395.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 |
| Comunicaciones | 0,10 | $ 65.000 | 0,12 | $ 78.000 | 0,17 | $ 110.500 | 0,13 | $ 84.500 | 0,45 | $ 292.500 | 0,45 | $ 292.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | $ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 6.913.000 | $ | 10.198.000 | $ | 10.755.500 | $ | 15.232.000 | $ | 19.720.000 | $ | 23.808.500 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 26.147.000 | $ | 38.790.580 | $ | 42.143.500 | $ | 61.465.580 | $ | 99.955.280 | $ | 97.794.500 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 26.147.000 | $ | 38.790.580 | $ | 42.143.500 | $ | 61.465.580 | $ | 99.955.280 | $ | 97.794.500 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 4.967.930 | $ | 7.370.210 | $ | 8.007.265 | $ | 11.678.460 | $ | 18.991.503 | $ | 18.580.955 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 31.114.930 | $ | 46.160.790 | $ | 50.150.765 | $ | 73.144.040 | $ | 118.946.783 | $ | 116.375.455 |

| CONCEPTO | AGOSTO H-M | VALOR | SEPTIEMBRE H-M | VALOR | OCTUBRE H-M | VALOR | NOVIEMBRE H-M | VALOR | DICIEMBRE H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | |
| VIATICOS | | | | | | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 |
| Motocicletas | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 |
| Trabajo de topografía | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 |
| Ensayos de Laboratorio | 0,90 | $ 540.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 |
| Oficina/Campamento | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| OTROS COSTOS | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Transportes aereos y/o terrestres | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Edición de informes | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 |
| Comunicaciones | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | $ 42 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 27.693.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.542 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 110.977.900 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.542 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 110.977.900 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.500 | $ | 111.651.542 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 21.085.801 | $ | 21.213.785 | $ | 21.213.785 | $ | 21.213.785 | $ | 21.213.793 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 132.063.701 | $ | 132.865.285 | $ | 132.865.285 | $ | 132.865.286 | $ | 132.865.335 |

2025

| CONCEPTO | ENERO H-M | VALOR | FEBRERO H-M | VALOR | MARZO H-M | VALOR | ABRIL H-M | VALOR | MAYO H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | |
| VIATICOS | | | | | | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 3,00 | $ 17.250.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 | 3,00 | $ 17.250.000 |
| Motocicletas | 3,00 | $ 1.950.000 | 2,54 | $ 1.651.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 |
| Trabajo de topografía | 1,00 | $ 6.250.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 |
| Ensayos de Laboratorio | 1,00 | $ 600.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 |
| Oficina/Campamento | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 | 1,00 | $ 1.250.000 |
| OTROS COSTOS | | | | | | | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Edición de informes | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 |
| Comunicaciones | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 27.753.500 | $ | 9.104.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 | $ | 27.753.500 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 111.651.500 | $ | 50.522.500 | $ | 107.519.140 | $ | 111.226.700 | $ | 162.037.500 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 111.651.500 | $ | 50.522.500 | $ | 107.519.140 | $ | 111.226.700 | $ | 162.037.500 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 21.213.785 | $ | 9.599.275 | $ | 20.428.637 | $ | 21.133.073 | $ | 30.787.125 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 132.865.285 | $ | 60.121.775 | $ | 127.947.777 | $ | 132.359.773 | $ | 192.824.625 |

| CONCEPTO | JUNIO H-M | VALOR | JULIO H-M | VALOR | AGOSTO H-M | VALOR | SEPTIEMBRE H-M | VALOR | OCTUBRE H-M | VALOR | | TOTAL H-M | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| VIATICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 4,00 | $ 840.000 | 0,00 | $ - | | 10,000 | $ 2.100.000 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| Vehículo tipo campero ó camioneta | 2,00 | $ 11.500.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | 1,00 | $ 5.750.000 | | 40,900 | $ 252.425.000 |
| Motocicletas | 3,00 | $ 1.950.000 | 3,00 | $ 1.950.000 | 2,16 | $ 1.404.000 | 2,10 | $ 1.365.000 | 2,00 | $ 1.300.000 | | 38,440 | $ 29.055.000 |
| Trabajo de topografía | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | 1,00 | $ 6.250.000 | | 13,500 | $ 103.125.000 |
| Ensayos de Laboratorio | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | 1,00 | $ 600.000 | | 11,660 | $ 8.796.000 |
| Oficina/Campamento | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | 0,60 | $ 750.000 | | 16,050 | $ 22.312.500 |
| OTROS COSTOS | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,000 | $ - |
| Transportes aereos y/o terrestres | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 2.700.000 | 0,00 | $ - | | 1,330 | $ 4.495.500 |
| Edición de informes | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | 0,40 | $ 200.000 | | 8,190 | $ 4.695.000 |
| Comunicaciones | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | 0,39 | $ 253.500 | | 6,100 | $ 4.725.500 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | 0,000 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | $ - |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | $ - |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | $ | 21.503.500 | $ | 15.753.500 | $ | 15.207.500 | $ | 18.708.500 | $ | 15.103.500 | | $ | 431.729.500 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | $ | 83.807.500 | $ | 97.574.700 | $ | 65.357.500 | $ | 73.177.300 | $ | 65.253.500 | | $ | 1.852.008.180 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | | | | | | | | $ | 12.697.702,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = € | $ | 83.807.500 | $ | 97.574.700 | $ | 65.357.500 | $ | 73.177.300 | $ | 65.253.500 | | $ | 1.864.705.882 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ | 15.923.425 | $ | 18.539.193 | $ | 12.417.925 | $ | 13.903.687 | $ | 12.398.165 | $ - | $ | 354.294.118 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ | 99.730.925 | $ | 116.113.893 | $ | 77.775.425 | $ | 87.080.987 | $ | 77.651.665 | | $ | 2.219.000.000 |

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS — $ -

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISION, TIENE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE PRORROGA DE SU PLAZO: CONTRATO 159-2023, PLAZO HASTA EL 31/10/2025, PLAZOS QUE COMO SE OBSERVA, SUPERA EL 31 DE JULIO DE 2025, POR LO CUAL, Y BASADOS EN LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL COMUNICADO CING-INV-5053-0187-25, SE SOLICITA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025, AJUSTANDO PLAN DE CARGAS, SEGUN LO REQUERIDO.

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante Legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: Luis Gonzalez Ozuna
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

## CONSORCIO PROVIDENCIA – CONTRATO DE OBRA No. 159 DE 2023.

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra 159-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

| | |
|---|---|
| **Valor Total ejecutado acumulado al mes 22** | **$ 12.565.469.848,00** |
| **Valor Obra Básica en el mes 22** | **$ 262.396.169,00** |
| **Valor Básico Estudios y Diseños** | **$0,00** |
| **Valor total Iva** | **$ 0,00** |
| **Porcentaje ejecutado acumulado obra básico** | **91.40%** |
| **Porcentaje programado acumulado obra básico** | **91.45%** |

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 91.40%, vs avance programado del 91.45%, presentando atraso del -0.05% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #4, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista aumentar el ritmo de trabajo, para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. El municipio adelantó las gestiones correspondientes y se tramitó la adición de $115.000.000 necesarios que permitan cubrir los costos de interventoría asociados a la prórroga #5 (hasta el 27 de enero de 2026),

La suspensión de obra #2 se realizó desde el dia 23 de octubre de 2025 hasta el dia 04 de diciembre de 2025, y una vez se subsanaron las causales que dieron origen a la suspensión, el dia 05 de diciembre de 2025 se reinician labores de ejecución del contrato de obra.

Se solicita al Consorcio Providencia, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento a la programación de obra aprobada, y avanzar en las actividades de ejecución de obra, con el fin de terminar las metas físicas en el menor tiempo posible.

Se avanzó con la reparación de las losas de concreto MR38 que presentan fisuras transversales en el tramo 1 y 2, cumpliendo un 100% en las reparaciones, dicha

actividad la ejecutaron a un buen ritmo de trabajo. De igual manera, se establecieron nuevas fisuras en diferentes losas, logrando identificar 12 losas, que requieren reparación, por lo que se conmina al contratista para que realice las respectivas reparaciones.

Para el box coulvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900, el contratista hizo entrega de los diseños hidráulicos y estructurales, los cuales fueron aprobados por la Interventoria, por lo que se requiere que el contratista de obra avance con esta actividad, y la ejecute en el menor tiempo posible.

La construcción del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200, fue ejecutado a satisfacción en la programación establecida, se requiere avanzar con la actividad de construcción de pavimento rígido en ese sector para finiquitar labores del tramo I, y proceder con la demarcación horizontal.

El dia 27 de agosto de 2024, se dio apertura a la audiencia de presunto incumplimiento, en el desarrollo de la misma, se presentó por parte del apoderado del contratista, un informe de descargos y presentación de pruebas solicitando desistimiento del proceso, la aseguradora presentó sus descargos y se suspendió la audiencia para dar paso al análisis de pruebas, la cual se está a la espera de la reanudación por parte del municipio. De igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones SST y ambientales. Adicionalmente, la Alcaldía cerró mediante comunicado remitido al consorcio providencia el proceso sancionatorio de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que se superaron las causales que lo originaron.

El municipio presentó la solicitud del permiso de ocupación de cauce para el proyecto ante la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y del San Jorge "CVS", con el fin de avanzar en la ejecución de actividades, y la entidad ambiental expide las resoluciones de permiso de ocupación de cauce para que puedan avanzar con las intervenciones correspondientes, solicitando unas compensaciones ambientales de 100 árboles por cada obra de arte. Por lo anterior, se solicitó al contratista de obra, la gestión necesaria ante el municipio, para que indiquen si tienen un sitio autorizado para la disposición final y siembra de los individuos arbóreos, para que puedan adelantar esta actividad.

El CONSORCIO PROVIDENCIA. el pasado 02 de abril de 2024, suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración No.3-1- 119640 con FIDUCIARIA

BOGOTÁ S.A., el cual tuvo por objeto constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el anticipo. En desarrollo de dicho contrato, el 05 de septiembre de 2024, se realizó en Fiduciaria Bogotá S.A., la apertura de la cuenta de ahorros del Banco Bogotá No.003003712, con los recursos provenientes de la entidad MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA por valor de $4.355.000.130,55. Los recursos consignados, generaron rendimientos finales por valor de $4.039.469,00 a nombre del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO los cuales fueron girados de manera mensual por medio de PSE de acuerdo con la instrucción de giro por parte del fideicomitente. A la fecha el contrato fiduciario 119640 CONSORCIO PROVIDENCIA, Cumplió con su objeto y se encuentra cancelado. La presente certificación la expide el banco de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

Se realiza reunión de avance mensual con participación de la veeduría ciudadana, comunidad, contratista de obra e Interventoria, con el fin de dar a conocer los avances técnicos que se han tenido en el desarrollo del proyecto y aclarar dudas e inquietudes de los asistentes.

Se han presentado las afiliaciones riesgos profesionales del personal vinculado a la obra. Pendiente entrega de las planillas pagadas del presente periodo.

Se ha cumplido con la señalización preventiva y temporal de obra.

A la fecha, el municipio ha consignado los rendimientos financieros de la cuenta convenio desde el año 2023 hasta el mes de diciembre 2024, y desde enero a abril de 2025 y julio de 2025. Pendiente agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.

**CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023.**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-006-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

| **Valor Total ejecutado acumulado** | **$ 5.873.079.611,00** |
|---|---|
| **Valor Obra Básica** | **$ 0,00** |
| **Valor Básico Estudios y Diseños** | **$0,00** |
| **Valor total Iva** | **$ 0,00** |
| **Porcentaje ejecutado acumulado obra básico** | **100.00%** |
| **Porcentaje programado acumulado obra básico** | **100.00%** |

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y las reparaciones en diferentes losas que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

## CONSORCIO L&S – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-MSBV-008-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

| **Valor Total ejecutado acumulado** | **$ 2.008.640.979,00** |
|---|---|
| **Valor Obra Básica** | **$0,00** |
| **Valor Básico Estudios y Diseños** | **$ 0,00** |
| **Valor total Iva** | **$ 0,00** |
| **Porcentaje ejecutado acumulado obra básico** | **100.00%** |
| **Porcentaje programado acumulado obra básico** | **100.00%** |

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 100.00%, vs avance programado del 100.00%, de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, evidenciándose la terminación de la demarcación horizontal y la instalación de señales verticales, que se encontraban dentro de lo establecido en el acta de visita previa, y poder suscribir el acta de recibo definitivo de la obra y hacer entrega oficial a la entidad contratante y a la comunidad en general.

# 8 ANEXOS.

## 8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | |
|---|---|---|---|
| **Radicado** | **Fecha** | **Entidad** | **Asunto** |
| CINGE-INV-5053-0293-25 | 2025-12-03 | CONSORCIO L&S | Respuesta comunicado del 1 de diciembre. Acta Recibo parcial No. 6. |
| CINGE-INV-5053-0294-25 | 2025-12-10 | CONSORCIO PROVIDENCIA | Respuesta comunicados OFI-CONS-115-2025 y OFI-CONS-129-2025 (informe mes de septiembre y octubre de 2025 del componente social) |
| CINGE-INV-5053-0295-25 | 2025-12-11 | CONSORCIO PROVIDENCIA | MANTENIM |
| CINGE-INV-5053-0296-25 | 2025-12-11 | CONSORCIO PROVIDENCIA | NTENIMI |
| CINGE-INV-5053-0297-25 | 2025-12-11 | CONSORCIO PROVIDENCIA | Y |
| CINGE-INV-5053-0298-25 | 2025-12-15 | CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA | : MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAME |
| CING-INV-5053-0299-25 | 2025-12-17 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | Remisión informe trimestral No 7 del Componente Social |
| CING-INV-5053-0300-25 | 2025-12-23 | CONSORCIO L&S | Revisión parcial documentos liquidacíon, |
| CINGE-INV-5053-0301-25 | 2025-12-24 | CONSORCIO PROVIDENCIA | MEJORAMIENT |
| CING-INV-5053-0302-25 | 2025-12-26 | CONSORCIO L&S | Solicitud documentos faltantes informe final del Componente Social |
| CINGE-INV-5053-0303-25 | 2025-12-26 | CONSORCIO PROVIDENCIA | Atención PQRS pago prestación de servicios de mano de obra |
| CINGE-INV-5053-0304-25 | 2025-12-26 | CONSORCIO PROVIDENCIA | Respuesta PQRS Pago liquidación laboral personal Consorcio Providencia |
| CINGE-INV-5053-0305-25 | 2025-12-26 | CONSORCIO PROVIDENCIA | Solicitud respuesta PQRS pago liquidación laboral Consorcio Providencia |

Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2025

Ingeniero
**EMIRO CARLOS BARGUIL**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Solicitud respuesta PQRS pago liquidación laboral Consorcio Providencia**

Por medio de la presente se informa que se recibió a través de correo electrónico una (1) PQRS, a nombre de la señora **ELIZABETH AGAMEZ ROZO**, identificada con CC No. 1.133.814.120, dirigida al Consorcio Providencia, en la que solicita el pago de liquidación laboral por su vinculación como Controladora Vial desde el 01 de febrero de 2025 hasta 25 de octubre de 2025, por lo que se insta revisar y atender el caso a la mayor brevedad.

Desde la interventoría se estará realizando el debido seguimiento al cumplimiento de este compromiso, toda vez que es un llamado a proceder de acuerdo con la legislación laboral colombiana que protege los derechos del empleado, garantizando que reciba el pago de todas las obligaciones que se generaron durante el contrato de trabajo.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2025

Ingeniero
**EMIRO CARLOS BARGUIL**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Solicitud respuesta PQRS Pago liquidación laboral personal Consorcio Providencia**

Por medio de la presente se informa que se recibió a través de correo electrónico una (1) PQRS, a nombre de la señora **GLADYS HERNÁNDEZ TRUJILLO**, identificada con CC No. 1.067.293.235, dirigida al Consorcio Providencia, en la que solicita el pago de liquidación laboral por su vinculación como Controladora Vial desde el 01 de febrero de 2025 hasta 30 de septiembre de 2025, por lo que se insta revisar y atender el caso a la mayor brevedad.

Desde la interventoría se estará realizando el debido seguimiento al cumplimiento de este compromiso, toda vez que es un llamado a proceder de acuerdo con la legislación laboral colombiana que protege los derechos del empleado, garantizando que reciba el pago de todas las obligaciones que se generaron durante el contrato de trabajo.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2025

Ingeniero
**EMIRO CARLOS BARGUIL**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Atención PQRS pago prestación de servicios de mano de obra.**

Por medio de la presente, se informa que se recibió a través de la alcaldía municipal de Planeta Rica – Córdoba, una (1) PQRS dirigida al proyecto **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** del **CONSORCIO PROVIDENCIA,** solicitando el pago de una deuda por concepto de prestación de servicios de mano de obra a nombre del señor Jhon Luis Almario Julio, identificado con cédula de ciudadana No. 15.669.981 de Planeta Rica – Córdoba.

Por lo anterior, se solita al Consorcio Providencia – Planeta Rica, revisar y notificar al interesado fecha y/o acuerdos de pago de dicho servicio prestado.

Se anexa solicitud recibida por parte de la persona antes mencionada.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**
cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**HABIB CHAAR SAKS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO L&S**

Referencia: Contrato de obra No. LP -MSBV – 008 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Solicitud documentos faltantes informe final del Componente Social**

Respetado Ingeniero,

Teniendo en cuenta que el proyecto "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, se encuentra ejecutado y en proceso de liquidación, se requiere complementar los documentos del informe final social enviado por el contratista a través de correo electrónico el dia 16 de diciembre de 2025, ya que fue revisado pero hacen falta los siguientes documentos:

1. Acta de socialización de cierre del proyecto, con sus respectivo anexo fotográfico y listado de asistencia.
2. Certificado paz y salvo personería municipal
3. Actas de vecindad de cierre

Favor enviar los documentos a la mayor brevedad, ya que se requiere dar celeridad al proceso de liquidación del contrato.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**
cc. Ing. Luis Torres Hernández - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Revisión reprogramación de obra de acuerdo a prórroga #5.**

Cordial saludo,

De conformidad con el seguimiento que se viene realizando a la ejecución del proyecto relacionado en la referencia, y una vez revisada la información suministrada mediante correo electrónico el dia 23 de diciembre 2025, se establece lo siguiente:

- La información presentada en la reprogramación de obra, respecto al tramo de pavimento rígido pendiente por ejecutar, no corresponde con la realidad de la ejecución. Se evidencia que aún faltan dos tramos por intervenir, los cuales requieren previamente la construcción de obras hidráulicas y el levantamiento de banca. En consecuencia, se solicita ajustar la programación a la situación real del proyecto o indicar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta.

- En la reprogramación se describe la ejecución de todas las actividades pendientes en los tramos 1 y 2, tales como la terminación de rellenos laterales con su respectiva compactación y la construcción de empedrados en los puntos requeridos. Se solicita ajustar esta información a la realidad del proyecto y cuantificar para cumplir con la meta física dentro del plazo contractual.

- Se requiere verificar la programación de la intervención del boxculvert 3x3, dado que los tiempos planteados no corresponden con la realidad de

ejecución. En consecuencia, se solicita ajustar la programación a las condiciones reales del proyecto.

- Tener presente en el documento a presentar, que la prórroga No. 5 del contrato de obra se encuentra vigente hasta el día 27 de enero de 2026.

- La reprogramación de obra debe contener información veraz y ajustada a la ejecución real, disponiendo el consorcio Providencia de los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, a fin de cumplir con la programación y adoptar medidas inmediatas de contingencia que permitan mitigar el atraso y alcanzar las metas físicas dentro del plazo contractual (27 de enero de 2026).

- El flujo de caja propuesto debe corresponder a los plazos y rendimientos descritos en la reprogramación, teniendo en cuenta que el proyecto no admite holguras en la ejecución de actividades. De acuerdo con la estandarización semanal, los plazos actuales no serían cumplidos. Por lo tanto, se solicita aplicar un plan de acción realista que permita disminuir el atraso y garantizar la terminación del tramo dentro del tiempo establecido.

Se solicita de manera urgente que la reprogramación de obra sea ajustada y presentada con información veraz y acorde a la realidad del proyecto. Este documento resulta indispensable para efectuar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución, así como para adoptar las medidas de control necesarias que permitan garantizar el cumplimiento de las metas físicas dentro del plazo contractual. La falta de una programación clara y actualizada impide realizar un seguimiento efectivo y compromete la planeación de las actividades, por lo cual se requiere su entrega inmediata. Se aclara que toda demora presentada será de entera responsabilidad del contratista de obra.

Finalmente, se solicita la entrega del balance del contrato con el fin de verificar y validar el cumplimiento de la meta física del mismo.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**HABIB CHAAR SAKS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO L&S**

Referencia: Contrato de obra No. LP -MSBV – 008 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Revisión parcial documentos liquidación**

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente se realizan observaciones a la documentación remitida mediante correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2025:

1. Liquidación contrato de fiducia: No fue posible abrir el archivo denominado 1. Monteria_318977_CONSORCIO L&S_Rendicion Final, requiere contraseña. Por lo cual no se puede validar la información.
2. Devolución rendimientos: Se presentan los soportes de transferencia de cuatro meses, correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, asi como la certificación de rendimientos expedida por la fiduciaria, se remitirá esta información a la Subdirección Financiera del INVIAS, sin embargo, se requieren los extractos bancarios para corroborar que la información sea consistente con lo presentado en la cuenta.
3. Planos Record: Se presenta un archivo en autocad, contiene un trazado vial, sin embargo el archivo carece de información, dentro de lo aportado se debe entregar entre otros:

**a. Requisitos generales del plano récord**

**Identificación del proyecto**

- Nombre oficial del proyecto (según contrato).
- Número de contrato y año.
- Tramo vial (origen – destino).
- Departamento y municipio(s).
- Longitud total del tramo intervenido.
- Convenio asocido

**Entidad y responsables**

- Entidad contratante.
- Nombre del contratista.
- Nombre del interventor.
- Firmas y matrículas profesionales:
  - Ingeniero responsable de la obra.
  - Ingeniero responsable de la elaboración de los planos récord.
  - Interventoría.

**Fecha**

- Fecha de elaboración del plano récord.
- Fecha de terminación de obra.

**b. Normas técnicas y referencia**

- Indicar explícitamente:
  - Normas INVIAS vigentes.
  - Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS.
  - Manual de Drenaje INVIAS.
  - Manual de Señalización Vial vigente.
- Sistema de coordenadas oficial:
  - **MAGNA-SIRGAS** (obligatorio).

**c. Información geométrica obligatoria**

- **Alineamiento horizontal**
  - Ejes definitivos construidos.
  - Radios reales de curvas.
  - Tangentes y espirales.
  - Progresivas iniciales y finales reales.
- **Alineamiento vertical**
  - Rasantes finales construidas.
  - Pendientes reales.
  - Curvas verticales (longitud y tipo).
  - Cotas finales de rasante.
- **Secciones transversales**

Anchos reales de:

- Calzada.
- Boca calles
- Bordillos

Pendientes transversales reales.

**d. Estructura del pavimento**

- Tipo de pavimento ejecutado.
- Espesores reales de cada capa:
  - Subrasante mejorada (si aplica).
  - Subbase.
  - Losa de concreto.
- Materiales usados (según especificaciones INVIAS).
- Atención de fallos
- Cambios respecto al diseño original (debidamente reflejados).

**e. Obras de drenaje**

1. **Drenaje longitudinal**
   - Filtros y zanjas drenantes.
2. **Drenaje transversal**
   - Box culvert
     - Diámetro o dimensiones reales.
     - Longitud total.
     - Cotas de entrada y salida.
     - Materiales usados (según especificaciones INVIAS).

**f. Señalización y seguridad vial**

1. **Señalización horizontal**
   - Líneas centrales, de borde, cebras, flechas.
   - Anchos y tipos de pintura.
2. **Señalización vertical**
   - Tipo de señales.
   - Ubicación por progresiva.
   - Lado de la vía.

**g. Presentación del plano**

- Escalas adecuadas (según tipo de plano).

- Norte gráfico.
- Cuadro de convenciones.
- Cuadro de revisiones.
- Numeración de planos.

Favor enviar los documentos a la mayor brevedad, ya que se requiere dar celeridad al proceso de liquidación del contrato.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**
cc. Ing. Luis Torres Hernández - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

Ing.
**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**
Subdirectora de Sostenibilidad
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogotá, D.C - Colombia

Referencia: Contrato de interventoría No. LP 5053 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1"

Asunto: **Remisión informe trimestral No 7 del Componente Social**

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales del contrato de referencia, esta interventoría remite el informe trimestral No 07 del componente social, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 22 de octubre de 2025 del siguiente contrato:

- Contrato No 159-2023 (Municipio de Planeta Rica)

Por último, esta interventoría remite link para descargar los informes del componente social de los respectivos periodos en mención.

https://drive.google.com/drive/folders/1_xJQu-_OAehAKvVGu-W88KFKE2qUvgGU?usp=sharing

Nota aclaratoria: Los proyectos de los frentes de obra de Los Córdobas y San Bernardo del Viento, finalizaron 31 de mayo de 2025, por tanto, no se reporta trimestral de los mismos.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**
CC. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Anexo. Lo enunciado

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**CESAR AUGUSTO RÍOS**
Representante legal
**CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA**

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Revisión balance final de obra.**

De acuerdo a correo electrónico recibido el dia 12 de diciembre de 2025, y una vez revisado el documento Balance final de obra, se puede manifestar lo siguiente:

1. Para el ítem de excavaciones varias sin clasificar, el resultado de las cantidades debe estar redondeado a dos decimales. La cantidad a modificar es mayor, por lo tanto, en la columna de mayores y menores debe estar sumando, y actualmente aparece en negativo. Las carteras topográficas deben ser revisadas y aprobadas por el topógrafo de Interventoria. No se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente "siete vueltas". La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir.

2. Para el ítem de Conformación de la calzada existente, no se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente "siete vueltas". La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir.

3. Para el ítem de Subbase granular clase C, no se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente "siete vueltas". La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir.

4. Para el ítem de afirmado (material para mejoramiento), no se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente “siete vueltas”. La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir y coincidir con la estructura del pavimento.

5. Para el ítem de Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 38 Mpa, no se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente “siete vueltas”. La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir.

6. Para el ítem de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS, no se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente “siete vueltas”. La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir. En la memoria de cálculo, se debe aclarar a qué lado corresponden las cantidades (izquierdo y derecho). Se debe realizar descuentos en bocacalles y demás elementos.

7. Para el ítem de Acero de Refuerzo Fy 4200 Kg/cm2, la cantidad a modificar es menor, por lo tanto, en la columna de mayores y menores debe estar restando, y actualmente aparece sumando. La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir. En la memoria de cálculo de las bermacunetas, se debe aclarar a qué lado corresponden las cantidades (izquierdo y derecho).

8. Para el ítem de Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m), deben incluir la memoria de cálculo con las cantidades en negativo para poder restarlas en el balance de obra actual.

9. Para el ítem de Señal Vertical de Transito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm, deben incluir la memoria de cálculo con las cantidades en negativo para poder restarlas en el balance de obra actual.

10. Para el ítem de Línea de demarcación con pintura en frio, la descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo del pavimento rígido, se debe corregir.

11. Para el ítem de terraplenes, no se tienen en cuenta las transiciones ubicadas en el puente “siete vueltas”. La descripción de los tramos donde se especifican las abscisas intervenidas, no coincide con la longitud descrita en la memoria de cálculo, se debe corregir y coincidir con la estructura del pavimento.

12. Para el ítem de Señal Vertical de Transito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (60 x 60) cm, deben incluir la memoria de cálculo, incluyendo las abscisas correspondientes donde se instalaron, para tener claridad de las cantidades. De igual manera corregir la cantidad, debido a que, en recorrido técnico de Interventoria realizado por los tramos intervenidos, se pudo constatar que en el tramo I aparecen 39 señales, divididas así, sector antes del puente existen 16 señales y en el sector después del puente existen 23 señales; y, en el tramo II existen 7 señales instaladas, para un total de 46 señales instaladas, lo cual deben corregir.

13. En el cuadro del balance de obra, en la columna financiera de mayores y menores cantidades, actualmente les arroja un valor de $ 172.071.910,00 y realmente el valor total que debe tener es $217.374.756,00 lo cual deben corregir.

14. Se debe actualizar las causales de la modificación, que correspondan a las necesidades del contrato de obra, lo cual deben corregir.

15. Los otros documentos que enviaron en el correo electrónico, los cuales llevan por nombre: Acta final, acta numérica final y cert interv acta final, deben adjuntarlos nuevamente corregidos, cuando realicen la subsanación de todas las observaciones descritas en el balance final de obra.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Solicitud reprogramación de obra de acuerdo a solicitud de prórroga #5.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría para el desarrollo del contrato referenciado, y de acuerdo a la solicitud de prórroga #5 por 45 dias, se solicita hacer entrega de la reprogramación de obra a más tardar el dia 17 de diciembre de 2025, con el fin de hacer seguimiento semanal de las actividades a ejecutar y llevar un control financiero del proyecto.

Cordialmente,



**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Solicitud actualización de pólizas de acuerdo a reinicio N°2.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría para el desarrollo del contrato referenciado, y de acuerdo al reinicio #2 a partir del dia 5 de diciembre de 2025, se solicita presentar la actualización de pólizas de acuerdo a las nuevas vigencias establecidas, de igual manera, gestionar ante el municipio la resolución de aprobación, con el fin de garantizar que todas las partes involucradas en el contrato de obra estén protegidas adecuadamente y que el proyecto se complete de manera segura y conforme a los términos acordados. .

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025

Ingeniero
**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Solicitud de evaluación hidráulica para instalación de filtros.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en la abscisa K5+900 se proyecta la construcción de un box culvert de 3x3, se reitera la solicitud de evaluar con su especialista hidráulico, la instalación de filtros en el tramo a cada lado de la vía, dicho sector presenta una pendiente pronunciada desde la abscisa K5+900 hacia menores, lo cual genera escorrentías que requieren una solución técnica para su adecuada evacuación. Esta medida busca garantizar la estabilidad y funcionalidad de la estructura del pavimento rígido MR38 a construir.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C, 10 de diciembre de 2025

Ingeniero
**EMIRO CARLOS BARGUIL**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO PROVIDENCIA**
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Respuesta comunicados OFI-CONS-115-2025 y OFI-CONS-129-2025 (informe mes de septiembre y octubre de 2025 del componente social)**

Estimado ingeniero,

En atención a los comunicados OFI-CONS-115-2025 y OFI-CONS-129-2025 (*informe mes de septiembre y octubre de 2025 del componente social)*, nos permitimos emitir la aprobación de los documentos de referencia, toda vez que la información se diligenció en los formatos indicados y de manera adecuada con los anexos correspondientes.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C, 03 de diciembre de 2025

Arquitecto
**DAVID ROJAS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO L&S**
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP -MSBV – 008 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta comunicado del 1 de diciembre de 2025. Acta Recibo parcial No. 6.**

En atención al comunicado de la referencia se da aval al acta de recibo parcial No. 6 correspondiente al periodo de enero – abril de 2025, para que continue su trámite frente a la entidad.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**Representante Legal**

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | | |
|---|---|---|---|
| **Cons.** | **Fecha** | **Asunto** | **Entidad** |
| 2025S-VBOG-093782 | 2025-12-05 | Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-059633 CI 5053 2023 CO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| 2025S-VCOR-86838 | 2025-12-09 | Reiteración presentación de actas de costos interventoría contr | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| OFI-CONS-136-2025 | 2025-12-11 | ENTREGA DISEÑO SEÑALIZACION | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-137-2025 | 2025-12-11 | Informe del componente social mes de noviembre del 2025 | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-137-2025 | 2025-12-17 | Solicitud pago de liquidación laboral | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-138-2025 | 2025-12-17 | Solicitud pago de liquidación laboral | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-139-2025 | 2025-12-17 | Solicitud de pagos pendientes por concepto de prestación de se | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-140-2025 | 2025-12-19 | ENTREGA INFORME FIDEICOMISO | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-143-2025 | 2025-12-27 | SUBSANACION PLANOS MURO DE CONTENCION | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-146-2025 | 2025-12-29 | PAZ Y SALVO PAOLA PACHECO | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-147-2025 | 2025-12-29 | PAZ Y SALVO LUISA SIERRA | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| OFI-CONS-148-2025 | 2025-12-29 | SOPORTE DE PAGO PLANILLAS DE SEGURIDAD | CONSORCIO PROVIDENCIA |

29-12-25 [illegible]

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba. 29 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-148-2025**

Señor(es):
**CONSORCIO INGECON - INCO**
**ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: SOPORTE DE PAGO PLANILLAS DE SEGURIDAD**

Estimados Señores,

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, remitir soportes de pago de planillas de seguridad de los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO
Fecha: 29-12-25 Hora 9:03
No. de folios: 5
Firma:
El recibido de esta comunicación no implica su aceptación

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi

Banco de Bogotá

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901784629 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CL 87 -5-48 | TELEFONO: | 7515984 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 11130038163 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO | 2025 |
| DIAS DE MORA: | | 46 | | | |
| FECHA PAGO (dia/mm/dd): | | 2025/12/05 | NÚMERO AUTORIZACION: | | 231502500 |

**TOTAL APORTES A PENSION**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMP. EADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 341.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.400 | $ 0 | $ 341.700 | $ 10.400 | $ 352.100 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 6 | $ 1.252.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37.900 | $ 0 | $ 1.252.800 | $ 37.900 | $ 1.290.600 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 11 | $ 2.415.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72.900 | $ 0 | $ 2.415.600 | $ 72.900 | $ 2.488.700 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.900 | $ 0 | $ 227.800 | $ 6.900 | $ 234.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 4.238.100 | $ 128.100 | $ 4.366.300 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACION COTIZACION | LIQUIDACION VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 979.000 | $ 0 | $ 29.800 | $ 0 | $ 979.000 | $ 29.800 | $ 0 | $ 1.008.800 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 5.400 | $ 0 | $ 178.000 | $ 5.400 | $ 0 | $ 183.400 |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 8 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.370.600 | $ 0 | $ 41.400 | $ 0 | $ 1.370.600 | $ 41.400 | $ 0 | $ 1.412.000 |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 7.600 | $ 0 | $ 250.000 | $ 7.600 | $ 0 | $ 257.600 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 267.000 | $ 0 | $ 8.100 | $ 0 | $ 267.000 | $ 8.100 | $ 0 | $ 275.100 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 267.000 | $ 0 | $ 8.100 | $ 0 | $ 267.000 | $ 8.100 | $ 0 | $ 275.100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 3.311.600 | $ 100.200 | $ 0 | $ 3.411.800 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACION COTIZACION | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 30 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.843.900 | $ 1.843.900 | $ 55.700 | $ 0 | $ 1.899.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 1.843.900 | $ 55.700 | $ 0 | $ 1.899.600 |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 30 | $ 1.060.400 | $ 32.000 | $ 1.092.400 |
| SUBTOTALES: | | | $ 1.060.400 | $ 32.000 | $ 1.092.400 |

**TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAICRF | PAICRF - ICRF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 20 | $ 785.100 | $ 34.100 | $ 820.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 12 | $ 330.800 | $ 10.000 | $ 340.800 |
| SUBTOTALES: | | | $ 1.128.900 | $ 34.100 | $ 1.167.000 |

**LIQUIDACION DETALLADA APORTES**

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES COLOMBIANO | EXTRANJERO | TRASLADO TRANSITORIA | IGE | IRET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | CCF | DIAS COT | IBC | ADMIN | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP - MINSDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1003190690 | LANDRANG FONTRADA MELISSA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1003576883 | MEDINA CUARTERO CARLOS ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1003100530 | BARMEN O ESPED JOSE ANTONIO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1064190182 | BRAVO ARROYO EJIFRAY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1006720582 | PEQUENO PRADO ROGEN ARLEY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1062827747 | SERNA MORENO YEISIS ALBERTO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC24-COOSALUD ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1006743022 | ROMERO PARRA NATALIA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACION: | NIT | NUMERO DE IDENTIFICACION: | 901784829 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCION: | CL 67 -5-10 | TELEFONO: | 7515984 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACION: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 11133038163 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 48 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/12/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 297502600 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

#### DATOS DEL COTIZANTE

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CC 10687181362 | HOYOS HERNANDEZ EDUARDO EDOUARDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 9 | CC 1068748321 | ALVAREZ NOJRA DANILZA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 10 | CC 1068748540 | SANJ HOYOS MARIA CAMILA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 11 | CC 1002750079 | CARRASCAL ESPICA ANGIE DANILZA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 12 | CC 1067850079 | HERNANDEZ GOMEZ JORGE LUIS | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 13 | CC 1067828146 | MENDEZ RUIZ ALVARO JOSE | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 14 | CC 1118704 | CAYOLA PRADO LUIS EMILCE | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 15 | CC 1130814128 | ALVAREZ HOYO ELIZABETH | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 16 | CC 1129875016 | ACOSTA GONZALEZ ESTEFANIA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 17 | CC 15667899 | OSORIO ARROYO JUAN ANTONIO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 18 | CC 15877277 | PUERTO ORTIZ JOSE RICARDO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | NO |
| 19 | CC 15877822 | TRUJILLO BARAT ROBERT EMIRO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |
| 20 | CC 7874877 | SALCEDO LOPEZ ALBERTO SEGUNDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO |

#### NOVEDADES

| N° | RET | TDE | TAE | TDP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 01 | | | | | | | | | | | | |

#### SEGURIDAD SOCIAL

##### PENSIÓN

| N° | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 9 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 10 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 11 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 12 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 13 | 230301-PORVENIR | 15 | $ 711.750 | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 113.900 |
| 14 | 230201-PROTECCION | 15 | $ 711.750 | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 113.900 |
| 15 | 230301-PORVENIR | 21 | $ 996.450 | $ 159.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 159.500 |
| 16 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 17 | 25-14 COLPENSIONES | 15 | $ 711.750 | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 113.900 |
| 18 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 |
| 19 | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 20 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |

##### SALUD

| N° | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 9 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 10 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 11 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 12 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 13 | EPS002-SALUD TOTAL | 15 | $ 711.750 | $ 89.000 | $ 0 | $ 89.000 |
| 14 | ESSC24-COOSALUD ESS | 15 | $ 711.750 | $ 89.000 | $ 0 | $ 89.000 |
| 15 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 21 | $ 996.450 | $ 124.600 | $ 0 | $ 124.600 |
| 16 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 17 | EPS037-NUEVA EPS | 15 | $ 711.750 | $ 89.000 | $ 0 | $ 89.000 |
| 18 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 |
| 19 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |
| 20 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 |

##### ARP

| N° | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 9 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 10 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 11 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 12 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 13 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 5612002 | $ 49.800 |
| 14 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 5612002 | $ 49.800 |
| 15 | 14-11 - ARL SURA | 21 | $ 996.450 | 5612002 | $ 69.400 |
| 16 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 17 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 5612002 | $ 49.800 |
| 18 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 5612002 | $ 139.200 |
| 19 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |
| 20 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 |

#### PARAFISCALES

| N° | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | $ 711.750 | CCF16-COMFACOR | $ 28.500 | $ 14.300 | $ 21.400 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | $ 711.750 | CCF16-COMFACOR | $ 28.500 | $ 0 | $ 21.400 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | $ 996.450 | CCF16-COMFACOR | $ 39.900 | $ 20.000 | $ 29.900 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | $ 1.423.500 | CCF18-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | $ 711.750 | CCF16-COMFACOR | $ 28.500 | $ 0 | $ 21.400 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | $ 2.000.000 | CCF16-COMFACOR | $ 80.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 11.931.100**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Bogotá

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901784629 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CL 67 -6-40 | TELÉFONO: | 7815894 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 1113029946 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES noviembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 20 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2815054003 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14-COLPENSIONES | 5 | $ 698.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.800 | $ 0 | $ 698.600 | $ 8.800 | $ 707.400 |
| 230201 | 230201-PROTECCION | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.900 | $ 0 | $ 227.800 | $ 2.900 | $ 230.700 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 0 | $ 1.117.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.100 | $ 0 | $ 1.117.400 | $ 14.100 | $ 1.131.500 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.900 | $ 0 | $ 227.800 | $ 2.900 | $ 230.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 2.271.600 | $ 28.700 | $ 2.300.300 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 2.300 | $ 0 | $ 178.000 | $ 2.300 | $ 0 | $ 180.300 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 403.600 | $ 0 | $ 5.100 | $ 0 | $ 403.600 | $ 5.100 | $ 0 | $ 408.700 |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 3.200 | $ 0 | $ 250.000 | $ 3.200 | $ 0 | $ 253.200 |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL ESS | 7 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 730.000 | $ 0 | $ 9.200 | $ 0 | $ 730.000 | $ 9.200 | $ 0 | $ 739.200 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 500 | $ 0 | $ 35.600 | $ 500 | $ 0 | $ 36.100 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 2.300 | $ 0 | $ 178.000 | $ 2.300 | $ 0 | $ 180.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 1.775.200 | $ 22.600 | $ 0 | $ 1.797.800 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 18 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 988.800 | $ 988.800 | $ 12.500 | $ 0 | $ 1.001.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 988.800 | $ 12.500 | $ 0 | $ 1.001.300 |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF18 | CCF18-COMFACOR | 16 | $ 568.300 | $ 7.200 | $ 575.500 |
| SUBTOTALES: | | | $ 568.300 | $ 7.200 | $ 575.500 |

**TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES**

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16 | $ 427.100 | $ 5.400 | $ 432.500 |
| PASENA | PASENA - SENA | 10 | $ 218.700 | $ 2.800 | $ 221.500 |
| SUBTOTALES: | | | $ 645.800 | $ 8.200 | $ 654.000 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1003190600 | LAMBRANO LOZADA [illegible] | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC 1003073083 | SEGOVIA QUINTERO CARELIS ALEJANDRA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC 1032100633 | SARMIENTO ESPEJO JOSE ANTONIO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC 1054100282 | BRAVO ARROYO ELFRAY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC 1065720522 | REQUENE PRADO ROGER APOLINAR | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC 1065720747 | SIERRA MORENO JESUS ALBERTO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC 1006749822 | TORRES PALMA NAYLER JOSE | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | | 01 | | | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

| Nº | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 2 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 3 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 4 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 47.450 | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 7.600 |
| 5 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 47.450 | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 7.600 |
| 6 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 |
| 7 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 47.450 | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 7.600 |

SALUD / ARP

| Nº | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 98.100 |
| 2 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 98.100 |
| 3 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 98.100 |
| 4 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 47.450 | $ 6.000 | $ 0 | $ 6.000 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 5812002 | $ 3.400 |
| 5 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 47.450 | $ 6.000 | $ 0 | $ 6.000 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 5812002 | $ 3.400 |
| 6 | ESSC24-COOSALUD ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5812002 | $ 99.100 |
| 7 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 47.450 | $ 6.000 | $ 0 | $ 6.000 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 5812002 | $ 3.400 |

PARAFISCALES

| Nº | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | 1 | $ 47.450 | CCF16-COMFACOR | $ 1.900 | $ 0 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | 1 | $ 47.450 | CCF18-COMFACOR | $ 1.900 | $ 0 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | 1 | $ 47.450 | CCF18-COMFACOR | $ 1.900 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soiler

Banco de Bogotá

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901764829 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO PROVIDENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CL 67 -5-40 | TELEFONO: | 7615895 |
| TIPO APORTANTE: | 03-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 111302984 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES noviembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 20 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 2310054000 |

**LIQUIDACION DETALLADA APORTES**

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | INGRESO TRASLADO | NOVEDADES: VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | SEGURIDAD SOCIAL: TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: CCF: DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CC 1067461036 | HOYOS HERNANDEZ EDUARDO SEGUNDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 8 | $ 284.700 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 45.600 | EPS037-NUEVA EPS | 8 | $ 284.700 | $ 35.600 | $ 0 | $ 35.600 | 14-11 - ARL SURA | 8 | $ 284.700 | 5612002 | $ 19.900 | 8 | $ 284.700 | CCF16-COMFACOR | $ 11.400 | $ 5.700 | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1068746921 | ALVAREZ ACUÑA DANIELA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 8 | $ 284.700 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 45.600 | EPS052-SALUD TOTAL | 8 | $ 284.700 | $ 35.600 | $ 0 | $ 35.600 | 14-11 - ARL SURA | 8 | $ 284.700 | 5612002 | $ 19.900 | 8 | $ 284.700 | CCF16-COMFACOR | $ 11.400 | $ 0 | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1068746840 | TANO HOYOS MARIA CAMILA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1068750876 | BARRASCAL OCHOA ANGIE DANIELA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESS C07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1007885784 | HERNANDEZ GOMEZ JORGE LUIS | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 1 | $ 47.450 | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 7.600 | ESS C07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 47.450 | $ 6.000 | $ 0 | $ 6.000 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 5612002 | $ 3.400 | 1 | $ 47.450 | CCF16-COMFACOR | $ 1.900 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1138074013 | ACOSTA GONZALEZ LUTEPHIA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 25-1 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESS C07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 15077277 | RUIZ HOYOS JOSE RICARDO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | MUTUAL SER EPS-R | 30 | $ 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 5612002 | $ 139.200 | 30 | $ 2.000.000 | CCF16-COMFACOR | $ 80.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 25970822 | TRIGUEROS NAVAS ROBERT YAIRO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23-1001-COLFONDOS | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESS C07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5612002 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF16-COMFACOR | $ 57.000 | $ 0 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 78748872 | SALCEDO LOPEZ ALBERTO EDUARDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | 23C301-PORVENIR | 1 | $ 47.450 | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 7.600 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 47.450 | $ 6.000 | $ 0 | $ 6.000 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 5612002 | $ 3.400 | 1 | $ 47.450 | CCF16-COMFACOR | $ 1.900 | $ 0 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 6.328.900**

29-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba. 29 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-147-2025**

Señor(es):
**CONSORCIO INGECON - INCO**
**ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: PAZ Y SALVO LUISA SIERRA**

Estimados Señores,

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, remitir paz y salvo de la señora LUISA SIERRA.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 29-12-25 Hora: 9:02
No. de folios: 2
Firma:
El recibido de esta devolución no implica su aceptación

**DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.**
**E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com**
**TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274**
**PLANETA RICA, CÓRDOBA.**

# PAZ Y SALVO

El suscrito Luisa Fernanda Sierra, identificado con cedula de ciudadanía No. 1066779677 de Planeta Rica Cor., declaro que he recibido de la empresa **CONSORCIO PROVIDENCIA** con **NIT: 901923200-6** los valores correspondientes al pago de Salarios, liquidaciones, prestaciones sociales, dotaciones, horas extras y todo lo demás relacionados a conceptos laborales.

Por lo consiguiente, declaro que la empresa **CONSORCIO PROVIDENCIA**, se encuentra a paz y salvo, por todo concepto y me comprometo a no adelantar acciones jurídicas, ni reclamaciones administrativas de ningún género contra de ellos.

En constancia se firma a los 24 días del mes de diciembre del año 2025 en Planeta rica, Córdoba.

Luisa Sierra.
**EMPLEADO**

**EMIRO BARGUIL**
**EMPLEADOR**

29-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba. 29 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-146-2025**

Señor(es):
**CONSORCIO INGECON - INCO**
**ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: PAZ Y SALVO PAOLA PACHECO**

Estimados Señores,

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, remitir paz y salvo de la señora PAOLA PACHECO.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 29 - 12 - 25 Hora: 7:57
No. de folios: 2
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

# PAZ Y SALVO

El suscrito Paola Pacheco G., identificado con cedula de ciudadanía No. 1066726169 de Planeta Rica, declaro que he recibido de la empresa **CONSORCIO PROVIDENCIA** con **NIT: 901923200-6** los valores correspondientes al pago de Salarios, liquidaciones, prestaciones sociales, dotaciones, horas extras y todo lo demás relacionados a conceptos laborales.

Por lo consiguiente, declaro que la empresa **CONSORCIO PROVIDENCIA**, se encuentra a paz y salvo, por todo concepto y me comprometo a no adelantar acciones jurídicas, ni reclamaciones administrativas de ningún género contra de ellos.

En constancia se firma a los 24 días del mes de Diciembre del año 2025 en Planeta rica, Córdoba.

**EMPLEADO**

**EMIRO BARGUIL**
**EMPLEADOR**

27-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba. 27 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-143-2025**

Señor(es):
**CONSORCIO INGECON - INCO**
**ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: SUBSANACIÓN PLANOS MURO DE CONTENCIÓN**

Estimados Señores,

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, remitir la siguiente documentación para su revisión y aprobación:

- Planos diseño estructural MURO DE CONTENCIÓN.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO
Fecha: 27-12-25 Hora: 7:52
No. de folios: 5
Firma:
El contenido de este documento no implica su aprobación

**DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.**
**E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com**
**TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274**
**PLANETA RICA, CÓRDOBA.**

## NOTAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DEL PROYECTO:


EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO DE UN BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO.
EL BOX TIENE UNA SECCION HIDRAULICA DE UNA CELDA DE 2.50x2.50m
Y UNA LONGITUD DE 6.00m, UBICACION: BUJATO

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:


- NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES LRFD-CCP14

CARGAS DE DISEÑO:


- "CAMION DE DISEÑO: CC-1-4"




- "LINEA DE CARGA"




- "TANDEM"




SOLICITACIONES A INCORPORAR EN EL DISEÑO

DC: COMPONENTES Y ACCESORIOS.
DW: SUPERFICIE DE RODADURA E INSTALACIONES.
EQ: CARGAS SISMICA.
IM: CARGAS DINAMICA VEHICULAR.
LL: CARGAS VEHICULAR

COMBINACIONES DE CARGA:

SE ESTABLECEN DE ACUERDO A LA TABLA 3.4.1-1 (CCP14)

METODO DE DISEÑO:

COMO LO DEMANDA LA NORMA CCP14, SE EJECUTARON LOS ANALISIS PARA CADA UNA DE LAS ANTERIORES COMBINACIONES CON BASE A LOS FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA. MEETODO LRFD. CON ESTOS PARAMETROS SE EFECTUO EL CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PROYECTO.

ESFUERZOS EN LOS ELEMENTOS:

LOS ESFUERZOS ULTIMOS ESTAN EN CONCORDANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA TODOS LOS ELEMENTOS, EN RAZON A LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE CONFORMAN LOS ELEMENTOS MOSTRADOS EN LOS PLANOS.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS:
EL CONCRETO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DISEÑADOS DEBE CORRESPONDER A LAS RESISTENCIAS ESPECIFICADAS A LOS 28 DIAS DE EDAD DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

BOX Y ALETAS INCLUIDA SOLERAS: CLASE C: f'c=280 Kg/cm2
LIMPIEZA, CICLOPEOS: CLASE F: f'c=140 Kg/cm2

MODULOS DE ELASTICIDAD DE LOS CONCRETOS:
LOS ANALISIS Y CALCULOS FUERON REVISADOS PARA LOS MODULOS DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO PRESENTADOS A CONTINUACION:
CONCRETO CLASE C: f'c=280 Kg/cm2 E=209.165 Kg/cm2

RESISTENCIA DE LOS ACEROS:

BARRAS DE ACERO ASTM A706: fy= 420 MPa

NOTAS GENERALES:

1- En las cantidades de acero no se incluyen desperdicios, ni traslapes adicionales a los indicados en los diagramas para figuración
2- En la Dosificación de mezcla la relación Agua y cemento debe ser menor a 0.49 El tamaño del Agregado Grueso 19mm Contenido mínimo cemento 360 kg/m3

LONGITUD DE TRASLAPOS Y GANCHOS

| DESIGNACIÓN BARRA | LONGITUDES ld | Lg |
|---|---|---|
| 3/8 | 40 | 15 |
| 1/2 | 60 | 20 |
| 5/8 | 70 | 25 |
| 3/4 | 85 | 30 |
| 7/8 | 125 | 35 |

ld: Longitud de Desarrollo
Lg: Longitud de Gancho a 90° y 180°

## 1. GENERALIDADES

- Localización: Planeta Rica - Córdoba
- Zona de desempeño sísmica: 3
- Norma de Diseño y Construcción: Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14 - AASHTO - LRFD 2014
- Alcance: Diseño, construcción y control de calidad en concreto 28 MPa.

## 2. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO

2.1 CARGAS

Cargas Muertas.
Material de relleno: "SUBBASE"

Cargas Vivas:
Camión de diseño CCP14: 2x40 KN

2.2 CATEGORÍA OPERACIONAL
Zona de desempeño sísmica: 3

2.3 PARÁMETROS SÍSMICOS

Procedimiento de análisis sísmico: Procedimiento general
Perfil de suelo: D
Coeficiente de Aceleración [National Map Seismic, PGA=0.15
Coeficiente de Aceleración Horizontal, Se=0.36
Coeficiente de Aceleración Horizontal, S1=0.20
Coeficiente de Sitio Tectónico Corto, Fpga=1.60
Coeficiente de Sitio Tectónico Corto, Fv=1.80
Coeficiente de Sitio Tectónico Horizontal, Fv=2.00

2.4 CIMENTACIÓN

El Estrato de Cimentación del sistema propuesto consiste, principalmente a 0.50m de profundidad medido desde el nivel de terreno natural.

## 3. CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

- Las especificaciones de construcción serán preparadas por el contratista y aprobadas por la interventoría de obra.
- La calidad de la obra durante el proceso será responsabilidad del contratista.
- Deben verificarse las dimensiones, localizaciones y niveles con los planos Arquitectónicos.
- El diseñador estructural no se hace responsable por las modificaciones hechas por terceros sobre los planos estructurales. Únicamente los planos firmados por los profesionales responsables del diseño

### 3.1 CONCRETO REFORZADO

- La resistencia característica f'c del concreto se define como la resistencia a la compresión obtenida en cilindros estándar a una edad de 28 días.
- El concreto premezclado debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC4027.
- Los agregados deben cumplir con la Norma NTC 174.
- El tamaño máximo nominal del agregado no debe ser mayor a:
  1/5 de la menor dimensión entre los lados de la formaleta
  1/3 del espesor de la losa
  3/4 del espaciamiento libre entre barras de refuerzo
- Debe garantizarse la mayor compacidad del concreto fresco, proporcionado, vibrado y curado, procesos de curado de los elementos.
- No debe alterarse la relación Agua-cemento de la mezcla adicionando agua para mejorar su manejabilidad. No se podrá realizar ninguna que haya sido rechazada después de su respectiva toma.
- Debe mantenerse la responsabilidad del contratista durante todo el proceso para evitar los inconvenientes producidos por la pérdida y presencia de agua y el exceso de concreto por las condiciones climáticas (calor y temperaturas ambientales).
- Se recomiendan los siguientes procesos de curado durante el concreto:

| |
|---|
| Concreto con Cemento Tipo I, en climas con temperaturas ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo 7 días |
| Concreto con Cemento Tipo II, en climas con temperaturas ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo 14 días |
| Concreto con Cemento Tipo III, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo de 3 días |
| En concretos masivos elaborados con cemento de desarrollos lentos de resistencia, en climas con temperaturas ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo deberá cubrir un periodo mínimo de 2 a 3 semanas. |

- Todas las juntas de obra deberán ser aprobadas por el Diseñador Arquitectónico.
- Se recomienda el uso de Agua como puente de adherencia entre concretos de diferentes edades. La superficie del concreto existente se deberá humedecer por tres horas continuas antes de vaciar el nuevo concreto.
- Deben hacerse los controles mínimos de calidad al concreto según lo estipulado CCP-14

### 3.2 ACERO DE REFUERZO

- El acero de refuerzo debe estar libre de polvo, barro, aceite o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia entre el concreto y el acero.
-Deben usarse soportes o espaciadores para sostener las varillas o dijelas en los lugares correspondientes y garantizar el recubrimiento mínimo requerido. No se permite el uso de trozos de ladrillo, escombro, madera o piedras para este propósito.
- La separación mínima entre varillas individuales y paralelas, fuera de una zona de traslapo, debe ser inferior a 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso, y en todo caso no menor a 25 mm.
- Los empalmes de refuerzo se ejecutan por traslapo en las zonas indicadas en los planos de despiece. La longitud de desarrollo para los traslapos será:


RELACION AGUA CEMENTO

| Clase de concreto | Contenido mínimo de cemento | Máxima relación A/C | Contenido de aire: | Agregado grueso según AASHTO M 43 (ASTM D448) | Resistencia a la compresión a los 28 días |
|---|---|---|---|---|---|
| | kg/m3 | kg/kg | % | Tamaño de las abertura (mm) | Mpa |
| A | 360 | 0,49 | | 25 a 4.75 | 28 |
| A(AE) | 360 | 0,45 | 6.0 ± 1.5 | 25 a 4.75 | 28 |
| A | 307 | 0.58 | | 50 a 25 | 17 |
| B(AE) | 307 | 0.55 | 5.0 ± 1.5 | 25 a 4.75 | 17 |
| C | 390 | 0.49 | - | 12.5 a 4.75 | 28 |
| C(AE) | 390 | 0.45 | 7.0 ± 1.5 | 12.5 a 4.75 | 28 |
| P | 335 | 0.49 | como 28 se especifique en otra parte | 25 a 4.75 | como 28 se especifique en otra parte |
| P(FPG) | | | | 12 a 4.75 | |
| S | 390 | 0.58 | - | 25 a 4.75 | - |
| Liviano | 335 | Como se especifique en los documentos contractuales | | | |

CUADRO DE TRASLAPOS (m)

| | | | RESISTENCIA DEL CONCRETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| φ" | N° | φ(cm) | 21.0MPa | 24.5MPa | 28MPa |
| 1/4" | 2 | 0.64 | 0.40 | 0.35 | 0.40 |
| 3/8" | 3 | 0.95 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
| 1/2" | 4 | 1.27 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| 5/8" | 5 | 1.59 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 3/4" | 6 | 1.91 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| 7/8" | 7 | 2.22 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
| 1" | 8 | 2.54 | 1.80 | 1.70 | 1.60 |
| 1 1/4" | 10 | 3.22 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |

CUADRO DE GANCHOS CCP-14




| φ" | A(m) | B(m) | A+B(m) | A(m) | B(m) | A+B(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| 1/2" | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 0.14 | 0.20 |
| 5/8" | 0.20 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | 0.16 | 0.23 |
| 3/4" | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 0.08 | 0.21 | 0.29 |
| 7/8" | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 0.09 | 0.25 | 0.34 |
| 1" | 0.30 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.28 | 0.38 |
| 1 1/4" | 0.38 | 0.20 | 0.58 | 0.13 | 0.46 | 0.59 |

D=6 DIAMETROS DE LA BARRA PARA #3/8" HASTA 1"
D=8 DIAMETROS PARA 1 1/4"



CUADRO DE LONGITUDES DE DESARROLLO MINIMAS EN TRACCIÓN

| φ" | B(cm) | L(cm) |
|---|---|---|
| 1/4" | 5 | 12 |
| 3/8" | 5 | 18 |
| 1/2" | 6 | 24 |
| 5/8" | 5 | 30 |
| 3/4" | 5 | 36 |
| 7/8" | 5 | 42 |
| 1" | 5 | 48 |
| 1 1/4" | 6.5 | 60 |

ESC1:50

PLANO 1/4

COBAING

COBAING ASESORÍAS SAS
INGENIERÍA DE DISEÑOS

313 880 5703
MONTERÍA - CÓRDOBA
Sistemasyproyectos@cobaingasesorias.com
DIS IAGRAVA CONSORCIO AINGASESORAS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2390DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION CON PILAS

PROPIETARIO:
CONSORCIO PROVIDENCIA
Municipio: Planeta rica
Departamento: Córdoba

UBICACIÓN:
VIA PROVIDENCIA
Municipio: Planeta rica
Departamento: Córdoba

DISEÑADOR ESTRUCTURAL
JESUS MANUEL CONTRERAS MEZA
TP. 0M037-0518458 COR
CC. 1,101,401,612 DE SAN LUIS DE SINCE, SUCRE

CONTIENE:

- NOTAS

REVISIONES Y MODIFICACIONES:

| No | Fecha | Descripción | Elaboró | Aprobó |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DIBUJADO:
ARQ. JEFERSON TORRES LOSA
3206167325
MONTERÍA - CÓRDOBA
yefersontorres1031@gmail.com


OBSERVACIONES:

La información contenida en el presente plano está protegida por la ley de Derechos de Autor ley 23 de 1982 y por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina
"Regimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos" en su artículo 4, 8,11, y 13.
Cualquier modificación en la información debe consentir del profesional firmante autorizado por la persona jurídica COBAING ASESORÍAS SAS.

ARCHIVO:

OCTUBRE 2025

PLANO
1/4
ESC1:50

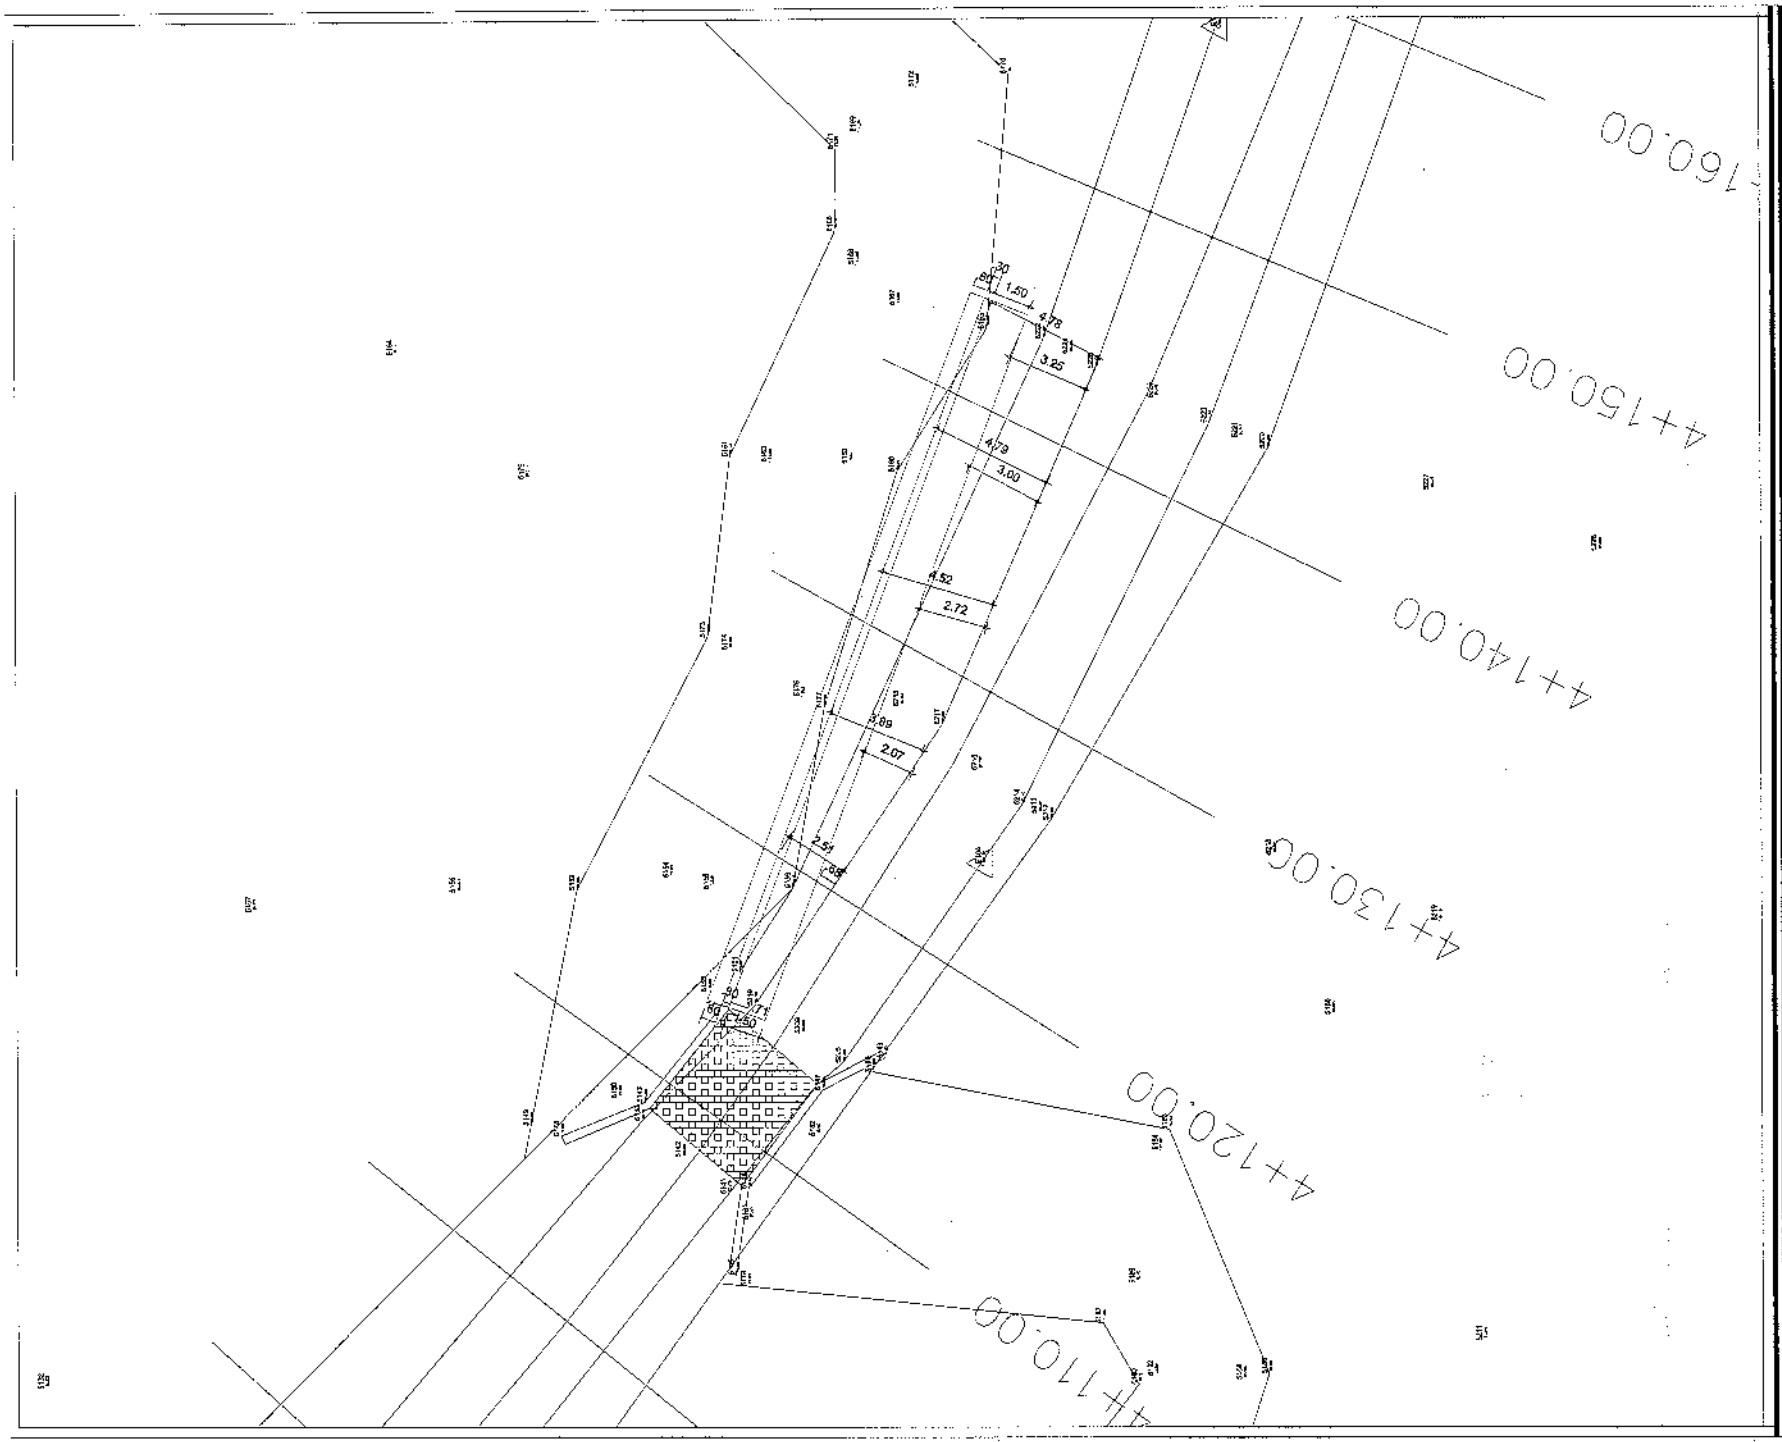


ESC1:50

PLANO
2/4

COBAING ASESORIAS SAS
Ingeniería de costos

313 380 2706
MONTERÍA - CÓRDOBA
Disenoyconstruccion@cobaingasesorias.com
INSTAGRAM: COBAING ASESORIAS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2240DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION CON PILAS

PROPIETARIO:
CONSORCIO PROVIDENCIA
Municipio Planeta rica
Departamento de Córdoba

UBICACION:
VIA PROVIDENCIA
Municipio Planeta rica
Departamento de Córdoba

DISEÑADOR ESTRUCTURAL
JESUS MANUEL CONTRERAS MEZA
TP. 251630-09161dbCOR
CC. 1.100.401.812 DE SAN LUIS DE SINCE,SUCRE

CONTIENE:

- PLANTA DE LOCALIZACION DE MURO

VERSIONES Y MODIFICACIONES:

| No. | Fecha | Descripción | Elaboró | Aprobó |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


DIBUJADO:
ARQ. JEFERSON TORRES OSA
3105057256
MONTERÍA - CÓRDOBA
yolanderamirez313@gmail.com

OBSERVACIONES:
La información contenida en el presente plano esta protegida por la ley de Derechos de Autor ley 23 de 1982 y por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina
"Régimen Común sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos en su artículo 4, 8, 11, y 13.
Cualquier modificación en la información debe proveer del profesional directo autorizado para la persona jurídica COBAING ASESORIAS SAS.


ARCHIVO:

OCTUBRE 2025


PLANO
2/4
ESC1:50

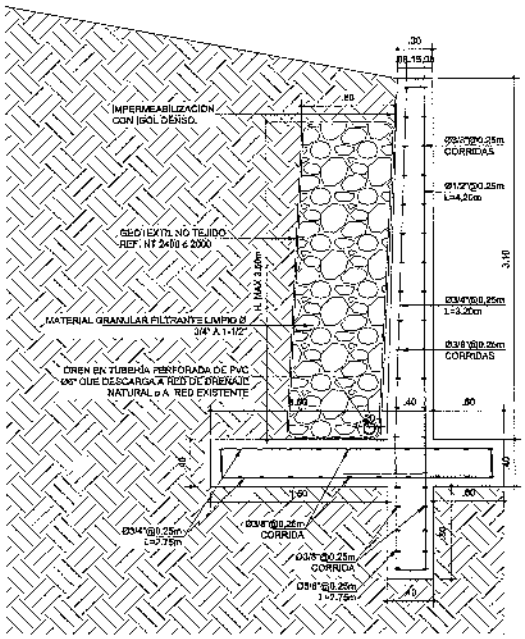



SECCION MURO DE CONTENCION
ESC. 1:25

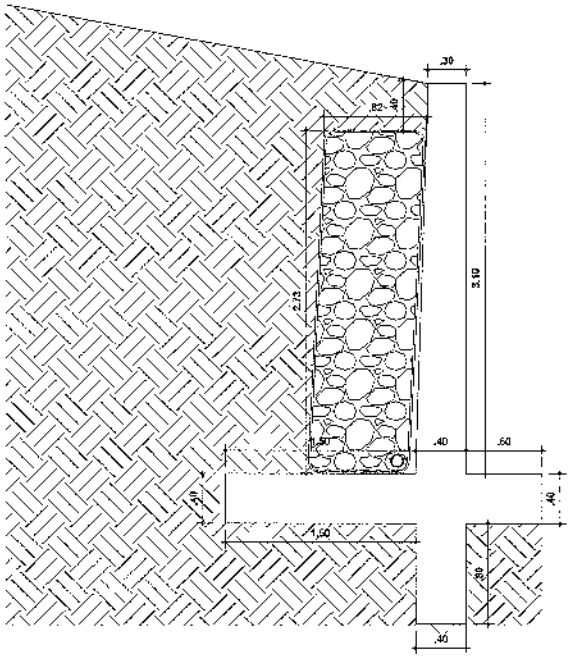



GEOMETRIA MURO DE CONTENCION
ESC. 1:25

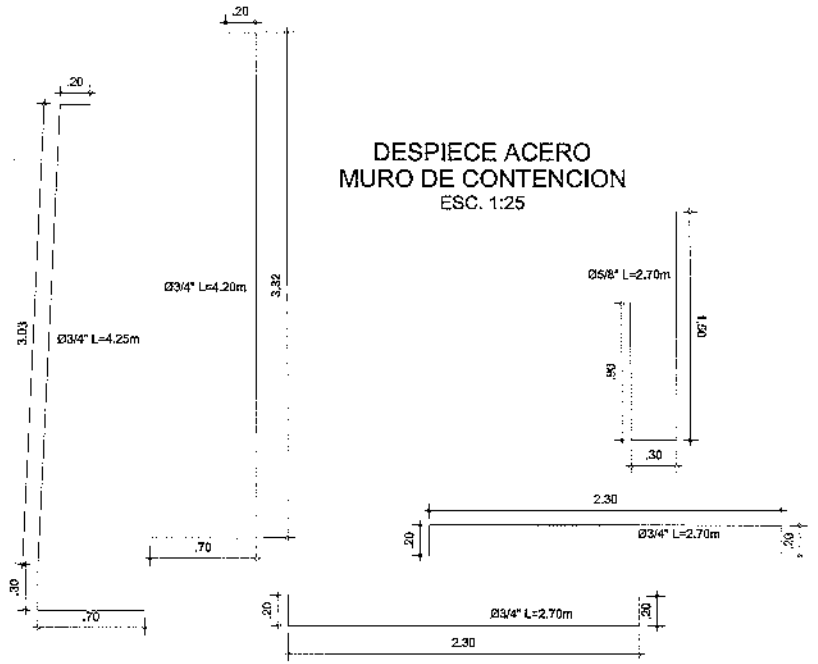


JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CADA 6.0m (MAX)
ESC. 1:20

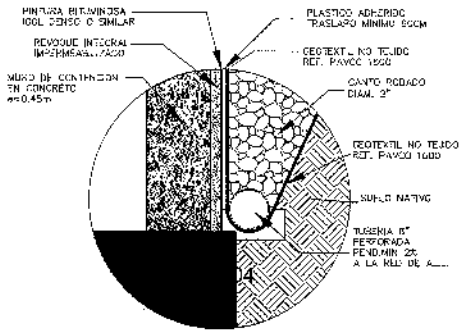


DETALLE DE
FILTRO
ESC: 1:10

ESC1:50
PLANO
3/4

COBAING ASESORÍAS SAS
INGENIERÍA DE DISEÑOS
313 600 3705
MONTERÍA - CÓRDOBA
INSTAGRAM: COBAING ASESORIAS

**PROYECTO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2280DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION

**PROPIETARIO:**
CONSORCIO PROVIDENCIA
Municipio Planeta rica
Departamento de Córdoba

**UBICACIÓN:**
VÍA PROVIDENCIA
Municipio Planeta rica
Departamento de Córdoba

**DISEÑADOR ESTRUCTURAL**
JESUS RAFAEL CONTRERAS MEZA
TP. 08102-0516458 COR
CC. 1.100.401.812 DE SAN LUIS DE SINCE,SUCRE

**CONTIENE:**
- SECCIÓN DE MURO
- GEOMETRÍA DE MURO
- DESPIECE DE ACEROS
- DETALLE DE JUNTA
- DETALLE DE ALTRO

**REVISIONES Y MODIFICACIONES:**

| No. | Fecha | Descripción | Elaboró | Aprobó |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DIBUJADO:**
ARQ. JEFERSON TORREGLOSA
3205687335
MONTERIA – CÓRDOBA
yefersontorregrosa31.9@gmail.com


**OBSERVACIONES:**
La información contenida en el presente plano esta protegida por la ley de Derechos de Autor ley 23 de 1982 y por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina
*Regimen Comun sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos en su articulo 4, 8, 11, y 13.
Cualquier modificación a la información dada proveniente del profesional limpiara autorizado por la persona jurídica COBAING ASESORÍAS SAS.

**ARCHIVO:**

**OCTUBRE 2025**


**PLANO**
**3/4**
**ESC1:50**

VIA (SEGUN DISEÑO DE PAVIMENTO Y ALINEAMIENTO TOPOGRAFICO)

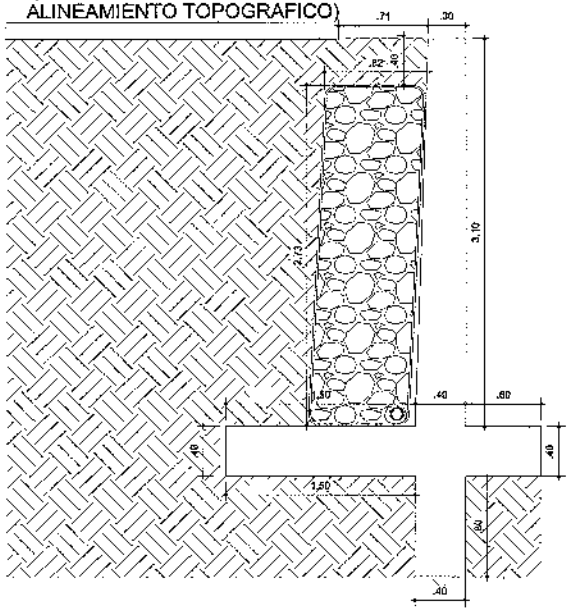



GEOMETRIA MURO DE CONTENCION
ESC. 1:25

VIA (SEGUN DISEÑO DE PAVIMENTO Y ALINEAMIENTO TOPOGRAFICO)

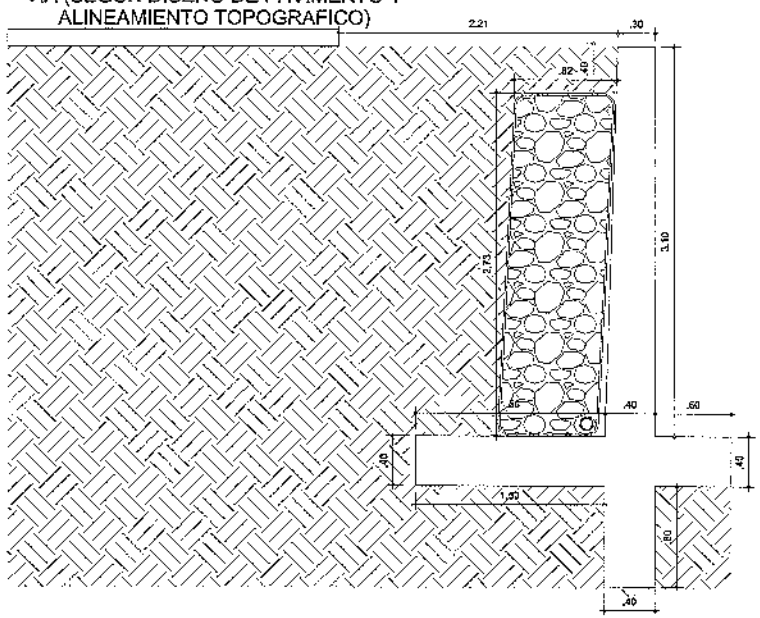


GEOMETRIA MURO DE CONTENCION
ESC. 1:25

VIA (SEGUN DISEÑO DE PAVIMENTO Y ALINEAMIENTO TOPOGRAFICO)

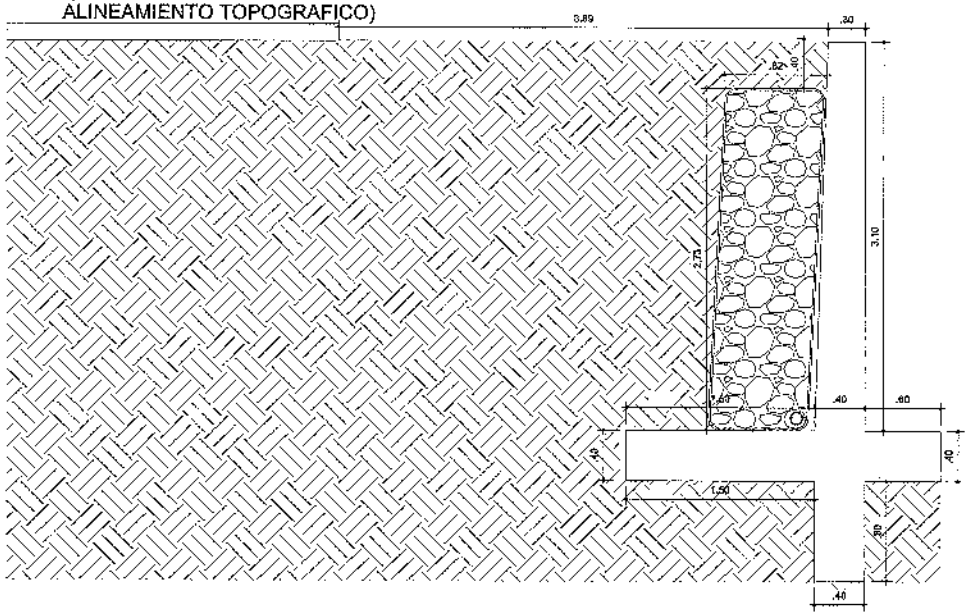


GEOMETRIA MURO DE CONTENCION
ESC. 1:25

ESC1:50

PLANO
4/4

COBAING ASESORÍAS SAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS

313 592 5705
MONTERÍA - CÓRDOBA
Direccionproyectos@cobaingasesorias.com
INSTAGRAM.COM/COBAING ASESORIAS

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2280DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN

PROPIETARIO:
CONSORCIO PROVIDENCIA
Municipio Planeta Rica
Departamento de Córdoba

UBICACIÓN:
VÍA PROVIDENCIA
Municipio Planeta Rica
Departamento de Córdoba

DISEÑADOR ESTRUCTURAL
JESUS MANUEL CONTRERAS MEZA
TP. 0810257-0512456 CQR
CC. 1.100.401.812 DE SAN LUIS DE SINCE,SUCRE

CONTIENE:
- SECCION DE MURO
- GEOMETRIA DE MURO

REVISIONES Y MODIFICACIONES:

| No | Fecha | Descripción | Elaboró | Aprobó |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DIBUJADO:
APD. JEFFERSON TORRES DIAZ
3126057335
MONTERIA - CORDOBA
yeisonjefferson2334@gmail.com

OBSERVACIONES:
La información contenida en el presente plano está protegida por la ley de Derechos de Autor (Ley 23 de 1982 y por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina.
"Ningún Comité sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en su artículo 4, 8.1.1, y 13.
Cualquier modificación en la información sobre presente del profesional firmado sin permiso por la persona jurídica COBAING ASESORÍAS SAS.

ARCHIVO:

OCTUBRE 2025

PLANO
4/4
ESC1:50

19-12-25 [illegible]

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba. 18 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-140-2025**

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 19-12-25 Hora: 7:40
No. de folios: 1
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

Señor(es):
**CONSORCIO INGECON - INCO**
**ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: ENTREGA INFORME FIDEICOMISO**

Estimados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para su respectivo control y seguimiento, nos permitimos remitir el último informe de gestión de la fiducia.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud adicional.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

17-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba, 15 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-139-2025**

Señor:

**JOHN LUIS ARMARIO JULIO**

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLAN ETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: Solicitud de pagos pendientes por concepto de prestación de servicios de mano de obra**

Estimado señor,

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de Representante Legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de dar respuesta a su solicitud en asunto.

Su solicitud se encuentra en revisión por parte del área encargada, una vez se cuente con una respuesta de esta área lo estaremos contactando.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 – 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 17-12-25 Hora: 7:32
No. de folios: 1
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

**DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.**
**E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com**
**TELÉFONO: 3104057905 – 3234029274 NO:**
**3104057905 – 3234029274**
**PLANETA RICA, CÓRDOBA.**

17-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba, 15 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-138-2025**

Señor(a):

**Gledys Hernández Trujillo**

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLAN ETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: Solicitud pago de liquidación laboral**

Estimada señora,

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de Representante Legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de dar respuesta a su solicitud en asunto.

Su solicitud se encuentra en revisión por parte del área encargada, una vez se cuente con una respuesta de esta área lo estaremos contactando.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 17-12-25 Hora: 7:31
No. de folios: 1
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

9-12-25

CONSORCIO INVIAS 2024
NIT.: 901.869.034-9

CINV2024-271

INGECON SAS
RECIBIDO
Fecha: 9-12-25 Hora: 9:21
No. de folios: 3
Firma:
El recibido de la comunicación no implica su aceptación

Manizales, 7 de diciembre de 2025

Señores
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
**Angela María Dávila Morales**
Interventoría

Referencia: ATENCION AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Asunto: Respuesta comunicado ING-INV-3750-0265-25 Trazabilidad cables de tensionamiento.

Cordial Saludo,

El 23 de julio de 2025 mediante comunicado *CINV2024-177* y dada la dificultad del suministro de cable de ½" el cual se encontraba muy escaso se le planteo al consultor del proyecto el cambio con el siguiente comunicado:

*Respetado Ing. Lara,*

*En aras de continuar con el proceso de ejecución de la obra, me dirijo a usted para que nos indique una alternativa para los cables de los torones, dado que el suministro de cable de ½" ha sido imposible y surgió la posibilidad de cambiarlo por cables de 5/8", es por esto que le solicitamos que nos proporciones la cantidad requerida de cables de 5/8".*

*Esta información se requiere con carácter urgente, actualmente se tienen 4 perforaciones y sin esta definición no se pueden instalar los cables y ya se están presentando derrumbe al interior del anclaje.*

De ese modo el ing. Lara emitió una respuesta el día 30 de julio de 2025 donde considero que la carga de diseño con el factor de seguridad de 2.0 es de 380 kN, el área de acero será mínimo de 226mm2 se debe utilizar dos (2) dos cables de d = 15.2mm que proporcionan un área de 282mm2, conclusión que fue soportada con los cálculos matemáticos.

Con esos argumentos planteados por el Ing. Lara, se emitió el comunicado CINV2024-183- Anclajes Activos Reemplazo BT del 31 de julio de 2025 manifestando lo siguiente:

> *Con la finalidad de seguir con el desarrollo del proyecto de la referencia, se envían los cálculos para el uso del cable de 5/8" (Cp190 - 15.2 documento adjunto Especificaciones del Productos), en respuesta del especialista a la consulta realizada por el Consorcio Invias 2024 mediante oficio CINV2024-177-Consulta Cables de Tensionamiento, consulta que se realizó por la escasez del cable de ½", y teniendo en cuenta que en la obra no prevista aprobada se extiende su uso a con cables de tensionamientos de 1/2" o 5/8".*
>
> *Documentos Adjuntos:*
>
> - *Reemplazo cables BTO ver02 (Memorias de cálculos)*
> - *Verificación parámetros de anclajes*
> - *Especificaciones del Productos (Especificaciones técnica del cable propuesto)*

En respuesta a nuestro comunicado, la interventoría emitió el oficio ING-INV-3750-0152-25, de asunto: Respuesta a comunicado CINV2024-183. Anclajes activos, donde expusieron:

> *En atención a su comunicado CINV2024-183, mediante el cual remiten concepto del especialista de Consorcio Invias 2024, respecto a los cables de tensionamiento, se solicita de manera inmediata el envio de la consulta realizada por el contratista a su especialista remitida mediante comunicado CINV2024-177.*

En atención al comunicado ING-INV-3750-0152-25 el Consorcio Invias 2024 le envió copia del oficio *CINV2024-177 a través del siguiente correo electrónico:*

**CONSORCIO INVIAS 2024** <consorcioinvias2024@gmail.com> jue, 31 jul, 4:50 p.m.
para Angela, Edinson, Juliano, Julio

Buenas tardes,

Enviamos adjunto el Oficio solicitado

Cordialmente

**Consorcio Invias 2024**

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

CINV2024-177- C...

El día 8 de agosto la interventoría emite la respuesta a la solicitud mediante comunicado ING-INV-3750-0163-25, donde adjunto el MEMORANDO TÉCNICO MT-2534-CM450-2025 con la siguiente conclusión:

> *Si se contempla que la tensión de diseño es de 40 ton, se obtiene que se requiere como mínimo tres (3) torones para alcanzar la carga de diseño, o disminuir la tensión de diseño a 35 ton con el fin de emplear los dos (2) torones contemplados inicialmente. Por lo anterior, se reitera en la solicitud de dar claridad con relación a cuál es la tensión de los anclajes requerida para cumplir con los factores de seguridad en la etapa constructiva y operativa, ya que si la carga requerida son 190 kN con dos torones es suficiente, pero si la carga son 400 kN se requieren tres torones.*

Con lo anterior el contratista asumió instalar tres cables de 5/8" con la finalidad de cumplir con las condiciones exigidas para el tensionamiento, teniendo en cuenta que con 3 cables de ½" se cumplía con el propósito inicial, entonces, con 3 de 5/8" se cumpliría también, es por esto que el Consorcio Invias 2024 realiza la siguiente oficio (CINV2024- 197 del 11 de agosto de 2025) en respuesta al comunicado ING-INV-3750-0163-25:

> *En respuesta a su comunicado ING-INV-3750-0163-25 de Asunto: "Respuesta a comunicado CINV2024-177 y CINV2024-183. Anclajes", es nuestro propósito el cumplimiento del objeto contractual bajo los estándares de calidad y en los tiempos requeridos del proyecto, es por eso que queremos agilizar para no tener más tropiezos ni inconvenientes y continuar con el buen desarrollo de la obra, razón por la cual, y dada la situación de suministro de los cables de 1/2" se utilizarán los de 15.nmm (5/8") en la misma cantidad, esto en aras de dar avances efectivo a la obra y no profundizar aspectos técnicos-teóricos que podrían desmejoran los rendimientos y avances del proyecto.*

De este último no se obtuvo más respuesta, se consideró como positiva nuestra solicitud, y se procedió con la instalación de los tres cables de 5/8", la cual se esta realizando actualmente son el seguimiento de la interventoría.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente:

Martha Rojas Vásquez
Representante Legal
Consorcio INVIAS 2024

11-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

**Planeta Rica, Córdoba. 10 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-137-2025**

INGECON SAS
RECIBIDO:
Fecha: 11-12-25 Hora: 9:17
No. de folios: 1
Firma:
El recibido de este documento no implica su aprobación

**Señor(es):**
**CONSORCIO INGECON - INCO**
ANGELA MARÍA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".**

**Asunto:** Informe del componente social mes de noviembre del 2025

Estimados señores,

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del consorcio PROVIDENCIA, con el propósito de dar respuesta al comunicado en asunto y así de esta manera dar entrega de lo siguiente:

- Informe del componente social mes de noviembre

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BURGUIL CUBILLOS**
C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
Obraprovidencia1@gmail.com

11-12-25

# CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 – 9

**Planeta Rica, Córdoba. 04 de diciembre de 2025.**

**OFI-CONS-136-2025**

INGECON S.A.S.
RECIBIDO
Fecha: 11-12-25 Hora: 8:16
Firma:
El recibido de este documento no implica su aprobación

Señor(es):
**CONSORCIO INGECON – INCO**
**ANGELA MARÍA DAVILA MORALES**
Representante Legal
Calle 148 N° 7G – 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá – Colombia.

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.**

**ASUNTO: ENTREGA DISEÑO SEÑALIZACIÓN**

Estimados Señores,

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, remitir la siguiente documentación para su revisión y aprobación:

- Informe diseño de señales viales.
- Planos de señalización en formato PDF y DWG.
- Ubicación y cantidades.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente,

**EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 – 9
obraprovidencia1@gmail.com

9-12-25

Fecha: 2025-11-14 08:53:24
Radicado: 2025S-VCOR-086838
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Nestor Edwin Lerma Villalobos,DIRECTOR TERRITO
2025-11-14T08:53:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Recame el Código QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VCOR-086838
**Fecha:** 2025-11-14 08:53:24

INGECON S.A.S
RECIBIDO:
Fecha: 9-12-25 Hora: 9:32
No. de folios: 3
Firma:
El recibido de este documento no implica su aceptación

SEÑOR(A):
**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO INGECON - INCO**
Calle 148No 7g-42
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Reiteración presentación de actas de costos interventoría contrato 5053-2023

Por medio de la presente, desde la supervisión ejercida por la Dirección Territorial Córdoba, nos permitimos reiterar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 5053 de 2023, suscrito entre el Instituto nacional de vías – INVIAS y el CONSORCIO INGECON INCO, el cual presenta un incumplimiento en las obligaciones pactadas, más específicamente en lo referente a la presentación de las Actas de Costos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del presente año.

En el Oficio 2025S-VCOR-073843 del 2 de octubre de 2025, esta supervisión remitió la solicitud formal para la presentación oportuna de las Actas de Costos e informes de interventoría, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Décima – Forma de Pago, el Anexo Técnico donde el interventor tiene la obligación de presentar las actas de costos dentro de los 5 días calendarios correspondiente al mes de ejecución y citando la Resolución 718 de 2022, "*si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución"* No obstante, y en aras de permitir la entrega completa y correcta de los documentos requeridos, esta supervisión ha mantenido el trámite al margen a la espera de la remisión de las versiones ajustadas. Sin embargo, ante el vencimiento del plazo de revisión y la ausencia de respuesta por parte de la interventoría, se hace necesario recordar la obligación de cumplimiento inmediato de lo solicitado."

Posteriormente, mediante Oficio 2025S-VCOR-07749 del 15 de octubre de 2025, se reitera la solicitud, evidenciando aun la existencia de atrasos y requiriendo nuevamente la entrega **inmediata** de los documentos.

Si bien la interventoría presentó las actas de costos indicadas, estas fueron devueltas para corrección debido a inconsistencias identificadas durante la revisión técnica. A

pesar de haberse remitido oportunamente las observaciones para su subsanación, no se ha recibido respuesta ni remisión de las actas corregidas.

Es pertinente aclarar que los informes de interventoría correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre ya se encuentran aprobados, y el informe de octubre se mantiene en revisión. Sin embargo, conforme al procedimiento contractual, las Actas de Costos y los Informes deben ser tramitados de manera simultánea; por tanto, aunque los informes estén avanzados, las actas no pueden ser radicadas ni gestionadas mientras la interventoría no remita las versiones corregidas.

Adicionalmente, se recuerda que el plazo de revisión ya se encuentra vencido, generando atrasos significativos en los procesos administrativos y financieros asociados al contrato, y afectando el oportuno avance de las obligaciones pactadas, cabe resaltar que la asignación del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público está sujeta a la disponibilidad de caja de la Nación, que, si no se presentan a tiempo, el pago de estas se verá afectado por la misma.

En consecuencia, esta supervisión reitera de manera urgente la **entrega inmediata** de las Actas de Costos corregidas correspondientes a los meses mencionados, con el fin de continuar con el trámite contractual y evitar mayores afectaciones.

Cordialmente,

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
DIRECTOR TERRITORIAL

Proyectado por: Thalia Anaya Soto
Revisado por: Luis Miguel Gonzalez Ozuna
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: SINIESTROS SEGUROS MUNDIAL ()

INVIAS

Nestor Elean Lemus Villadiego,DIRECTOR TERRITO
2025-11-14T08:53:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Estampa el Codigo OR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN - 11078166

14/11/2025 08:53:36 COT -05

NBTD-7OAG-OF1O-TARY-F176-3128-4162-45

Fecha: 2025-11-14T08:53:30-05:00
Nestor Elean Lemus Villadiego
DIRECTOR TERRITORIAL
1000012 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
INVIAS

5-12-25

Fecha: 2025-12-04 20:53:09
Radicado: 2026S-VBOG-093782
Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Anexos: 0

INVIAS
Instituto Nacional de Vías

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-093782
**Fecha:** 2025-12-04 20:53:09

INGECON SAS
Recibido
Fecha: 5-12-25 Hora: 8:09
No. de folios: 3
Firma:

SEÑOR(A):
**ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS**
CALLE 148 No. 7 G - 42
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ

**ASUNTO:** Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-059633 CI 5053 2023 CO 159-2023.
Cordial saludo:

En atención al radicado 2025E-VUVRAZ-059633, mediante el cual la Interventoría del Contrato 5053-2023, a cargo de CONSORCIO INGECON - INCO, remite documento en relación con el requerimiento señalado en el oficio 2024S- VBOG-087127 del 21/11/2024, referente al PAGA V4 del contrato de obra 159 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", al respecto se manifiesta lo siguiente:

Se recuerda que la información radicada se remite de manera extemporánea, por lo tanto, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad de la presentación de la documentación sobre la gestión ambiental.

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado CING-INV-5053-0181-25 y tras la verificación de la documentación soporte allegada, se constató que el contratista de obra atendió los requerimientos solicitados.

Por lo anterior, se considera que el documento PAGA se ajusta a los estándares mínimos establecidos.

Ahora bien, se requiere que en los informes de avance de cumplimiento del PAGA, se informe el estado actual del permiso de ocupación de cauce obtenido para el desarrollo de la obra.

Por otra parte, es preciso aclarar a la interventoría que, de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría, le corresponde otorgar la aprobación de la documentación ambiental formulada por el contratista de obra. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el comunicado CING-INV-5053-0181-25 se indica que la interventoría emite un concepto de No Objeción al PAGA.

Por lo tanto, se recomienda abstenerse de utilizar dicho término en las comunicaciones e informes relacionados.

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Danilo Jose Villazon Escobar
Revisado por: Carlos Andrés Mora - Coordinador Grupo Ambiental
Javier Guerrero Ruiz - Abogado Subdireccion de Sostenibilidad
ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ – SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52269703 - 04/12/2025 20:53:21 COT -05

HBTD-7OAG-OF1O-TC2F-J176-4899-6019-35

SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1130500 SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

## CONSORCIO PROVIDENCIA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023.

| Foto 1. Excavación y mejoramiento con pedraplen para la construcción del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. | Foto 2. Armado e instalación de acero de refuerzo para los cimientos del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. |
|---|---|
|  |  |

| Foto 3. Fundida de cimientos con concreto premezclado del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. | Foto 4. Rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido construido, ubicado en la abscisa K2+500. |
|---|---|
|  |  |

| | |
|---|---|
| Foto 5. Armado e instalación de acero de refuerzo y formaleteria de la pantalla del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. | Foto 6. Adecuación de desvío para intervención de boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900. |
|  |  |
| Foto 7. Fundida con concreto premezclado 4000PSI de la pantalla del muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. | Foto 8. Visita técnica supervisor de invias - Boxculvert 3x3 a intervenir ubicado en la abscisa K5+900. |
|  |  |
| Foto 9. Instalación de filtro longitudinal en el muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. | Foto 10. Relleno lateral compacto en el muro de contención ubicado en la abscisa K4+200. |
|  |  |

## 8.3 BITACORA DE OBRA.

* 05 de diciembre 2025.

Estado del tiempo: Seco.
Se realiza reinicio de obra, una vez se subsanaron las causales que dieron origen a la suspensión.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza excavaciones con maquinaria para la Construcción del muro de Contención en la abscisa K4+200
Se realiza retiro de material sobrante.
Se realiza mejoramiento con pedraplen a lo largo de la excavación.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para el muro de Contención.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director Obra

* 06 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se continúa retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Se realiza mejoramiento con pedraplen a lo largo de la excavación para el muro de Contención.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para el muro de Contención.
Se realiza rellenos laterales a lo largo del pavimento rigido Construido.
Se realiza relleno y Compactación de material granular y se realiza fundida de Solado.

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Director obra

* 07 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 08 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra (festivo).

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 09 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para el muro de contención.
Se realiza armado de acero de refuerzo para el muro de Contención con todo el equipo de trabajo.
Se realiza rellenos laterales y compactación a lo largo del pavimento rigido Construido.

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Scanned with CamScanner

* 10 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza figuración de acero de refuerzo para el muro de Contención.
Se realiza armado e instalación de acero de refuerzo para el muro de Contención con todo el equipo de trabajo.
Se realiza instalación de formaletas para los cimientos del muro de Contención.
Se realiza fundida de los cimientos del muro con Concreto premezclado.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 11 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza figuración y armado de refuerzo para el muro de Contención.
Se realiza desencofrado de los cimientos fundidos - formaleteria.
Se realiza rellenos laterales y compactación a lo largo del pavimento rígido Construido.

Director Obra

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 12 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se Continúa armado e instalación de acero de refuerzo para el muro de Contención.
Se Continua con los rellenos laterales y Compactación a lo largo del pavimento rígido Construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 13 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se Continúa armado e instalación de acero de refuerzo para el muro de Contención.
Se Continúa con los rellenos laterales y Compactación a lo largo del pavimento rígido Construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 14 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Scanned with CamScanner

* 15 de diciembre 2025.

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza armado e instalación del acero de refuerzo para la pantalla del muro de Contención.
Se Continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido Construido.
Se realiza adecuación de desvío para la intervención del boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900.

Director obra

Residente Interventoría

* 16 de diciembre 2025.

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza armado e instalación del acero de refuerzo para la pantalla del muro de Contención.
Se inicia con la instalación de formaleteria para la pantalla del muro de Contención.
Se Continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido Construido.
Se Continúa con la adecuación de desvío para la intervención del boxculvert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Scanned with CamScanner

* 17 de diciembre 2025.

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se avanza con la instalación de la formaleteria para la pantalla del muro de contención.
Se Continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rigido Construido.
Se Continuá con la adecuación de desvio para la intervención de boxCulVert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 18 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se avanza con la instalación de la formaleteria para la pantalla del muro de contención.
Se Continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rigido Construido.
Se Continua con la adecuación de desvio para la intervención del boxculVert 3x3 ubicado en la abscisa K5+900.
Se realiza reunión de Veeduría con participación de Contratista de obra e interventoria con el fin de dar a conocer los avances de obra y aclara duda e inquietudes.
Se realiza aseo y limpieza general en la obra.

Scanned with CamScanner

Se realiza acopio de materiales granulares.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 19 de diciembre 2025
Estado del tiempo: seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se avanza con la instalación de formaletería para la pantalla del muro de contención.
Se continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 20 de diciembre 2025.
Estado del tiempo: seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se avanza con la instalación de formaletería para la pantalla del muro de contención.
Se continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B

* 21 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Director Obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 22 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza fundida de muro de Contención (pantalla) segmento Inferior con concreto premezclado 4000 psi.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.
Se Continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido Construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 23 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza fundida de muro de Contención (pantalla) Segmento Superior con Concreto premezclado 4000 psi.
Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.
Se Continúa con los rellenos laterales a lo

Scanned with CamScanner

largo del pavimento rígido construido.
Se realiza aseo y limpieza general en obra.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 24 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 25 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
No se realizan actividades en obra (festivo).

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 26 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se realiza desencofrado de formaletería del muro de contención fundido.
Se continúa con los rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido construido.
Se localizan unas losas fisuradas en el tramo 1, las cuales serán reparadas de

acuerdo a diseño aprobado.
Se realiza limpieza y aseo general en obra.

Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

Director obra

* 27 de diciembre 2025.
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se continúa desencofrado la formaleteria del muro de contención construido.
Se inicia con el relleno lateral e instalación de filtro en el sector del muro de contención.
Se continúa rellenos laterales a lo largo del pavimento rigido construido.

Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

Director obra

* 28 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco,
No se realizan actividades en obra (Domingo).

Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

Director obra

* 29 de diciembre 2025

Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se avanza con el relleno lateral Compacto e instalación de filtro longitudinal en el Sector del muro de Contención Construido.
Se Continúa rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido Construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 30 de diciembre 2025
Estado del tiempo: Seco.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se avanza con el relleno lateral Compacto e instalación de filtro longitudinal en el Sector del muro de Contención Construido.
Se Continúa rellenos laterales a lo largo del pavimento rígido Construido.

Director obra

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 31 de diciembre 2025 a 04 de enero 2026 no se realizan actividades en obra.
Estado del tiempo: Seco.

Director Obr

Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

Scanned with CamScanner
