FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 26 DEL 10/03/2026 AL 16/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927 2025 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 5,7,10,18,19,20 Y 21 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA	CONSORCIO MMC 2025	NIT	901.985.204-0
INTERVENTOR	CGR S.A.S (Escriba el nombre o razón social del interventor)	NIT	830.076.603-9 (Escriba el NIT del interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor	$ 9.340.789.495	Valor	$ 1.700.423.323
Valor Adicional 1	$ 159.803.083	Valor Adicional 1	$ 560.407.390
Valor Adicional 2	$ 4.485.956.755	Valor Adicional 2	$ 238.580.358
Valor Actualizado	$ 13.986.489.333	Valor Actualizado	$ 2.499.411.071
Plazo Inicial	3.5 meses	Plazo Inicial	3.5 meses
Plazo Prórroga 1	1.7 meses	Plazo Prorroga 1	1.7 meses
Plazo Prórroga 2	1 mes	Plazo Prorroga 2	1 mes
Plazo Actualizado	6.2 meses	Plazo Actualizado	6.2 meses
Fecha de Iniciación	22/09/2025	Fecha de Iniciación	17/09/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha de Terminación Actual	20/03/2026	Fecha de Terminación Actual	20/03/2026
No. de empleos generados	38	No. De empleos generados	49

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ (Escriba el nombre del Supervisor Secretaría de Infraestructura)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: DIANA MONTILLA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

(Escriba el número del oficio radicado) dd-mm-aa


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	LONGITUD (ML)/CALZADA	km/carril	km	Unidad	
Mantenimiento y mejoramiento de calzada	$ 13.624.172.821,00	7082	10,764			
Mejoramiento de vía con Placa Huella	$ 362.316.512,00	203	203			
						70%
TOTALES	$ 13.986.489.333,00	7285	213,764	0	0	

A. AVANCE GENERAL

AVANCE DEL PROYECTO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo programado obra (%)	0,00%	99,00%		Total Ejecutado (%)	0,00%	97,00%	-2,00%
Valor del Trabajo programado obra ($)	$ -	$ 13.717.286.494,00		Total Ejecutado ($)	$ -	$ 9.742.360.104,00	$ -3.974.926.390,00
Avance Financiero Obra	$ 9.742.360.104,00	69,66%		Avance Financiero Interventoria Lote 3	$ 508.204.483,00	97,00%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA	ACUMULADO FINANCIERO PROGR.[%]	EJECC. [%]
1	0%	0%
2	0%	0%
3	2%	0%
4	5%	1%
5	8%	5%
6	14%	8%
7	20%	14%
8	29%	18,66%
9	39%	25,41%
10	52%	37,00%
11	66%	55,00%
12	72%	56,00%
13	82%	57,00%
14	93%	64,00%
15	99%	70,00%
16	100%	71,00%
17	69%	64,00%
18	74%	69,00%
19	83%	70,00%
20	91%	81,00%
21	95%	85,00%
22	97%	87,00%
23	100%	89,00%
24	95%	90,00%
25	97%	95,00%
26	99%	97,00%
27		
28		

Analisis de la Grafica:

N/A

AVANCE METAS FISICAS

PROGRAMADO				EJECUTADO			
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Fisica Programada Calzada (m/calzad	0 00	7283 00	100 0%	Meta Fisica Ejecutada (m2)	13,00	5478 15	75,2%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

Frente	Comuna/Corregimiento	Longitud (ML)	Tipo de Intervención	Tramo Vial	Estado	INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA Fecha de inicio programada	Pavimento (m)	Observaciones
40	5	300	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y CRA 3	FINALIZADO	14/11/2025	300,00	FINALIZADO. Pendiente aseo general
41	5	682,4	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62	FINALIZADO	21/11/2025	680,00	FINALIZADO * Pendiente terminar demarcación y atención
42	7	91,5	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 74 ENTRE CARRERA 8C Y CRA 9	FINALIZADO	11/11/2025	91,45	FINALIZADO Pendiente aseo general
43 R	7	135	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78	EN EJECUCIÓN	19/01/2026	119,70	* PENDIENTE DEMARCACIÓN. * Pendiente observaciones menores y pavimentos.
44	10	431,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43A ENTRE CALLES 13 y 14	FINALIZADO	5/11/2025	430,00	FINALIZADO
45	10	442	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 36B ENTRE CALLES 14 y 18	FINALIZADO	20/10/2025	440,00	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
46	18	168	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	6/10/2025	157,50	FINALIZADO
47	18	168	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3B ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	6/10/2025	159,60	FINALIZADO
48	18	95,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 72 ENTRE CALLES 3A Y 3C	FINALIZADO	6/10/2025	95,50	FINALIZADO
49	18	521,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5	FINALIZADO	7/11/2025	517,00	FINALIZADO * En proceso de recibo por calidad de producto
50	19	242,8	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 8A ENTRE CARRERA 42 Y CARRERA 44	FINALIZADO	6/10/2025	242,80	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
51	19	198	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56	FINALIZADO	14/10/2025	180,60	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
52	20	55	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A OESTE	EN EJECUCIÓN	22/10/2025	40,80	* PENDIENTE DEMARCACIÓN.
53	20	71,4	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	DIAGONAL 48 ENTRE CALLE 12 OESTE Y CARRERA 54	FINALIZADO	28/10/2025	71,40	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
54	20	80	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	EN EJECUCIÓN	12/01/2026	-	* PENDIENTE SELLOS EN ASFALTO Y CARPETA ASFALTICA
55	21	600	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27	EN EJECUCIÓN	7/11/2025	450,00	* FINALIZADO. * En proceso de subsanación de observaciones.
56	21	230	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26	EN EJECUCIÓN	5/11/2025	223,75	* PENDIENTE FINALIZAR DEMARCACIÓN * PENDIENTE IMPLEMENTACIÓN DE
57	LA BUITRERA	203	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CALLEJÓN PLANETARIO FRENTE A SEDE COMUNAL	FINALIZADO	6/10/2025	203,00	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones menores.(RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
58	18	90	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 72 Y 73 - ADICIONAL	FINALIZADO	10/12/2025	88,00	FINALIZADO
59	19	110	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 59	EN EJECUCIÓN	19/01/2026	118,62	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * Pendiente cambio de rej las
60	19	230	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19 - TRAMO 60	EN EJECUCIÓN	21/01/2026	225,20	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * En proceso de Subsanación de observaciones
61	19	200	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 61	EN EJECUCIÓN	12/01/2026	209,03	* PENDIENTE DEMARCACIÓN. * En proceso de Subsanación de observaciones

FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

ENT DAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 26 **DEL** 10/03/2026 **AL** 16/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927 2025 (Número de Contrato)

62	19	1500	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 (AMBAS CALZADAS) - COMUNA - TRAMO 62	SIN INICIAR	12/01/2026	-	* PENDIENTE ENTREGA PMT CAT. 3.
63	7	100	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 72A ENTRE CARRERAS 7B Y 7C - COMUNA - TRAMO 63	EN EJECUCIÓN	12/01/2026	102,00	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * Pendiente subsanancion de observaciones menores
64	7	260	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA - TRAMO 64	EN EJECUCIÓN	20/01/2026	262,20	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * Pendiente subsanancion de observaciones menores
65	7	80	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 74 Y 74A	EN EJECUCIÓN	20/01/2026	70,00	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * Pendiente subsanancion de observaciones menores
TOTAL		**7285**					**5.478,15**	

* Para los tramos 40 al 56 se tienen observaciones menores de reemplazo de rej llas de sumideros y remates pendientes que deberán ser subsanados por el contratista para el recibo defin tivo de obra.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO POR TRAMOS:

FRENTE	TRAMOS VIALES	COMUNA	ACTIVIDADES TECNICAS
41	CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62	5	* Se rea iza instalación de reductores de velocidad. * Se rea iza cambio de reji las y panelas en sumideros.
49	CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5	18	* Se rea iza cambio dereji las y panelas.
52	CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A OESTE	20	* Se rea iza nivelación de cámara.
54	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	20	* Se termina nivelación de pozo. * Se inicia con el tratamiento de juntas.
55	CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27	21	* Se rea iza demarcación. * Se rea iza ajuste de observaciones menores.
56	CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26	21	* Se rea iza sello de fisuras en sumideros.
57	CALLEJÓN PLANETARIO FRENTE A SEDE COMUNAL	19	* Se finaliza actividades de concreto. * Se estan realizando actividades menores, retiro de sobranres de concreto, compactación de material de relleno,

ACTIVIDADES GENERALES (TECNICO)

Se rem tieron los siguientes comunicados
* C-T-141-267-2026 L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-135 de febrero 21, con asunto Remisión de actas de vecindad tramo 41 Barranquilla.
* C-T-141-264-2025 L3 –Observaciones al documento PAGA- V2 -MMC 2025-161 - LOTE 3
* C-T-141-263-2026 L3 – OBSERVACIONES CARTERAS TOPOGRAFICAS Y LEVANTAMIENTO DE LA SECCION PRINCIPAL INTERVENIDA - TRAMOS – 40-41-42-44-45-49 Y 56 - L3.
* C-T-141-261-2026 L3 –Solicitud de entrega prioritaria del presupuesto PAGA– L3.
* C-T-141-249-2026 L3- Observaciones al informe mensual No. 5 del componente SST. Correspondiente al mes de febrero. LOTE 3.
* C-T-141-308-2026 L3 - CONCEPTO DE NO OBJECIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA – REPROGRAMACIÓN N° 2 - L3.
* C-T-141-244-2026 L3 – Observaciones al comunicado MMC 2025-150 Remisión de entrega de Informe de Gestión Ambiental No. 05 – LOTE 3.

Por otra parte el contratista rem tió los siguientes comunicados
* MMC 2025 - 163 RESPUESTA A OFICIO C-T-141-256-2026 – LLAMADO DE ATENCIÓN POR INASISTENCIA A REUNIÓN DE DIÁLOGO BARRIO CALIMÍO – COMUNA 21.
* MMC 2025 - 162 REMISION ACTA NO. 004 AJUSTADA Y SOPORTES CONSORCIO MMC 2025
* MMC 2025 - 161 Atención a la comunicación C-T-141-015-2026 L3 – Solicitud de actualización del documento PAGA – Lote 3.

ACTIVIDADES GENERALES (AMBIENTAL)

Tramos activos 40, 41, 43R, 44, 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 64, 65. Se ver fica las intalaciones de los frentes de obra, puntos ecológicos donde se evidencia la separación en la fuente de los residuos generados. Se evidencia protección de los sumideros mediante la instalación de malla, como acción preventiva para evitar el ingreso de material y residuos. Se verifico la disposición de unidades san tarias y la señalización de obra requerida para la delimitación del frente de trabajo. Se continuan con las jornadas de orden y aseo. El 11 de marzo mediante comunicado C-T-141-250-2026, Se realiza la entrega del informe mensual N°5 correspondiente al mes de febrero. Adicional, el 12 de marzo se rec be el comunicado MMC 2025-161, se remite la version actualziada del documento PAGA, la cual incorpora los ajustes derivados de la adición contractual. El día 16 de marzo, mediante comunicado C-T- 141-261-2026 se solicita la entrega prioritaria del presupuesto PAGA, lo que ha generado lim taciones en el proceso de evaluación del cump imiento de las obligaciones ambientales contractuales, lo cual puede afectar el adecuado cierre y liquidación ambiental del contrato.

ACTIVIDADES GENERALES (SOCIAL)

* Verificación del cierre y pago de la PQRS N 14, de la comuna 21.
* Actua izacion de bitacora social.
* Verificacion del envio de las respuestas tecnicas de las PQRS No.07, PQRS No. 08, PQRS No. 09 y PQRS No. 10; dando cierre a las mismas por parte del contratista.
* Continuan en revision las ADV de los comuncados MMC 2025 -136, 137, 138, 147, 149, 153, 154, , evidenciando que no estan soportados por el registro fotografico, SIn embargo, no se reciben en su totalidad los ajustes al corte del informe semanal, a pesar de haber sido solic tados por la interventoria mediante correo electronico y whatsapp.
* Nuevamente, se sostuvo conversacion telefionica con la lideresa de la comuna 19, representante de la comunidad de los tramos del barrio Cambulos, con quien despues de explicarle las etapas del proyecto, se concerto un esapcio de finalizacion con ella y algunos miembros de la veeduria ciudadana y los representantes del proyecto, para el cierre formal y entrega simbolica de las vias, en el mes de marzo o cuando las actividades tecnicas finalicen.
* El enlace social de la secretaria de infraestructura de la comuna 21, envio por Whatsapp el 10 de marzo, convocatoria sobre solicitud de reunion informativa con la JAL de la comuna y la JAC de Calimio Desepaz. La interventoria envio por correo electronico de manera formal al area social del contratista, dicha convocatoria, con la solicitud de asistencia al espacioy la preparacion de una presentacion resumida del avance del tramo.
* Asistencia al espacio de reunion informativa con la JAL de la comuna y la JAC de Calimio Desepaz., la secretaria de infraestructura y la interventoria, en donde se abordaron los temas requeridos por la comunidad, como la demarcacion vial y ajuste en los reductores de velocidad. El contratista no asistio al espacio.
* Se recibe el comunicado MMC 2025 160 de marzo 10, sobre entrega de actas de vecindad de cierre del tramo 45. Se revisan en fisico, pero no tienen el regisro fotografico.El contratista envia el Registro fotografico de manera extemporanea y se revisa, identificando varias observaciones que fueron envidas por Whatsapp al contratista el15 de marzo.
* Se recibe el comunicado MMC 2025 161 de marzo 12, sobre entrega de actas de vecindad de cierre de los tramo 55,40,47,48,56. Se revisan en fisico, pero no tienen el regisro fotografico.El contratista envia el Registro fotografico de manera extemporanea y se revisa, identificando varias observaciones que fueron envidas por Whatsapp al contratista el15 de marzo.
* Se envio un correo electronico al contratista, con respecto al tramo 57, ubicado en el corregimiento de La Buitrera, en donde el señor Hernando Ayala, habitante del sector, manifestó a la interventoria una situación relacionada con el presunto no pago de jornales a dos personas de la comunidad. En este sentido, la interventoría solicito respetuosamente al contratista

1. Ponerse en contacto con las personas mencionadas, con el fin de conocer en detalle la situación presentada.
2. Abrir el respectivo registro en el sistema de PQRS, con el propósito de dar seguimiento y trazabilidad formal al caso.
3. Verificar los hechos reportados y adelantar las gestiones correspondientes, para determinar si procede o no el pago solicitado, garantizando el debido proceso y dejando el respectivo soporte documental.

En todo caso, al cierre del presente informe, el contratista no ha tomado acciones frente al tema.
* Se hace mesa de trabajo con el contratista, en la cual se revisan las actas de vecindad, de los comunicados 129, 136, 137, 138, 147, 149, 153, 154, 160, 161 ; de la cual salen los siguientes compromisos

Entrega de actas ajustadas
El contratista se compromete a entregar a la interventoría todas las actas de vecindad radicadas hasta el comunicado MMC-2025-161 completamente ajustadas, incluyendo el registro fotográfico correspondiente, la semana del 16 al 20, para su revisión, firma y devolución para proceso de cierre.

ACTIVIDADES GENERALES (SST)

* 11 de marzo de 2026. Se remiten observaciones al informe mensual No.5 del componente SST, correspondiente al mes de febrero mediante comunicado C-T-141-249-2026.
* 13-03-2026. Se realizo mesa de trabajo junto al contratista con el fin de dar a conocer los lineamientos para informe final solicitados por secretaría de infraestructura, donde se contó con la asistencia de las profesionales de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con la normativa vigente en Colombia (Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), el contratista debe garantizar la trazabilidad de la gestión de riesgos durante la ejecución del proyecto.

14-03-2026- Mesa de trabajo interventoría y contratista, seguimiento a observaciones remitidas al informe No.5.
*
Durante la semana las actividades principales se llevaron a cabo en
Tramo 40,41,49 Instalación de rejillas y paneles.
Tramo 55 Instalación de pintura horizontal y pictogramas
Tramo 40,41,49,46,47,48,51, Se lo de fisuras de las carteras de los sumideros

Se relaciona a continuación los profesionales radicados por el contratista para revisión y aprobación por parte de la interventoría

RECOMENDACIONES: Se han adelantado requerimientos por la interventoría teniendo en cuenta que se encuentra documentación pendiente de la etapa de preconstrucción. Así mismo se han realizado comités con el fin de fijar compromisos referentes al inicio de nuevos tramos y los atrasos que se presentan en programación.

1. Cronograma en Ms Project	SÍ	x
2. Registro Fotográfico	SÍ	x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones, en CALI., a los NUEVE (Día en letras) 9 (Día en números) de MARZO (Mes en letras) de 2026 (Año de firma del nforme)

(Nombre) Firma del Director de Interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 26 **DEL** 10/03/2026 **AL** 16/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Antes, Tramo 40. CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y CRA 3



Descripción Foto 2.

Después, Tramo 40. CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y CRA 3



Descripción Foto 3.

Antes, Tramo 41. CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62



Descripción Foto 4.

Después, Tramo 41. CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62



Descripción Foto 5.

Antes, Tramo 44. CARRERA 43A ENTRE CALLES 13 y 14



Descripción Foto 6.

Después, Tramo 44. CARRERA 43A ENTRE CALLES 13 y 14



Descripción Foto 7.

Antes, Tramo 45. CARRERA 36B ENTRE CALLES 14 y 18



Descripción Foto 8.

Después, Tramo 45. CARRERA 36B ENTRE CALLES 14 y 18

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 26 **DEL** 10/03/2026 **AL** 16/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO




Descripción Foto 9.

Antes, Tramo 49. CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5



Descripción Foto 10.

Después, Tramo 49. CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5

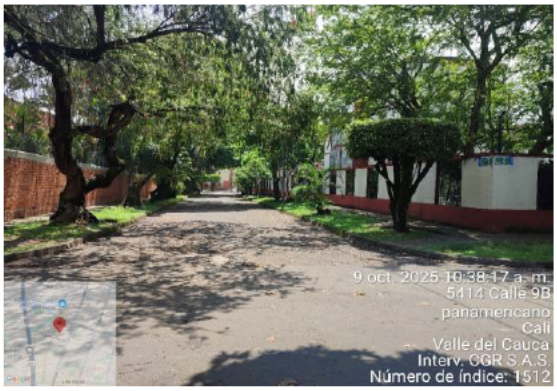

Descripción Foto 11.

Antes, Tramo 51. CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 12.

Después, Tramo 51. CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 13.

Antes, Tramo 52. CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A



Descripción Foto 13.

Después, Tramo 52. CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A OESTE



Descripción Foto 15.

Antes, Tramo 54. CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B



Descripción Foto 16.

Después, Tramo 54. CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B

FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**


SEMANA No. 26 **DEL** 10/03/2026 **AL** 16/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO

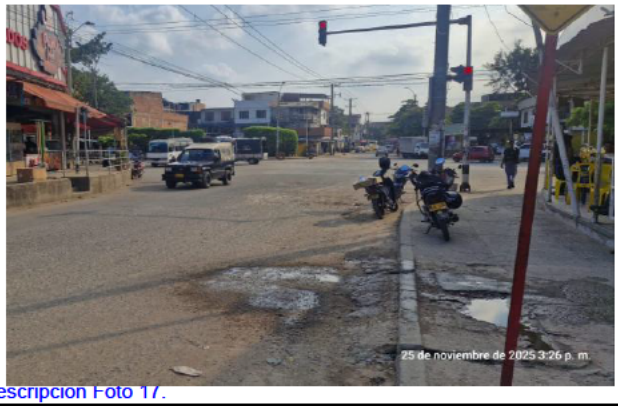

Descripcion Foto 17.
Antes, Tramo 55. CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27

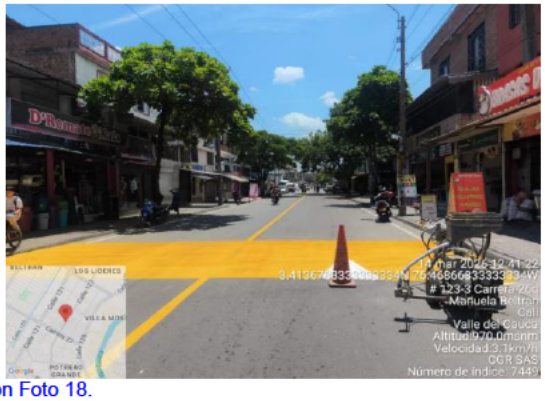

Descripción Foto 18.
Después, Tramo 55. CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27



Descripción Foto 19.
Antes, Tramo 57, CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 20.
Después, Tramo 57, CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

NUEVE (Día en letras) (9) dias del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora
