FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 22 **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 5,7,10,18,19,20 Y 21 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA	CONSORCIO MMC 2025	**NIT**	901.985.204-0
INTERVENTOR	CGR S.A.S (Escriba el nombre o razón social del interventor)	**NIT**	830.076.603-9 (escriba el NIT del interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Inicial	$ 9.340.789.495	Inicial	$ 1.700.423.323
Valor Adicional 1	$ 159.803.083	Valor Adicional 1	$ 560.407.390
Valor Adicional 2	$ 4.485.896.755	Valor Adicional 2	
Valor Actualizado	$ 13.986.489.333	Valor Actualizado	$ 2.260.830.713
Plazo Inicial	3.5 meses	Plazo Inicial	3.5 meses
Plazo Prórroga 1	1.7 meses	Plazo Prorroga 1	1.7 meses
Plazo Actualizado	5.2 meses	Plazo Actualizado	5.2 meses
Fecha de Iniciación	22/09/2025	Fecha de Iniciación	17/09/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha de Terminación Actual	20/02/2026	Fecha de Terminación Actual	20/02/2026
No. de empleos generados	38	No. De empleos generados	49

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ (Escriba el nombre del Supervisor Secretaria de Infraestructura)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: DIANA MONTILLA (Escriba el nombre del profesional del equipo de Apoyo a la supervisión)

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

(escriba el numero del otrosi radicado) (en letras)

TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	LONGITUD (ML)/CALZADA	km/carril	km	Unidad
Mantenimiento y mejoramiento de calzada	$ 13.624.172.821,00	7082	10,764		
Mejoramiento de via con Placa Huella	$ 362.316.512,00	203	203		
TOTALES	$ 13.986.489.333,00	7285	213,764	0	0

60%


A. AVANCE GENERAL

AVANCE DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo programado obra (%)	0,00%	97,00%	Total Ejecutado (%)	0,00%	87,00%	-10,00%
Valor del Trabajo programado obra ($)	$ -	$ 13.476.166.278,00	Total Ejecutado ($)	$ 16.629.553,00	$ 8.330.179.485,00	$ -5.145.986.793,00
Avance Financiero Obra	**$ 8.330.179.485,00**	**59,56%**	**Avance Financiero Interventoría Lote 3**	**$ 455.812.268,00**	**87,00%**	

* Se encuentra pendiente ajustes en la reprogramación de obra por parte del contratista, teniendo en cuenta la adición No. 2 y prorroga 1 al contrato de obra, por tanto posteriormente los porcentajes programados y ejecutados de obra serán objeto de ajustes.

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

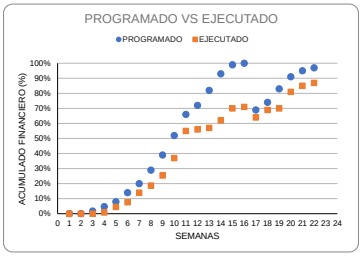

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGR (%)			EJEC. (%)
1	0%			0%
2	0%			0%
3	2%			0%
4	5%			1%
5	8%			5%
6	14%			8%
7	20%			14%
8	29%			18,66%
9	39%			25,41%
10	52%			37,00%
11	66%			55,00%
12	72%			56,00%
13	82%			57,00%
14	93%			62,00%
15	99%			70,00%
16	100%			71,00%
17	69%			64,00%
18	74%			69,00%
19	83%			70,00%
20	91%			81,00%
21	95%			85,00%
22	97%			87,00%

AVANCE METAS FISICAS

PROGRAMADO				EJECUTADO			
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Programada Calzada (m/calzada)	0,00	7139,00	98,0%	Meta Física Ejecutada (m2)	19,00	4347,40	59,7%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

Frente	Comuna/Corregimiento	Longitud (ML)	Tipo de Intervención	Tramo Vial	Estado	INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA Fecha de inicio programada	Pavimento (m)	Observaciones
40	5	300	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y CRA 3	FINALIZADO	14/11/2025	300,00	* Tramo finalizado.
41	5	682,4	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62	EN EJECUCIÓN	21/11/2025	680,00	* Pendiente demarcación. * En proceso de recibo por calidad de producto terminado.
42	7	91,5	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 74 ENTRE CARRERA 8C Y CRA 9	FINALIZADO	11/11/2025	91,45	* Tramo finalizado. * Pendiente aseo de obra.
43 R	7	135	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78	EN EJECUCIÓN	19/01/2026	-	* Tramo en excavación y proceso de instalación de base.
44	10	431,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43A ENTRE CALLES 13 y 14	FINALIZADO	5/11/2025	430,00	* Tramo finalizado .
45	10	442	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 36B ENTRE CALLES 14 y 18	FINALIZADO	20/10/2025	440,00	* Tramo finalizado . * En proceso de recibo algunos pendientes calidad
46	18	168	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	6/10/2025	157,50	* Tramo finalizado. * Pendientes menores en sumideros
47	18	168	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3B ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	6/10/2025	159,60	* Tramo finalizado. * Pendientes menores en sumideros
48	18	95,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 72 ENTRE CALLES 3A Y 3C	FINALIZADO	6/10/2025	95,50	* Tramo finalizado. * Pendientes menores en sumideros

FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 22 **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

49	18	521,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5	EN EJECUCIÓN	7/11/2025	517,00	* Pendiente demarcación. * En proceso de recibo algunos pendientes calidad producto terminado.
50	19	242,8	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 8A ENTRE CARRERA 42 Y CARRERA 44	FINALIZADO	6/10/2025	242,80	* Tramo Finalizado. * En proceso de recibo algunos pendientes calidad producto terminado.
51	19	198	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56	FINALIZADO	14/10/2025	180,60	* Tramo finalizado
52	20	55	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A OESTE	EN EJECUCIÓN	22/10/2025	40,80	* Pendiente sello de juntas. * Pendiente demarcación.
53	20	71,4	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	DIAGONAL 48 ENTRE CALLE 12 OESTE Y CARRERA 54	FINALIZADO	28/10/2025	71,40	* Tramo finalizado
54	20	80	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	EN EJECUCIÓN	12/01/2026	-	* Losas del costado Izquierdo fundidas. * Inicio con demolición de losas costado derecho.
55	21	600	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27	EN EJECUCIÓN	7/11/2025	450,00	* Pendiente demarcación.
56	21	230	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26	EN EJECUCIÓN	5/11/2025	223,75	* Pendiente demarcación.
57	LA BUITRERA	203	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CALLEJÓN PLANETARIO FRENTE A SEDE COMUNAL	EN EJECUCIÓN	6/10/2025	179,00	* Fundida de huellas y empedrado 177.02 m, aprox. * Fundida de cunetas los dos cotados 130 m aprox. * Fundida de bordillo los dos costados 100 m .aprox. * Se inicia con demolición de los 26 m restantes.
58	18	90	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 72 Y 73 - ADICIONAL	EN EJECUCIÓN	10/12/2025	88,00	* Pendiente demarcación.
59	19	110	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 59	EN EJECUCIÓN	19/01/2026	-	* Tramo imprimado
60	19	230	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19 - TRAMO 60	EN EJECUCIÓN	21/01/2026	-	* Tramo imprimado
61	19	200	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 61	EN EJECUCIÓN	12/01/2026	-	* Tramo en base. * Nivelación de pozos.
62	19	1500	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 (AMBAS CALZADAS) - COMUNA - TRAMO 62	SIN INICIAR	12/01/2026	-	* Tramo sin iniciar, PMT CAT. 3 en elaboración por parte del contratista.
63	7	100	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 72A ENTRE CARRERAS 7B Y 7C - COMUNA - TRAMO 63	EN EJECUCIÓN	12/01/2026	-	* Tramo en proceso de excavación.
64	7	260	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA - TRAMO 64	EN EJECUCIÓN	20/01/2026	-	* Tramo en excavación calzada costado Sur. * Tramo en conformación de base costado Norte.
65	7	80	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 74 Y 74A	EN EJECUCIÓN	20/01/2026	-	Tramo en conformación de base.
TOTAL		**7285**					**4.347,40**	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO POR TRAMOS:

FRENTE	TRAMOS VIALES	COMUNA	ACTIVIDADES TECNICAS
51	CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56	19	* Se genera demarcación
49	CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5	18	* Se genera toma de núcleos el 13-02-2026, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en comité del 11-02-2026.
54	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	20	* Se genera fundida de concreto de 7 losas.
57	CALLEJÓN PLANETARIO FRENTE A SEDE COMUNAL	19	* Se genera conformación de cuenta costado derecho junto a talud. * Fundida de cuneta costado Izquierdo. * Fundida de bordillo derecho.
59	CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 59	19	* Se genera nivelación de cámaras. * Se genera lleno total con base granular. * Se genera imprimación con emulsión asfáltica.
60	CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19 - TRAMO 60	19	* Se genera nivelación de cámaras. * Se genera lleno total con base granular. * Se genera imprimación con emulsión asfáltica.
61	CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 61	19	* Se genera nivelación de cámaras. * Se continua con el proceso de instalación de base granular y retiro de fallos.
63	CALLE 72A ENTRE CARRERAS 7B Y 7C - COMUNA - TRAMO 63	7	*Tramo en excavación.
64	CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA - TRAMO 64	7	* Se termina con la excavación total de las dos calzadas. *Se genera conformación de subrasante de las dos calzadas. * Se inicia con la instalación y conformación de la base granular. Costado sur.
65	CARRERA 11 ENTRE CALLES 74 Y 74A	7	* Se genera conformación de base granular. * Se generan ajustes a la nivelación de cámaras.

ACTIVIDADES GENERALES (TECNICO)

* Genera reunión entre contratista, interventoría y secretaria de infraestructura para revisión obras de drenaje y terminación del asfalto en tramos 55 y 56.
* interventoría remite oficio Incumplimiento en la entrega de la actualización del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) por prórroga y adición contractual - C-T-141-185-2026.
* interventoría remite RESPUESTA MMC 2025-089 Y MMC 2025-126 – "REMISIÓN DE ENTREGA DE INFORME DE GESTION TECNICA No. 003 Y 004 - C-T-141-186-2026 L3.
* interventoría remite oficio Reiteración No.1- Solicitud de paz y salvos personal de obra, proveedores y subcontratistas C-T-141-183-2026
* Interventoría remite Solicitud de información – Estado actual y avance PMT Categoría 3 – Tramo 62 - C-T-141-177-2026
* interventoría remite Recomendación de materialización de niveletas y cimbrado para garantizar niveles y espesores.C-T-141-175-2026 L3
* Contratista remite Oficio MMC 2025-128 – CONCEPTOS TECNICOS PQRS No.07 y PQRS No. 08
* Contratista remite MMc 2025-125 Remisión Programa RCD firmado

ACTIVIDADES GENERALES (AMBIENTAL)

El 10 de febrero mediante comunicado C-T-141-151-2026, se realiza la remisión del Plan de Gestión Ambiental de RCD e informe Trimestral para la revisión , validación y posterior radicación ante el DAGMA, se presenta conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos establecidos para gestión integral de los RCD. El 11 de febrero mediante oficio C-T-141-162-2026, se realiza requerimiento de certificados cantidades pendientes de materiales correspondientes del periodo comprendido entre octubre 2025 al 05 de enero de 2026, evidenciándose diferencias entre las cantidades registradas por la interventoría y las certificadas por el contratista. Adicional, mediante oficio C-T-141-161-2026, se hace la radicación del Plan de Gestión Ambiental de RCD e Informe Trimestral ante el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA, por parte de interventoría, mediante radicados Programa de manejo ambiental de RCD N° de radicado 20264173010021843 2.. Informe trimestral de gestión ambiental de RCD N° de radicado 20264173010021877 2. El 13 de febrero se realiza la entrega del informe mensual N° 4 de los componentes Social, Ambiental y SST en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los requerimientos emitidos por la Secretaria de Infraestructura, mediante el oficio C-T-141-169-2026.

ACTIVIDADES GENERALES (SOCIAL)

* Se recibe y se revisa el informe mensual N. 4, por parte del contratista, mediante comunicado MMC2025-118.
* Actualización de bitácora social.
* Revisión y aprobación de volante informativo de recomendaciones por inicio de actividades técnicas, en el tramo 63 de la comuna 7; mediante WhatsApp y correo electrónico del 7 de febrero.
* Revisión del registro fotográfico de los comunicados; MMC 2025-123-ENTREGA ACTAS DE VECINDAD CIERRE TRAMO 49 MELENDEZ; MMC 2025-121 -ENTREGA ACTAS DE VECINDAD CIERRE TRAMO 42 ANDRES SANIN TRAMO 46 BUENOS AIRES; MMC 2025-122 -ENTREGA ACTAS DE VECINDAD TRAMO 56 CIUDADELA DEL RIO TRAMO 40 EL SENA.
* Verificación de la subsanación a las observaciones realizadas a las Actas de vecindad de inicio en el tramo 43 R, comuna 7.
* Remisión de comunicado C-T-141-170-2026 L3- RESPUESTA A COMUNICADO MMC 2025-101 DE ENERO 23, CON ASUNTO ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD CIERRE TRAMO 46 COMUNA 18.
* Remisión de comunicado C-T-141-171-2026 L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-100 de enero 23, con asunto Entrega de actas de vecindad tramo 41 Barranquilla, Tramo 58 Buenos Aires.
* Recibo de comunicado MMC 2025-128 sobre los conceptos técnicos de las PQRS No.07 y PQRS No. 08; para revisión de la interventoría; para proceder al cierre de las mismas

FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

ENTIDAD CONTRATANTE: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**

SEMANA No. 22 **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)

ACTIVIDADES GENERALES (SST)

Recepción y revisión de paz y salvo de personal administrativo y de obra - Lote 3.

Comunicado C-T-141-148-2026-L2 del 09/02/2026, en el cual se notifica al contratista, el incumplimiento en la implementación del PAGA y PMT.

Verificación de correcta implementación de planes de manejo de transito - PMT, realizando recorridos por los frentes de obra 43-R, 59, 60, 61, 64, 65 - Lote 3.

Se relaciona a continuación los profesionales radicados por el contratista para revisión y aprobación por parte de la interventoría

RECOMENDACIONES:
documentación pendiente de la etapa de preconstrucción. Así mismo se han realizado comités con el fin de fijar compromisos referentes al inicio de nuevos tramos y los atrasos que se presentan en programación.

Se han adelantado requerimientos por la interventoría teniendo en cuenta que se encuentra

1. Cronograma en Ms Project	SÍ	x
2. Registro Fotográfico	SÍ	x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones, en CALI, a los DIECISÉIS (Día en letras) 16 (Día en números) de FEBRERO (Mes en letras) de 2026 (Año de firma del informe)

(Nombre) Firma del Director de Interventoría

FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 22 **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Antes, TRAMO 54 CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49C Y 50B



Descripción Foto 2.

Después, TRAMO 54 CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49C Y 50B



Descripción Foto 3.

Antes, TRAMO 59 CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19.



Descripción Foto 4.

Después, TRAMO 59 CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19.



Descripción Foto 5.

Antes, TRAMO 60 - CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19 .



Descripción Foto 6.

Después, TRAMO 60 - CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 22 **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 7.

Antes,TRAMO 61 - CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA 19 .



Descripcion Foto 8.

Después,TRAMO 61 - CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA19.



Descripción Foto 9.

Antes, TRAMO 43R - CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78 (REEMPLAZA AL FRENTE CARRERA 8D ENTRE CALLE 73 Y CALLE 74).



Descripción Foto 10.

Después, TRAMO 43R - CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78 (REEMPLAZA AL FRENTE CARRERA 8D ENTRE CALLE 73 Y CALLE 74).



Descripción Foto 11.

Antes, Tramo 57, CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 12.

Después, Tramo 57, CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 22 **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 13.

Antes, TRAMO 64 - CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA




Descripción Foto 14.

Después, TRAMO 64 - CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA



Descripción Foto 15.

Antes, TRAMO 65 - CARRERA 11 ENTRE CALLES 7A Y 74A - COMUNA.

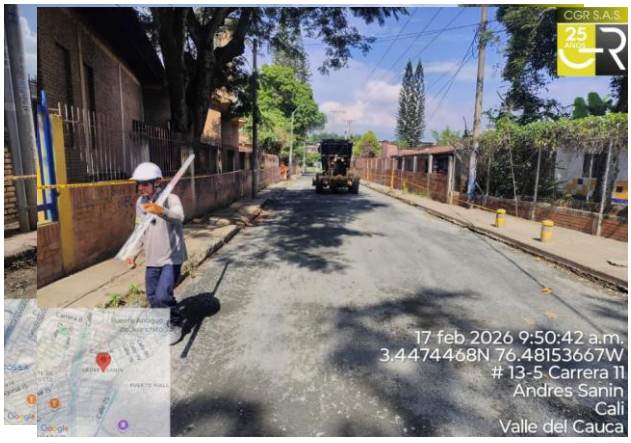

Descripción Foto 16.

Después, TRAMO 65 - CARRERA 11 ENTRE CALLES 7A Y 74A - COMUNA.



Descripción Foto 17.

Antes, Tramo 51, CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 18.

Antes, Tramo 51, CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISÉIS (Día en letras) (16) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

FORMATO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. **22** **DEL** 10/02/2026 **AL** 16/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora
