ACTA DE PARCIAL No.01

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	1	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA				
2. ACTA No.	PARCIAL 1			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	CORTE	RECIBO PARCIAL DE OBRA			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	OBRA OPTIMIZACION GRUPO 1					DEL 1 DE ENERO 2026 AL 30 DE ENERO DE 2026			
26									
6. CONTRATO OBRA No:	10673-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 12.832.243.483,00
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	25,00 Meses
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO1								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11833-2025			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265,00
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	26,00 Meses
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL .								
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ. JOHNNY EDWAR PADILLA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 30 días del mes de ENERO del año 2026 se reunieron representante legal contratista HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ
ING JORGE BELTRAN CATUMBA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de CORTE 01 Obray/o Modificaciones
del mes de 30-ene-26 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	$ 28.024,00	$ 28.024,00	2,00	$ 56.048,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1	$ 12.898,00	$ 12.898,00	52,00	$ 670.696,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR.	M2	1	$ 35.909,00	$ 35.909,00	340,00	$ 12.209.060,00	233,21	$ 8.374.337,89		$ 0,00	233,21	$ 8.374.337,89
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 23.208,00	$ 23.208,00	4,71	$ 109.309,68	4,71	$ 109.309,68		$ 0,00	4,71	$ 109.309,68
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1	$ 6.602,00	$ 6.602,00	87,50	$ 577.675,00	87,50	$ 577.675,00		$ 0,00	87,50	$ 577.675,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	1	$ 78.571,00	$ 78.571,00	60,00	$ 4.714.260,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0.30 X 0.60 M. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA	M2	1	$ 485.156,00	$ 485.156,00	3,02	$ 1.465.171,12	3,02	$ 1.465.171,12		$ 0,00	3,02	$ 1.465.171,12
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	$ 456.935,00	$ 456.935,00	2,23	$ 1.018.965,05		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	$ 754.543,00	$ 754.543,00	4,71	$ 3.553.897,53	4,71	$ 3.553.897,53		$ 0,00	4,71	$ 3.553.897,53

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	$ 42.492,00	$ 42.492,00	30,00	$ 1.274.760,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.3	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 28.403,00	$ 28.403,00	26,70	$ 758.360,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	$ 125.506,00	$ 125.506,00	26,70	$ 3.351.010,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	$ 252.993,00	$ 252.993,00	340,00	$ 86.017.620,00	233,21	$ 59.000.497,53		$ 0,00	233,21	$ 59.000.497,53
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1	$ 99.685,00	$ 99.685,00	43,90	$ 4.376.171,50	43,90	$ 4.376.171,50		$ 0,00	43,90	$ 4.376.171,50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	80,00	$ 4.301.120,00	28,95	$ 1.556.467,80		$ 0,00	28,95	$ 1.556.467,80
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	$ 82.147,00	$ 82.147,00	65,00	$ 5.339.555,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS			**$ 2.566.836,00**	**$ 2.566.836,00**		**$ 129.793.679,18**		**$ 79.013.528,05**		**$ 0,00**		**$ 79.013.528,05**
	UNIDAD OPERATIVA LA PAZ												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE	U	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	25,00	$ 615.650,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO	M2	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	18,14	$ 446.715,64	18,14	$ 446.715,64		$ 0,00	18,14	$ 446.715,64
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 18.496,00	$ 18.496,00	12,00	$ 221.952,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	$ 14.178,00	$ 14.178,00	2,00	$ 28.356,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO DIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO	M2	1	$ 10.681,00	$ 10.681,00	12,06	$ 128.812,86		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR	M2	1	$ 24.843,00	$ 24.843,00	30,00	$ 745.290,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.8.17	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1	$ 24.664,00	$ 24.664,00	60,00	$ 1.479.840,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1	$ 6.417,00	$ 6.417,00	9,79	$ 62.822,43		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1	$ 6.602,00	$ 6.602,00	20,00	$ 132.040,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 16.793,00	$ 16.793,00	26,00	$ 436.618,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1	$ 42.458,00	$ 42.458,00	64,00	$ 2.717.312,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1	$ 121.172,00	$ 121.172,00	64,00	$ 7.755.008,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2.2	CONCRETOS												
2.2.10	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CON UNA CARA LA VISTA F'C=3000 PSI, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M3	1	$ 1.089.686,00	$ 1.089.686,00	37,60	$ 40.972.193,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	1	$ 304.979,00	$ 304.979,00	50,00	$ 15.248.950,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 5.294,00	$ 5.294,00	2.700,00	$ 14.293.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.4	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO 29X12X9 CM (L X A X H) CELDA CIRCULAR, SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	$ 94.157,00	$ 94.157,00	30,00	$ 2.824.710,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3.1.5	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 29X14,5X9 CM (L X A X H) CELDA CIRCULAR, SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	$ 100.806,00	$ 100.806,00	30,00	$ 3.024.180,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	1	$ 27.607,00	$ 27.607,00	15,00	$ 414.105,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	$ 23.009,00	$ 23.009,00	30,00	$ 690.270,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.11	TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 31.144,00	$ 31.144,00	2,50	$ 77.860,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 126.018,00	$ 126.018,00	2,00	$ 252.036,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	1	$ 20.459,00	$ 20.459,00	1,00	$ 20.459,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.8	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO H.=1/3 ESPESOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO / ENTREPISO PF.>4,1<=7,0 CM (VER ADICIONAL EL ÍTEM DE SELLANTE).	M	1	$ 12.072,00	$ 12.072,00	20,00	$ 241.440,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO.	M2	1	$ 155.408,00	$ 155.408,00	12,00	$ 1.864.896,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	$ 24.239,00	$ 24.239,00	20,00	$ 484.780,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	$ 113.133,00	$ 113.133,00	12,06	$ 1.364.383,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 149.983,00	$ 149.983,00	3,00	$ 449.949,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	1	$ 177.272,00	$ 177.272,00	43,20	$ 7.658.150,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	$ 339.791,00	$ 339.791,00	1,00	$ 339.791,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.6	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	1	$ 37.801,00	$ 37.801,00	2,00	$ 75.602,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.2	DIVISIONES.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1	$ 151.041,00	$ 151.041,00	1,20	$ 181.249,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1	$ 101.902,00	$ 101.902,00	25,98	$ 2.647.413,96		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL /BWG 10 HUECO 2 1/4"X2 1/4". ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS	M2	1	$ 101.952,00	$ 101.952,00	300,00	$ 30.585.600,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	1	$ 38.811,00	$ 38.811,00	116,40	$ 4.517.600,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.544,00	$ 4.544,00	350,00	$ 1.590.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	$ 20.170,00	$ 20.170,00	30,40	$ 613.168,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES.	M2	1	$ 16.668,00	$ 16.668,00	30,00	$ 500.040,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	$ 28.487,00	$ 28.487,00	100,00	$ 2.848.700,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	30,00	$ 1.612.920,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	$ 41.937,00	$ 41.937,00	18,00	$ 754.866,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	$ 414.583,00	$ 414.583,00	3,00	$ 1.243.749,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA LA PAZ			**$ 4.142.273,00**	**$ 4.142.273,00**		**$ 152.163.679,47**		**$ 446.715,64**		**$ 0,00**		**$ 446.715,64**
	UNIDAD OPERATIVA SAUCES												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.												
1.2.4	DESMONTE MANUAL DE MUEBLE EXISTENTE EN ACERO INOXIDABLE A.>40<=60 CM. INCLUYE EMBALAJE CON POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL ÁREA ENCARGADA PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES.	M	1	$ 23.541,00	$ 23.541,00	20,80	$ 489.652,80	17,70	$ 416.675,70		$ 0,00	17,70	$ 416.675,70
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	$ 28.024,00	$ 28.024,00	6,00	$ 168.144,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	$ 20.014,00	$ 20.014,00	312,52	$ 6.254.775,28	287,30	$ 5.750.022,20		$ 0,00	287,30	$ 5.750.022,20
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS	M2	1	$ 19.378,00	$ 19.378,00	47,07	$ 912.122,46	47,07	$ 912.122,46		$ 0,00	47,07	$ 912.122,46
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 18.496,00	$ 18.496,00	45,50	$ 841.568,00	41,79	$ 772.947,84		$ 0,00	41,79	$ 772.947,84
1.5.10	DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 33.490,00	$ 33.490,00	40,20	$ 1.346.298,00	34,98	$ 1.171.480,20		$ 0,00	34,98	$ 1.171.480,20
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	$ 14.178,00	$ 14.178,00	60,00	$ 850.680,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	$ 9.737,00	$ 9.737,00	848,57	$ 8.262.526,09		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.17	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1	$ 24.664,00	$ 24.664,00	255,00	$ 6.289.320,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.7	RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERIAS EN LADRILLO TOLETE MACIZO 24,5X12X6 CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA, MORTERO PARA HOMOGENIZAR LA SUPERFICIE CON EL PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS HUECOS DE MUROS POR CELDA Y MURO POSTERIOR CON CARA AL TÚNEL. EL PAGO SE REALIZARA POR UNIDAD	UN	1	$ 13.385,00	$ 13.385,00	100,00	$ 1.338.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 20.683,00	$ 20.683,00	732,00	$ 15.139.956,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.11	TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 31.144,00	$ 31.144,00	4,00	$ 124.576,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.												
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1	$ 40.648,00	$ 40.648,00	4,00	$ 162.592,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 192.560,00	$ 192.560,00	60,00	$ 11.553.600,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.11	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1	$ 64.350,00	$ 64.350,00	85,70	$ 5.514.795,00	76,77	$ 4.940.149,50		$ 0,00	76,77	$ 4.940.149,50
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1	$ 68.811,00	$ 68.811,00	17,28	$ 1.189.054,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	$ 24.239,00	$ 24.239,00	50,00	$ 1.211.950,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	$ 622.270,00	$ 622.270,00	13,86	$ 8.624.662,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 149.983,00	$ 149.983,00	160,00	$ 23.997.280,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1	$ 24.540,00	$ 24.540,00	4,00	$ 98.160,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.6	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	1	$ 37.801,00	$ 37.801,00	60,00	$ 2.268.060,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.544,00	$ 4.544,00	500,00	$ 2.272.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	$ 20.170,00	$ 20.170,00	798,57	$ 16.107.156,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 48.436,00	$ 48.436,00	487,39	$ 23.607.222,04	487,39	$ 23.607.222,04		$ 0,00	487,39	$ 23.607.222,04
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 29.924,00	$ 29.924,00	605,00	$ 18.104.020,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES.	M2	1	$ 16.668,00	$ 16.668,00	4.051,90	$ 67.537.069,20	772,89	$ 12.882.530,52		$ 0,00	772,89	$ 12.882.530,52
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1	$ 3.575,00	$ 3.575,00	247,05	$ 883.203,75	247,05	$ 883.203,75		$ 0,00	$ 247,05	$ 883.203,75
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 30.982,00	$ 30.982,00	312,52	$ 9.682.494,64	287,30	$ 8.901.128,60		$ 0,00	287,30	$ 8.901.128,60
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	$ 125.506,00	$ 125.506,00	312,52	$ 39.223.135,12	287,30	$ 36.057.873,80		$ 0,00	287,30	$ 36.057.873,80
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 214.844,00	$ 214.844,00	34,60	$ 7.433.602,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	50,00	$ 2.688.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	$ 41.937,00	$ 41.937,00	341,61	$ 14.326.098,57		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA SAUCES			**$ 2.072.286,00**	**$ 2.072.286,00**		**$ 298.502.474,53**		**$ 96.295.356,61**		**$ 0,00**		**$ 96.295.356,61**
	UNIDAD OPERATIVA ALAMEDA												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 22.588,00	$ 22.588,00	693,73	$ 15.669.973,24	349,55	$ 7.895.635,40		$ 0,00	349,55	$ 7.895.635,40
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. CARGUE.	M2	1	$ 72.138,00	$ 72.138,00	54,00	$ 3.895.452,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLÚCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS	M2	1	$ 19.378,00	$ 19.378,00	31,92	$ 618.545,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO. TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA	M2	1	$ 6.471,00	$ 6.471,00	18,00	$ 116.478,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	$ 23.009,00	$ 23.009,00	80,00	$ 1.840.720,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	$ 24.239,00	$ 24.239,00	30,30	$ 734.441,70	30,30	$ 734.441,70		$ 0,00	30,30	$ 734.441,70

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	$ 26.968,00	$ 26.968,00	20,00	$ 539.360,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 149.983,00	$ 149.983,00	16,61	$ 2.491.217,63		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1	$ 241.579,00	$ 241.579,00	20,70	$ 5.000.685,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.2	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.				$ 0,00								
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1	$ 31.425,00	$ 31.425,00	271,48	$ 8.531.259,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 13.684,00	$ 13.684,00	271,48	$ 3.714.932,32		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 29.924,00	$ 29.924,00	300,00	$ 8.977.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	$ 11.140,00	$ 11.140,00	250,00	$ 2.785.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 30.982,00	$ 30.982,00	693,73	$ 21.493.142,86	197,77	$ 6.127.310,14		$ 0,00	197,77	$ 6.127.310,14
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	$ 125.506,00	$ 125.506,00	693,73	$ 87.067.277,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	$ 252.993,00	$ 252.993,00	160,52	$ 40.610.436,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	9,00	$ 483.876,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	$ 41.937,00	$ 41.937,00	29,67	$ 1.244.270,79	29,67	$ 1.244.270,79		$ 0,00	$ 29,67	$ 1.244.270,79
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1	$ 25.399,00	$ 25.399,00	51,60	$ 1.310.588,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1	$ 81.221,00	$ 81.221,00	2,00	$ 162.442,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	$ 414.583,00	$ 414.583,00	11,00	$ 4.560.413,00	11,00	$ 4.560.413,00		$ 0,00	11,00	$ 4.560.413,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA ALAMEDA			$ 1.698.911,00	$ 1.698.911,00		$ 211.847.711,74		$ 20.562.071,03		$ 0,00		$ 20.562.071,03

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL ATA												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1	$ 38.578,00	$ 38.578,00	25,00	$ 964.450,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	13,00	$ 320.138,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	28,94	$ 712.676,44		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	$ 20.014,00	$ 20.014,00	241,48	$ 4.832.980,72	241,48	$ 4.832.980,72		$ 0,00	241,48	$ 4.832.980,72
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 22.588,00	$ 22.588,00	47,25	$ 1.067.283,00	47,25	$ 1.067.283,00		$ 0,00	47,25	$ 1.067.283,00
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	$ 10.908,00	$ 10.908,00	39,35	$ 429.229,80	39,35	$ 429.229,80		$ 0,00	39,35	$ 429.229,80
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 27.846,00	$ 27.846,00	210,62	$ 5.864.924,52	210,62	$ 5.864.924,52		$ 0,00	210,62	$ 5.864.924,52
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.24	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UN	1	$ 43.983,00	$ 43.983,00	2,00	$ 87.966,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.6.32	DEMOLICIÓN POSTE EN CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, ALTURA 10 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES.	UN	1	$ 533.725,00	$ 533.725,00	1,00	$ 533.725,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	$ 10.681,00	$ 10.681,00	2,00	$ 21.362,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 16.793,00	$ 16.793,00	24,30	$ 408.069,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1	$ 42.458,00	$ 42.458,00	16,20	$ 687.819,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.11	TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 31.144,00	$ 31.144,00	15,50	$ 482.732,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
4.4	FILTROS.												
4.4.1	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FILTRO FRANCES DE DIMENSIONES 0,30X0,60 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø.=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS DIFERENTES AL MENCIONADO.	M	1	$ 63.780,00	$ 63.780,00	16,20	$ 1.033.236,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG LSHF	M	1	$ 18.698,00	$ 18.698,00	45,00	$ 841.410,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF	M	1	$ 24.250,00	$ 24.250,00	25,00	$ 606.250,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1	$ 56.201,00	$ 56.201,00	50,00	$ 2.810.050,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1	$ 41.145,00	$ 41.145,00	152,56	$ 6.277.081,20	152,56	$ 6.277.081,20		$ 0,00	$ 152,56	$ 6.277.081,20
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 49.503,00	$ 49.503,00	152,56	$ 7.552.177,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1	$ 127.304,00	$ 127.304,00	105,31	$ 13.406.384,24	105,31	$ 13.406.384,24		$ 0,00	105,31	$ 13.406.384,24
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1	$ 18.624,00	$ 18.624,00	39,35	$ 732.854,40	39,35	$ 732.854,40		$ 0,00	39,35	$ 732.854,40
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	$ 126.667,00	$ 126.667,00	4,73	$ 599.134,91		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	$ 376.298,00	$ 376.298,00	0,95	$ 357.483,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	$ 208.290,00	$ 208.290,00	2,56	$ 533.222,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	$ 622.270,00	$ 622.270,00	6,12	$ 3.808.292,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 149.983,00	$ 149.983,00	2,34	$ 350.960,22		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	$ 177.272,00	$ 177.272,00	31,40	$ 5.566.340,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1	$ 119.813,00	$ 119.813,00	3,45	$ 413.354,85		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	$ 754.543,00	$ 754.543,00	28,94	$ 21.836.474,42		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12.13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	1	$ 373.650,00	$ 373.650,00	28,50	$ 10.649.025,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METALICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	1	$ 38.811,00	$ 38.811,00	624,00	$ 24.218.064,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1	$ 77.132,00	$ 77.132,00	7,00	$ 539.924,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1	$ 16.332,00	$ 16.332,00	155,50	$ 2.539.626,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.2	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.				$ -								
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1	$ 31.425,00	$ 31.425,00	65,00	$ 2.042.625,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 13.684,00	$ 13.684,00	371,65	$ 5.085.658,60	371,65	$ 5.085.658,60		$ 0,00	371,65	$ 5.085.658,60
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 48.436,00	$ 48.436,00	178,35	$ 8.638.560,60	178,35	$ 8.638.560,60		$ 0,00	178,35	$ 8.638.560,60
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	$ 51.373,00	$ 51.373,00	12,50	$ 642.162,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	$ 414.583,00	$ 414.583,00	20,00	$ 8.291.660,00	20,00	$ 8.291.660,00		$ 0,00	20,00	$ 8.291.660,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA ATA			**$ 4.848.037,00**	**$ 4.848.037,00**		**$ 145.785.369,30**		**$ 54.626.617,08**		**$ 0,00**		**$ 54.626.617,08**
	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	10,00	$ 246.260,00	7,00	$ 172.382,00		$ 0,00	7,00	$ 172.382,00
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METALICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	5,76	$ 141.845,76		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 27.846,00	$ 27.846,00	30,57	$ 851.252,22	10,38	$ 289.041,48		$ 0,00	10,38	$ 289.041,48
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.24	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	$ 43.983,00	$ 43.983,00	3,00	$ 131.949,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	$ 14.178,00	$ 14.178,00	2,00	$ 28.356,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	$ 19.168,00	$ 19.168,00	3,00	$ 57.504,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR	M2	1	$ 24.843,00	$ 24.843,00	4,44	$ 110.302,92	4,44	$ 110.302,92		$ 0,00	4,44	$ 110.302,92
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1	$ 53.570,00	$ 53.570,00	17,20	$ 921.404,00	17,20	$ 921.404,00		$ 0,00	17,20	$ 921.404,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.1	CARGUE DE ESCOMBROS PREEXISTENTES A LA OBRA, ESCOMBROS DE TIPO GRANULAR O TÉRREO HOMOGÉNEO, TRANSPORTE Y RETIRO A ZONA DE ACOPIO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. INCLUYEN LONAS PARA RECOLECCIÓN. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.	M3	1	$ 36.794,00	$ 36.794,00	15,10	$ 555.589,40	7,00	$ 257.558,00		$ 0,00	7,00	$ 257.558,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.											$ 0,00	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 16.793,00	$ 16.793,00	14,80	$ 248.536,40	6,03	$ 101.261,79		$ 0,00	6,03	$ 101.261,79
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1	$ 42.458,00	$ 42.458,00	15,75	$ 668.713,50	15,75	$ 668.713,50		$ 0,00	15,75	$ 668.713,50
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	$ 36.041,00	$ 36.041,00	26,46	$ 953.644,86	26,46	$ 953.644,86		$ 0,00	26,46	$ 953.644,86

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	$ 97.521,00	$ 97.521,00	11,20	$ 1.092.235,20	6,38	$ 622.183,98		$ 0,00	6,38	$ 622.183,98
2.2	CONCRETOS												
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1	$ 328.439,00	$ 328.439,00	16,00	$ 5.255.024,00	16,00	$ 5.255.024,00		$ 0,00	16,00	$ 5.255.024,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 4.906,00	$ 4.906,00	50,00	$ 245.300,00	27,46	$ 134.718,76		$ 0,00	27,46	$ 134.718,76
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 5.294,00	$ 5.294,00	50,00	$ 264.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1	$ 18.140,00	$ 18.140,00	230,00	$ 4.172.200,00	39,50	$ 716.530,00		$ 0,00	39,50	$ 716.530,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.											$ 0,00	
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	$ 193.656,00	$ 193.656,00	2,37	$ 458.964,72	1,80	$ 348.580,80		$ 0,00	1,80	$ 348.580,80
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	$ 9.624,00	$ 9.624,00	112,00	$ 1.077.888,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).											0,00	
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	$ 12.221,00	$ 12.221,00	14,20	$ 173.538,20	14,20	$ 173.538,20		$ 0,00	14,20	$ 173.538,20
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1	$ 42.135,00	$ 42.135,00	1,00	$ 42.135,00	1,00	$ 42.135,00		$ 0,00	1,00	$ 42.135,00
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1	$ 44.622,00	$ 44.622,00	1,00	$ 44.622,00	1,00	$ 44.622,00		$ 0,00	1,00	$ 44.622,00
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 209.719,00	$ 209.719,00	20,60	$ 4.320.211,40	12,00	$ 2.516.628,00		$ 0,00	12,00	$ 2.516.628,00
4,1,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 59.813,00	$ 59.813,00	9,50	$ 568.223,50	9,50	$ 568.223,50		$ 0,00	9,50	$ 568.223,50
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1	$ 53.037,00	$ 53.037,00	1,00	$ 53.037,00	1,00	$ 53.037,00		$ 0,00	1,00	$ 53.037,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0	
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 126.018,00	$ 126.018,00	1,00	$ 126.018,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE APARATO	UN	1	$ 20.200,00	$ 20.200,00	1,00	$ 20.200,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	SALIDAS												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 159.365,00	$ 159.365,00	2,00	$ 318.730,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 128.111,00	$ 128.111,00	2,00	$ 256.222,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 192.560,00	$ 192.560,00	2,00	$ 385.120,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1	$ 40.466,00	$ 40.466,00	1,00	$ 40.466,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.											0	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1	$ 41.145,00	$ 41.145,00	24,00	$ 987.480,00	10,73	$ 441.485,85		$ 0,00	10,73	$ 441.485,85
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.13	PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1	$ 105.473,00	$ 105.473,00	5,40	$ 569.554,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1	$ 127.304,00	$ 127.304,00	20,54	$ 2.614.824,16	20,54	$ 2.614.824,16		$ 0,00	20,54	$ 2.614.824,16
7.4	OTROS												
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	1	$ 3.454,00	$ 3.454,00	79,00	$ 272.866,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO HETEROGENEO TARALAY ALTO TRÁFICO	M2	1	$ 181.080,00	$ 181.080,00	20,90	$ 3.784.572,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	$ 126.667,00	$ 126.667,00	9,87	$ 1.250.203,29	9,87	$ 1.250.203,29		$ 0,00	9,87	$ 1.250.203,29
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	$ 339.791,00	$ 339.791,00	1,00	$ 339.791,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	1	$ 647.786,00	$ 647.786,00	1,00	$ 647.786,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA (CINCO PIEZAS)	UN	1	$ 94.539,00	$ 94.539,00	1,00	$ 94.539,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1	$ 405.221,00	$ 405.221,00	6,00	$ 2.431.326,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1	$ 563.315,00	$ 563.315,00	1,00	$ 563.315,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1	$ 1.066.543,00	$ 1.066.543,00	1,00	$ 1.066.543,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	$ 754.543,00	$ 754.543,00	4,70	$ 3.546.352,10		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	1	$ 38.811,00	$ 38.811,00	123,00	$ 4.773.753,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1	$ 77.132,00	$ 77.132,00	32,00	$ 2.468.224,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1	$ 16.332,00	$ 16.332,00	22,00	$ 359.304,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL											0	
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.544,00	$ 4.544,00	324,00	$ 1.472.256,00	116,25	$ 528.240,00		$ 0,00	116,25	$ 528.240,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.											0	
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	$ 76.779,00	$ 76.779,00	18,60	$ 1.428.089,40	9,87	$ 757.808,73		$ 0,00	9,87	$ 757.808,73
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.											0	
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1	$ 71.487,00	$ 71.487,00	18,60	$ 1.329.658,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 13.684,00	$ 13.684,00	253,20	$ 3.464.788,80	158,70	$ 2.171.650,80		$ 0,00	158,70	$ 2.171.650,80

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 48.436,00	$ 48.436,00	426,90	$ 20.677.328,40	102,69	$ 4.973.892,84		$ 0,00	102,69	$ 4.973.892,84
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 29.924,00	$ 29.924,00	444,50	$ 13.301.218,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, LINEAL A <=50 GLS. CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	$ 11.140,00	$ 11.140,00	87,00	$ 969.180,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	1	$ 53.589,00	$ 53.589,00	23,70	$ 1.270.059,30		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1	$ 3.575,00	$ 3.575,00	185,90	$ 664.592,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	$ 42.492,00	$ 42.492,00	135,00	$ 5.736.420,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	30,00	$ 1.612.920,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA ATANASIO GIRARDOT			$ 7.109.323,00	$ 7.109.323,00		$ 101.527.136,43		$ 26.687.635,46		$ 0,00		$ 26.687.635,46
	UNIDAD OPERATIVA PIEDRA VERDE												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1	$ 38.578,00	$ 38.578,00	93,70	$ 3.614.758,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	$ 28.024,00	$ 28.024,00	1,00	$ 28.024,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO	M2	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	86,10	$ 2.120.298,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	$ 20.014,00	$ 20.014,00	150,56	$ 3.013.307,84		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METALICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR.	M2	1	$ 35.909,00	$ 35.909,00	4,40	$ 157.999,60	4,40	$ 157.999,60		$ 0,00	4,40	$ 157.999,60
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1	$ 27.846,00	$ 27.846,00	150,56	$ 4.192.493,76		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERIA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 20.619,00	$ 20.619,00	46,02	$ 948.886,38		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	$ 10.962,00	$ 10.962,00	11,38	$ 124.692,75		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	$ 15.635,00	$ 15.635,00	100,00	$ 1.563.500,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1	$ 6.417,00	$ 6.417,00	210,55	$ 1.351.099,35		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.											0	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	$ 64.211,00	$ 64.211,00	3,44	$ 220.885,84		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	CONCRETOS												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1	$ 26.389,00	$ 26.389,00	8,61	$ 227.209,29		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	1	$ 304.979,00	$ 304.979,00	28,70	$ 8.752.897,30		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 5.294,00	$ 5.294,00	208,76	$ 1.105.175,44		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.											0	
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	$ 9.624,00	$ 9.624,00	178,30	$ 1.715.959,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 20.683,00	$ 20.683,00	357,07	$ 7.385.278,81		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	1	$ 27.607,00	$ 27.607,00	107,50	$ 2.967.752,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	$ 23.009,00	$ 23.009,00	31,78	$ 731.226,02		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).											0	
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 70.513,00	$ 70.513,00	1,00	$ 70.513,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.											0	
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 28.373,00	$ 28.373,00	146,52	$ 4.157.211,96		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1	$ 15.145,00	$ 15.145,00	41,00	$ 620.945,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1	$ 152.676,00	$ 152.676,00	354,18	$ 54.074.785,68		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	$ 26.968,00	$ 26.968,00	2.124,20	$ 57.285.425,60	67,95	$ 1.832.475,60		$ 0,00	67,95	$ 1.832.475,60
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0.30 X 0.60 M. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR	M2	1	$ 712.778,00	$ 712.778,00	2,35	$ 1.675.028,30		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1	$ 178.192,00	$ 178.192,00	1,00	$ 178.192,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).											0,00	
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LAMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO,	M2	1	$ 200.441,00	$ 200.441,00	46,02	$ 9.224.294,82		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1	$ 101.902,00	$ 101.902,00	210,55	$ 21.455.466,10		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	1	$ 38.811,00	$ 38.811,00	86,10	$ 3.341.627,10		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL											0,00	
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.544,00	$ 4.544,00	514,67	$ 2.338.660,48		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.											0,00	
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	$ 79.207,00	$ 79.207,00	11,37	$ 900.583,59		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.											0,00	
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 29.924,00	$ 29.924,00	44,40	$ 1.328.625,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	$ 28.487,00	$ 28.487,00	12,70	$ 361.784,90	12,70	$ 361.784,90		$ 0,00	12,70	$ 361.784,90
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	$ 42.492,00	$ 42.492,00	357,16	$ 15.176.442,72	357,16	$ 15.176.442,72		$ 0,00	357,16	$ 15.176.442,72
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.3	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 28.403,00	$ 28.403,00	150,56	$ 4.276.355,68		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	$ 125.506,00	$ 125.506,00	150,56	$ 18.896.183,36		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	95,70	$ 5.145.214,80	81,20	$ 4.365.636,80		$ 0,00	81,20	$ 4.365.636,80
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	$ 41.937,00	$ 41.937,00	100,00	$ 4.193.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES											0	
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	$ 414.583,00	$ 414.583,00	10,00	$ 4.145.830,00	10,00	$ 4.145.830,00		$ 0,00	10,00	$ 4.145.830,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA PIEDRA VERDE			**$ 3.085.072,00**	**$ 3.085.072,00**		**$ 249.068.315,97**		**$ 26.040.169,62**		**$ 0,00**		**$ 26.040.169,62**
	UNIDAD OPERATIVA EL NOGAL												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	1	$ 5.695,00	$ 5.695,00	279,60	$ 1.592.322,00	81,64	$ 464.939,80		$ 0,00	81,64	$ 464.939,80
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.												
1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 21.733,00	$ 21.733,00	10,00	$ 217.330,00	5,98	$ 129.963,34		$ 0,00	5,98	$ 129.963,34
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.1	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERIA METALICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	$ 19.378,00	$ 19.378,00	46,68	$ 904.565,04	11,64	$ 225.559,92		$ 0,00	11,64	$ 225.559,92
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	$ 28.024,00	$ 28.024,00	6,00	$ 168.144,00	5,00	$ 140.120,00		$ 0,00	5,00	$ 140.120,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	$ 17.531,00	$ 17.531,00	3,42	$ 59.956,02	3,42	$ 59.956,02		$ 0,00	3,42	$ 59.956,02
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LAMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1	$ 12.898,00	$ 12.898,00	23,85	$ 307.617,30	23,85	$ 307.617,30		$ 0,00	23,85	$ 307.617,30
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LAMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1	$ 12.898,00	$ 12.898,00	9,00	$ 116.082,00	9,00	$ 116.082,00		$ 0,00	9,00	$ 116.082,00
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	$ 20.014,00	$ 20.014,00	200,00	$ 4.002.800,00	162,47	$ 3.251.674,58		$ 0,00	162,47	$ 3.251.674,58
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE,	M2	1	$ 72.138,00	$ 72.138,00	18,90	$ 1.363.408,20	18,48	$ 1.333.110,24		$ 0,00	18,48	$ 1.333.110,24
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METALICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR.	M2	1	$ 35.909,00	$ 35.909,00	9,30	$ 333.953,70		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS	M2	1	$ 19.378,00	$ 19.378,00	12,00	$ 232.536,00	12,00	$ 232.536,00		$ 0,00	12,00	$ 232.536,00
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 27.846,00	$ 27.846,00	100,00	$ 2.784.600,00	90,48	$ 2.519.506,08		$ 0,00	90,48	$ 2.519.506,08
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICION MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERIA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 20.619,00	$ 20.619,00	174,30	$ 3.593.891,70	106,08	$ 2.187.263,52		$ 0,00	106,08	$ 2.187.263,52
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	$ 10.681,00	$ 10.681,00	298,00	$ 3.182.938,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8.17	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1	$ 24.664,00	$ 24.664,00	100,00	$ 2.466.400,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.7	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES HASTA NIVEL DE PISO. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO COMO AREA CONSTRUIDA	M2	1	$ 65.617,00	$ 65.617,00	77,54	$ 5.087.942,18		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	$ 64.211,00	$ 64.211,00	6,22	$ 399.392,42		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	CONCRETOS												
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	$ 801.661,00	$ 801.661,00	5,00	$ 4.008.305,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2.13	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	1	$ 631.605,00	$ 631.605,00	5,00	$ 3.158.025,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 5.294,00	$ 5.294,00	150,00	$ 794.100,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	UN	1	$ 495.246,00	$ 495.246,00	4,00	$ 1.980.984,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	$ 47.616,00	$ 47.616,00	35,30	$ 1.680.844,80		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.												
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A.>10,0<=12,5 CM EN CONCRETO F'C=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	1	$ 140.251,00	$ 140.251,00	21,29	$ 2.985.943,79		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.3.3	COLUMNETAS Y/O VIGUETAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI, PARA REFORZAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	$ 496.395,00	$ 496.395,00	0,20	$ 99.279,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.10	TUBERIA PVCP 1" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL . INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE	M	1	$ 15.059,00	$ 15.059,00	90,00	$ 1.355.310,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.11	TUBERIA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 31.144,00	$ 31.144,00	90,00	$ 2.802.960,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.12	TUBERIA PVCP 1,1/4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 25.023,00	$ 25.023,00	90,00	$ 2.252.070,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.13	TUBERIA PVCP 2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 66.947,00	$ 66.947,00	90,00	$ 6.025.230,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.14	TUBERIA PVCP 2,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 86.504,00	$ 86.504,00	90,00	$ 7.785.360,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.15	TUBERIA PVCP 3" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 96.428,00	$ 96.428,00	90,00	$ 8.678.520,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.16	TUBERIA PVCP 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE	M	1	$ 186.502,00	$ 186.502,00	90,00	$ 16.785.180,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	$ 85.642,00	$ 85.642,00	90,00	$ 7.707.780,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	$ 12.221,00	$ 12.221,00	90,00	$ 1.099.890,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	$ 27.534,00	$ 27.534,00	50,00	$ 1.376.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	$ 28.011,00	$ 28.011,00	90,00	$ 2.520.990,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1	$ 42.135,00	$ 42.135,00	28,00	$ 1.179.780,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1	$ 44.622,00	$ 44.622,00	31,00	$ 1.383.282,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	1	$ 46.197,00	$ 46.197,00	15,00	$ 692.955,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	1	$ 75.301,00	$ 75.301,00	4,00	$ 301.204,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 209.719,00	$ 209.719,00	12,00	$ 2.516.628,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 70.513,00	$ 70.513,00	20,00	$ 1.410.260,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 59.813,00	$ 59.813,00	20,00	$ 1.196.260,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 34.172,00	$ 34.172,00	20,00	$ 683.440,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 1-1/2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 14.897,00	$ 14.897,00	20,00	$ 297.940,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 47.564,00	$ 47.564,00	20,00	$ 951.280,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 41.345,00	$ 41.345,00	20,00	$ 826.900,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	$ 25.985,00	$ 25.985,00	20,00	$ 519.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1	$ 56.989,00	$ 56.989,00	2,00	$ 113.978,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1	$ 53.109,00	$ 53.109,00	2,00	$ 106.218,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2"	UN	1	$ 42.233,00	$ 42.233,00	6,00	$ 253.398,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1	$ 103.908,00	$ 103.908,00	2,00	$ 207.816,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1	$ 53.037,00	$ 53.037,00	20,00	$ 1.060.740,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"	UN	1	$ 45.567,00	$ 45.567,00	20,00	$ 911.340,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.												
4.2.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 4"	UN	1	$ 969.073,00	$ 969.073,00	2,00	$ 1.938.146,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 3"	UN	1	$ 505.237,00	$ 505.237,00	2,00	$ 1.010.474,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 2"	UN	1	$ 520.413,00	$ 520.413,00	2,00	$ 1.040.826,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1	$ 160.031,00	$ 160.031,00	2,00	$ 320.062,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.												
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	1	$ 86.335,00	$ 86.335,00	20,00	$ 1.726.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4".	M	1	$ 44.609,00	$ 44.609,00	20,00	$ 892.180,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 126.018,00	$ 126.018,00	9,00	$ 1.134.162,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 141.046,00	$ 141.046,00	4,00	$ 564.184,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 216.536,00	$ 216.536,00	2,00	$ 433.072,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1	$ 45.492,00	$ 45.492,00	12,00	$ 545.904,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 233.280,00	$ 233.280,00	12,00	$ 2.799.360,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 234.005,00	$ 234.005,00	8,00	$ 1.872.040,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 188.235,00	$ 188.235,00	11,00	$ 2.070.585,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 76.242,00	$ 76.242,00	15,00	$ 1.143.630,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 69.575,00	$ 69.575,00	4,00	$ 278.300,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 49.503,00	$ 49.503,00	42,96	$ 2.126.648,88		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2	ACABADO DE PISOS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE	M2	1	$ 84.243,00	$ 84.243,00	18,00	$ 1.516.374,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.8	ACABADO DE PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 51 X 51 CM COLOR MATE. INCLUYE PEGA CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1	$ 110.996,00	$ 110.996,00	99,64	$ 11.059.641,44		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1	$ 26.636,00	$ 26.636,00	73,84	$ 1.966.802,24		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1	$ 50.001,00	$ 50.001,00	82,60	$ 4.130.082,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	1	$ 23.917,00	$ 23.917,00	50,00	$ 1.195.850,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4.18	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1	$ 123.715,00	$ 123.715,00	163,90	$ 20.276.888,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	$ 126.667,00	$ 126.667,00	197,80	$ 25.054.732,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	$ 376.298,00	$ 376.298,00	13,20	$ 4.967.133,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	$ 622.270,00	$ 622.270,00	16,00	$ 9.956.320,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1	$ 41.090,00	$ 41.090,00	4,00	$ 164.360,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 149.983,00	$ 149.983,00	5,60	$ 839.904,80		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	$ 865.594,00	$ 865.594,00	16,00	$ 13.849.504,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1	$ 753.998,00	$ 753.998,00	1,00	$ 753.998,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1	$ 592.916,00	$ 592.916,00	2,00	$ 1.185.832,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1	$ 648.167,00	$ 648.167,00	10,00	$ 6.481.670,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1	$ 100.337,00	$ 100.337,00	4,00	$ 401.348,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERÍA	UN	1	$ 238.227,00	$ 238.227,00	2,00	$ 476.454,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1	$ 405.221,00	$ 405.221,00	11,00	$ 4.457.431,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS)	UN	1	$ 113.690,00	$ 113.690,00	2,00	$ 227.380,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	$ 754.543,00	$ 754.543,00	50,40	$ 38.028.967,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.7	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS	UN	1	$ 179.664,00	$ 179.664,00	2,00	$ 359.328,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	1	$ 249.661,00	$ 249.661,00	4,00	$ 998.644,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1	$ 107.096,00	$ 107.096,00	174,30	$ 18.666.832,80		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADOS 1.5 DE E=4MM. INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	1	$ 58.316,00	$ 58.316,00	45,96	$ 2.680.203,36		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.544,00	$ 4.544,00	416,00	$ 1.890.304,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	$ 76.779,00	$ 76.779,00	78,24	$ 6.007.188,96		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 29.924,00	$ 29.924,00	31,30	$ 936.621,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES.	M2	1	$ 16.668,00	$ 16.668,00	9,30	$ 155.012,40		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	$ 30.982,00	$ 30.982,00	200,00	$ 6.196.400,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	$ 125.506,00	$ 125.506,00	200,00	$ 25.101.200,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.	M	1	$ 13.561,00	$ 13.561,00	100,00	$ 1.356.100,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	$ 252.993,00	$ 252.993,00	40,20	$ 10.170.318,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.2	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	1	$ 761.205,00	$ 761.205,00	31,92	$ 24.297.663,60		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	$ 414.583,00	$ 414.583,00	6,00	$ 2.487.498,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA EL NOGAL			**$ 17.021.044,00**	**$ 17.021.044,00**		**$ 382.714.731,93**		**$ 10.968.328,80**		**$ 0,00**		**$ 10.968.328,80**
	UNIDAD OPERATIVA SERVITA												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	1	$ 5.695,00	$ 5.695,00	35,90	$ 204.450,50	35,9	$ 204.450,50		$ 0,00	35,90	$ 204.450,50
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS	M2	1	$ 19.378,00	$ 19.378,00	142,84	$ 2.767.953,52	121,52	$ 2.354.814,56		$ 0,00	121,52	$ 2.354.814,56
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO. TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA	M2	1	$ 6.471,00	$ 6.471,00	476,02	$ 3.080.325,42	476,02	$ 3.080.325,42		$ 0,00	476,02	$ 3.080.325,42

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	$ 64.211,00	$ 64.211,00	3,79	$ 243.359,69	3,79	$ 243.359,69		$ 0,00	3,79	$ 243.359,69
2.2	CONCRETOS												
2.2.5	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	$ 760.401,00	$ 760.401,00	0,22	$ 167.288,22	0,22	$ 167.288,22		$ 0,00	0,22	$ 167.288,22
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	$ 801.661,00	$ 801.661,00	1,53	$ 1.226.541,33	0,93	$ 745.544,73		$ 0,00	0,93	$ 745.544,73
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 5.294,00	$ 5.294,00	200,00	$ 1.058.800,00	200,1	$ 1.059.329,40		$ 0,00	200,10	$ 1.059.329,40
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	UN	1	$ 495.246,00	$ 495.246,00	6,00	$ 2.971.476,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1	$ 18.140,00	$ 18.140,00	176,70	$ 3.205.338,00	176,7	$ 3.205.338,00		$ 0,00	176,70	$ 3.205.338,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 20.683,00	$ 20.683,00	350,00	$ 7.239.050,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	$ 23.009,00	$ 23.009,00	350,00	$ 8.053.150,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	$ 26.968,00	$ 26.968,00	1.352,88	$ 36.484.467,84	549,79	$ 14.826.736,72		$ 0,00	549,79	$ 14.826.736,72
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA OCTOGONAL. PERFIL RECTANGULAR PPAL DE 80X40MM Y PERFILES INTERMEDIOS DE 25X25MM CADA 10CM. AREA 40MT2	M2	1	$ 791.378,00	$ 791.378,00	71,44	$ 56.536.044,32	71,44	$ 56.536.044,32		$ 0,00	71,44	$ 56.536.044,32
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø =2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2.1/4"X2.1/4". ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS	M2	1	$ 101.952,00	$ 101.952,00	35,20	$ 3.588.710,40	35,2	$ 3.588.710,40		$ 0,00	35,20	$ 3.588.710,40
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	1	$ 90.477,00	$ 90.477,00	2,00	$ 180.954,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1	$ 153.525,00	$ 153.525,00	9,12	$ 1.400.148,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1	$ 77.132,00	$ 77.132,00	38,32	$ 2.955.698,24	38,32	$ 2.955.698,24		$ 0,00	38,32	$ 2.955.698,24
18	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.												
18.1	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 485.102,00	$ 485.102,00	6,00	$ 2.910.612,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.544,00	$ 4.544,00	1.015,40	$ 4.613.977,60	206,68	$ 939.153,92		$ 0,00	206,68	$ 939.153,92
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	$ 20.170,00	$ 20.170,00	140,00	$ 2.823.800,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.1.12	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1	$ 29.962,00	$ 29.962,00	80,00	$ 2.396.960,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES	M2	1	$ 16.668,00	$ 16.668,00	105,00	$ 1.750.140,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	$ 37.216,00	$ 37.216,00	369,48	$ 13.750.567,68	369,48	$ 13.750.567,68		$ 0,00	369,48	$ 13.750.567,68
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	$ 28.487,00	$ 28.487,00	36,40	$ 1.036.926,80	39,2	$ 1.116.690,40		$ 0,00	39,20	$ 1.116.690,40
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	$ 252.993,00	$ 252.993,00	60,56	$ 15.321.256,08		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 214.844,00	$ 214.844,00	192,96	$ 41.456.298,24	121,52	$ 26.107.842,88		$ 0,00	121,52	$ 26.107.842,88
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1	$ 25.399,00	$ 25.399,00	551,00	$ 13.994.849,00	551	$ 13.994.849,00		$ 0,00	551,00	$ 13.994.849,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	$ 414.583,00	$ 414.583,00	12,00	$ 4.974.996,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA SERVITA			**$ 4.991.589,00**	**$ 4.991.589,00**		**$ 236.394.138,88**		**$ 144.876.744,08**		**$ 0,00**		**$ 144.876.744,08**
	UNIDAD OPERATIVA VILLA CRISTINA												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METALICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	$ 24.626,00	$ 24.626,00	5,00	$ 123.130,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS	M2	1	$ 19.378,00	$ 19.378,00	36,00	$ 697.608,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	$ 14.178,00	$ 14.178,00	10,00	$ 141.780,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.10	DESMONTE / DEMOLICION MANUAL DE MURO / DIVISION UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO DE ESPESOR HASTA 1/2", CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	$ 20.001,00	$ 20.001,00	33,70	$ 674.033,70		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	$ 5.294,00	$ 5.294,00	40,00	$ 211.760,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1	$ 18.140,00	$ 18.140,00	350,00	$ 6.349.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 20.683,00	$ 20.683,00	300,00	$ 6.204.900,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.5	RED GENERAL CONTRAINCENDIO.												
4.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO MANIJA	UN	1	$ 1.125.160,00	$ 1.125.160,00	1,00	$ 1.125.160,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 192.560,00	$ 192.560,00	10,00	$ 1.925.600,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1	$ 68.811,00	$ 68.811,00	10,00	$ 688.110,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	$ 26.968,00	$ 26.968,00	6,00	$ 161.808,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 204.051,00	$ 204.051,00	7,20	$ 1.469.167,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 149.983,00	$ 149.983,00	10,00	$ 1.499.830,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.2	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1.20 M) MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	$ 217.171,00	$ 217.171,00	1,56	$ 338.786,76		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	$ 754.543,00	$ 754.543,00	5,00	$ 3.772.715,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.2	DIVISIONES.												
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	1	$ 85.074,00	$ 85.074,00	5,00	$ 425.370,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	1	$ 38.811,00	$ 38.811,00	21,00	$ 815.031,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.5	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA PREONDULADA; POSTES PRINCIPALES EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AGUA NEGRA GALVANIZADO Ø.=2" E.=2,49 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; MARCO EN ÁNGULO DE ACERO DE 1,1/4"X3/16" CONFORMANDO MÓDULOS DE TAMAÑO MÁXIMO 2.00X2.00 M C/U (SE PUEDEN PACHAR MÓDULOS ENTRE SÍ); PISAMALLA EN ÁNGULO DE ACERO DE	M	1	$ 189.481,00	$ 189.481,00	36,00	$ 6.821.316,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	1	$ 90.477,00	$ 90.477,00	4,00	$ 361.908,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1	$ 153.525,00	$ 153.525,00	13,00	$ 1.995.825,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 29.924,00	$ 29.924,00	550,00	$ 16.458.200,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.4	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METALICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA. MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y	M2	1	$ 40.241,00	$ 40.241,00	24,00	$ 965.784,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	$ 37.216,00	$ 37.216,00	50,00	$ 1.860.800,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	$ 28.487,00	$ 28.487,00	12,00	$ 341.844,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	$ 42.492,00	$ 42.492,00	450,00	$ 19.121.400,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	$ 214.844,00	$ 214.844,00	36,00	$ 7.734.384,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS	M	1	$ 53.764,00	$ 53.764,00	12,00	$ 645.168,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA XXX			**$ 3.865.883,00**	**$ 3.865.883,00**		**$ 82.930.418,66**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 9.648.303.370,68**		**$ 1.990.727.656,09**		**$ 459.517.166,37**		**$ 0,00**		**$ 459.517.166,37**
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			$ 2.605.041.910,08		$ 537.496.467,14		$ 124.069.634,92		$ 0,00		$ 124.069.634,92
	IMPREVISTO	2,00%			$ 192.966.067,41		$ 39.814.553,12				$ 0,00		$ 0,00
	UTILIDAD	4,00%			$ 385.932.134,83		$ 79.629.106,24		$ 18.380.686,65		$ 0,00		$ 18.380.686,65
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 3.183.940.112,32**		**$ 656.940.127,00**		**$ 142.450.321,57**		**$ 0,00**		**$ 142.450.321,57**
	TOTAL COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO				**$ 12.832.243.483,00**		**$ 2.647.667.783,09**		**$ 601.967.487,94**		$ 0,00		**$ 601.967.487,94**
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ 0,00		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ 0,00		-$ 0,09		$ 0,06		$ 0,00		$ 0,06
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 12.832.243.483,00**		**$ 2.647.667.783,00**		**$ 601.967.488,00**		**$ 0,00**		**$ 601.967.488,00**

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025 literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) el contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago" NO se cobra el 2% del valor de IMPREVISTOS para el corte No.1

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	DICIEMBRE DEL 2025				
INFORME SOCIAL	1	DICIEMBRE DEL 2025				
INFORME AMBIENTAL	1	DICIEMBRE DEL 2025				
INFORME SST	1	DICIEMBRE DEL 2025				
INFORME DE SUPERVISION	1	DICIEMBRE DEL 2025				
ACTA PARCIAL	1	ENERO DEL 2026				
SOPORTE PAGO SDH	1					
FACTURA	1					
FORMATO MC 14	1					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de ENERO _del año _2026_

Nombre: HERNANDO LANCHERO IBAÑES
C.C. No 19,260,302
Rep Legal.
Nit. 902,002,156-2
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLS

Nombre: JORGE BELTRAN CATUMBA
C.C. No. 80,882,815
Rep legal
Nit. 902,006,712-5
CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

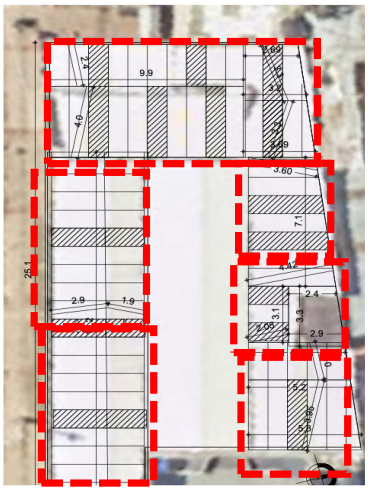
PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**ACTA 01**
ITEM	**1.4.8.**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE
LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
BAÑOS- AULA 2- AULA 1- COSTADO SUR	55,68	2,90	19,20			1,00	55,68			
BAÑOS- AULA 2- AULA 1- COSTADO NORTE	36,48	1,90	19,20			1,00	36,48			
OFICINAS COORDINACION - BAÑO- COCINA	39,60	4,00	9,90			1,00	39,60			
ARCHIVO-BAÑO-DESPENSA- COCINA	23,76	2,40	9,90			1,00	23,76			
SALA AMIGA- AULA 3	10,54	3,30	3,19			1,00	10,54			
AULA 3	28,47	4,01	7,10			1,00	28,47			
BAÑOS - COSTADO POSTERIOR	6,36	2,05	3,10			1,00	6,36			
AULA 4	10,61	2,10	5,05			1,00	10,61			
AULA 4	21,73	3,95	5,50			1,00	21,73			

TOTAL EJECUTADO	233,21	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**233,21**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
233,21	0,00	**233,21**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

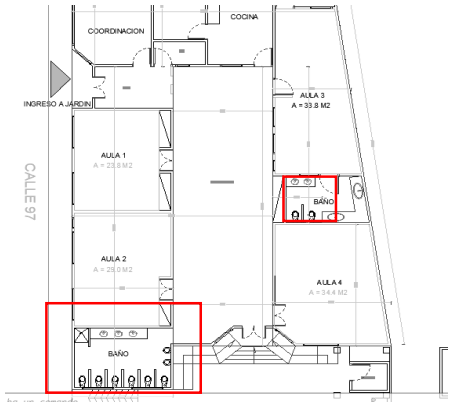
Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 01**
ITEM	**1.8.11** **DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE
LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
BAÑOS- AULA 2- AULA 1-			0,82	0,82		6,00	4,03			
BAÑOS- AULA 3			0,82	0,82		1,00	0,67			

TOTAL EJECUTADO	4,71	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,71**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,71	0,00	**4,71**

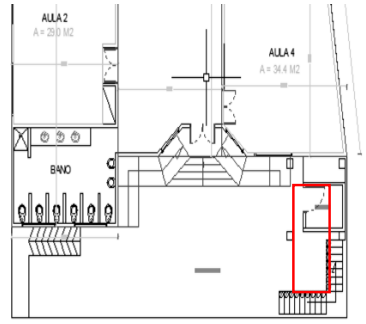

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO CARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**9,1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**9,1,5** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	PUERTA SHUT BASURAS (ZONA DE JUEGOS)		1,52		1,99		1,00	3,02			
PUERTA TIPO 5 (depósitos de residuos y cuartos de aseo)  											

TOTAL EJECUTADO	3,0200	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3,02000**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,02	0,00	**3,020**

OBSERVACIONES:

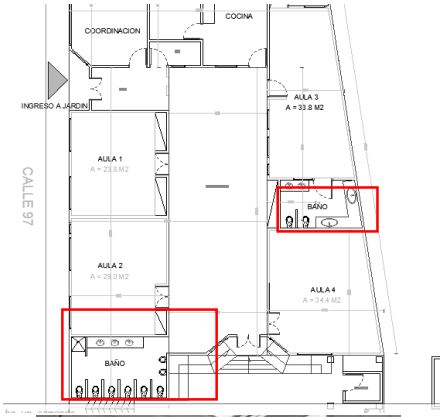
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAD**	CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**	**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**	

CAPITULO	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 01**
ITEM	**12.3** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑOS- AULA 2- AULA 1-			0,82	0,82		6,00	4,03			
	BAÑOS- AULA 3			0,82	0,82		1,00	0,67			





TOTAL EJECUTADO	4,71	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,71**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,71	0,00	**4,71**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

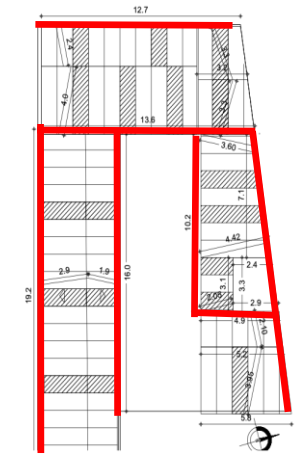
Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1,11,10**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
BAÑOS- AULA 2- AULA 1- COSTADO SUR			19,20			1,00	19,20			
BAÑOS- AULA 2- AULA 1- COSTADO NORTE			16,00			1,00	16,00			
OFICINAS COORDINACION - BAÑO- COCINA			13,60			1,00	13,60			
ARCHIVO-BAÑO- DESPENSA-COCINA			12,70			1,00	12,70			
AULA 3			10,20			1,00	10,20			
BAÑOS - COSTADO POSTERIOR			5,10			1,00	5,10			
AULA 4			4,90			1,00	4,90			
AULA 4			5,80			1,00	5,80			

TOTAL EJECUTADO	87,50	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**87,50**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
87,50	0,00	**87,50**

OBSERVACIONES:

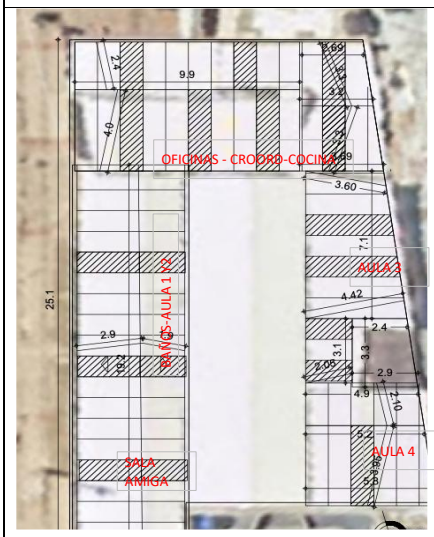
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**ACTA No:**	**ACTA 01**	
ITEM	**23.4.5.**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)+D19**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
BAÑOS- AULA 2- AULA 1- COSTADO SUR	55,68	2,90	19,20			1,00	55,68			
BAÑOS- AULA 2- AULA 1- COSTADO NORTE	36,48	1,90	19,20			1,00	36,48			
OFICINAS COORDINACION - BAÑO- COCINA	39,60	4,00	9,90			1,00	39,60			
ARCHIVO-BAÑO- DESPENSA-COCINA	23,76	2,40	9,90			1,00	23,76			
SALA AMIGA- AULA 3	10,54	3,30	3,19			1,00	10,54			
AULA 3	28,47	4,01	7,10			1,00	28,47			
BAÑOS - COSTADO POSTERIOR	6,36	2,05	3,10			1,00	6,36			
AULA 4	10,61	2,10	5,05			1,00	10,61			
AULA 4	21,73	3,95	5,50			1,00	21,73			

TOTAL EJECUTADO	233,21	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**233,21**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
233,21	0,00	**233,21**

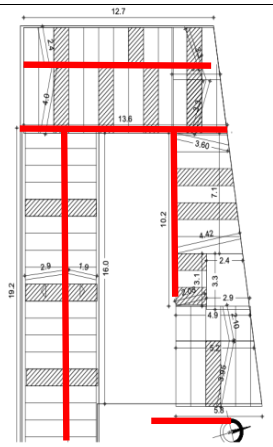

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**23.4.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑOS- AULA 2- AULA 1-		1,00	19,20				19,20			
	OFICINAS COORDINACION - BAÑO- COCINA		1,00	9,90				9,90			
	SALA AMIGA- AULA 3		1,00	3,30				3,30			
	SALA AMIGA- AULA 3		1,00	6,30				6,30			
	AULA 4		1,00	5,20				5,20			
 											

TOTAL EJECUTADO	43,90	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**43,90**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
43,90	0,00	**43,90**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

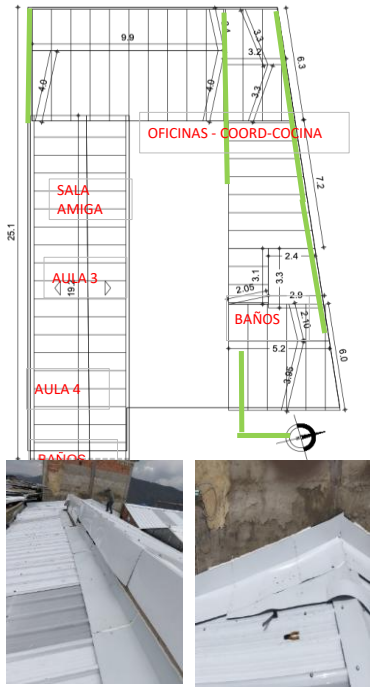
Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDÍN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE
LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
OFICINAS COORDINACION -BAÑO- COCINA			4,00			1,00	4,00			
ARCHIVO-BAÑO-DESPENSA- COCINA			4,00			1,00	4,00			
ARCHIVO-BAÑO-DESPENSA- COCINA			2,40			1,00	2,40			
AULA 3			7,20			1,00	7,20			
BAÑOS			3,30			1,00	3,30			
BAÑOS			2,05			1,00	2,05			
AULA 4			6,00			1,00	6,00			

TOTAL EJECUTADO	28,95	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**28,95**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,95	0,00	**28,95**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		CHAPINERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.3.12**	**DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE
	LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	PATIO OCCIDENTAL CERRAMIENTO		3,10		1,95		3,00	18,14			
							TOTAL EJECUTADO	18,140	M2		
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2		
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2		

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.2.4** — **DESMONTE MANUAL DE MUEBLE EXISTENTE EN ACERO INOXIDABLE A.>40<=60 CM. INCLUYE EMBALAJE CON POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL ÁREA ENCARGADA PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
DESMONTE DE MUEBLES EN COCINA - PERIMETRAL	9,80	0,7	14			1,00	9,80			
ESTUFAS	3,52	0,88	4			1,00	3,52			
MESON ENTREGA ALIMENTOS	2,18	0,70	3,11			1,00	2,18			
MUEBLE DESPENSA	2,20	2,00	1,245			1,00	2,20			

TOTAL EJECUTADO	17,70	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**17,70**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17,70	0,00	**17,70**

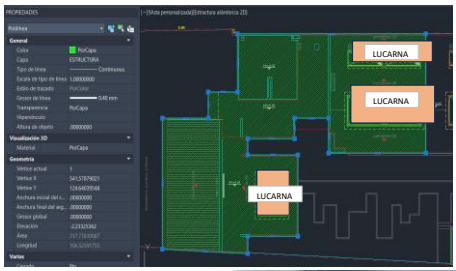

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.(CUBERTA MANTO) DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	DESMONTE DE MANTO EN UBIERTA	317,77	19,18	16,57			1,00	317,77			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #1	6,81	1,00	6,81			-1,00	-6,81			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #2	15,94	2,34	6,81			-1,00	-15,94			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #3	7,73	2,40	3,22			-1,00	-7,73			
 											

TOTAL EJECUTADO	287,30	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**287,30**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
287,30	0,00	**287,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO #1	22,39	2,53	8,85			1,00	22,39			
	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO #2	24,68	2,85	8,66			1,00	24,68			
 											

TOTAL EJECUTADO	47,07	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**47,07**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
47,07	0,00	**47,07**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.5.6** **DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.(COCINA)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	DEMOLICION DE ENCHAPE EN COCINA	41,79	4,31	9,70			1,00	41,79			

TOTAL EJECUTADO	41,79	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**41,79**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
41,79	0,00	**41,79**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.5.10**	**DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.(ZONA ADMINISTRATIVA)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE #1
	LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	DESMONTE DE PISO ZON ADMISITRATIVA										
	ZONA 1	23,09	8,10	2,85			1,00	23,09			
	ZONA 2	11,90	4,17	2,85			1,00	11,90			
 											

TOTAL EJECUTADO	34,98	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**34,98**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
34,98	0,00	**34,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7.2 ACABADO DE PISOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**7.2.11**	**ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.(COCINA)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	SUMINISTRO E INSTALACION PISO COCINA	41,79	4,31	9,70			1,00	41,79			
	SUMINISTRO E INSTALACION PISO ZONA	34,98	4,34	8,06			1,00	34,98			
											
											
 											

TOTAL EJECUTADO	76,77	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**76,77**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
76,77	0,00	**76,77**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.(MUROS INTERNOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	MURO VINILO AULA #1	24,56		20,81	1,18		1,00	24,56			
	MURO VINILO AULA #2	21,37		18,11	1,18		1,00	21,37			
	MURO VINILO AULA #3	24,84		21,05	1,18		1,00	24,84			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #3	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #4	21,33		18,08	1,18		1,00	21,33			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #4	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #5	21,33		18,08	1,18		1,00	21,33			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #5	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #6	21,33		18,08	1,18		1,00	21,33			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #6	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #7	21,33		18,08	1,18		1,00	21,33			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #7	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #8	21,33		18,08	1,18		1,00	21,33			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #8	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #9	21,33		18,08	1,18		1,00	21,33			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #9	12,33		11,52	1,07		1,00	12,33			
	MURO VINILO AULA #10	20,04		16,98	1,18		1,00	20,04			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #10	12,41		11,6	1,07		1,00	12,41			
	MURO VINILO AULA #11	19,89		16,86	1,18		1,00	19,89			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #11	15,74		15,42	0,8		1,00	15,74			
	MURO VINILO AULA #11	19,89		16,86	1,18		1,00	19,89			
	MURO VINILO LUCARNA AULA #11	15,74		15,42	0,8		1,00	15,74			







TOTAL EJECUTADO	388,77	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**388,77**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
388,77	0,00	**388,77**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			LOS SAUCES
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.(CIELO RASO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
CIELO RASO AULA #1	30,72	7,30	4,21			1,00	30,72			
CIELO RASO AULA #2	30,36	7,30	4,21			1,00	30,36			
CIELO RASO AULA #3	35,28	7,03	5,02			1,00	35,28			
CIELO RASO AULA #4	32,60	6,43	5,07			1,00	32,60			
CIELO RASO AULA #5	32,60	6,43	5,07			1,00	32,60			
CIELO RASO AULA #6	32,60	6,43	5,07			1,00	32,60			
CIELO RASO AULA #7	32,60	6,43	5,07			1,00	32,60			
CIELO RASO AULA #8	32,60	6,43	5,07			1,00	32,60			
CIELO RASO AULA #9	32,60	6,43	5,07			1,00	32,60			
CIELO RASO AULA #10	31,55	3,95	7,99			1,00	31,55			
CIELO RASO AULA #11	30,67	4,90	6,26			1,00	30,67			
CIELO RASO AULA #12	29,95	4,90	6,11			1,00	29,95			

TOTAL EJECUTADO	384,12	M2
VIENE DE MEMORIA ANTERIOR	388,77	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**772,89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
772,89	0,00	**772,89**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**22.1.10** — **PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA














LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE #1
LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO ESMALTE AULA #1	34,22		22,81	1,50		1,00	34,22			
MURO ESMALTE AULA #2	33,09		22,06	1,50		1,00	33,09			
MURO ESMALTE AULA #3	36,33		24,22	1,50		1,00	36,33			
MURO ESMALTE AULA #4	32,31		21,54	1,50		1,00	32,31			
MURO ESMALTE AULA #5	32,31		21,54	1,50		1,00	32,31			
MURO ESMALTE AULA #6	32,31		21,54	1,50		1,00	32,31			
MURO ESMALTE AULA #7	32,31		21,54	1,50		1,00	32,31			
MURO ESMALTE AULA #8	32,31		21,54	1,50		1,00	32,31			
MURO ESMALTE AULA #9	32,31		21,54	1,50		1,00	32,31			
MURO ESMALTE AULA #10	30,03		20,02	1,50		1,00	30,03			
MURO ESMALTE AULA #11	28,22		18,81	1,50		1,00	28,22			
MURO ESMALTE AULA #12	28,22		18,81	1,50		1,00	28,22			
MURO ESMALTE BAÑO #1	9,30		17,55	0,53		1,00	9,30			
CIELO RASO ESMALTE BAÑO #1	14,16		6,11	2,32		1,00	14,16			
MURO ESMALTE BAÑO #2	8,65		16,33	0,53		1,00	8,65			
CIELO RASO ESMALTE BAÑO #2	14,62		6,11	2,39		1,00	14,62			
MURO ESMALTE BAÑO Y CUARTO DE ASEO #1	5,55		10,48	0,53		1,00	5,55			
CIELO RASO ESMALTE BAÑO Y CUARTO DE ASEO #1	3,40		1,28	2,65		1,00	3,40			
MURO ESMALTE BAÑO #3	6,94		13,09	0,53		1,00	6,94			
CIELO RASO ESMALTE BAÑO #3	14,26		2,60	5,48		1,00	14,26			
MURO ESMALTE BAÑO #4	6,72		12,67	0,53		1,00	6,72			
CIELO RASO ESMALTE BAÑO #4	12,37		2,26	5,48		1,00	12,37			
MURO ESMALTE BAÑO Y CUARTO DE ASEO #2	4,84		9,14	0,53		1,00	4,84			
CIELO RASO ESMALTE BAÑO Y CUARTO DE ASEO #2	2,62		1,87	1,40		1,00	2,62			

TOTAL EJECUTADO	487,39	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**487,39**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
487,39	0,00	**487,39**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGÜIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

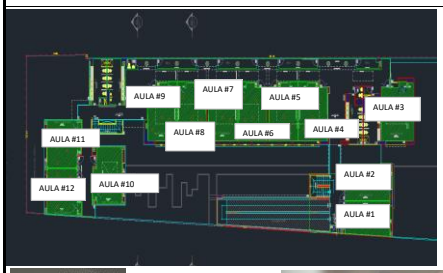
Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**22.6 OTROS EN OBRAS INTERIORES.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**22.6.2**	**PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**									
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #1			22,81			1,00	22,81			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #2			22,06			1,00	22,06			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #3			22,24			1,00	22,24			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #4			21,54			1,00	21,54			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #5			21,54			1,00	21,54			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #6			21,54			1,00	21,54			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #7			21,54			1,00	21,54			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #8			21,54			1,00	21,54			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #9			21,54			1,00	21,54			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #10			16,98			1,00	16,98			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #11			16,86			1,00	16,86			
PINTURA GUARDA ESCOBA AULA #12			16,86			1,00	16,86			

TOTAL EJECUTADO	247,05	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**247,05**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
247,05	0,00	**247,05**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

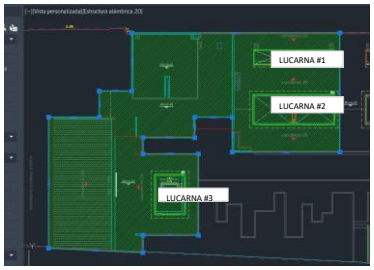
PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.3.2**	**ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.(cubierta)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE #1
	LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	ALISTADO DE MORTERO	317,77	19,18	16,5678			1,00	317,77			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #1	6,81	1,00	6,81			-1,00	-6,81			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #2	15,94	2,34	6,81			-1,00	-15,94			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #3	7,73	2,40	3,22			-1,00	-7,73			
 											

TOTAL EJECUTADO	287,30	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**287,30**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
287,30	0,00	**287,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**		JARDIN INFANTIL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**		**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.3.4**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2(cubierta)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE #1**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	INSTALACION MANTO	317,77	19,18	16,57			1,00	317,77			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #1	6,81	1,00	6,81			-1,00	-6,81			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #2	15,94	2,34	6,81			-1,00	-15,94			
	DESCUENTO VANO LUCARNA #3	7,73	2,40	3,22			-1,00	-7,73			
 											

TOTAL EJECUTADO	287,30	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**287,30**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
287,30	0,00	**287,30**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ CARLOS GAONA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
   	PLACA PISO 3 COSTADO CRA 13		6,85	27,01				185,02			
	PLACA PISO 3 COSTADO CRA 13		7,06	1,81				12,75			
	PLACA PISO 3 COSTADO CALLE 22		6,23	27,01				168,39			
	PERGOLA CIRCULAR EN CRISTAL ESCALERA		-16,61	1,00				-16,61			

TOTAL EJECUTADO	349,55	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**349,55**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
349,55	0,00	**349,55**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ LUZ ELENA CHOCONTA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**7.4.14**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 1 PISO 2		4,70				1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 2 PISO 2		4,70				1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 3 PISO 2		4,70				1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 4 PISO 3		4,70				1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 5 PISO 4		4,70				1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 6 PISO 4		4,70				1,00	4,70			
 	SELLE DE PLATINAS ESTRUCTURA METALICA		1,05				2,00	2,10			

TOTAL EJECUTADO	30,30	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**30,30**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
30,30	0,00	**30,30**

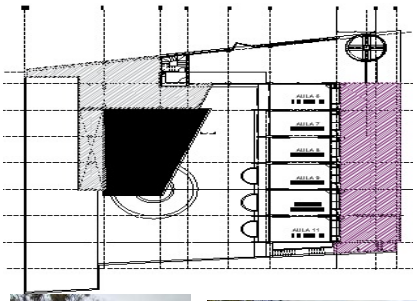
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ LUZ ELENA CHOCONTA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.3.2**	**ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	PLACA PISO 3 COSTADO CRA 13		6,85	27,01			1,00	185,02			
	PLACA PISO 3 COSTADO CRA 13		7,06	1,8064			1,00	12,75			
											
											
											
											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.8.17**	**TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	PLACA PISO 3 COSTADO CRA 13		197,77				0,15	29,67			

TOTAL EJECUTADO	29,67	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**29,67**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,67	0,00	**29,67**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ LUZ ELENA CHOCONTA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**25 OTRAS ACTIVIDADES**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**25.3**	**DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
   	INSTALACUION DE PUNTOS DE ANCHAJES CERTIFICADOS DE RESTRICCION						11,00	11,00			

TOTAL EJECUTADO	11,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**11,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
11,00	0,00	**11,00**

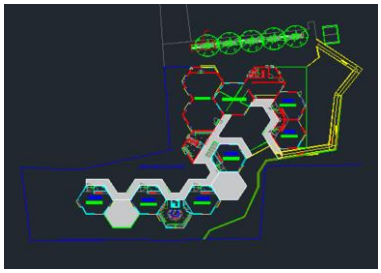
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	Luz Choconta Puerto
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ LUZ ELENA CHOCONTA**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	PLACA CORREDOR AULAS 11 A 13		1,70	34,70				58,99			
	PLACA CORREDOR AULA 10		1,70	29,70				50,49			
	PLACA CORREDOR AULAS 8 Y 9		1,70	21,10				35,87			
	PLACA CORREDOR OFICINA		1,70	5,00				8,50			
	PARQUES		23,75	1,70				40,38			
			27,00	1,75				47,25			

TOTAL EJECUTADO	241,48	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**241,48**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
241,48	0,00	**241,48**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	PARQUE ORIENTAL	27	1,75				47,25	47,25			
											

TOTAL EJECUTADO	47,25	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**47,25**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
47,25	0,00	**47,25**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.5.3**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COMEDOR / Costado Oriental			12,00				12,00			
	COMEDOR / Costado Occidental			13,60				13,60			
	COMEDOR / Norte - Sur			13,75				13,75			
											

TOTAL EJECUTADO	39,35	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**39,35**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
39,35	0,00	**39,35**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**1.5**	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**1.5.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**	

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COMEDOR		12,00	7,00			2,00	168,00			
	COCINA		5,22	3,45			2,00	36,02			
			1,58	0,84			2,00	2,65			
			1,16	1,70			2,00	3,94			

TOTAL EJECUTADO	210,62	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**210,62**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
210,62	0,00	**210,62**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**7.1.4**	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	PARQUE ORIENTAL		27,00	1,75				47,25			
	COMEDOR		12,00	7,00				84,00			
	COCINA		5,22	3,45				18,01			
			1,58	0,84				1,33			
			1,16	1,70				1,97			
								0,00			
											

TOTAL EJECUTADO	152,56	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**152,56**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
152,56	0,00	**152,56**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7.2 ACABADO DE PISOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**7.2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	PARQUE ORIENTAL		12,00	7,00				84,00			
	COMEDOR		5,22	3,45				18,01			
	COCINA		1,58	0,84				1,33			
			1,16	1,70				1,97			
											
											

TOTAL EJECUTADO	105,31	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**105,31**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
105,31	0,00	**105,31**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**7.3.11**	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COMEDOR / Costado Oriental			12,00				12,00			
	COMEDOR / Costado Occidental			13,60				13,60			
	COMEDOR / Norte - Sur			13,75				13,75			
											

TOTAL EJECUTADO	39,35	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**39,35**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
39,35	0,00	**39,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
    	CIELO RASO PRIMER PISO		1,70	34,70				58,99			
			1,70	29,70				50,49			
			1,70	21,10				35,87			
			1,70	5,00				8,50			
	ACCESO PRINCIPAL		9,20	5,94				54,60			
	COMEDOR PRIMER PISO - Cielo Raso		12,00	7,00				84,00			
	COMEDOR SEGUNDO PISO		44,00	1,80				79,20			

TOTAL EJECUTADO	371,65	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**371,65**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
371,65	0,00	**371,65**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM:	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
    	COMEDOR PRIMER PISO		27,40	2,30				63,02			
	COCINA		19,80	2,30				45,54			
	PLACA COCINA		3,45	6,20				21,39			
	COMEDOR SEGUNDO PISO		44,00	1,10				48,40			

TOTAL EJECUTADO	178,35	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**178,35**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
178,35	0,00	**178,35**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ATA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**25 OTRAS ACTIVIDADES**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**25.3**	**DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
   	PLACA RÍGIDA						20,00	20,00			

TOTAL EJECUTADO	20,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**20,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
20,00	0,00	**20,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO ADMT.						1,00	1,00			
	AULAS 1er. y 2o. NIVEL						6,00	6,00			
											

TOTAL EJECUTADO	7,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U
PRESENTE ACTA	**7,00**	U

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**1.5.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑOS NIÑ@S		2,40	1,70			1,00	4,08			
	HALL PRINCIPAL		0,90	3,50			2,00	6,30			
											
											

TOTAL EJECUTADO	10,38	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,38**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,38	0,00	**10,38**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.8.12**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO ADMT.		2,00	0,90				1,80			
	ANTEPECHO OFICINA		3,30	0,80				2,64			
											

TOTAL EJECUTADO	4,44	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,44**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,44	0,00	**4,44**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.9.10**	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO ADMT.		4,00	0,30				1,20			
	OFICINA		4,00	3,70				14,80			
	C.I. NUEVA		1,20	1,00				1,20			
											

TOTAL EJECUTADO	17,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**17,20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17,20	0,00	**17,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMIARES**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.11.1**	**CARGUE DE ESCOMBROS PREEXISTENTES A LA OBRA, ESCOMBROS DE TIPO GRANULAR O TÉRREO HOMOGÉNEO, TRANSPORTE Y RETIRO A ZONA DE ACOPIO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. INCLUYEN LONAS PARA RECOLECCIÓN. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO, OFICINA Y ZONA RAMPA						7,00	7,00			
											

TOTAL EJECUTADO	7,00	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**7,00**	M3

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**2.1.1**	**DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COSTADO OCCIDENTAL		6,70	0,90				6,03			
											

TOTAL EJECUTADO	6,03	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**6,03**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,03	0,00	**6,03**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**2,1.5.**	**EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COSTADO OCCIDENTAL(FACHAADA LATERAL IZQUIERDA PARA CAJA DE INSPECCION PRINCIPAL)						11,00	11,00			
	OFICINA(CONEXXION BAÑO A CAJA EXTERIOR)						4,75	4,75			
											

TOTAL EJECUTADO	15,75	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**15,75**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
15,75	0,00	**15,75**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**2,1.7**	**RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COSTADO OCCIDENTAL(FACHAADA LATERAL IZQUIERDA PARA CAJA DE INSPECCION PRINCIPAL)		11,00	1,40	1,20		18,48	18,48			
	OFICINA(CONEXXION BAÑO A CAJA EXTERIOR)		4,75	1,40	1,20		7,98	7,98			
											

TOTAL EJECUTADO	26,46	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**26,46**	M3

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,46	0,00	**26,46**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**2,1.9**	**RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN..**		**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	COSTADO OCCIDENTAL(FACHAADA LATERAL IZQUIERDA PARA CAJA DE INSPECCION PRINCIPAL)		11,00	0,45	0,90			4,46			
	OFICINA(CONEXXION BAÑO A CAJA EXTERIOR)		4,75	0,45	0,90			1,92			
											

TOTAL EJECUTADO	6,38	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**6,38**	M3

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,38	0,00	**6,38**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**2.2.8**	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO ADMT.		4,00	0,30				1,20			
	OFICINA(COORDINACIÓN)		4,00	3,70				14,80			
											
											

TOTAL EJECUTADO	16,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**16,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,00	0,00	**16,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LABA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE - CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**2.5 ACERO DE REFUERZO- ESTRUCTURA**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**2.5.1**	**MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.**		**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO ADMT.		4,00	0,30	1,32			1,58			
	OFICINA		4,00	3,70	1,32			19,54			
	CAJA NUEVA		4,00	1,20	1,32			6,34			
											

TOTAL EJECUTADO	27,46	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**27,46**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
27,46	0,00	**27,46**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**2,6 ESTRUCTURA METALICA**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**2.6.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**		**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	REFUERZO PLACA TANQUES		2,50		15,80	39,50		39,50			
											

TOTAL EJECUTADO	39,50	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**39,50**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
39,50	0,00	**39,50**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**3,1 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**3.1.3**	**MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	BAÑO ADMT.		2	0,90				1,80			

TOTAL EJECUTADO	1,80	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1,80**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,80	0,00	**1,80**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**4,1 TUBERIA Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**4.1.32**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	BAÑO NUEVO		14,20	1,00				14,20			

TOTAL EJECUTADO	14,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**14,20**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,20	0,00	**14,20**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**4,1 TUBERIA Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**4.1.35**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO NUEVO						1,00	1,00			
											

TOTAL EJECUTADO	1,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U
PRESENTE ACTA	**1,00**	U

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**4,1 TUBERIA Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**4.1.36**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO NUEVO						1,00	1,00			
											

TOTAL EJECUTADO	1,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U
PRESENTE ACTA	**1,00**	U

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**4,1 TUBERIA Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**4.1.39**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	OFICINA						6,0	6,0			
	EXTERIOR						6,0	6,0			

TOTAL EJECUTADO	12,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**12,00**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,00	0,00	**12,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**4,1 TUBERIA Y ACCESORIOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**4.1.41**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
  	BAÑO NUEVO			9,50			9,50	9,50			

TOTAL EJECUTADO	9,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**9,50**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,50	0,00	**9,50**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**4,1 TUBERIA Y ACCESORIOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**4.1.59**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"**		**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	BAÑO NUEVO						1	1,00			

TOTAL EJECUTADO	1,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U
PRESENTE ACTA	**1,00**	U

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7.1 BASE DE PISOS Y AFINADOS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**7.1.14**	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO NIÑOS		2,75	3,3			9,08	9,08			
	BAÑO NUEVO		1,32	1,25			1,65	1,65			
											

TOTAL EJECUTADO	10,73	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,73**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,73	0,00	**10,73**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**7,2 ACABADO DE PISOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**7.2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
   	BAÑO NIÑOS		2,75	3,30			9,08	9,08			
	BAÑO NUEVO		1,32	1,25			1,65	1,65			
	HALL PRINCIPAL		7,55	1,30			9,82	9,82			

TOTAL EJECUTADO	20,54	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**20,54**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
20,54	0,00	**20,54**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**8 ACABADOS SOBRE MUROS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**8.2**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	BAÑO NUEVO		4,7	2,10			9,87	9,87			

TOTAL EJECUTADO	9,87	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**9,87**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,87	0,00	**9,87**

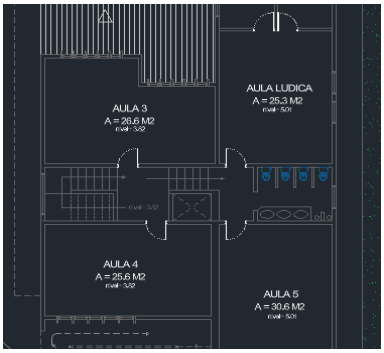
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**



CAPITULO	**19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	AULA LÚDICA	4,35	5,82	4,35				25,32			
	AULA 3	6,54	4,00	6,54				26,16			
	AULA 4	7,00	4,35	7,00				30,45			
	AULA 5	6,40	4,05	6,40				25,92			
	HALL 2o. NIVEL	1,40	6,00	1,40				8,40			

TOTAL EJECUTADO	116,25	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**116,25**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
116,25	0,00	**116,25**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**21,1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**21.1.9**	**PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	BAÑO NUEVO		4,7	2,1				9,87			

TOTAL EJECUTADO	9,87	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**9,87**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,87	0,00	**9,87**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**


CAPITULO	**22,1 SOBREMUROS Y PANELERIA LIVIANA**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	AULA LÚDICA		20,35	1,7				34,60			
	AULA 3		22,35	1,7				38,00			
	AULA 4		18	1,7				30,60			
	AULA 5		18,15	1,70				30,86			
	HALL 2o. NIVEL		14,5	1,70				24,65			

TOTAL EJECUTADO	158,70	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**158,70**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
158,70	0,00	**158,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE -CANDELARIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ATANASIO GIRARDOT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**22,1 SOBREMUROS Y PANELERIA LIVIANA**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	AULA LÚDICA		20,35	1,1				22,39			
	AULA 3		22,35	1,1				24,59			
	AULA 4		18	1,1				19,80			
	AULA 5		18,15	1,1				19,97			
	HALL 2o. NIVEL		14,5	1,1				15,95			

TOTAL EJECUTADO	102,69	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**102,69**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
102,69	0,00	**102,69**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ARQ ARIEL MONTEALEGRE**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE CAFAM
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.4 DDEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:1**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.8**	**UNIDAD**	**M2**

DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	CUBIERTA 3	4,40	2,20	4,00			1,00	4,40		
							TOTAL EJECUTADO	4,40	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**4,40**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,40	0,00	**4,40**

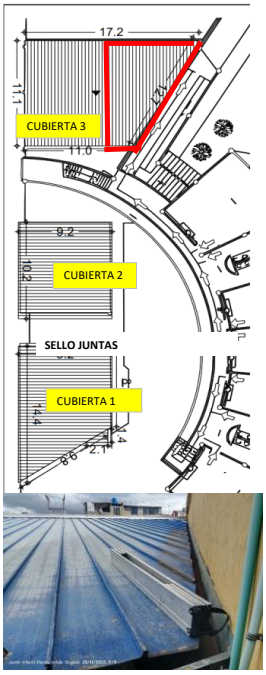
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. LINA BARRETO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE CAFAM
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

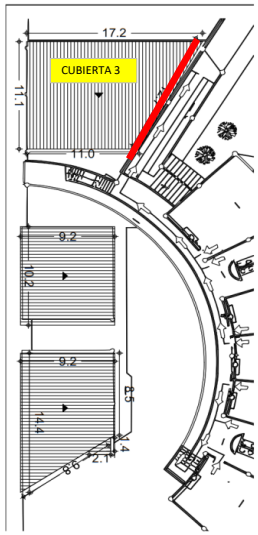

CAPITULO	**7,4 OTROS**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**	**UNIDAD** **M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CUBIERTA 3			67,95				67,95	M	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE CAFAM
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3)**		**UNIDAD**	**M**

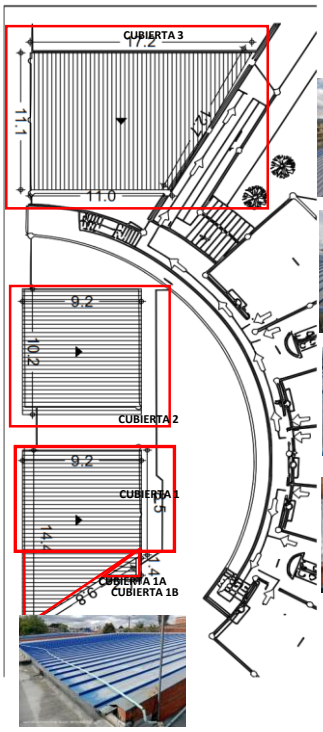
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
    CANAL	CUBIERTA3- AULA MULTIPLE			12,7				12,70		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE CAFAM
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**23,1 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS**			**ACTA No:1**	**CORTE 01**
ITEM	**23.1.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA 1	78,20	8,50	9,20			1,00	78,20		
CUBIERTA 1A	27,14	5,90	9,20			1,00	27,14		
CUBIERTA 1B	1,47	1,40	2,10			1,00	1,47		
CUBIERTA 2	93,84	9,20	10,20			1,00	93,84		
CUBIERTA 3	156,51	11,10	14,10			1,00	156,51		

TOTAL EJECUTADO	357,16	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**357,16**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
357,16	0,00	**357,16**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. LINA BARRETO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE CAFAM
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**23,8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTO**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Área	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA 1			14,40			1,00	14,40		
CUBIERTA 2			10,20			1,00	10,20		
CUBIERTA 3			11,10			2,00	22,20		
CUBIERTA 3			17,20			2,00	34,40		

FLANCHES

TOTAL EJECUTADO	81,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**81,20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
81,20	0,00	**81,20**

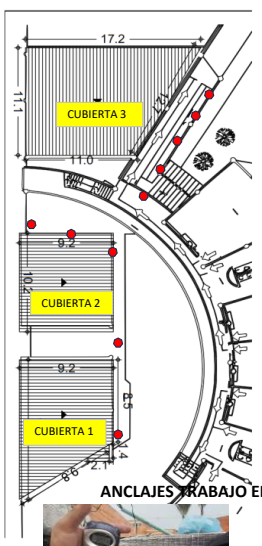
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. LINA BARRETO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE CAFAM
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026


CAPITULO	**25. OTRAS ACTIVIDADES**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**25.3**	**DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
    **ANCLAJES TRABAJO EN ALTURAS**  	AULA MULTIME CUBIERTA 3						5,00	5,00		
	AULA MULTIME CUBIERTA 1 Y 2						5,00	5,00		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO NIÑOS		5,70	7,16			1,00	40,82		
	BAÑO NIÑAS		5,70	7,16			1,00	40,82		
										
							TOTAL EJECUTADO	81,64	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**81,64**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
81,64	0,00	**81,64**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.2 DEMOLICION,DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL**		**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.2.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO NIÑOS LAVAMANOS		0,50	3,51			1,00	1,76		
	BAÑO NIÑAS LAVAMANOS		0,50	3,51			1,00	1,76		
	BAÑO NIÑOS LAVA COLAS		0,70	3,51			1,00	2,46		
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 1**	
ITEM	**1.3.1**	**DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  	BODEGA QUIMICOS		3,00	2,20			1,00	6,60		
			2,29	2,20			1,00	5,04		

TOTAL EJECUTADO	11,64	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**11,64**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
11,64	0,00	**11,64**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	U

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.3.3** **DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**30 DE ENERO 2026**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BODEGA QUIMICOS						1,00	1,00		
	BODEGA ALMACENAMIENTO						1,00	1,00		
	LAVANDERIA						1,00	1,00		
	MARCO BAÑO NIÑOS						0,50	0,50		
	MARCO BAÑO NIÑAS						0,50	0,50		
	INSUMOS ASEO						1,00	1,00		
	PILETA DE ASEO						1,00	0,00		
										

TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.3.7**	**DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	REJAS BAÑOS		1,00	1,14			3,00	3,42		
										

TOTAL EJECUTADO	3,42	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3,42**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,42	0,00	**3,42**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.4.2**	**DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD** **M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ESTRUCTURA EXTERNA VISERA BICICLETERO			6,00			1,00	6,00		
	ZONA EXTERNA EDIFICIO BAÑOS			11,85			1,00	11,85		
	CUARTO DE QUIMICOS Y BODEGA			6,00			1,00	6,00		
										

TOTAL EJECUTADO	23,85	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**23,85**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
23,85	0,00	**23,85**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.4.3**	**DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ESTRUCTURA EXTERNA			3,0			1,0	3,0		
	ZONA EXTERNA EDIFICIO BAÑOS			3,0			1,0	3,0		
	CUARTO DE QUIMICOS Y BODEGA			3,0			1,0	3,0		
							TOTAL EJECUTADO	9,00	M	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
							PRESENTE ACTA	**9,00**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,00	0,00	**9,00**


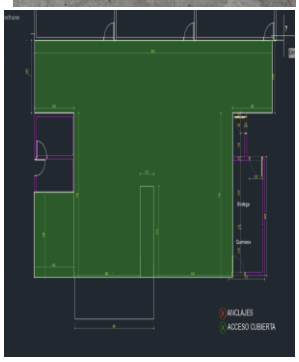
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.4.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CUBIERTA PASILLO		3,30	3,00			1,00	9,90		
	CUBIERTA SHUT BASURAS		3,90	3,03			1,00	11,82		
	CUBIERTA BAÑO NIÑOS		10,84	5,03			1,00	54,53		
	CUBIERTA TANQUE		6,66	1,03			1,00	6,86		
	CUBIERTA BAÑO NIÑAS		10,84	6,01			1,00	65,15		
	CUBIERTA PASILLO		3,30	3,00			1,00	9,90		
	CUBIERTA TANQUE		4,18	1,03			1,00	4,31		

TOTAL EJECUTADO	162,47	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**162,47**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
162,47	0,00	**162,47**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026


CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.4.7**	**DESCRIPCIÓN**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.**
UNIDAD	**M2**		

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CUARTO DE QUIMICOS Y BODEGA		2,80	6,60			1,00	18,48		
										
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

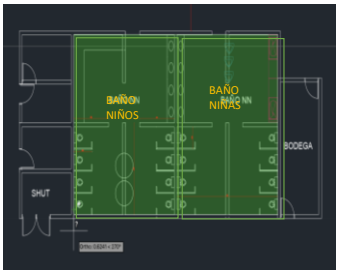
CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PASILLO SHUT DE BASURAS		2,00	6,00			1,00	12,00		
										
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 1**	
ITEM	**1.5.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO NIÑOS		6,00	7,54			1,00	45,24		
	BAÑO NIÑAS		6,00	7,54			1,00	45,24		
										

TOTAL EJECUTADO	90,48	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**90,48**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
90,48	0,00	**90,48**

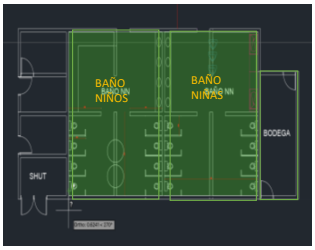
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 1**	
ITEM	**1.7.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑO NIÑOS		6,00	7,54			1,00	45,24		
	BAÑO NIÑAS		6,00	7,54			1,00	45,24		
	BODEGA		6,00	2,60			1,00	15,60		

TOTAL EJECUTADO	106,08	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,08**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
106,08	0,00	**106,08**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	Rampa acceso segundo piso al tercer piso		1,00	17,95			2,00	35,90		
										

TOTAL EJECUTADO	35,90	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**35,90**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,90	0,00	**35,90**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Estructura Metalica Nave 1		6,20	9,80			1,00	60,76		
	Estructura Metalica Nave 2		6,20	9,80			1,00	60,76		
										
										

TOTAL EJECUTADO	121,52	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**121,52**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
121,52	0,00	**121,52**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1,10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**1.10.1**	**DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
V1		0,67	1,22			1,00	0,82		
V2		0,67	3,60			1,00	2,41		
V3		2,95	2,50			1,00	7,38		
V4		1,96	3,95			1,00	7,74		
V5		1,92	1,20			1,00	2,30		
V6		0,67	2,88			1,00	1,93		
V7		2,70	1,20			1,00	3,24		
V8		2,94	4,85			1,00	14,26		
V9		2,70	1,20			1,00	3,24		
V10		0,67	2,85			1,00	1,91		
V11		2,94	4,85			1,00	14,26		
V12		2,70	1,20			1,00	3,24		
V13		0,66	2,85			1,00	1,88		
V14		1,93	1,20			1,00	2,32		
V15		1,98	3,96			1,00	7,84		
V16		2,67	3,90			1,00	10,41		
V17		0,67	3,30			1,00	2,21		
V18		1,94	2,20			1,00	4,27		
V19		0,81	1,20			1,00	0,97		
V20		0,66	2,60			1,00	1,72		
V21		0,66	1,45			1,00	0,96		
V22		2,70	3,50			1,00	9,45		
V23		2,70	3,65			1,00	9,86		
V24		2,70	3,65			1,00	9,86		
V25		2,70	5,00			1,00	13,50		
V26						1,00	0,00		
V27		0,66	1,22			1,00	0,81		
V28		0,66	3,53			1,00	2,33		
V29		0,66	1,22			1,00	0,81		
V30		2,61	4,05			1,00	10,57		
V31		0,66	3,50			1,00	2,31		
V32		2,67	2,50			1,00	6,68		
V33		0,66	6,35			1,00	4,19		
V34		2,70	1,60			1,00	4,32		
V35		1,93	1,17			1,00	2,26		
V36		2,72	1,17			1,00	3,18		
V37		1,95	2,40			1,00	4,68		
V38		1,00	2,40			1,00	2,40		
V39		1,00	2,40			1,00	2,40		
V40		0,66	6,35			1,00	4,19		
V41		2,70	1,60			1,00	4,32		
V42		1,93	1,17			1,00	2,26		
V43		2,72	1,17			1,00	3,18		
V44		1,95	2,40			1,00	4,68		
V45		1,00	2,40			1,00	2,40		
V46		1,00	2,40			1,00	2,40		
V47		0,66	6,35			1,00	4,19		
V48		2,70	1,60			1,00	4,32		
V49		1,93	1,17			1,00	2,26		
V50		2,72	1,17			1,00	3,18		
V51		1,95	2,40			1,00	4,68		
V52		1,00	2,40			1,00	2,40		
V53		1,00	2,40			1,00	2,40		
V54		0,66	6,35			1,00	4,19		
V55		2,70	1,60			1,00	4,32		
V56		1,93	1,17			1,00	2,26		
V57		2,72	1,17			1,00	3,18		
V58		1,95	2,40			1,00	4,68		
V59		1,00	2,40			1,00	2,40		
V60		1,00	2,40			1,00	2,40		
V61		1,97	2,40			1,00	4,73		
V62		2,65	3,50			1,00	9,28		
V63		2,61	4,05			1,00	10,57		
V64		2,70	5,00			1,00	13,50		
V65		2,70	1,65			1,00	4,46		
V66		2,70	3,36			1,00	9,07		
V67		2,70	1,60			1,00	4,32		
V68		2,70	3,30			1,00	8,91		
V69		2,70	3,30			1,00	8,91		
V70		2,70	3,30			1,00	8,91		
V71		2,70	3,30			1,00	8,91		
V72		2,70	5,00			1,00	13,50		
V73		1,90	2,70			1,00	5,13		
V74		1,95	4,60			1,00	8,97		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

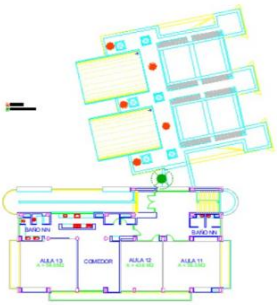
PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**1,10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**1.10.1**	**DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**		**UNIDAD**	**M2**



V75		0,60	3,25			1,00	1,95		
V76		1,00	6,00			1,00	6,00		
V77		0,66	6,35			1,00	4,19		
V78		2,70	1,60			1,00	4,32		
V79		1,93	1,17			1,00	2,26		
V80		2,72	1,17			1,00	3,18		
V81		1,95	2,40			1,00	4,68		
V82		1,00	2,40			1,00	2,40		
V83		1,00	2,40			1,00	2,40		
V84		0,66	6,35			1,00	4,19		
V85		2,70	1,60			1,00	4,32		
V86		1,93	1,17			1,00	2,26		
V87		2,72	1,17			1,00	3,18		
V88		1,95	2,40			1,00	4,68		
V89		1,00	2,40			1,00	2,40		
V90		1,00	2,40			1,00	2,40		
V91		0,66	6,35			1,00	4,19		
V92		2,70	1,60			1,00	4,32		
V93		1,93	1,17			1,00	2,26		
V94		2,72	1,17			1,00	3,18		
V95		1,95	2,40			1,00	4,68		
V96		1,00	2,40			1,00	2,40		
V97		1,00	2,40			1,00	2,40		
V98		0,66	6,35			1,00	4,19		
V99		2,70	1,60			1,00	4,32		
V100		1,93	1,17			1,00	2,26		
V101		2,72	1,17			1,00	3,18		
V102		1,95	2,40			1,00	4,68		
V103		1,00	2,40			1,00	2,40		
V104		1,00	2,40			1,00	2,40		
						TOTAL EJECUTADO	476,02	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	**476,02**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
476,02	0,00	**476,02**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ. LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**2.1.4**	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	Ceramineto		0,20	18,60	0,40		1,00	1,49		
	Zapatas		0,40	0,40	0,20		7,00	0,22		
	Jardin		0,80	13,00	0,20		1,00	2,08		
										

TOTAL EJECUTADO	3,79	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**3,79**	M3

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,79	0,00	**3,79**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**	**ACTA No:**		**CORTE 01**
ITEM	**2.2.5**	**ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Cerramiento Zapatas		0,40	0,40	0,20		7,00	0,22		
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**30 DE ENERO 2026**

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**		**ACTA No:**		**CORTE 01**
ITEM	**2.2.6**	**VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.**		**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Cerramiento		0,25	18,60	0,20		1,00	0,93		
										
							TOTAL EJECUTADO	0,93	M3	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3	
							PRESENTE ACTA	**0,93**	M3	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,93	0,00	**0,93**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**2.5 ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**2.5.2**	**ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.**	**UNIDAD**	**Kg**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Cerramiento Varilla #3			1,00		0,56	128,00	71,68		
	Cerramiento Varilla #4			6,00		0,99	15,00	89,46		
	Zapatas Varilla #4			0,70		0,99	56,00	38,96		

TOTAL EJECUTADO	200,10	Kg
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	Kg
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	Kg
PRESENTE ACTA	**200,10**	Kg

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
200,10	0,00	**200,10**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**2.6 ESTRUCTURAS METALICAS**	**ACTA No:**		**CORTE 01**
ITEM	**2.6.2**	**SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTRUCUTRA METALICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCURA)**	**UNIDAD**	**Kg**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM.			2,5		11,8	6,00	176,70		
										
							TOTAL EJECUTADO	176,70	Kg	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	Kg	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	Kg	
							PRESENTE ACTA	**176,70**	Kg	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
176,70	0,00	**176,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026


CAPITULO	**7.4 OTROS**		**ACTA No:**	**CORTE 1**	
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	V1		0,67	1,22			2,00	3,78		
	V2			3,60			2,00	7,20		
	V2		0,67				6,00	4,02		
	V3			2,50			4,00	10,00		
	V3		2,95				7,00	20,65		
	V4			3,95			2,00	7,90		
	V4		1,96				10,00	19,60		
	V5			1,20			4,00	4,80		
	V5		1,92				2,00	3,84		
	V6			2,88			2,00	5,76		
	V6		0,67				4,00	2,68		
	V7			1,20			2,00	2,40		
	V7		2,70				4,00	10,80		
	V8			4,85			4,00	19,40		
	V8		2,94				8,00	23,52		
	V9			1,20			4,00	4,80		
	V9		2,70				2,00	5,40		
	V10			2,85			2,00	5,70		
	V10		0,67				6,00	4,02		
	V11			4,85			4,00	19,40		
	V11		2,94				2,00	5,88		
	V12			1,20			4,00	4,80		
	V12		2,70				2,00	5,40		
	V13			2,85			2,00	5,70		
	V13		0,66				6,00	3,96		
	V14			1,20			6,00	7,20		
	V14		1,93				2,00	3,86		
	V15			3,96			2,00	7,92		
	V15		1,98				6,00	11,88		
	V16			3,90			6,00	23,40		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**7.4 OTROS**	**ACTA No:**	**CORTE 1**
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**	**UNIDAD** **M**



V16		2,67				6,00	16,02		
V17			3,30			2,00	6,60		
V17		0,67				4,00	2,68		
V18			2,20			2,00	4,40		
V18		1,94				4,00	7,76		
V19			1,20			2,00	2,40		
V19		0,81				6,00	4,86		
V20			2,60			2,00	5,20		
V20		0,66				6,00	3,96		
V21			1,45			2,00	2,90		
V21		0,66				6,00	3,96		
V22			3,50			6,00	21,00		
V22		2,70				6,00	16,20		
V23			3,65			6,00	21,90		
V23		2,70				6,00	16,20		
V24			3,65			6,00	21,90		
V24		2,70				6,00	16,20		
V25			5,00			6,00	30,00		
V25		2,70				6,00	16,20		
V26						2,00	0,00		
V27			1,22			2,00	2,44		
V27		0,66				6,00	3,96		
V28			3,53			2,00	7,06		
V28		0,66				6,00	3,96		
V29			1,22			2,00	2,44		
V29		0,66				6,00	3,96		
V30			4,05			6,00	24,30		
V30		2,61				6,00	15,66		
					TOTAL EJECUTADO		549,79	M	
					MENOS ACTAS ANTERIORES		0,00	M	
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X		0,00	M	
					PRESENTE ACTA		**549,79**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
549,79	0,00	**549,79**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**12.14** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA OCTOGONAL. PERFIL RECTANGULAR PPAL DE 80X40MM Y PERFILES INTERMEDIOS DE 50X50MM CADA 10CM. AREA 40MT2**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	Rampa acceso segundo piso al tercer piso		1,90	18,8			2,00	71,44		

TOTAL EJECUTADO	71,44	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**71,44**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
71,44	0,00	**71,44**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**16 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 01**	
ITEM	**16.3**	**CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	Cerramiento			17,60	2,00		1,00	35,20		
										
							TOTAL EJECUTADO	35,20	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**35,20**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,20	0,00	**35,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**16 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**		**CORTE 01**
ITEM	**16.13**	**OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Jardin junto a parque de niños		0,60	18,60			2,00	22,32		
	Adecuacion terreno e instalcion pasto junto cerramiento		2,00	8,00			1,00	16,00		
										
							TOTAL EJECUTADO	38,32	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**38,32**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
38,32	0,00	**38,32**

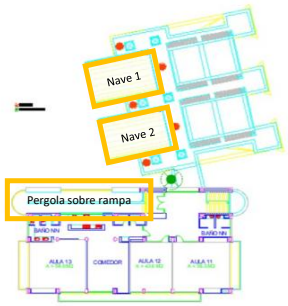
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	Rampa acceso segundo piso al tercer piso		1,90	18,80			2,00	71,44		
	Area bajo Estrcutra Metalica Nave 1		6,90	9,80			1,00	67,62		
	Area bajo Estrcutra Metalica Nave 2		6,90	9,80			1,00	67,62		
										

TOTAL EJECUTADO	206,68	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**206,68**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
206,68	0,00	**206,68**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**22.3.5**	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Estrucutra metalica Exterior (curva soporte policarbonato)			6,54			12,00	78,48		
Estrucutra metalica Exterior horizontal			9,80			10,00	98,00		
Estrucutra metalica Exterior vertical			4,00			4,00	16,00		
Pergola esdtructura 4x8 patio			1,90			14,00	26,60		
Pergola esdtructura 5x5 largas			18,80			8,00	150,40		

TOTAL EJECUTADO	369,48	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**369,48**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
369,48	0,00	**369,48**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**			**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Canal en Cubierta Nave 1			9,80			2,00	19,60		
Canal en Cubierta Nave 2			9,80			2,00	19,60		

TOTAL EJECUTADO	39,20	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**39,20**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
39,20	0,00	**39,20**

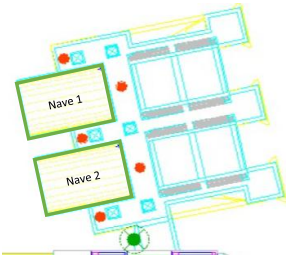
OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**		**ACTA No:**		**CORTE 01**
ITEM	**23.4.10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA POLICARBONATO (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	Cubierta Nave 1		6,20	9,80			1,00	60,76		
	Cubierta Nave 2		6,20	9,80			1,00	60,76		
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**		**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.8.18**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

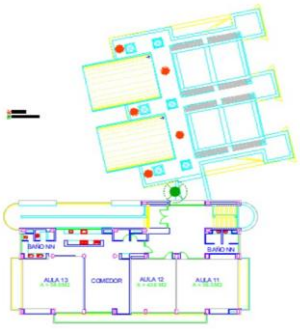


LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
V31		0,66	3,50			6,00	24,96		
V32		2,67	2,50			6,00	31,02		
V33		0,66	6,35			6,00	42,06		
V34		2,70	1,60			6,00	25,80		
V35		1,93	1,17			6,00	18,60		
V36		2,72	1,17			6,00	23,34		
V37		1,95	2,40			6,00	26,10		
V38		1,00	2,40			6,00	20,40		
V39		1,00	2,40			6,00	20,40		
V40		0,66	6,35			6,00	42,06		
V41		2,70	1,60			6,00	25,80		
V42		1,93	1,17			6,00	18,60		
V43		2,72	1,17			6,00	23,34		
V44		1,95	2,40			6,00	26,10		
V45		1,00	2,40			6,00	20,40		
V46		1,00	2,40			6,00	20,40		
V47		0,66	6,35			6,00	42,06		
V48		2,70	1,60			6,00	25,80		
V49		1,93	1,17			6,00	18,60		
V50		2,72	1,17			6,00	23,34		
V51		1,95	2,40			6,00	26,10		
V52		1,00	2,40			6,00	20,40		
V53		1,00	2,40			6,00	20,40		
V54		0,66	6,35			6,00	42,06		
V55		2,70	1,60			6,00	25,80		
V56		1,93	1,17			6,00	18,60		
V57		2,72	1,17			6,00	23,34		
V58		1,95	2,40			6,00	26,10		
V59		1,00	2,40			6,00	20,40		
V60		1,00	2,40			6,00	20,40		
V61		1,97	2,40			6,00	26,22		
V62		2,65	3,50			6,00	36,90		
V63		2,61	4,05			6,00	39,96		
V64		2,70	5,00			6,00	46,20		
V65		2,70	1,65			6,00	26,10		
V66		2,70	3,36			6,00	36,36		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**LOCALIDAD**	USAQUEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE**			**FECHA**	30 DE ENERO 2026

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**CORTE 01**
ITEM	**23.8.18**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA**	**UNIDAD**	**M2**



V67		2,70	1,60			6,00	25,80		
V68		2,70	3,30			6,00	36,00		
V69		2,70	3,30			6,00	36,00		
V70		2,70	3,30			6,00	36,00		
V71		2,70	3,30			6,00	36,00		
V72		2,70	5,00			6,00	46,20		
V73		1,90	2,70			6,00	27,60		
V74		1,95	4,60			6,00	39,30		
V75		0,60	3,25			6,00	23,10		
V76		1,00	6,00			6,00	42,00		
V77		0,66	6,35			6,00	42,06		
V78		2,70	1,60			6,00	25,80		
V79		1,93	1,17			6,00	18,60		
V80		2,72	1,17			6,00	23,34		
V81		1,95	2,40			6,00	26,10		
V82		1,00	2,40			6,00	20,40		
V83		1,00	2,40			6,00	20,40		
V84		0,66	6,35			6,00	42,06		
V85		2,70	1,60			6,00	25,80		
V86		1,93	1,17			6,00	18,60		
V87		2,72	1,17			6,00	23,34		
V88		1,95	2,40			6,00	26,10		
V89		1,00	2,40			6,00	20,40		
V90		1,00	2,40			6,00	20,40		
V91		0,66	6,35			6,00	42,06		
V92		2,70	1,60			6,00	25,80		
V93		1,93	1,17			6,00	18,60		
V94		2,72	1,17			6,00	23,34		
V95		1,95	2,40			6,00	26,10		
V96		1,00	2,40			6,00	20,40		
V97		1,00	2,40			6,00	20,40		
V98		0,66	6,35			6,00	42,06		
V99		2,70	1,60			6,00	25,80		
V100		1,93	1,17			6,00	18,60		
V101		2,72	1,17			6,00	23,34		
V102		1,95	2,40			6,00	26,10		
V103		1,00	2,40			6,00	20,40		
V104		1,00	2,40			6,00	20,40		
						TOTAL EJECUTADO	551,00	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	**551,00**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
551,00	0,00	**551,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ LEONARDO LARA**	**NOMBRE**	**ING. PAULO GRIMALDO**
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	**ARQ JORGE AGUIRRE**	**NOMBRE**	**ARQ JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**
