Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-04000-008539-3
2026-03-25 17:13 -INFRAESTRU
Destino: 4000
cc:
Rem/D: MIGUEL DAN JENSSEN D
Asunto: ORDEN DE PAGO No. 00
Folios: 859
Anexos: CUENTA DE COBRO

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE VÍAS

ORDEN DE PAGO No. 000065

25 MAR 2026

Para: Adriana Boada Arguello, Profesional Especializado
De: Arq. Mary Fabiana Leal Garay – secretaria de Vías
Asunto: Presentación de documentos

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por la secretaria de hacienda para la presentación de documentos para el pago de la obligación contraída por este despacho a favor de:
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S, NIT 901.485.464-3 por concepto de pago al contrato interadministrativo CTOI-SV-02532-2023 cuyo objeto es GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. Factura por valor de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 2.150.212.552,00).**

Pago que debe realizarse a nombre de **CONSORCIO VIA CENTRO** identificado con NIT No. 301740307-9 de conformidad con la autorización enviada por la **EICE FARO DEL CATATUMBO** en cumplimiento del modificatorio No. 5 al contrato interadministrativo No. 02532-2023 correspondiente al ACTA PARCIAL No. 12 del contrato **LP-FC-38-2023** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRANDO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATAMTUMBO S.A.S.**

El valor neto a pagar será por la suma de **MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 1.720.170.042,00); CON CARGO AL RP-000853 de 25 de marzo de 2025, con fuente de recursos 1.3.3.11.07- RB –TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL.** El valor anterior teniendo en cuenta que de la factura presentada se amortiza la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 430.042.510,00); correspondiente al 20% del valor a pagar por concepto de amortización del anticipo entregado mediante FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA U CONSTRUCTORA CARGET S.A.S, CONSTRUCTORA MATICCES, EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA.**

Atentamente,

Arquitecta MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías

Revisó técnica	Ing. Manuel Alberto Florez	Profesional Universitario
Revisó Jurídica	Doc. Jenyffer Berbesi Medina	Profesional Universitario
Proyectó	Ing. Jonathan Lizcano	Profesional Contratista

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Cúcuta 25 de marzo de 2026

Arquitecta
MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de vias
Gobernación de Norte de Santander

Ref: "solicitud de pago cuenta N° 12 del proyecto MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.

En la presente me permito muy respetuosamente solicitar el pago de la cuenta N° 12 del proyecto MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER

Atentamente

.

FREDDY A FONTIVEROS

FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente
EICE FARO DEL CATATUMBO

Proyecto: Rafael Redondo- Apoyo a la supervisión

Adjunto cuenta.

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
A-001079
FECHA: 24/03/2026
FORMA PAGO : CREDITO-dias: 0
FEC. VENCE: 30/06/2026

:83b53f43c44ad50f240e88a5b8f5d237c35c4c503bae289c71b57d6cad2caf46f21d6043e4c44033b6d0d76b0d377b7

lel Emisor	**Adquiriente**
social/Nombre: EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.	**Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
01485464-3	**NIT:** 800103927-7
ón: AV 5 13-82 BARRIO CENTRO	**Dirección:** A
ios: 310221490	**Teléfonos:** 5
	Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co

ódigo	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Vr. Unit.**	**% IVA**	**Vr. Total**
02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CORREDOR VIAL 2.0	1.00	unidad	2,150,212,552.00	0.00	2,150,212,552.00

Obs:RECURSOS PARA EL MANEJO DE OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS -OFSS- EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. VALOR $2.150.212.552,00 /r/nCOSORCIO VIA CENTRO FACT FE24 $2.111.151.563 FACT FE25 $39.060.989- RR

Descripción	**Vr. Total**

Total base:	2,150,212,552.00
IVA:	0.00
SubTotal	2,150,212,552.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
TOTAL:	2,150,212,552.00

en letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.

SOS PARA EL MANEJO DE OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS -OFSS- EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO AMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 DOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO DMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y CIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. VALOR $2.150.212.552,00
CIO VIA CENTRO FACT FE24 $2.111.151.563 FACT FE25 $39.060.989- RR

ción Dian N° 18764102226472 prefijo A desde 1001 al 1501 Fecha 28/11/2025 Vigencia 28/11/2027

Powered by CamScanner

FACTURA

Factura Electrónica de Venta FE - 24

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/03/2026 09:39
Fecha de Vencimiento	24/03/2026 09:39
Fecha de Validación	24/03/2026 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT	901740307-9
Obligación	IVA
Email	consorcioviacentro@gmail.com
Teléfono	3202358957
Dirección Fiscal	CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT	901485464-3
Obligación	IVA
Email	farodelcatatumbotesoreria@gmail.com
Teléfono	3102214908
Dirección	AVENIDA 5 13-82 CENTRO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	COSTO DE OBRA	1.0	EA	$1,623,962,741.00		$1,623,962,741.00	$1,623,962,741.00
2	02	A.I.U 30 %	1.0	EA	$487,188,822.00		$487,188,822.00	$487,188,822.00

2

Subtotal	$2,111,151,563.00
Total a Pagar	**$2,111,151,563.00**

PAGO ACTA PARCIAL 12 CONTRATO DE OBRA LP-FC-38-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
AMORTIZACIÓN 20 % ANTICIPO POR VALOR DE $ 422.230.312
SALDO A PAGAR: $ 1.688.921.251
Periodo Febrero 2026
PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA CCC SAS - 35%
EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA - 30%
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA - 30%
CONSTRUCTORA CARGET SAS - 5%

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: a6171eb30d25ec52ceb345f82333909219e7f8d2b225d0d1352bc8c193a915dea26d48e8949d57aa336eea62d3bc7d5c

Factura Electrónica de Venta FE - 24

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/03/2026 09:39
Fecha de Vencimiento	24/03/2026 09:39
Fecha de Validación	24/03/2026 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a6171eb30d25ec52ceb345f82333909219e7f8d2b225d0d1352bc8c193a915dea26d48e8949d57aa336eea62d3bc7d5c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

6

Factura Electrónica de Venta FE - 25

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/03/2026 09:40
Fecha de Vencimiento	24/03/2026 09:40
Fecha de Validación	24/03/2026 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT	901740307-9
Obligación	IVA
Email	consorcioviacentro@gmail.com
Teléfono	3202358957
Dirección Fiscal	CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT	901485464-3
Obligación	IVA
Email	farodelcatatumbotesoreria@gmail.com
Teléfono	3102214908
Dirección	AVENIDA 5 13-82 CENTRO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	04	AUTORIZACIÓN O PERMISO DE TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS:	1.0	EA	$6,599,332.00		$6,599,332.00	$6,599,332.00
2	05	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS)	1.0	EA	$32,461,657.00		$32,461,657.00	$32,461,657.00

2

Subtotal	$39,060,989.00
Total a Pagar	**$39,060,989.00**

PAGO ACTA PARCIAL 12 CONTRATO DE OBRA LP-FC-38-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
AMORTIZACIÓN 20% ANTICIPO POR VALOR DE $ 7.812.198
SALDO A PAGAR: $ 31.248.791
AUTORIZACIÓN O PERMISO DE TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS: Febrero 2026
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS) Febrero 2026
PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA CCC SAS - 35%
EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA - 30%
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA - 30%
CONSTRUCTORA CARGET SAS - 5%

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 0e3e2c16e9fd4a687f89eb8808635e41d5ee03bb70f9ad9d244693599f6afd3d8eef091bfe70f317ddce07b33432edb8

Factura Electrónica de Venta FE - 25

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/03/2026 09:40
Fecha de Vencimiento	24/03/2026 09:40
Fecha de Validación	24/03/2026 09:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ESTAMPILLA PROHOSPITAL

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT: 901740307-9

San José de Cúcuta, 09 de marzo de 2026

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Avenida 5 N 13-82 Centro de Negocios 5ta Avenida, Oficina 208
Cúcuta, Norte De Santander, Colombia.

Referencia: LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Por medio de la presente y en mi facultad de representante legal del **CONSORCIO VIA CENTRO con NIT: 901740307-9**, autorizo a la Empresa **EICE FARO DEL CATATUMBO SAS**, identificada con NIT: 901485464-3, en virtud del contrato de obra de la referencia en llevar a cabo el descuento del 2% del valor del acta en trámite.

Atentamente,

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307-9
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

CERTIFICACION BANCARIA

Certificado
Bancario

martes, 3 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VIA CENTRO identificado(a) con NIT 901740307, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83400007022	2023/08/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141067916309

(415)7707212489984(8020) 00001410679163O 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIA CENTRO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA

42. Correo electrónico consorcioviacentro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 3 5 8 9 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 8 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 5 61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 11 : 27: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ ESPITIA MARIO ALONSO
985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 25-07-2024 02:31:09PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 7 2 1	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 0 4 7 3 1 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	PAEZ	MIGUEL	DAN JENSSEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 1 2 3 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	ALVAREZ	HUGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 3 7 2 6	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CCC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 3 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 5 0 5 6 4 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 4 7 9 6 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 1 1 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 3 0 7 2 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERT. RETEICA

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT: 901740307-9

San José de Cúcuta, 09 de marzo de 2026

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Avenida 5 N 13-82 Centro de Negocios 5ta Avenida, Oficina 208
Cúcuta, Norte De Santander, Colombia.

Referencia: LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

ASUNTO: CERTIFICADO RETENCION ICA

Cordial saludo,

Con la presente el CONSORCIO VIA CENTRO en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, certifica que el cobro del acta parcial de obra No 12 por valor de $ 2.150.212.552,00 que se ejecutó en:

- corresponde al municipio de SALAZAR, con el 40.39% ($ 868.388.186,00) del valor parcial del acta de obra No 12.
- corresponde al municipio de SANTIAGO, con el 57.59% ($ 1.238.401.574,00) del valor parcial del acta de obra No 12.
- corresponde al municipio de ARBOLEDAS, con el 2.02% ($ 43.422.793,00) del valor parcial del acta de obra No 12.

Los cuales fueron desarrolladas en el periodo del 01 al 28 de febrero del 2026 en el desarrollo del contrato de obra No **LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.**

Atentamente,

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307-9
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

CDP

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT : 901485464-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 000053

Fecha: 10/02/2026 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

OBRA MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GÓMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G. - Servicios para la comunidad sociales y personales

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.61	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/tOTRAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G	37,485,464,309.20

Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE DEL GOBIERNO EN GENERAL
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

TOTALES **37,485,464,309.20**

VIGENCIA: 2026
VALOR: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
CARGO: GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

GERMAN PRADA DUARTE
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RP

20

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT : 901485464-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000064

FECHA : 03/03/2026
A FAVOR DE : CONSORCIO VIA CENTRO NIT: 901740307-9
COMPROMISO : OBRA MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GÓMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G. - Servicios para la comunidad sociales y personales
DISPONIBILIDAD : 00 000053 -- 10/02/2026
DEPENDENCIA : GERENCIA

TIPO CONTRATO :04 - NO APLICA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.61	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/tOTRAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G	000053 - 10/02/2026	37,485,464,309.20

Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE DEL GOBIERNO EN GENERAL
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

TOTALES **37,485,464,309.20**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.

GERMAN PRADA DUARTE
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREACTA Y MEMORIAS

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

PREACTA N° 12

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los nueve (09) dias del mes de Marzo de 2026 se reunieron los residentes de obra e interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 12 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 12	
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC
1		**CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900**				**947.545.039,00**
1.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**161.148.415,00**
1.2.1		**ALCANTARILLAS**				**44.946.205,00**
1.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	49.324,00	399,40	19.700.006,00
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar	m3	71.464,00	17,40	1.243.474,00
1.2.1.20		Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	787.275,00	7,30	5.747.108,00
1.2.1.22		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3	1.055.238,00	17,30	18.255.617,00
1.2.2		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**24.738.629,00**
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.042,00	1.570,70	17.343.669,00
1.2.2.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	173.962,00	6,30	1.095.961,00
1.2.2.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	161.765,00	13,70	2.216.181,00
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	9.165,00	124,80	1.143.792,00
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	21,60	415.152,00
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m	32.744,00	52,00	1.702.688,00
1.2.2.13	303	Demolicion manual en roca	m3	326.510,00	2,20	718.322,00
1.2.2.14	1020	Tubo PVC Ø2'' sanitario, para paso de lloradero	m	17.144,00	6,00	102.864,00
1.2.5		**BOXCULVERT**				**$ 91.463.581,00**
1.2.5.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	71.464,00	14,70	1.050.521,00
1.2.5.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	1.212.774,00	30,00	36.383.220,00
1.2.5.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	4.720,00	54.029.840,00
1.3		**OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.**				**150.090.551,00**
1.3.5		**MURO CAISSON K4+140**				**150.090.551,00**
1.3.5.10	1012	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.042,00	10.591,00	116.945.822,00
NP-12 1.3		Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	1.175.345,00	28,20	33.144.729,00
1.4		**MOVIMIENTO DE TIERAS**				**2.544.728,00**
1.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	132,40	2.544.728,00
1.5		**PAVIMENTOS**				**607.096.692,00**
1.5.1	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	180.292,33	49,00	8.834.324,00
1.5.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	191.244,00	652,30	124.748.461,00
1.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	8.985,00	155,80	1.399.863,00
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.229.422,75	379,60	466.688.876,00
1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	12.873,90	388,00	4.995.073,00
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	3.059,00	140,60	430.095,00
1.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO**				**26.664.653,00**
1.7.2		**VIA**				**26.664.653,00**
1.7.2.8	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2	39.092,00	682,10	26.664.653,00
3		**ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900**				**657.091.563,00**
3.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**7.184.281,00**
3.2.1		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**7.184.281,00**
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	222,00	2.541.234,00
3.2.1.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa		1.055.238,00	4,40	4.643.047,00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

PREACTA N° 12

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los nueve (09) dias del mes de Marzo de 2026 se reunieron los residentes de obra e interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 12 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 12	
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC
3.3		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**50.060.494,00**
3.3.1		**ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO**				**1.350.746,00**
3.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	118,00	1.350.746,00
3.3.2		**BOXCULVERT**				**48.709.748,00**
3.3.2.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	100,00	1.922.000,00
3.3.2.29	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	180.292,33	18,00	3.245.262,00
3.3.2.30		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm	m3	590.593,00	62,90	37.148.300,00
NP-06 3.3		Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi	m3	1.253.762,00	5,10	6.394.186,00
3.8		**PAVIMENTOS**				**599.846.788,00**
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion	m2	12.667,00	961,80	12.183.121,00
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.358.848,00	422,40	573.977.395,00
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	3.059,00	4.474,10	13.686.272,00
4		**ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920**				**19.326.139,00**
4.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**19.326.139,00**
4.2.4		**BOXCULVERT**				**19.326.139,00**
4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	1.265.396,00	0,70	885.777,00
4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	1.654.832,00	1,80	2.978.698,00
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	1.712.800,00	3,00	5.138.400,00
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	1.849.526,00	1,80	3.329.147,00
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	611,00	6.994.117,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		**1.623.962.741,00**
				A.I.U (30%)		**487.188.822,00**
				VALOR TOTAL DE OBRA FISICA:		**2.111.151.563,00**
				AUTORIZACION O PERMISO DE TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS:		**6.599.332,00**
				EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES (0,4% CT OBRA FISICA):		**32.461.657,00**
				VALOR TOTAL PROYECTO:		**2.150.212.552,00**
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20,00%):		**430.042.510,00**
				VALOR TOTAL PRESENTE ACTA		**1.720.170.042,00**

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ING. WILLIAN QUINTERO PABON
MP. No 54202230225 NTS
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VÍA CENTRO

ING. YORIS ALEXANDER MONTAÑO
MP. No 54202106093 NTS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSORCIO R&Q - JOYCO

ING, MIGUEL DANN JENSSEN DURAN PAEZ
MP. No 54202380648 NTS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VÍA CENTRO

ING. SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
MP. No 54202209738 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONSORCIO R&Q - JOYCO

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1,2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.10	**DESCRIPCION**	Relleno compactado por medio mecánico (vibro compactador) , mat. selec de excavación
FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL:**	
UND.	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTOS M3	TOTAL M3
relleno lateral	k05+067	k05+067			2,86	20,47		58,54
relleno placa hasta nivel se subrasante	k05+067	k05+067			0,76	22,27		16,93
relleno lateral	k04+957	k04+957			2,59	27,38		70,91
relleno placa hasta nivel se subrasante	k04+957	k04+957			0,50	31,31		15,66
relleno lateral	k04+684	k04+684			2,25	13,67		30,76
relleno placa hasta nivel se subrasante	k04+684	k04+684			0,25	9,83		2,46
relleno lateral	k04+740	k04+740			3,84	46,14		177,18
relleno placa hasta nivel se subrasante	k04+740	k04+740			0,76	35,51		26,99
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,02
							TOTAL	**399,40**

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE RELLENOS BOXCULVERT ABSCISAS K4+684 – K4+740 K4+957 – K5+067 EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

FEBRERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

RELLENO LATERAL BOX K5+067		
AREA	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN LLENO
20.47	2.86	58.5

RELLENO PLACA HASTA NIVEL SUB RASANTE BOX K5+067		
AREA	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN LLENO
22.27	0.76	16.93
	VOL TOTAL	75.5

RELLENO LATERAL BOX K4+957		
AREA	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN LLENO
27.38	2.59	70.9

RELLENO PLACA HASTA NIVEL SUB RASANTE BOX K4+957		
AREA	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN LLENO
31.31	0.5	15.66
	VOL TOTAL	86.6

Franklin D. C.

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ENCOLE Y MEDIO CUERPO BOX K4+684		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
13.67	2.25	30.8

RELLENO PLACA HASTA NIVEL SUB RASANTE BOX K4+684		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
9.83	0.25	2.46
	VOL TOTAL	33.2


RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ENCOLE Y MEDIO CUERPO BOX K4+740		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
46.14	3.84	177.2

RELLENO PLACA HASTA NIVEL SUB RASANTE BOX K4+740		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
35.51	0.76	26.99
	VOL TOTAL	204.2


Franklin D'C.

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

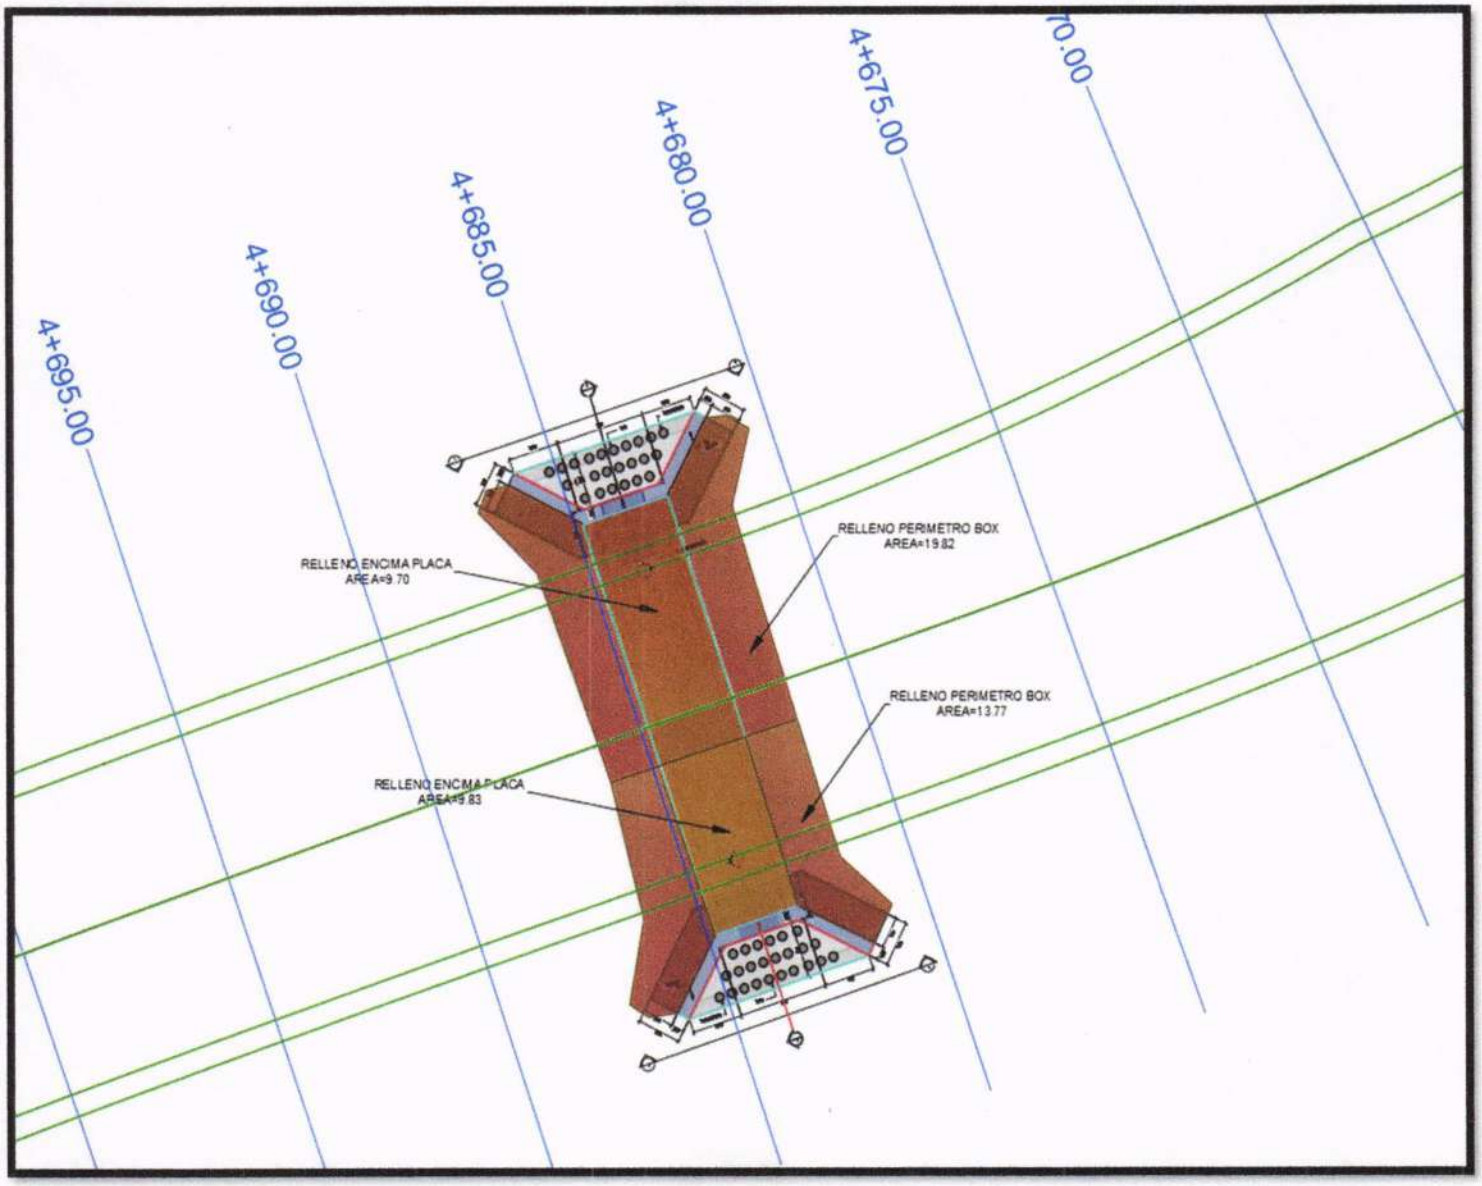


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

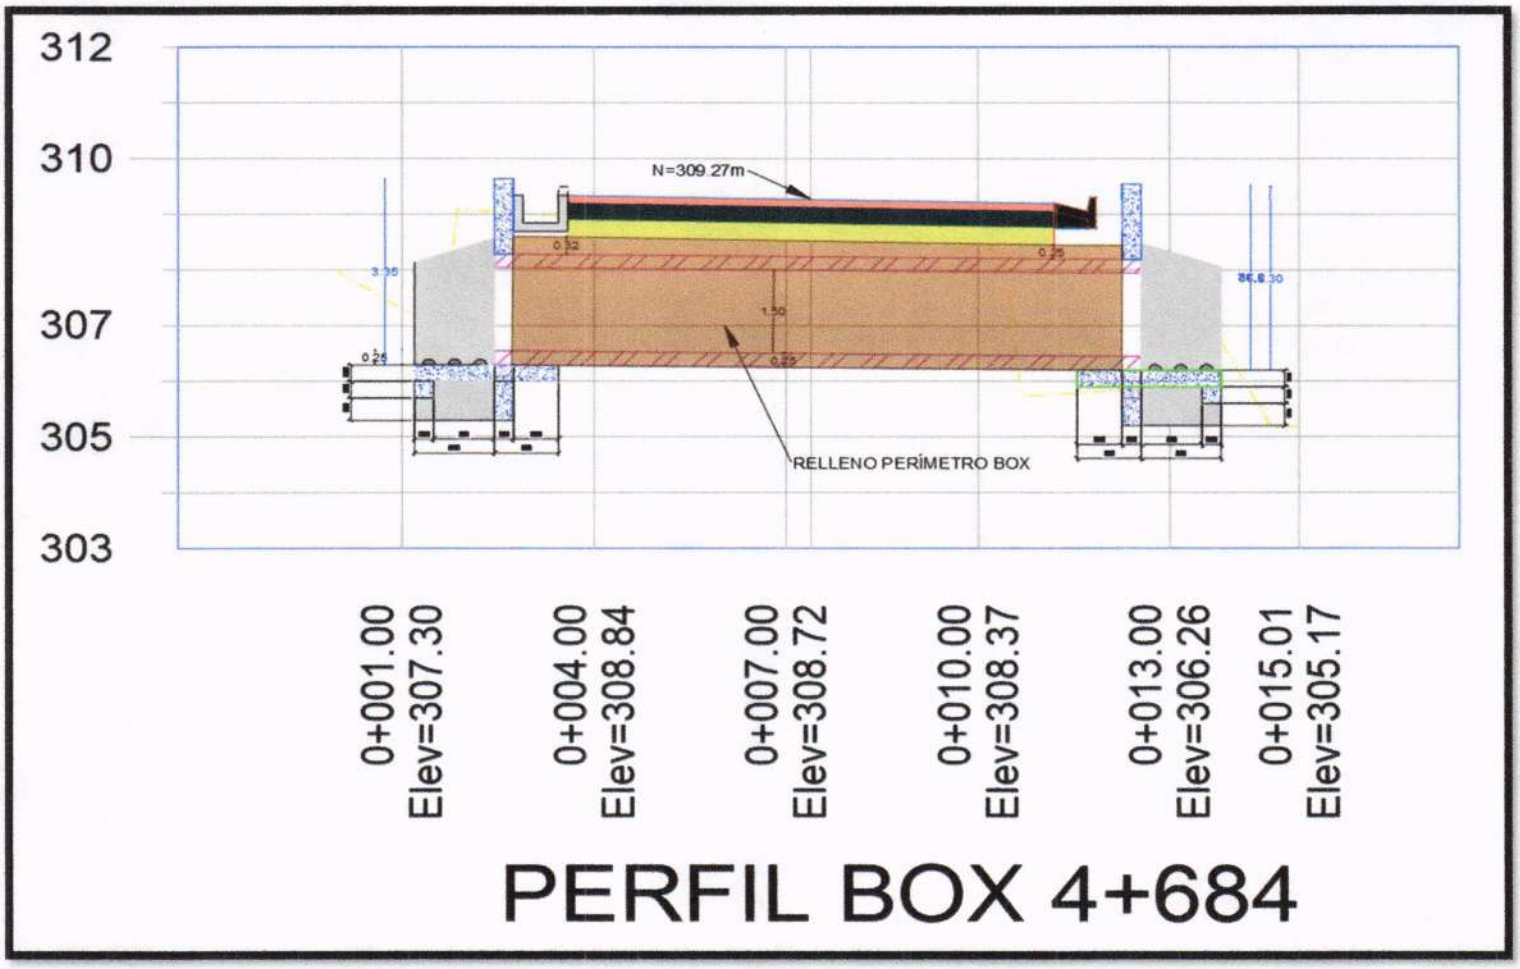


PERFIL BOX 4+684


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

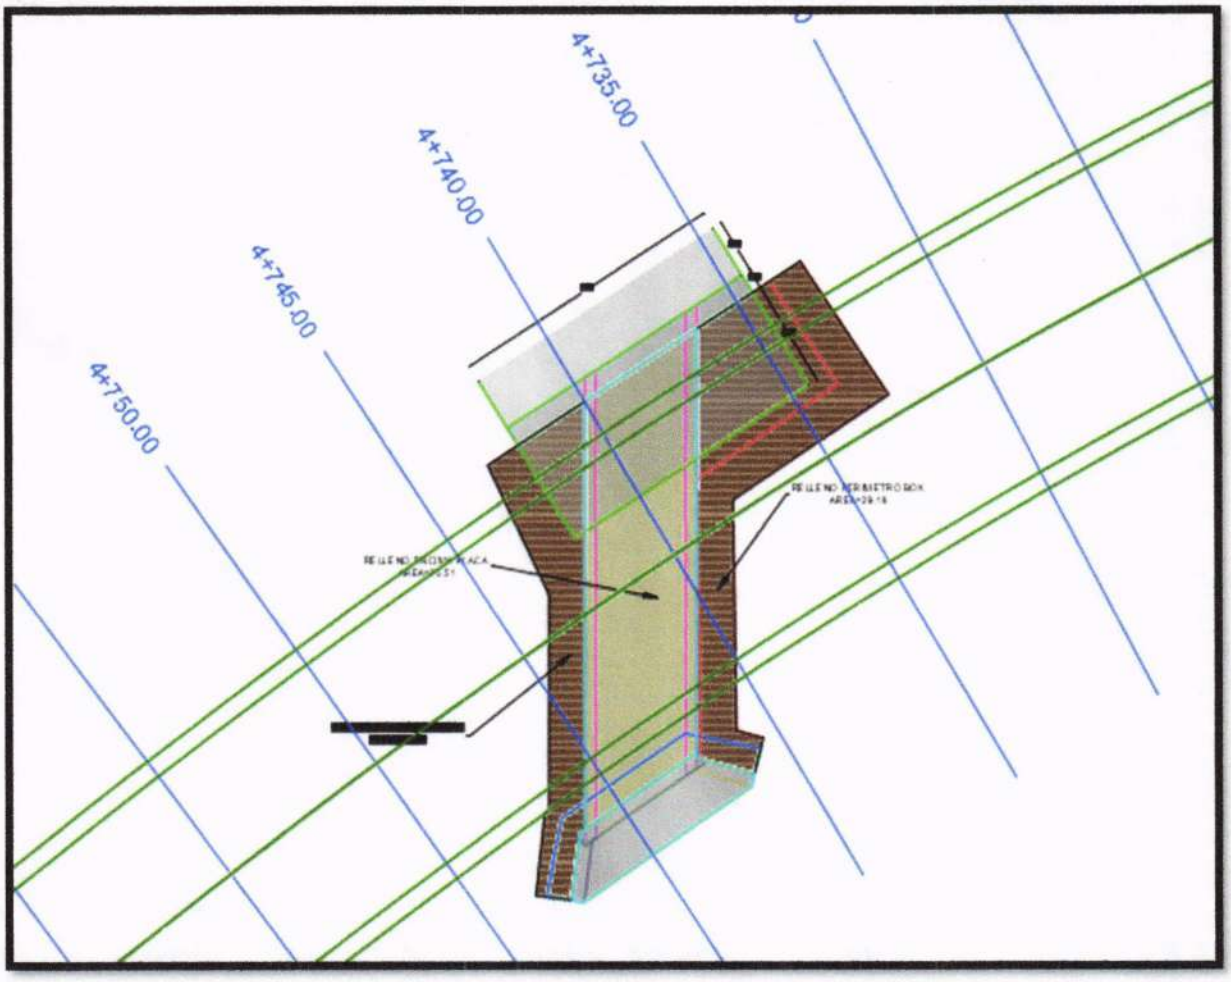

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

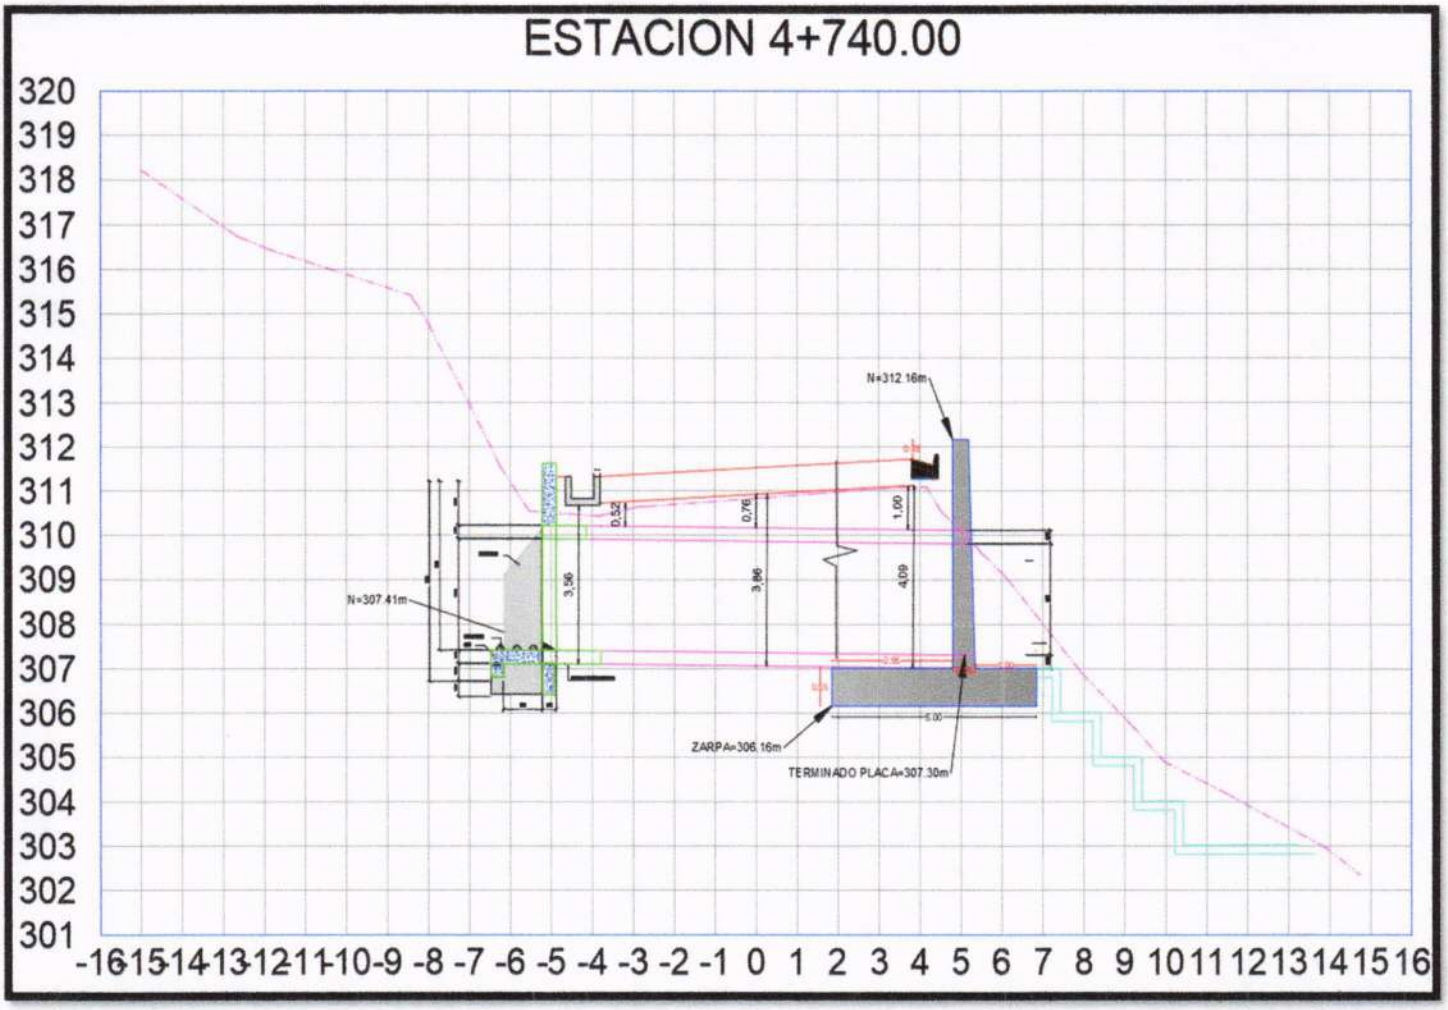


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

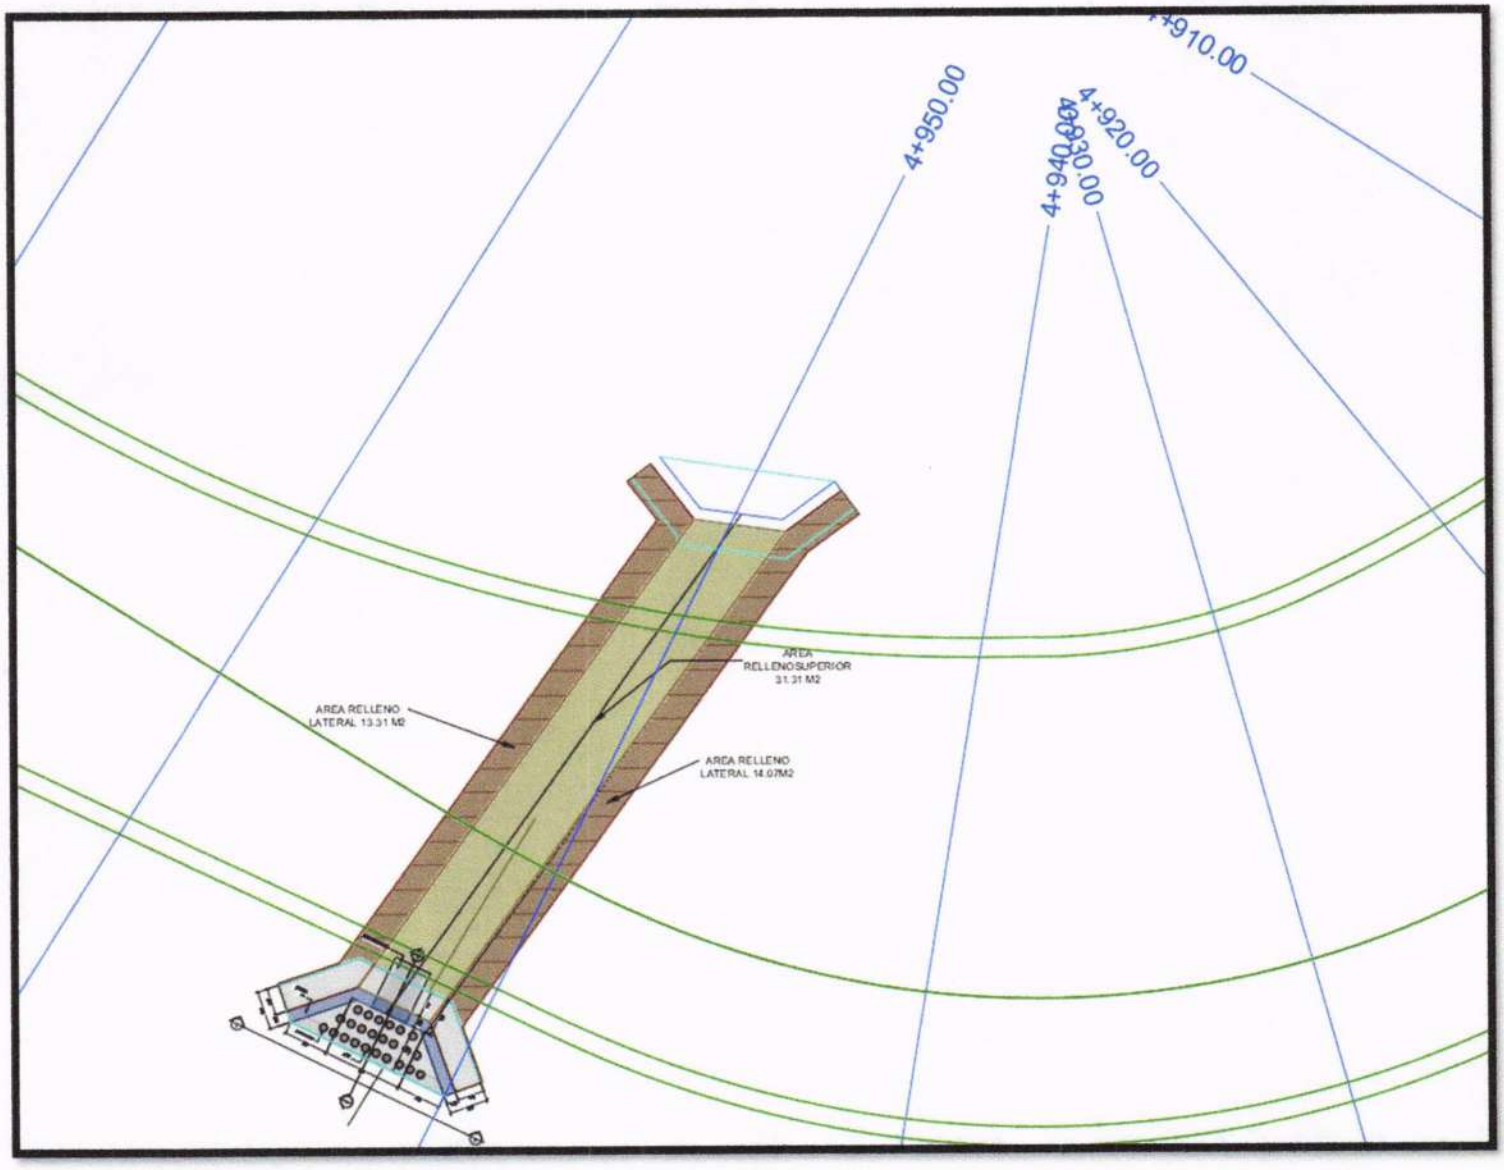


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

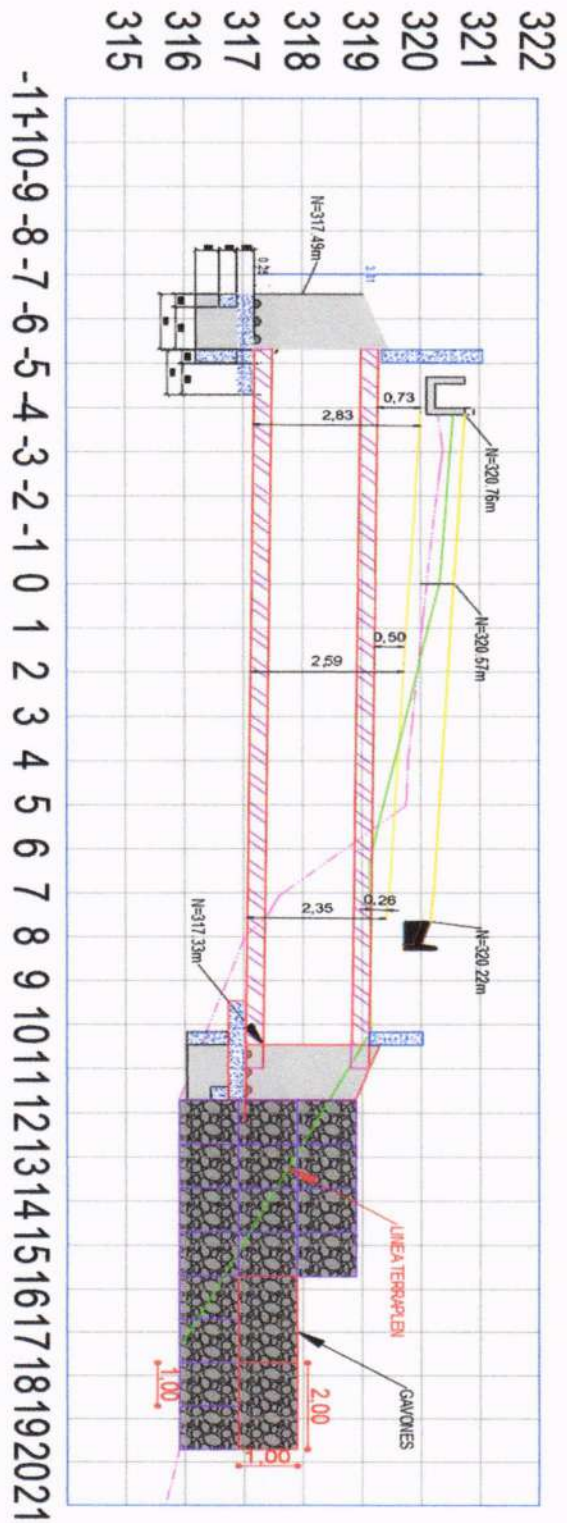


ESTACION 4+950.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

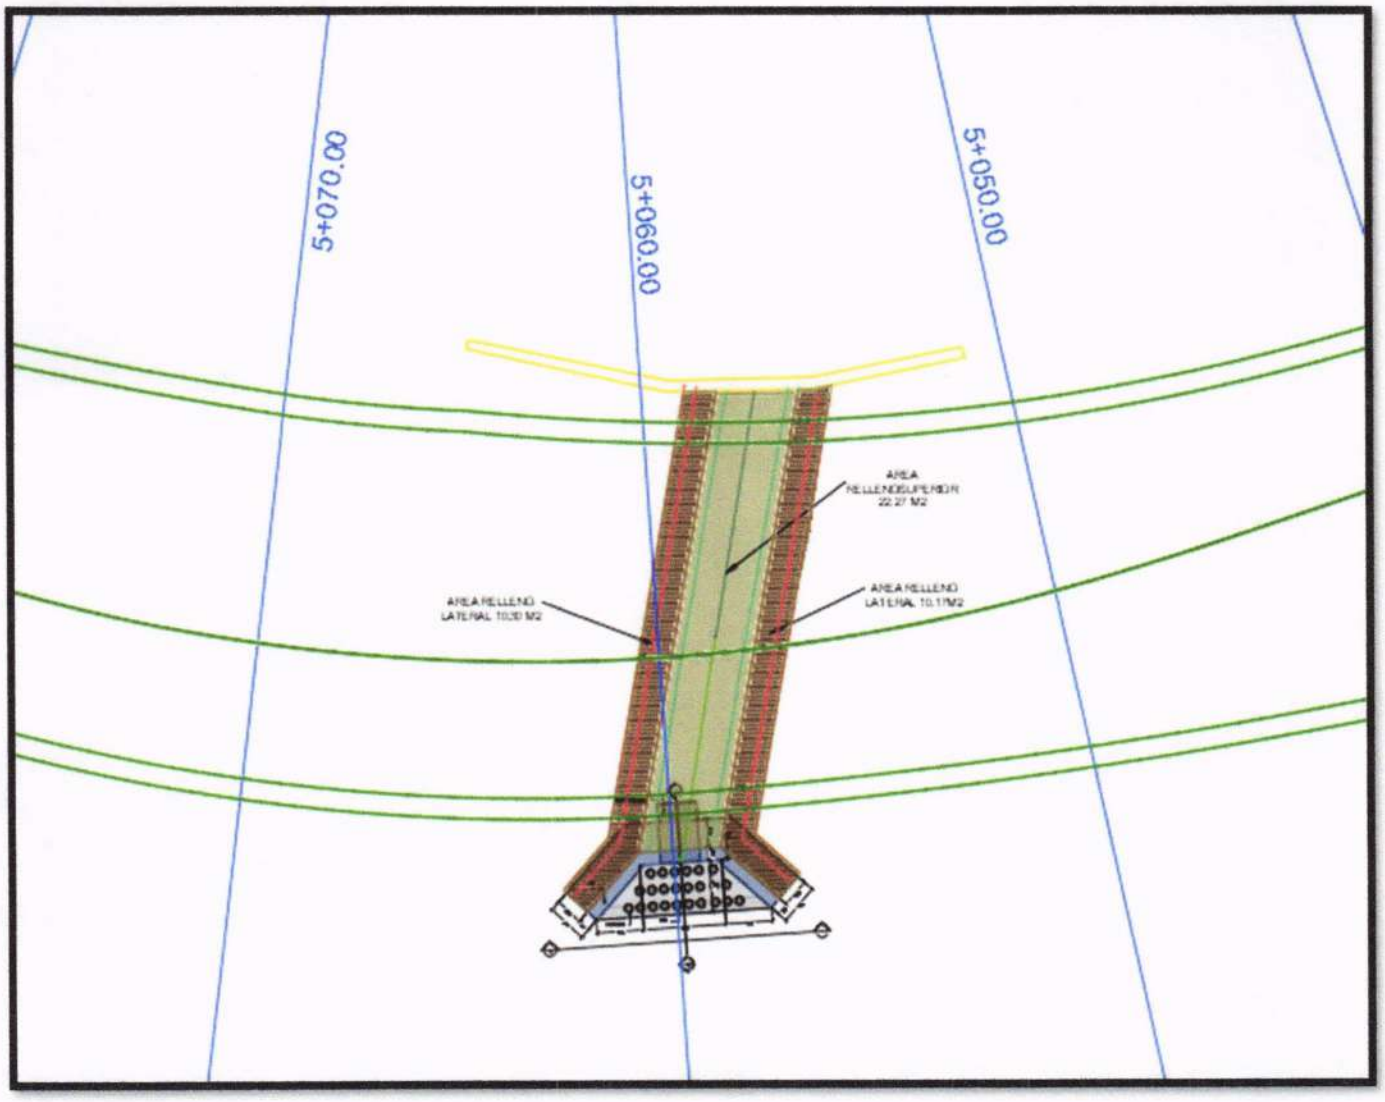

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

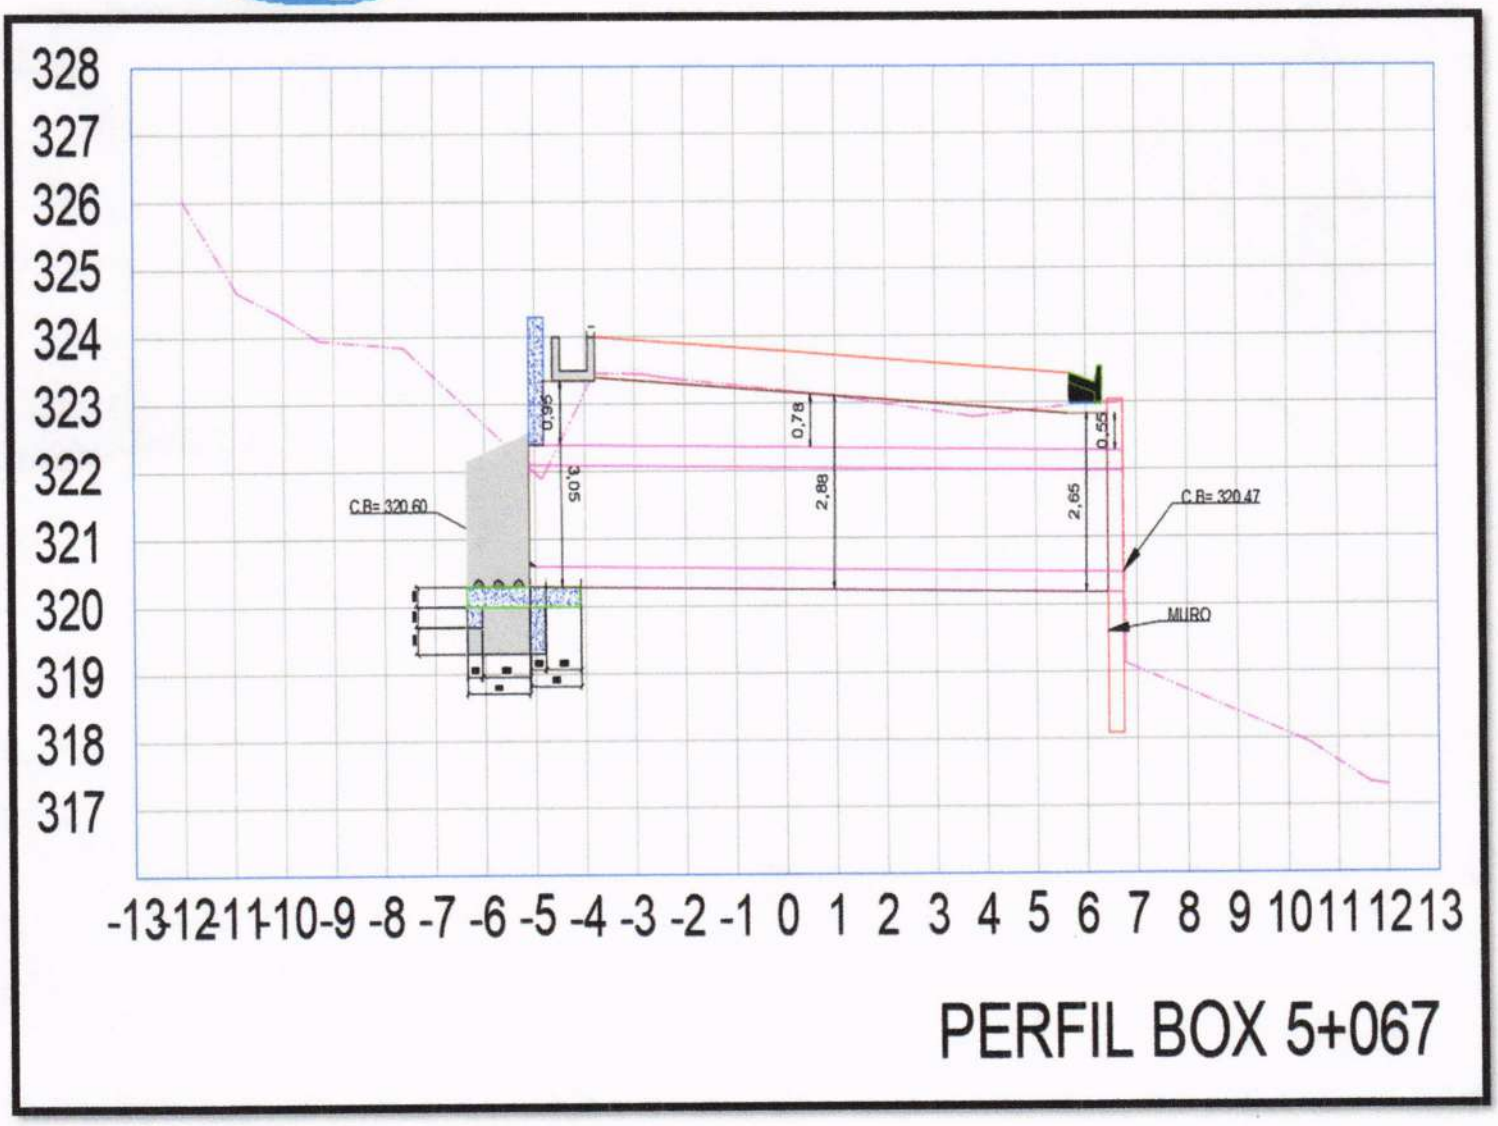

PERFIL BOX 5+067

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.19	**DESCRIPCION**	Excavación manual en material sin clasificar.
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
	excavacion descole a cuneta rectangular	k05+120	k05+122	1,00	1,60	0,80		1,28
	excavacion descole a cuneta rectangular	k05+120	k05+122	1,00	1,60	0,40		0,64
	excavacion gradas disipadoras descole	k05+880	k05+880	1,50	4,80	0,50		3,60
	excavacion gradas disipadoras descole	k05+880	k05+880	1,50	4,80	1,00		7,20
	placa acceso predio	k04+486	k04+496			0,15	25,00	3,75
	placa acceso predio	k04+486	k04+496	4,20	0,30	0,15		0,19
	placa acceso predio	k04+486	k04+496	3,30	0,30	0,35		0,35
	placa acceso predio	k04+486	k04+496	10,00	0,15	0,15		0,23
	placa acceso predio	k04+486	k04+496	5,70	0,15	0,15		0,13
								0,04
							TOTAL	17,40

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.20	DESCRIPCION	Concreto ciclópeo para pisos y solados
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
cierre aletas box culvert	k05+880	k05+880	2,15	0,30	2,50		1,61
cierre aletas box culvert	k05+880	k05+880	2,45	0,32	2,40		1,88
gradas disipadoras descole	k05+880	k05+880	3,65	4,95	0,15		2,71
gradas disipadoras descole	k05+880	k05+880	5,10	0,30	0,40		0,61
muros cana descole	k05+880	k05+880	1,70	0,50	0,15		0,13
muros cana descole	k05+880	k05+880	1,50	0,50	0,15		0,11
muros cana descole	k05+880	k05+880	1,90	0,50	0,15		0,14
muros cana descole	k05+880	k05+880	1,50	0,50	0,15		0,11
					AJUSTE AL DECIMAL		-0,01
					TOTAL		7,30

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.22	DESCRIPCION	Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
FECHA DE INICIO:		FECHA FINAL:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	K INICIAL	K FINAL	AREA M2	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M3	TOTAL M3
contra huella encole zarpa box culvert	k04+684	k04+684		4,40	0,15	0,86		0,57
Huella canal encole	k04+684	k04+684		4,50	1,08	0,15		0,73
Contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		5,90	0,15	0,90		0,80
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,80	1,80	0,15		1,30
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,80	0,15	0,60		0,43
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,60	1,40	0,15		0,97
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,60	0,15	0,60		0,41
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,20	1,35	0,15		0,85
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,20	0,15	0,95		0,60
Huella contra huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		4,20	0,30	0,50		0,63
muros canal descole	k04+684	k04+684		5,88	0,15	1,00		0,88
muros canal descole	k04+684	k04+684		4,92	0,15	1,00		0,74
Contra huella canal encole box culvert	k04+957	k04+957		6,50	0,30	1,05		2,05
Contra huella canal encole box culvert	k04+957	k04+957		6,50	0,70	0,15		0,68
Contra huella canal encole box culvert	k04+957	k04+957		2,00	0,30	1,85		1,11
huella canal encole box culvert	k04+957	k04+957		6,50	0,70	0,15		0,68
huella canal encole box culvert	k04+684	k04+684		5,40	1,30	0,15		1,05
huella canal encole box culvert	k04+953	k04+953		7,00	0,85	0,15		0,89
contrahuella canal encole	k04+957	k04+957		6,00	0,50	0,65		1,95
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,02
							TOTAL	17,30

OBSERVACION:

WILLIAN QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

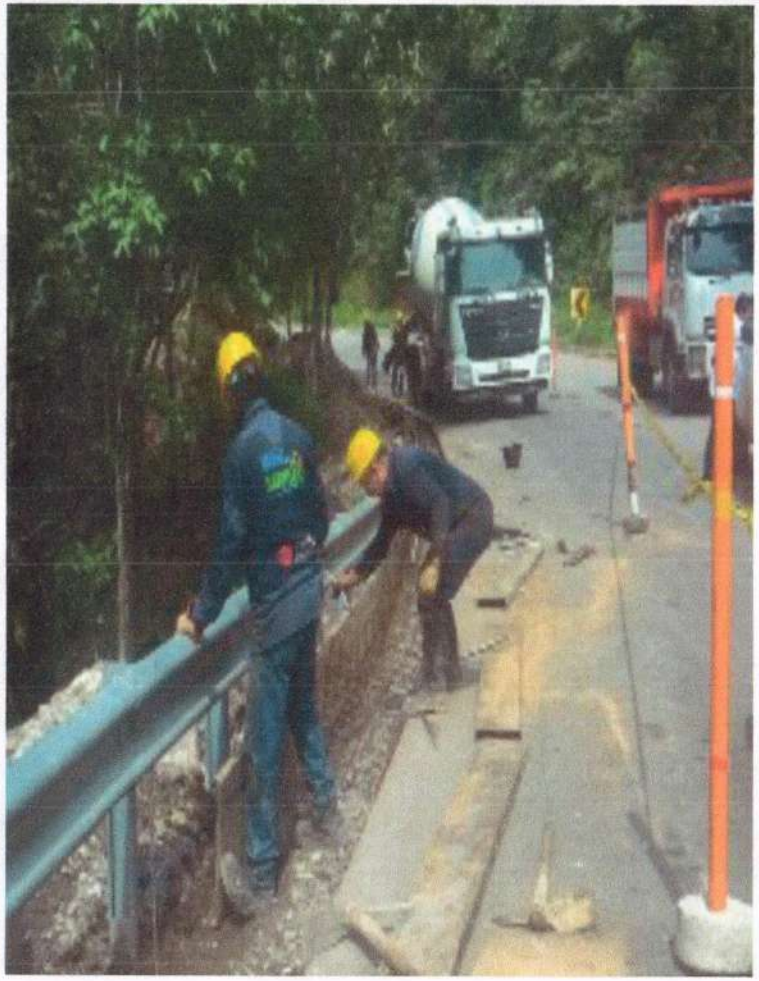

LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CUNETA RECTANGULAR K5+060 - K5+070					
0.70 0.70 0.70	4,00	2,10	0,994	49,00	102,28
10.30	3,00	10,30	0,560	4,00	23,07
17.70	3,00	17,70	0,560	3,00	29,74
14.00	3,00	14,00	0,560	3,00	23,52
0.10 2.20 0.10	4,00	2,40	0,994	25,00	59,64
1.05 0.75 1.05	3,00	2,85	0,560	8,00	12,77
1.05 0.75 2.60	3,00	4,40	0,560	8,00	19,71
1.50	3,00	1,50	0,560	10,00	8,40
CUNETA RECTANGULAR K4+960 - K4+980					
0.70 0.70 0.70	4,00	2,10	0,994	101,00	210,83
21.80	3,00	21,80	0,560	4,00	48,83
21.80	3,00	21,80	0,560	3,00	36,62
21.80	3,00	21,80	0,560	3,00	36,62

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CUNETA RECTANGULAR K5+120 - K5+122					
1.40	3,00	1,40	0,560	6,00	4,70
1.75	3,00	1,75	0,560	4,00	3,92
3.06	3,00	3,06	0,560	4,00	6,85
1.20	4,00	1,20	0,994	8,00	9,54
PLACA ACCESO K4+486 - K4+496					
L= 6.20m	4,00	6,20	0,994	16,00	98,60
0.10 3.07 0.10	4,00	3,27	0,994	5,00	16,25
L= 2.78m	4,00	2,78	0,994	57,00	157,51
0.10 0.80 0.10	4,00	1,00	0,994	50,00	49,70
3.15	4,00	3,15	0,994	2,00	6,26
4.05	4,00	4,05	0,994	1,00	4,03
CUNETA TRIANGULAR K4+646 - K4+682					

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9




Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

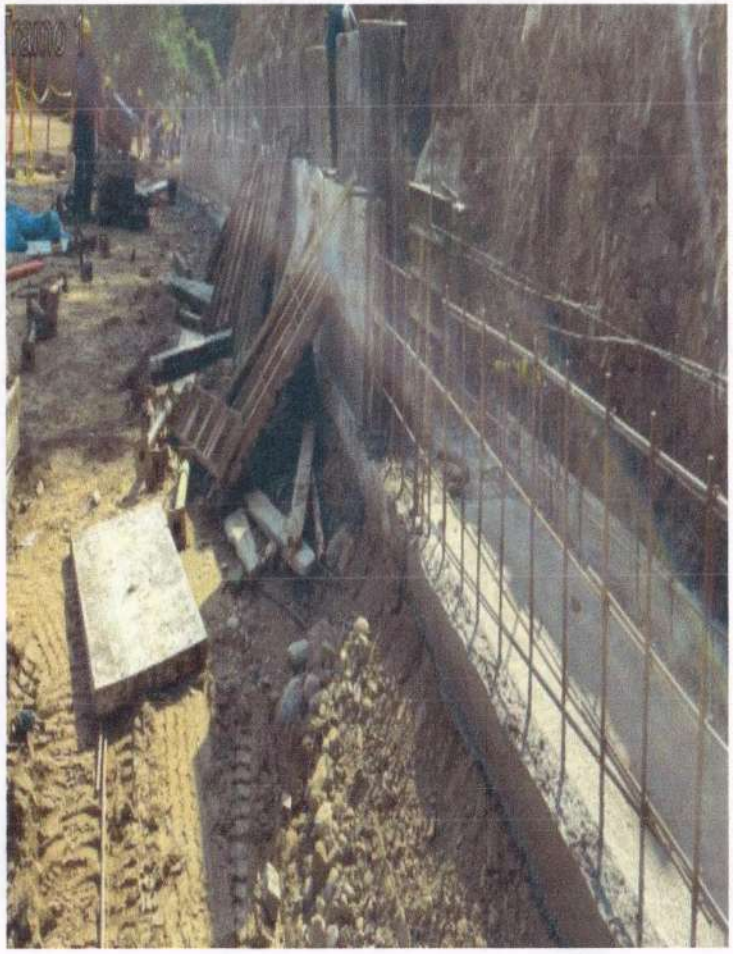

LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	3,00	0,55	0,560	181,00	55,75
	3,00	40,20	0,560	3,00	67,54
	3,00	0,82	0,560	181,00	83,12
	3,00	40,20	0,560	3,00	67,54
PLACA CUNETA RECTANGULAR K4+682 - K4+700					
	3,00	0,55	0,560	90,00	27,72
	3,00	19,40	0,560	3,00	32,59
	3,00	0,82	0,560	90,00	41,33
	3,00	19,40	0,560	3,00	32,59
CUNETA TRIANGULAR K4+605 - K4+616.5					
	3,00	0,55	0,560	55,00	16,94
	3,00	2,20	0,560	15,00	18,48

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	55,00	25,26
2.20	3,00	2,20	0,560	15,00	18,48
CUNETA RECTANGULAR K4+953 - K4+969					
0.70 / 0.70 / 0.70	4,00	2,10	0,994	36,00	75,15
7.70	3,00	7,70	0,560	3,00	12,94
7.70	3,00	7,70	0,560	3,00	12,94
7.70	3,00	7,70	0,560	3,00	12,94
				AJUSTE AL DECIMAL	0,01
				TOTAL	**1.570,70**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.4	DESCRIPCION:	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
FECHA DE INICIO:		FECHA FINAL:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	kinicial	kfinal	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
	material de cobertura sobre filtro	k04+990	k04+980	20,00	0,85	0,20		3,40
	material de cobertura sobre filtro	k05+685	k05+695	10,00	0,85	0,20		1,70
	material de cobertura sobre filtro	k04+953	k04+960	7,00	0,85	0,20		1,19
							AJUSTE AL DECIMAL	0,01
							TOTAL	6,30

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.5	DESCRIPCION	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL m3
	filtro margen izquierdo	k04+960	k04+980	20,00	0,50	0,70			7,00
	filtro margen izquierdo	k04+685	k04+695	10,00	0,50	0,70			3,50
	filtro margen izquierdo	k04+875	k04+884	9,20	0,50	0,70			3,22
								AJUSTE AL DECIMAL	-0,02
								TOTAL	13,70

OBSERVACIONES:

WILLIAM GUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.6	**DESCRIPCION**	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M2
	MANTO GEOTEXTIL FILTROS	k04+960	k04+980	20,00	2,40				48,00
	MANTO GEOTEXTIL FILTROS	k04+685	k04+695	10,00	2,40				24,00
	MANTO GEOTEXTIL FILTROS	k04+875	k04+890	15,00	2,40				36,00
	MANTO GEOTEXTIL FILTROS	k04+953	k04+960	7,00	2,40				16,80
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**124,80**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.9	**DESCRIPCION**	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	EXCAVACION DE FILTROS	k04+960	k04+980	20,00	0,50	0,90			9,00
	EXCAVACION DE FILTROS	k04+685	k04+695	10,00	0,50	0,90			4,50
	EXCAVACION DE FILTROS	k04+875	k04+890	15,00	0,50	0,70			5,25
	EXCAVACION DE FILTROS	k04+953	k04+960	7,00	0,50	0,80			2,80
								AJUSTE AL DECIMAL	0,05
								TOTAL	**21,60**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

46

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.10	**DESCRIPCION**	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	TOTAL ML
Tuberia para filtros	k04+960	k04+980	20,00				20,00
Tuberia para filtros	k04+685	k04+695	10,00				10,00
Tuberia para filtros	k04+875	k04+890	15,00				15,00
Tuberia para filtros	k04+953	k04+960	7,00				7,00
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	**52,00**


OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.13	**DESCRIPCION**	Demolición manual de roca
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

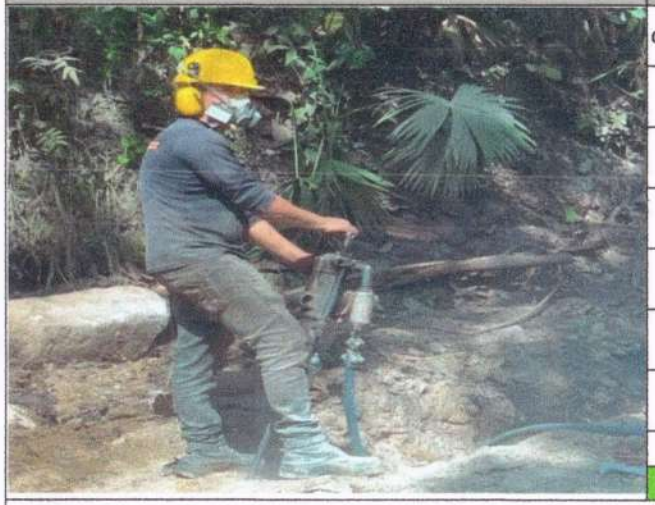REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	demolicion manual en roca	k04+960	k04+980	20,00	0,50	0,22			2,20
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	2,20

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.14	**DESCRIPCION**	Tubo PVC Ø2'' sanitario, para paso de lloradero
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	lloraderos cuneta rectangular	k04+011	k05+900	6,00					6,00
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**6,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PADON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.5	**DESCRIPCION**	Excavación manual en material sin clasificar.
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
dentellon encole	k04+684	k04+684	4,60	1,80	0,30			2,48
dentellon descole	k04+684	k04+684	4,80	1,50	0,60			4,32
dentellon canal box culvert	k04+684	k04+684	4,20	1,50	0,60			3,78
dentellon canal box culvert	k04+684	k04+684	4,20	0,30	0,50			0,63
gradas disipadoras descole box culvert	k04+740	k04+740	6,50	0,35	0,20			0,46
gradas disipadoras descole box culvert	k04+740	k04+740	8,60	0,35	0,50			1,51
dentellon encole	k04+957	k04+957	5,10	0,30	0,20			0,31
dentellon encole	k04+957	k04+957	8,00	0,30	0,50			1,20
							AJUSTE AL DECIMAL	0,02
							TOTAL	**14,70**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo — Empresa Industrial y Comercial del Estado

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.7	DESCRIPCION	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
Muro pantalla box culvert	k05+063	k05+063	2,05	1,95	0,30			1,20
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+957	k04+957			0,30	18,03		5,41
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+957	k04+957	5,10	0,30	0,30			0,46
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+957	k04+957	8,00	0,30	0,70			1,68
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+957	k04+957	6,90	2,00	0,25			3,45
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+740	k04+740			0,35	19,88		6,96
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+740	k04+740	6,50	0.35	0,30			1,95
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+740	k04+740	8,60	0,35	0,70			2,11
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+740	k04+740	4,90	3,10	0,30			4,56
Zarpa dentellones 2da parte box culevert	k04+740	k04+740	13,10	0,15	0,15			0,29
Muros 2da parte box culvert	k04+957	k04+957	7,80	0,25	1,00			1,95
								Mu
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,01
							TOTAL	30,00

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
BOXCULVERT K5+063					
0.15 1.80 0.15	4,00	2,10	0,994	20,00	41,75
0.15 2.00 0.15	4,00	2,30	0,994	20,00	45,72
BOXCULVERT K4+957					
0.15 8.45	4,00	8,60	0,994	16,00	136,77
0.15 8.55	4,00	8,70	0,994	16,00	138,36
0.15 2.00 0.15	4,00	2,30	0,994	78,00	178,32
0.15 2.00 0.15	4,00	2,30	0,994	76,00	173,75
0.15 2.00 0.15	4,00	2,30	0,994	78,00	178,32
8.20	4,00	8,20	0,994	20,00	163,02
0.15 3.30 0.15	4,00	3,60	0,994	38,00	135,98
0.15 3.20 0.15	4,00	3,50	0,994	32,00	111,33
0.15 3.20 0.15	4,00	3,50	0,994	32,00	111,33
0.15 2.74 0.15	4,00	3,04	0,994	32,00	96,70
0.15 1.30	4,00	1,45	0,994	60,00	86,48

Faro del Catatumbo	Gobernación de Norte de Santander	CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9	Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA




LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
7.20	4,00	7,20	0,994	12,00	85,88
0.70	4,00	0,70	0,994	60,00	41,75
6.50	4,00	6,50	0,994	6,00	38,77
0.20 1.90 0.15	4,00	2,25	0,994	24,00	53,68
0.15 1.85 0.15	4,00	2,15	0,994	18,00	38,47
2.85	4,00	2,85	0,994	32,00	90,65
3.40	4,00	3,40	0,994	20,00	67,59
0.70	4,00	0,70	0,994	60,00	41,75
6.50	4,00	6,50	0,994	6,00	38,77
0.50	4,00	0,50	0,994	60,00	29,82
6.50	4,00	6,50	0,994	3,00	19,38
BOXCULVERT K4+740					
0.25 3.00 0.25	5,00	3,50	1,552	128,00	695,30
0.25 8.65	5,00	8,90	1,552	22,00	303,88
0.25 6.75	5,00	7,00	1,552	22,00	239,01

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

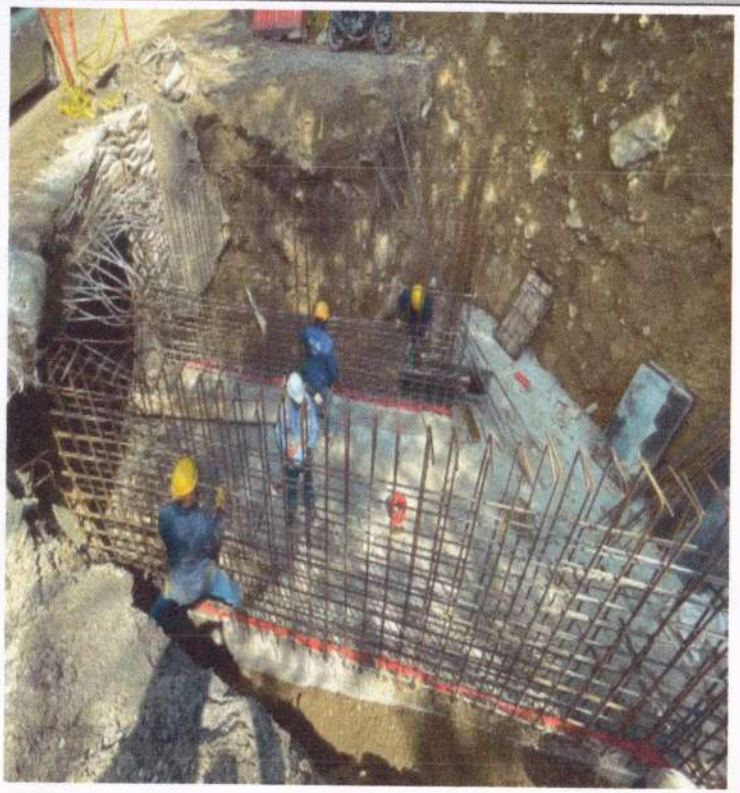

LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.25 3.00 0.25	5,00	3,50	1,552	54,00	293,33
0.25 5.60	5,00	5,85	1,552	30,00	272,38
0.15(45°) 0.81 0.15(45°)	3,00	1,11	0,560	41,00	25,49
0.25 1.30 0.25	5,00	1,80	1,552	16,00	44,70
0.25 4.40 0.25	4,00	4,90	0,994	38,00	185,08
0.25 2.80 0.25	4,00	3,30	0,994	50,00	164,01
0.25 4.30 0.25	4,00	4,80	0,994	34,00	162,22
0.25 1.72 0.25	4,00	2,22	0,994	8,00	17,65
0.25 2.80 0.25	4,00	3,30	0,994	48,00	157,45
0.25 1.45 0.25	4,00	1,95	0,994	8,00	15,51
				AJUSTE AL DECIMAL	-0,33
				TOTAL	**4.720,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

54

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.3.5 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	1.3.5.10	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO: | **FECHA FINAL DEL PERIODO:** | **UND:** Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
ACERO PARA PILAS MURO CAISSON K4+834					
0.30 3.95	8,00	4,25	3,042	48,00	620,57
L=3.55m	5,00	3,55	1,552	93,00	512,39
L=3.45m	4,00	3,45	0,994	60,00	205,76
0.30 11.70	7,00	12,00	3,973	48,00	2.288,45
ACERO PARA PILAS MURO CAISSON K4+860.5					
L=4.06m	5,00	4,06	1,552	93,00	586,00
L=4.06m	4,00	4,06	0,994	60,00	242,14
0.30 3.95	8,00	4,25	3,042	48,00	620,57



0.30 11.70	7,00	12,00	3,973	48,00	2.288,45
ACERO PARA PILAS MURO CAISSON K4+853.5					
L=4.06m	5,00	4,06	1,552	12,00	75,61
L=4.06m	4,00	4,06	0,994	60,00	242,14
0.30 3.95	8,00	4,25	3,042	48,00	620,57
0.30 11.70	7,00	12,00	3,973	48,00	2.288,45
				AJUSTE AL DECIMAL	-0,09
				TOTAL	**10.591,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	NP-12 1.3	DESCRIPCION	Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	RADIO ^2	π	ALTURA ML	LONGITUD ML	TOTAL M3
CAISSON #4 PILA	k04+864	k04+864	0,39	3,14	13,00		15,93
CAISSON #3 PILA	k04+860	k04+860	0,39	3,14	10,00		12,25
					AJUSTE AL DECIMAL		0,02
					TOTAL		28,20

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM No.:	1.4.1	DESCRIPCION:	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD M3	TOTAL M3
excavacion de caja	k04+986	k05+031				132,40	132,40
					AJUSTE AL DECIMAL		0,00
					TOTAL		132,40

OBSERVACIONES: los documentos soportes con carteras estan en el informe de topografia que respalda esta memoria.

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE EXCAVACION CAJA ABSCISAS K4+985.60 – K5+003.60 EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

FEBRERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

EXCAVACION CAJA K5+985.60 HASTA K5+030.60				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
K4+985.60		0.45		
	5		1.83	9.2
K4+990.60		3.21		
	5		2.09	10.5
K4+995.60		3.73		
	5		3.84	19.2
K5+000.60		3.95		
	5		3.59	17.9
K5+005.60		3.22		
	5		3.08	15.4
K5+010.60		2.93		
	5		2.92	14.6
K5+015.60		2.9		
	5		3.02	15.1
K5+020.60		3.13		
	5		3.20	16.0
K5+025.60		3.26		
	5		2.94	14.7
K5+030.60		2.62		
			VOL TOTAL	132.4

Franklin R. C.

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

ESTACION 4+990.60

ESTACION 4+985.60

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -3208492598


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

ESTACION 5+000.60


ESTACION 4+995.60

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: - 3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

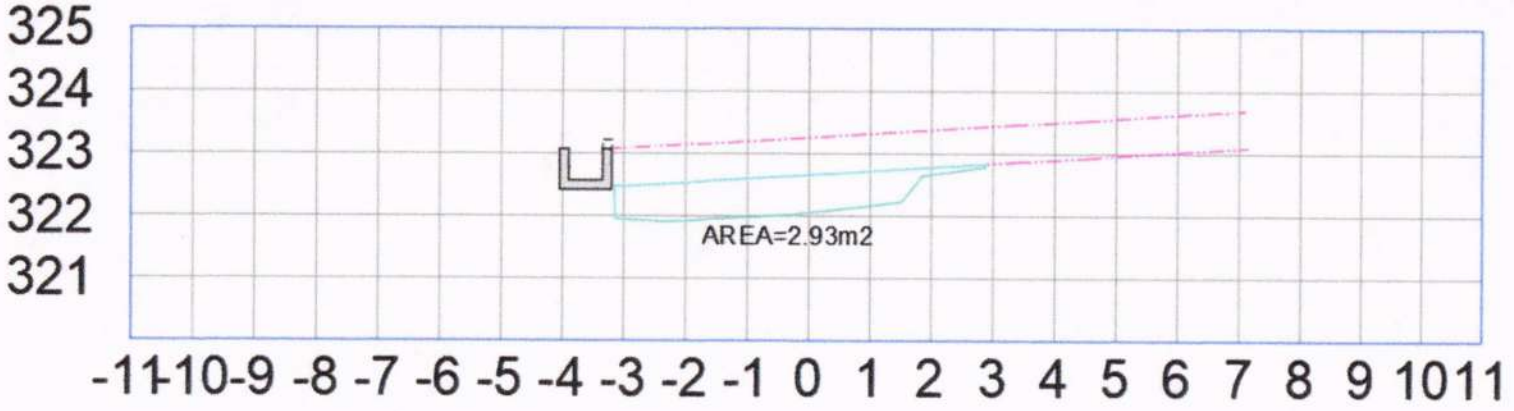


ESTACION 5+010.60

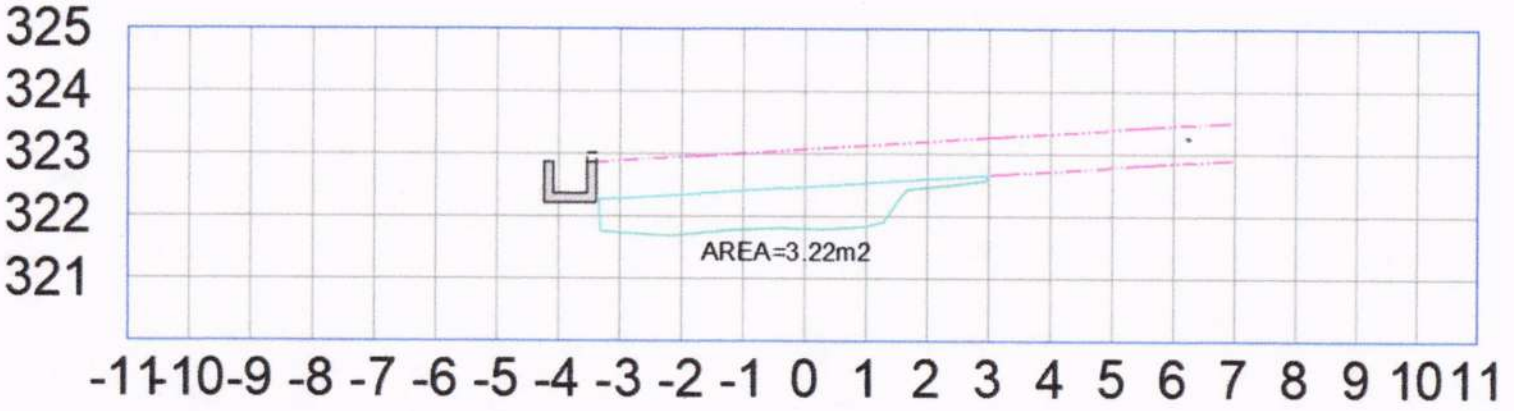


ESTACION 5+005.60

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

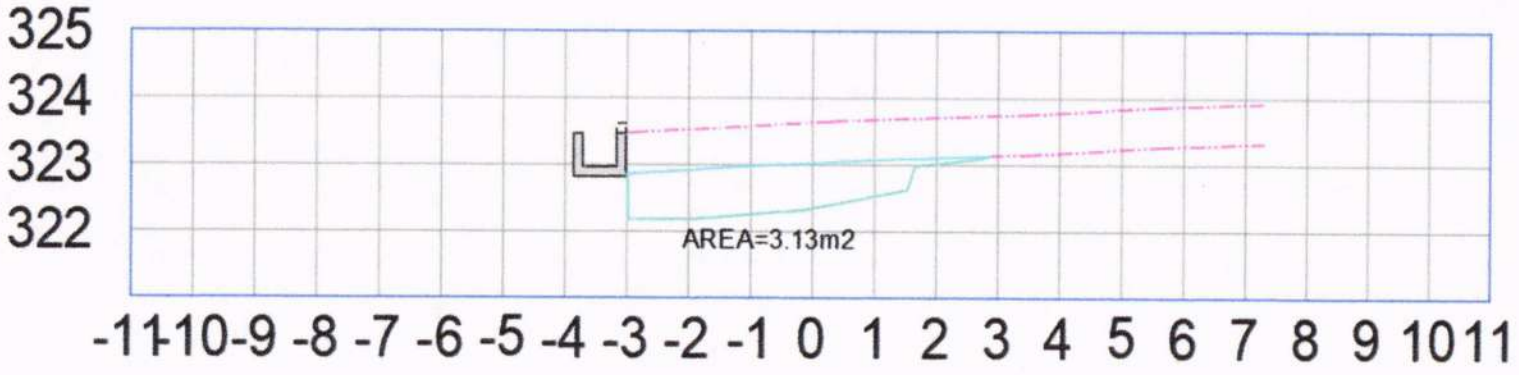


ESTACION 5+020.60

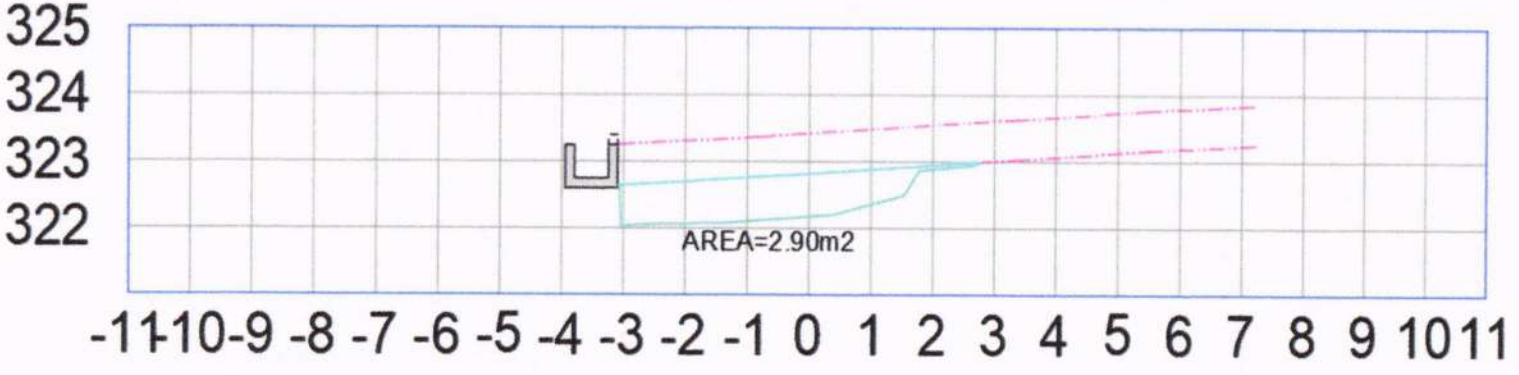


ESTACION 5+015.60

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

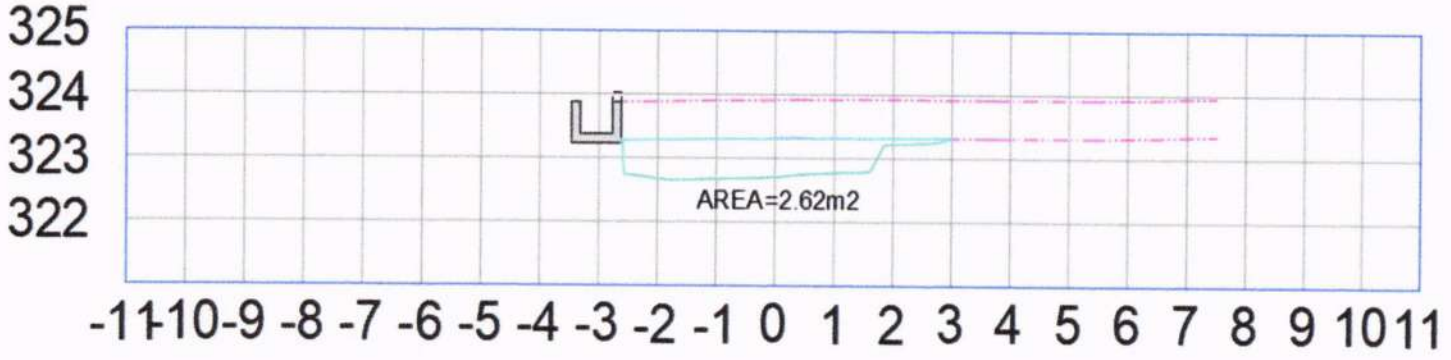

ESTACION 5+030.60

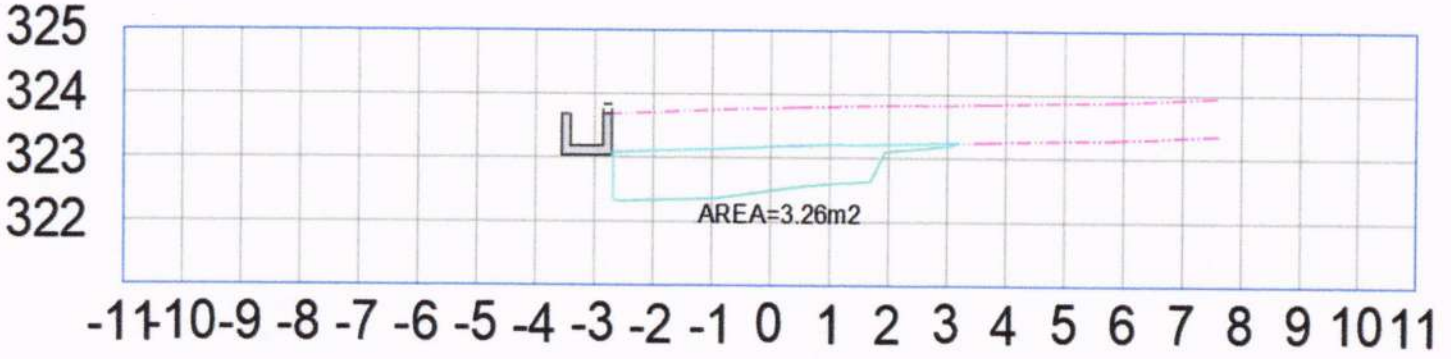

ESTACION 5+025.60

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.1	**DESCRIPCION**	Mejoramiento sub rasante en piedra rajon, extendida con transporte
FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTOS M3	TOTAL M3
Mejoramiento subrasante via	k05+905	k05+945	20,00	5,00	0,35		35,00
Mejoramiento subrasante via	k05+005	k05+013	8,00	5,00	0,35		14,00
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	**49,00**

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.3	**DESCRIPCION**	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**				**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
	BASE GRANULAR	k05+380	k05+463	83,00	7,53	0,30		187,50
	BASE GRANULAR	k05+815	k05+900	85,00	7,60	0,30		193,80
	BASE GRANULAR	k05+620	k05+715	95,00	9,51	0,30		271,04
								0,00
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,03
							TOTAL	**652,30**

OBSERVACIONES:

CESAR ANDRES CARDENAS COLL
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE INSTALACION BASE EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL
CATATUMBO
S.A.S."

FEBRERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

CONSOLIDADO INSTALACION BASE				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+380				
	83	7.53	0.3	187.50
K5+463				


CONSOLIDADO INSTALACION BASE				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+815				
	85	7.6	0.3	193.80
K5+900				

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+620				
	95	9.51	0.3	271.04
K5+715				


VOL TOTAL INSTALACION BASE	652.3

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

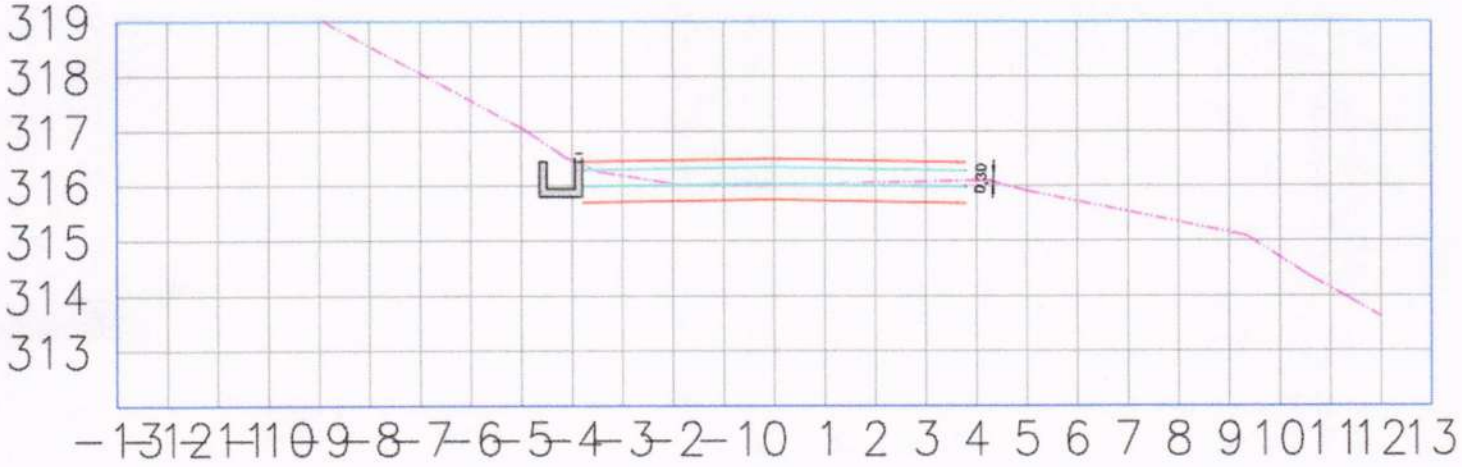


ESTACION 5+400.00

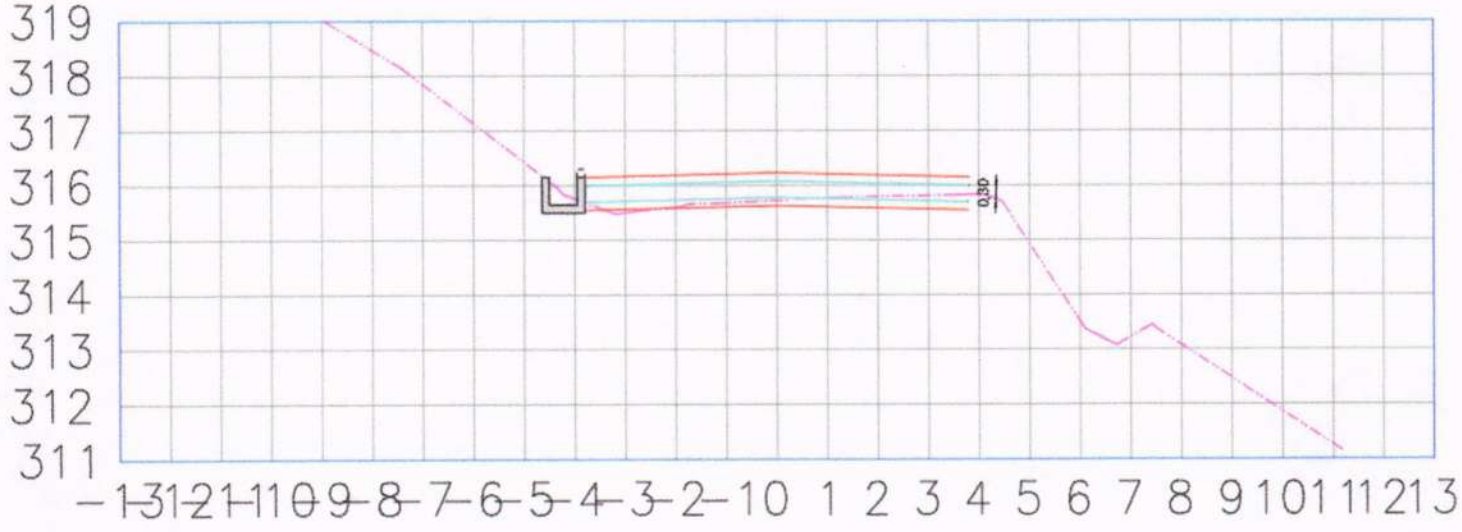


ESTACION 5+380.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

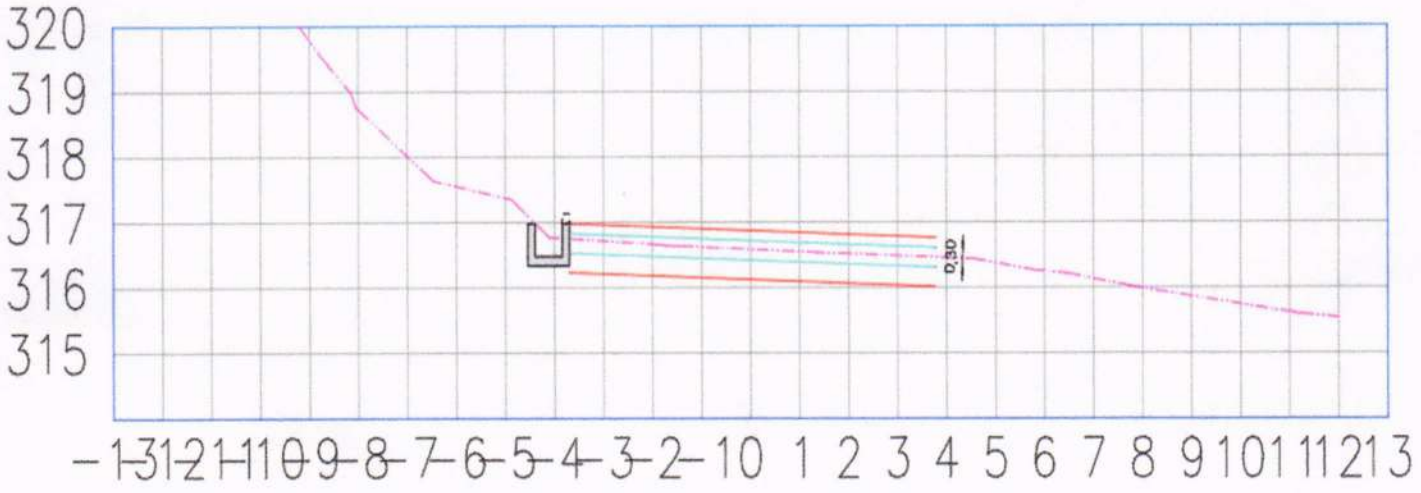


ESTACION 5+440.00

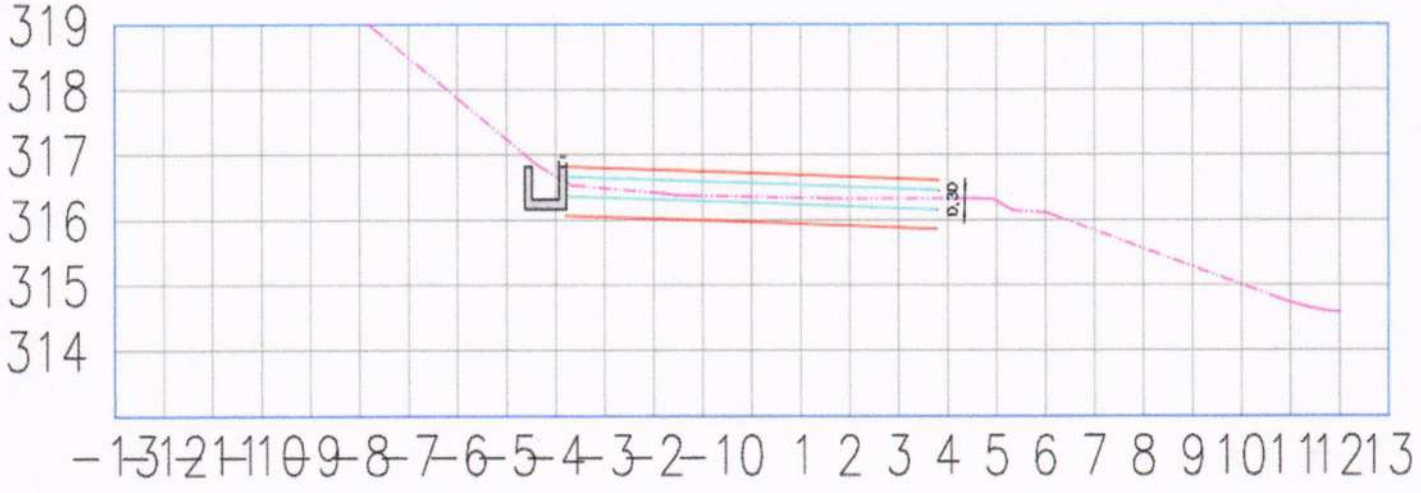


ESTACION 5+420.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

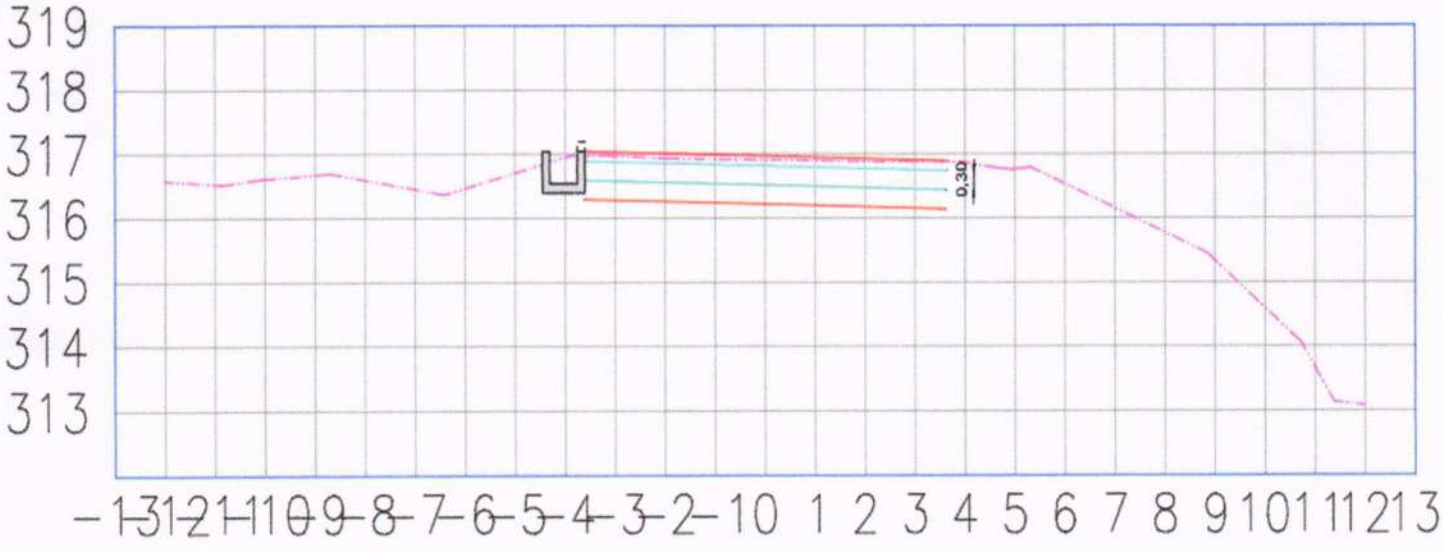


ESTACION 5+460.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

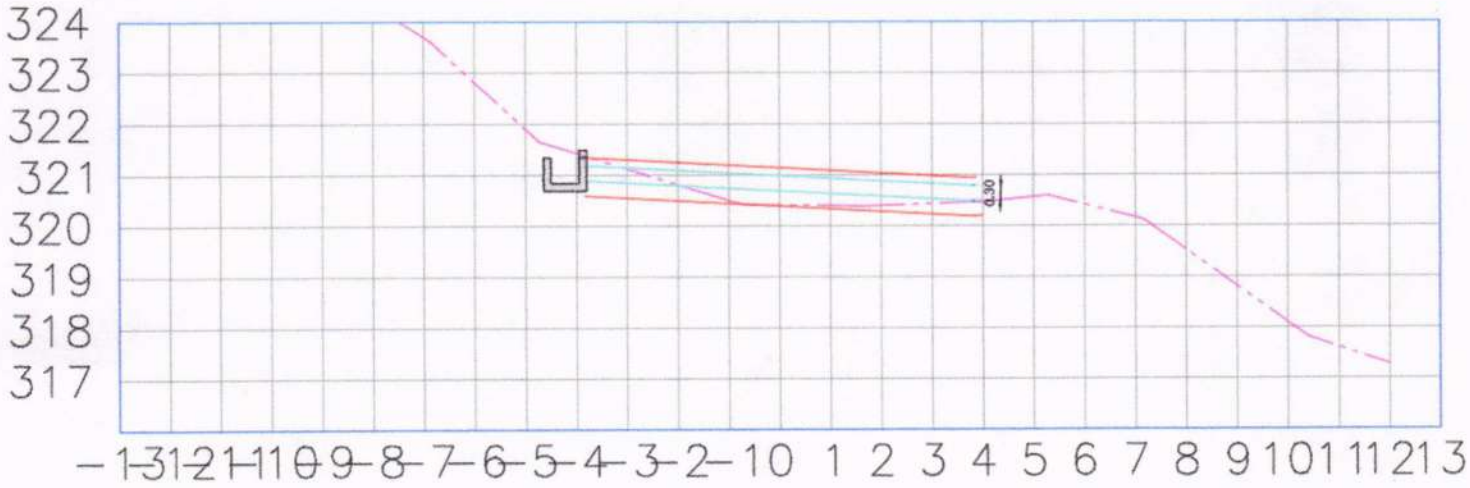


ESTACION 5+840.00

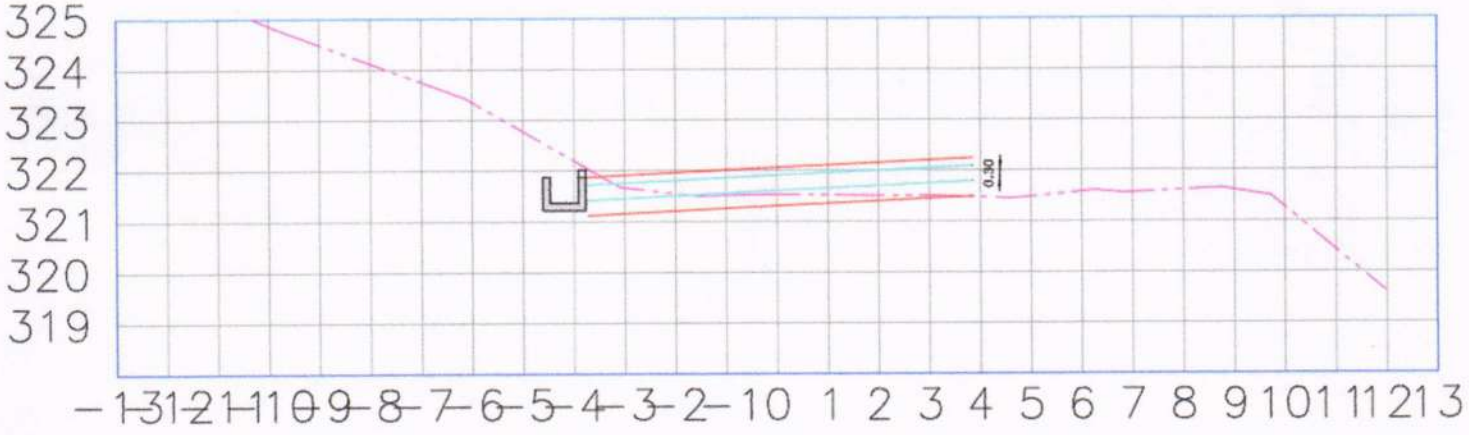


ESTACION 5+815.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

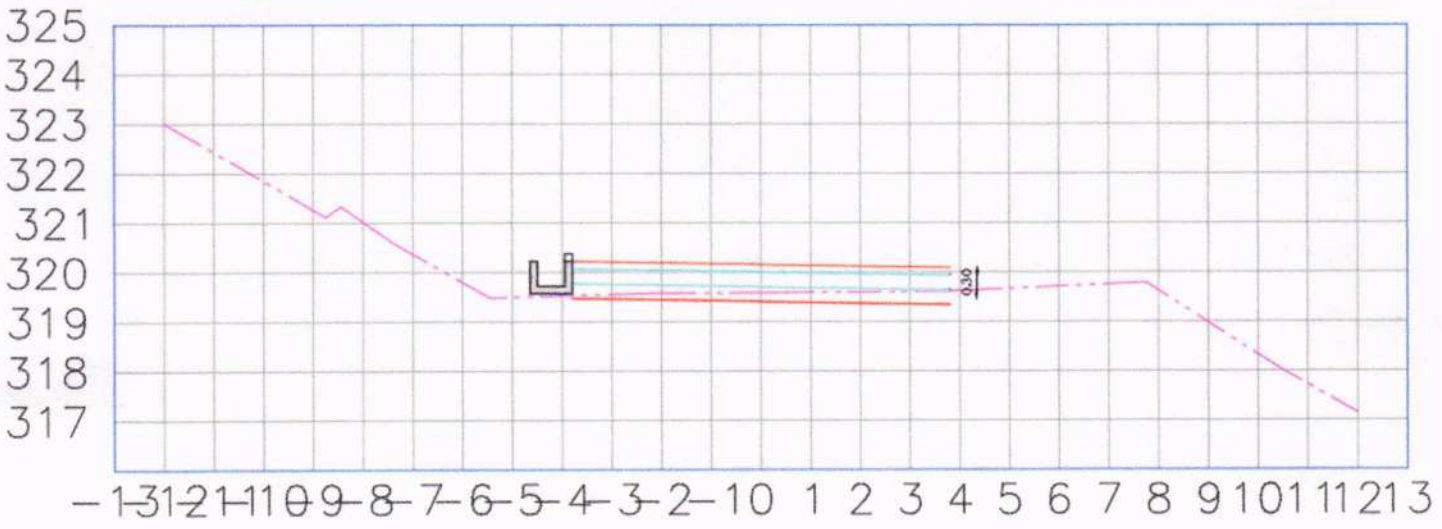


ESTACION 5+880.00

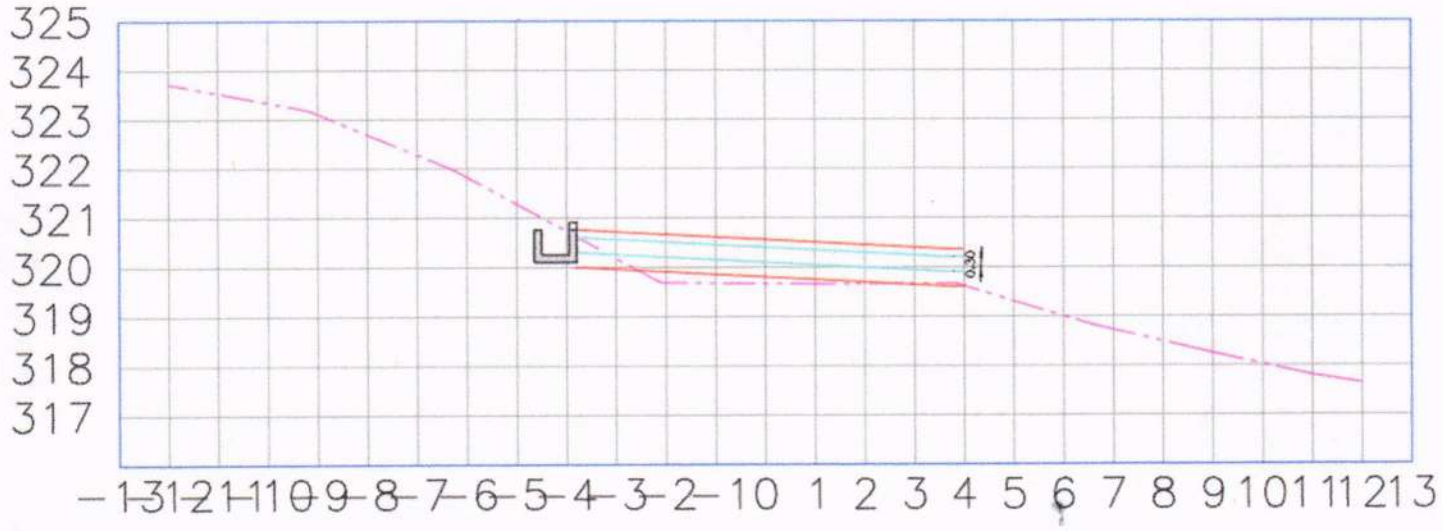

ESTACION 5+860.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

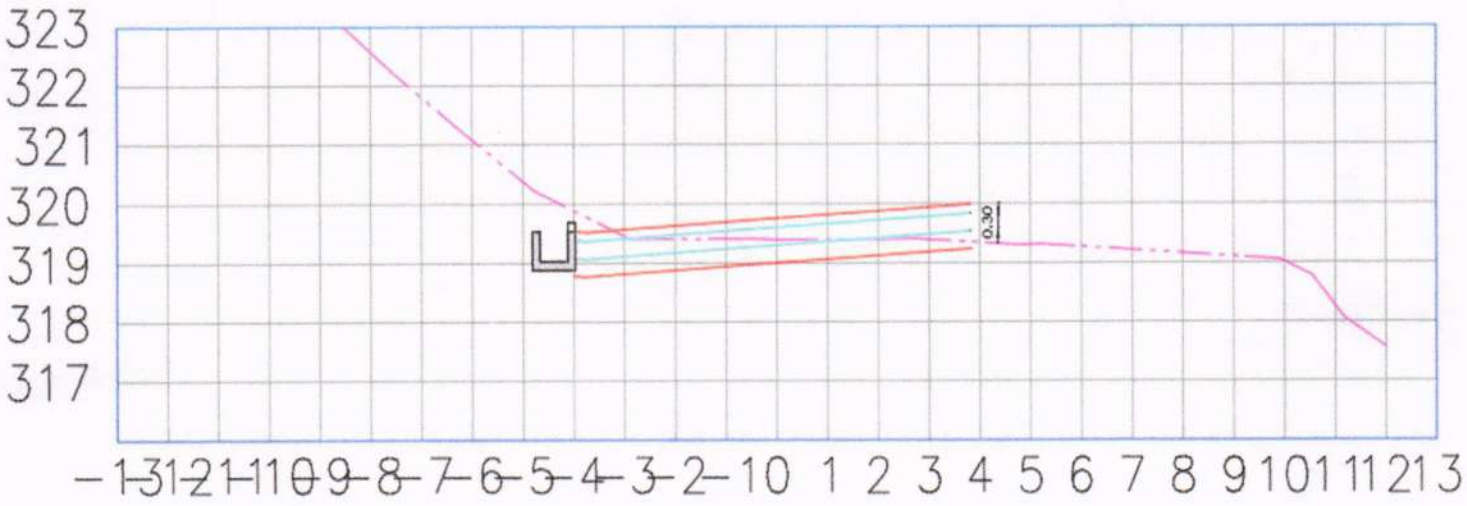

ESTACION 5+900.00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.5	**DESCRIPCION**	Riego de Imprimacion

FECHA INICIAL DEL		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**			**UND:**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M2
	Carril izquierdo emulsión CRL-1	k05+380	k05+464	41,00	3,80			155,80
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**155,80**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.6	DESCRIPCION	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19
FECHA INICIAL DEL		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



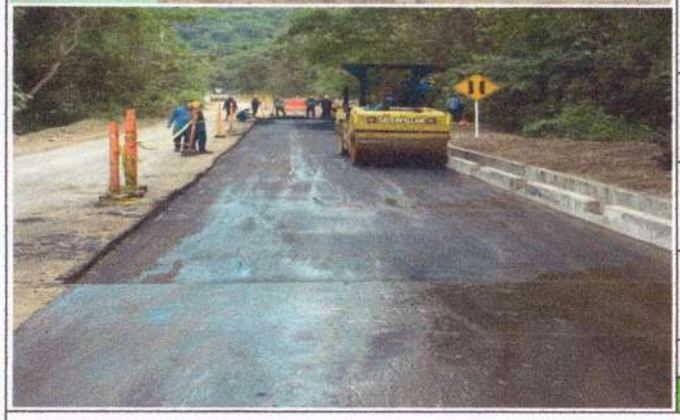

LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M3
Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	k05+370	k05+463	93,00	7,54	0,15		105,18
Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	k05+478	k05+515	37,00	7,56	0,15		41,96
Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	k05+620	k05+715	95,00	9,51	0,15		135,52
Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	k05+815	k05+900	85,00	7,60	0,15		96,90
						AJUSTE AL DECIMAL	0,04
						TOTAL	379,60

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INFORME CANTIDAD DE INSTALACION ASFALTO EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

FEBRERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+370				
	93	7.54	0.15	105.18
K5+463				

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+478				
	37	7.56	0.15	41.96
K5+515				

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+620				
	95	9.51	0.15	135.52
K5+715				

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+815				
	85	7.6	0.15	96.90
K5+900				

CANTIDAD INSTALADA ASFALTO TRAMO 1	379.6

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS

ITEM No.:	1.5.7	**DESCRIPCION**	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:** M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M2
	GEOTEXTIL VIA	k05+670	k05+710	40,00	9,70			388,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**388,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	NP-11 1.5	DESCRIPCION	Riego de liga con emulsion asfaltica
FECHA INICIAL DEL		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M2		

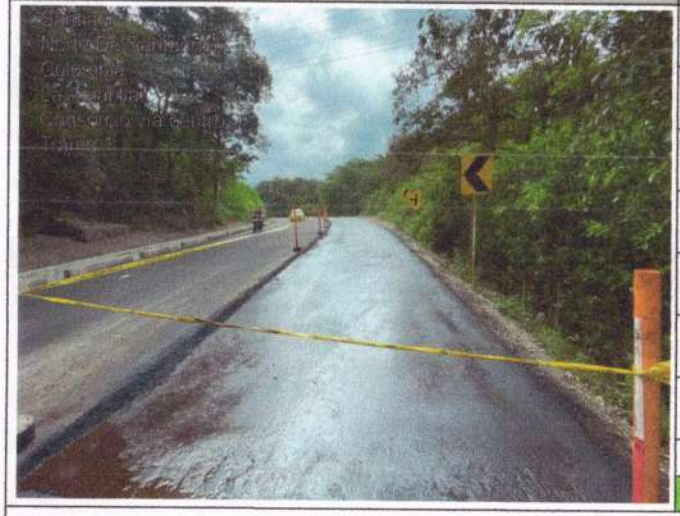REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M2
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+478	k05+515	37,00	3,80			140,60
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	140,60

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.7 OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

ITEM No.:	1.7.2.8	DESCRIPCION	Revegetalizacion con semillas agricolas	FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	UND:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M2
HIDROSIEMBRA 1	k04+011	k04+117				218,84	218,84
HIDROSIEMBRA 2	k04+238	k04+277				34,49	34,49
HIDROSIEMBRA 3	k04+295	k04+430				152,46	152,46
HIDROSIEMBRA 4	k04+463	k05+535				72,52	72,52
HIDROSIEMBRA 5	k04+554	k04+656				112,40	112,40
HIDROSIEMBRA 6	k05+203	k05+244				54,77	54,77
HIDROSIEMBRA 7	k05+317	k05+340				21,94	21,94
HIDROSIEMBRA 8	k05+357	k05+374				14,68	14,68
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	**682,10**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

83

INFORME CANTIDAD DE HIDROSIEMBRA EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL
CATATUMBO
S.A.S."

FEBRERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

AREAS DE HIDROSIEMBRA		
ABSCISA	DESCRIPCION	AREA
K4+011 - K4+117	HIDROSIEMBRA 1	218.84
K4+238 - K4+277.60	HIDROSIEMBRA 2	34.49
K4+295 - K4+430	HIDROSIEMBRA 3	152.46
K4+463 - K4+535	HIDROSIEMBRA 4	72.52
K4+554 - K4+656	HIDROSIEMBRA 5	112.4
K5+203 - K5+244	HIDROSIEMBRA 6	54.77
K5+317 - K5+340	HIDROSIEMBRA 7	21.94
K5+357.41 - K5+374.55	HIDROSIEMBRA 8	14.68
CANTIDAD HIDROSIEMBRA TRAMO 1		682.1

Franklin D. "C.

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	3.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CUNETA Y BORDILLO K22+544 - K22+571					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,556	136,00	41,59
0.10 / 0.88 / 0.10	3,00	0,88	0,556	136,00	66,54
6.30	3,00	6,30	0,556	27,00	94,58
CUNETA K22+542 - K22+544					
2.40	3,00	2,40	0,556	2,00	2,67
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,556	13,00	3,98
0.10 / 0.90 / 0.10	3,00	1,10	0,556	12,00	7,34
1.68	3,00	1,68	0,556	6,00	5,60
				AJUSTE AL DECIMAL	-0,29
				TOTAL	**222,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	SUB-CAPITULO:	3.2.1 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	3.2.1.18	DESCRIPCION	Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	AREA M2	CANTIDAD
BORDILLO	k22+542	k22+544	2,40	0,15	0,45			0,16
PLACA CUNETA IRREGULAR	22+542	k22+544		0,15	0,45		2,18	0,15
CUNETA	k22+544	k22+572		1,00	0,15		27,00	4,05
						AJUSTE AL DECIMAL		0,04
							TOTAL	4,40

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO


Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	SUB-CAPITULO:	3.3.1. ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO
ITEM No.:	3.3.1.9	DESCRIPCION:	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

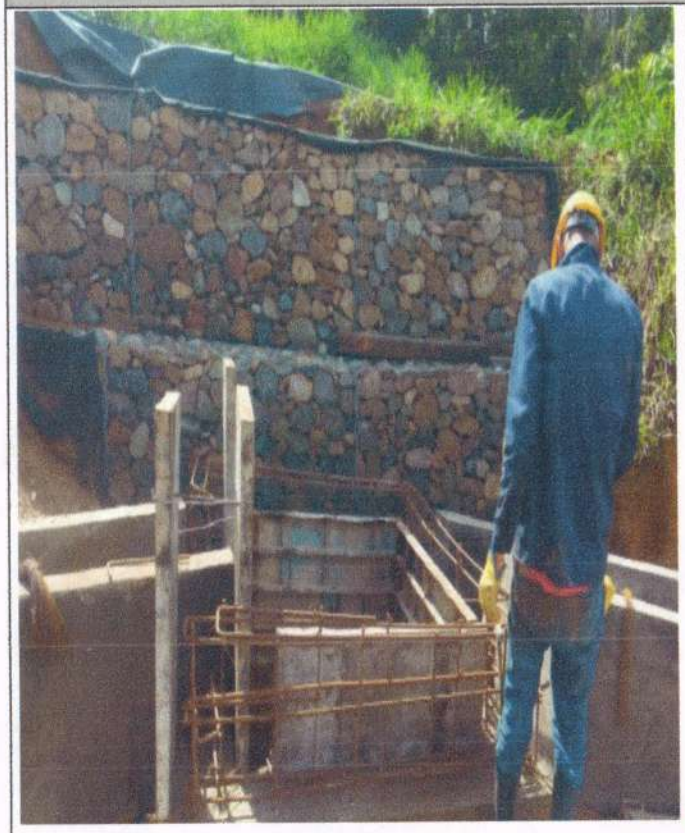

LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
REALCE ALCANTARILLA #14 K21+751					
0.20 1.90 0.20	4,00	2,30	0,994	12,00	27,43
0.20 1.35 0.20	4,00	1,75	0,994	6,00	10,44
0.60	4,00	0,60	0,994	30,00	17,89
0.20 1.90 0.20	4,00	2,30	0,994	6,00	13,72
0.60	4,00	0,60	0,994	12,00	7,16
0.20 1.90 0.20	4,00	2,30	0,994	12,00	27,43
0.60	4,00	0,60	0,994	24,00	14,31
				AJUSTE AL DECIMAL	-0,39
				TOTAL	118,00

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOXCULVERT
ITEM No.:	3.3.2.5	**DESCRIPCION**	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	CANTIDAD M3
	EXCAVACION PARA COLCHOGAVIONES	k22+875	k22+875	200,00	0,50	1,00			100,00
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**100,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRÁ

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOXCULVERT
ITEM No.:	3.3.2.29	**DESCRIPCION**	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	CANTIDAD M3
MEJORAMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	6,15	7,00	0,20		8,61
MEJORAMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	9,40	5,00	0,20		9,40
					AJUSTE AL DECIMAL		-0,01
					TOTAL		**18,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOXCULVERT
ITEM No.:	3.3.2.30	**DESCRIPCION**	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	CANTIDAD M3
	COLCHOGAVION BOX	k22+875	k22+875	5,00	4,00	0,50		10,00
	COLCHOGAVION BOX	k22+875	k22+875	2,00	2,00	0,50		2,00
	COLCHOGAVION BOX	k22+875	k22+875	4,00	1,05	0,50		2,10
	COLCHOGAVION BOX	k22+875	k22+875			0,50	64,00	32,00
	COLCHOGAVION BOX	k22+875	k22+875	13,10	2,57	0,50		16,80
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**62,90**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

90

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	SUB-CAPITULO:	3.3.2 BOX CULVERT
ITEM No.:	NP-06 3.3	DESCRIPCION	Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi

FECHA INICIAL DEL PERIODO:			FECHA FINAL DEL PERIODO:			UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	CANTIDAD M3
	RECUBRIMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	4,00	1,80	0,05		0,36
	RECUBRIMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	4,00	2,00	0,05		0,40
	RECUBRIMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875			0,05	86,00	4,30
						AJUSTE AL DECIMAL		0,04
						TOTAL		5,10

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.8 PAVIMENTOS
ITEM No.:	3.8.4	**DESCRIPCION**	Riego de Imprimacion

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	CANTIDAD M2
	riego de imprimacion	k22+735	k22+810	75,00	3,54			265,50
	riego de imprimacion	k22+870	k22+900	30,00	3,41			102,30
	riego de imprimacion	k22+690	k22+870	180,00	3,30			594,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**961,80**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.8 PAVIMENTOS
ITEM No.:	3.8.5	**DESCRIPCION**	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M3	CANTIDAD M3
	carpeta asfaltica	k21+900	k21+995	95,00	4,8000	0,0700		31,92
	carpeta asfaltica	k21+995	k22+010	15,00	4,3500	0,0700		4,57
	carpeta asfaltica	k22+010	k22+066	56,00	3,8000	0,0700		14,90
	carpeta asfaltica	k22+066	k22+238	172,00	4,3590	0,0700		52,48
	carpeta asfaltica	k22+004	k22+225	221,00	4,3950	0,0650		63,13
	carpeta asfaltica	k22+225	k22+410	185,00	3,9700	0,0650		47,74
	carpeta asfaltica	k22+410	k22+547	137,00	3,9600	0,0650		35,26
	carpeta asfaltica	k22+607	k22+662	54,50	4,3950	0,0650		15,57
	carpeta asfaltica	k22+545	k22+607	62,00	3,9800	0,0650		16,04
	carpeta asfaltica	k22+390	k22+545	155,00	3,8000	0,0650		38,29
	carpeta asfaltica	k22+237	k22+390	153,00	4,3200	0,0650		42,96
	carpeta asfaltica	k22+690	k22+830	140,00	3,3000	0,0650		30,03
	carpeta asfaltica	k22+545	k22+662	117,00	3,8800	0,0650		29,51
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**422,40**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.8 PAVIMENTOS
ITEM No.:	NP11-3.8	**DESCRIPCION**	Riego de liga para emulsion asfaltica
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M3	CANTIDAD M3
	riego de imprimacion costado izquierdo	k22+004	k22+225	221,00	4,36			963,34
	riego de imprimacion costado izquierdo	k22+225	k22+410	185,00	3,97			734,45
	riego de imprimacion costado izquierdo	k22+410	k22+547	137,00	3,96			542,52
	riego de imprimacion costado izquierdo	k22+545	k22+662	116,50	4,15			483,48
	riego de imprimacion costado derecho	k22+390	k22+545	155,00	3,80			589,00
	riego de imprimacion costado derecho	k22+237	k22+390	153,00	4,33			662,49
	riego de imprimacion costado derecho	k22+545	k22+661	116,00	4,30			498,80
							AJUSTE AL DECIMAL	0,03
							TOTAL	**4474,10**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO								
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920			**SUB-CAPITULO:**	4.2.4 BOXCULVERT				
ITEM No.:	4.2.4.4	**DESCRIPCION**	solado en concreto de 17,5mpa	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**			**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	KINCIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
	solado	k00+370	k00+370	2,00	3,60	0,10		0,72
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,02
							TOTAL	0,70

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920	**SUB-CAPITULO:**	4.2.4 BOXCULVERT
ITEM No.:	4.2.4.5	**DESCRIPCION**	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones

FECHA INICIAL DEL PERIODO:			**FECHA FINAL DEL PERIODO:**			**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	KINCIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
placa piso	k00+370	k00+370	3,60	2,00	0,25		1,80
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	**1,80**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920	**SUB-CAPITULO:**	4.2.4 BOXCULVERT
ITEM No.:	4.2.4.6	**DESCRIPCION**	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**				**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	KINCIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UNID	AREA M2	TOTAL M3
GUARDARUEDA	k00+255	k00+255	1,15	2,50	0,30	1,00		0,86
GUARDARUEDA	k00+370	k00+370	2,00	0,30	0,60	1,00		0,36
MUROS	k00+370	k00+370	3,60	1,00	0,25	2,00		1,80
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,02
							TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920	**SUB-CAPITULO:**	4.2.4 BOXCULVERT
ITEM No.:	4.2.4.7	**DESCRIPCION**	Concreto 28 Mpa para vigas y losa

FECHA INICIAL DEL PERIODO:			**FECHA FINAL DEL PERIODO:**			**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	KINCIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UNID	AREA M2	TOTAL M3
Placa superior	k00+370	k00+370	3,60	2,00	0,25	1,00		1,80
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	1,80

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920	**SUB-CAPITULO:**	4.2.4 BOXCULVERT
ITEM No.:	4.2.4.11	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:	**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	**BARRA No.**	**LARGO m**	**PESO Kg/m**	**CANT x ELEM UND**	**TOTAL Kg**
BOXCULVERT K0+370					
0.20 — 1.90 — 0.20	4,00	2,30	0,994	4,00	9,14
h, b=0.15, h=0.75, g=0.10	4,00	2,00	0,994	10,00	19,88
1.45 — 1.45 — 1.40	4,00	4,30	0,994	18,00	76,94
1.45 — 1.45 — 1.40	4,00	4,30	0,994	18,00	76,94
0.20 — 1.95 — 0.20	4,00	2,35	0,994	18,00	42,05
0.15 — 1.50 — 0.25	4,00	1,90	0,994	18,00	33,99
0.15 — 1.50 — 0.25	4,00	1,90	0,994	18,00	33,99
0.20 — 3.60	4,00	3,80	0,994	10,00	37,77
0.20 — 3.60	4,00	3,80	0,994	10,00	37,77
0.20 — 3.60	6,00	3,80	0,994	10,00	37,77

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920	**SUB-CAPITULO:**	4.2.4 BOXCULVERT
ITEM No.:	4.2.4.11	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

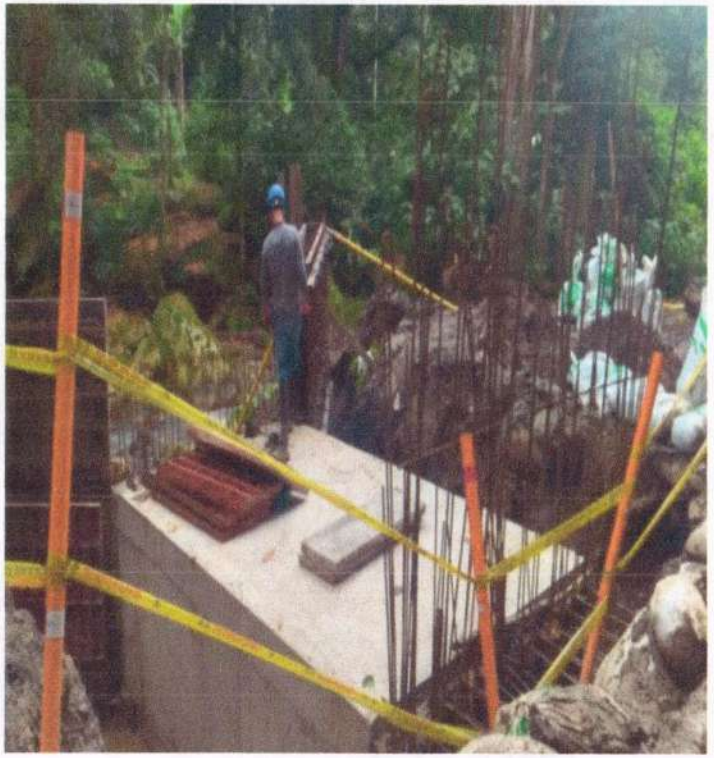

LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.20 — 3.60	4,00	3,80	0,994	10,00	37,77
0.20 — 1.95 — 0.20	4,00	2,35	0,994	19,00	44,38
0.20 — 3.60	4,00	3,80	0,994	10,00	37,77
0.20 — 3.60	4,00	3,80	0,994	10,00	37,77
BOXCULVERT K0+255					
0.20 — 2.35 — 0.25	4,00	2,80	0,994	4,00	11,13
h, b — b=0.15 h=1.25 g=0.10	4,00	3,00	0,994	12,00	35,78
				AJUSTE AL DECIMAL	0,14
				TOTAL	**611,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
