RESOLUCIÓN No. 107 **del** 11 MAR 2024

"Por la cual se otorga un permiso forestal para árboles aislados"

Mano Tigre	*Didymopanax morototoni*	6
Limón Ornamental	*Swinglea glutinosa*	1
Moral	*Maclura tinctoria*	5
Tachuelo	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	3
Sangro	*Vismia guianensis*	2
Pepe burro	*Xylopia Aromática*	2
Palma Real	*Roystonea regia (Kunth) OFCook*	2
Cedro Rosado	*Cedrela odorata L.*	4
Arepo	*NN*	2
Trompillo	*Guarea guidonia*	3
Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.	4
Mamón	Melicoccus bijugatus Jacq.	4
Varasanta	Triplaris americana	2
Ficus	Ficus Sp	1
Sururo	Myrcia Sp	2
Hobo	Spondias mombin L.	3
Ceibo	Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook	2

Parágrafo Primero: Los productos y sub productos resultantes de la Tala, No se autoriza la comercialización y deben ser depositados en un relleno sanitario, por lo cual, el solicitante deberá presentar ante la Corporación los recibos de disposición final de los residuos obtenidos del material vegetal retirado sobre esta área.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de este permiso ambiental es por **seis (06) meses**, contados a partir de la expedición del Acto Administrativo; la empresa la empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9, deberá pagar la tarifa de seguimiento de acuerdo a la Resolución No. 071 del 19 de febrero de 2024 o la que lo modifique, por concepto de visita de seguimiento ambiental por la vigencia del permiso otorgado.

ARTÍCULO TERCERO. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones:

1* Las talas solo podrán ser ejecutada por personas que tengan la certificación de capacitación e idoneidad en la materia expedida por una entidad competente, para lo cual deberán enviar a la Corporación la relación del personal Profesional y de trabajadores dentro del cronograma de actividades en el cual deben incluir las áreas seleccionadas.

2* Las talas o intervención sobre los árboles debe ser un proceso planificado que incorpore por lo menos: Alistamiento de personal y equipos, los riesgos de accidentes, la información sobre las labores a desarrollar a los propietarios o arrendatarios de los predios donde se ubiquen los árboles a intervenir, la reposición de posibles daños, el manejo de recolección de los sobrantes (retiro del árbol, retiro de ramas y hojas, preparación, cargue, transporte y disposición final de los mismos); igualmente deben incluir el tratamiento fitosanitario de los árboles intervenidos, no se permitirá dejar los residuos de corte sobre los corredores de las talas, ya que se constituyen en material combustible fácil de incendiar, de obviarse estas recomendaciones, se harán responsables como permisionarios, en caso que sea comprobado como causa de inicio de un incendio forestal o estructural de acuerdo a la ubicación de los desechos de podas y cortes.

3* Una vez realizada las talas, cada árbol debe recibir tratamiento para control de la disposición final de los residuos en una escombrera o relleno sanitario que cumpla con los requisitos de funcionamiento y operación.

4* En caso de afectar árboles que no se requieren, se debe aplicar fertilización en piso o foliar, o mediante otro sistema de fertilización de recuperación, tratamiento que debe ser informado a la Corporación.

5* Cada árbol debe ser revisado minuciosamente para identificar **fauna** que se hospede, con el fin de ser reubicada o protegida en un habitad similar.

6* Para el conocimiento de la comunidad, se deben instalar mínimo dos (2) vallas por sector, en lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, numero de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, número de árboles autorizados para la Tala, compensaciones etc., cada valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico, diferente en cada una de ellas, las vallas a instalar, deben tener unas dimensiones de 2,00 x 1,60 mts.

En los extremos del eje vial a intervenir, deben instalar una de las vallas, que se puedan identificar en ambos sentidos de la vía, es decir, que su contenido pueda ser observado desde cualquier dirección de quienes transiten o se desplacen por esta vía.

Corponor

RESOLUCION No.

PERMISO FORESTAL ARBOLES AISLADOS

CONSORCIO VIA CENTRO.

Nit. 901740307-9

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALAZAR -ARBOOLEDAS, MUNICIPIO DE SALAZAR.

PERMISO FORESTAL ARBOLES AISLADOS:

ARBOLES AUTORIZADOS PARA TALA:	**146 Árboles**
ARBOLES PARA SIEMBRA EN LA VIA:	**146 Árboles**
ENTREGA MATERIAL VEGETAL:	**2920 árboles Ornamentales.**
LOCALIZACIÓN:	**k23+040 - k21+840 corredor vial Salazar-Arboledas.**
VIGENCIA:	**06 meses.**

MENSAJE ALUSIVO A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
¡TODOS POR EL AGUA!

Parágrafo Único: CORPONOR, no se hará responsable por los daños que se puedan causar a terceros producto de las actividades necesarias para el desarrollo del presente permiso, situación que de presentarse cualquier queja recae directamente sobre la empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9 por ser el titular del permiso, de la misma forma será también responsable de los daños o afectaciones ambientales no previstas o no consideradas en este concepto, sin importar las acciones que demande sobre procesos sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: La empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No13.458.485. expedida en Cúcuta, además, cumplir con las medidas de carácter compensatorio que buscan retribuir o resarcir al ecosistema y su diversidad biológica las afectaciones ocasionadas por la tala los árboles, la corporación establece las siguientes medidas:

RESOLUCIÓN No. 107 **del** 11 MAR 2024

"Por la cual se otorga un permiso forestal para árboles aislados"

ARTICULO QUINTO: Como medida de **REPOSICIÓN AMBIENTAL:** Como medida de reposición ambiental debido a la necesidad de realizar la tala de ciento cuarenta y seis (146) árboles, se calculará la compensación en relación 1:20, por lo cual, deberán entregar una factura de un vivero del Área Metropolitana de Cúcuta por la compra de dos mil novecientas veinte (2920), Palmas areca (Dypsis lutescens), ejemplares con altura no superior a 30 centímetros, en bolsa de kilo de sustrato, material vegetal que será utilizado por la Corporación para los proyectos sociales.

ARTICULO SEXTO: Como medida de. **RESTAURACION AMBIENTAL:** Se deberá realizar la siembra de ciento cuarenta y seis (146) árboles, ubicando en la zona de influencia del proyecto, se recomienda plantar árboles de las especies Guayacán (Tabebuia chrysotricha), Arévalo (Cupania americana), Cedro Rosado (Cedrela odorata), Nogal cafetero (Cordia alliodora), treinta y cuatro (34) ejemplares de las especies Guayacán, Cedro Rosado, Nogal cafetero y Arévalo a plantar, debe tener una altura mínima de 0.60 metros; Palma real (Roystonea regía) plantas con altura no inferior a dos (2,00) metros, a este material vegetal a plantar deberán realizar mantenimiento por un (01) año para garantizar la presencia de estos nuevos individuos, esto con el fin de compensar los efectos ambientales, se debe informar a la Corporación sobre el cronograma de siembras y georreferenciación para practicar visita técnica de verificación de la siembra de los nuevos árboles.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez se den por terminadas las actividades autorizadas, bien sea por vencimiento del término, o por cumplimiento de lo autorizado la Corporación **realizará una (1) visita de seguimiento y una visita de cierre emitiendo concepto técnico**, en el cual se dejare constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario, en caso contrario la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas, en consecuencia el titular de la autorización y/o permiso, deberá cancelar por motivos de visitas , **la tarifa establecida en la Resolución No. 118 del 17 de febrero de 2023, o por aquella que la modifique, reemplace o sustituya**. Hasta tanto no se constate por parte de la Corporación el cumplimiento de las obligaciones no se archivará el expediente.
Se le recuerda al usuario que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo de otorgamiento será causal de remisión del expediente a la oficina de control y vigilancia de la Corporación para dar inicio al debido **Proceso Sancionatorio que haya lugar, conforme lo establece la Ley 1333 de 2009.**

ARTICULO OCTAVO Por la naturaleza del permiso a otorgar y las recomendaciones contempladas en este apartado también se realizarán el seguimiento administrativo de conformidad con lo establecido en la Resolución 1379 del 30 de diciembre de 2021:

"ARTICULO PRIMERO: Establecer el seguimiento ambiental administrativo, a los procesos que adelante la corporación, que por su naturaleza lo requieran, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y/o las obligaciones, en las que se incluye la revisión de los documentos contenidos en la licencia ambiental, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental otorgados por la corporación".

ARTICULO NOVENO: * La empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9, deben presentar las autorizaciones y/o consentimientos de los propietarios o tenedores de los predios donde se ubiquen los árboles a intervenir, igualmente, el cronograma de Obra para el manejo del componente verde donde se especifiquen labores de talas, cronograma a presentar entre los primeros diez (10) días siguientes a la notificación del Permiso.

ARTICULO DECIMO La empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No13.458.485. expedida en Cúcuta, deberá entregar informes al final de la ejecución de las actividades, informes presentados por la Interventoría Ambiental de la empresa, informes que contengan: Relación de daños o modificación del paisaje, identificando los impactos ambientales causados, número y especies de árboles intervenidos, tratamientos realizados, inconvenientes presentados (Relacionados con los recursos naturales sobre presencia de fauna, indicando traslados, reubicación etc., soportados con registros fotográficos), estado en que se

153

RESOLUCIÓN No. 107 **del** 11 MAR 2024

"Por la cual se otorga un permiso forestal para árboles aislados"

entregan los árboles con su respectivo registro fotográfico, copias de las actas de reuniones en donde se socialicen las labores que se estén realizando, y demás consideraciones que la empresa considere relevantes.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Acto Administrativo, dará lugar a la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, de conformidad con la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución podrá ser suspendida o revocada mediante resolución motivada y/o sustentada, cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos condiciones, obligaciones, o exigencias inherentes a ella, y contemplados en el presente acto de otorgamiento, y así mismo se enviarán el expediente a la dependencia correspondiente a efectos de iniciar el respectivo proceso sancionatorio, teniendo como evidencia el informe de la visita y el incumplimiento de los hallazgos encontrados.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo al señor **GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO** identificado con la cédula de ciudadanía No. **13.458.485.** expedida en Cúcuta, como representante legal de La empresa **CONSORCIO VIA CENTRO**. identificada con Nit. **901740307-9**.; o a quien se autorice debidamente, según con las condiciones establecidas en el artículo 67 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El presente acto administrativo deberá publicarse en la página Web de CORPONOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la Dirección General dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVAN CACERES GARCIA

Nombres y apellidos		*Cargo*	
Revisó y	*María Eugenia Ararat Díaz*	*Subdirectora Jurídica*	
Elaboro:	*Javier A. Peñaloza Gelvez*	*Profesional Contratista*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

154

Corponor

Republica de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

NIT. 890505253-4

Calle 13 Av. El Bosque No. 3E-278 Barrio Caobos

TELEFONO: 5828484
FAX: 5716219
CORREO: corponor@corponor.gov.co
CIUDAD: CUCUTA

No Contribuyentes de Renta Segun Art 22 Estatuto Tributario / RÉGIMEN COMÚN, Autorización Numeración de Facturación, RESL. 18764076546364 DIAN

Referencia : 3 OC-105475901740307-9

Señores:	CONSORCIO VIA CENTRO
Dirigido a:	
NIT:	901740307-9
Sector:	
Dirección:	CALLE 10 N° 5-50 CENTRO AGROBANCARIO, LOCAL 27
Teléfono:	6075729321 **Fax:**
Correo:	consorcioviacentro@gmail.com
Ciudad:	CUCUTA **Departamento:** NORTE DE SANTANDER
Centro de uso:	PAMPLONA
Cuenca:	CUCUTA

Factura Electrónica No. **OC-105475**

Referencia de Pago: 510581

Periodo Facturado

Desde:	1 de ene de 2025
Hasta:	31 de dic de 2025
Fecha Vencimiento:	11 de abr de 2025
Fecha Expedición:	11 de mar de 2025
Ciudad:	CUCUTA

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	RECARGO	DESCUENTO	VAL. TOTAL
480353003	Seguimiento Permiso de Tala o Reubicación de Árboles Aislados por Obra Pública o Privada en Centros Urbanos. (Para la Realización, Remodelación o Ampliación de obras de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares). (valor por árbol)	1	$14.169.154,00	$0,00	$0,00	$14.169.154,00

CUFE: 0316bdfed43b8318953100b29445eafd4e4b80038e9dd77a90849da741e66dd47bd477d55decaa1829befe210ca6cf3

SUBTOTAL:	$14.169.154,00
I.V.A.:	$0,00
RECARGO:	$0,00
DESCUENTO:	$0,00
TOTAL:	$14.169.154,00

SON: catorce millones ciento sesenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro

Observaciones:

EXPEDIENTE 33904 PERMISO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS PARA TALA Y/O PODA EN CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADOS - CANTIDAD 146 FECHA SEGUIMIENTO 2025 --- RES 766 DE 15/11/2024

Nota:

El valor cobrado en esta factura corresponde solamente al periodo indicado. En caso de tener saldos pendientes por periodos anteriores deberá presentarse en la Oficina Jurídica de CORPONOR para informar * * Pagos a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros N° 61740884137.* REPORTAR EL PAGO AL E-MAIL: bescalante@corponor.gov.co - factura vencida generara intereses.

Elaboró

LGALINDEZ

Recibido

Acepto y me Obligo a Pagar
Rep. Legal y/o Apoderado
Firma y/o Sello

USUARIO

CORPONOR

Referencia de Pago

Referencia : 3 OC-105475901740307-9

Información Usuario

NIT: 901740307-9
Nombre: CONSORCIO VIA CENTRO
Dirección: CALLE 10 N° 5-50 CENTRO AGROBANCARIO, LOCAL 27 **Tel:** 6075729321

Periodo Facturado

Desde:	1 de ene de 2025
Hasta:	31 de dic de 2025
Vence:	11 de abr de 2025
Expedida:	11 de mar de 2025

Detalle de la Cuenta

SUBTOTAL:	$14.169.154,00
I.V.A.:	$0,00
RECARGO:	$0,00
TOTAL:	$14.169.154,00

Puntos de Pago:

* BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No 61740884137.

Forma Pago **Fecha**

	Cod.	No. Cuenta	Valor
CHEQUES			
EFECTIVO			
Total Pagado			

SON: *catorce millones ciento sesenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro*

BANCO

(415)7709998019386(8020)0000510581(3900)000014169154(96)20250411

FACTURA VENCIDA NO PUEDE SER CANCELADA EN BANCOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CORPONORVC
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 83400007022

Fecha: 21-04-2025 **Hora:** 15:41:48
Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 21-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2025

Impreso por: Andrescentro23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $44,398,174.00	**Valor Registros Procesados:** $44,398,174.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61740884137	Ahorros	890505253	CORPONOR	44,398,174.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2025

Pago facturas — 105116 ✓
105125 ✓
105252 ✓
105425 ✓
105476 ✓
105498 ✓

Facturas $ 43.889.402
Diferencia $ 508.772
$ 44.398.174

Powered by CamScanner

155

Corponor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR

RESOLUCIÓN No. 1165 **del** 11 DIC 2025

"Por medio del cual se decreta la perdida de ejecutoriedad y archivo de la solicitud de Permiso Forestal de Arboles Aislados, con Radicado No. 2023010150143342 de fecha 11 de diciembre de 2023 y expediente NEPTUNO 33904, presentado por la empresa CONSORCIO VIA CENTRO., identificada con NIT 901740307-9".

LA SUBDIRECTORA JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL CORPONOR

En uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 del 2015, la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 476 del 25 de abril de 2019 "Por la cual se delega una función al subdirector Jurídico de la Corporación",

CONSIDERANDO

Que, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.

Que, el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, sobre la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo dice:

"...Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. *Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*
2. *Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.*
3. *Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.*
4. *Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.*
5. *Cuando pierdan vigencia...".* Subrayado por fuera de texto.

Que, mediante Radicado No. 2023010150143342 y NEPTUNO 33904 del 11 de diciembre de 2023; la empresa CONSORCIO VÍA CENTRO, identificada con Nit. 901740307-9 representada legalmente en su momento por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No13.458.485. expedida en Cúcuta, presentó solicitud de Permiso

RESOLUCIÓN No. 1165 **del** 11 DIC 2025

"Por medio del cual se decreta la perdida de ejecutoriedad y archivo de la solicitud de Permiso Forestal de Arboles Aislados, con Radicado No. 2023010150143342 de fecha 11 de diciembre de 2023 y expediente NEPTUNO 33904, presentado por la empresa CONSORCIO VIA CENTRO., identificada con NIT 901740307-9".

Forestal de Arboles aislados, para la tala de ciento cuarenta y seis (146) árboles en el predio donde se proyecta construcción de obra nueva, mediante contrato LP-FC38-2023 celebrado entre el FARO DEL CATATUMBO y la CONSORCIO VIA CENTRO, ubicado en abscisas. k23+040 - k21+840 corredor vial Salazar-Arboledas, Municipio de Salazar de las Palmas, Departamento Norte de Santander.

Que, mediante radicado No, 2024-01015-000050-1, del 09 de enero de 2024, la Subdirectora Jurídica envía al correo consorcioviacentro@gmail.com, requerimiento al representante legal, para que haga entrega del Registro único tributario y la entrega del pago de factura por concepto de visita técnica de evaluación.

Que, mediante radicado No. 2024010150002412, del 10 de enero de 2024, el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO como Representante legal del CONSORCIO VIA CENTRO, hace entrega del Anexo RUT y del pago de factura de evaluación de visita técnica.

Que, con fecha del 06 de febrero de 2024, la subdirectora jurídica firma el Auto de Tramite donde resuelve Iniciar el trámite ambiental del PERMISO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, promovido por la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No 13.458.485. expedida en Cúcuta, mediante Radicado No. 2023010150143342 y NEPTUNO 33904. Para la tala de ciento cuarenta y seis (146) arboles en el predio donde se proyecta construcción de obra nueva, ubicado en abscisas k23+040 k21+840 corredor vial Salazar-Arboledas, Municipio Salazar de las Palmas, Departamento Norte de Santander., y ordena la práctica de la visita técnica de que trata el artículo 2.2.1.1.7.6. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, en la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.

Que, producto de la visita técnica se entrega el concepto técnico de evaluación el día 09 de febrero de 2024, por el cual se expidió el acto administrativo No. 0107 del 11 de marzo de 2024 por la cual se otorga un permiso forestal para árboles aislados y se dictan otras disposiciones.

Que, mediante Resolución No, 0107 del 11 de marzo de 2024, se otorga permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, por el cual se otorga prorroga y se emite la Resolución No. 0766 del 15 de noviembre de 2024 a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No 13.458.485, conformando el expediente con radicado No. 2023010150143342 y NEPTUNO 33904 del 11 de diciembre de 2023.

Que, se emite la Resolución No. 0107 del 11 de marzo de 2024 *"Por El Cual Se Otorga Un Permiso Forestal De Árboles Aislados"* a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 por una vigencia de 06 meses.

Que, el 12 de agosto de 2024, bajo radicado No. 2024-01015-008971-2 el Consorcio Via Centro, a través del representante legal MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, presentó la propuesta para siembra; medida de compensación Resolución No. 107 del 11 de marzo del 2024, *"Por Medio De La Cual Se Otorga Un Permiso De Aprovechamiento Forestal"*.

Que, el 15 de agosto de 2024, bajo radicado No. 2024-01015-009133-2, el Consorcio Via Centro, a través del representante legal MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, presenta Solicitud de prórroga del permiso otorgado mediante Resolución No. 107 del 11 de marzo de 2024 *"Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones"*.

RESOLUCIÓN No. 1165 **del** 11 DIC 2025

"Por medio del cual se decreta la perdida de ejecutoriedad y archivo de la solicitud de Permiso Forestal de Arboles Aislados, con Radicado No. 2023010150143342 de fecha 11 de diciembre de 2023 y expediente NEPTUNO 33904, presentado por la empresa CONSORCIO VIA CENTRO., identificada con NIT 901740307-9".

Que, por disposición del subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible, Doctor Jorge Iván Cáceres García, se practica visita de evaluación el día 19 del mes de septiembre de 2024.

Que, se emite la Resolución No. 0766 del 15 de noviembre de 2024 *"Por El Cual Se Otorga Prorroga De Un Permiso De Aprovechamiento Forestal De Árboles Aislados Concedida Mediante Resolución N° 107 Del 11 De marzo De 2024"* a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9 por una vigencia de 06 meses. Notificada el 20 de noviembre de 2024.

Que, es función de CORPONOR propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la resolución No. 107 *Del 11 De marzo De 2024*, por el cual se otorga prorroga y se emite la Resolución No. 0766 del 15 de noviembre de 2024 mediante la cual la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, otorgó permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados para la tala de árboles, a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No13.458.485. expedida en Cúcuta, Como consecuencia **ARCHÍVESE** el expediente con radicado No. 2023010150143342 y NEPTUNO 33904 del 11 de diciembre de 2023, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte al usuario que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente sin la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes, conlleva la imposición de las sanciones conforme a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Oficina de Control y Vigilancia de la Corporación, para verificar si en la actualidad se está ejerciendo de forma ilegal la actividad, y si es el caso, proceder a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad con lo señalado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y a su ley modificatoria 2387 del 25 de julio 2024.

ARTICULO CUARTO. De acuerdo a la Carta Cartera expedida por la subdirección financiera de CORPONOR y que reposa en el expediente de la empresa CONSORCIO VIA CENTRO. identificada con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No13.458.485. expedida en Cúcuta, se encuentran en Paz y Salvo

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente auto el señor DIEGO ANDRES TREJOS NIETO, identificado con cedula de ciudadanía No 6.663.308 expedida en Cúcuta, como representante legal de la empresa el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cédula de ciudadanía No13.458.485. expedida en Cúcuta o a quien haga sus veces o legalmente autorice; en los términos establecidos en los artículos 66 y ss., de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

RESOLUCIÓN No. 1165 **del** 11 DIC 2025

"Por medio del cual se decreta la perdida de ejecutoriedad y archivo de la solicitud de Permiso Forestal de Arboles Aislados, con Radicado No. 2023010150143342 de fecha 11 de diciembre de 2023 y expediente NEPTUNO 33904, presentado por la empresa CONSORCIO VIA CENTRO., identificada con NIT 901740307-9".

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín Ambiental de la página web de CORPONOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Susana Andrea Castañeda Zabala

	Nombres y apellidos	*Cargo*	
Revisó y	*Susana Andrea Castañeda Zabala*	*Subdirectora Jurídica*	
Elaboro:	*Javier A. Peñaloza Gelvez*	*Profesional Contratista*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Corponor **CORPONOR**

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Hoy 11 de Diciembre de 20 25

se notificó personalmente a Mayi Diaz

Duran Diaz de la C.C. 913

que antecede enterado(s) de su contenido firma(s)

El Notificado

C.C No. 1004931356

157

Corponor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR

RESOLUCIÓN N° 116 DEL 26 DIC 2025

"Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las concedidas en la Constitución Política de 1991, en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y

CONSIDERANDO

Que, el artículo 8 de la Constitución Política establece que *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".*

Que, el artículo 79 de la Carta Política indica que: *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

Que, *"es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."*

Que, el artículo 80 ibidem, establece que: *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..."*

Que, la Ley 99 de 1993 establece: que: "*Corresponde a la Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo a las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente*".

Que, así mismo, la Ley 99 de 1993 dispuso en su artículo 31 las funciones de la Corporación, entre las cuales se encuentra; ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo a las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, de igual forma, el artículo en mención, señala como otra función de la Corporación; otorgar permisos requeridos por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que, el Decreto – Ley 2811 de 1974 determina en su artículo 102, que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Que, por su parte, el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, dispone que para la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.

RESOLUCIÓN Nº 1216 **DEL** 26 OTC 2025

"Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones"

Que, según el artículo 31 numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, de acuerdo el numeral 12 del artículo 31 ibidem, establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el trámite de Ocupación de Cauce es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974.


Que, mediante radicado NEPTUNO 36800, y radicada por SIEP con radicado No. 2025010150135402 con fecha del 21 de octubre de 2025, la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, solicita ante CORPONOR, un permiso de ocupación de cauce para el proyecto, obra o actividad denominado; "MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA" En el municipio de Arboledas, Departamento Norte de Santander.

Que la subdirección jurídica, una vez revisó la solicitud presentada por la empresa CONSORCIO VIA CENTRO., observó que la documentación cumplió con los requisitos a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y por lo tanto, procedió a dictar el auto de inicio ordenando en él, correr traslado a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del expediente correspondiente para que se practicara la visita y continuara el proceso de evaluación de la solicitud presentada.


Que de la evaluación efectuada por la subdirección de desarrollo sostenible se emitió el informe técnico que es señalado continuación:

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad la obtención del permiso de ocupación de cauce por parte de la Autoridad Ambiental competente, con el propósito de Realizar obras hidráulicas y estructurales de reemplazo de Box Culvert, alcantarillas y construcción de muros de contención en jurisdicción del municipio de Arboledas, departamento de Norte de Santander.



Reemplazar por construcción de Box Culvert 2.0*1.5m - K 0+255




Reemplazar por construcción de Box Culvert 1.5*1m - K 0+370




Reemplazar por construcción de Box Culvert 2.5*1m - K 0+540



alcantarilla de tubería de 36 pulgadas con encole y descole en concreto de 4000 psi reforzado con acero estructural. K 0+746

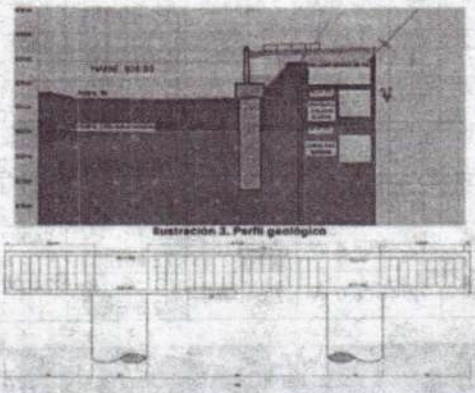

Muro de contención K 0+264 a K 0+314

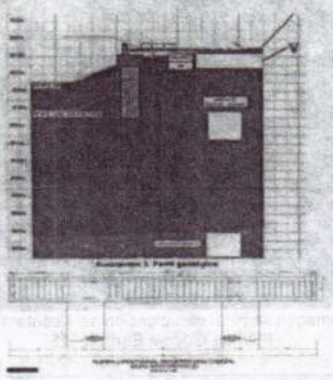

Muro de contención K 0+386 a K 0+458

RESOLUCIÓN Nº ***DEL*** 28 DIC 2025

"Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones"

UBICACIÓN Y CARTOGRAFIA

El permiso de ocupación de cauce solicitada, para el Tramo 4 del proyecto 'MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER', el cual se encuentra ubicado entre las abscisas k0+000 al k0+745 jurisdicción del municipio de Arboledas.

Las actividades se desarrollan en las siguientes coordenadas:

COORDENADAS DE REFERENCIA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PERMISO						
LUGAR	Coordenadas Geográficas				Origen Nacional	
	Formato en grados, minutos y segundos (DMS)		Formato decimal (DD)			
	Norte	Oeste	Latitud	Longitud	Norte	Este
OBRA N° 1 K 0+255	7°38'32.1" N	72°48'10.4"W	7.642250	-72.802889	2402464.840	5021731.342
OBRA N° 2 K 0+290	7°38'31.1" N	72°48'09.7"W	7.641972	-72.802694	2402434.154	5021752.793
OBRA N° 3 K 0+370	7°38'28.8" N	72°48'08.5"W	7.641333	-72.802361	2402363.569	5021789.575
OBRA N° 4 K 0+540	7°38'24.2" N	72°48'06.7"W	7.640056	-72.801861	2402222.393	5021844.765
OBRA N° 5 K 0+746	7°38'21.4" N	72°47'59.9"W	7.639278	-72.799972	2402136.540	5022053.055
MURO 1 K0+264 a K0+314	7°38'31.9" N	72°48'10.2"W	7.642188	-72.802832	2402457.992	5021737.617
	7°38'30.5" N	72°48'09.3"W	7.641806	-72.802583	2402415.742	5021765.051
MURO 2 K0+386 a K0+458	7°38'28.2" N	72°48'08.4"W	7.641167	-72.802333	2402345.153	5021792.646
	7°38'26.1" N	72°48'08.0"W	7.640583	-72.802222	2402280.697	5021804.926



Imagen satelital de ubicación de alcantarillas
Fuente: Google Earth (2025)

EQUIPOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR

Para la ejecución general de las actividades de demolición del box culvert y/o alcantarillas existente, construcción del nuevo box culvert y edificación de muros de contención, se contará con retroexcavadora sobre orugas equipada con cucharón y martillo hidráulico para demoliciones y excavaciones; cargador frontal y minicargador para el cargue, movimiento y manejo de materiales; volquetas doble troque para el transporte y disposición del material excavado y escombros; planta de

concreto o mixer para el suministro del concreto requerido en las diferentes estructuras; vibradores de inmersión para asegurar una adecuada compactación del concreto; formaletas en madera o metálicas para el encofrado de elementos estructurales; equipo de izaje como grúa o brazo telescópico para la movilización y colocación de elementos pesados o prefabricados; compactadores tipo rodillo vibratorio o pata de cabra para la compactación de rellenos y capas estructurales; y herramientas manuales como palas, picas, cortadoras, cinceles, punzones, barras y equipos de nivelación para labores de apoyo y acabados en zonas de difícil acceso o de trabajo detallados.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

ACTIVIDAD	IMPACTO PRIMARIO	IMPACTO SECUNDARIO
FASE PRECONSTRUCTIVA		
Información a las autoridades locales y a la comunidad	Generación de expectativas	Conflictos Sociales
FASE CONSTRUCTIVA		
Localización y replanteo	Perdida de la cobertura vegetal	Desplazamiento de la fauna
Descapote y limpieza	Desmonte de alcantarillas y Box Culver	Modificación de las estructuras
	Generación de escombros	Incremento temporal de material particulado en el aire
		Aumento en los niveles de ruido
Excavación para adecuar estructuras	Generación de escombros	
	Perdida del suelo	Modificación de su estructura
Fundición en concreto reforzado de las obras de arte en la vía	Cambio en las características físicas del suelo	Aumento en los niveles de ruido
	Construcción de Box Culvert y muros de contención	
	Alteración del suelo y modificación	
instalación de estructura	Generación de residuos sólidos	Aumento en los niveles de ruido
FASE POST-CONSTRUCTIVA		
Terminación de la obra y recuperación del área	Alteración del suelo	
	Recuperación de la cobertura vegetal	
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN		
Mantenimiento y operación	Dinamización del transporte en cuanto a tiempo y seguridad vial..	Mejoramiento de la calidad de vida
	Mejoramiento de la infraestructura vial de la región	

MEDIDAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

Para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER" En el municipio de Arboledas, Departamento Norte de Santander, se recomienda las siguientes medidas de control y monitoreo ambiental:

- Deben tener contempladas medidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos que puedan producirse sobre el recurso hídrico, fauna ictíca, y el recurso suelo, medidas que deben soportarse en el informe de actividades que deben presentar, en el caso de secciones con presencia de agua corriente.

- Deben garantizar las medidas técnicas ambientales necesarias para que se garantice el libre recorrido de las aguas sobre los cauces, alternativa que se debe tener en la programación del proceso constructivo.

- Las actividades de movimiento de tierra, excavaciones y rellenos, al igual que la instalación de estructuras, producen desechos y residuos que deben ir a un depósito final, los sobrantes como son de suelos, de metales, residuos sólidos generados en la construcción, no se autoriza el retiro de material excavado o material depositado.

- Se debe realizar obras de protección en el cauce a intervenir de forma favorable a las actividades a desarrollar, obras que posterior a la construcción, deben ser retiradas y acondicionar el terreno en las más cercanas condiciones a las encontradas antes de la intervención

- Para la construcción de las obras a desarrollar, la empresa debe presentar los documentos que avalen la procedencia de los materiales a utilizar (material pétreo, de cantera o de arrastre).

- Como es el caso, si se va a utilizar y preparar algunas mezclas de concretos en el sitio de construcción, deben almacenar los productos como cemento, aditivos, inhibidores, acelerantes etc. bajo techo, o ser cubiertos totalmente con material plástico, para prevenir arrastre de los mismos hacia el cauce, recomendación que debe ser soportada con registro fotográficos dentro de los informes de Cumplimiento Ambiental ICA, a entregar previo desarrollo del 60% de las actividades de apertura y construcción del nuevo cauce a autorizar.

- Al preparar las mezclas en los sitios, deben aislar la mezcla del suelo para evitar contaminaciones al suelo y a las fuentes hídricas, aislamiento con bateas de madera o metálicas o material de plástico o cartones, al final de la obra no deben dejar residuos de mezclas en las áreas de influencia del proyecto.

- La preparación de mezclas requiere del uso de aguas, razón por la cual deben presentar el origen legal adjuntando en el informe de actividades, la Concesión de aguas que autorice su uso, información a incluir en los ICA.

- Los residuos de bolsas y empaques de los elementos utilizados en la actividad de preparación de mezclas deben ser almacenados en un lugar seco y trasladados a un relleno sanitario autorizado, o en su defecto devolverlos al proveedor.

- En caso de utilizar mezclas de plantas retiradas de la obra, a través de vehículos mixer, deben tener toda la infraestructura para evitar caída de mezclas a los cauces y de otras áreas que drenen a las vertientes que debe atravesar estos vehículos en la zona de construcción.

- En cualquiera de los casos, los materiales de origen pétreo a utilizar deben contar con los respectivos permisos de concesión minera y licencias ambientales, así sean suministrados o preparados en el sitio.

- En caso de ubicación o colocación de formaletas para impedir la caída de material o aditivos, estas deben ser retiradas al final de la obra y dejar en las mejores condiciones posibles el cauce, para lo cual, deben presentar registros fotográficos antes de la intervención y posterior a ella para que sean imágenes referentes al estado, información que deben relacionar en el informe de actividades ambientales ICA a presentar a la Corporación.

- Hay que considerar que el otorgamiento del permiso no será obstáculo para que con posterioridad se reglamente el uso del cuerpo de agua, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

- Se deben de disponer de recipientes para la recolección de residuos sólidos (puntos ecológicos) producto de la actividad humana durante la obra, para la recolección y posterior disposición final, información a incluir en los ICA.

- Se debe disponer de baños portátiles para uso de los trabajadores y visitantes de la obra, una batería sanitaria por cada 15 personas, la empresa que preste este servicio debe poseer los permisos de vertimientos respectivos, información a incluir en los ICA con registro fotográfico.

- El responsable de la ocupación de cauce debe informar a la Corporación sobre **el inicio de actividades.**

- La Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, debe cancelar a la Corporación por visita técnica de seguimiento ambiental, el valor que se establezca de acuerdo con Resolución No. 0136 del 28 de febrero de 2025 o el acto administrativo que la modifique, igualmente una visita de cierre por el mismo valor, visitas que se deben practicar para verificar las condiciones y cumplimiento de las recomendaciones dadas, mínimo una visita por la vigencia del permiso de Ocupación de cauces.

- El permisionario deberá presentar informe de actividades ambientales ICA del desarrollo del proyecto tomando como referencia de seguimiento las recomendaciones dadas por la Corporación y las resultantes durante el desarrollo, informe a entregar una vez cumplido el 60% de las obras programada, y un informe ICA final una vez cumplido el 100%.

- Estas obras o actividades no son sujetos a licenciamiento ambiental, según lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, artículo reglamentado en el Decreto 1900 de 2006, compilado en el capítulo 3 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y, posteriormente, modificado por los Decretos 2099 del 22 de diciembre de 2016, Decreto 075 del 20 de enero de 2017 y Decreto 1120 del 29 de junio de 2017, por lo tanto, no tienen obligación de la inversión forzosa de no menos del 1% por el uso del recurso hídrico.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Por la naturaleza del Permiso solicitado, no se debe imponer medidas de compensación ambiental para los permisos de Ocupación de Cauce, a otorgar a la Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156.

Independiente a lo enunciado, se procederá a la implementación de medidas ambientales inmediatas bajo la responsabilidad del solicitante en caso de detectarse intervenciones y afectaciones al medio ambiente no contempladas dentro del presente informe técnico.

RECOMENDACIONES

El Decreto 1076 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, en la sección sobre ocupación de playas, cauces y lechos señala en el Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. Basado en los principios anotados, y la información presentada a la Corporación más la obtenida en la visita técnica de evaluación de la solicitud, se considera necesario emitir el concepto favorable a la solicitud.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.10. Construcción de obras de defensa sin permiso. Cuando por causa de crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras de defensa sin permiso de la Autoridad Ambiental competente deberán darle aviso escrito dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter

provisional, cuidando de no causar daños a terceros y quedarán sujetas a su revisión o aprobación por parte dela Autoridad Ambiental competente.

(Decreto 1541 de 1978, art. 196).

Basado en los principios anotados, y la información presentada a la Corporación, más la obtenida en la visita técnica de evaluación de la solicitud, se analizaron las acciones, Obras y las recomendaciones dadas por la Corporación donde se manifiesta que, durante el desarrollo de las actividades, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

En caso de presentarse cambios en los diseños o ajustes en las áreas informadas, deben comunicarlo oportunamente por escrito a la Corporación.

Se autoriza labores de realización de obras hidráulicas y estructurales de reemplazo de Box Culvert, alcantarillas y construcción de muros de contención "MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER" En el municipio de Arboledas, Departamento Norte de Santander.

El manejo de los residuos sólidos es responsabilidad directa la Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, debiendo realizar el manejo clasificando en reciclables y no reciclables, información que se debe plasmar en los informes de actividades o de cumplimiento ambiental, detallando además el manejo dado y la disposición final de los mismos, anexando copia de las autorizaciones ambientales del receptor, información a incluir en los ICA con registro fotográfico.

El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las obras de doce (12) meses, debiendo presentar informe de avance de actividades ICA, terminado el 60% de las obras sobre los cauces autorizados, e informe final, para verificación del cumplimiento de las recomendaciones dadas.

Deben garantizar las medidas técnicas ambientales necesarias para que se garantice el libre recorrido de las aguas sobre el cauce a intervenir.

No se autoriza labores de rocería, ni tala de árboles sobre márgenes del cauce del sitio señalado en la corriente hídrica, sin contar con los permisos ambientales correspondientes.

Deben informar a la Corporación, en caso de resultar, sobre el sitio de disposición final de los residuos, sitio que debe ser del conocimiento de la Alcaldía municipal de Arboledas.

Para el seguimiento ambiental del sitio de las obras a realiza, deben presentar el Cronograma de actividades con fechas programadas reales indicando el responsable de cada una de ellas, cronograma a entregar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del permiso de ocupación de cauce, junto con la socialización a los propietarios del área de influencia directa.

El responsable de la ocupación de cauce debe informar a la Corporación sobre el inicio de actividades.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo señalado en el decreto 1076 de 2015 en sus artículos: **ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. *Ocupación*** La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.

Atendiendo los criterios técnicos de orden ambiental se considera que con la información presentada y la requerida, después de realizada la correspondiente visita de evaluación, y teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y que el área donde se solicita la ocupación de cauce, es indicada y ajustada

para adelantar las obras que se solicitan, por lo tanto, es viable autorizar los permiso de ocupación de cauce, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando, se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental, Autorización a la Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, para realizar obras hidráulicas y estructurales de reemplazo de Box Culvert, alcantarillas y construcción de muros de contención en las abscisas k0+000 al k0+745" del CONTRATO: LP-FC-38-2023. "MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER" En el municipio de Arboledas, Departamento Norte de Santander

COORDENADAS DE REFERENCIA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PERMISO						
LUGAR	Coordenadas Geográficas				Origen Nacional	
	Formato en grados, minutos y segundos (DMS)		Formato decimal (DD)			
	Norte	Oeste	Latitud	Longitud	Norte	Este
OBRA N° 1 K 0+255	7°38'32.1"N	72°48'10.4"W	7.642250	-72.802889	2402464.840	5021731.342
OBRA N° 2 K 0+290	7°38'31.1"N	72°48'09.7"W	7.641972	-72.802694	2402434.154	5021752.793
OBRA N° 3 K 0+370	7°38'28.8"N	72°48'08.5"W	7.641333	-72.802361	2402363.569	5021789.575
OBRA N° 4 K 0+540	7°38'24.2"N	72°48'06.7"W	7.640056	-72.801861	2402222.393	5021844.765
OBRA N° 5 K 0+746	7°38'21.4"N	72°47'59.9"W	7.639278	-72.799972	2402136.540	5022053.055
MURO 1 K0+264 a K0+314	7°38'31.9"N	72°48'10.2"W	7.642188	-72.802832	2402457.992	5021737.617
	7°38'30.5"N	72°48'09.3"W	7.641806	-72.802583	2402415.742	5021765.051
MURO 2 K0+386 a K0+458	7°38'28.2"N	72°48'08.4"W	7.641167	-72.802333	2402345.153	5021792.646
	7°38'26.1"N	72°48'08.0"W	7.640583	-72.802222	2402280.697	5021804.926

El responsable del proyecto, en este caso, Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, deberá responder por la ejecución de las obras físicas y ambientales contenidas en el presente informe.

Durante el desarrollo de las obras y una vez terminadas, no se permite verter materiales o desechos sobre los lecho y corrientes hídrica a intervenir, afluentes del rio pamplonita, los materiales deberán ser dispuestos en sitios previamente autorizados, actividad que debe ser informada y soportada con registros fotográficos dentro del informe de actividades ambientales ICA a presentar.

Se debe hacer instalación de señales preventivas que permitan la seguridad por las áreas de construcción y especialmente donde se emplee maquinaria pesada y depósito de materiales de excavación.

Para el inicio de actividades contempladas en el presente informe y permiso de ocupación de cauce, se debe contar con los respectivos permisos de intervención sobre predios de propiedad privada, deberán informar a la Corporación la Socialización del Acto Administrativo con evidencias fotográficas y registro de firmas soportada con registros fotográficos dentro del informe de actividades ambientales ICA a presentar.

Dentro del informe de cumplimiento ambiental ICA, se debe entregar registro fotográfico de todas las actividades ambientales contempladas en el permiso de ocupación de cauces a otorgar, igualmente el de la instalación de las vallas de prevención y las informativas.

Para conocimiento de la Comunidad, se deben instalar dos vallas informativas con dimensiones de 2,00 x 1,60 metros, una al inicio de la obra K0+000 otra al final de las obras K0+745.

Corponor

RESOLUCION No. XXXX-25
PERMISO DE OCUPACION, PLAYAS Y LECHOS

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT 901.740.307


PROYECTO: "TRAMO 4 - MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER"

ESTRUCTURA A CONSTRUIR: BOX CULVERT Y MUROS DE CONTENCION
FUENTE A INTERVENIR: QUEBRADA MONAR
LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE ARBOLEDAS ABSCISAS K0+000 AL K0+745 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VIGENCIA: DOCE (12) meses.

MENSAJE ALUSIVO A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE


REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA HIDRAULICA 1 - K 0+255
7°38'32.1"N 72°48'10.4"W

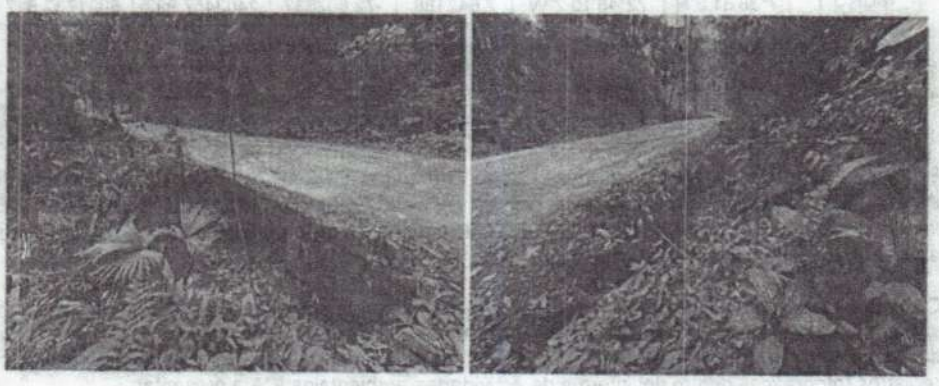

Reemplazar por construcción de Box Culvert 2.0*1.5m

OBRA HIDRAULICA 2 - K 0+290
7°38'31.1"N 72°48'09.7"W

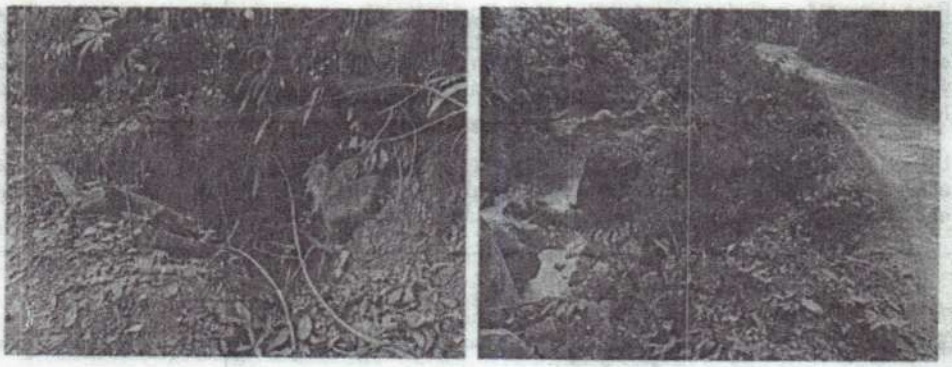


Suspendida a demoler


OBRA HIDRAULICA 3 - K 0+370
7°38'28.8"N 72°48'08.5"W



Existente a demoler y reemplazar por construcción de alcantarilla canal rectangular h:1.0 m x B=1.5m en concreto de 4000 psi y acero estructural


OBRA HIDRAULICA 4 - K 0+540
7°38'24.2"N 72°48'06.7"W

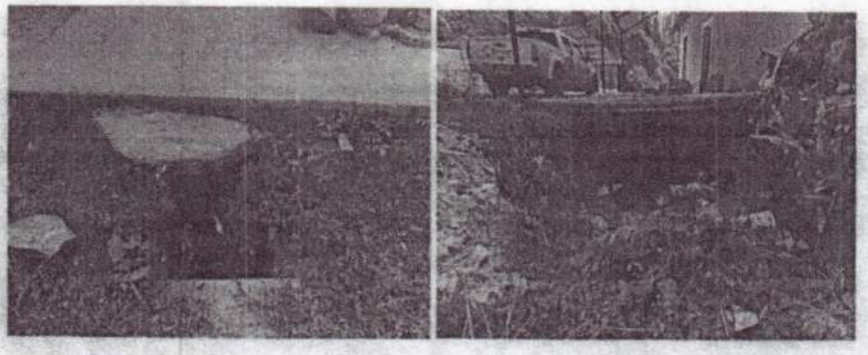

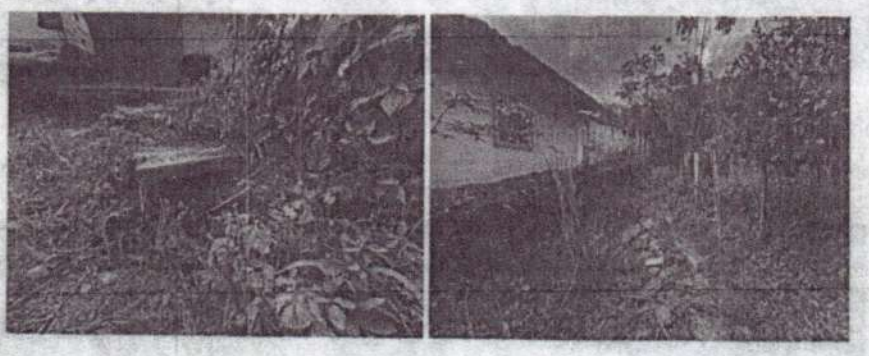

Existente a demoler y reemplazar por construcción de box Coulvert h:1.0 m x B=1.5m en concreto de 4000 psi y acero estructural.

OBRA HIDRAULICA 5 - K 0+746
7°38'21.4"N 72°47'59.9"W

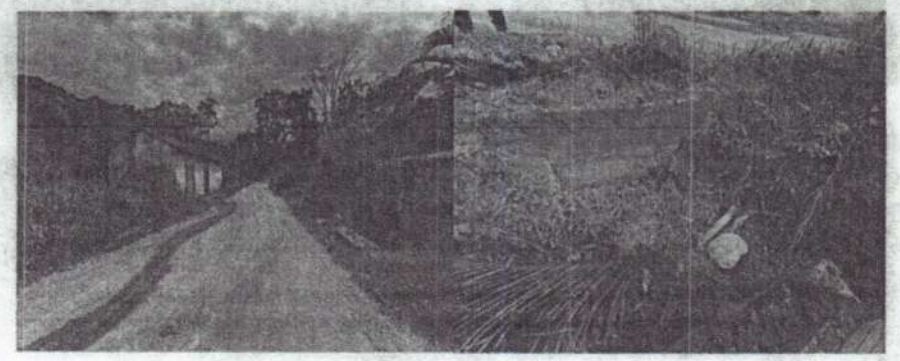

Existente a demoler y reemplazar por construcción de alcantarilla de tubería de 36 pulgadas con encole y descole en concreto de 4000 psi reforzado con acero estructural.

OBRA ESTRUCTURAL 1: K0+264 a K0+314



Construcción de un muro de contención en concreto reforzado con acero estructural de 50 metros de longitud

OBRA ESTRUCTURAL 2: K0+386 a K0+458



la construcción de un muro de contención en concreto reforzado con acero estructural de 70 metros de longitud

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauces, playas y lechos a favor de la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, para el proyecto, obra o actividad denominado; mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 corredor vial Cornejo- puente Gomez- Salazar- Arboledas- Cucutilla, En el municipio de Arboledas, Departamento Norte de Santander.

ARTÍCULO SEGUNDO: Vigencia se otorga un tiempo de doce (12) meses a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, prorrogables a solicitud del beneficiario, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario deberá cumplir con cada una de las recomendaciones u obligaciones consignadas en el informe técnico relacionado en el presente acto administrativo, so pena de las sanciones legales a las que hubiere lugar:

- Deben tener contempladas medidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos que puedan producirse sobre el recurso hídrico, fauna ictíca, y el recurso suelo, medidas que deben soportarse en el informe de actividades que deben presentar, en el caso de secciones con presencia de agua corriente.
- Deben garantizar las medidas técnicas ambientales necesarias para que se garantice el libre recorrido de las aguas sobre los cauces, alternativa que se debe tener en la programación del proceso constructivo.
- No se autoriza la extracción y/o comercialización de material de arrastre, No alterar las condiciones normales actuales del flujo del río.
- Las actividades de movimiento de tierra, excavaciones y rellenos, al igual que la instalación de estructuras, producen desechos y residuos que deben ir a un depósito final, los sobrantes como son de suelos, de metales, residuos sólidos generados en la construcción, no se autoriza el retiro de material excavado o material depositado.
- Se debe realizar obras de protección en el cauce a intervenir de forma favorable a las actividades a desarrollar, obras que posterior a la construcción, deben ser retiradas y acondicionar el terreno en las más cercanas condiciones a las encontradas antes de la intervención
- Para la construcción de las obras a desarrollar, la empresa debe presentar los documentos que avalen la procedencia de los materiales a utilizar (material pétreo, de cantera o de arrastre).
- Como es el caso, si se va a utilizar y preparar algunas mezclas de concretos en el sitio de construcción, deben almacenar los productos como cemento, aditivos, inhibidores, acelerantes etc. bajo techo, o ser cubiertos totalmente con material plástico, para prevenir arrastre de los mismos hacia el cauce, recomendación que debe ser soportada con registro fotográficos dentro de los informes de Cumplimiento Ambiental ICA, a entregar previo desarrollo del 60% de las actividades de apertura y construcción del nuevo cauce a autorizar.
- Al preparar las mezclas en los sitios, deben aislar la mezcla del suelo para evitar contaminaciones al suelo y a las fuentes hídricas, aislamiento con bateas de madera o metálicas o material de plástico o cartones, al final de la obra no deben dejar residuos de mezclas en las áreas de influencia del proyecto.
- La preparación de mezclas requiere del uso de aguas, razón por la cual deben presentar el origen legal adjuntando en el informe de actividades, la Concesión de aguas que autorice su uso, información a incluir en los ICA.

RESOLUCIÓN Nº 1216 ***DEL*** 28 DIC 2025

"Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones"

- Los residuos de bolsas y empaques de los elementos utilizados en la actividad de preparación de mezclas deben ser almacenados en un lugar seco y trasladados a un relleno sanitario autorizado, o en su defecto devolverlos al proveedor.

- En caso de utilizar mezclas de plantas retiradas de la obra, a través de vehículos mixer, deben tener toda la infraestructura para evitar caída de mezclas a los cauces y de otras áreas que drenen a las vertientes que debe atravesar estos vehículos en la zona de construcción.

- En cualquiera de los casos, los materiales de origen pétreo a utilizar deben contar con los respectivos permisos de concesión minera y licencias ambientales, así sean suministrados o preparados en el sitio.

- En caso de ubicación o colocación de formaletas para impedir la caída de material o aditivos, estas deben ser retiradas al final de la obra y dejar en las mejores condiciones posibles el cauce, para lo cual, deben presentar registros fotográficos antes de la intervención y posterior a ella para que sean imágenes referentes al estado, información que deben relacionar en el informe de actividades ambientales ICA a presentar a la Corporación.

- Hay que considerar que el otorgamiento del permiso no será obstáculo para que con posterioridad se reglamente el uso del cuerpo de agua, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

- Se deben de disponer de recipientes para la recolección de residuos sólidos (puntos ecológicos) producto de la actividad humana durante la obra, para la recolección y posterior disposición final, información a incluir en los ICA.

- Se debe disponer de baños portátiles para uso de los trabajadores y visitantes de la obra, una batería sanitaria por cada 15 personas, la empresa que preste este servicio debe poseer los permisos de vertimientos respectivos, información a incluir en los ICA con registro fotográfico.

- El responsable de la ocupación de cauce debe informar a la Corporación sobre **el inicio de actividades.**

- Como recomendación final se debe dar cumplimiento a los requisitos de recomendaciones contempladas en los diseños iniciales de las obras de rehabilitación y complementación.

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario del presente permiso debe cancelar a la Corporación dos visitas técnicas: una de seguimiento ambiental por el valor que se establezca de acuerdo a la resolución N° 136 del 28 de febrero del 2025, o el acto administrativo que la modifique, por seguimiento del permiso de ocupación de cauces y una visita de cierre por el mismo valor, que se debe practicar para verificar las condiciones y cumplimiento de las recomendaciones dadas.

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones, o exigencias contempladas en la presente resolución, dará lugar a la revocatoria o a la suspensión del permiso de ocupación de cauce, mediante acto administrativo motivado y así mismo se enviará el expediente a la dependencia correspondiente a efectos de iniciar el respectivo proceso sancionatorio ambiental de acuerdo lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o aquella la modifique, adicione o sustituya.

PARÁGRAFO PRIMERO. El beneficiario del presente permiso, asume toda la responsabilidad por los perjuicios derivados por el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones señaladas en la presente resolución.

PARÁGRAFO SEGUNDO. CORPONOR no se hará responsable de los daños que se causan a terceros por el desarrollo de la actividad. Estas responsabilidades pertenecen única y exclusivamente al beneficiario del presente permiso. De la misma forma será también responsable de los daños o afectaciones no previstos y no considerados en este concepto.

RESOLUCIÓN N° 1216 DEL 26 DIC 2025

"Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, o persona autorizada, al correo electrónico proporcionado en la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo procederá a realizarse la correspondiente publicación en el Boletín Ambiental de la página web de CORPONOR, de conformidad con lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante la Dirección General, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL HUMBERTO CAMACHO CARRILLO

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó:	Susana Andrea Castañeda Zabala	Subdirectora Jurídica	
Elaboro:	Estefania Hincapie Uribe	Profesional - Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Corponor **CORPONOR**

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Hoy 26 de Diciembre de 20 25

se notificó personalmente a Miguel Dan Jenssen Duran Páez de la Resolución 1216/2025

que antecede enterado(a) de su contenido firma.

El Notificado

C.C No. 1090473156 Tarjeta Profesional No.

El Funcionario

165

Republica de Colombia

Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

NIT. 890505253-4

Referencia:	29942

Señores:	CONSORCIO VIA CENTRO		
Dirigido a:	CONSORCIO VIA CENTRO		
NIT:	901740307		
Dirección:	Calle 10 #5-50, centro agrobancario, local 27		
Teléfono:	6075729321	**Fax:**	
Correo:	CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM		
Ciudad:	CUCUTA	**Departamento:**	NortedeSantander
Cuenta:			

COD REF.	REFERENCIA	CANT	VAL. UNITARIO	DESCUENTO	VAL. TOTAL
320338301	Evaluación Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos para la Construcción de Alcantarillas, Bateas y Box Coulvert, Pontones y Puentes	1	$ 5.849.740	$ 0	$ 5.849.740

TOTAL : **$ 5.849.740 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE)**

Observaciones: EXPEDIENTE 36800 OCUPACIÓN DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS

CORPONOR			
Referencia de Pago			
Referencia:	29942		
Información Usuario			
Nit:	901740307		
Nombre:	CONSORCIO VIA CENTRO		
Dirección:	Calle 10 #5-50, centro agrobancario, local 27	**Tel:**	6075729321
Puntos de Pago			
Recuerda imprimir este recibo únicamente en impresora láser para poder realizar el pago correctamente a la cuenta BANCOLOMBIA Ahorros N° 61740884137 con número de convenio 37361. Enviar copia del comprobante al correo bescalante@corponor.gov.co informando el número del expediente que cancela.			
SON:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		

(415)7709998083851(8020)000029942(3900)0005849740(96)20251121

FACTURA PAGADA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañia: CONSORCIO VIA CENTRO

NIT Compañia: 0901740307

Fecha Actual: Martes, 21 de octubre de 2025 - 14:20 PM

Número de cuenta:	617-408841-37	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CORPONOR	Documento:	000000890505253
Valor:	5.849.740,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	21 de Octubre de 2025		

Powered by CamScanner

166

Corponor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL –CORPONOR

Resolución No. 095 de 13 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las concedidas en la Constitución Política de 1991, en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y

CONSIDERANDO

Que, el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que, el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Que, "es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."

Que, el artículo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..."

Que, la Ley 99 de 1993 establece: que: "Corresponde a la Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo a las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente".

Que, así mismo, la Ley 99 de 1993 dispuso en su artículo 31 las funciones de la Corporación, entre las cuales se encuentra; ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo a las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, de igual forma, el artículo en mención, señala como otra función de la Corporación; otorgar permisos requeridos por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que, el Decreto – Ley 2811 de 1974 determina en su artículo 102, que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Que, por su parte, el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, dispone que para la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.

Que, según el artículo 31 numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, de acuerdo el numeral 12 del artículo 31 ibidem, establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

ANTECEDENTES

Que mediante documentación con radicado de NEPTUNO 37123, el día 28 de enero de 2026 y radicada por SIEP mediante radicado No. 2026-01015-004148-2 con fecha 17 de febrero de 2026, la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURÁN PÁEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, solicita ante CORPONOR, un permiso de ocupación de cauce para el proyecto, obra o actividad denominado; LP-FC-038-2023 *"MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA. INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS TRAMO 1: K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 2. K12+200-K12+600 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 3: K21+900-K22+900 TRAMO 4: ARBOLEDAS-SALAZAR, K0+000-K0+700 ARBOLEDAS-CUCUTILLA, Y TRAMO 5: K2+000-K3+300 CUCUTILLA-ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER"*. Enfocado en ejecutar doce (12) obras hidráulicas localizadas entre las abscisas K2+000 y K3+295, en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander

Que la información y/o documentación allegada cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por lo cual, la Subdirección Jurídica procederá a decretar el inicio del trámite correspondiente en virtud de la delegación establecida en la Resolución interna de CORPONOR con número 0428 del cuatro (04) de abril de 2019.

Que, se evidencia la entrega de la siguiente documentación: Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos, mapa de localización, memorias de cálculo, documento de conformación de consorcio, Sabana predial, copia de Contrato de Obra LP-FC-38-2023, cedula de representante legal, descripción de obras hidráulicas, declaración de proyecto y el pago de la factura OC-111106 Referencia: 30390.

Que, el 18 de febrero de 2026, la subdirección de jurídica emite auto de inicio "Por medio de la cual se da inicio a un trámite para la obtención de un permiso de Ocupación de Cauce y se dictan otras disposiciones" a nombre de la la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURÁN PÁEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156.

Que, el día 18 de febrero de 2026, la subdirección de jurídica envía expediente a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible mediante plataforma NEPTUNO

Que, el 18 de febrero de 2026, la subdirectora de desarrollo sectorial sostenible Mileydi Davila Jiménez, bajo memorando No. 2000.49.14.107, delega la visita de evaluación al trámite con radicado. 2026-01015-004148-2, y NEPTUNO 37123.

Que, se practica visita técnica de evaluación ambiental el día 20 de febrero de 2026, al permiso de ocupación de cauce NEPTUNO 37123.

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad la obtención del Permiso de Ocupación de Cauce ante la Autoridad Ambiental competente, con el propósito de ejecutar doce (12) obras hidráulicas localizadas entre las abscisas K2+000 y K3+295, en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander, las cuales se describen a continuación.

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 1	Alcantarilla	K 2+080	Existente	proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"	Drenaje NN1	SI
OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 2	Box Culvert	K 2+180	Existente	proyectar box culvert 4m X 4.5m	Quebrada Guayabal	SI

Resolución N° 095 de 13 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

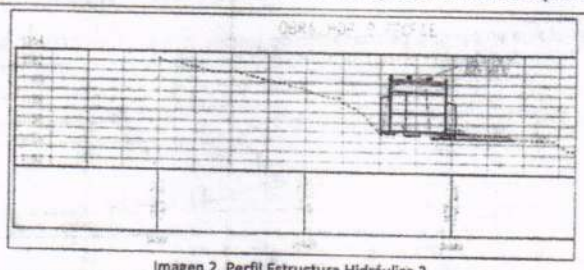


Imagen 2. Perfil Estructura Hidráulica 2

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 4	Alcantarilla	K 2+326	Existente	proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"	Drenaje NN4	SI

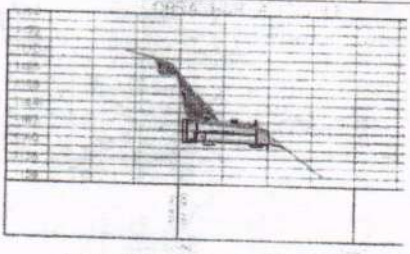


Imagen 3. Perfil Estructura Hidráulica 4

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 5	Alcantarilla	K 2+449	Existente	proyectar alcantarilla aleta – aleta, 36"	Drenaje NN5	SI

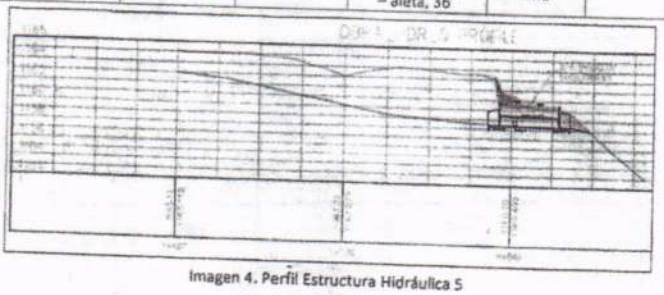


Imagen 4. Perfil Estructura Hidráulica 5

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 6	Box Culvert	K 2+584	Existente	proyectar box culvert 4m X 3m	Drenaje NN6	SI

Resolución N° 095 "de 13 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

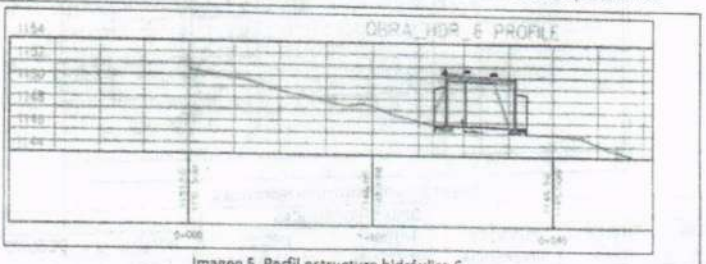


Imagen 5. Perfil estructura hidráulica 6

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 7	Alcantarilla	K 2+659	Existente	proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"	Drenaje NN7	SI

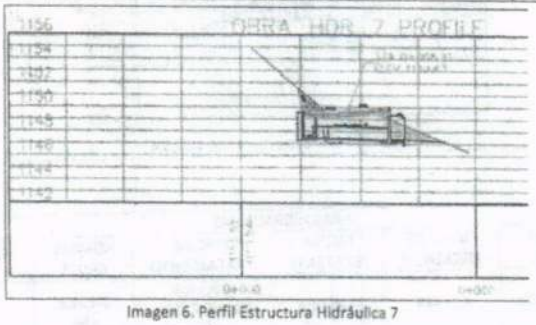


Imagen 6. Perfil Estructura Hidráulica 7

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 8	Alcantarilla	K 2+696	Existente	proyectar alcantarilla aleta – aleta, 36"	Drenaje NN8	SI



Imagen 7. Perfil Estructura Hidráulica 8

Resolución N° 095 de 03 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 9	Alcantarilla	K 2+810	Existente	proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"	Drenaje NN9	SI

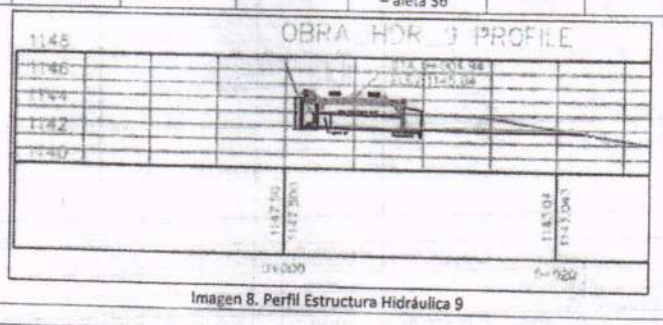


Imagen 8. Perfil Estructura Hidráulica 9

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 10	Alcantarilla	K 3+075	Existente	proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"	Drenaje NN10	SI



Imagen 9. Perfil Estructura Hidráulica 10

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 11	Alcantarilla	K 3+210	Existente	proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"	Drenaje NN11	SI

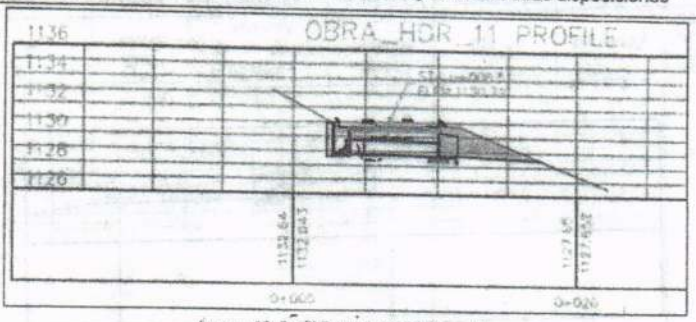


Imagen 10. Perfil Estructura Hidráulica 11

OBRAS HIDRAULICAS						
OBRA	TIPO DE OBRA	PUNTO DE REFERENCIA	NUEVA /EXISTENTE	TIPO DE TRATAMIENTO	NOMBRE CAUCE	OC SI/NO
OBRA N° 12	Alcantarilla	K 3+260	Existente	proyectar pontón	Drenaje NN12	SI

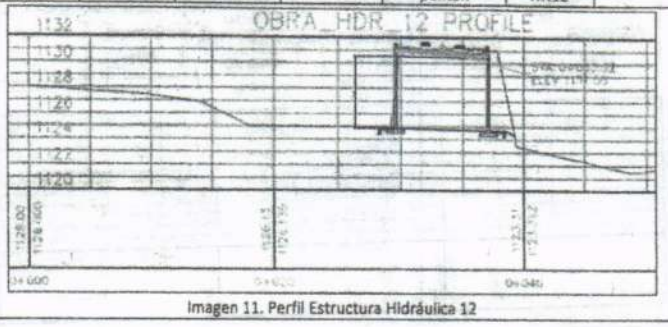


Imagen 11. Perfil Estructura Hidráulica 12

UBICACIÓN Y CARTOGRAFIA

El permiso de ocupación de cauce solicitado se localiza en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander, en las abscisas K2+000 y K3+300, Longitud del tramo 1 kilómetro 300 metros.
Las actividades se desarrollan en las siguientes coordenadas geográficas:

1. Obra No. 1: Alcantarilla K 2+080 – Fuente hídrica Drenaje NN1 – Coordenada: 7°33'33.5"N 72°46'21.8"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"
2. Obra No. 2: Box Culvert K 2+180 – Fuente hídrica Quebrada Guayabal – Coordenada: 7°33'36.6"N 72°46'23.1"W - Tipo De Tratamiento: proyectar box culvert 4m X 4.5m
3. Obra No. 3: Alcantarilla K 2+307– Fuente hídrica Drenaje NN3 – Coordenada: 7°33'39.9"N 72°46'25.0"W - Tipo De Tratamiento: suspender y demoler
4. Obra No. 4: Alcantarilla K 2+326– Fuente hídrica Drenaje NN4 – Coordenada: 7°33'40.6"N 72°46'25.2"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"
5. Obra No. 5: Alcantarilla K 2+449 – Fuente hídrica Drenaje NN5– Coordenada: 7°33'44.3"N 72°46'25.5"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla aleta – aleta, 36"
6. Obra No. 6: Box Culvert K K 2+584 – Fuente hídrica Drenaje NN6– Coordenada: 7°33'47.9"N 72°46'26.3"W - Tipo De Tratamiento: proyectar box culvert 4m X 3m
7. Obra No. 7: Alcantarilla K 2+659 – Fuente hídrica Drenaje NN7– Coordenada: 7°33'50.3"N 72°46'26.0"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"
8. Obra No. 8: Alcantarilla K 2+696 – Fuente hídrica Drenaje NN8– Coordenada: 7°33'51.3"N 72°46'26.2"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla aleta – aleta, 36"
9. Obra No. 9: Alcantarilla K 2+810 – Fuente hídrica Drenaje NN9– Coordenada: 7°33'55.1"N 72°46'25.6"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla cajón – aleta 36"

10. Obra No. 10: Alcantarilla K 3+075– Fuente hídrica Drenaje NN10– Coordenada: 7°34'02.5"N 72°46'21.3"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla cajón – aleta 36°
11. Obra No. 11: Alcantarilla K 3+210 – Fuente hídrica Drenaje NN11– Coordenada: 7°34'06.4"N 72°46'20.3"W - Tipo De Tratamiento: proyectar alcantarilla cajón – aleta 36°
12. Obra No. 12: Alcantarilla K 3+260 – Fuente hídrica Drenaje NN12– Coordenada: 7°34'08.1"N 72°46'20.5"W - Tipo De Tratamiento: proyectar pontón

EQUIPOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR

Para la ejecución de las obras hidráulicas contempladas en el Permiso de Ocupación de Cauce, ubicado en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander, entre las abscisas K2+000 y K3+300, se contará principalmente con retroexcavadora sobre orugas, destinada a la excavación estructural, conformación de taludes, adecuación de fundaciones y retiro de estructuras existentes.

De manera complementaria, se emplearán volquetas doble troque para el transporte de material excavado y el suministro de material granular proveniente de fuentes autorizadas, requerido para rellenos y conformación de estructuras como alcantarillas tipo cajón, box coulvert y pontón.

Asimismo, se utilizarán equipos menores y formaletas para la construcción de las estructuras en concreto reforzado.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

En resumen, de la información presentada resultante de los estudios y diseños, se observa algunas de las etapas del proceso constructivo:

- Replanteo topográfico y demarcación del área de intervención.
- Desvío provisional del cauce o manejo temporal de aguas mediante canales, según se requiera.
- Excavación estructural y conformación de la subrasante para la cimentación de las alcantarillas y el pontón.
- Construcción de la cimentación (losa de fondo o zapata), instalación de acero de refuerzo, formaletería y vaciado de concreto estructural para muros, losas superiores y aletas en el caso de box coulvert y alcantarillas tipo cajón.
- Montaje de la superestructura del pontón, incluyendo estribos, losa y elementos de apoyo estructural.
- Relleno lateral con material seleccionado, compactación por capas y conformación de taludes.
- Construcción de obras complementarias de protección y disipación de energía, según diseño.
- Limpieza final y adecuación del área intervenida.

Estas actividades pueden generar residuos de excavación y demolición, material sobrante, emisiones de polvo y ruido por operación de maquinaria, así como residuos menores asociados al proceso constructivo; por lo tanto, se implementarán las respectivas medidas de manejo ambiental durante toda la ejecución de las obras.

MEDIDAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

Para la ejecución del proyecto "LP-FC-038-2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS TRAMO 1: K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 2: K12+200-K12+600 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 3: K21+900-K22+900 TRAMO 4: ARBOLEDAS-SALAZAR, K0+000-K0+700 ARBOLEDAS-CUCUTILLA, Y TRAMO 5: K2+000-K3+300 CUCUTILLA-ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER" Enfocado en ejecutar doce (12) obras hidráulicas localizadas entre las abscisas K2+000 y K3+295, en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander, se recomienda las siguientes medidas de control y monitoreo ambiental:

- Deben tener contempladas medidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos que puedan producirse sobre el recurso hídrico, fauna ictica, y el recurso suelo, medidas que deben soportarse en el informe de actividades que deben presentar, en el caso de secciones con presencia de agua corriente.

- Deben garantizar las medidas técnicas ambientales necesarias para que se garantice el libre recorrido de las aguas sobre los cauces, alternativa que se debe tener en la programación del proceso constructivo.

- Las actividades de movimiento de tierra, excavaciones, rellenos e instalación de estructuras generan residuos de construcción y demolición (RCD). Los materiales sobrantes producto de las excavaciones, así como residuos de suelos, metales y demás residuos sólidos derivados del proceso constructivo, deberán ser transportados y dispuestos exclusivamente en sitios de disposición final debidamente autorizados por la autoridad competente, quedando prohibida su descarga, acopio o vertimiento en el cauce, rondas hídricas o áreas no autorizadas.

Resolución N° 095 de 13 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

- Para la construcción de las obras a desarrollar, la empresa debe presentar los documentos que avalen la procedencia de los materiales a utilizar (material pétreo, de cantera o de arrastre).

- Como es el caso, si se va a utilizar y preparar algunas mezclas de concretos en el sitio de construcción, deben almacenar los productos como cemento, aditivos, inhibidores, acelerantes etc. bajo techo, o ser cubiertos totalmente con material plástico, para prevenir arrastre de los mismos hacia el cauce, recomendación que debe ser soportada con registro fotográficos dentro de los informes de Cumplimiento Ambiental ICA, a entregar previo desarrollo del 60% de las actividades de apertura y construcción del nuevo cauce a autorizar.

- Al preparar las mezclas en los sitios, deben aislar la mezcla del suelo para evitar contaminaciones al suelo y a las fuentes hídricas, aislamiento con bateas de madera o metálicas o material de plástico o cartones, al final de la obra no deben dejar residuos de mezclas en las áreas de influencia del proyecto.

- La preparación de mezclas requiere del uso de aguas, razón por la cual deben presentar el origen legal adjuntando en el informe de actividades, la Concesión de aguas que autorice su uso, información a incluir en los ICA.

- Los residuos de bolsas y empaques de los elementos utilizados en la actividad de preparación de mezclas, deben ser almacenados en un lugar seco y trasladados a un relleno sanitario autorizado, o en su defecto devolverlos al proveedor.

- En caso de ubicación o colocación de formaletas para impedir la caída de material o aditivos, estas deben ser retiradas al final de la obra y dejar en las mejores condiciones posibles el cauce, para lo cual, deben presentar registros fotográficos antes de la intervención y posterior a ella para que sean imágenes referentes al estado, información que deben relacionar en el informe de actividades ambientales ICA a presentar a la Corporación.

- Hay que considerar que el otorgamiento del permiso no será obstáculo para que con posterioridad se reglamente el uso del cuerpo de agua, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

- Se deben de disponer de recipientes para la recolección de residuos sólidos (puntos ecológicos) producto de la actividad humana durante la obra, para la recolección y posterior disposición final, información a incluir en los ICA.

- Se debe disponer de baños portátiles para uso de los trabajadores y visitantes de la obra, una batería sanitaria por cada 15 personas, la empresa que preste este servicio debe poseer los permisos de vertimientos respectivos, información a incluir en los ICA con registro fotográfico.

- El responsable de la ocupación de cauce debe informar a la Corporación sobre el inicio de actividades.

- La Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURÁN PÁEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, debe cancelar a la Corporación por visita técnica de seguimiento ambiental, el valor que se establezca de acuerdo a Resolución No. 0049 del 30 de enero de 2026 o el acto administrativo que la modifique, igualmente una visita de cierre por el mismo valor, visitas que se deben practicar para verificar las condiciones y cumplimiento de las recomendaciones dadas, mínimo una visita por la vigencia del permiso de Ocupación de cauces.

- El permisionario deberá presentar informe de actividades ambientales ICA del desarrollo del proyecto tomando como referencia de seguimiento las recomendaciones dadas por la Corporación y las resultantes durante el desarrollo, informe a entregar una vez cumplido el 60% de las obras programada, y un informe ICA final una vez cumplido el 100%.

Estas obras o actividades no son sujetos a licenciamiento ambiental, según lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, artículo reglamentado en el Decreto 1900 de 2006, compilado en el capítulo 3 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y, posteriormente, modificado por los Decretos 2099 del 22 de diciembre de 2016, Decreto 075 del 20 de enero de 2017 y Decreto 1120 del 29 de junio de 2017, por lo tanto, no tienen obligación de la inversión forzosa de no menos del 1% por el uso del recurso hídrico.

Resolución N° 095 de 03 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Por la naturaleza del Permiso solicitado, no se debe imponer medidas de compensación ambiental para los permisos de Ocupación de Cauce, a otorgar a la CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURÁN PÁEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156. Independiente a lo enunciado, se procederá a la implementación de medidas ambientales inmediatas bajo la responsabilidad del solicitante en caso de detectarse intervenciones y afectaciones al medio ambiente no contempladas dentro del presente informe técnico.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo señalado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 Código de los Recursos Naturales, y los artículos 30 y 104 del Decreto 1541 de 1978, la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de aguas requiere autorización para su ejecución, la cual se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental competente, igualmente se requiere de permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas, Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.3.2.2.2. y artículo 2.2.3.2.12.1 Ocupación.

De conformidad con el Decreto 2811 de 1974 Articulo 42 del Dominio de Los Recursos Naturales Renovables. *Artículo 42°.- Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. "...*

En relación con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales se establece en el Artículo 9°.-*"El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:*

a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes;

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público;

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación."

Basado en los principios anotados, y la información presentada a la Corporación, más la obtenida en la visita técnica de evaluación de la solicitud, se analizaron las acciones, Obras y las recomendaciones dadas por la Corporación donde se manifiesta que, durante el desarrollo de las actividades, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

En caso de presentarse cambios en los diseños o ajustes en las áreas informadas, deben comunicarlo oportunamente por escrito a la Corporación.

Se autoriza la ocupación del cauce para realizar las 12 obras hidráulicas propuestas y antes mencionadas en este informe.

El manejo de los residuos sólidos es responsabilidad directa la CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURÁN PÁEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, debiendo realizar el manejo clasificando en reciclables y no reciclables, información que se debe plasmar en los informes de actividades o de cumplimiento ambiental, detallando además el manejo

dado y la disposición final de los mismos, anexando copia de las autorizaciones ambientales del receptor, información a incluir en los ICA con registro fotográfico.
El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las obras de doce (12) meses, debiendo presentar informe de avance de actividades ICA, terminado el 60% de las obras sobre los cauces autorizados, e informe final, para verificación del cumplimiento de las recomendaciones dadas.

Deben garantizar las medidas técnicas ambientales necesarias para que se garantice el libre recorrido de las aguas sobre el cauce a intervenir.

No se autoriza labores de rocería, ni tala de árboles sobre márgenes del cauce del sitio señalado en la corriente hídrica, sin contar con los permisos ambientales correspondientes.

Deben informar a la Corporación, en caso de resultar, sobre el sitio de disposición final de los residuos de corte, sitio que debe ser del conocimiento de la Alcaldía municipal de Cucutilla.

Para el seguimiento ambiental del sitio de las obras a realiza, deben presentar el Cronograma de actividades con fechas programadas reales indicando el responsable de cada una de ellas, cronograma a entregar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del permiso de ocupación de cauce, junto con la socialización a los propietarios del área de influencia directa.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo señalado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 Código de los Recursos Naturales, y el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de aguas requiere autorización para su ejecución, la cual se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental competente.

Atendiendo los criterios técnicos de orden ambiental se considera que con la información presentada y la requerida, después de realizada la correspondiente visita de evaluación, y teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y que el área donde se solicita la ocupación de cauce, es indicada y ajustada para adelantar las obras que se solicitan, por lo tanto, es viable autorizar los permiso de ocupación de cauce, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando, se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental, Autorización a la Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9, representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURÁN PÁEZ, identificado con C.C. No. 1.090.473.156, para la ejecución de doce (12) obras hidráulicas localizadas entre las abscisas K2+000 y K3+300, en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander.

El responsable del proyecto, en este caso, Empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307, deberá responder por la ejecución de las obras físicas y ambientales contenidas en el presente informe.

Durante el desarrollo de las obras y una vez terminadas, no se permite verter materiales o desechos sobre los lecho y corrientes hídrica a intervenir o afluentes, los materiales deberán ser dispuestos en sitios previamente autorizados, actividad que debe ser informada y soportada con registros fotográficos dentro del informe de actividades ambientales ICA a presentar.

Se debe hacer instalación de señales preventivas que permitan la seguridad por las áreas de construcción y especialmente donde se emplee maquinaria pesada y depósito de materiales de excavación.

Para el inicio de actividades contempladas en el presente informe y permiso de ocupación de cauce, se debe contar con los respectivos permisos de intervención sobre predios de propiedad privada, deberán informar a la Corporación la Socialización del Acto Administrativo con evidencias fotográficas y registro de firmas soportada con registros fotográficos dentro del informe de actividades ambientales ICA a presentar.

Dentro del informe de cumplimiento ambiental ICA, se debe entregar registro fotográfico de todas las actividades ambientales contempladas en el permiso de ocupación de cauces a otorgar, igualmente el de la instalación de las vallas de prevención y las informativas.

Para conocimiento de la Comunidad, se deben instalar una valla informativa con dimensiones de 2,00 x 1,60 metros.

Imagen 13. Ejemplo Valla informativa.

Resolución Nº 095 de 03 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

Corponor	RESOLUCION No. XXXX-26 PERMISO DE OCUPACION, PLAYAS Y LECHOS	CONSORCIO VIA CENTRO NIT 901.740.307

PROYECTO: "LP-FC-033-2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS TRAMO 1: K4+000-K5+000 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 2: K12+200-K12+600 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 3: K21+900-K22+900 TRAMO 4: ARBOLEDAS-SALAZAR, K0+000-K0+700 ARBOLEDAS-CUCUTILLA, Y TRAMO 5: K2+000-K3+300 CUCUTILLA-ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER".

ESTRUCTURA A CONSTRUIR:	OBRAS HIDRAULICAS – BOX CULVERT, ALCANTARILLAS
FUENTE A INTERVENIR:	DRENAJES Y QUEBRADA GUAYABAL
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE CUCUTILLA – TRAMO 5 - K2+000 y K3+300
VIGENCIA:	DOCE (12) meses.

MENSAJE ALUSIVO A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Fuente: Corponor. 2026

Que,al término del sesenta (60) por ciento del avance de las obras programadas, el solicitante deberá presentar los informes de cumplimiento ambiental para el respectivo seguimiento.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el permiso de ocupación de cauce, solicitado mediante radicado No. mediante radicado No. 2026-01015-004148-2 con fecha 17 de febrero de 2026, a nombre de la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9, para el proyecto, obra o actividad denominado; *"MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS TRAMO 1: K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 2: K12+200-K12+600 CORNEJO-SANTIAGO, TRAMO 3: K21+900-K22+900 TRAMO 4: ARBOLEDAS-SALAZAR, K0+000-K0+700 ARBOLEDAS-CUCUTILLA, Y TRAMO 5: K2+000-K3+300 CUCUTILLA-ARBOLEDAS,* enfocado en ejecutar doce (12) obras hidráulicas localizadas entre las abscisas K2+000 y K3+295, en jurisdicción del municipio de Cucutilla, departamento de Norte de Santander.

PARAGRAFO UNICO: El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las obras de doce (12) meses, debiendo presentar informe de avance de actividades ICA, terminado el 60% de las obras sobre los cauces autorizados, e informe final, para verificación del cumplimiento de las recomendaciones dadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario deberá cumplir con cada una de las recomendaciones consignadas en el informe técnico relacionado en el presente acto administrativo, so pena de las sanciones legales a las que hubiere lugar. El concepto técnico.

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso debe hacer instalación de señales preventivas que permitan la seguridad por las áreas de construcción. Igualmente, una valla que permita informar a la comunidad sobre lo autorizado por la Corporación como intervención de cauces, incluido un mensaje de protección a la naturaleza. La valla debe estar ubicada en un lugar visible en el sitio de la ocupación de cauce.

Igualmente, la valla debe informar sobre el número y fecha del acto administrativo por el cual se otorga permiso temporal de ocupación de cauce, playas y lechos y se dictan otras disposiciones, el tipo de obra, vigencia del permiso, mensaje ecológico, valla que debe contener en sus extremos superiores el logo de la Corporación y el del beneficiario, es decir, CONSORCIO VIA CENTRO, con NIT 901.740.307-9. La valla a instalar deben tener como mínimo las medidas de 1,20 x 2,00 metros.

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario del presente permiso debe cancelar a la Corporación por visita técnica de seguimiento ambiental, el valor que se establezca de acuerdo a la Resolución 049 del 30 de enero de 2026 o la que la modifique o actualice, Igualmente, una visita de cierre por el mismo valor, visitas que se deben practicar para verificar las condiciones y cumplimiento de las recomendaciones dadas, mínimo una visita por año o las que se consideren necesarias para el cumplimiento del acto administrativo inicial.

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones, o exigencias contempladas en la presente resolución, dará lugar a la revocatoria o a la suspensión del permiso de ocupación de cauce, mediante acto administrativo motivado y así mismo se enviará el expediente a la dependencia correspondiente a efectos de iniciar el respectivo proceso sancionatorio ambiental de acuerdo lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y su modificatoria la Ley 2387 de 2024 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Resolución N° 095 de 03 MAR 2026

"Por la cual otorga un permiso de ocupación de cauces a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con NIT 901.740.307-9 y se dictan otras disposiciones"

PARÁGRAFO PRIMERO. El beneficiario del presente permiso, asume toda la responsabilidad por los perjuicios derivados por el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones señaladas en la presente resolución.

PARÁGRAFO SEGUNDO. CORPONOR no se hará responsable de los daños que se causan a terceros por el desarrollo de la actividad. Estas responsabilidades pertenecen única y exclusivamente al beneficiario del presente permiso. De la misma forma será también responsable de los daños o afectaciones no previstos y no considerados en este concepto.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con el NIT No. 901.740.307-9, al correo: consorcioviacentro@gmail.com, o a quien se encuentre debidamente autorizado en los términos establecidos en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo procederá a realizarse la correspondiente publicación en el Boletín Ambiental de la página web de CORPONOR, de conformidad con lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante la Dirección General, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL HUMBERTO CAMACHO CARRILLO

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó:	Susana Andrea Castañeda Zabala	Subdirectora Jurídica	
Elaboró	Juan Carlos Martinez Santana	Profesional Universitario	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

CORPONOR

Corponor

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Hoy 04 de 4/2026 de 20 26

se notificó personalmente a Miguel Dan Jensen Pardo Paez de la Resol. 095/2026

que antecede enterado(s) de su contenido firma(s)

El Notificado

CC No. 16071356 Tarjeta Profesional No.

El Funcionario

172

Republica de Colombia

Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

NIT. 890505253-4

Referencia:	30390

Señores:	CONSORCIO VIA CENTRO		
Dirigido a:	CONSORCIO VIA CENTRO		
NIT:	901740307		
Dirección:	CL 10 0E 94 OF4 120 CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA		
Teléfono:	3202358957	**Fax:**	
Correo:	CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM		
Ciudad:	CUCUTA	**Departamento:**	NortedeSantander
Cuenta:			

COD REF.	REFERENCIA	CANT	VAL. UNITARIO	DESCUENTO	VAL. TOTAL
320338301	Evaluación Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos para la Construcción de Alcantarillas, Bateas y Box Coulvert, Pontones y Puentes	1	$ 5.849.740	$ 0	$ 5.849.740

TOTAL : **$ 5.849.740 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE)**

Observaciones: EXPEDIENTE 37123 OCUPACIÓN DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS

CORPONOR			
Referencia de Pago			
Referencia:	30390		
Información Usuario			
Nit:	901740307		
Nombre:	CONSORCIO VIA CENTRO		
Dirección:	CL 10 0E 94 OF4 120 CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA	**Tel:**	3202358957
Puntos de Pago			
Recuerda imprimir este recibo únicamente en impresora láser para poder realizar el pago correctamente a la cuenta BANCOLOMBIA Ahorros N° 61740884137 con número de convenio 37361. Enviar copia del comprobante al correo bescalante@corponor.gov.co informando el número del expediente que cancela.			
SON:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		

(415)7709998083851(8020)000030390(3900)0005849740(96)20260228

FACTURA PAGADA

Corponor

Republica de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Corporacion Autonoma Regional de la Frontera Nororiental

No Contribuyentes de Renta Según Art 22 Estatuto Tributario / REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OC-111106
FECHA: 29/01/2026
FORMA PAGO : CONTADO
FEC. VENCE: 29/01/2026

Datos del Emisor		Adquiriente	
Razón social/Nombre:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR	**Razón social/Nombre:**	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT:	890505253-4	**NIT:**	901740307
Dirección:	Calle 13 No. 3E-278, Barrio Caobos	**Dirección:**	CALLE 10 N° 5-50 CENTRO AGROBANCARIO, LOCAL 27
Teléfonos:	5748868	**Teléfonos:**	6075729321
		Email:	consorcioviacentro@gmail.com

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	% IVA	Vr. Total
1	320338301	Evaluacion Permiso de ocupacion de cauces, playas y lechos para la construccion de alcantarillas, bateas y box coulvert, pontones y puentes.	1.00	unidad	5,849,740.00	0.00	5,849,740.00
		Obs:EXPEDIENTE 37123 OCUPACIÓN DE CAUCES, PLAYA Y LECHOS. REFERENCIA 30390.					

Código	Descripción	Vr. Total

Total base:	5,849,740.00
IVA:	0.00
SubTotal	5,849,740.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
TOTAL:	5,849,740.00

Corponor
29 ENE 2026
CANCELADO

Monto en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.

Resolución Dian N° 18764091379641 prefijo OC desde 106001 al 120000 Fecha 01/04/2025 Vigencia 01/04/2027

Impresa por Software TNS
NIT 900 180 856-1

ACTA DE RECIBO PARCIAL CON ANEXO 1

Faro del Catatumbo EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12	Página 1 de 4

FECHA DEL ACTA	09 DE MARZO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-FC-38-2023 – 8 DE AGOSTO 23
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍA CENTRO
C.C. o N.I.T.	901.740.307-92
REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
C.C. o N.I.T.	1.090.473.156 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 ($69.756.000.000,00) M/CTE
ADICIONAL No.1	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 599.955.314.00) M/TE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 70.355.955.314.00) M/TE
PLAZO O DURACIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N.A
PLAZO TOTAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las actividades previstas en el presente Contrato se ejecutarán en el CORREDOR VIAL CORNEJO – SANTIAGO – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, y el domicilio contractual es el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.009.81 mejoramiento en marco del programa para la conexión de territorios, en el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 corredor vial cornejo – Santiago – Salazar – Arboledas – Cucutilla, Norte de Santander.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000189 del 12 de julio 2023 No. 00 000231 del 08 de agosto 2024 No. 00 000070 del 17 de febrero 2025 No. 00 000053 del 10 de febrero 2026

Faro del Catatumbo EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12	Página 2 de 4

REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 000163 del 09 agosto 2023 No. 00 000222 del 13 de agosto 2024 No. 00 000032 del 18 de febrero 2025 No. 00 000064 del 03 de marzo 2026
SUPERVISOR	LILIANA FUENTES MEDINA, Designada mediante memorando del 08 de agosto de 2023. ING LUIS ALFONSO RIVERA PABON, Designada mediante memorando del 16 de octubre del 2024.
INTERVENTOR (externo)	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. HECTOR MIGUEL DIAZ (APODERADO)
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	NO APLICA.
ACTAS PREVIAS REINICIO	NO APLICA.
GARANTIAS	**ANEXO 0** No. 400049798 – 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 11/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 1** No. 400049798 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 16/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 2** No. 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 11/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 3** No. 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 4/09/2024 Fecha de Aprobación: 6/09/2024 **ANEXO 4** No. 400049798 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 4/09/2024 Fecha de Aprobación: 6/09/2024

ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025. ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025.
ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024. ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025. ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025. ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025. ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025. ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025. ACTA No. 7 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 8 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2025

Faro del Catatumbo EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12	Página 3 de 4

	ACTA PARCIAL N° 9 DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N°10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N°11 DEL 03 DE MARZO DEL 2026
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.150.212.552,00)
VALOR A CANCELAR EN PRESENTA ACTA	MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 1.720.170.042,00)
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	3.06%
% EJECUTADO ACUMULADO	39.61%
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	75.60%
% A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA	2.44%
PERÍODO DEL ACTA	PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2026 AL VENTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026.

RESUMEN ACTAS DE PAGO		
RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 69.756.000.000,00	
VALOR ADICIONAL	$ 599.955.314.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 70.355.955.314.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		$ 471.026.144,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		$ 378.641.159,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		$ 1.344.468.123,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 04		$ 1.874.700.291,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 05		$ 2.187.803.958,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 06		$ 2.248.662.875,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 07		$ 2.414.655.762,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 08		$3.136.079.055,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 09		$2.496.597.312,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 10		$7.096.479.077,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 11		$2.070.850.890,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 12 EN CURSO		$2.150.212.552,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 42.485.778.116,00
SUMAS IGUALES	$ 70.355.955.314.00	$ 70.355.955.314.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	$ 13.951.200.000,00	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		$ 94.205.229,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		$ 75.728.232
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03		$ 268.893.625
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04		$ 374.940.058
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05		$ 437.560.792
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 06		$ 449.732.575,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 07		$ 482.931.152,00

177

AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 08		$ 627.215.811,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 09		$499.319.462,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 10		$1.419.295.815,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 11		$414.170.178,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 12		$430.042.510,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 8.377.164.560,80
SUMAS IGUALES	$ 13.951.200.000,00	$ 13.951.200.000,00

En San José de Cúcuta, en las oficinas de **E.I.C.E. FARO CATATUMBO S.A.S.**, se reunieron los suscritos a saber: **ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS**, Ordenador del Gasto, **ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN,** Representante Legal Consorcio Vía Centro, Contratista, **ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON**, Supervisor, e **ING. HÉCTOR MIGUEL DIAZ**, R/L (APODERADO) del Consorcio R&Q - JOYCO, Interventor Contratado por el Instituto Nacional de Vías, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se deja constancia que el periodo de pago de la presente acta es del Primero (01) de febrero del 2026 al veintiocho de (28) de febrero de 2026.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
R/L CONSORCIO VÍA CENTRO
Contratista

ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON
E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Supervisor

ING. HÉCTOR MIGUEL DIAZ
GERENTE CONSORCIO R&Q - JOYCO
Interventor Externo

Vb. Ing Yoris montaño
Director de la interventoria
MP No.: 54202 106093 NTS

Vo. Bo. ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Ordenador del gasto

Proyectó: Ing. Rafael Ricardo Redondo – Apoyo a la Supervisión.
Revisó: Ing. Luis Alfonso Rivera Pabón – Supervisor

Nota 1: **Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.**

Nota 2: Las cantidades y valores consignados en la presenta acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría y/o supervisión.

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 06-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1		CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K8+000				9.242.656.956,00		7.874.125.783,00	46,14%		$ 16.831.739.830,00		847.546.039,00	8,70%		8.891.082.169,00	51,68%
1.1		PRELIMINARES				61.650.905,00		3.268.038,00	3,30%		$ 99.106.680,00		0,00	0,00%		3.268.038,00	3,30%
1.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	8.587,00	3.944,00	33.867.128,00	0,00	0,00	0,00%	20.140,00	$ 79.432.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	8.587,00	2.071,00	17.783.677,00	1.578,00	3.268.038,00	18,61%	9.500,00	$ 19.674.500,00		0,00	0,00%	1.578,00	3.268.038,00	18,61%
1.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				2.887.082.215,00		3.344.193.417,00	48,77%		$ 6.856.832.813,00		101.148.415,00	2,35%		3.505.341.831,00	51,12%
1.2.1		ALCANTARILLAS				1.304.230.891,00	0,00	1.059.834.076,00	60,76%		$ 2.304.357.903,00		44.946.206,00	2,15%	0,00	1.104.470.291,00	47,93%
1.2.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	147,00	238.519,00	35.062.293,00	15,80	3.768.600,00	10,75%	147,00	$ 35.062.293,00		0,00	0,00%	15,80	3.768.600,00	10,75%
1.2.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	58,00	101.591,00	5.892.278,00	80,00	8.127.280,00	68,03%	117,60	$ 11.947.102,00		0,00	0,00%	80,00	8.127.280,00	68,03%
1.2.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.918,00	3.944,00	7.564.592,00	0,00	0,00	0,00%	1.918,00	$ 7.564.592,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	4.296,00	19.220,00	82.569.120,00	688,70	13.236.814,00	16,03%	4.296,00	$ 82.569.120,00		0,00	0,00%	688,70	13.236.814,00	16,03%
1.2.1.5	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	24,00	865.060,00	20.761.440,00	11,50	9.946.190,00	38,33%	30,00	$ 25.951.800,00		0,00	0,00%	11,50	9.946.190,00	38,33%
1.2.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	19.295,00	11.042,00	213.065.390,00	25.403,60	280.506.551,00	81,95%	31.000,00	$ 342.302.000,00		0,00	0,00%	25.403,60	280.506.551,00	81,95%
1.2.1.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y otras)	m3	299,00	1.212.774,00	362.619.426,00	158,90	192.709.789,00	45,40%	350,00	$ 424.470.900,00		0,00	0,00%	158,90	192.709.789,00	45,40%
1.2.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	106,00	2.216.826,00	239.417.208,00	118,10	261.807.151,00	98,42%	120,00	$ 266.019.120,00		0,00	0,00%	118,10	261.807.151,00	98,42%
1.2.1.9	835	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	m	14,00	392.958,00	5.501.412,00	0,00	0,00	0,00%	14,00	$ 5.501.412,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. seleo de excavación	m3	318,00	49.324,00	15.685.032,00	832,30	41.052.365,00	38,39%	2.168,00	$ 106.934.432,00	399,40	19.700.006,00	59,79%	1.231,70	60.752.371,00	56,81%
1.2.1.11	805	Descole en gaviones (incluye excavación y relleno)	m	53,00	2.046.918,00	108.466.854,00	0,00	0,00	0,00%	53,00	$ 108.466.854,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.12	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	38,00	320.568,00	12.181.508,00	0,00	0,00	0,00%	38,00	$ 12.181.508,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	257,00	9.194,00	2.362.858,00	255,40	2.348.148,00	99,38%	257,00	$ 2.362.858,00		0,00	0,00%	255,40	2.348.148,00	99,38%
1.2.1.14	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	56.263,00	2.381,00	133.962.203,00	1.203,50	2.865.534,00	2,14%	56.263,00	$ 133.962.203,00		0,00	0,00%	1.203,50	2.865.534,00	2,14%
1.2.1.15	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	6.839,00	8.643,00	59.109.477,00	0,00	0,00	0,00%	6.839,00	$ 59.109.477,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00		0,00%		$ -				0,00		0,00%
1.2.1.16		Demoliciones en concreto ciclópeo	m3		193.409,00		181,00	31.138.849,00	52,61%	306,00	$ 59.183.154,00		0,00	0,00%	181,00	31.138.849,00	52,61%
1.2.1.17	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3		180.282,33		6,70	1.207.959,00	16,75%	40,00	$ 7.211.693,00		0,00	0,00%	6,70	1.207.959,00	16,75%
1.2.1.18		Demolicion manual en roca	m3		326.510,00		235,90	77.023.709,00	94,36%	250,00	$ 81.627.500,00		0,00	0,00%	235,90	77.023.709,00	94,36%
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00		122,10	8.725.754,00	87,21%	140,00	$ 10.004.960,00	17,40	1.243.474,00	29,00%	139,50	9.969.228,00	99,64%
1.2.1.20		Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787.275,00		48,00	37.788.200,00	64,00%	75,00	$ 59.045.625,00	7,30	5.747.108,00	9,73%	55,30	43.536.308,00	73,73%
1.2.1.21	1318	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	0,00	2.382.438,00		0,00	0,00	0,00%	150,00	$ 357.365.700,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.22		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3	0,00	1.055.238,00		82,70	87.268.183,00	82,70%	100,00	$ 105.523.800,00	17,30	18.255.017,00	17,30%	100,00	105.523.800,00	100,00%
1.2.2		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				854.392.386,00	0,00	1.719.380.400,00	61,23%		$ 2.909.107.626,00		34.738.628,00	0,89%	0,00	1.744.119.028,00	62,11%
1.2.2.1	815	Cunetas en concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,84mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	126,00	1.055.238,00	132.959.988,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1.500,00	182.918,00	274.377.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	$ 274.377.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	9.000,00	11.042,00	99.378.000,00	39.408,00	435.143.136,00	62,55%	63.000,00	$ 695.646.000,00	1.570,70	17.343.669,00	2,49%	40.978,70	452.486.805,00	65,05%
1.2.2.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	126,00	173.982,00	21.919.212,00	283,50	49.318.227,00	94,50%	300,00	$ 52.188.600,00	6,30	1.095.981,00	3,15%	289,80	50.414.188,00	96,60%
1.2.2.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	750,00	161.765,00	121.323.750,00	636,50	102.963.423,00	34,18%	1.862,00	$ 301.208.430,00	13,70	2.216.181,00	0,74%	650,20	105.179.603,00	34,92%
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	4.133,00	9.185,00	37.978.945,00	4.543,80	41.643.927,00	65,14%	6.975,00	$ 63.925.875,00	124,80	1.143.792,00	1,79%	4.668,60	42.787.719,00	66,93%
1.2.2.7	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS-PVC, H=1,50 mt	m	1.117,00	111.380,00	124.411.460,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.8	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	887,00	47.513,00	42.144.031,00	0,00	0,00	0,00%	887,00	$ 42.144.031,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00		0,00%						0,00	0,00	0,00%
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00		955,20	18.358.944,00	86,64%	1.100,00	$ 21.142.000,00	21,60	415.152,00	1,96%	976,80	18.774.096,00	88,60%
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m		32.744,00		1.815,00	59.430.360,00	94,29%	1.925,00	$ 63.032.200,00	52,00	1.702.888,00	2,70%	1.867,00	61.133.048,00	96,99%
1.2.2.11	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		865.060,00		35,40	30.623.124,00	29,50%	120,00	$ 103.807.200,00		0,00	0,00%	35,40	30.623.124,00	29,50%
1.2.2.12		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y otras)	m3		1.212.774,00		73,50	89.138.889,00	43,24%	170,00	$ 206.171.580,00		0,00	0,00%	73,50	89.138.889,00	43,24%
1.2.2.13	303	Demolicion manual en roca	m3		326.510,00		327,50	106.932.025,00	57,46%	570,00	$ 186.110.700,00	2,20	718.322,00	0,39%	329,70	107.650.347,00	57,84%
1.2.2.14	1020	Tubo PVC Ø2'' sanitario, para paseo de floradero	m	0,00	17.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	$ 102.864,00	6,00	102.864,00	100,00%	6,00	102.864,00	100,00%
1.2.2.15	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	0,00	17.925,75	0,00	526,60	9.439.700,00	97,52%	540,00	$ 9.679.905,00		0,00	0,00%	526,60	9.439.700,00	97,52%
1.2.2.16	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0,00	2.381,00	0,00	730,80	1.740.035,00	19,45%	3.757,50	$ 8.946.908,00		0,00	0,00%	730,80	1.740.035,00	19,45%
1.2.2.17	505	Extendido Humedecimiento y compacto de relleno en botaderos	m3	0,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35,00	$ 302.505,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3		1.055.238,00		733,10	773.594.978,00	99,57%	736,25	$ 776.918.978,00		0,00	0,00%	733,10	773.594.978,00	99,57%
1.2.2.19	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3		9.194,00		114,60	1.053.632,00	43,81%	261,60	$ 2.405.150,00		0,00	0,00%	114,60	1.053.632,00	43,81%
1.2.2.20	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	2.000,00	110.030,20		0,00		0,00%								0,00%
1.2.3		PUENTE QUEBRADA LA ESMERALDA				407.781.254,00	0,00	0,00	0,00%		$ 431.399.504,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.1	201	Localización, replantes y control topográfico	m2	1.610,00	3.944,00	6.349.840,00	0,00	0,00	0,00%	1.610,00	$ 6.349.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	396,00	19.220,00	7.611.120,00	0,00	0,00	0,00%	396,00	$ 7.611.120,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.3	740	Colchonete enrocada para control a la socavacion en orillas y fechos de rios, e=30cm	m3	162,00	590.592,80	95.676.034,00	0,00	0,00	0,00%	162,00	$ 95.676.034,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.4	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	540,00	16.153,20	8.722.728,00	0,00	0,00	0,00%	540,00	$ 8.722.728,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.5	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	49,26	91.858,84	4.524.982,00	0,00	0,00	0,00%	49,26	$ 4.524.982,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.6	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	15,08	1.663.451,24	25.084.254,00	0,00	0,00	0,00%	15,08	$ 25.084.254,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.7	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	36,19	1.067.569,09	38.360.373,00	0,00	0,00	0,00%	36,19	$ 38.360.373,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.8	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	37,48	1.276.742,57	47.847.204,00	0,00	0,00	0,00%	37,48	$ 47.847.204,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.874,68	11.042,00	97.994.208,00	0,00	0,00	0,00%	8.874,68	$ 97.994.208,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.10	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	Kg	90,00	787.275,00	70.854.750,00	0,00	0,00	0,00%	120,00	$ 94.473.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

178

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALE S	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.2.3.11	1014	Conformación talud con material seleccionado del sitio , compactado a rana-vibrocompactador	Kg	514,80	5.805,00	2.885.454,00	0,00	0,00	0,00%	514,80	$ 2.885.454,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.12	635	Union de Anclaje en concreto con resina epoxica.	Kg	48,00	18.131,40	870.307,00	0,00	0,00	0,00%	48,00	$ 870.307,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4		PASOS PEATONALES				120.677.684,00	0,00	0,00	0,00%		$ 120.677.684,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	Kg	88,00	3.944,00	347.072,00	0,00	0,00	0,00%	88,00	$ 347.072,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	Kg	21,20	71.484,01	1.515.037,00	0,00	0,00	0,00%	21,20	$ 1.515.037,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.3	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	Kg	16,00	787.275,00	12.596.400,00	0,00	0,00	0,00%	16,00	$ 12.596.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.4	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	Kg	5,20	1.276.742,57	6.639.061,00	0,00	0,00	0,00%	5,20	$ 6.639.061,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.5	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	520,00	11.042,00	5.741.840,00	0,00	0,00	0,00%	520,00	$ 5.741.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	Kg	32,00	458.207,00	14.662.624,00	0,00	0,00	0,00%	32,00	$ 14.662.624,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.7	1837	Estructura paso peatonal Metálico, incluye transporte, suministros e instalacion.	Kg	44,00	1.799.448,60	79.175.650,00	0,00	0,00	0,00%	44,00	$ 79.175.650,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5		BOX CULVERT				0,00	0,00	665.298.941,00	0,00%		$ 1.192.260.096,00		$ 91.463.881,00	0,00%	0,00	666.762.822,00	55,08%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00								0,00	0,00	0,00%
1.2.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	219,00	$ 419.385,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	219,00	$ 453.549,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	0,00	193.409,00	0,00	106,80	20.617.399,00	69,54%	153,30	$ 29.649.600,00		0,00	0,00%	106,80	20.617.399,00	69,54%
1.2.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	0,00	19.220,00	0,00	732,30	14.074.806,00	62,70%	1.166,00	$ 22.448.960,00		0,00	0,00%	732,30	14.074.806,00	62,70%
1.2.5.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0,00	71.484,00	0,00	3,00	214.392,00	0,51%	564,00	$ 41.734.976,00	14,70	1.050.521,00	2,52%	17,70	1.264.913,00	3,03%
1.2.5.6	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	0,00	865.060,00	0,00	10,70	9.256.142,00	7,33%	146,00	$ 126.298.760,00		0,00	0,00%	10,70	9.256.142,00	7,33%
1.2.5.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y otras)	m3	0,00	1.212.774,00	0,00	209,60	254.197.430,00	58,22%	360,00	$ 436.598.640,00	30,00	36.383.220,00	8,33%	239,60	290.580.650,00	66,56%
1.2.5.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	0,00	11.447,00	0,00	20.975,00	240.100.825,00	69,92%	30.000,00	$ 343.410.000,00	4.720,00	54.029.640,00	15,73%	25.695,00	294.130.865,00	85,65%
1.2.5.9	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	0,00	349.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	277,40	$ 96.852.268,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	0,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	146,00	$ 1.342.324,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	$ 23.810.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	0,00	8.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.314,00	$ 11.358.902,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.13	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3	0,00	787.275,00	0,00	10,60	8.345.115,00	90,75%	11,68	$ 9.195.372,00		0,00	0,00%	10,60	8.345.115,00	90,75%
1.2.5.14		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3		458.207,00		38,00	17.411.866,00	0,00%	100,00	$ 45.820.700,00		0,00	0,00%	38,00	17.411.866,00	38,00%
1.2.5.15		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3		191.244,00		5,60	1.070.966,00	0,00%	15,00	$ 2.868.660,00		0,00	0,00%	5,60	1.070.966,00	37,33%
1.2.5.16		Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m		36.592,00		0,00	0,00	0,00%				0,00		0,00	0,00	0,00%
1.3		OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.				649.087.172,00		908.969.340,00	48,46%		$ 1.876.592.896,00		150.090.551,00	8,00%		1.059.059.891,00	56,46%
1.3.1		OBRA K5+170-K5+215: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m				76.968.893,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	196,00	3.944,00	773.024,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	196,00	2.071,00	405.916,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	135,00	19.220,00	2.594.700,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	167,00	10.016,00	1.672.672,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	135,00	458.207,00	61.857.945,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	9,00	191.244,00	1.721.196,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.802,00	2.381,00	6.671.562,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	146,00	8.843,00	1.291.878,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2		OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m				61.646.669,00	0,00	192.973.002,00	77,62%		$ 248.618.016,00		$ -	0,00%	0,00	192.973.002,00	77,62%
1.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	416,00	3.944,00	1.640.704,00	0,00	0,00	0,00%	416,00	$ 1.640.704,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	204	Rocería y Limpieza	m2	416,00	2.071,00	861.536,00	0,00	0,00	0,00%	416,00	$ 861.536,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	100,00	19.220,00	1.922.000,00	312,00	5.996.640,00	86,19%	362,00	$ 6.957.640,00		0,00	0,00%	312,00	5.996.640,00	86,19%
1.3.2.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	170,00	10.016,00	1.702.720,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	$ 2.003.200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	100,00	458.207,00	45.820.700,00	368,50	168.849.280,00	79,59%	463,00	$ 212.149.841,00		0,00	0,00%	368,50	168.849.280,00	79,59%
1.3.2.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	20,00	191.244,00	3.824.880,00	33,40	6.387.550,00	100,00%	33,40	$ 6.387.550,00		0,00	0,00%	33,40	6.387.550,00	100,00%
1.3.2.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.075,00	2.381,00	4.940.575,00	980,10	2.333.618,00	45,17%	2.170,00	$ 5.168.770,00		0,00	0,00%	980,10	2.333.618,00	45,17%
1.3.2.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	108,00	8.843,00	933.444,00	0,00	0,00	0,00%	108,00	$ 933.444,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		402,00	3.684.330,00	89,33%	450,00	$ 4.124.250,00		0,00	0,00%	402,00	3.684.330,00	89,33%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00	0,00	0,00%		$ -			0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. sobc de excavación	m3	0,00	49.324,00		116,00	5.721.584,00	68,24%	170,00	$ 8.386.080,00		0,00	0,00%	116,00	5.721.584,00	68,24%
1.3.2.11	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3		OBRA K5+485-K5+625: Muro en gaviones H=3.00m L=140.00m				468.022.539,00	0,00	0,00	0,00%		$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	720,00	3.944,00	2.839.680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	720,00	2.071,00	1.491.120,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	840,00	19.220,00	16.144.800,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	798,00	10.016,00	7.992.768,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	840,00	458.207,00	384.893.880,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	28,00	191.244,00	5.354.832,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	17.430,00	2.381,00	41.500.830,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	903,00	8.843,00	7.804.629,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

176

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.3.4		OBRA K5+695-K5+720: Muro en gaviones H=2.00m L=25.00m				42.429.181,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	116,00	3.944,00	457.504,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.2	204	Rocería y Limpieza	m2	116,00	2.071,00	240.236,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	75,00	19.220,00	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467lm	m2	56,00	10.016,00	560.896,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	75,00	456.207,00	34.365.525,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	5,00	191.244,00	956.220,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.957,00	2.381,00	3.707.217,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	81,00	8.643,00	700.083,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5		MURO CAISSON K4+140					0,00	715.996.338,00	57,16%		$ 1.827.082.880,00		150.090.581,00	11,98%	0,00	866.086.889,00	53,23%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00	0,00	0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	$ 788.800,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	$ 828.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	0,00	238.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	$ 16.696.330,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	0,00	19.220,00	0,00	114,50	2.200.690,00	78,33%	530,00	$ 10.186.900,00		0,00	0,00%	114,50	2.200.690,00	21,60%
1.3.5.5	405	Excavación manual en roca o colución para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	0,00	2.215.149,90	0,00	8,10	17.942.714,00	10,12%	80,00	$ 177.211.992,00		0,00	0,00%	8,10	17.942.714,00	10,12%
1.3.5.6	701	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	0,00	1.663.451,00	0,00	19,80	32.936.330,00	90,00%	28,00	$ 46.576.628,00		0,00	0,00%	19,80	32.936.330,00	70,71%
1.3.5.7	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 12mt	m3	0,00	2.444.660,47	0,00	8,80	21.513.188,00	55,00%	30,00	$ 73.340.414,00		0,00	0,00%	8,80	21.513.188,00	29,33%
1.3.5.8	737	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	0,00	1.654.832,00	0,00	18,00	29.786.976,00	54,55%	40,00	$ 66.193.280,00		0,00	0,00%	18,00	29.786.976,00	45,00%
1.3.5.9	767	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	0,00	1.712.800,00	0,00	24,50	41.963.600,00	39,52%	80,00	$ 137.024.000,00		0,00	0,00%	24,50	41.963.600,00	30,63%
1.3.5.10	1012	Acero de refuerzo 90.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	0,00	11.042,00	0,00	23.408,90	258.458.990,00	78,02%	34.000,00	$ 375.428.000,00	10.591,00	116.945.822,00	35,30%	33.997,90	375.404.812,00	99,99%
1.3.5.11	401	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0,00	2.381,00	0,00	1.030,80	2.454.335,00	98,17%	2.100,00	$ 5.000.100,00		0,00	0,00%	1.030,80	2.454.335,00	49,09%
1.3.5.12	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	0,00	2.382.438,00	0,00	22,10	52.651.860,00	44,20%	100,64	$ 239.768.117,00		0,00	0,00%	22,10	52.651.860,00	21,96%
1.3.5.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	0,00	9.194,00		57,30	526.816,00	29,38%	195,00	$ 1.792.830,00		0,00	0,00%	57,30	526.816,00	29,38%
1.3.5.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		865.080,00	0,00	1,50	1.297.590,00	0,00%	24,00	$ 20.761.440,00		0,00	0,00%	1,50	1.297.590,00	6,25%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-02 1.3		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m	0,00	262.118,38	0,00	174,00	45.608.598,00	87,00%	200,00	$ 52.423.676,00		0,00	0,00%	174,00	45.608.598,00	87,00%
NP-12 1.3		Concreto 28MPa para pilas pre-excavades, a cualquier profundidad	m3	0,00	1.175.345,00	0,00	84,80	99.669.256,00	75,04%	113,00	$ 132.813.985,00	28,20	33.144.729,00	24,96%	113,00	132.813.985,00	100,00%
NP-13 1.3		Excavación manual en roca o colución para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita	m3	0,00	2.215.149,90	0,00	49,20	108.985.375,00	57,88%	122,00	$ 270.248.286,00		0,00	0,00%	49,20	108.985.375,00	40,33%
1.4		MOVIMIENTO DE TIERAS				695.097.174,00		194.622.020,00	35,39%		$ 549.786.795,00		2.544.728,00	0,46%		197.066.748,00	35,84%
1.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	10.835,00	19.220,00	208.246.700,00	1.872,20	35.983.684,00	13,00%	14.400,00	$ 276.766.000,00	132,40	2.544.728,00	0,92%	2.004,60	38.528.412,00	13,92%
1.4.2	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	1.918,00	17.925,75	34.381.579,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	$ 8.962.865,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	500,00	180.292,33	90.146.165,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	76.508,00	2.381,00	182.165.548,00	5.856,00	13.943.136,00	8,77%	16.508,00	$ 39.305.548,00		0,00	0,00%	5.856,00	13.943.136,00	35,47%
1.4.5	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9.274,00	8.643,00	80.155.182,00	0,00	0,00	0,00%	9.274,00	$ 80.155.182,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4.6		Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00		1.600,00	144.595.200,00	0,00%	1.600,00	$ 144.595.200,00		0,00	0,00%	1.600,00	144.595.200,00	100,00%
1.4.7	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3		2.382.438,00		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO - TALUD INFERIOR CURVA 9 PROYECTAR 30 ML					0,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-02 2.10		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m		262.118,38		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-03 2.10		Suministro el Instalacion de Guaya 3/8" Perimetral y Diagonalmente Entre Anclajes para Refuerzo tipo STEEL GRID	m		57.178,11		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-04 2.10		Suministro e instalacion malla Macmat R1 con Guaya Perimetral y Diagonales Tipo STEEL GRID.	m2		139.454,29		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5		PAVIMENTOS				3.190.371.808,80		2.809.983.254,00	44,94%		$ 6.807.254.383,00		607.096.693,00	10,40%		3.216.949.946,00	56,38%
1.5.1	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	2.100,00	180.292,33	378.613.893,00	400,00	72.116.932,00	10,00%	4.000,00	$ 721.189.320,00	49,00	8.834.324,00	1,22%	449,00	80.951.256,00	11,22%
1.5.2	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	3.375,00	173.962,00	587.121.750,00	2.404,20	416.239.440,00	62,04%	3.875,00	$ 674.102.750,00		0,00	0,00%	2.404,20	416.239.440,00	62,04%
1.5.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.100,00	191.244,00	401.612.400,00	3.009,50	575.546.818,00	66,00%	4.560,00	$ 872.072.640,00	652,30	124.746.461,00	14,30%	3.661,80	700.297.279,00	80,30%
1.5.4	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	10.500,00	16.153,20	169.608.600,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	10.500,00	8.965,00	94.142.500,00	11.404,00	102.464.940,00	75,03%	15.200,00	$ 136.572.000,00	155,80	1.399.863,00	1,03%	11.559,80	103.864.803,00	76,05%
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.260,00	1.229.422,75	1.549.072.665,00	842,10	1.035.296.898,00	36,93%	2.280,00	$ 2.803.081.671,00	379,60	466.686.876,00	16,65%	1.221,70	1.501.985.774,00	53,56%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00		0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2		12.873,90		9.013,50	116.038.898,00	59,30%	15.200,00	$ 195.683.280,00	388,00	4.995.073,00	2,55%	9.401,50	121.033.971,00	61,85%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-07 1.5		Demolicion de pavimento flexible	m2	0,00	44.147,00		6.572,30	290.147.328,00	81,02%	8.111,90	$ 358.115.932,00		0,00	0,00%	6.572,30	290.147.328,00	81,02%
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	0,00	3.059,00		0,00	0,00	0,00%	15.200,00	$ 46.496.800,00	140,60	430.095,00	0,92%	140,60	430.095,00	0,92%
1.6		SEÑALIZACION VIAL				70.363.534,00		660.506.656,00	49,99%		$ 1.301.165.696,00		0,00	0,00%		660.506.656,00	49,99%
1.6.1	1101	Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un	23,00	525.144,60	12.078.326,00	0,00	0,00	0,00%	74,00	$ 38.860.700,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

180

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION Nº07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.6.2	1102	Demarcación horizontal	Km	2,00	3.089.213,75	6.178.428,00	0,00	0,00	0,00%	5,70	$ 17.608.518,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.6.3	1103	Taches reflectivos bidireccionales, suministro e instalacion	Un	559,00	13.140,04	7.345.284,00	0,00	0,00	0,00%	662,00	$ 8.698.708,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.6.4	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	115,00	389.230,40	44.761.496,00	0,00	0,00	0,00%	202,00	$ 78.624.541,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00%
1.6.5	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas sn HQ	m	0,00	606.613,00	0,00	1.072,00	650.289.136,00	56,42%	1.900,00	$ 1.152.564.700,00		0,00	0,00%	1.072,00	650.289.136,00	56,42%
1.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0,00	71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,00	$ 643.176,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-09 1.6		Delineador vial tipo corona	Un	0,00	109.761,00		2,00	219.522,00	7,69%	26,00	$ 2.853.786,00		0,00	0,00%	2,00	219.522,00	7,69%
NP-10 1.6		Marca vial con pintura en frio	m2	0,00	64.292,00		0,00	0,00	0,00%	20,40	$ 1.311.557,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO**				**1.009.034.147,00**		**34.807.496,00**	**24,40%**		**$ 141.860.289,00**		**26.664.653,00**	**18,69%**		**43.969.401,00**	**30,99%**
1.7.1		ZOOME K6+980				352.164.391,00	0,00	0,00	0,00%		$ 38.006.283,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.793,00	3.944,00	11.015.592,00	0,00	0,00	0,00%	2.793,00	$ 11.015.592,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2.793,00	1.287,00	3.594.591,00	0,00	0,00	0,00%	2.793,00	$ 3.594.591,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.3	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	252,00	458.207,00	115.468.164,00	0,00	0,00	0,00%	53,24	$ 24.396.110,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	96,00	173.962,00	16.700.352,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.5	908	Filtro en geotextil y tuberia perforada pvc Ø4" sección 0,5x1,0 mas material filtrante	m	300,00	100.653,80	30.196.140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.6	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	1.829,00	90.572,00	165.680.388,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.7	837	Canal rampa en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	12,00	826.597,00	9.919.164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2		VIA				607.773.776,00	0,00	17.303.748,00	8,98%		$ 102.853.998,00		26.664.653,00	13,80%	0,00	43.968.401,00	42,76%
1.7.2.1	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	40,00	248.765,10	9.950.604,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.2	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	60,00	77.939,00	4.676.340,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	$ 4.676.340,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.3	836	Canal sección 2,40x0,60 en sacos (1,20x2,40) relleno con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	181,00	415.333,00	75.175.273,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.4	902	Sub drenes horizontales en tuberia pvc Ø3"	m	732,00	451.972,50	330.843.870,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.5	1401	Arborización con especies nativas	Un	2.500,00	50.192,30	125.480.750,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	$ 25.096.150,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.6	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	569,00	108.342,60	61.646.939,00	0,00		0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00				$ -		0,00		0,00		0,00%
1.7.2.7	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tocon	Un	0,00	205.997,00	0,00	84,00	17.303.748,00	50,91%	165,00	$ 33.989.505,00		0,00	0,00%	84,00	17.303.748,00	50,91%
1.7.2.8	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2	0,00	39.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	$ 39.092.000,00	682,10	26.664.653,00	68,21%	682,10	26.664.653,00	68,21%
1.7.3		BARRERA DE FLUJO				49.076.980,00	0,00	0,00	0,00%		$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	200,00	3.944,00	788.800,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	200,00	2.071,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.3	754	Micropilotes en concreto 28 Mpa Ø40cm + refuerzo + excavación + desputar	m	40,00	459.555,00	18.382.200,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.4	702	Concreto 24,5 Mpa para viga cabezal	m3	12,00	1.208.185,00	14.498.220,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.5	1702	Acero de refuerzo 2.400kg/cm2 (37.000psi) corte, figurado y colocación	Kg	1.320,00	11.358,00	14.992.560,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2		**CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K12+200 - K12+600, LONGITUD: 400 MTS**				**5.354.309.256,50**		**2.402.248.042,00**	**79,50%**		**$ 2.177.808.193,00**		**0,00**	**0,00%**		**2.402.248.042,00**	**79,50%**
2.1		PRELIMINARES				176.469.296,00		13.371.550,00	43,23%		$ 30.934.321,00		0,00	0,00%		13.371.550,00	43,23%
2.1.1		Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	7.519,58	3.944,00	29.657.224,00	0,00	0,00	0,00%	4.400,00	$ 17.353.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.2		Rocaria y Limpieza	m2	3.135,79	2.071,00	6.494.221,00	995,00	2.060.645,00	90,78%	1.096,00	$ 2.269.616,00		0,00	0,00%	995,00	2.060.645,00	90,78%
2.1.3		Dique de desvio del rio, con material del sitio, adecuacion y conformacion	m3	960,00	56.786,00	54.514.560,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.4		Mantenimiento y conservación de dique de desvió del rio	Hora	320,00	264.979,00	84.793.280,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00							0,00%	0,00		0,00%
2.1.5		Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	und	0,00	2.262.181,00		5,00	11.310.905,00	100,00%	5,00	$ 11.310.905,00		0,00	0,00%	5,00	11.310.905,00	100,00%
2.2		**PROTECCIÓN DE TALUD CON COLCHONETA ENROCADA (Longitud 208,80m)**				**929.054.214,00**		**4.754.279,00**	**100,00%**		**$ 4.754.279,00**		**0,00**	**0,00%**		**4.754.279,00**	**100,00%**
2.2.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.536,74	24.823,00	38.146.497,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.2		Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) : mat. selec de excavación	m3	63,71	49.324,00	3.142.432,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.3		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	1.479,67	540.592,80	799.998.948,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.4		Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	2.899,74	10.016,00	29.043.796,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.5		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	6.392,84	2.381,00	15.221.352,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.6		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.598,21	8.643,00	13.813.329,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.7		Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	510,50	77.939,00	39.787.860,00	61,00	4.754.279,00	0,00%	61,00	$ 4.754.279,00		0,00	0,00%	61,00	4.754.279,00	100,00%
2.3		**PROTECCIÓN DEL TALUD CON ESPIGONES (Son 6 Tramo K12+370 - K12+530)**				**1.729.198.886,00**		**0,00**	**0,00%**		**$ -**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
2.3.1		Excavación a maquina bajo agua, profundidad hasta 4mt. Incluye extender el material	m3	927,00	38.107,00	35.325.189,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.2		Bolsacreto en sacos polipropileno de 1,2x2,4 concreto 21Mpa, transportado 1:3:3	m3	386,00	1.733.589,00	669.165.354,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.3		Concreto ciclópeo tremie 21MPa para pisos solados	m3	772,00	1.034.073,00	798.304.356,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.4		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	5.237,00	11.442,00	59.931.754,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.5		Concreto 24,5 Mpa 3500psi Basico	m3	9,00	844.688,00	7.602.192,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.6		Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	95,00	1.212.774,00	78.830.310,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.7		Micropilote Ø4" L=3mt con barra hueca R-32 Ø1 1/4" autoperforante	un	84,00	744.350,00	62.525.400,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.8		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	3.856,32	2.381,00	9.181.898,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.9		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	964,06	8.643,00	8.332.543,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

18

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
2.4		**PROTECCIÓN DE TALUD CON BOLSAS EN GAVIONES (Longitud : 40m)**				**241.868.096,00**		**0,00**	**0,00%**		**$ -**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
2.4.1		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	393,70	458.207,00	180.396.096,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.4.2		Protección del enrocado de gaviones sobre talud, con redmalla 8x10 MC, mas cables metálicos de 8mm en una dirección, para protección y soporte complementario de los sacos de gaviones colocados sobre el talud	m2	400,00	153.530,00	61.472.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5		**MURO EN GAVIONES PROYECTADO (Longitud 51,00m) (Prolongación de gaviones existentes)**				**520.144.729,00**		**0,00**	**0,00%**		**$ -**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
2.5.1		Excavación para estructuras con maquina, incluye cargue	m3	495,00	19.220,00	9.513.900,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.2		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	1.094,00	458.207,00	501.278.458,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.3		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.058,20	2.381,00	4.902.955,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.5		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	514,80	8.643,00	4.449.416,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**563.120.163,00**		**426.349.967,00**	**80,83%**		**$ 629.313.290,00**		**0,00**	**0,00%**		**426.349.967,00**	**80,83%**
2.6.1		**ALCANTARILLAS**				**563.120.163,00**	0,00	**426.349.967,00**	76,09%		**$ 629.313.290,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**426.349.967,00**	**80,83%**
2.6.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	40,00	238.519,00	9.540.760,00	0,00	0,00	0,00%	3,30	$ 787.113,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	30,00	101.591,00	3.047.730,00	29,50	2.996.935,00	98,64%	33,28	$ 3.380.948,00		0,00	0,00%	29,50	2.996.935,00	98,64%
2.6.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	160,00	1.915,00	306.400,00	0,00	0,00	0,00%	160,00	$ 306.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	160,00	24.823,00	3.971.680,00	518,40	12.868.243,00	72,66%	713,48	$ 17.710.714,00		0,00	0,00%	518,40	12.868.243,00	72,66%
2.6.1.5	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	8,00	1.265.396,00	10.123.168,00	9,70	12.274.341,00	99,94%	9,71	$ 12.281.427,00		0,00	0,00%	9,70	12.274.341,00	99,94%
2.6.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	7.200,00	11.442,00	82.382.400,00	9.802,30	112.157.942,00	85,47%	10.021,44	$ 114.665.298,00		0,00	0,00%	9.802,30	112.157.942,00	97,81%
2.6.1.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3	120,00	1.657.370,00	198.884.400,00	86,90	144.025.453,00	65,96%	131,75	$ 218.358.498,00		0,00	0,00%	86,90	144.025.453,00	65,96%
2.6.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	40,00	2.216.826,00	88.673.040,00	42,00	93.106.692,00	99,88%	42,05	$ 93.217.533,00		0,00	0,00%	42,00	93.106.692,00	99,88%
2.6.1.9	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53,00	3.032.345,00	160.714.285,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.300,00	2.381,00	5.476.300,00	777,00	1.850.037,00	76,93%	1.010,00	$ 2.404.810,00		0,00	0,00%	777,00	1.850.037,00	76,93%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS															0,00%
2.6.1.11		Desmontar o desarmar gaviones	m3		43.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	$ 175.912,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.12		Concreto ciclópeo para piso y soleados	m3		787.275,00	0,00	29,50	23.224.613,00	56,08%	52,60	$ 41.410.665,00		0,00	0,00%	29,50	23.224.613,00	56,08%
2.6.1.13		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	$ 428.784,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.14		Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3		49.324,00	0,00	353,20	17.421.237,00	97,54%	362,11	$ 17.860.714,00		0,00	0,00%	353,20	17.421.237,00	97,54%
2.6.1.15		Demoliciones en concreto ciclópeo	m3		193.409,00	0,00	32,70	6.324.474,00	100,00%	32,70	$ 6.324.474,00		0,00	0,00%	32,70	6.324.474,00	100,00%
2.7		**PAVIMENTOS**				**1.185.593.762,00**		**717.828.814,00**	**78,82%**		**$ 913.780.179,00**		**0,00**	**0,00%**		**717.828.814,00**	**78,82%**
2.7.1		Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	1.200,00	180.292,00	216.350.400,00	377,00	67.970.084,00	95,08%	396,80	$ 71.503.807,00		0,00	0,00%	377,00	67.970.084,00	95,08%
2.7.2		Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1.260,00	173.962,00	219.192.120,00	797,70	138.769.487,00	93,63%	852,00	$ 148.215.624,00		0,00	0,00%	797,70	138.769.487,00	93,63%
2.7.3		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	960,00	193.405,00	185.668.800,00	760,20	147.026.481,00	94,91%	801,00	$ 154.917.405,00		0,00	0,00%	760,20	147.026.481,00	94,91%
2.7.4		Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	3.200,00	16.153,00	51.689.600,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.7.5		Riego de imprimacion	m2	3.200,00	12.667,00	40.534.400,00	2.480,00	31.414.160,00	100,00%	2.480,00	$ 31.414.160,00		0,00	0,00%	2.480,00	31.414.160,00	100,00%
2.7.6		Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	384,00	1.229.423,00	472.098.432,00	232,60	285.963.790,00	82,53%	372,00	$ 457.345.356,00		0,00	0,00%	232,60	285.963.790,00	82,53%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS															0,00%
2.7.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m3		12.873,90	0,00	2.800,00	36.046.920,00	100,00%	2.800,00	$ 36.046.920,00		0,00	0,00%	2.800,00	36.046.920,00	100,00%
2.7.8		Excavación mejoramiento sub-rasante con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	287,00	5.516.140,00	96,93%	298,10	$ 5.891.042,00		0,00	0,00%	287,00	5.516.140,00	96,93%
2.7.9		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2.381,00	0,00	432,00	1.028.592,00	97,08%	445,00	$ 1.059.545,00		0,00	0,00%	432,00	1.028.592,00	97,08%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-11	2.7	Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	0,00	3.059,00		1.240,00	3.793.160,00	50,00%	2.480,00	$ 7.586.320,00		0,00	0,00%	1.240,00	3.793.160,00	50,00%
		CAPITULOS NO PREVISTOS															
2.8		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**0,00**		**20.565.091,00**	**49,17%**		**$ 41.024.336,00**		**0,00**	**0,00%**		**20.565.091,00**	**49,17%**
2.8.1		Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tronco	und		205.997,00	0,00	22,00	4.531.934,00	78,57%	28,00	$ 5.767.916,00		0,00	0,00%	22,00	4.531.934,00	78,57%
2.8.2		Arborización con especies nativas	Un		50.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,00	$ 1.405.384,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.8.3		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3		8.643,00	0,00	182,00	1.573.026,00	10,47%	1.738,00	$ 15.021.534,00		0,00	0,00%	182,00	1.573.026,00	10,47%
2.8.4		Revegetalizacion con semillas agricolas	m2		39.092,00	0,00	369,90	14.460.131,00	16,05%	502,14	$ 19.629.502,00		0,00	0,00%	369,90	14.460.131,00	73,67%
2.9		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**0,00**		**423.495.809,00**	**66,21%**		**$ 716.869.380,50**		**0,00**	**0,00%**		**423.495.809,00**	**66,21%**
2.9.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	250,20	4.808.844,00	63,62%	393,28	$ 7.558.842,00		0,00	0,00%	250,20	4.808.844,00	63,62%
2.9.2		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2.381,00	0,00	375,00	892.875,00	89,78%	417,68	$ 994.486,00		0,00	0,00%	375,00	892.875,00	89,78%
2.9.3		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	1.243,10	11.393.012,00	99,93%	1.244,00	$ 11.401.260,00		0,00	0,00%	1.243,10	11.393.012,00	99,93%
2.9.4		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m		32.744,00	0,00	392,60	12.855.294,00	93,65%	419,20	$ 13.726.265,00		0,00	0,00%	392,60	12.855.294,00	93,65%
2.9.5		Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		161.765,00	0,00	215,10	34.795.652,00	40,09%	536,60	$ 86.803.099,00		0,00	0,00%	215,10	34.795.652,00	40,09%
2.9.6		Cunetas en concreto de 21 Mpa e=0,10 m, ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3		1.055.238,00	0,00	34,10	35.983.616,00	100,00%	34,10	$ 35.983.616,00		0,00	0,00%	34,10	35.983.616,00	100,00%
2.9.7		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg		11.042,00	0,00	11.255,00	124.277.710,00	94,81%	11.871,00	$ 131.079.582,00		0,00	0,00%	11.255,00	124.277.710,00	94,81%
2.9.8		Solado en concreto 17,5 MPa	m3		1.265.396,00	0,00	8,10	10.249.708,00	20,84%	38,87	$ 49.189.249,00		0,00	0,00%	8,10	10.249.708,00	20,84%
2.9.9		Concreto ciclopeo para piso y soleados	m3		787.275,00	0,00	18,40	14.485.860,00	26,29%	70,00	$ 55.109.250,00		0,00	0,00%	18,40	14.485.860,00	26,29%

182

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
2.9.10		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3		1.657.370,00	0,00	35,30	58.505.161,00	34,47%	102,40	$ 169.714.688,00		0,00	0,00%	35,30	58.505.161,00	34,47%
2.9.11		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	7,10	507.394,00	88,75%	8,00	$ 571.712,00		0,00	0,00%	7,10	507.394,00	88,75%
2.9.12	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador), mat. selec de excavación	m3		49.234,00	0,00	107,70	5.302.502,00	87,25%	122,65	$ 6.038.753,00		0,00	0,00%	107,70	5.302.502,00	87,81%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00								0,00		0,00%
2.9.13		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3		1.066.238,00		103,70	109.428.181,00	73,55%	141,00	$ 148.788.558,00		0,00	0,00%	103,70	109.428.181,00	73,55%
2.9.14	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m		110.030,20		0,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10		AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE TALUDES				0,00		597.199.277,00	84,49%		$ 706.903.355,00		0,00	0,00%		597.199.277,00	84,49%
2.10.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	246,00	$ 4.728.120,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.2		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	369,00	$ 878.589,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.3		Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00	0,00	602,30	54.431.056,00	55,26%	1.090,00	$ 98.506.480,00		0,00	0,00%	602,30	54.431.056,00	55,26%
2.10.4		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg		11.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.5		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3		1.657.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.6		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3		458.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	$ 2.749.242,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.7	902	Sub drenes horizontales en tuberia pvc Ø2"	m		451.972,50	0,00	45,00	20.338.763,00	100,00%	45,00	$ 20.338.763,00		0,00	0,00%	45,00	20.338.763,00	100,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JUNIO-2025 ACTA 01 APROBACION)					0,00								0,00		
NP-02 2.10		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, lucrca y platina abovedada 15x15	m		262.118,38	0,00	1.108,00	290.427.165,00	100,00%	1.108,00	$ 290.427.165,00		0,00	0,00%	1.108,00	290.427.165,00	100,00%
NP-03 2.10		Suministro el Instalacion de Guaya 3/8" Perimetral y Diagonalmente Entre Anclajes para Refuerzo tipo STEEL GRID	m		57.178,11	0,00	1.412,90	80.786.952,00	75,15%	1.880,00	$ 107.494.847,00		0,00	0,00%	1.412,90	80.786.952,00	75,15%
NP-04 2.10		Suministro e instalacion malla Macmat R1 con Guaya Perimetral y Diagonales Tipo STEEL GRID.	m2		139.454,29	0,00	1.084,20	151.196.341,00	83,22%	1.302,80	$ 181.681.049,00		0,00	0,00%	1.084,20	151.196.341,00	83,22%
2.11		SEÑALIZACION VIAL				0,00		199.129.585,00	87,23%		$ 233.139.183,00		0,00	0,00%		199.129.585,00	85,41%
2.11.1		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	$ 357.320,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.2		Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un		525.144,60	0,00	2,00	1.050.289,00	6,90%	29,00	$ 15.229.193,00		0,00	0,00%	2,00	1.050.289,00	6,90%
2.11.3		Demarcación horizontal	km		3.089.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,20	$ 3.707.057,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.4		Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un		13.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	$ 2.628.008,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.5		Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un		389.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	$ 5.838.456,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.6		Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m		606.613,00	0,00	324,00	196.542.612,00	100,00%	324,00	$ 196.542.612,00		0,00	0,00%	324,00	196.542.612,00	100,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JUNIO-2025 ACTA 01 APROBACION)				0,00	0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-08 2.11		Suministro e instalacion de estoperol	Un		7.757,00		0,00	0,00	0,00%	720,00	$ 5.585.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-09 2.11		Delineador vial tipo corona	und		109.761,00		14,00	1.536.654,00	58,33%	24,00	$ 2.634.264,00		0,00	0,00%	14,00	1.536.654,00	58,33%
NP-10 2.11		Marca vial con pintura en frio	m2		64.292,00		0,00	0,00	0,00%	9,80	$ 617.203,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3		ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900				11.825.784.216,00		7.808.348.795,00	63,50%		11.825.784.216,00		657.091.583,00	5,56%		8.105.837.348,00	68,54%
3.1		PRELIMINARES				70.947.069,00		41.290.924,00	46,37%		89.044.817,00		9,00	0,00%		41.290.924,00	46,37%
3.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	10.600,00	3.944,00	41.806.400,00	8.175,00	32.242.200,00	77,12%	10.600,00	41.806.400,00		0,00	0,00%	8.175,00	32.242.200,00	77,12%
3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	4.240,00	2.071,00	8.781.040,00	0,00	0,00	0,00%	4.240,00	8.781.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	9,00	2.262.181,00	20.359.629,00	4,00	9.048.724,00	44,44%	17,00	38.457.077,00		0,00	0,00%	4,00	9.048.724,00	23,53%
3.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				1.307.396.972,00		734.567.316,00	56,53%		1.347.196.688,00		7.184.291,00	0,53%		741.751.896,00	56,06%
3.2.1		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				1.307.396.972,00	0,00	734.567.316,00	56,19%		1.347.196.688,00		7.184.291,00	0,55%	0,00	741.751.896,00	56,06%
3.2.1.1	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	62,08	193.409,00	12.006.753,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	1.934.012,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1.656,00	71.464,00	118.344.384,00	35,50	2.536.972,00	2,14%	314,10	22.446.842,00		0,00	0,00%	35,50	2.536.972,00	11,30%
3.2.1.3	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	5.244,00	23.815,00	123.837.060,00	664,00	15.680.360,00	12,66%	664,00	15.680.360,00		0,00	0,00%	664,00	15.680.360,00	100,00%
3.2.1.4	901	Geodren con tubo 4" tipo AOS H=1,50 mt	m	1.000,00	111.380,00	111.380.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	960,00	393.912,00	378.155.520,00	694,30	273.493.102,00	72,32%	800,00	315.129.600,00		0,00	0,00%	694,30	273.493.102,00	86,79%
3.2.1.6	806	Cunetas en concreto de 21 Mpa e=0,10 m, ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	91,00	1.477.118,00	134.417.738,00	19,70	29.099.225,00	21,65%	19,80	29.243.982,00		0,00	0,00%	19,70	29.099.225,00	99,51%
3.2.1.7	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	1.932,00	47.513,00	91.795.116,00	0,00	0,00	0,00%	132,00	6.271.716,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.8	809	Bordillo en concreto 21 Mpa, sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1.000,00	233.544,00	233.544.000,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	116.772.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	6.000,00	11.447,00	68.682.000,00	11.787,00	134.925.789,00	39,97%	30.247,26	346.240.361,00	222,00	2.541.234,00	3,70%	12.009,00	137.467.023,00	39,70%
3.2.1.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volquete	m3	1.656,00	9.194,00	15.225.264,00	0,00	0,00	0,00%	62,08	570.764,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.152,80	2.381,00	5.125.817,00	2.195,60	5.227.724,00	37,99%	5.779,84	13.761.799,00		0,00	0,00%	2.195,60	5.227.724,00	37,99%
3.2.1.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.722,24	8.643,00	14.885.320,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	6.914.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00%
3.2.1.13	908	Tuberia perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	1.016,00	33.267.904,00	0,00%	1.400,00	45.841.600,00		0,00	0,00%	1.016,00	33.267.904,00	72,57%
3.2.1.14	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	630,90	12.125.898,00	0,00%	800,00	15.376.000,00		0,00	0,00%	630,90	12.125.898,00	78,86%
3.2.1.15	835	Union de Anclaje en concreto con resina epoxica.	kg		18.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	173,20	3.140.358,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.16	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	3.151,30	28.881.865,00	0,00%	4.200,00	38.493.000,00		0,00	0,00%	3.151,30	28.881.865,00	75,03%
3.2.1.17	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		1.295.396,00	0,00	6,50	8.225.074,00	0,00%	47,32	59.878.539,00		0,00	0,00%	6,50	8.225.074,00	13,74%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.2.1.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa			1.055.238,00		181,10	191.103.602,00	0,00%	293,30	309.501.305,00	4,40	4.643.047,00	0,00%	185,50	195.746.649,00	63,25%
3.3		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**1.838.882.726,00**		**2.085.958.178,00**	**90,71%**		**2.594.612.866,00**		**50.060.494,00**	**1,94%**		**2.136.018.670,00**	**82,84%**
3.3.1		**ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO**				**1.056.066.192,00**	0,00	**1.137.695.625,00**	**97,67%**		**1.298.267.369,00**		**1.350.746,00**	**0,13%**	0,00	**1.139.046.371,00**	**97,67%**
3.3.1.1	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	56,40	101.591,00	5.729.732,00	56,37	5.726.685,00	99,95%	56,40	5.729.732,00		0,00	0,00%	56,37	5.726.685,00	99,95%
3.3.1.2	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	19,81	238.519,00	4.677.358,00	17,21	4.104.912,00	87,76%	19,61	4.677.358,00		0,00	0,00%	17,21	4.104.912,00	87,76%
3.3.1.3	303	Demolicion manual en roca	m3	6,36	326.510,00	2.076.604,00	6,50	2.122.315,00	100,00%	6,50	2.122.315,00		0,00	0,00%	6,50	2.122.315,00	100,00%
3.3.1.4	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	607,00	1.915,00	1.162.405,00	136,96	262.276,00	22,56%	904,84	1.732.769,00		0,00	0,00%	136,96	262.276,00	15,14%
3.3.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.673,97	19.220,00	32.173.819,00	2.280,47	43.830.633,00	90,32%	2.524,67	48.528.001,00		0,00	0,00%	2.280,47	43.830.633,00	90,32%
3.3.1.6	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornes)	m3	175,39	1.657.370,00	290.689.439,00	231,90	384.344.103,00	99,16%	233,87	387.610.365,00		0,00	0,00%	231,90	384.344.103,00	99,16%
3.3.1.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	2,73	1.265.396,00	3.448.637,00	4,53	5.732.244,00	100,00%	4,53	5.732.244,00		0,00	0,00%	4,53	5.732.244,00	100,00%
3.3.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	50,00	2.216.828,00	110.841.300,00	135,50	300.379.923,00	100,00%	173,75	385.173.518,00		0,00	0,00%	135,50	300.379.923,00	77,99%
3.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.186,48	11.447,00	128.051.682,00	23.771,13	272.108.125,00	97,11%	24.477,50	280.193.949,00	118,00	1.350.746,00	1,05%	23.889,13	273.458.871,00	97,80%
3.3.1.10	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,80 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	22,31	2.369.134,00	52.854.195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.11	833	Canal sección 1,20x0,80 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	100,30	328.443,00	32.942.833,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.12	805	Descole en gaviones (incluye excavación y relleno)	m	53,00	3.032.345,00	160.714.285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.13	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	405,00	458.207,00	185.573.835,00	64,00	29.325.248,00	15,80%	64,00	29.325.248,00		0,00	0,00%	64,00	29.325.248,00	100,00%
3.3.1.14	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) mat. selec de excavación	m3	355,48	49.324,00	17.533.853,00	716,70	35.350.511,00	84,35%	849,66	41.908.829,00		0,00	0,00%	716,70	35.350.511,00	84,35%
3.3.1.15	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	55,76	9.194,00	512.630,00	61,84	568.557,00	81,36%	76,01	698.808,00		0,00	0,00%	61,84	568.557,00	81,36%
3.3.1.16	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	4.463,85	2.381,00	10.628.431,00	2.064,87	4.916.455,00	46,26%	8.250,32	19.644.017,00		0,00	0,00%	2.064,87	4.916.455,00	25,03%
3.3.1.17	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.897,14	8.643,00	16.396.954,00	0,00	0,00	0,00%	2.172,00	18.772.589,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.3.1.18	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	18,10	1.293.498,00	0,00%	30,00	2.143.920,00		0,00	0,00%	18,10	1.293.498,00	60,33%
3.3.1.19	742	Concreto ciclópeo para piso y soleados	m3		797.275,00	0,00	60,50	47.830.138,00	0,00%	82,90	66.263.917,00		0,00	0,00%	60,50	47.830.138,00	72,98%
3.3.2		**BOX CULVERT**				**682.874.534,00**	0,00	**948.262.591,00**	**79,77%**		**1.265.168.696,00**		**48.709.748,00**	**8,36%**	0,00	**996.972.299,00**	**77,56%**
3.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	430,54	1.915,00	824.492,00	0,00	0,00	0,00%	430,54	824.492,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.2	204	Rocería y Limpieza	m2	430,54	2.071,00	891.857,00	0,00	0,00	0,00%	430,54	891.857,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	7,73	238.519,00	1.843.521,00	7,73	1.843.752,00	100,00%	18,13	4.324.349,00		0,00	0,00%	7,73	1.843.752,00	42,64%
3.3.2.4	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	29,37	193.409,00	5.680.244,00	53,20	10.289.359,00	25,17%	211,37	40.880.682,00		0,00	0,00%	53,20	10.289.359,00	25,17%
3.3.2.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	279,44	19.220,00	5.370.801,00	885,64	17.022.001,00	71,02%	1.247,00	23.967.304,00	100,00	1.922.000,00	35,79%	985,64	18.944.001,00	79,04%
3.3.2.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	277,57	71.464,00	19.836.182,00	0,00	0,00	0,00%	18,74	1.339.236,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	47,32	1.265.396,00	59.881.164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.8	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	2,64	2.252.436,00	5.941.931,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.9	730	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y estribos, bajo agua	m3	25,57	2.187.530,00	55.932.517,00	14,36	31.412.931,00	56,16%	34,19	74.785.417,00		0,00	0,00%	14,36	31.412.931,00	42,00%
3.3.2.10	1006	Muro pantalla en concreto 28 Mpa	m3	14,83	1.705.519,00	25.285.172,00	74,48	127.027.055,00	96,73%	77,00	131.319.846,00		0,00	0,00%	74,48	127.027.055,00	96,73%
3.3.2.11	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	43,89	1.849.526,00	81.170.388,00	126,88	234.667.859,00	98,38%	129,00	238.583.546,00		0,00	0,00%	126,88	234.667.859,00	98,38%
3.3.2.12	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	36,15	1.784.716,00	64.522.838,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.13	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	4,96	1.426.721,00	7.110.777,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.14	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	10.213,78	11.447,00	116.917.195,00	29.505,90	337.754.037,00	93,51%	31.553,00	361.187.191,00		0,00	0,00%	29.505,90	337.754.037,00	93,51%
3.3.2.15	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	18,44	47.513,00	876.140,00	0,00	0,00	0,00%	18,44	876.140,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.16	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	39,80	36.592,00	1.456.362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.17	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	11,30	405.580,00	4.581.899,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.18	805	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	184,68	10.718,00	1.979.063,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.19	1020	Tubo PVC Ø2" sanitario, para paso de Boraderos	m	6,00	17.144,00	102.864,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	102.864,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.20	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	12,14	393.912,00	4.783.667,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.969.560,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.21	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	68,28	349.143,00	23.836.402,00	17,10	5.970.345,00	25,05%	245,00	85.540.035,00		0,00	0,00%	17,10	5.970.345,00	6,98%
3.3.2.22	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	111,00	458.207,00	50.860.977,00	3,50	1.603.725,00	3,15%	25,00	11.455.175,00		0,00	0,00%	3,50	1.603.725,00	14,00%
3.3.2.23	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	54,60	590.592,80	32.246.387,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.24	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	409,07	9.194,00	3.760.959,00	7,73	71.070,00	1,89%	229,50	2.110.023,00		0,00	0,00%	7,73	71.070,00	3,37%
3.3.2.25	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	772,34	2.381,00	1.838.933,00	1.659,42	3.951.079,00	22,93%	7.236,80	17.230.809,00		0,00	0,00%	1.659,42	3.951.079,00	22,93%
3.3.2.26	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	617,87	8.643,00	5.340.242,00	0,00	0,00	0,00%	1.265,74	10.939.782,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00			0,00	0,00					0,00	0,00%
3.3.2.27	742	Concreto ciclopeo para piso y soleados	m3		797.275,00	0,00	63,70	50.149.418,00	0,00%	64,80	51.015.420,00		0,00	0,00%	63,70	50.149.418,00	98,30%
3.3.2.28	303	Demolicion manual en roca	m3		326.510,00	0,00	9,00	2.938.590,00	0,00%	16,36	5.341.704,00		0,00	0,00%	9,00	2.938.590,00	55,01%
3.3.2.29	1210	Mejoramiento sub resante con piedra rajon extendida, con transporte	m3		160.282,33	0,00	5,20	937.520,00	0,00%	143,00	25.781.803,00	18,00	3.245.262,00	0,00%	23,20	4.182.782,00	16,22%
3.3.2.30		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=60cm	m3		590.593,00	0,00	161,80	95.557.947,00	0,00%	261,00	154.144.773,00	62,90	37.148.300,00	0,00%	224,70	132.706.247,00	86,09%
3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	0,00	9.165,00	0,00	12,00	109.980,00	0,00%	213,00	1.952.145,00		0,00	0,00%	12,00	109.980,00	5,83%
3.3.2.32		Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	0,00	32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	1.178.784,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00	0,00	0,00%						0,00		0,00%
NP-06 3.3		Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi	m3		1.253.762,00	0,00	21,50	26.955.883,00		30,00	37.612.860,00	5,10	6.394.186,00	0,00%	26,60	33.350.069,00	88,67%
3.4		**OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA**				**1.838.402.409,00**		**980.354.072,00**	**86,16%**		**1.150.986.432,00**		**0,00**	**0,00%**		**980.354.072,50**	**86,16%**
3.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.362,13	1.915,00	4.523.479,00	0,00	0,00	0,00%	219,38	420.113,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2.362,13	2.071,00	4.891.971,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	28,66	238.519,00	6.836.666,00	16,40	3.911.712,00	57,22%	28,66	6.836.666,00		0,00	0,00%	16,40	3.911.712,00	57,22%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 | 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 06-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.4.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	14,30	101.591,00	1.452.751,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.679,72	19.220,00	32.284.295,00	4.256,00	81.800.320,00	59,01%	7.212,53	138.624.815,00		0,00	0,00%	4.256,00	81.800.320,00	59,01%
3.4.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	773,40	71.464,00	55.270.150,00	0,00	0,00	0,00%	4,50	321.588,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	22,68	1.265.396,00	28.703.294,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o straque + afirmado	m	68,10	2.216.826,00	150.970.284,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.434,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.9	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornes)	m3	84,49	1.657.370,00	140.029.886,00	217,80	360.975.186,00	100,00%	217,80	360.975.186,00		0,00	0,00%	217,80	360.975.186,00	100,00%
3.4.10	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	105,21	1.657.645,00	174.400.830,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.11	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	37,74	110.030,20	4.152.540,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	6.601.812,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.12	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	81,06	1.784.716,00	144.695.850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.13	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	36,38	1.596.819,00	58.096.267,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.14	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	16,83	1.426.721,00	24.011.714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.15	1020	Tubo PVC Ø2" sanitario, para paso de filtraderos	m	40,26	17.144,00	690.217,00	0,00	0,00	0,00%	30,52	523.235,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.16	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	23.578,00	11.447,00	269.897.366,00	31.869,00	364.804.443,00	100,00%	31.869,00	364.804.443,00		0,00	0,00%	31.869,00	364.804.443,00	100,00%
3.4.17	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	88,00	32.744,00	2.881.472,00	61,00	1.997.384,00	69,32%	74,80	2.449.251,00		0,00	0,00%	61,00	1.997.384,00	81,55%
3.4.18	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	1.443,96	12.873,90	18.589.654,00	0,00	0,00	0,00%	0,04	515,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.19	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) mat. selec de excavación	m3	58,79	49.324,00	2.899.561,00	560,52	27.647.164,00	93,14%	601,82	29.684.007,00		0,00	0,00%	560,52	27.647.164,00	93,14%
3.4.20	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	91,85	383.912,00	36.180.817,00	39,50	15.559.524,00	43,00%	41,56	16.369.407,00		0,00	0,00%	39,50	15.559.524,00	95,05%
3.4.21	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	323,75	17.925,75	5.803.496,00	4,00	71.703,00	1,24%	20,00	358.515,00		0,00	0,00%	4,00	71.703,00	20,00%
3.4.22	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	155,19	349.143,00	54.183.502,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.23	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	143,73	405.590,00	58.295.451,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.24	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	30,60	3.032.345,00	92.789.757,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.25	1002	Gaviones revestidos por dos caras, cimentado en ciclópeo, muro de confinamiento	m3	6,00	1.618.029,00	9.708.174,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.26	814	Gradas disipadoras sección 1,5x2,0 con sacos (50x80) rellenos con suelo/cemento 1:5, mas arena de rio	m	44,19	281.906,00	12.457.426,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.27	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energia en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	14,10	234.428,00	3.305.435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.28	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,80 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	16,95	2.369.134,00	39.452.715,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.29	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	5,14	2.252.438,00	11.568.522,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.30	1318	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	5,36	2.382.438,00	12.769.868,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.31	840	Canal sección 2,40x0,80 en sacos (1,20x2,40 y 0,50x0,60) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	8,20	394.178,00	3.232.260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.32	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	158,34	122.011,00	19.319.222,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.33	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	285,00	451.972,50	128.812.163,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.34	811	Trincho en madera vertical H=1,80 D= 3-4"	m	20,00	85.732,90	1.714.658,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.35	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	398,00	458.207,00	182.386.386,00	96,30	44.125.334,00	24,20%	101,00	46.278.907,00		0,00	0,00%	96,30	44.125.334,00	96,35%
3.4.36	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	402,64	9.194,00	3.703.754,00	0,00	0,00	0,00%	28,66	263.527,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.37	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	5.595,26	2.381,00	13.322.354,00	12.511,00	29.788.691,00	57,82%	21.637,59	51.519.088,00		0,00	0,00%	12.511,00	29.788.691,00	57,82%
3.4.38	505	Extandido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.561,40	8.643,00	22.138.201,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	25.929.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.4.39	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	59,40	46.763.946,00	0,00%	122,03	96.071.168,00		0,00	0,00%	59,40	46.763.946,00	48,68%
3.4.40	1.226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	301,00	2.758.665,00	0,00%	322,94	2.959.745,00		0,00	0,00%	301,00	2.758.665,00	93,21%
3.5		OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES				1.312.765.873,00		276.796.574,00	27,66%		1.000.735.900,00		0,00	0,00%		276.796.574,00	27,66%
3.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	3.438,58	1.915,00	6.584.879,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	3.438,58	2.071,00	7.121.297,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	13,91	238.519,00	3.317.509,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	122,75	101.591,00	12.470.295,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	6.803,47	19.220,00	169.202.659,00	332,50	6.390.650,00	3,78%	1.500,00	28.830.000,00		0,00	0,00%	332,50	6.390.650,00	22,17%
3.5.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	307,85	71.464,00	21.996.021,00	6,00	428.784,00	1,95%	50,00	3.573.200,00		0,00	0,00%	6,00	428.784,00	12,00%
3.5.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	30,66	1.265.396,00	38.793.285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o straque + afirmado	m	48,92	2.216.826,00	108.442.694,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.9	842	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena + straque + afirmado	m	45,00	681.227,97	30.655.259,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.10	843	Tubería de PVC Ø20", incluye instalación	m	41,60	590.000,00	24.544.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.11	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornes)	m3	137,67	1.657.370,00	228.501.991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.12	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	41,35	36.592,00	1.513.262,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.13	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	21,78	1.784.716,00	38.865.011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.14	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	2,91	1.712.800,00	4.987.674,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.15	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	10.083,42	11.447,00	115.424.910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.16	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	20,00	12.873,90	257.478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.17	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	119,94	17.925,75	2.149.935,00	2,00	35.852,00	1,67%	370,00	6.632.528,00		0,00	0,00%	2,00	35.852,00	0,54%
3.5.18	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2,00	405.590,00	811.180,00	4,00	1.622.360,00	9,30%	43,00	17.440.370,00		0,00	0,00%	4,00	1.622.360,00	9,30%
3.5.19	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	13,20	3.032.345,00	40.026.954,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION Nº07 noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.5.20	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuezo de 3/8"	m	4,00	234.428,00	937.712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.21	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	8,35	2.369.134,00	19.772.792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.22	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelto con agromanto Ø15cm	m	180,00	16.660,50	2.998.890,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.23	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2	201,40	39.092,00	7.873.129,00	459,00	17.943.228,00	45,90%	1.000,00	39.092.000,00		0,00	0,00%	459,00	17.943.228,00	45,90%
3.5.24	1402	Cultivo con hidrosiembra	m2	2.263,42	32.687,80	73.985.849,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.25	1317	Empradizado con cespedon, instalado y funcionando	m2	29,64	29.136,30	863.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.26	1405	Revegetalizacion de talud con manto permanente	m2	83,02	98.084,50	8.141.315,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.27	836	Canal sección 2,40x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	36,60	415.333,00	15.201.166,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.28	840	Canal sección 2,40x0,80 en sacos (1,20x2,40 y 0,50x0,60) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	14,68	394.178,00	5.786.533,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.29	812	Cunetas en sacos de 120x240 rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1	m	35,80	364.129,00	13.035.818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.30	829	Cunetas en sacos de 80x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	99,50	122.011,00	12.140.095,00	0,00	0,00	0,00%	50,18	6.122.279,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.31	902	Sub drenes horizontales en tuberia pvc Ø2"	m	300,00	451.972,50	135.591.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.32	811	Trinche en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	9,96	85.732,90	855.614,00	25,40	2.177.616,00	25,40%	100,00	8.573.290,00		0,00	0,00%	25,40	2.177.616,00	25,40%
3.5.33	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	191,94	218.765,10	41.986.789,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.34	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	12,00	458.207,00	5.498.484,00	30,00	13.746.210,00	6,98%	430,00	197.029.010,00		0,00	0,00%	30,00	13.746.210,00	6,98%
3.5.35	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	339,25	9.194,00	3.119.083,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.36	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	11.760,46	2.381,00	28.001.645,00	77,00	183.337,00	0,65%	21.916,75	52.188.544,00		0,00	0,00%	77,00	183.337,00	0,35%
3.5.37	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9.408,36	8.643,00	81.316.494,00	2.198,00	18.997.314,00	23,36%	6.000,00	51.858.000,00		0,00	0,00%	2.198,00	18.997.314,00	36,63%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.5.38	1404	Cubrir talud con geomento permenente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00	0,00	2.165,80	195.727.678,00	0,00%	4.348,58	392.969.872,00		0,00	0,00%	2.165,80	195.727.678,00	49,80%
3.5.39	742	Concreto ciclopeo para piso y soleados	m3		787.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32,93	25.928.540,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.40	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	158,00	1.448.070,00	0,00%	597,00	5.471.505,00		0,00	0,00%	158,00	1.448.070,00	26,47%
3.5.41	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	40,00	1.309.760,00	0,00%	50,00	1.637.200,00		0,00	0,00%	40,00	1.309.760,00	80,00%
3.5.42	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	0,00	393.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	7.878.240,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		
NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	m		118.043,00		142,20	16.785.715,00	0,00%	1.317,28	155.493.322,00		0,00	0,00%	142,20	16.785.715,00	10,80%
3.6		PUNTOS CRITICOS				1.876.321.281,00		722.169.463,00	67,22%		1.074.368.234,00		0,00	0,00%		722.169.463,00	67,22%
3.6.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.696,81	1.915,00	3.249.391,00	0,00	0,00	0,00%	1.137,90	2.179.086,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.197,44	2.071,00	2.479.895,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	24,73	236.519,00	5.896.511,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	17,70	101.591,00	1.798.161,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	2.111,89	19.220,00	40.590.601,00	1.461,80	28.091.952,00	69,21%	2.381,00	45.762.895,00		0,00	0,00%	1.461,80	28.091.952,00	61,39%
3.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	79,35	71.464,00	5.670.668,00	18,30	1.307.791,00	23,06%	229,10	16.372.402,00		0,00	0,00%	18,30	1.307.791,00	7,96%
3.6.7	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	86,00	96.858,84	8.329.860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.8	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	92,00	2.215.149,90	203.793.791,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.9	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	148,66	1.368.572,54	203.452.218,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.10	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	23,00	1.972.830,24	45.375.096,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.11	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	23,00	2.444.680,47	56.227.651,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.12	702	Concreto 24,5 Mpa para viga cabezal	m3	71,40	1.579.715,96	112.791.720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.13	209	Desmontar o desarmar gaviones	m3	14,09	43.978,00	619.650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	19,46	1.265.396,00	24.656.203,00	0,20	253.079,00	1,03%	17,84	22.574.415,00		0,00	0,00%	0,20	253.079,00	1,12%
3.6.15	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	33,50	2.216.828,00	74.263.671,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.16	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornes)	m3	35,07	1.657.370,00	58.117.171,00	38,00	62.980.060,00	68,84%	55,20	91.488.824,00		0,00	0,00%	38,00	62.980.060,00	68,84%
3.6.17	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	35,10	1.596.819,00	56.048.347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.18	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	79,85	1.657.645,00	132.358.718,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.19	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	11,80	1.426.721,00	16.835.308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.20	1020	Tubo PVC Ø32¨ sanitario, para paso de iloraderos	m	17,00	17.144,00	291.448,00	0,00	0,00	0,00%	5,60	96.006,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.21	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación).	Kg	33.407,27	11.447,00	382.413.074,00	3.174,00	36.332.778,00	9,50%	6.700,00	76.694.900,00		0,00	0,00%	3.174,00	36.332.778,00	47,37%
3.6.22	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	144,14	9.165,00	1.321.043,00	1.044,00	9.568.260,00	63,66%	1.640,00	15.030.600,00		0,00	0,00%	1.044,00	9.568.260,00	63,66%
3.6.23	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	700,45	12.873,90	9.017.523,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.24	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	328,82	405.580,00	133.383.036,00	1,30	527.267,00	0,40%	2,00	811.160,00		0,00	0,00%	1,30	527.267,00	95,00%
3.6.25	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	42,00	180.292,33	7.572.278,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.26	1228	Manto geotextil tejido R-41Kn/m para muro tierra armada	m2	428,72	18.009,00	7.720.818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.27	1027	Refuerzo para muro mecanicamente estabilizado en malla metalica INVIAS tipo 1, largo 3 mt, altura =0.5m	m	42,00	400.876,00	16.836.792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.28	1028	Refuerzo para muro mecanicamente estabilizado en malla metalica INVIAS tipo 1, largo 3.5 mt, altura =0.5m	m	14,00	415.181,00	5.812.534,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.29	508	Relleno compactado con material tipo recebo para Muros mecanicamente reforzados	m3	68,60	380.952,00	24.761.307,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.30	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	196,50	10.716,00	2.105.694,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.31	1233	Relleno para terraplen de acceso, suministro y compactado	m3	132,28	327.234,27	43.286.549,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

186

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.6.32	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	48,65	49.324,00	2.409.379,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.33	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	6,00	3.032.345,00	18.194.070,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.34	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en grades (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	1,60	234.428,00	375.085,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.35	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	178,40	458.207,00	81.744.129,00	311,40	142.685.860,00	97,31%	320,00	146.626.240,00		0,00	0,00%	311,40	142.685.860,00	97,31%
3.6.36	1002	Gaviones revestidos por dos caras, cimentado en ciclópeo, muro de confinamiento	m3	1,50	1.618.029,00	2.427.044,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.37	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	276,31	90.372,00	24.970.687,00	808,20	73.036.850,00	87,86%	919,87	83.130.482,00		0,00	0,00%	808,20	73.036.850,00	87,86%
3.6.38	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	7,00	328.443,00	2.299.101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.39	832	Grades disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	4,86	2.369.134,00	11.513.991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.40	1502	Enrocado con piedra RIP-RAP para espigones, control de socavacion	m3	18,00	333.048,00	5.994.828,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.41	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y techos de rios, e=30cm	m3	138,26	590.592,80	81.655.361,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.42	1311	Concreto 17,5MPa húmedo, lanzado sobre taludes temporalmente + malla electrosoldada 6mm	m3	14,70	1.991.467,48	29.274.572,00	0,00	0,00	0,00%	21,55	42.916.124,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.43	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	257,94	9.194,00	2.371.540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.44	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.223,71	2.381,00	5.294.646,00	344,00	819.064,00	15,47%	7.391,83	17.599.468,00		0,00	0,00%	344,00	819.064,00	4,65%
3.6.45	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.367,10	8.643,00	20.718.115,00	0,00	0,00	0,00%	2.111,89	18.253.099,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.6.46	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		393.912,00	0,00	176,60	69.564.859,00	0,00%	242,26	95.429.121,00		0,00	0,00%	176,60	69.564.859,00	72,90%
3.6.47	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3		17.925,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	490,10	8.785.408,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.48	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3		349.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.49	840	Canal sección 2,40x0,80 en sacos (1,20x2,40 y 0,50x0,80) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m		394.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.50	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m		110.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	22,00	2.420.664,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.51	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2		23.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.52	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	279,30	9.145.399,00	0,00%	338,30	11.077.295,00		0,00	0,00%	279,30	9.145.399,00	82,56%
3.6.53	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	20,50	16.139.138,00	0,00%	37,82	29.774.741,00		0,00	0,00%	20,50	16.139.138,00	54,20%
3.6.54		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.55		Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m		451.972,50		202,00	91.298.445,00	0,00%	220,00	99.433.950,00		0,00	0,00%	202,00	91.298.445,00	91,82%
3.6.56	1316	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3		2.382.438,00		4,10	9.767.996,00	0,00%	21,55	51.341.539,00		0,00	0,00%	4,10	9.767.996,00	19,03%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-02 3.6		Anclajes pasivos de 1" incluye suministro, perforación e inyección, tuercs y platina abovedada 15x15	m		262.118,38	0,00	651,00	170.639.065,00	0,00%	750,00	196.588.785,00		0,00	0,00%	651,00	170.639.065,00	86,80%
3.7		MOVIMIENTO DE TIERRAS				175.454.138,00		113.802.963,00	56,79%		204.018.462,00		0,00	0,00%		113.802.963,00	56,78%
3.7.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	3.813,45	19.220,00	73.294.509,00	4.663,50	89.632.470,00	93,12%	5.008,00	96.253.790,00		0,00	0,00%	4.663,50	89.632.470,00	93,12%
3.7.2	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	1.505,65	49.324,00	74.274.545,00	0,00	0,00	0,00%	461,10	22.743.296,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.7.3	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.999,88	2.381,00	7.142.714,00	10.151,40	24.170.483,00	57,92%	17.528,00	41.734.168,00		0,00	0,00%	10.151,40	24.170.483,00	57,92%
3.7.4	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.369,90	8.643,00	20.742.370,00	0,00	0,00	0,00%	5.008,00	43.284.176,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.8		PAVIMENTOS				3.194.541.820,05		2.264.908.734,00	62,14%		3.644.728.171,00		599.846.799,00	16,46%		2.864.755.511,00	78,60%
3.8.1	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	8.000,00	12.873,90	102.991.200,00	3.402,80	43.807.307,00	42,54%	8.142,83	104.829.975,00		0,00	0,00%	3.402,80	43.807.307,00	41,79%
3.8.2	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.400,00	405.590,00	973.416.000,00	1.956,30	805.623.417,00	82,78%	2.035,71	825.662.574,00		0,00	0,00%	1.956,30	805.623.417,00	97,57%
3.8.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.100,00	422.873,00	888.033.300,00	1.965,80	831.283.743,00	93,61%	2.035,71	860.845.706,00		0,00	0,00%	1.965,80	831.283.743,00	96,57%
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion	m2	7.000,00	12.867,00	88.869.000,00	2.402,50	30.432.468,00	34,32%	8.142,83	103.145.224,00	961,80	12.183.121,00	13,74%	3.364,30	42.615.588,00	41,32%
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	840,00	1.358.846,00	1.141.432.320,00	156,20	212.252.058,00	18,60%	1.017,85	1.383.108.481,00	422,40	573.977.395,00	50,29%	578,60	786.229.453,00	56,65%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.8.6	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida	m3		180.292,33	0,00	1.894,20	341.509.731,00	0,00%	1.898,18	342.227.295,00		0,00	0,00%	1.894,20	341.509.731,00	99,79%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2		3.059,00		0,00	0,00	0,00%	8.142,83	24.908.916,00	4.474,10	13.686.272,00	0,00%	4.474,10	13.686.272,00	54,95%
3.9		SEÑALIZACION VIAL				109.191.415,00		97.058.080,00	35,59%		272.901.429,00		0,00	0,00%		97.058.080,00	35,58%
3.9.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1,49	71.464,00	106.124,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.2	1101	Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un	48,00	525.144,60	25.206.941,00	0,00	0,00	0,00%	75,00	39.385.845,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.3	1102	Demarcación horizontal	km	3,00	3.089.213,75	9.267.641,00	0,00	0,00	0,00%	3,00	9.267.641,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.4	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	795,00	13.140,04	10.445.335,00	0,00	0,00	0,00%	378,00	4.966.936,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.5	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	9,00	389.230,40	3.503.074,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	14.012.294,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.6	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m	100,00	606.613,00	60.661.300,00	160,00	97.058.080,00	66,67%	240,00	145.587.120,00		0,00	0,00%	160,00	97.058.080,00	66,67%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-08 3.9		Suministro e instalacion de estoperol	Un		7.757,00		0,00	0,00	0,00%	4.725,00	36.651.825,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-09 3.9		Delineador vial tipo corona	Un		109.761,00		0,00	0,00	0,00%	90,00	9.878.490,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-10 3.9		Marca vial con pintura en frio	m2		64.292,00		0,00	0,00	0,00%	203,00	13.051.276,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

187

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALE S	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.10		OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL				111.954.833,00		192.603.480,00	46,40%		434.232.432,00		0,00	0,00%		192.603.480,00	46,40%
3.10.1	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tronco	un	245,00	205.997,00	50.469.265,00	58,00	11.947.826,00	23,67%	245,00	50.469.265,00		0,00	0,00%	58,00	11.947.826,00	23,67%
3.10.2	1401	Arborización con especies nativas	Un	1.225,00	50.192,30	61.485.568,00	0,00	0,00	0,00%	1.225,00	61.485.568,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.10.3	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		1.265.396,00	0,00	1,20	1.518.475,00	0,00%	7,00	8.857.772,00		0,00	0,00%	1,20	1.518.475,00	17,14%
3.10.4	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	12,00	9.447.300,00	0,00%	32,20	25.350.255,00		0,00	0,00%	12,00	9.447.300,00	37,27%
3.10.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 6x12 C.12 suministro y construcción	m3		458.207,00	0,00	218,00	99.889.126,00	0,00%	293,46	134.463.780,00		0,00	0,00%	218,00	99.889.126,00	74,29%
3.10.6	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	275,00	9.004.600,00	0,00%	340,00	11.132.960,00		0,00	0,00%	275,00	9.004.600,00	80,88%
3.10.7	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2		23.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.10.8	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		393.912,00	0,00	129,30	50.932.822,00	0,00%	170,00	66.965.040,00		0,00	0,00%	129,30	50.932.822,00	76,08%
3.10.9	1410	Revegetalizacion con semillas agrícolas	m2		39.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.336,30	52.238.612,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.10.10	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	150,30	2.888.766,00	0,00%	204,00	3.920.880,00		0,00	0,00%	150,30	2.888.766,00	73,68%
3.10.11		Manto Geotextil no tejido 2500, 712lbs	m2		9.185,00		761,00	6.974.585,00	0,00%	1.020,00	9.348.300,00		0,00	0,00%	761,00	6.974.585,00	74,61%
3.11		OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL				92.024.481,00		0,00	0,00%		33.036.066,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
3.11.1	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	110,00	216.765,10	24.084.161,00	0,00	0,00	0,00%	34,00	7.438.013,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.11.2	1411	Tala, cargue y retiro de arboles de altura h= 3m a 15m y DAP mayor a 15cm.	und	96,00	205.997,00	19.775.712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.11.3	1401	Arborización con especies nativas	Un	960,00	50.192,30	48.164.608,00	0,00	0,00	0,00%	510,00	25.598.073,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4		ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920				12.935.982.169,00		128.676.634,00	1,38%		9.357.286.792,00		19.326.139,00	0,21%		199.981.670,00	2,13%
4.1		PRELIMINARES				70.156.370,00		0,00	0,00%		70.156.370,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	10.120,00	3.944,00	39.913.280,00	0,00	0,00	0,00%	10.120,00	39.913.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	3.680,00	2.071,00	7.621.280,00	0,00	0,00	0,00%	3.680,00	7.621.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	10,00	2.262.181,00	22.621.810,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	22.621.810,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				6.012.109.399,00		108.676.158,50	4,47%		2.433.934.026,00		19.326.139,00	0,79%		128.002.295,50	5,26%
4.2.1		ALCANTARILLAS				221.231.397,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	221.231.397,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	6,26	238.519,00	1.493.924,00	0,00	0,00	0,00%	6,26	1.493.924,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	6,90	101.591,00	700.978,00	0,00	0,00	0,00%	6,90	700.978,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	283,40	1.915,00	542.711,00	0,00	0,00	0,00%	283,40	542.711,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	271,92	19.220,00	5.226.277,00	0,00	0,00	0,00%	271,92	5.226.277,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.5	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	19,40	2.216.828,00	43.006.424,00	0,00	0,00	0,00%	19,40	43.006.424,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.6	219	Solado en concreto 17,5 Mpa	m3	6,01	1.265.396,00	7.607.561,00	0,00	0,00	0,00%	6,01	7.607.561,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.7	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	8,37	405.590,00	3.396.005,00	0,00	0,00	0,00%	8,37	3.396.005,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.8	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	2,40	2.252.436,00	5.405.851,00	0,00	0,00	0,00%	2,40	5.405.851,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.9	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornes)	m3	18,48	1.657.370,00	30.635.757,00	0,00	0,00	0,00%	18,48	30.635.757,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.10	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	8,33	1.715.841,00	14.296.420,00	0,00	0,00	0,00%	8,33	14.296.420,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.11	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	10,56	1.655.015,00	17.476.958,00	0,00	0,00	0,00%	10,56	17.476.958,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.12	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	1,60	1.578.724,00	2.525.958,00	0,00	0,00	0,00%	1,60	2.525.958,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.13	1020	Tubo PVC Ø2'' sanitario, para paso de Boraderos	m	3,80	17.144,00	65.147,00	0,00	0,00	0,00%	3,80	65.147,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.14	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	2.721,76	11.447,00	31.156.027,00	0,00	0,00	0,00%	2.721,76	31.156.027,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.15	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	1,20	787.275,00	944.730,00	0,00	0,00	0,00%	1,20	944.730,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.16	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	93,04	13.851,80	1.288.771,00	0,00	0,00	0,00%	93,04	1.288.771,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.17	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	8,00	393.912,00	3.151.296,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	3.151.296,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.18	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. sobo de excavación	m3	31,08	49.324,00	1.533.089,00	0,00	0,00	0,00%	31,08	1.533.089,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.19	841	Gradas disipadoras en concreto de 21MPa, incluye acero	m3	10,17	2.251.728,00	22.898.047,00	0,00	0,00	0,00%	10,17	22.898.047,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.20	740	Colchonetas enroscadas para control a la socavacion en orillas y fechos de rios, e=30cm	m3	5,47	590.592,80	3.231.724,00	0,00	0,00	0,00%	5,47	3.231.724,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.21	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	2,00	3.032.345,00	6.064.690,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	6.064.690,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.22	833	Canal sección 1,20x0,80 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	30,00	328.443,00	9.853.290,00	0,00	0,00	0,00%	30,00	9.853.290,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.23	1002	Gaviones revestidos por dos caras, cimentado en solado, muro de confinamiento	m3	0,75	1.618.029,00	1.213.522,00	0,00	0,00	0,00%	0,75	1.213.522,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.24	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	12,00	234.428,00	2.813.136,00	0,00	0,00	0,00%	12,00	2.813.136,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.25	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 6x12 C.12 suministro y construcción	m3	3,50	458.207,00	1.603.725,00	0,00	0,00	0,00%	3,50	1.603.725,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.26	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volquets	m3	10,23	9.194,00	94.033,00	0,00	0,00	0,00%	10,23	94.033,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.27	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	323,32	2.381,00	769.814,00	0,00	0,00	0,00%	323,32	769.814,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.28	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	258,65	8.643,00	2.235.532,00	0,00	0,00	0,00%	258,65	2.235.532,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2		CANALES PARALELOS DEBAJO DE CUNETA				396.291.236,00	0,00	0,00	0,00%		396.291.236,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	455,16	19.220,00	8.748.084,00	0,00	0,00	0,00%	455,16	8.748.084,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.2	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	28,44	1.265.396,00	35.982.421,00	0,00	0,00	0,00%	28,44	35.982.421,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.3	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornes)	m3	147,10	1.657.370,00	243.797.367,00	0,00	0,00	0,00%	147,10	243.797.367,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.4	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.781,46	11.447,00	100.521.382,00	0,00	0,00	0,00%	8.781,46	100.521.382,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.5	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	20,00	36.592,00	731.840,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	731.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.6	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	591,70	2.381,00	1.408.844,00	0,00	0,00	0,00%	591,70	1.408.844,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.7	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	473,36	8.643,00	4.091.268,00	0,00	0,00	0,00%	473,36	4.091.268,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				1.165.194.772,00	0,00	88.275.679,00	7,58%	0,00	1.165.194.772,00		0,00	0,00%	0,00	88.275.679,00	7,58%
4.2.3.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1.440,00	71.464,00	102.908.160,00	0,00	0,00	0,00%	1.440,00	102.908.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
4.2.3.2	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	3.154,00	23.615,00	74.481.710,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-602.340,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.3	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt	m	900,00	111.380,00	100.242.000,00	0,00	0,00	0,00%	855,77	95.315.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.4	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	996,00	393.912,00	392.336.352,00	224,10	88.275.679,00	22,50%	996,00	392.336.352,00		0,00	0,00%	224,10	88.275.679,00	22,50%
4.2.3.5	806	Cunetas concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación.	m3	90,00	1.477.118,00	132.940.620,00	0,00	0,00	0,00%	90,00	132.940.620,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.6	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m	1.162,00	47.513,00	55.210.106,00	0,00	0,00	0,00%	1.162,00	55.210.106,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.7	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20. Incluye refuerzo	m	900,00	233.544,00	210.189.600,00	0,00	0,00	0,00%	900,00	210.189.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	3.600,00	11.447,00	41.209.200,00	0,00	0,00	0,00%	3.600,00	41.209.200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.9	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	1.872,00	9.194,00	17.211.168,00	0,00	0,00	0,00%	1.872,00	17.211.168,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	9.360,00	2.381,00	22.286.160,00	0,00	0,00	0,00%	9.360,00	22.286.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.11	505	Extendido Humedacimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.872,00	8.643,00	16.179.696,00	0,00			1.872,00	16.179.696,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
4.2.3.12		Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00		415,00	13.588.760,00		540,00	17.681.760,00		0,00	0,00%	415,00	13.588.760,00	76,85%
4.2.3.13		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00		186,80	3.590.296,00		400,00	3.363.500,00		0,00	0,00%	186,80	3.590.296,00	0,00%
4.2.3.14		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		1.245,00	11.410.425,00		1.728,00	15.837.120,00		0,00	0,00%	1.245,00	11.410.425,00	0,00%
4.2.3.15		Demolicion manual en roca	m3		326.510,00		37,40	12.211.474,00		117,00	38.201.670,00		0,00	0,00%	37,40	12.211.474,00	0,00%
4.2.4		BOX CULVERT				651.826.620,00	0,00	0,00	0,00%		651.826.620,00		19.326.139,00	2,96%	0,00	19.326.139,00	2,96%
4.2.4.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	19,81	238.519,00	4.725.205,00	0,00	0,00	0,00%	19,81	4.725.205,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.2	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	356,42	1.915,00	682.548,00	0,00	0,00	0,00%	356,42	682.548,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	416,61	19.220,00	8.007.198,00	0,00	0,00	0,00%	416,61	8.007.198,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	15,17	1.285.398,00	19.196.057,00	0,00	0,00	0,00%	15,17	19.196.057,00	0,70	885.777,00	4,61%	0,70	885.777,00	4,61%
4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	41,91	1.654.832,00	69.358.250,00	0,00	0,00	0,00%	41,91	69.358.250,00	1,80	2.978.698,00	4,29%	1,80	2.978.698,00	4,29%
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantalles	m3	43,31	1.712.800,00	74.185.479,00	0,00	0,00	0,00%	43,31	74.185.479,00	3,00	5.138.400,00	6,93%	3,00	5.138.400,00	6,93%
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	32,48	1.849.526,00	60.077.691,00	0,00	0,00	0,00%	32,48	60.077.691,00	1,80	3.329.147,00	5,54%	1,80	3.329.147,00	5,54%
4.2.4.8	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	90,52	1.482.889,00	134.235.233,00	0,00	0,00	0,00%	90,52	134.235.233,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.9	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	200,80	36.592,00	7.347.674,00	0,00	0,00	0,00%	200,80	7.347.674,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.10	841	Gradas disipadoras en concreto de 21MPa, incluye acero	m3	3,59	2.251.728,00	8.072.445,00	0,00	0,00	0,00%	3,59	8.072.445,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	19.869,01	11.447,00	227.440.597,00	0,00	0,00	0,00%	19.869,01	227.440.597,00	611,00	6.994.117,00	3,08%	611,00	6.994.117,00	3,08%
4.2.4.12	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	51,48	590.582,80	30.403.717,00	0,00	0,00	0,00%	51,48	30.403.717,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.13	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	194,70	13.851,80	2.696.945,00	0,00	0,00	0,00%	194,70	2.696.945,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.14	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	19,81	9.194,00	182.139,00	0,00	0,00	0,00%	19,81	182.139,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.15	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	561,40	2.381,00	1.336.695,00	0,00	0,00	0,00%	561,40	1.336.695,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.16	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	449,12	8.643,00	3.881.747,00	0,00	0,00	0,00%	449,12	3.881.747,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5		MUROS Y OBRAS DE ACOMPAÑAMIENTO PUENTE				673.100.830,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	213,34	19.220,00	4.100.395,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.2	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	9,76	1.285.398,00	12.350.265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.3	1032	Concreto 24,5 MPa para muros, vástago y pantalles	m3	100,25	1.341.898,00	134.532.639,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.4	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.122,47	11.447,00	92.977.563,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.5	1020	Tubo PVC Ø2" sanitario, para paso de lloraderos	m	17,20	17.144,00	294.877,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C,12 suministro y construcción	m3	258,50	458.207,00	118.446.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.7	1228	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	340,25	9.165,00	3.118.391,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.8	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	546,27	17.925,75	9.792.335,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.9	1502	Enrocado con piedra RIP-RAP para espigones, control de socavacion	m3	573,92	333.046,00	191.141.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.10	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	272,00	13.851,80	3.767.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	277,34	2.381,00	660.351,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	221,87	8.643,00	1.917.654,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6		PUENTE JULIO ABSCISA K0+600 Longitud:40m				3.006.474.540,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.297,47	1.915,00	2.484.655,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.2	204	Roceria y Limpieza	m2	1.387,16	2.071,00	2.872.808,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	316,34	193.409,00	61.183.003,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.4	311	Desmonte y traslado de estructuras metalicas	kg	8.000,00	1.973,00	15.784.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.5	411	Excavación para estructuras con maquina, incluye cargue	m3	2.509,20	14.291,00	35.858.977,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.6	416	Excavación manual para pilas, profundidad 0 - 4mt, bajo agua	m3	46,37	1.962.689,00	91.009.708,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.7	417	Excavación manual para pilas, profundidad 4 - 12mt, bajo agua	m3	52,04	2.443.730,56	127.180.594,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.8	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	14,58	1.972.830,24	28.757.927,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.9	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 12mt	m3	15,83	2.444.680,47	38.706.159,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.10	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	94,72	1.368.572,54	129.629.848,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.11	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	12,39	1.285.398,00	15.683.318,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.12	748	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y estribos	m3	145,86	1.697.371,00	247.239.017,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.13	1627	Concreto 28 Mpa para topes sismicos y bloques de apoyo.	m3	4,28	1.962.838,00	8.404.676,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.14	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	100,94	1.849.526,00	186.694.653,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.15	1025	Concreto 35 MPa para losa y vigas VP	m3	178,45	1.971.944,00	347.949.519,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.16	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	17,36	1.578.724,00	27.394.019,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.17	1207	Concreto 21 Mpa para anden + vigas + tabiques, incluye refuerzo	m2	80,00	620.328,00	49.626.240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.18	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	24,06	1.482.869,00	35.681.535,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.19	1706	Acero de pre-esfuerzo, postensado	Ton/m	179,502,92	3.408,00	611.745.951,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.20	904	Drenaje de tablero 4" L=1,50m, con rejilla	UN	22,00	103.334,50	2.273.359,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR		CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
4.2.6.21	1236	Estructura baranda Peatonal en tubo metalico, h=1,2 fy322psi, Seis lineas de tubos + paral (para Puentes)	m	80,00	606.927,00	48.554.160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.22	1234	Estructura baranda metalica Ø2" para peaton, h=1,2 fy322 psi, de un solo tubo, incrustado New jersey	m	80,00	236.708,00	18.936.640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.23	1636	Apoyo en neopreno D-80 reforzado con platina A36 3mm (400x600x113mm)	un	8,00	2.118.321,00	16.946.568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.24	1637	Apoyo en neopreno D-80 (200x200x20mm)	un	4,00	165.224,00	660.896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.25	1625	Junta elastomerica para puentes D-80 pernada c/u 30cm, E=4,5cm elongacio rotura >300%, pernos de 15cm Ø7/8"	m	23,00	978.275,20	22.500.330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.26	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	67.171,01	11.447,00	768.906.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.27	503	Relleno con material seleccionado de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	247,66	17.925,75	4.439.491,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.28	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	444,28	9.194,00	4.084.688,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.29	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	3.458,58	2.381,00	8.234.873,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.30	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.766,66	8.643,00	23.913.989,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.31	224	Prueba de carga estática, para puentes	un	1,00	9.322.945,80	9.322.946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.32	226	Pre-Prueba de carga estática, para puentes	un	1,00	8.762.235,80	8.762.236,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.33	227	Prueba de carga para vigas pos-tensadas	un	1,00	4.058.962,20	4.058.962,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3		OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA				3.742.649.660,00		0,00	0,00%		3.742.649.660,00			0,00	0,00%		0,00	0,00%
4.3.1		SUPERESTRUCTURA EN VOLADIZO				3.018.754.289,00	0,00	0,00	0,00%		3.018.754.289,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.159,06	1.915,00	4.134.600,00	0,00	0,00	0,00%	2.159,06	4.134.600,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.354,00	2.071,00	2.804.134,00	0,00	0,00	0,00%	1.354,00	2.804.134,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	6,83	193.409,00	1.320.171,00	0,00	0,00	0,00%	6,83	1.320.171,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.4	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	452,70	3.944,00	1.785.449,00	0,00	0,00	0,00%	452,70	1.785.449,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	65,95	71.464,00	4.712.908,00	0,00	0,00	0,00%	65,95	4.712.908,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.6	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	607,78	19.220,00	11.681.532,00	0,00	0,00	0,00%	607,78	11.681.532,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.7	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	190,85	96.858,84	18.485.679,00	0,00	0,00	0,00%	190,85	18.485.679,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.8	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	143,14	2.215.149,80	317.073.932,00	0,00	0,00	0,00%	143,14	317.073.932,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.9	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	28,14	1.265.396,00	35.603.182,00	0,00	0,00	0,00%	28,14	35.603.182,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.10	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o straque + afirmado	m	35,70	2.216.826,00	79.140.688,00	0,00	0,00	0,00%	35,70	79.140.688,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.11	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y otros)	m3	8,97	1.657.370,00	14.869.196,00	0,00	0,00	0,00%	8,97	14.869.196,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.12	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	47,50	1.972.830,24	93.711.174,00	0,00	0,00	0,00%	47,50	93.711.175,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.13	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 12mt	m3	35,63	2.444.660,47	87.093.357,00	0,00	0,00	0,00%	35,63	87.093.357,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.14	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	250,86	1.368.572,54	343.325.619,00	0,00	0,00	0,00%	250,86	343.325.619,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.15	1016	Viga cabezal en concreto 28 Mpa	m3	259,20	1.654.742,00	428.909.126,00	0,00	0,00	0,00%	259,20	428.909.126,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.16	748	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y estribos	m3	5,04	1.697.371,00	8.554.750,00	0,00	0,00	0,00%	5,04	8.554.750,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.17	1032	Concreto 24,5 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	5,25	1.341.938,00	7.045.175,00	0,00	0,00	0,00%	5,25	7.045.175,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.18	1222	Viga acartelada en concreto 28Mpa	m3	23,80	1.727.784,26	41.121.266,00	0,00	0,00	0,00%	23,80	41.121.266,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.19	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	51,00	1.849.526,00	94.325.826,00	0,00	0,00	0,00%	51,00	94.325.826,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.20	1015	Concreto 28Mpa Columnas, Viga corona y Vástago	m3	37,80	1.654.832,00	62.552.650,00	0,00	0,00	0,00%	37,80	62.552.650,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.21	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	22,75	1.578.724,00	35.919.128,00	0,00	0,00	0,00%	22,75	35.919.128,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.22	833	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	12,22	2.369.134,00	28.950.817,00	0,00	0,00	0,00%	12,22	28.950.817,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.23	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energia en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	0,18	234.428,00	41.353,00	0,00	0,00	0,00%	0,18	41.353,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.24	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	83.745,76	11.447,00	958.637.757,00	0,00	0,00	0,00%	83.745,76	958.637.757,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.25	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	10,00	49.324,00	493.240,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	493.240,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.26	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	143,60	369.143,00	53.008.935,00	0,00	0,00	0,00%	143,60	53.008.935,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.27	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	0,18	787.275,00	143.284,00	0,00	0,00	0,00%	0,18	143.284,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.28	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	112,52	590.592,80	66.452.321,00	0,00	0,00	0,00%	112,52	66.452.321,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.29	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	18,90	393.912,00	7.444.937,00	0,00	0,00	0,00%	18,90	7.444.937,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.30	1228	Manto Geotextil no tejido 2500, 712lbn	m2	205,20	9.185,00	1.885.658,00	0,00	0,00	0,00%	205,20	1.885.658,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.31	801	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt	m	108,00	111.360,00	12.029.040,00	0,00	0,00	0,00%	108,00	12.029.040,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.32	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	96,00	248.765,10	23.881.450,00	0,00	0,00	0,00%	96,00	23.881.450,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.33	1305	Empradizado con pasto vetiver, instalado y funcionando	m2	178,18	33.198,00	5.915.220,00	0,00	0,00	0,00%	178,18	5.915.220,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.34	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	20,47	90.372,00	1.849.915,00	0,00	0,00	0,00%	20,47	1.849.915,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.35	1403	Cartucho cortaflujo en veras de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	79,84	16.660,50	1.330.174,00	0,00	0,00	0,00%	79,84	1.330.174,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.36	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	290,00	451.972,50	131.072.025,00	0,00	0,00	0,00%	290,00	131.072.025,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.37	903	Estructura de descole para recibo del sub dren, en concreto reforzado, según planos	UN	9,00	727.215,80	6.544.942,00	0,00	0,00	0,00%	9,00	6.544.942,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.38	1401	Arborización con especies nativas	Un	150,00	50.192,30	7.528.845,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	7.528.845,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.39	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	510,01	9.194,00	4.689.040,00	0,00	0,00	0,00%	510,01	4.689.040,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.40	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.151,20	2.381,00	2.741.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.151,20	2.741.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.41	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.151,20	8.643,00	9.949.794,00	0,00	0,00	0,00%	1.151,20	9.949.794,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2		OBRAS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES				723.895.371,00	0,00	0,00	0,00%		723.895.371,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	574,00	3.944,00	2.263.856,00	0,00	0,00	0,00%	574,00	2.263.856,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.2	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	636,00	1.915,00	1.221.770,00	0,00	0,00	0,00%	636,00	1.221.770,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.3	204	Rocería y Limpieza	m2	1.487,18	2.071,00	3.079.950,00	0,00	0,00	0,00%	1.487,18	3.079.950,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

190

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO: CANT CONTRACTUALE $	V/R UNIT	V/R PARC	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES: CANT	VALOR	%	MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025: CANT	VALOR	ACTA PARCIAL No. 12: CANT	V/R PARC	%	EJECUTADO ACUMULADO: CANT	VALOR	%
4.3.2.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.907,92	19.220,00	36.670.299,00	0,00	0,00	0,00%	1.907,92	36.670.299,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	376,53	71.464,00	26.908.483,00	0,00	0,00	0,00%	376,53	26.908.483,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.6	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	8,58	1.265.396,00	10.859.628,00	0,00	0,00	0,00%	8,58	10.859.628,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.7	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	20,00	2.216.826,00	44.336.520,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	44.336.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.8	1007	Concreto 28 MPs para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornas)	m3	28,71	1.457.370,00	44.260.364,00	0,00	0,00	0,00%	28,71	44.260.364,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.9	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	9,78	2.369.134,00	23.160.654,00	0,00	0,00	0,00%	9,78	23.160.654,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.10	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energia en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	0,28	234.428,00	64.983,00	0,00	0,00	0,00%	0,28	64.983,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	3.620,51	11.447,00	41.443.991,00	0,00	0,00	0,00%	3.620,51	41.443.991,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.12	830	Gradas disipadoras sección 1,20x0,60 con sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	15,50	368.783,80	5.716.149,00	0,00	0,00	0,00%	15,50	5.716.149,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.13	831	Gradas disipadoras sección 0,60x0,60 con sacos (0,60x0,50) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	10,00	316.493,80	3.164.938,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	3.164.938,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.14	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C,12 suministro y construccion	m3	256,00	458.207,00	117.300.992,00	0,00	0,00	0,00%	256,00	117.300.992,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.15	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat, selec de excavación	m3	10,59	49.324,00	522.095,00	0,00	0,00	0,00%	10,59	522.095,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.16	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	8,70	369.143,00	3.211.544,00	0,00	0,00	0,00%	8,70	3.211.544,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.17	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	27,00	405.590,00	10.950.930,00	0,00	0,00	0,00%	27,00	10.950.930,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.18	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	873,40	13.851,80	12.098.162,00	0,00	0,00	0,00%	873,40	12.098.162,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.19	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	9,30	3.032.345,00	28.200.809,00	0,00	0,00	0,00%	9,30	28.200.809,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.20	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	0,90	787.275,00	710.122,00	0,00	0,00	0,00%	0,90	710.122,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.21	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	369,00	16.660,50	6.147.725,00	0,00	0,00	0,00%	369,00	6.147.725,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.22	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	14,40	590.592,80	8.504.536,00	0,00	0,00	0,00%	14,40	8.504.536,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.23	1017	Gaviones en saco de L=3mt Ø0,65mt malla (10X12) cal. 3mm triple torsión	m3	10,95	412.854,00	4.522.017,00	0,00	0,00	0,00%	10,95	4.522.017,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.24	1302	Revestimiento de talud con geomanta tridimensional e=1cm	m2	22,50	46.003,70	1.035.083,00	0,00	0,00	0,00%	22,50	1.035.083,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.25	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	236,50	248.765,10	58.832.946,00	0,00	0,00	0,00%	236,50	58.832.946,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.26	1305	Empradizado con pasto vetiver, instalado y funcionando	m2	155,00	33.196,00	5.145.690,00	0,00	0,00	0,00%	155,00	5.145.690,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.27	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	30,80	90.372,00	2.783.458,00	0,00	0,00	0,00%	30,80	2.783.458,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.28	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø3"	m	345,00	451.972,50	155.930.513,00	0,00	0,00	0,00%	345,00	155.930.513,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.29	903	Estructura de descole para recibo del sub dren, en concreto reforzado, según planos	UN	34,00	727.215,80	24.725.337,00	0,00	0,00	0,00%	34,00	24.725.337,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.30	1401	Arborización con especies nativas	Un	230,00	50.192,30	11.544.229,00	0,00	0,00	0,00%	230,00	11.544.229,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.31	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	419,51	9.194,00	3.856.944,00	0,00	0,00	0,00%	419,51	3.856.944,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.32	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.546,24	2.381,00	6.062.588,00	0,00	0,00	0,00%	2.546,24	6.062.588,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.33	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.156,75	8.643,00	18.638.066,00	0,00	0,00	0,00%	2.156,75	18.638.066,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4		MOVIMIENTO DE TIERRAS				301.297.067,00		0,00	0,00%		301.297.067,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	9.278,45	19.220,00	178.331.809,00	0,00	0,00	0,00%	9.278,45	178.331.809,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4.2	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat, selec de excavación	m3	291,20	49.324,00	14.363.149,00	0,00	0,00	0,00%	291,20	14.363.149,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4.3	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	11.683,43	2.381,00	27.818.235,00	0,00	0,00	0,00%	11.683,43	27.818.235,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4.4	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9.346,74	8.643,00	80.783.874,00	0,00			9.346,74	80.783.874,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5		PAVIMENTOS				2.499.820.199,00		0,00	0,00%		2.499.820.199,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4.5.1	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	6.750,00	12.873,90	86.896.825,00	0,00	0,00	0,00%	6.750,00	86.896.825,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.2	507	Relleno con material de afirmado, extendida y compactada, incluye transporte	m3	305,55	402.570,00	123.005.264,00	0,00	0,00	0,00%	305,55	123.005.264,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.3	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.025,00	405.590,00	821.319.750,00	0,00	0,00	0,00%	2.025,00	821.319.750,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.4	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1.260,00	422.873,00	532.819.980,00	0,00	0,00	0,00%	1.260,00	532.819.980,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	6.300,00	12.667,00	79.802.100,00	0,00	0,00	0,00%	6.300,00	79.802.100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	630,00	1.356.848,00	856.074.240,00	0,00	0,00	0,00%	630,00	856.074.240,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6		SEÑALIZACION VIAL				170.660.971,00		0,00	0,00%		170.660.971,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4.6.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0,59	71.464,00	41.806,00	0,00	0,00	0,00%	0,59	41.806,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.2	1101	Señal vial vertical, Suministro e instalación	Un	8,00	525.144,60	4.201.157,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	4.201.157,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.3	1102	Demarcación Horizontal	km	2,00	3.089.213,75	6.178.428,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	6.178.428,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.4	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	690,00	13.140,04	9.066.628,00	0,00	0,00	0,00%	690,00	9.066.630,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.5	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	5,00	389.230,40	1.946.152,00	0,00			5,00	1.946.152,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.6	1105	Defensa metalica ecanalada a dos crestas	m	246,00	606.613,00	149.226.798,00	0,00			246,00	149.226.798,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7		OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL				139.068.540,00		0,00	0,00%		139.068.540,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4.7.1	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tocon,	un	160,00	205.987,00	32.958.520,00	0,00	0,00	0,00%	160,00	32.958.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.2	1401	Arborización con especies nativas	Un	800,00	50.192,30	40.153.840,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	40.153.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.3	829	Cunetas en sacos de 90x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	300,00	125.577,00	37.673.100,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	37.673.100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.4	1412	Revegetalización con pasto Brachiaria Decumbens	m2	600,00	30.794,80	18.458.880,00	0,00	0,00	0,00%	600,00	18.458.880,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.5	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	300,00	32.744,00	9.823.200,00	0,00			300,00	9.823.200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5		CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+320				12.546.021.119,00		0,00	0,00%		9.516.314.854,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.1		PRELIMINARES				46.884.724,00		0,00	0,00%		46.880.081,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	8.000,00	3.944,00	31.552.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	31.552.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	4.000,00	2.071,00	8.284.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.807,13	5.389.357,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

19

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION Nº07 06-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALE $	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	4,00	2.282.181,00	9.046.724,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	9.046.724,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**4.548.372.142,00**		**0,00**	**0,00%**		**3.082.184.793,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
5.2.1		ALCANTARILLAS				793.336.909,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	793.336.909,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	40,00	101.591,00	4.063.640,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	4.063.640,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.2	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	63,09	193.409,00	12.202.909,00	0,00	0,00	0,00%	63,09	12.202.909,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	23,86	238.519,00	5.690.485,00	0,00	0,00	0,00%	23,86	5.690.485,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.4	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	184,00	1.915,00	352.360,00	0,00	0,00	0,00%	184,00	352.360,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	184,00	19.220,00	3.536.480,00	0,00	0,00	0,00%	184,00	3.536.480,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.6	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	40,00	2.216.626,00	88.673.040,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	88.673.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	4,60	1.265.396,00	5.820.822,00	0,00	0,00	0,00%	4,60	5.820.822,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.8	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas y ornas)	m3	150,00	1.657.370,00	248.605.500,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	248.605.500,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	9.500,00	11.447,00	108.746.500,00	0,00	0,00	0,00%	9.500,00	108.746.500,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat, selec de excavación	m3	6,06	49.324,00	299.002,00	0,00	0,00	0,00%	6,06	299.002,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.11	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	62,24	405.590,00	25.245.544,00	0,00	0,00	0,00%	62,24	25.245.544,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.12	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	61,00	3.032.345,00	184.973.045,00	0,00	0,00	0,00%	61,00	184.973.045,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.13	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	105,00	328.443,00	34.486.515,00	0,00	0,00	0,00%	105,00	34.486.515,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.14	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	12,00	436.752,00	5.241.024,00	0,00	0,00	0,00%	12,00	5.241.024,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.15	837	Canal rampa en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	41,00	851.226,00	34.900.266,00	0,00	0,00	0,00%	41,00	34.900.266,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.16	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en grados + refuerzo de 1/2"	m	16,40	234.428,00	3.844.619,00	0,00	0,00	0,00%	16,40	3.844.619,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.17	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	86,95	9.194,00	799.431,00	0,00	0,00	0,00%	86,95	799.431,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.18	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.765,28	2.381,00	6.584.142,00	0,00	0,00	0,00%	2.765,28	6.584.142,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.19	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.229,82	8.643,00	19.270.585,00	0,00	0,00	0,00%	2.229,82	19.270.585,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				1.246.300.078,00	0,00	0,00	0,00%		1.246.300.078,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1.600,00	71.464,00	114.342.400,00	0,00	0,00	0,00%	1.600,00	114.342.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.2	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	5.000,00	23.615,00	118.075.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	118.075.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.3	901	Geodren con tubo 4" tipo AD5 H=1,50 mt	m	1.000,00	111.380,00	111.380.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	111.380.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.4	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	1.000,00	393.912,00	393.912.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	393.912.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.5	807	Cunetas concreto 21 MPa e=0,10 m. Ancho 1,06mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	106,00	1.513.858,00	160.468.948,00	0,00	0,00	0,00%	106,00	160.468.948,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.6	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20, incluye refuezo	m	1.000,00	233.544,00	233.544.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	233.544.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.7	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m	355,00	16.694,00	5.926.370,00	0,00	0,00	0,00%	355,00	5.926.370,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	4.000,00	11.447,00	45.788.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	45.788.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.9	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	2.080,00	9.194,00	19.123.520,00	0,00	0,00	0,00%	2.080,00	19.123.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	10.400,00	2.381,00	24.762.400,00	0,00	0,00	0,00%	10.400,00	24.762.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.11	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.080,00	8.643,00	17.977.440,00	0,00	0,00	0,00%	2.080,00	17.977.440,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3		BOX CULVERT				1.043.648.776,00	0,00	0,00	0,00%		1.043.648.776,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.1	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	125,84	193.409,00	24.337.912,00	0,00	0,00	0,00%	125,84	24.337.912,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	964,87	19.220,00	18.544.859,00	0,00	0,00	0,00%	964,87	18.544.859,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.3	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	10,90	1.284.576,00	13.995.456,00	0,00	0,00	0,00%	10,90	13.995.456,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.4	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornas)	m3	296,21	1.657.370,00	490.926.584,00	0,00	0,00	0,00%	296,21	490.926.584,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.5	741	Cinta flexible pvc en15cm, para sello de juntas	m	91,20	36.592,00	3.337.190,00	0,00	0,00	0,00%	91,20	3.337.190,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.6	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	36,39	1.482.888,00	53.962.374,00	0,00	0,00	0,00%	36,39	53.962.374,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.7	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	11,18	1.578.724,00	17.645.714,00	0,00	0,00	0,00%	11,18	17.645.714,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	26.872,25	11.447,00	307.606.651,00	0,00	0,00	0,00%	26.872,25	307.606.651,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.9	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat, selec de excavación	m3	115,50	49.324,00	5.696.922,00	0,00	0,00	0,00%	115,50	5.696.922,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.10	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	193,70	400.096,00	77.496.595,00	0,00	0,00	0,00%	193,70	77.496.595,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.11	1212	Estructura baranda peatonal en tubo metalico, h=1,2 fy322psi, Seis lineas de tubos + paral	m	17,20	681.585,00	11.723.434,00	0,00	0,00	0,00%	17,20	11.723.434,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.12	1234	Estructura baranda metalica Ø2" para peaton, h=1,2 fy322 psi, de un solo tubo, incrustado New jersey	m	17,20	236.708,00	4.071.378,00	0,00	0,00	0,00%	17,20	4.071.378,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	125,84	9.194,00	1.156.941,00	0,00	0,00	0,00%	125,84	1.156.941,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.14	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.360,17	2.381,00	3.238.188,00	0,00	0,00	0,00%	1.360,17	3.238.188,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

192

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.2.3.15	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.129,30	8.643,00	9.760.578,00	0,00	0,00	0,00%	1.129,30	9.760.578,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.4		PUENTE K3+226				1.467.187.379,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	410,52	1.915,00	786.146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.2	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	126,00	193.409,00	24.369.534,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.3	411	Excavación para estructuras con maquina, incluye cargue	m3	962,32	14.291,00	13.752.479,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.4	416	Excavación manual para pilas, profundidad 0 - 4mt, bajo agua	m3	61,07	1.962.689,00	119.866.444,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.5	417	Excavación manual para pilas, profundidad 4 - 12mt, bajo agua	m3	91,61	2.443.730,56	223.867.326,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.6	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	12,06	2.142.545,00	25.847.054,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.7	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	18,10	2.576.181,00	46.617.473,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.8	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	26,27	1.591.386,00	44.995.379,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.9	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	3,74	1.265.386,00	4.737.643,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.10	748	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y estribos	m3	89,97	1.697.371,00	152.717.561,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.11	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	16,02	1.764.716,00	28.584.011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.12	1627	Concreto 28 Mpa para topes sismicos y bloques de apoyo.	m3	1,02	1.962.838,00	1.992.281,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.13	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	61,19	1.849.526,00	113.174.345,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.14	1235	Concreto 28MPa para barrera tipo New Jersey + Acero	m3	5,20	3.655.703,00	19.009.656,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.15	1207	Concreto 21 Mpa para anden + vigas + tabiques, incluye refuerzo	m2	3,83	620.328,00	2.374.740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.16	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	25,62	1.482.869,00	38.293.965,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.17	1238	Estructura baranda Peatonal en tubo metalico, h=1,2 fy322psi, Seis lineas de tubos + paral (para Puentes)	m	26,00	733.613,00	19.073.938,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.18	1234	Estructura baranda metalica Ø2" para peaton, h=1,2 fy322 psi, de un solo tubo, incrustado New jersey	m	26,00	236.708,00	6.154.408,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.19	1630	Apoyo en neopreno D-60 reforzado con platina A36 1,5mm (150x150x67,5mm)	Un	10,00	325.409,40	3.254.094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.20	1631	Apoyo en neopreno D-60 reforzado con platina A36 1,5mm (250x250x67,5mm)	Un	4,00	841.577,40	3.366.310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.21	1625	Junta elastomerica para puentes D-60 pernada c/u 30cm, E=4,5cm elongacio rotura >300%, pernos de 15cm Ø7/8"	m	23,40	989.820,80	23.161.807,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.22	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	39.381,91	11.447,00	450.804.678,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.23	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina (rana)	m3	141,35	17.925,75	2.533.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.24	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	552,50	13.851,80	7.653.120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.25	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y fechos de rios, e=30cm	m3	165,75	446.825,00	74.081.244,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.26	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	324,49	9.194,00	2.983.323,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.27	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.391,74	2.381,00	3.313.741,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.28	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.138,59	8.643,00	9.840.675,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3		OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA				3.809.293.963,00		0,00	0,00%		2.645.869.720,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.3.1		MUROS EN GAVIONES				484.824.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	484.824.687,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	484,00	1.915,00	926.860,00	0,00	0,00	0,00%	484,00	926.860,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	352,20	71.464,00	25.169.821,00	0,00	0,00	0,00%	352,20	25.169.818,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.3	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	35,20	17.925,75	630.966,00	0,00	0,00	0,00%	35,20	630.966,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.4	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	64,10	422.873,00	27.106.159,00	0,00	0,00	0,00%	64,10	27.106.159,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.5	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	760,50	13.851,80	10.534.294,00	0,00	0,00	0,00%	760,50	10.534.284,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12, suministro y construcción	m3	452,50	436.752,00	197.630.280,00	0,00	0,00	0,00%	452,50	197.630.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.7	907	Tuberia drenaje con tubo pvc Ø6" h=3,0 mt	m	163,35	143.318,00	23.410.869,00	0,00	0,00	0,00%	163,35	23.410.869,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.8	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	61,11	1.578.724,00	96.467.930,00	0,00	0,00	0,00%	61,11	96.467.930,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.361,54	11.447,00	95.714.523,00	0,00	0,00	0,00%	8.361,54	95.714.523,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	380,40	9.194,00	3.497.398,00	0,00	0,00	0,00%	380,40	3.497.398,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	380,40	2.381,00	905.732,00	0,00	0,00	0,00%	380,40	905.732,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	304,32	8.643,00	2.630.238,00	0,00	0,00	0,00%	304,32	2.630.238,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2		MUROS EN CONCRETO REFORZADO				2.588.670.090,00	0,00	0,00	0,00%		1.661.935.562,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

193

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.267,00	1.915,00	2.426.305,00	0,00	0,00	0,00%	823,55	1.577.098,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	2.452,50	19.220,00	47.137.050,00	0,00	0,00	0,00%	1.594,13	30.639.084,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.3	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	118,87	2.262.438,00	267.747.306,00	0,00	0,00	0,00%	77,27	174.035.748,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.4	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	84,16	400.096,00	33.672.079,00	0,00	0,00	0,00%	54,70	21.886.853,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.5	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	461,64	1.807.706,00	834.870.939,00	0,00	0,00	0,00%	300,20	542.666.110,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.6	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	299,47	1.713.283,00	513.070.871,00	0,00	0,00	0,00%	194,96	333.495.066,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.7	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	191,43	187.051,34	35.807.862,00	0,00	0,00	0,00%	124,43	23.275.110,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.8	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	84,80	1.578.724,00	133.875.795,00	0,00	0,00	0,00%	55,12	87.019.267,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	43.149,34	11.447,00	493.930.495,00	0,00	0,00	0,00%	28.047,07	321.054.822,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.10	1020	Tubo PVC Ø2 " sanitario, para paso de lloraderos	m	231,00	21.977,30	5.078.756,00	0,00	0,00	0,00%	150,15	3.299.893,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.11	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	424,00	32.744,00	13.883.456,00	0,00	0,00	0,00%	275,60	9.024.246,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.12	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	3.366,40	13.851,80	46.630.700,00	0,00	0,00	0,00%	2.188,16	30.308.955,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.13	502	Relleno con material filtrante extendida, humadecida y compactada	m3	226,96	393.912,00	89.402.268,00	0,00	0,00	0,00%	147,52	58.111.474,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.14	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humadecida y compactada a maquina	m3	1.626,60	17.925,75	29.158.017,00	0,00	0,00	0,00%	1.057,29	18.952.711,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.15	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.073,67	2.381,00	2.556.408,00	0,00	0,00	0,00%	697,89	1.661.665,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.16	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	858,94	8.643,00	7.423.784,00	0,00	0,00	0,00%	558,31	4.825.460,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3		ESTABILIDAD PUNTOS CRITICOS				767.999.183,00	0,00	0,00	0,00%		489.199.471,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.112,00	1.915,00	2.129.480,00	0,00	0,00	0,00%	722,80	1.384.162,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.112,00	2.071,00	2.302.952,00	0,00	0,00	0,00%	722,80	1.496.919,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	4.550,90	19.220,00	87.468.298,00	0,00	0,00	0,00%	2.958,09	56.854.394,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.4	416	Excavación manual para pilas, profundidad 0 - 4mt, bajo agua	m3	30,79	1.962.689,00	60.426.500,00	0,00	0,00	0,00%	20,01	39.277.225,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.5	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	508,00	16.660,50	8.463.534,00	0,00	0,00	0,00%	330,20	5.501.297,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.6	1305	Empradizado con pasto vetiver, instalado y funcionando	m2	415,00	33.196,00	13.777.170,00	0,00	0,00	0,00%	269,75	8.955.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.7	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	250,00	451.972,50	112.993.125,00	0,00	0,00	0,00%	162,50	73.445.531,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.8	903	Estructura de descole para recibo del sub dren, en concreto reforzado, según planos	UN	25,00	727.215,80	18.180.395,00	0,00	0,00	0,00%	16,25	11.817.257,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.9	806	Cunetas concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	12,00	1.477.118,00	17.725.416,00	0,00	0,00	0,00%	7,80	11.521.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.10	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	151,00	328.443,00	49.584.893,00	0,00	0,00	0,00%	98,15	32.236.680,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.11	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	147,00	85.732,90	12.602.736,00	0,00	0,00	0,00%	95,55	8.191.780,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.12	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	8,17	2.142.545,00	17.500.609,00	0,00	0,00	0,00%	5,31	11.375.396,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.13	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	26,55	1.591.366,00	42.245.661,00	0,00	0,00	0,00%	17,28	27.459.680,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.14	1016	Viga cabezal en concreto 24,5 Mpa	m3	30,80	1.249.087,00	38.222.062,00	0,00	0,00	0,00%	19,89	24.844.340,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.15	1004	Concreto 24,5 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	21,00	1.807.706,00	37.961.826,00	0,00	0,00	0,00%	13,65	24.675.187,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.16	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	12.078,37	11.447,00	138.261.101,00	0,00	0,00	0,00%	7.850,94	89.869.718,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.17	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	120,00	436.752,00	52.410.240,00	0,00	0,00	0,00%	78,00	34.066.656,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.18	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	40,02	9.194,00	367.980,00	0,00	0,00	0,00%	26,02	239.187,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.19	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	5.956,19	2.381,00	14.181.688,00	0,00	0,00	0,00%	3.871,53	9.218.104,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.20	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	4.764,96	8.643,00	41.183.507,00	0,00	0,00	0,00%	3.097,22	26.769.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4		MOVIMIENTO DE TIERRAS				790.566.278,00		0,00	0,00%		790.566.278,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	17.408,75	19.220,00	334.596.175,00	0,00	0,00	0,00%	17.408,75	334.596.175,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.2	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	613,80	49.324,00	30.275.071,00	0,00	0,00	0,00%	613,80	30.275.071,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.3	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	21.833,44	2.381,00	51.985.409,00	0,00	0,00	0,00%	21.833,44	51.985.409,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.4	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	510,00	436.752,00	222.743.520,00	0,00	0,00	0,00%	510,00	222.743.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.5	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	17.466,75	8.643,00	150.965.103,00	0,00	0,00	0,00%	17.466,75	150.965.103,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5		PAVIMENTO				3.139.120.500,00		0,00	0,00%		3.139.120.500,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.5.1	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	14.000,00	12.873,90	180.234.600,00	0,00	0,00	0,00%	14.000,00	180.234.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5.2	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	1.200,00	248.217,00	297.860.400,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	297.860.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

194

Faro del Catatumbo

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12 — 09-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-39-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 (30-noviembre-2025)		ACTA PARCIAL No. 12			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APUS)	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT CONTRACTUALES	VR UNIT	VR PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	VR PARC	%	CANT	VALOR	%
0.0.3	1004	Subbase en material granular compactado, incluye transporte	M3	3.250,00	440.540,00	912.577.000,00	6,16	0,00	0,00%	2.858,00	802.577.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.4	1005	Base en material granular, estabilizado y compactado, incluye transporte	M3	1.500,00	423.673,00	634.309.500,00	6,00	0,00	0,00%	1.500,00	634.309.500,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.5	1006	Imprimación con emulsión asfáltica EA - 1L	M2	7.500,00	12.867,00	96.952.500,00	6,00	0,00	0,00%	7.500,00	96.952.500,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.6	1008	Capa asfáltica en caliente MDC 19	M3	753,00	1.355.845,00	1.011.134.500,00	6,00	0,00	0,00%	753,00	1.011.134.500,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0		SUBBASE GRANULAR VIAL				68.649.703,00		0,00	0,00%		68.649.703,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
0.0.1	001	Excavación manual en material sin clasificar	M3	3,75	71.494,00	273.134,00	0,00	0,00	0,00%	3,75	273.134,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.2	1003	Suministro, extensión, humedecimiento y compactación de material de afirmado	M3	35,00	271.817,00	20.569.472,00	0,00	0,00	0,00%	35,00	20.569.472,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.3	1004	Demolición de concreto	M3	0,00	1.967.089,00	6.774.000,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	6.774.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.4	1005	Cortes definitivos, conformación, compactación y nivelación	M3	1.961,63	13.473,00	13.473.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	13.473.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.0.5	1006	Demolición de cuneta o canal de concreto existente	M3	49,00	571.817,00	27.447.216,00	0,00	0,00	0,00%	49,00	27.447.216,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.1		OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL				142.214.750,00		0,00	0,00%		142.214.750,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%
0.1.1	1001	Valla de aviso de una 3 x 1m de altura con estructura de hierro	UNE	360,00	205.967,00	72.908.950,00	0,00	0,00	0,00%	354,00	72.908.950,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0.1.2	1002	Señalización con material reflejo	Un	1.060,00	69.765,00	73.133.800,00	0,00	0,00	0,00%	1.060,00	73.133.800,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO						10.906.633.584,00		10.906.134.708,00	37,51%		$ 30.900.633.284,00		1.123.952.741,00	3,19%		28.933.057.859,00	41,19%
A I U (40%)						15.271.906.975,00		5.799.440.275,00	37,51%		$ 15.271.906.976,00		487.109.822,00	3,19%		8.276.829.151,00	41,19%
VALOR TOTAL DE OBRA FISICA						26.178.523.560,00		25.587.574.677,00	37,51%		$ 46.172.527.958,00		2.311.151.563,00	3,19%		37.195.726.190,00	41,19%
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE AMENAZA Y RIESGO SUSTENTANDO VARIABILIDAD CLIMÁTICA (5.3% CT OBRA FISICA)						702.700.808,00		0,00	0,00%		702.700.808,00			0,00%		0,00	0,00%
MULLIDO VIA (10%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS						132.513.000,00		0,00	0,00%		132.513.000,00			0,00%		0,00	0,00%
AUTORIZACIÓN O PERMISO DE TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS						40.966.336,00		32.955.936,00	80,43%		73.873.208,00		8.393.232,00	5,38%		19.230.756,00	74,42%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES (0.4% CT OBRA FISICA)						393.220.417,00		43.102.208,00	24,19%		393.220.417,00		22.481.827,00	15,97%		51.623.515,00	40,17%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO Y CONTROL DE TRANSITO (PMT) (2.5% CT OBRA FISICA)						330.693.115,00		0,00	0,00%		330.693.115,00			0,00%		0,00	0,00%
VALOR A PAGAR SEGÚN PRESENTE ACTA: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL						384.470.368,00		14.695.800,00	3,77%		384.470.368,00			0,00%		14.695.800,00	3,77%
ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL MEJORAMIENTO						2.220.796.951,00		519.639.931,00	23,24%		2.220.796.951,00			0,00%		519.639.931,00	23,34%
PAGO DE SERVIDUMBRE TEMPORAL (2.0%CT)						43.785.406,00		0,00	0,00%		11.224.853,00			0,00%		0,00	0,00%
PLAN DE GESTION SOCIO PREDIAL (0.5% CT PREDIOS)						111.039.845,00		0,00	0,00%		111.039.845,00			0,00%		0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROYECTO						76.333.005.314,00		25.719.984.644,00	36,56%		$ 76.333.005.314,00		2.150.212.737,00	3,06%		37.875.777.796,00	53,81%
AMORTIZACION ANTICIPO (20,00%)						13.951.209.000,00		9.143.962.524,00	34,87%				430.042.719,00	3,06%		5.574.625.425,00	39,96%

VALOR A PAGAR SEGUN ACTA DE RECIBO No. 12 DEL 09 MARZO DE 2026 — $ 1.720.170.043,00

VALOR A PAGAR SEGÚN PRESENTE ACTA: MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 13.951.209.000,00	100%
Valor Amortización Acumulada	$ 430.042.719,00	3,08%
Valor Amortizado Acumulado	$ 5.574.625.425,00	39,95%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8.377.164.567,00	60,05%

DE PAGO POR LOS SUBCONTRATISTAS/PROVEEDORES

ING. MIGUEL ÁNGEL JENNEDY DURAN PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIA CENTRO
NIT No. 901023644-9 NTS

Supervisor
ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON
NIT. No 5402036550 NTS

Interventor (Externa)
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ
GERENTE CONSORCIO R&G - J3YCO
NIT. No 3528213514 (CNO)

Vobo Ing Faro Norte/Sur
Director interventoria
NIT No 54202 155353 NTS

Vo.Bo. Ordenador del Gasto
ING FREDY ALEXANDER PONTIVEROS

CERTIFICADO INTERV. (CANTIDADES)

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

San José de Cúcuta, 20 de marzo de 2026

CERTIFICACION

Señor(es)
FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente General
EICE FARO DEL CATATUMBO SAS
E-mail: eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Av. 5ta # 13-82 Ofic. 206 Edf. Centro de negocios 5ta avenida

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO.

Asunto: Cantidades de obra presentadas en el acta Parcial de Obra No. 12 correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026

El consorcio R&Q JOYCO, quien actúa como interventor del contrato de obra LP-FC-038-2023, en uso de sus obligaciones y compromisos, certifica que el avance físico ejecutado correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026, se encuentra acorde a las cantidades relacionadas en el acta parcial de obra No. 12 para su respectivo cobro, las cuales fueron revisadas, conciliadas y aprobadas de conformidad con los lineamientos estipulados en las especificaciones técnicas del INVIAS vigente.

Atentamente,

HECTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
C.C 19.332.879
Representante legal (A)
Consorcio R&Q - JOYCO

Revisó Yoris Montaño
Director Interventoría
MP 54202 106093 NTS

CERTIFICADO INTERV. (VERACIDAD INFORMACION)

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

San José de Cúcuta, 20 de marzo de 2026

CERTIFICACION

Señor(es)
FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente General
EICE FARO DEL CATATUMBO SAS
E-mail: eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Av. 5ta # 13-82 Ofic. 206 Edf. Centro de negocios 5ta avenida

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO.

Asunto: Documentos para el cobro del Acta Parcial de Obra No. 12 correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026.

El consorcio R&Q - JOYCO quien actúa como interventor del contrato de obra LP-FC-038-2023, en uso de sus obligaciones y compromisos, certifica que CONSORCIO VIA CENTRO ha presentado la documentación de forma completa y veraz para el pago de acta parcial de Obra No. 12 correspondiente al periodo 01 de febrero al 28 de febrero del 2026, según los lineamientos y requerimientos exigidos por la entidad contratante EICE FARO DEL CATATUMBO.

Atentamente,

HECTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
C.C 19.332.879
Representante legal (A)
Consorcio R&Q - JOYCO

Reviso Yoris Montaño
Director Interventoría
MP 54202 106093 NTS

200

CERTIFICADO INHABILIDAD

201

Cúcuta, 20 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

PERSONA JURIDICA

Yo, **JESSICA VALENTINA SUAREZ ORTIZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.004.967.761 de Cúcuta, con Tarjeta Profesional No. 331695-T, de la Junta Central de Contadores, Obrando en calidad de **CONTADOR PÚBLICO**, del **CONSORCIO VIA CENTRO** identificado con NIT 901.740.307-9 CERTIFICO que: el **CONSORCIO VIA CENTRO**, NO tiene inhabilidad e incompatibilidad de tipo tributaria, para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con el artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 núm. 1o. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que NO se encuentra incurso en ninguna de ellas.

Dado en Cúcuta, Norte de Santander a los veinte (20) días del mes marzo del 2026

MIGUEL DAN JESSEN DUARN PEREZ
CC 1.090.473.156
Representante Legal

Jessica Suarez

JESSICA VALENTINA SUAREZ ORTIZ
CC. 1.004.967.761 de Cucuta
Contador Público designado
por Luna Asesores &Consultores S.A.S TP 331695-T

PLANILLAS SS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JAIRF S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	025 - OBRA TRAMO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6010391539	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		118345045

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.036.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 2.039.000	$ 2.700	$ 2.039.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.401.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 1.402.900	$ 1.900	$ 1.683.500
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.681.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 1.683.500	$ 2.200	$ 5.125.400
SUBTOTALES:										$ 5.119.000	$ 6.800	$ 5.125.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 705.700	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 705.700	$ 1.000	$ 0	$ 706.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 280.500	$ 400	$ 0	$ 280.900
CCFC60	CCFC60 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 140.200	$ 200	$ 0	$ 140.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS042	EPS042 - COOSALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 140.200	$ 200	$ 0	$ 140.400
SUBTOTALES:													$ 1.338.700	$ 1.900	$ 0	$ 1.338.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.222.700	$ 2.222.700	$ 2.900	$ 0	$ 2.225.600
SUBTOTALES:									$ 2.222.700	$ 2.900	$ 0	$ 2.225.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	20	$ 1.287.500	$ 1.700	$ 1.289.200
SUBTOTALES:			$ 1.287.500	$ 1.700	$ 1.289.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	025 - OBRA TRAMO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6010391539	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		2					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				118345045

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1120584035	SALINAS REAL ELKIN JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 13197639	RIVERA MEMOLINA NAHUM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 13606468	TORRES MENDOZA GUSTAVO ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1094002	REYES LLAN ALFREDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 5489902	PENA MORA JOSE ELADIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.400.724		$ 97.500	24	$ 1.400.724	CCF37-COMFANORTE	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5489902	PENA MORA JOSE ELADIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										25-30						230301-PORVENIR	6	$ 350.181	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.100	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 350.181	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	6	$ 350.181		$ 0	6	$ 350.181	CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 5497064	RAMIREZ GILBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 5497255	RAMIREZ JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 0	13	$ 758.726	CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 5497255	RAMIREZ JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180		$ 69.100	17	$ 992.180	CCF37-COMFANORTE	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 5497428	RUBIO RAMIREZ DERWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 5497633	MARTINEZ RAMIREZ YOHN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 88178986	MORCADA VILLAMIZAR RAUL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 88252035	CANIZARES LOPEZ JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.978.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	018 - VÍA SALAZAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6009838406	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	116356990

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.961.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 1.961.800	$ 2.600	$ 1.964.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.130.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 1.130.300	$ 1.500	$ 1.131.800
230201	230201- PROTECCION	3	$ 569.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 569.800	$ 800	$ 570.600
SUBTOTALES:										$ 3.661.700	$ 4.900	$ 3.666.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 123.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 123.900	$ 200	$ 0	$ 124.100
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 280.400	$ 400	$ 0	$ 280.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 212.700	$ 300	$ 0	$ 213.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 343.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 343.000	$ 400	$ 0	$ 343.400
SUBTOTALES:													$ 860.000	$ 1.300	$ 0	$ 861.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.373.500	$ 1.373.500	$ 1.800	$ 0	$ 1.375.300
SUBTOTALES:									$ 1.373.500	$ 1.800	$ 0	$ 1.375.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	$ 789.900	$ 1.100	$ 791.000
SUBTOTALES:			$ 789.900	$ 1.100	$ 791.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007887610	ORTIZ PEREZ JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1063463429	GARCIA ROJAS FELIX	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1092648153	GALVIS PABON JOSE ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1093884367	PEREZ MONCADA JOSE PRIMITIVO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1093886624	LAGUADO PALACIOS LUIS ARVEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1093867157	TIBADUISA MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01																25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF37-COMFANORTE	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1093859499	PEREZ ROLON JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																01-30	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 0	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1064659086	CONTRERAS RIVAS VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 5497753	LAGUADO DELVES EMILIO HERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 88178696	LINDARTE CARDENAS EDGAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01																230201-PROTECCION	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	NUEVA EPS CM	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF37-COMFANORTE	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 88178748	PALACIOS PALACIOS JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																01-08	230301-PORVENIR	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 466.908	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 466.908		$ 0	8	$ 466.908	CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 88178748	PALACIOS PALACIOS JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	CCF37-COMFANORTE	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

204

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5872254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	018 - VÍA SALAZAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6009838406			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			116358990

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 88175256	RAMIREZ CARDENAS LUIS ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37 - COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 88175321	PALACIOS PALACIOS CRISANTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS037 - NUEVA EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	CCF37 - COMFANORTE	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 88175321	PALACIOS PALACIOS CRISANTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI											01-06							230301 - PORVENIR	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS037 - NUEVA EPS	8	$ 466.908	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 466.908		$ 0	8	$ 466.908	CCF37 - COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 88179353	ROJAS ORTIZ LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	NUEVA EPS CM	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	CCF37 - COMFANORTE	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 88179353	ROJAS ORTIZ LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI											01-06							25-14 COLPENSIONES	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	NUEVA EPS CM	8	$ 466.908	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 466.908		$ 0	8	$ 466.908	CCF37 - COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 88265303	ROJAS FONTALVO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF37 - COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.694.200

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901740307	9	CONSORCIO VIA CENTRO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO		3175217717			CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36570283	E	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	17.034.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
28	36570283	2026-03-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRO	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5401800	QUINTANA ALVERNIA YEFERSON	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAORIENTE-CCF36	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5429001
2	CC 5483795	BECERRA LINDARTE JOSE BELEN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
3	CC 13278653	QUINTERO PABON WILLIAM	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
4	CC 13411159	CONTRERAS GELVES JESUS DARIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
5	CC 13487307	VALERO GARCIA LUIS EDUARDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
6	CC 30050210	RAMIREZ GOMEZ DENIS JOHANNA	6.000.000	F																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	5.800.000	928.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.800.000	232.000	COMFAORIENTE-CCF36	5.800.000	232.000	5.800.000	403.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.795.700	S	5429001
7	CC 30050210	RAMIREZ GOMEZ DENIS JOHANNA	6.000.000	F											X					0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	200.000	32.000	0	0	SANITAS-EPS005	200.000	8.000	COMFAORIENTE-CCF36	0	0	200.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	40.000	S	5429001
8	CC 60391400	GUTIERREZ PARRA MARLENE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	COOSALUD-EPS042	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
9	CC 88178147	PEÑARANDA PEÑARANDA JAIME	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
10	CC 88179493	URIBE LAGUADO JOSE BELEN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
11	CC 88239557	LOPEZ FERREIRA JAVIER ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
12	CC 88278073	GAMERO PAEZ JOSE JOAQUIN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
13	CC 1004896942	NEIRA FERNANDEZ MILDRETH JOHANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
14	CC 1005025734	FUENTES PEREZ LUISA DANIELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
15	CC 1007307881	ASCANIO ASCANIO YILMER JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
16	CC 1090175924	CASTRILLON CONTRERAS MARLON ALEXI	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
17	CC 1090385445	PARRA RAMIREZ CARLOS SNEIDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
18	CC 1090445824	CASTILLA RIVERA ADRIAN REINALDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
19	CC 1090458213	VILLAMIZAR ATUESTA BETTY ISABEL	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
20	CC 1090473156	DURAN PAEZ MIGUEL DAN JENSSEN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
21	CC 1090495934	CARDENAS LINDARTE MARCO ANTONIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
22	CC 1093774341	GALVIS RODRIGUEZ DARLY JUDITH	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
23	CC 1093884767	PEREZ LINDARTE GERSON JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
24	CC 1093886323	URBINA POLENTINO BELCY YOHANNA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
25	CC 1094244145	GARCIA MARTINEZ CARLOS ANTONIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
26	CC 1094427498	AVELLANEDA FUENTES BRAYAN ALBERTO	2.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.300.000	368.000	0	0	COOSALUD-EPS042	2.300.000	92.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5429001
27	CC 1094552023	MARTINEZ DUARTE YANK CARLOS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
28	CC 1094858628	CACERES IBARRA KELY ZULEIMA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001

205

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012322528		ALBARRACIN BELLON DIANA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 68 A # 23-47 INT 5 AP 604	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183545206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	71874584	9499790025	I	2026/03/06	2026/02/18	BANCO DE BOGOTA	0	$1,392,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$4,500,000	$109,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,500,000**	**$720,000**			**$4,500,000**	**$562,500**			**$0**	**$0**			**$4,500,000**	**$109,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$4,500,000	$109,700		$0	$0
1	CC	1012322528 ALBARRACIN DIANA	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500		0	$0	$0	14-23	30	$4,500,000	$109,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$4,500,000**	**$720,000**			**$4,500,000**	**$562,500**			**$0**	**$0**			**$4,500,000**	**$109,700**		**$0**	**$0**

2026/02/17 07:17 PM

206

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012322528		ALBARRACIN BELLON DIANA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 68 A # 23-47 INT 5 AP 604	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183545206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	71874584	9499790025	I	2026/03/06	2026/02/18	BANCO DE BOGOTA	0	$1,392,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$720,000	$0	$0	$720,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,700	$0	$0	$109,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$109,700	$0	$0	$109,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$562,500	$0	$0	$562,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$562,500	$0	$0	$562,500
TOTAL				1	$1,392,200	$0	$0	$1,392,200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901740307	9	CONSORCIO VIA CENTRO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO		3175217717		CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36211677	Y	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	762.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36211677	2026-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1012322528	ALBARRACIN BELLON DIANA ROCIO	2.200.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	153.200	N	5429001
2	CC 1018499112	DURAN CERON MARIA ALEJANDRA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
3	CC 1090469880	PULIDO YAÑEZ JESSICA DAYANNA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
4	CC 1093774397	OLEJUA ROJAS LINA GABRIELA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
5	CC 1096947236	PEÑA YURY MARCELA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
6	CC 1193066917	MARQUEZ RINCON FELIPE	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901740307	9	CONSORCIO VIA CENTRO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO		3175217717		CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36211677	Y	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	762.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36211677	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	10.954.525	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				6	762.700	0	0	0	762.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	762.700	0	0	0	762.700
Gran Total					762.700	0	0	0	762.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090469880
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESSICA DAYANNA PULIDO YANEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CONJ. RESIDENCIAL VERONA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004517229	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			84452357

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193066917
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FELIPE MARQUEZ RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 4E 6 49 UR SAYAGO	TELÉFONO:	3124294
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004841700**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	95419299

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																															PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1193066917	MARQUEZ RINCON FELIPE	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

209

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193066917
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FELIPE MARQUEZ RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 4E 6 49 UR SAYAGO	TELÉFONO:	3124294
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004841700	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			95419299

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																											PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1193066917	MARQUEZ RINCON FELIPE	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900				$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

210

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1093774397
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA GABRIELA OLEJUA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CUCUTA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4644447800	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995843192

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 595.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.200	$ 0	$ 595.200
SUBTOTALES:										**$ 595.200**	**$ 0**	**$ 595.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 465.000
SUBTOTALES:													**$ 465.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 465.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 259.000	$ 259.000	$ 0	$ 0	$ 259.000
SUBTOTALES:									**$ 259.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 259.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090380386		SANDRA KATHERINE BARRERA MONSALVE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Carrera 3 Nro 3-10 Barrio El Centro	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5732794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	132163657	9501314326	E	2026/03/19	2026/03/11	BANCOLOMBIA	0	$4,067,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (8 Afiliados)																								$13,131,788	$2,101,500			$13,131,788	$525,800			$13,131,788	$525,800			$13,131,788		$914,300		$0	$0		$4,067,400
Centro de Trabajo: CUCUTA (4 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700			$6,128,168	$245,400			$6,128,168	$245,400			$6,128,168		$426,700		$0	$0		$1,898,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700			$6,128,168	$245,400			$6,128,168	$245,400			$6,128,168		$426,700		$0	$0		$1,898,200
1	CC	88221008	GOMEZ JOSE																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1090391639	MORENO JESUS		X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF36	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	SI	$271,300
3	CC	1010063145	ORTEGA YEIFERSON																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1090485739	PEREZ SERGIO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																								$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$487,600		$0	$0		$2,169,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																								$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$487,600		$0	$0		$2,169,200
5	CC	88159891	BARROSO LUIS																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1004996797	JAIME MARLYN																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1093140436	MONTES JAIRO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	1090434194	OVALLES FRANKLIN																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total			**Afiliados(8)**																					$13,131,788	$2,101,500			$13,131,788	$525,800			$13,131,788	$525,800			$13,131,788		$914,300		$0	$0		$4,067,400

2/2

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,101,500	$0	$0	$2,101,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,100	$0	$0	$140,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$914,300	$0	$0	$914,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$914,300	$0	$0	$914,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$525,800	$0	$0	$525,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	8	$525,800	$0	$0	$525,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$525,800	$0	$0	$525,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$245,400	$0	$0	$245,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				8	$4,067,400	$0	$0	$4,067,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090434194		OVALLES ORTIZ FRANKLIN JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAORIENTE	CLL 13 AV 9	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3134174441	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	1317828844	95013130 16	E	2026/03/24	2026/03/11	BANCOLOMBIA	0	$4,284,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090528946	FERNANDEZ GUZMAN ANDRES CAMILO	X																	231001	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF36	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
2	CC	1090394886	GOMEZ ACEVEDO MANUEL GERARDO		X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF36	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
3	CC	1093590006	HERNANDEZ CARRILLO JUAN DAVID																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1090511325	MONCADA PEREZ RENZON ALDEMAR		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC50	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	1094532836	ORTIZ MANRIQUE EDINSON JAHIR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1090490917	OVALLES ORTIZ HERMEL ANDREY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1090376279	OVALLES ORTIZ LEONEL ALBERTO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	1093596041	OVALLES HERNANDEZ SEBASTIAN YARLEY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1092349290	VARGAS LOPEZ WALTHER		X																230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	**Afiliados(9)**																						$13,832,150	$2,213,600			$13,832,150	$553,800			$13,832,150	$553,800			$13,832,150	$963,100		$0	$0		$4,284,300

2026/03/11 11:24 AM

23

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090434194		OVALLES ORTIZ FRANKLIN JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAORIENTE	CLL 13 AV 9	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3134174441	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	131782844	9501313016	E	2026/03/24	2026/03/11	BANCOLOMBIA	0	$4,284,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,213,600	$0	$0	$2,213,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$233,500	$0	$0	$233,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$859,300	$0	$0	$859,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$963,100	$0	$0	$963,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$963,100	$0	$0	$963,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$553,800	$0	$0	$553,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	9	$553,800	$0	$0	$553,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$553,800	$0	$0	$553,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$74,800	$0	$0	$74,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$58,400	$0	$0	$58,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				9	$4,284,300	$0	$0	$4,284,300

214

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILSON ELIAS ORTEGA GALVIS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1092645373
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36158759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36158759
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 121.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 621.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026

215

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007909639
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO PINEDA TARAZONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 11 #36-20 BELLAVISTA	TELÉFONO:	3154526
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004751681**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		107798915

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 121.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 121.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 621.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 621.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Sanicolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO IDENTIFICACION 1007260239
NOMBRE O RAZON SOCIAL		CAMILO ALBERTO PINEDA TARAZONA
CIUDAD/MUNICIPIO	CUCUTA	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
DIRECCION	AV 7 # 2-20 EL CAIRO	TELEFONO 3184529
TIPO APORTANTE	01 - MIEMBRO DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA		ACTIVIDAD ECONOMICA Otros servicios de servicios
FORMA DE PRESENTACION	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF		PERSONA NATURAL NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	80047316 81	TIPO DE PLANILLA		H-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION	MES	Marzo	MES	Marzo
OTROS SUBSIDETEMAT	AÑO	2026	AÑO	2026
DIAS DE MORA		0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/3/30 NUMERO AUTORIZACION		10172869 3

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACION SENCILLA

	TOTALES
COTIZANTES	TOTAL PAGADO

RESUMEN

ADMINISTRADORA

NIT	CODIGO	NOMBRE	
800226482	25002	COMPENSAR	$ 280.200
		SUBTOTAL	$ 280.200

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT	CODIGO	NOMBRE	
800251440	EPS005	EPS005 SANITAS S.A	$ 218.900
		SUBTOTAL	$ 218.900

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT	CODIGO	NOMBRE	
860066942	14-11	ARL SURA	$ 121.900
		SUBTOTAL	$ 121.900

VALOR SIN MORA:	$ 621.000
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 621.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410635	0	INGENIERIA CONTROL 2011 SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-405	CLL 25 N 8 42 PATIO CENTRO		5802179		INGENIERIA_CONTROL2011@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36624015	E	2026-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.891.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	36624015	2026-03-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 27837795	RINCON BALCARCEL RUTH ADRIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001
2	CC 60387834	JACOME ROMERO SHIRLEY CAROLINA	3.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	5.500.000	880.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.500.000	220.000	COMFANORTE-CCF37	3.200.000	128.000	5.500.000	239.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.467.300	S	5711001
3	CC 88028246	ANGARITA LAZARO IVAN	1.750.905	F	X															0			25	25	25	25	COLPENSION-ES-25-14	1.595.877	255.400	0	0	COOSALUD-EPS042	1.595.877	63.900	COMFANORTE-CCF37	1.459.088	58.400	1.595.877	111.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	488.800	S	5711001
4	CC 88028246	ANGARITA LAZARO IVAN	1.750.905	F											X					0			1	1	1	1	COLPENSION-ES-25-14	58.364	9.400	0	0	COOSALUD-EPS042	58.364	2.400	COMFANORTE-CCF37	0	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	11.800	S	5711001
5	CC 88232415	RANGEL VERA IVAN ENRIQUE	3.230.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.499.167	559.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.499.167	140.000	COMFANORTE-CCF37	3.230.000	129.200	3.499.167	152.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	981.400	S	5711001
6	CC 1005054736	VARGAS VERA CARLOS EDUARDO	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.283.997	51.400	COMFANORTE-CCF37	1.283.997	51.400	1.283.997	89.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	397.700	S	5711001
7	CC 1020835779	ARIAS WENDY PAOLA	2.500.000	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	2.052.163	328.400	0	0	COOSALUD-EPS042	2.052.163	82.100	COMFANORTE-CCF37	1.833.334	73.400	2.052.163	10.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	494.700	S	1711001
8	CC 1090425239	POLITI CASTELLANOS ILENE ADRIANA	2.305.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.497.083	399.600	0	0	COOSALUD-EPS042	2.497.083	99.900	COMFANORTE-CCF37	2.305.000	92.200	2.497.083	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	604.800	S	1711001
9	CC 1090504132	ROJAS HERRERA YAN CARLOS	1.845.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.058.328	329.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.058.328	82.400	COMFANORTE-CCF37	1.845.000	73.800	2.058.328	143.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	628.900	S	5711001
10	CC 1093761446	CULMA TORRES GERSON DAVID	1.950.905	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.252.611	360.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.252.611	90.200	COMFANORTE-CCF37	1.885.875	75.500	2.252.611	156.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	683.000	S	5711001
11	CC 1093772195	RIVERA ORTEGA JEAN CARLOS	1.845.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.010.281	321.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.010.281	80.500	COMFANORTE-CCF37	1.845.000	73.800	2.010.281	140.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	616.000	S	5711001
12	CC 1127572146	PEÑALOZA CONTRERAS IKSEN JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.851.217	296.200	0	0	COMPAORIENTE-CCFC50	1.851.217	74.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.851.217	128.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	569.300	S	5711001
13	CC 1149454486	CANCINO USECHE FRANKLIN JOSUE	2.950.000	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	2.028.144	324.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.028.144	81.200	COMFANORTE-CCF37	1.966.667	78.700	2.028.144	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	495.100	S	1711001
14	CC 1149454486	CANCINO USECHE FRANKLIN JOSUE	2.950.000	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	4.700	COMFANORTE-CCF37	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	1711001

216

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410635	0	INGENIERIA CONTROL 2011 SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-405	CLL 25 N 8 42 PATIO CENTRO		5802179		INGENIERIA_CONTROL2011@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36624015	E	2026-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.891.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	36624015	2026-03-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
28.554.864	28.554.864	28.554.864	24.355.771	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	4.569.500	0	0	0	4.569.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	840.100	0	0	0	840.100
PORVENIR	230301	800224808	8	8	2.584.600	0	0	0	2.584.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.144.800	0	0	0	1.144.800
EPS(Administradoras: 6)				12	1.142.900	0	0	0	1.142.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	220.000	0	0	0	220.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	3	248.300	0	0	0	248.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	82.400	0	0	0	82.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	80.500	0	0	0	80.500
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	74.100	0	0	0	74.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	437.600	0	0	0	437.600
ARP(Administradoras: 1)				12	1.204.800	0	0	0	1.204.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	1.204.800	0	0	0	1.204.800
CCF(Administradoras: 1)				12	974.600	0	0	0	974.600
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	12	974.600	0	0	0	974.600
Gran Total					7.891.800	0	0	0	7.891.800
