Reunión técnica revisión avance convenio ConvenioGGC1941 2025 ACGSZC y MME

FECHA: 09-marzo-2026
HORA: 7:30 a 8:30 AM
LUGAR: Teams
ASISTENTES:

Equipo convenio – Ricardo Manzano – Coordinador General
Equipo convenio – Francisco Idrobo - Coordinador Operativo
Equipo convenio – Mónica Castro – Apoyo Jurídico
MME OAAS – Olga Lucia Mellizo – Apoyo técnico

OBJETO DE LA REUNION

Identificar el estado de avance de los productos estipulados en el plan de trabajo del convenio, verificar el cumplimiento de los hitos para el segundo desembolso y evaluar la necesidad de una prórroga

DESARROLLO

A. Estado de los Productos Técnicos

El coordinador operativo presento y los avances en relación al plan de trabajo y cronograma frente a los productos del segundo pago:

1. **Dificultades**

Estudios Geotécnicos y Estabilidad. La realización del estudio geomecánico en tajo abierto y el plan de estabilización de taludes requieren suelos estables. Las lluvias constantes han generado una saturación hídrica que altera la cohesión de los materiales, provocando deslizamientos activos. Ejecutar estos estudios bajo las condiciones actuales entregaría resultados distorsionados que no garantizarían la seguridad física y estructural requerida en el largo plazo. La recolección de datos topográficos para el cálculo del volumen de ripios también se ha suspendido por la inestabilidad de los terrenos de acopio.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Riesgo en Infraestructura de Vertimientos y Aguas. inundaciones en algunas del área de intervención han retrasado la ejecución de los estudios y diseños de la red de agua potable y sanitaria, así como la reubicación de la PTAR. El exceso de escorrentía superficial han retraso las pruebas de infiltración y los levantamientos.

Cartografía y topografía Se identificó en terreno la modificación de un punto de control previamente establecido, obligando a esperar la estabilización del terreno para realizar una nueva demarcación, para ajustar el punto de control materializado en terreno, con el fin de verificar la precisión de georreferenciación antes de generar las salidas gráficas (mapas) de los informes. Esto retraso afecta directamente la delimitación de los buffers de seguridad en zonas de subsidencia y la proyección del túnel de ventilación.

2. **Avance de productos y proyecciones técnicas**

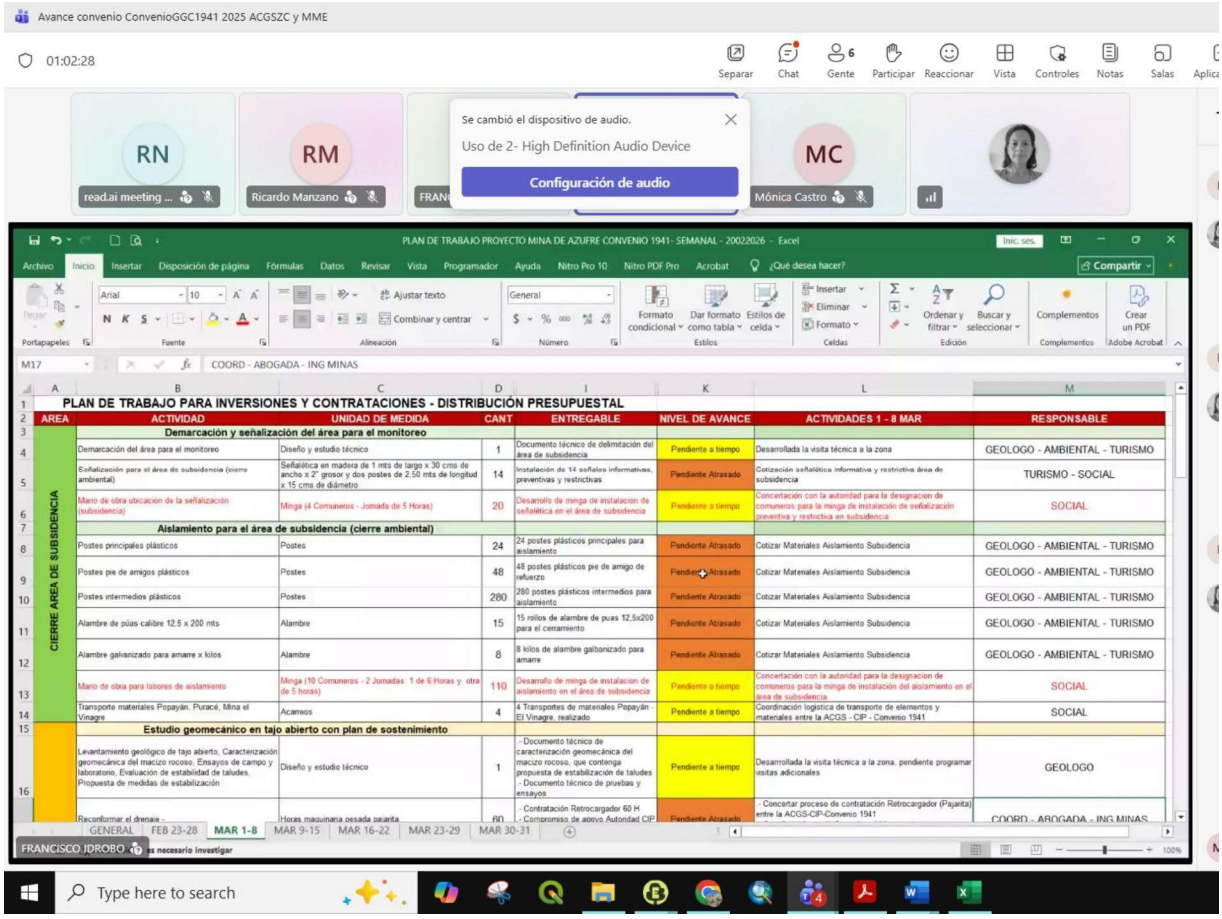
A pesar de las limitaciones climáticas el equipo técnico ha avanzado en la valoración in situ con el geólogo y en la definición preliminar de los puntos de aforo para el circuito de ventilación. Sin embargo, productos clave como el informe de recuperación de drenajes no presentan avances debido a la falta de maquinaria, y los informes de seguridad operativa y desmantelamiento parcial están supeditados a la cartografía de base para evitar reprocesos. Dado que no se cumplirán las entregas previstas para la segunda semana de marzo, el equipo proyecta una entrega parcial de documentos.

Conclusión técnica:

1. **Informe de Seguridad (Delimitación de áreas de subsidencia):** El análisis de valoración está documentado, pero no se ha podido generar las salidas gráficas finales.
2. **Recuperación de Drenajes:** Presenta retrasos significativos porque se presentan inundación de algunas de los túneles y se ha dificultado el acceso.
3. **Ventilación:** No se alcanzará a entregar en la fecha prevista toda vez que los (se proyecta para la tercera semana de marzo).

Desde el Ministerio se acusa recibo del reporte de avances y de los puntos críticos expuestos. Si bien se reconoce la gestión técnica realizada en campo y la validación de los puntos de aforo para ventilación, manifiesta que es necesario que realicen la topografía que garantice el rigor geográfico requerido.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180



B. Estado de ejecución Administrativa y Financiera

- **Ricardo Manzano** informó que se presenta retrasos significativos en el flujo de recursos debido a que el primer desembolso se encuentra retenido por inconsistencias en el cargue de pólizas y requisitos en la plataforma SECOP. Esta situación ha impactado la capacidad de ejecución, específicamente en la contratación de maquinaria pesada y el pago de dinamizadores por producto.
- **Apoyo técnico OAAS:** Ante la proximidad del vencimiento del plazo contractual (finales de marzo), desde el apoyo técnico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) recomendó tramitar una prórroga antes del 15 de marzo, sustentada técnicamente en la necesidad de ajustar cronogramas y resolver los cuellos de botella administrativos y operativos detectados. Asimismo, se solicita

al equipo técnico subsanar de manera inmediata las observaciones en las pólizas y el cargue en SECOP, pues la trazabilidad administrativa es el único soporte legal para justificar la procedencia de los pagos y garantizar que el cronograma ajustado cuente con el respaldo presupuestal necesario para la contratación de la maquinaria y los dinamizadores pendientes.

1. **Decisión de Prórroga**





Ante la imposibilidad de cumplir con la entrega de todos los productos en la fecha prevista, se acuerda **proceder con una solicitud de prórroga**.

- La solicitud se basará en un **sustento técnico** que demuestre que hay avances reales y actividades ejecutadas y precisar los factores externos que han impedido la finalización de los productos.

COMPROMISOS:

Responsable	Compromiso	Fecha
Ricardo Manzano	Enviar consulta formal al MME sobre el estado de los desembolsos.	Inmediato
Ricardo Manzano	Revisión del desfase técnico entre topografía y cartografía para salidas gráficas.	16 de marzo
Equipo técnico y Jurídico	Proyectar la solicitud técnica de prórroga y el nuevo cronograma ajustado.	16 de marzo
Apoyo técnico OAAS	Revisión de la propuesta de prorroga y los documentos técnicos	Una vez enviados

ASISTENCIA:

Nombre	Cargo	Firma
Ricardo Manzano	Equipo convenio – Coordinador General	
Francisco Idrobo	Equipo convenio – Coordinador Operativo	
Mónica Castro	Equipo convenio – Apoyo Jurídico	
Olga Lucia Mellizo	MME OAAS – Apoyo técnico	

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Avance convenio ConvenioGGC1941 2025 ACGSZC y MME

lunes, 9 marzo 2026 7:29 a.m. - 9:13 a.m. Más

Asistencia Participación

8
Asistieron

7:29 a.m. - 9:13 a.m.
Hora de inicio y finalización

1h 44m 5s
Duración de la reunión

56m 6s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reu...	Rol	Compromiso
OLGA LUCIA MELLIZO ORTIZ olmellizo@minenergia.gov.co	7:30 a.m.	8:57 a.m.	1h 26m 14s	Organizador	- - -
FI FRANCISCO IDR... (No comprobado)	7:33 a.m.	8:58 a.m.	1h 24m 39s	Moderador	- - -
RM Ricardo Manz... (No comprobado)	7:33 a.m.	7:37 a.m.	3m 38s	Moderador	- - -
RM Ricardo Manz... (No comprobado)	7:41 a.m.	8:56 a.m.	1h 15m 2s	Moderador	- - -
MC Mónica Castro (No comprobado)	7:44 a.m.	8:07 a.m.	23m 10s	Moderador	- - -
FI FRANCISCO IDROBO	8:06 a.m.	9:13 a.m.	1h 7m 26s	Moderador	- - -
MC Mónica Castro (No comprobado)	8:10 a.m.	8:56 a.m.	46m	Moderador	- - -

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180
