Código: C-F-45	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 01	FORMATO ACTA PARCIAL	Fecha: 24/03/2023
ACTA PARCIAL		FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2026

ACTA PARCIAL	No 7		
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	CONTRATO DE OBRA 345 DE 2025	DE FECHA: 08 DE MARZO DE 2025	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO TERMINACIÓN UMI		NIT: 901.919.277-7
	R.L. ING. ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO		C.C: 1.037.630.191
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025		NIT: 901.928.027-0
	R.L. BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO		C.C: 1.123.628.511
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL :	$ 6.167.353.887,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 3.083.611.678,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 9.250.965.565,00		
PLAZO INICIAL	10 meses		
PRORROGA N° 1	Tiempo: 2 MESES Y 25 DÍAS	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2026	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	10 meses		
FECHA DE INICIACIÓN	21/03/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	De Fecha:	31/12/2025	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	De Fecha:	5/01/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/03/2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 01/11/2025 al 30/11/2025		
RBPP N°	23201010010208		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 232010100102080808

En las oficinas de la obra en la Avenida universitaria 51 - 60 se reunieron los señores, BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO Interventora y la señora ING.ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 82246035 de Noviembre 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	9.250.965.565,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		1.512.062.386,00
Valor Total actas pagadas		6.099.188.319,00
Saldo por ejecutar		1.639.714.860,00
Sumas iguales	9.250.965.565,00	9.250.965.565,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0371 0009 3436	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ING. ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Contratista
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

Firma: _____
Nombre: BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	FORMATO	VERSION: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA:	12/02/2026

CONTRATO:	345 DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERMIMACION UMI
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
V. INICIAL	$ 6.167.353.887,00
V. ADICIONAL	$ 3.083.611.678,00
VALOR TOTAL	$ 9.250.965.565,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL:	21/03/2025	ACTA PARCIAL	X		
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	31/12/2025	ACTA FINAL			
PRÓRROGA:	84 DÍAS	ACTA No.	**7**		
		FECHA:	12 de febrero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/03/2026	MES:	**NOVIEMBRE**		

% OBRA EJECT.	**82,3%**	**% TIEMPO**	**88,9%**

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA**				**$ 524.036.456,00**		**$ 245.459.185,00**		**$ 90.528.882,00**		**$ 335.988.068,00**
1,01	ESTUCO MUROS	Metro Cuadrado	14.113,09	$ 10.154,00	$ 143.304.316,00	8170,90	$ 82.967.321,65	1.128,24	$ 11.456.148,96	9.299,14	$ 94.423.470,61
1,02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M	Metro lineal	1.071,86	$ 7.114,00	$ 7.625.212,00	2642,13	$ 18.796.112,82	683,24	$ 4.860.569,36	3.325,37	$ 23.656.682,18
1,03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	3.721,31	$ 8.502,00	$ 31.638.578,00	3868,96	$ 32.893.872,41	869,86	$ 7.395.549,72	4.738,82	$ 40.289.422,13
1,04	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Metro Cuadrado	8.099,70	$ 10.307,00	$ 83.483.608,00		$ -		$ -		$ -
1,05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	Metro Cuadrado	6.013,39	$ 27.886,00	$ 167.689.394,00	3774,67	$ 105.260.476,57	1.065,59	$ 29.715.042,74	4.840,26	$ 134.975.519,31
1,06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Metro Cuadrado	2.463,10	$ 17.574,00	$ 43.286.519,00	254,50	$ 4.472.618,10	1.472,74	$ 25.881.932,76	1.727,24	$ 30.354.550,86
1,07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M	Metro lineal	3.495,86	$ 13.447,00	$ 47.008.829,00	79,48	$ 1.068.783,70	834,36	$ 11.219.638,92	913,84	$ 12.288.422,62
2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES**				**$ 228.448.060,00**		**$ 7.259.764,00**		**$ 159.743.909,00**		**$ 167.003.674,00**
2,01	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	Metro Cuadrado	1.708,98	$ 113.392,00	$ 193.784.660,00	60,62	$ 6.874.185,89	1.351,96	$ 153.301.448,32	1.412,58	$ 160.175.634,21
2,02	REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"	Metro lineal	1.200,00	$ 11.374,00	$ 13.648.800,00	33,90	$ 385.578,60	566,42	$ 6.442.461,08	600,32	$ 6.828.039,68
2,03	DILATACION BRONCE	Metro lineal	980,25	$ 21.438,00	$ 21.014.600,00		$ -	-	$ -	-	$ -
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS**				**$ 843.775.523,00**		**$ 52.897.711,00**		**$ 563.204.935,00**		**$ 616.102.647,00**
3,01	MORTERO AUTONIVELANTE	Metro Cuadrado	938,24	$ 88.507,00	$ 83.040.808,00		$ -	-	$ -	-	$ -
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	Metro lineal	2.360,65	$ 85.963,00	$ 202.928.556,00	473,71	$ 40.721.588,61	3.935,93	$ 338.344.350,59	4.409,64	$ 379.065.939,20
3,03	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)	Metro lineal	347,31	$ 74.452,00	$ 25.857.924,00	54,61	$ 4.066.084,30	131,11	$ 9.761.401,72	185,72	$ 13.827.486,02
3,04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO	Metro Cuadrado	4.184,07	$ 41.392,00	$ 173.187.025,00	195,93	$ 8.110.038,25	3.143,74	$ 130.125.686,08	3.339,67	$ 138.235.724,33
3,05	BANDAS ANTIDESLIZANTES	Metro lineal	168,75	$ 24.828,00	$ 4.189.725,00		$ -	-	$ -	-	$ -
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC)	Metro Cuadrado	100,76	$ 334.385,00	$ 33.692.633,00		$ -	-	$ -	-	$ -
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO ANTIBACTERIAL (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC)	Metro Cuadrado	838,16	$ 252.917,00	$ 211.984.913,00		$ -	-	$ -	-	$ -
3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC	Metro lineal	2.060,98	$ 52.836,00	$ 108.893.939,00		$ -	1.608,25	$ 84.973.497,00	1.608,25	$ 84.973.497,00
4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				**$ 955.798.285,00**		**$ 141.482.227,00**		**$ 326.590.300,00**		**$ 468.072.526,00**
4,01	DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	Metro Cuadrado	72,35	$ 717.097,00	$ 51.881.968,00		$ -	10,39	$ 7.450.637,83	10,39	$ 7.450.637,83
4,02	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	50,09	$ 700.171,00	$ 35.071.565,00		$ -	-	$ -	-	$ -
4,03	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA.	Metro Cuadrado	591,07	$ 455.000,00	$ 268.936.850,00	25,20	$ 11.463.725,00	146,58	$ 66.693.900,00	171,78	$ 78.157.625,00
4,04	VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	Metro Cuadrado	644,94	$ 346.624,00	$ 223.551.683,00	310,18	$ 107.516.799,75	270,01	$ 93.591.946,24	580,19	$ 201.108.745,99
4,05	MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE EN PVC	Metro Cuadrado	380,73	$ 204.833,00	$ 77.986.068,00		$ -	-	$ -	-	$ -
4,06	MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE EN PVC	Metro Cuadrado	160,76	$ 177.662,00	$ 28.560.943,00	64,43	$ 11.446.355,81	69,91	$ 12.420.350,42	134,34	$ 23.866.706,23
4,07	VIDRIO 4 MM	Metro Cuadrado	31,14	$ 64.603,00	$ 2.011.737,00		$ -	-	$ -	-	$ -
4,08	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 3+3 MM	Metro Cuadrado	627,29	$ 252.578,00	$ 158.439.654,00		$ -	222,12	$ 56.102.625,36	222,12	$ 56.102.625,36
4,09	CERRADURA ALCOBA	Unidad	455,00	$ 57.038,00	$ 25.952.290,00	113,00	$ 6.445.294,00	-	$ -	113,00	$ 6.445.294,00
4,1	CERRADURA BAÑO	Unidad	50,00	$ 62.298,00	$ 3.114.900,00	74,00	$ 4.610.052,00	-	$ -	74,00	$ 4.610.052,00
4,11	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Unidad	30,00	$ 136.131,00	$ 4.083.930,00		$ -	-	$ -	-	$ -
4,12	SELLADO DEL MARCOS VENTANERIA CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA Y ACABADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO	Metro lineal	1.354,76	$ 28.460,00	$ 38.556.470,00		$ -	997,41	$ 28.386.288,60	997,41	$ 28.386.288,60
4,13	SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE PUNTERA DE REMATE	Metro lineal	204,80	$ 183.839,00	$ 37.650.227,00		$ -	336,95	$ 61.944.551,05	336,95	$ 61.944.551,05
5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS**				**$ 270.163.748,00**		**$ -**		**$ 2.627.176,00**		**$ 2.627.176,00**
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO	Unidad	112,00	$ 1.975.246,00	$ 221.227.552,00		$ -	-	$ -	-	$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Unidad	144,00	$ 294.224,00	$ 42.368.256,00		$ -	-	$ -	-	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	Unidad	5,00	$ 1.313.588,00	$ 6.567.940,00		$ -	2,00	$ 2.627.176,00	2,00	$ 2.627.176,00
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN**				**$ 330.884.334,00**		**$ 18.353.723,00**		**$ 241.888.667,00**		**$ 260.242.390,00**
6,01	TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ETC)	Metro lineal	2.586,00	$ 29.662,00	$ 76.705.932,00		$ -	2.107,81	$ 62.521.860,22	2.107,81	$ 62.521.860,22
6,02	SALIDA APARATO DE DETECCIÓN	Unidad	432,00	$ 115.203,00	$ 49.767.696,00		$ -	403,00	$ 46.426.809,00	403,00	$ 46.426.809,00
6,03	CABLE FPLP	Metro lineal	5.339,00	$ 10.040,00	$ 53.603.560,00	324,47	$ 3.257.678,80	2.840,93	$ 28.522.937,20	3.165,40	$ 31.780.616,00
6,04	BOCINA CON ESTROBO	Unidad	24,00	$ 409.105,00	$ 9.818.520,00	4,50	$ 1.840.972,50	16,50	$ 6.750.232,50	21,00	$ 8.591.205,00
6,05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	Unidad	350,00	$ 326.419,00	$ 114.246.650,00	38,80	$ 12.665.057,20	234,50	$ 76.545.255,50	273,30	$ 89.210.312,70
6,06	DETECTOR TERMICO	Unidad	4,00	$ 298.604,00	$ 1.194.416,00		$ -	2,00	$ 597.208,00	2,00	$ 597.208,00
6,07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	Unidad	24,00	$ 295.007,00	$ 7.080.168,00	2,00	$ 590.014,00	19,00	$ 5.605.133,00	21,00	$ 6.195.147,00
6,08	MODULO DE MONITOREO	Unidad	30,00	$ 236.544,00	$ 7.096.320,00		$ -	15,00	$ 3.548.160,00	15,00	$ 3.548.160,00
6,09	PANEL DE CONTROL	Unidad	1,00	$ 11.371.072,00	$ 11.371.072,00		$ -	1,00	$ 11.371.072,00	1,00	$ 11.371.072,00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES**				**$ 1.136.646.818,00**		**$ -**		**$ 663.791.363,00**		**$ 663.791.363,00**
7,01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	1.100,00	$ 105.442,00	$ 115.986.200,00		$ -	1.631,44	$ 172.022.296,48	1.631,44	$ 172.022.296,48
7,02	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 3/4". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	1.500,00	$ 140.667,00	$ 211.000.500,00		$ -	1.699,65	$ 239.084.666,55	1.699,65	$ 239.084.666,55
7,03	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	174,00	$ 237.492,00	$ 41.323.608,00		$ -	484,27	$ 115.010.250,84	484,27	$ 115.010.250,84
7,04	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	90,00	$ 286.930,00	$ 25.823.700,00		$ -	133,79	$ 38.388.364,70	133,79	$ 38.388.364,70
7,05	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2	Unidad	122,00	$ 543.829,00	$ 66.347.138,00		$ -	24,00	$ 13.051.896,00	24,00	$ 13.051.896,00
7,06	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC	Unidad	140,00	$ 543.829,00	$ 76.136.060,00		$ -	19,00	$ 10.332.751,00	19,00	$ 10.332.751,00
7,07	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR	Unidad	112,00	$ 543.829,00	$ 60.908.848,00		$ -	3,00	$ 1.631.487,00	3,00	$ 1.631.487,00
7,08	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 1 GAS INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	6,00	$ 9.221.997,00	$ 55.331.982,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,09	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 3 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	14,00	$ 10.460.643,00	$ 146.449.002,00		$ -	6,30	$ 65.902.050,90	6,30	$ 65.902.050,90
7,1	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	3,00	$ 11.855.110,00	$ 35.565.330,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,11	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	6,00	$ 2.395.849,00	$ 14.375.094,00		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7,12	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-3/4". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	3,00	$ 2.650.117,00	$ 7.950.351,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,13	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"- 1/2"-1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	14,00	$ 2.091.900,00	$ 29.286.600,00		$ -	4,00	$ 8.367.600,00	4,00	$ 8.367.600,00
7,14	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA CO2 Y N2O (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6788 Y UN REGULADOR DE LINEA CONCOA 6798 CON BY-PASS)	Unidad	1,00	$ 7.255.897,00	$ 7.255.897,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,15	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA O2 Y AIRE DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6716 Y UN REGULADOR DE LÍNEA CONCOA 6794 Ó REGO 1784 CON BY-PASS)	Unidad	1,00	$ 8.650.025,00	$ 8.650.025,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,16	ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON SOPORTES, VÁLVULAS DE CORTE DE ALTA PRESIÓN POR CILINDRO Y MANGUERAS IMPORTADAS. PARA INSTALAR A MURO.	Unidad	2,00	$ 10.180.069,00	$ 20.360.138,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,17	RACOR DISS PARA QUIROFANO PISO 2	Unidad	18,00	$ 48.787,00	$ 878.166,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,18	RACOR DISS PARA UCI PISO 2	Unidad	186,00	$ 48.787,00	$ 9.074.382,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,19	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS GENTEC 3816E- AGS, INCLUYE CAJA EN A. INOX. PARA MONTAJE EN PARED	Unidad	3,00	$ 9.344.441,00	$ 28.033.323,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,2	SISTEMA PULMÓN MEDICINAL (INTERCONEXIÓN SISTEMA PRINCIPAL Y SISTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	3,00	$ 7.391.525,00	$ 22.174.575,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,21	TOMA PANEL CONNECT II SERIE 400 VACÍO	Unidad	18,00	$ 545.385,00	$ 9.816.930,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,22	UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 3/4" PARA TANQUE, TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SAM CON FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO ALTO FLUJO	Unidad	3,00	$ 23.710.583,00	$ 71.131.749,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,23	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	4,00	$ 376.256,00	$ 1.505.024,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,24	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	191,00	$ 209.028,00	$ 39.924.348,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,25	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	2,00	$ 585.780,00	$ 1.171.560,00		$ -	-	$ -	-	$ -
7,26	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 3/4". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	114,00	$ 264.792,00	$ 30.186.288,00		$ -	-	$ -	-	$ -
8	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**				**$ 165.839.838,00**		**$ 5.474.914,00**		**$ 235.652.338,00**		**$ 241.127.252,00**
8,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	Metro Cuadrado	120,00	$ 6.371,00	$ 764.520,00		$ -	1.553,24	$ 9.895.692,04	1.553,24	$ 9.895.692,04
8,02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	236,54	$ 25.449,00	$ 6.019.706,00		$ -	341,62	$ 8.693.887,38	341,62	$ 8.693.887,38
8,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	55,83	$ 64.534,00	$ 3.602.933,00		$ -	127,94	$ 8.256.479,96	127,94	$ 8.256.479,96
8,04	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	17,79	$ 95.421,00	$ 1.697.540,00		$ -	13,66	$ 1.303.450,86	13,66	$ 1.303.450,86
8,05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-Km	1.004,27	$ 1.850,00	$ 1.857.900,00		$ -	32.369,51	$ 59.883.593,50	32.369,51	$ 59.883.593,50
8,06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	4.571,62	$ 2.312,00	$ 10.569.585,00		$ -	8.238,21	$ 19.046.741,52	8.238,21	$ 19.046.741,52
8,07	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro Cuadrado	109,76	$ 74.859,00	$ 8.216.524,00		$ -	95,03	$ 7.113.850,77	95,03	$ 7.113.850,77
8,08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA (2000PSI)	Metro Cuadrado	84,48	$ 44.574,00	$ 3.765.612,00		$ -	141,94	$ 6.326.833,56	141,94	$ 6.326.833,56
8,09	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cúbico	19,36	$ 1.060.141,00	$ 20.524.330,00		$ -	25,97	$ 27.531.861,77	25,97	$ 27.531.861,77
8,1	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cúbico	18,30	$ 1.102.801,00	$ 20.181.258,00		$ -	15,40	$ 16.983.135,40	15,40	$ 16.983.135,40
8,11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	kilogramo	8.168,20	$ 7.002,00	$ 57.193.736,00	781,91	$ 5.474.913,60	9.778,75	$ 68.470.807,50	10.560,66	$ 73.945.721,10
8,12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	Metro lineal	70,40	$ 76.643,00	$ 5.395.667,00		$ -	28,00	$ 2.146.004,00	28,00	$ 2.146.004,00
8,13	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y OBRAS HIDRAHULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR.	Metro Cuadrado	102,96	$ 253.016,00	$ 26.050.527,00		$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO**				**$ 288.525.312,00**		**$ -**		**$ 160.091.623,00**		**$ 160.091.623,00**
9,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	metro cubico	69,45	$ 64.534,00	$ 4.481.886,00		$ -	841,74	$ 54.320.849,16	841,74	$ 54.320.849,16
9,02	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	metro cubico	65,89	$ 90.646,00	$ 5.972.665,00		$ -	397,56	$ 36.037.223,76	397,56	$ 36.037.223,76
9,03	ANDEN ADOQUIN DE GRES	Metro Cuadrado	350,00	$ 133.668,00	$ 46.783.800,00		$ -	-	$ -	-	$ -
9,04	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	7.375,82	$ 7.139,00	$ 52.655.979,00		$ -	-	$ -	-	$ -
9,05	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	120,00	$ 130.054,00	$ 15.606.480,00		$ -	39,15	$ 5.091.614,10	39,15	$ 5.091.614,10
9,06	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	Metro Cuadrado	2.000,00	$ 30.843,00	$ 61.686.000,00		$ -	390,04	$ 12.030.003,72	390,04	$ 12.030.003,72
9,07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	Metro lineal	120,00	$ 58.919,00	$ 7.070.280,00		$ -	-	$ -	-	$ -
9,08	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	Metro lineal	50,00	$ 97.011,00	$ 4.850.550,00		$ -	-	$ -	-	$ -
9,09	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	Metro lineal	20,00	$ 61.090,00	$ 1.221.800,00		$ -	-	$ -	-	$ -
9,1	CERRAMIENTO METALICO	Metro Cuadrado	228,00	$ 386.824,00	$ 88.195.872,00		$ -	136,01	$ 52.611.932,24	136,01	$ 52.611.932,24
10	**ITEMS NO PREVISTOS**						**$ 692.197.388,00**		**$ 2.247.575.233,00**		**$ 2.939.772.621,00**
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	Metro Cuadrado		$ 87.716,00	$ -	25,88	$ 2.270.476,03	255,17	$ 22.382.491,72	281,05	$ 24.652.967,75
NP 2	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado		$ 33.165,57	$ -		$ -	180,96	$ 6.001.641,55	180,96	$ 6.001.641,55
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado		$ 132.446,27	$ -		$ -	793,42	$ 105.085.519,54	793,42	$ 105.085.519,54
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO MOVILIDAD REDUCIDA	Unidad		$ 1.946.254,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	Unidad		$ 332.271,20	$ -	42,50	$ 14.121.526,00	-	$ -	42,50	$ 14.121.526,00
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL	Unidad		$ 263.535,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 7	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad		$ 359.623,11	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	Unidad		$ 89.532,50	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro lineal		$ 73.154,27	$ -		$ -	30,00	$ 2.194.628,10	30,00	$ 2.194.628,10
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Metro lineal		$ 101.192,80	$ -		$ -	47,72	$ 4.828.920,42	47,72	$ 4.828.920,42
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Metro lineal		$ 212.563,05	$ -		$ -	114,10	$ 24.253.444,01	114,10	$ 24.253.444,01
NP 12	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad		$ 737.541,36	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	Unidad		$ 1.203.760,30	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 14	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H ≤ 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	Unidad		$ 2.608.699,27	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro cuadrado		$ 7.326,84	$ -		$ -	376,47	$ 2.758.335,45	376,47	$ 2.758.335,45
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.	Metro cubico		$ 157.693,66	$ -		$ -	87,40	$ 13.782.425,88	87,40	$ 13.782.425,88
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal		$ 33.484,59	$ -		$ -	129,54	$ 4.337.593,79	129,54	$ 4.337.593,79
NP 18	CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro cubico		$ 588.756,71	$ -		$ -	36,77	$ 21.648.584,23	36,77	$ 21.648.584,23
NP 19	PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO	Metro lineal		$ 161.374,53	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 20	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal		$ 2.696,49	$ -		$ -	525,23	$ 1.416.277,44	525,23	$ 1.416.277,44
NP 21	CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA	Metro lineal		$ 2.891,00	$ -	857,83	$ 2.479.998,09	7.976,48	$ 23.060.003,68	8.834,31	$ 25.540.001,77
NP 22	CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM.	Metro cuadrado		$ 85.928,00	$ -		$ -	228,73	$ 19.654.311,44	228,73	$ 19.654.311,44
NP 23	FAJA EN MURO UNA CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	Metro lineal		$ 67.478,00	$ -		$ -	104,92	$ 7.079.791,76	104,92	$ 7.079.791,76
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo		$ 4.177,57	$ -	12.950,73	$ 54.102.574,51	-	$ -	12.950,73	$ 54.102.574,51
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	Metro cuadrado		$ 23.401,47	$ -		$ -	252,15	$ 5.900.680,66	252,15	$ 5.900.680,66
NP 26	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	Metro cuadrado		$ 39.441,07	$ -		$ -	471,37	$ 18.591.337,17	471,37	$ 18.591.337,17
NP 27	FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro lineal		$ 21.550,00	$ -		$ -	938,16	$ 20.217.348,00	938,16	$ 20.217.348,00
NP 28	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro cuadrado		$ 31.209,12	$ -		$ -	322,61	$ 10.068.374,20	322,61	$ 10.068.374,20
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal		$ 349.372,00	$ -		$ -	115,34	$ 40.296.566,48	115,34	$ 40.296.566,48
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE ÁREA DOBLE DIGITAL GASES MEDICINALES	Unidad		$ 8.709.168,00	$ -		$ -	4,97	$ 43.284.564,96	4,97	$ 43.284.564,96
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 2"	Unidad		$ 738.206,00	$ -		$ -	2,00	$ 1.476.412,00	2,00	$ 1.476.412,00
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G 1/2"-1/2" EN BRONCE	Unidad		$ 1.267.835,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	Metro lineal		$ 102.758,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	Metro lineal		$ 175.155,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE Y DIMENSIONES SEGUN DISEÑO. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O CUALQUIER OTRO REQUERIDO), ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE, ESQUINEROS, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Kilogramo		$ 53.061,00	$ -	2.744,44	$ 145.622.512,91	17.426,05	$ 924.643.639,05	20.170,49	$ 1.070.266.151,96
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR AMBAS CARAS CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO GOFRADO DE 60 MICRAS DE ESPESOR. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Metro cuadrado		$ 179.927,00	$ -		$ -	45,51	$ 8.188.477,77	45,51	$ 8.188.477,77
NP 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6" X 6" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 190.111,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 222.511,00	$ -		$ -	4,90	$ 1.090.303,90	4,90	$ 1.090.303,90
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 268.111,00	$ -		$ -	54,90	$ 14.719.293,90	54,90	$ 14.719.293,90
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 288.111,00	$ -		$ -	11,00	$ 3.169.221,00	11,00	$ 3.169.221,00
NP 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 164.313,00	$ -		$ -	3,00	$ 492.939,00	3,00	$ 492.939,00
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 281.182,00	$ -		$ -	57,00	$ 16.027.374,00	57,00	$ 16.027.374,00
NP 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 215.463,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 281.182,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 303.782,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 342.917,00	$ -		$ -	2,10	$ 720.125,70	2,10	$ 720.125,70
NP 47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12X8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 380.567,00	$ -		$ -	1,00	$ 380.567,00	1,00	$ 380.567,00
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 418.117,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 14x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 446.356,00	$ -		$ -	2,00	$ 892.712,00	2,00	$ 892.712,00
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 495.741,00	$ -		$ -	1,00	$ 495.741,00	1,00	$ 495.741,00
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x18 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 524.141,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 20x16 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 717.925,00	$ -		$ -	1,00	$ 717.925,00	1,00	$ 717.925,00
NP 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR FLUJO LAMINAR QUIROFANO CON PORTA FILTROTERMINAL DE 24"X24"	unidad		$ 2.886.975,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR	Unidad		$ 1.591.000,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 55	BALANCEAMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BARÓMETRO O ANEMÓMETRO, TOMA DE MEDIDAS, SUPERVISIÓN E INFORME.	Unidad		$ 1.227.437,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE AHORRADOR DE AGUA Y ALTO PODER DE DESCARGA TIPO POWER MISTY O SIMILAR	Unidad		$ 701.771,00	$ -	7,80	$ 5.473.813,80	44,20	$ 31.018.278,20	52,00	$ 36.492.092,00
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON VALVULA TIPO PUSH	unidad		$ 1.652.121,00	$ -		$ -	39,40	$ 65.093.567,40	39,40	$ 65.093.567,40
NP 58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR	Unidad		$ 240.876,77	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS DE SENSOR ACERO INOXIDABLE	Unidad		$ 622.352,00	$ -		$ -	6,30	$ 3.920.817,60	6,30	$ 3.920.817,60
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AUXILIAR BAÑO, PARA LAVAMANOS EN MADERA MELAIMINICA RH DIMENSIONES HASTA B=0.60, A=0.50, H=0.80 COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN) INCLUYE HERRAJES BISAGRAS Y SOPORTES	Unidad		$ 627.207,48	$ -	42,50	$ 26.656.317,90	-	$ -	42,50	$ 26.656.317,90
NP 61	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	Metro cuadrado		$ 324.341,83	$ -		$ -	14,07	$ 4.563.489,55	14,07	$ 4.563.489,55
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM ANCHO 130/120 CM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y CHAPETAS ESQUINERAS EN ALUMINIO CHAPA CENTRAL Y MANIJAS TIPO ROMA ANCHO ENTRE 80CM - 1M	Unidad		$ 2.082.362,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE.	Unidad		$ 3.151.051,00	$ -	19,74	$ 62.201.746,74	-	$ -	19,74	$ 62.201.746,74
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE DE VAIVÉN CON SISTEMA HIDRAUILICO COLOR ALUMINIO PINTURA BLANCA	Unidad		$ 3.820.278,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PVC PROYECTANTE	Metro cuadrado		$ 731.968,00	$ -	1,11	$ 809.849,40	6,00	$ 4.391.808,00	7,11	$ 5.201.657,40
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DWRAP, INCLUYE ZUNCHOS, GRAPAS, CINTA FOIL Y PEGA	Metro cuadrado		$ 136.554,00	$ -	41,80	$ 5.707.903,67	213,89	$ 29.207.535,06	255,69	$ 34.915.438,73
NP 67	SUMISTRIO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE AREA TIPO TOUCH DE 5 GASES	Unidad		$ 5.262.004,00	$ -		$ -	2,10	$ 11.050.208,40	2,10	$ 11.050.208,40
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 1/2"	Unidad		$ 227.720,00	$ -		$ -	63,00	$ 14.346.360,00	63,00	$ 14.346.360,00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 3/4"	Unidad		$ 264.558,00	$ -		$ -	62,00	$ 16.402.596,00	62,00	$ 16.402.596,00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 1"	Unidad		$ 345.650,00	$ -		$ -	4,00	$ 1.382.600,00	4,00	$ 1.382.600,00
NP 71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 1 1/2"	Unidad		$ 395.484,00	$ -		$ -	1,00	$ 395.484,00	1,00	$ 395.484,00
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2" - 3/4".	Unidad		$ 1.054.953,00	$ -		$ -	8,00	$ 8.439.624,00	8,00	$ 8.439.624,00
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2" - 1/2" - 3/4".	Unidad		$ 1.338.988,00	$ -		$ -	9,00	$ 12.050.892,00	9,00	$ 12.050.892,00

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2" - 1/2" - 1/2" - 1/2" - 3/4"	Unidad		$ 1.733.643,00	$ -		$ -	3,00	$ 5.200.929,00	3,00	$ 5.200.929,00
NP 75	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	Metro lineal		$ 4.761,30	$ -		$ -	235,00	$ 1.118.905,50	235,00	$ 1.118.905,50
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	Metro lineal		$ 139.386,26	$ -		$ -	7,80	$ 1.087.212,83	7,80	$ 1.087.212,83
NP 77	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	Unidad		$ 1.458.509,51	$ -		$ -	10,00	$ 14.585.095,10	10,00	$ 14.585.095,10
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN.	Unidad		$ 908.344,00	$ -		$ -	5,00	$ 4.541.720,00	5,00	$ 4.541.720,00
NP 79	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (H < = 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	Unidad		$ 1.121.474,05	$ -		$ -	3,00	$ 3.364.422,15	3,00	$ 3.364.422,15
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN ACERO AL CARBON DE 6" X 40 CM ROSCADOS	Unidad		$ 735.951,00	$ -		$ -	3,00	$ 2.207.853,00	3,00	$ 2.207.853,00
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN PVC 3" X 40 CM	Unidad		$ 431.490,00	$ -		$ -	5,00	$ 2.157.450,00	5,00	$ 2.157.450,00
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.D. D = 6" EXTREMO LISO	Unidad		$ 1.953.745,70	$ -		$ -	1,00	$ 1.953.745,70	1,00	$ 1.953.745,70
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL DE LLENADO CON FLOTADOR ELECTRICO	Unidad		$ 7.158.943,00	$ -		$ -	1,00	$ 7.158.943,00	1,00	$ 7.158.943,00
NP 84	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro cubico		$ 1.136.574,77	$ -	1,39	$ 1.574.787,99	7,14	$ 8.115.143,86	8,53	$ 9.689.931,85
NP 85	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro cubico		$ 1.087.554,32	$ -	0,36	$ 394.129,69	0,39	$ 424.146,18	0,75	$ 818.275,87
NP 86	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro cubico		$ 887.295,00	$ -		$ -	6,65	$ 5.900.511,75	6,65	$ 5.900.511,75
NP 87	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M	Metro cuadrado		$ 71.370,94	$ -	60,92	$ 4.348.224,56	91,37	$ 6.521.162,79	152,29	$ 10.869.387,35
NP 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO PARA VARILLA 3/8" X 15 CM CON HILTI RE500V3 O SIMILAR. EL ACERO SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	Unidad		$ 24.850,00	$ -	20,00	$ 497.000,00	736,00	$ 18.289.600,00	756,00	$ 18.786.600,00
NP 89	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E= 0,15M	Metro cuadrado		$ 129.510,00	$ -		$ -	71,03	$ 9.199.095,30	71,03	$ 9.199.095,30
NP 90	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro cubico		$ 569.366,37	$ -		$ -	2,45	$ 1.394.947,61	2,45	$ 1.394.947,61
NP 91	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Metro cuadrado		$ 187.405,13	$ -		$ -	14,07	$ 2.636.790,18	14,07	$ 2.636.790,18
NP 92	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro cuadrado		$ 35.818,47	$ -	68,06	$ 2.437.754,92	182,74	$ 6.545.467,21	250,80	$ 8.983.222,13
NP 93	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal		$ 5.071,42	$ -		$ -	55,53	$ 281.615,95	55,53	$ 281.615,95
NP 94	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal		$ 7.613,13	$ -		$ -	28,10	$ 213.928,95	28,10	$ 213.928,95
NP 95	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro cuadrado		$ 38.101,75	$ -		$ -	105,77	$ 4.030.022,10	105,77	$ 4.030.022,10
NP 96	RETIRO DE CABLE ELECTRICO	Metro lineal		$ 3.749,00	$ -		$ -	2.827,40	$ 10.599.922,60	2.827,40	$ 10.599.922,60
NP 97	RETIRO DE CANASTILLA	Metro lineal		$ 7.081,00	$ -		$ -	286,00	$ 2.025.166,00	286,00	$ 2.025.166,00
NP 98	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO E: 15 CM	Metro cuadrado		$ 266.876,00	$ -		$ -	15,41	$ 4.112.559,16	15,41	$ 4.112.559,16
NP 99	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 A 2,0 M DE PROFUNDIDAD CON DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,00M, EN MATERIAL HETEROGÉNEO, CON PIEDRAS DE HASTA 0.05 M³.	Metro cubico		$ 131.026,00	$ -		$ -	4,52	$ 592.237,52	4,52	$ 592.237,52
NP 100	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 A 4,0 M DE PROFUNDIDAD CON DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,00M, EN MATERIAL HETEROGÉNEO, CON PIEDRAS DE HASTA 0.05 M³.	Metro cubico		$ 153.293,00	$ -		$ -	2,26	$ 346.442,18	2,26	$ 346.442,18
NP 101	CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO PARA EXCAVACIONES DE PILAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA.	Metro cubico		$ 759.731,00	$ -		$ -	2,07	$ 1.572.643,17	2,07	$ 1.572.643,17
NP 102	CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN CONCRETO 21 MPA.	Metro cubico		$ 799.288,00	$ -		$ -	4,71	$ 3.764.646,48	4,71	$ 3.764.646,48
NP 103	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO E: 30 CM	Metro cuadrado		$ 390.940,00	$ -		$ -	53,13	$ 20.770.642,20	53,13	$ 20.770.642,20
NP 104	CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28DIAS, ASENTAMIENTO 10 CM +/- 2.5CM (MR 36 NORMAL) (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).	Metro cubico		$ 983.511,10	$ -	78,11	$ 76.822.440,41	75,96	$ 74.707.503,16	154,07	$ 151.529.943,57
NP 105	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	Metro cubico		$ 108.310,56	$ -		$ -	102,57	$ 11.109.414,14	102,57	$ 11.109.414,14
NP 106	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro cuadrado		$ 88.356,31	$ -		$ -	301,70	$ 26.657.098,73	301,70	$ 26.657.098,73
NP 107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA RECTANGULAR 15X40X5 CM	Metro cuadrado		$ 206.411,00	$ -		$ -	86,91	$ 17.939.180,01	86,91	$ 17.939.180,01
NP 108	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BALDOSA TERRAZO PARA EXTERIORES	Metro cuadrado		$ 162.777,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-20	Metro cuadrado		$ 118.877,54	$ -		$ -	35,60	$ 4.232.040,42	35,60	$ 4.232.040,42
NP 110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO 10x20x80	Metro lineal		$ 52.371,00	$ -		$ -	124,55	$ 6.522.808,05	124,55	$ 6.522.808,05
NP 111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO 15x30x100	Metro lineal		$ 63.899,00	$ -		$ -	76,85	$ 4.910.638,15	76,85	$ 4.910.638,15
NP 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO 20x40x80	Metro lineal		$ 68.510,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo		$ 7.423,82	$ -	2.054,91	$ 15.255.288,23	1.933,34	$ 14.352.768,16	3.988,25	$ 29.608.056,38
NP 114	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.25 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal		$ 77.362,80	$ -		$ -	71,33	$ 5.518.288,52	71,33	$ 5.518.288,52
NP 115	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN PARA SUPERFICIES ENTERRADAS, CON ADITIVO TIPO IGOL DENSO O SIMILAR. SE DEBE IMPRIMAR PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON IGOL IMPRIMANTE O EQUIVALENTE.	Metro cuadrado		$ 104.707,00	$ -		$ -	79,04	$ 8.276.041,28	79,04	$ 8.276.041,28
NP 116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE CON MEMBRANA DE PVC TIPO SIKAPLAN O EQUIVALENTE DE ESPESOR DE 1,2MM. INCLUYE MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA, INCLUYE SIKAPLAN O EQUIVALENTE, PERFIL DE FONDO, PERFIL DE BORDE, SIKA PRIMER 215 O EQUIVALENTE, SIKAFLEX CONSTRUCTION O EQUIVALENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Metro cuadrado		$ 283.746,00	$ -		$ -	85,05	$ 24.132.597,30	85,05	$ 24.132.597,30
NP 117	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo		$ 24.067,10	$ -	9.083,72	$ 218.618.815,17	4.765,33	$ 114.687.673,64	13.849,05	$ 333.306.488,81
NP 118	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	Metro cuadrado		$ 132.717,63	$ -		$ -	16,24	$ 2.155.334,31	16,24	$ 2.155.334,31
NP 119	MURO UNA CARA DE E = 0.10 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM	Metro Cuadrado		$ 148.176,90	$ -	80,13	$ 11.873.563,17	7,75	$ 1.148.370,98	87,88	$ 13.021.934,15
NP 120	FAJA HASTA 60 CM MURO UNA CARA DE E = 0.10 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM EN FACHADA MAYOR A 3 METROS	Metro lineal		$ 97.199,00	$ -	106,51	$ 10.352.665,49	501,78	$ 48.772.514,22	608,29	$ 59.125.179,71
NP 121	CONSTRICCIÓN DE DILATACION EN C, INCLUYE SELLO CON TEXJOINT JUNTAS O SIMILAR	Metro lineal		$ 26.935,00	$ -	55,50	$ 1.494.892,50	79,15	$ 2.131.905,25	134,65	$ 3.626.797,75
NP 122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS	Metro Cuadrado		$ 38.126,65	$ -	51,18	$ 1.951.332,62	4,65	$ 177.288,92	55,83	$ 2.128.621,54
NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAJA HASTA 60 CM EN ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS	Metro lineal		$ 25.409,00	$ -	352,80	$ 8.964.295,20	255,49	$ 6.491.745,41	608,29	$ 15.456.040,61
NP 124	STRIPSCREEN LISO O PERFAORADO. SUMINISTRO DE STRIPSCREEN EN PANEL DE ALUZINC LISO O PERFORADO, CALIBRE DE 0,6 mm, MÓDULO DE 300mm CON SEPARACIÓN ENTRE LÁMINAS DE 20MM, INSTALACIÓN VERTICAL EN TIRAS DE HASTA 12m PINTURA CARA 1 EXTERIOR TERMINACIÓN COLORES ESTÁNDAR. INCLUYE KIT DE ENSAMBLE SUPERIOR E INFERIOR, KIT DE INSTALACIÓN SUPERIOR E INFERIOR CON RESORTE Y/O TENSOR.	Metro Cuadrado		$ 787.049,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA RH COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado		$ 508.142,00	$ -	7,30	$ 3.710.961,03	183,02	$ 93.000.148,84	190,32	$ 96.711.109,87
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA RH ESTRUCTURA INTERNA REFORZADA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado		$ 573.592,00	$ -	25,20	$ 14.454.518,40	100,80	$ 57.818.073,60	126,00	$ 72.272.592,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 4.744.118.374,00**		**$ 1.163.124.912,00**		**$ 4.691.694.426,00**		**$ 5.854.819.340,00**
	A.I.U. __%				$ 1.423.235.513,00		$ 348.937.474,00		$ 1.407.508.328,00		$ 1.756.445.802,00
	COSTO TOTAL				**$ 6.167.353.887,00**		**$ 1.512.062.386,00**		**$ 6.099.202.754,00**		**$ 7.611.265.142,00**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**$ 1.512.062.386,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 1.512.062.386,00**

SON: MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1,01	ESTUCO MUROS	CAP	1,00
Registro fotográfico				









SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA		UNIDAD	Metro Cuadrado		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
19,00	2,54	N/A	1	100%	48,26	LAVANDERIA
1,50	2,10	N/A	-1	100%	-3,15	DESCUENTO PUERTA EN LAVANDERIA
27,90	2,70	N/A	1	100%	75,33	PARQUEADERO SOTANO
23,15	2,80	N/A	1	100%	64,82	PARQUEADERO SOTANO
1,00	2,10	N/A	-5	100%	-10,50	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1,50	2,10	N/A	-1	100%	-3,15	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0,40	2,00	N/A	-1	100%	-0,80	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
1,20	2,10	N/A	-5	100%	-12,60	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1,00	1,10	N/A	-1	100%	-1,10	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
14,00	2,45	N/A	1	100%	34,30	CONSULTORIO DE DIETAS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO PUERTA CONSULTORIO DE DIETAS
16,66	2,45	N/A	1	100%	40,82	ROPA LIMPIA
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PUERTA ROPA LIMPIA
9,38	2,50	N/A	1	100%	23,45	ROPA SUCIA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO PUERTA ROPA SUCIA
48,88	2,55	N/A	1	100%	124,64	BODEGA FARMACIA
0,40	2,00	N/A	-1	100%	-0,80	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
1,21	2,10	N/A	-1	100%	-2,54	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
38,10	2,52	N/A	1	100%	96,01	ARCHIVO
1,21	2,10	N/A	-1	100%	-2,54	DESCUENTO DE PUERTA ARCHIVO
0,40	1,20	N/A	-1	100%	-0,48	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0,40	2,00	N/A	-1	100%	-0,80	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
20,21	2,45	N/A	1	100%	49,51	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
15,10	2,53	N/A	1	100%	38,20	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1,32	2,10	N/A	-1	100%	-2,77	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
14,82	2,50	N/A	1	100%	37,05	DEP. CADAVERES
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PIUERTA EN DEP DE CADAVERES
11,21	2,40	N/A	1	100%	26,90	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2,20	2,20	N/A	1	100%	4,84	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1,40	1,50	N/A	1	100%	2,10	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,55	1,00	N/A	-1	100%	-0,55	DESCUENTO VENTANA EN CICULACION
14,06	2,50	N/A	1	100%	35,15	CIRCULACION SALA DE STAR
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,33	0,73	N/A	-1	100%	-0,24	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
17,25	2,52	N/A	1	100%	43,47	DEPOSITO ALMACEN
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA EN DEPOSITO ALMACEN
0,55	1,00	N/A	-1	100%	-0,55	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
2,00	0,40	N/A	-1	100%	-0,80	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
14,25	2,70	N/A	1	100%	38,48	ASEO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO PUERTA
0,40	0,67	N/A	-1	100%	-0,27	DESCUENTO VENTANA
PISO 1						
17,53	2,60	N/A	1	100%	45,58	LOBORATORIO
2,93	1,10	N/A	1	100%	3,22	MURO INTERMEDIO -LABORATORIO
0,97	2,09	N/A	1	100%	2,03	MURO INERMEDIO LAVA OJOS
4,64	2,60	N/A	1	100%	12,06	CUARTO LABORATORIO
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	DESCUENTO PUERTA
1,30	1,30	N/A	-4	100%	-6,76	DESCUENTO VENTANA
10,24	0,99	N/A	1	100%	10,14	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
2,74	1,20	N/A	1	100%	3,29	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
1,64	1,12	N/A	1	100%	1,84	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
30,76	2,50	N/A	1	100%	76,90	LABORATO IYECTOLOGIA
0,97	2,10	N/A	-1	100%	-2,04	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTA PUERTA
0,94	1,10	N/A	-1	100%	-1,03	DESCUENTA VENTANA
0,71	2,10	N/A	-1	100%	-1,49	DESCUENTA PUERTA
1,30	0,65	N/A	-1	100%	-0,85	DESCUENTA VENTANA
3,60	2,50	N/A	1	100%	9,00	CUARO RESIDUOS RESICLABLES ORDINARIOS
0,79	2,10	N/A	-1	100%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
0,49	1,30	N/A	-1	100%	-0,64	DESCUENTO VENTANA
0,86	0,86	N/A	-1	100%	-0,74	DESCUENTO VENTANA
3,91	2,60	N/A	1	100%	10,17	CUARTO NEVERA
0,99	2,10	N/A	-1	100%	-2,08	DESCUENTO PUERTA
10,92	2,60	N/A	1	100%	28,39	CUARTO TRANFUCIONAL
0,97	2,10	N/A	-1	100%	-2,04	DESCUENTO DE PUERTA
0,94	1,10	N/A	-1	100%	-1,03	DESCUENTO DE VENTANA
0,95	1,00	N/A	-1	100%	-0,95	DESCUENTO DE VENTANA
5,46	2,60	N/A	1	100%	14,20	CUARTO NEVERA MURO
3,71	2,60	N/A	1	100%	9,65	HALL CIRCULACION
1,21	0,61	N/A	1	100%	0,74	CIRCULACION HALL
4,06	2,60	N/A	1	100%	10,56	MURO HALL ENTRADA LABORATORIO
3,70	2,60	N/A	1	100%	9,62	MURO TOMA DE MUESTRAS
2,86	2,60	N/A	1	100%	7,44	MURO TOMA DE MUESTRAS
2,82	2,60	N/A	1	100%	7,33	MURO TOMA DE MUESTRAS
1,64	2,60	N/A	1	100%	4,26	TOMA DE MUESTRAS
3,64	2,60	N/A	1	100%	9,46	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1,47	2,60	N/A	1	100%	3,82	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1,67	2,60	N/A	1	100%	4,34	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO DE PUERTA GINECOLOGICA
2,06	2,60	N/A	1	100%	5,36	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
2,06	2,60	N/A	1	100%	5,36	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
1,30	1,30	N/A	-1	100%	-1,69	DESCUENTO VENTANA
3,91	2,60	N/A	1	100%	10,17	ENTREGA DE MUESTRAS
8,29	2,60	N/A	1	100%	21,55	MURO FRENTE A FARMACIA
0,99	0,65	N/A	-1	100%	-0,64	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA
6,81	2,60	N/A	1	100%	17,71	MURO EXTERIOR FARMACIA
0,99	3,00	N/A	-1	100%	-2,97	DESCUENTO VENTANA
4,25	2,53	N/A	1	100%	10,75	MURO INTERNO FARMACIA
0,99	3,00	N/A	-1	100%	-2,97	DESCUENTO
2,92	2,53	N/A	1	100%	7,39	MURO INTERNO FARMACIA
4,55	2,53	N/A	1	100%	11,51	MURO INTERNO FARMACIA
0,83	1,05	N/A	1	100%	0,87	MURO INTERNO FARMACIA
0,94	2,53	N/A	1	100%	2,38	MURO ENTREGA FARMACIA
3,46	2,60	N/A	1	100%	9,00	AREA ENTREGA DE FARNACIA
3,77	2,60	N/A	1	100%	9,80	AREA ENTREGA DE FARMACIA
0,50	0,64	N/A	-1	100%	-0,32	DESCUENTA VENTANA
7,94	2,60	N/A	1	100%	20,64	AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO PUERTA
0,50	0,65	N/A	-1	100%	-0,33	DESCUENTO VENTANA
3,88	2,60	N/A	1	100%	10,09	MURO CIRCULACION A FARMACIA
1,36	2,60	N/A	1	100%	3,54	MURO HALL AL LADO DE ADMICIONES
1,10	2,10	N/A	-1	100%	-2,31	DESCUENTO DE PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO DE PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO DE PUERTA
1,29	2,10	N/A	-1	100%	-2,71	DESCUENTO DE PUERTA
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO DE PUERTA
8,82	2,60	N/A	1	100%	22,93	PROCEDIMIENTOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA
1,10	2,10	N/A	-1	100%	-2,31	DESCUENTO PUERTA










0,40	1,00	N/A	-1	100%	**-0,40**	DESCUENTO VENTANA
7,96	2,60	N/A	1	100%	**20,70**	SALA DE IGEMATOLOGIA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO DE PUERTA
17,49	2,60	N/A	1	100%	**45,47**	ADMICIONES
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
1,29	2,10	N/A	-1	100%	**-2,71**	DESCUENTO PUERTA
14,80	2,60	N/A	1	100%	**38,48**	PROCEDIMIENTOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
1,10	2,10	N/A	-1	100%	**-2,31**	DESCUENTO PUERTA
0,90	1,30	N/A	-1	100%	**-1,17**	DESCUENTO VENTANA
1,30	1,30	N/A	-1	100%	**-1,69**	DESCUENTO VENTANA
6,16	2,60	N/A	1	100%	**16,02**	TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
12,67	2,60	N/A	1	100%	**32,94**	COLSULTORIO DE CARDILOGO
14,25	2,60	N/A	1	100%	**37,05**	MUROS CIRCULACION
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
2,30	2,10	N/A	-1	100%	**-4,83**	DESCUENTO PUERTA
1,34	1,99	N/A	-1	100%	**-2,67**	DESCUENTO ACENSOR
9,10	2,60	N/A	1	100%	**23,66**	OFICINA RADIOLOGIA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
0,85	1,20	N/A	-1	100%	**-1,02**	DESCUENTO VENTANA
7,07	2,60	N/A	1	100%	**18,38**	INSUMOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	INSUMOS
10,03	2,60	N/A	1	100%	**26,08**	SALA DE ESPERA
1,10	2,10	N/A	-2	100%	**-4,62**	DESCANSO DE PUERTA
1,00	0,40	N/A	-1	100%	**-0,40**	DESCANSO DE VENTANA
21,59	2,60	N/A	1	100%	**56,13**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1,10	2,10	N/A	-1	100%	**-2,31**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1,30	1,30	N/A	-1	100%	**-1,69**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
16,04	2,60	N/A	1	100%	**41,70**	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0,90	1,30	N/A	-1	100%	**-1,17**	DESCUENTO
1,10	2,10	N/A	-1	100%	**-2,31**	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
30,52	2,42	N/A	1	100%	**73,86**	HALL DE CIRCULACION
10,38	2,10	N/A	-1	100%	**-21,80**	DESCUENTO DE PUERTAS
1,00	1,10	N/A	-1	100%	**-1,10**	DESCUENTO VENTANA
32,20	2,42	N/A	1	100%	**77,92**	HALL CIRCULACION
11,47	2,10	N/A	-1	100%	**-24,09**	DESCUENTO PUERTAS
1,00	1,00	N/A	-4	100%	**-4,00**	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,40	N/A	-1	100%	**-1,40**	DESCUENTO VENTANAS
17,34	2,54	N/A	1	100%	**44,04**	COLSULTORIO 3
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO PUERTA
1,80	2,54	N/A	-1	100%	**-4,57**	DESCUENTO PUERTA
16,71	2,10	N/A	1	100%	**35,09**	CONSULTORIO 4
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO PUERTA
1,00	1,00	N/A	-1	100%	**-1,00**	DESCUENTA VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
11,18	2,42	N/A	1	100%	**27,06**	MONITEREO GINECOSTRETICO
1,73	2,10	N/A	-2	100%	**-7,27**	DESCUENTO PUERTA
18,67	2,60	N/A	1	100%	**48,54**	REANIMACION
1,30	1,30	N/A	-2	100%	**-3,38**	DESCUENTO VENTANA
1,70	2,10	N/A	-1	100%	**-3,57**	DESCUENTA PUERTA
18,96	2,60	N/A	1	100%	**49,30**	AUDITORIO
1,30	2,10	N/A	-1	100%	**-2,73**	DESCUENTO PUERTA
14,14	2,70	N/A	1	100%	**38,18**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0,40	0,80	N/A	-1	100%	**-0,32**	DESCUENTO VENTANA
2,00	0,40	N/A	-1	100%	**-0,80**	DESCUENTO VENTANA
2,00	0,40	N/A	-1	100%	**-0,80**	DESCUENTO VENTANA
1,00	2,10	N/A	-1	100%	**-2,10**	DESCUENTO VENTANA
8,95	2,70	N/A	1	100%	**24,17**	CIRCULACION HALL
0,40	0,80	N/A	-1	100%	**-0,32**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1,98	2,70	N/A	2	100%	**10,69**	MURO
1,70	1,10	N/A	-2	100%	**-3,74**	DESCUENTO PUERTA
3,00	2,70	N/A	1	100%	**8,10**	BÑO DISCAPACITADOS Y PRIMER PISO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
1,34	2,70	N/A	1	100%	**3,62**	BAÑO MUJERES
18,59	2,70	N/A	1	100%	**50,19**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
1,00	2,10	N/A	-1	100%	**-2,10**	DESCUENTO PERTA
0,80	0,40	N/A	-1	100%	**-0,32**	DESCUENTO VENTANA
2,00	0,40	N/A	-1	100%	**-0,80**	DESCUENTO VENTANA
4,65	2,70	N/A	1	100%	**12,56**	AUTORIZACIONES
1,00	1,00	N/A	-1	100%	**-1,00**	DESCUENTO DE VENTANA
4,41	2,70	N/A	1	100%	**11,91**	HALL PRINCIPAL
10,00	2,30	N/A	1	100%	**23,00**	COCINETA
1,00	1,90	N/A	1	100%	**1,90**	DESCUENTO PUERTA
21,86	2,30	N/A	1	100%	**50,28**	COCINETA INTERNA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO BAÑOS
-1,00	2,10	N/A	-1	100%	**2,10**	DESCUENTO PUERTA
11,37	2,55	N/A	1	100%	**28,99**	CAFETERIA
0,90	2,10	N/A	-2	100%	**-3,78**	DESCUENTO PUERTA
1,30	2,10	N/A	-1	100%	**-2,73**	DESCUENTO PUERTA
10,26	2,38	N/A	1	100%	**24,42**	MANOGRAFO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
5,11	2,38	N/A	1	100%	**12,16**	VESTIER CONTINUO A MANOGRAFO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
5,43	2,48	N/A	1	100%	**13,47**	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
6,71	2,48	N/A	1	100%	**16,64**	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
1,70	2,10	N/A	-1	100%	**-3,57**	DESCUENTO PUERTA TAC
0,89	2,10	N/A	-1	100%	**-1,87**	DESCUENTO PUERTA TAC
0,89	2,10	N/A	-1	100%	**-1,87**	DESCUENTO PUERTA ASEO
2,00	2,40	N/A	2	100%	**9,60**	PUERTA ENTRE CENTRAL DE EMFERMERIA Y TAC
2,00	1,98	N/A	-2	100%	**-7,92**	DESCUENTO PUERTA
18,52	2,37	N/A	1	100%	**43,89**	TAC
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	**-1,47**	DESCUENTO PUERTA
0,60	0,90	N/A	-1	100%	**-0,54**	DESCUENTO VENTANA
6,94	2,37	N/A	1	100%	**16,45**	CUARTO DISPARO
0,60	0,90	N/A	-1	100%	**-0,54**	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO VENTANA
4,58	2,45	N/A	1	100%	**11,22**	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA T LIMPIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
31,39	2,45	N/A	1	100%	**76,91**	OBSERVACION PEDIATRA
0,90	2,10	N/A	-2	100%	**-3,78**	DESCUENTO PUERTA
6,67	0,80	N/A	2	100%	**10,67**	CENTRAL DE EMFERMERIA
4,82	2,52	N/A	1	100%	**12,15**	RESIDUOS ORDINARIOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
4,27	2,52	N/A	1	100%	**10,76**	RESIDUOS PELIGROSOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
11,48	2,32	N/A	1	100%	**26,63**	DIR URGENSIAS
1,00	1,00	N/A	-1	100%	**-1,00**	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
10,61	2,43	N/A	1	100%	**25,78**	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
1,65	2,10	N/A	-1	100%	**-3,47**	DESCUENTO PUERTA
12,13	2,40	N/A	1	100%	**29,11**	SALA DE YESOS
0,94	1,00	N/A	-1	100%	**-0,94**	DESCUENTO VENTANA
1,70	2,10	N/A	-1	100%	**-3,57**	DESCUENTO PUERTA
15,60	2,53	N/A	1	100%	**39,47**	DIGITACION
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
1,29	1,00	N/A	-1	100%	**-1,29**	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO PUERTA
14,90	2,50	N/A	1	100%	**37,25**	SALA ERA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA
1,00	1,30	N/A	-1	100%	**-1,30**	DESCUENTO VENTANA
14,37	2,50	N/A	1	100%	**35,93**	CONSULTORIO 3
1,30	2,10	N/A	-1	100%	**-2,73**	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO PUERTA

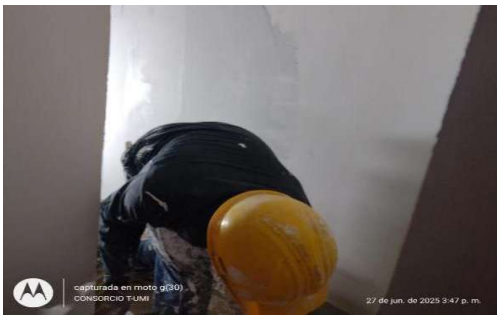









1,41	1,00	N/A	-1	100%	-1,41	DESCUENTO VENTANA
16,26	2,50	N/A	1	100%	40,65	CONSULTORIO 2
1,50	1,30	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO VENTANA
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO PUERTA
15,88	2,48	N/A	1	100%	39,38	CONSULTORIO 1
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO PUERTA
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO PUERTA
0,92	0,86	N/A	-1	100%	-0,79	DESCUENTO VENTANA
13,40	2,52	N/A	1	100%	33,77	ADMISIONES URGENSIAS
0,94	2,10	N/A	-1	100%	-1,97	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA
1,20	1,40	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO VENTANA
2,00	1,40	N/A	-1	100%	-2,80	DESCUENTO VENTANA
8,71	2,52	N/A	1	100%	21,95	REF Y CONTRA REF
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUEBTO PUERTA
11,20	2,53	N/A	1	100%	28,34	SALA ESPERA URGENCIAS
1,40	0,93	N/A	-1	100%	-1,30	DESCUENTO VENTANA
1,40	0,93	N/A	-1	100%	-1,30	DESCUENTO VENTANA
0,40	1,00	N/A	-1	100%	-0,40	DESCUENTO VENTANA
7,51	2,53	N/A	1	100%	19,00	ACCESO URGENCIAS
2,00	2,10	N/A	-1	100%	-4,20	DESCUENTO PUERA ACCESO URGENCIAS
0,70	1,00	N/A	-1	100%	-0,70	DESCUENTO VENTANA
6,35	2,53	N/A	1	100%	16,07	SALA ESPERA ADULTOS
1,20	1,75	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO VENTANA
1,13	1,73	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO VENTANA
6,37	0,75	N/A	1	100%	4,78	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
16,18	2,52	N/A	1	100%	40,77	DESCUENTO VENTANA
0,97	0,97	N/A	-1	100%	-0,94	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA
15,31	2,52	N/A	1	100%	38,58	CUARTO DE EQUIPOS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO PUERTA
0,40	0,50	N/A	-1	100%	-0,20	DESCUENTO VENTA
13,60	2,50	N/A	1	100%	34,00	RAYOS X
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUENTO PUERTA
14,90	2,54	N/A	1	100%	37,85	SALA ESPERA (HALL), PASILLO HACIA FARMACIA Y MUROS EXTERIOR Y POSTERIOR DE CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO
1,84	1,58	N/A	-1	100%	-2,91	DESCUENTO: VENTALA PASILLO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO: PUERTA CONTROL IMAGENOLOGÍA
3,51	1,00	N/A	2	100%	7,02	CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO - RECEPCIÓN (ANTEPECHO)
2,50	1,00	N/A	2	100%	5,00	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (ANTEPECHO)
1,25	2,54	N/A	1	100%	3,18	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (MURO CORTO LATERAL DERECH)
6,86	2,64	N/A	1	100%	18,11	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS (ACCESO A URG) Y ACCESO A TRIAGES
0,70	2,64	N/A	1	100%	1,85	
1,16	1,75	N/A	-1	100%	-2,03	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 1
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 2
4,40	2,50	N/A	1	100%	11,00	ACCESO A LAVADO DE PACIENTES
2,00	2,10	N/A	-1	100%	-4,20	DESCUENTO: PUERTA PASILLO
20,55	2,54	N/A	1	100%	52,20	MONITOREO GINESCOBTETRICIA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO: PUERTA CUARTO LIBRE
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1,71	2,10	N/A	-1	100%	-3,59	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
15,29	2,63	N/A	1	100%	40,21	SALA EDA
0,95	0,95	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1,07	1,00	N/A	-1	100%	-1,07	DESCUENTO: VENTANA PASILLO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
4,37	2,66	N/A	1	100%	11,62	AUDITORIO (MURO ORIENTAL)
1,13	1,72	N/A	-1	100%	-1,94	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
5,50	2,50	N/A	1	100%	13,75	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA: DIGITACIÓN
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO: PUERTA
4,60	2,50	N/A	1	100%	11,50	ROPA LIMPIA: DIGITACIÓN
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO: PUERTA
4,01	2,50	N/A	1	100%	10,03	ROPA SUCIA: DIGITACIÓN
2,95	2,50	N/A	1	100%	7,38	FACTURACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ADMISIÓN (MURO SUR)
5,77	2,4	N/A	1	100%	13,85	TRIAGE 2
2,53	2,4	N/A	1	100%	6,07	
0,81	1,5	N/A	-1	100%	-1,22	DESCUENTO VENTANA
2,10	2,2	N/A	1	100%	4,62	SALA ESPERA ADULTO
1,14	2,4	N/A	1	100%	2,74	AUDITORIO
1,70	2,4	N/A	1	100%	4,08	
3,16	2,4	N/A	2	100%	15,17	DESCANSO URGENCIAS
3,15	2,4	N/A	1	100%	7,56	
0,80	2,1	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUENTO PUERTA
1,63	2,4	N/A	1	100%	3,91	DESCANSO URGENCIAS
1,70	2,34	N/A	1	100%	3,98	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA
1,40	1,1	N/A	1	100%	1,54	
4,40	1,33	N/A	1	100%	5,85	CUARTO ASEO URGENCIAS
2,28	1	N/A	1	100%	2,28	SALA ERA
5,85	2,4	N/A	1	100%	14,04	CUARTO EQUIPO URG
0,90	2,07	N/A	-1	100%	-1,86	DESCUENTO PUERTA
0,80	0,9	N/A	1	100%	0,72	SALA YESO
1,60	0,7	N/A	1	100%	1,12	
1,50	1,07	N/A	1	100%	1,61	PASILLO URGENCIAS - TABLERO GASES
0,26	0,42	N/A	-1	100%	-0,11	PASILLO URGENCIAS - TABLERO
1,50	1,2	N/A	1	100%	1,80	PROCEDIMIENTO
2,40	0,9	N/A	1	100%	2,16	
2,00	0,8	N/A	1	100%	1,60	RESIDUOS PELIGROS
1,30	1	N/A	1	100%	1,30	RESIDUOS RESICLABLE
2,82	0,9	N/A	1	100%	2,54	OBSERVACION PEDIATRIA - TOMAS Y GASES
2,60	1,1	N/A	1	100%	2,86	
1,40	2,6	N/A	1	100%	3,64	
4,20	0,76	N/A	1	100%	3,19	CENTRAL DE ENFERMERIA
6,46	1,6	N/A	2	100%	20,67	TRABAJO LIMPIO - TRABAJO SUCIO
0,80	2,1	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUENTO PUERTAS
5,30	1,34	N/A	1	100%	7,10	CIRCULACION - CUARTO DE ASEO
1,30	1,02	N/A	1	100%	1,33	CUARO DE ASEO RX
0,60	2,4	N/A	1	100%	1,44	TOMA DE MUESTRA
1,62	2,4	N/A	1	100%	3,89	RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO
2,63	1,1	N/A	1	100%	2,89	FARMACIA AREA ENTREGA
4,94	1,1	N/A	1	100%	5,43	
2,40	0,8	N/A	1	100%	1,92	FACTURACION ADMISION
1,40	1,10	N/A	1	100%	1,54	PROCEDIMIENTO ACEPTICOS
1,27	2,40	N/A	1	100%	3,05	PROCEDIMIENTO ACEPTICOS
5,55	2,40	N/A	1	100%	13,32	T LIMPIO EN OBSERVACION PEDIATRA
0,79	2,06	N/A	-1	100%	-1,63	DESCUENTO DE PUERTA
6,63	2,40	N/A	1	100%	15,91	T SUCIO EN OBSERVACION
0,79	2,06	N/A	-1	100%	-1,63	DESCUENTO DE PUERTA
7,34	2,40	N/A	1	100%	17,62	INSUMOS AL LADO DE PROCEDIMIENTOS
0,80	2,06	N/A	-1	100%	-1,65	DESCUENTO DE PUERTA
		PISO 2				
37,05	2,50	N/A	1	100%	92,63	PASILLO RECUPERACION
8,25	2,10	N/A	-1	100%	-17,33	DESCUENTO PUERTAS
17,52	2,40	N/A	1	100%	42,05	PREPARACION PASIENTES
3,70	2,10	N/A	-1	100%	-7,77	DESCUENTO PUERTAS
39,12	2,55	N/A	1	100%	99,76	RECUPERACION QUIRURGICA
5,11	2,10	N/A	-1	100%	-10,73	DESCUENTO PUERTAS
13,37	0,70	N/A	-1	100%	-9,36	DESCUENTO VENTANAS
11,97	0,79	N/A	1	100%	9,46	CENTRAL EMFERMERIA
27,31	2,50	N/A	1	100%	68,28	CENTRAL ESTERILIZACION
1,90	2,10	N/A	-1	100%	-3,99	DESCUENTO PUERTAS
1,48	1,00	N/A	-1	100%	-1,48	DESCUENTO VENTANAS
1,00	0,70	N/A	-1	100%	-0,70	DESCUENTO VENTANAS
0,84	1,46	N/A	-1	100%	-1,23	DESCUENTO VENTANAS
11,39	2,50	N/A	1	100%	28,48	INGRESO AUTO CLAVE
2,10	2,10	N/A	-1	100%	-4,41	DESCUENTO PUERTAS
0,81	1,00	N/A	-1	100%	-0,81	DESCUENTO VENTANAS
61,80	2,50	N/A	1	100%	154,50	CICULACION DE QUIRURGICOS A SALA DE PARTOS
18,61	2,10	N/A	-1	100%	-39,08	DESCUENTO PUERTAS











1,50	1,26	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO VENTANAS
2,15	0,90	N/A	-1	100%	-1,94	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,00	N/A	-2	100%	-2,00	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,50	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO VENTANAS
2,00	2,50	N/A	-1	100%	-5,00	DESCUENTO ENTRADA A PASILLO
16,11	2,60	N/A	1	100%	41,89	SALA DE PARTOS #1
1,70	2,10	N/A	-1	100%	-3,57	DESCUENTO PUERTAS
0,95	0,95	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO VENTANAS
16,82	2,60	N/A	1	100%	43,73	SALA DE PARTOS #2
1,70	2,10	N/A	-1	100%	-3,57	DESCUENTO PUERTAS
4,12	0,50	N/A	-1	100%	-2,06	DESCUENTO VENTANAS
11,67	2,50	N/A	1	100%	29,18	CUARTO DE EQUIPOS
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO PUERTAS
21,53	2,50	N/A	1	100%	53,83	DESCANSO QUIROFANOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-2	100%	-3,78	DESCUENTO PUERTAS
3,21	0,50	N/A	-1	100%	-1,61	DESCUENTO VENTANAS
18,07	2,60	N/A	1	100%	46,98	QUIROFANO #1
1,70	2,10	N/A	-1	100%	-3,57	DESCUENTO PUERTAS
18,17	2,60	N/A	1	100%	47,24	QUIROFANO #2
1,70	2,10	N/A	-1	100%	-3,57	DESCUENTO PUERTAS
18,10	2,60	N/A	1	100%	47,06	QUIROFANO #3
1,70	2,10	N/A	-1	100%	-3,57	DESCUENTO PUERTAS
2,42	2,60	N/A	1	100%	6,29	TRABAJO SUCIO
3,50	2,10	N/A	-1	100%	-7,35	DESCUENTO PUERTAS
2,00	0,37	N/A	-1	100%	-0,74	DESCUENTO PUERTAS
1,00	0,70	N/A	-1	100%	-0,70	DESCUENTO VENTANAS
12,91	2,50	N/A	1	100%	32,28	FARMACIA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
1,00	1,00	N/A	-3	100%	-3,00	DESCUENTO VENTANAS
0,37	2,00	N/A	-1	100%	-0,74	DESCUENTO VENTANAS
5,95	2,50	N/A	1	100%	14,88	BODEGA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
13,66	2,50	N/A	1	100%	34,15	DESCANSO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
0,60	2,10	N/A	-1	100%	-1,26	DESCUENTO PUERTAS
1,00	1,00	N/A	-1	100%	-1,00	DESCUENTO VENTANAS
8,82	2,50	N/A	1	100%	22,05	PASILLO VESTIER
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	DESCUENTO PUERTAS
20,57	2,40	N/A	1	100%	49,37	VESTIER MUJERES
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-3	100%	-4,41	DESCUENTO VENTANAS
20,70	2,40	N/A	1	100%	49,68	VESTIER HOMBRES
0,80	2,10	N/A	2	100%	3,36	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	2	100%	2,94	DESCUENTO VENTANAS
83,30	2,45	N/A	1	100%	204,09	PASILLO PRINCIPAL A UCI
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO PUERTAS
1,00	0,70	N/A	-1	100%	-0,70	DESCUENTO VENTANAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO VENTANAS
2,00	2,45	N/A	-1	100%	-4,90	DESCUENTO VENTANAS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,50	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO VENTANAS
1,96	2,10	N/A	-1	100%	-4,12	DESCUENTO VENTANAS
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
0,76	2,10	N/A	-1	100%	-1,60	DESCUENTO PUERTAS
1,70	2,10	N/A	-1	100%	-3,57	DESCUENTO PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
0,60	2,10	N/A	-1	100%	-1,26	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO PUERTAS
2,00	2,10	N/A	-1	100%	-4,20	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
1,10	2,45	N/A	-1	100%	-2,70	DESCUENTO PUERTAS
1,70	2,10	N/A	-2	100%	-7,14	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
3,88	0,98	N/A	1	100%	3,80	RESECION
34,33	0,50	N/A	1	100%	17,17	TRABAJO DE PARTO
1,67	2,10	N/A	-1	100%	-3,51	DESCUENTO PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTAS
2,13	0,90	N/A	-1	100%	-1,92	DESCUENTO PUERTAS
1,50	1,30	N/A	-3	100%	-5,85	DESCUENTO PUERTAS
4,90	0,85	N/A	1	100%	4,17	CENTRAL DE EMFERMERIA
38,26	2,50	N/A	1	100%	95,65	RECUPERACION DE PARTOS
0,95	2,10	N/A	-1	100%	-2,00	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUNTO DE PUERTAS
1,50	1,30	N/A	-2	100%	-3,90	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUNTO DE PUERTAS
2,00	2,10	N/A	-1	100%	-4,20	DESCUNTO DE PUERTAS
5,22	0,77	N/A	1	100%	4,02	CENTRAL DE EMFERMERIA
5,95	2,50	N/A	1	100%	14,88	ROPA LIMPIA
0,95	2,10	N/A	-1	100%	-2,00	DESCUNTO DE PUERTAS
19,11	2,50	N/A	1	100%	47,78	VESTIER PARTOS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUNTO DE PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUNTO DE PUERTAS
96,00	2,50	N/A	1	100%	240,00	UCI ADULTOS
1,96	2,10	N/A	-1	100%	-4,12	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUNTO DE PUERTAS
1,60	2,10	N/A	-2	100%	-6,72	DESCUNTO DE PUERTAS
1,50	1,30	N/A	-4	100%	-7,80	DESCUNTO DE VENTANA
0,95	0,95	N/A	-2	100%	-1,81	DESCUNTO DE VENTANA
1,10	2,10	N/A	-2	100%	-4,62	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-4	100%	-6,72	DESCUNTO DE PUERTAS
1,30	0,92	N/A	-1	100%	-1,20	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,30	N/A	-1	100%	-1,69	DESCUNTO DE VENTANA
1,25	0,80	N/A	-2	100%	-2,00	DESCUNTO DE VENTANA
0,95	0,95	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUNTO DE VENTANA
1,20	1,30	N/A	-1	100%	-1,56	DESCUNTO DE VENTANA
5,19	0,85	N/A	1	100%	4,41	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7,28	0,78	N/A	1	100%	5,68	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7,65	2,50	N/A	1	100%	19,13	FILTRO ACCESO FAMILIARES
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUNTO DE PUERTAS
6,20	2,50	N/A	1	100%	15,50	IMFORMACION FAMILIARES
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE PUERTAS
19,41	2,50	N/A	1	100%	48,53	FILTRO ACCESO PERSONAL
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-2	100%	-2,94	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
9,50	2,50	N/A	1	100%	23,75	DESCANSO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUNTO DE PUERTAS
1,50	1,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUNTO DE PUERTAS
12,10	2,50	N/A	1	100%	30,25	EXTRACION
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUNTO DE PUERTAS
9,81	2,50	N/A	1	100%	24,53	FILTRO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE PUERTAS
11,51	2,50	N/A	1	100%	28,78	PASILLO ACCESO UCI
2,00	2,10	N/A	-2	100%	-8,40	DESCUNTO DE VENTANA
0,85	3,10	N/A	-1	100%	-2,64	DESCUNTO DE VENTANA
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUNTO DE PUERTAS
0,66	2,10	N/A	-1	100%	-1,39	DESCUNTO DE PUERTAS
17,21	2,50	N/A	1	100%	43,03	LACTARIO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUNTO DE PUERTAS











11,91	2,40	N/A	1	100%	28,58	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	1,00	N/A	-1	100%	-0,70	DESCUNTO DE VENTANA
96,38	2,50	N/A	1	100%	240,95	UCI NEONATAL
2,00	2,10	N/A	-1	100%	-4,20	DESCUNTO DE PUERTAS
1,35	2,10	N/A	-1	100%	-2,84	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	1,30	N/A	-1	100%	-1,17	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,30	N/A	-6	100%	-10,14	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,05	N/A	-1	100%	-1,37	DESCUNTO DE VENTANA
0,70	1,00	N/A	-1	100%	-0,70	DESCUNTO DE VENTANA
0,70	1,20	N/A	-2	100%	-1,68	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	1,30	N/A	-1	100%	-1,17	DESCUNTO DE VENTANA
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUNTO DE VENTANA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	2,50	N/A	-1	100%	-2,25	DESCUNTO DE VENTANA
1,35	2,10	N/A	-1	100%	-2,84	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE PUERTAS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	-1,58	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
15,00	0,66	N/A	1	100%	9,90	UCI AISLADO
12,79	0,66	N/A	1	100%	8,44	UCI AISLADO
4,68	0,82	N/A	4	100%	15,35	CENTRAL DE EMFERMERIA
10,64	0,82	N/A	1	100%	8,72	CENTRAL DE EMFERMERIA
11,41	2,50	N/A	1	100%	28,53	PASILLO DESCANSO
0,80	2,10	N/A	-4	100%	-6,72	DESCUNTO DE PUERTAS
20,32	2,50	N/A	1	100%	50,80	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	DESCUNTO DE VENTANA
1,90	1,30	N/A	-1	100%	-2,47	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,30	N/A	-1	100%	-1,69	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	1,30	N/A	-1	100%	-1,17	DESCUNTO DE VENTANA
11,78	2,50	N/A	1	100%	29,45	PASILLO ASEO Y LAVADO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUNTO DE PUERTAS
17,56	2,50	N/A	1	100%	43,90	PASILLO ASESO ASISTENCIAL
1,80	2,10	N/A	-1	100%	-3,78	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUNTO DE PUERTAS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	-1,58	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	DESCUNTO DE PUERTAS
1,73	2,10	N/A	-1	100%	-3,63	DESCUNTO DE PUERTAS
2,67	2,30	N/A	1	100%	6,14	ROPA LIMPIA
2,90	2,30	N/A	1	100%	6,67	ROPA SUCIA
13,60	2,60	N/A	1	100%	35,36	VESTIER ASISTENCIAL
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	3,60	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUNTO DE PUERTAS
9,21	2,40	N/A	1	100%	22,10	COORDINACION
1,80	2,10	N/A	-1	100%	-3,78	DESCUNTO DE PUERTAS
4,29	0,70	N/A	-1	100%	-3,00	DESCUNTO DE VENTANA
23,88	2,50	N/A	1	100%	59,70	HALL PRINCIPAL
1,90	2,10	N/A	-1	100%	-3,99	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	DESCUNTO DE PUERTAS
2,20	2,10	N/A	-1	100%	-4,62	DESCUNTO DE PUERTAS
5,56	2,40	N/A	1	100%	13,34	T LIMPIO CUIDADOS INTERMEDIOS
0,70	2,06	N/A	-1	100%	-1,44	DESCUENTO PUERTA
7,46	2,40	N/A	1	100%	17,90	T LIMPIO CUIDADOS INTENSIVOS
0,90	2,06	N/A	-1	100%	-1,85	DESCUENTO PUERTA
7,00	2,40	N/A	1	100%	16,80	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0,80	2,06	N/A	-1	100%	-1,65	DESCUENTO PUERTA
0,90	0,95	N/A	-1	100%	-0,86	DESCUENTO PUERTA
6,20	2,40	N/A	1	100%	14,88	T SUCIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0,80	2,06	N/A	-1	100%	-1,65	DESCUENTO PUERTA
9,80	2,40	N/A	1	100%	23,52	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0,70	2,06	N/A	-1	100%	-1,44	DESCUENTO PUERTAS
		PISO 3				
2,28	2,80	N/A	1	100%	6,38	LUDOTECA
1,55	2,80	N/A	1	100%	4,34	LUDOTECA
1,57	2,80	N/A	1	100%	4,40	LUDOTECA
1,55	2,80	N/A	1	100%	4,34	LUDOTECA
2,57	2,80	N/A	1	100%	7,20	LUDOTECA
6,68	2,80	N/A	1	100%	18,70	LUDOTECA
4,78	2,80	N/A	1	100%	13,38	LUDOTECA
4,78	2,80	N/A	1	100%	13,38	LUDOTECA
5,01	2,80	N/A	1	100%	14,03	LUDOTECA
4,80	2,80	N/A	1	100%	13,44	LUDOTECA
3,35	2,80	N/A	1	100%	9,38	LUDOTECA
4,91	2,80	N/A	1	100%	13,75	LUDOTECA
2,13	2,80	N/A	1	100%	5,96	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	100%	5,40	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	100%	5,40	LUDOTECA
2,23	2,80	N/A	1	100%	6,24	LUDOTECA
3,46	2,80	N/A	1	100%	9,69	LUDOTECA
7,90	2,80	N/A	1	100%	22,12	LUDOTECA
4,76	2,80	N/A	1	100%	13,33	LUDOTECA
4,17	2,80	N/A	1	100%	11,68	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	100%	5,40	LUDOTECA
1,10	2,80	N/A	1	100%	3,08	LUDOTECA
2,53	2,80	N/A	1	100%	7,08	LUDOTECA
0,93	2,80	N/A	1	100%	2,60	LUDOTECA
1,76	2,80	N/A	1	100%	4,93	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	100%	5,40	LUDOTECA
1,50	1,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,20	1,80	N/A	-1	100%	-2,16	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,20	2,00	N/A	-1	100%	-2,40	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2,24	4,78	N/A	-1	100%	-10,71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2,25	2,30	N/A	-1	100%	-5,18	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,35	4,80	N/A	-1	100%	-6,48	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,35	3,35	N/A	-1	100%	-4,52	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0,90	2,16	N/A	-1	100%	-1,94	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0,80	2,16	N/A	-2	100%	-3,46	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
0,90	2,16	N/A	-1	100%	-1,94	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
11,87	2,55	N/A	1	100%	30,27	EXTRACION DE LECHE MATERIAL
0,90	2,16	N/A	-1	100%	-1,94	DESCUENTO PUERTA LECHE MATERIAL
7,28	2,60	N/A	1	100%	18,93	DEPOSITO DE INSUMOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO PUERTA AREA DEPOSITO
5,92	2,60	N/A	1	100%	15,39	FILTRO INGRESO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	PREPARACION DE FORMULAS
15,02	2,60	N/A	1	100%	39,05	PREPARACION DE FORMULAS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	PREPARACION DE FORMULAS
1,96	1,25	N/A	-1	100%	-2,45	PREPARACION DE FORMULAS
1,55	1,05	N/A	-1	100%	-1,63	PREPARACION DE FORMULAS
11,50	2,60	N/A	1	100%	29,90	IMFORMACION FAMILIARES
0,90	2,80	N/A	-1	100%	-2,52	IMFORMACION FAMILIARES
13,17	2,70	N/A	1	100%	35,56	COORDINACIÓN PEDIATRA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	COORDINACIÓN PEDIATRA
32,31	2,54	N/A	1	100%	82,07	CIRCULACION
0,90	2,10	N/A	-5	100%	-9,45	CIRCULACION
0,70	2,10	N/A	-2	100%	-2,94	CIRCULACION
13,30	2,70	N/A	1	100%	35,91	DESCANSO DE MEDICO
0,70	2,50	N/A	-1	100%	-1,75	DESCANSO DE MEDICO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCANSO DE MEDICO
10,10	2,70	N/A	1	100%	27,27	DESCANSO EMFERMERIA
0,70	2,50	N/A	-1	100%	-1,75	DESCANSO EMFERMERIA
4,05	2,55	N/A	1	100%	10,33	ESTACION DE CAFÉ
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	ESTACION DE CAFÉ
15,45	2,80	N/A	1	100%	43,26	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,90	1,36	N/A	-1	100%	-2,58	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,30	1,36	N/A	-1	100%	-1,77	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	COORDINACION UCI PEDIATRICA
4,04	2,70	N/A	1	100%	10,91	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
9,35	2,70	N/A	1	100%	25,25	ASISTENCIAL
0,70	0,80	N/A	-1	100%	-0,56	ASISTENCIAL
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	ASISTENCIAL









8,18	2,60	N/A	1	100%	21,27	ROPA LIMPIA
0,70	1,14	N/A	-1	100%	-0,80	ROPA LIMPIA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	ROPA LIMPIA
8,40	2,60	N/A	1	100%	21,84	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0,70	0,80	N/A	-1	100%	-0,56	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
9,13	2,60	N/A	1	100%	23,74	CUARTO EQUIPOS
0,80	2,10	N/A	1	100%	1,68	CUARTO EQUIPOS
0,70	0,80	N/A	1	100%	0,56	CUARTO EQUIPOS
32,02	2,73	N/A	1	100%	87,41	CIRCULACION
0,80	2,10	N/A	-7	100%	-11,76	CIRCULACION
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	CIRCULACION
23,24	2,80	N/A	1	100%	65,07	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
2,00	0,73	N/A	6	100%	8,76	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0,20	2,10	N/A	-1	100%	-0,42	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
14,64	2,57	N/A	1	100%	37,62	ORATORIO
2,30	2,10	N/A	-1	100%	-4,83	ORATORIO
2,45	2,10	N/A	-2	100%	-10,29	ORATORIO
17,80	2,55	N/A	1	100%	45,39	SALA DE ESPERA
2,32	2,12	N/A	-1	100%	-4,92	SALA DE ESPERA
2,10	2,10	N/A	-1	100%	-4,41	SALA DE ESPERA
0,80	2,10	N/A	-3	100%	-5,04	SALA DE ESPERA
2,00	2,10	N/A	-1	100%	-4,20	SALA DE ESPERA
11,48	2,75	N/A	1	100%	31,57	U.C.I. 1
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 1 DESCUENTO
11,83	2,70	N/A	1	100%	31,94	U.C.I. 3
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 3 DESCUENTO
2,50	0,60	N/A	-1	100%	-1,50	U.C.I. 3 DESCUENTO
1,12	0,40	N/A	-1	100%	-0,45	U.C.I. 3 DESCUENTO
11,34	2,70	N/A	1	100%	30,62	U.C.I. 5
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 5 DESCUENTO
0,70	2,50	N/A	-1	100%	-1,75	U.C.I. 5 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 5 DESCUENTO
11,92	2,70	N/A	1	100%	32,18	U.C.I. 7
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 7 DESCUENTO
0,70	2,50	N/A	-1	100%	-1,75	U.C.I. 7 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 7 DESCUENTO
11,51	2,70	N/A	1	100%	31,08	U.C.I. 9
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 9 DESCUENTO
2,50	2,50	N/A	-1	100%	-6,25	U.C.I. 9 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 9 DESCUENTO
13,81	2,75	N/A	1	100%	37,98	U.C.I. 11
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 11 DESCUENTO
2,50	2,50	N/A	-1	100%	-6,25	U.C.I. 11 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 11 DESCUENTO
13,50	2,70	N/A	1	100%	36,45	U.C.I. 12
0,90	2,15	N/A	-1	100%	-1,94	U.C.I. 12 DESCUENTO
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 12 DESCUENTO
1,00	1,00	N/A	-1	100%	-1,00	U.C.I. 12 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 12 DESCUENTO
0,23	2,70	N/A	-1	100%	-0,62	U.C.I. 12 DESCUENTO
9,62	2,70	N/A	1	100%	25,97	U.C.I. 10
1,50	0,90	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 10 DESCUENTO
0,70	2,50	N/A	-1	100%	-1,75	U.C.I. 10 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 10 DESCUENTO
10,40	2,70	N/A	1	100%	28,08	U.C.I. 8
0,90	2,70	N/A	-1	100%	-2,43	U.C.I. 8 DESCUENTO
0,70	3,05	N/A	-1	100%	-2,14	U.C.I. 8 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 8 DESCUENTO
10,00	2,70	N/A	1	100%	27,00	U.C.I.
0,90	1,50	N/A	-1	100%	-1,35	U.C.I. 6 DESCUENTO
0,70	3,00	N/A	-1	100%	-2,10	U.C.I. 6 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	100%	-0,18	U.C.I. 6 DESCUENTO
7,00	2,70	N/A	1	100%	18,90	U.C.I. 4
3,00	0,70	N/A	-1	100%	-2,10	U.C.I. 4 DESCUENTO
6,70	2,70	N/A	1	100%	18,09	U.C.I. 2
3,00	0,70	N/A	-1	100%	-2,10	U.C.I. 2 DESCUENTO
2,80	2,70	N/A	1	100%	7,56	CIRCULACION
0,80	2,10	N/A	-2	100%	-3,36	CIRCULACION
17,84	2,40	N/A	1	100%	42,82	HABITACIÓN 301
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,00	1,45	N/A	-1	100%	-1,45	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,94	2,10	N/A	1	100%	4,07	HABITACIÓN 301 - CLOSET
18,17	2,40	N/A	1	100%	43,61	HABITACIÓN 302
1,90	2,10	N/A	1	100%	3,99	HABITACIÓN 302 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
0,95	0,95	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO
18,43	2,40	N/A	1	100%	44,23	HABITACIÓN 303
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 303 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
26,42	2,40	N/A	1	100%	63,41	HABITACIÓN 304
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 304 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
18,61	2,40	N/A	1	100%	44,66	HABITACIÓN 305
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 305 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
27,02	2,40	N/A	1	100%	64,85	HABITACIÓN 306
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 306 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,49	2,40	N/A	1	100%	44,38	HABITACIÓN 307
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 307 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
23,62	2,40	N/A	1	100%	56,69	HABITACIÓN 308
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 308 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
7,33	2,40	N/A	1	100%	17,59	CUARTO DE EQUIPOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
18,20	2,40	N/A	1	100%	43,68	HABITACIÓN 309
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 309 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,15	2,40	N/A	1	100%	43,56	HABITACIÓN 310
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 310 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
17,95	2,40	N/A	1	100%	43,08	HABITACIÓN 311
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 311 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO








0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,78	2,10	N/A	1	100%	**39,44**	HABITACIÓN 312
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 312 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
21,42	2,40	N/A	1	100%	**51,41**	HABITACIÓN 313
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 313 - CLOSET
1,20	1,50	N/A	-1	100%	**-1,80**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,33	2,40	N/A	1	100%	**43,99**	HABITACIÓN 314
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 314 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,42	2,40	N/A	1	100%	**44,21**	HABITACIÓN 315
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 315 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,45	2,00	N/A	-1	100%	**-0,90**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,02	2,40	N/A	1	100%	**43,25**	HABITACIÓN 316
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 316 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,95	1,45	N/A	-1	100%	**-1,38**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,37	2,40	N/A	1	100%	**44,09**	HABITACIÓN 317
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 317 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,28	2,40	N/A	1	100%	**43,87**	HABITACIÓN 318
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 318 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,35	2,40	N/A	1	100%	**44,04**	HABITACIÓN 319
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 319 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,38	2,40	N/A	1	100%	**44,11**	HABITACIÓN 320
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 320 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,21	2,40	N/A	1	100%	**43,70**	HABITACIÓN 321
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 321 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
17,96	2,40	N/A	1	100%	**43,10**	HABITACIÓN 322
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 322 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,48	2,40	N/A	1	100%	**44,35**	HABITACIÓN 323
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 323 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,01	2,40	N/A	1	100%	**43,22**	HABITACIÓN 324
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 324 - CLOSET
0,95	0,90	N/A	-1	100%	**-0,86**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
18,18	2,40	N/A	1	100%	**43,63**	HABITACIÓN 325
1,95	2,10	N/A	1	100%	**4,10**	HABITACIÓN 325 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	**-1,50**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
5,10	2,40	N/A	1	100%	**12,24**	ZONA TRABAJO NORTE
7,91	0,85	N/A	1	100%	**6,72**	
83,05	2,40	N/A	1	100%	**199,32**	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1,20	2,10	N/A	-25	100%	**-63,00**	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
0,80	0,80	N/A	-3	100%	**-1,92**	DESCUENTO GABINETE
0,33	0,25	N/A	-2	100%	**-0,17**	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13,90	1,05	N/A	1	100%	**14,60**	CENTRAL ENFERMERIA
5,14	2,40	N/A	1	100%	**12,34**	
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
8,78	2,40	N/A	1	100%	**21,07**	TRABAJO LIMPIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
3,41	2,40	N/A	1	100%	**8,18**	ROPA LIMPIA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	**-1,47**	DESCUENTO
5,86	2,40	N/A	1	100%	**14,06**	TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
11,69	2,40	N/A	1	100%	**28,06**	PROCEDIMIENTOS
1,40	2,10	N/A	-1	100%	**-2,94**	DESCUENTO
11,28	2,40	N/A	1	100%	**27,07**	DESCANSO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
27,87	2,40	N/A	1	100%	**66,89**	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,20	1,50	N/A	-1	100%	**-1,80**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
1,30	2,10	N/A	-1	100%	**-2,73**	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
1,40	2,10	N/A	-1	100%	**-2,94**	DESCUENTO
0,83	0,83	N/A	-1	100%	**-0,69**	DESCUENTO GABINTE
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
4,58	2,60	N/A	1	100%	**11,91**	SALIDA BALCON SUR
6,28	0,85	N/A	1	100%	**5,34**	BALCON SUR
2,10	2,40	N/A	1	100%	**5,04**	ROPA LIMPIA
4,68	2,40	N/A	1	100%	**11,23**	RESIDUOS ORDINARIOS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	**-1,58**	DESCUENTO
4,02	2,40	N/A	1	100%	**9,65**	RESIDUOS PELIGROSOS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	**-1,58**	DESCUENTO
14,35	2,40	N/A	1	100%	**34,44**	PASILLO ACCESO
0,75	2,10	N/A	-2	100%	**-3,15**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-3	100%	**-5,67**	DESCUENTO
0,75	2,40	N/A	-1	100%	**-1,80**	DESCUENTO
23,10	2,40	N/A	1	100%	**55,44**	HALL
6,35	1,45	N/A	-1	100%	**-9,21**	DESCUENTO
3,45	1,45	N/A	-1	100%	**-5,00**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
1,05	1,66	N/A	-1	100%	**-1,74**	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	**-2,10**	DESCUENTO
12,36	2,40	N/A	1	100%	**29,66**	COORDINACIÓN
1,05	2,66	N/A	-1	100%	**-2,79**	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	**-2,10**	DESCUENTO
1,66	1,47	N/A	-1	100%	**-2,44**	DESCUENTO



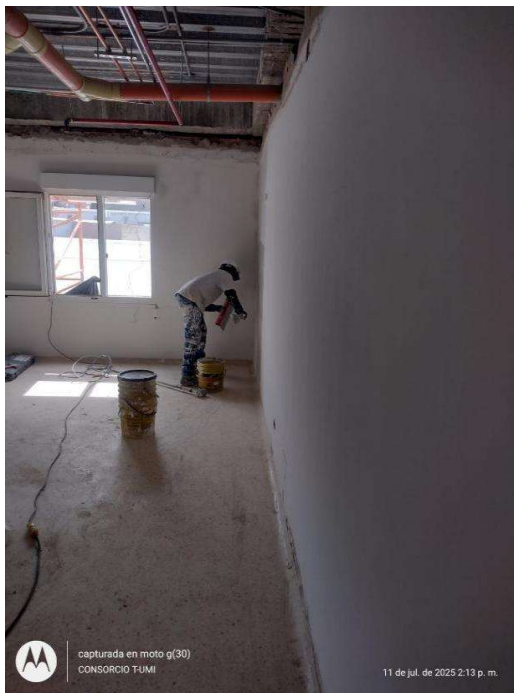





0,78	1,47	N/A	-1	100%	-1,15	DESCUENTO
		PISO 4				
17,84	2,40	N/A	1	100%	42,82	HABITACIÓN 401
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,00	1,45	N/A	-1	100%	-1,45	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,94	2,10	N/A	1	100%	4,07	HABITACIÓN 401 - CLOSET
18,17	2,40	N/A	1	100%	43,61	HABITACIÓN 402
1,90	2,10	N/A	1	100%	3,99	HABITACIÓN 402 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
0,95	0,95	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO
18,43	2,40	N/A	1	100%	44,23	HABITACIÓN 403
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 403 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
26,42	2,40	N/A	1	100%	63,41	HABITACIÓN 404
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 404 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
18,61	2,40	N/A	1	100%	44,66	HABITACIÓN 405
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 405 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
27,02	2,40	N/A	1	100%	64,85	HABITACIÓN 406
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 406 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,49	2,40	N/A	1	100%	44,38	HABITACIÓN 407
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 407 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
23,62	2,40	N/A	1	100%	56,69	HABITACIÓN 408
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 408 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
7,33	2,40	N/A	1	100%	17,59	CUARTO DE EQUIPOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
18,20	2,40	N/A	1	100%	43,68	HABITACIÓN 409
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 409 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,15	2,40	N/A	1	100%	43,56	HABITACIÓN 410
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 410 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
17,95	2,40	N/A	1	100%	43,08	HABITACIÓN 411
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 411 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,78	2,10	N/A	1	100%	39,44	HABITACIÓN 412
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 412 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
21,42	2,40	N/A	1	100%	51,41	HABITACIÓN 413
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 413 - CLOSET
1,20	1,50	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,33	2,40	N/A	1	100%	43,99	HABITACIÓN 414
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 414 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,42	2,40	N/A	1	100%	44,21	HABITACIÓN 415
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 415 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,45	2,00	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,02	2,40	N/A	1	100%	43,25	HABITACIÓN 416
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 416 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,95	1,45	N/A	-1	100%	-1,38	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,37	2,40	N/A	1	100%	44,09	HABITACIÓN 417
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 417 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,28	2,40	N/A	1	100%	43,87	HABITACIÓN 418
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 418 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,35	2,40	N/A	1	100%	44,04	HABITACIÓN 419
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 419 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,38	2,40	N/A	1	100%	44,11	HABITACIÓN 420
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 420 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,21	2,40	N/A	1	100%	43,70	HABITACIÓN 421
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 421 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
17,96	2,40	N/A	1	100%	43,10	HABITACIÓN 422
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 422 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,48	2,40	N/A	1	100%	44,35	HABITACIÓN 423







1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 423 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,01	2,40	N/A	1	100%	43,22	HABITACIÓN 424
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 424 - CLOSET
0,95	0,90	N/A	-1	100%	-0,86	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,18	2,40	N/A	1	100%	43,63	HABITACIÓN 425
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 425 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
5,10	2,40	N/A	1	100%	12,24	ZONA TRABAJO NORTE
7,91	0,85	N/A	1	100%	6,72	
83,05	2,40	N/A	1	100%	199,32	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1,20	2,10	N/A	-25	100%	-63,00	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
0,80	0,80	N/A	-3	100%	-1,92	DESCUENTO GABINETE
0,33	0,25	N/A	-2	100%	-0,17	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13,90	1,05	N/A	1	100%	14,60	CENTRAL ENFERMERIA
5,14	2,40	N/A	1	100%	12,34	
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
8,78	2,40	N/A	1	100%	21,07	TRABAJO LIMPIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
3,41	2,40	N/A	1	100%	8,18	ROPA LIMPIA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	-1,47	DESCUENTO
5,86	2,40	N/A	1	100%	14,06	TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
11,69	2,40	N/A	1	100%	28,06	PROCEDIMIENTOS
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO
11,28	2,40	N/A	1	100%	27,07	DESCANSO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
27,87	2,40	N/A	1	100%	66,89	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,20	1,50	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	2,10	N/A	-1	100%	-2,73	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
1,40	2,10	N/A	-1	100%	-2,94	DESCUENTO
0,83	0,83	N/A	-1	100%	-0,69	DESCUENTO GABINTE
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
4,58	2,60	N/A	1	100%	11,91	SALIDA BALCON SUR
6,28	0,85	N/A	1	100%	5,34	BALCON SUR
2,10	2,40	N/A	1	100%	5,04	ROPA LIMPIA
4,68	2,40	N/A	1	100%	11,23	RESIDUOS ORDINARIOS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	-1,58	DESCUENTO
4,02	2,40	N/A	1	100%	9,65	RESIDUOS PELIGROSOS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	-1,58	DESCUENTO
14,35	2,40	N/A	1	100%	34,44	PASILLO ACCESO
0,75	2,10	N/A	-2	100%	-3,15	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-3	100%	-5,67	DESCUENTO
0,75	2,40	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO
23,10	2,40	N/A	1	100%	55,44	HALL
6,35	1,45	N/A	-1	100%	-9,21	DESCUENTO
3,45	1,45	N/A	-1	100%	-5,00	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
1,05	1,66	N/A	-1	100%	-1,74	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO
12,36	2,40	N/A	1	100%	29,66	COORDINACIÓN
1,05	2,66	N/A	-1	100%	-2,79	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO
1,66	1,47	N/A	-1	100%	-2,44	DESCUENTO
0,78	1,47	N/A	-1	100%	-1,15	DESCUENTO
2,30	1,2	N/A	1	100%	2,76	HAB 401
1,70	2,4	N/A	1	100%	4,08	PASILLO HAB 401 GABINETE
0,81	0,81	N/A	-1	100%	-0,66	DESCUENTO GABINETE
3,20	2,4	N/A	1	100%	7,68	HAB 403
1,00	1,5	N/A	1	100%	1,50	HAB 405
2,40	2,4	N/A	1	100%	5,76	HAB 407
0,94	2,4	N/A	1	100%	2,26	HAB 406
1,20	2,4	N/A	1	100%	2,88	HAB 409
3,14	2,4	N/A	1	100%	7,54	HAB 410
1,00	1,5	N/A	1	100%	1,50	HAB 411
2,30	2,4	N/A	1	100%	5,52	HAB 412
1,70	2,4	N/A	1	100%	4,08	PASILLO HAB 417
0,81	0,81	N/A	-1	100%	-0,66	PASILLO HAB 418
1,20	1,5	N/A	1	100%	1,80	HAB 414
1,20	1,5	N/A	1	100%	1,80	HAB 415
2,04	2,4	N/A	1	100%	4,90	HAB 416
2,10	1,4	N/A	1	100%	2,94	HAB 417
1,00	1,6	N/A	1	100%	1,60	HAB 418
3,08	2,4	N/A	1	100%	7,39	HAB 419
1,80	1,5	N/A	1	100%	2,70	HAB 420
1,30	1,7	N/A	1	100%	2,21	HAB 421
1,30	1,5	N/A	1	100%	1,95	HAB 422
1,20	1,5	N/A	1	100%	1,80	HAB 423
1,20	1,5	N/A	1	100%	1,80	HAB 424
1,60	2,4	N/A	1	100%	3,84	PASILLO GABINETE
0,80	0,8	N/A	-1	100%	-0,64	GABINETE

OBSERVACIONES:

TOTAL	**9.299,14**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**1.128,24**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**8.170,90**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1,02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M	CAP	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
2,55	N/A	N/A	12	100%	**30,60**	BODEGA FARMACIA
2,52	N/A	N/A	11	100%	**27,72**	ARCHIVO
2,10	N/A	N/A	5	100%	**10,50**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
1,40	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
2,10	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2,53	N/A	N/A	3	100%	**7,59**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1,30	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1,40	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2,50	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	DEP. CADAVERES
2,10	N/A	N/A	8	100%	**16,80**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2,00	N/A	N/A	2	100%	**4,00**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1,40	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2,10	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULACION SALA DE STAR
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CIRCULACION SALA DE STAR
0,70	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	CIRCULACION SALA DE STAR
2,52	N/A	N/A	5	100%	**12,60**	DEPOSITO ALMACEN
2,50	N/A	N/A	5	100%	**12,50**	LAVANDERIA
2,70	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	PARQUEADERO SOTANO
2,80	N/A	N/A	3	100%	**8,40**	PARQUEADERO SOTANO
PISO 1						
4,02	N/A	N/A	1	100%	**4,02**	LAVADO DE OJOS
2,90	N/A	N/A	1	100%	**2,90**	LAVADO DE OJOS
0,96	N/A	N/A	1	100%	**0,96**	LAVADO DE OJOS
1,30	N/A	N/A	15	100%	**19,50**	LABORATORIO
2,20	N/A	N/A	2	100%	**4,40**	LABORATORIO
0,80	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	LABORATORIO
1,60	N/A	N/A	1	100%	**1,60**	INYECTOLOGIA
2,28	N/A	N/A	1	100%	**2,28**	INYECTOLOGIA
4,37	N/A	N/A	1	100%	**4,37**	INYECTOLOGIA
2,60	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	INYECTOLOGIA
1,70	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	INYECTOLOGIA
3,86	N/A	N/A	1	100%	**3,86**	INYECTOLOGIA
2,76	N/A	N/A	1	100%	**2,76**	INYECTOLOGIA
2,02	N/A	N/A	1	100%	**2,02**	RESIDUOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	RESIDUOS
0,64	N/A	N/A	2	100%	**1,28**	RESIDUOS
1,30	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	RESIDUOS
0,47	N/A	N/A	1	100%	**0,47**	RESIDUOS
1,30	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	RESIDUOS
2,60	N/A	N/A	3	100%	**7,80**	INYECTOLOGIA
1,08	N/A	N/A	1	100%	**1,08**	AREA NEVERA
2,02	N/A	N/A	2	100%	**4,04**	PRETRASFUCIONAL
1,10	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	PRETRASFUCIONAL
0,96	N/A	N/A	2	100%	**1,92**	PRETRASFUCIONAL
2,60	N/A	N/A	3	100%	**7,80**	PRETRASFUCIONAL
0,65	N/A	N/A	2	100%	**1,30**	PRETRASFUCIONAL
1,00	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	PRETRASFUCIONAL
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	BAÑO URGENCIAS
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	MUESTRAS GINECO
1,30	N/A	N/A	4	100%	**5,20**	MUESTRAS GINECO
1,07	N/A	N/A	3	100%	**3,21**	MUESTRAS GINECO
2,60	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	TOMA DE MUESTRAS
1,21	N/A	N/A	2	100%	**2,42**	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
1,10	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
2,60	N/A	N/A	14	100%	**36,40**	FARMACIA
2,10	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	FARMACIA
3,00	N/A	N/A	2	100%	**6,00**	FARMACIA
1,50	N/A	N/A	6	100%	**9,00**	FARMACIA
1,64	N/A	N/A	1	100%	**1,64**	FARMACIA
2,10	N/A	N/A	6	100%	**12,60**	FARMACIA
2,60	N/A	N/A	4	100%	**10,40**	FARMACIA
1,00	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	CICULACION HALL
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CICULACION HALL
1,29	N/A	N/A	1	100%	**1,29**	CICULACION HALL
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	CICULACION HALL
2,10	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	ADMISIONES
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	MANOGRAFO
1,10	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	IMAGENOLOGIA
1,00	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	IMAGENOLOGIA
0,40	N/A	N/A	2	100%	**0,80**	IMAGENOLOGIA
2,60	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	ADMISIONES
2,10	N/A	N/A	5	100%	**10,50**	ADMISIONES
1,10	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	ADMISIONES
0,90	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	ADMISIONES
2,60	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	PROCEDIMIENTOS
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	PROCEDIMIENTOS
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	PROCEDIMIENTOS
2,60	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	COSULTORIO CARDIOLOGIA
0,70	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	CICULACION HALL A ASECIA
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CICULACION HALL A ASECIA
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CICULACION HALL A ASECIA
2,60	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	OFICINA RADIOLOGIA
2,60	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	INSUMOS
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	INSUMOS
2,10	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	INSUMOS
2,60	N/A	N/A	4	100%	**10,40**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
1,10	N/A	N/A	2	100%	**2,20**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
1,00	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
0,40	N/A	N/A	2	100%	**0,80**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	ECOGRAFIA
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	ECOGRAFIA
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	ECOGRAFIA
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	ECOGRAFIA
2,60	N/A	N/A	3	100%	**7,80**	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CONSULTORIO ECOGRAFIA
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2,10	N/A	N/A	9	100%	**18,90**	CIRCULACION ACESO URGENCIAS
11,47	N/A	N/A	1	100%	**11,47**	FAJAS DINTE CONSULTORIO 3
4,00	N/A	N/A	4	100%	**16,00**	FAJAS DINTE CONSULTORIO 3
1,40	N/A	N/A	2	100%	**2,80**	CONSULTORIO 4
1,00	N/A	N/A	4	100%	**4,00**	CONSULTORIO 4
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CONSULTORIO 4
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	MONITOREO GINECOSTETRIA
1,73	N/A	N/A	1	100%	**1,73**	REANIMACION
1,30	N/A	N/A	8	100%	**10,40**	REANIMACION
2,10	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	REANIMACION
2,16	N/A	N/A	1	100%	**2,16**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2,10	N/A	N/A	6	100%	**12,60**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1,00	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2,70	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1,70	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1,00	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0,80	N/A	N/A	4	100%	**3,20**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2,00	N/A	N/A	4	100%	**8,00**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0,40	N/A	N/A	8	100%	**3,20**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0,80	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2,00	N/A	N/A	2	100%	**4,00**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
0,40	N/A	N/A	4	100%	**1,60**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2,70	N/A	N/A	6	100%	**16,20**	FACTURACION
1,00	N/A	N/A	4	100%	**4,00**	FACTURACION
2,70	N/A	N/A	6	100%	**16,20**	HALL GENERAL
2,30	N/A	N/A	4	100%	**9,20**	COCINETA
1,90	N/A	N/A	1	100%	**1,90**	COCINETA
2,10	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CAFETERIA











0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	CAFETERIA
1,30	N/A	N/A	1	100%	1,30	CAFETERIA
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	PUERTA MANOGRAFO
0,50	N/A	N/A	1	100%	0,50	PUERTA DINTEL
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	TAC
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	TAC
0,80	N/A	N/A	3	100%	2,40	TAC
1,70	N/A	N/A	2	100%	3,40	DISPARO
2,38	N/A	N/A	3	100%	7,14	DISPARO
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	DISPARO
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	DISPARO
2,45	N/A	N/A	6	100%	14,70	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2,10	N/A	N/A	6	100%	12,60	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2,73	N/A	N/A	3	100%	8,19	OBSERVACION PEDIATRA
0,79	N/A	N/A	3	100%	2,37	OBSERVACION PEDIATRA
0,51	N/A	N/A	2	100%	1,02	OBSERVACION PEDIATRA
2,45	N/A	N/A	11	100%	26,95	OBSERVACION PEDIATRA
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	OBSERVACION PEDIATRA
6,67	N/A	N/A	1	100%	6,67	CENTRAL DE EMFERMERIA
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	CENTRAL DE EMFERMERIA
1,00	N/A	N/A	3	100%	3,00	DIR URGENCIAS
2,42	N/A	N/A	3	100%	7,26	PROCEDIMIRNTOD ASCEPTICOS
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	DIGITACION
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	DIGITACION
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	DIGITACION
1,30	N/A	N/A	2	100%	2,60	DIGITACION
2,50	N/A	N/A	3	100%	7,50	SALA ERA
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	SALA ERA
1,30	N/A	N/A	2	100%	2,60	SALA ERA
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	SALA ERA
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	SALA ERA
2,50	N/A	N/A	4	100%	10,00	CONSULTORIO 3
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	CONSULTORIO 3
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	CONSULTORIO 3
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	CONSULTORIO 3
1,40	N/A	N/A	2	100%	2,80	CONSULTORIO 3
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	CONSULTORIO 2
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	CONSULTORIO 2
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	CONSULTORIO 2
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	CONSULTORIO 2
1,30	N/A	N/A	2	100%	2,60	CONSULTORIO 2
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	CONSULTORIO 2
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	CONSULTORIO 1
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	CONSULTORIO 1
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	CONSULTORIO 1
0,93	N/A	N/A	2	100%	1,86	CONSULTORIO 1
0,92	N/A	N/A	2	100%	1,84	CONSULTORIO 1
2,50	N/A	N/A	3	100%	7,50	ADMISIONES
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	REF Y CONTRA REF
2,52	N/A	N/A	4	100%	10,08	SALA ESEPRA URGENCIAS
1,40	N/A	N/A	4	100%	5,60	SALA ESEPRA URGENCIAS
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	SALA ESEPRA URGENCIAS
2,52	N/A	N/A	2	100%	5,04	SALA ESEPRA URGENCIAS
1,20	N/A	N/A	2	100%	2,40	SALA ESEPRA URGENCIAS
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	SALA ESEPRA URGENCIAS
0,75	N/A	N/A	2	100%	1,50	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
2,52	N/A	N/A	1	100%	2,52	DESCANSO INTERNOS
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	DESCANSO INTERNOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	DESCANSO INTERNOS
2,52	N/A	N/A	5	100%	12,60	EQUIPOS
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	EQUIPOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	EQUIPOS
2,54	N/A	N/A	4	100%	10,16	PASILLO - SALA ESPERA A FARMACIA: COLUMAS
1,84	N/A	N/A	1	100%	1,84	PASILLO - SALA ESPERA A FARMACIA: VENTANA
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	CONTROL IMGENOLOGÍA - CARDIOLOGÍA: VANO PUERTA (ALTO)
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	CONTROL IMGENOLOGÍA - CARDIOLOGÍA: VANO PUERTA (ANCHO)
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	SALA ESPERA - RECEPCIÓN: ANTEPECHO (LARGO)
1,00	N/A	N/A	1	100%	1,00	SALA ESPERA - RECEPCIÓN: ANTEPECHO (ALTO)
3,51	N/A	N/A	1	100%	3,51	CONTROL IMAGENOLOGÍA - CARDIO: ANTEPECHO
1,50	N/A	N/A	1	100%	1,50	CONTROL IMAGENOLOGÍA - CARDIO:COLUMNETA
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	SALA ESPERA - RECEPCIÓN: MURO CORTO LATERAL DERECHO
2,64	N/A	N/A	2	100%	5,28	CAMILLA Y SILLAS RUEDAS: COLUMNA
2,00	N/A	N/A	1	100%	2,00	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA: PUERTA ACCESO (ANCHO)
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA: PUERTA ACCESO (ALTO)
2,54	N/A	N/A	5	100%	12,70	MONITOREO GINESCOBTETRIA: COLUMNAS
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTAS (ALTOS)
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTA BAÑO (ANCHO)
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTA CUARTO LIBRE (ANCHO)
1,71	N/A	N/A	1	100%	1,71	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0,95	N/A	N/A	4	100%	3,80	SALA EDA: VENTANA EXTERIOR
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	SALA EDA: VENTANA PASILLO (ANCHO)
1,07	N/A	N/A	2	100%	2,14	SALA EDA: VENTANA PASILLO (ALTO)
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	SALA EDA: PUERTAS (ALTOS)
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	SALA EDA: PUERTA BAÑO (ANCHO)
1,00	N/A	N/A	1	100%	1,00	SALA EDA: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
2,63	N/A	N/A	4	100%	10,52	SALA EDA: COLUMNAS
1,13	N/A	N/A	2	100%	2,26	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): VENTANA (ANCHO)
1,72	N/A	N/A	1	100%	1,72	AUDITORIO (MURO ORIANTAL): VENTANA (ALTO)
2,62	N/A	N/A	1	100%	2,62	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): COLUMNA
3,80	N/A	N/A	4	100%	15,20	
2,37	N/A	N/A	1	100%	2,37	AUDITORIO (MURO NORTE): VENTANA
2,62	N/A	N/A	1	100%	2,62	
2,66	N/A	N/A	5	100%	13,30	AUDITORIO (MURO NORTE): COLUMNAS
3,89	N/A	N/A	2	100%	7,78	SALA ESPERA ADULTO: VENTANA (ANCHO)
2,60	N/A	N/A	1	100%	2,60	SALA ESPERA ADULTO: VENTANA (ALTO)
2,60	N/A	N/A	6	100%	15,60	SALA ESPERA ADULTO: COLUMNAS
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ALTO)
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ANCHO)
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	ROPA LIMPIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ALTO)
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	ROPA LIMPIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ANCHO)
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	ROPA SUCIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ALTO)
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	ROPA SUCIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ANCHO)
2,53	N/A	N/A	2	100%	5,06	REANIMACIÓN: COLUMNA
2,57	N/A	N/A	4	100%	10,28	DIGITACIÓN: COLUMNA
2,60	N/A	N/A	3	100%	7,80	OBS. GINESCOTETRICA
2,55	N/A	N/A	2	100%	5,10	PROCEDIMIENTOS: COLUMNAS
2,52	N/A	N/A	2	100%	5,04	SALA DE LECTURA DE IMAGENOLOGÍCA: COLUMNAS
2,50	N/A	N/A	5	100%	12,50	RX: COLUMNAS
2,56	N/A	N/A	2	100%	5,12	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGÍCA: COLUMNA
2,56	N/A	N/A	2	100%	5,12	RESIDUOS RECICLABLES ORDINARIOS: COLUMNAS
2,60	N/A	N/A	8	100%	20,80	COCINA: COLUMNAS
2,60	N/A	N/A	2	100%	5,20	CAFETERIA: COLUMNAS
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACIÓN):
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	PUERTA
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	ROPA LIMPIA (DIGITACIÓN): PUERTA
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	ROPA SUCIA (DIGITACIÓN): PUERTA
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
1,30	N/A	N/A	2	100%	2,60	CONSULTORIO # 2
2,17	N/A	N/A	1	100%	2,17	CONSULTORIO # 2
1,20	N/A	N/A	5	100%	6,00	OBSERVACION GINECOSTETRICA
1,20	N/A	N/A	8	100%	9,60	OBSERVACION PEDIATRIA
1,50	N/A	N/A	1	100%	1,50	CIRCULACION A LADO GABINETE
1,24	N/A	N/A	1	100%	1,24	SALA PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
		PISO 2				
8,95	N/A	N/A	1	100%	8,95	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2,10	N/A	N/A	8	100%	16,80	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2,50	N/A	N/A	3	100%	7,50	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
3,70	N/A	N/A	1	100%	3,70	PREPARACION PACIENTES
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	PREPARACION PACIENTES
2,40	N/A	N/A	2	100%	4,80	PREPARACION PACIENTES










3,11	N/A	N/A	1	100%	3,11	RECUPERACION QUIRURGICA
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	PACIENTES
2,55	N/A	N/A	7	100%	17,85	FAJAS ESQUINERAS
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	COLUMNA
8,47	N/A	N/A	1	100%	8,47	CENTRAL DE ENFERMERIA
1,48	N/A	N/A	2	100%	2,96	FAJAS VENTANAS
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	FAJAS VENTANAS
2,50	N/A	N/A	6	100%	15,00	CENRAL DE ESTERILIZACIÓN
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	INGRESO AUTOCLAVE
18,61	N/A	N/A	1	100%	18,61	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
2,10	N/A	N/A	21	100%	44,10	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
1,00	N/A	N/A	10	100%	10,00	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
2,15	N/A	N/A	2	100%	4,30	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
2,50	N/A	N/A	5	100%	12,50	SALA DE PARTOS 1
0,95	N/A	N/A	4	100%	3,80	SALA DE PARTOS 1
2,60	N/A	N/A	2	100%	5,20	SALA DE PARTOS 2
0,50	N/A	N/A	2	100%	1,00	VENTANA
4,12	N/A	N/A	2	100%	8,24	VENTANA
3,21	N/A	N/A	2	100%	6,42	DESCANSO QUIROFANOS
0,50	N/A	N/A	2	100%	1,00	VENTANACPUERTA COLUMNA
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	QUIROFANO 1
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	QUIROFANO 2
2,60	N/A	N/A	2	100%	5,20	QUIROFANO 3
2,60	N/A	N/A	3	100%	7,80	PASILLO TRABAJO SUCIO
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	PASILLO TRABAJO SUCIO
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	PASILLO TRABAJO SUCIO
1,00	N/A	N/A	1	100%	1,00	PASILLO TRABAJO SUCIO
0,37	N/A	N/A	2	100%	0,74	PASILLO TRABAJO SUCIO
2,00	N/A	N/A	2	100%	4,00	FARMACIA
0,37	N/A	N/A	2	100%	0,74	FARMACIA
2,00	N/A	N/A	2	100%	4,00	FARMACIA
2,50	N/A	N/A	5	100%	12,50	FARMACIA
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	FARMACIA
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	FARMACIA
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	BODEGA
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	BODEGA
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	DESCANSO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	DESCANSO
1,00	N/A	N/A	4	100%	4,00	DESCANSO
0,60	N/A	N/A	1	100%	0,60	DESCANSO
2,50	N/A	N/A	9	100%	22,50	DESCANSO
2,10	N/A	N/A	7	100%	14,70	VESTIER MUJERES
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	VESTIER MUJERES
0,70	N/A	N/A	3	100%	2,10	VESTIER MUJERES
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	VESTIER MUJERES
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	VESTIER HOMBRES
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	VESTIER HOMBRES
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	VESTIER HOMBRES
2,40	N/A	N/A	3	100%	7,20	VESTIER HOMBRES
2,10	N/A	N/A	23	100%	48,30	PASILLO PRINCIPAL UCI
15,60	N/A	N/A	1	100%	15,60	PUERTA DINTEL
2,45	N/A	N/A	5	100%	12,25	ESQUINERO
3,00	N/A	N/A	1	100%	3,00	RECEPCION
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	TRABAJO DE PARTOS
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	TRABAJO DE PARTOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	TRABAJO DE PARTOS
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	TRABAJO DE PARTOS
2,50	N/A	N/A	8	100%	20,00	TRABAJO DE PARTOS
4,69	N/A	N/A	1	100%	4,69	CENTRAL DE ENFERMERIA
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	RECUPERACIÓN PARTOS
0,95	N/A	N/A	1	100%	0,95	RECUPERACIÓN PARTOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	RECUPERACIÓN PARTOS
1,00	N/A	N/A	1	100%	1,00	RECUPERACIÓN PARTOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	RECUPERACIÓN PARTOS
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	RECUPERACIÓN PARTOS
2,50	N/A	N/A	20	100%	50,00	RECUPERACIÓN PARTOS
5,31	N/A	N/A	1	100%	5,31	CENTRAL DE ENFERMERIA
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	ROPA LIMPIA
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	FAJA VESTIER PARTOS
2,10	N/A	N/A	12	100%	25,20	UCI ADULTOS (UARO)
0,80	N/A	N/A	4	100%	3,20	UCI ADULTOS (UARO)
1,10	N/A	N/A	2	100%	2,20	UCI ADULTOS (UARO)
1,30	N/A	N/A	3	100%	3,90	UCI ADULTOS (UARO)
1,30	N/A	N/A	2	100%	2,60	UCI ADULTOS (UARO)
0,92	N/A	N/A	2	100%	1,84	UCI ADULTOS (UARO)
0,25	N/A	N/A	4	100%	1,00	UCI ADULTOS (UARO)
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	UCI ADULTOS (UARO)
0,95	N/A	N/A	4	100%	3,80	UCI ADULTOS (UARO)
1,30	N/A	N/A	1	100%	1,30	UCI ADULTOS (UARO)
1,20	N/A	N/A	2	100%	2,40	UCI ADULTOS (UARO)
0,60	N/A	N/A	1	100%	0,60	UCI ADULTOS (UARO)
2,35	N/A	N/A	2	100%	4,70	UCI ADULTOS (UARO)
0,95	N/A	N/A	4	100%	3,80	UCI ADULTOS (UARO)
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	UCI ADULTOS (UARO)
0,80	N/A	N/A	3	100%	2,40	UCI ADULTOS (UARO)
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	UCI ADULTOS (UARO)
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	UCI ADULTOS (UARO)
2,50	N/A	N/A	47	100%	117,50	UCI ADULTOS (UARO)
12,00	N/A	N/A	2	100%	24,00	MUR DIVISORIO UCI 1 Y UCI 2
11,72	N/A	N/A	2	100%	23,44	MUR DIVISORIO UCI 2 Y UCI 3
12,56	N/A	N/A	2	100%	25,12	MUR DIVISORIO UCI 3 Y UCI 4
11,72	N/A	N/A	2	100%	23,44	MUR DIVISORIO UCI 4 Y UCI 5
11,75	N/A	N/A	2	100%	23,50	MUR DIVISORIO UCI 5 Y UCI 6
13,31	N/A	N/A	2	100%	26,62	MUR DIVISORIO UCI 7 Y UCI 8
12,74	N/A	N/A	2	100%	25,48	MURO DIVISORIO UCI 8 Y UCI 9
3,77	N/A	N/A	1	100%	3,77	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 8 Y 9
4,54	N/A	N/A	1	100%	4,54	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 1 A 6
0,80	N/A	N/A	4	100%	3,20	DESCANSO
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	DESCANSO
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	DESCANSO
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	FILTRO
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	FILTRO
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	ACCESO UCI NEONATAL
2,50	N/A	N/A	3	100%	7,50	LACTARIO
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	LACTARIO
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	LACTARIO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
1,00	N/A	N/A	1	100%	1,00	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	UCI NEONATAL
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI NEONATAL
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI NEONATAL
1,30	N/A	N/A	28	100%	36,40	UCI NEONATAL
0,30	N/A	N/A	2	100%	0,60	UCI NEONATAL
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI NEONATAL
1,05	N/A	N/A	2	100%	2,10	UCI NEONATAL
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	UCI NEONATAL
0,70	N/A	N/A	6	100%	4,20	UCI NEONATAL
0,90	N/A	N/A	4	100%	3,60	UCI NEONATAL
1,00	N/A	N/A	1	100%	1,00	UCI NEONATAL
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	UCI NEONATAL
1,35	N/A	N/A	1	100%	1,35	UCI NEONATAL
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	UCI NEONATAL
2,50	N/A	N/A	36	100%	90,00	UCI NEONATAL
9,71	N/A	N/A	1	100%	9,71	AISALADO INTENSIVO
8,67	N/A	N/A	1	100%	8,67	AISALADO INTENSIVO
4,66	N/A	N/A	4	100%	18,64	CENTRALES SATELITE
7,69	N/A	N/A	1	100%	7,69	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,80	N/A	N/A	4	100%	3,20	PASILLO DESCANSO
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	PASILLO DESCANSO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	DESCANSO
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	DESCANSO
1,30	N/A	N/A	4	100%	5,20	DESCANSO
1,90	N/A	N/A	1	100%	1,90	DESCANSO
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	DESCANSO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	PASILLODESCANSO
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	PASILLODESCANSO
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	PASILLODESCANSO
2,10	N/A	N/A	3	100%	6,30	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0,75	N/A	N/A	1	100%	0,75	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
1,50	N/A	N/A	1	100%	1,50	ROPA LIMPIA





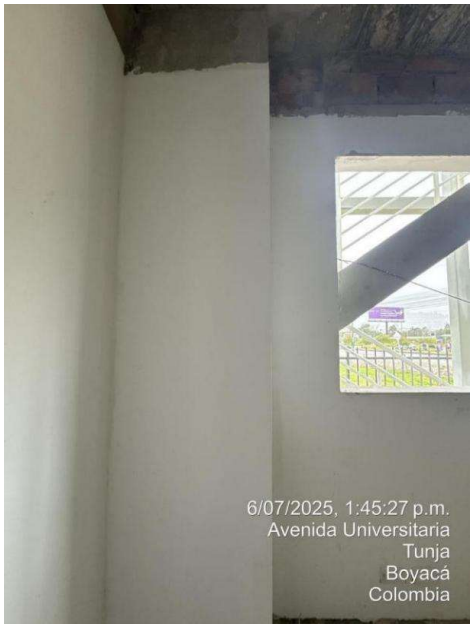



1,73	N/A	N/A	1	100%	1,73	ROPA SUCIA
2,10	N/A	N/A	4	100%	8,40	VESTIER
0,80	N/A	N/A	4	100%	3,20	VESTIER
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	VESTIER
3,60	N/A	N/A	2	100%	7,20	VESTIER
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	COORDINACION
1,80	N/A	N/A	1	100%	1,80	COORDINACION
4,30	N/A	N/A	2	100%	8,60	COORDINACION
2,50	N/A	N/A	3	100%	7,50	HALL
		PISO 3				
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,60	N/A	N/A	1	100%	2,60	
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	
1,80	N/A	N/A	1	100%	1,80	
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	
1,05	N/A	N/A	1	100%	1,05	
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
2,52	N/A	N/A	6	100%	15,12	
0,90	N/A	N/A	5	100%	4,50	
2,10	N/A	N/A	14	100%	29,40	
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	
5,10	N/A	N/A	1	100%	5,10	LUDOTECA Y ZONA ADMINISTRATIVA
6,40	N/A	N/A	1	100%	6,40	
5,70	N/A	N/A	1	100%	5,70	
3,00	N/A	N/A	1	100%	3,00	
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	
0,83	N/A	N/A	2	100%	1,66	
0,92	N/A	N/A	2	100%	1,84	
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,10	N/A	N/A	9	100%	18,90	
0,80	N/A	N/A	7	100%	5,60	
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	
2,00	N/A	N/A	3	100%	6,00	
2,80	N/A	N/A	1	100%	2,80	
2,12	N/A	N/A	1	100%	2,12	
2,45	N/A	N/A	2	100%	4,90	
2,55	N/A	N/A	2	100%	5,10	
1,18	N/A	N/A	1	100%	1,18	
2,70	N/A	N/A	2	100%	5,40	UCI # 1
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 1
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	UCI # 1
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 1
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 3
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	UCI # 3
2,70	N/A	N/A	1	100%	2,70	UCI # 3
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 3
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	UCI # 3
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 5
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	UCI # 5
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	UCI # 5
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 5
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	UCI # 5
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	UCI # 7
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 7
2,70	N/A	N/A	1	100%	2,70	UCI # 7
2,70	N/A	N/A	2	100%	5,40	UCI # 9
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 9
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	UCI # 9
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	UCI # 9
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 11
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	UCI # 11
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 11
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	UCI # 11
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	UCI # 12
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	UCI # 12
1,00	N/A	N/A	4	100%	4,00	UCI # 12
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	UCI # 12
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 12
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	UCI # 12
2,50	N/A	N/A	2	100%	5,00	UCI # 10
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 10
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	UCI # 10
3,05	N/A	N/A	2	100%	6,10	UCI # 8
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 8
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	UCI # 8
0,90	N/A	N/A	2	100%	1,80	UCI # 8
1,65	N/A	N/A	1	100%	1,65	UCI # 8
3,00	N/A	N/A	2	100%	6,00	UCI # 6
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 6
2,70	N/A	N/A	1	100%	2,70	UCI # 6
3,00	N/A	N/A	2	100%	6,00	UCI # 4
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 4
2,70	N/A	N/A	2	100%	5,40	UCI # 2
3,00	N/A	N/A	2	100%	6,00	UCI # 2
0,70	N/A	N/A	2	100%	1,40	UCI # 2
2,10	N/A	N/A	2	100%	4,20	CIRCULACION
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	CIRCULACION
2,70	N/A	N/A	1	100%	2,70	CIRCULACION
		PISO 4				
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 425
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 425
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 425
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 425
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 425
2,30	N/A	N/A	5	100%	11,50	HABITACION 424
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 424
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 424
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 424
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 424
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 423
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 423
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 423
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 423
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 423
2,30	N/A	N/A	5	100%	11,50	HABITACION 422
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 422
1,96	N/A	N/A	2	100%	3,92	HABITACION 422
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 422
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 422
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 421
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 421
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 421
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 421
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 421
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 420
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 420
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 420
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 420
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 420
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 419
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 419
1,96	N/A	N/A	2	100%	3,92	HABITACION 419
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 419
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 419
2,30	N/A	N/A	1	100%	2,30	HABITACION 418
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 418
1,96	N/A	N/A	6	100%	11,76	HABITACION 418
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 418
0,76	N/A	N/A	1	100%	0,76	HABITACION 418
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 417
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 417
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 417







1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 417
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 417
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 416
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 416
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 416
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 416
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 416
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 415
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 415
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 415
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 415
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 415
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 414
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 414
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 414
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 414
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 414
2,30	N/A	N/A	1	100%	2,30	HABITACION 413
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 413
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 413
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 413
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	HABITACION 413
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 412
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 412
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 412
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 412
0,76	N/A	N/A	2	100%	1,52	HABITACION 412
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 411
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 411
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 411
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 411
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 411
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 410
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 410
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 410
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 410
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 410
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 409
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 409
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 409
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 409
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 409
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 408
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 408
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 408
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 408
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 408
2,30	N/A	N/A	1	100%	2,30	HABITACION 407
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 407
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 407
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 407
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 407
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 406
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 406
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 406
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 406
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 406
2,30	N/A	N/A	5	100%	11,50	HABITACION 405
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 405
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 405
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 405
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 405
2,30	N/A	N/A	2	100%	4,60	HABITACION 404
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 404
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 404
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 404
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 404
2,30	N/A	N/A	11	100%	25,30	HABITACION 403
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 403
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 403
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 403
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 403
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 402
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 402
1,96	N/A	N/A	3	100%	5,88	HABITACION 402
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 402
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 402
2,30	N/A	N/A	3	100%	6,90	HABITACION 401
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	HABITACION 401
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	HABITACION 401
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	HABITACION 401
0,77	N/A	N/A	2	100%	1,54	HABITACION 401
7,64	N/A	N/A	1	100%	7,64	CENTRAL DE ENFERMETRIA
1,96	N/A	N/A	1	100%	1,96	TRABAJO LIMPIO
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	TRABAJO LIMPIO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	TRABAJO SUCIO
1,96	N/A	N/A	1	100%	1,96	TRABAJO SUCIO
1,96	N/A	N/A	1	100%	1,96	PROCEDIMIENTO
1,40	N/A	N/A	1	100%	1,40	PROCEDIMIENTO
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	PROCEDIMIENTO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	CUARTO DE ASEO
0,96	N/A	N/A	1	100%	0,96	CUARTO DE ASEO
2,40	N/A	N/A	2	100%	4,80	DESCANSO VESTIER
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	DESCANSO VESTIER
1,90	N/A	N/A	2	100%	3,80	DESCANSO VESTIER
2,40	N/A	N/A	9	100%	21,60	CIRCULACION RESTRINGIDA
1,96	N/A	N/A	2	100%	3,92	CIRCULACION RESTRINGIDA
1,30	N/A	N/A	1	100%	1,30	CIRCULACION RESTRINGIDA
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	RESIDUOS ORDINARIOS
1,96	N/A	N/A	1	100%	1,96	RESIDUOS ORDINARIOS
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	RESIDUOS ORDINARIOS
1,96	N/A	N/A	1	100%	1,96	RESIDUOS PELIGROSO
1,96	N/A	N/A	4	100%	7,84	BAÑOS
0,86	N/A	N/A	2	100%	1,72	BAÑOS
0,93	N/A	N/A	1	100%	0,93	BAÑOS
1,96	N/A	N/A	1	100%	1,96	COORDINACION
2,63	N/A	N/A	1	100%	2,63	COORDINACION
1,05	N/A	N/A	1	100%	1,05	COORDINACION
2,74	N/A	N/A	1	100%	2,74	COORDINACION
2,40	N/A	N/A	3	100%	7,20	COORDINACION
4,79	N/A	N/A	1	100%	4,79	COORDINACION
0,78	N/A	N/A	2	100%	1,56	COORDINACION
6,75	N/A	N/A	3	100%	20,25	SALA DE ESPERA
3,43	N/A	N/A	3	100%	10,29	SALA DE ESPERA
2,40	N/A	N/A	5	100%	12,00	SALA DE ESPERA
5,50	N/A	N/A	1	100%	5,50	SALA DE ESPERA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**3.325,37**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**683,24**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**2.642,13**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1,03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	CAP	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO - FILOS						
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	CONSULTORIO DE DIETAS
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CONSULTORIO DE DIETAS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	ROPA LIMPIA
1,4	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	ROPA LIMPIA
2,45	N/A	N/A	1	100%	**2,45**	ROPA LIMPIA
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	ROPA SUCIA
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	ROPA SUCIA
2,55	N/A	N/A	12	100%	**30,60**	BODEGA FARMACIA
2,1	N/A	N/A	5	100%	**10,50**	BODEGA FARMACIA
2,8	N/A	N/A	1	100%	**2,80**	BODEGA FARMACIA
0,8	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	BODEGA FARMACIA
1,21	N/A	N/A	1	100%	**1,21**	BODEGA FARMACIA
2,52	N/A	N/A	11	100%	**27,72**	ARCHIVO
3,31	N/A	N/A	1	100%	**3,31**	ARCHIVO
2,8	N/A	N/A	1	100%	**2,80**	ARCHIVO
2,45	N/A	N/A	4	100%	**9,80**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
2,1	N/A	N/A	6	100%	**12,60**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
1,4	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2,53	N/A	N/A	5	100%	**12,65**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1,4	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	DEP. CADAVERES
1,4	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	DEP. CADAVERES
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	DEP. CADAVERES
2,1	N/A	N/A	9	100%	**18,90**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2	N/A	N/A	1	100%	**2,00**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
0,5	N/A	N/A	2	100%	**1,00**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2,4	N/A	N/A	1	100%	**2,40**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	CIRCULACION SALA DE STAR
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULACION SALA DE STAR
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	CIRCULACION SALA DE STAR
2,3	N/A	N/A	1	100%	**2,30**	CIRCULACION SALA DE STAR
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	DEPOSITO ALMACEN
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	DEPOSITO ALMACEN
3,1	N/A	N/A	1	100%	**3,10**	DEPOSITO ALMACEN
4,5	N/A	N/A	3	100%	**13,50**	DEPOSITO ALMACEN
4,8	N/A	N/A	1	100%	**4,80**	DEPOSITO ALMACEN
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	LAVANDERIA
2,7	N/A	N/A	3	100%	**8,10**	PARQUEADERO SOTANO
2,8	N/A	N/A	4	100%	**11,20**	PARQUEADERO SOTANO
PISO 1 - FILOS						
2,91	N/A	N/A	2	100%	**5,82**	MURO DIVISOR LAVADO DE OJOS
2,09	N/A	N/A	2	100%	**4,18**	MURO DIVISOR LAVADO DE OJOS
0,96	N/A	N/A	2	100%	**1,92**	MURO DIVISOR LAVADO DE OJOS
1,3	N/A	N/A	15	100%	**19,50**	VENTANA
2,2	N/A	N/A	5	100%	**11,00**	PUETAS BAÑOS Y CUERTO FARMACIA
0,8	N/A	N/A	4	100%	**3,20**	PUETAS BAÑOS Y CUERTO FARMACIA
2,6	N/A	N/A	4	100%	**10,40**	LABORATORIO
1,6	N/A	N/A	1	100%	**1,60**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
2,28	N/A	N/A	2	100%	**4,56**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
4,37	N/A	N/A	2	100%	**8,74**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
1,7	N/A	N/A	2	100%	**3,40**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
3,86	N/A	N/A	2	100%	**7,72**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
2,76	N/A	N/A	2	100%	**5,52**	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
1,4	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	RESIDUOS ORDINARIOS
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	RESIDUOS ORDINARIOS
2,02	N/A	N/A	3	100%	**6,06**	RESIDUOS ORDINARIOS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	RESIDUOS ORDINARIOS
0,8	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	RESIDUOS ORDINARIOS
0,64	N/A	N/A	2	100%	**1,28**	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
0,47	N/A	N/A	2	100%	**0,94**	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
2,6	N/A	N/A	6	100%	**15,60**	INYECTOLOGIA
2,02	N/A	N/A	4	100%	**8,08**	INYECTOLOGIA
1,08	N/A	N/A	2	100%	**2,16**	PUERTAS NEVERA
1,1	N/A	N/A	4	100%	**4,40**	VENTANA PRETASFUCIONAL
0,96	N/A	N/A	2	100%	**1,92**	VENTANA PRETASFUCIONAL
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	FILOS COLUMNA PRETASFUCIONAL
0,65	N/A	N/A	2	100%	**1,30**	FILOS COLUMNA PRETASFUCIONAL
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	FILOS VENTANA PRETASFUCIONAL
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	ENTRADS HALL A LOBORATORIO
1,21	N/A	N/A	1	100%	**1,21**	ENTRADS HALL A LOBORATORIO
2,6	N/A	N/A	5	100%	**13,00**	TOMA DE MUESTRA
1,3	N/A	N/A	4	100%	**5,20**	TOMA DE MUESTRA
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	BAÑOS EN TOMA DE MUESTRA
0,8	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	BAÑOS EN TOMA DE MUESTRA
2,6	N/A	N/A	10	100%	**26,00**	FARMACIA
2,1	N/A	N/A	5	100%	**10,50**	FARMACIA
3	N/A	N/A	4	100%	**12,00**	FARMACIA
1,5	N/A	N/A	4	100%	**6,00**	FARMACIA
1,64	N/A	N/A	1	100%	**1,64**	FARMACIA
2,1	N/A	N/A	8	100%	**16,80**	CICULACION HALL
2,6	N/A	N/A	10	100%	**26,00**	CICULACION HALL
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	CICULACION HALL
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CICULACION HALL
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	FILOS DINTEL EXTERIOR ADMISIONES
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	PROCEDIMIENTOS
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	PROCEDIMIENTOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	PROCEDIMIENTOS
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	PROCEDIMIENTOS
1	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	PROCEDIMIENTOS
0,4	N/A	N/A	2	100%	**0,80**	PROCEDIMIENTOS
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	SALA DE LECTURA INYECTOLOGIA
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	SALA DE LECTURA INYECTOLOGIA










0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	SALA DE LECTURA INYECTOLOGIA
2,6	N/A	N/A	4	100%	**10,40**	ADMISIONES PUERTA
2,1	N/A	N/A	6	100%	**12,60**	ADMISIONES VETANA
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	ADMISIONES PUERTA
1,29	N/A	N/A	1	100%	**1,29**	ADMISIONES PUERTA
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	PUERTA PROCEDIMIENTOS
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	PUERTA PROCEDIMIENTOS
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	PUERTA PROCEDIMIENTOS
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	VENTANA PROCEDIMIENTOS
2,6	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	ADMISIONES PUERTA
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	ADMISIONES PUERTA
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	ADMISIONES VENTANA
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	ADMISIONES PUERTA
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	COLSULTORIO
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	COLSULTORIO
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	COLSULTORIO
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CICULACION ACENSOR
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CICULACION ACENSOR
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CICULACION ACENSOR
2,6	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	OFICINA RADIOLOGIA
2,6	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	OFICINA RADIOLOGIA
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	INSUMOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	INSUMOS
2,6	N/A	N/A	5	100%	**13,00**	INSUMOS
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	INSUMOS
1,1	N/A	N/A	2	100%	**2,20**	INSUMOS
1,1	N/A	N/A	3	100%	**3,30**	SALA ESPERA CONSULTORIO
2,6	N/A	N/A	1	100%	**2,60**	SALA ESPERA CONSULTORIO
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	SALA ESPERA CONSULTORIO
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
2,6	N/A	N/A	3	100%	**7,80**	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	CONSULTORIO DISPONIBLE
2,1	N/A	N/A	20	100%	**42,00**	CONSULTORIO DISPONIBLE
1,1	N/A	N/A	2	100%	**2,20**	CONSULTORIO DISPONIBLE
10,34	N/A	N/A	1	100%	**10,34**	CONSULTORIO DISPONIBLE
2,1	N/A	N/A	16	100%	**33,60**	CENTRAL DE EMFERMERIA
11,47	N/A	N/A	1	100%	**11,47**	CENTRAL DE EMFERMERIA
2,42	N/A	N/A	7	100%	**16,94**	CENTRAL DE EMFERMERIA
4	N/A	N/A	4	100%	**16,00**	CIRCULCION HALL
1,4	N/A	N/A	2	100%	**2,80**	CIRCULCION HALL
1	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	CIRCULCION HALL
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULCION HALL
2,54	N/A	N/A	1	100%	**2,54**	CIRCULCION HALL
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	CIRCULCION HALL
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CIRCULCION HALL
2,5	N/A	N/A	4	100%	**10,00**	CIRCULCION HALL
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULCION HALL
1,8	N/A	N/A	1	100%	**1,80**	CIRCULCION HALL
0,2	N/A	N/A	1	100%	**0,20**	CONSULTORIO 1
1	N/A	N/A	4	100%	**4,00**	CONSULTORIO 1
1,73	N/A	N/A	1	100%	**1,73**	CONSULTORIO 1
2,6	N/A	N/A	2	100%	**5,20**	CONSULTORIO 1
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CONSULTORIO 1
1,3	N/A	N/A	8	100%	**10,40**	REANIMACION
2,1	N/A	N/A	9	100%	**18,90**	REANIMACION
2,7	N/A	N/A	3	100%	**8,10**	REANIMACION
1,7	N/A	N/A	2	100%	**3,40**	REANIMACION
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	CICULACION SALA ESPERA HALL
0,8	N/A	N/A	4	100%	**3,20**	CICULACION SALA ESPERA HALL
2	N/A	N/A	4	100%	**8,00**	CICULACION SALA ESPERA HALL
0,4	N/A	N/A	8	100%	**3,20**	CICULACION SALA ESPERA HALL
0,8	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	CICULACION SALA ESPERA HALL
2	N/A	N/A	2	100%	**4,00**	CICULACION SALA ESPERA HALL
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	CICULACION SALA ESPERA HALL
0,4	N/A	N/A	4	100%	**1,60**	PERSONAÑ ASISTENCIAL
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	PERSONAÑ ASISTENCIAL
1	N/A	N/A	4	100%	**4,00**	PERSONAÑ ASISTENCIAL
2,7	N/A	N/A	3	100%	**8,10**	PERSONAÑ ASISTENCIAL
2,3	N/A	N/A	7	100%	**16,10**	PERSONAÑ ASISTENCIAL
2,1	N/A	N/A	4	100%	**8,40**	HALL GENERAL
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HALL GENERAL
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	AUTOSERVICIO
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	AUTOSERVICIO
2,55	N/A	N/A	1	100%	**2,55**	AUTOSERVICIO
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	AUTOSERVICIO
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	AUTOSERVICIO
2,1	N/A	N/A	5	100%	**10,50**	MAMOGRAFO
0,8	N/A	N/A	3	100%	**2,40**	MAMOGRAFO
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	MAMOGRAFO
2,1	N/A	N/A	4	100%	**8,40**	CIRCULACION
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	TAC
0,89	N/A	N/A	1	100%	**0,89**	TAC
2	N/A	N/A	2	100%	**4,00**	TAC
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CIRCULACION
1,47	N/A	N/A	2	100%	**2,94**	TAC
0,6	N/A	N/A	2	100%	**1,20**	TAC
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	TAC
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	DISPARO
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	DISPARO
1,7	N/A	N/A	2	100%	**3,40**	DISPARO
2,38	N/A	N/A	2	100%	**4,76**	DISPARO
2,45	N/A	N/A	8	100%	**19,60**	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2,1	N/A	N/A	6	100%	**12,60**	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0,8	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2,45	N/A	N/A	8	100%	**19,60**	OBSERVACION PEDIATRIA
2,43	N/A	N/A	2	100%	**4,86**	OBSERVACION PEDIATRIA
0,71	N/A	N/A	2	100%	**1,42**	OBSERVACION PEDIATRIA
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	OBSERVACION PEDIATRIA
6,67	N/A	N/A	2	100%	**13,34**	OBSERVACION PEDIATRIA
0,8	N/A	N/A	4	100%	**3,20**	CENTRAL DE EMFERMERIA
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CENTRAL DE EMFERMERIA
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CUARTO DE RESIDUOS ORDINARIOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CUARTO DE RESIDUOS ORDINARIOS
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	RESIDUOS PELIGROSOS
1	N/A	N/A	3	100%	**3,00**	RESIDUOS PELIGROSOS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	DIR URGENCIAS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	DIR URGENCIAS









2,42	N/A	N/A	2	100%	**4,84**	DIR URGENCIAS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	PROCEDIMIENTOS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	SALA DE YESOS
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	SALA DE YESOS
0,94	N/A	N/A	2	100%	**1,88**	SALA DE YESOS
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	SALA DE YESOS
2,1	N/A	N/A	4	100%	**8,40**	DIGITACION
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	DIGITACION
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	DIGITACION
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	DIGITACION
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	SALA ERA
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	SALA ERA
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	SALA ERA
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	SALA ERA
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	SALA ERA
1	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	SALA ERA
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	CONSULTORIO 3
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	CONSULTORIO 3
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CONSULTORIO 3
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	CONSULTORIO 3
1,4	N/A	N/A	2	100%	**2,80**	CONSULTORIO 3
1	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	CONSULTORIO 3
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CONSULTORIO 2
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	CONSULTORIO 2
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CONSULTORIO 2
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	CONSULTORIO 2
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	CONSULTORIO 2
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	CONSULTORIO 2
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	CONSULTORIO 1
2,5	N/A	N/A	1	100%	**2,50**	CONSULTORIO 1
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	CONSULTORIO 1
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	CONSULTORIO 1
0,92	N/A	N/A	2	100%	**1,84**	CONSULTORIO 1
0,93	N/A	N/A	2	100%	**1,86**	CONSULTORIO 1
2,1	N/A	N/A	3	100%	**6,30**	ADMISIONES URGENCIAS
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	ADMISIONES URGENCIAS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	ADMISIONES URGENCIAS
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	ADMISIONES URGENCIAS
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	ADMISIONES URGENCIAS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	REF Y CONTRA REF
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	REF Y CONTRA REF
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	SALA ESPERA URGENCIAS
1,4	N/A	N/A	4	100%	**5,60**	SALA ESPERA URGENCIAS
2,52	N/A	N/A	1	100%	**2,52**	SALA ESPERA URGENCIAS
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	SALA ESPERA URGENCIAS
1,2	N/A	N/A	2	100%	**2,40**	SALA ESPERA URGENCIAS
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	SALA ESPERA URGENCIAS
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	SALA ESPERA URGENCIAS
6,37	N/A	N/A	1	100%	**6,37**	ANTEPECHO URGENCIAS
0,75	N/A	N/A	4	100%	**3,00**	ANTEPECHO URGENCIAS
0,97	N/A	N/A	4	100%	**3,88**	DESCANSO INTERNOS
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	DESCANSO INTERNOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	DESCANSO INTERNOS
2,52	N/A	N/A	1	100%	**2,52**	DESCANSO INTERNOS
2,52	N/A	N/A	3	100%	**7,56**	EQUIPOS
2,1	N/A	N/A	1	100%	**2,10**	EQUIPOS
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	EQUIPOS
		PISO 2				
2,1	**N/A**	**N/A**	16	**100%**	**33,60**	
1	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**2,00**	
	N/A	**N/A**	2	**100%**	**0,00**	
1,2	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**2,40**	PASILLO A AUTOCLAVE
2	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**4,00**	
2	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**4,00**	
2,5	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**5,00**	
2,5	**N/A**	**N/A**	6	**100%**	**15,00**	RECUPERACIÓN QUIRURGICA
1,75	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,50**	
4,2	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**8,40**	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,76	**N/A**	**N/A**	4	**100%**	**3,04**	
2,1	**N/A**	**N/A**	7	**100%**	**14,70**	TRABAJO SUCIO
0,7	**N/A**	**N/A**	4	**100%**	**2,80**	
2,1	**N/A**	**N/A**	40	**100%**	**84,00**	PASILLO QUIROFANO
1	**N/A**	**N/A**	4	**100%**	**4,00**	VENTANA AUTOCLAVE
1,5	**N/A**	**N/A**	4	**100%**	**6,00**	
0,9	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,80**	FARMACIA
1	**N/A**	**N/A**	16	**100%**	**16,00**	
1,8	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,60**	
0,4	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**0,80**	PASILLO QUIROFANO
1,7	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,40**	
0,9	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,80**	
1,5	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,00**	VENTANA PASILLO
2,15	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**4,30**	
1	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**2,00**	
0,8	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,60**	PASILLO QUIROFANO
1,7	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,40**	
2,5	**N/A**	**N/A**	13	**100%**	**32,50**	
2,5	**N/A**	**N/A**	3	**100%**	**7,50**	QUIROFANO 3
	N/A	**N/A**	2	**100%**	**0,00**	QUIROFANO 2
2,5	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**5,00**	QUIROFANO 1
0,9	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,80**	
2,1	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**4,20**	DESCANSO QUIRURGICO
2,5	**N/A**	**N/A**	3	**100%**	**7,50**	
2,5	**N/A**	**N/A**	1	**100%**	**2,50**	PARTOS 2
2,5	**N/A**	**N/A**	3	**100%**	**7,50**	PARTOS 1
2,5	**N/A**	**N/A**	3	**100%**	**7,50**	
2,1	**N/A**	**N/A**	4	**100%**	**8,40**	PASILLO TRABAJO SUCIO
0,8	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,60**	
2,5	**N/A**	**N/A**	5	**100%**	**12,50**	FARMACIA
1	**N/A**	**N/A**	4	**100%**	**4,00**	
2,1	**N/A**	**N/A**	67	**100%**	**140,70**	
0,8	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,60**	
1,03	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**2,06**	
1,67	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,34**	
0,8	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**1,60**	
2	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**4,00**	
0,8	**N/A**	**N/A**	1	**100%**	**0,80**	CIRCULACIÓN QUIROFÁNO A UCI NEONATAL
0,7	**N/A**	**N/A**	1	**100%**	**0,70**	
0,6	**N/A**	**N/A**	1	**100%**	**0,60**	
1	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**2,00**	
1,7	**N/A**	**N/A**	2	**100%**	**3,40**	








0,76	N/A	N/A	2	100%	1,52	
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	CIRCULACIÓN QUIROFÁNO A UCI NEONATAL: PUERTAS
8	N/A	N/A	2	100%	16,00	
	N/A	N/A	2	100%	0,00	
1,97	N/A	N/A	2	100%	3,94	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
0,85	N/A	N/A	2	100%	1,70	
0,74	N/A	N/A	2	100%	1,48	
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	
1,9	N/A	N/A	2	100%	3,80	
2	N/A	N/A	2	100%	4,00	
0,7	N/A	N/A	2	100%	1,40	VENTANAS CIRCULACIÓN
0,15	N/A	N/A	2	100%	0,30	
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	
2,72	N/A	N/A	2	100%	5,44	ATENCIÓN A USUARIO
0,97	N/A	N/A	1	100%	0,97	
2,1	N/A	N/A	5	100%	10,50	DESCANSO MÉDICO
0,6	N/A	N/A	1	100%	0,60	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,45	N/A	N/A	7	100%	17,15	
2,1	N/A	N/A	12	100%	25,20	VESTIER M.
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
0,7	N/A	N/A	3	100%	2,10	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,1	N/A	N/A	8	100%	16,80	VESTIER H.
0,8	N/A	N/A	4	100%	3,20	
0,7		N/A	2	100%	1,40	
2,4	N/A	N/A	5	100%	12,00	
2,5	N/A	N/A	12	100%	30,00	TRABAJO PARTOS
2,1	N/A	N/A	4	100%	8,40	
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	
0,7	N/A	N/A	1	100%	0,70	
3,73	N/A	N/A	2	100%	7,46	CENTRAL DE ENFERMERIA T.P.
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	
2,1	N/A	N/A	12	100%	25,20	RECUPERACIÓN PARTOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	
1	N/A	N/A	1	100%	1,00	
0,9	N/A	N/A	2	100%	1,80	
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	
0,95	N/A	N/A	2	100%	1,90	
2,4	N/A	N/A	17	100%	40,80	
4,37	N/A	N/A	2	100%	8,74	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACIÓN
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	
2,5	N/A	N/A	5	100%	12,50	VESTIER PARTOS
2,1	N/A	N/A	8	100%	16,80	FILTRO PERSONAL ASISTENCIAL
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	
0,7	N/A	N/A	2	100%	1,40	
0,8	N/A	N/A	4	100%	3,20	
2,5	N/A	N/A	1	100%	2,50	
2,1	N/A	N/A	3	100%	6,30	FILTRO ACCESO FAMILIARES UARO
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,1	N/A	N/A	3	100%	6,30	INFORMACIÓN FAMILIARES
0,7	N/A	N/A	2	100%	1,40	
5,8	N/A	N/A	1	100%	5,80	UCI URO 1
2,4	N/A	N/A	3	100%	7,20	
11,23	N/A	N/A	1	100%	11,23	UCI URO 2
	N/A	N/A	3	100%	0,00	
11,55	N/A	N/A	1	100%	11,55	UCI URO 3
2,4	N/A	N/A	2	100%	4,80	
12,06	N/A	N/A	1	100%	12,06	UCI URO 4
2,4	N/A	N/A	1	100%	2,40	
11,17	N/A	N/A	1	100%	11,17	UCI URO 5
2,4	N/A	N/A	2	100%	4,80	
7,47	N/A	N/A	1	100%	7,47	UCI URO 6 - AISLADO
2,4	N/A	N/A	3	100%	7,20	
0,95	N/A	N/A	4	100%	3,80	
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	
6,85	N/A	N/A	1	100%	6,85	UCI URO 7
2,4	N/A	N/A	3	100%	7,20	
1,2	N/A	N/A	2	100%	2,40	
1,3	N/A	N/A	1	100%	1,30	
7,12	N/A	N/A	1	100%	7,12	UCI URO 8
0,95	N/A	N/A	4	100%	3,80	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
1,25	N/A	N/A	2	100%	2,50	
2,8	N/A	N/A	1	100%	2,80	UCI URO 9
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	
1,25	N/A	N/A	2	100%	2,50	
1,3	N/A	N/A	2	100%	2,60	
1,3	N/A	N/A	4	100%	5,20	
0,93	N/A	N/A	2	100%	1,86	
2,1	N/A	N/A	11	100%	23,10	PASILLO UCI URO: 7 A 9
0,8	N/A	N/A	4	100%	3,20	
1,1	N/A	N/A	2	100%	2,20	
1,6	N/A	N/A	2	100%	3,20	
2,22	N/A	N/A	4	100%	8,88	
2,5	N/A	N/A	1	100%	2,50	CENTRAL ENFERMERIA
2,06	N/A	N/A	1	100%	2,06	
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	PASILLO UCI URO: 7 A 9
2,4	N/A	N/A	3	100%	7,20	
7,84	N/A	N/A	1	100%	7,84	ANTEPECHO SOBRE PASILLO
0,6	N/A	N/A	10	100%	6,00	PASILLO UCI URO: 1 A 6
7,42	N/A	N/A	1	100%	7,42	ANTEPECHO SOBRE PASILLO
7,32	N/A	N/A	1	100%	7,32	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	
1,7	N/A	N/A	4	100%	6,80	
2,1	N/A	N/A	4	100%	8,40	PASILLO UCI URO: 1 A 6
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,4	N/A	N/A	4	100%	9,60	CENTRAL ENFERMERIA
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	DESCANSO
1,5	N/A	N/A	2	100%	3,00	
2,5	N/A	N/A	1	100%	2,50	
2,5	N/A	N/A	1	100%	2,50	EXTRACCIÓN
2,5	N/A	N/A	4	100%	10,00	FILTRO UCI URO
2,1	N/A	N/A	4	100%	8,40	EXTRACCIÓN
2,5	N/A	N/A	1	100%	2,50	
1,35	N/A	N/A	2	100%	2,70	RESIDUOS UCI NEONATAL








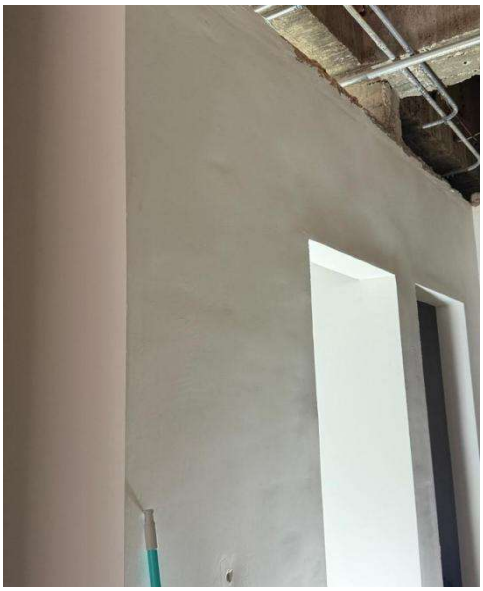

2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	RECIBIDOS UCI NEONATAL
2,16	N/A	N/A	1	100%	2,16	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	
2,1	N/A	N/A	2	100%	4,20	CIRCULACIÓN ASEO UCI NEONATAL
1,2	N/A	N/A	1	100%	1,20	
2,5	N/A	N/A	4	100%	10,00	
2,1	N/A	N/A	4	100%	8,40	
0,8	N/A	N/A	2	100%	1,60	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2,5	N/A	N/A	2	100%	5,00	
2,1	N/A	N/A	7	100%	14,70	
0,75	N/A	N/A	1	100%	0,75	UCI NEONATAL
0,7	N/A	N/A	1	100%	0,70	
1,35	N/A	N/A	1	100%	1,35	
5,12	N/A	N/A	2	100%	10,24	CENTRAL ENFERMERIA UCI NEO
0,85	N/A	N/A	6	100%	5,10	
2,5	N/A	N/A	10	100%	25,00	UCI INTENSIVOS
18,84	N/A	N/A	1	100%	18,84	AISLADOS INTENSIVOS
1,3	N/A	N/A	1	100%	1,30	
0,9	N/A	N/A	2	100%	1,80	VENTANA UCI NEONATAL
1,3	N/A	N/A	8	100%	10,40	
2,5	N/A	N/A	7	100%	17,50	CUARTO EQUIPOS
2,5	N/A	N/A	19	100%	47,50	
2,7	N/A	N/A	2	100%	5,40	CUIDADOS INTERMEDIOS
2,71	N/A	N/A	2	100%	5,42	
3	N/A	N/A	2	100%	6,00	
1,3	N/A	N/A	4	100%	5,20	
0,25	N/A	N/A	2	100%	0,50	
0,9	N/A	N/A	2	100%	1,80	VENTANA INTERMEDIOS
2,3	N/A	N/A	2	100%	4,60	
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	
8,56	N/A	N/A	4	100%	34,24	SATELITES ENFERMERIA
2,1	N/A	N/A	2	100%	4,20	
2,5	N/A	N/A	1	100%	2,50	CUIDADOS BÁSICOS UCI
0,7	N/A	N/A	4	100%	2,80	
1,9	N/A	N/A	4	100%	7,60	
1,3	N/A	N/A	12	100%	15,60	
0,7	N/A	N/A	2	100%	1,40	VENTANA BÁSICOS
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	
1,3	N/A	N/A	2	100%	2,60	
1	N/A	N/A	2	100%	2,00	
1,3	N/A	N/A	2	100%	2,60	
0,95	N/A	N/A	2	100%	1,90	
1,3	N/A	N/A	4	100%	5,20	DESCANSO UCI NEONATAL
1,9	N/A	N/A	2	100%	3,80	
2,1	N/A	N/A	3	100%	6,30	
0,8	N/A	N/A	4	100%	3,20	
2,1	N/A	N/A	6	100%	12,60	
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	PASILLO A DESCANSO
2,5	N/A	N/A	2	100%	5,00	
2,5	N/A	N/A	4	100%	10,00	
2,1	N/A	N/A	21	100%	44,10	
1,8	N/A	N/A	2	100%	3,60	
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	PASILLO ASISTENCIA A UCI NEONATAL
0,75	N/A	N/A	1	100%	0,75	
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	
1,73	N/A	N/A	2	100%	3,46	
1,51	N/A	N/A	2	100%	3,02	
2,1	N/A	N/A	2	100%	4,20	
0,7	N/A	N/A	1	100%	0,70	VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
3,6	N/A	N/A	2	100%	7,20	
2,5	N/A	N/A	2	100%	5,00	COORDINACIÓN UCI NEONATAL
4,13	N/A	N/A	2	100%	8,26	
2,1	N/A	N/A	6	100%	12,60	
1,9	N/A	N/A	1	100%	1,90	
0,7	N/A	N/A	1	100%	0,70	HALL
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	
2,8	N/A	N/A	7	100%	19,60	
2,5	N/A	N/A	3	100%	7,50	
2,1	N/A	N/A	3	100%	6,30	PASILLO ESTERIL
0,7	N/A	N/A	2	100%	1,40	
0,8	N/A	N/A	4	100%	3,20	
		PISO 3 - FILOS				
2,1	N/A	N/A	4	100%	8,40	EXTRACION DE LECHE MATERIAL
0,9	N/A	N/A	2	100%	1,80	EXTRACION DE LECHE MATERIAL
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	DEPOSITO DE INSUMOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	DEPOSITO DE INSUMOS
2,1	N/A	N/A	3	100%	6,30	FILTRO INGRESO
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	FILTRO INGRESO
4,05	N/A	N/A	1	100%	4,05	PREPARACION DE FORMULAS
2,6	N/A	N/A	1	100%	2,60	PREPARACION DE FORMULAS
5	N/A	N/A	1	100%	5,00	PREPARACION DE FORMULAS
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	IMFORMACION FAMILIARES
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	IMFORMACION FAMILIARES
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	COORDINACIÓN PEDIATRA
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	COORDINACIÓN PEDIATRA
2,52	N/A	N/A	3	100%	7,56	CIRCULACION
5,1	N/A	N/A	1	100%	5,10	DESCANSO DE MEDICO
6,4	N/A	N/A	1	100%	6,40	DESCANSO DE MEDICO
5,7	N/A	N/A	1	100%	5,70	DESCANSO EMFERMERIA
3	N/A	N/A	1	100%	3,00	DESCANSO EMFERMERIA
2,5	N/A	N/A	2	100%	5,00	ESTACION DE CAFÉ
3	N/A	N/A	1	100%	3,00	ESTACION DE CAFÉ
2,1	N/A	N/A	2	100%	4,20	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2,8	N/A	N/A	1	100%	2,80	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
0,83	N/A	N/A	2	100%	1,66	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
0,92	N/A	N/A	1	100%	0,92	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
2,1	N/A	N/A	5	100%	10,50	ASISTENCIAL
0,8	N/A	N/A	3	100%	2,40	ASISTENCIAL
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	ROPA LIMPIA
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	ROPA LIMPIA
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0,8	N/A	N/A	1	100%	0,80	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
2,1	N/A	N/A	1	100%	2,10	CUARTO EQUIPOS
0,9	N/A	N/A	1	100%	0,90	CUARTO EQUIPOS
2,1	N/A	N/A	14	100%	29,40	CIRCULACION
0,8	N/A	N/A	7	100%	5,60	CIRCULACION
0,9	N/A	N/A	2	100%	1,80	CIRCULACION
2	N/A	N/A	8	100%	16,00	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR

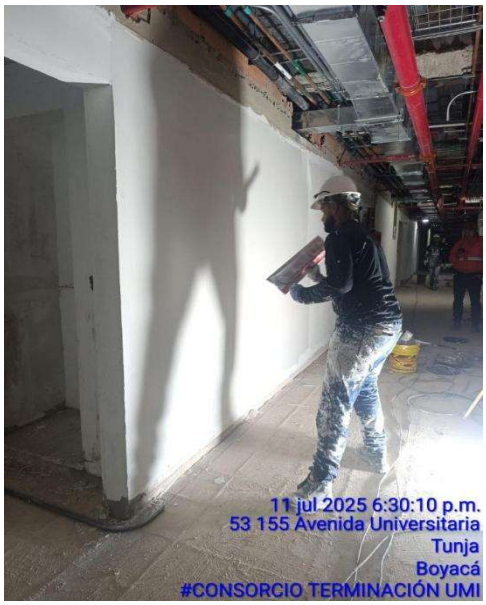





2,1	N/A	N/A	4	100%	**8,40**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
2,12	N/A	N/A	2	100%	**4,24**	ORATORIO
2,45	N/A	N/A	1	100%	**2,45**	ORATORIO
2,55	N/A	N/A	5	100%	**12,75**	SALA DE ESPERA
1,18	N/A	N/A	1	100%	**1,18**	SALA DE ESPERA
2	N/A	N/A	1	100%	**2,00**	SALA DE ESPERA
2,7	N/A	N/A	4	100%	**10,80**	UCI # 1
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 1
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 1
0,9	N/A	N/A	4	100%	**3,60**	UCI # 3
1,5	N/A	N/A	4	100%	**6,00**	UCI # 3
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 3
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	UCI # 3
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	UCI # 3
0,9	N/A	N/A	4	100%	**3,60**	UCI # 5
1,5	N/A	N/A	4	100%	**6,00**	UCI # 5
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	UCI # 5
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	UCI # 5
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	UCI # 5
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 7
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 7
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	UCI # 7
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	UCI # 7
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	UCI # 7
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 7
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 9
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 9
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 9
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	UCI # 9
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	UCI # 9
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	UCI # 9
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 11
1,5	N/A	N/A	4	100%	**6,00**	UCI # 11
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	UCI # 11
0,7	N/A	N/A	3	100%	**2,10**	UCI # 11
2,75	N/A	N/A	2	100%	**5,50**	UCI # 11
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	UCI # 12
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	UCI # 12
1	N/A	N/A	4	100%	**4,00**	UCI # 12
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	UCI # 12
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 12
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 12
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 10
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 11
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	UCI # 12
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 13
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	UCI # 14
0,7	N/A	N/A	2	100%	**1,40**	UCI # 15
3,05	N/A	N/A	2	100%	**6,10**	UCI # 8
0,7	N/A	N/A	2	100%	**1,40**	UCI # 8
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 8
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	UCI # 8
1,65	N/A	N/A	1	100%	**1,65**	UCI # 8
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 8
3	N/A	N/A	2	100%	**6,00**	UCI # 6
0,7	N/A	N/A	2	100%	**1,40**	UCI # 6
9	N/A	N/A	2	100%	**18,00**	UCI # 6
1,5	N/A	N/A	2	100%	**3,00**	UCI # 6
1,65	N/A	N/A	1	100%	**1,65**	UCI # 6
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 6
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	UCI # 4
3	N/A	N/A	2	100%	**6,00**	UCI # 4
0,7	N/A	N/A	2	100%	**1,40**	UCI # 4
2,7	N/A	N/A	2	100%	**5,40**	UCI # 2
3	N/A	N/A	2	100%	**6,00**	UCI # 2
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	UCI # 2
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	CIRCULACION
2,1	N/A	N/A	4	100%	**8,40**	CIRCULACION
2,3	N/A	N/A	1	100%	**2,30**	HABITACIÓN 01
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	HABITACIÓN 01
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACIÓN 01
0,75	N/A	N/A	1	100%	**0,75**	HABITACIÓN 01
0,95	N/A	N/A	2	100%	**1,90**	HABITACIÓN 01
1,45	N/A	N/A	2	100%	**2,90**	HABITACIÓN 01
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACIÓN 02
2,3	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACIÓN 02
2,1	N/A	N/A	4	100%	**8,40**	HABITACIÓN 02
0,84	N/A	N/A	1	100%	**0,84**	HABITACIÓN 02
0,75	N/A	N/A	2	100%	**1,50**	HABITACIÓN 02
2,3	N/A	N/A	1	100%	**2,30**	HABITACIÓN 18
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	HABITACIÓN 18
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACIÓN 18
0,75	N/A	N/A	2	100%	**1,50**	HABITACIÓN 18
2,3	N/A	N/A	8	100%	**18,40**	HABITACIÓN 19
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	HABITACIÓN 19
0,75	N/A	N/A	2	100%	**1,50**	HABITACIÓN 19
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACIÓN 19
2,3	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACIÓN 20
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	HABITACIÓN 20
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACIÓN 20
0,75	N/A	N/A	2	100%	**1,50**	HABITACIÓN 20
2,3	N/A	N/A	8	100%	**18,40**	HABITACIÓN 21
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACIÓN 21
0,75	N/A	N/A	2	100%	**1,50**	HABITACIÓN 21
0,85	N/A	N/A	1	100%	**0,85**	HABITACIÓN 21
2,1	N/A	N/A	2	100%	**4,20**	HABITACIÓN 21
2,1	N/A	N/A	16	100%	**33,60**	CIRCULACIÓN BALCÓN NORTE A HABITACIÓN 19
1,2	N/A	N/A	8	100%	**9,60**	CIRCULACIÓN BALCÓN NORTE A HABITACIÓN 19
PISO 3 - DILATACIONES						
4,9	N/A	N/A	2	100%	**9,80**	TERRAZA SOLAR
3,35	N/A	N/A	2	100%	**6,70**	TERRAZA SOLAR
2,28	N/A	N/A	1	100%	**2,28**	TERRAZA SOLAR
0,97	N/A	N/A	2	100%	**1,94**	TERRAZA SOLAR
0,2	N/A	N/A	2	100%	**0,40**	TERRAZA SOLAR
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	TERRAZA SOLAR
2,32	N/A	N/A	1	100%	**2,32**	TERRAZA SOLAR
2,7	N/A	N/A	11	100%	**29,70**	LUDOTECA
2,17	N/A	N/A	2	100%	**4,34**	LUDOTECA
0,3	N/A	N/A	4	100%	**1,20**	LUDOTECA









1	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	LUDOTECA
0,9	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	LUDOTECA
0,72	N/A	N/A	3	100%	**2,16**	LUDOTECA
0,32	N/A	N/A	3	100%	**0,96**	LUDOTECA
2,48	N/A	N/A	2	100%	**4,96**	LUDOTECA
0,79	N/A	N/A	2	100%	**1,58**	LUDOTECA
1,6	N/A	N/A	4	100%	**6,40**	LUDOTECA
0,9	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	LUDOTECA
2,05	N/A	N/A	2	100%	**4,10**	LUDOTECA
1,91	N/A	N/A	2	100%	**3,82**	LUDOTECA
3,3	N/A	N/A	1	100%	**3,30**	LUDOTECA
2,5	N/A	N/A	1	100%	**2,50**	LUDOTECA
4,8	N/A	N/A	2	100%	**9,60**	LUDOTECA
1,73	N/A	N/A	2	100%	**3,46**	LUDOTECA
3,95	N/A	N/A	1	100%	**3,95**	LUDOTECA
3,05	N/A	N/A	1	100%	**3,05**	LUDOTECA
1,48	N/A	N/A	1	100%	**1,48**	LUDOTECA
1,28	N/A	N/A	2	100%	**2,56**	LUDOTECA
1,54	N/A	N/A	2	100%	**3,08**	LUDOTECA
2,35	N/A	N/A	1	100%	**2,35**	LUDOTECA
0,56	N/A	N/A	1	100%	**0,56**	LUDOTECA
6,26	N/A	N/A	1	100%	**6,26**	LUDOTECA
2,8	N/A	N/A	1	100%	**2,80**	LUDOTECA
1,1	N/A	N/A	1	100%	**1,10**	LUDOTECA
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	LUDOTECA
6,49	N/A	N/A	1	100%	**6,49**	LUDOTECA
0,9	N/A	N/A	-1	100%	**-0,90**	DESCUENTO PUERTA
2,7	N/A	N/A	6	100%	**16,20**	CIRCULACION A DESCANSO
2,03	N/A	N/A	1	100%	**2,03**	CIRCULACION A DESCANSO
0,5	N/A	N/A	1	100%	**0,50**	CIRCULACION A DESCANSO
3,94	N/A	N/A	2	100%	**7,88**	CIRCULACION A DESCANSO
1,46	N/A	N/A	1	100%	**1,46**	CIRCULACION A DESCANSO
0,34	N/A	N/A	1	100%	**0,34**	CIRCULACION A DESCANSO
3,98	N/A	N/A	1	100%	**3,98**	CIRCULACION A DESCANSO
3,18	N/A	N/A	1	100%	**3,18**	CIRCULACION A DESCANSO
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	CIRCULACION A DESCANSO
0,4	N/A	N/A	2	100%	**0,80**	CIRCULACION A DESCANSO
1,15	N/A	N/A	1	100%	**1,15**	CIRCULACION A DESCANSO
4,25	N/A	N/A	1	100%	**4,25**	CIRCULACION A DESCANSO
5,33	N/A	N/A	1	100%	**5,33**	CIRCULACION A DESCANSO
4,43	N/A	N/A	1	100%	**4,43**	CIRCULACION A DESCANSO
2,08	N/A	N/A	3	100%	**6,24**	CIRCULACION A DESCANSO
0,25	N/A	N/A	4	100%	**1,00**	CIRCULACION A DESCANSO
1,1	N/A	N/A	2	100%	**2,20**	CIRCULACION A DESCANSO
1,7	N/A	N/A	1	100%	**1,70**	CIRCULACION A DESCANSO
0,6	N/A	N/A	1	100%	**0,60**	CIRCULACION A DESCANSO
0,2	N/A	N/A	1	100%	**0,20**	CIRCULACION A DESCANSO
4,47	N/A	N/A	2	100%	**8,94**	CIRCULACION A DESCANSO
5,25	N/A	N/A	1	100%	**5,25**	CIRCULACION A DESCANSO
2,94	N/A	N/A	1	100%	**2,94**	CIRCULACION A DESCANSO
0,9	N/A	N/A	-1	100%	**-0,90**	DESCUUENTO
2,7	N/A	N/A	1	100%	**2,70**	DESCANSO MEDICO
1,51	N/A	N/A	1	100%	**1,51**	DESCANSO MEDICO
4,86	N/A	N/A	1	100%	**4,86**	DESCANSO MEDICO
3,17	N/A	N/A	1	100%	**3,17**	DESCANSO MEDICO
4,63	N/A	N/A	1	100%	**4,63**	DESCANSO MEDICO
0,5	N/A	N/A	1	100%	**0,50**	DESCANSO MEDICO
1,64	N/A	N/A	1	100%	**1,64**	DESCANSO MEDICO
0,6	N/A	N/A	1	100%	**0,60**	DESCANSO MEDICO
2,98	N/A	N/A	1	100%	**2,98**	DESCANSO EMFERMERIA
0,5	N/A	N/A	1	100%	**0,50**	DESCANSO EMFERMERIA
6,93	N/A	N/A	1	100%	**6,93**	DESCANSO EMFERMERIA
0,78	N/A	N/A	1	100%	**0,78**	DESCANSO EMFERMERIA
0,6	N/A	N/A	2	100%	**1,20**	DESCANSO EMFERMERIA
1,33	N/A	N/A	1	100%	**1,33**	DESCANSO EMFERMERIA
0,97	N/A	N/A	1	100%	**0,97**	DESCANSO EMFERMERIA
3,59	N/A	N/A	2	100%	**7,18**	COORDINACION PEDIATRICA
0,44	N/A	N/A	1	100%	**0,44**	COORDINACION PEDIATRICA
2,05	N/A	N/A	1	100%	**2,05**	COORDINACION PEDIATRICA
1,76	N/A	N/A	1	100%	**1,76**	COORDINACION PEDIATRICA
2,62	N/A	N/A	1	100%	**2,62**	COORDINACION PEDIATRICA
3,52	N/A	N/A	3	100%	**10,56**	UCI # 11
1,3	N/A	N/A	3	100%	**3,90**	UCI # 11
0,99	N/A	N/A	3	100%	**2,97**	UCI # 11
0,98	N/A	N/A	2	100%	**1,96**	UCI # 11
2,35	N/A	N/A	1	100%	**2,35**	UCI # 11
1,43	N/A	N/A	2	100%	**2,86**	UCI # 11
2,01	N/A	N/A	1	100%	**2,01**	UCI # 11
2,02	N/A	N/A	2	100%	**4,04**	UCI 12
1,34	N/A	N/A	2	100%	**2,68**	UCI 12
2,75	N/A	N/A	2	100%	**5,50**	UCI 12
3,34	N/A	N/A	2	100%	**6,68**	UCI 10
3,08	N/A	N/A	1	100%	**3,08**	UCI 10
1,63	N/A	N/A	1	100%	**1,63**	UCI 10
0,487	N/A	N/A	1	100%	**0,49**	UCI 10
5,05	N/A	N/A	1	100%	**5,05**	UCI 8
4,11	N/A	N/A	1	100%	**4,11**	UCI 8
2,12	N/A	N/A	1	100%	**2,12**	UCI 8
2,44	N/A	N/A	1	100%	**2,44**	UCI 8
0,56	N/A	N/A	1	100%	**0,56**	UCI 8
2,44	N/A	N/A	1	100%	**2,44**	UCI 8
3,07	N/A	N/A	1	100%	**3,07**	UCI 8
4,07	N/A	N/A	1	100%	**4,07**	UCI 6
3,68	N/A	N/A	1	100%	**3,68**	UCI 6
1,28	N/A	N/A	1	100%	**1,28**	UCI 6
1,95	N/A	N/A	1	100%	**1,95**	UCI 6
2,55	N/A	N/A	1	100%	**2,55**	UCI 6
2,17	N/A	N/A	1	100%	**2,17**	UCI 6
2,5	N/A	N/A	3	100%	**7,50**	UCI 4
3,77	N/A	N/A	1	100%	**3,77**	UCI 4
3,72	N/A	N/A	1	100%	**3,72**	UCI 4
4,12	N/A	N/A	1	100%	**4,12**	UCI 4
3,33	N/A	N/A	2	100%	**6,66**	UCI 2
3,24	N/A	N/A	1	100%	**3,24**	UCI 2
1,36	N/A	N/A	1	100%	**1,36**	ACCESO ASISTENCIAL
1,48	N/A	N/A	1	100%	**1,48**	ACCESO ASISTENCIAL
1,79	N/A	N/A	1	100%	**1,79**	ACCESO ASISTENCIAL
1,67	N/A	N/A	1	100%	**1,67**	ACCESO ASISTENCIAL
1,74	N/A	N/A	1	100%	**1,74**	ACCESO ASISTENCIAL
1,37	N/A	N/A	1	100%	**1,37**	ACCESO ASISTENCIAL
2,07	N/A	N/A	2	100%	**4,14**	ACCESO ASISTENCIAL









0,71	N/A	N/A	1	100%	**0,71**	ACCESO ASISTENCIAL
0,93	N/A	N/A	3	100%	**2,79**	ACCESO ASISTENCIAL
2,07	N/A	N/A	1	100%	**2,07**	ACCESO ASISTENCIAL
0,8	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	ACCESO ASISTENCIAL
0,44	N/A	N/A	2	100%	**0,88**	ACCESO ASISTENCIAL
1,44	N/A	N/A	1	100%	**1,44**	ACCESO ASISTENCIAL
2,27	N/A	N/A	1	100%	**2,27**	ACCESO ASISTENCIAL
1,5	N/A	N/A	1	100%	**1,50**	ACCESO ASISTENCIAL
0,66	N/A	N/A	1	100%	**0,66**	ACCESO ASISTENCIAL
0,3	N/A	N/A	1	100%	**0,30**	ACCESO ASISTENCIAL
0,66	N/A	N/A	2	100%	**1,32**	ACCESO ASISTENCIAL
0,8	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	ACCESO ASISTENCIAL
2,08	N/A	N/A	1	100%	**2,08**	ACCESO ASISTENCIAL
2	N/A	N/A	1	100%	**2,00**	CIRCULACION INFORMACION
0,3	N/A	N/A	2	100%	**0,60**	CIRCULACION INFORMACION
2,71	N/A	N/A	1	100%	**2,71**	CIRCULACION INFORMACION
3,78	N/A	N/A	1	100%	**3,78**	CIRCULACION INFORMACION
1,48	N/A	N/A	1	100%	**1,48**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0,93	N/A	N/A	4	100%	**3,72**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,02	N/A	N/A	3	100%	**3,06**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0,22	N/A	N/A	1	100%	**0,22**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,9	N/A	N/A	1	100%	**1,90**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2,5	N/A	N/A	2	100%	**5,00**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2,75	N/A	N/A	1	100%	**2,75**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0,5	N/A	N/A	1	100%	**0,50**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,2	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,63	N/A	N/A	1	100%	**1,63**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,57	N/A	N/A	1	100%	**1,57**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
3,76	N/A	N/A	1	100%	**3,76**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
		PISO 4 - FILOS				
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 425
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 425
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 425
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 425
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 425
2,30	N/A	N/A	4	100%	**9,20**	HABITACION 424
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 424
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 424
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 424
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 424
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 423
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 423
1,96	N/A	N/A	4	100%	**7,84**	HABITACION 423
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 423
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 423
2,30	N/A	N/A	5	100%	**11,50**	HABITACION 422
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 422
1,96	N/A	N/A	4	100%	**7,84**	HABITACION 422
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 422
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 422
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 421
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 421
1,96	N/A	N/A	3	100%	**5,88**	HABITACION 421
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 421
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 421
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 420
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 420
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 420
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 420
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 420
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 419
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 419
1,96	N/A	N/A	4	100%	**7,84**	HABITACION 419
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 419
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 419
2,30	N/A	N/A	2	100%	**4,60**	HABITACION 418
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 418
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 418
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 418
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 418
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 417
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 417
1,96	N/A	N/A	5	100%	**9,80**	HABITACION 417
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 417
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 417
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 416
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 416
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 416
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 416
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 416
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 415
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 415
1,96	N/A	N/A	5	100%	**9,80**	HABITACION 415
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 415
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 415
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 414
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 414
1,96	N/A	N/A	5	100%	**9,80**	HABITACION 414
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 414
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 414
2,30	N/A	N/A	2	100%	**4,60**	HABITACION 413
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 413
1,96	N/A	N/A	5	100%	**9,80**	HABITACION 413
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 413
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 413
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 412
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 412
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 412
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 412
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 412
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 411
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 411
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 411
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 411
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 411
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 410
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 410
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 410







1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 410
0,76	N/A	N/A	2	100%	**1,52**	HABITACION 410
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 409
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 409
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 409
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 409
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 409
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 408
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 408
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 408
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 408
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 408
2,30	N/A	N/A	2	100%	**4,60**	HABITACION 407
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 407
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 407
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 407
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 407
2,30	N/A	N/A	2	100%	**4,60**	HABITACION 406
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 406
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 406
1,20	N/A	N/A	2	100%	**2,40**	HABITACION 406
0,77	N/A	N/A	1	100%	**0,77**	HABITACION 406
2,30	N/A	N/A	6	100%	**13,80**	HABITACION 405
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 405
1,96	N/A	N/A	4	100%	**7,84**	HABITACION 405
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 405
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 405
2,30	N/A	N/A	2	100%	**4,60**	HABITACION 404
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 404
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 404
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 404
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 404
2,30	N/A	N/A	10	100%	**23,00**	HABITACION 403
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 403
1,96	N/A	N/A	6	100%	**11,76**	HABITACION 403
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 403
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 403
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 402
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 402
1,96	N/A	N/A	5	100%	**9,80**	HABITACION 402
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 402
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 402
2,30	N/A	N/A	3	100%	**6,90**	HABITACION 401
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	HABITACION 401
1,96	N/A	N/A	5	100%	**9,80**	HABITACION 401
1,20	N/A	N/A	1	100%	**1,20**	HABITACION 401
0,77	N/A	N/A	2	100%	**1,54**	HABITACION 401
1,20	N/A	N/A	25	100%	**30,00**	CIRCULACION HOSPITALIZACION
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CUARTO DE EQUIPO
1,96	N/A	N/A	25	100%	**49,00**	CIRCULACION FILOS
7,64	N/A	N/A	2	100%	**15,28**	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	TRABAJO LIMPIO
1,96	N/A	N/A	1	100%	**1,96**	TRABAJO LIMPIO
2,40	N/A	N/A	3	100%	**7,20**	PROCEDIMIENTO
1,96	N/A	N/A	1	100%	**1,96**	PROCEDIMIENTO
1,40	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	PROCEDIMIENTO
0,70	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	CUARTO DE ASEO
0,80	N/A	N/A	1	100%	**0,80**	CUARTO DE ASEO
2,40	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	DESCANSO Y VESTIER
1,96	N/A	N/A	4	100%	**7,84**	DESCANSO Y VESTIER
0,90	N/A	N/A	2	100%	**1,80**	DESCANSO Y VESTIER
2,40	N/A	N/A	9	100%	**21,60**	CIRCULACION RESTRINGIDA
1,96	N/A	N/A	10	100%	**19,60**	CIRCULACION RESTRINGIDA
1,30	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	CIRCULACION RESTRINGIDA
0,80	N/A	N/A	2	100%	**1,60**	CIRCULACION RESTRINGIDA
0,90	N/A	N/A	1	100%	**0,90**	CIRCULACION RESTRINGIDA
1,96	N/A	N/A	2	100%	**3,92**	FILO ENTRADA DUCTOS
0,93	N/A	N/A	2	100%	**1,86**	BAÑO
1,96	N/A	N/A	2	100%	**3,92**	BAÑO
0,86	N/A	N/A	2	100%	**1,72**	BAÑO
1,96	N/A	N/A	2	100%	**3,92**	BAÑO
0,88	N/A	N/A	2	100%	**1,76**	BAÑO
2,40	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	ROPA SUCIA
1,96	N/A	N/A	3	100%	**5,88**	RESIDUOS ORDINARIOS
2,77	N/A	N/A	2	100%	**5,54**	RESIDUOS ORDINARIOS
1,96	N/A	N/A	3	100%	**5,88**	RESIDUOS PELIGROSO
0,75	N/A	N/A	2	100%	**1,50**	RESIDUOS PELIGROSO
2,40	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	CIRCULACION HALL
2,40	N/A	N/A	5	100%	**12,00**	COORDINACION
2,67	N/A	N/A	2	100%	**5,34**	COORDINACION
1,96	N/A	N/A	2	100%	**3,92**	COORDINACION
2,63	N/A	N/A	2	100%	**5,26**	COORDINACION
1,04	N/A	N/A	2	100%	**2,08**	COORDINACION
4,79	N/A	N/A	1	100%	**4,79**	COORDINACION
0,78	N/A	N/A	2	100%	**1,56**	COORDINACION
2,40	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	SALA ESPERA
3,44	N/A	N/A	2	100%	**6,88**	SALA ESPERA
6,35	N/A	N/A	2	100%	**12,70**	SALA ESPERA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**4.738,82**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**869,86**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**3.868,96**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1,05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	CAP	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
19,00	2,54	N/A	1	33%	15,93	LAVANDERIA
1,50	2,10	N/A	-1	33%	-1,04	DESCUENTO PUERTA EN LAVANDERIA
27,90	2,70	N/A	1	33%	24,86	PARQUEADERO SOTANO
23,15	2,80	N/A	1	33%	21,39	PARQUEADERO SOTANO
1,00	2,10	N/A	-5	33%	-3,47	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1,50	2,10	N/A	-1	33%	-1,04	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0,40	2,00	N/A	-1	33%	-0,26	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
1,20	2,10	N/A	-5	33%	-4,16	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1,00	1,10	N/A	-1	33%	-0,36	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
14,00	2,45	N/A	1	33%	11,32	CONSULTORIO DE DIETAS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO PUERTA CONSULTORIO DE DIETAS
16,66	2,45	N/A	1	33%	13,47	ROPA LIMPIA
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PUERTA ROPA LIMPIA
9,38	2,50	N/A	1	33%	7,74	ROPA SUCIA
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO PUERTA ROPA SUCIA
48,88	2,55	N/A	1	33%	41,13	BODEGA FARMACIA
0,40	2,00	N/A	-1	33%	-0,26	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
1,21	2,10	N/A	-1	33%	-0,84	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
38,10	2,52	N/A	1	33%	31,68	ARCHIVO
1,21	2,10	N/A	-1	33%	-0,84	DESCUENTO DE PUERTA ARCHIVO
0,40	1,20	N/A	-1	33%	-0,16	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0,40	2,00	N/A	-1	33%	-0,26	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
20,21	2,45	N/A	1	33%	16,34	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
15,10	2,53	N/A	1	33%	12,61	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1,32	2,10	N/A	-1	33%	-0,91	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
14,82	2,50	N/A	1	33%	12,23	DEP. CADAVERES
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PIUERTA EN DEP DE CADAVERES
11,21	2,40	N/A	1	33%	8,88	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2,20	2,20	N/A	1	33%	1,60	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1,40	1,50	N/A	1	33%	0,69	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,55	1,00	N/A	-1	33%	-0,18	DESCUENTO VENTANA EN CICULACION
14,06	2,50	N/A	1	33%	11,60	CIRCULACION SALA DE STAR
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0,33	0,73	N/A	-1	33%	-0,08	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
17,25	2,52	N/A	1	33%	14,35	DEPOSITO ALMACEN
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTA EN DEPOSITO ALMACEN
0,55	1,00	N/A	-1	33%	-0,18	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
2,00	0,40	N/A	-1	33%	-0,26	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
14,25	2,70	N/A	1	33%	12,70	ASEO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO PUERTA
0,40	0,67	N/A	-1	33%	-0,09	DESCUENTO VENTANA
PISO 1						
17,53	2,60	N/A	1	66%	30,08	LABORATORIO
2,93	1,10	N/A	1	66%	2,13	MURO INTERMEDIO - LABORATORIO
0,97	2,09	N/A	1	66%	1,34	MURO INERMEDIO LAVA OJOS
4,64	2,60	N/A	1	66%	7,96	CUARTO LABORATORIO
0,80	2,10	N/A	-3	66%	-3,33	DESCUENTO PUERTA
1,30	1,30	N/A	-4	66%	-4,46	DESCUENTO VENTANA
10,24	0,99	N/A	1	66%	6,69	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
2,74	1,20	N/A	1	66%	2,17	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
1,64	1,12	N/A	1	66%	1,21	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
30,76	2,50	N/A	1	66%	50,75	LABORATO
0,97	2,10	N/A	-1	66%	-1,34	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTA PUERTA
0,94	1,10	N/A	-1	66%	-0,68	DESCUENTA VENTANA
0,71	2,10	N/A	-1	66%	-0,98	DESCUENTA PUERTA
1,30	0,65	N/A	-1	66%	-0,56	DESCUENTA VENTANA
3,60	2,50	N/A	1	66%	5,94	CUARO RESIDUOS RESICLABLES ORDINARIOS
0,79	2,10	N/A	-1	66%	-1,09	DESCUENTO PUERTA
0,49	1,30	N/A	-1	66%	-0,42	DESCUENTO VENTANA
0,86	0,86	N/A	-1	66%	-0,49	DESCUENTO VENTANA
3,91	2,60	N/A	1	66%	6,71	CUARTO NEVERA
0,99	2,10	N/A	-1	66%	-1,37	DESCUENTO PUERTA
10,92	2,60	N/A	1	66%	18,74	CUARTO TRANFUCIONAL
0,97	2,10	N/A	-1	66%	-1,34	DESCUENTO DE PUERTA
0,94	1,10	N/A	-1	66%	-0,68	DESCUENTO DE VENTANA
0,95	1,00	N/A	-1	66%	-0,63	DESCUENTO DE VENTANA
5,46	2,60	N/A	1	66%	9,37	CUARTO NEVERA MURO
3,71	2,60	N/A	1	66%	6,37	HALL CIRCULACION
1,21	0,61	N/A	1	66%	0,49	CIRCULACION HALL
4,06	2,60	N/A	1	66%	6,97	MURO HALL ENTRADA LABORATORIO
3,70	2,60	N/A	1	66%	6,35	MURO TOMA DE MUESTRAS
2,86	2,60	N/A	1	66%	4,91	MURO TOMA DE MUESTRAS
2,82	2,60	N/A	1	66%	4,84	MURO TOMA DE MUESTRAS
1,64	2,60	N/A	1	66%	2,81	TOMA DE MUESTRAS
3,64	2,60	N/A	1	66%	6,25	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1,47	2,60	N/A	1	66%	2,52	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1,67	2,60	N/A	1	66%	2,87	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO DE PUERTA GINECOLOGICA
2,06	2,60	N/A	1	66%	3,53	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
2,06	2,60	N/A	1	66%	3,53	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
1,30	1,30	N/A	-1	66%	-1,12	DESCUENTO VENTANA
3,91	2,60	N/A	1	66%	6,71	ENTREGA DE MUESTRAS
8,29	2,60	N/A	1	66%	14,23	MURO FRENTE A FARMACIA
0,99	0,65	N/A	-1	66%	-0,42	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
6,81	2,60	N/A	1	66%	11,69	MURO EXTERIOR FARMACIA
0,99	3,00	N/A	-1	66%	-1,96	DESCUENTO VENTANA
4,25	2,53	N/A	1	66%	7,10	MURO INTERNO FARMACIA
0,99	3,00	N/A	-1	66%	-1,96	DESCUENTO
2,92	2,53	N/A	1	66%	4,88	MURO INTERNO FARMACIA
4,55	2,53	N/A	1	66%	7,60	MURO INTERNO FARMACIA
0,83	1,05	N/A	1	66%	0,58	MURO INTERNO FARMACIA
0,94	2,53	N/A	1	66%	1,57	MURO ENTREGA FARMACIA
3,46	2,60	N/A	1	66%	5,94	AREA ENTREGA DE FARNACIA
3,77	2,60	N/A	1	66%	6,47	AREA ENTREGA DE FARMACIA
0,50	0,64	N/A	-1	66%	-0,21	DESCUENTA VENTANA
7,94	2,60	N/A	1	66%	13,63	AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
0,70	2,10	N/A	-1	66%	-0,97	DESCUENTO PUERTA
0,50	0,65	N/A	-1	66%	-0,21	DESCUENTO VENTANA
3,88	2,60	N/A	1	66%	6,66	MURO CIRCULACION A FARMACIA
1,36	2,60	N/A	1	66%	2,33	MURO HALL AL LADO DE ADMICIONES
1,10	2,10	N/A	-1	66%	-1,52	DESCUENTO DE PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO DE PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO DE PUERTA
1,29	2,10	N/A	-1	66%	-1,79	DESCUENTO DE PUERTA
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO DE PUERTA
8,82	2,60	N/A	1	66%	15,14	PROCEDIMIENTOS
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
1,10	2,10	N/A	-1	66%	-1,52	DESCUENTO PUERTA











0,40	1,00	N/A	-1	66%	-0,26	DESCUENTO VENTANA
7,96	2,60	N/A	1	66%	13,66	SALA DE IGEMATOLOGIA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO DE PUERTA
17,49	2,60	N/A	1	66%	30,01	ADMICIONES
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
1,29	2,10	N/A	-1	66%	-1,79	DESCUENTO PUERTA
14,80	2,60	N/A	1	66%	25,40	PROCEDIMIENTOS
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
1,10	2,10	N/A	-1	66%	-1,52	DESCUENTO PUERTA
0,90	1,30	N/A	-1	66%	-0,77	DESCUENTO VENTANA
1,30	1,30	N/A	-1	66%	-1,12	DESCUENTO VENTANA
6,16	2,60	N/A	1	66%	10,57	TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
12,67	2,60	N/A	1	66%	21,74	COLSULTORIO DE CARDILOGO
14,25	2,60	N/A	1	66%	24,45	MUROS CIRCULACION
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
2,30	2,10	N/A	-1	66%	-3,19	DESCUENTO PUERTA
1,34	1,99	N/A	-1	66%	-1,76	DESCUENTO ACENSOR
9,10	2,60	N/A	1	66%	15,62	OFICINA RADIOLOGIA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
0,85	1,20	N/A	-1	66%	-0,67	DESCUENTO VENTANA
7,07	2,60	N/A	1	66%	12,13	INSUMOS
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	INSUMOS
10,03	2,60	N/A	1	66%	17,21	SALA DE ESPERA
1,10	2,10	N/A	-2	66%	-3,05	DESCANSO DE PUERTA
1,00	0,40	N/A	-1	66%	-0,26	DESCANSO DE VENTANA
21,59	2,60	N/A	1	66%	37,05	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1,10	2,10	N/A	-1	66%	-1,52	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1,30	1,30	N/A	-1	66%	-1,12	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
16,04	2,60	N/A	1	66%	27,52	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0,90	1,30	N/A	-1	66%	-0,77	DESCUENTO
1,10	2,10	N/A	-1	66%	-1,52	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO
30,52	2,42	N/A	1	66%	48,75	HALL DE CIRCULACION
10,38	2,10	N/A	-1	66%	-14,39	DESCUENTO DE PUERTAS
1,00	1,10	N/A	-1	66%	-0,73	DESCUENTO VENTANA
32,20	2,42	N/A	1	66%	51,43	HALL CIRCULACION
11,47	2,10	N/A	-1	66%	-15,90	DESCUENTO PUERTAS
1,00	1,00	N/A	-4	66%	-2,64	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,40	N/A	-1	66%	-0,92	DESCUENTO VENTANAS
17,34	2,54	N/A	1	66%	29,07	COLSULTORIO 3
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
1,80	2,54	N/A	-1	66%	-3,02	DESCUENTO PUERTA
16,71	2,10	N/A	1	66%	23,16	CONSULTORIO 4
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
1,00	1,00	N/A	-1	66%	-0,66	DESCUENTA VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
11,18	2,42	N/A	1	66%	17,86	MONITEREO GINECOSTRETICO
1,73	2,10	N/A	-2	66%	-4,80	DESCUENTO PUERTA
18,96	2,60	N/A	1	100%	49,30	AUDITORIO
1,30	2,10	N/A	-1	100%	-2,73	DESCUENTO PUERTA
14,14	2,70	N/A	1	100%	38,18	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0,40	0,80	N/A	-1	100%	-0,32	DESCUENTO VENTANA
2,00	0,40	N/A	-1	100%	-0,80	DESCUENTO VENTANA
2,00	0,40	N/A	-1	100%	-0,80	DESCUENTO VENTANA
1,00	2,10	N/A	-1	100%	-2,10	DESCUENTO VENTANA
8,95	2,70	N/A	1	66%	15,95	CIRCULACION HALL
0,40	0,80	N/A	-1	66%	-0,21	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1,98	2,70	N/A	2	66%	7,06	MURO
1,70	1,10	N/A	-2	66%	-2,47	DESCUENTO PUERTA
3,00	2,70	N/A	1	66%	5,35	BAÑO DISCAPACITADOS Y PRIMER PISO
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
1,34	2,70	N/A	1	66%	2,39	BAÑO MUJERES
18,59	2,70	N/A	1	66%	33,13	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
1,00	2,10	N/A	-1	66%	-1,39	DESCUENTO PERTA
0,80	0,40	N/A	-1	66%	-0,21	DESCUENTO VENTANA
2,00	0,40	N/A	-1	66%	-0,53	DESCUENTO VENTANA
4,65	2,70	N/A	1	66%	8,29	AUTORIZACIONES
1,00	1,00	N/A	-1	66%	-0,66	DESCUENTO DE VENTANA
4,41	2,70	N/A	1	66%	7,86	HALL PRINCIPAL
10,00	2,30	N/A	1	100%	23,00	COCINETA
1,00	1,90	N/A	1	100%	1,90	DESCUENTO PUERTA
21,86	2,30	N/A	1	100%	50,28	COCINETA INTERNA
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO BAÑOS
-1,00	2,10	N/A	-1	100%	2,10	DESCUENTO PUERTA
11,37	2,55	N/A	1	100%	28,99	CAFETERIA
0,90	2,10	N/A	-2	100%	-3,78	DESCUENTO PUERTA
1,30	2,10	N/A	-1	100%	-2,73	DESCUENTO PUERTA
10,26	2,38	N/A	1	66%	16,12	MAMOGRAFO
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
5,11	2,38	N/A	1	66%	8,03	VESTIER CONTINUO A RX
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
5,43	2,48	N/A	1	66%	8,89	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
6,71	2,48	N/A	1	66%	10,98	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
1,70	2,10	N/A	-1	66%	-2,36	DESCUENTO PUERTA TAC
0,89	2,10	N/A	-1	66%	-1,23	DESCUENTO PUERTA TAC
0,89	2,10	N/A	-1	66%	-1,23	DESCUENTO PUERTA ASEO
2,00	2,40	N/A	2	66%	6,34	PUERTA ENTRE CENTRAL DE EMFERMERIA Y TAC
2,00	1,98	N/A	-2	66%	-5,23	DESCUENTO PUERTA
18,52	2,37	N/A	1	66%	28,97	TAC
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
0,70	2,10	N/A	-1	66%	-0,97	DESCUENTO PUERTA
0,60	0,90	N/A	-1	66%	-0,36	DESCUENTO VENTANA
6,94	2,37	N/A	1	66%	10,86	CUARTO DISPARO
0,60	0,90	N/A	-1	66%	-0,36	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO VENTANA
4,58	2,45	N/A	1	66%	7,41	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA T LIMPIO
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
31,39	2,45	N/A	1	66%	50,76	OBSERVACION PEDIATRA
0,90	2,10	N/A	-2	66%	-2,49	DESCUENTO PUERTA
6,67	0,80	N/A	2	66%	7,04	CENTRAL DE EMFERMERIA
4,82	2,52	N/A	1	66%	8,02	RESIDUOS ORDINARIOS
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
4,27	2,52	N/A	1	66%	7,10	RESIDUOS PELIGROSOS
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO
11,48	2,32	N/A	1	66%	17,58	DIR URGENSIAS
1,00	1,00	N/A	-1	66%	-0,66	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
10,61	2,43	N/A	1	66%	17,02	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
1,65	2,10	N/A	-1	66%	-2,29	DESCUENTO PUERTA
12,13	2,40	N/A	1	66%	19,21	SALA DE YESOS
0,94	1,00	N/A	-1	66%	-0,62	DESCUENTO VENTANA
1,70	2,10	N/A	-1	66%	-2,36	DESCUENTO PUERTA
15,60	2,53	N/A	1	66%	26,05	DIGITACION
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
1,29	1,00	N/A	-1	66%	-0,85	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
14,90	2,50	N/A	1	66%	24,59	SALA ERA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
1,00	1,30	N/A	-1	66%	-0,86	DESCUENTO VENTANA
14,37	2,50	N/A	1	66%	23,71	CONSULTORIO 3
1,30	2,10	N/A	-1	66%	-1,80	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
1,41	1,00	N/A	-1	66%	-0,93	DESCUENTO VENTANA
16,26	2,50	N/A	1	66%	26,83	CONSULTORIO 2
1,50	1,30	N/A	-1	66%	-1,29	DESCUENTO VENTANA







1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
15,88	2,48	N/A	1	66%	25,99	CONSULTORIO 1
1,20	2,10	N/A	-1	66%	-1,66	DESCUENTO PUERTA
1,00	2,10	N/A	-1	66%	-1,39	DESCUENTO PUERTA
0,92	0,86	N/A	-1	66%	-0,52	DESCUENTO VENTANA
13,40	2,52	N/A	1	66%	22,29	ADMISIONES URGENSIAS
0,94	2,10	N/A	-1	66%	-1,30	DESCUENTO PUERTA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
1,20	1,40	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO VENTANA
2,00	1,40	N/A	-1	66%	-1,85	DESCUENTO VENTANA
8,71	2,52	N/A	1	66%	14,49	REF Y CONTRA REF
1,00	2,10	N/A	-1	66%	-1,39	DESCUEBTO PUERTA
11,20	2,53	N/A	1	66%	18,70	SALA ESPERA URGENCIAS
1,40	0,93	N/A	-1	66%	-0,86	DESCUENTO VENTANA
1,40	0,93	N/A	-1	66%	-0,86	DESCUENTO VENTANA
0,40	1,00	N/A	-1	66%	-0,26	DESCUENTO VENTANA
7,51	2,53	N/A	1	66%	12,54	ACCESO URGENCIAS
2,00	2,10	N/A	-1	66%	-2,77	DESCUENTO PUERA ACCESO URGENCIAS
0,70	1,00	N/A	-1	66%	-0,46	DESCUENTO VENTANA
6,35	2,53	N/A	1	66%	10,60	SALA ESPERA ADULTOS
1,20	1,75	N/A	-1	66%	-1,39	DESCUENTO VENTANA
1,13	1,73	N/A	-1	66%	-1,29	DESCUENTO VENTANA
6,37	0,75	N/A	1	66%	3,15	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
16,18	2,52	N/A	1	66%	26,91	DESCUENTO VENTANA
0,97	0,97	N/A	-1	66%	-0,62	DESCUENTO VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO PUERTA
15,31	2,52	N/A	1	66%	25,46	CUARTO DE EQUIPOS
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO PUERTA
0,40	0,50	N/A	-1	66%	-0,13	DESCUENTO VENTA
13,60	2,50	N/A	1	66%	22,44	RAYOS X
0,80	2,10	N/A	-2	66%	-2,22	DESCUENTO PUERTA
14,90	2,54	N/A	1	66%	24,98	SALA ESPERA (HALL), PASILLO HACIA FARMACIA Y MUROS EXTERIOR Y POSTERIOR DE CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO
1,84	1,58	N/A	-1	66%	-1,92	DESCUENTO: VENTALA PASILLO
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO: PUERTA CONTROL IMAGENOLOGÍA
3,51	1,00	N/A	2	66%	4,63	CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO - RECEPCIÓN (ANTEPECHO)
2,50	1,00	N/A	2	66%	3,30	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (ANTEPECHO)
1,25	2,54	N/A	1	66%	2,10	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (MURO CORTO LATERAL DERECH)
6,86	2,64	N/A	1	66%	11,95	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS (ACCESO A URG) Y
0,70	2,64	N/A	1	66%	1,22	ACCESO A TRIAGES
1,16	1,75	N/A	-1	66%	-1,34	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1,00	2,10	N/A	-1	66%	-1,39	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 1
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 2
4,40	2,50	N/A	1	66%	7,26	ACCESO A LAVADO DE PACIENTES
2,00	2,10	N/A	-1	66%	-2,77	DESCUENTO: PUERTA PASILLO
20,55	2,54	N/A	1	66%	34,45	MONITOREO GINESCOBTETRICIA
0,70	2,10	N/A	-1	66%	-0,97	DESCUENTO: PUERTA CUARTO LIBRE
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1,71	2,10	N/A	-1	66%	-2,37	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
15,29	2,63	N/A	1	66%	26,54	SALA EDA
0,95	0,95	N/A	-1	66%	-0,60	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1,07	1,00	N/A	-1	66%	-0,71	DESCUENTO: VENTANA PASILLO
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1,00	2,10	N/A	-1	66%	-1,39	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
4,37	2,66	N/A	1	66%	7,67	AUDITORIO (MURO ORIENTAL)
1,13	1,72	N/A	-1	66%	-1,28	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
5,50	2,50	N/A	1	66%	9,08	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA: DIGITACIÓN
0,90	2,10	N/A	-1	66%	-1,25	DESCUENTO: PUERTA
4,60	2,50	N/A	1	66%	7,59	ROPA LIMPIA: DIGITACIÓN
0,80	2,10	N/A	-1	66%	-1,11	DESCUENTO: PUERTA
4,01	2,50	N/A	1	66%	6,62	ROPA SUCIA: DIGITACIÓN
2,95	2,50	N/A	1	66%	4,87	FACTURACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ADMISIÓN (MURO SUR)
5,77	2,40	N/A	1	66%	9,14	TRIAGE 2
2,53	2,40	N/A	1	66%	4,01	
0,81	1,50	N/A	-1	66%	-0,80	DESCUENTO VENTANA
2,10	2,20	N/A	1	66%	3,05	SALA ESPERA ADULTO
1,14	2,40	N/A	1	100%	2,74	AUDITORIO
1,70	2,40	N/A	1	100%	4,08	
3,16	2,40	N/A	2	66%	10,01	DESCANSO URGENCIAS
3,15	2,40	N/A	1	66%	4,99	
0,80	2,10	N/A	-2	66%	-2,22	DESCUENTO PUERTA
1,63	2,40	N/A	1	66%	2,58	DESCANSO URGENCIAS
1,70	2,34	N/A	1	66%	2,63	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA
1,40	1,10	N/A	1	66%	1,02	
4,40	1,33	N/A	1	66%	3,86	CUARTO ASEO URGENCIAS
2,28	1,00	N/A	1	66%	1,50	SALA ERA
5,85	2,40	N/A	1	66%	9,27	CUARTO EQUIPO URG
0,90	2,07	N/A	-1	66%	-1,23	DESCUENTO PUERTA
0,80	0,90	N/A	1	66%	0,48	SALA YESO
1,60	0,70	N/A	1	66%	0,74	
1,50	1,07	N/A	1	66%	1,06	PASILLO URGENCIAS - TABLERO GASES
0,26	0,42	N/A	-1	66%	-0,07	PASILLO URGENCIAS - TABLERO
1,50	1,20	N/A	1	66%	1,19	PROCEDIMIENTO
2,40	0,90	N/A	1	66%	1,43	
2,00	0,80	N/A	1	66%	1,06	RESIDUOS PELIGROS
1,30	1,00	N/A	1	66%	0,86	RESIDUOS RESICLABLE
2,82	0,90	N/A	1	66%	1,68	OBSERVACION PEDIATRIA - TOMAS Y GASES
2,60	1,10	N/A	1	66%	1,89	
1,40	2,60	N/A	1	66%	2,40	
4,20	0,76	N/A	1	66%	2,11	CENTRAL DE ENFERMERIA
6,46	1,60	N/A	2	66%	13,64	TRABAJO LIMPIO - TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-2	66%	-2,22	DESCUENTO PUERTAS
5,30	1,34	N/A	1	66%	4,69	CIRCULACION - CUARTO DE ASEO
1,30	1,02	N/A	1	66%	0,88	CUARO DE ASEO RX
0,60	2,40	N/A	1	66%	0,95	TOMA DE MUESTRA
1,62	2,40	N/A	1	66%	2,57	RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO
2,63	1,10	N/A	1	66%	1,91	FARMACIA AREA ENTREGA
4,94	1,10	N/A	1	66%	3,59	
2,40	0,80	N/A	1	66%	1,27	FACTURACION ADMISION
1,40	1,10	N/A	1	66%	1,02	PROCEDIMIENTO ASEPTICOS
1,27	2,40	N/A	1	66%	2,01	PROCEDIMIENTO ASEPTICOS
5,55	2,40	N/A	1	66%	8,79	T LIMPIO EN OBSERVACION PEDIATRA
0,79	2,06	N/A	-1	66%	-1,07	DESCUENTO DE PUERTA
6,63	2,40	N/A	1	66%	10,50	T SUCIO EN OBSERVACION
0,79	2,06	N/A	-1	66%	-1,07	DESCUENTO DE PUERTA
7,34	2,40	N/A	1	66%	11,63	INSUMOS AL LADO DE PROCEDIMIENTOS
0,80	2,06	N/A	-1	66%	-1,09	DESCUENTO DE PUERTA
		PISO 2				
37,05	2,50	N/A	1	33%	30,57	PASILLO RECUPERACION
8,25	2,10	N/A	-1	33%	-5,72	DESCUENTO PUERTAS
17,52	2,40	N/A	1	33%	13,88	PREPARACION PASIENTES
3,70	2,10	N/A	-1	33%	-2,56	DESCUENTO PUERTAS
39,12	2,55	N/A	1	33%	32,92	RECUPERACION QUIRURGICA
5,11	2,10	N/A	-1	33%	-3,54	DESCUENTO PUERTAS
13,37	0,70	N/A	-1	33%	-3,09	DESCUENTO VENTANAS
11,97	0,79	N/A	1	33%	3,12	CENTRAL EMFERMERIA
27,31	2,50	N/A	1	33%	22,53	CENTRAL ESTERILIZACION
1,90	2,10	N/A	-1	33%	-1,32	DESCUENTO PUERTAS
1,48	1,00	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO VENTANAS
1,00	0,70	N/A	-1	33%	-0,23	DESCUENTO VENTANAS
0,84	1,46	N/A	-1	33%	-0,40	DESCUENTO VENTANAS
11,39	2,50	N/A	1	33%	9,40	INGRESO AUTO CLAVE
2,10	2,10	N/A	-1	33%	-1,46	DESCUENTO PUERTAS
0,81	1,00	N/A	-1	33%	-0,27	DESCUENTO VENTANAS
61,80	2,50	N/A	1	33%	50,99	CICULACION DE QUIRURGICOS A SALA DE PARTOS
18,61	2,10	N/A	-1	33%	-12,90	DESCUENTO PUERTAS
1,50	1,26	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO VENTANAS
2,15	0,90	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,00	N/A	-2	33%	-0,66	DESCUENTO VENTANAS









1,00	1,50	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO VENTANAS
2,00	2,50	N/A	-1	33%	-1,65	DESCUENTO ENTRADA A PASILLO
11,67	2,50	N/A	1	33%	9,63	CUARTO DE EQUIPOS
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUENTO PUERTAS
21,53	2,50	N/A	1	33%	17,76	DESCANSO QUIROFANOS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-2	33%	-1,25	DESCUENTO PUERTAS
3,21	0,50	N/A	-1	33%	-0,53	DESCUENTO VENTANAS
2,42	2,60	N/A	1	33%	2,08	TRABAJO SUCIO
3,50	2,10	N/A	-1	33%	-2,43	DESCUENTO PUERTAS
2,00	0,37	N/A	-1	33%	-0,24	DESCUENTO PUERTAS
1,00	0,70	N/A	-1	33%	-0,23	DESCUENTO VENTANAS
12,91	2,50	N/A	1	33%	10,65	FARMACIA
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
1,00	1,00	N/A	-3	33%	-0,99	DESCUENTO VENTANAS
0,37	2,00	N/A	-1	33%	-0,24	DESCUENTO VENTANAS
5,95	2,50	N/A	1	33%	4,91	BODEGA
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
13,66	2,50	N/A	1	33%	11,27	DESCANSO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
0,60	2,10	N/A	-1	33%	-0,42	DESCUENTO PUERTAS
1,00	1,00	N/A	-1	33%	-0,33	DESCUENTO VENTANAS
8,82	2,50	N/A	1	33%	7,28	PASILLO VESTIER
0,80	2,10	N/A	-3	33%	-1,66	DESCUENTO PUERTAS
20,57	2,40	N/A	1	33%	16,29	VESTIER MUJERES
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-3	33%	-1,46	DESCUENTO VENTANAS
20,70	2,40	N/A	1	33%	16,39	VESTIER HOMBRES
0,80	2,10	N/A	2	33%	1,11	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	2	33%	0,97	DESCUENTO VENTANAS
83,30	2,45	N/A	1	33%	67,35	PASILLO PRINCIPAL A UCI
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO PUERTAS
1,00	0,70	N/A	-1	33%	-0,23	DESCUENTO VENTANAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO VENTANAS
2,00	2,45	N/A	-1	33%	-1,62	DESCUENTO VENTANAS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO VENTANAS
1,00	1,50	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO VENTANAS
1,96	2,10	N/A	-1	33%	-1,36	DESCUENTO VENTANAS
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
0,76	2,10	N/A	-1	33%	-0,53	DESCUENTO PUERTAS
1,70	2,10	N/A	-1	33%	-1,18	DESCUENTO PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
0,60	2,10	N/A	-1	33%	-0,42	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO PUERTAS
2,00	2,10	N/A	-1	33%	-1,39	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
1,10	2,45	N/A	-1	33%	-0,89	DESCUENTO PUERTAS
1,70	2,10	N/A	-2	33%	-2,36	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
3,88	0,98	N/A	1	33%	1,25	RESECION
34,33	0,50	N/A	1	33%	5,66	TRABAJO DE PARTO
1,67	2,10	N/A	-1	33%	-1,16	DESCUENTO PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTAS
2,13	0,90	N/A	-1	33%	-0,63	DESCUENTO PUERTAS
1,50	1,30	N/A	-3	33%	-1,93	DESCUENTO PUERTAS
4,90	0,85	N/A	1	33%	1,37	CENTRAL DE EMFERMERIA
38,26	2,50	N/A	1	33%	31,56	RECUPERACION DE PARTOS
0,95	2,10	N/A	-1	33%	-0,66	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUNTO DE PUERTAS
1,50	1,30	N/A	-2	33%	-1,29	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUNTO DE PUERTAS
2,00	2,10	N/A	-1	33%	-1,39	DESCUNTO DE PUERTAS
5,22	0,77	N/A	1	33%	1,33	CENTRAL DE EMFERMERIA
5,95	2,50	N/A	1	33%	4,91	ROPA LIMPIA
0,95	2,10	N/A	-1	33%	-0,66	DESCUNTO DE PUERTAS
19,11	2,50	N/A	1	33%	15,77	VESTIER PARTOS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUNTO DE PUERTAS
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUNTO DE PUERTAS
96,00	2,50	N/A	1	33%	79,20	UCI ADULTOS
1,96	2,10	N/A	-1	33%	-1,36	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUNTO DE PUERTAS
1,60	2,10	N/A	-2	33%	-2,22	DESCUNTO DE PUERTAS
1,50	1,30	N/A	-4	33%	-2,57	DESCUNTO DE VENTANA
0,95	0,95	N/A	-2	33%	-0,60	DESCUNTO DE VENTANA
1,10	2,10	N/A	-2	33%	-1,52	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-4	33%	-2,22	DESCUNTO DE PUERTAS
1,30	0,92	N/A	-1	33%	-0,39	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,30	N/A	-1	33%	-0,56	DESCUNTO DE VENTANA
1,25	0,80	N/A	-2	33%	-0,66	DESCUNTO DE VENTANA
0,95	0,95	N/A	-1	33%	-0,30	DESCUNTO DE VENTANA
1,20	1,30	N/A	-1	33%	-0,51	DESCUNTO DE VENTANA
5,19	0,85	N/A	1	33%	1,46	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7,28	0,78	N/A	1	33%	1,87	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7,65	2,50	N/A	1	33%	6,31	FILTRO ACCESO FAMILIARES
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUNTO DE PUERTAS
6,20	2,50	N/A	1	33%	5,12	IMFORMACION FAMILIARES
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE PUERTAS
19,41	2,50	N/A	1	33%	16,01	FILTRO ACCESO PERSONAL
0,80	2,10	N/A	-3	33%	-1,66	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-2	33%	-0,97	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
9,50	2,50	N/A	1	33%	7,84	DESCANSO
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUNTO DE PUERTAS
1,50	1,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUNTO DE PUERTAS
12,10	2,50	N/A	1	33%	9,98	EXTRACION
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUNTO DE PUERTAS
9,81	2,50	N/A	1	33%	8,09	FILTRO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE PUERTAS
11,51	2,50	N/A	1	33%	9,50	PASILLO ACCESO UCI
2,00	2,10	N/A	-2	33%	-2,77	DESCUNTO DE VENTANA
0,85	3,10	N/A	-1	33%	-0,87	DESCUNTO DE VENTANA
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUNTO DE PUERTAS
0,66	2,10	N/A	-1	33%	-0,46	DESCUNTO DE PUERTAS
17,21	2,50	N/A	1	33%	14,20	LACTARIO
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUNTO DE PUERTAS
11,91	2,40	N/A	1	33%	9,43	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
0,80	2,10	N/A	-3	33%	-1,66	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	1,00	N/A	-1	33%	-0,23	DESCUNTO DE VENTANA
96,38	2,50	N/A	1	33%	79,51	UCI NEONATAL
2,00	2,10	N/A	-1	33%	-1,39	DESCUNTO DE PUERTAS
1,35	2,10	N/A	-1	33%	-0,94	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	1,30	N/A	-1	33%	-0,39	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,30	N/A	-6	33%	-3,35	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,05	N/A	-1	33%	-0,45	DESCUNTO DE VENTANA
0,70	1,00	N/A	-1	33%	-0,23	DESCUNTO DE VENTANA
0,70	1,20	N/A	-2	33%	-0,55	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	1,30	N/A	-1	33%	-0,39	DESCUNTO DE VENTANA
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUNTO DE VENTANA
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	2,50	N/A	-1	33%	-0,74	DESCUNTO DE VENTANA











1,35	2,10	N/A	-1	33%	-0,94	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE PUERTAS
0,75	2,10	N/A	-1	33%	-0,52	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
15,00	0,66	N/A	1	33%	3,27	UCI AISLADO
12,79	0,66	N/A	1	33%	2,79	UCI AISLADO
4,68	0,82	N/A	4	33%	5,07	CENTRAL DE EMFERMERIA
10,64	0,82	N/A	1	33%	2,88	CENTRAL DE EMFERMERIA
11,41	2,50	N/A	1	33%	9,41	PASILLO DESCANSO
0,80	2,10	N/A	-4	33%	-2,22	DESCUNTO DE PUERTAS
20,32	2,50	N/A	1	33%	16,76	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-3	33%	-1,66	DESCUNTO DE VENTANA
1,90	1,30	N/A	-1	33%	-0,82	DESCUNTO DE VENTANA
1,30	1,30	N/A	-1	33%	-0,56	DESCUNTO DE VENTANA
0,90	1,30	N/A	-1	33%	-0,39	DESCUNTO DE VENTANA
11,78	2,50	N/A	1	33%	9,72	PASILLO ASEO Y LAVADO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUNTO DE PUERTAS
17,56	2,50	N/A	1	33%	14,49	PASILLO ASESO ASISTENCIAL
1,80	2,10	N/A	-1	33%	-1,25	DESCUNTO DE PUERTAS
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUNTO DE PUERTAS
0,75	2,10	N/A	-1	33%	-0,52	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-3	33%	-1,66	DESCUNTO DE PUERTAS
1,73	2,10	N/A	-1	33%	-1,20	DESCUNTO DE PUERTAS
2,67	2,30	N/A	1	33%	2,03	ROPA LIMPIA
2,90	2,30	N/A	1	33%	2,20	ROPA SUCIA
13,60	2,60	N/A	1	33%	11,67	VESTIER ASISTENCIAL
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	3,60	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUNTO DE PUERTAS
9,21	2,40	N/A	1	33%	7,29	COORDINACION
1,80	2,10	N/A	-1	33%	-1,25	DESCUNTO DE PUERTAS
4,29	0,70	N/A	-1	33%	-0,99	DESCUNTO DE VENTANA
23,88	2,50	N/A	1	33%	19,70	HALL PRINCIPAL
1,90	2,10	N/A	-1	33%	-1,32	DESCUNTO DE PUERTAS
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUNTO DE PUERTAS
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	DESCUNTO DE PUERTAS
2,20	2,10	N/A	-1	33%	-1,52	DESCUNTO DE PUERTAS
5,56	2,40	N/A	1	33%	4,40	T LIMPIO CUIDADOS INTERMEDIOS
0,70	2,06	N/A	-1	33%	-0,48	DESCUENTO PUERTA
7,46	2,40	N/A	1	33%	5,91	T LIMPIO CUIDADOS INTENSIVOS
0,90	2,06	N/A	-1	33%	-0,61	DESCUENTO PUERTA
7,00	2,40	N/A	1	33%	5,54	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0,80	2,06	N/A	-1	33%	-0,54	DESCUENTO PUERTA
0,90	0,95	N/A	-1	33%	-0,28	DESCUENTO PUERTA
6,20	2,40	N/A	1	33%	4,91	T SUCIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0,80	2,06	N/A	-1	33%	-0,54	DESCUENTO PUERTA
9,80	2,40	N/A	1	33%	7,76	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0,70	2,06	N/A	-1	33%	-0,48	DESCUENTO PUERTAS
		PISO 3				
2,28	2,80	N/A	1	33%	2,11	LUDOTECA
1,55	2,80	N/A	1	33%	1,43	LUDOTECA
1,57	2,80	N/A	1	33%	1,45	LUDOTECA
1,55	2,80	N/A	1	33%	1,43	LUDOTECA
2,57	2,80	N/A	1	33%	2,37	LUDOTECA
6,68	2,80	N/A	1	33%	6,17	LUDOTECA
4,78	2,80	N/A	1	33%	4,42	LUDOTECA
4,78	2,80	N/A	1	33%	4,42	LUDOTECA
5,01	2,80	N/A	1	33%	4,63	LUDOTECA
4,80	2,80	N/A	1	33%	4,44	LUDOTECA
3,35	2,80	N/A	1	33%	3,10	LUDOTECA
4,91	2,80	N/A	1	33%	4,54	LUDOTECA
2,13	2,80	N/A	1	33%	1,97	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	33%	1,78	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	33%	1,78	LUDOTECA
2,23	2,80	N/A	1	33%	2,06	LUDOTECA
3,46	2,80	N/A	1	33%	3,20	LUDOTECA
7,90	2,80	N/A	1	33%	7,30	LUDOTECA
4,76	2,80	N/A	1	33%	4,40	LUDOTECA
4,17	2,80	N/A	1	33%	3,85	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	33%	1,78	LUDOTECA
1,10	2,80	N/A	1	33%	1,02	LUDOTECA
2,53	2,80	N/A	1	33%	2,34	LUDOTECA
0,93	2,80	N/A	1	33%	0,86	LUDOTECA
1,76	2,80	N/A	1	33%	1,63	LUDOTECA
1,93	2,80	N/A	1	33%	1,78	LUDOTECA
1,50	1,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,20	1,80	N/A	-1	33%	-0,71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,20	2,00	N/A	-1	33%	-0,79	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2,24	4,78	N/A	-1	33%	-3,53	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2,25	2,30	N/A	-1	33%	-1,71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,35	4,80	N/A	-1	33%	-2,14	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1,35	3,35	N/A	-1	33%	-1,49	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0,90	2,16	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0,80	2,16	N/A	-2	33%	-1,14	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
0,90	2,16	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
11,87	2,55	N/A	1	33%	9,99	EXTRACION DE LECHE MATERIAL
0,90	2,16	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO PUERTA LECHE MATERIAL
7,28	2,60	N/A	1	33%	6,25	DEPOSITO DE INSUMOS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO PUERTA AREA DEPOSITO
5,92	2,60	N/A	1	33%	5,08	FILTRO INGRESO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	PREPARACION DE FORMULAS
15,02	2,60	N/A	1	33%	12,89	PREPARACION DE FORMULAS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	PREPARACION DE FORMULAS
1,96	1,25	N/A	-1	33%	-0,81	PREPARACION DE FORMULAS
1,55	1,05	N/A	-1	33%	-0,54	PREPARACION DE FORMULAS
11,50	2,60	N/A	1	33%	9,87	IMFORMACION FAMILIARES
0,90	2,80	N/A	-1	33%	-0,83	IMFORMACION FAMILIARES
13,17	2,70	N/A	1	33%	11,73	COORDINACIÓN PEDIATRA
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	COORDINACIÓN PEDIATRA
32,31	2,54	N/A	1	33%	27,08	CIRCULACION
0,90	2,10	N/A	-5	33%	-3,12	CIRCULACION
0,70	2,10	N/A	-2	33%	-0,97	CIRCULACION
13,30	2,70	N/A	1	33%	11,85	DESCANSO DE MEDICO
0,70	2,50	N/A	-1	33%	-0,58	DESCANSO DE MEDICO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCANSO DE MEDICO
10,10	2,70	N/A	1	33%	9,00	DESCANSO EMFERMERIA
0,70	2,50	N/A	-1	33%	-0,58	DESCANSO EMFERMERIA
4,05	2,55	N/A	1	33%	3,41	ESTACION DE CAFÉ
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	ESTACION DE CAFÉ
15,45	2,80	N/A	1	33%	14,28	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,90	1,36	N/A	-1	33%	-0,85	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1,30	1,36	N/A	-1	33%	-0,58	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	COORDINACION UCI PEDIATRICA
4,04	2,70	N/A	1	33%	3,60	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
9,35	2,70	N/A	1	33%	8,33	ASISTENCIAL
0,70	0,80	N/A	-1	33%	-0,18	ASISTENCIAL
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	ASISTENCIAL
8,18	2,60	N/A	1	33%	7,02	ROPA LIMPIA
0,70	1,14	N/A	-1	33%	-0,26	ROPA LIMPIA
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	ROPA LIMPIA
8,40	2,60	N/A	1	33%	7,21	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0,70	0,80	N/A	-1	33%	-0,18	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
9,13	2,60	N/A	1	33%	7,83	CUARTO EQUIPOS
0,80	2,10	N/A	1	33%	0,55	CUARTO EQUIPOS
0,70	0,80	N/A	1	33%	0,18	CUARTO EQUIPOS
32,02	2,73	N/A	1	33%	28,85	CIRCULACION
0,80	2,10	N/A	-7	33%	-3,88	CIRCULACION
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	CIRCULACION
23,24	2,80	N/A	1	33%	21,47	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
2,00	0,73	N/A	6	33%	2,89	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,14	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR









0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
14,64	2,57	N/A	1	33%	12,42	ORATORIO
2,30	2,10	N/A	-1	33%	-1,59	ORATORIO
2,45	2,10	N/A	-2	33%	-3,40	ORATORIO
17,80	2,55	N/A	1	33%	14,98	SALA DE ESPERA
2,32	2,12	N/A	-1	33%	-1,62	SALA DE ESPERA
2,10	2,10	N/A	-1	33%	-1,46	SALA DE ESPERA
0,80	2,10	N/A	-3	33%	-1,66	SALA DE ESPERA
2,00	2,10	N/A	-1	33%	-1,39	SALA DE ESPERA
11,48	2,75	N/A	1	33%	10,42	U.C.I. 1
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 1 DESCUENTO
11,83	2,70	N/A	1	33%	10,54	U.C.I. 3
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 3 DESCUENTO
2,50	0,60	N/A	-1	33%	-0,50	U.C.I. 3 DESCUENTO
1,12	0,40	N/A	-1	33%	-0,15	U.C.I. 3 DESCUENTO
11,34	2,70	N/A	1	33%	10,10	U.C.I. 5
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 5 DESCUENTO
0,70	2,50	N/A	-1	33%	-0,58	U.C.I. 5 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 5 DESCUENTO
11,92	2,70	N/A	1	33%	10,62	U.C.I. 7
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 7 DESCUENTO
0,70	2,50	N/A	-1	33%	-0,58	U.C.I. 7 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 7 DESCUENTO
11,51	2,70	N/A	1	33%	10,26	U.C.I. 9
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 9 DESCUENTO
2,50	2,50	N/A	-1	33%	-2,06	U.C.I. 9 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 9 DESCUENTO
13,81	2,75	N/A	1	33%	12,53	U.C.I. 11
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 11 DESCUENTO
2,50	2,50	N/A	-1	33%	-2,06	U.C.I. 11 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 11 DESCUENTO
13,50	2,70	N/A	1	33%	12,03	U.C.I. 12
0,90	2,15	N/A	-1	33%	-0,64	U.C.I. 12 DESCUENTO
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 12 DESCUENTO
1,00	1,00	N/A	-1	33%	-0,33	U.C.I. 12 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 12 DESCUENTO
0,23	2,70	N/A	-1	33%	-0,20	U.C.I. 12 DESCUENTO
9,62	2,70	N/A	1	33%	8,57	U.C.I. 10
1,50	0,90	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 10 DESCUENTO
0,70	2,50	N/A	-1	33%	-0,58	U.C.I. 10 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 10 DESCUENTO
10,40	2,70	N/A	1	33%	9,27	U.C.I. 8
0,90	2,70	N/A	-1	33%	-0,80	U.C.I. 8 DESCUENTO
0,70	3,05	N/A	-1	33%	-0,70	U.C.I. 8 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 8 DESCUENTO
10,00	2,70	N/A	1	33%	8,91	U.C.I.
0,90	1,50	N/A	-1	33%	-0,45	U.C.I. 6 DESCUENTO
0,70	3,00	N/A	-1	33%	-0,69	U.C.I. 6 DESCUENTO
1,10	0,16	N/A	-1	33%	-0,06	U.C.I. 6 DESCUENTO
7,00	2,70	N/A	1	33%	6,24	U.C.I. 4
3,00	0,70	N/A	-1	33%	-0,69	U.C.I. 4 DESCUENTO
6,70	2,70	N/A	1	33%	5,97	U.C.I. 2
3,00	0,70	N/A	-1	33%	-0,69	U.C.I. 2 DESCUENTO
2,80	2,70	N/A	1	33%	2,49	CIRCULACION
0,80	2,10	N/A	-2	33%	-1,11	CIRCULACION
17,84	2,40	N/A	1	33%	14,13	HABITACIÓN 301
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
1,00	1,45	N/A	-1	33%	-0,48	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
1,94	2,10	N/A	1	33%	1,34	HABITACIÓN 301 - CLOSET
18,17	2,40	N/A	1	33%	14,39	HABITACIÓN 302
1,90	2,10	N/A	1	33%	1,32	HABITACIÓN 302 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
0,95	0,95	N/A	-1	33%	-0,30	DESCUENTO
18,43	2,40	N/A	1	33%	14,60	HABITACIÓN 303
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 303 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
26,42	2,40	N/A	1	33%	20,92	HABITACIÓN 304
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 304 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
18,61	2,40	N/A	1	33%	14,74	HABITACIÓN 305
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 305 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
27,02	2,40	N/A	1	33%	21,40	HABITACIÓN 306
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 306 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,49	2,40	N/A	1	33%	14,64	HABITACIÓN 307
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 307 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
23,62	2,40	N/A	1	33%	18,71	HABITACIÓN 308
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 308 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
7,33	2,40	N/A	1	33%	5,81	CUARTO DE EQUIPOS
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
18,20	2,40	N/A	1	33%	14,41	HABITACIÓN 309
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 309 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,15	2,40	N/A	1	33%	14,37	HABITACIÓN 310
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 310 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
17,95	2,40	N/A	1	33%	14,22	HABITACIÓN 311
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 311 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,78	2,10	N/A	1	33%	13,01	HABITACIÓN 312
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 312 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
21,42	2,40	N/A	1	33%	16,96	HABITACIÓN 313
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 313 - CLOSET
1,20	1,50	N/A	-1	33%	-0,59	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,33	2,40	N/A	1	33%	14,52	HABITACIÓN 314
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 314 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO







1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,42	2,40	N/A	1	33%	14,59	HABITACIÓN 315
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 315 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,45	2,00	N/A	-1	33%	-0,30	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,02	2,40	N/A	1	33%	14,27	HABITACIÓN 316
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 316 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,95	1,45	N/A	-1	33%	-0,45	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,37	2,40	N/A	1	33%	14,55	HABITACIÓN 317
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 317 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,28	2,40	N/A	1	33%	14,48	HABITACIÓN 318
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 318 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,35	2,40	N/A	1	33%	14,53	HABITACIÓN 319
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 319 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,38	2,40	N/A	1	33%	14,56	HABITACIÓN 320
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 320 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,21	2,40	N/A	1	33%	14,42	HABITACIÓN 321
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 321 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
17,96	2,40	N/A	1	33%	14,22	HABITACIÓN 322
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 322 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,48	2,40	N/A	1	33%	14,64	HABITACIÓN 323
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 323 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,01	2,40	N/A	1	33%	14,26	HABITACIÓN 324
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 324 - CLOSET
0,95	0,90	N/A	-1	33%	-0,28	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
18,18	2,40	N/A	1	33%	14,40	HABITACIÓN 325
1,95	2,10	N/A	1	33%	1,35	HABITACIÓN 325 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	33%	-0,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
5,10	2,40	N/A	1	33%	4,04	ZONA TRABAJO NORTE
7,91	0,85	N/A	1	33%	2,22	
83,05	2,40	N/A	1	33%	65,78	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1,20	2,10	N/A	-25	33%	-20,79	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
0,80	0,80	N/A	-3	33%	-0,63	DESCUENTO GABINETE
0,33	0,25	N/A	-2	33%	-0,05	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13,90	1,05	N/A	1	33%	4,82	CENTRAL ENFERMERIA
5,14	2,40	N/A	1	33%	4,07	
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
8,78	2,40	N/A	1	33%	6,95	TRABAJO LIMPIO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
3,41	2,40	N/A	1	33%	2,70	ROPA LIMPIA
0,70	2,10	N/A	-1	33%	-0,49	DESCUENTO
5,86	2,40	N/A	1	33%	4,64	TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
11,69	2,40	N/A	1	33%	9,26	PROCEDIMIENTOS
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO
11,28	2,40	N/A	1	33%	8,93	DESCANSO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	33%	-0,64	DESCUENTO
27,87	2,40	N/A	1	33%	22,07	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,20	1,50	N/A	-1	33%	-0,59	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	33%	-0,62	DESCUENTO
1,30	2,10	N/A	-1	33%	-0,90	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
1,40	2,10	N/A	-1	33%	-0,97	DESCUENTO
0,83	0,83	N/A	-1	33%	-0,23	DESCUENTO GABINTE
0,80	2,10	N/A	-1	33%	-0,55	DESCUENTO
4,58	2,60	N/A	1	33%	3,93	SALIDA BALCON SUR
6,28	0,85	N/A	1	33%	1,76	BALCON SUR
2,10	2,40	N/A	1	33%	1,66	ROPA LIMPIA
4,68	2,40	N/A	1	33%	3,71	RESIDUOS ORDINARIOS
0,75	2,10	N/A	-1	33%	-0,52	DESCUENTO
4,02	2,40	N/A	1	33%	3,18	RESIDUOS PELIGROSOS
0,75	2,10	N/A	-1	33%	-0,52	DESCUENTO
14,35	2,40	N/A	1	33%	11,37	PASILLO ACCESO
0,75	2,10	N/A	-2	33%	-1,04	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-3	33%	-1,87	DESCUENTO
0,75	2,40	N/A	-1	33%	-0,59	DESCUENTO
23,10	2,40	N/A	1	33%	18,30	HALL
6,35	1,45	N/A	-1	33%	-3,04	DESCUENTO
3,45	1,45	N/A	-1	33%	-1,65	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	33%	-0,83	DESCUENTO
1,05	1,66	N/A	-1	33%	-0,58	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUENTO
12,36	2,40	N/A	1	33%	9,79	COORDINACIÓN
1,05	2,66	N/A	-1	33%	-0,92	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	33%	-0,69	DESCUENTO
1,66	1,47	N/A	-1	33%	-0,81	DESCUENTO
0,78	1,47	N/A	-1	33%	-0,38	DESCUENTO
		PISO 4				
17,84	2,40	N/A	1	100%	42,82	HABITACIÓN 401
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,00	1,45	N/A	-1	100%	-1,45	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,94	2,10	N/A	1	100%	4,07	HABITACIÓN 401 - CLOSET
18,17	2,40	N/A	1	100%	43,61	HABITACIÓN 402
1,90	2,10	N/A	1	100%	3,99	HABITACIÓN 402 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
0,95	0,95	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO
18,43	2,40	N/A	1	100%	44,23	HABITACIÓN 403
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 403 - CLOSET







0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
26,42	2,40	N/A	1	100%	63,41	HABITACIÓN 404
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 404 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
18,61	2,40	N/A	1	100%	44,66	HABITACIÓN 405
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 405 - CLOSET
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
27,02	2,40	N/A	1	100%	64,85	HABITACIÓN 406
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 406 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,49	2,40	N/A	1	100%	44,38	HABITACIÓN 407
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 407 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
23,62	2,40	N/A	1	100%	56,69	HABITACIÓN 408
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 408 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
7,33	2,40	N/A	1	100%	17,59	CUARTO DE EQUIPOS
0,80	2,10	N/A	-1	100%	-1,68	DESCUENTO
18,20	2,40	N/A	1	100%	43,68	HABITACIÓN 409
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 409 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,15	2,40	N/A	1	100%	43,56	HABITACIÓN 410
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 410 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
17,95	2,40	N/A	1	100%	43,08	HABITACIÓN 411
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 411 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,78	2,10	N/A	1	100%	39,44	HABITACIÓN 412
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 412 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
21,42	2,40	N/A	1	100%	51,41	HABITACIÓN 413
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 413 - CLOSET
1,20	1,50	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,33	2,40	N/A	1	100%	43,99	HABITACIÓN 414
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 414 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,42	2,40	N/A	1	100%	44,21	HABITACIÓN 415
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 415 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,45	2,00	N/A	-1	100%	-0,90	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,02	2,40	N/A	1	100%	43,25	HABITACIÓN 416
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 416 - CLOSET
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,95	1,45	N/A	-1	100%	-1,38	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,37	2,40	N/A	1	100%	44,09	HABITACIÓN 417
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 417 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,28	2,40	N/A	1	100%	43,87	HABITACIÓN 418
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 418 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,35	2,40	N/A	1	100%	44,04	HABITACIÓN 419
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 419 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,38	2,40	N/A	1	100%	44,11	HABITACIÓN 420
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 420 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,21	2,40	N/A	1	100%	43,70	HABITACIÓN 421
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 421 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
17,96	2,40	N/A	1	100%	43,10	HABITACIÓN 422
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 422 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,48	2,40	N/A	1	100%	44,35	HABITACIÓN 423
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 423 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,01	2,40	N/A	1	100%	43,22	HABITACIÓN 424
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 424 - CLOSET
0,95	0,90	N/A	-1	100%	-0,86	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	-1,89	DESCUENTO
18,18	2,40	N/A	1	100%	43,63	HABITACIÓN 425
1,95	2,10	N/A	1	100%	4,10	HABITACIÓN 425 - CLOSET
1,30	1,50	N/A	-1	100%	-1,95	DESCUENTO
0,75	2,00	N/A	-1	100%	-1,50	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	-2,52	DESCUENTO



0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
5,10	2,40	N/A	1	100%	**12,24**	ZONA TRABAJO NORTE
7,91	0,85	N/A	1	100%	**6,72**	
83,05	2,40	N/A	1	100%	**199,32**	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1,20	2,10	N/A	-25	100%	**-63,00**	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
0,80	0,80	N/A	-3	100%	**-1,92**	DESCUENTO GABINETE
0,33	0,25	N/A	-2	100%	**-0,17**	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13,90	1,05	N/A	1	100%	**14,60**	CENTRAL ENFERMERIA
5,14	2,40	N/A	1	100%	**12,34**	
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
8,78	2,40	N/A	1	100%	**21,07**	TRABAJO LIMPIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
3,41	2,40	N/A	1	100%	**8,18**	ROPA LIMPIA
0,70	2,10	N/A	-1	100%	**-1,47**	DESCUENTO
5,86	2,40	N/A	1	100%	**14,06**	TRABAJO SUCIO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
11,69	2,40	N/A	1	100%	**28,06**	PROCEDIMIENTOS
1,40	2,10	N/A	-1	100%	**-2,94**	DESCUENTO
11,28	2,40	N/A	1	100%	**27,07**	DESCANSO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
1,30	1,50	N/A	-1	100%	**-1,95**	DESCUENTO
27,87	2,40	N/A	1	100%	**66,89**	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,20	1,50	N/A	-1	100%	**-1,80**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-1	100%	**-1,89**	DESCUENTO
1,30	2,10	N/A	-1	100%	**-2,73**	DESCUENTO
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
1,40	2,10	N/A	-1	100%	**-2,94**	DESCUENTO
0,83	0,83	N/A	-1	100%	**-0,69**	DESCUENTO GABINTE
0,80	2,10	N/A	-1	100%	**-1,68**	DESCUENTO
4,58	2,60	N/A	1	100%	**11,91**	SALIDA BALCON SUR
6,28	0,85	N/A	1	100%	**5,34**	BALCON SUR
2,10	2,40	N/A	1	100%	**5,04**	ROPA LIMPIA
4,68	2,40	N/A	1	100%	**11,23**	RESIDUOS ORDINARIOS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	**-1,58**	DESCUENTO
4,02	2,40	N/A	1	100%	**9,65**	RESIDUOS PELIGROSOS
0,75	2,10	N/A	-1	100%	**-1,58**	DESCUENTO
14,35	2,40	N/A	1	100%	**34,44**	PASILLO ACCESO
0,75	2,10	N/A	-2	100%	**-3,15**	DESCUENTO
0,90	2,10	N/A	-3	100%	**-5,67**	DESCUENTO
0,75	2,40	N/A	-1	100%	**-1,80**	DESCUENTO
23,10	2,40	N/A	1	100%	**55,44**	HALL
6,35	1,45	N/A	-1	100%	**-9,21**	DESCUENTO
3,45	1,45	N/A	-1	100%	**-5,00**	DESCUENTO
1,20	2,10	N/A	-1	100%	**-2,52**	DESCUENTO
1,05	1,66	N/A	-1	100%	**-1,74**	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	**-2,10**	DESCUENTO
12,36	2,40	N/A	1	100%	**29,66**	COORDINACIÓN



1,05	2,66	N/A	-1	100%	**-2,79**	DESCUENTO
1,00	2,10	N/A	-1	100%	**-2,10**	DESCUENTO
1,66	1,47	N/A	-1	100%	**-2,44**	DESCUENTO
0,78	1,47	N/A	-1	100%	**-1,15**	DESCUENTO
2,30	1,20	N/A	1	100%	**2,76**	HAB 401
1,70	2,40	N/A	1	100%	**4,08**	PASILLO HAB 401 GABINETE
0,81	0,81	N/A	-1	100%	**-0,66**	DESCUENTO GABINETE
3,20	2,40	N/A	1	100%	**7,68**	HAB 403
1,00	1,50	N/A	1	100%	**1,50**	HAB 405
2,40	2,40	N/A	1	100%	**5,76**	HAB 407
0,94	2,40	N/A	1	100%	**2,26**	HAB 406
1,20	2,40	N/A	1	100%	**2,88**	HAB 409
3,14	2,40	N/A	1	100%	**7,54**	HAB 410
1,00	1,50	N/A	1	100%	**1,50**	HAB 411
2,30	2,40	N/A	1	100%	**5,52**	HAB 412
1,70	2,40	N/A	1	100%	**4,08**	PASILLO HAB 417
0,81	0,81	N/A	-1	100%	**-0,66**	PASILLO HAB 418
1,20	1,50	N/A	1	100%	**1,80**	HAB 414
1,20	1,50	N/A	1	100%	**1,80**	HAB 415
2,04	2,40	N/A	1	100%	**4,90**	HAB 416
2,10	1,40	N/A	1	100%	**2,94**	HAB 417
1,00	1,60	N/A	1	100%	**1,60**	HAB 418
3,08	2,40	N/A	1	100%	**7,39**	HAB 419
1,80	1,50	N/A	1	100%	**2,70**	HAB 420
1,30	1,70	N/A	1	100%	**2,21**	HAB 421
1,30	1,50	N/A	1	100%	**1,95**	HAB 422
1,20	1,50	N/A	1	100%	**1,80**	HAB 423
1,20	1,50	N/A	1	100%	**1,80**	HAB 424
1,60	2,40	N/A	1	100%	**3,84**	PASILLO GABINETE
0,80	0,80	N/A	-1	100%	**-0,64**	GABINETE

OBSERVACIONES:

TOTAL	**4.840,26**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**1.065,59**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**3.774,67**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1,06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	CAP	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico













Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA SUR-OCCIDENTAL						
8,54	10,24	N/A	1	95%	**83,08**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
14,58	10,24	N/A	1	95%	**141,83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,00	0,38	N/A	-1	95%	**-0,72**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,95	0,95	N/A	-1	95%	**-0,86**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,30	1,30	N/A	-1	95%	**-1,61**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,65	2,50	N/A	-1	95%	**-6,29**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	1,30	N/A	-1	95%	**-1,57**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	1,30	N/A	-1	95%	**-1,57**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	1,30	N/A	-1	95%	**-1,57**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	1,30	N/A	-1	95%	**-1,57**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	1,30	N/A	-1	95%	**-1,57**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	1,30	N/A	-1	95%	**-1,57**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,89	1,27	N/A	-1	95%	**-2,28**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,98	0,95	N/A	-1	95%	**-0,88**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,30	1,28	N/A	-1	95%	**-1,58**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,30	1,23	N/A	-1	95%	**-1,52**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,40	1,29	N/A	-1	95%	**-1,72**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,00	0,70	N/A	-1	95%	**-0,67**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,04	1,29	N/A	-1	95%	**-1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,94	1,28	N/A	-1	95%	**-1,14**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,30	1,28	N/A	-1	95%	**-1,58**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,19	1,35	N/A	-1	95%	**-1,53**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3,34	1,35	N/A	-1	95%	**-4,28**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,55	2,24	N/A	-1	95%	**-5,43**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3,02	2,24	N/A	-1	95%	**-6,43**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,30	1,35	N/A	-1	95%	**-1,67**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
16,20	10,00	N/A	1	95%	**153,90**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
6,90	10,24	N/A	1	95%	**67,12**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,30	1,30	N/A	-2	95%	**-3,21**	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
1,02	0,93	N/A	-1	95%	**-0,90**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0,50	1,03	N/A	-1	95%	**-0,49**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0,68	1,30	N/A	-1	95%	**-0,84**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
1,90	0,70	N/A	-2	95%	**-2,53**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0,93	0,30	N/A	-1	95%	**-0,26**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
4,80	1,30	N/A	-1	95%	**-5,93**	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
3,01	2,40	N/A	-1	95%	**-6,86**	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
3,01	2,40	N/A	-1	95%	**-6,86**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0,80	0,70	N/A	-2	95%	**-1,06**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0,70	0,67	N/A	-1	95%	**-0,45**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
1,16	0,68	N/A	-1	95%	**-0,75**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
20,36	10,24	N/A	1	60%	**125,09**	FACHADA NOR OCCIDENTAL
3,03	2,40	N/A	-1	60%	**-4,36**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,01	2,40	N/A	-1	60%	**-4,33**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,01	2,40	N/A	-1	60%	**-4,33**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
1,33	0,68	N/A	-1	60%	**-0,54**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,25	0,68	N/A	-1	60%	**-1,33**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,06	0,68	N/A	-1	60%	**-1,25**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,04	0,68	N/A	-1	60%	**-1,24**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,10	0,68	N/A	-1	60%	**-1,26**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	0,70	N/A	-1	60%	**-1,28**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	0,70	N/A	-1	60%	**-1,28**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	0,70	N/A	-1	60%	**-1,28**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	0,70	N/A	-1	60%	**-1,28**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
FACHADA OCCIDENTAL						
4,43	13,00	**N/A**	1	95%	**54,71**	FACHADA OCCIDENTAL
1,00	1,00	**N/A**	-2	95%	**-1,90**	DESCUENTO VENTANA
2,40	1,24	**N/A**	1	95%	**2,83**	FACHADA OCCIDENTAL
FACHADA SUR						
14,50	5,76	N/A	1	60%	**50,11**	FACHADA SUR
12,86	4,21	N/A	1	60%	**32,48**	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
2,14	2,90	N/A	1	60%	**3,72**	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
15,41	7,25	N/A	1	60%	**67,03**	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
3,23	0,20	N/A	-1	60%	**-0,39**	DESCUENTO SUR VENTANA
3,29	0,20	N/A	-1	60%	**-0,39**	DESCUENTO SUR VENTANA
1,20	1,80	N/A	-1	60%	**-1,30**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,80	2,10	N/A	-1	60%	**-1,01**	DESCUENTO SUR VENTANA
2,00	1,20	N/A	-1	60%	**-1,44**	DESCUENTO SUR VENTANA
1,30	1,50	N/A	-3	60%	**-3,51**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,71	1,20	N/A	-1	60%	**-0,51**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,84	1,98	N/A	-1	60%	**-1,00**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,84	1,98	N/A	-1	60%	**-1,00**	DESCUENTO SUR VENTANA
1,20	1,20	N/A	-2	60%	**-1,73**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,84	1,98	N/A	-1	60%	**-1,00**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,84	1,98	N/A	-1	60%	**-1,00**	DESCUENTO SUR VENTANA
0,94	0,95	N/A	-1	60%	**-0,54**	DESCUENTO SUR VENTANA
6,45	5,96	N/A	-1	60%	**-23,07**	DESCUENTO PUERTA PRICIPAL
1,30	1,30	N/A	-1	60%	**-1,01**	DESCUENTO VENTANA SUR
1,30	1,30	N/A	-1	60%	**-1,01**	DESCUENTO VENTANA SUR
0,91	1,30	N/A	-1	60%	**-0,71**	DESCUENTO VENTANA SUR
1,30	1,30	N/A	-1	60%	**-1,01**	DESCUENTO VENTANA SUR
1,30	1,30	N/A	-1	60%	**-1,01**	DESCUENTO VENTANA SUR
0,92	1,10	N/A	-1	60%	**-0,61**	DESCUENTO VENTANA SUR
0,90	1,10	N/A	-1	60%	**-0,59**	DESCUENTO VENTANA SUR
1,30	1,10	N/A	-1	60%	**-0,86**	DESCUENTO VENTANA SUR
1,30	1,10	N/A	-1	60%	**-0,86**	DESCUENTO VENTANA SUR
1,30	1,29	N/A	-1	60%	**-1,01**	DESCUENTO VENTANA SUR
13,26	5,70	N/A	1	60%	**45,35**	ENTRE: PISOS 1 - 2 Y EJES 1 - 3
0,50	0,50	N/A	-1	60%	**-0,15**	DESCUENTO: (PISO 1) VENTANA 34
0,50	0,50	N/A	-1	60%	**-0,15**	DESCUENTO: (PISO 1) VENTANA 35
1,22	0,55	N/A	-1	60%	**-0,40**	DESCUENTO: (PISO 1) VENTANA 36
0,48	0,48	N/A	-1	60%	**-0,14**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 1
1,20	1,30	N/A	-1	60%	**-0,94**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 2
0,98	0,80	N/A	-1	60%	**-0,47**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 3
0,96	0,96	N/A	-1	60%	**-0,55**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 1'
8,25	4,20	N/A	1	60%	**20,79**	FACHADA SUR
2,30	2,25	N/A	-1	60%	**-3,11**	DESCUENTO VENTANA
4,78	2,25	N/A	-1	60%	**-6,45**	DESCUENTO VENTANA
4,38	7,20	N/A	1	60%	**18,92**	FACHADA SUR
0,97	0,97	N/A	-1	60%	**-0,56**	DESCUENTO VENTANA
1,62	3,00	N/A	1	60%	**2,92**	FACHADA SUR
2,80	3,80	N/A	1	60%	**6,38**	FACHADA SUR
0,52	1,36	N/A	1	50%	**0,35**	BALCON SUR 4RTO PISO
6,85	1,36	N/A	1	50%	**4,66**	BALCON SUR 4RTO PISO
1,63	1,36	N/A	1	50%	**1,11**	BALCON SUR 5TO PISO
6,83	1,36	N/A	1	50%	**4,64**	BALCON SUR 5TO PISO
5,40	0,70	N/A	1	50%	**1,89**	ANTE PECHO TERRAZA
4,35	7,21	N/A	1	85%	**26,66**	FACHADA DONDE SE INSTALO EN EL ANGEL
1,00	1,00	N/A	-1	85%	**-0,85**	DESCUENTO VENTANA
FACHADA NORTE						
6,05	4,39	N/A	1	60%	**15,94**	FACHADA NORTE
3,82	5,58	N/A	1	60%	**12,79**	FACHADA NORTE
2,35	3,82	N/A	-1	60%	**-5,39**	DESCUENTO VENTANA
5,59	5,79	N/A	1	60%	**19,42**	FACHADA NORTE
4,49	13,32	N/A	1	60%	**35,88**	FACHADA NORTE
4,46	5,04	N/A	1	60%	**13,49**	FACHADA NORTE
3,52	0,50	N/A	-1	60%	**-1,06**	DESCUENTO VENTANA
3,52	0,50	N/A	-1	60%	**-1,06**	DESCUENTO VENTANA
3,28	0,50	N/A	-1	60%	**-0,98**	DESCUENTO VENTANA
4,13	0,92	N/A	-1	60%	**-2,28**	DESCUENTO PUERTA
7,00	7,10	N/A	1	60%	**29,82**	FACHADA NORTE





7,00	1,83	N/A	-1	60%	-7,69	DESCUENTO VENTANA
7,00	1,83	N/A	-1	60%	-7,69	DESCUENTO VENTANA
11,41	4,43	N/A	1	60%	30,33	FACHADA ENTRADA URGENCIAS
0,95	0,95	N/A	-1	60%	-0,54	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
FACHADA ORIENTAL						
3,52	8,73	N/A	1	70%	21,51	FACHADA ORIENTAL
3,01	2,40	N/A	-1	70%	-5,06	DESCUENTO VENTANA
3,01	0,68	N/A	-1	70%	-1,43	DESCUENTO VENTANA
3,05	0,70	N/A	-1	70%	-1,49	DESCUENTO VENTANA
20,11	15,35	N/A	1	70%	216,08	FACHADA ORIENTAL
0,70	6,00	N/A	1	70%	2,94	FACHADA NORTE
1,30	1,30	N/A	-3	70%	-3,55	DESCUENTO VENTANAS PISO 1
0,45	0,95	N/A	-1	70%	-0,30	DESCUENTO VENTANAS PISO 1
1,30	1,30	N/A	-3	70%	-3,55	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
0,45	0,95	N/A	-1	70%	-0,30	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
1,30	1,30	N/A	-3	70%	-3,55	DESCUENTO VENTANAS PISO 3
2,24	0,50	N/A	-3	70%	-2,35	DESCUENTO VENTANAS PISO 4
0,40	2,00	N/A	-1	70%	-0,56	DESCUENTO VENTANAS PISO 5
22,82	15,30	N/A	1	70%	244,40	FACHADA ORIENTAL - ENTRE EJES A' - E
1,30	1,50	N/A	-19	70%	-25,94	DESCUENTO VENTANA 1
0,95	0,95	N/A	-6	70%	-3,79	DESCUENTO VENTANA 2
0,95	1,50	N/A	-2	70%	-2,00	DESCUENTO VENTANA 3
0,90	1,50	N/A	-1	70%	-0,95	DESCUENTO VENTANA 4
0,56	0,30	N/A	-7	70%	-0,82	DESCUENTO VENTANA 5
2,00	0,37	N/A	-2	70%	-1,04	DESCUENTO VENTANA 6
1,20	0,37	N/A	-2	70%	-0,62	DESCUENTO VENTANA 7
FACHADA TERRAZA 3ER NIVEL (CIRCULACIÓN EXTERIOR)						
21,40	4,10	N/A	1	60%	52,64	FACHADA CIRCULACION 3ER NIVEL
2,50	0,70	N/A	-5	60%	-5,25	DESCUENTO VENTANA
21,40	7,10	N/A	1	60%	91,16	FACHADA CIRCULACION 3ER NIVEL
1,30	1,50	N/A	-6	60%	-7,02	DESCUENTO VENTANA
0,85	2,00	N/A	-6	60%	-6,12	DESCUENTO PUERTA
1,20	1,20	N/A	-6	60%	-5,18	DESCUENTO VENTANA
FACHADA QUINTO PISO (TERRAZA)						
5,45	4,10	N/A	1	60%	13,41	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
6,60	1,47	N/A	1	60%	5,82	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
5,45	2,60	N/A	1	60%	8,50	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
1,23	2,30	N/A	-1	60%	-1,70	DESCUENTO ESCALERA AZOTEA
0,92	0,94	N/A	-1	60%	-0,52	DESCUENTO VENTANA
0,90	2,24	N/A	-1	60%	-1,21	DESCUENTO PUERTA MAQUINA
142,80	0,74	N/A	1	60%	63,40	ANTEPECHO PERIMETRAL
68,90	0,80	N/A	1	60%	33,07	ANTEPECHO PERIMETRAL - AZOTEA CUARTO MAQUINA
7,74	2,65	N/A	1	60%	12,31	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA ORIENTAL
1,50	2,10	N/A	-1	60%	-1,89	DESCUENTO PUERTA
8,85	1,47	N/A	1	60%	7,81	ANTEPECHO EXTERIOR - FACHADA ORIENTAL
142,80	0,74	N/A	1	100%	105,67	ANTEPECHO PERIMETRAL
68,90	0,80	N/A	1	100%	55,12	ANTEPECHO PERIMETRAL - AZOTEA CUARTO MAQUINA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1.727,24**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**1.472,74**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**254,50**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1,07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M	CAP	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico













Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA SUR-OCCIDENTAL						
2	N/A	N/A	1	100%	**2,00**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,95	N/A	N/A	1	100%	**0,95**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,65	N/A	N/A	1	100%	**2,65**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,89	N/A	N/A	1	100%	**1,89**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,98	N/A	N/A	1	100%	**0,98**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,4	N/A	N/A	1	100%	**1,40**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1	N/A	N/A	1	100%	**1,00**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,04	N/A	N/A	1	100%	**1,04**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,94	N/A	N/A	1	100%	**0,94**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,19	N/A	N/A	1	100%	**1,19**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3,34	N/A	N/A	1	100%	**3,34**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,55	N/A	N/A	1	100%	**2,55**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3,02	N/A	N/A	1	100%	**3,02**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,38	N/A	N/A	1	100%	**0,38**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,95	N/A	N/A	1	100%	**0,95**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,5	N/A	N/A	1	100%	**2,50**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	1	100%	**1,30**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,27	N/A	N/A	1	100%	**1,27**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,95	N/A	N/A	1	100%	**0,95**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,28	N/A	N/A	1	100%	**1,28**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,23	N/A	N/A	1	100%	**1,23**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,29	N/A	N/A	1	100%	**1,29**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,29	N/A	N/A	1	100%	**1,29**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,28	N/A	N/A	1	100%	**1,28**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,28	N/A	N/A	1	100%	**1,28**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,35	N/A	N/A	1	100%	**1,35**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,35	N/A	N/A	1	100%	**1,35**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,24	N/A	N/A	1	100%	**2,24**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2,24	N/A	N/A	1	100%	**2,24**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1,35	N/A	N/A	1	100%	**1,35**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
3,03	N/A	N/A	1	100%	**3,03**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,01	N/A	N/A	1	100%	**3,01**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,01	N/A	N/A	1	100%	**3,01**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
1,33	N/A	N/A	1	100%	**1,33**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,25	N/A	N/A	1	100%	**3,25**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,06	N/A	N/A	1	100%	**3,06**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,04	N/A	N/A	1	100%	**3,04**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,1	N/A	N/A	1	100%	**3,10**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	N/A	N/A	1	100%	**3,05**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	N/A	N/A	1	100%	**3,05**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	N/A	N/A	1	100%	**3,05**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3,05	N/A	N/A	1	100%	**3,05**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2,4	N/A	N/A	1	100%	**2,40**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2,4	N/A	N/A	1	100%	**2,40**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2,4	N/A	N/A	1	100%	**2,40**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,68	N/A	N/A	1	100%	**0,68**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,68	N/A	N/A	1	100%	**0,68**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,68	N/A	N/A	1	100%	**0,68**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,68	N/A	N/A	1	100%	**0,68**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,68	N/A	N/A	1	100%	**0,68**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	1	100%	**0,70**	VENTANA NOR OCCIDENTAL
FACHADA OCCIDENTAL						
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	FACHADA OCCIDENTAL
0,93	N/A	N/A	2	100%	**1,86**	FACHADA OCCIDENTAL
1,03	N/A	N/A	2	100%	**2,06**	FACHADA OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	FACHADA OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	2	100%	**1,40**	FACHADA OCCIDENTAL
0,295	N/A	N/A	2	100%	**0,59**	FACHADA OCCIDENTAL
1,3	N/A	N/A	2	100%	**2,60**	FACHADA OCCIDENTAL
2,4	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	FACHADA OCCIDENTAL
2,4	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	FACHADA OCCIDENTAL
0,7	N/A	N/A	2	100%	**1,40**	FACHADA OCCIDENTAL
0,67	N/A	N/A	2	100%	**1,34**	FACHADA OCCIDENTAL
0,68	N/A	N/A	2	100%	**1,36**	FACHADA OCCIDENTAL
2,40	N/A	N/A	2	100%	**4,80**	FACHADA OCCIDENTAL
1,00	N/A	N/A	2	100%	**2,00**	FACHADA OCCIDENTAL
5,2	N/A	N/A	2	100%	**10,40**	ALFAJIA OCCIDENTAL
6,9	N/A	N/A	1	100%	**6,90**	ALFAJIA OCCIDENTAL
9,3	N/A	N/A	1	100%	**9,30**	ALFAJIA OCCIDENTAL
20,36	N/A	N/A	1	100%	**20,36**	ALFAJIA OCCIDENTAL
FACHADA SUR						
1,3	N/A	N/A	4	60%	**3,12**	FACHADA SUR
1,02	N/A	N/A	2	60%	**1,22**	FACHADA SUR
0,5	N/A	N/A	2	60%	**0,60**	FACHADA SUR
0,68	N/A	N/A	2	60%	**0,82**	FACHADA SUR
1,9	N/A	N/A	4	60%	**4,56**	FACHADA SUR
0,93	N/A	N/A	2	60%	**1,12**	FACHADA SUR
4,8	N/A	N/A	2	60%	**5,76**	FACHADA SUR
3,01	N/A	N/A	2	60%	**3,61**	FACHADA SUR
3,01	N/A	N/A	2	60%	**3,61**	FACHADA SUR
0,8	N/A	N/A	4	60%	**1,92**	FACHADA SUR
0,7	N/A	N/A	4	60%	**1,68**	FACHADA SUR
1,16	N/A	N/A	2	60%	**1,39**	FACHADA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
0,91	N/A	N/A	1	60%	**0,55**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
0,92	N/A	N/A	1	60%	**0,55**	VENTANA SUR
0,9	N/A	N/A	1	60%	**0,54**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR
1,3	N/A	N/A	1	60%	**0,78**	VENTANA SUR









1,1	N/A	N/A	1	60%	0,66	VENTANA SUR
1,1	N/A	N/A	1	60%	0,66	VENTANA SUR
1,1	N/A	N/A	1	60%	0,66	VENTANA SUR
1,1	N/A	N/A	1	60%	0,66	VENTANA SUR
1,29	N/A	N/A	1	60%	0,77	VENTANA SUR
5,72	N/A	N/A	2	60%	6,86	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
3,23	N/A	N/A	2	60%	3,88	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0,2	N/A	N/A	1	60%	0,12	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2	N/A	N/A	1	60%	1,20	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1,2	N/A	N/A	2	60%	1,44	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1,8	N/A	N/A	1	60%	1,08	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2,1	N/A	N/A	1	60%	1,26	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0,8	N/A	N/A	1	60%	0,48	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
7,25	N/A	N/A	1	60%	4,35	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1,5	N/A	N/A	3	60%	2,70	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2	N/A	N/A	3	60%	3,60	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1,2	N/A	N/A	5	60%	3,60	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0,84	N/A	N/A	1	60%	0,50	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2,27	N/A	N/A	2	60%	2,72	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
7,25	N/A	N/A	1	60%	4,35	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
6,59	N/A	N/A	1	60%	3,95	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2,99	N/A	N/A	1	60%	1,79	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
5,7	N/A	N/A	7	60%	23,94	ENTRE PISOS 1 - 2 Y EJES 1 - 3: (COLUMNAS)
0,5	N/A	N/A	2	60%	0,60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 34 (ALTO)
0,5	N/A	N/A	2	60%	0,60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 34 (ANCHO)
0,5	N/A	N/A	2	60%	0,60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 35 (ALTO)
0,5	N/A	N/A	2	60%	0,60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 35 (ANCHO)
1,22	N/A	N/A	2	60%	1,46	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 36 (ALTO)
0,55	N/A	N/A	2	60%	0,66	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 36 (ANCHO)
0,48	N/A	N/A	2	60%	0,58	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1 (ALTO)
0,48	N/A	N/A	2	60%	0,58	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1 (ANCHO)
1,2	N/A	N/A	2	60%	1,44	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 2 (ALTO)
1,3	N/A	N/A	2	60%	1,56	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 2 (ANCHO)
0,98	N/A	N/A	2	60%	1,18	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 3 (ALTO)
0,8	N/A	N/A	2	60%	0,96	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 3 (ANCHO)
0,96	N/A	N/A	2	60%	1,15	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1' (ALTO)
0,96	N/A	N/A	2	60%	1,15	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1' (ANCHO)
4,1	N/A	N/A	3	60%	7,38	FACHADA SUR
1,63	N/A	N/A	12	60%	11,74	FACHADA SUR
4,49	N/A	N/A	1	60%	2,69	FACHADA SUR
4,37	N/A	N/A	1	60%	2,62	FACHADA SUR
3,82	N/A	N/A	1	60%	2,29	FACHADA SUR
2,5	N/A	N/A	10	60%	15,00	FACHADA SUR
0,7	N/A	N/A	10	60%	4,20	FACHADA SUR
1,3	N/A	N/A	12	60%	9,36	FACHADA SUR
1,5	N/A	N/A	12	60%	10,80	FACHADA SUR
1,2	N/A	N/A	18	60%	12,96	FACHADA SUR
2	N/A	N/A	12	60%	14,40	FACHADA SUR
0,85	N/A	N/A	6	60%	3,06	FACHADA SUR
7,2	N/A	N/A	2	60%	8,64	FACHADA SUR
0,97	N/A	N/A	4	60%	2,33	FACHADA SUR
2,8	N/A	N/A	1	60%	1,68	FACHADA SUR
16,2	N/A	N/A	1	66%	10,69	ALFAJIA SUR
5,3	N/A	N/A	1	66%	3,50	ALFAJIA SUR
14,06	N/A	N/A	1	66%	9,28	ALFAJIA SUR
15,41	N/A	N/A	1	66%	10,17	ALFAJIA SUR
8,25	N/A	N/A	1	66%	5,45	ALFAJIA SUR
FACHADA NORTE						
3,70	N/A	N/A	1	60%	2,22	ENTRADA URGENCIAS
0,95	N/A	N/A	4	60%	2,28	VENTANA URGENCIAS
4,10	N/A	N/A	3	60%	7,38	
1,63	N/A	N/A	12	60%	11,74	
4,49	N/A	N/A	1	60%	2,69	
4,37	N/A	N/A	1	60%	2,62	
3,82	N/A	N/A	1	60%	2,29	
2,50	N/A	N/A	10	60%	15,00	
0,70	N/A	N/A	10	60%	4,20	
1,30	N/A	N/A	12	60%	9,36	FACHADA NORTE
1,50	N/A	N/A	12	60%	10,80	
1,20	N/A	N/A	18	60%	12,96	
2,00	N/A	N/A	12	60%	14,40	
0,85	N/A	N/A	6	60%	3,06	
7,20	N/A	N/A	2	60%	8,64	
0,97	N/A	N/A	4	60%	2,33	
2,80	N/A	N/A	1	60%	1,68	
FACHADA ORIENTAL						
13,44	N/A	N/A	3	60%	24,19	FACHADA ORIENTAL
2,73	N/A	N/A	1	60%	1,64	FACHADA ORIENTAL
3,00	N/A	N/A	2	60%	3,60	FACHADA ORIENTAL
1,30	N/A	N/A	18	60%	14,04	FAJA VENTANA
0,45	N/A	N/A	2	60%	0,54	FAJA VENTANA
2,24	N/A	N/A	3	60%	4,03	FAJA VENTANA
0,40	N/A	N/A	2	60%	0,48	FAJA VENTANA
0,95	N/A	N/A	2	60%	1,14	FAJA VENTANA
0,50	N/A	N/A	2	60%	0,60	FAJA VENTANA
2,00	N/A	N/A	2	60%	2,40	FAJA VENTANA
15,00	N/A	N/A	5	60%	45,00	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE COLUMNA
3,07	N/A	N/A	8	60%	14,74	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE COLUMNA
2,75	N/A	N/A	2	60%	3,30	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE COLUMNA
1,30	N/A	N/A	19	60%	14,82	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0,95	N/A	N/A	14	60%	7,98	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0,56	N/A	N/A	7	60%	2,35	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
2,00	N/A	N/A	2	60%	2,40	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
1,20	N/A	N/A	2	60%	1,44	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
1,50	N/A	N/A	22	60%	19,80	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0,30	N/A	N/A	7	60%	1,26	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0,37	N/A	N/A	4	60%	0,89	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
20,11	N/A	N/A	1	60%	12,07	ALFAJIA ORIENTAL
2,00	N/A	N/A	1	60%	1,20	ALFAJIA ORIENTAL
22,82	N/A	N/A	1	60%	13,69	ALFAJIA ORIENTAL
1,60	N/A	N/A	1	60%	0,96	ALFAJIA ORIENTAL
FACHADA QUINTO PISO (TERRAZA)						
2,65	N/A	N/A	2	60%	3,18	CUARTO MAQUINAS - CALDERA
142,8	N/A	N/A	1	60%	85,68	ALFAJIA SOBRE ANTEPECHO PERIMETRAL
12,7	N/A	N/A	1	60%	7,62	ALFAJIA SOBRE ANTEPECHO PERIMETRAL DE
56,2	N/A	N/A	1	60%	33,72	CUARTO MAQUINAS
2,65	N/A	N/A	2	60%	3,18	CUARTO MAQUINAS - CALDERA

OBSERVACIONES:


TOTAL	**913,84**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**834,36**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**79,48**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	2,01	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	CAP	2,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

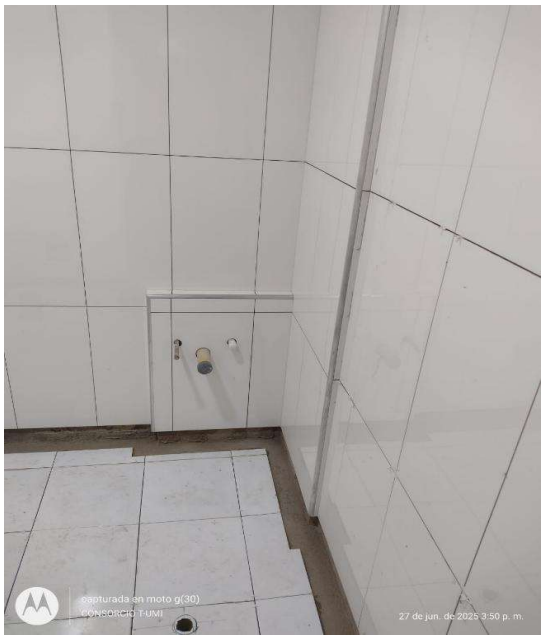






Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
7,34	2,40	N/A	1	100%	17,62	BAÑO PRIMER PISO
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
5,29	2,04	N/A	1	100%	10,79	BAÑO PRIMER PISO
0,77	2,02	N/A	-1	100%	-1,56	DESCUENTO
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	WC FAMILIAR
12,94	2,40	N/A	1	100%	31,06	
0,48	0,48	N/A	-1	100%	-0,23	DESCUENTO: VENTANA
0,90	2,02	N/A	-1	100%	-1,82	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
8,10	2,40	N/A	1	100%	19,44	OBS. PEDIATRICA: BAÑO AISLADO
0,90	2,02	N/A	-1	100%	-1,82	DESCUENTO PUERTA
7,71	2,40	N/A	1	100%	18,50	SALA EDA: BAÑO
0,77	2,02	N/A	-1	100%	-1,56	DESCUENTO: PUERTA
5,70	2,40	N/A	1	100%	13,68	SALA ERA: BAÑO
0,89	2,02	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO: PUERTA
3,40	2,40	N/A	1	100%	8,16	LAVADO DE PACIENTES
4,32	2,40	N/A	1	100%	10,37	LAVADO DE PACIENTES
1,47	1,03	N/A	1	100%	1,51	LAVADO DE PACIENTES
5,57	2,40	N/A	1	100%	13,37	CONSULTORIO 4
0,76	2,00	N/A	-1	100%	-1,52	DESCUENTO PUERTAS
5,75	2,40	N/A	1	100%	13,80	CONSULTORIO 1
0,97	2,02	N/A	-1	100%	-1,96	DESCUENTO PUERTAS
5,13	2,40	N/A	1	100%	12,31	CONSULTORIO 2
0,87	0,87	N/A	-1	100%	-0,76	DESCUENTO PUERTAS
6,00	2,40	N/A	1	100%	14,40	CONSULTORIO 5
2,02	0,87	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO PUERTAS
5,71	2,40	N/A	1	100%	13,70	SALA ERA
2,02	0,87	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO PUERTAS
9,83	2,40	N/A	1	100%	23,59	W.C MUJERES - SALA ESPERA ADULTOS
0,76	2,02	N/A	-1	100%	-1,54	DESCUENTO PUERTAS
8,04	2,40	N/A	1	100%	19,30	BAÑO PMR - SALA ESPERA ADULTOS
0,98	2,02	N/A	-1	100%	-1,98	DESCUENTO PUERTAS
12,26	2,40	N/A	1	100%	29,42	W.C HOMBRES - SALA ESPERA ADULTOS
0,78	2,02	N/A	-1	100%	-1,58	DESCUENTO PUERTAS
7,85	2,40	N/A	1	100%	18,84	WC MIXTO PMR
0,88	2,04	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO PUERTA
5,85	2,10	N/A	1	100%	12,29	WC LABORATORIO
0,76	2,02	N/A	-1	100%	-1,54	DESCUENTO PUERTA
5,71	2,40	N/A	1	100%	13,70	WC ÁREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0,68	2,02	N/A	-1	100%	-1,37	DESCUENTO PUERTA
5,43	2,40	N/A	1	100%	13,03	WC IMAGENOLOGÍA
0,79	2,02	N/A	-1	100%	-1,60	DESCUENTO PUERTA
5,76	2,40	N/A	1	100%	13,82	WC PERSONAL ASISTENCIAL
0,79	2,02	N/A	-1	100%	-1,60	DESCUENTO PUERTA
5,96	2,40	N/A	1	100%	14,30	WC PERSONAL ASISTENCIAL
0,80	2,02	N/A	-1	100%	-1,62	DESCUENTO PUERTA
6,25	2,40	N/A	1	100%	15,00	WC MONITOREO GINECOBSTETRICIA
0,89	2,02	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO PUERTA
5,38	2,40	N/A	1	100%	12,91	WC ECOGRAFIA - IMAGENOLOGÍA
1,18	2,02	N/A	-1	100%	-2,38	DESCUENTO PUERTA
1,20	1,67	N/A	1	100%	2,00	C. ASEO LABORATORIO
0,70	1,33	N/A	1	100%	0,93	MESÓN LABORATORIO
3,22	1,20	N/A	1	100%	3,86	ASEO CAFETERIA
2,87	0,40	N/A	1	100%	1,15	BAÑO PRIMER PISO
2,77	0,40	N/A	1	100%	1,11	BAÑO PRIMER PISO
2,40	0,40	N/A	7	100%	6,72	WC FAMILIAR: COLUMNAS
2,02	0,40	N/A	3	100%	2,42	WC FAMILIAR: PUERTAS (ALTOS)
1,38	0,40	N/A	3	100%	1,66	WC FAMILIAR: ACCESP HACIA CAMBIADOS
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	WC FAMILIAR: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0,38	0,40	N/A	1	100%	0,15	WC FAMILIAR: SOBREANCHO LAVAMANOS
0,75	0,40	N/A	3	100%	0,90	
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	SALA EDA - BAÑO: PUERTA
0,77	0,40	N/A	1	100%	0,31	
2,40	0,40	N/A	5	100%	4,80	LAVADO DE PACIENTES
2,00	0,40	N/A	1	100%	0,80	CONSULTORIO 4
0,76	0,40	N/A	1	100%	0,30	CONSULTORIO 4
2,40	0,40	N/A	1	100%	0,96	CONSULTORIO 1
2,97	0,40	N/A	1	100%	1,19	CONSULTORIO 1
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	CONSULTORIO 2
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	CONSULTORIO 2
2,40	0,40	N/A	1	100%	0,96	CONSULTORIO 2
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	CONSULTORIO 5
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	CONSULTORIO 5
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	SALA ERA
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	SALA ERA
0,76	0,40	N/A	1	100%	0,30	W.C MUJERES
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	W.C MUJERES
2,98	0,40	N/A	1	100%	1,19	BAÑO DISCAPASITADOS
2,40	0,40	N/A	2	100%	1,92	W.C HOMBRES
2,76	0,40	N/A	1	100%	1,10	W.C HOMBRES
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC MIXTO PRM
0,88	0,40	N/A	1	100%	0,35	
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0,67	0,40	N/A	1	100%	0,27	
0,88	0,40	N/A	1	100%	0,35	WC LABORATORIO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC PROCEMIENTOS IMAGENOLOGIA
0,77	0,40	N/A	1	100%	0,31	
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC ECOGRAFO
1,18	0,40	N/A	1	100%	0,47	
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC PERSONAL ASISTENCIAL 1
0,80	0,40	N/A	1	100%	0,32	
0,80	0,40	N/A	1	100%	0,32	WC PERSONAL ASISTENCIAL 2
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	
2,40	0,40	N/A	1	100%	0,96	WC MONITOREO GINECOBSTETRICIA
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	
0,88	0,40	N/A	1	100%	0,35	
1,00	0,40	N/A	2	100%	0,80	WC SALA ESPERA ADULTOS
0,40	0,40	N/A	2	100%	0,32	WC SALA ESPERA ADULTOS
1,07	0,40	N/A	3	100%	1,28	ASEO CIRCULACIÓN URG
1,20	0,40	N/A	1	100%	0,48	ASEO CIRCULACIÓN URG
2,00	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC FAMILIAR OBSERVACIÓN
0,88	0,40	N/A	1	100%	0,35	WC FAMILIAR OBSERVACIÓN
0,68	0,40	N/A	2	100%	0,54	C. ASEO LABORATORIO
0,75	0,40	N/A	3	100%	0,90	C. ASEO LABORATORIO
0,70	0,40	N/A	1	100%	0,28	C. ASEO LABORATORIO
0,70	0,40	N/A	12	100%	3,36	MESÓN LABORATORIO
1,00	0,40	N/A	7	100%	2,80	BAÑO/VESTIER PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLIGÍA
0,87	0,40	N/A	4	100%	1,39	C. ASEO PASILLO OBSERVACIONES A FARMACIA
1,00	0,40	N/A	2	100%	0,80	C. ASEO PASILLO OBSERVACIONES A FARMACIA
1,00	0,40	N/A	6	100%	2,40	WC ADULTOS OBS. GINECOBSTETRICIA
1,00	0,40	N/A	13	100%	5,20	LAVADO DE PACIENTES
1,00	0,40	N/A	17	100%	6,80	WC 1 - CAFETERIA





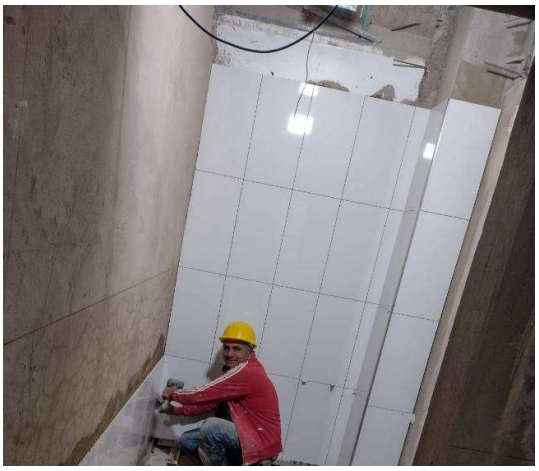

1,00	0,40	N/A	7	100%	2,80	WC 2 - CAFETERIA
1,00	0,40	N/A	8	100%	3,20	LABORATORIO
1,00	0,40	N/A	3	100%	1,20	WC OBSERVACIÓN GINECOBSTETRICIA
0,72	0,40	N/A	5	100%	1,44	ASEO CAFETERIA
2,00	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC PRINCIPAL H S.E. ADULTOS
2,00	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC PRINCIPAL M S.E. ADULTOS
2,00	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC PERSONAL ASISTENCIAL
2,00	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC LABORATORIO
3,00	0,40	N/A	1	100%	1,20	WC FARMACIA
PISO 2						
9,26	2,40	N/A	1	100%	22,22	BAÑO UCI UARO - FRENTE CAMA 8
1,07	2,01	N/A	-1	100%	-2,15	DESCUENTO PUERTA
7,82	2,40	N/A	1	100%	18,77	FILTRO UARO
0,80	2,00	N/A	-1	100%	-1,60	DESCUENTO PUERTA
4,86	2,40	N/A	1	100%	11,66	BAÑO RECUPERACIÓN PARTO (FONDO)
0,80	2,00	N/A	-1	100%	-1,60	DESCUENTO PUERTA
6,62	2,40	N/A	1	100%	15,89	BAÑO RECUPERACIÓN PARTO (POSTERIOR CENTRAL ENFERMERIA)
1,00	2,00	N/A	-1	100%	-2,00	DESCUENTO PUERTA
8,44	2,40	N/A	1	100%	20,26	BAÑO TRABAJO PARTO
0,90	2,00	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO PUERTA
5,42	2,40	N/A	1	100%	13,01	BAÑO DESCANSO
0,60	2,00	N/A	-1	100%	-1,20	DESCUENTO PUERTA
5,05	2,40	N/A	1	100%	12,12	DUCHA VESTIER MUJERES
0,70	2,00	N/A	-1	100%	-1,40	DESCUENTO PUERTA
4,58	2,40	N/A	1	100%	10,99	BAÑO 1 VESTIER MUJERES
0,70	2,00	N/A	-1	100%	-1,40	DESCUENTO PUERTA
4,54	2,40	N/A	1	100%	10,90	BAÑO 2 VESTIER MUJERES
0,70	2,00	N/A	-1	100%	-1,40	DESCUENTO PUERTA
6,20	2,40	N/A	1	100%	14,88	WC PREPARACIÓN PACIENTES
0,87	2,10	N/A	-1	100%	-1,83	DESCUENTO PUERTA
7,70	2,40	N/A	1	100%	18,48	WC PMR UCI
0,87	2,40	N/A	-1	100%	-2,09	DESCUENTO PUERTA
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO UCI ADULTO
1,05	0,40	N/A	1	100%	0,42	BAÑO UCI ADULTO
2,40	0,40	N/A	1	100%	0,96	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
1,76	0,40	N/A	1	100%	0,70	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	BAÑO RECUPERACION PARTO
0,96	0,40	N/A	1	100%	0,38	BAÑO RECUPERACION PARTO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO RECUPERACION PARTO
1,77	0,40	N/A	1	100%	0,71	BAÑO RECUPERACION PARTO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO PREPARACION PARTO
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	BAÑO PREPARACION PARTO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO PREPARACION PARTO
0,57	0,40	N/A	1	100%	0,23	BAÑO DESCANSO PARTO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO VESTIER MUJER
0,67	0,40	N/A	1	100%	0,27	BAÑO VESTIER MUJER
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO VESTIER MUJER
0,67	0,40	N/A	1	100%	0,27	BAÑO VESTIER MUJER
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO VESTIER MUJER
0,67	0,40	N/A	1	100%	0,27	BAÑO VESTIER MUJER
2,40	0,40	N/A	2	100%	1,92	WC PREPARACIÓN PACIENTES
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC PREPARACIÓN PACIENTES
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	WC PREPARACIÓN PACIENTES
2,70	0,40	N/A	2	100%	2,16	WC CIRCULACIÓN A DESCANSO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC CIRCULACIÓN A DESCANSO
0,80	0,40	N/A	1	100%	0,32	WC CIRCULACIÓN A DESCANSO
1,20	0,40	N/A	2	100%	0,96	ASEO UARO
1,20	0,40	N/A	4	100%	1,92	ASEO UARO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC PERSONAL ASISTENCIAL
0,70	0,40	N/A	1	100%	0,28	WC PEROSONAL ASISTENCIAL
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	WC. FRENTE A COORDINACION UCI
0,80	0,40	N/A	1	100%	0,32	WC. FRENTE A COORDINACION UCI
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	W,C MUJERES FRENTEB PERSONAL ASISTENCIAL
0,80	0,40	N/A	1	100%	0,32	W,C MUJERES FRENTEB PERSONAL ASISTENCIAL
5,90	2,4	N/A	1	100%	14,16	WC CIRCULACIÓN A DESCANSO
0,90	2	N/A	-1	100%	-1,80	DESCUENTO PUERTA
3,82	1,20	N/A	1	100%	4,58	ASEO UARO
6,38	2,40	N/A	1	100%	15,31	WC PEROSONAL ASISTENCIAL
0,70	2,02	N/A	-1	100%	-1,41	DESCUENTO PUERTA
6,96	2,40	N/A	1	100%	16,70	WC. FRENTE A COORDINACION UCI
0,80	2,02	N/A	-1	100%	-1,62	DESCUENTO PUERTA
5,54	2,40	N/A	1	100%	13,30	W,C MUJERES FRENTEB PERSONAL ASISTENCIAL
0,70	2,02	N/A	-1	100%	-1,41	DESCUENTO PUERTA
5,18	2,4	N/A	1	100%	12,43	W.C FILTRO A AUTOCLAVE
0,9	2,02	N/A	-1	100%	-1,82	DESCUENTO PUERTA
3,7	1,2	N/A	1	100%	4,44	ASEO POSETA CICULACCION A HALL
2,2	1,2	N/A	1	100%	2,64	ASEO FRENTE A SALA DE PARTOS
3,6	1,2	N/A	1	100%	4,32	ASEO UCI NEO
PISO 3						
7,13	2,40	N/A	1	100%	17,11	HABITACION 301
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,42	2,40	N/A	1	100%	17,81	HABITACION 302
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,24	2,40	N/A	1	100%	17,38	HABITACION 307
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,70	2,40	N/A	1	100%	18,48	HABITACION 308
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,02	2,40	N/A	1	100%	16,85	HABITACION 310
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,12	2,40	N/A	1	100%	17,09	HABITACION 311
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,40	2,40	N/A	1	100%	17,76	HABITACION 316
0,80	2,02	N/A	-1	100%	-1,62	DESCUENTO
7,69	2,40	N/A	1	100%	18,46	HABITACION 318
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,23	2,40	N/A	1	100%	17,35	HABITACION 325
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
4,80	2,40	N/A	1	100%	11,52	BAÑO DESCANSO PISO 3
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
4,80	1,20	N/A	1	100%	5,76	CUARTO ASEO TRANSFERCIA MEDICAMENTOS
0,77	1,20	N/A	-1	100%	-0,92	DESCUENTO PUERTA
5,94	2,40	N/A	1	100%	14,26	W.C ACCESO ASISTENCIAL
0,77	2,02	N/A	-1	100%	-1,56	DESCUENTO PUERTA
0,70	0,60	N/A	-1	100%	-0,42	DESCUENTO VENTANA
7,02	2,40	N/A	1	100%	16,85	BAÑO LUDOTECA
0,85	1,99	N/A	-1	100%	-1,69	DESCUENTO PUERTA
6,15	2,40	N/A	1	100%	14,76	BAÑO LUDOTECA
0,60	1,99	N/A	-1	100%	-1,19	DESCUENTO PUERTA ASEO
3,44	1,20	N/A	1	100%	4,13	ASEO
7,20	2,40	N/A	1	100%	17,28	BAÑO LUDOTECA
0,77	1,99	N/A	-1	100%	-1,53	DESCUENTO PUERTA
5,84	2,40	N/A	1	100%	14,02	W.C - CONTINUO A COORDINACION
0,67	2,02	N/A	-1	100%	-1,35	DESCUENTO PUERTA
5,84	2,40	N/A	1	100%	14,02	W.C - CONTINUO A COORDINACION









0,67	2,02	N/A	-1	100%	-1,35	DESCUENTO PUERTA
6,22	2,40	N/A	1	100%	14,93	UCI PEDIATRICA: BAÑO PMR
1,21	0,04	N/A	1	100%	0,05	
2,40	0,02	N/A	1	100%	0,05	
2,02	0,05	N/A	1	100%	0,10	
0,87	0,05	N/A	1	100%	0,04	
3,64	1,20	N/A	1	100%	4,37	CUARTO ASEO (CIRCULACIÓN RESTRINGIDA)
0,13	0,49	N/A	-2	100%	-0,13	DESCUENTO: MURO POCETA
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 301
0,83	0,40	N/A	1	100%	0,33	HABITACION 301
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 302
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	HABITACION 302
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	HABITACION 307
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 307
2,40	0,40	N/A	2	100%	1,92	HABITACION 308
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 308
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	HABITACION 308
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 310
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	HABITACION 310
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 311
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	HABITACION 311
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 316
0,88	0,40	N/A	1	100%	0,35	HABITACION 316
2,40	0,40	N/A	3	100%	2,88	HABITACION 318
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACION 325
0,81	0,40	N/A	1	100%	0,32	HABITACION 325
2,40	0,40	N/A	2	100%	1,92	HABITACION 325
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	DESCANSO
1,20	0,40	N/A	1	100%	0,48	DESCANSO
1,20	0,40	N/A	1	100%	0,48	CUARTO ASEO TRANSFERENCIA
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	CUARTO ASEO TRANSFERENCIA
0,77	0,40	N/A	1	100%	0,31	CUARTO ASEO TRANSFERENCIA
1,99	0,40	N/A	1	100%	0,80	BAÑO LUDOTECA
0,85	0,40	N/A	1	100%	0,34	BAÑO LUDOTECA
1,20	0,40	N/A	1	100%	0,48	ASEO
1,99	0,40	N/A	1	100%	0,80	ASEO
2,40	0,40	N/A	1	100%	0,96	BAÑO LUDOTECA
0,77	0,40	N/A	1	100%	0,31	BAÑO LUDOTECA
1,99	0,40	N/A	2	100%	1,59	BAÑO LUDOTECA
2,89	0,40	N/A	1	100%	1,16	BAÑO LUDOTECA
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO CONTINUO A COORDINACION
0,67	0,40	N/A	1	100%	0,27	BAÑO CONTINUO A COORDINACION
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO CONTINUO A COORDINACION
0,67	0,40	N/A	1	100%	0,27	BAÑO CONTINUO A COORDINACION
1,21	0,40	N/A	1	100%	0,48	UCI PEDIATRICA: SOBREANCHO LAVAMANOS
2,40	0,40	N/A	1	100%	0,96	UCI PEDIATRICA: ESQUINERO
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	UCI PEDIATRICA: PUERTA
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	
1,20	0,40	N/A	2	100%	0,96	CUARTO ASEO (CIRCILACIÓN RESTRINGIDA: MURO
2,20	0,40	N/A	2	100%	1,76	WC CIRCULACIÓN
2,06	0,40	N/A	2	100%	1,65	WC CIRCULACIÓN
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC CIRCULACIÓN
1,00	0,40	N/A	1	100%	0,40	WC CIRCULACIÓN
2,16	0,40	N/A	2	100%	1,73	WC HABITACIÓN 21
2,01	0,40	N/A	2	100%	1,61	WC HABITACIÓN 21
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 21
2,16	0,40	N/A	1	100%	0,86	WC HABITACIÓN 20
2,01	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC HABITACIÓN 20
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 20
2,01	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC HABITACIÓN 22
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 22
2,01	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC HABITACIÓN 23
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 23
2,01	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC HABITACIÓN 24
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	WC HABITACIÓN 24
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 19
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 19
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 17
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 17
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 14
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 14
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 15
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 15
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 12
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 12
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 13
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 13
1,00	0,40	N/A	3	100%	1,20	WC ASISTENCIAL
1,00	0,40	N/A	6	100%	2,40	WC PMR UCIP
1,00	0,40	N/A	19	100%	7,60	WC HABITACIÓN 03
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 03
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 03
1,00	0,40	N/A	20	100%	8,00	WC HABITACIÓN 04
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 04
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 04
1,00	0,40	N/A	20	100%	8,00	WC HABITACIÓN 06
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 06
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 06
1,00	0,40	N/A	19	100%	7,60	WC HABITACIÓN 05
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 05
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 05
1,00	0,40	N/A	19	100%	7,60	WC HABITACIÓN 09
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	WC HABITACIÓN 09
0,87	0,35	N/A	2	100%	0,61	WC HABITACIÓN 09
6,22	2,40	N/A	1	100%	14,93	UCI PEDIATRICA - BAÑO
3,64	1,20	N/A	1	100%	4,37	CUARTO ASEO (CIRCULACIÓN RESTRINGIDA)
0,13	0,49	N/A	-2	100%	-0,13	DESCUENTO: MURO POCETA
7,55	2,40	N/A	1	100%	18,12	WC HABITACIÓN 24
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO PUERTA
8,86	2,40	N/A	1	100%	21,26	W.C PRICIPAL 3ER PISO
0,97	2,02	N/A	-1	100%	-1,96	DESCUENTO PUERTA
PISO 4						
7,55	2,40	N/A	1	100%	18,12	HABITACION # 1
0,85	2,02	N/A	-1	100%	-1,72	DESCUENTO
6,27	2,40	N/A	1	100%	15,05	HABITACION # 2
0,85	2,02	N/A	-1	100%	-1,72	DESCUENTO
7,44	2,40	N/A	1	100%	17,86	HABITACION # 11
0,85	2,02	N/A	-1	100%	-1,72	DESCUENTO
7,74	2,40	N/A	1	100%	18,58	HABITACION # 16
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,42	2,40	N/A	1	100%	17,81	HABITACION # 18
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,25	2,40	N/A	1	100%	17,40	HABITACION # 8
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,25	2,40	N/A	1	100%	17,40	HABITACION # 7
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,15	2,40	N/A	1	100%	17,16	HABITACION # 10
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,29	2,40	N/A	1	100%	17,50	HABITACION # 24
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
7,01	2,40	N/A	1	100%	16,82	HABITACION # 25





0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCUENTO
4,73	2,40	N/A	1	100%	11,35	BAÑO DESCANSO PISO 4
0,87	2,02	N/A	-1	100%	-1,76	DESCANSO
4,02	1,20	N/A	1	100%	4,82	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
2,87	0,40	N/A	1	100%	1,15	HABITACION # 1 PISO 4
2,87	0,40	N/A	1	100%	1,15	HABITACION # 2 PISO 4
2,87	0,40	N/A	1	100%	1,15	HABITACION # 11 PISO 4
2,89	0,40	N/A	1	100%	1,16	HABITACION # 16 PISO 4
2,87	0,40	N/A	1	100%	1,15	HABITACION # 18 PISO 4
2,89	0,40	N/A	1	100%	1,16	HABITACION # 7 PISO 4
2,40	0,40	N/A	2	100%	1,92	HABITACION # 8 PISO 4
2,87	0,40	N/A	1	100%	1,15	HABITACION # 8 PISO 4
2,89	0,40	N/A	1	100%	1,16	HABITACION # 10 PISO 4
2,89	0,40	N/A	1	100%	1,16	HABITACION # 24 PISO 4
2,89	0,40	N/A	1	100%	1,16	HABITACION # 25 PISO 4
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	BAÑO DESCANSO
0,87	0,40	N/A	1	100%	0,35	BAÑO DESCANSO
2,40	0,40	N/A	2	100%	1,92	BAÑO DESCANSO
2,16	0,40	N/A	3	100%	2,59	HABITACIÓN 422
0,89	0,40	N/A	1	100%	0,36	HABITACIÓN 422
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	HABITACIÓN 422
0,89	0,40	N/A	1	100%	0,36	HABITACIÓN 422
2,16	0,40	N/A	3	100%	2,59	HABITACIÓN 423
0,89	0,40	N/A	2	100%	0,71	HABITACIÓN 423
2,05	0,40	N/A	1	100%	0,82	HABITACIÓN 423
2,16	0,40	N/A	3	100%	2,59	HABITACIÓN 420
0,89	0,40	N/A	2	100%	0,71	HABITACIÓN 420
2,05	0,40	N/A	1	100%	0,82	HABITACIÓN 420
0,89	0,40	N/A	2	100%	0,71	HABITACIÓN 421
2,05	0,40	N/A	1	100%	0,82	HABITACIÓN 421
2,16	0,40	N/A	2	100%	1,73	HABITACIÓN 419
0,89	0,40	N/A	2	100%	0,71	HABITACIÓN 419
2,05	0,40	N/A	1	100%	0,82	HABITACIÓN 419
1,17	0,40	N/A	3	100%	1,40	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,20	0,40	N/A	1	100%	0,48	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
2,16	0,40	N/A	2	100%	1,73	HABITACIÓN 417
2,04	0,40	N/A	1	100%	0,82	HABITACIÓN 417
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 417
2,18	0,40	N/A	3	100%	2,62	HABITACIÓN 415
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	HABITACIÓN 415
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 415
2,20	0,40	N/A	3	100%	2,64	HABITACIÓN 414
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	HABITACIÓN 414
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 414
2,17	0,40	N/A	3	100%	2,60	HABITACIÓN 413
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 413
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACIÓN 413
2,17	0,40	N/A	2	100%	1,74	HABITACIÓN 412
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACIÓN 412
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 412
2,18	0,40	N/A	3	100%	2,62	HABITACIÓN 409
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 409
2,02	0,40	N/A	1	100%	0,81	HABITACIÓN 409
2,17	0,40	N/A	2	100%	1,74	HABITACIÓN 405
20,20	0,40	N/A	2	100%	16,16	HABITACIÓN 405
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 405
2,17	0,40	N/A	2	100%	1,74	HABITACIÓN 406
2,02	0,40	N/A	2	100%	1,62	HABITACIÓN 406
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	HABITACIÓN 406
2,16	0,40	N/A	3	100%	2,59	WC HABITACIÓN 04
2,01	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC HABITACIÓN 04
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 04
2,16	0,40	N/A	3	100%	2,59	WC HABITACIÓN 03
2,01	0,40	N/A	1	100%	0,80	WC HABITACIÓN 03
0,87	0,40	N/A	2	100%	0,70	WC HABITACIÓN 03
8,86	2,40	N/A	1	100%	21,26	W.C PRICIPAL 4RTO PISO
0,97	2,02	N/A	-1	100%	-1,96	DESCUENTO PUERTA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1.412,58**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**1.351,96**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**60,62**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	2,02	REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"	CAP	2,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	UNIDAD	Metro lineal			UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico















Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 4				
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION # 1 PISO 4
2,87	N/A	N/A	1	100%	2,87	HABITACION # 1 PISO 4
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION # 2 PISO 4
2,87	N/A	N/A	1	100%	2,87	HABITACION # 2 PISO 4
2,40	N/A	N/A	3	100%	7,20	HABITACION # 11 PISO 4
2,87	N/A	N/A	1	100%	2,87	HABITACION # 11 PISO 4
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION # 16 PISO 4
2,89	N/A	N/A	1	100%	2,89	HABITACION # 16 PISO 4
2,40	N/A	N/A	3	100%	7,20	HABITACION # 18 PISO 4
2,87	N/A	N/A	1	100%	2,87	HABITACION # 18 PISO 4
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION # 7 PISO 4
2,89	N/A	N/A	1	100%	2,89	HABITACION # 7 PISO 4
2,40	N/A	N/A	2	100%	4,80	HABITACION # 8 PISO 4
2,87	N/A	N/A	1	100%	2,87	HABITACION # 8 PISO 4
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION # 10 PISO 4
2,89	N/A	N/A	1	100%	2,89	HABITACION # 10 PISO 4
2,40	N/A	N/A	3	100%	7,20	HABITACION # 24 PISO 4
2,89	N/A	N/A	1	100%	2,89	HABITACION # 24 PISO 4
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION # 25 PISO 4
2,89	N/A	N/A	1	100%	2,89	HABITACION # 25 PISO 4
2,10	N/A	N/A	1	100%	2,10	BAÑO DESCANSO
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	BAÑO DESCANSO
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	BAÑO DESCANSO
0,89	N/A	N/A	1	100%	0,89	HABITACIÓN 422
2,06	N/A	N/A	1	100%	2,06	HABITACIÓN 422
0,89	N/A	N/A	1	100%	0,89	HABITACIÓN 423
2,05	N/A	N/A	1	100%	2,05	HABITACIÓN 423
0,89	N/A	N/A	1	100%	0,89	HABITACIÓN 420
2,05	N/A	N/A	1	100%	2,05	HABITACIÓN 420
0,89	N/A	N/A	1	100%	0,89	HABITACIÓN 421
2,05	N/A	N/A	1	100%	2,05	HABITACIÓN 421
0,89	N/A	N/A	1	100%	0,89	HABITACIÓN 419
2,05	N/A	N/A	1	100%	2,05	HABITACIÓN 419
4,12	N/A	N/A	1	100%	4,12	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,17	N/A	N/A	1	100%	1,17	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 417
2,04	N/A	N/A	1	100%	2,04	HABITACIÓN 417
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 415
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 415
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 414
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 414
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 413
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 413
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 412
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 412
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 409
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 409
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 405
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 405
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACIÓN 406
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACIÓN 406
2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	WC HABITACIÓN 04
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	WC HABITACIÓN 04
2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	WC HABITACIÓN 03
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	WC HABITACIÓN 03
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C PRINCIPAL 4RTO NIVEL
0,97	N/A	N/A	1	100%	0,97	W.C PRINCIPAL 4RTO NIVEL
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	W.C PRINCIPAL 4RTO NIVEL
		PISO 3				
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 301
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 301
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 301
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 302
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 302
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 302
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 307
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 307
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 307
2,40	N/A	N/A	2	100%	4,80	HABITACION 308
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 308
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 308
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 310
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 310
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 310
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 311
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 311
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 311
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 316
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 316
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 316
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 318
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 318
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 318
2,40	N/A	N/A	4	100%	9,60	HABITACION 325
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	HABITACION 325
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	HABITACION 325
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	DESCANSO
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	DESCANSO
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	DESCANSO
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	CUARTO DE ASEO
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	CUARTO DE ASEO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	CUARTO DE ASEO
1,21	N/A	N/A	1	100%	1,21	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: SOBREANCHO LAVAMANOS
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	UCI PEDIATRICA - BAÑO PM: ESQUINERO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: PUERTA
0,89	N/A	N/A	1	100%	0,89	
1,17	N/A	N/A	2	100%	2,34	CUARTO ASEO - CIRCILACIÓN RESTRINGIDA: MURO POCETA ASEO
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	CUARTO ASE - CIRCILACIÓN RESTRINGIDA: MURO
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	WC CIRCULACIÓN
2,06	N/A	N/A	-1	100%	-2,06	WC CIRCULACIÓN
2,16	N/A	N/A	1	100%	2,16	WC HABITACIÓN 21
2,01	N/A	N/A	2	100%	4,02	WC HABITACIÓN 21
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	WC HABITACIÓN 21
2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	WC HABITACIÓN 20
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	WC HABITACIÓN 20
2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	WC HABITACIÓN 22
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	WC HABITACIÓN 22









2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	W.C HABITACIÓN 23
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 23
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	W.C HABITACIÓN 24
2,01	N/A	N/A	3	100%	6,03	W.C HABITACIÓN 24
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 24
2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	W.C HABITACIÓN 04
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 04
2,01	N/A	N/A	1	100%	2,01	W.C HABITACIÓN 03
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 03
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 19
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 19
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 17
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 17
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 14
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 14
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 15
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 15
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 12
20,20	N/A	N/A	1	100%	20,20	W.C HABITACIÓN 12
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 13
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 13
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 03
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 03
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 04
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 04
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 06
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 06
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 05
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 05
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C HABITACIÓN 09
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C HABITACIÓN 09
2,02	N/A	N/A	2	100%	4,04	W.C PRINCIPAL 3ER NIVEL
0,97	N/A	N/A	1	100%	0,97	W.C PRINCIPAL 3ER NIVEL
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	W.C PRINCIPAL 3ER NIVEL
		PISO 2				
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	BAÑO UCI ADULTO
1,05	N/A	N/A	1	100%	1,05	BAÑO UCI ADULTO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
0,76	N/A	N/A	1	100%	0,76	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
2,02	N/A	N/A	2	100%	4,04	BAÑO RECUPERACION PARTO
0,96	N/A	N/A	1	100%	0,96	BAÑO RECUPERACION PARTO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	BAÑO RECUPERACION PARTO
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	BAÑO RECUPERACION PARTO
2,02	N/A	N/A	2	100%	4,04	BAÑO PREPARACION PARTO
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	BAÑO PREPARACION PARTO
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	BAÑO PREPARACION PARTO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	BAÑO DESCANSO PARTO
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	BAÑO VESTIER MUJER
0,65	N/A	N/A	1	100%	0,65	BAÑO VESTIER MUJER
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	BAÑO VESTIER MUJER
0,67	N/A	N/A	1	100%	0,67	BAÑO VESTIER MUJER
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	BAÑO VESTIER MUJER
0,65	N/A	N/A	1	100%	0,65	BAÑO VESTIER MUJER
0,65	N/A	N/A	1	100%	0,65	BAÑO VESTIER MUJER
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	W.C PREPARACIÓN PACIENTES
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C PREPARACIÓN PACIENTES
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C PREPARACIÓN PACIENTES
2,02	N/A	N/A	2	100%	4,04	W.C PMR SALA ESPERA
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C PMR SALA ESPERA
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C CIRCULACIÓN A DESCANSO
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	W.C CIRCULACIÓN A DESCANSO
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	W.C CIRCULACIÓN A DESCANSO
4,23	N/A	N/A	1	100%	4,23	ASEO UARO
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	ASEO UARO
1,11	N/A	N/A	2	100%	2,22	ASEO UARO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C PEROSONAL ASISTENCIAL
0,70	N/A	N/A	1	100%	0,70	W.C PEROSONAL ASISTENCIAL
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C. FRENTE A COORDINACION UCI
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	W.C. FRENTE A COORDINACION UCI
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C MUJERES FRENTEB PERSONAL ASISTENCIAL
0,80	N/A	N/A	1	100%	0,80	W.C MUJERES FRENTEB PERSONAL ASISTENCIAL
2,92	N/A	N/A	1	100%	2,92	W.C FILTRO AUTO CLAVE
1,18	N/A	N/A	1	100%	1,18	ASEO CIRCULACCION A HALL
1,20	N/A	N/A	2	100%	2,40	ASEO CIRCULACCION A HALL
4,30	N/A	N/A	1	100%	4,30	ASEO CIRCULACCION A HALL
1,20	N/A	N/A	1	100%	1,20	ASEO FRENTE A SALA DE PARTOS
3,00	N/A	N/A	1	100%	3,00	ASEO FRENTE A SALA DE PARTOS
3,60	N/A	N/A	1	100%	3,60	ASEO UCI NEO
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	ASEO UCI NEO
0,80	N/A	N/A	2	100%	1,60	ASEO UCI NEO
		PISO 1				
2,87	N/A	N/A	1	100%	2,87	BAÑO PRIMER PISO
2,77	N/A	N/A	1	100%	2,77	BAÑO PRIMER PISO
0,75	N/A	N/A	2	100%	1,50	W.C FAMILIAR: SOBREANCHO LAVAMANOS
0,38	N/A	N/A	1	100%	0,38	
2,02	N/A	N/A	5	100%	10,10	W.C FAMILIAR: PUERTAS (ALTOS)
1,40	N/A	N/A	3	100%	4,20	W.C FAMILIAR: COLUMNAS
1,38	N/A	N/A	2	100%	2,76	W.C FAMILIAR: ACCESO HACIA CAMBIADOR
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	W.C FAMILIAR: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0,90	N/A	N/A	1	100%	0,90	W.C FAMILIAR: PUERTA SANITARIO ANCHO
2,02	N/A	N/A	2	100%	4,04	SALA EDA - BAÑO: PUERTA
0,77	N/A	N/A	1	100%	0,77	
2,00	N/A	N/A	1	100%	2,00	CONSULTORIO 4
0,76	N/A	N/A	1	100%	0,76	CONSULTORIO 4
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	CONSULTORIO 1
2,97	N/A	N/A	1	100%	2,97	CONSULTORIO 1
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	CONSULTORIO 2
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	CONSULTORIO 2
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	CONSULTORIO 2
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	CONSULTORIO 5
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	CONSULTORIO 5
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	SALA ERA
0,87	N/A	N/A	1	100%	0,87	SALA ERA
0,76	N/A	N/A	1	100%	0,76	W.C MUJERES
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C MUJERES
2,98	N/A	N/A	1	100%	2,98	BAÑO DISCAPASITADOS
2,40	N/A	N/A	2	100%	4,80	W.C HOMBRES
2,78	N/A	N/A	1	100%	2,78	W.C HOMBRES
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C MIXTO PRM
0,88	N/A	N/A	1	100%	0,88	
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	W.C AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0,67	N/A	N/A	1	100%	0,67	
0,88	N/A	N/A	1	100%	0,88	W.C LABORATORIO
2,02	N/A	N/A	1	100%	2,02	
2,02	N/A	N/A	2	100%	4,04	W.C PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGÍA



0,77	N/A	N/A	1	**100%**	**0,77**	WC PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA
2,02	N/A	N/A	1	**100%**	**2,02**	WC ECOGRAFO
1,18	N/A	N/A	1	**100%**	**1,18**	
2,02	N/A	N/A	1	**100%**	**2,02**	WC PERSONAL ASISTENCIAL 1
0,80	N/A	N/A	1	**100%**	**0,80**	
0,80	N/A	N/A	1	**100%**	**0,80**	WC PERSONAL ASISTENCIAL 2
2,02	N/A	N/A	1	**100%**	**2,02**	
2,40	N/A	N/A	2	**100%**	**4,80**	WC MONITOREO GINECOBSTETRICIA
2,02	N/A	N/A	2	**100%**	**4,04**	
0,88	N/A	N/A	1	**100%**	**0,88**	
1,00	N/A	N/A	2	**100%**	**2,00**	WC PRINCIPAL
0,40	N/A	N/A	2	**100%**	**0,80**	WC PRINCIPAL
4,30	N/A	N/A	1	**100%**	**4,30**	ASEO CIRCILACIÓN URG
1,20	N/A	N/A	1	**100%**	**1,20**	ASEO CIRCILACIÓN URG
1,07	N/A	N/A	2	**100%**	**2,14**	ASEO CIRCILACIÓN URG
0,88	N/A	N/A	1	**100%**	**0,88**	WC FAMILIAR OBSERVACIONES
2,00	N/A	N/A	1	**100%**	**2,00**	WC FAMILIAR OBSERVACIONES
0,75	N/A	N/A	1	**100%**	**0,75**	C. ASEO LABOTORIO
3,37	N/A	N/A	1	**100%**	**3,37**	C. ASEO LABOTORIO
0,70	N/A	N/A	10	**100%**	**7,00**	MESÓN LABORATORIO
0,87	N/A	N/A	2	**100%**	**1,74**	C. ASEO PASILLO OBSERVACIONES A FARMACIA
1,00	N/A	N/A	7	**100%**	**7,00**	ASEO CAFETERIA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**600,32**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**566,42**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**33,90**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	CAP	3,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SÓTANO						
48,50	**N/A**	**N/A**	1	**60%**	**29,10**	BODEGA DE FARMACIA
13,15	**N/A**	**N/A**	1	**60%**	**7,89**	PASILLO A BODEGA DE FARMACIA
PISO 1						
28,73	N/A	N/A	1	**95%**	**27,29**	AUDITORIO
39,16	N/A	N/A	1	**95%**	**37,20**	CAFETERIA
1,64	N/A	N/A	1	**95%**	**1,56**	
20,06	N/A	N/A	1	**95%**	**19,06**	COCINA
35,37	N/A	N/A	1	**95%**	**33,60**	SALA ESPERA IMAGENOLOGIA
22,25	N/A	N/A	1	**95%**	**21,14**	RECEPCIÓN MEDICAMENTO FARMACIA
28,27	N/A	N/A	1	**95%**	**26,86**	FARMACIA
45,22	N/A	N/A	1	**95%**	**42,96**	EQUIPOS LABORATORIO
25,43	N/A	N/A	1	**95%**	**24,16**	CENTRIFUGA Y LOQUER LABORATORIO
9,94	N/A	N/A	1	**95%**	**9,44**	NEVERAS LABORATORIO
13,51	N/A	N/A	1	**95%**	**12,83**	PRETRASFUNCIONAL LABORATORIO
18,64	N/A	N/A	1	**95%**	**17,71**	RESIDUOS PELIGROSO, RESIDUOS RECICLABLE,ASEO LABORATORIO
7,00	N/A	N/A	1	**95%**	**6,65**	INGRESO LABORATORIO
11,06	N/A	N/A	1	**95%**	**10,51**	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGIA
16,60	N/A	N/A	1	**95%**	**15,77**	TOMA DE MUESTRA
10,47	N/A	N/A	1	**95%**	**9,95**	PASILLO SUR IMAGENOLOGIA
6,74	N/A	N/A	1	**95%**	**6,40**	PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA
9,33	N/A	N/A	1	**95%**	**8,86**	SALA DE ESPERA ECOGRAFIA
20,36	N/A	N/A	1	**95%**	**19,34**	ECOGRAFO 1
15,15	N/A	N/A	1	**95%**	**14,39**	ECOGRAFO 2
14,64	N/A	N/A	1	**95%**	**13,91**	ADMISIONES PROCEDIMIENTO
19,82	N/A	N/A	1	**95%**	**18,83**	PROCEDIMIENTO CARDIO
12,19	N/A	N/A	1	**95%**	**11,58**	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
20,00	N/A	N/A	1	**95%**	**19,00**	OBSERVACION GINECOPEDIATRIA
11,29	N/A	N/A	1	**95%**	**10,73**	CIRCULACION RX
9,09	N/A	N/A	1	**95%**	**8,64**	CIRCULACION MAMOGRAFIA
34,67	N/A	N/A	1	**95%**	**32,94**	OBSERVACION PEDIATRICA
23,41	N/A	N/A	1	**95%**	**22,24**	CENTRAL DE ENFERMERIA
7,78	N/A	N/A	1	**95%**	**7,39**	DISPARO
16,26	N/A	N/A	1	**95%**	**15,45**	T.A.C
14,48	N/A	N/A	1	**95%**	**13,76**	OFICINA RADIOLOGIA Y RECIDUO RX
9,48	N/A	N/A	1	**95%**	**9,01**	SALA LECTURA RADIOLOGIA
2,53	N/A	N/A	1	**95%**	**2,40**	CIRCULACION FRENTE SALA DE LECTURA
3,95	N/A	N/A	1	**95%**	**3,75**	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE
3,50	N/A	N/A	1	**95%**	**3,33**	RESIDUO PELIGROSO
15,46	N/A	N/A	1	**95%**	**14,69**	SALA EDA
18,54	N/A	N/A	1	**95%**	**17,61**	DIGITACION
3,89	N/A	N/A	1	**95%**	**3,70**	ROPA SUCIA
4,85	N/A	N/A	1	**95%**	**4,61**	EQUIPO
13,83	N/A	N/A	1	**95%**	**13,14**	ERA
9,57	N/A	N/A	1	**95%**	**9,09**	CIRCULACION CENTRA DE ENFERMERIA A ERA
10,68	N/A	N/A	1	**95%**	**10,15**	DIRECCION DE URGENCIAS
13,06	N/A	N/A	1	**95%**	**12,41**	PROCEDIMEINTOS ASEPTICOS
13,95	N/A	N/A	1	**95%**	**13,25**	SALA DE YESOS
13,3	N/A	N/A	1	**95%**	**12,64**	CONSULTORIO 5
26,96	N/A	N/A	1	**95%**	**25,61**	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
14,56	N/A	N/A	1	**95%**	**13,83**	CONSULTORIO 2
14,57	N/A	N/A	1	**95%**	**13,84**	CONSULTORIO 1
14,86	N/A	N/A	1	**95%**	**14,12**	CONSULTORIO 4
15,4	N/A	N/A	1	**95%**	**14,63**	CONSULTORIO 3
21,2	N/A	N/A	1	**95%**	**20,14**	REANIMACIÓN
28,24	N/A	N/A	1	**95%**	**26,83**	CIRCULACION URGENCIAS
4,71	N/A	N/A	1	**95%**	**4,47**	PASILLO URGENCIAS
8,2	N/A	N/A	1	**95%**	**7,79**	TRIAGE # 2
12,72	N/A	N/A	1	**95%**	**12,08**	CIRCULACION TRIAGE Y SILLAS DE RUEDAS
11,13	N/A	N/A	1	**95%**	**10,57**	TRIAGE # 1
47,32	N/A	N/A	1	**95%**	**44,95**	SALA DE ESPERA ADULTOS
31,27	N/A	N/A	1	**95%**	**29,71**	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
31,27	N/A	N/A	1	**95%**	**29,71**	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
9,87	N/A	N/A	1	**95%**	**9,38**	FACTURACIÓN
15,8	N/A	N/A	1	**95%**	**15,01**	DESCANSO MEDICO
16,27	N/A	N/A	1	**95%**	**15,46**	DATA CENTER
11,53	N/A	N/A	1	**95%**	**10,95**	HALL CENTRAL
5,31	N/A	N/A	1	**95%**	**5,04**	WC CAFETERIA
6,49	N/A	N/A	1	**95%**	**6,17**	WC DISCAPACITADOS CAFETERIA
7,11	N/A	N/A	1	**95%**	**6,75**	WC DISCAPACITADOS SALA DE ESPERA ADULTOS
9,07	N/A	N/A	1	**95%**	**8,62**	WC DAMAS SALA DE ESPERA ADULTOS
4,79	N/A	N/A	1	**95%**	**4,55**	WC DESCANSO MEDICO 1
5,16	N/A	N/A	1	**95%**	**4,90**	WC DESCANSO MEDICO 2
27,24	N/A	N/A	1	**95%**	**25,88**	DESCANSO MEDICO
4,8	N/A	N/A	1	**95%**	**4,56**	CONSULTORIO 4
4,98	N/A	N/A	1	**95%**	**4,73**	CONSULTORIO 1
4,79	N/A	N/A	1	**95%**	**4,55**	CONSULTORIO 2
5,31	N/A	N/A	1	**95%**	**5,04**	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
5,14	N/A	N/A	1	**95%**	**4,88**	CONSULTORIO 5
4,85	N/A	N/A	1	**95%**	**4,61**	SALA ERA
17,15	N/A	N/A	1	**95%**	**16,29**	WC FAMILIAR
6,65	N/A	N/A	1	**95%**	**6,32**	WC DISCAPACITADOS GINECOPSTETRICIA
6,05	N/A	N/A	1	**95%**	**5,75**	BAÑO VESTIER ADMISIONES
4,27	N/A	N/A	1	**95%**	**4,06**	WC ECOGRAFO 1
4,27	N/A	N/A	1	**95%**	**4,06**	WC ECOGRAFO 2
4,72	N/A	N/A	1	**95%**	**4,48**	WC PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
4,28	N/A	N/A	1	**95%**	**4,07**	WC TOMA DE MUESTRAS
5,08	N/A	N/A	1	**95%**	**4,83**	WC LABORATORIO
5,03	N/A	N/A	1	**95%**	**4,78**	WC FARMACIA
6,22	N/A	N/A	1	**95%**	**5,91**	WC MIXTO ESPERA IMAGENOLOGIA
6,227	N/A	N/A	1	**95%**	**5,92**	WC DISCAPACITADOS ESPERA IMAGENOLOGIA
6,5	N/A	N/A	1	**95%**	**6,18**	ASEO URGENCIAS
7	N/A	N/A	1	**95%**	**6,65**	ADMISIONES URGENCIAS
7,6	N/A	N/A	1	**95%**	**7,22**	
5,7	N/A	N/A	1	**95%**	**5,42**	
4,8	N/A	N/A	1	**95%**	**4,56**	WC CONSULTORIO 3
11,3	N/A	N/A	1	**95%**	**10,74**	LAVADO PACIENTES
5,28	N/A	N/A	1	**95%**	**5,02**	WC MONITOREO GINECOPSTETRICIA
12,3	N/A	N/A	1	**95%**	**11,69**	BAÑO HOMBRES ESPERA ADULTOS
3,03	N/A	N/A	1	**95%**	**2,88**	TRIAGE 1 MURO ADISIONAL
3,82	N/A	N/A	1	**95%**	**3,63**	ROPA LIMPIA DIGITACION
3,87	N/A	N/A	1	**95%**	**3,68**	SALA EDA MURO ADISIONAL
6,92	N/A	N/A	1	**95%**	**6,57**	WC SALA EDA
7,15	N/A	N/A	1	**95%**	**6,79**	WC OBSERVACION PEDIATRICA
6,22	N/A	N/A	1	**95%**	**5,91**	TRABAJO LIMPIO OBSERVACION PEDIATRIA
5,6	N/A	N/A	1	**95%**	**5,32**	TRABAJO SUCIO OBSERVACION PEDIATRIA
6,5	N/A	N/A	1	**95%**	**6,18**	ASEO PASILLO IMAGENOLOGIA
5,97	N/A	N/A	1	**95%**	**5,67**	TRABAJO LIMPIO INSUMOS
3,1	N/A	N/A	2	**95%**	**5,89**	INGRESO A URGENCIAS
1,5	N/A	N/A	1	**95%**	**1,43**	OBSERVACION GINECOPSTETRICIA REPARACION
3,74	N/A	N/A	1	**95%**	**3,55**	FACTURACIÓN
5,62	N/A	N/A	1	**95%**	**5,34**	MURO FALSO TRAS RECEPCIÓN
4,37	N/A	N/A	1	**95%**	**4,15**	ASEO CAFETERIA










		PISO 2				
13,57	N/A	N/A	1	**80%**	**10,86**	UCI URO - 9
15,64	N/A	N/A	1	**80%**	**12,51**	UCI URO - 8
13,63	N/A	N/A	1	**80%**	**10,90**	UCI URO - 7
11,67	N/A	N/A	1	**80%**	**9,34**	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 7 A 9
7,61	N/A	N/A	1	**80%**	**6,09**	UCI AURO - 6
13,2	N/A	N/A	1	**80%**	**10,56**	
14,17	N/A	N/A	1	**80%**	**11,34**	UCI URO - 5
14,15	N/A	N/A	1	**80%**	**11,32**	UCI URO - 4
14,14	N/A	N/A	1	**80%**	**11,31**	UCI URO - 3
13,92	N/A	N/A	1	**80%**	**11,14**	UCI URO - 2
14,09	N/A	N/A	1	**80%**	**11,27**	UCI URO - 1
18,22	N/A	N/A	1	**80%**	**14,58**	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 1 A 5
9,53	N/A	N/A	1	**80%**	**7,62**	CENTRAL DE ENFERMERIA + MATERIAL: FRENTE A UCI URO 8
3,51	N/A	N/A	1	**80%**	**2,81**	INGRESO CUARTOS DE UCI URO
10,26	N/A	N/A	1	**80%**	**8,21**	CENTRAL DE ENFERMERIA: FRENTE A UCI URO 3
2,57	N/A	N/A	1	**80%**	**2,06**	INFORMACIÓN FAMILIAR
6,52	N/A	N/A	1	**80%**	**5,22**	FILTRO ACCESO PERSONAL UARO
5,04	N/A	N/A	1	**80%**	**4,03**	PASILLO ACCESO BAÑO COSTADO DE VESTIER PACIENTES
18,31	N/A	N/A	1	**80%**	**14,65**	VESTIER PACIENTES
2,3	N/A	N/A	1	**80%**	**1,84**	RACK
40,76	N/A	N/A	1	**80%**	**32,61**	RECUPERACIÓN SALA PARTO
9,93	N/A	N/A	1	**80%**	**7,94**	ESTACIÓN ENFERMERIA RECUPERACIÓN
9,04	N/A	N/A	1	**80%**	**7,23**	CIRCULACIÓN DE: SALA PARTO A UCI ADULTO (LATERAL IZQUIERDO)
17,67	N/A	N/A	1	**80%**	**14,14**	CIRCULACIÓN DE: SALA DE PARTO 1 Y 2 A DESCANSO
10,51	N/A	N/A	1	**80%**	**8,41**	CUARTO DE EQUIPOS
8,68	N/A	N/A	1	**80%**	**6,94**	CIRCULACIÓN HACIA QUIROFANOS DESDE RECUPERACIÓN PARTOS (COSTADO DERECHO)
20,8	N/A	N/A	1	**80%**	**16,64**	DESCANSO MÉDICO - QUIROFÁNOS
9,32	N/A	N/A	1	**80%**	**7,46**	CIRCULACIÓN QUIROFANO: DEL 1 AL 3 (COSTADO DERECHO)
5,33	N/A	N/A	1	**80%**	**4,26**	BODEGA
49,36	N/A	N/A	1	**80%**	**39,49**	RECUPERACIÓN QUIRURGICA + ESTACIÓN ENFERMERIA
10,7	N/A	N/A	1	**80%**	**8,56**	PASILLO A AUTOCLAVE: DESDE RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA
31,83	N/A	N/A	1	**80%**	**25,46**	AUTOCLAVE
7,85	N/A	N/A	1	**80%**	**6,28**	PASILLO AUTOCLAVE - HACIA QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
2,75	N/A	N/A	1	**80%**	**2,20**	
14,34	N/A	N/A	1	**80%**	**11,47**	PREPARACIÓN PACIENTES AMBULATORIOS
5,39	N/A	N/A	1	**80%**	**4,31**	WC H: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.
6,06	N/A	N/A	1	**80%**	**4,85**	WC M: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.
14,54	N/A	N/A	1	**80%**	**11,63**	PASILLO QUIROFANOS - DEL 3 AL 1 (COSTADO DERECHO)
14,38	N/A	N/A	1	**80%**	**11,50**	FARMACIA
24,89	N/A	N/A	1	**80%**	**19,91**	PASILLO POSTERIOR FARMACIA
5,85	N/A	N/A	1	**80%**	**4,68**	RESIDUOS TEMPARALES 1
4,76	N/A	N/A	1	**80%**	**3,81**	RESIDUOS TEMPARALES 2
5,21	N/A	N/A	1	**80%**	**4,17**	ASEO (FUERA DE QUIROFANO 3)
13,19	N/A	N/A	1	**80%**	**10,55**	PASILLO RECUPARACIÓN PARTOS - DESDE QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
15,4	N/A	N/A	1	**80%**	**12,32**	DESCANSO: RECUPERACIÓN Y QUIROFANOS
5,18	N/A	N/A	1	**80%**	**4,14**	BODEGA (COSTADO DERECHO DE DESCANSO
5,31	N/A	N/A	1	**80%**	**4,25**	CIRCULACIÓN: DESCANSO/VESTIER
16,89	N/A	N/A	1	**80%**	**13,51**	VESTIER MUJERES VESTIER MUJERES
18,25	N/A	N/A	1	**80%**	**14,60**	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
4,53	N/A	N/A	1	**80%**	**3,62**	VESTIER MUJERES: DUCHA
4,11	N/A	N/A	1	**80%**	**3,29**	VESTIER MUJERES: BAÑO 1
4,06	N/A	N/A	1	**80%**	**3,25**	VESTIER MUJERES: BAÑO 2
3,72	N/A	N/A	1	**80%**	**2,98**	VESTIER HOMBRE: DUCHA
4,35	N/A	N/A	1	**80%**	**3,48**	VESTIER HOMBRE: BAÑO
3,09	N/A	N/A	1	**80%**	**2,47**	RESIDUO ORDINARIO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
3,17	N/A	N/A	1	**80%**	**2,54**	RESIDUO PELIGROSO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
7,01	N/A	N/A	1	**80%**	**5,61**	RECEPCIÓN - CONTROL (COSTADO DE RACK)
1,61	N/A	N/A	1	**80%**	**1,29**	MURO EXTERIOR: DESCANSO-UCI URO
8,78	N/A	N/A	1	**80%**	**7,02**	DESCANSO: UCI URO
6,26	N/A	N/A	1	**80%**	**5,01**	FILTRO FAMILIARES URO
19,08	N/A	N/A	1	**80%**	**15,26**	CIRCULACIÓN: UCI URO A UCI NEO
6,2	N/A	N/A	1	**80%**	**4,96**	INGRESO UCI NEO (DESDE UCI URO)
9,4	N/A	N/A	1	**80%**	**7,52**	FILTRO VISITANTES: UCO NEO
15,11	N/A	N/A	1	**80%**	**12,09**	LACTARIO + BODEGA
4,76	N/A	N/A	1	**80%**	**3,81**	WC PMR (COSTADO DE RESIDUOS TEMPORALES)
10,05	N/A	N/A	1	**80%**	**8,04**	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
11,35	N/A	N/A	1	**80%**	**9,08**	EXTRACCIÓN
2,67	N/A	N/A	1	**80%**	**2,14**	RESIDUOS TEMPORALES
9,76	N/A	N/A	1	**80%**	**7,81**	CIRCULACIÓN ASEO: UCI NEO
5,92	N/A	N/A	1	**80%**	**4,74**	LAVADO DE INCUBADORAS
2,53	N/A	N/A	1	**80%**	**2,02**	ASEO : UCI NEO
45,52	N/A	N/A	1	**80%**	**36,42**	UCI NEO: INTENSIVOS
11,08	N/A	N/A	1	**80%**	**8,86**	CENTRAL ENFERMERIA: UCI INTENSIVOS
68,09	N/A	N/A	1	**80%**	**54,47**	UCI NEO: INTERMEDIOS
3,84	N/A	N/A	4	**80%**	**12,29**	CENTRAL ENFERMERIA: UCI NEO INTERMEDIOS
4,78	N/A	N/A	1	**80%**	**3,82**	T. LIMPIO: CENTRAL ENFERMERÍ INTERMEDIO
2,3	N/A	N/A	1	**80%**	**1,84**	ESTACIÓN SATELITE Y ARCHIVO
11,24	N/A	N/A	1	**80%**	**8,99**	PASILLO: HACIA DESCANSO UCI NEO
18,03	N/A	N/A	1	**80%**	**14,42**	DESCANSO: UCI NEO
4,83	N/A	N/A	1	**80%**	**3,86**	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
5,57	N/A	N/A	1	**80%**	**4,46**	T. SUCIO: UCI NEO
4,79	N/A	N/A	1	**80%**	**3,83**	WC (EN PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO)
8,23	N/A	N/A	1	**80%**	**6,58**	ESPACIO: POCETAS (HACIA DESCANSO) + MURO POSTERIOR DE CENTRAL ENFERMERIA DE INTENSIVOS
20,14	N/A	N/A	1	**80%**	**16,11**	CUARTO DE EQUIPOS
6,77	N/A	N/A	1	**80%**	**5,42**	LIMPIO: UCI NEO
6,66	N/A	N/A	1	**80%**	**5,33**	SUCIO: UCI NEO
8,54	N/A	N/A	1	**80%**	**6,83**	PASILLO: VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2,67	N/A	N/A	1	**80%**	**2,14**	SUCIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2,92	N/A	N/A	1	**80%**	**2,34**	LIMPIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
6,13	N/A	N/A	1	**80%**	**4,90**	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
4,88	N/A	N/A	1	**80%**	**3,90**	WC: MUJERES
6,31	N/A	N/A	1	**80%**	**5,05**	WC PMR: MUJERES
11,25	N/A	N/A	1	**80%**	**9,00**	COORDINACIÓN UCI NEO
11,57	N/A	N/A	1	**80%**	**9,26**	VESTIER ASISTENCIAL
5,83	N/A	N/A	1	**80%**	**4,66**	WC: VESTIER
24,14	N/A	N/A	1	**80%**	**19,31**	SALA ESPERA-HALL
4,05	N/A	N/A	1	**80%**	**3,24**	RACK
9,48	N/A	N/A	1	**80%**	**7,58**	PASILLO: HACIA WCH Y VESTIER AUTOCLAVE
4,51	N/A	N/A	1	**80%**	**3,61**	WC H (PASILLO HACIA VESTIER AUTOCLAVE)
4,05	N/A	N/A	1	**80%**	**3,24**	VESTIER AUTOCLAVE
9,81	N/A	N/A	1	**80%**	**7,85**	FILTRO AUTOCLAVE
11,93	N/A	N/A	1	**80%**	**9,54**	WC PMR HOMBRE + INGRESO WC
3,93	N/A	N/A	1	**80%**	**3,14**	ROPA SUCIA (EXTERIOR DE RECUPERACIÓN PARTO)
5,46	N/A	N/A	1	**80%**	**4,37**	T. SUCIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
41,22	N/A	N/A	1	**80%**	**32,98**	TRABAJO PARTO + CENTRAL DE ENFERMERIA
7,77	N/A	N/A	1	**80%**	**6,22**	WC: TRABAJO PARTO
6,86	N/A	N/A	1	**80%**	**5,49**	T. LIMPIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
5,59	N/A	N/A	1	**80%**	**4,47**	ROPA LIMPIA: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
6,9	N/A	N/A	1	**80%**	**5,52**	T. LIMPIO: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
5,47	N/A	N/A	1	**80%**	**4,38**	WC 1: RECUPERACIÓN PARTO





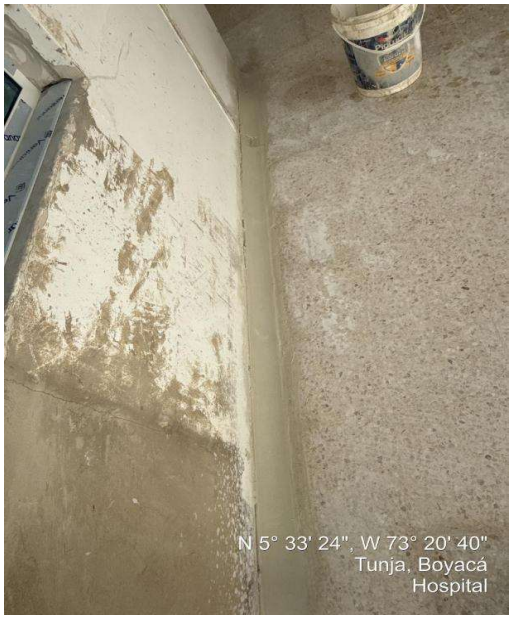




4,2	N/A	N/A	1	80%	3,36	WC 2: RECUPERACIÓN PARTO
3,78	N/A	N/A	1	80%	3,02	DEP. ROPA SUCIA: UCI ARO
5,64	N/A	N/A	1	80%	4,51	LIMPIO: UCI ARO
7,24	N/A	N/A	1	80%	5,79	WC: UARO AISLADO -06
6,79	N/A	N/A	1	80%	5,43	WC 1 (FRENTE UARO-07)
8,36	N/A	N/A	1	80%	6,69	WC 2 (FRENTE UARO-07)
5,34	N/A	N/A	1	80%	4,27	EQUIPOS: FRENTE UARO-09
3,24	N/A	N/A	1	80%	2,59	ASEO: FRENTE UARO-09
4,85	N/A	N/A	1	80%	3,88	T. SUCIO: CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UARO-08
		PISO 3				
17,72	N/A	N/A	1	95%	16,83	UCI PEDIATRICA 1
16,35	N/A	N/A	1	95%	15,53	UCI PEDIATRICA 3
17,55	N/A	N/A	1	95%	16,67	UCI PEDIATRICA 5
13,86	N/A	N/A	1	95%	13,17	UCI PEDIATRICA 7
16,96	N/A	N/A	1	95%	16,11	UCI PEDIATRICA 9
15,94	N/A	N/A	1	95%	15,14	UCI PEDIATRICA 11
13,43	N/A	N/A	1	95%	12,76	UCI PEDIATRICA 12
14,14	N/A	N/A	1	95%	13,43	UCI PEDIATRICA 10
15,77	N/A	N/A	1	95%	14,98	UCI PEDIATRICA 8
12,67	N/A	N/A	1	95%	12,04	UCI PEDIATRICA 6
15,61	N/A	N/A	1	95%	14,83	UCI PEDIATRICA 4
12,33	N/A	N/A	1	95%	11,71	UCI PEDIATRICA 2
16,77	N/A	N/A	1	95%	15,93	PASILLO A CUARTO DE EQUIPOS
8,47	N/A	N/A	1	95%	8,05	CUARTO DE EQUIPOS
8,68	N/A	N/A	1	95%	8,25	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS
7,00	N/A	N/A	1	95%	6,65	TRABAJO LIMPIO
7,12	N/A	N/A	1	95%	6,76	TRABAJO SUCIO
6,30	N/A	N/A	1	95%	5,99	BAÑO DISCAPACITADOS UCI P
4,75	N/A	N/A	1	95%	4,51	CUARTO ASEO
4,80	N/A	N/A	1	95%	4,56	SALIDA INFORMACIÓN FAMILIARES
0,95	N/A	N/A	1	95%	0,90	PASILLO INFORMACIÓN FAMILIARES
4,62	N/A	N/A	1	95%	4,39	TRANSFER MEDICAMENTOS A ACCESO ASISTENCIAL
5,16	N/A	N/A	1	95%	4,90	WC ACCESO ASISTENCIAL
5,40	N/A	N/A	1	95%	5,13	ACCESO ASISTENCIAL
1,65	N/A	N/A	1	95%	1,57	ACCESO ASISTENCIAL
3,43	N/A	N/A	1	95%	3,26	ACCESO ASISTENCIAL
25,19	N/A	N/A	1	95%	23,93	PASILLO A DESCANSO
15,19	N/A	N/A	1	95%	14,43	DESCANSO MEDICO
3,60	N/A	N/A	1	95%	3,42	COCINETA
12,91	N/A	N/A	1	95%	12,26	DESCANSO ENFERMERIA
12,32	N/A	N/A	1	95%	11,70	COORDINACIÓN PEDIATRICA
5,16	N/A	N/A	1	95%	4,90	WC 1
5,17	N/A	N/A	1	95%	4,91	WC 2
16,11	N/A	N/A	1	95%	15,30	COORDINACIÓN UCI P
10,72	N/A	N/A	1	95%	10,18	INFORMACIÓN FAMILIARES
14,22	N/A	N/A	1	95%	13,51	PREPARACION FORMULAS
4,58	N/A	N/A	1	95%	4,35	DEPOSITO DE INSUMOS
3,89	N/A	N/A	1	95%	3,70	FILTRO PACIENTES
8,32	N/A	N/A	1	95%	7,90	PASILLO A LUDOTECA
12,98	N/A	N/A	1	95%	12,33	EXTRACCION LECHE MATERNA
21,84	N/A	N/A	1	95%	20,75	BAÑOS LUDOTECA
8,00	N/A	N/A	1	95%	7,60	LUDOTECA
7,50	N/A	N/A	1	95%	7,13	LUDOTECA
4,20	N/A	N/A	1	95%	3,99	LUDOTECA
3,90	N/A	N/A	1	95%	3,71	LUDOTECA
6,80	N/A	N/A	1	95%	6,46	TERRAZA SOLAR
3,70	N/A	N/A	1	95%	3,52	TERRAZA SOLAR
4,80	N/A	N/A	1	95%	4,56	TERRAZA SOLAR
1,90	N/A	N/A	1	95%	1,81	TERRAZA SOLAR
5,80	N/A	N/A	1	95%	5,51	LUDOTECA
4,20	N/A	N/A	1	95%	3,99	LUDOTECA
5,00	N/A	N/A	1	95%	4,75	LUDOTECA
8,00	N/A	N/A	1	95%	7,60	LUDOTECA
5,00	N/A	N/A	1	95%	4,75	LUDOTECA
9,70	N/A	N/A	1	95%	9,22	CENTRAL DE ENFERMERIA LUDOTECA
4,83	N/A	N/A	1	95%	4,59	PASILLO ASENSOR - LUDOTECA
1,30	N/A	N/A	1	95%	1,24	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA SUR
4,92	N/A	N/A	1	95%	4,67	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA SUR
5,00	N/A	N/A	1	95%	4,75	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA SUR
5,00	N/A	N/A	1	95%	4,75	DEPOSITO DE INSUMOS
1,33	N/A	N/A	1	95%	1,26	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,42	N/A	N/A	1	95%	0,40	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,34	N/A	N/A	1	95%	0,32	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,18	N/A	N/A	1	95%	3,97	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,37	N/A	N/A	1	95%	0,35	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
2,12	N/A	N/A	1	95%	2,01	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,37	N/A	N/A	1	95%	0,35	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,13	N/A	N/A	1	95%	3,92	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,35	N/A	N/A	1	95%	0,33	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,10	N/A	N/A	1	95%	3,90	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,39	N/A	N/A	1	95%	0,37	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,18	N/A	N/A	1	95%	3,97	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,39	N/A	N/A	1	95%	0,37	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,12	N/A	N/A	1	95%	3,91	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,37	N/A	N/A	1	95%	0,35	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,13	N/A	N/A	1	95%	3,92	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,41	N/A	N/A	1	95%	0,39	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,13	N/A	N/A	1	95%	3,92	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,35	N/A	N/A	1	95%	0,33	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
2,12	N/A	N/A	1	95%	2,01	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
8,00	N/A	N/A	1	95%	7,60	BALCÓN NORTE
3,20	N/A	N/A	1	95%	3,04	BALCÓN NORTE
2,17	N/A	N/A	1	95%	2,06	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,38	N/A	N/A	1	95%	0,36	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,14	N/A	N/A	1	95%	3,93	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,35	N/A	N/A	1	95%	0,33	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,10	N/A	N/A	1	95%	3,90	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,40	N/A	N/A	1	95%	0,38	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,12	N/A	N/A	1	95%	3,91	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
1,17	N/A	N/A	1	95%	1,11	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
7,25	N/A	N/A	1	95%	6,89	HABITACION 301
7,58	N/A	N/A	1	95%	7,20	HABITACION 301
1,60	N/A	N/A	1	95%	1,52	HABITACION 301
7,10	N/A	N/A	1	95%	6,75	HABITACION 302
8,00	N/A	N/A	1	95%	7,60	HABITACION 302
1,57	N/A	N/A	1	95%	1,49	HABITACION 302
7,10	N/A	N/A	1	95%	6,75	HABITACION 307
8,20	N/A	N/A	1	95%	7,79	HABITACION 307
0,36	N/A	N/A	1	95%	0,34	HABITACION 307
8,00	N/A	N/A	1	95%	7,60	HABITACION 308
4,00	N/A	N/A	1	95%	3,80	HABITACION 308
6,00	N/A	N/A	1	95%	5,70	HABITACION 308
7,33	N/A	N/A	1	95%	6,96	HABITACION 310
7,60	N/A	N/A	1	95%	7,22	HABITACION 310
1,40	N/A	N/A	1	95%	1,33	HABITACION 310
7,10	N/A	N/A	1	95%	6,75	HABITACION 311
8,00	N/A	N/A	1	95%	7,60	HABITACION 311
1,44	N/A	N/A	1	95%	1,37	HABITACION 311
7,30	N/A	N/A	1	95%	6,94	HABITACION 316
7,80	N/A	N/A	1	95%	7,41	HABITACION 316





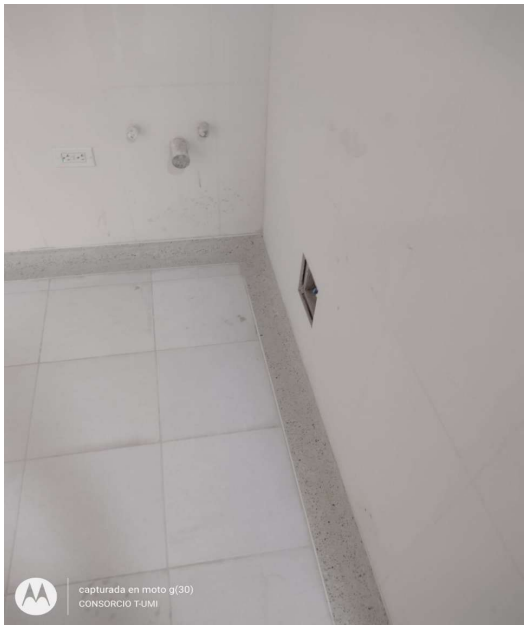



1,30	N/A	N/A	1	95%	1,24	HABITACION 316
7,15	N/A	N/A	1	95%	6,79	HABITACION 318
7,60	N/A	N/A	1	95%	7,22	HABITACION 318
1,40	N/A	N/A	1	95%	1,33	HABITACION 318
7,34	N/A	N/A	1	95%	6,97	HABITACION 324
7,60	N/A	N/A	1	95%	7,22	HABITACION 324
1,50	N/A	N/A	1	95%	1,43	HABITACION 324
7,70	N/A	N/A	1	95%	7,32	HABITACION 325
7,86	N/A	N/A	1	95%	7,47	HABITACION 325
1,50	N/A	N/A	1	95%	1,43	HABITACION 325
6,19	N/A	N/A	1	95%	5,88	CIRCULACIÓN INGRESO
2,76	N/A	N/A	1	95%	2,62	
13,41	N/A	N/A	1	95%	12,74	ORATORIO
9,87	N/A	N/A	1	95%	9,38	HALL
7,60	N/A	N/A	1	95%	7,22	PASILLO DE HALL A LUDOTECA
2,20	N/A	N/A	1	95%	2,09	RESIDUOS NO PELIGROSOS
2,20	N/A	N/A	1	95%	2,09	RESIDUOS PELIGROSOS
2,20	N/A	N/A	1	95%	2,09	ROPA SUCIA
7,18	N/A	N/A	1	95%	6,82	ACCESO FAMILIARES
10,24	N/A	N/A	1	95%	9,73	PASILLO INFORMACIÓN FAMILIARES
1,00	N/A	N/A	1	95%	0,95	ACCESO TRABAJO LIMPIO
7,70	N/A	N/A	1	95%	7,32	ROPA LIMPIA
14,26	N/A	N/A	1	95%	13,55	CIRCULACION RESTRINGIDA NORTE
10,28	N/A	N/A	1	95%	9,77	DESCANSO MEDICO
4,46	N/A	N/A	1	95%	4,24	BAÑO DESCANSO MEDICO
11,71	N/A	N/A	1	95%	11,12	PROCEDIMIENTOS
2,59	N/A	N/A	1	95%	2,46	TRABAJO SUCIO
12,44	N/A	N/A	1	95%	11,82	CENTRAL DE ENFERMERIA HOSPITALIZACIÓN
7,88	N/A	N/A	1	95%	7,49	
7,76	N/A	N/A	1	95%	7,37	WC HABITACION 324
8,22	N/A	N/A	1	95%	7,81	WC HABITACION 325
7,64	N/A	N/A	1	95%	7,26	WC HABITACION 318
8,13	N/A	N/A	1	95%	7,72	WC HABITACION 316
8,33	N/A	N/A	1	95%	7,91	ROPA LIMPIA UCI PEDIATRICA
7,75	N/A	N/A	1	95%	7,36	BAÑO HABITACION 311
7,69	N/A	N/A	1	95%	7,31	BAÑO HABITACION 310
7,97	N/A	N/A	1	95%	7,57	TRABAJO LIMPIO
7,91	N/A	N/A	1	95%	7,51	BAÑO HABITACION 307
7,51	N/A	N/A	1	95%	7,13	BAÑO HABITACION 308
7,56	N/A	N/A	1	95%	7,18	BAÑO HABITACION 301
7,84	N/A	N/A	1	95%	7,45	BAÑO HABITACION 302
3,16	N/A	N/A	1	95%	3,00	MURO FALSO HABITACION 302
3,65	N/A	N/A	1	95%	3,47	MURO FALSO HABITACION 301
3,17	N/A	N/A	1	95%	3,01	MURO FALSO HABITACION 308
3,42	N/A	N/A	1	95%	3,25	MURO FALSO HABITACION 313
9,35	N/A	N/A	1	95%	8,88	BALCON SUR
3,30	N/A	N/A	1	95%	3,14	ACCESO ASENSORES
16,85	N/A	N/A	1	95%	16,01	HABITACION 303
7,61	N/A	N/A	1	95%	7,23	BAÑO HABITACION 303
21,91	N/A	N/A	1	95%	20,81	HABITACION 304
7,32	N/A	N/A	1	95%	6,95	BAÑO HABITACION 304
16,21	N/A	N/A	1	95%	15,40	HABITACION 305
7,70	N/A	N/A	1	95%	7,32	BAÑO HABITACION 305
20,94	N/A	N/A	1	95%	19,89	HABITACION 306
7,39	N/A	N/A	1	95%	7,02	BAÑO HABITACION 306
16,38	N/A	N/A	1	95%	15,56	HABITACION 309
7,53	N/A	N/A	1	95%	7,15	BAÑO HABITACION 309
16,62	N/A	N/A	1	95%	15,79	HABITACION 312
7,54	N/A	N/A	1	95%	7,16	BAÑO HABITACION 312
15,23	N/A	N/A	1	95%	14,47	HABITACION 313
7,89	N/A	N/A	1	95%	7,50	BAÑO HABITACION 313
16,58	N/A	N/A	1	95%	15,75	HABITACION 314
7,37	N/A	N/A	1	95%	7,00	BAÑO HABITACION 314
16,52	N/A	N/A	1	95%	15,69	HABITACION 315
7,25	N/A	N/A	1	95%	6,89	BAÑO HABITACION 315
16,23	N/A	N/A	1	95%	15,42	HABITACION 317
7,34	N/A	N/A	1	95%	6,97	BAÑO HABITACION 317
17,09	N/A	N/A	1	95%	16,24	HABITACION 319
7,29	N/A	N/A	1	95%	6,93	BAÑO HABITACION 319
16,55	N/A	N/A	1	95%	15,72	HABITACION 320
7,74	N/A	N/A	1	95%	7,35	BAÑO HABITACION 320
16,07	N/A	N/A	1	95%	15,27	HABITACION 321
7,22	N/A	N/A	1	95%	6,86	BAÑO HABITACION 321
16,76	N/A	N/A	1	95%	15,92	HABITACION 322
7,56	N/A	N/A	1	95%	7,18	BAÑO HABITACION 322
16,44	N/A	N/A	1	95%	15,62	HABITACION 323
7,54	N/A	N/A	1	95%	7,16	BAÑO HABITACION 323
1,52	N/A	N/A	1	60%	0,91	PASILLO DE INGRESO
8,27	N/A	N/A	1	60%	4,96	BAÑO SOCIAL
		PISO 4				
16,31	N/A	N/A	1	95%	15,49	HABITACION 424
16,67	N/A	N/A	1	95%	15,84	HABITACION 425
16,07	N/A	N/A	1	95%	15,27	HABITACION 418
16,22	N/A	N/A	1	95%	15,41	HABITACION 416
31,13	N/A	N/A	1	95%	29,57	PASILLO CIRCULACIÓN NORTE
10,40	N/A	N/A	1	95%	9,88	CIRCULACIÓNA ACCESO
8,14	N/A	N/A	1	95%	7,73	PASILLO SALIDA DE EMERGENCIA
17,63	N/A	N/A	1	95%	16,75	HALL
12,71	N/A	N/A	1	95%	12,07	IAMI
18,72	N/A	N/A	1	95%	17,78	CENTRAL DE ENFERMERIA
25,46	N/A	N/A	1	95%	24,19	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
11,42	N/A	N/A	1	95%	10,85	PROCEDIMEINTOS
10,13	N/A	N/A	1	95%	9,62	DESCANSO MEDICO
8,48	N/A	N/A	1	95%	8,06	WC HABITACION 401
16,01	N/A	N/A	1	95%	15,21	HABITACION 402
8,85	N/A	N/A	1	95%	8,41	WC HABITACION 402
16,55	N/A	N/A	1	95%	15,72	HABITACION 407
8,63	N/A	N/A	1	95%	8,20	WC HABITACION 407
21,49	N/A	N/A	1	95%	20,42	HABITACION 408
4,17	N/A	N/A	1	95%	3,96	WC HABITACION 408
16,34	N/A	N/A	1	95%	15,52	HABITACION 410
8,56	N/A	N/A	1	95%	8,13	WC HABITACION 410
4,68	N/A	N/A	1	95%	4,45	PROCEDIMEINTOS
4,34	N/A	N/A	1	95%	4,12	WC DESCANSO
16,16	N/A	N/A	1	95%	15,35	HABITACION 411
8,38	N/A	N/A	1	95%	7,96	WC HABITACION 411
24,10	N/A	N/A	1	95%	22,90	PUESTO DE TRABAJO BALCON NORTE
15,51	N/A	N/A	1	95%	14,73	PASILLO SUR DESDE HABITACION 411
8,22	N/A	N/A	1	95%	7,81	
8,27	N/A	N/A	1	95%	7,86	BALCON SUR
7,75	N/A	N/A	1	95%	7,36	TRABAJO LIMPIO
16,85	N/A	N/A	1	95%	16,01	HABITACION 403
7,61	N/A	N/A	1	95%	7,23	BAÑO HABITACION 403
21,91	N/A	N/A	1	95%	20,81	HABITACION 404
7,32	N/A	N/A	1	95%	6,95	BAÑO HABITACION 404
16,21	N/A	N/A	1	95%	15,40	HABITACION 405
7,70	N/A	N/A	1	95%	7,32	BAÑO HABITACION 405
20,94	N/A	N/A	1	95%	19,89	HABITACION 406
7,39	N/A	N/A	1	95%	7,02	BAÑO HABITACION 406
16,38	N/A	N/A	1	95%	15,56	HABITACION 409



7,53	N/A	N/A	1	**95%**	**7,15**	BAÑO HABITACION 409
16,62	N/A	N/A	1	**95%**	**15,79**	HABITACION 412
7,54	N/A	N/A	1	**95%**	**7,16**	BAÑO HABITACION 412
15,23	N/A	N/A	1	**95%**	**14,47**	HABITACION 413
7,89	N/A	N/A	1	**95%**	**7,50**	BAÑO HABITACION 413
16,58	N/A	N/A	1	**95%**	**15,75**	HABITACION 414
7,37	N/A	N/A	1	**95%**	**7,00**	BAÑO HABITACION 414
16,52	N/A	N/A	1	**95%**	**15,69**	HABITACION 415
7,25	N/A	N/A	1	**95%**	**6,89**	BAÑO HABITACION 415
16,23	N/A	N/A	1	**95%**	**15,42**	HABITACION 417
7,34	N/A	N/A	1	**95%**	**6,97**	BAÑO HABITACION 417
17,09	N/A	N/A	1	**95%**	**16,24**	HABITACION 419
7,29	N/A	N/A	1	**95%**	**6,93**	BAÑO HABITACION 419
16,55	N/A	N/A	1	**95%**	**15,72**	HABITACION 420
7,74	N/A	N/A	1	**95%**	**7,35**	BAÑO HABITACION 420
16,07	N/A	N/A	1	**95%**	**15,27**	HABITACION 421
7,22	N/A	N/A	1	**95%**	**6,86**	BAÑO HABITACION 421
16,76	N/A	N/A	1	**95%**	**15,92**	HABITACION 422
7,56	N/A	N/A	1	**95%**	**7,18**	BAÑO HABITACION 422
16,44	N/A	N/A	1	**95%**	**15,62**	HABITACION 423
7,54	N/A	N/A	1	**95%**	**7,16**	BAÑO HABITACION 423
8,17	N/A	N/A	1	**60%**	**4,90**	BAÑO SOCIAL INGRESO
2,19	N/A	N/A	1	**60%**	**1,31**	PASILLO CIRCULACION RESTRINGIDA
2,93	N/A	N/A	1	**60%**	**1,76**	DUCHA HABITACION 408
1,57	N/A	N/A	1	**60%**	**0,94**	PASILLO DE INGRESO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**4.409,64**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**3.935,93**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**473,71**	**Metro lineal**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	3,03	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)	CAP	3,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



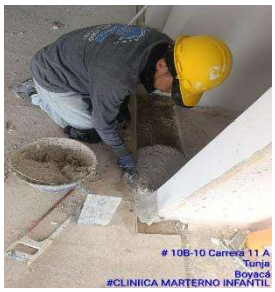







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4						
1,21	N/A	N/A	1	95%	1,15	HABITACION 424
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 425
1,21	N/A	N/A	1	95%	1,15	HABITACION 423
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 422
1,21	N/A	N/A	1	95%	1,15	HABITACION 421
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 420
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 419
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 417
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 416
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 415
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 414
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 413
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 418
1,76	N/A	N/A	1	95%	1,67	RESIDUS ORDINARIOS
1,76	N/A	N/A	1	95%	1,67	RESIDUOS PELIGROSOS
0,75	N/A	N/A	1	95%	0,71	ROPA SUCIA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	BAÑO MUJERES
0,87	N/A	N/A	1	95%	0,83	BAÑOS HOMBRES
0,93	N/A	N/A	1	95%	0,88	RACK
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO SUCIO
0,70	N/A	N/A	1	95%	0,67	ROPA LIMPIA
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 401
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 402
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 403
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 404
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 405
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 406
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 407
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 408
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	CUARTO DE EQUIPOS
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 409
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 410
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 411
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	HABITACION 412
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO LIMPIO
1,00	N/A	N/A	1	60%	0,60	BAÑO SOCIAL
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	RACK
1,00	N/A	N/A	1	60%	0,60	DUCHA H 408
PISO 3						
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO LIMPIO
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO SUCIO
0,86	N/A	N/A	1	95%	0,82	BAÑO UCI PEDIATRICA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	CUARTO ASEO
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC ACCESO ASISTENCIAL
0,70	N/A	N/A	1	95%	0,67	WC 1 DESCANSO MEDICO
0,70	N/A	N/A	1	95%	0,67	WC 2 DESCANSO MEDICO
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	BAÑO LUDOTECA
1,00	N/A	N/A	1	95%	0,95	SALIDA DE EMERGENCIA LUDOTECA SUR
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	BAÑO LUDOTECA
0,70	N/A	N/A	1	95%	0,67	ROPA SUCIA
1,20	N/A	N/A	25	95%	28,50	HABITACIONES
0,80	N/A	N/A	4	95%	3,04	RESIDUOS NO PELIGROSOS
0,80	N/A	N/A	4	95%	3,04	RESIDUS PELIGROSOS
0,80	N/A	N/A	4	95%	3,04	ROPA SUCIA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	FILTRO FAMILIARES
0,90	N/A	N/A	2	95%	1,71	BAÑO DESCANSO MEDICO
0,73	N/A	N/A	1	95%	0,69	RESIDUOS ORDINARIOS
0,83	N/A	N/A	1	95%	0,79	RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALIZACION
0,76	N/A	N/A	1	95%	0,72	ROPA SUCIA
1,10	N/A	N/A	1	95%	1,05	BAÑO HABITACIÓN 324
0,71	N/A	N/A	1	95%	0,67	BAÑO HABITACIÓN 325
1,00	N/A	N/A	1	95%	0,95	BAÑO HABITACIÓN 318
1,03	N/A	N/A	1	95%	0,98	BAÑO HABITACIÓN 316
1,02	N/A	N/A	1	95%	0,97	BAÑO HABITACION 311
1,02	N/A	N/A	1	95%	0,97	BAÑO HABITACION 310
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO LIMPIO
1,02	N/A	N/A	1	95%	0,97	BAÑO HABITACION 307
1,01	N/A	N/A	1	95%	0,96	BAÑO HABITACION 308
0,95	N/A	N/A	1	95%	0,90	BAÑO HABITACION 301
0,61	N/A	N/A	1	95%	0,58	BAÑO HABITACION 302
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	RACK
1,00	N/A	N/A	1	60%	0,60	BAÑO SOCIAL
PISO 2						
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	ASEO UCI UARO
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	EQUIPOS UARO
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	T SUCIO UARO
1,07	N/A	N/A	1	60%	0,64	WC 1 FRENTE A UARO 8
1,60	N/A	N/A	1	60%	0,96	WC 1 FRENTE A UARO 8
1,07	N/A	N/A	1	60%	0,64	WC 1 FRENTE A UARO 7
2,00	N/A	N/A	1	60%	1,20	WC 1 FRENTE A UARO 7
1,50	N/A	N/A	1	60%	0,90	WC AISLADO UARO
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	WC AISLADO UARO
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	DEP ROPA SUCIA UARO
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	TRABAJO LIMPIO UARO
1,25	N/A	N/A	1	60%	0,75	BAÑO ACCESO PERSONAL UARO
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	WC 1 REQ PARTO
1,00	N/A	N/A	1	60%	0,60	WC 2 REQ PARTOS
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	T LIMPIO RECUPERACION PARTOS
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	ROPA LIMPIA REQ PARTOS
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	TRABAJO LIMPIO TRABAJO D EPARTOS
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	WC TRABAJO D EPARTOS
1,00	N/A	N/A	1	60%	0,60	
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	RESIDUOS TEMPORALES 1
0,78	N/A	N/A	1	60%	0,47	RESIDUOS TEMPORALES 2
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	WC DESCANSO MEDICO
0,60	N/A	N/A	1	60%	0,36	WC 1 VESTIER HOMBRES
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	WC 2 VESTIER HOMBRES
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	WC 1 VESTIER MUJERES
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	DUCHA VESTIER MUJERES
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	WC PMR INGRESO UCI NEONATAL PUERTA
1,45	N/A	N/A	1	60%	0,87	WC PMR INGRESO UCI NEONATAL DUCHA
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	TRABAJO LIMPIO UCI NEONATAL
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	TRABAJO SUCIO RECUPERACION QUIRURGICA
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	TRABAJO LIMPIO RECUPERACION QUIRURGICA
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	ASEO DE QUIROFANOS A RECUPERACION
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	PRELAVADO AUTOCLAVE
1,00	N/A	N/A	1	60%	0,60	WC HOMBRES HALL
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	WC PMR HALL
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	WC UCI NEONATAL
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	WC 1 PREPARACION PACIENTES
0,90	N/A	N/A	1	60%	0,54	WC 2 PREPARACION PACIENTES
1,60	N/A	N/A	1	60%	0,96	DUCHA WC 1 PREPARACION PACIENTES
1,65	N/A	N/A	1	60%	0,99	DUCHA WC 2 PREPARACION PACIENTES
1,67	N/A	N/A	1	60%	1,00	QUIROFANO 1
1,69	N/A	N/A	1	60%	1,01	QUIROFANO 2
1,67	N/A	N/A	1	60%	1,00	QUIROFANO 3

1,68	N/A	N/A	1	60%	1,01	SALA DE PARTOS 1
1,68	N/A	N/A	1	60%	1,01	SALA DE PARTOS 2
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	ASEO PASILLO A QUIROFANOS
0,60	N/A	N/A	1	60%	0,36	RESIDUOS ORDINARIOS
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	RESIDUOS PELIGROSOS
0,80	N/A	N/A	1	60%	0,48	TRABAJO SUCIO A UCI NEO
1,50	N/A	N/A	1	60%	0,90	ROPA SUCIA UCI NEO
1,73	N/A	N/A	1	60%	1,04	ROPA LIMPIA UCI NEO
0,75	N/A	N/A	1	60%	0,45	WC FRENTE A COORDINACION UCI NEO
1,52	N/A	N/A	1	60%	0,91	DUCHA WC PERSONAL ASISTENCIAL UCI NEO
0,70	N/A	N/A	1	60%	0,42	PUERTA WC PERSONAL ASISTENCIA UCI NEO
		PISO 1				
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC CAFETERIA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	WC DISCAPACITADOS CAFETERIA
0,97	N/A	N/A	1	95%	0,92	WC DISCAPACITADOS SALA DE ESPERA ADULTOS
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC DAMAS SALA DE ESPERA ADULTOS
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC DESCANSO MEDICO 1
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC DESCANSO MEDICO 2
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	CONSULTORIO 4
1,00	N/A	N/A	1	95%	0,95	CONSULTORIO 1
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	CONSULTORIO 2
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	CONSULTORIO 5
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	SALA ERA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	WC FAMILIAR
1,66	N/A	N/A	1	95%	1,58	
2,26	N/A	N/A	1	95%	2,15	WC DISCAPACITADOS GINECOPSTETRICIA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	BAÑO VESTIER ADMISIONES
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC ECOGRAFO 1
1,20	N/A	N/A	1	95%	1,14	WC ECOGRAFO 2
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC TOMA DE MUESTRAS
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	WC LABORATORIO
0,70	N/A	N/A	1	95%	0,67	WC FARMACIA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	WC MIXTO ESPERA IMAGENOLOGIA
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	WC DISCAPACITADOS ESPERA IMAGENOLOGIA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	CONSULTORIO 3
1,50	N/A	N/A	1	95%	1,43	LAVADO DE PACIENTES
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	LAVADO GINECOPSTETRICIA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	BAÑO HOMBRES ESPERA ADULTOS
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	ROPA LIMPIA DIGITACIÓN
1,82	N/A	N/A	1	95%	1,73	BAÑO SALA EDA
1,96	N/A	N/A	1	95%	1,86	BAÑO OBSERVACION PEDIATRICA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO LIMPIO
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO SUCIO
0,90	N/A	N/A	1	95%	0,86	ASEO IMAGENOLOGIA
0,80	N/A	N/A	1	95%	0,76	TRABAJO LIMPIO INSUMOS
1,80	N/A	N/A	1	95%	1,71	INGRESO IMAGENOLOGIA
4,10	N/A	N/A	1	95%	3,90	INGRESO URGENCIAS
		ESCALERAS (ENTREPISOS)				
3,34	N/A	N/A	1	85%	2,84	DE PISO 1 A PISO 2
3,35	N/A	N/A	1	85%	2,85	DE PISO 2 A PISO 3
3,50	N/A	N/A	1	85%	2,98	DE PISO 3 A PISO 4
3,32	N/A	N/A	1	85%	2,82	DE PISO 4 A TERRAZA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**185,72**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**131,11**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**54,61**	**Metro lineal**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ITEM	3,04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO	CAP	3,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



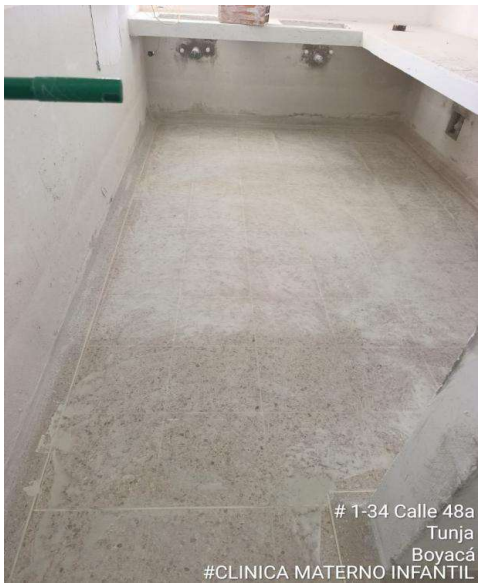






Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
6,96	9,98	N/A	1	0%	-	COCINA
0,96	0,60	N/A	-1	0%	-	
0,30	0,30	N/A	-1	0%	-	DESCUENTO
0,26	0,60	N/A	-1	0%	-	
5,90	0,15	N/A	-1	0%	-	
2,60	4,34	N/A	1	0%	-	CONSULTORIO DIETAS
1,74	2,02	N/A	1	0%	-	SALA DE ESTAR
1,83	1,00	N/A	1	0%	-	
4,20	1,60	N/A	1	0%	-	PASILLO SALA DE ESTAR
2,10	0,40	N/A	1	0%	-	
4,39	1,81	N/A	1	0%	-	PASILLO CONSULTORIO DIETAS
12,34	2,34	N/A	1	0%	-	
2,17	2,21	N/A	1	0%	-	PASILLO ASCENSORES
1,26	0,45	N/A	1	0%	-	
2,20	1,08	N/A	1	0%	-	CUARTO BAJO ESCALERAS
4,07	4,84	N/A	1	0%	-	DEPOSITO ALMACEN
0,30	0,42	N/A	-1	0%	-	DESCUENTO
0,80	0,15	N/A	1	0%	-	BOCA PUERTA DEPOSITO
3,88	1,80	N/A	1	0%	-	PASILLO ROPA LIMPIA
2,45	6,74	N/A	1	0%	-	
0,84	1,47	N/A	1	0%	-	PASILLO DEPOSITO DE CADAVERES
1,37	2,14	N/A	1	0%	-	
2,75	2,12	N/A	1	0%	-	PASILLO IGRESO ARCHIVO
2,88	1,55	N/A	1	0%	-	
3,94	9,85	N/A	1	0%	-	ARCHIVO
7,98	5,04	N/A	1	0%	-	
0,43	0,27	N/A	-1	0%	-	
0,43	0,20	N/A	-1	0%	-	DESCUETO
1,60	1,45	N/A	-1	0%	-	
10,00	1,76	N/A	1	0%	-	
11,98	5,04	N/A	1	0%	-	BODEGA FARMACIA
1,60	1,62	N/A	1	0%	-	
0,27	0,42	N/A	-1	0%	-	
0,44	0,20	N/A	-2	0%	-	DESCUENTO
0,20	0,20	N/A	-2	0%	-	
4,83	2,49	N/A	1	0%	-	CUARTO ASEO
0,42	0,24	N/A	-1	0%	-	DESCUENTO
1,60	2,60	N/A	1	0%	-	DEPOSITO 1
1,62	2,40	N/A	1	0%	-	DEPOSITO 2
7,20	5,52	N/A	1	0%	-	LAVANDERIA
3,70	0,50	N/A	-1	0%	-	DESCUENTO
PISO 1						
7,03	2,36	N/A	1	95%	**15,76**	LABORATORIO
2,00	0,15	N/A	1	95%	**0,29**	LABORATORIO
5,88	2,36	N/A	1	95%	**13,18**	LABORATORIO
1,65	1,10	N/A	1	95%	**1,72**	LABORATORIO
0,80	0,15	N/A	1	95%	**0,11**	LABORATORIO
3,48	2,19	N/A	1	95%	**7,24**	LABORATORIO
3,90	1,62	N/A	1	95%	**6,00**	LABORATORIO
3,59	2,19	N/A	1	95%	**7,47**	LABORATORIO
3,89	2,32	N/A	1	95%	**8,57**	LABORATORIO
6,79	1,19	N/A	1	95%	**7,68**	PASILLO LABORATORIO
4,06	1,21	N/A	1	95%	**4,67**	PASILLO LABORATORIO
0,25	0,25	N/A	-3	95%	- **0,18**	DESCUENTOS
1,30	0,15	N/A	-1	95%	- **0,19**	DESCUENTOS
3,66	2,54	N/A	1	95%	**8,83**	RECEPCION MUESTRAS
4,78	0,15	N/A	-1	95%	- **0,68**	DESCUENTOS
3,62	1,08	N/A	1	95%	**3,71**	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
1,62	2,44	N/A	1	95%	**3,76**	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
0,64	0,36	N/A	-1	95%	- **0,22**	DESCUENTOS
3,76	3,01	N/A	1	95%	**10,75**	TOMA MUESTRA
2,90	1,89	N/A	1	95%	**5,21**	RECIBO Y TOMA MUESTRAS
4,96	3,06	N/A	1	95%	**14,42**	FARMACIA
1,92	1,79	N/A	1	95%	**3,26**	FARMACIA
6,94	4,89	N/A	1	95%	**32,24**	FARMACIA
2,17	0,15	N/A	-1	95%	- **0,31**	DESCUENTOS
1,14	0,15	N/A	-1	95%	- **0,16**	DESCUENTOS
1,77	2,45	N/A	-1	95%	- **4,12**	DESCUENTOS
1,63	2,22	N/A	1	95%	**3,44**	ADMINISTRATIVA
15,73	2,00	N/A	1	95%	**29,89**	PASILLO
4,27	1,60	N/A	1	95%	**6,49**	PASILLO
2,42	1,91	N/A	1	95%	**4,39**	SALA PROCEDIMIENTOS
2,80	2,67	N/A	1	95%	**7,10**	SALA LECTURA
0,56	0,35	N/A	-1	95%	- **0,19**	DESCUENTOS
6,75	2,91	N/A	1	95%	**18,66**	ECOGRAFO
1,61	1,55	N/A	-1	95%	- **2,37**	DESCUENTOS
5,17	2,93	N/A	1	95%	**14,39**	CONSULTORIO ECOGRAFO
1,33	1,54	N/A	-1	95%	- **1,95**	DESCUENTOS
0,42	0,36	N/A	-1	95%	- **0,14**	DESCUENTOS
3,73	2,16	N/A	1	95%	**7,65**	ESPERA
1,57	0,46	N/A	1	95%	**0,69**	ESPERA
0,43	0,41	N/A	-1	95%	- **0,17**	DESCUENTOS
3,26	2,68	N/A	1	95%	**8,30**	OFICINA RADIOLOGIA
1,90	0,13	N/A	-1	95%	- **0,23**	DESCUENTOS
0,61	0,21	N/A	-1	95%	- **0,12**	DESCUENTOS
5,28	3,39	N/A	1	0%	-	RAYOS X
1,94	0,13	N/A	-1	0%	-	DESCUENTOS
0,60	0,27	N/A	-1	0%	-	DESCUENTOS
0,25	0,27	N/A	-1	0%	-	DESCUENTOS
1,43	2,02	N/A	1	0%	-	DISPARO
4,91	2,41	N/A	1	0%	-	PASILLO RX
1,53	1,88	N/A	1	0%	-	PASILLO RX
2,03	0,88	N/A	1	0%	-	VESTIER
2,36	2,76	N/A	1	0%	-	RAYOS X
5,08	3,14	N/A	1	95%	**15,15**	PROCEDIMIENTOS
3,43	3,60	N/A	1	95%	**11,73**	ADMISIONES
1,98	0,51	N/A	1	95%	**0,96**	ADMISIONES
1,92	0,15	N/A	-1	95%	- **0,27**	DESCUENTOS
4,06	2,50	N/A	1	95%	**9,64**	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
1,21	0,28	N/A	-1	95%	- **0,32**	DESCUENTOS
0,50	0,33	N/A	-1	95%	- **0,16**	DESCUENTOS
5,86	3,40	N/A	1	95%	**18,93**	T.A.C
2,83	2,61	N/A	1	95%	**7,02**	DISPARO
0,41	0,28	N/A	-1	95%	- **0,11**	DESCUENTOS
0,67	0,26	N/A	-1	95%	- **0,17**	DESCUENTOS
4,76	4,72	N/A	1	95%	**21,34**	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
4,22	3,99	N/A	1	95%	**16,00**	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
0,42	0,42	N/A	-1	95%	- **0,17**	DESCUENTOS
3,00	2,86	N/A	1	95%	**8,15**	CENTRAL ENFERMERA
0,41	0,42	N/A	-1	95%	- **0,16**	DESCUENTOS
5,12	2,00	N/A	1	95%	**9,73**	PASILLO
3,16	1,42	N/A	1	95%	**4,26**	PASILLO
15,24	3,78	N/A	1	95%	**54,73**	OBSERVACION PEDIATRICA
8,94	0,24	N/A	-1	95%	- **2,04**	DESCUENTOS
2,75	0,11	N/A	-1	95%	- **0,29**	DESCUENTOS
0,80	0,11	N/A	-1	95%	- **0,08**	DESCUENTOS
0,42	0,25	N/A	-3	95%	- **0,30**	DESCUENTOS
32,04	2,56	N/A	1	95%	**77,92**	PASILLO URGENCIA
1,34	1,08	N/A	1	95%	**1,37**	RESIDUOS ORDINARIOS




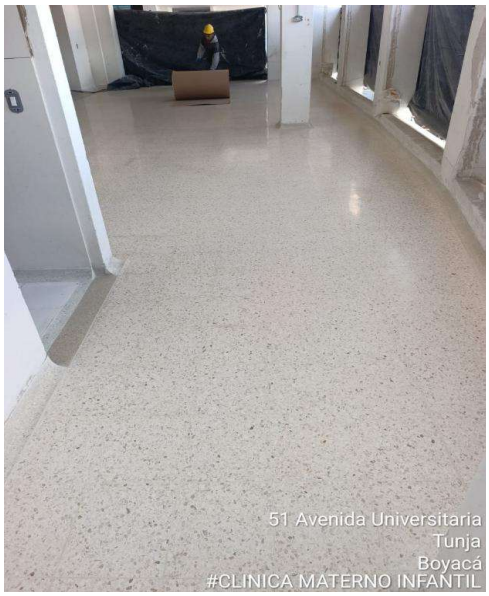





1,00	1,13	N/A	1	95%		1,07	RESIDUOS PELIGROSOS
2,68	3,06	N/A	1	95%		7,79	DIRECCION URGENCIAS
3,50	1,75	N/A	1	95%		5,82	SALA ERA
3,23	2,24	N/A	1	95%		6,87	SALA ERA
0,30	0,30	N/A	-1	95%	-	0,09	DESCUENTOS
0,80	0,28	N/A	-1	95%	-	0,21	DESCUENTOS
3,55	3,52	N/A	1	95%		11,87	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
0,42	0,28	N/A	-1	95%	-	0,11	DESCUENTOS
1,19	5,25	N/A	1	95%		5,94	DIGITACION
2,65	1,99	N/A	1	95%		5,01	DIGITACION
1,42	1,31	N/A	1	95%		1,77	INSUMOS FARMACIA
1,43	0,43	N/A	1	95%		0,58	EQUIPOS
3,49	4,33	N/A	1	95%		14,36	SALA YESOS
2,65	3,46	N/A	1	95%		8,71	SALA ERA
1,85	1,16	N/A	1	95%		2,04	SALA ERA
0,89	0,25	N/A	-1	95%	-	0,21	DESCUENTOS
0,25	0,27	N/A	-1	95%	-	0,06	DESCUENTOS
3,77	1,84	N/A	1	95%		6,59	CONSULTORIO 5
2,08	2,27	N/A	1	95%		4,49	CONSULTORIO 5
0,42	0,28	N/A	-1	95%	-	0,11	DESCUENTOS
3,85	1,74	N/A	1	95%		6,36	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
5,58	5,48	N/A	1	95%		29,05	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
2,18	1,38	N/A	-1	95%	-	2,86	DESCUENTOS
0,32	0,30	N/A	-1	95%	-	0,09	DESCUENTOS
0,44	0,80	N/A	-1	95%	-	0,33	DESCUENTOS
5,09	1,52	N/A	1	95%		7,35	CONSULTORIO 2
3,67	1,72	N/A	1	95%		6,00	CONSULTORIO 2
4,98	1,60	N/A	1	95%		7,57	CONSULTORIO 1
3,28	1,92	N/A	1	95%		5,98	CONSULTORIO 1
0,29	0,22	N/A	-1	95%	-	0,06	DESCUENTOS
3,93	1,64	N/A	1	95%		6,12	CONSULTORIO 4
0,44	0,83	N/A	-1	95%	-	0,35	DESCUENTOS
1,83	0,40	N/A	-1	95%	-	0,70	DESCUENTOS
5,74	3,17	N/A	1	95%		17,29	CONSULTORIO 3
1,65	0,83	N/A	-1	95%	-	1,30	DESCUENTOS
6,16	5,06	N/A	1	95%		29,61	REANIMACION
1,16	0,30	N/A	1	95%		0,33	REANIMACION
5,81	2,91	N/A	1	95%		16,06	ADMISIONES URGENCIAS
1,90	0,15	N/A	-1	95%	-	0,27	DESCUENTOS
1,06	0,51	N/A	-1	95%	-	0,51	DESCUENTOS
0,43	0,30	N/A	-1	95%	-	0,12	DESCUENTOS
0,88	1,50	N/A	1	95%		1,25	ACCESO LAVADO PACIENTES
2,26	2,09	N/A	1	95%		4,49	CONSULTORIO TRIAGE 2
0,44	0,26	N/A	-1	95%	-	0,11	DESCUENTOS
2,76	3,33	N/A	1	95%		8,73	CONSULTORIO TRIAGE 1
0,30	0,26	N/A	-1	95%	-	0,07	DESCUENTOS
2,93	1,48	N/A	1	95%		4,12	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
0,80	0,29	N/A	-1	95%	-	0,22	DESCUENTOS
2,05	2,81	N/A	1	95%		5,47	PASILLO TRIAGE
2,93	1,80	N/A	1	95%		5,01	CUARTO EQUIPOS
0,23	0,20	N/A	-1	95%	-	0,04	DESCUENTOS
2,95	3,25	N/A	1	95%		9,11	CENTRAL DE CABLEADO
0,43	0,19	N/A	-1	95%	-	0,08	DESCUENTOS
0,93	2,22	N/A	1	95%		1,96	RACK
5,13	2,76	N/A	1	95%		13,45	DESCANSO INTERNOS
1,39	0,34	N/A	1	95%		0,45	DESCANSO INTERNOS
3,63	2,65	N/A	1	95%		9,14	FACTURACION Y ADMISIONES
0,20	0,33	N/A	-1	95%	-	0,06	DESCUENTOS
0,30	0,55	N/A	-1	95%	-	0,16	DESCUENTOS
0,30	0,47	N/A	-1	95%	-	0,13	DESCUENTOS
2,55	3,00	N/A	1	95%		7,27	HALL
12,37	6,43	N/A	1	95%		75,56	HALL
4,54	5,81	N/A	1	95%		25,06	SALA DE ESPERA
1,18	0,34	N/A	-1	95%	-	0,38	DESCUENTOS
1,81	4,63	N/A	1	95%		7,96	PASILLO
3,68	1,15	N/A	1	95%		4,02	ADMISIONES
1,00	0,15	N/A	-1	95%	-	0,14	DESCUENTOS
6,45	1,60	N/A	1	95%		9,80	ACCESO PRINCIPAL
11,60	6,34	N/A	1	95%		69,87	CAFETERIA
2,26	2,15	N/A	1	95%		4,62	CAFETERIA
2,98	4,24	N/A	1	95%		12,00	CAFETERIA
4,90	2,55	N/A	1	95%		11,87	CAFETERIA
4,40	1,67	N/A	1	95%		6,98	CAFETERIA
0,60	0,27	N/A	-1	95%	-	0,15	DESCUENTOS
0,26	0,27	N/A	-1	95%	-	0,07	DESCUENTOS
0,30	0,30	N/A	-1	95%	-	0,09	DESCUENTOS
2,23	1,34	N/A	-1	95%	-	2,84	DESCUENTOS
6,44	5,11	N/A	1	95%		31,26	SALA DE ESTAR
3,28	1,60	N/A	-1	95%	-	4,99	DESCUENTOS
9,97	7,15	N/A	1	95%		67,72	AUDITORIO
4,41	0,28	N/A	-1	95%	-	1,17	DESCUENTOS
0,60	0,69	N/A	-1	95%	-	0,39	DESCUENTOS
12,39	1,91	N/A	1	95%		22,48	PASILLOS
2,21	1,91	N/A	1	95%		4,01	PASILLOS
9,84	6,70	N/A	1	95%		62,63	SALA ESPERA ADULTOS
4,32	2,63	N/A	1	95%		10,79	SALA ESPERA ADULTOS
1,12	1,70	N/A	1	95%		1,81	SALA ESPERA ADULTOS
0,60	0,50	N/A	-1	95%	-	0,29	DESCUENTOS
6,38	0,15	N/A	-1	95%	-	0,91	DESCUENTOS
2,23	4,12	N/A	1	95%		8,73	ACCESO EMERGENCIAS
3,83	1,10	N/A	1	95%		4,00	ACCESO A BAÑOS
1,10	0,95	N/A	1	95%		0,99	CUARTO EN MONITOREO GINECOBSTETRICIA
1,60	0,52	N/A	2	95%		1,58	ACCESO ASCENSOR
PISO 2							
4,69	2,00	N/A	1	50%		4,69	PASILLO INGRESO NEONATAL
2,34	3,10	N/A	1	50%		3,63	TRABAJOS ESTERIL
0,76	0,60	N/A	-1	50%	-	0,23	DESCUENTO
2,52	1,93	N/A	1	50%		2,43	FILTRO VISITANTES
0,60	0,35	N/A	-1	50%	-	0,11	DESCUENTO
0,66	0,18	N/A	-1	50%	-	0,06	DESCUENTO
10,36	2,20	N/A	1	50%		11,40	PASILLO ASCENSOR
2,31	3,40	N/A	1	50%		3,93	LACTARIO
0,88	0,70	N/A	-1	50%	-	0,31	DESCUENTO
1,60	1,30	N/A	1	50%		1,04	BODEGA LACTARIO
2,76	3,23	N/A	1	50%		4,46	ESTRACCION
0,95	0,58	N/A	-1	50%	-	0,28	DESCUENTO
25,00	1,98	N/A	1	50%		24,75	PASILLO PUERTA QUIROFANOS
2,17	2,42	N/A	1	50%		2,63	PASILLO UCI ADULTOS
15,33	2,69	N/A	1	50%		20,62	
2,78	1,95	N/A	1	50%		2,71	
9,25	2,28	N/A	1	50%		10,55	
19,79	4,68	N/A	1	50%		46,31	UCI ADULTOS
31,83	0,15	N/A	-1	50%	-	2,39	DESCUENTO
9,81	4,00	N/A	1	50%		19,62	UCI ADULTOS FONDO
11,90	0,15	N/A	-1	50%	-	0,89	DESCUENTO
3,85	0,42	N/A	-1	50%	-	0,81	
0,20	0,60	N/A	-9	50%	-	0,54	
2,02	3,03	N/A	1	50%		3,06	CENTRAL ENFERMERIA UCI
2,74	1,10	N/A	1	50%		1,51	FILTRO ACCESO FAMILIA
2,14	1,11	N/A	1	50%		1,19	INFORMACION FAMILARES
3,05	1,16	N/A	1	50%		1,76	CENTRAL ENFERMERIA 2
1,34	1,44	N/A	1	50%		0,96	DEPOSITO DE INSUMOS
1,18	2,00	N/A	1	50%		1,18	EQUIPOS
0,77	1,13	N/A	1	50%		0,44	RACK
2,75	2,27	N/A	1	50%		3,12	DESCANSO
1,27	0,15	N/A	-1	50%	-	0,10	DESCUENTO

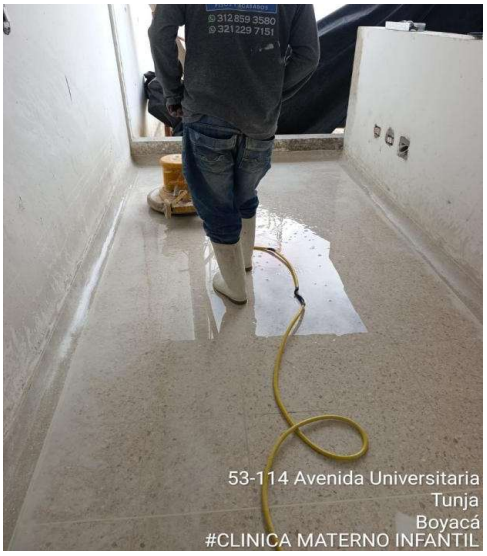







1,29	1,56	N/A	1	50%	1,01	RECEPCIÓN
1,71	1,31	N/A	1	50%	1,12	RACK
0,77	0,18	N/A	-1	50%	- 0,07	DESCUENTO
2,68	1,27	N/A	1	50%	1,70	PASILLO ACCESO
2,94	0,80	N/A	1	50%	1,18	FILTRO PERSONAL
1,63	2,74	N/A	1	50%	2,23	
1,20	0,28	N/A	-1	50%	- 0,17	DESCUENTO
5,38	2,41	N/A	1	50%	6,48	VESTIER PASILLO
2,88	0,15	N/A	-1	50%	- 0,22	
1,94	1,02	N/A	-1	50%	- 0,99	DESCUENTO
0,52	0,34	N/A	-1	50%	- 0,09	
1,43	2,28	N/A	1	50%	1,63	VESTIER
13,66	9,62	N/A	1	50%	65,70	RECUPERACION PARTOS
5,37	5,21	N/A	-1	50%	- 13,99	
4,29	4,39	N/A	-1	50%	- 9,42	
3,03	1,86	N/A	-1	50%	- 2,82	DESCUENTOS
0,40	0,40	N/A	-1	50%	- 0,08	
0,44	0,27	N/A	-1	50%	- 0,06	
0,42	0,27	N/A	-1	50%	- 0,06	
4,30	2,38	N/A	-1	50%	- 5,12	CENTRAL DE ENFERMERIA
4,93	0,15	N/A	-1	50%	- 0,37	DESCUENTO
28,21	2,00	N/A	1	50%	28,21	PASILLO QUIEROFANOS
0,25	2,42	N/A	1	50%	0,30	
10,89	2,17	N/A	1	50%	11,82	PASILLO AUTOCLAVE
3,90	2,05	N/A	1	50%	4,00	EQUIPOS
1,04	0,15	N/A	-1	50%	- 0,08	DESCUENTO
2,43	2,97	N/A	1	50%	3,61	DESCANSO
0,70	0,15	N/A	-1	50%	- 0,05	DESCUENTO
2,21	3,61	N/A	1	50%	3,99	DESCANSO
2,01	0,12	N/A	-1	50%	- 0,12	
0,86	0,34	N/A	-1	50%	- 0,15	DESCUENTO
0,59	1,34	N/A	1	50%	0,40	
5,00	1,76	N/A	1	50%	4,40	FARMACIA
0,43	0,40	N/A	-1	50%	- 0,09	DESCUENTO
0,95	0,14	N/A	-1	50%	- 0,07	
1,17	1,80	N/A	1	50%	1,05	BODEGA
0,80	0,20	N/A	1	50%	0,08	
5,17	1,00	N/A	1	50%	2,59	
5,65	0,92	N/A	1	50%	2,60	PASILLO FARMACIA
2,56	1,16	N/A	1	50%	1,48	
3,50	3,72	N/A	1	50%	6,51	DESCANSO
1,65	1,10	N/A	-1	50%	- 0,91	DESCUENTO
0,44	0,44	N/A	-1	50%	- 0,10	
3,86	1,10	N/A	1	50%	2,12	PASILLO DESCANSO
8,02	2,38	N/A	1	50%	9,54	VESTIER MUJERES
5,90	1,25	N/A	-1	50%	- 3,69	DESCUENTO
1,19	0,90	N/A	1	50%	0,54	
2,45	2,64	N/A	1	50%	3,23	VESTIER HOMBRES
1,21	0,35	N/A	1	50%	0,21	
4,32	2,14	N/A	1	50%	4,62	
1,13	1,77	N/A	-1	50%	- 1,00	DESCUENTO
5,02	8,53	N/A	1	50%	21,41	AUTOCLAVE
0,78	0,74	N/A	1	50%	0,29	
0,73	1,56	N/A	-1	50%	- 0,57	
2,07	1,43	N/A	-1	50%	- 1,48	DESCUENTO
3,92	0,15	N/A	-1	50%	- 0,29	
3,55	2,39	N/A	1	50%	4,24	
2,76	1,39	N/A	1	50%	1,92	RECUPERACION PACIENTES
0,34	1,24	N/A	1	50%	0,21	
5,86	2,00	N/A	1	50%	5,86	PASILLO AUTOCLAVE
1,59	2,00	N/A	1	50%	1,59	
4,07	5,86	N/A	1	50%	11,93	PREPARACIO CIRUGIA
6,56	4,67	N/A	1	50%	15,32	RECUPERACION QUIRURGICA
4,11	6,00	N/A	1	50%	12,33	
2,13	3,04	N/A	-1	50%	- 3,24	DESCUENTO
1,44	1,50	N/A	1	50%	1,08	BODEGA
6,58	0,12	N/A	-1	50%	- 0,39	DESCUENTO
0,42	0,41	N/A	-1	50%	- 0,09	
6,55	8,92	N/A	1	50%	29,21	HALL
3,05	6,29	N/A	1	50%	9,59	
0,45	0,40	N/A	1	50%	0,09	DESCUENTO
1,23	1,33	N/A	1	50%	0,82	HALL
4,59	0,91	N/A	1	50%	2,09	INGRESO AUTOCLAVE POR HALL
0,56	0,20	N/A	-1	50%	- 0,06	DESCUENTO
1,82	1,73	N/A	1	50%	1,57	INSUMOS
8,80	0,90	N/A	1	50%	3,96	PASILLO
3,00	3,23	N/A	1	50%	4,85	COORDINACION UCI NEONATAL
0,25	0,42	N/A	-1	50%	- 0,05	DESCUENTO
3,37	3,59	N/A	1	50%	6,05	VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
1,75	1,72	N/A	1	50%	1,51	INSUMOS TERAPIA
2,78	4,85	N/A	1	50%	6,74	DESCANSO
2,00	0,15	N/A	-1	50%	- 0,15	DESCUENTO
10,98	4,83	N/A	1	50%	26,52	CUIDADOS INTERMEDIOS
0,42	3,82	N/A	1	50%	0,80	CUIDADOS INTERMEDIOS
0,42	3,02	N/A	1	50%	0,63	CUIDADOS INTERMEDIOS
3,10	1,50	N/A	1	50%	2,33	CUIDADOS INTERMEDIOS
9,38	4,62	N/A	1	50%	21,67	CUIDADOS INTERMEDIOS
0,12	2,88	N/A	-4	50%	- 0,69	DESCUENTO MUROS
0,42	2,31	N/A	1	50%	0,49	CUIDADOS INTENSOS
0,42	6,31	N/A	1	50%	1,33	CUIDADOS INTENSOS
12,19	4,09	N/A	1	50%	24,93	CUIDADOS INTENSOS
6,41	0,12	N/A	-1	50%	- 0,38	DESCUENTO MUROS
5,68	4,18	N/A	1	50%	11,87	CUIDADOS INTENSIVOS
6,66	4,07	N/A	1	50%	13,55	CUIDADOS INTENSIVOS
0,84	5,49	N/A	1	50%	2,31	CIRCULACION LAVADO ENCUVADORAS
2,51	2,06	N/A	1	50%	2,59	CIRCULACION FRENTE AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
0,80	5,46	N/A	1	50%	2,18	CICULACION A DESCANSO
0,12	5,48	N/A	-1	50%	- 0,33	DESCUENTO MURO CENTRAL EMFERMERIA
0,40	0,76	N/A	-1	50%	- 0,15	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
0,42	0,33	N/A	-1	50%	- 0,07	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
0,42	0,81	N/A	-1	50%	- 0,17	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
7,51	0,12	N/A	-1	50%	- 0,45	DESCUENTO MUROS
6,76	7,22	N/A	1	50%	24,40	RECUPERACIÓN PARTOS
0,66	0,10	N/A	1	50%	0,03	
0,40	0,10	N/A	-1	50%	- 0,02	DESCUENTO: COLUMNAS
0,15	0,10	N/A	-1	50%	- 0,01	DESCUENTO: COLUMNAS
0,74	0,30	N/A	-1	50%	- 0,11	DESCUENTO: COLUMNAS
0,75	0,26	N/A	-1	50%	- 0,10	DESCUENTO: COLUMNAS
0,60	0,16	N/A	-1	50%	- 0,05	DESCUENTO: COLUMNAS
1,45	0,16	N/A	-1	50%	- 0,12	DESCUENTO: ESPACIO DE DIJITACIÓN
2,85	3,68	N/A	1	50%	5,24	CENTRAL ENFERMERIA - RECUPERACIÓN PARTOS
3,90	0,16	N/A	-1	50%	- 0,31	DESCUENTO: ÁREA
5,52	0,83	N/A	1	50%	2,29	UCI NEO - CIRCULACIÓN CUARTO DE ASEO
		PISO 3				
4,57	2,13	N/A	1	95%	9,25	ORATORIO
9,00	6,61	N/A	1	95%	56,52	HALL ORATORIO
6,66	0,15	N/A	-1	95%	- 0,95	
1,50	0,15	N/A	-1	95%	- 0,21	DESCUENTO
2,75	2,30	N/A	-1	95%	- 6,01	
7,43	2,00	N/A	1	95%	14,12	PASILLO INGRESO
13,54	1,80	N/A	1	95%	23,15	
2,24	1,68	N/A	1	95%	3,58	PASILLO SCIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0,80	0,90	N/A	1	95%	0,68	
4,30	0,30	N/A	1	95%	1,23	
2,50	3,52	N/A	1	95%	8,36	DESCANSO VESTIER









1,35	1,64	N/A	-1	95%	- 2,10	DESCUENTO
2,14	0,92	N/A	1	95%	1,87	DEPOSITO INSUMOS
2,25	2,39	N/A	1	95%	5,11	PROCEDIMIENTOS
1,43	1,23	N/A	1	95%	1,67	
0,43	0,42	N/A	-1	95%	- 0,17	DESCUENTO
4,70	2,07	N/A	1	95%	9,24	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,90	0,37	N/A	-1	95%	- 0,32	DESCUENTO
0,27	0,32	N/A	-1	95%	- 0,08	
3,40	3,84	N/A	1	95%	12,40	HABITACIÓN 308
4,74	1,57	N/A	1	95%	7,07	
2,74	0,37	N/A	-1	95%	- 0,96	DESCUENTO
3,32	3,29	N/A	1	95%	10,38	
0,84	0,30	N/A	1	95%	0,24	HABITACÓN 302
2,65	1,65	N/A	1	95%	4,15	
3,46	3,27	N/A	1	95%	10,75	HABITACIÓN 301
2,61	1,65	N/A	1	95%	4,09	
47,44	1,99	N/A	1	95%	89,69	PASILLO PRINCIPAL
3,30	3,49	N/A	1	95%	10,94	
1,58	0,33	N/A	1	95%	0,50	HABITACIÓN 307
2,42	1,45	N/A	1	95%	3,33	
0,14	0,26	N/A	-1	95%	- 0,03	DESCUENTO
2,41	1,52	N/A	1	95%	3,48	
3,21	3,41	N/A	1	95%	10,40	HABITACIÓN 310
0,33	1,65	N/A	1	95%	0,52	
2,43	1,47	N/A	1	95%	3,39	
3,51	3,15	N/A	1	95%	10,50	HABITACIÓN 311
0,33	1,56	N/A	1	95%	0,49	
2,55	1,48	N/A	1	95%	3,59	
3,29	3,28	N/A	1	95%	10,25	HABITACIÓN 316
0,33	1,58	N/A	1	95%	0,50	
2,60	1,47	N/A	1	95%	3,63	
3,40	3,05	N/A	1	95%	9,85	HABITACIÓN 318
0,33	1,55	N/A	1	95%	0,49	
2,51	1,56	N/A	1	95%	3,72	
0,33	1,67	N/A	1	95%	0,52	HABITACIÓN 324
3,34	3,48	N/A	1	95%	11,04	
2,50	1,62	N/A	1	95%	3,85	
3,45	3,53	N/A	1	95%	11,57	HABITACIÓN 325
0,33	1,72	N/A	1	95%	0,54	
0,32	0,38	N/A	-1	95%	- 0,12	DESCUENTO
1,20	2,00	N/A	1	95%	2,28	BALCON NORTE
1,34	5,13	N/A	1	95%	6,53	
5,13	1,80	N/A	1	95%	8,77	BALCON SUR
1,50	1,20	N/A	1	95%	1,71	BAÑO HABITACION 302
1,60	1,20	N/A	1	95%	1,82	BAÑO HABITACION 301
1,84	1,20	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACION 307
1,30	1,80	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACION 308
1,70	1,30	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACION 310
1,50	1,30	N/A	1	95%	1,85	BAÑO HABITACION 311
1,60	1,40	N/A	1	95%	2,13	BAÑO HABITACION 316
1,40	1,30	N/A	1	95%	1,73	BAÑO HABITACION 318
1,70	1,30	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACION 325
1,40	1,30	N/A	1	95%	1,73	BAÑO HABITACION 324
2,26	1,37	N/A	1	95%	2,94	DEPOSITO INSUMOS
0,79	0,16	N/A	1	95%	0,12	DEPOSITO INSUMOS
1,38	1,58	N/A	1	95%	2,07	FILTRO INGRESO
0,79	0,16	N/A	1	95%	0,12	FILTRO INGRESO
0,76	0,61	N/A	1	95%	0,44	PREPACION FORMULAS
0,61	1,58	N/A	1	95%	0,92	PREPACION FORMULAS
3,86	2,52	N/A	1	95%	9,24	PREPACION FORMULAS
0,79	0,15	N/A	1	95%	0,11	PREPACION FORMULAS
3,74	2,01	N/A	1	95%	7,14	CIRCULACION
3,07	0,30	N/A	1	95%	0,87	CIRCULACION
2,00	0,30	N/A	1	95%	0,57	CIRCULACION
1,90	0,60	N/A	1	95%	1,08	CIRCULACION
7,94	1,31	N/A	1	95%	9,88	CIRCULACION
0,75	0,93	N/A	1	95%	0,66	CIRCULACION
1,59	0,93	N/A	1	95%	1,40	CIRCULACION
0,90	0,15	N/A	1	95%	0,13	CIRCULACION
3,59	2,15	N/A	1	95%	7,33	IMFORMACION A FAMILIARES
5,45	1,32	N/A	1	95%	6,83	CIRCULACION
2,17	1,52	N/A	1	95%	3,13	ESTACION DE CAFÉ
3,27	4,91	N/A	1	95%	15,25	DESCANSO MEDICO
0,90	0,15	N/A	1	95%	0,13	DESCANSO MEDICO
3,76	3,15	N/A	1	95%	11,25	DESCANSO EMFERMERIA
4,94	3,53	N/A	1	95%	16,57	TERRAZA SOLAR
5,11	3,25	N/A	1	95%	15,78	LUDOTECA
9,89	6,86	N/A	1	95%	64,45	
4,70	0,16	N/A	-1	95%	- 0,71	DESCUENTO CENTRAL ENFERMERIA
4,11	3,00	N/A	1	95%	11,71	INGRESO A LUDOTECA
1,55	1,29	N/A	-1	95%	- 1,90	DESCUENTO
3,53	2,00	N/A	1	95%	6,71	PASILLO A ZONA ADMINISTRATIVA
0,86	1,63	N/A	1	95%	1,33	BODEGA
4,85	3,72	N/A	1	95%	17,14	UCI 11
0,84	0,15	N/A	-1	95%	- 0,12	DESCUENTO
4,92	3,55	N/A	1	95%	16,59	UCI 9
0,15	1,60	N/A	-1	95%	- 0,23	DESCUENTO
3,99	2,88	N/A	1	95%	10,92	UCI 12
0,40	0,12	N/A	-1	95%	- 0,05	DESCUENTO
3,27	3,30	N/A	1	95%	10,25	UCI 10
0,73	1,00	N/A	1	95%	0,69	UCI 10
1,20	0,15	N/A	-1	95%	- 0,17	DESCUENTO
1,87	5,43	N/A	1	95%	9,65	CICULACION ENTRE UCIS 12-10-09-11
3,20	3,98	N/A	1	95%	12,10	UCI 8
0,98	1,00	N/A	1	95%	0,93	UCI 8
1,60	0,15	N/A	-1	95%	- 0,23	DESCUENTO
5,25	3,30	N/A	1	95%	16,46	UCI 7
1,60	0,15	N/A	-1	95%	- 0,23	DESCUENTO
5,32	3,30	N/A	1	95%	16,68	UCI 5
1,78	0,15	N/A	-1	95%	- 0,25	DESCUENTO
4,55	3,25	N/A	1	95%	14,05	UCI 6
1,65	0,15	N/A	-1	95%	- 0,24	DESCUENTO
1,54	6,92	N/A	1	95%	10,12	CIRCULACION 6-5-7-8
4,12	3,24	N/A	1	95%	12,68	UCI 4
1,23	0,15	N/A	-1	95%	- 0,18	DESCUENTO
3,74	3,25	N/A	1	95%	11,55	UCI 2
1,58	0,15	N/A	-1	95%	- 0,23	DESCUENTO
5,45	2,96	N/A	1	95%	15,33	UCI 1 AISLADO
2,61	0,15	N/A	-1	95%	- 0,37	DESCUENTO
5,50	3,29	N/A	1	95%	17,19	UCI 3
1,70	0,15	N/A	-1	95%	- 0,24	DESCUENTO
6,35	2,35	N/A	1	95%	14,18	CIRCULACION ENTRE UCIS 1-3-5-6
13,84	2,00	N/A	1	95%	26,30	CIRCULACION ENTRE UCI Y LUDOTECA
1,31	3,07	N/A	1	95%	3,82	CIRCULACION FRENTE A TRABAJO LIMPIO
7,92	0,95	N/A	1	95%	7,15	CIRCULACION A TRANFERENCIA
1,71	2,82	N/A	1	95%	4,58	CUARTO EQUIPOS
1,50	2,79	N/A	1	95%	3,98	CUARTO ESTERIL
1,00	0,50	N/A	1	95%	0,48	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
1,65	0,88	N/A	1	95%	1,38	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
0,80	0,15	N/A	1	95%	0,11	ACCESO ASISTENCIAL
1,11	3,24	N/A	1	95%	3,42	ACCESO ASISTENCIAL
0,83	0,15	N/A	1	95%	0,12	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
0,92	1,70	N/A	1	95%	1,49	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
1,35	2,01	N/A	1	95%	2,58	IMFORMACION FAMILIAR
3,99	2,92	N/A	1	95%	11,07	EXTRACION LECHE MATERNA
3,60	2,99	N/A	1	95%	10,23	COORDINACION PEDIATRA
1,36	1,63	N/A	1	95%	2,11	COORDINACION UCI PEDIATRA
2,98	3,19	N/A	1	95%	9,03	COORDINACION UCI PEDIATRA
6,4	3,3	N/A	1	95%	20,06	HABITACION 323







2,6	1,8	N/A	-1	95%	- 4,45	DESCUENTO
1,6	1,25	N/A	1	95%	1,90	BAÑO HABITACIÓN 323
6	3,23	N/A	1	95%	18,41	HABITACION 322
2,66	1,82	N/A	-1	95%	- 4,60	DESCUENTO
1,8	1,25	N/A	1	95%	2,14	BAÑO HABITACIÓN 322
6,02	3,2	N/A	1	95%	18,30	HABITACION 321
2,45	1,8	N/A	-1	95%	- 4,19	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 321
5,8	3,2	N/A	1	95%	17,63	HABITACION 320
2,6	1,75	N/A	-1	95%	- 4,32	DESCUENTO
1,75	1,3	N/A	1	95%	2,16	BAÑO HABITACIÓN 320
6,03	3,2	N/A	1	95%	18,33	HABITACION 319
2,5	1,8	N/A	-1	95%	- 4,28	DESCUENTO
1,8	1,25	N/A	1	95%	2,14	BAÑO HABITACIÓN 319
6,03	3,2	N/A	1	95%	18,33	HABITACION 317
2,5	1,8	N/A	-1	95%	- 4,28	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 317
6,04	3,25	N/A	1	95%	18,65	HABITACION 314
2,5	1,8	N/A	-1	95%	- 4,28	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 314
6,11	3,32	N/A	1	95%	19,27	HABITACION 315
2,55	1,7	N/A	-1	95%	- 4,12	DESCUENTO
1,7	1,3	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACIÓN 315
7,5	3,07	N/A	1	95%	21,87	HABITACION 313
2,5	1,7	N/A	-1	95%	- 4,04	DESCUENTO
1,7	1,25	N/A	1	95%	2,02	BAÑO HABITACIÓN 313
6,13	3,3	N/A	1	95%	19,22	HABITACION 312
2,6	1,8	N/A	-1	95%	- 4,45	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 312
6,12	3,3	N/A	1	95%	19,19	HABITACION 309
2,6	1,8	N/A	-1	95%	- 4,45	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 309
8,5	3,37	N/A	1	95%	27,21	HABITACION 306
2,8	1,7	N/A	-1	95%	- 4,52	DESCUENTO
1,7	1,3	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACIÓN 306
6,03	3,31	N/A	1	95%	18,96	HABITACION 305
2,6	1,8	N/A	-1	95%	- 4,45	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 305
8,6	3,3	N/A	1	95%	26,96	HABITACION 304
2,8	1,8	N/A	1	95%	4,79	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 304
6,1	3,33	N/A	1	95%	19,30	HABITACION 303
2,6	1,8	N/A	-1	95%	- 4,45	DESCUENTO
1,8	1,3	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACIÓN 303
		PISO 4				
5,15	1,53	N/A	1	95%	7,49	BALCON SUR
47,37	2,00	N/A	1	95%	90,00	PASILLO HABITACIONES
2,00	1,14	N/A	1	95%	2,17	BALCON NORTE
1,62	5,12	N/A	1	95%	7,88	
2,42	1,50	N/A	1	95%	3,45	
0,33	1,61	N/A	1	95%	0,50	HABITACIÓN 425
3,52	3,36	N/A	1	95%	11,24	
0,31	0,35	N/A	-1	95%	- 0,10	DESCUENTO
2,42	1,58	N/A	1	95%	3,63	
0,33	1,70	N/A	1	95%	0,53	HABITACIÓN 424
3,46	3,36	N/A	1	95%	11,04	
2,40	1,47	N/A	1	95%	3,35	
0,33	1,58	N/A	1	95%	0,50	HABITACIÓN 418
3,06	3,52	N/A	1	95%	10,23	
0,33	1,56	N/A	1	95%	0,49	
3,24	3,28	N/A	1	95%	10,10	HABITACIÓN 416
2,55	1,48	N/A	1	95%	3,59	
2,39	1,48	N/A	1	95%	3,36	
0,33	1,61	N/A	1	95%	0,50	HABITACIÓN 411
3,50	3,08	N/A	1	95%	10,24	
2,41	1,52	N/A	1	95%	3,48	
3,21	3,41	N/A	1	95%	10,40	HABITACIÓN 410
0,33	1,56	N/A	1	95%	0,49	
3,30	3,49	N/A	1	95%	10,94	
1,58	0,33	N/A	1	95%	0,50	HABITACIÓN 407
2,42	1,45	N/A	1	95%	3,33	
0,14	0,26	N/A	-1	95%	- 0,03	DESCUENTO
2,42	1,53	N/A	1	95%	3,52	
0,30	1,66	N/A	1	95%	0,47	HABITACIÓN 401
3,36	1,15	N/A	1	95%	3,67	
3,29	3,32	N/A	1	95%	10,38	
0,84	0,30	N/A	1	95%	0,24	HABITACIÓN 402
2,65	1,65	N/A	1	95%	4,15	
13,63	1,78	N/A	1	95%	23,05	
4,39	0,27	N/A	1	95%	1,13	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,49	2,44	N/A	1	95%	3,45	
0,80	0,80	N/A	1	95%	0,61	
3,53	2,50	N/A	1	95%	8,38	DESCANSO Y VESTIER
1,65	1,34	N/A	-1	95%	- 2,10	DESCUENTO
4,81	1,56	N/A	1	95%	7,13	
3,01	3,69	N/A	1	95%	10,55	HABITACIÓN 408
0,33	1,68	N/A	1	95%	0,53	
2,83	0,27	N/A	-1	95%	- 0,73	DESCUENTO
2,32	2,24	N/A	1	95%	4,94	PROCEDIMIENTOS
1,48	1,28	N/A	1	95%	1,80	
0,44	0,44	N/A	-1	95%	- 0,18	DESCUENTO
4,88	2,10	N/A	1	95%	9,74	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,38	0,87	N/A	-1	95%	- 0,31	DESCUENTO
0,27	0,32	N/A	-1	95%	- 0,08	
7,50	2,00	N/A	1	95%	14,25	PASILLO INGRESO
8,95	6,77	N/A	1	95%	57,56	HALL
9,16	0,15	N/A	-1	95%	- 1,31	
0,40	0,65	N/A	-1	95%	- 0,25	DESCUENTO
0,35	0,42	N/A	-1	95%	- 0,14	
1,50	1,30	N/A	1	95%	1,85	BAÑO HABITACION 401
1,50	1,20	N/A	1	95%	1,71	BAÑO HABITACION 402
1,84	1,20	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACION 407
1,80	1,30	N/A	1	95%	2,22	BAÑO HABITACION 408
1,70	1,30	N/A	1	95%	2,10	BAÑO HABITACION 410
1,50	1,30	N/A	1	95%	1,85	BAÑO HABITACION 411
1,60	1,40	N/A	1	95%	2,13	BAÑO HABITACION 416
1,60	1,20	N/A	1	95%	1,82	BAÑO HABITACION 418
1,40	1,30	N/A	1	95%	1,73	BAÑO HABITACION 424
1,60	1,30	N/A	1	95%	1,98	BAÑO HABITACION 425

OBSERVACIONES:

TOTAL	**3.339,67**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**3.143,74**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**195,93**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	4,03	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA.	CAP	4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 1				
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Interna baño familiar
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño familiar
	0,90	2,10	1	100%	1,89	baño discapacitados
	0,80	2,10	1	100%	1,68	t limpio
	0,80	2,10	1	100%	1,68	t sucio
	0,80	2,10	1	100%	1,68	T limpio insumos
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Cardiologia
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño vestier
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño consultorio ecografo 2
	1,10	2,10	1	100%	2,31	Ingreso ecografo 2
	1,00	2,10	1	100%	2,10	ingreso ecografo 1
	1,20	2,10	1	100%	2,52	baño ecografo 1
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño muestras ginecologicas
	1,00	2,10	1	100%	2,10	Muestras ginecologicas
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Residuos ordinarios
	0,75	2,10	1	100%	1,58	reciduos peligrosos
	0,80	2,10	1	100%	1,68	aseo
	0,95	2,10	1	100%	2,00	ingreso laboratorio
	1,00	2,10	1	100%	2,10	transfuncional
	1,00	2,10	1	100%	2,10	neveras laboratorio
	0,80	2,10	1	100%	1,68	deposito de materiles
	0,80	2,10	1	100%	1,68	baño laboratorio
	0,70	2,10	1	100%	1,47	baño área administrativa
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Area administrativa
	1,30	2,50	1	100%	3,25	Acceso por rampa a laboratorio
	1,20	2,10	1	100%	2,52	Ingreso por pasillo a laboratoro
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño Sala de procedimeintos imagenologia
	1,00	2,10	1	100%	2,10	Sala de procedimeintos imagenologia
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Sala de lectura imagenologia
	1,80	2,10	1	100%	3,78	Acceso de sala de espera a laboratorio
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Cuarto aseo
	1,30	2,10	1	100%	2,73	Ingreso a admisiones
	2,00	2,10	1	100%	4,20	Circulacion ginecopstetricia
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Disparo Tac a pasillo
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Mamografo a pasillo
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Oficina radiologia
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño oficina radiologia
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Residuos ordinarios
	0,80	2,10	1	100%	1,68	residuos peligrosos
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño aislado pediatria
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Direccion urgencias
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Sala EDA
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño sala EDA
	1,70	2,10	1	100%	3,57	Procedimeintos ascepticos
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Ropa sucia
	0,80	2,10	1	100%	1,68	ropa limpia
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Dispositivos farmacia
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Equipos
	1,70	2,10	1	100%	3,57	Sala de yesos
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Sala ERA
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño sala ERA
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño consultorio 5
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño consultorio 2
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño consultorio 1
	1,70	2,10	1	100%	3,57	Monitoreo ginecopstetricia
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Baño monitoreo gineopstetricia
	0,70	2,10	1	100%	1,47	Cuarto interno monitoreo ginecopstetricia
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño cnsultorio 4
	1,70	2,10	1	100%	3,57	Reanimación
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Baño consultorio 3
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Aseo
	0,80	2,10	1	100%	1,68	Admisiones urgencias
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Triage 2
	1,00	2,10	1	100%	2,10	triage 1
	1,00	2,10	1	100%	2,10	Baño hombres sala espera
	0,80	2,10	1	100%	1,68	baño mujeres sala espera
	1,00	2,10	1	100%	2,10	baño dispcapacitados sala espera
	1,70	2,10	1	100%	3,57	circulacion de sala espera a hall
	0,90	2,10	1	100%	1,89	Rack
	1,20	2,10	1	100%	2,52	Cocineta
	0,75	2,10	1	100%	1,58	Cuarto iNterno cocineta
		PISO 3				
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Baño acceso asientencial
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Ingreso 2 informacion familiares
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Aseo
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Ropa limpia
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Caurto esteril
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Equipos
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Trabajo sucio
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Trabajo limpio
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Residuos no peligrosos ingreso
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Residuos no peligrosos salida
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Residuos peligrosos ingreso
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Residuos peligrosos salida
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Ropa sucia ingreso
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Ropa sucia salida
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Salida filtro familiares

OBSERVACIONES:

TOTAL		171,78	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR		146,58	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA		25,20	Metro Cuadrado


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE

ITEM	4,04	VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	CAP	4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL


Registro fotográfico



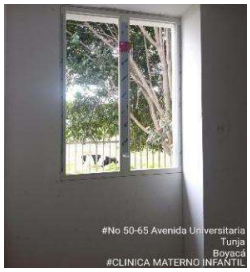





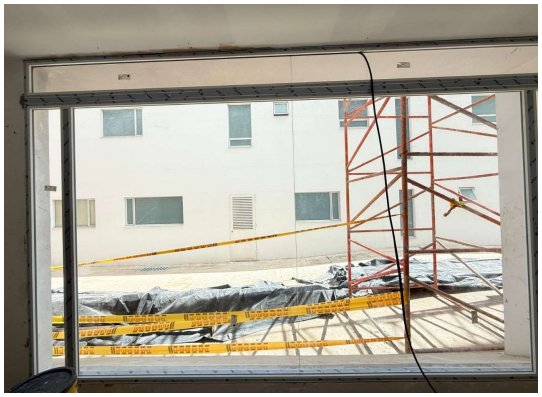



Dimensiones					Total (m)	Observaciones	
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%			
		PISO 1				REF.	UBICACIÓN
	1,27	1,30	6	100%	9,91	1,2,3,4,5,6	FAC. OCC.
	1,30	1,30	1	100%	1,69	37	FAC. SUR.
	2,65	2,50	1	100%	6,63	7	FAC. OCC.
	1,22	0,55	1	100%	0,67	36	FAC. SUR.
	0,91	1,30	1	100%	1,18	39	FAC. SUR.
	1,30	1,30	1	100%	1,69	41	FAC. SUR.
	1,30	1,30	1	100%	1,69	46	FAC. SUR.
	1,85	1,52	1	100%	2,81	55	RADIOLOGIA
	1,30	1,30	1	100%	1,69	8	FAC. OCC.
	0,95	0,95	0		0,00	9	FAC. OCC.
	0,80	1,50	0		0,00	23	FAC. NORTE.
	1,50	1,50	1	100%	2,25	24	FAC. NORTE.
	0,50	1,30	1	100%	0,65	44	FAC. SUR.
	1,02	0,95	1	100%	0,97	45	FAC. SUR.
	0,65	0,50	1	100%	0,33	49	RECEP MED
	0,65	1,00	1	100%	0,65	50	TRANSFUNC.
	1,00	1,04	0		0,00	52	TAC
	0,95	1,04	0		0,00	54	URGENCIAS
	1,41	1,00	0		0,00	58	CONSUL 5
	0,70	0,98	1	100%	0,69	64	LAVADO
	2,74	1,40	0		0,00	47	LAB
	1,20	1,75	1	100%	2,10	19	FAC. NORTE.
	1,20	2,10	0		0,00	20	FAC. NORTE.
	1,20	2,10	0		0,00	21	FAC. NORTE.
	1,20	1,76	1	100%	2,11	22	FAC. NORTE.
	3,01	2,40	6	100%	43,34	10,11,12,13, 14,15	FAC. OCC.
	3,85	2,40	2	100%	18,48	17	FAC. NORTE.
	2,13	1,00	0		0,00	51	ESTANTERIA
	6,45	5,96	0		0,00	1	ACC PPAL
	6,45	2,72	0		0,00	2	HALL ACC PPAL
	1,59	2,60	1	100%	4,13	9	PASILLO FARM
	2,54	2,60	1	100%	6,60	3	REC MUEST
	2,29	2,60	1	100%	5,95	4	ADM LAB
	2,17	2,60	1	100%	5,64	5	LAB
	3,80	2,60	1	100%	9,88	6	PEDIATRIA
	2,10	2,40	1	100%	5,04	7	PEDIATRIA
	0,50	0,49	1	100%	0,24	34	FACHADA SUR
	0,50	0,50	1	100%	0,25	35	FACHADA SUR
	0,92	1,30	1	100%	1,19	38	FACHADA SUR
	1,29	1,30	1	100%	1,68	40	FACHADA SUR
	1,29	1,30	1	100%	1,68	42	FACHADA SUR
	0,95	1,00	1	100%	0,95	56	SALA DE YESOS
	1,98	0,40	1	100%	0,78	62	PERSONAL ASISTENCIAL
	3,03	2,09	1	100%	6,33	51	AREA DE ESTANTERIA
	2,63	1,34	1	100%	3,53	47	NUEVA
	1,88	1,34	1	100%	2,52	67	NUEVA
	1,59	1,34	1	100%	2,13	68	NUEVA
	6,40	5,89	1	100%	37,67	1	FACHADA OCCIDENTAL
	4,21	2,59	1	100%	10,87	20 - 21	FACHADA NORTE
	1,30	0,78	1	100%	1,02	25	EXTERNA
	1,29	0,78	1	100%	1,01	26	EXTERNA
	4,20	2,58	1	100%	10,85	P1-20-21	INTERNA
	4,07	2,58	0		0,00	P1-10	INTERNA
	2,76	2,40	1	100%	6,61	P1-57	INTERNA
		PISO 2				REF.	UBICACIÓN
	1,20	1,30	1	100%	1,56	2	FAC. SUR.
	1,20	1,30	0		0,00	2	FAC. SUR.
	1,30	1,30	1	100%	1,69	4	FAC. SUR.
	1,30	1,10	1	100%	1,43	8	FAC. SUR.
	1,30	1,29	1	100%	1,68	9	FAC. SUR.
	1,30	1,28	1	100%	1,66	10	FAC. SUR.
	1,30	1,28	1	100%	1,66	14	FAC. OCC.
	1,30	1,29	1	100%	1,68	15	FAC. OCC.
	1,40	1,29	1	100%	1,81	16	FAC. OCC.
	1,30	1,28	1	100%	1,66	20	FAC. OCC.
	1,89	1,27	1	100%	2,40	21	FAC. OCC.
	2,87	0,69	1	100%	1,98	23	FAC. OCC.
	3,04	0,69	1	100%	2,10	24	FAC. OCC.
	3,52	0,50	0		0,00	32	FAC. NORTE.
	3,52	0,50	0		0,00	33	FAC. NORTE.
	3,28	0,50	1	100%	1,64	34	FAC. NORTE.
	4,07	0,50	1	100%	2,04	35	FAC. NORTE.
	0,93	0,27	1	100%	0,25	11	FAC. SUR.
	1,90	0,70	1	100%	1,33	12	FAC. SUR.
	1,90	0,70	1	100%	1,33	13	FAC. SUR.
	1,00	0,70	1	100%	0,70	17	FAC. OCC.
	1,04	1,29	1	100%	1,34	18	FAC. OCC.
	0,94	1,28	1	100%	1,20	19	FAC. OCC.
	0,98	0,95	1	100%	0,93	22	FAC. OCC.
	3,25	0,68	1	100%	2,21	27	FAC. OCC.
	3,06	0,68	1	100%	2,08	28	FAC. OCC.
	3,04	0,68	1	100%	2,07	29	FAC. OCC.
	3,10	0,68	1	100%	2,11	30	FAC. OCC.
	2,50	0,68	1	100%	1,70	31	FAC. OCC.
	0,94	0,94	1	100%	0,88	36	FAC. NORTE.
	1,00	1,03	1	100%	1,03	51	PARTOS
	1,00	1,03	1	100%	1,03	52	FARMACIA
	1,00	1,03	1	100%	1,03	53	FARMACIA
	1,48	0,98	1	100%	1,45	54	AUTOCLAVE
	1,02	1,92	1	100%	1,96	14	AUTOCLAVE
	2,87	1,92	0		0,00	6	UCI-NEONATAL
	2,02	1,92	0		0,00	9	UCI-NEONATAL
	1,94	1,92	0		0,00	12	UCI-NEONATAL
	3,23	2,60	0		0,00	4	UCI-NEONATAL
	3,61	2,60	0		0,00	7	UCI-NEONATAL
	3,61	2,60	0		0,00	11	UCI-NEONATAL
	1,53	2,60	1	100%	3,98	13	AUTOCLAVE
	1,53	2,60	1	100%	3,98	15	AUTOCLAVE
	2,20	2,60	0		0,00	16	AUTOCLAVE
	1,07	2,60	0		0,00	17	AUTOCLAVE
	1,00	2,40	0		0,00	2	UCI-NEONATAL
	2,70	2,60	1	100%	7,02	1	UARO
	1,89	2,60	0		0,00	3	UCI-NEONATAL
	1,73	2,60	0		0,00	8	UCI-NEONATAL
	1,73	2,60	0		0,00	10	UCI-NEONATAL
	3,75	2,60	0		0,00	5	UCI-NEONATAL
	0,97	0,95	1	100%	0,92	3	FACHADA SUR
	0,92	1,30	1	100%	1,20	5	FACHADA SUR
	0,92	1,30	1	100%	1,19	6	FACHADA SUR
	2,15	0,89	1	100%	1,91	55	INTERNA
	0,95	0,95	1	100%	0,90	1	INTERNA
	2,44	2,34	0		0,00	P2-1	INTERNA
	1,57	2,01	0		0,00	P2-18-26-A	INTERNA
	1,57	2,01	0		0,00	19	INTERNA
	1,57	2,01	0		0,00	20	INTERNA
	1,57	2,01	0		0,00	21	INTERNA



	1,57	2,00	0		0,00	22	INTERNA
	1,57	2,00	1	100%	3,13	23	INTERNA
	1,58	1,99	1	100%	3,15	24	INTERNA
	1,57	2,00	0		0,00		INTERNA
	1,56	2,00	0		0,00		INTERNA
		PISO 3				REF.	UBICACIÓN
	1,30	1,35	1	100%	1,76	7	FAC. OCC.
	1,90	1,35	1	100%	2,57	8	FAC. OCC.
	1,80	1,18	1	100%	2,12	45	BALCON SUR
	1,20	1,20	0		0,00	60	VESTIER
	0,80	0,70	1	100%	0,56	9	FAC. OCC.
	0,80	0,70	1	100%	0,56	10	FAC. OCC.
	0,71	0,68	1	100%	0,48	11	FAC. OCC.
	1,16	0,68	1	100%	0,79	12	FAC. OCC.
	0,80	0,70	1	100%	0,56	13	FAC. OCC.
	0,80	0,70	1	100%	0,56	14	FAC. OCC.
	0,80	0,70	1	100%	0,56	15	FAC. OCC.
	0,80	0,70	1	100%	0,56	16	FAC. OCC.
	3,05	0,70	1	100%	2,14	17	FAC. OCC.
	3,05	0,70	1	100%	2,14	18	FAC. OCC.
	3,05	0,70	1	100%	2,14	19	FAC. OCC.
	3,05	0,70	1	100%	2,14	20	FAC. OCC.
	3,05	0,70	1	100%	2,14	21	FAC. OCC.
	1,00	0,99	1	100%	0,99	22	FAC. OCC.
	0,98	0,70	1	100%	0,69	23	FAC. NORTE.
	1,24	1,89	0		0,00	24	FAC. NORTE.
	1,40	1,89	0		0,00	26	FAC. NORTE.
	0,74	1,21	0		0,00	43	BALCON SUR
	0,40	2,10	0		0,00	46	CAPILLA
	0,40	2,10	0		0,00	46	CAPILLA
	2,50	0,70	1	100%	1,75	54	BALCON NORTE
	2,50	0,70	1	100%	1,75	55	BALCON NORTE
	2,50	0,70	1	100%	1,75	56	BALCON NORTE
	2,50	0,70	1	100%	1,75	57	BALCON NORTE
	2,50	0,70	1	100%	1,75	58	BALCON NORTE
	0,90	1,50	1	100%	1,35	61	UCI-PEDIATRIA
	0,90	1,50	1	100%	1,35	62	UCI-PEDIATRIA
	0,90	1,50	1	100%	1,35	63	UCI-PEDIATRIA
	0,90	1,50	1	100%	1,35	64	UCI-PEDIATRIA
	0,90	1,50	1	100%	1,35	65	UCI-PEDIATRIA
	0,90	1,50	1	100%	1,35	66	UCI-PEDIATRIA
	0,90	1,50	1	100%	1,35	67	UCI-PEDIATRIA
	1,74	1,70	0		0,00	69	UCI-PEDIATRIA
	1,54	1,70	0		0,00	70	UCI-PEDIATRIA
	2,49	1,70	0		0,00	71	UCI-PEDIATRIA
	1,57	1,70	0		0,00	72	UCI-PEDIATRIA
	1,73	1,70	0		0,00	73	UCI-PEDIATRIA
	1,58	1,70	0		0,00	74	UCI-PEDIATRIA
	2,48	0,70	1	100%	1,74	77	DESC MEDIC
	1,96	1,70	0		0,00	68	UCI-PEDIATRIA
	1,82	1,70	0		0,00	75	UCI-PEDIATRIA
	1,98	1,70	0		0,00	76	UCI-PEDIATRIA
	2,28	2,26	1	100%	5,15	2	FAC. SUR.
	2,00	1,18	1	100%	2,36	44	BALCON SUR
	4,80	1,35	1	100%	6,48	3	FAC. SUR.
	3,34	1,35	1	100%	4,51	4	FAC. OCC.
	2,55	2,24	1	100%	5,71	5	FAC. OCC.
	3,02	2,24	1	100%	6,76	6	FAC. OCC.
	4,80	2,28	1	100%	10,94	1	FAC. SUR.
	5,38	1,89	0		0,00	25	FAC. NORTE.
	0,95	0,45	0		0,00	31,35,40	FAC. ORIEN.
	1,14	2,80	0		0,00	9	UCI-PEDIATRIA
	2,00	2,40	1	100%	4,80	16	SAL BALCON NORTE
	2,00	2,40	0		0,00	17	SAL BALCON SUR
	3,20	2,80	1	100%	8,96	1	TERRAZA
	3,20	2,80	0		0,00	3	UCI-PEDIATRIA
	2,18	2,80	0		0,00	4	UCI-PEDIATRIA
	2,15	2,80	0		0,00	5	UCI-PEDIATRIA
	2,30	2,80	0		0,00	6	UCI-PEDIATRIA
	2,40	2,80	0		0,00	10	UCI-PEDIATRIA
	2,22	2,80	0		0,00	11	UCI-PEDIATRIA
	2,22	2,80	0		0,00	12	UCI-PEDIATRIA
	2,22	2,80	0		0,00	13	UCI-PEDIATRIA
	2,24	2,80	0		0,00	14	UCI-PEDIATRIA
	2,95	2,80	0		0,00	2	UCI-PEDIATRIA
	3,60	2,80	0		0,00	7 y 8	UCI-PEDIATRIA
	1,60	2,80	0		0,00	15	UCI-PEDIATRIA
	7,20	1,87	1	100%	13,49	24-25-26	TERRAZA NORTE
	0,74	1,21	1	100%	0,89	43	BALCON SUR
	2,67	2,10	0		0,00	59	NUEVA
	1,49	2,65	2	100%	7,88	18 Y 19	INTERNA
	8,73	2,50	1	100%	21,82	6-71-7-8	UCI
	1,14	2,50	1	100%	2,84	9	UCI
	8,01	2,45	1	100%	19,61	4-69-70-05	UCI
	7,20	2,45	1	100%	17,65	3-68-02	UCI
	7,98	2,45	1	100%	19,55	10-72-73-11	UCI
	7,96	2,45	1	100%	19,50	12-74-75-13	UCI
	6,21	2,45	1	100%	15,22	14-76-15	UCI
		PISO 4				REF.	UBICACIÓN
	1,30	1,50	1	100%	1,95	5	FAC. OCC.
	1,76	1,46	1	100%	2,57	10	FAC. OCC.
	1,20	1,30	0		0,00	11	FAC. OCC.
	0,78	1,46	0		0,00	9	FAC. OCC.
	1,24	1,89	0		0,00	18	FAC. OCC.
	1,40	1,89	0		0,00	20	FAC. NORTE.
	6,35	1,46	1	100%	9,27	7	FAC. OCC.
	3,34	1,46	1	100%	4,88	8	FAC. OCC.
	5,38	1,89	0		0,00	19	FAC. NORTE.
	1,00	1,00	0		0,00	1	FAC. OCC.
	0,95	0,45	0		0,00	21,25,24	FAC. OCC.
	2,00	2,40	0		0,00	1	SAL BALCON SUR
	2,00	2,40	0		0,00	2	SAL BALCON NORTE
	7,16	1,83	1	100%	13,13	18-19-20	FACHADA NORTE
	1,49	2,35	1	100%	3,49	3	INTERNA
	1,52	2,32	0	100%	0,00	4	INTERNA
	2,00	2,30	0		0,00	16	INTERNA
	2,00	2,12	1	100%	4,22	1	INTERNA
		SOTANO				REF.	UBICACIÓN
	1,20	0,40	0		0,00	14	ARCHIVO
	2,00	0,40	0		0,00	15	ARCHIVO
	2,00	0,40	0		0,00	17	DEPOSITO
	0,74	0,33	0		0,00	18	INTERNA
	0,74	0,33	1	50%	0,12	18	INTERNA

OBSERVACIONES:


TOTAL	**580,19**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**270,01**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**310,18**	**Metro Cuadrado**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	4,09	CERRADURA ALCOBA	CAP	4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

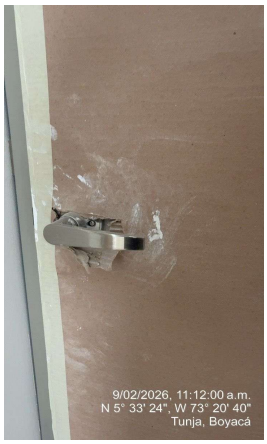

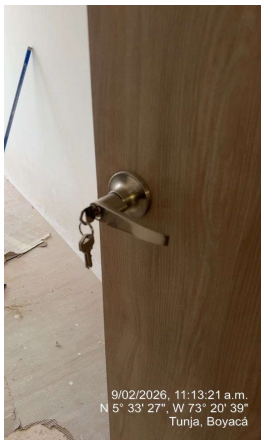





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 4				
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 01
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 02
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 03
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 04
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 05
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 06
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 07
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 08
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 09
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 10
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 11
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 12
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 13
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 14
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 15
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 16
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 17
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 18
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 19
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 20
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 21
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 22
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 23
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 24
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 25
		PISO 3				
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 01
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 02
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 03
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 04
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 05
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 06
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 07
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 08
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 09
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 10
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 11
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 12
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 13
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 14
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 15
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 16
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 17
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 18
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 19
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 20
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 21
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 22
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 23
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 24
			1	100%	1,00	HABITACIÓN 25
			1	100%	1,00	Ingreso 2 informacion familiares
			1	100%	1,00	Aseo
			1	100%	1,00	Ropa limpia
			1	100%	1,00	Cuarto esteril
			1	100%	1,00	Equipos
			1	100%	1,00	Trabajo sucio
			1	100%	1,00	Trabajo limpio
			1	100%	1,00	Residuos no peligrosos ingreso
			1	100%	1,00	Residuos no peligrosos salida
			1	100%	1,00	Residuos peligrosos ingreso
			1	100%	1,00	Residuos peligrosos salida
			1	100%	1,00	Ropa sucia ingreso
			1	100%	1,00	Ropa sucia salida
			1	100%	1,00	Salida filtro familiares
		PISO 1				
			1	100%	1,00	CONTROL IMAGENEOLOGIA
			1	100%	1,00	CONSULTORIO N°2
			1	100%	1,00	ASEO CAFETERIA
			1	100%	1,00	CONSULTORIO N°3
			1	100%	1,00	ENTRADA FARMACIA (POR RAMPA)
			1	100%	1,00	RESIDUOS ORDINARIOS
			1	100%	1,00	CONSULTORIO N°5
			1	100%	1,00	SALA EDA
			1	100%	1,00	ASEO
			1	100%	1,00	DEP MATERIALES
			1	100%	1,00	CONSULTORIO N°1
			1	100%	1,00	OBSV. GINECOBSTETRICIA
			1	100%	1,00	ECOGRAFO
			1	100%	1,00	INGRESO A LABORATORIO
			1	100%	1,00	DIR. URG
			1	100%	1,00	PROCEDIMIENTOS
			1	100%	1,00	CONSULTORIO N°4
			1	100%	1,00	TRIAGE N°2
			1	100%	1,00	RESIDUOS PELIGROSOS
			1	100%	1,00	PROCEDIMIENTOS IMAGENEOLIGIA
			1	100%	1,00	T. LIMPIO DE OBSV.
			1	100%	1,00	RESIDUOS PELIGROSOS
			1	100%	1,00	R. SUCIA
			1	100%	1,00	T. SUCIO DE OBSV
			1	100%	1,00	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
			1	100%	1,00	INGRESO POR PASILLO A LABORATORIO
			1	100%	1,00	TRIAGE N°1
			1	100%	1,00	OFIC. RADIOLOGIA
			1	100%	1,00	EQUIPOS
			1	100%	1,00	FARMACIA
			1	100%	1,00	RESIDUOS DE LAB.
			1	100%	1,00	MUESTRAS GINECOLOGICAS
			1	100%	1,00	ADM. URG
			1	100%	1,00	ECOGRAFO
			1	100%	1,00	SALA ERA
			1	100%	1,00	ASEO DE LAB.
			1	100%	1,00	HALL
			1	100%	1,00	ASEO CIRC. FARMACIA
			1	100%	1,00	ÁREA ADM. FARMACIA
			1	100%	1,00	SALA LECTURA IMAGENEOLIGIA
			1	100%	1,00	TRANSFUNCIONAL
			1	100%	1,00	ESPACIO NEVERA (LAB)
			1	100%	1,00	INDUMOS DE PROCEDIMIENTOS
			1	100%	1,00	DESCANSO PERSONAL ASISTENCIAL
			1	100%	1,00	DISPESARIO INTRAHOSPITALARIO
			1	100%	1,00	FARMACIA
			1	100%	1,00	LABORATORIO
			1	100%	1,00	VESTIER
			1	100%	1,00	FACTURACIÓN

OBSERVACIONES:

TOTAL	113,00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0,00	Unidad
PRESENTE ACTA	113,00	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	4,1	CERRADURA BAÑO	CAP	4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4							
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 01
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 02
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 03
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 04
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 05
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 06
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 07
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 08
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 09
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 10
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 11
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 12
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 13
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 14
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 15
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 16
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 17
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 18
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 19
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 20
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 21
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 22
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 23
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 24
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 25
PISO 3							
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 21
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 22
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 23
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 24
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 25
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 26
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 27
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 28
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 29
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 30
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 31
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 32
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 33
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 34
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 35
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 36
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 37
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 38
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 39
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 40
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 41
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 42
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 43
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 44
				1	100%	1,00	WC HABITACIÓN 45
				1	100%	1,00	Baño acceso asientencial
PISO 1							
				1	100%	1,00	WC M SALA ESPERA IMAGENEOLOGIA
				1	100%	1,00	WC PMR SALA ESPERA IMAGENEOLOGIA
				1	100%	1,00	WC ÁREA ADM
				1	100%	1,00	WC LABORATORIO
				1	100%	1,00	WC TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
				1	100%	1,00	WC CONSULTORIO CARDIOLOGIA
				1	100%	1,00	WC VESTIER CONSULTORIO CARDIO
				1	100%	1,00	WC OBSV. GINECOLOGICA
				1	100%	1,00	WC FAMILIAR OBSV.
				1	100%	1,00	WC AISLADO OBSV
				1	100%	1,00	WC SALA PROCEDIMIENTOS
				1	100%	1,00	WC SALA EDA
				1	100%	1,00	WC SALA ERA
				1	100%	1,00	WC CONSULTORIO N°1
				1	100%	1,00	WC CONSULTORIO N°2
				1	100%	1,00	WC CONSULTORIO N°3
				1	100%	1,00	WC CONSULTORIO N°4
				1	100%	1,00	WC CONSULTORIO N°5
				1	100%	1,00	WC MONITOREO GINECOBSTETRICIA
				1	100%	1,00	WC MIXTO
				1	100%	1,00	WC CAFETERIA
				1	100%	1,00	WC VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
				1	100%	1,00	WC VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL

OBSERVACIONES:

TOTAL	74,00	**Unidad**
ACUMULADO ANTERIOR	0,00	**Unidad**
PRESENTE ACTA	74,00	**Unidad**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6,03	CABLE FPLP	CAP	4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico




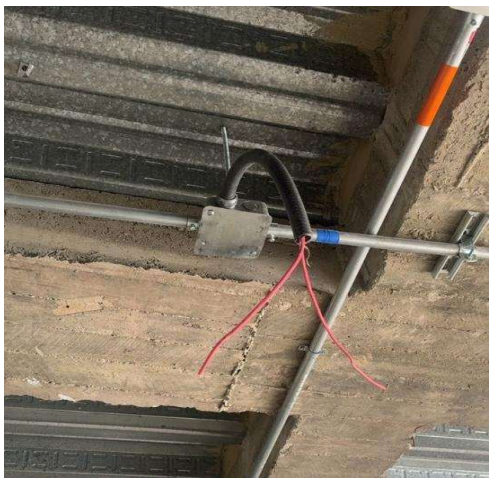

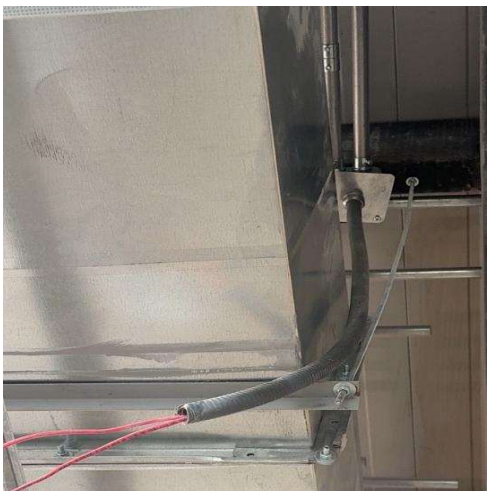


Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
10,20	N/A	N/A	1	**100%**	**10,20**	LABORATORIO A LAVADO YESO
5,30	N/A	N/A	1	**100%**	**5,30**	LABORATORIO A AREA ADMINISTRATIVA
3,70	N/A	N/A	1	**100%**	**3,70**	AREA ADMINISTRATIVA LAB A HALL
5,40	N/A	N/A	1	**100%**	**5,40**	HALL A RESIDUOS PELIGROSO
5,60	N/A	N/A	1	**100%**	**5,60**	RESIDUOS PELIGROSO A MUESTRA GINECOLOGIA
8,50	N/A	N/A	1	**100%**	**8,50**	MUESTRA GINECOLOGIA A SERVICIO IMAGENOLOGIA
6,50	N/A	N/A	1	**100%**	**6,50**	LABORATORIO A FACTURACION
10,80	N/A	N/A	1	**100%**	**10,80**	FARMACIA A ENTREGA FARMACIA
9,10	N/A	N/A	1	**100%**	**9,10**	ENTREGA FARMACIA A DEPOSITO
4,50	N/A	N/A	1	**100%**	**4,50**	DEPOSITO A TRASFUNCIONAL
10,50	N/A	N/A	1	**100%**	**10,50**	TRASFUNCIONAL A HALL
12,20	N/A	N/A	1	**100%**	**12,20**	HALL A SALIDA DE ESPERA
8,50	N/A	N/A	1	**100%**	**8,50**	SALA DE ESPERA A HALL ESPERA
9,30	N/A	N/A	1	**100%**	**9,30**	HALL GENERAL A INFORMACION
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	IMAGENOLOGIA A CONSULTORIO ECOGRAFO
6,50	N/A	N/A	1	**100%**	**6,50**	CONSULTORIO ECOGRAFO A CAMINADOR
11,20	N/A	N/A	1	**100%**	**11,20**	CAMINADOR A INSUMO
7,30	N/A	N/A	1	**100%**	**7,30**	INSUMO A CONSULTORIO CARDIOLOGO
6,20	N/A	N/A	1	**100%**	**6,20**	INSUMO A GINECOBSTETRICIA
8,20	N/A	N/A	1	**100%**	**8,20**	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA A OBSERVACION PEDIATRIA
13,70	N/A	N/A	1	**100%**	**13,70**	OBSERVACION PEDIATRIA
9,50	N/A	N/A	1	**100%**	**9,50**	OBSERVACION PEDIATRIA HALL URGENCIA
5,90	N/A	N/A	1	**100%**	**5,90**	HALL URGENCIAS A VIRGEN
8,50	N/A	N/A	1	**100%**	**8,50**	DISPARO A VIRGEN
7,20	N/A	N/A	1	**100%**	**7,20**	DISPARO A HALL ECOGRAFO
7,20	N/A	N/A	1	**100%**	**7,20**	HALL ECOGRAFO A T.A.C
11,10	N/A	N/A	1	**100%**	**11,10**	T.A.C A MAMOGRAFIA
6,00	N/A	N/A	1	**100%**	**6,00**	MAMOGRAFIA 1 A MAMOGRAFIA2
4,50	N/A	N/A	1	**100%**	**4,50**	MAMOGRAFIA A OFICINA
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	MAMOGRAFIA A ECPGRAFO
8,00	N/A	N/A	1	**100%**	**8,00**	ECOGRAFO A HALL
7,00	N/A	N/A	1	**100%**	**7,00**	ECOGRAFO A CONSULTORIO ECOGRAFO
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	CONSULTORIO ECOGRAFO A HALL
5,50	N/A	N/A	1	**100%**	**5,50**	HALL A DIGITACION
5,90	N/A	N/A	1	**100%**	**5,90**	DIGITACION A AUDIOLOGIA
4,00	N/A	N/A	1	**100%**	**4,00**	AUDIOLOGIA A INSUMOS
15,00	N/A	N/A	1	**100%**	**15,00**	INSUMO A RACK
4,50	N/A	N/A	1	**100%**	**4,50**	RACK 1 A RACK 2
6,20	N/A	N/A	1	**100%**	**6,20**	RACK A DESCANSO INTERNO
8,70	N/A	N/A	1	**100%**	**8,70**	DESCANSO INTERNO A FACTURACION
17,00	N/A	N/A	1	**100%**	**17,00**	FACTURACION A CONSULTORIO 5
9,50	N/A	N/A	1	**100%**	**9,50**	CONSULTORIO 5 A HALL URGENCIA
6,20	N/A	N/A	1	**100%**	**6,20**	HALL URGENCIAS A YESO
7,90	N/A	N/A	1	**100%**	**7,90**	YESO A PROCESO ASEPTICO
9,90	N/A	N/A	1	**100%**	**9,90**	PROCESO ASEPTICO A EDA
15,00	N/A	N/A	1	**100%**	**15,00**	EDA A DIGITACION
4,00	N/A	N/A	1	**100%**	**4,00**	DIGITACION A ROPA LIMPIA
4,00	N/A	N/A	1	**100%**	**4,00**	ROPA LIMPIA A ROPA SUCIA
3,00	N/A	N/A	1	**100%**	**3,00**	ROPA SUCIA A EQUIPO
4,00	N/A	N/A	1	**100%**	**4,00**	EQUIPO A INSUMO FARMACIA
7,70	N/A	N/A	1	**100%**	**7,70**	INSUMO FARMACIA A ERA
7,20	N/A	N/A	1	**100%**	**7,20**	SALA ERA A CONSULTORIO 1
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	CONSULTORIO 1 A LAMPARA EM
6,30	N/A	N/A	1	**100%**	**6,30**	CONSULTORIO 1 A CONSULTORIO 2
15,00	N/A	N/A	1	**100%**	**15,00**	CONSULTORIO 2 A REANIMACION PEDIATRIA
14,00	N/A	N/A	1	**100%**	**14,00**	REANIMACION PEDIATRIA A ADMISION URGENCIAS
5,00	N/A	N/A	1	**100%**	**5,00**	ADMISION URGENCIAS A CONTRA
7,00	N/A	N/A	1	**100%**	**7,00**	ADMISION URGENCIAS A CONSULTORIO 3
6,30	N/A	N/A	1	**100%**	**6,30**	CONSULTORIO 3 A HALL URGENCIAS
6,90	N/A	N/A	1	**100%**	**6,90**	HALL URGENCIAS CONSULTORIO 4
5,60	N/A	N/A	1	**100%**	**5,60**	CONSULTORIO 4 A HALL MONITOREO
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	HALL MONITOREO A MONITORIO
12,30	N/A	N/A	1	**100%**	**12,30**	GINECO A COCINETA
5,80	N/A	N/A	1	**100%**	**5,80**	COCINETA A CAFETERIA
10,90	N/A	N/A	1	**100%**	**10,90**	CAFETERIA 1 A CAFETERIA 2
12,60	N/A	N/A	1	**100%**	**12,60**	CAFETERIA A AUDITORIO
12,00	N/A	N/A	1	**100%**	**12,00**	AUDITORIO A DESCANSO URGENCIAS
13,00	N/A	N/A	1	**100%**	**13,00**	DESCANSO URGENCIAS A LAMPARA EM
13,00	N/A	N/A	1	**100%**	**13,00**	DESCANSO URGENCIAS A SALA ESPERA ADULTO
12,70	N/A	N/A	1	**100%**	**12,70**	SALA ESPERA ADULTO A ENTRADA URGENCIA
7,80	N/A	N/A	1	**100%**	**7,80**	ENTRADA URGENCIAS A TRIAGE 2
6,00	N/A	N/A	1	**100%**	**6,00**	TRIAGE 2 A TRIAGE 1
PISO 2						
7,24	N/A	N/A	1	**100%**	**7,24**	
7,55	N/A	N/A	1	**100%**	**7,55**	
7,20	N/A	N/A	1	**100%**	**7,20**	
5,46	N/A	N/A	1	**100%**	**5,46**	
4,81	N/A	N/A	1	**100%**	**4,81**	
5,70	N/A	N/A	1	**100%**	**5,70**	
5,80	N/A	N/A	1	**100%**	**5,80**	
3,40	N/A	N/A	1	**100%**	**3,40**	
4,20	N/A	N/A	1	**100%**	**4,20**	
4,40	N/A	N/A	1	**100%**	**4,40**	
9,30	N/A	N/A	1	**100%**	**9,30**	
18,20	N/A	N/A	1	**100%**	**18,20**	
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	
8,69	N/A	N/A	1	**100%**	**8,69**	
13,50	N/A	N/A	1	**100%**	**13,50**	
5,22	N/A	N/A	1	**100%**	**5,22**	
5,00	N/A	N/A	1	**100%**	**5,00**	
5,30	N/A	N/A	1	**100%**	**5,30**	
3,64	N/A	N/A	1	**100%**	**3,64**	
3,40	N/A	N/A	1	**100%**	**3,40**	
12,04	N/A	N/A	1	**100%**	**12,04**	
6,78	N/A	N/A	1	**100%**	**6,78**	
11,50	N/A	N/A	1	**100%**	**11,50**	
8,70	N/A	N/A	1	**100%**	**8,70**	
6,04	N/A	N/A	1	**100%**	**6,04**	
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	



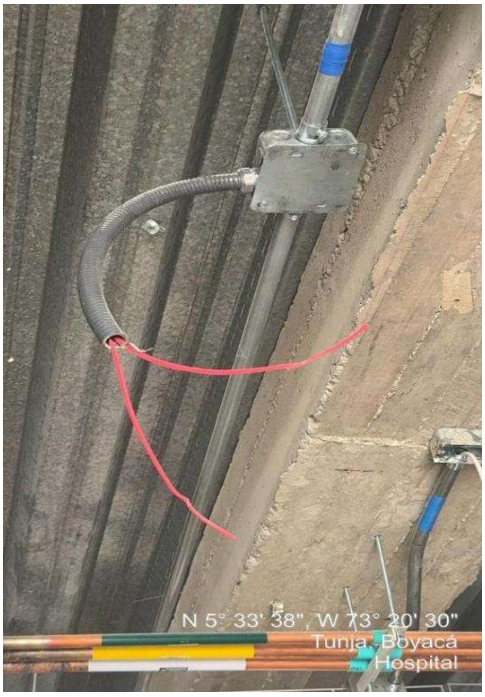




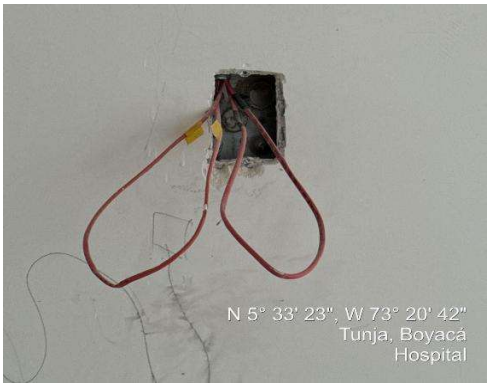

7,13	N/A	N/A	1	100%	7,13	
9,17	N/A	N/A	1	100%	9,17	
6,80	N/A	N/A	1	100%	6,80	
7,19	N/A	N/A	1	100%	7,19	
7,89	N/A	N/A	1	100%	7,89	
6,19	N/A	N/A	1	100%	6,19	
5,91	N/A	N/A	1	100%	5,91	
5,86	N/A	N/A	1	100%	5,86	
6,56	N/A	N/A	1	100%	6,56	
5,34	N/A	N/A	1	100%	5,34	
6,63	N/A	N/A	1	100%	6,63	
6,59	N/A	N/A	1	100%	6,59	
8,09	N/A	N/A	1	100%	8,09	
3,24	N/A	N/A	1	100%	3,24	
7,30	N/A	N/A	1	100%	7,30	
8,37	N/A	N/A	1	100%	8,37	
6,48	N/A	N/A	1	100%	6,48	
5,44	N/A	N/A	1	100%	5,44	
5,45	N/A	N/A	1	100%	5,45	
5,45	N/A	N/A	1	100%	5,45	
5,86	N/A	N/A	1	100%	5,86	
5,32	N/A	N/A	1	100%	5,32	
5,37	N/A	N/A	1	100%	5,37	
5,63	N/A	N/A	1	100%	5,63	
5,73	N/A	N/A	1	100%	5,73	
5,21	N/A	N/A	1	100%	5,21	
3,27	N/A	N/A	1	100%	3,27	
5,11	N/A	N/A	1	100%	5,11	
5,09	N/A	N/A	1	100%	5,09	
4,25	N/A	N/A	1	100%	4,25	
3,83	N/A	N/A	1	100%	3,83	
3,10	N/A	N/A	1	100%	3,10	
5,20	N/A	N/A	1	100%	5,20	
9,82	N/A	N/A	1	100%	9,82	
9,17	N/A	N/A	1	100%	9,17	
9,89	N/A	N/A	1	100%	9,89	
9,20	N/A	N/A	1	100%	9,20	
6,96	N/A	N/A	1	100%	6,96	
5,43	N/A	N/A	1	100%	5,43	
4,57	N/A	N/A	1	100%	4,57	
5,87	N/A	N/A	1	100%	5,87	
9,47	N/A	N/A	1	100%	9,47	
8,40	N/A	N/A	1	100%	8,40	
6,50	N/A	N/A	1	100%	6,50	
3,25	N/A	N/A	1	100%	3,25	
5,21	N/A	N/A	1	100%	5,21	
5,40	N/A	N/A	1	100%	5,40	
5,76	N/A	N/A	1	100%	5,76	
7,04	N/A	N/A	1	100%	7,04	
3,10	N/A	N/A	1	100%	3,10	
5,09	N/A	N/A	1	100%	5,09	
5,70	N/A	N/A	1	100%	5,70	
6,52	N/A	N/A	1	100%	6,52	
5,72	N/A	N/A	1	100%	5,72	
5,96	N/A	N/A	1	100%	5,96	
3,36	N/A	N/A	1	100%	3,36	
7,12	N/A	N/A	1	100%	7,12	
5,48	N/A	N/A	1	100%	5,48	
3,55	N/A	N/A	1	100%	3,55	
4,05	N/A	N/A	1	100%	4,05	
11,80	N/A	N/A	1	100%	11,80	
4,61	N/A	N/A	1	100%	4,61	
5,22	N/A	N/A	1	100%	5,22	
4,05	N/A	N/A	1	100%	4,05	
6,73	N/A	N/A	1	100%	6,73	
6,55	N/A	N/A	1	100%	6,55	
3,76	N/A	N/A	1	100%	3,76	
3,55	N/A	N/A	1	100%	3,55	
5,91	N/A	N/A	1	100%	5,91	
4,60	N/A	N/A	1	100%	4,60	
6,53	N/A	N/A	1	100%	6,53	
22,00	N/A	N/A	1	100%	22,00	
22,00	N/A	N/A	1	100%	22,00	
7,76	N/A	N/A	1	100%	7,76	
3,77	N/A	N/A	1	100%	3,77	
7,33	N/A	N/A	1	100%	7,33	
3,90	N/A	N/A	1	100%	3,90	
5,12	N/A	N/A	1	100%	5,12	
6,97	N/A	N/A	1	100%	6,97	
8,61	N/A	N/A	1	100%	8,61	
3,95	N/A	N/A	1	100%	3,95	
6,03	N/A	N/A	1	100%	6,03	
7,41	N/A	N/A	1	100%	7,41	
16,23	N/A	N/A	1	100%	16,23	
20,04	N/A	N/A	1	100%	20,04	
39,13	N/A	N/A	1	100%	39,13	
33,92	N/A	N/A	1	100%	33,92	
19,71	N/A	N/A	1	100%	19,71	
24,47	N/A	N/A	1	100%	24,47	
		PISO 3				
44,50	N/A	N/A	1	100%	44,50	PASILLO: DE SWICH 1 AL 2
36,00	N/A	N/A	1	100%	36,00	PASILLO: DE SWICH 1 AL 3
44,60	N/A	N/A	1	100%	44,60	SUR A NORTE: DE SWINCH 1 AL 2
32,00	N/A	N/A	1	100%	32,00	NORTE A SUR: DE SWICH 2 AL 3
33,50	N/A	N/A	1	100%	33,50	UCI-P: DE SWICH 3 AL 4
48,00	N/A	N/A	1	100%	48,00	PASILLO: DE SWICH 4 A BUITRON
22,30	N/A	N/A	1	100%	22,30	BUITRON A PASILLO ORATORIO
19,10	N/A	N/A	1	100%	19,10	DE ORATORIO A UCI-P 1
6,10	N/A	N/A	1	100%	6,10	DE UCI-P 3 A UCI-P 5
6,40	N/A	N/A	1	100%	6,40	DE UCI-P 5 A UCI-P 7
6,40	N/A	N/A	1	100%	6,40	DE UCI-P 7 A UCI-P 9
6,40	N/A	N/A	1	100%	6,40	DE UCI-P 9 A UCI-P 11
8,60	N/A	N/A	1	100%	8,60	DE UCI-P 11 A UCI-P 12
6,40	N/A	N/A	1	100%	6,40	DE UCI-P 12 A UCI-P 10
7,46	N/A	N/A	1	100%	7,46	DE UCI-P 10 A UCI-P 8
6,10	N/A	N/A	1	100%	6,10	DE UCI-P 8 A UCI-P 6
5,50	N/A	N/A	1	100%	5,50	DE UCI-P 6 A UCI-P 4
6,10	N/A	N/A	1	100%	6,10	DE UCI-P 4 A UCI-P 2
5,00	N/A	N/A	1	100%	5,00	DE UCI-P 2 A TRABAJO LIMPIO
7,50	N/A	N/A	1	100%	7,50	DE WC ADULTOS Y WC NIÑOS - ESTAR DE TV




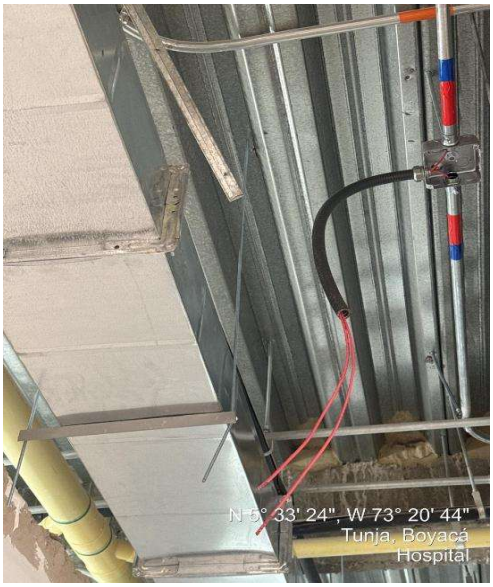





5,80	N/A	N/A	1	100%	5,80	ESTAR DE TV A BODEGA
5,90	N/A	N/A	1	100%	5,90	BODEGA A CORDINACIÓN DE PEDIATRIA
6,50	N/A	N/A	1	100%	6,50	COORDINACIÓN PEDIATRIA A PREPARACIÓN DE FORMULAS
5,10	N/A	N/A	1	100%	5,10	PREPARACIÓN DE FORMULAS A PASILLO FRENTE C. ASEO
10,00	N/A	N/A	1	100%	10,00	PASILLO FRENTE C. ASEO A PASILLO DE PUNTO DE SALIDA EMERGENCIA
5,70	N/A	N/A	1	100%	5,70	PASILLO DE PUNTO DE SALIDA EMERGENCIA A RACK
6,10	N/A	N/A	1	100%	6,10	RACK A DEPOSITO DE INSUMOS
5,50	N/A	N/A	1	100%	5,50	DEPOSITO DE INSUMOS A EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA
9,70	N/A	N/A	1	100%	9,70	EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA A LUDOTECA
41,70	N/A	N/A	1	100%	41,70	LUDOTECA A HOSPITALIZACIÓN HAB. 302
10,10	N/A	N/A	1	100%	10,10	HOSPITALIZACIÓN HAB. 302 A HAB. 301
45,50	N/A	N/A	1	100%	45,50	SALA ESPERA A BUITRON
56,10	N/A	N/A	1	100%	56,10	SWICH 4 A SWICH 1
1,70	N/A	N/A	1	100%	1,70	PROCEDIMIENTOS A ASEO
6,10	N/A	N/A	1	100%	6,10	ASEO A DEPOSITO DE INSUMOS
3,70	N/A	N/A	1	100%	3,70	ASEO A CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
4,90	N/A	N/A	1	100%	4,90	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA A DESCANSO DE VESTIER
6,30	N/A	N/A	1	100%	6,30	DESCANSO VESTIER A INFORMACIÓN FAMILIARES
4,20	N/A	N/A	1	100%	4,20	INFORMACIÓN FAMILIARES A TRANSFER MEDICAMENTOS
9,80	N/A	N/A	1	100%	9,80	TRANSFER MEDICAMENTOS A INFORMACIÓN FAMILIARES
5,10	N/A	N/A	1	100%	5,10	INFORMACIÓN FAMILIARES A PASILLO FRENTE A COORDINACIÓN UCI-P
7,40	N/A	N/A	1	100%	7,40	PASILLO FRENTE A COORDINACIÓN UCI-P A PASILLO ALFRENTE DE WC
10,10	N/A	N/A	1	100%	10,10	PASILLO ALFRENTE DE WC A COORDINACIÓN UCI-P
6,80	N/A	N/A	1	100%	6,80	COORDINACIÓN UCI-P A DESCANSO ENFERMERIA
7,40	N/A	N/A	1	100%	7,40	DESCANSO ENFERMERIA A DESCANSO DE MEDICOS
7,10	N/A	N/A	1	100%	7,10	DESCANSO DE MEDICOS A COMPLEMENTACIÓN PEDAGOGICA
11,40	N/A	N/A	1	100%	11,40	COMPLEMENTACIÓN PEDAGOGICA A ESTACIÓN DE CAFÉ
8,90	N/A	N/A	1	100%	8,90	ESTACIÓN DE CAFÉ A EBTRADA DE WC ADULTOS Y WC NIÑOS
3,50	N/A	N/A	1	100%	3,50	TRABAJO LIMPIO A TRABAJO SUCIO
3,20	N/A	N/A	1	100%	3,20	TRABAJO SUCIO A CUARTO EQUIPOS
3,40	N/A	N/A	1	100%	3,40	CUARTO DE EQUIPOS A CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO DE INSUMOS
3,30	N/A	N/A	1	100%	3,30	CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO DE INSUMOS A ROPA LIMPIA
3,40	N/A	N/A	1	100%	3,40	ROPA LIMPIA A CUARTO DE ASEO
3,30	N/A	N/A	1	100%	3,30	CUARTO ASEO A PASILLO ALFRENTE DE CUARTO DE ASEO
9,50	N/A	N/A	1	100%	9,50	PASILLO AL FRENTE DE CUARTO ASEO A PASILLO AL FRENTE DE RESISUOS PELIGROSOS
4,70	N/A	N/A	1	100%	4,70	PASILLO AL FRENTE DE RESISUOS PELIGROSOS A RESIDUOS NO PELIGROSOS
3,00	N/A	N/A	1	100%	3,00	RESIDUOS NO PELIGROSOS A RESIDUOS PELIGROSOS
3,00	N/A	N/A	1	100%	3,00	RESIDUOS PELIGROSOS A ROPA SUCIA
8,20	N/A	N/A	1	100%	8,20	ROPA SUCIA A SALA DE ESPERA
10,20	N/A	N/A	1	100%	10,20	SALA ESPERA A ALFRENTE DE WC M
4,90	N/A	N/A	1	100%	4,90	AL FRENTE DE WC M A DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS
2,40	N/A	N/A	1	100%	2,40	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSO A DEPOSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS RECICLABLES
7,80	N/A	N/A	1	100%	7,80	DEPOSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS RECICLABLES A TRABAJO LIMPIO
21,50	N/A	N/A	1	100%	21,50	TRABAJO LIMPIO A BUITRON
10,00	N/A	N/A	1	100%	10,00	HABITACIÓN 24 - 25
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 25 - 23
12,30	N/A	N/A	1	100%	12,30	HABITACIÓN 23 - 21
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 21 - 19
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 19 - 17
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 17 - 15
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 15 - 13
2,00	N/A	N/A	1	100%	2,00	PROCEDIMIENTOS A TRABAJO SUCIO
6,00	N/A	N/A	1	100%	6,00	CUARTO ASEO A PASILLO
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	PASILLO A HABITACIÓN 9
5,20	N/A	N/A	1	100%	5,20	HABITACIÓN 9 - 1 0
13,30	N/A	N/A	1	100%	13,30	HABITACIÓN 10 - 11
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 11 - 12
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 12 - 14
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 14 - 16
12,60	N/A	N/A	1	100%	12,60	HABITACIÓN 16 - 18
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 18 - 20
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACIÓN 20 - 22
13,30	N/A	N/A	1	100%	13,30	HABITACIÓN 1 - 2
3,30	N/A	N/A	1	100%	3,30	HABITACIÓN 2 - 3
15,50	N/A	N/A	1	100%	15,50	HABITACIÓN 3 - 4 Y 4 - 6
17,90	N/A	N/A	1	100%	17,90	HABITACIÓN 6 - 8
10,40	N/A	N/A	1	100%	10,40	HABITACIÓN 6 - 5
4,70	N/A	N/A	1	100%	4,70	HABITACIÓN 5 - 7
7,00	N/A	N/A	1	100%	7,00	HAB 7 A CUARTO EQUIPOS
5,00	N/A	N/A	1	100%	5,00	CUARTO ASEO A CUARTO EQUIPOS
3,00	N/A	N/A	1	100%	3,00	PASILLO A PROCEDIMIENTOS
		PISO 4				
5,45	N/A	N/A	1	100%	5,45	PROCEDIMIENTOS A TRABAJO LIMPIO
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	TRABAJO LIMPIO A DEPOSITO
2,85	N/A	N/A	1	100%	2,85	DEPOSITO A TRABAJO SUIO
5,50	N/A	N/A	1	100%	5,50	TRABAJO SUCIO A CIRCULACION RESTRINGIDA
6,50	N/A	N/A	1	100%	6,50	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA A DEPOSITO RESIDUOS
3,20	N/A	N/A	1	100%	3,20	DEPOSITO RECIDUOS A EQUIPOS
6,20	N/A	N/A	1	100%	6,20	EQUIPOS A CIRCULACIÓN
8,80	N/A	N/A	1	100%	8,80	CIRCULACIÓN A CIRCULACION
2,50	N/A	N/A	1	100%	2,50	CIRCCULACION A ROPA LIMPIA
2,70	N/A	N/A	1	100%	2,70	ROPA LIMPIA A ROPA SUCIA
30,00	N/A	N/A	1	100%	30,00	ROPA SUCIA A DUCTO
20,00	N/A	N/A	1	100%	20,00	DUCTO A SALA DE ESPERA
7,50	N/A	N/A	1	100%	7,50	SALA DE ESPERA A FACTURACIÓN
8,30	N/A	N/A	1	100%	8,30	FACTURACION A HABITACIÓN 13
5,00	N/A	N/A	1	100%	5,00	HABITACION 13 A HABITACIÓN 15
8,00	N/A	N/A	1	100%	8,00	HABITACION 15 A CIRCULACIÓN

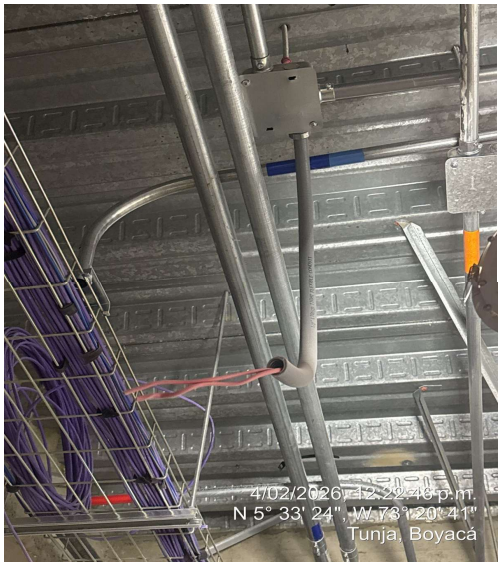



5,00	N/A	N/A	1	100%	5,00	CIRCCULACION A HABITACION 17
5,30	N/A	N/A	1	100%	5,30	HABITACION 17 A HABITACION 19
3,50	N/A	N/A	1	100%	3,50	HABITACION 19 A HABITACION 21
9,00	N/A	N/A	1	100%	9,00	HABITACION 21 A CIRCULACIÓN
7,50	N/A	N/A	1	100%	7,50	DE CIRCULACION A HABITACION 23
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	HABITACION 23 A HABITACION 25
8,60	N/A	N/A	1	100%	8,60	HABITACION 25 A PUESTO DE TRABAJO
8,30	N/A	N/A	1	100%	8,30	DE PUESTO DE TRABAJO A HBITACION 24
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	HABITACION 24 A HABITACIÓN 22
4,30	N/A	N/A	1	100%	4,30	HABITACION 22 A HABITACIÓN 20
4,60	N/A	N/A	1	100%	4,60	HABITACION 20 A HABITACIÓN 18
4,10	N/A	N/A	1	100%	4,10	HABITACION 18 A HABITACIÓN 16
3,50	N/A	N/A	1	100%	3,50	HABITACION 16 A HABITACIÓN 14
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	HABITACION 14 A HABITACIÓN 12
4,20	N/A	N/A	1	100%	4,20	HABITACION 12 A HABITACIÓN 11
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	HABITACION 11 A HABITACIÓN 10
3,80	N/A	N/A	1	100%	3,80	HABITACION 10 A HABITACIÓN 09
4,80	N/A	N/A	1	100%	4,80	HABITACION 09 A HABITACIÓN 07
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	HABITACION 07 A HABITACIÓN 05
8,50	N/A	N/A	1	100%	8,50	HABITACION 05 A HABITACIÓN 03
4,50	N/A	N/A	1	100%	4,50	HABITACION 03 A HABITACIÓN 01
3,50	N/A	N/A	1	100%	3,50	HABITACION 01 A HABITACIÓN 02
9,00	N/A	N/A	1	100%	9,00	HABITACION 02 A HABITACIÓN 04
4,00	N/A	N/A	1	100%	4,00	HABITACION 04 A HABITACIÓN 06
5,00	N/A	N/A	1	100%	5,00	HABITACION 06 A HABITACIÓN 08
3,50	N/A	N/A	1	100%	3,50	HABITACION 08 A CIRCULACION RESTRINGIDA
10,00	N/A	N/A	1	100%	10,00	DE CIRCULACION RESTRINGIDA A CIRCULACION RESTRINGIDA
4,30	N/A	N/A	1	100%	4,30	DE CIERCULACION RESTRINGIDA A DESCANSO VESTIER
9,50	N/A	N/A	1	100%	9,50	DE DESCANSO VESTIER A ASEO
24,90	N/A	N/A	1	100%	24,90	DE ASEO A DUCTO
20,00	N/A	N/A	1	100%	20,00	DE ASEO A DUCTO
1,50	N/A	N/A	1	100%	1,50	DE ASEO A DUCTO
28,50	N/A	N/A	1	100%	28,50	DE ASEO A DUCTO
1,50	N/A	N/A	1	100%	1,50	DE ASEO A DUCTO
46,00	N/A	N/A	1	100%	46,00	DE ASEO A DUCTO
1,50	N/A	N/A	1	100%	1,50	DE ASEO A DUCTO
		SOTANO				
16,70	N/A	N/A	1	100%	16,70	ESTACIÓN MANUAL: SALIDA A PARQUEON 22
14,30	N/A	N/A	1	100%	14,30	EQUIPOS DE VENTILACIÓN
13,60	N/A	N/A	1	100%	13,60	EQUIPOS BIOMÉDICOS
12,20	N/A	N/A	1	100%	12,20	BIOMEDICO
6,50	N/A	N/A	1	100%	6,50	BIOMEDICO A TALLER DE MANTENIMIENTO
6,70	N/A	N/A	1	100%	6,70	A BODEGA SUCIO
5,60	N/A	N/A	1	100%	5,60	A ASEO
8,70	N/A	N/A	1	100%	8,70	A ASEO
5,60	N/A	N/A	1	100%	5,60	A ARCHIVO
4,40	N/A	N/A	1	100%	4,40	A CUARTO ASEO
2,80	N/A	N/A	1	100%	2,80	A ROPA SUCIA
2,33	N/A	N/A	1	100%	2,33	A ROPA LIMPIA
2,60	N/A	N/A	1	100%	2,60	A DIETAS
5,00	N/A	N/A	1	100%	5,00	A SALA STAR
14,02	N/A	N/A	1	100%	14,02	A LAVADO LOZA
11,10	N/A	N/A	1	100%	11,10	A LAVADO LOZA
9,60	N/A	N/A	1	100%	9,60	A LAVADO LOZA
8,12	N/A	N/A	1	100%	8,12	A LAVADO LOZA
5,70	N/A	N/A	1	100%	5,70	A LAVADO OLLAS
12,60	N/A	N/A	1	100%	12,60	ESTACIÓN DE CONTROL
21,00	N/A	N/A	1	100%	21,00	DEPOSITO A CIRCULACIÓN
19,60	N/A	N/A	1	100%	19,60	A CIRCULACIÓN VEHICULOS
10,00	N/A	N/A	1	100%	10,00	A CIRCULACIÓN VEHICULOS
21,60	N/A	N/A	1	100%	21,60	A SUBESTACIÓN
22,60	N/A	N/A	1	100%	22,60	A SUBESTACIÓN
22,60	N/A	N/A	1	100%	22,60	A DEPOSITO ALMACEN
13,00	N/A	N/A	1	100%	13,00	A ACCESO SERVICIO
13,00	N/A	N/A	1	100%	13,00	A CUARTO RACK
12,90	N/A	N/A	1	100%	12,90	SUBESTACIÓN A C. BOMBAS

OBSERVACIONES:

TOTAL	**3.165,40**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**2.840,93**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**324,47**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6,04	BOCINA CON ESTROBO	CAP	6,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	4	100%	4,00	SOTANO
N/A	N/A	N/A	6	100%	6,00	PISO 1
N/A	N/A	N/A	6	50%	3,00	PISO 2
N/A	N/A	N/A	5	100%	5,00	PISO 3
N/A	N/A	N/A	3	100%	3,00	PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	21,00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	16,50	Unidad
PRESENTE ACTA	4,50	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6,05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	CAP	6,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	30	**50%**	**15,00**	SOTANO
N/A	N/A	N/A	71	**100%**	**71,00**	PISO 1
N/A	N/A	N/A	110	**50%**	**55,00**	PISO 2
N/A	N/A	N/A	97	**90%**	**87,30**	PISO 3
N/A	N/A	N/A	45	**100%**	**45,00**	PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	**273,30**	**Unidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**234,50**	**Unidad**
PRESENTE ACTA	**38,80**	**Unidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6,07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	CAP	6,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	4	100%	4,00	SOTANO
N/A	N/A	N/A	6	100%	6,00	PISO 1
N/A	N/A	N/A	6	50%	3,00	PISO 2
N/A	N/A	N/A	5	100%	5,00	PISO 3
N/A	N/A	N/A	3	100%	3,00	PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	21,00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	19,00	Unidad
PRESENTE ACTA	2,00	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8,11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	CAP	8,00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico











Dimensiones							
N° Barra	L (m) incluye ganchos	Kg/m	Elementos (cant)	Total KG	%	Total (m)	Observaciones
TANQUE DE ALMACENAMIENTO							
1/2	8,50	0,994	48	405,55	100%	**405,55**	Longituinal inferior losa de piso
1/2	4,50	0,994	48	214,70	100%	**214,70**	
1/2	5,50	0,994	48	262,42	100%	**262,42**	Longituinal superior losa de piso
1/2	7,50	0,994	48	357,84	100%	**357,84**	
1/2	7,45	0,994	77	570,21	100%	**570,21**	Transversal inferior losa de piso
1/2	7,45	0,994	77	570,21	100%	**570,21**	Transversal superior losa de piso
1/2	1,80	0,994	40	71,57	100%	**71,57**	Vertical muro oriental
1/2	2,50	0,994	40	99,40	100%	**99,40**	Vertical muro oriental
1/2	11,00	0,994	10	109,34	100%	**109,34**	Transversal muro oriental
1/2	7,50	0,994	10	74,55	100%	**74,55**	Transversal muro oriental
1/2	2,50	0,994	86	213,71	100%	**213,71**	Vertical muro divisorio cuarto de maquinas
1/2	6,85	0,994	20	136,18	100%	**136,18**	Transversal oriental muro divisorio cuarto de maquinas
1/2	5,75	0,994	10	57,16	100%	**57,16**	Transversal occidental muro divisorio cuarto de maquinas
1/2	2,50	0,994	86	213,71	100%	**213,71**	Vertical muro occidental
1/2	8,80	0,994	10	87,47	100%	**87,47**	Transversal occidental muro occidental
1/2	6,85	0,994	10	68,09	100%	**68,09**	
1/2	5,75	0,994	10	57,16	100%	**57,16**	Transversal oriental muro occidental
1/2	2,50	0,994	126	313,11	100%	**313,11**	Vertical muro norte
1/2	6,35	0,994	10	63,12	100%	**63,12**	Transversal sur muro norte
1/2	2,50	0,994	152	377,72	100%	**377,72**	Vertical muro sur
1/2	12,00	0,994	10	119,28	100%	**119,28**	Transversal Norte, muro sur
5/8	12,00	1,552	40	744,96	100%	**744,96**	Longitudinal inferior losa de cubierta
5/8	6,40	1,552	80	794,62	100%	**794,62**	Longitudinal superior losa de cubierta
5/8	6,85	1,552	75	797,34	100%	**797,34**	Transversal inferior losa de cubierta
5/8	3,85	1,552	150	896,28	100%	**896,28**	Transversal superior losa de cubierta
URBANISMO							
							VIGA CIMIENTO
1/2	70,35	0,994	1	69,93	100%	**69,93**	Longitudinal (traslapo: 70cm)
3/8	1,00	0,56	420	235,20	100%	**235,20**	Transversal (fleje C/15 - S:20x20cm - G:10cm)
							SUMIDERO 1 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN URBANISMO
3/8	2,90	0,56	4	6,50	100%	**6,50**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2,50	0,56	5	7,00	100%	**7,00**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4,20	0,56	4	9,41	100%	**9,41**	Transversal (traslapo: 40cm)
						0,00	
							SUMIDERO 2 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN EDF. ESPECIALISTA
3/8	2,90	0,56	4	6,50	100%	**6,50**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2,50	0,56	5	7,00	100%	**7,00**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4,20	0,56	4	9,41	100%	**9,41**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 3 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN URBANISMO
3/8	2,90	0,56	4	6,50	100%	**6,50**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2,50	0,56	5	7,00	100%	**7,00**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4,20	0,56	4	9,41	100%	**9,41**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 4 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN EDF. ESPECIALISTA
3/8	2,90	0,56	4	6,50	100%	**6,50**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2,50	0,56	5	7,00	100%	**7,00**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4,20	0,56	4	9,41	100%	**9,41**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 5 - COSTADO NOROCCIDENTAL INGRESO VÍA
3/8	2,90	0,56	4	6,50	100%	**6,50**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2,50	0,56	5	7,00	100%	**7,00**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4,20	0,56	4	9,41	100%	**9,41**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 6 - COSTADO NOROCCIDENTAL INGRESO VÍA
3/8	2,90	0,56	4	6,50	100%	**6,50**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2,50	0,56	5	7,00	100%	**7,00**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4,20	0,56	4	9,41	100%	**9,41**	Transversal (traslapo: 40cm)
							POZO 1 - VÍA COSTADO OCCIDENTAL
1/2	1,00	0,994	28	27,83	100%	**27,83**	Longitudinal
3/8	6,00	0,56	4	13,44	100%	**13,44**	Transversal (C/20cm - D:120cm - traslapo: 80cm)
							POZO 2 - VÍA COSTADO OCCIDENTAL
1/2	1,30	0,994	28	36,18	100%	**36,18**	Longitudinal
3/8	6,00	0,56	4	13,44	100%	**13,44**	Transversal (C/20cm - D:120cm - traslapo: 80cm)
							POZO 3 - COSTADO SUR
1/2	1,00	0,994	28	27,83	100%	**27,83**	Longitudinal
3/8	6,00	0,56	4	13,44	100%	**13,44**	Transversal (C/20cm - D:120cm - traslapo: 80cm)
							PLAZOLETA ESTATUA
1/2	18,22	0,994	2	36,23	100%	**36,23**	Longitudinal - radio externo (traslapo: 70cm)
1/2	17,31	0,994	4	68,82	100%	**68,82**	Longitudinal - radio interno (traslapo: 70cm)
3/8	1,00	0,56	109	61,04	100%	**61,04**	Transversal (fleje C/15 - S:20x20cm - G:10cm)
							VIGA CIMIENTO DE RAMPA - EXTERIOR AUDITORIO
1/2	9,82	0,994	4	39,04	100%	**39,04**	Longitudinal - radio externo (traslapo: 70cm)
3/8	1,00	0,56	66	36,96	100%	**36,96**	Transversal (fleje C/15 - S:20x20cm - G:10cm)
							VIGA CIMIENTO DE RAMPA - EXTERIOR FARMACIA
1/2	6,00	0,994	4	23,86	100%	**23,86**	Longitudinal - radio externo (traslapo: 70cm)
3/8	1,00	0,56	41	22,96	100%	**22,96**	Transversal (fleje C/15 - S:20x20cm - G:10cm)
Ancho losa (m)	**L (m) incluye ganchos**	**Kg/m**		**Elementos (cant)**	**%**	**Total (m)**	
							VÍA - MR
4,25	0,35	3,97		16,00	100%	**22,23**	LOSA 1
4,25	0,35	3,97		16,00	100%	**22,23**	LOSA 2
4,25	0,35	3,97		16,00	100%	**22,23**	LOSA 3
4,18	0,35	3,97		15,00	100%	**20,84**	LOSA 4
5,06	0,35	3,97		18,00	100%	**25,01**	LOSA 5
2,10	0,35	3,97		8,00	100%	**11,12**	LOSA 6
1,33	0,35	3,97		6,00	100%	**8,34**	LOSA 7
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 8
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 9
2,06	0,35	3,97		8,00	100%	**11,12**	LOSA 10
2,25	0,35	3,97		9,00	100%	**12,51**	LOSA 11
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 12
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 13
3,04	0,35	3,97		12,00	100%	**16,67**	LOSA 14
2,10	0,35	3,97		8,00	100%	**11,12**	LOSA 15
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 16
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 17
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 18
1,00	0,35	3,97		5,00	100%	**6,95**	LOSA 19
1,90	0,35	3,97		8,00	100%	**11,12**	LOSA 20
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 21
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 22
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	**18,06**	LOSA 23











3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 24
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 25
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 26
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 27
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 28
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 29
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 30
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 31
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 32
2,10	0,35	3,97		8,00	100%	11,12	LOSA 33
2,10	0,35	3,97		8,00	100%	11,12	LOSA 34
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 35
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 36
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 37
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 38
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 39
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 40
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 41
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 42
2,44	0,35	3,97		10,00	100%	13,90	LOSA 43
2,05	0,35	3,97		8,00	100%	11,12	LOSA 44
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 45
2,62	0,35	3,97		10,00	100%	13,90	LOSA 46
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 47
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 48
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 49
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 50
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 51
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 52
2,50	0,35	3,97		10,00	100%	13,90	LOSA 53
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 54
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 55
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 56
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 57
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 58
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 59
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 60
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 61
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 62
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 63
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 64
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 65
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 66
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 67
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 68
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 69
1,27	0,35	3,97		6,00	100%	8,34	LOSA 70 trapesoidal
2,37	0,35	3,97		9,00	100%	12,51	LOSA 71 trapesoidal
2,54	0,35	3,97		10,00	100%	13,90	LOSA 72
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 73
2,54	0,35	3,97		10,00	100%	13,90	LOSA 74
3,50	0,35	3,97		13,00	100%	18,06	LOSA 75
1,20	0,35	3,97		5,00	100%	6,95	LOSA 76 triangular
			CASETA GASES MEDICINALES				
							ZAPATA 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 2
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 3
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 4
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 5
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 6
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 7
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
							ZAPATA 8
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 1
1/2	1,10	0,994	5	5,47	100%	5,47	Lado 2
			TERRAZA - 5TO PISO				
							DADOS DE SOPORTE DE EQUIPOS DE HVAC - COSTADO NORTE
1/2	1,67	0,994	30	49,80	100%	49,80	DADOS RECTANGULARES: Longitudinal
3/8	0,35	0,56	105	20,58	100%	20,58	DADOS RECTANGULARES: Transversal
1/2	0,9	0,994	50	44,73	100%	44,73	DADOS CUADRADOS: Longitudinal (lado 1 y lado 2)
							DADOS DE SOPORTE DE EQUIPOS DE HVAC - COSTADO ORIENTAL
1/2	1,4	0,994	24	33,40	100%	33,40	DADOS RECTANGULARES: Longitudinal
3/8	0,35	0,56	84	16,46	100%	16,46	DADOS RECTANGULARES: Transversal
							DADOS DE SOPORTE DE EQUIPOS DE HVAC - COSTADO SUR
1/2	1,67	0,994	24	39,84	100%	39,84	DADOS RECTANGULARES: Longitudinal
3/8	0,35	0,56	84	16,46	100%	16,46	DADOS RECTANGULARES: Transversal
1/2	0,9	0,994	20	17,89	100%	17,89	DADOS CUADRADOS: Longitudinal (lado 1 y lado 2)
							DADOS DE SOPORTE DE EQUIPOS DE HVAC - COSTADO OCCIDENTAL
1/2	1,88	0,994	6	11,21	100%	11,21	DADOS RECTANGULARES: Longitudinal
3/8	0,35	0,56	42	8,23	100%	8,23	DADOS RECTANGULARES: Transversal
1/2	1,4	0,994	6	8,35	100%	8,35	DADOS RECTANGULARES: Longitudinal
3/8	0,35	0,56	42	8,23	100%	8,23	DADOS RECTANGULARES: Transversal
							VIGUETAS
1/2	6,5	0,994	2	12,92	100%	12,92	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
3/8	0,35	0,56	45	8,82	100%	8,82	
1/2	1,77	0,994	2	3,52	100%	3,52	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
3/8	0,35	0,56	13	2,55	100%	2,55	
			PISO 1				
				Elementos iguales (cant)			**COLUMNETAS**
1/2	1,79	0,994	2	1	100%	3,56	ANTEPECHO FACHADA FARMACIA
3/8	0,35	0,56	13	1	100%	2,55	
1/2	2,75	0,994	2	1	100%	5,47	AUDITORIO
3/8	0,35	0,56	20	1	100%	3,92	
1/2	2,85	0,994	2	1	100%	5,67	PERSONAL ASISTENCIAL
3/8	0,35	0,56	20	1	100%	3,92	
1/2	2,70	0,994	2	5	100%	26,84	WC PERSONAL ASSTENCIAL
3/8	0,35	0,56	19	5	100%	18,62	
1/2	2,85	0,994	2	2	100%	11,33	CAFETERIA
3/8	0,35	0,56	20	2	100%	7,84	
							VIGUETAS
1/2	2,81	0,994	2	5,59	100%	5,59	ANTEPECHO FARMACIA - FACHADA NOROCCIDENTAL
3/8	0,35	0,56	20	3,92	100%	3,92	
1/2	4,51	0,994	2	8,97	100%	8,97	AUDITORIO







3/8	0,35	0,56	32	6,27	100%	6,27	AUDITORIO
1/2	3,30	0,994	2	6,56	100%	6,56	PERSONAL ASISTENCIAL
3/8	0,35	0,56	23	4,51	100%	4,51	
1/2	4,96	0,994	2	9,86	100%	9,86	PERSONAL ASISTENCIAL
3/8	0,35	0,56	35	6,86	100%	6,86	
1/2	3,75	0,994	2	7,46	100%	7,46	CAFETERIA
3/8	0,35	0,56	26	5,10	100%	5,10	
			PISO 3				
				Elementos iguales (cant)			COLUMNETAS
1/2	2,75	0,994	2	2	100%	10,93	MURO BUITRO - ORATORIO
3/8	0,35	0,56	20	2	100%	7,84	
1/2	2,25	0,994	2	1	100%	4,47	WC PRINCIPAL HALL
3/8	0,35	0,56	16	1	100%	3,14	
1/2	2,85	0,994	2	4	100%	22,66	MURO BUITRO - HAB 313
3/8	0,35	0,56	20	4	100%	15,68	
			PISO 4				
				Elementos iguales (cant)			COLUMNETAS
1/2	2,70	0,994	2	2	100%	10,74	MURO BUITRO - HAB 413
3/8	0,35	0,56	19	2	100%	7,45	
1/2	2,10	0,994	2	2	100%	8,35	WC PRINCIPAL HALL
3/8	0,35	0,56	15	2	100%	5,88	
			SÓTANO				
				Elementos iguales (cant)			COLUMNETAS
1/2	2,77	0,994	2	4	100%	7,45	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
3/8	0,35	0,56	20	4	100%	8,35	
1/2	2,77	0,994	2	1	100%	5,88	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
3/8	0,35	0,56	20	1	100%	5,66	
1/2	2,77	0,994	2	1	100%	4,87	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
3/8	0,35	0,56	20	1	100%	4,09	
1/2	2,77	0,994	2	1	100%	3,31	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
3/8	0,35	0,56	20	1	100%	2,52	
1/2	2,77	0,994	2	3	100%	1,74	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
3/8	0,35	0,56	20	3	100%	0,95	
							VIGUETAS
1/2	6,96	0,994	2	13,84	100%	13,84	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
3/8	0,35	0,56	48	9,41	100%	9,41	
1/2	0,85	0,994	2	1,69	100%	1,69	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
3/8	0,35	0,56	7	1,37	100%	1,37	
1/2	0,46	0,994	2	0,91	100%	0,91	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
3/8	0,35	0,56	5	0,98	100%	0,98	
1/2	2,85	0,994	2	5,67	100%	5,67	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
3/8	0,35	0,56	20	3,92	100%	3,92	
1/2	1,00	0,994	2	1,99	100%	1,99	SUBESTACIÓN: PUERTA
3/8	0,35	0,56	8	1,57	100%	1,57	
1/2	5,08	0,994	2	10,10	100%	10,10	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
3/8	0,35	0,56	35	6,86	100%	6,86	
1/2	1,24	0,994	2	2,47	100%	2,47	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
3/8	0,35	0,56	10	1,96	100%	1,96	

OBSERVACIONES:

TOTAL	10.560,66	kilogramo
ACUMULADO ANTERIOR	9.778,75	kilogramo
PRESENTE ACTA	781,91	kilogramo

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



















Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4						
1,3	1,15	N/A	1	**100%**	**1,50**	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
2,9	1,20	N/A	1	**100%**	**3,48**	T. LIMPIO
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 04
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 03
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 05
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 06
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 08
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 09
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 13
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 14
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 15
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 16
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 17
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 18
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 19
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 20
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 21
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 18
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 22
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 23
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 24
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 25
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC PREPARACIÓN PACIENTES
2,7	1,05	N/A	1	**100%**	**2,84**	ROPA LIMPIA
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 04
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 05
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 06
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 08
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 13
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 15
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 16
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 17
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 19
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 21
0,9	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 23
PISO 3						
1,7	1,54	N/A	1	**100%**	**2,62**	UCI PEDIATRICA: BAÑO PMR
2,385	1,40	N/A	1	**100%**	**3,34**	UCI PEDIATRICA: TRABAJO SUCIO
2,37	1,36	N/A	1	**100%**	**3,22**	UCI PEDIATRICA: TRABAJO LIMPIO
1,12	0,78	N/A	1	**100%**	**0,87**	UCI PEDIATRICA: ROPA SUCIA
1,12	0,78	N/A	1	**100%**	**0,87**	UCI PEDIATRICA: RESIDUOS PELIGROSOS
1,13	0,72	N/A	1	**100%**	**0,81**	UCI PEDIATRICA: RESIDUOS NO PELIGROSOS
1,74	1,40	N/A	1	**100%**	**2,44**	LUDOTECA: BAÑO PMR
0,68	0,33	N/A	1	**100%**	**0,22**	
2,71	1,45	N/A	1	**100%**	**3,93**	LUDOTECA: ÁREA LAVAMANOS
0,52	0,33	N/A	1	**100%**	**0,17**	LUDOTECA: CUARTO ASEO
1,05	0,68	N/A	1	**100%**	**0,71**	
0,62	0,30	N/A	1	**100%**	**0,19**	LUDOTECA: BAÑOS
0,66	0,34	N/A	1	**100%**	**0,22**	
1,46	1,60	N/A	1	**100%**	**2,34**	
0,68	0,72	N/A	1	**100%**	**0,49**	CUARTO ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0,29	0,53	N/A	1	**100%**	**0,15**	
0,9	0,90	N/A	1	**100%**	**0,81**	WC HABITACIÓN 24
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 04
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 03
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 05
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 06
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 08
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 09
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 13
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 14
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 15
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 17
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 20
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 21
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 18
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 22
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	WC HABITACIÓN 23
1,61	1,39	N/A	1	**100%**	**2,24**	WC PREPARACIÓN PACIENTES
2,70	1,05	N/A	1	**100%**	**2,84**	ROPA LIMPIA
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 04
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 05
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 06
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 08
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 13
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 15
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 16
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 17
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 19
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 21
0,90	1,00	N/A	1	**100%**	**0,90**	HABITACIÓN 23
2,90	1,20	N/A	1	**100%**	**3,48**	T. SUCIO CENTRAL ENFERMERIA
PISO 1						
3,8	1,93	N/A	1	**100%**	**7,33**	LAVADO DE PACIENTES
2,67	1,93	N/A	1	**100%**	**5,15**	W.C MUJERES
1,52	2,21	N/A	1	**100%**	**3,36**	BAÑO DISCAPASITADOS
1,94	2,65	N/A	1	**100%**	**5,14**	W.C SALA ESPERA ADULTO
1,2	1,76	N/A	1	**100%**	**2,11**	W.C SALA ESPERA ADULTO
1,36	1,25	N/A	1	**100%**	**1,70**	CONSULTORIO 1
1,46	1,10	N/A	1	**100%**	**1,61**	CONSULTORIO 2
1,5	1,02	N/A	1	**100%**	**1,53**	CONSULTORIO 3
1,56	1,19	N/A	1	**100%**	**1,86**	CONSULTORIO 4
1,22	1,35	N/A	1	**100%**	**1,65**	SALA ERA
2,11	1,53	N/A	1	**100%**	**3,23**	WC MIXTO PMR
2,11	1,13	N/A	1	**100%**	**2,38**	WC MUJERES
1,17	1,45	N/A	1	**100%**	**1,70**	WC AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
1,78	0,84	N/A	1	**100%**	**1,50**	WC LABORATORIO
1,05	1,30	N/A	1	**100%**	**1,37**	WC ENTREGA MUESTRAS
2,07	1,44	N/A	1	**100%**	**2,98**	WC PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA
1,28	1,14	N/A	1	**100%**	**1,46**	WC ECOGRAFO
1,27	1,00	N/A	1	**100%**	**1,27**	WC CONSULTORIO DE ECOGRAFO
1,32	19,00	N/A	1	**100%**	**25,08**	WC ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1	2,02	N/A	1	**100%**	**2,02**	T. LIMPIO ADMISIONES
1,7	1,20	N/A	1	**100%**	**2,04**	T. LIMPIO OBSERVACIÓN PEDIATRIA
1,66	1,00	N/A	1	**100%**	**1,66**	T. SUCIO OBSERVACIÓN PEDIATRIA
6	1,85	N/A	1	**100%**	**11,10**	WC FAMILIAR OBS. PEDIATRIA
1,36	1,30	N/A	1	**100%**	**1,77**	WC PERSONAL ASISTENCIAL 1
1,14	1,36	N/A	1	**100%**	**1,55**	WC PERSONAL ASISTENCIAL 2
1,8	1,10	N/A	1	**100%**	**1,98**	WC MONITOREO GINECOSTETRICIA
1,8	1,02	N/A	1	**100%**	**1,84**	WC CAFETERIA
1,7	1,73	N/A	1	**100%**	**2,94**	WC CAFETERIA
1,45	1,05	N/A	1	**100%**	**1,52**	ASEO CIRCULACIÓN URG
1,17	1,00	N/A	1	**100%**	**1,17**	WC DIGITACIÓN
1,6	0,94	N/A	1	**100%**	**1,50**	WC CONSULTORIO 3
2,6	0,95	N/A	1	**100%**	**2,47**	WC SALA EDA



2,82	1,00	N/A	1	100%	2,82	WC OBS PEDIATRIA
1,9	1,40	N/A	1	100%	2,66	WC OBS GINECOBSTETRICIA
0,7	1,30	N/A	1	100%	0,91	C. ASEO PASILLO OBSVACIONES A FARMACIA
		PISO 2				
1,15	1,15	N/A	1	100%	1,32	WC RECUPERACIÓN PARTO
2,21	1,36	N/A	1	100%	3,01	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN PARTOS
2,21	0,82	N/A	1	100%	1,81	ROPA LIMPIA - RECUPERACIÓN PARTOS
1,56	1,25	N/A	1	100%	1,95	TRABAJO SUCIO - RECUPERACIÓN PARTOS
2,64	1,25	N/A	1	100%	3,30	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN PARTOS DETRÁS DE CENTRAL ENFERMERIA
1,15	1,36	N/A	1	100%	1,56	WC DESCANSO
1,04	1,00	N/A	1	100%	1,04	WC VESTIER MUJERES
2,74	1,15	N/A	1	100%	3,15	
2,1	0,93	N/A	1	100%	1,95	WC-H PMR
1,33	0,45	N/A	1	100%	0,60	
3,5	1,82	N/A	1	100%	6,37	FILTRO A ESTERILIZACIÓN
1,21	1,16	N/A	1	100%	1,40	
1,93	1,18	N/A	1	100%	2,28	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN QUIRURGICA
1,93	1,18	N/A	1	100%	2,28	TRABAJO SUCIO - RECUPERACIÓN QUIRUGICA
1,68	1,02	N/A	1	100%	1,71	C. ASEO - FRENTE A QUIROFANO 3
1,34	0,86	N/A	1	100%	1,15	WC VESTIER HOMBRES
1,03	0,87	N/A	1	100%	0,90	DUCHA VESTIER HOMBRES
1,94	0,87	N/A	1	100%	1,69	ROPA SUCIA CENTRAL DE ENFERMERIA
1,26	1,30	N/A	1	100%	1,64	T. SUCIO CENTRAL DE ENFERMERIA
0,95	1,83	N/A	1	100%	1,74	MATERIAL - INSUMOS UCI URO
1,25	1,00	N/A	1	100%	1,25	DUCHA VESTIER MUJERE
1,27	2,00	N/A	1	100%	2,54	LAVADO INCUVADORA
1,23	1,66	N/A	1	100%	2,04	T- SUCIO UCI NEO
1,55	1,32	N/A	1	100%	2,05	WC CIRCULACIÓN A DESCANSO
2,20	1,20	N/A	1	100%	2,64	T. LIMPIO
1,62	0,60	N/A	1	100%	0,97	WC FILTRO ACCESO UARO
1,25	1,80	N/A	1	100%	2,25	WC FILTRO ACCESO UARO
1,92	1,45	N/A	1	100%	2,78	T. LIMPIO UARO
1,71	1,34	N/A	1	100%	2,29	WC AISLADO UARO
1,34	0,60	N/A	1	100%	0,80	WC AISLADO UARO
1,65	1,93	N/A	1	100%	3,18	WC UARO
2,93	1,46	N/A	1	100%	4,28	WC UARO
1,20	1,00	N/A	1	100%	1,20	ASEO UARO
1,12	1,80	N/A	1	100%	2,02	WC RECUPERACIÓN PARTO
1,43	1,47	N/A	1	100%	2,10	WC TRABAJO PARTOS
0,95	0,88	N/A	1	100%	0,84	WC TRABAJO PARTOS
1,75	0,65	N/A	1	100%	1,14	RESIDUOS TEMPORALES
1,63	1,30	N/A	1	100%	2,12	RESIDUOS TEMPORALES
1,60	1,48	N/A	1	100%	2,37	WC PEROSONAL ASISTENCIAL
1,70	1,60	N/A	1	100%	2,72	WC. FRENTE A COORDINACION UCI
1,60	1,00	N/A	1	100%	1,60	W.C MUJERES FRENTEB PERSONAL ASISTENCIAL
1,80	1,90	N/A	1	100%	3,42	W.C MOVILIDAD REDUCIDA UCI NEO
1,56	1,56	N/A	1	100%	2,43	W.C PREPARACION PACIENTES
2,20	2,17	N/A	1	100%	4,77	W.C PRINCIPAL 3ER NIVEL
2,20	2,17	N/A	1	100%	4,77	W.C PRINCIPAL 4RTO NIVEL
1,19	1,19	N/A	1	100%	1,42	W.C FILTRO AUTO CLAVE
1,20	0,80	N/A	1	100%	0,96	ASEO POSETA
1,20	0,80	N/A	1	100%	0,96	RESIDUOS ORDINARIOS
1,20	0,80	N/A	1	100%	0,96	RESIDUOS PELIGROSOS
1,40	0,95	N/A	1	100%	1,33	ROPA SUCIA CENTRAL DE ENFERMERIA
2,20	1,20	N/A	1	100%	2,64	ASEO FRENTE A SALA DE PARTOS
1,34	1,40	N/A	1	100%	1,88	T-LIMPIO UCI NEO
2,30	1,20	N/A	1	100%	2,76	T-SUCIO UCI NEO
1,00	1,00	N/A	1	100%	1,00	ASEO UCI NEO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**281,05**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**255,17**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**25,88**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







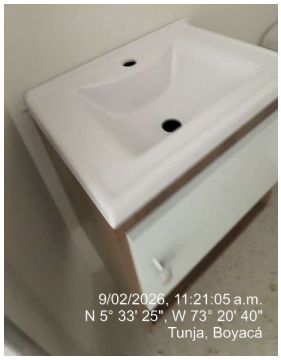

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 3				
			1	85%	0,85	Habitacion 1
			1	85%	0,85	Habitacion 2
			1	85%	0,85	Habitación 3
			1	85%	0,85	Habitacion 4
			1	85%	0,85	Habitacion 6
			1	85%	0,85	Habitacion 5
			1	85%	0,85	Habitacion 7
			1	85%	0,85	Habitacion 8
			1	85%	0,85	Habitacion 9
			1	85%	0,85	Habitacion 10
			1	85%	0,85	Hbaitacion 11
			1	85%	0,85	Habitacion 12
			1	85%	0,85	Habitacion 13
			1	85%	0,85	Habitacion 14
			1	85%	0,85	Habitacion 15
			1	85%	0,85	Habitacion 16
			1	85%	0,85	Habitacion 17
			1	85%	0,85	Habitacion 19
			1	85%	0,85	Habitacion 18
			1	85%	0,85	Habitacion 20
			1	85%	0,85	habitacion 21
			1	85%	0,85	Habitacion 23
			1	85%	0,85	Habitacion 22
			1	85%	0,85	Habitacion 24
			1	85%	0,85	Habitacion 25
		PISO 4				
			1	85%	0,85	Habitacion 1
			1	85%	0,85	Habitacion 2
			1	85%	0,85	Habitación 3
			1	85%	0,85	Habitacion 4
			1	85%	0,85	Habitacion 6
			1	85%	0,85	Habitacion 5
			1	85%	0,85	Habitacion 7
			1	85%	0,85	Habitacion 8
			1	85%	0,85	Habitacion 9
			1	85%	0,85	Habitacion 10
			1	85%	0,85	Hbaitacion 11
			1	85%	0,85	Habitacion 12
			1	85%	0,85	Habitacion 13
			1	85%	0,85	Habitacion 14
			1	85%	0,85	Habitacion 15
			1	85%	0,85	Habitacion 16
			1	85%	0,85	Habitacion 17
			1	85%	0,85	Habitacion 19
			1	85%	0,85	Habitacion 18
			1	85%	0,85	Habitacion 20
			1	85%	0,85	habitacion 21
			1	85%	0,85	Habitacion 23
			1	85%	0,85	Habitacion 22
			1	85%	0,85	Habitacion 24
			1	85%	0,85	Habitacion 25

OBSERVACIONES:

TOTAL	42,50	Cantidad
ACUMULADO ANTERIOR	0,00	Cantidad
PRESENTE ACTA	42,50	Cantidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 21	CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
PISO 1						
28,73	N/A	N/A	2	**100%**	**57,46**	AUDITORIO
39,16	N/A	N/A	2	**100%**	**78,32**	CAFETERIA
1,64	N/A	N/A	2	**100%**	**3,28**	
20,06	N/A	N/A	2	**100%**	**40,12**	COCINA
35,37	N/A	N/A	2	**100%**	**70,74**	SALA ESPERA IMAGENOLOGIA
22,25	N/A	N/A	2	**100%**	**44,50**	RECEPCIÓN MEDICAMENTO FARMACIA
28,27	N/A	N/A	2	**100%**	**56,54**	FARMACIA
45,22	N/A	N/A	2	**100%**	**90,44**	EQUIPOS LABORATORIO
25,43	N/A	N/A	2	**100%**	**50,86**	CENTRIFUGA Y LOQUER LABORATORIO
9,94	N/A	N/A	2	**100%**	**19,88**	NEVERAS LABORATORIO
13,51	N/A	N/A	2	**100%**	**27,02**	PRETRASFUNCIONAL LABORATORIO
18,64	N/A	N/A	2	**100%**	**37,28**	RESIDUOS PELIGROSO, RESIDUOS RECICLABLE,ASEO LABORATORIO
7,00	N/A	N/A	2	**100%**	**14,00**	INGRESO LABORATORIO
11,06	N/A	N/A	2	**100%**	**22,12**	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGIA
16,60	N/A	N/A	2	**100%**	**33,20**	TOMA DE MUESTRA
10,47	N/A	N/A	2	**100%**	**20,94**	PASILLO SUR IMAGENOLOGIA
6,74	N/A	N/A	2	**100%**	**13,48**	PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA
9,33	N/A	N/A	2	**100%**	**18,66**	SALA DE ESPERA ECOGRAFIA
20,36	N/A	N/A	2	**100%**	**40,72**	ECOGRAFO 1
15,15	N/A	N/A	2	**100%**	**30,30**	ECOGRAFO 2
14,64	N/A	N/A	2	**100%**	**29,28**	ADMISIONES PROCEDIMIENTO
19,82	N/A	N/A	2	**100%**	**39,64**	PROCEDIMIENTO CARDIO
12,19	N/A	N/A	2	**100%**	**24,38**	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
20,00	N/A	N/A	2	**100%**	**40,00**	OBSERVACION GINECOPEDIATRIA
11,29	N/A	N/A	2	**100%**	**22,58**	CIRCULACION RX
9,09	N/A	N/A	2	**100%**	**18,18**	CIRCULACION MAMOGRAFIA
34,67	N/A	N/A	2	**100%**	**69,34**	OBSERVACION PEDIATRICA
23,41	N/A	N/A	2	**100%**	**46,82**	OBSERVACION PEDIATRICA
7,78	N/A	N/A	2	**100%**	**15,56**	DISPARO
16,26	N/A	N/A	2	**100%**	**32,52**	T.A.C
14,48	N/A	N/A	2	**100%**	**28,96**	OFICINA RADIOLOGIA Y RECIDUO RX
9,48	N/A	N/A	2	**100%**	**18,96**	SALA LECTURA RADIOLOGIA
2,53	N/A	N/A	2	**100%**	**5,06**	CIRCULACION FRENTE SALA DE LECTURA
3,95	N/A	N/A	2	**100%**	**7,90**	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE
3,50	N/A	N/A	2	**100%**	**7,00**	RESIDUO PELIGROSO
15,46	N/A	N/A	2	**100%**	**30,92**	SALA EDA
18,54	N/A	N/A	2	**100%**	**37,08**	DIGITACION
3,89	N/A	N/A	2	**100%**	**7,78**	ROPA SUCIA
4,85	N/A	N/A	2	**100%**	**9,70**	EQUIPO
13,83	N/A	N/A	2	**100%**	**27,66**	ERA
9,57	N/A	N/A	2	**100%**	**19,14**	CIRCULACION CENTRA DE ENFERMERIA A ERA
10,68	N/A	N/A	2	**100%**	**21,36**	DIRECCION DE URGENCIAS
13,06	N/A	N/A	2	**100%**	**26,12**	PROCEDIMEINTOS ASEPTICOS
13,95	N/A	N/A	2	**100%**	**27,90**	SALA DE YESOS
13,3	N/A	N/A	2	**100%**	**26,60**	CONSULTORIO 5
26,96	N/A	N/A	2	**100%**	**53,92**	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
14,56	N/A	N/A	2	**100%**	**29,12**	CONSULTORIO 2
14,57	N/A	N/A	2	**100%**	**29,14**	CONSULTORIO 1
14,86	N/A	N/A	2	**100%**	**29,72**	CONSULTORIO 4
15,4	N/A	N/A	2	**100%**	**30,80**	CONSULTORIO 3
21,2	N/A	N/A	2	**100%**	**42,40**	REANIMACIÓN
28,24	N/A	N/A	2	**100%**	**56,48**	CIRCULACION URGENCIAS
4,71	N/A	N/A	2	**100%**	**9,42**	PASILLO URGENCIAS
8,2	N/A	N/A	2	**100%**	**16,40**	TRIAGE # 2
12,72	N/A	N/A	2	**100%**	**25,44**	CIRCULACION TRIAGE Y SILLAS DE RUEDAS
11,13	N/A	N/A	2	**100%**	**22,26**	TRIAGE # 1
47,32	N/A	N/A	2	**100%**	**94,64**	SALA DE ESPERA ADULTOS
31,27	N/A	N/A	2	**100%**	**62,54**	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
31,27	N/A	N/A	2	**100%**	**62,54**	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
9,87	N/A	N/A	2	**100%**	**19,74**	FACTURACIÓN
15,8	N/A	N/A	2	**100%**	**31,60**	DESCANSO MEDICO
16,27	N/A	N/A	2	**100%**	**32,54**	DATA CENTER
11,53	N/A	N/A	2	**100%**	**23,06**	HALL CENTRAL
5,31	N/A	N/A	2	**100%**	**10,62**	WC CAFETERIA
6,49	N/A	N/A	2	**100%**	**12,98**	WC DISCAPACITADOS CAFETERIA
7,11	N/A	N/A	2	**100%**	**14,22**	WC DISCAPACITADOS SALA DE ESPERA ADULTOS
9,07	N/A	N/A	2	**100%**	**18,14**	WC DAMAS SALA DE ESPERA ADULTOS
4,79	N/A	N/A	2	**100%**	**9,58**	WC DESCANSO MEDICO 1
5,16	N/A	N/A	2	**100%**	**10,32**	WC DESCANSO MEDICO 2
27,24	N/A	N/A	2	**100%**	**54,48**	DESCANSO MEDICO
4,8	N/A	N/A	2	**100%**	**9,60**	CONSULTORIO 4
4,98	N/A	N/A	2	**100%**	**9,96**	CONSULTORIO 1
4,79	N/A	N/A	2	**100%**	**9,58**	CONSULTORIO 2
5,31	N/A	N/A	2	**100%**	**10,62**	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
5,14	N/A	N/A	2	**100%**	**10,28**	CONSULTORIO 5
4,85	N/A	N/A	2	**100%**	**9,70**	SALA ERA
17,15	N/A	N/A	2	**100%**	**34,30**	WC FAMILIAR
6,65	N/A	N/A	2	**100%**	**13,30**	WC DISCAPACITADOS GINECOPSTETRICIA
6,05	N/A	N/A	2	**100%**	**12,10**	BAÑO VESTIER ADMISIONES
4,27	N/A	N/A	2	**100%**	**8,54**	WC ECOGRAFO 1
4,27	N/A	N/A	2	**100%**	**8,54**	WC ECOGRAFO 2
4,72	N/A	N/A	2	**100%**	**9,44**	WC PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
4,28	N/A	N/A	2	**100%**	**8,56**	WC TOMA DE MUESTRAS
5,08	N/A	N/A	2	**100%**	**10,16**	WC LABORATORIO
5,03	N/A	N/A	2	**100%**	**10,06**	WC FARMACIA
6,22	N/A	N/A	2	**100%**	**12,44**	WC MIXTO ESPERA IMAGENOLOGIA
6,227	N/A	N/A	2	**100%**	**12,45**	WC DISCAPACITADOS ESPERA IMAGENOLOGIA
6,5	N/A	N/A	2	**100%**	**13,00**	ASEO URGENCIAS
7	N/A	N/A	2	**100%**	**14,00**	ADMISIONES URGENCIAS
7,6	N/A	N/A	2	**100%**	**15,20**	
5,7	N/A	N/A	2	**100%**	**11,40**	
4,8	N/A	N/A	2	**100%**	**9,60**	WC CONSULTORIO 3
11,3	N/A	N/A	2	**100%**	**22,60**	LAVADO PACIENTES
5,28	N/A	N/A	2	**100%**	**10,56**	WC MONITOREO GINECOPSTETRICIA
12,3	N/A	N/A	2	**100%**	**24,60**	BAÑO HOMBRES ESPERA ADULTOS
3,03	N/A	N/A	2	**100%**	**6,06**	TRIAGE 1 MURO ADISIONAL
3,82	N/A	N/A	2	**100%**	**7,64**	ROPA LIMPIA DIGITACION
3,87	N/A	N/A	2	**100%**	**7,74**	SALA EDA MURO ADISIONAL
6,92	N/A	N/A	2	**100%**	**13,84**	WC SALA EDA
7,15	N/A	N/A	2	**100%**	**14,30**	WC OBSERVACION PEDIATRICA
6,22	N/A	N/A	2	**100%**	**12,44**	TRABAJO LIMPIO OBSERVACION PEDIATRIA
5,6	N/A	N/A	2	**100%**	**11,20**	TRABAJO SUCIO OBSERVACION PEDIATRIA
6,5	N/A	N/A	2	**100%**	**13,00**	ASEO PASILLO IMAGENOLOGIA
5,97	N/A	N/A	2	**100%**	**11,94**	TRABAJO LIMPIO INSUMOS
3,1	N/A	N/A	2	**100%**	**6,20**	INGRESO A URGENCIAS
1,5	N/A	N/A	2	**100%**	**3,00**	OBSERVACION GINECOPSTETRICIA REPARACION
3,74	N/A	N/A	2	**100%**	**7,48**	FACTURACIÓN
5,62	N/A	N/A	2	**100%**	**11,24**	MURO FALSO TRAS RECEPCIÓN
4,37	N/A	N/A	2	**100%**	**8,74**	ASEO CAFETERIA
PISO 2						
13,57	N/A	N/A	2	**100%**	**27,14**	UCI URO - 9
15,64	N/A	N/A	2	**100%**	**31,28**	UCI URO - 8









13,63	N/A	N/A	2	100%	27,26	UCI URO - 7
11,67	N/A	N/A	2	100%	23,34	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 7 A 9
7,61	N/A	N/A	2	100%	15,22	UCI AURO - 6
13,2	N/A	N/A	2	100%	26,40	
14,17	N/A	N/A	2	100%	28,34	UCI URO - 5
14,15	N/A	N/A	2	100%	28,30	UCI URO - 4
14,14	N/A	N/A	2	100%	28,28	UCI URO - 3
13,92	N/A	N/A	2	100%	27,84	UCI URO - 2
14,09	N/A	N/A	2	100%	28,18	UCI URO - 1
18,22	N/A	N/A	2	100%	36,44	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 1 A 5
9,53	N/A	N/A	2	100%	19,06	CENTRAL DE ENFERMERIA + MATERIAL: FRENTE A UCI URO 8
3,51	N/A	N/A	2	100%	7,02	INGRESO CUARTOS DE UCI URO
10,26	N/A	N/A	2	100%	20,52	CENTRAL DE ENFERMERIA: FRENTE A UCI URO 3
2,57	N/A	N/A	2	100%	5,14	INFORMACIÓN FAMILIAR
6,52	N/A	N/A	2	100%	13,04	FILTRO ACCESO PERSONAL UARO
5,04	N/A	N/A	2	100%	10,08	PASILLO ACCESO BAÑO COSTADO DE VESTIER PACIENTES
18,31	N/A	N/A	2	100%	36,62	VESTIER PACIENTES
2,3	N/A	N/A	2	100%	4,60	RACK
40,76	N/A	N/A	2	100%	81,52	RECUPERACIÓN SALA PARTO
9,93	N/A	N/A	2	100%	19,86	ESTACIÓN ENFERMERIA RECUPERACIÓN
9,04	N/A	N/A	2	100%	18,08	CIRCULACIÓN DE: SALA PARTO A UCI ADULTO (LATERAL IZQUIERDO)
17,67	N/A	N/A	2	100%	35,34	CIRCULACIÓN DE: SALA DE PARTO 1 Y 2 A DESCANSO
10,51	N/A	N/A	2	100%	21,02	CUARTO DE EQUIPOS
8,68	N/A	N/A	2	100%	17,36	CIRCULACIÓN HACIA QUIROFANOS DESDE RECUPERACIÓN PARTOS (COSTADO DERECHO)
20,8	N/A	N/A	2	100%	41,60	DESCANSO MÉDICO - QUIROFÁNOS
9,32	N/A	N/A	2	100%	18,64	CIRCULACIÓN QUIROFANO: DEL 1 AL 3 (COSTADO DERECHO)
5,33	N/A	N/A	2	100%	10,66	BODEGA
49,36	N/A	N/A	2	100%	98,72	RECUPERACIÓN QUIRURGICA + ESTACIÓN ENFERMERIA
10,7	N/A	N/A	2	100%	21,40	PASILLO A AUTOCLAVE: DESDE RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA
31,83	N/A	N/A	2	100%	63,66	AUTOCLAVE
7,85	N/A	N/A	2	100%	15,70	PASILLO AUTOCLAVE - HACIA QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
2,75	N/A	N/A	2	100%	5,50	
14,34	N/A	N/A	2	100%	28,68	PREPARACIÓN PACIENTES AMBULATORIOS
5,39	N/A	N/A	2	100%	10,78	WC H: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.
6,06	N/A	N/A	2	100%	12,12	WC M: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.
14,54	N/A	N/A	2	100%	29,08	PASILLO QUIROFANOS - DEL 3 AL 1 (COSTADO DERECHO)
14,38	N/A	N/A	2	100%	28,76	FARMACIA
24,89	N/A	N/A	2	100%	49,78	PASILLO POSTERIOR FARMACIA
5,85	N/A	N/A	2	100%	11,70	RESIDUOS TEMPARALES 1
4,76	N/A	N/A	2	100%	9,52	RESIDUOS TEMPARALES 2
5,21	N/A	N/A	2	100%	10,42	ASEO (FUERA DE QUIROFANO 3)
13,19	N/A	N/A	2	100%	26,38	PASILLO RECUPARACIÓN PARTOS - DESDE QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
15,4	N/A	N/A	2	100%	30,80	DESCANSO: RECUPERACIÓN Y QUIROFANOS
5,18	N/A	N/A	2	100%	10,36	BODEGA (COSTADO DERECHO DE DESCANSO
5,31	N/A	N/A	2	100%	10,62	CIRCULACIÓN: DESCANSO/VESTIER
16,89	N/A	N/A	2	100%	33,78	VESTIER MUJERES VESTIER MUJERES
18,25	N/A	N/A	2	100%	36,50	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
4,53	N/A	N/A	2	100%	9,06	VESTIER MUJERES: DUCHA
4,11	N/A	N/A	2	100%	8,22	VESTIER MUJERES: BAÑO 1
4,06	N/A	N/A	2	100%	8,12	VESTIER MUJERES: BAÑO 2
3,72	N/A	N/A	2	100%	7,44	VESTIER HOMBRE: DUCHA
4,35	N/A	N/A	2	100%	8,70	VESTIER HOMBRE: BAÑO
3,09	N/A	N/A	2	100%	6,18	RESIDUO ORDINARIO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
3,17	N/A	N/A	2	100%	6,34	RESIDUO PELIGROSO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
7,01	N/A	N/A	2	100%	14,02	RECEPCIÓN - CONTROL (COSTADO DE RACK)
1,61	N/A	N/A	2	100%	3,22	MURO EXTERIOR: DESCANSO-UCI URO
8,78	N/A	N/A	2	100%	17,56	DESCANSO: UCI URO
6,26	N/A	N/A	2	100%	12,52	FILTRO FAMILIARES URO
19,08	N/A	N/A	2	100%	38,16	CIRCULACIÓN: UCI URO A UCI NEO
6,2	N/A	N/A	2	100%	12,40	INGRESO UCI NEO (DESDE UCI URO)
9,4	N/A	N/A	2	100%	18,80	FILTRO VISITANTES: UCO NEO
15,11	N/A	N/A	2	100%	30,22	LACTARIO + BODEGA
4,76	N/A	N/A	2	100%	9,52	WC PMR (COSTADO DE RESIDUOS TEMPORALES)
10,05	N/A	N/A	2	100%	20,10	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
11,35	N/A	N/A	2	100%	22,70	EXTRACCIÓN
2,67	N/A	N/A	2	100%	5,34	RESIDUOS TEMPORALES
9,76	N/A	N/A	1	100%	9,76	CIRCULACIÓN ASEO: UCI NEO
5,92	N/A	N/A	1	100%	5,92	LAVADO DE INCUBADORAS
2,53	N/A	N/A	1	100%	2,53	ASEO : UCI NEO
45,52	N/A	N/A	1	100%	45,52	UCI NEO: INTENSIVOS
11,08	N/A	N/A	1	100%	11,08	CENTRAL ENFERMERIA: UCI INTENSIVOS
68,09	N/A	N/A	1	100%	68,09	UCI NEO: INTERMEDIOS
3,84	N/A	N/A	1	100%	3,84	CENTRAL ENFERMERIA: UCI NEO INTERMEDIOS
4,78	N/A	N/A	1	100%	4,78	T. LIMPIO: CENTRAL ENFERMERÍ INTERMEDIO
2,3	N/A	N/A	1	100%	2,30	ESTACIÓN SATELITE Y ARCHIVO
11,24	N/A	N/A	1	100%	11,24	PASILLO: HACIA DESCANSO UCI NEO
18,03	N/A	N/A	1	100%	18,03	DESCANSO: UCI NEO
4,83	N/A	N/A	1	100%	4,83	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
5,57	N/A	N/A	1	100%	5,57	T. SUCIO: UCI NEO
4,79	N/A	N/A	1	100%	4,79	WC (EN PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO)
8,23	N/A	N/A	1	100%	8,23	ESPACIO: POCETAS (HACIA DESCANSO) + MURO POSTERIOR DE CENTRAL ENFERMERIA DE INTENSIVOS
20,14	N/A	N/A	1	100%	20,14	CUARTO DE EQUIPOS
6,77	N/A	N/A	1	100%	6,77	LIMPIO: UCI NEO
6,66	N/A	N/A	1	100%	6,66	SUCIO: UCI NEO
8,54	N/A	N/A	2	100%	17,08	PASILLO: VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2,67	N/A	N/A	2	100%	5,34	SUCIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2,92	N/A	N/A	2	100%	5,84	LIMPIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
6,13	N/A	N/A	2	100%	12,26	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
4,88	N/A	N/A	2	100%	9,76	WC: MUJERES
6,31	N/A	N/A	2	100%	12,62	WC PMR: MUJERES
11,25	N/A	N/A	2	100%	22,50	COORDINACIÓN UCI NEO
11,57	N/A	N/A	2	100%	23,14	VESTIER ASISTENCIAL
5,83	N/A	N/A	2	100%	11,66	WC: VESTIER
24,14	N/A	N/A	2	100%	48,28	SALA ESPERA-HALL
4,05	N/A	N/A	2	100%	8,10	RACK
9,48	N/A	N/A	2	100%	18,96	PASILLO: HACIA WCH Y VESTIER AUTOCLAVE
4,51	N/A	N/A	2	100%	9,02	WC H (PASILLO HACIA VESTIER AUTOCLAVE)
4,05	N/A	N/A	2	100%	8,10	VESTIER AUTOCLAVE
9,81	N/A	N/A	2	100%	19,62	FILTRO AUTOCLAVE
11,93	N/A	N/A	2	100%	23,86	WC PMR HOMBRE + INGRESO WC
3,93	N/A	N/A	2	100%	7,86	ROPA SUCIA (EXTERIOR DE RECUPERACIÓN PARTO)
5,46	N/A	N/A	2	100%	10,92	T. SUCIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
41,22	N/A	N/A	2	100%	82,44	TRABAJO PARTO + CENTRAL DE ENFERMERIA
7,77	N/A	N/A	2	100%	15,54	WC: TRABAJO PARTO
6,86	N/A	N/A	2	100%	13,72	T. LIMPIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
5,59	N/A	N/A	2	100%	11,18	ROPA LIMPIA: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
6,9	N/A	N/A	2	100%	13,80	T. LIMPIO: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
5,47	N/A	N/A	2	100%	10,94	WC 1: RECUPERACIÓN PARTO
4,2	N/A	N/A	2	100%	8,40	WC 2: RECUPERACIÓN PARTO
3,78	N/A	N/A	2	100%	7,56	DEP. ROPA SUCIA: UCI ARO









5,64	N/A	N/A	2	**100%**	**11,28**	LIMPIO: UCI ARO
7,24	N/A	N/A	2	**100%**	**14,48**	WC: UARO AISLADO -06
6,79	N/A	N/A	2	**100%**	**13,58**	WC 1 (FRENTE UARO-07)
8,36	N/A	N/A	2	**100%**	**16,72**	WC 2 (FRENTE UARO-07)
5,34	N/A	N/A	2	**100%**	**10,68**	EQUIPOS: FRENTE UARO-09
3,24	N/A	N/A	2	**100%**	**6,48**	ASEO: FRENTE UARO-09
4,85	N/A	N/A	2	**100%**	**9,70**	T. SUCIO: CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UARO-08
		PISO 3				
17,72	N/A	N/A	1	**100%**	**17,72**	UCI PEDIATRICA 1
16,35	N/A	N/A	1	**100%**	**16,35**	UCI PEDIATRICA 3
17,55	N/A	N/A	1	**100%**	**17,55**	UCI PEDIATRICA 5
13,86	N/A	N/A	1	**100%**	**13,86**	UCI PEDIATRICA 7
16,96	N/A	N/A	1	**100%**	**16,96**	UCI PEDIATRICA 9
15,94	N/A	N/A	1	**100%**	**15,94**	UCI PEDIATRICA 11
13,43	N/A	N/A	1	**100%**	**13,43**	UCI PEDIATRICA 12
14,14	N/A	N/A	1	**100%**	**14,14**	UCI PEDIATRICA 10
15,77	N/A	N/A	1	**100%**	**15,77**	UCI PEDIATRICA 8
12,67	N/A	N/A	1	**100%**	**12,67**	UCI PEDIATRICA 6
15,61	N/A	N/A	1	**100%**	**15,61**	UCI PEDIATRICA 4
12,33	N/A	N/A	1	**100%**	**12,33**	UCI PEDIATRICA 2
16,77	N/A	N/A	1	**100%**	**16,77**	PASILLO A CUARTO DE EQUIPOS
8,47	N/A	N/A	1	**100%**	**8,47**	CUARTO DE EQUIPOS
8,68	N/A	N/A	1	**100%**	**8,68**	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS
7,00	N/A	N/A	1	**100%**	**7,00**	TRABAJO LIMPIO
7,12	N/A	N/A	1	**100%**	**7,12**	TRABAJO SUCIO
6,30	N/A	N/A	1	**100%**	**6,30**	BAÑO DISCAPACITADOS UCI P
4,75	N/A	N/A	1	**100%**	**4,75**	CUARTO ASEO
4,80	N/A	N/A	1	**100%**	**4,80**	SALIDA INFORMACIÓN FAMILIARES
0,95	N/A	N/A	1	**100%**	**0,95**	PASILLO INFORMACIÓN FAMILIARES
4,62	N/A	N/A	1	**100%**	**4,62**	TRANSFER MEDICAMENTOS A ACCESO ASISTENCIAL
5,16	N/A	N/A	1	**100%**	**5,16**	WC ACCESO ASISTENCIAL
5,40	N/A	N/A	1	**100%**	**5,40**	ACCESO ASISTENCIAL
1,65	N/A	N/A	1	**100%**	**1,65**	ACCESO ASISTENCIAL
3,43	N/A	N/A	1	**100%**	**3,43**	ACCESO ASISTENCIAL
25,19	N/A	N/A	1	**100%**	**25,19**	PASILLO A DESCANSO
15,19	N/A	N/A	1	**100%**	**15,19**	DESCANSO MEDICO
3,60	N/A	N/A	1	**100%**	**3,60**	COCINETA
12,91	N/A	N/A	1	**100%**	**12,91**	DESCANSO ENFERMERIA
12,32	N/A	N/A	1	**100%**	**12,32**	COORDINACIÓN PEDIATRICA
5,16	N/A	N/A	1	**100%**	**5,16**	WC 1
5,17	N/A	N/A	1	**100%**	**5,17**	WC 2
16,11	N/A	N/A	1	**100%**	**16,11**	COORDINACIÓN UCI P
10,72	N/A	N/A	1	**100%**	**10,72**	INFORMACIÓN FAMILIARES
14,22	N/A	N/A	1	**100%**	**14,22**	PREPARACION FORMULAS
4,58	N/A	N/A	1	**100%**	**4,58**	DEPOSITO DE INSUMOS
3,89	N/A	N/A	1	**100%**	**3,89**	FILTRO PACIENTES
8,32	N/A	N/A	1	**100%**	**8,32**	PASILLO A LUDOTECA
12,98	N/A	N/A	1	**100%**	**12,98**	EXTRACCION LECHE MATERNA
21,84	N/A	N/A	1	**100%**	**21,84**	BAÑOS LUDOTECA
8,00	N/A	N/A	1	**100%**	**8,00**	LUDOTECA
7,50	N/A	N/A	1	**100%**	**7,50**	LUDOTECA
4,20	N/A	N/A	1	**100%**	**4,20**	LUDOTECA
3,90	N/A	N/A	1	**100%**	**3,90**	LUDOTECA
6,80	N/A	N/A	1	**100%**	**6,80**	TERRAZA SOLAR
3,70	N/A	N/A	1	**100%**	**3,70**	TERRAZA SOLAR
4,80	N/A	N/A	1	**100%**	**4,80**	TERRAZA SOLAR
1,90	N/A	N/A	1	**100%**	**1,90**	TERRAZA SOLAR
5,80	N/A	N/A	1	**100%**	**5,80**	LUDOTECA
4,20	N/A	N/A	1	**100%**	**4,20**	LUDOTECA
5,00	N/A	N/A	1	**100%**	**5,00**	LUDOTECA
8,00	N/A	N/A	1	**100%**	**8,00**	LUDOTECA
5,00	N/A	N/A	1	**100%**	**5,00**	LUDOTECA
9,70	N/A	N/A	1	**100%**	**9,70**	CENTRAL DE ENFERMERIA LUDOTECA
4,83	N/A	N/A	1	**100%**	**4,83**	PASILLO ASENSOR - LUDOTECA
1,30	N/A	N/A	2	**100%**	**2,60**	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA SUR
4,92	N/A	N/A	2	**100%**	**9,84**	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA SUR
5,00	N/A	N/A	2	**100%**	**10,00**	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA SUR
5,00	N/A	N/A	2	**100%**	**10,00**	DEPOSITO DE INSUMOS
1,33	N/A	N/A	2	**100%**	**2,66**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,42	N/A	N/A	2	**100%**	**0,84**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,34	N/A	N/A	2	**100%**	**0,68**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,18	N/A	N/A	2	**100%**	**8,36**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,37	N/A	N/A	2	**100%**	**0,74**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
2,12	N/A	N/A	2	**100%**	**4,24**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,37	N/A	N/A	2	**100%**	**0,74**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,13	N/A	N/A	2	**100%**	**8,26**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,35	N/A	N/A	2	**100%**	**0,70**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,10	N/A	N/A	2	**100%**	**8,20**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,39	N/A	N/A	2	**100%**	**0,78**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
4,18	N/A	N/A	2	**100%**	**8,36**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACIÓN SUR
0,39	N/A	N/A	2	**100%**	**0,78**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,12	N/A	N/A	2	**100%**	**8,24**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,37	N/A	N/A	2	**100%**	**0,74**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,13	N/A	N/A	2	**100%**	**8,26**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,41	N/A	N/A	2	**100%**	**0,82**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,13	N/A	N/A	2	**100%**	**8,26**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,35	N/A	N/A	2	**100%**	**0,70**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
2,12	N/A	N/A	2	**100%**	**4,24**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
8,00	N/A	N/A	2	**100%**	**16,00**	BALCÓN NORTE
3,20	N/A	N/A	2	**100%**	**6,40**	BALCÓN NORTE
2,17	N/A	N/A	2	**100%**	**4,34**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,38	N/A	N/A	2	**100%**	**0,76**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,14	N/A	N/A	2	**100%**	**8,28**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,35	N/A	N/A	2	**100%**	**0,70**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,10	N/A	N/A	2	**100%**	**8,20**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
0,40	N/A	N/A	2	**100%**	**0,80**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
4,12	N/A	N/A	2	**100%**	**8,24**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
1,17	N/A	N/A	2	**100%**	**2,34**	PASILLO PRINCIPAL HOSPITALIZACION NORTE
7,25	N/A	N/A	2	**100%**	**14,50**	HABITACION 301
7,58	N/A	N/A	2	**100%**	**15,16**	HABITACION 301
1,60	N/A	N/A	2	**100%**	**3,20**	HABITACION 301
7,10	N/A	N/A	2	**100%**	**14,20**	HABITACION 302
8,00	N/A	N/A	2	**100%**	**16,00**	HABITACION 302
1,57	N/A	N/A	2	**100%**	**3,14**	HABITACION 302
7,10	N/A	N/A	2	**100%**	**14,20**	HABITACION 307
8,20	N/A	N/A	2	**100%**	**16,40**	HABITACION 307
0,36	N/A	N/A	2	**100%**	**0,72**	HABITACION 307
8,00	N/A	N/A	2	**100%**	**16,00**	HABITACION 308
4,00	N/A	N/A	2	**100%**	**8,00**	HABITACION 308
6,00	N/A	N/A	2	**100%**	**12,00**	HABITACION 308
7,33	N/A	N/A	2	**100%**	**14,66**	HABITACION 310
7,60	N/A	N/A	2	**100%**	**15,20**	HABITACION 310
1,40	N/A	N/A	2	**100%**	**2,80**	HABITACION 310
7,10	N/A	N/A	2	**100%**	**14,20**	HABITACION 311
8,00	N/A	N/A	2	**100%**	**16,00**	HABITACION 311
1,44	N/A	N/A	2	**100%**	**2,88**	HABITACION 311
7,30	N/A	N/A	2	**100%**	**14,60**	HABITACION 316
7,80	N/A	N/A	2	**100%**	**15,60**	HABITACION 316
1,30	N/A	N/A	2	**100%**	**2,60**	HABITACION 316
7,15	N/A	N/A	2	**100%**	**14,30**	HABITACION 318









7,60	N/A	N/A	2	100%	15,20	HABITACION 318
1,40	N/A	N/A	2	100%	2,80	HABITACION 318
7,34	N/A	N/A	2	100%	14,68	HABITACION 324
7,60	N/A	N/A	2	100%	15,20	HABITACION 324
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	HABITACION 324
7,70	N/A	N/A	2	100%	15,40	HABITACION 325
7,86	N/A	N/A	2	100%	15,72	HABITACION 325
1,50	N/A	N/A	2	100%	3,00	HABITACION 325
6,19	N/A	N/A	2	100%	12,38	CIRCULACIÓN INGRESO
2,76	N/A	N/A	2	100%	5,52	
13,41	N/A	N/A	2	100%	26,82	ORATORIO
9,87	N/A	N/A	2	100%	19,74	HALL
7,60	N/A	N/A	2	100%	15,20	PASILLO DE HALL A LUDOTECA
2,20	N/A	N/A	2	100%	4,40	RESIDUOS NO PELIGROSOS
2,20	N/A	N/A	2	100%	4,40	RESIDUOS PELIGROSOS
2,20	N/A	N/A	2	100%	4,40	ROPA SUCIA
7,18	N/A	N/A	2	100%	14,36	ACCESO FAMILIARES
10,24	N/A	N/A	2	100%	20,48	PASILLO INFORMACIÓN FAMILIARES
1,00	N/A	N/A	2	100%	2,00	ACCESO TRABAJO LIMPIO
7,70	N/A	N/A	2	100%	15,40	ROPA LIMPIA
14,26	N/A	N/A	2	100%	28,52	CIRCULACION RESTRINGIDA NORTE
10,28	N/A	N/A	2	100%	20,56	DESCANSO MEDICO
4,46	N/A	N/A	2	100%	8,92	BAÑO DESCANSO MEDICO
11,71	N/A	N/A	2	100%	23,42	PROCEDIMIENTOS
2,59	N/A	N/A	2	100%	5,18	TRABAJO SUCIO
12,44	N/A	N/A	2	100%	24,88	CENTRAL DE ENFERMERIA HOSPITALIZACIÓN
7,88	N/A	N/A	2	100%	15,76	
7,76	N/A	N/A	2	100%	15,52	WC HABITACION 324
8,22	N/A	N/A	2	100%	16,44	WC HABITACION 325
7,64	N/A	N/A	2	100%	15,28	WC HABITACION 318
8,13	N/A	N/A	2	100%	16,26	WC HABITACION 316
8,33	N/A	N/A	2	100%	16,66	ROPA LIMPIA UCI PEDIATRICA
7,75	N/A	N/A	2	100%	15,50	BAÑO HABITACION 311
7,69	N/A	N/A	2	100%	15,38	BAÑO HABITACION 310
7,97	N/A	N/A	2	100%	15,94	TRABAJO LIMPIO
7,91	N/A	N/A	2	100%	15,82	BAÑO HABITACION 307
7,51	N/A	N/A	2	100%	15,02	BAÑO HABITACION 308
7,56	N/A	N/A	2	100%	15,12	BAÑO HABITACION 301
7,84	N/A	N/A	2	100%	15,68	BAÑO HABITACION 302
3,16	N/A	N/A	2	100%	6,32	MURO FALSO HABITACION 302
3,65	N/A	N/A	2	100%	7,30	MURO FALSO HABITACION 301
3,17	N/A	N/A	2	100%	6,34	MURO FALSO HABITACION 308
3,42	N/A	N/A	2	100%	6,84	MURO FALSO HABITACION 313
9,35	N/A	N/A	2	100%	18,70	BALCON SUR
3,30	N/A	N/A	2	100%	6,60	ACCESO ASENSORES
16,85	N/A	N/A	2	100%	33,70	HABITACION 303
7,61	N/A	N/A	2	100%	15,22	BAÑO HABITACION 303
21,91	N/A	N/A	2	100%	43,82	HABITACION 304
7,32	N/A	N/A	2	100%	14,64	BAÑO HABITACION 304
16,21	N/A	N/A	2	100%	32,42	HABITACION 305
7,70	N/A	N/A	2	100%	15,40	BAÑO HABITACION 305
20,94	N/A	N/A	2	100%	41,88	HABITACION 306
7,39	N/A	N/A	2	100%	14,78	BAÑO HABITACION 306
16,38	N/A	N/A	2	100%	32,76	HABITACION 309
7,53	N/A	N/A	2	100%	15,06	BAÑO HABITACION 309
16,62	N/A	N/A	2	100%	33,24	HABITACION 312
7,54	N/A	N/A	2	100%	15,08	BAÑO HABITACION 312
15,23	N/A	N/A	2	100%	30,46	HABITACION 313
7,89	N/A	N/A	2	100%	15,78	BAÑO HABITACION 313
16,58	N/A	N/A	2	100%	33,16	HABITACION 314
7,37	N/A	N/A	2	100%	14,74	BAÑO HABITACION 314
16,52	N/A	N/A	2	100%	33,04	HABITACION 315
7,25	N/A	N/A	2	100%	14,50	BAÑO HABITACION 315
16,23	N/A	N/A	2	100%	32,46	HABITACION 317
7,34	N/A	N/A	2	100%	14,68	BAÑO HABITACION 317
17,09	N/A	N/A	2	100%	34,18	HABITACION 319
7,29	N/A	N/A	2	100%	14,58	BAÑO HABITACION 319
16,55	N/A	N/A	2	100%	33,10	HABITACION 320
7,74	N/A	N/A	2	100%	15,48	BAÑO HABITACION 320
16,07	N/A	N/A	2	100%	32,14	HABITACION 321
7,22	N/A	N/A	2	100%	14,44	BAÑO HABITACION 321
16,76	N/A	N/A	2	100%	33,52	HABITACION 322
7,56	N/A	N/A	2	100%	15,12	BAÑO HABITACION 322
16,44	N/A	N/A	2	100%	32,88	HABITACION 323
7,54	N/A	N/A	2	100%	15,08	BAÑO HABITACION 323
1,52	N/A	N/A	2	100%	0,91	PASILLO DE INGRESO
8,27	N/A	N/A	2	100%	4,96	BAÑO SOCIAL
		PISO 4				
16,31	N/A	N/A	2	100%	32,62	HABITACION 424
16,67	N/A	N/A	2	100%	33,34	HABITACION 425
16,07	N/A	N/A	2	100%	32,14	HABITACION 418
16,22	N/A	N/A	2	100%	32,44	HABITACION 416
31,13	N/A	N/A	2	100%	62,26	PASILLO CIRCULACIÓN NORTE
10,40	N/A	N/A	2	100%	20,80	CIRCULACIÓNA ACCESO
8,14	N/A	N/A	2	100%	16,28	PASILLO SALIDA DE EMERGENCIA
17,63	N/A	N/A	2	100%	35,26	HALL
12,71	N/A	N/A	2	100%	25,42	IAMI
18,72	N/A	N/A	2	100%	37,44	CENTRAL DE ENFERMERIA
25,46	N/A	N/A	2	100%	50,92	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
11,42	N/A	N/A	2	100%	22,84	PROCEDIMEINTOS
10,13	N/A	N/A	2	100%	20,26	DESCANSO MEDICO
8,48	N/A	N/A	2	100%	16,96	WC HABITACION 401
16,01	N/A	N/A	2	100%	32,02	HABITACION 402
8,85	N/A	N/A	2	100%	17,70	WC HABITACION 402
16,55	N/A	N/A	2	100%	33,10	HABITACION 407
8,63	N/A	N/A	2	100%	17,26	WC HABITACION 407
21,49	N/A	N/A	2	100%	42,98	HABITACION 408
4,17	N/A	N/A	2	100%	8,34	WC HABITACION 408
16,34	N/A	N/A	2	100%	32,68	HABITACION 410
8,56	N/A	N/A	2	100%	17,12	WC HABITACION 410
4,68	N/A	N/A	2	100%	9,36	PROCEDIMEINTOS
4,34	N/A	N/A	2	100%	8,68	WC DESCANSO
16,16	N/A	N/A	2	100%	32,32	HABITACION 411
8,38	N/A	N/A	2	100%	16,76	WC HABITACION 411
24,10	N/A	N/A	2	100%	48,20	PUESTO DE TRABAJO BALCON NORTE
15,51	N/A	N/A	2	100%	31,02	PASILLO SUR DESDE HABITACION 411
8,22	N/A	N/A	2	100%	16,44	
8,27	N/A	N/A	2	100%	16,54	BALCON SUR
7,75	N/A	N/A	2	100%	15,50	TRABAJO LIMPIO
16,85	N/A	N/A	2	100%	33,70	HABITACION 403
7,61	N/A	N/A	2	100%	15,22	BAÑO HABITACION 403
21,91	N/A	N/A	2	100%	43,82	HABITACION 404
7,32	N/A	N/A	2	100%	14,64	BAÑO HABITACION 404
16,21	N/A	N/A	2	100%	32,42	HABITACION 405
7,70	N/A	N/A	2	100%	15,40	BAÑO HABITACION 405
20,94	N/A	N/A	2	100%	41,88	HABITACION 406
7,39	N/A	N/A	2	100%	14,78	BAÑO HABITACION 406
16,38	N/A	N/A	2	100%	32,76	HABITACION 409
7,53	N/A	N/A	2	100%	15,06	BAÑO HABITACION 409
16,62	N/A	N/A	2	100%	33,24	HABITACION 412



7,54	N/A	N/A	2	100%	15,08	BAÑO HABITACION 412
15,23	N/A	N/A	2	100%	30,46	HABITACION 413
7,89	N/A	N/A	2	100%	15,78	BAÑO HABITACION 413
16,58	N/A	N/A	2	100%	33,16	HABITACION 414
7,37	N/A	N/A	2	100%	14,74	BAÑO HABITACION 414
16,52	N/A	N/A	2	100%	33,04	HABITACION 415
7,25	N/A	N/A	2	100%	14,50	BAÑO HABITACION 415
16,23	N/A	N/A	2	100%	32,46	HABITACION 417
7,34	N/A	N/A	2	100%	14,68	BAÑO HABITACION 417
17,09	N/A	N/A	2	100%	34,18	HABITACION 419
7,29	N/A	N/A	2	100%	14,58	BAÑO HABITACION 419
16,55	N/A	N/A	2	100%	33,10	HABITACION 420
7,74	N/A	N/A	2	100%	15,48	BAÑO HABITACION 420
16,07	N/A	N/A	2	100%	32,14	HABITACION 421
7,22	N/A	N/A	2	100%	14,44	BAÑO HABITACION 421
16,76	N/A	N/A	2	100%	33,52	HABITACION 422
7,56	N/A	N/A	2	100%	15,12	BAÑO HABITACION 422
16,44	N/A	N/A	2	100%	32,88	HABITACION 423
7,54	N/A	N/A	2	100%	15,08	BAÑO HABITACION 423
8,17	N/A	N/A	2	100%	4,90	BAÑO SOCIAL INGRESO
2,19	N/A	N/A	2	100%	1,31	PASILLO CIRCULACION RESTRINGIDA
2,93	N/A	N/A	2	100%	1,76	DUCHA HABITACION 408
1,57	N/A	N/A	2	100%	0,94	PASILLO DE INGRESO
		SÓTANO				
48,50	**N/A**	**N/A**	2	100%	29,10	BODEGA DE FARMACIA
13,15	**N/A**	**N/A**	2	100%	7,89	PASILLO A BODEGA DE FARMACIA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**8.834,31**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**7.976,48**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**857,83**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







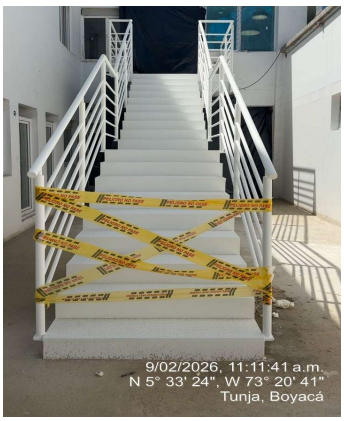

Dimensiones				Total (Kilogramo)	Observaciones
Peso (kg)	Cantidad (und)	(%)			
				1413,34	**ESCALERA DE EVACUACION SOBRE ORATORIO**
26,40	1	100%	8,90	234,96	VIGA IPE 220
26,38	18	100%	1,20	569,72	PLATINA DE 1/2" PARA HUELLAS ANCHO 28 CM
15,54	18	100%	1,20	335,73	PLATINA DE 1/2" PARA CONTRAHUELLA ANCHO 16.5 CM
19,60	18	100%	0,19	66,06	ANGULO EMPACHADO 4" X 1/4" SOPORTE PELDAÑOS
9,40	1	100%	4,40	41,36	ANGULO EMPACHADO 2" X 1/4" SOPORTE PELDAÑOS
97,36	1	100%	1,20	116,83	PLATINA DE 1/2" PARA DESCANSO ANCHO 1 METRO
121,00	1	100%	0,08	10,16	PLATINA Y ANCLAJES
121,00	2	100%	0,15	36,30	PLATINA Y ANCLAJES
1,00	8	100%	0,14	1,09	PERNOS
0,07	16	100%		1,12	TUERCAS
				42,40	**SOLDADURA**
				243,33	**ESTRUCTURA PARA LOSA SOBRE ORATORIO**
26,40	1	100%	2,40	63,36	VIGA IPE 220 FRONTAL DEL MARCO SUPERIOR
15,80	2	100%	3,08	97,33	VIGA IPE 160 COLUMNAS FRONTALES
15,80	2	100%	2,00	63,20	VIGA IPE 160 VIGAS LATERLAES ADOSADAS A VIGA DE CONCRETO
97,40	4	100%	0,04	15,58	PLATINAS DE ANCLAJE EN PISO Y VIGA PARA ESTRUCTURA EN GENERAL
1,00	16	100%	0,14	2,18	PERNOS
0,07	24	100%		1,68	TUERCAS
				7,30	**SOLDADURA**
				10811,89	**ESCALERA DE EVACUACION SUR**
43,96	6	100%	8,10	2136,46	COLUMNAS PTS 200 X 200 X 7 mm ENTRE EJES 5 Y 8
43,96	1	100%	14,68	645,33	VIGAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 1 AL 2
43,96	1	100%	14,68	645,33	VIGAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 2 AL 3
43,96	6	100%	2,23	588,18	VIGAS INTERMEDIAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 1 AL NIVEL 3 SOPORTES EE DESCANSOS
36,50	2	100%	9,95	726,35	GUALDERA DEL NIVEL 1 AL NIVEL 2
36,50	2	100%	8,92	651,16	GUALDERA DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3
4,70	42	100%	2,90	572,46	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4" DEL NIVEL 1 AL NIVEL 3
4,70	1	100%	9,48	44,56	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE DESCANSO DEL NIVEL 1 AL NIVEL 2 EN ANGULO DE 2" X 1/4"
4,70	1	100%	9,48	44,56	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE DESCANSO DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3 EN ANGULO DE 2" X 1/4"
9,40	1	100%	6,84	64,30	SOPORTE EN T EN ANGULO DE 2" EN ACCESO A NIVEL 2 PARA LOSA EN STEEL DECK
121,70	6	100%	0,16	116,83	PLATINA DE SOPORTE COLUMNAS
121,70	4	100%	0,06	30,43	PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE DESCANSOS DE ESCALERAS
1,00	72	100%	0,14	9,79	PERNOS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS
0,07	72	100%		5,04	TUERCAS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS
9,40	2	100%	1,20	22,56	SOPORTE CENTRAL PARA VACIADO DE LOSA EN DESCANSOS DE NIVEL 1 A NIVEL 3
36,10	3	100%	1,42	153,79	VIGA IPE 270 SOPORTE DE PASARELA EN NIVEL 3 EJES 3, 4 Y 5
36,10	2	100%	1,42	102,52	VIGA IPE 270 PIE DE AMIGO SOPORTE DE PASARELA EN NIVEL 3 EJES 4 Y 5
36,10	2	100%	2,49	179,78	VIGA IPE 270 SOPORTE ASCENSO A NIVEL 4 EJE 1
43,96	1	100%	4,00	175,84	PTS DE 200X200X7 mm PIED DE AMIGO DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3 SOBRE EJE 1
43,96	2	100%	1,81	159,14	COLUMNAS PTS 200 X 200 X 7 mm PARA DESCANSO DE ACCESO A NIVEL 4
43,96	1	100%	2,00	87,92	VIGA PTS 200 X 200 X 7 mm DE SOPORTE DE ACCESO A NIVEL 4
9,40	34	100%	1,43	457,03	ANGULO DE SOPORTE EN T D 2" X 1/4" COMO SOPORTE DE PASARELA
36,50	2	100%	13,72	1001,56	GUALDERA DE PASARALES LAMINA DE 15 mm
36,50	2	100%	8,42	614,66	GUALDERA DE NIVEL 3 A NIVEL 4
4,70	19	100%	2,90	258,97	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4"
4,70	1	100%	7,86	36,94	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE DESCANSO DEL NIVEL 3 AL NIVEL 4 EN ANGULO DE 2" X 1/4"
121,70	6	100%	0,23	166,12	PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE PASARELA
121,70	4	100%	0,14	68,15	PLATINAS DE SOPORTE ACCESO A NIVEL 4
18,20	1,46	100%	39,37	1046,14	LAMINA TIPO ALFAJOR DE 1/4" PARA PASARELA
				432,48	**SOLDADURA**
				0,00	**ESCALERA DE EVACUACION NORTE**
36,50	1	**0%**	21,65	0,00	GUALDERA EXTERNA
36,50	1	**0%**	18,91	0,00	GUALDERA INTERNA
36,50	1	**0%**	1,20	0,00	GUALDERA DE CIERRE
36,10	6	**0%**	1,20	0,00	VIGA IPE 270 SOPORTES DE ESCALERA
36,10	4	**0%**	1,42	0,00	VIGA IPE 270 PIE DE AMIGO SOPORTE DE VIGAS
4,75	35	**0%**	2,96	0,00	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4"
4,75	1	**0%**	7,86	0,00	ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" DESCANSO 1
4,75	1	**0%**	10,80	0,00	ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" DESCANSO 2
4,75	1	**0%**	7,40	0,00	ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" DESCANSO 3
4,75	1	**0%**	17,42	0,00	ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" DESCANSO 4
121,70	7	**0%**	0,16	0,00	PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE DESCANSOS DE ESCALERAS
1,00	70	**0%**	0,14	0,00	PERNOS DE PLATINAS EN VIGAS Y PIE DE AMIGOS
0,07	70	**0%**		0,00	TUERCAS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS
				0,00	**SOLDADURA**

OBSERVACIONES:


TOTAL	**12950,73**	**Kilogramo**
ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**	**Kilogramo**
PRESENTE ACTA	**12950,73**	**Kilogramo**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE Y DIMENSIONES SEGUN DISEÑO. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O CUALQUIER OTRO REQUERIDO), ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE, ESQUINEROS, TORNILLERÍA Y	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones									
	L (m)	A (pulgadas)	h (pulgadas)	Cantidad	No de pestañas	Calibre	peso x m2 (kg)	Total (KG)	Elemento	Observaciones
				PISO 1						
				SISTEMA DE SUMINISTRO (1)						
	1,13	22	12	10	2	24	4,69	98,83	DUCTO	
	0,7	22	12	1	2	24	4,69	6,40	AJUSTE	
	1,13	22	12	3	2	24	4,69	29,65	DUCTO	Sobre equipos, sala de yesos, descanso internos, hall principal y sala de espera
	0,21	22	12	1	2	24	4,69	2,43	SEMI CODO	
	0,68	22	12	3	2	24	4,69	18,71	CODOS	
	0,52	22	12	1	2	24	4,69	4,94	AJUSTE	
	1,13	22	12	16	2	24	4,69	158,12	DUCTO	
	0,52	22	12	1	2	24	4,69	4,94	AJUSTE	
	0,86	12	22	1	2	24	4,69	7,70	CURBA	
	0,74	12	22	1	2	24	4,69	6,72	DUCTO	Circulación
	0,7	12	22	1	2	24	4,69	6,40	CODOS	
	1,13	12	22	5	2	24	4,69	49,41	DUCTO	
	0,8	12	22	1	2	24	4,69	7,21	DUCTO	
	0,13	11,5	7	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	
	0,07	9	7	1	2	24	4,69	0,61	ZAPATO	
	1,13	9	7	1	2	24	4,69	4,65	DUCTO	
	0,3	9	7	1	2	24	4,69	1,49	DUCTO	
	0	9	7	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
	0,13	11	5	1	2	24	4,69	0,84	ZAPATO	
	0,07	8	5	1	2	24	4,69	0,50	ZAPATO	
	0,9	8	5	1	2	24	4,69	3,07	DUCTO	
	0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
	0,15	11	5	1	2	24	4,69	0,91	ZAPATO	
	0,37	8	5	1	2	24	4,69	1,42	ZAPATO	
	1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
	0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
	0,52	21	12	1	2	24	4,69	4,80	REDUCCION	
	1,13	20	12	4	2	24	4,69	37,21	DUCTO	Farmacia
	0	20	12	1	2	24	4,69	1,11	TAPA	
	0,12	11,5	9	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO	
	0,08	9	9	1	2	24	4,69	0,73	ZAPATO	
	0,4	9	9	1	2	24	4,69	2,10	DUCTO	
	0,3	9	9	1	2	24	4,69	1,67	REDUCCION	
	0,2	6	9	1	2	24	4,69	1,04	DUCTO	
	1,13	6	9	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
	0,45	6	9	1	2	24	4,69	1,93	DUCTO	
	0,42	6	9	1	2	24	4,69	1,82	CODO	
	0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
	0,2	11,5	6	1	2	24	4,69	1,21	ZAPATO	
	1,13	6	9	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
	0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
	0,2	23	10	1	2	24	4,69	2,28	ZAPATO	
	1,13	20	10	1	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
	0,52	19	10	1	2	24	4,69	4,21	REDUCCION	
	1,13	18	10	2	2	24	4,69	16,28	DUCTO	
	0,4	17	10	1	2	24	4,69	3,15	REDUCCION	
	1,13	16	10	1	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
	0,4	8,5	13	1	2	24	4,69	2,51	REDUCCION	
	1,13	7	10	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
	0,13	11,5	5	2	2	24	4,69	1,73	ZAPATO	
	0,07	9	5	2	2	24	4,69	1,07	ZAPATO	
	0,8	9	5	2	2	24	4,69	5,94	DUCTO	
	0,13	11,5	5	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
	0,07	9	5	1	2	24	4,69	0,53	ZAPATO	
	1,13	5	9	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
	0,6	5	9	1	2	24	4,69	2,30	DUCTO	
	0	5	9	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
	0	10	7	1	2	24	4,69	0,43	TAPA	
	0,2	16,5	10	1	2	24	4,69	1,83	ZAPATO	
	0,3	10	14	1	2	24	4,69	2,23	DUCTO	
	1,13	10	14	1	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
	0,3	9	12	1	2	24	4,69	1,95	REDUCCION	Laboratorio
	1,13	8	10	2	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
	0,52	8	9	1	2	24	4,69	2,47	REDUCCION	
	1,13	8	8	2	2	24	4,69	9,30	DUCTO	
	0,52	8	8	1	2	24	4,69	2,33	DUCTO	
	0,4	6,5	8	1	2	24	4,69	1,69	REDUCCION	
	1,13	8	5	4	2	24	4,69	15,11	DUCTO	
	0,41	8	5	1	2	24	4,69	1,55	CODO	
	0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
	0,13	10,5	5	2	2	24	4,69	1,62	ZAPATO	
	0,07	8	5	2	2	24	4,69	0,99	ZAPATO	
	1,13	8	5	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
	0,75	8	5	2	2	24	4,69	5,20	DUCTO	
	0	8	5	2	2	24	4,69	0,60	TAPA	
	0,12	10,5	5	1	2	24	4,69	0,78	ZAPATO	
	0,52	8	5	1	2	24	4,69	1,89	ZAPATO	
	0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
	0,12	11,5	7	7	2	24	4,69	6,48	ZAPATO	
	0,08	9	7	7	2	24	4,69	4,54	ZAPATO	
	1,13	9	7	7	2	24	4,69	32,55	DUCTO	
	0,3	9	7	7	2	24	4,69	10,41	DUCTO (AJUSTE)	
	0	9	7	7	2	24	4,69	2,80	TAPA	
	0,12	10,5	5	7	2	24	4,69	5,43	ZAPATO	
	0,08	8	5	7	2	24	4,69	3,69	ZAPATO	FARMACIA
	0,9	8	5	7	2	24	4,69	21,46	DUCTO	
	0	8	5	7	2	24	4,69	2,09	TAPA	
	0,15	10,5	4	7	2	24	4,69	5,80	ZAPATO	
	0,38	8	4	7	2	24	4,69	9,41	DUCTO	
	1,13	8	4	7	2	24	4,69	24,42	DUCTO	
	0	8	4	7	2	24	4,69	1,84	TAPA	
				SISTEMA DE SUMINISTRO (2)						
	1,13	20	12	10	2	24	4,69	93,01	DUCTO	
	0,7	20	12	1	2	24	4,69	6,02	AJUSTE	
	0,21	20	12	2	2	24	4,69	4,57	SEMI CODO	
	1,13	20	12	1	2	24	4,69	9,30	DUCTO	
	0,23	20	12	1	2	24	4,69	2,44	AJUSTE	
	0,72	20	12	1	2	24	4,69	6,18	AJUSTE	
	1,13	20	12	3	2	24	4,69	27,90	DUCTO	
	0,52	18,5	12	1	2	24	4,69	4,43	REDUCION	Sobre sala ERA, Sala de Yesos, Hall y Sala de espera
	1,13	17	12	3	2	24	4,69	25,29	DUCTO	
	0,78	17	12	1	2	24	4,69	6,01	AJUSTE	
	0,4	15	12	1	2	24	4,69	3,15	REDUCION	
	1,13	13	12	3	2	24	4,69	21,80	DUCTO	
	0,4	13	12	1	2	24	4,69	2,92	AJUSTE	
	0,61	13	12	1	2	24	4,69	4,17	CODO	
	1,13	13	12	1	2	24	4,69	7,27	DUCTO	
	0,3	11	12,5	1	2	24	4,69	2,18	REDUCION	
	0,13	5	6	1	2	24	4,69	0,58	ZAPATO	
	0,07	12	6	1	2	24	4,69	0,69		
	1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
	0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
	0,13	14,5	5	1	2	24	4,69	1,02	ZAPATO	
	0,07	12	5	1	2	24	4,69	0,65		
	1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
	0,2	12	5	1	2	24	4,69	1,17	DUCTO	Hall central
	0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
	0,13	14,5	5	1	2	24	4,69	1,02	ZAPATO	
	0,07	12	5	1	2	24	4,69	0,65		
	1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
	0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
	0,4	11,5	9	1	2	24	4,69	2,39	REDUCCION	
	1,13	8	9	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
	0	8	9	1	2	24	4,69	0,44	TAPA	
	0,36	10	4	2	2	24	4,69	3,00	DUCTO	
	0,52	10	4	2	2	24	4,69	4,07	DUCTO	BAÑO SALA ESPERA
	0	10	4	4	2	24	4,69	1,24	TAPA	
	0,12	10	4	1	2	24	4,69	0,70	ZAPATO	
	0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO	
	1,13	8	4	3	2	24	4,69	10,46	DUCTO	DESCANSO ASISTENCIAL
	0,3	7	4	1	2	24	4,69	1,02	REDUCCIÓN	
	1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
	0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
	0,12	12,5	6	1	2	24	4,69	0,93	ZAPATO	
	0,08	10	6	1	2	24	4,69	0,65	ZAPATO	
	1,13	10	6	3	2	24	4,69	13,95	DUCTO	
	0,13	10,5	4	1	2	24	4,69	0,76	ZAPATO	
	0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO	
	0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
	0,4	10	7	1	2	24	4,69	1,98	REDUCCIÓN	
	0,52	8	10	1	2	24	4,69	2,62	DUCTO	CONSULTORIO 4 Y 5
	0,52	9,5	7	1	2	24	4,69	2,40	REDUCCIÓN	
	0,64	6	9	1	2	24	4,69	2,61	DUCTO	
	1,13	6	9	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
	0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
	0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
	0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO	
	0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
	0,15	8	4	1	2	24	4,69	0,69	ZAPATO	
	0,25	6	4	1	2	24	4,69	0,81	ZAPATO	
	0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
	0,85	8	6	1	2	24	4,69	3,14	DUCTO	
	0,4	8	6	1	2	24	4,69	1,63	CODO	CONSULTORIO 4 Y 6
	1,13	8	6	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
	0,25	8	6	1	2	24	4,69	1,13	DUCTO	
	1,13	8	6	1	2	24	4,69	4,07	DESVIO	
	1,13	8	6	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
	0	8	6	1	2	24	4,69	0,33	TAPA	
	0,2	11,5	5	2	2	24	4,69	2,28	ZAPATO	
	1,13	9	5	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	SALA ESPERA
	0,94	9	5	2	2	24	4,69	6,87	DUCTO	
	0	9	5	2	2	24	4,69	0,65	TAPA	
	0,15	11,5	6	1	2	24	4,69	1,00	ZAPATO	
	0,05	9	6	1	2	24	4,69	0,50	ZAPATO	
	1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
	0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
	0,2	9	9	11	1	24	4,69	11,56	CUELLO	
	0,14	10,5	5	2	2	24	4,69	1,70	ZAPATO	
	0,06	8	5	1	2	24	4,69	0,46	ZAPATO	
				SISTEMA DE SUMINISTRO (3)						

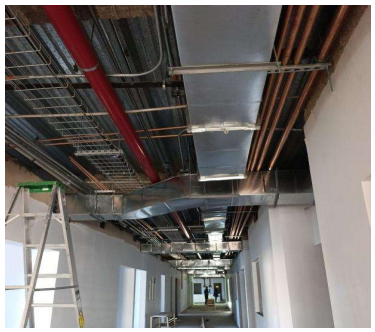




















1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
0,52	20,5	11	1	2	24	4,69	4,58	REDUCION	
1,13	19	10	9	2	24	4,69	75,86	DUCTO	Sobre consultorio 2 y Monitoreo ginecopsetricia.
0,4	16,5	9	1	2	24	4,69	2,98	REDUCION	
1,13	14	8	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO	
0	14	8	1	2	24	4,69	0,61	TAPA	
0,13	12	6	1	2	24	4,69	0,94	ZAPATO	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57		
1,13	9	6	3	2	24	4,69	13,08	DUCTO	
0,2	9	6	1	2	24	4,69	1,04	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,13	12	6	1	2	24	4,69	0,94	ZAPATO	Consultorios
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57		
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
0,9	9	6	1	2	24	4,69	3,54	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
1,13	12	12	1	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
1,13	14	8	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	Monitoreo ginecopsetricia
0,3	11,5	8	1	2	24	4,69	1,81	REDUCCION	
1,13	8	9	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,3	6,5	9	1	2	24	4,69	1,44	REDUCCION	
1,13	9	5	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
1	9	5	1	2	24	4,69	3,64	TAPA	Facturación
1,13	9	5	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0,1	9	5	1	2	24	4,69	0,63	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (4)							
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
1,13	12	6	2	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
1	12	6	1	2	24	4,69	4,67	DUCTO	
0,5	12	6	1	2	24	4,69	2,53	CODO	
0,3	8	12	1	2	24	4,69	1,86	REDUCION	
1,13	10	12	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
0,72	10	12	1	2	24	4,69	4,25	DUCTO	
0,5	10	12	1	2	24	4,69	3,09	CODO	Sobre reanimación, acceso a urgencias, sala de espera adultos, auditorio, cafeteria y Hall.
0,3	11	14	1	2	24	4,69	2,32	REDUCION	
1,13	16	12	3	2	24	4,69	24,42	DUCTO	
0,52	18	12	1	2	24	4,69	4,36	REDUCION	
1,13	21	12	33	2	24	4,69	316,54	DUCTO	
0,35	21	12	2	2	24	4,69	6,92	SEMI CODO	
0,52	21	12	1	2	24	4,69	4,80	DUCTO	
0,66	21	12	3	2	24	4,69	17,69	CODO	
0,25	21	12	1	2	24	4,69	2,67	AJUSTE	
1,3	21	12	1	2	24	4,69	10,93	DUCTO	
0,12	14,5	6	2	2	24	4,69	2,05	ZAPATO	
0,08	12	6	2	2	24	4,69	1,46		
0,74	12	6	1	2	24	4,69	3,56	DUCTO	CAFETERIA
0,72	12	6	1	2	24	4,69	3,47	DUCTO	
1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (5)							
0,6	18	12	1	2	24	4,69	4,93	CODO	
1,13	18	12	15	2	24	4,69	130,80	DUCTO	
0,52	18	11	1	2	24	4,69	4,21	REDUCION	
1,13	18	10	2	2	24	4,69	16,28	DUCTO	
0,44	18	10	1	2	24	4,69	3,54	DUCTO	
0,52	15	10	1	2	24	4,69	3,63	REDUCION	
1,13	12	1	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,52	12	7,5	1	2	24	4,69	2,83	REDUCION	
1,13	12	5	5	2	24	4,69	24,71	DUCTO	
0,5	12	5	1	2	24	4,69	2,39	CODO	
0,72	12	5	1	2	24	4,69	3,28	AJUSTE	
1,13	18	12	3	2	24	4,69	26,16	DUCTO	
0,1	18	12	1	2	24	4,69	1,36	DUCTO	
0,65	18	12	1	2	24	4,69	5,29	CODO	
0,52	19,5	12	1	2	24	4,69	4,58	REDUCCION	Sobre reanimación, acceso a urgencias, sala de espera adultos, auditorio y cafeteria.
1,13	21	12	3	2	24	4,69	28,78	DUCTO	
0,12	12	6	1	2	24	4,69	0,90	ZAPATO	
0,08	9	6	1	2	24	4,69	0,61		
0,6	9	6	1	2	24	4,69	2,47	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,13	11,5	6	3	2	24	4,69	2,75	ZAPATO	
0,07	9	6	3	2	24	4,69	1,72		
1,13	9	6	3	2	24	4,69	13,08	DUTO	
0,93	9	6	3	2	24	4,69	10,94	CODO	
0,52	9	6	3	2	24	4,69	6,54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4,69	1,09	TAPA	
0,13	12	6	3	2	24	4,69	2,83	ZAPATO	
0,07	9	6	3	2	24	4,69	1,72		
0,52	9	6	3	2	24	4,69	6,54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4,69	1,09	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (6)							
1,13	22	12	1	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0,3	22	12	1	2	24	4,69	3,16	CODO	
0,17	22	12	1	2	24	4,69	2,11	AJUSTE	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
1,13	22	12	6	2	24	4,69	59,30	DUCTO	
0,52	22	12	1	2	24	4,69	4,94	REDUCION	
0,4	22	12	1	2	24	4,69	3,97	DUCTO	Sobre lavado depacientes, acceso a urgencias y sala de spera adultos
1,13	22	11	2	2	24	4,69	19,18	DUCTO	
0,4	15	10	1	2	24	4,69	2,92	REDUCION	
1,13	15	10	2	2	24	4,69	14,53	DUCTO	
0,56	10	10	1	2	24	4,69	3,10	DUCTO	
0	10	10	1	2	24	4,69	0,55	TAPA	
0,12	17	11	1	2	24	4,69	1,40	TRAPECIO DEL ZAPATO	
0,8	22	11	1	2	24	4,69	7,00	ZAPATO PARTE RECTA	
0,15	12	6	3	2	24	4,69	3,09	ZAPATO	
0,28	9	6	3	2	24	4,69	3,97		Sala de espera urgencias
0,2	9	6	1	2	24	4,69	1,04	DUCTO	
0,52	9	6	3	2	24	4,69	6,54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4,69	1,09	TAPA	
1,13	12	12	10	2	24	4,69	69,76	ducto	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,38	8	8	1	1	24	4,69	1,62	CUELLO	CONSULTORIO TRIAGE 1
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,52	15,5	8	1	2	24	4,69	3,42	REDUCION	
1,13	9	4	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,36	9	4	1	2	24	4,69	1,39	CODO	
0	9	4	1	2	24	4,69	0,29	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (7)							
1,13	18	12	3	2	24	4,69	26,16	DUCTO	
0,13	11,5	6	1	2	24	4,69	0,92	ZAPATO	
0,07	6	9	1	2	24	4,69	0,57		
1,13	6	9	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	Reanimación
0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,52	16,5	12	1	2	24	4,69	4,14	REDUCCION	
1,13	15	12	1	2	24	4,69	7,85	DUCTO	
0,2	15	12	1	2	24	4,69	1,87	ZAPATO	
0,38	15	12	1	2	24	4,69	3,02		Circulación
1,13	15	12	2	2	24	4,69	15,70	DUCTO	
0,32	14	12	1	2	24	4,69	2,54	REDUCCION	
0,46	4	12	1	2	24	4,69	2,10	DUCTO	
0,45	13	12	1	2	24	4,69	3,22	CODO	Consultorios
1,13	13	12	1	2	24	4,69	7,27	DUCTO	
0,3	13	11	1	2	24	4,69	2,23	REDUCCION	
1,13	13	10	2	2	24	4,69	13,37	DUCTO	
0,13	12	6	1	2	24	4,69	0,94	ZAPATO	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57		
0,42	6	9	1	2	24	4,69	1,82	CODO	
0,52	6	9	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0	13	10	1	2	24	4,69	0,68	TAPA	Admisiones
0,12	16,5	8	1	2	24	4,69	1,23	ZAPATO	
0,08	8	14	1	2	24	4,69	0,89		
1,13	8	14	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
0,8	8	14	1	2	24	4,69	4,66	DUCTO	
0,3	13	8	1	2	24	4,69	1,95	REDUCCION	
1,13	12	8	6	2	24	4,69	34,88	DUCTO	
0,52	12	8	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0,29	7	11,5	1	2	24	4,69	1,67	REDUCCIÓN	Baños y descanso asistencial
0,25	9	6	1	2	24	4,69	1,22	DUCTO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
0,15	12	5	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO (T)	
0,05	9	5	1	2	24	4,69	0,47	ZAPATO (R)	
0,42	9	5	1	2	24	4,69	1,70	CODO	
0,52	9	5	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO (R)	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	12	6	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO (T)	
0,2	9	6	1	2	24	4,69	1,04	ZAPATO (R)	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
0,58	9	6	1	2	24	4,69	2,39	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,13	12	5	1	2	24	4,69	0,89	ZAPATO	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0,42	9	6	1	2	24	4,69	1,82	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,25	9	6	1	2	24	4,69	1,22	ZAPATO	
0,15	12	6	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (8)							
1,13	12	22	3	2	24	4,69	29,65	DUCTO	
0,52	12	20	1	2	24	4,69	4,65	REDUCCION	
1,13	18	12	3	2	24	4,69	26,16	DUCTO	
0,45	18	12	1	2	24	4,69	3,86	DUCTO	
0,52	17	12	1	2	24	4,69	4,21	REDUCCION	
0,6	16	12	1	2	24	4,69	4,60	DUCTO	
0,55	16	12	1	2	24	4,69	4,27	CODO	
1,13	16	12	1	2	24	4,69	5,14	DUCTO	
0,6	16	12	1	2	24	4,69	4,60	DUCTO	
0,52	16	11	1	2	24	4,69	3,92	REDUCCION	
1,13	16	11	1	2	24	4,69	7,85	DUCTO	





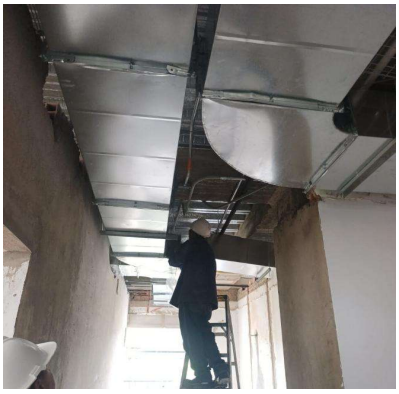









0,13	14,5	8	1	2	24	4,69	1,18	ZAPATO	
0,07	12	8	1	2	24	4,69	0,76		
1,13	12	8	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0,7	12	8	1	2	24	4,69	3,76	DUCTO	
0,4	10,5	7	1	2	24	4,69	2,04	REDUCCION	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	Observacion pediatrica
0,13	11,5	6	1	2	24	4,69	0,92	ZAPATO	
0,4	9	6	1	2	24	4,69	1,75		
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,13	14,5	6	1	2	24	4,69	1,07	ZAPATO	
0,07	12	6	1	2	24	4,69	0,69		
0,8	12	6	1	2	24	4,69	3,82	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,13	14,5	10	1	2	24	4,69	1,28	ZAPATO	
0,07	10	12	1	2	24	4,69	0,84		
1,13	10	12	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO	
0,52	9	12	1	2	24	4,69	3,05	REDUCCION	
1,13	8	12	4	2	24	4,69	23,25	DUCTO	
0,4	8	12	1	2	24	4,69	2,33	CODO	
0,35	7	10,5	1	2	24	4,69	1,83	REDUCCION	
0,7	6	9	1	2	24	4,69	2,82	DUCTO	
0,4	6	9	1	2	24	4,69	1,75	CODO	
1,13	6	9	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
0,5	6	9	1	2	24	4,69	2,11	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,52	14,5	9	1	2	24	4,69	3,42	REDUCCIÓN	
1,13	12	8	2	2	24	4,69	11,63	DUCTO	
0,45	12	8	1	2	24	4,69	2,57	DCODA	
0	12	8	1	2	24	4,69	0,54	TAPA	
0,2	14,5	5	1	2	24	4,69	1,35	DUCTO	SALA EDA
1,13	12	5	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,15	14	5	2	2	24	4,69	2,17	ZAPATO	
0,05	14	5	2	2	24	4,69	1,27	ZAPATO	
1,13	12	5	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICIA
0	12	5	2	2	24	4,69	0,80	TAPA	
0,12	16,5	8	1	2	24	4,69	1,23	ZAPATO	
0,17	14	8	1	2	24	4,69	1,36	ZAPATO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	FACTURACIÓN
0,9	9	6	1	2	24	4,69	3,54	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (9)							
1,13	12	21	3	2	24	4,69	28,78	DUCTO	
0,52	19	12	1	2	24	4,69	4,51	REDUCCION	
1,13	17	12	11	2	24	4,69	92,72	DUCTO	
0,52	16	12	1	2	24	4,69	4,07	REDUCCION	
1,13	15	12	5	2	24	4,69	39,24	DUCTO	
0,4	10	12	1	2	24	4,69	2,57	REDUCCION	
1,13	8	9	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,6	8	9	1	2	24	4,69	2,79	DUCTO	
0,4	8	9	1	2	24	4,69	1,98	CODO	Circuación farmacia
1,13	8	9	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0,3	6	9	1	2	24	4,69	1,39	REDUCCION	
0,98	6	9	1	2	24	4,69	3,82	DUCTO	
0,4	6	9	1	2	24	4,69	1,75	CODO	
0,4	6	9	1	1	24	4,69	1,69	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,15	10,5	8	1	2	24	4,69	1,06	ZAPATO	
1,13	8	8	2	2	24	4,69	9,30	DUCTO	
0,6	8	8	1	2	24	4,69	2,63	DUCTO	
0,4	8	6,5	1	2	24	4,69	1,69	REDUCCION	
1	8	5	1	2	24	4,69	3,38	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	1,52	CODO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,65	8	5	1	2	24	4,69	2,29	DUCTO	
0,13	10,5	5	1	2	24	4,69	0,81	ZAPATO	
0,07	8	5	1	2	24	4,69	0,50	ZAPATO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,85	9	5	1	2	24	4,69	3,14	DUCTO	
0,4	9	5	1	2	24	4,69	1,63	CODO	
0,45	9	5	1	2	24	4,69	1,80	DUCTO	Coordinacion imagenologia
1,13	9	5	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0,4	10	6,5	1	2	24	4,69	1,93	REDUCCION	
1,13	8	11	3	2	24	4,69	16,57	DUCTO	
0,4	8	11	1	2	24	4,69	2,22	DUCTO	
0,52	8	11	1	2	24	4,69	2,76	DUCTO	
0,13	8	13	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	
0,07	8	10	1	2	24	4,69	0,69	ZAPATO	
0,13	11,5	5	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,07	5	9	1	2	24	4,69	0,53	ZAPATO	
0,8	5	9	1	2	24	4,69	2,97	DUCTO	
0	5	9	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,15	4	10,5	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	
0,4	4	8	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO	
0	4	8	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,13	5	14,5	1	2	24	4,69	1,02	ZAPATO	
0,07	5	12	1	2	24	4,69	0,65	ZAPATO	Procedimientos
1,13	5	12	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0	5	12	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,13	6	11,5	1	2	24	4,69	0,92	ZAPATO	
0,07	6	9	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	
1,13	6	9	3	2	24	4,69	13,08	DUCTO	Observacion pediatrica
0,4	6	9	1	2	24	4,69	1,75	CODO	
0,52	6	9	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0,13	10,5	8	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	
0,05	8	8	1	2	24	4,69	0,53	ZAPATO	
0,58	8	8	1	2	24	4,69	2,55	DUCTO	
1,13	8	8	2	2	24	4,69	9,30	DUCTO	
0,4	8	6,5	1	2	24	4,69	1,69	REDUCCIÓN	
1,13	8	5	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,6	8	5	1	2	24	4,69	2,14	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	1,52	CODO	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (10)							
1,13	22	12	3	2	24	4,69	29,65	DUCTO	Observacion pediatrica
0,52	20,5	12	1	2	24	4,69	4,72	REDUCCION	
1,13	19	12	3	2	24	4,69	27,03	DUCTO	Circulación
0,52	19	12	1	2	24	4,69	6,72	DUCTO	
0,52	13	11	1	2	24	4,69	3,49	REDUCCION	
0,52	10	8	1	2	24	4,69	2,62	DUCTO	
1,13	10	8	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0	10	8	1	2	24	4,69	0,47	TAPA	
0,15	11,5	4	1	2	24	4,69	0,89	ZAPATO	
0,05	9	4	1	2	24	4,69	0,43	ZAPATO	
0,65	9	4	1	2	24	4,69	2,29	DUCTO	
0	9	4	1	2	24	4,69	0,29	TAPA	
0,13	11,5	6	1	2	24	4,69	0,92	ZAPATO	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	Coordinación y circulación de urgencias
1,13	9	6	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0,63	9	6	1	2	24	4,69	2,57	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,2	14	5	1	2	24	4,69	1,31	ZAPATO	
1,13	12	5	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,2	15,5	9	1	2	24	4,69	1,69	ZAPATO	
1,13	13	9	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO	
0,7	13	9	1	2	24	4,69	4,14	DUCTO	
0,13	11,5	6	1	2	24	4,69	0,92	ZAPATO	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	
1,13	9	6	5	2	24	4,69	21,80	DUCTO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
0,15	11,5	9	1	2	24	4,69	1,17	ZAPATO	
0,05	9	9	1	2	24	4,69	0,60	ZAPATO	
1,13	9	9	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0,9	9	9	1	2	24	4,69	4,25	DUCTO	
0,52	6,5	9	1	2	24	4,69	2,25	REDUCCION	
1,13	4	9	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,52	4	9	1	2	24	4,69	1,89	DUCTO	
0,2	16	8	1	2	24	4,69	1,66	ZAPATO	
1,13	13	8	2	2	24	4,69	12,21	DUCTO	Urgencias,, circulacion, sala de yesos y TAC
0,3	11,5	8	1	2	24	4,69	1,81	REDUCCION	
0,4	10	8	1	2	24	4,69	2,10	DUCTO	
0,13	11,5	6	1	2	24	4,69	0,92	ZAPATO	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	
0,55	10	8	1	2	24	4,69	2,74	CODO	
0,4	10	8	1	2	24	4,69	2,10	DUCTO	
1,13	10	8	3	2	24	4,69	15,70	DUCTO	
0,52	9,5	6,5	1	2	24	4,69	2,33	REDUCCION	
1,13	9	5	3	2	24	4,69	12,21	DUCTO	
0,4	9	6	1	2	24	4,69	1,75	CODO	
0,7	9	6	1	2	24	4,69	2,82	DUCTO	
0	9	6	2	2	24	4,69	0,72	TAPA	
0,13	9	6	1	2	24	4,69	0,79	DUCTO	
		SISTEMA DE RETORNO (1)							
0,52	12,5	10	1	2	24	4,69	3,27	REDUCCION	
1,13	13	10	5	2	24	4,69	33,43	DUCTO	
0,4	13	10	1	2	24	4,69	2,69	AJUSTE	
0,52	13	10	1	2	24	4,69	3,34	CODO	
0,33	13,5	10	1	2	24	4,69	2,35	REDUCCION	
1,13	14	10	2	2	24	4,69	13,95	DUCTO	
1,13	14	10	5	2	24	4,69	34,88	DUCTO	Laboratoio,farmacia, sala de espera contigua a hall y cafeteria.
0,8	14	10	1	2	24	4,69	5,09	DUCTO	
0,52	14	10	1	2	24	4,69	3,49	CODO	
0,25	14	10	1	2	24	4,69	1,94	DUCTO	
0,2	16,5	10	1	2	24	4,69	1,83	ZAPATO	
1,13	16	10	14	2	24	4,69	100,80	DUCTO	
0,52	16	10	2	2	24	4,69	7,56	CODO	
0,52	16	10	3	2	24	4,69	11,34	DESVIACIÓN	
0,6	16	10	2	2	24	4,69	8,55	CODO	
0,6	16	10	1	2	24	4,69	4,27	DUCTO	SALA ESPERA
0,14	16	10	1	2	24	4,69	1,42	DUCTO	
0,52	12	7	1	2	24	4,69	2,76	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	BAÑO PMR
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,48	18	8	1	2	24	4,69	3,53	REDUCCIÓN	
1,13	22	6	2	2	24	4,69	16,28	DUCTO	FARMACIA
0,7	18	8	1	2	24	4,69	4,89	REDUCCIÓN	





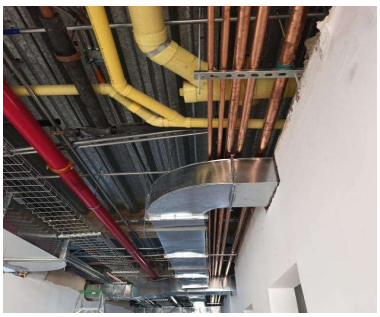




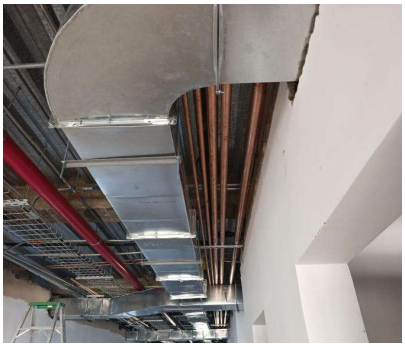





0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,78	8	4	1	2	24	4,69	2,49	DUCTO	LABORATORÍO
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	DUCTO	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	
0,12	8,5	6	1	2	24	4,69	0,73	ZAPATO	TOMA DE MUESTRAS
0,08	6	6	1	2	24	4,69	0,49	ZAPATO	
1,13	6	6	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,4	6	6	1	2	24	4,69	1,40	DUCTO	
1,13	6	6	2	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	
0,38	8	4	1	2	24	4,69	1,34	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	ECÓGRAFO
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	DUCTO	
0,44	8	4	1	2	24	4,69	1,52	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
1,13	13	10	1	2	24	4,69	6,69	DUCTO	
0,52	12,5	10	1	2	24	4,69	3,27	REDUCCIÓN	
1	12	10	1	2	24	4,69	5,71	DUCTO	
1,13	12	10	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
0,52	12	9	1	2	24	4,69	3,05	REDUCCIÓN	PROCEDIMIENTOS
0,4	12	9	1	2	24	4,69	2,45	DUCTO	
0,47	12	8	2	2	24	4,69	5,34	CODO	
0,72	12	8	1	2	24	4,69	3,86	DUCTO	
0,77	12	8	1	2	24	4,69	4,10	DUCTO	
0,81	12	8	1	2	24	4,69	4,29	DUCTO	
0,3	12	8	1	2	24	4,69	1,86	DUCTO	
1,13	12	8	7	2	24	4,69	40,69	DUCTO	
0,52	11	7,5	1	2	24	4,69	2,69	REDUCCIÓN	
0,05	10	7	2	2	24	4,69	1,13	DUCTO	
1,13	10	7	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,35	10	6	1	2	24	4,69	1,68	REDUCCIÓN	
1	10	5	1	2	24	4,69	3,90	DUCTO	
0,45	10	5	1	2	24	4,69	1,93	CODO	
1,13	10	5	4	2	24	4,69	17,44	DUCTO	OBSERVACIÓN GINESCOTETRICA
0,05	10	5	1	2	24	4,69	0,50	DUCTO	
0,52	8	5,5	1	2	24	4,69	1,96	REDUCCIÓN	
1,13	6	4	4	2	24	4,69	11,63	DUCTO	BAÑO OBSERVACIÓN PEDIATRICA
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,2	10,5	5	2	2	24	4,69	2,14	ZAPATO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,52	8	5	1	2	24	4,69	1,89	DUCTO	
0	8	5	2	2	24	4,69	0,60	TAPA	
0,4	7	4,5	1	2	24	4,69	1,34	REDUCCIÓN	ROPA SUCIA
0,35	6	4	1	2	24	4,69	1,05	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,14	8,5		2	2	24	4,69	0,93	ZAPATO	
0,4	6	4	2	2	24	4,69	2,33	DUCTO	PROCEDIMIENTOS
0	6	4	2	2	24	4,69	0,44	TAPA	
0,2	14,5	4	1	2	24	4,69	1,28	ZAPATO	
1,13	12	5	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,15	8,5	5	1	2	24	4,69	0,77	ZAPATA	
0,4	6	4	1	2	24	4,69	1,17	DUCTO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,12	11,5	6	1	2	24	4,69	0,88	ZAPATATO	
0,41	8	6	1	2	24	4,69	1,67	DUCTO	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4,69	0,33	TAPA	
0,21	10,5	4	2	2	24	4,69	2,07	ZAPATO	ECÓGRAFO
0,4	8	4	2	2	24	4,69	2,80	DUCTO	
1,05	8	4	1	2	24	4,69	3,26	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,8	8	4	1	2	24	4,69	2,54	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,8	8	4	1	2	24	4,69	2,54	DUCTO	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO	
0,4	6	4	1	2	24	4,69	1,17	DUCTO	
0,86	6	4	1	2	24	4,69	2,26	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,87	33	33	1	2	24	4,69	15,10	CODO	EN TERRAZA 5
			SISTEMA DE RETORNO (2)						
1,13	19	10	5	2	24	4,69	42,15	DUCTO	COCINETA
0,3	19	10	1	2	24	4,69	2,69	DUCTO	
0,65	19	10	2	2	24	4,69	10,23	CODO	
0,42	19	10	1	2	24	4,69	3,52	DUCTO	
1,13	19	10	2	2	24	4,69	16,86	DUCTO	CIRCULACIÓN A SALA ESPERA
0,4	19	9	1	2	24	4,69	3,27	REDUCCIÓN	
1,13	19	8	1	2	24	4,69	7,85	DUCTO	
0,82	19	8	1	2	24	4,69	5,85	DUCTO	
0,52	19	8	1	2	24	4,69	3,92	DUCTO	
0,8	19	8	1	2	24	4,69	5,73	DESVIO	
0,4	17,5	8	1	2	24	4,69	2,98	REDUCCIÓN	
1,13	16	8	1	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0,52	16	8	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0	16	8	1	2	24	4,69	0,68	TAPA	
0,12	16,5	8	1	2	24	4,69	1,23	ZAPATO	BAÑO
0,21	14	8	1	2	24	4,69	1,57	ZAPATO	
1,13	14	8	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
1,05	14	8	1	2	24	4,69	5,98	DUCTO	
1,13	14	8	5	2	24	4,69	31,97	DUCTO	
0,85	14	8	1	2	24	4,69	4,93	DUCTO	ATECCIÓN URGENCIAS
1,13	14	8	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO	
0,55	14	8	1	2	24	4,69	3,35	DUCTO	
0,55	14	8	1	2	24	4,69	3,35	CODO	CIRCULACIÓN URGENCIAS
1,13	14	8	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
0,9	14	8	1	2	24	4,69	5,19	DUCTO	
1,13	14	8	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
0,4	13	8	1	2	24	4,69	2,45	REDUCCIÓN	
1,13	12	8	4	2	24	4,69	23,26	DUCTO	
0,4	11	8	1	2	24	4,69	2,22	REDUCCIÓN	
1,13	10	8	2	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
0,35	12	7	2	2	24	4,69	3,98	REDUCCIÓN	
1,22	14	6	1	2	24	4,69	6,24	DUCTO	
1,07	8	6	1	2	24	4,69	3,87	DUCTO	
1,13	8	6	6	2	24	4,69	24,42	DUCTO	
0,2	8	5	1	2	24	4,69	0,90	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,2	8	4	1	2	24	4,69	0,83	DUCTO	
0,142	8	4	1	2	24	4,69	0,66	CODO	
1,07	8	4	1	2	24	4,69	3,32	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,7	8	4	1	2	24	4,69	2,26	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
1,6	10	4	1	2	24	4,69	5,64	ZAPATO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	DUCTO	OBSERVACIÓN PEDIATRICA
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO	
0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	ZAPATO	
0,43	6	4	1	2	24	4,69	1,24	DUCTO	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO	SALA EDA
0,5	6	4	1	2	24	4,69	1,41	ZAPATO	
0,75	6	4	1	2	24	4,69	2,00	DUCTO	
1,13	6	4	3	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
1,13	6	4	3	2	24	4,69	8,72	DUCTO	DIGITACIÓN
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO	SALA ERA
0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	ZAPATO	
0,75	6	4	1	2	24	4,69	2,00	DUCTO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	DUCTO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	CONSULTORÍO # 2
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO	
0,85	8	4	1	2	24	4,69	2,69	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,45	8	4	1	2	24	4,69	1,54	CODO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	CONSULTORÍO # 1
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO	
0,9	8	4	1	2	24	4,69	2,83	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
12	10,5	4	1	2	24	4,69	41,77	ZAPATO	BAÑOS CAFETERIA
0,08	8	4	1	2	24	4,69	0,49	ZAPATO	
0,25	8	4	1	2	24	4,69	0,97	CODO	
0,86	8	4	1	2	24	4,69	2,72	DUCTO	
1,13	8	4	4	2	24	4,69	13,95	DUCTO	
0,52	7	4	1	2	24	4,69	1,60	REDUCCIÓN	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,08	10	6	1	2	24	4,69	0,65	ZAPATO	BAÑO SALA ESPERA
0,12	8	6	1	2	24	4,69	0,70	ZAPATO	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
1	8	6	1	2	24	4,69	3,64	DUCTO	
1,4	8	6	1	2	24	4,69	4,97	DUCTO	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
0,3	8	5	1	2	24	4,69	1,21	REDUCCIÓN	
0,8	8	4	1	2	24	4,69	2,54	DUCTO	
0	8	4	4	2	24	4,69	1,05	TAPA	
0,1	12	4	4	2	24	4,69	2,90	ZAPATO	
0,1	10	4	4	2	24	4,69	2,54	ZAPATO	
0,52	14	10	1	2	24	4,69	3,49	DESVIO	PASILLO URG
0,84	14	10	1	2	24	4,69	5,32	DESVIO	
0,52	14	10	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,52	9	7	1	2	24	4,69	2,33	REDUCCIÓN	
			SISTEMA DE EXTRACCION DE REGILLAS SOBREPUESTAS - PLENUM						
1,13	60	20	2	2	18	10,10	100,15	DUCTO	DE 1ER PISO A 2DO PISO - POR BUITRON DE 2DO PISO DETRÁS DE C. ASEO DE RECIPERACIÓN PARTOS
0,3	60	20	1	2	18	10,10	16,01	DUCTO	
0,35	20	60	1	2	18	10,10	18,06	CODO	
0,52	20	60	1	2	18	10,10	25,04	DUCTO	
			CUELLOS DE TODO EL SISTEMA PISO 1						
0,13	9	9	1	1	24	4,69	0,75		FARMACIA
0,16	9	9	1	1	24	4,69	0,88		FARMACIA
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93		AREA ADMINISTRATIVA
0,2	8	6	1	1	24	4,69	0,82		BAÑO AREA ADNINISTRATIVA
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93		AREA ESCALERAS FARMACIA
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93		FARMACIA AREA ESTANTERIA
0,2	9	9	1	1	24	4,69	1,05		LABORATORIO
0,2	9	9	1	1	24	4,69	1,05		LABORATORIO

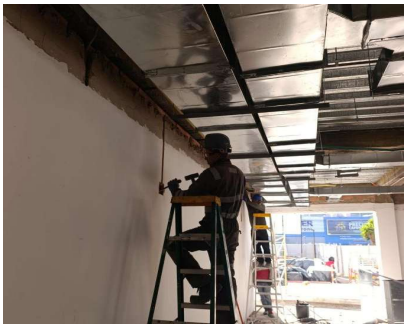



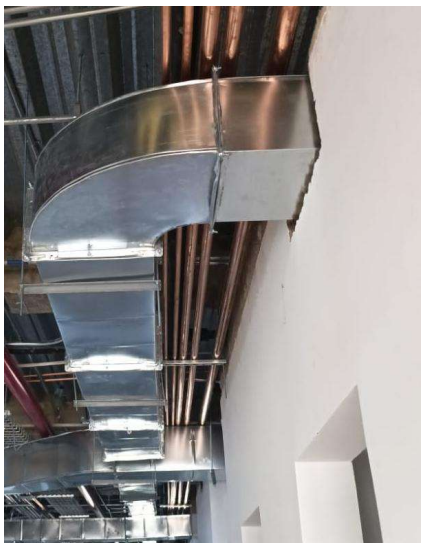

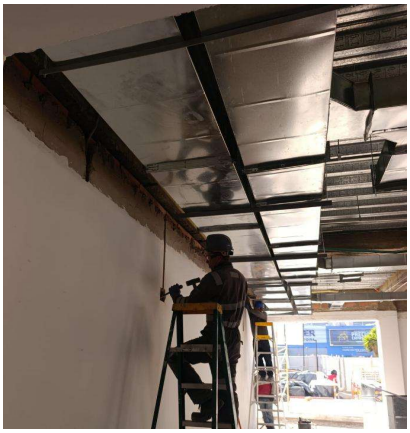

0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		LABORATORIO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		LABORATORIO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		LABORATORIO
0,2	8	8	1	1	24	4,69	**0,93**		LABORATORIO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		CIRCULACCION A ASEO LABORATORIO
0,2	8	8	1	1	24	4,69	**0,93**		TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		BAÑO TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		TOMO DE MUESTRAS
0,2	8	8	1	1	24	4,69	**0,93**		TOMO DE MUESTRAS
0,2	8	8	1	1	24	4,69	**0,93**		SALA DE LECTURA IMAGENECOLOGIA
0,2	8	8	1	1	24	4,69	**0,93**		OFICINA RADIOLOGIA
0,2	8	8	1	1	24	4,69	**0,93**		PROCEDIMIENTO IMAGEONOLOGIA
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		ECOGRAFO SERVICIO IMAGEONOLOGIA
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		BAÑO VESTIER IMAGEONOLOGIA
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		ECOGRAFO SERVICIO IMAGEONOLOGIA
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		BAÑO PROCEDIMIENTO IMAGEONOLOGIA
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**		ECOGRAFO
0,25	12	12	1	1	24	4,69	**1,69**		ADMISIONES
0,17	12	12	1	1	24	4,69	**1,23**		PROCEDIMIENTOS
0,34	8	6	1	1	24	4,69	**1,28**		ISUMOS
0,34	8	6	1	1	24	4,69	**1,28**		ASEO EN PROCEDIMIENTOS
0,34	9	9	1	1	24	4,69	**1,65**		CONSULTORIO CARDIOLOGO
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		ASEO FRENTE A T.A.C
0,24	8	6	1	1	24	4,69	**0,95**		CONSULTORIO CARDIOLOGO
0,09	9	9	1	1	24	4,69	**0,58**		MAMOGRAFO
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**		T.A.C
0,14	9	9	1	1	24	4,69	**0,79**		DISPARO
0,16	12	12	1	1	24	4,69	**1,17**		OBSERVACION GINECOSTETRICIA
0,16	12	12	1	1	24	4,69	**1,17**		OBSERVACION GINECOSTETRICIA
0,31	8	6	1	1	24	4,69	**1,18**		BAÑO OBSERVACION GINECOSTETRICIA
0,34	8	6	1	1	24	4,69	**1,28**		T SUCIO
0,34	8	6	1	1	24	4,69	**1,28**		T LIMPIO
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**		W.C FAMILIAR
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		OBSERVACION PEDIATRA
0,17	9	9	1	1	24	4,69	**0,92**		OBSERVACION PEDIATRA
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		CENTRAL EMFERMERIA EN OBSERVACION
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		OBSERVACION PEDIATRA
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		OBSERVACION PEDIATRA
0,16	8	8	1	1	24	4,69	**0,78**		OBSERVACION PEDIATRA CUBICULO DE AISLAMIENTO
0,23	8	6	1	1	24	4,69	**0,92**		BAÑOM CUBICULO AISLAMIENTO
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**		RESIDUOS ORDINARIOS
0,22	8	6	1	1	24	4,69	**0,88**		RESIDUOS PELIGROSOS
0,3	8	6	1	1	24	4,69	**1,15**		SALA EDA
0,27	12	12	1	1	24	4,69	**1,80**		BAÑO SALA EDA
0,21	9	9	1	1	24	4,69	**1,09**		DIR. URGENCIAS
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		PROCEDIENTOS ACEPTICOS
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		DIGITACION
0,3	8	6	1	1	24	4,69	**1,15**		ROPA LIMPIA
0,26	8	6	1	1	24	4,69	**1,02**		ROPA SUCIA
0,12	9	9	1	1	24	4,69	**0,71**		SALA DE YESOS
0,3	8	6	1	1	24	4,69	**1,15**		W . C SALA ERA
0,15	9	9	1	1	24	4,69	**0,84**		SALA ERA
0,3	8	6	1	1	24	4,69	**1,15**		W.C CONSULTORIO 2
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		CONSULTORIO 2
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		CONSULTORIO 5
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		W.C CONSULTORIO 5
0,12	12	12	1	1	24	4,69	**0,94**		MONITOREO GINECOSTETRICIA
0,12	12	12	1	1	24	4,69	**0,94**		MONITOREO GINECOSTETRICIA
0,24	8	6	1	1	24	4,69	**0,95**		MONITOREO GINECOSTETRICIA
0,1	9	9	1	1	24	4,69	**0,62**		CONSULTORIO 4
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**		BAÑO CONSULTORIO 5
0,15	9	9	1	1	24	4,69	**0,84**		CONSULTORIO 1
0,34	8	6	1	1	24	4,69	**1,28**		BAÑO CONSULTORIO 1
0,14	9	9	1	1	24	4,69	**0,79**		REANIMACION
0,21	9	9	1	1	24	4,69	**1,09**		REANIMACION
0,17	9	9	1	1	24	4,69	**0,92**		CONSULTORIO 3
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**		BAÑO CONSULTORIO 3
0,15	9	9	1	1	24	4,69	**0,84**		ADMISION URGENCIAS
0,18	8	8	1	1	24	4,69	**0,86**		ADMISION URGENCIAS
0,12	9	9	1	1	24	4,69	**0,71**		ACCESO URGENCIAS
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		SALA ESPERA ADULTOS
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**		SALA ESPERA ADULTOS
0,14	9	9	1	1	24	4,69	**0,79**		SALA ESPERA ADULTOS
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		SALA ESPERA ADULTOS
0,14	9	9	1	1	24	4,69	**0,79**		SALA ESPERA ADULTOS
0,16	9	9	1	1	24	4,69	**0,88**		SALA ESPERA ADULTOS
0,21	9	9	1	1	24	4,69	**1,09**		AUDITORIO
0,21	9	9	1	1	24	4,69	**1,09**		AUDITORIO
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**		AUDITORIO
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**		AUDITORIO
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**		AUDITORIO
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**		AUDITORIO
0,18	8	6	1	1	24	4,69	**0,75**		BAÑO CAFETERIA
0,18	8	6	1	1	24	4,69	**0,75**		BAÑO CAFETERIA
0,19	12	12	1	1	24	4,69	**1,34**		CAFETERIA
0,17	12	12	1	1	24	4,69	**1,23**		CAFETERIA
0,17	12	12	1	1	24	4,69	**1,23**		CAFETERIA
0,19	12	12	1	1	24	4,69	**1,34**		CAFETERIA
0,2	12	12	1	1	24	4,69	**1,40**		CAFETERIA
0,23	12	12	1	1	24	4,69	**1,57**		HALL GENERAL
0,19	12	12	1	1	24	4,69	**1,34**		HALL GENERAL
0,12	12	12	1	1	24	4,69	**0,94**		HALL GENERAL
0,13	12	12	1	1	24	4,69	**1,00**		HALL GENERAL
0,13	12	12	1	1	24	4,69	**1,00**		HALL GENERAL
0,19	9	9	1	1	24	4,69	**1,01**		FACTURACION AUTORIZACION
0,22	9	9	1	1	24	4,69	**1,14**		CENYTRO DE CABLEADO
0,12	9	9	1	1	24	4,69	**0,71**		DESCABNSO INTERNOS
0,08	9	9	1	1	24	4,69	**0,54**		SALA ESPERA
0,1	9	9	1	1	24	4,69	**0,62**		SALA ESPERA
0,08	9	9	1	1	24	4,69	**0,54**		SALA ESPERA
0,1	9	9	1	1	24	4,69	**0,62**		SALA ESPERA
0,16	8	6	1	1	24	4,69	**0,68**		SALA ESPERA
0,16	8	6	1	1	24	4,69	**0,68**		SALA ESPERA
0,37	8	6	1	1	24	4,69	**1,38**		BAÑO PERSONAL ASISTENCIAL
0,37	8	6	1	1	24	4,69	**1,38**		BAÑO PERSONAL ASISTENCIAL
0,22	9	9	1	1	24	4,69	**1,14**		PERSONAL ASISTENCIAL
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**		PERSONAL ASISTENCIAL
0,33	8	6	1	1	24	4,69	**1,25**		BAÑOS DISCAPASITADOS
0,27	8	6	1	1	24	4,69	**1,05**		W.C MUJERES
0,27	8	6	1	1	24	4,69	**1,05**		W.C MUJERES
0,27	8	6	1	1	24	4,69	**1,05**		W.C HOMBRE
0,27	8	6	1	1	24	4,69	**1,05**		W.C HOMBRE
0,31	8	6	1	1	24	4,69	**1,18**		W.C HOMBRE
		PISO 4							
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
0,15	10,5	4	2	2	24	4,69	**1,66**	ZAPATO	
0,05	8	4	2	2	24	4,69	**0,80**	ZAPATO	
1,13	8	4	5	2	24	4,69	**17,44**	DUCTO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0	8	4	2	2	24	4,69	**0,53**	TAPAS	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,3	1,5	4	1	2	24	4,69	**0,51**	REDUCCIÓN	
0,65	7	4	1	2	24	4,69	**1,94**	DUCTO	
0	7	4	1	2	24	4,69	**0,24**	TAPAS	
0,4	10	8	1	2	24	4,69	**2,10**	DUCTO	
0,15	10,5	6	1	2	24	4,69	**0,94**	ZAPATO	
0,05	8	6	1	2	24	4,69	**0,47**	ZAPATO	
0,45	10	6	1	2	24	4,69	**2,06**	DUCTO	
1,13	10	5	1	2	24	4,69	**4,36**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	REDUCCIÓN	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
0,54	8	4	1	2	24	4,69	**1,80**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
1	8	4	1	2	24	4,69	**3,12**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPAS	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0,2	8	4	1	2	24	4,69	**0,83**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPAS	
0,15	10,5	6	1	2	24	4,69	**0,94**	ZAPATO	
0,05	8	6	1	2	24	4,69	**0,47**	ZAPATO	
1,13	8	6	2	2	24	4,69	**8,14**	DUCTO	
0,52	8	6	1	2	24	4,69	**2,03**	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4,69	**0,33**	TAPAS	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,94	8	4	1	2	24	4,69	**2,94**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPAS	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
0,2	8	4	1	2	24	4,69	**0,83**	DUCTO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,6	7	4	1	2	24	4,69	**1,81**	REDUCCIÓN	
0,6	6	4	1	2	24	4,69	**1,64**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPAS	
0,15	9	4	2	2	24	4,69	**1,49**	ZAPATO	
0,05	6	4	2	2	24	4,69	**0,67**	ZAPATO	
1,13	6	4	5	2	24	4,69	**14,53**	DUCTO	
0,65	6	4	1	2	24	4,69	**1,76**	DUCTO	
0,15	12,5	6	1	2	24	4,69	**1,06**	ZAPATO	
0,05	10	6	1	2	24	4,69	**0,53**	ZAPATO	
1,13	10	6	2	2	24	4,69	**9,30**	DUCTO	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	**1,52**	REDUCCIÓN	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	
0,4	6	4	1	2	24	4,69	**1,17**	CODO	
0,7	6	4	1	2	24	4,69	**1,88**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPAS	
0,15	9	4	1	2	24	4,69	**0,74**	ZAPATO	
0,4	6	4	1	2	24	4,69	**1,17**	ZAPATO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPAS	










1,13	6	4	4	2	24	4,69	**11,63**	DUCTO	
0,65	6	4	1	2	24	4,69	**1,76**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPAS	
0,15	9	4	1	2	24	4,69	**0,74**	ZAPATO	
0,05	6	4	1	2	24	4,69	**0,33**	ZAPATO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPAS	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
1,13	21	12	9	2	24	4,69	**86,33**	DUCTO	
0,6	21	12	1	2	24	4,69	**5,42**	DESVIO	
0	21	12	1	2	24	4,69	**1,15**	TAPA	
0,16	14,5	8	1	2	24	4,69	**1,34**	ZAPATO	
0,05	12	8	1	2	24	4,69	**0,67**	ZAPATO	
0,52	12	8	1	2	24	4,69	**2,91**	DESVIO	
1,13	10	8	5	2	24	4,69	**26,16**	DUCTO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	REDUCCION	
1,13	8	4	5	2	24	4,69	**17,44**	DUCTO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0,15	16,5	11	1	2	24	4,69	**1,57**	ZAPATO	
0,5	14	11	1	2	24	4,69	**3,51**	ZAPATO	
0,8	14	11	1	2	24	4,69	**5,30**	DUCTO	
0,52	14	11	1	2	24	4,69	**3,63**	DESVIO	Red principal de retorno piso 4, todo sobre pasillo.
1,13	14	11	3	2	24	4,69	**21,80**	DUCTO	
0,52	13,5	10,5	1	2	24	4,69	**3,49**	REDUCCION	
1,13	13	10	5	2	24	4,69	**33,43**	DUCTO	
0,75	13	10	1	2	24	4,69	**4,60**	DUCTO	
0,52	12,5	10	1	2	24	4,69	**3,27**	REDUCCION	
1,13	12	10	5	2	24	4,69	**31,97**	DUCTO	
0,75	12	10	1	2	24	4,69	**4,40**	DUCTO	
0,52	10	10	1	2	24	4,69	**2,91**	REDUCCION	
1,13	10	8	5	2	24	4,69	**26,16**	DUCTO	
0,75	10	8	1	2	24	4,69	**3,60**	DUCTO	
0,52	9	86	1	2	24	4,69	**13,81**	REDUCCION	
1,13	8	4	5	2	24	4,69	**17,44**	DUCTO	
0,75	8	4	1	2	24	4,69	**2,40**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,22	8	4	1	2	24	4,69	**0,89**	CODO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
0,6	8	4	1	2	24	4,69	**1,97**	DUCTO	
0,2	8	4	1	2	24	4,69	**0,83**	DUCTO	WC HABITACIONES: 421 - 423
0,41	8	4	1	2	24	4,69	**1,43**	CODO	
0	7	4	1	2	24	4,69	**0,24**	REDUCCIÓN	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,22	8	4	1	2	24	4,69	**0,89**	CODO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
0,6	8	4	1	2	24	4,69	**1,97**	DUCTO	
0,2	8	4	1	2	24	4,69	**0,83**	DUCTO	WC HABITACIONES: 417 - 419
0,41	8	4	1	2	24	4,69	**1,43**	CODO	
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	
0,6	6	4	1	2	24	4,69	**1,54**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,22	8	4	1	2	24	4,69	**0,89**	CODO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
0,6	8	4	1	2	24	4,69	**1,97**	DUCTO	
0,45	8	4	1	2	24	4,69	**1,54**	DUCTO	WC HABITACIONES: 409 - 407
0,41	8	4	1	2	24	4,69	**1,43**	CODO	
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	
0,62	6	4	1	2	24	4,69	**1,69**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,22	8	4	1	2	24	4,69	**0,89**	CODO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
0,98	8	4	1	2	24	4,69	**3,06**	DESVIO	
1	8	4	1	2	24	4,69	**3,12**	DUCTO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	WC HABITACIONES: 406 - 404
0,41	8	4	1	2	24	4,69	**1,43**	CODO	
0	7	4	1	2	24	4,69	**0,24**	REDUCCIÓN	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,17	8	6	1	1	24	4,69	**0,72**	CUELLO	WC HAB 412
0,32	8	6	1	1	24	4,69	**1,22**	CUELLO	WC HAB 413
0,19	8	6	1	1	24	4,69	**0,78**	CUELLO	WC HAB 414
0,3	8	6	1	1	24	4,69	**1,15**	CUELLO	WC HAB 415
0,1	8	6	1	1	24	4,69	**0,48**	CUELLO	WC HAB 416
0,32	8	6	1	1	24	4,69	**1,22**	CUELLO	WC HAB 417
0,12	8	6	1	1	24	4,69	**0,55**	CUELLO	WC HAB 418
0,26	8	6	1	1	24	4,69	**1,02**	CUELLO	WC HAB 419
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**	CUELLO	WC HAB 420
0,28	8	6	1	1	24	4,69	**1,08**	CUELLO	WC HAB 421
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**	CUELLO	WC HAB 422
0,3	8	6	1	1	24	4,69	**1,15**	CUELLO	WC HAB 423
0,11	8	6	1	1	24	4,69	**0,52**	CUELLO	WC HAB 424
0,17	8	6	1	1	24	4,69	**0,72**	CUELLO	WC HAB 425
1,13	21	12	1	2	24	4,69	**9,59**	DUCTO	EN TERRAZA 5
CUELLOS DE LOS SISTEMAS EN EL PISO									
0,16	8	6	1	1	24	4,69	**0,68**	CUELLO	HABITACIÓN 411
0,12	8	6	1	1	24	4,69	**0,55**	CUELLO	HABITACIÓN 410
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**	CUELLO	HABITACIÓN 409
0,17	8	6	1	1	24	4,69	**0,72**	CUELLO	HABITACIÓN 408
0,1	8	6	1	1	24	4,69	**0,48**	CUELLO	HABITACIÓN 407
0,19	8	6	1	1	24	4,69	**0,78**	CUELLO	HABITACIÓN 406
0,255	8	6	1	1	24	4,69	**1,00**	CUELLO	HABITACIÓN 405
0,19	8	6	1	1	24	4,69	**0,78**	CUELLO	HABITACIÓN 404
0,25	8	6	1	1	24	4,69	**0,98**	CUELLO	HABITACIÓN 403
0,19	8	6	1	1	24	4,69	**0,78**	CUELLO	HABITACIÓN 402
0,15	8	6	1	1	24	4,69	**0,65**	CUELLO	HABITACIÓN 401
0,13	8	6	1	1	24	4,69	**0,58**	CUELLO	TRABAJO SUCIO
0,16	8	6	1	1	24	4,69	**0,68**	CUELLO	PROCEDIMIENTOS
0,105	8	6	1	1	24	4,69	**0,50**	CUELLO	ASEO
0,1	8	6	1	1	24	4,69	**0,48**	CUELLO	BAÑO DESCANSO
0,18	8	6	1	1	24	4,69	**0,75**	CUELLO	TRABAJO LIMPIO
0,44	8	6	1	1	24	4,69	**1,62**	CUELLO	WC CIRCULACIÓN HALL
0,43	8	6	1	1	24	4,69	**1,58**	CUELLO	WC CIRCULACIÓN HALL
PISO 2									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1,13	20	12	1	2	24	4,69	**9,30**	DUCTO	
0,52	18	12	1	2	24	4,69	**4,36**	REDUCCIÓN	
1,13	16	12	4	2	24	4,69	**32,55**	DUCTO	
0,52	16	11	1	2	24	4,69	**3,92**	REDUCCIÓN	
1,13	16	10	4	2	24	4,69	**30,23**	DUCTO	
0,52	15	9	1	2	24	4,69	**3,49**	REDUCCIÓN	
0,4	14	8	1	2	24	4,69	**2,57**	DUCTO	
1,13	14	8	1	2	24	4,69	**6,39**	DUCTO	
0,4	12	8	1	2	24	4,69	**2,33**	REDUCCIÓN	
0,5	10	8	1	2	24	4,69	**2,53**	DUCTO	
1,13	10	8	2	2	24	4,69	**10,46**	DUCTO	
0,6	10	8	1	2	24	4,69	**2,96**	DUCTO	
0,4	9,5	7	1	2	24	4,69	**1,93**	REDUCCIÓN	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	**0,36**	TAPA	
0,3	10	8	1	2	24	4,69	**1,67**	DUCTO	
0,45	10	8	1	2	24	4,69	**2,32**	CODO	
0,15	12,5	8	1	2	24	4,69	**1,17**	ZAPATO (T)	
0,05	9	8	1	2	24	4,69	**0,57**	ZAPATO (R)	
1,13	9	8	2	2	24	4,69	**9,88**	DUCTO	
0,58	9	8	1	2	24	4,69	**2,71**	DUCTO	UCI UARO - CAMA 7
0,45	9	7	1	2	24	4,69	**2,06**	REDUCCIÓN	
0,42	9	6	1	2	24	4,69	**1,82**	CODO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	**4,36**	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	**0,36**	TAPA	
0,125	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,74**	ZAPATO (T)	
0,075	8	4	1	2	24	4,69	**0,47**	ZAPATO (R)	UCI UARO - DE CAMA 7 A FILTRO CAMA 6 AISLADO
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	11,5	6	1	2	24	4,69	**1,00**	ZAPATO	
0,05	9	6	1	2	24	4,69	**0,50**	ZAPATO	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	**8,72**	DUCTO	UCI URO 08
0,6	9	6	1	2	24	4,69	**2,47**	DUCTO	
0,88	9	6	1	2	24	4,69	**3,47**	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	**0,36**	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,16	8	4	1	2	24	4,69	**0,71**	ZAPATO	CENTRAL DE ENFERMERIA
0,8	8	4	1	2	24	4,69	**2,54**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAA	
1,13	12	8	2	2	24	4,69	**11,63**	DUCTO	
0,52	10,5	7,5	1	2	24	4,69	**2,62**	REDUCCIÓN	
1,13	9	7	1	2	24	4,69	**4,65**	DUCTO	UCI URO 05 A A AISLADO
0	9	7	1	2	24	4,69	**0,40**	TAPA	
0,15	14,5	8	1	2	24	4,69	**1,29**	ZAPATO	
0,38	12	8	1	2	24	4,69	**2,24**	ZAPATO	
0,15	10,5	5	1	2	24	4,69	**0,89**	ZAPATO	
0,37	8	5	1	2	24	4,69	**1,42**	ZAPATO	UCI URO 09
1,13	8	5	2	2	24	4,69	**7,56**	DUCTO	
1,16	16	12	1	2	24	4,69	**8,34**	DUCTO	PASILLO FUERA TRABAJO DE PARTO
0,13	14	5	1	2	24	4,69	**1,00**	ZAPATO	
0,24	9	5	1	2	24	4,69	**1,10**	ZAPATO	
0,38	9	5	1	2	24	4,69	**1,57**	DUCTO	
1,13	9	5	1	2	24	4,69	**4,07**	DUCTO	
0,13	11	4	1	2	24	4,69	**0,79**	ZAPATO	
0,15	6	4	1	2	24	4,69	**0,57**	ZAPATO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	UCI UARO
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,3	9	5	1	2	24	4,69	**1,30**	REDUCCIÓN	
1,13	9	4	2	2	24	4,69	**7,56**	DUCTO	
0,37	9	4	1	2	24	4,69	**1,42**	CODO	
0,52	9	4	1	2	24	4,69	**1,89**	DUCTO	
1,13	9	4	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
0	9	4	1	2	24	4,69	**0,29**	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (1)									
0,425	10	12	1	2	24	4,69	**2,70**	CODO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR DE QUIROFANO 1 Y 2
1,13	12	10	8	2	24	4,69	**51,16**	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	2	24	4,69	**2,41**	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	**2,41**	CODO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	2	24	4,69	**2,41**	CODO (AISLADO)	
1,13	10	12	6	2	24	4,69	**38,37**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	4	2	24	4,69	**25,58**	DUCTO (AISLADO)	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 3
0,44	10	10	1	2	24	4,69	**2,53**	CODO (AISLADO)	
0,52	11	10	1	2	24	4,69	**3,05**	REDUCCIÓN (AISLADO)	
1,13	10	10	1	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO (AISLADO)	







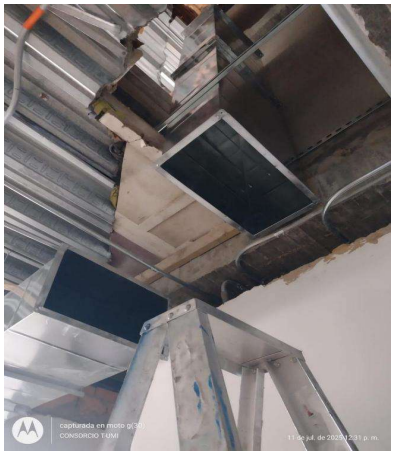



SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1,13	21	10	1	2	24	4,69	**9,01**	DUCTO	
0,15	14,5	8	2	2	24	4,69	**2,57**	ZAPATO	
0,05	12	8	2	2	24	4,69	**1,33**	ZAPATO	
0,8	12	8	1	2	24	4,69	**4,24**	DUCTO	
1,13	12	8	1	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0,4	10,5	7	1	2	24	4,69	**2,04**	REDUCCIÓN	
0,3	9	6	1	2	24	4,69	**1,39**	DUCTO	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	**8,72**	DUCTO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	**0,36**	TAPA	
0,9	12	8	1	2	24	4,69	**4,72**	DUCTO	
0,52	10,5	7	1	2	24	4,69	**2,54**	REDUCCIÓN	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	DUCTO	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	**8,72**	DUCTO	
0,66	9	6	1	2	24	4,69	**2,68**	DUCTO	
0,52	18,5	11	1	2	24	4,69	**4,29**	REDUCCIÓN	
1,13	16	10	3	2	24	4,69	**22,67**	DUCTO	
0,5	15	9	1	2	24	4,69	**3,37**	REDUCCIÓN	
1,13	14	8	3	2	24	4,69	**19,18**	DUCTO	
0,6	14	8	1	2	24	4,69	**3,62**	DUCTO	
0,52	11	7	1	2	24	4,69	**2,62**	REDUCCIÓN	
1,13	8	6	2	2	24	4,69	**8,14**	DUCTO	
0,52	8	5	1	2	24	4,69	**1,89**	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	3	2	24	4,69	**10,46**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,8	8	4	1	2	24	4,69	**2,54**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	11,5	6	1	2	24	4,69	**1,00**	ZAPATO	CENTRAL ENFERMERIA UCI URO
0,05	9	6	1	2	24	4,69	**0,50**	ZAPATO	
0,3	9	6	1	2	24	4,69	**1,39**	DUCTO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	**4,36**	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	**0,36**	TAPA	
0,15	11,5	6	1	2	24	4,69	**1,00**	ZAPATO	
0,05	9	6	1	2	24	4,69	**0,50**	ZAPATO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	**0,36**	TAPA	
0,15	10,5	5	1	2	24	4,69	**0,89**	ZAPATO	EXTRACCIÓN
0,05	8	5	1	2	24	4,69	**0,43**	ZAPATO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	**0,30**	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	VESTIER
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	15	6	1	2	24	4,69	**1,20**	ZAPATO	TRABAJO DE PARTOS
0,02	10	6	1	2	24	4,69	**0,42**	ZAPATO	
0,76	10	6	1	2	24	4,69	**3,24**	DUCTO	
0,46	10	6	1	2	24	4,69	**2,10**	DUCTO	
0,55	10	6	1	2	24	4,69	**2,44**	DUCTO	
0,55	10	6	1	2	24	4,69	**2,44**	DUCTO	
0,52	9,5	5	1	2	24	4,69	**2,11**	REDUCCIÓN	CIRCULACION QUIROFANOS
0,52	9	4	1	2	24	4,69	**1,89**	DUCTO	
1,13	9	4	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
	9	4	1	1	24	4,69	**0,19**	TAPA	
0,13	14	4	1	2	24	4,69	**0,94**	ZAPATO	
0,05	9	4	1	2	24	4,69	**0,43**	ZAPATO	
0,53	9	4	4	2	24	4,69	**7,68**	DUCTO	
1,13	9	4	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
	9	4	1	1	24	4,69	**0,19**	TAPA	
0,15	14	4	1	2	24	4,69	**1,03**	ZAPATO	
0,05	9	4	1	2	24	4,69	**0,43**	ZAPATO	
1,13	9	4	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
	9	4	1	1	24	4,69	**0,19**	TAPA	
0,15	14	5	1	2	24	4,69	**1,09**	ZAPATO	TRABAJO DE PARTOS
0,05	9	9	1	2	24	4,69	**0,60**	ZAPATO	
0,93	5	5	1	2	24	4,69	**2,43**	DUCTO	
0,4	9	9	1	2	24	4,69	**2,10**	CODO	
1,13	9	9	5	2	24	4,69	**26,16**	DUCTO	
0,15	15	15	1	2	24	4,69	**1,72**	ZAPATO	
0,05	10	10	1	2	24	4,69	**0,67**	ZAPATO	CIRCULACION QUIEROFANOS A HALL
0,52	10	10	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	
0	10	10	1	1	24	4,69	**0,42**	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (2)									
1,13	12	10	2	2	24	4,69	**12,79**	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR DESCANSO A DE QUIROFANO 1
0,52	12	10	1	2	24	4,69	**3,20**	CODO (AISLADO)	
0,425	12	10	3	2	24	4,69	**8,10**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	2	2	24	4,69	**12,79**	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0,52	11	10	1	2	24	4,69	**3,05**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	101	10	1	2	24	4,69	**32,26**	DUCTO (AISLADO)	
0,2	10	10	1	2	24	4,69	**1,38**	CODO (AISLADO)	
0,33	10	10	1	2	24	4,69	**2,00**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	10	10	1	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	2	24	4,69	**0,55**	TAPA (AISLADO)	
0,25	12	10	1	2	24	4,69	**1,78**	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	**2,41**	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	**4,82**	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	**38,37**	DUCTO (AISLADO)	
0,4	12	10	1	2	24	4,69	**2,57**	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIROFANOS
0,44	12	10	1	2	24	4,69	**2,78**	CODO (AISLADO)	
0,6	12	10	1	2	24	4,69	**3,62**	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	**2,78**	CODO (AISLADO)	
0,4	12	10	1	2	24	4,69	**2,57**	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	**2,78**	CODO (AISLADO)	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	2	24	4,69	**6,39**	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1,13	22	12	1	2	24	4,69	**9,88**	DUCTO	RECUPERACIÓN PARTOS
0,52	19	12	1	2	24	4,69	**4,51**	REDUCCIÓN	
1,13	16	12	2	2	24	4,69	**16,28**	DUCTO	
0,52	14	12	1	2	24	4,69	**3,78**	REDUCCIÓN	
1,13	12	12	2	2	24	4,69	**13,95**	DUCTO	
0,4	12	10	1	2	24	4,69	**2,57**	REDUCCIÓN	
1,13	12	8	5	2	24	4,69	**29,07**	DUCTO	
0,4	10	7	1	2	24	4,69	**1,98**	REDUCCIÓN	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	**4,07**	DUCTO	
0,52	8	6	1	2	24	4,69	**2,03**	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4,69	**0,33**	TAPA	
0,21	22	12	1	2	24	4,69	**2,43**	DUCTO	
0,66	22	12	1	2	24	4,69	**6,08**	CODO	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	**19,77**	DUCTO	
0,72	22	12	1	2	24	4,69	**6,56**	DUCTO	
0,66	22	12	1	2	24	4,69	**6,08**	CODO	
0,6	22	12	1	2	24	4,69	**5,59**	DUCTO	
0,15	13	4	1	2	24	4,69	**0,97**	ZAPATO	VESTIER HOMBRE Y MUJERES
0,38	8	4	13	2	24	4,69	**17,47**	ZAPATO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,13	13	4	1	2	24	4,69	**0,89**	ZAPATO	
0,15	8	4	1	2	24	4,69	**0,69**	ZAPATO	
1,31	8	4	1	2	24	4,69	**4,00**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	13	4	1	2	24	4,69	**0,97**	ZAPATO	
0,37	8	4	1	2	24	4,69	**1,32**	ZAPATO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0,425	8	4	2	2	24	4,69	**2,94**	CODO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	19	10	1	2	24	4,69	**1,66**	ZAPATO	RECUPERACIÓN PARTOS
0,15	14	10	1	2	24	4,69	**1,37**	ZAPATO	
1,13	14	10	1	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0,5	13	8,5	1	2	24	4,69	**3,02**	REDUCCIÓN	
1,13	12	7	4	2	24	4,69	**22,09**	DUCTO	
0	12	7	1	2	24	4,69	**0,50**	TAPA	
0,13	17	7	1	2	24	4,69	**1,26**	ZAPATO	
0,05	12	7,5	1	2	24	4,69	**0,65**	ZAPATO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	**4,94**	DUCTO	
0	12	5	1	1	24	4,69	**0,28**	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (3)									
1,13	12	10	2	2	24	4,69	**12,79**	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO
0,52	12	10	1	2	24	4,69	**3,20**	CODO (AISLADO)	
0,425	12	10	3	2	24	4,69	**8,10**	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE DE QUIROFANO 1 A 2
1,13	12	10	2	2	24	4,69	**12,79**	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0,52	11	10	1	2	24	4,69	**3,05**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	101	10	1	2	24	4,69	**32,26**	DUCTO (AISLADO)	
0,2	10	10	1	2	24	4,69	**1,38**	CODO (AISLADO)	
0,33	10	10	1	2	24	4,69	**2,00**	DUCTO (AISLADO)	
1,13	10	10	1	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	2	24	4,69	**0,55**	TAPA (AISLADO)	
1,13	12	10	2	2	24	4,69	**12,79**	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	**2,41**	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	**4,82**	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	**38,37**	DUCTO (AISLADO)	
0,4	12	10	1	2	24	4,69	**2,57**	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QIROFANOS
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
1,13	21	12	2	2	24	4,69	**19,18**	DUCTO	
0,52	21	12	1	2	24	4,69	**4,80**	DUCTO	
0,52	19,5	12	1	2	24	4,69	**4,58**	REDUCCIÓN	
1,13	18	12	3	2	24	4,69	**26,16**	DUCTO	
0,21	18	12	1	2	24	4,69	**2,14**	DUCTO	
0,52	15	10	1	2	24	4,69	**3,63**	REDUCCIÓN	
1,13	12	8	2	2	24	4,69	**11,63**	DUCTO	
0,65	12	8	1	2	24	4,69	**3,53**	DESVIO	
1,13	12	8	1	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0,4	10,5	7	1	2	24	4,69	**2,04**	REDUCCIÓN	
1,06	9	6	1	2	24	4,69	**4,11**	DESVIO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	**4,36**	DUCTO	
0,4	9	6	1	2	24	4,69	**1,75**	CODO	
1,13	9	6	3	2	24	4,69	**13,08**	DUCTO	













0,33	9	6	1	2	24	4,69	1,50	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,13	14	6	1	2	24	4,69	1,05	ZAPATO	
0,07	12	6	1	2	24	4,69	0,69	ZAPATO	
1,13	12	6	2	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,15	17	6	1	2	24	4,69	1,32	ZAPATO	
0,15	12	6	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO	TRABAJO DE PARTOS
1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,15	17	6	1	2	24	4,69	1,32	ZAPATO	
0,15	12	6	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO	
1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (4)									
1,13	12	10	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	
0,37	12	10	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,52	10	12	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	4,82	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	38,37	DUCTO (AISLADO)	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	EQUIPOS
0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	
0,67	12	10	1	2	24	4,69	3,98	DUCTO (AISLADO)	
0,52	11	10	1	2	24	4,69	3,05	REDUCCIÓN (AISLADO)	
1,13	10	10	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2
0,44	10	10	1	2	24	4,69	2,53	CODO (AISLADO)	
1,13	10	10	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	2	24	4,69	0,55	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
1,13	23	12	7	2	24	4,69	71,21	DUCTO (BUITRON)	
0,5	23	12	1	2	24	4,69	4,92	CODO	
0,51	12	23	1	2	24	4,69	5,00	CODO	
0,68	12	23	1	2	24	4,69	6,42	DESVIO	
1	12	23	1	2	24	4,69	9,09	DUCTO	
0,58	12	23	1	2	24	4,69	5,59	DESVIO	
1,13	12	23	2	2	24	4,69	20,35	DUCTO	
1,13	12	23	10	2	24	4,69	101,73	DUCTO	
0,77	12	23	1	2	24	4,69	7,17	CODO	
0,85	12	23	1	2	24	4,69	7,84	DUCTO	
1,13	12	23	5	2	24	4,69	50,87	DUCTO	
0,52	12	20,5	1	2	24	4,69	4,72	REDUCCIÓN	
0,52	12	18	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
1,13	12	18	2	2	24	4,69	17,44	DUCTO	
0,52	11	15,5	1	2	24	4,69	3,85	REDUCCIÓN	
0,3	10	13	1	2	24	4,69	2,14	DUCTO	BAJA: BUITRON FRENTE CONTROL (RECEPCIÓN) A
1,13	10	13	2	2	24	4,69	13,37	DUCTO	UCI NEO - INTENSIVOS
0,4	10	11,5	1	2	24	4,69	2,51	REDUCCIÓN	
0,52	10	10	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0,52	9	7	1	2	24	4,69	2,33	REDUCCIÓN	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,13	14,5	5	1	2	24	4,69	1,02	ZAPATO (T)	
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO (R)	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,15	14,5	5	1	2	24	4,69	1,12	ZAPATO (T)	
0,39	12	5	1	2	24	4,69	1,94	ZAPATO (R)	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,13	14	7	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	
0,7	12	7	1	2	24	4,69	3,58	ZAPATO	
1,13	12	7	1	2	24	4,69	5,52	DUCTO	
0,52	12	6	1	2	24	4,69	2,62	REDUCCIÓN	UCI NEONATAL INTENSIVOS A INTERMEDIOS
0,21	12	5	1	2	24	4,69	1,22	DUCTO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO	
0,37	8	4	1	2	24	4,69	1,32	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	14,5	7	1	2	24	4,69	1,23	ZAPATO	
0,38	12	7	1	2	24	4,69	2,13	ZAPATO	
1,13	12	7	3	2	24	4,69	16,57	DUCTO	UCI NEONATAL - INTERMEDIOS
0,7	12	7	1	2	24	4,69	3,58	DUCTO	
0,15	10,5	1	1	2	24	4,69	0,66	ZAPATO	
0,38	8	1	1	2	24	4,69	1,01	ZAPATO	
0	8	1	1	2	24	4,69	0,16	TAPA	
0	12	7	1	2	24	4,69	0,50	TAPA	
0,15	14,5	5	1	2	24	4,69	1,12	ZAPATO	
0,38	12	5	1	2	24	4,69	1,90	ZAPATO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	UCI NEONATAL - INTENSIVOS
0,13	17	5	1	2	24	4,69	1,15	ZAPATO	
0,07	12	5	1	2	24	4,69	0,65	ZAPATO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,13	12	12	1	1	24	4,69	1,00	CUELLOS	
0,17	12	12	1	1	24	4,69	1,23	CUELLOS	
0,13	12	12	1	1	24	4,69	1,00	CUELLOS	
0,15	12	12	1	1	24	4,69	1,12	CUELLOS	
0,12	8	8	1	1	24	4,69	0,63	CUELLOS	UCI NEO - INTENSIVOS
0	8	8	1	1	24	4,69	0,29	CUELLOS	
0,52	8	5	1	2	24	4,69	1,89	CODO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (6)									
1,13	10	10	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO (AISLADO)	
0,52	11	10	1	2	24	4,69	3,05	REDUCCIÓN (AISLADO)	
1,13	12	10	7	2	24	4,69	44,76	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	3	2	24	4,69	19,18	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	4,82	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	38,37	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	3	2	24	4,69	19,18	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	DESCANSO QUIROFANOS
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1,13	22	12	7	2	24	4,69	69,18	DUCTO (BUITRON)	
0,5	22	12	3	2	24	4,69	14,34	CODO	
0,53	22	12	1	2	24	4,69	5,02	DUCTO	
0,62	22	12	1	2	24	4,69	5,75	DUCTO	
1,13	22	12	9	2	24	4,69	88,94	DUCTO	
1	22	12	1	2	24	4,69	8,83	DUCTO	
0,5	22	12	1	2	24	4,69	4,78	CODO	
0,4	22	12	1	2	24	4,69	3,97	DUCTO	
1,13	22	12	9	2	24	4,69	88,94	DUCTO	
0,5	22	12	1	2	24	4,69	4,78	CODO	
1,13	22	12	7	2	24	4,69	69,18	DUCTO	
0,52	14	10,5	1	2	24	4,69	3,56	REDUCCIÓN	
0,18	22,5	12	1	2	24	4,69	2,22	ZAPATO (T)	
0,05	20	12	1	2	24	4,69	1,07	ZAPATO (R)	
0,7	20	12	1	2	24	4,69	6,02	DUCTO	
1,13	20	12	1	2	24	4,69	9,30	DUCTO	
0,52	19	11	1	2	24	4,69	4,36	REDUCCIÓN	
0,52	18	10	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
1,13	18	10	1	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0	18	10	1	2	24	4,69	0,88	TAPA	
0,13	14,5	8	1	2	24	4,69	1,18	ZAPATO (T)	
0,07	12	8	1	2	24	4,69	0,76	ZAPATO (R)	
1,13	12	8	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0	12	8	1	2	24	4,69	0,54	TAPA	
0,12	14,5	5	1	2	24	4,69	0,98	ZAPATO (T)	
0,05	12	5	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO (R)	
1,13	12	5	3	2	24	4,69	14,82	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,15	14,5	5	1	2	24	4,69	1,12	ZAPATO (T)	UCI NEO - INTERMEDIOS
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO (R)	
0,52	12	5	1	2	24	4,69	2,47	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,15	14,5	8	1	2	24	4,69	1,29	ZAPATO (T)	
0,05	12	8	1	2	24	4,69	0,67	ZAPATO (R)	
1,13	12	8	2	2	24	4,69	11,63	DUCTO	
0,52	12	8	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0,13	10,5	5	1	2	24	4,69	0,81	ZAPATO (T)	
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO (R)	
1,13	12	5	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0,13	16,5	4	1	2	24	4,69	1,07	ZAPATO (T)	
0,07	14	4	1	2	24	4,69	0,69	ZAPATO (R)	
0,52	14	1	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
0	14	4	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0	12	8	1	2	24	4,69	0,54	TAPA	
0,13	14,5	5	1	2	24	4,69	1,02	ZAPATO (T)	
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO (R)	
0,52	12	5	1	2	24	4,69	2,47	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,13	14,5	5	1	2	24	4,69	1,02	ZAPATO (T)	
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO (R)	
1,13	12	5	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,125	14,5	5	1	2	24	4,69	1,00	ZAPATO (T)	
0,075	12	5	1	2	24	4,69	0,67	ZAPATO (R)	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,87	8	6	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO	
0,4	8	6	1	2	24	4,69	1,63	CODO	
1,13	8	6	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4,69	0,33	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO (R)	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	DESCANSO UCI NEO
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
1,25	10,5	4	1	2	24	4,69	4,63	ZAPATO (T)	
0,075	8	4	1	2	24	4,69	0,47	ZAPATO (R)	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO (T)	
















0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	ZAPATO (R)	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
1,13	6	4	2	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,98	22	12	1	2	24	4,69	8,67	DUCTO	FRENTE ESTACIÓN SATELITE UCI NEO
0,15	12	12	2	1	24	4,69	2,23	CUELLOS	UCI NEO - INTERMEDIOS
0,16	12	12	1	1	24	4,69	1,17	CUELLOS	
0,2	12	12	1	1	24	4,69	1,40	CUELLOS	
0,17	12	12	1	1	24	4,69	1,23	CUELLOS	
0,17	12	12	1	1	24	4,69	1,23	CUELLOS	
0,21	12	12	1	1	24	4,69	1,46	CUELLOS	
0,16	12	12	1	1	24	4,69	1,17	CUELLOS	
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93	CUELLOS	
0,18	8	8	1	1	24	4,69	0,86	CUELLOS	
			SISTEMA DE SUMINISTRO (7)						
1,13	22	12	7	2	24	4,69	69,18	DUCTO (BUITRON)	
0,5	22	12	2	2	24	4,69	9,56	CODO	
1,13	22	12	5	2	24	4,69	49,41	DUCTO	
0,52	19	12	1	2	24	4,69	4,51	REDUCCIÓN	
1,13	16	12	5	2	24	4,69	40,69	DUCTO	
0,73	16	12	1	2	24	4,69	5,47	DUCTO	
0,52	13	9	1	2	24	4,69	3,20	REDUCCIÓN	
0,5	10	6	1	2	24	4,69	2,25	CODO	
1,13	16	12	1	2	24	4,69	8,14	DUCTO	SALA ESPERA
1,13	10	6	3	2	24	4,69	13,95	DUCTO	VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
0,4	9	5,5	1	2	24	4,69	1,69	REDUCCIÓN	
0,9	8	5	1	2	24	4,69	3,07	DUCTO	
1,13	8	5	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	1,52	DUCTO	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	1,52	CODO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0,15	10,5	5	1	2	24	4,69	0,89	CODO	COORDINACIÓN UCI NEO
0,05	8	5	1	2	24	4,69	0,43	TAPA	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	CODO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0,15	14,5	10	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO (T)	DE SALA ESPERA A RECUPERACIÓN QUIRURGIA AMBULATORIA
0,38	12	10	1	2	24	4,69	2,46	ZAPATO (R)	
1,13	12	10	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO	
0,65	12	10	1	2	24	4,69	3,88	DUCTO	
0,4	12	8	1	2	24	4,69	2,33	REDUCCIÓN	
1,13	12	6	6	2	24	4,69	31,39	DUCTO	
0,5	12	6	1	2	24	4,69	2,53	CODO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,125	14,5	6	1	2	24	4,69	1,05	ZAPATO (T)	SALA ESPERA
0,075	12	6	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO (R)	
0,72	12	6	1	2	24	4,69	3,47	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,15	14,5	6	1	2	24	4,69	1,17	ZAPATO (T)	
0,35	12	6	1	2	24	4,69	1,89	ZAPATO (R)	
1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0,61	12	6	1	2	24	4,69	3,00	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,66	22	12	1	2	24	4,69	6,08	CODO	SALA ESPERA
0,13	8	8	1	1	24	4,69	0,67	CUELLO	VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
0,15	8	8	1	1	24	4,69	0,74	CUELLO	COORDINACIÓN UCI NEO
0,14	12	12	1	1	24	4,69	1,06	CUELLO	HALL
0,15	12	12	1	1	24	4,69	1,12	CUELLO	
0,16	12	12	1	1	24	4,69	1,17	CUELLO	
0,13	17	6	1	2	24	4,69	1,21	ZAPATO	
0,07	12	6	1	2	24	4,69	0,69	ZAPATO	
0,75	12	6	1	2	24	4,69	3,60	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,17	12	12	1	1	24	4,69	1,23	CUELLO	
			SISTEMA DE SUMINISTRO (6)						
1,13	22	12	7	2	24	4,69	69,18	DUCTO (BUITRON)	
0,5	22	12	2	2	24	4,69	9,56	CODO	
0,57	22	12	1	2	24	4,69	5,35	DUCTO	
1,13	22	12	3	2	24	4,69	29,65	DUCTO	
0,5	22	12	3	2	24	4,69	14,34	CODO	
1,13	22	12	6	2	24	4,69	59,30	DUCTO	
0,3	22	12	2	2	24	4,69	6,32	DUCTO	
1,13	22	12	3	2	24	4,69	29,65	DUCTO	
0,5	22	12	2	2	24	4,69	9,56	CODO	
0,8	22	12	1	2	24	4,69	7,21	DUCTO	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
0,53	21	12	1	2	24	4,69	4,87	REDUCCIÓN	
0,51	20	12	1	2	24	4,69	4,57	DUCTO	
1,13	20	12	3	2	24	4,69	27,90	DUCTO	
0,52	15	11	1	2	24	4,69	3,78	REDUCCIÓN	
1,13	10	8	4	2	24	4,69	20,93	DUCTO	
0,52	10	8	1	2	24	4,69	2,62	DUCTO	
0,15	11,5	5	1	2	24	4,69	0,94	ZAPATO	
0,05	9	5	1	2	24	4,69	0,47	ZAPATO	
0,2	9	5	1	2	24	4,69	0,97	DUCTO	
1,13	9	5	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,15	12	6	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO	
0,4	9	6	1	2	24	4,69	1,75	ZAPATO	
0,6	9	6	1	2	24	4,69	2,47	DUCTO	
0,4	9	6	1	2	24	4,69	1,75	CODO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
0,6	9	6	1	2	24	4,69	2,47	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
0,15	16,5	8	1	2	24	4,69	1,40	ZAPATO	
0,4	14	8	1	2	24	4,69	2,57	ZAPATO	
1,13	14	8	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO	
0,52	14	8	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO	
0	14	8	1	2	24	4,69	0,61	TAPA	
0,15	14,5	9	1	2	24	4,69	1,34	ZAPATO	
0,38	12	9	1	2	24	4,69	2,35	ZAPATO	
1,13	12	9	4	2	24	4,69	24,42	DUCTO	
0	12	9	1	2	24	4,69	0,59	TAPA	
0,15	11,5	5	1	2	24	4,69	0,94	ZAPATO	FRENTE A QUIRURGICOS 2 Y 1
0,37	9	5	1	2	24	4,69	1,53	ZAPATO	
0	9	5	3	2	24	4,69	0,97	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,17	17	5	1	2	24	4,69	1,35	ZAPATO	ESTERILIZACIÓN
0,385	12	5	1	2	24	4,69	1,92	ZAPATO	
0,52	12	5	1	2	24	4,69	2,47	AJUSTE	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	
0,13	17	5	1	2	24	4,69	1,15	ZAPATO	RECUPERACION DE CIRUGIA
0,07	12	5	1	2	24	4,69	0,65	ZAPATO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,6	12	5	1	2	24	4,69	2,79	DUCTO	
0	12	5	1	1	24	4,69	0,28	TAPA	
0,15	17	5	1	2	24	4,69	1,26	ZAPATO	
0,52	12	5	1	2	24	4,69	2,47	ZAPATO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0	12	5	1	1	24	4,69	0,28	TAPA	
			SISTEMA DE RETORNO (1)						
0,45	17	12	1	2	24	4,69	3,73	ducto	
0,111	12	17	1	2	24	4,69	1,39	desvio	
1,13	17	12	14	2	24	4,69	118,01	ducto	
0,58	17	12	3	2	24	4,69	13,89	codo	
0,35	17	12	1	2	24	4,69	3,04	ajuste	
0,52	15,5	12	1	2	24	4,69	4,00	reduccion	
1,13	14	12	1	2	24	4,69	7,56	ducto	
0,75	14	12	1	2	24	4,69	5,20	ajuste	
0,52	14	12	1	2	24	4,69	3,78	reduccion	
1,13	13	12	2	2	24	4,69	14,53	ducto	
0,52	13	11,5	1	2	24	4,69	3,56	reduccion	
0,74	13	11	1	2	24	4,69	4,75	ajuste	
0,5	13	11	1	2	24	4,69	3,37	codo	
1,13	13	11	4	2	24	4,69	27,90	ducto	
0,52	13	9,5	1	2	24	4,69	3,27	reduccion	
1,13	13	8	7	2	24	4,69	42,73	ducto	
0	13	8	1	2	24	4,69	0,58	tapa	
0,13	14	6	1	2	24	4,69	1,05	zapato	
0,07	11	6	2	2	24	4,69	1,30	zapto	
1,13	11	6	4	2	24	4,69	19,77	ducto	
0,4	9,5	6	1	2	24	4,69	1,81	reduccion	
0,4	8	6	1	2	24	4,69	1,63	codo	
1,13	8	6	3	2	24	4,69	12,21	ducto	
1,13	8	6	2	2	24	4,69	8,14	ducto	
0,4	8	3	1	2	24	4,69	1,28	reduccion	
1,13	8	4	10	2	24	4,69	34,88	ducto	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	1,40	codo	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	zapato	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	zapato	
1,13	8	4	7	2	24	4,69	24,42	ducto	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	ajuste	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	tapa	
0,15	10,5	6	1	2	24	4,69	0,94	zapato	
0,05	8	6	1	2	24	4,69	0,47	zapato	
1,13	8	6	4	2	24	4,69	16,28	ducto	
0,3	8	3	1	2	24	4,69	1,02	reduccion	
1,13	8	4	3	2	24	4,69	10,46	ducto	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	tapa	
0,46	13	12	1	2	24	4,69	3,28	DUCTO	RECUPERACIÓN PARTOS
0,5	13	12	2	2	24	4,69	7,03	DUCTO	
0,77	13	12	1	2	24	4,69	5,12	DUCTO	
0,33	17	12	1	2	24	4,69	2,90	DUCTO	PASILLO UCI NEO
0,35	17	12	2	2	24	4,69	6,08	DUCTO	
0,54	17	12	1	2	24	4,69	4,35	DUCTO	
0,13	8,5	6	1	2	24	4,69	0,76	ZAPATO	TRABAJO SUCIO RECUPERACIÓN PARTO A WC RECUPERACIÓN PARTO
0,07	6	66	1	2	24	4,69	2,74	ZAPATO	
1,13	6	6	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,3	6	5	1	2	24	4,69	1,02	REDUCCIÓN	
1,09	6	4	1	2	24	4,69	2,81	DUCTO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
1,28	16	12	1	2	24	4,69	9,14	DUCTO (DESVIO)	PASILLO FUERA TRABAJO DE PARTO
1,06	6	8	1	2	24	4,69	3,84	DESVIO	ESTERILIZACIÓN
1,13	6	8	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
1,06	6	8	1	2	24	4,69	3,84	DESVIO	
0,37	12	5	1	2	24	4,69	1,66	DUCTO	
0,13	17	5	1	2	24	4,69	1,15	ZAPATO	
0,52	12	5	1	2	24	4,69	2,47	ZAPATO	
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,13	15	6	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	VESTIER - ESTERILIZACIÓN
0,28	10	6	1	2	24	4,69	1,41	ZAPATO	
0,44	6	10	2	2	24	4,69	4,04	CODO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	REDUCCIÓN	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	1,52	REDUCCIÓN	








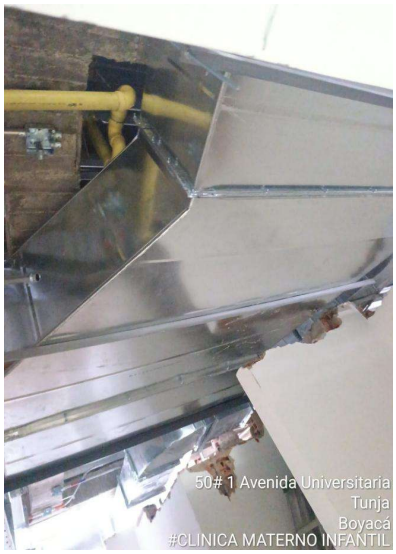




1,13	8	5	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,41	8	5	1	2	24	4,69	1,55	CODO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,15	13	4	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	VESTIER MUJERES
0,25	8	4	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	13	4	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	ASEO
0,37	8	4	1	2	24	4,69	1,32	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	PREPARACIÓN PARTOS
0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	ZAPATO	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	ZAPATO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	WC TRABAJO PARTOS
0,37	6	4	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,35	6	10	2	2	24	4,69	3,35	CODO	AUTOCLAVE
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	REDUCCION	
1,07	6	8	1	2	24	4,69	3,87	DUCTO	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,15	6	4	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0	6	4	1	1	24	4,69	0,14	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,27	6	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,3	6	4	1	2	24	4,69	0,93	DUCTO	
1,13	6	4	3	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0	6	4	1	1	24	4,69	0,14	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,15	6	4	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO	
1,13	6	4	3	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0,36	6	4	1	2	24	4,69	1,07	CODO	
1,13	6	4	5	2	24	4,69	14,53	DUCTO	
0	6	4	1	1	24	4,69	0,14	TAPA	RECUPERACION DE CIRUGIA
0,15	15	4	1	2	24	4,69	1,09	ZAPATO	
0,37	10	4	1	2	24	4,69	1,53	ZAPATO	
0	10	4	1	1	24	4,69	0,21	TAPA	
0,15	14	6	1	2	24	4,69	1,14	ZAPATO	TRABAJO LIMPIO RECUPERACION DE CIRUGIA
0,05	9	6	1	2	24	4,69	0,50	ZAPATO	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	TRABAJO SUCIO RECUPERACION DE CIRUGIA
0	9	6	1	1	24	4,69	0,25	TAPA	
0,8	28	12	2	2	24	4,69	16,96	CODO	TERRAZA 5
1,13	28	12	1	2	24	4,69	11,63	DUCTO	
0,8	28	12	1	2	24	4,69	8,48	TRANSFORMACION	
SISTEMA DE RETORNO UMA (1)									
1,13	12	10	13	2	24	4,69	83,13	DUCTO (AISLADO)	FRENTE A QUIROFANOS 1 - 2 - 3
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	4,82	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	38,37	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO
0,52	12	10	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	2	2	24	4,69	5,56	CODO (AISLADO)	
0,32	12	10	1	2	24	4,69	2,15	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	3	2	24	4,69	19,18	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO (2)									
0,45	10	15	1	2	24	4,69	3,22	codo	
1,13	15	10	2	2	24	4,69	14,53	ducto	
0,4	10,5	8	1	2	24	4,69	2,16	reduccion	
11,3	6	6	2	2	24	4,69	65,13	ducto	
0,52	6	6	1	2	24	4,69	1,74	ducto	
0,3	6	6	1	2	24	4,69	1,12	reduccion	
0,36	6	6	1	2	24	4,69	1,29	ducto	
1,13	6	6	1	2	24	4,69	3,49	ducto	
0,67	6	6	1	2	24	4,69	2,17	ducto	
0,4	6	5	1	2	24	4,69	1,28	codo	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	ducto	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	ajuste	
0,52	10	9	1	2	24	4,69	2,76	reduccion	
1,3	12	8	7	2	24	4,69	46,36	ducto	
1,13	12	8	3	2	24	4,69	17,44	tapa	
0,61	12	8	3	2	24	4,69	10,01	reduccion	
0,52	12	8	1	2	24	4,69	2,91	ducto	
0,44	12	8	1	2	24	4,69	2,53	ducto	
0,5	11	8	1	2	24	4,69	2,67	ajuste	
0,83	10	8	1	2	24	4,69	3,95	ajuste	
0,44	10	8	1	2	24	4,69	2,27	codo	
1,13	10	8	2	2	24	4,69	10,46	reduccion	
0,37	10	7	1	2	24	4,69	1,86	reduccion	
1	10	6	1	2	24	4,69	4,16	ducto	
0,4	8	6	1	2	24	4,69	1,63	reduccion	
0,52	6	6	1	2	24	4,69	1,74	ducto	
0,4	6	6	1	2	24	4,69	1,40	codo	
1,13	6	6	1	2	24	4,69	3,49	ducto	
0	6	6	1	2	24	4,69	0,28	tapa	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	zapato	
0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	zapato	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	ducto	
0,38	6	4	1	2	24	4,69	1,12	codo	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO	UCI NEONATAL - TRABAJO LIMPIO Y SUCIO
0,05	6	4	1	2	24	4,69	0,33	ZAPATO	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,13	12,5	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	
0,26	10	4	1	2	24	4,69	1,17	ZAPATO	
0,93	10	4	1	2	24	4,69	3,40	DUCTO	
1,13	10	4	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
0,42	10	4	1	2	24	4,69	1,70	DUCTO	CUARTO EQUIPOS
0,52	10	4	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0,36	10	4	1	2	24	4,69	1,50	DUCTO	
1,13	10	4	3	2	24	4,69	12,21	DUCTO	DE ROPA SUCIA A TRABAJO SUCIO
0,52	10	4	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0,6	10	4	1	2	24	4,69	2,30	DESVIO	
0,52	10	4	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0,52	9	4	1	2	24	4,69	1,89	REDUCCIÓN	TRABAJO SUCIO
1,13	8	4	2	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0,68	12	10	1	2	24	4,69	4,04	DESVIO	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO	FRENTE ASCENSOR
0,45	12	10	1	2	24	4,69	2,83	CODO	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	0,71	ZAPATO	ASEO
0,38	6	4	1	2	24	4,69	1,12	ZAPATO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,58	17	12	1	2	24	4,69	4,63	CODO	VESTIER PACIENTES
0,73	17	12	1	2	24	4,69	5,67	DUCTO	
1,13	17	12	1	2	24	4,69	8,43	DUCTO	
0,6	10	4	1	2	24	4,69	2,30	DESVIO	
0,52	8	6	1	2	24	4,69	2,03	DESVIO	
0,96	12	8	1	2	24	4,69	5,00	DUCTO	UCI NEO INTENSIVOS
0,15	11	6	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	UCI UARO CENTRAL ENFERMERIA
0,05	6	6	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO	
0,52	6	6	1	2	24	4,69	1,74	REDUCCIÓN	
1,13	6	6	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0,3	6	4	1	2	24	4,69	0,93	DUCTO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	DUCTO	
0,12	11	4	1	2	24	4,69	0,75	ZAPATO	
0,37	6	4	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,13	11	4	1	2	24	4,69	0,79	ZAPATO	
0,37	6	4	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	EQUIPOS
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	TRABAJO SUCIO
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	LACTARIO
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	13	4	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	WC UCI UARO
0,37	8	4	1	2	24	4,69	1,32	ZAPATO	
0,3	7	4	1	2	24	4,69	1,02	REDUCCIÓN	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0,5	6	4	1	2	24	4,69	1,41	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	ROPA SUCIA
0,37	6	4	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	TRABAJO LIMPIO
0,37	6	4	1	2	24	4,69	1,10	ZAPATO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	AJUSTE	
0	6	4	2	2	24	4,69	0,44	TAPA	
SISTEMA DE EXTRACCION - REGILLAS SOBREPUESTAS									
0,52	60	20	1	2	18	10,10	25,04	DUCTO	VESTIER PACIENTES
1,13	60	20	1	2	18	10,10	50,08	DUCTO	
1,25	60	20	1	2	18	10,10	55,00	DESVIO	
1,13	33	33	6	2	18	10,10	247,88	DUCTO	DE 2DO A TERRAZA
0,52	33	33	1	2	18	10,10	20,66	DUCTO	
0	33	33	1	2	18	10,10	4,04	TAPA	
1,13	48	20	6	2	18	10,10	255,39	DUCTO	POR BUITRON A TERRAZA
0,52	48	20	1	2	18	10,10	21,28	AJUSTE	
1,13	28	12	7	2	18	10,10	175,27	DUCTO	
0,515	28	12	2	2	18	10,10	24,63	CODO	
0,7	60	20	1	2	18	10,10	32,43	SEMICODO	SALE: BUITRON DETRÁS DE C. ASEO DE RECUPERACIÓN PARTO A BUITRON FRENTE CONTROL
0,7	60	20	1	2	18	10,10	32,43	SEMICODO	
0,85	46,5	20	1	2	18	10,10	32,07	REDUCCIÓN	
SISTEMA DE RETORNO UMA (2)									
1,13	12	10	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 1 (INTERNO)
1,13	10	12	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO AISLADO	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	4,82	CODO AISLADO	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	38,37	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO UMA (3)									
1,13	12	10	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 1 (INTERNO)
1,13	12	10	8	2	24	4,69	51,16	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2 A SALA PARTO 1
0	12	10	1	2	24	4,69	0,64	TAPA (AISLADO)	
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	2	24	4,69	4,82	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	2	24	4,69	38,37	DUCTO (AISLADO)	
0,75	12	10	1	2	24	4,69	4,40	DUCTO (AISLADO)	

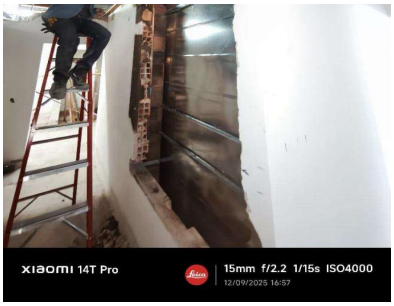



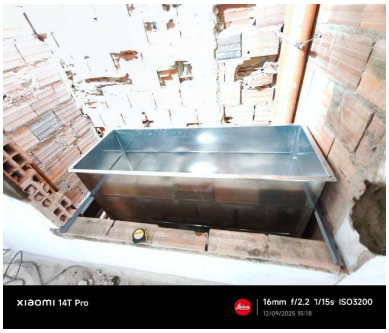






0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	DESCANSO QUIROFANOS
0,4	12	10	1	2	24	4,69	2,57	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	
0,35	12	10	1	2	24	4,69	2,31	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	2	2	24	4,69	12,79	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 2
0,8	12	10	1	2	24	4,69	4,66	DUCTO (AISLADO)	
			SISTEMA DE RETORNO UMA (4)						
1,13	12	10	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2
0	12	10	1	2	24	4,69	0,64	TAPA (AISLADO)	
0,37	12	10	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	EQUIPOS (QUIRURGICO): SALE FACHADA NORTE
0,52	12	10	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	7	2	24	4,69	44,76	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	4	2	24	4,69	25,58	DUCTO (AISLADO)	SALA DE PARTO 2
			SISTEMA DE RETORNO UMA (5)						
1,13	10	12	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO (AISLADO)	EQUIPO (QUIRURGICO)
0,37	10	12	1	2	24	4,69	2,41	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	7	2	24	4,69	44,76	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	2	24	4,69	2,78	CODO (AISLADO)	
0,87	12	10	1	2	24	4,69	5,03	DUCTO (AISLADO)	
			UNIÓN SISTEMA DE RETORNO (1 y 2) QUE VIENEN DE 1ER PISO						
0,52	27,5	11	1	2	24	4,69	5,60	REDUCCIÓN	VESTIER HOMBRES
1,13	27	10	6	2	24	4,69	64,53	DUCTO	
0,78	27	10	1	2	24	4,69	7,67	AJUSTE	
0,785	27	10	1	2	24	4,69	7,71	CODO	
1,13	27	10	3	2	24	4,69	32,26	DUCTO	ESTERILIZACIÓN
0,8	27	10	1	2	24	4,69	7,85	DUCTO	
0,78	27	10	1	2	24	4,69	7,67	CODO	
1,13	27	10	1	2	24	4,69	10,75	DUCTO	
1,14	27	10	1	2	24	4,69	10,84	DESVIO	
0,47	27	10	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,78	27	10	1	2	24	4,69	7,67	CODO	
1,13	27	10	1	2	24	4,69	10,75	DUCTO	
0,15	15	19	1	2	24	4,69	1,94	ZAPATO	POR WITRON DE PISO 1 A PISO 2 Y A TERRAZA
0,37	10	19	1	2	24	4,69	3,18	ZAPATO	
0,52	16	10	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,44	10	16	2	2	24	4,69	5,57	CODO	
0,2	21	10	1	2	24	4,69	2,14	ZAPATO	
0	27	10	1	1	24	4,69	1,02	TAPA	
1,13	27	10	3	2	24	4,69	32,26	DUCTO	
0,35	27	10	1	2	24	4,69	3,88	DUCTO	
1	27	10	1	2	24	4,69	9,61	DUCTO	
0,44	10	27	1	2	24	4,69	4,67	CODO	
0,27	28	12	2	2	24	4,69	5,86	DUCTO	SOBRE TERRAZA DE PISO 5 A PISO 6
0,82	28	12	1	2	24	4,69	8,67	CODO	
1,13	28	12	4	2	24	4,69	46,51	DUCTO	
1,5	28	12	1	2	24	4,69	15,15	DESVIO	
			CUELLOS						
0,29	8	6	1	1	24	4,69	1,12	CUELLO	CUELLOS DEL 01 AL 105 SOBRE TODA EL AREA DE PISO 2
0,41	8	6	1	1	24	4,69	1,52	CUELLO	
0,28	9	9	1	1	24	4,69	1,39	CUELLO	
0,19	8	8	1	1	24	4,69	0,90	CUELLO	
0,27	6	6	1	1	24	4,69	0,90	CUELLO	
0,27	6	6	1	1	24	4,69	0,90	CUELLO	
0,35	8	6	1	1	24	4,69	1,32	CUELLO	
0,2	9	9	1	1	24	4,69	1,05	CUELLO	
0,31	8	6	1	1	24	4,69	1,18	CUELLO	
0,43	8	6	1	1	24	4,69	1,58	CUELLO	
0,42	8	6	1	1	24	4,69	1,55	CUELLO	
0,42	8	6	1	1	24	4,69	1,55	CUELLO	
0,43	8	6	1	1	24	4,69	1,58	CUELLO	
0,43	8	6	1	1	24	4,69	1,58	CUELLO	
0,19	9	9	1	1	24	4,69	1,01	CUELLO	
0,25	8	8	1	1	24	4,69	1,12	CUELLO	
0,27	9	9	1	1	24	4,69	1,35	CUELLO	
0,26	9	9	1	1	24	4,69	1,31	CUELLO	
0,21	8	6	1	1	24	4,69	0,85	CUELLO	
0,27	9	9	1	1	24	4,69	1,35	CUELLO	
0,27	9	9	1	1	24	4,69	1,35	CUELLO	
0,31	9	9	1	1	24	4,69	1,52	CUELLO	
0,31	9	9	1	1	24	4,69	1,52	CUELLO	
0,33	9	9	1	1	24	4,69	1,61	CUELLO	
0,33	9	9	1	1	24	4,69	1,61	CUELLO	
0,28	6	6	1	1	24	4,69	0,93	CUELLO	
0,39	6	6	1	1	24	4,69	1,24	CUELLO	
0,18	8	8	1	1	24	4,69	0,86	CUELLO	
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93	CUELLO	
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93	CUELLO	
0,31	8	6	1	1	24	4,69	1,18	CUELLO	
0,385	8	6	1	1	24	4,69	1,43	CUELLO	
0,3	8	6	1	1	24	4,69	1,15	CUELLO	
0,28	8	6	1	1	24	4,69	1,08	CUELLO	
0,29	8	6	1	1	24	4,69	1,12	CUELLO	
0,34	6	6	1	1	24	4,69	1,10	CUELLO	
0,13	8	8	1	1	24	4,69	0,67	CUELLO	
0,19	8	8	1	1	24	4,69	0,90	CUELLO	
0,09	8	6	1	1	24	4,69	0,45	CUELLO	
0,09	8	6	1	1	24	4,69	0,45	CUELLO	
0,2	8	8	1	1	24	4,69	0,93	CUELLO	
0,35	8	6	1	1	24	4,69	1,32	CUELLO	
0,35	8	6	1	1	24	4,69	1,32	CUELLO	
0,4	8	6	1	1	24	4,69	1,48	CUELLO	
0,39	8	6	1	1	24	4,69	1,45	CUELLO	
0,41	8	6	1	1	24	4,69	1,52	CUELLO	
0,24	8	6	1	1	24	4,69	0,95	CUELLO	
0,22	8	6	1	1	24	4,69	0,88	CUELLO	
0,22	8	6	1	1	24	4,69	0,88	CUELLO	
0,21	8	6	1	1	24	4,69	0,85	CUELLO	
0,23	8	6	1	1	24	4,69	0,92	CUELLO	
0,14	12	12	1	1	24	4,69	1,06	CUELLO	
0,28	12	12	1	1	24	4,69	1,86	CUELLO	
0,28	12	12	1	1	24	4,69	1,86	CUELLO	
0,3	8	6	1	1	24	4,69	1,15	CUELLO	
0,23	8	6	1	1	24	4,69	0,92	CUELLO	
0,25	8	6	1	1	24	4,69	0,98	CUELLO	
0,24	9	9	1	1	24	4,69	1,22	CUELLO	
0,34	8	6	1	1	24	4,69	1,28	CUELLO	
0,34	8	6	1	1	24	4,69	1,28	CUELLO	
0,2	12	12	1	1	24	4,69	1,40	CUELLO	
0,17	12	12	1	1	24	4,69	1,23	CUELLO	
0,24	9	9	1	1	24	4,69	1,22	CUELLO	
0,16	9	9	1	1	24	4,69	0,88	CUELLO	
0,12	9	9	1	1	24	4,69	0,71	CUELLO	
0,1	9	9	1	1	24	4,69	0,62	CUELLO	
0,21	9	9	1	1	24	4,69	1,09	CUELLO	
0,21	9	9	1	1	24	4,69	1,09	CUELLO	
0,23	12	12	1	1	24	4,69	1,57	CUELLO	
0,285	12	12	1	1	24	4,69	1,89	CUELLO	
0,34	12	12	1	1	24	4,69	2,20	CUELLO	
0,33	9	9	1	1	24	4,69	1,61	CUELLO	
0,27	8	6	1	1	24	4,69	1,05	CUELLO	
0,16	8	6	1	1	24	4,69	0,68	CUELLO	
0,12	8	6	1	1	24	4,69	0,55	CUELLO	
0,35	8	6	1	1	24	4,69	1,32	CUELLO	
0,36	8	6	1	1	24	4,69	1,35	CUELLO	
0,2	12	12	1	1	24	4,69	1,40	CUELLO	
0,27	12	12	1	1	24	4,69	1,80	CUELLO	
0,21	12	12	1	1	24	4,69	1,46	CUELLO	
0,21	8	8	1	1	24	4,69	0,97	CUELLO	
0,18	8	8	1	1	24	4,69	0,86	CUELLO	
			PISO 3						
			SISTEMA DE SUMINISTRO (1)						
0,5	18	14	1	2	24	4,69	4,50	CODO	
1,13	18	14	7	2	24	4,69	65,11	DUCTO	
0,5	18	14	1	2	24	4,69	4,50	CODO	
0,4	16	13	1	2	24	4,69	3,39	REDUCCIÓN	
0,52	14	12	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,2	14	12	1	2	24	4,69	1,80	DUCTO	
1,13	14	12	2	2	24	4,69	15,11	DUCTO	
0,52	14	11	1	2	24	4,69	3,63	REDUCCIÓN	
1,13	14	10	3	2	24	4,69	20,93	DUCTO	
0,52	13	10	1	2	24	4,69	3,34	REDUCCIÓN	
1,13	12	10	3	2	24	4,69	19,18	DUCTO	
0,52	10,5	7,5	1	2	24	4,69	2,62	REDUCCIÓN	
1,13	9	5	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0,52	9	5	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0,42	9	5	1	2	24	4,69	1,70	CODO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,15	14,5	6	1	2	24	4,69	1,17	ZAPATO	
0,05	12	6	1	2	24	4,69	0,60	ZAPATO	
0,8	12	6	1	2	24	4,69	3,82	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
0,15	11,5	5	5	2	24	4,69	4,72	ZAPATO	
0,05	9	5	5	2	24	4,69	2,33	ZAPATO	
1,13	9	5	10	2	24	4,69	40,69	DUCTO	
0	9	5	6	2	24	4,69	1,95	TAPA	
0,12	14,5	6	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO (T)	CAMAS UCI PEDIATRICA
0,08	12	6	1	2	24	4,69	0,73	ZAPATO (R)	
0,72	12	6	1	2	24	4,69	3,47	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4,69	0,45	TAPA	
1,13	18	14	1	2	24	4,69	9,30	DUCTO	SUBE: PRINCIPAL CAMA 1 UCI PEDIATRICA
0,52	9	5	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	UCI P - 10
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,07	9	5	1	2	24	4,69	0,53	ZAPATO	
0,13	14	5	1	2	24	4,69	1,00	ZAPATO	
0,13	9	9	1	1	24	4,69	0,75	CUELLO	
			SISTEMA DE SUMINISTRO (2)						
1,13	16	14	1	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0,52	16	13	1	2	24	4,69	4,21	REDUCCIÓN	
1,13	16	12	2	2	24	4,69	16,28	DUCTO	
0,2	16	12	1	2	24	4,69	1,93	DUCTO	
0,52	15	12	1	2	24	4,69	3,92	REDUCCIÓN	
1,13	14	12	2	2	24	4,69	15,11	DUCTO	
0,7	14	12	1	2	24	4,69	4,89	DUCTO	
0,52	14	11	1	2	24	4,69	3,63	REDUCCIÓN	
1,13	14	10	1	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	3,20	REDUCCIÓN	
1,13	10	10	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO	
0,5	10	9	1	2	24	4,69	2,67	REDUCCIÓN	



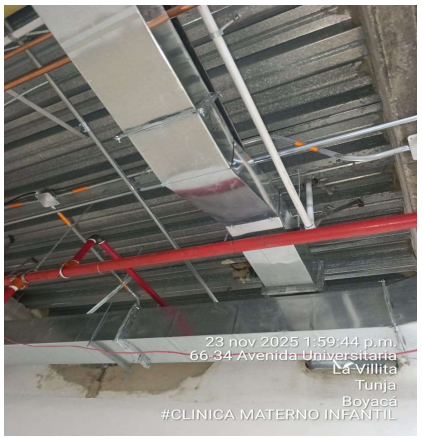








1,13	10	8	2	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
0,73	10	8	1	2	24	4,69	3,52	DUCTO	
0,52	9,5	6,5	1	2	24	4,69	2,33	REDUCCIÓN	
1,13	9	5	2	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0,7	9	5	1	2	24	4,69	2,64	DUCTO	
0,52	16	14	1	2	24	4,69	4,36	CODO	
0,35	16	14	1	2	24	4,69	3,14	DUCTO	SUBE: PRINCIPAL EN CAMA 1 DE UCI PEDIATRICA
0,58	14	14	1	2	24	4,69	4,47	DUCTO	
0,15	11	5	5	2	24	4,69	4,57	ZAPATO (T)	
0,05	9	5	5	2	24	4,69	2,33	ZAPATO (R)	
0	9	5	5	2	24	4,69	1,62	TAPA	
0,72	9	5	1	2	24	4,69	2,70	DUCTO	
0,73	9	5	1	2	24	4,69	2,74	DUCTO	
0,76	9	5	1	2	24	4,69	2,84	DUCTO	
0,82	9	5	1	2	24	4,69	3,04	DUCTO	
0,8	9	5	1	2	24	4,69	2,97	DUCTO	
0,42	9	5	1	2	24	4,69	1,70	CODO	CAMAS UCI PEDIATRICA
0,87	9	5	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
0,52	9	5	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0,15	9	5	1	2	24	4,69	0,80	ZAPATO (T)	
0,05	9	5	1	2	24	4,69	0,47	ZAPATO (R)	
1,13	9	5	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
0,87	9	5	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (3)							
1,13	12	10	3	2	24	4,69	19,18	DUCTO	
0,52	12	8	1	2	24	4,69	2,91	REDUCCIÓN	
1,13	12	6	5	2	24	4,69	26,16	DUCTO	
0,46	10	5,5	1	2	24	4,69	2,03	REDUCCIÓN	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	DESCANSO Y VESTIER FRENTE A INFOR. FAMILIARES UCI-P
0,62	8	5	1	2	24	4,69	2,20	DUCTO	
0,39	8	5	1	2	24	4,69	1,49	CODO	
0,52	5	8	1	2	24	4,69	1,89	DESVIO	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (4)							
0,5	19	14	1	2	24	4,69	4,64	CODO	
1,13	19	14	2	2	24	4,69	19,18	DUCTO	
0,52	18	14	1	2	24	4,69	4,65	REDUCCIÓN	
1,13	17	14	4	2	24	4,69	36,04	DUCTO	
0,52	16,5	12	1	2	24	4,69	4,14	REDUCCIÓN	
1,13	14	10	4	2	24	4,69	27,90	DUCTO	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	3,20	REDUCCIÓN	
1,13	10	10	4	2	24	4,69	23,25	DUCTO	
0	10	10	1	2	24	4,69	0,55	TAPA	
1,13	19	14	2	2	24	4,69	19,18	DUCTO	SUBE - LUDOTECA
0,15	14,5	5	4	2	24	4,69	4,46	ZAPATO	
0,05	12,5	5	4	2	24	4,69	2,33	ZAPATO	
0,52	12,5	5	2	2	24	4,69	5,09	DUCTO	
1,13	12	5	6	2	24	4,69	29,65	DUCTO	
0	12	5	6	2	24	4,69	2,41	TAPA	LUDOTECA
0,15	11	6	1	2	24	4,69	0,97	ZAPATO	
0,05	9	6	1	2	24	4,69	0,50	ZAPATO	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
		SISTEMA DE SUMINISTRO (5)							
1,13	16	12	3	2	24	4,69	24,42	DUCTO	
0,52	14	11,5	1	2	24	4,69	3,71	REDUCCIÓN	
0,38	12	9	1	2	24	4,69	2,35	DUCTO	
1,13	12	9	3	2	24	4,69	18,31	DUCTO	
0,52	12	7,5	1	2	24	4,69	2,83	REDUCCIÓN	
1,13	12	6	5	2	24	4,69	26,16	DUCTO	
0,17	14,5	9	1	2	24	4,69	1,46	ZAPATO (T)	
0,38	12	9	1	2	24	4,69	2,35	ZAPATO (R)	
1,13	12	9	2	2	24	4,69	12,21	DUCTO	
0,73	12	9	1	2	24	4,69	4,10	DUCTO	ENTRA: EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA
0,4	12	8	1	2	24	4,69	2,33	REDUCCIÓN	
0,42	12	7	1	2	24	4,69	2,31	CODO	
1,13	12	7	1	2	24	4,69	5,52	DUCTO	
0	12	7	1	2	24	4,69	0,50	TAPA	
0,14	11	6	1	2	24	4,69	0,93	ZAPATO (T)	
0,07	9	6	1	2	24	4,69	0,57	ZAPATO (R)	
1,13	9	6	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	ENTRA: PREPARACIÓN DE FORMULAS
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0,5	12	6	1	2	24	4,69	2,53	CODO	
0,55	12	6	1	2	24	4,69	2,74	DUCTO	ENTRA: DESCANSO ENFERMERIA
1	12	6	1	2	24	4,69	4,67	DESVIO	
0,4	10,5	6	1	2	24	4,69	1,93	REDUCCIÓN	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	
0	9	6	2	2	24	4,69	0,72	TAPA	
0,15	14,5	6	1	2	24	4,69	1,17	ZAPATO (T)	
0,05	12	6	1	2	24	4,69	0,60	ZAPATO (R)	
0,52	12	6	1	2	24	4,69	2,62	DUCTO	
1,13	12	6	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	ENTRA: INFORMACIÓN FAMILIARES
0,12	10,5	5	1	2	24	4,69	0,78	ZAPATO (T)	
0,08	8	5	1	2	24	4,69	0,53	ZAPATO (R)	
0,74	8	5	1	2	24	4,69	2,57	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	0,30	TAPA	
0,34	10,5	6	1	2	24	4,69	1,69	REDUCCIÓN	
1,13	9	6	2	2	24	4,69	8,72	DUCTO	ENTRA: COORDINACIÓN PEDIATRIA
0,42	9	6	1	2	24	4,69	1,82	CODO	
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	
1,13	16	12	1	2	24	4,69	8,14	DUCTO	PASILLO FRENTE A COORD. UCI-P
		SISTEMA DE SUMINISTRO (6)							
1,13	12	8	2	2	24	4,69	11,63	DUCTO	
0,5	12	8	1	2	24	4,69	2,81	CODO	
0,52	11	8	1	2	24	4,69	2,76	REDUCCIÓN	
1,13	10	8	4	2	24	4,69	20,93	DUCTO	
0,52	9	6,5	1	2	24	4,69	2,25	REDUCCIÓN	PASILLO TÉCNICO - UCI PEDIATRICA
1,13	8	5	3	2	24	4,69	11,34	DUCTO	
0,3	4,5	7	1	2	24	4,69	1,07	REDUCCIÓN	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO (R)	TRASNFER MÉDICAMENTOS
1,13	8	4	2	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
		SISTEMA DE RETORNO (1)							
1,13	10	8	10	2	24	4,69	52,32	DUCTO	
0,4	10	8	1	2	24	4,69	2,10	CODO	
0,75	10	8	1	2	24	4,69	3,60	DUCTO	
0,52	10	6,5	1	2	24	4,69	2,40	REDUCCIÓN	
0,52	11	9	1	2	24	4,69	2,91	REDUCCIÓN	
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DESVIO	ACCESO - LUDOTECA
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO	
0,76	12	10	1	2	24	4,69	4,46	DUCTO	
1,13	10	8	2	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO (T)	
0,08	8	4	1	2	24	4,69	0,49	ZAPATO (R)	ENTRA A DEPOSITO DE INSUMOS
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,45	10	6	1	2	24	4,69	2,06	REDUCCIÓN	
0,52	10	4	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	
0,7	10	4	1	2	24	4,69	2,64	DUCTO	
1,13	10	4	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
1,08	10	4	1	2	24	4,69	3,90	DUCTO	
0	10	4	1	2	24	4,69	0,31	TAPA	
0,12	10,5	4	1	2	24	4,69	0,73	ZAPATO (T)	ZONA DE BAÑOS LUDOTEA
0,27	8	4	1	2	24	4,69	1,03	ZAPATO (R)	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO (R)	
0,82	8	4	1	2	24	4,69	2,60	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO (R)	BODEGA - LUDOTECA
1,13	8	4	2	2	24	4,69	6,98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	0,83	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	1	2	24	4,69	0,40	ZAPATO (R)	
1,13	8	4	3	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
0,42	8	4	1	2	24	4,69	1,46	CODO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	6,98	DUCTO	SALE: BAÑO LUDOTECA A BAÑOS DESCANSO MÉDICO
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,15	10,5	4	2	2	24	4,69	1,66	ZAPATO (T)	
0,05	8	4	2	2	24	4,69	0,80	ZAPATO (R)	
0,48	8	4	2	2	24	4,69	3,26	DUCTO	
0	8	4	2	2	24	4,69	0,53	TAPA	
0,41	10	8	1	2	24	4,69	2,14	CODO	
1,13	10	8	1	2	24	4,69	5,23	DUCTO	
0,36	9	8	1	2	24	4,69	1,82	REDUCCIÓN	
1,13	8	8	3	2	24	4,69	13,95	DUCTO	
0,4	8	8	1	2	24	4,69	1,87	CODO	
0,4	8	8	1	2	24	4,69	1,87	DUCTO	
1,23	8	8	1	2	24	4,69	5,03	DUCTO	
0,4	8	8	1	2	24	4,69	1,87	CODO	
0,5	8	8	1	2	24	4,69	2,25	DUCTO	
0,72	8	8	1	2	24	4,69	3,09	DUCTO	
0,4	8	8	1	2	24	4,69	1,87	CODO	
1,13	8	8	3	2	24	4,69	13,95	DUCTO	
0,75	8	8	1	2	24	4,69	3,20	DUCTO	DE LUDOTECA A ZONA ADMINISTRATIVA UCI PEDIATRICA
0,7	8	8	1	2	24	4,69	3,01	DUCTO	
0,73	8	8	1	2	24	4,69	3,13	DUCTO	
0,15	9	4	1	2	24	4,69	0,74	ZAPATO	
0,18	6	4	1	2	24	4,69	0,64	ZAPATO	
0,35	6	4	1	2	24	4,69	1,05	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	
1,13	8	8	1	2	24	4,69	4,65	DUCTO	
0,52	8	7,5	1	2	24	4,69	2,25	REDUCCIÓN	
0,52	8	5,5	1	2	24	4,69	1,96	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	3	2	24	4,69	10,46	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	CODO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	
0,13	26	12	1	2	24	4,69	1,99	ZAPATO	
0,18	21	12	1	2	24	4,69	2,12	ZAPATO	
0,48	21	12	1	2	24	4,69	4,48	DUCTO	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0,13	18	10	1	2	24	4,69	1,47	ZAPATO	
0,27	13	10	1	2	24	4,69	1,97	ZAPATO	
0,52	13	10	1	2	24	4,69	3,34	AJUSTE	



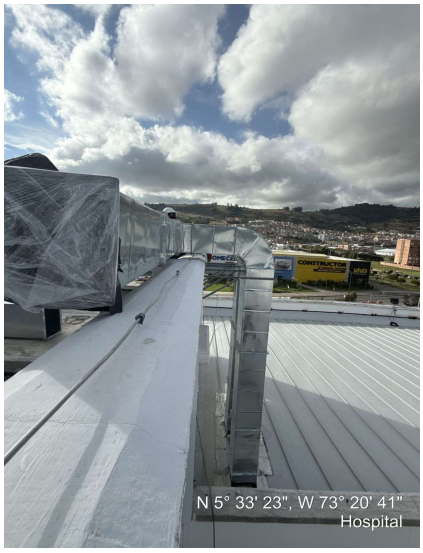





SISTEMA DE RETORNO (2)									
1,13	21	12	8	2	24	4,69	**76,74**	DUCTO	
1,13	14	11	4	2	24	4,69	**29,07**	DUCTO	
0,52	13,5	10,5	1	2	24	4,69	**3,49**	REDUCCIÓN	
1,13	13	10	5	2	24	4,69	**33,43**	DUCTO	
0,7	13	10	1	2	24	4,69	**4,33**	DUCTO	
0,52	12,5	10	1	2	24	4,69	**3,27**	REDUCCIÓN	
1,13	12	10	5	2	24	4,69	**31,97**	DUCTO	
0,7	12	10	1	2	24	4,69	**4,14**	DUCTO	
0,52	11	9	1	2	24	4,69	**2,91**	REDUCCIÓN	
1,13	10	8	5	2	24	4,69	**26,16**	DUCTO	
0,7	10	8	1	2	24	4,69	**3,39**	DUCTO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	4	2	24	4,69	**13,95**	DUCTO	
0,61	12	8	1	2	24	4,69	**3,34**	DUCTO	
0,52	10,5	8	1	2	24	4,69	**2,69**	REDUCCIÓN	
1,13	9	8	5	2	24	4,69	**24,71**	DUCTO	
0,5	9	8	1	2	24	4,69	**2,39**	DUCTO	
0,52	8,5	6	1	2	24	4,69	**2,11**	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	5	2	24	4,69	**17,44**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
1,13	21	12	1	2	24	4,69	**9,59**	DUCTO	
0	21	12	1	2	24	4,69	**1,15**	TAPA	
0,12	14	8	1	2	24	4,69	**1,10**	ZAPATO	
0,29	12	8	1	2	24	4,69	**1,81**	DUCTO	
0,15	16,5	11	1	2	24	4,69	**1,57**	ZAPATO	
0,16	14	11	1	2	24	4,69	**1,49**	ZAPATO	
0,13	8,5	4	1	2	24	4,69	**0,66**	ZAPATO	
0,07	6	4	1	2	24	4,69	**0,38**	ZAPATO	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1,13	6	4	2	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,8	13	10	1	2	24	4,69	**4,88**	DUCTO	
1,13	13	10	2	2	24	4,69	**13,37**	DUCTO	
0,15	14,5	10	1	2	24	4,69	**1,40**	ZAPATO	
0,05	12	10	1	2	24	4,69	**0,73**	ZAPATO	
0,4	12	10	1	2	24	4,69	**2,87**	DUCTO	
0	13	10	1	2	24	4,69	**0,68**	TAPA	
1,13	6	4	4	2	24	4,69	**11,63**	DUCTO	
0,4	6	4	1	2	24	4,69	**1,17**	DUCTO	DESCANSO ME´DICO
0,35	6	4	1	2	24	4,69	**1,05**	CODO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,13	11,5	4	1	2	24	4,69	**0,81**	ZAPATO	
0,07	8	4	1	2	24	4,69	**0,46**	ZAPATO	HABITACIÓN 301
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
1,13	8	4	2	2	24	4,69	**6,98**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,13	11,5	4	1	2	24	4,69	**0,81**	ZAPATO	
0,07	8	4	1	2	24	4,69	**0,46**	ZAPATO	
1,13	8	4	3	2	24	4,69	**10,46**	DUCTO	HABITACIÓN 302
0,76	8	4	1	2	24	4,69	**2,43**	DUCTO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,35	8	4	1	2	24	4,69	**1,26**	CODO	HABITACIÓN 307
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
1,07	8	4	1	2	24	4,69	**3,32**	DUCTO	
0,3	8	6	1	2	24	4,69	**1,30**	CODO	
0,52	8	6	1	2	24	4,69	**2,03**	DUCTO	
0,52	8	5	1	2	24	4,69	**1,89**	REDUCCIÓN	
0,4	8	5	1	2	24	4,69	**1,52**	DUCTO	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	HABITACIONES: 310 - 311
0,05	8	4	1	2	24	4,69	**0,40**	ZAPATO	
0,42	8	4	1	2	24	4,69	**1,46**	DUCTO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	10	6	1	2	24	4,69	**0,91**	ZAPATO	
0,25	8	6	1	2	24	4,69	**1,13**	ZAPATO	
0,52	8	6	1	2	24	4,69	**2,03**	DUCTO	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	**4,07**	DUCTO	
0,3	8	5	1	2	24	4,69	**1,21**	REDUCCIÓN	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	HABITACIONES: 316 - 318
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,14	11	4	1	2	24	4,69	**0,82**	ZAPATO	
0,42	8	4	1	2	24	4,69	**1,46**	ZAPATO	
0,4	8	4	1	2	24	4,69	**1,40**	CODO	
0,95	8	4	1	2	24	4,69	**2,97**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	8	4	1	2	24	4,69	**0,69**	DUCTO	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	8,5	4	1	2	24	4,69	**0,71**	ZAPATO	HABITACIÓN: 324
0,3	6	4	1	2	24	4,69	**0,93**	ZAPATO	
0,39	6	4	1	2	24	4,69	**1,14**	DUCTO	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DESCIO	
0,13	15	6	1	2	24	4,69	**1,10**	ZAPATO	
0,17	10	6	1	2	24	4,69	**0,99**	ZAPATO	
1,13	10	6	2	2	24	4,69	**9,30**	DUCTO	
0,52	8	5	1	2	24	4,69	**1,89**	REDUCCIÓN	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
0,13	8	6	1	2	24	4,69	**0,73**	ZAPATO	
0,07	13	6	1	2	24	4,69	**0,72**	ZAPATO	
1,13	8	6	1	2	24	4,69	**4,07**	DUCTO	
0,3	7	5	1	2	24	4,69	**1,12**	REDUCCIÓN	
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,07	13	4	1	2	24	4,69	**0,65**	ZAPATO	
0,13	8	4	1	2	24	4,69	**0,63**	ZAPATO	
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,07	11	4	1	2	24	4,69	**0,57**	ZAPATO	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA - ASEO - PROCEDIMIENTOS - WC - T LIMPIO - T SUCIO
0,13	6	4	1	2	24	4,69	**0,52**	ZAPATO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,07	11	4	1	2	24	4,69	**0,57**	ZAPATO	
0,13	6	4	1	2	24	4,69	**0,52**	ZAPATO	
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,07	11	4	1	2	24	4,69	**0,57**	ZAPATO	
0,13	6	4	1	2	24	4,69	**0,52**	ZAPATO	
1,13	6	4	2	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	
0,1	8	6	1	1	24	4,69	**0,48**	CUELLOS	
0,08	8	6	1	1	24	4,69	**0,42**	CUELLOS	
0,05	8	6	1	1	24	4,69	**0,32**	CUELLOS	
0,19	8	6	1	1	24	4,69	**0,78**	CUELLOS	
0,06	8	6	1	1	24	4,69	**0,35**	CUELLOS	
0,1	8	6	2	1	24	4,69	**0,97**	CUELLOS	
SISTEMA DE EXTRACCION - CUARTO AISLADO UCIP									
1,13	12	10	15	2	24	4,69	**95,92**	DUCTO	
0,52	12	10	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO	UCI-P AISLADO - HAB 11
1,13	12	10	1	2	24	4,69	**6,39**	DUCTO	
0	12	10	1	2	24	4,69	**0,64**	TAPA	
0,15	19	22	1	2	24	4,69	**2,34**	ZAPATO	
0,34	22	14	1	2	24	4,69	**3,69**	ZAPATO	
1,13	22	14	7	2	24	4,69	**73,25**	DUCTO	
0,36	22	14	1	2	24	4,69	**3,86**	DUCTO	
0,52	14	22	1	2	24	4,69	**5,23**	CODO	SOBRE TERRAZA
0,52	19	14	1	2	24	4,69	**4,80**	DUCTO	
0,72	25	25	1	2	24	4,69	**9,65**	CODO	
1,13	25	25	1	2	24	4,69	**14,53**	DUCTO	
CUELLOS DE LOS SISTEMAS EN EL PISO									
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	LUDOTECA - PUESTO ENFER
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	ÁREA MUÑECOS Y JUGUETES
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	JUEGOS ESTIMULACIÓN
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	JUEGOS DE MESA
0,14	8	8	1	1	24	4,69	**0,71**	CUELLO	ESTAR TV
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	TERRAZA SOLAR
0,33	9	9	1	1	24	4,69	**1,61**	CUELLO	DESCANSO MÉDICO
0,33	9	9	1	1	24	4,69	**1,61**	CUELLO	DESCANSO ENFERMERIA
0,12	8	8	1	1	24	4,69	**0,63**	CUELLO	COORDINACIÓN UCI P
0,23	8	6	1	1	24	4,69	**0,92**	CUELLO	WC NIÑOS
0,23	8	6	1	1	24	4,69	**0,92**	CUELLO	WC NIÑOS
0,23	8	6	1	1	24	4,69	**0,92**	CUELLO	CUARTO ASEO
0,23	8	6	1	1	24	4,69	**0,92**	CUELLO	BAÑOS
0,23	8	6	1	1	24	4,69	**0,92**	CUELLO	BAÑOS
0,17	9	9	1	1	24	4,69	**0,92**	CUELLO	COORDINACIÓN PEDIATRIA
0,17	9	8	1	1	24	4,69	**0,87**	CUELLO	INFORMACIÓN FAMILIAR
0,23	9	6	1	1	24	4,69	**0,98**	CUELLO	WC ADULTOS
0,16	12	12	1	1	24	4,69	**1,17**	CUELLO	EXTRACCIÓN LECHE MATERNA
0,36	8	6	1	1	24	4,69	**1,35**	CUELLO	CUARTO ASEO
0,15	8	6	1	1	24	4,69	**0,65**	CUELLO	DEPOSITO INSUMOS
0,07	8	6	1	1	24	4,69	**0,38**	CUELLO	WC DESCANSO VESTIER
0,35	9	9	1	1	24	4,69	**1,69**	CUELLO	INFORMACIÓN FAMILIAR
0,35	9	9	1	1	24	4,69	**1,69**	CUELLO	CIRCULACIÓN A LUDOTECA
0,1	8	8	1	1	24	4,69	**0,55**	CUELLO	ACCESO ASISTENCIAL
0,12	8	6	1	1	24	4,69	**0,55**	CUELLO	WC ACCESO ASISTENCIAL
0,1	8	6	1	1	24	4,69	**0,48**	CUELLO	ROPA LIMPIA
0,15	8	6	1	1	24	4,69	**0,65**	CUELLO	CUARTO ESTERIL
0,12	8	6	1	1	24	4,69	**0,55**	CUELLO	TRABAJO SUCIO
0,12	8	6	1	1	24	4,69	**0,55**	CUELLO	TRABAJO LIMPIO
0,26	6	6	1	1	24	4,69	**0,87**	CUELLO	INFORMACIÓN
0,26	9	9	1	1	24	4,69	**1,31**	CUELLO	CIRCULACIÓN A INFORMACIÓN
0,2	9	9	1	1	24	4,69	**1,05**	CUELLO	CIRCULACIÓN A INFORMACIÓN
0,15	9	9	1	1	24	4,69	**0,84**	CUELLO	UCI-P 02
0,19	9	9	1	1	24	4,69	**1,01**	CUELLO	UCI-P 04
0,18	9	9	1	1	24	4,69	**0,96**	CUELLO	UCI-P 06
0,15	9	9	1	1	24	4,69	**0,84**	CUELLO	UCI-P 08
13	9	9	1	1	24	4,69	**55,94**	CUELLO	UCI-P 10
0,13	9	9	1	1	24	4,69	**0,75**	CUELLO	UCI-P 12
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	CIRCULACIÓN UCIP
0,35	12	12	1	1	24	4,69	**2,26**	CUELLO	CIRCULACIÓN UCIP
0,14	12	12	1	1	24	4,69	**1,06**	CUELLO	CIRCULACIÓN UCIP
0,34	9	9	1	1	24	4,69	**1,65**	CUELLO	UCI-P 01
0,37	9	9	1	1	24	4,69	**1,78**	CUELLO	UCI-P 03
0,36	9	9	1	1	24	4,69	**1,74**	CUELLO	UCI-P 05
0,37	9	9	1	1	24	4,69	**1,78**	CUELLO	UCI-P 07
0,36	9	9	1	1	24	4,69	**1,74**	CUELLO	UCI-P 09
0,6	14	10	1	1	24	4,69	**3,69**	CUELLO	UCI-P 11















SISTEMA DE EXTRACCIÓN - BAÑOS HOSPITALIZACION									
0,18	8	6	1	1	24	4,69	**0,75**	CUELLO	HABITACUÍN 301
0,09	8	6	1	1	24	4,69	**0,45**	CUELLO	HABITACUÍN 302
0,24	4	8	1	2	24	4,69	**0,94**	CODO	HABITACUÍN 303 Y 305
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 303 Y 305
1,06	8	4	1	2	24	4,69	**3,29**	DUCTO	HABITACUÍN 303 Y 305
0,28	8	4	1	2	24	4,69	**1,06**	AJUSTE	HABITACUÍN 303 Y 305
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	HABITACUÍN 303 Y 305
0,32	6	4	1	2	24	4,69	**0,98**	CODO	HABITACUÍN 303 Y 305
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	HABITACUÍN 303 Y 305
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 303 Y 305
0,35	8	6	1	2	24	4,69	**1,47**	CUELLO	HABITACUÍN 303
0,33	8	6	1	2	24	4,69	**1,40**	CUELLO	HABITACUÍN 305
0,25	6	4	1	2	24	4,69	**0,81**	AJUSTE	HABITACUÍN 307 Y 309
0,32	6	4	1	2	24	4,69	**0,98**	CODO	HABITACUÍN 307 Y 309
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	HABITACUÍN 307 Y 309
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 307 Y 309
0,15	8	6	1	1	24	4,69	**0,65**	CUELLO	HABITACUÍN 307
0,29	8	6	1	1	24	4,69	**1,12**	CUELLO	HABITACUÍN 309
0,08	8	6	1	1	24	4,69	**0,42**	CUELLO	HABITACUÍN 310
0,08	8	6	1	1	24	4,69	**0,42**	CUELLO	HABITACUÍN 311
0,13	13	4	1	2	24	4,69	**0,89**	ZAPATO	HABITACUÍN 312 Y 314
0,37	8	4	1	2	24	4,69	**1,32**	ZAPATO	HABITACUÍN 312 Y 314
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 312 Y 314
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	HABITACUÍN 312 Y 314
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	HABITACUÍN 312 Y 314
0,32	7	4	1	2	24	4,69	**1,07**	CODO	HABITACUÍN 312 Y 314
0,6	6	4	1	2	24	4,69	**1,64**	DUCTO	HABITACUÍN 312 Y 314
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 312 Y 314
0,23	8	6	1	2	24	4,69	**1,07**	CUELLO	HABITACUÍN 312
0,26	8	6	1	2	24	4,69	**1,17**	CUELLO	HABITACUÍN 314
0,13	13	4	1	2	24	4,69	**0,89**	ZAPATO	HABITACUÍN 320 - 322
0,39	8	4	1	2	24	4,69	**1,37**	ZAPATO	HABITACUÍN 320 - 322
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 320 - 322
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	HABITACUÍN 320 - 322
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 320 - 322
1,13	6	4	1	2	24	4,69	**2,91**	DUCTO	HABITACUÍN 320 - 322
0,13	11	4	1	2	24	4,69	**0,79**	ZAPATO	HABITACUÍN 320 - 322
0,12	6	4	1	2	24	4,69	**0,50**	ZAPATO	HABITACUÍN 320 - 322
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	HABITACUÍN 320 - 322
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 320 - 322
0,05	8	6	1	1	24	4,69	**0,32**	CUELLO	HABITACUÍN 320
0,05	8	6	1	1	24	4,69	**0,32**	CUELLO	HABITACUÍN 322
0,24	8	6	1	1	24	4,69	**0,95**	CUELLO	HABITACUÍN 318
0,26	8	6	1	1	24	4,69	**1,02**	CUELLO	HABITACUÍN 316
0,1	8	6	1	1	24	4,69	**0,48**	CUELLO	HABITACUÍN 324
0,32	4	8	1	2	24	4,69	**1,17**	CODO	HABITACUÍN 325
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	HABITACUÍN 325
1,13	6	4	3	2	24	4,69	**8,72**	DUCTO	HABITACUÍN 325
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 325
0,13	8	6	1	1	24	4,69	**0,58**	CUELLO	HABITACUÍN 325
0,32	4	8	1	2	24	4,69	**1,17**	CODO	HABITACUÍN 321 - 323
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 321 - 323
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	HABITACUÍN 321 - 323
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DESVIO	HABITACUÍN 321 - 323
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 321 - 323
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	HABITACUÍN 321 - 323
0,13	11	4	1	2	24	4,69	**0,79**	ZAPATO	HABITACUÍN 321 - 323
0,39	6	4	1	2	24	4,69	**1,14**	ZAPATO	HABITACUÍN 321 - 323
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 321 - 323
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	DUCTO	HABITACUÍN 321 - 323
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**	CUELLO	HABITACUÍN 323
0,19	8	6	1	1	24	4,69	**0,78**	CUELLO	HABITACUÍN 321
0,32	4	8	1	2	24	4,69	**1,17**	CODO	HABITACUÍN 319 - 317
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 319 - 317
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	HABITACUÍN 319 - 317
1,06	4	8	1	2	24	4,69	**3,29**	DESVIO	HABITACUÍN 319 - 317
0,3	7	4	1	2	24	4,69	**1,02**	REDUCCIÓN	HABITACUÍN 319 - 317
1	6	4	1	2	24	4,69	**2,60**	DUCTO	HABITACUÍN 319 - 317
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 319 - 317
0,13	13	4	1	2	24	4,69	**0,89**	ZAPATO	HABITACUÍN 319 - 317
0,39	8	4	1	2	24	4,69	**1,37**	ZAPATO	HABITACUÍN 319 - 317
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	DUCTO	HABITACUÍN 319 - 317
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	HABITACUÍN 319 - 317
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**	CUELLO	HABITACUÍN 317
0,2	8	6	1	1	24	4,69	**0,82**	CUELLO	HABITACUÍN 319
0,32	4	8	1	2	24	4,69	**1,17**	CODO	HABITACUÍN 313 Y 315
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	HABITACUÍN 313 Y 315
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	AJUSTE	HABITACUÍN 313 Y 315
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DESVIO	HABITACUÍN 313 Y 315
0,52	8	4	1	2	24	4,69	**1,74**	AJUSTE	HABITACUÍN 313 Y 315
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	HABITACUÍN 313 Y 315
0,13	11	4	1	2	24	4,69	**0,79**	ZAPATO	HABITACUÍN 313 Y 315
0,17	6	4	1	2	24	4,69	**0,62**	ZAPATO	HABITACUÍN 313 Y 315
0,52	6	4	1	2	24	4,69	**1,45**	AJUSTE	HABITACUÍN 313 Y 315
0	6	4	1	2	24	4,69	**0,22**	TAPA	HABITACUÍN 313 Y 315
0,24	8	6	1	1	24	4,69	**0,95**	CUELLO	HABITACUÍN 313
0,27	8	6	1	1	24	4,69	**1,05**	CUELLO	HABITACUÍN 315
UNIÓN ENTRE SISTEMA DE RETORNO: (1) Y (2)									
0,7	17	12	1	2	24	4,69	**5,46**	DESVIO	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0,37	17	12	1	2	24	4,69	**3,18**	DUCTO	
0,479	12	17	1	2	24	4,69	**3,93**	CODO	
0,13	17	17	1	2	24	4,69	**1,78**	ZAPATO	
0,27	12	17	1	2	24	4,69	**2,49**	ZAPATO	
0,19	15	20	1	2	24	4,69	**2,33**	DUCTO	
0,44	10	15	1	2	24	4,69	**3,16**	CODO	
0,66	15	20	1	2	24	4,69	**6,25**	DESVIO	
0,52	15,5	12,5	1	2	24	4,69	**4,07**	REDUCCIÓN	
1,13	20	15	8	2	24	4,69	**81,39**	DUCTO	
0,32	20	15	1	2	24	4,69	**3,42**	AJUSTE	
0,638	20	15	1	2	24	4,69	**6,07**	CODO	
SOTANO									
SISTEMA DE RETORNO (1)									
0,7	57	14	1	2	18	10,10	**28,78**	DUCTO	PARQUADEROS: 28 - 27 - 26 -25 A PARQUEADERO 13
1,13	57	14	1	2	18	10,10	**44,44**	DUCTO	
0,55	56	13	1	2	18	10,10	**22,66**	REDUCCIÓN	
1,13	56	12	9	2	18	10,10	**383,09**	DUCTO	
0,52	48,5	12	1	2	18	10,10	**18,94**	REDUCCIÓN	
1,13	42	12	15	2	18	10,10	**507,03**	DUCTO	
0,52	31,5	12	1	2	18	10,10	**13,61**	REDUCCIÓN	
1,13	21	12	5	2	24	4,69	**47,96**	DUCTO	
0,12	24,5	10	1	2	24	4,69	**1,73**	ZAPATO	
0,16	22	10	1	2	24	4,69	**1,91**	ZAPATO	
1,13	22	10	6	2	24	4,69	**55,81**	DUCTO	
0,54	22	10	1	2	24	4,69	**4,80**	DUCTO	
0,52	17	10	1	2	24	4,69	**3,92**	REDUCCIÓN	
1,13	12	10	3	2	24	4,69	**19,18**	DUCTO	PARQUEADEROS: 33 -36 A BODEGA DE SERVICIOS GENERALES
0,38	15	10	1	2	24	4,69	**2,80**	DUCTO	
1,13	15	10	1	2	24	4,69	**7,27**	DUCTO	
0,84	15	10	1	2	24	4,69	**5,54**	DUCTO	
1,13	15	10	5	2	24	4,69	**36,33**	DUCTO	
0,53	15	10	1	2	24	4,69	**3,69**	DUCTO	
0,36	12,5	9	1	2	24	4,69	**2,25**	REDUCCIÓN	
1,13	10	8	5	2	24	4,69	**26,16**	DUCTO	
0,44	10	8	1	2	24	4,69	**2,27**	CODO	
1,13	10	8	4	2	24	4,69	**20,93**	DUCTO	
0,13	12,5	8	1	2	24	4,69	**1,07**	ZAPATO	
0,07	10	8	1	2	24	4,69	**0,69**	ZAPATO	
0,4	12	8	1	2	24	4,69	**2,33**	DUCTO	FRENTE A CUARTO ELÉCTRICO A DEP. CADAVERES
1,13	12	8	1	2	24	4,69	**5,81**	DUCTO	
0,6	12	8	1	2	24	4,69	**3,29**	DUCTO	
1,13	12	8	7	2	24	4,69	**40,69**	DUCTO	
0,57	12	8	1	2	24	4,69	**3,14**	DUCTO	
0,3	11	7	1	2	24	4,69	**1,67**	REDUCCIÓN	
0,52	10	6	1	2	24	4,69	**2,33**	DUCTO	
0,86	10	6	1	2	24	4,69	**3,62**	DUCTO	
0,18	8,5	4	1	2	24	4,69	**0,80**	ZAPATO	BIENESTAR A HALL Y DEP. ALMACEN
0,36	6	4	1	2	24	4,69	**1,07**	ZAPATO	
1,13	6	4	13	2	24	4,69	**37,79**	DUCTO	
0,36	6	4	1	2	24	4,69	**1,07**	CODO	
0,6	6	4	1	2	24	4,69	**1,64**	DUCTO	
0,36	6	4	1	2	24	4,69	**1,07**	CODO	
0,52	9	6	1	2	24	4,69	**2,18**	REDUCCIÓN	
1,13	8	4	1	2	24	4,69	**3,49**	DUCTO	DEPARTAMENTO BIOMEDICO
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	10,5	4	2	2	24	4,69	**1,66**	ZAPATO	
0,37	8	4	2	2	24	4,69	**2,63**	ZAPATO	
0	8	4	2	2	24	4,69	**0,53**	TAPA	
1,13	10	8	4	2	24	4,69	**20,93**	DUCTO	TALLER MANTENIMIENTO
0	10	8	1	2	24	4,69	**0,47**	TAPA	
0,15	12,5	4	1	2	24	4,69	**0,94**	ZAPATO	
0,05	10	4	1	2	24	4,69	**0,47**	ZAPATO	
0,52	10	4	1	2	24	4,69	**2,03**	DUCTO	
0,52	10	6	1	2	24	4,69	**2,33**	REDUCCIÓN	
0,52	10	5	1	2	24	4,69	**2,18**	DUCTO	CONSULTORIO DE DIETAS A CUARTO ASEO Y BAÑO
1,13	10	5	9	2	24	4,69	**39,24**	DUCTO	
0,52	8	5	1	2	24	4,69	**1,89**	REDUCCIÓN	
1,13	8	5	1	2	24	4,69	**3,78**	DUCTO	
0,95	8	5	1	2	24	4,69	**3,22**	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4,69	**0,30**	TAPA	
0,15	10,5	4	1	2	24	4,69	**0,83**	ZAPATO	
0,37	8	4	1	2	24	4,69	**1,32**	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4,69	**0,26**	TAPA	
0,15	8,5	5	1	2	24	4,69	**0,77**	ZAPATO	
0,37	6	5	1	2	24	4,69	**1,21**	ZAPATO	
1,13	6	5	1	2	24	4,69	**3,20**	DUCTO	
0	6	5	1	2	24	4,69	**0,25**	TAPA	PARQUEADERO 29 A 26
0,13	17,5	10	1	2	24	4,69	**1,44**	ZAPATO	
0,38	15	10	1	2	24	4,69	**2,80**	ZAPATO	
1,13	15	10	1	2	24	4,69	**7,27**	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4,69	**0,76**	TAPA	
0,175	20	10	2	1	24	4,69	**3,14**	CUELLO	
0,17	17,5	10	1	2	24	4,69	**1,70**	ZAPATO	
0,38	15	10	1	2	24	4,69	**2,80**	ZAPATO	
1,13	15	10	1	2	24	4,69	**7,27**	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4,69	**0,76**	TAPA	
0,175	20	10	2	1	24	4,69	**3,14**	CUELLO	PARQUEADEROS: 48, 35, 17
0,175	20	10	2	1	24	4,69	**3,14**	CUELLO	
0,175	20	10	2	1	24	4,69	**3,14**	CUELLO	
0,13	17,5	10	1	2	24	4,69	**1,44**	ZAPATO	
0,54	15	10	1	2	24	4,69	**3,75**	ZAPATO	
1,13	15	10	1	2	24	4,69	**7,27**	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4,69	**0,76**	TAPA	
0,175	20	10	2	1	24	4,69	**3,14**	CUELLO	
1,13	57	14	2	1	18	10,10	**85,61**	DUCTO	



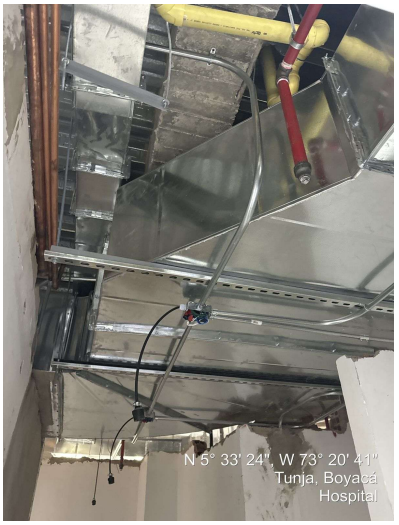









0,71	50,5	16	1	1	18	10,10	25,76	REDUCCIÓN	PARQUEADERO
0,52	44	18	1	1	18	10,10	17,97	DUCTO	
1,13	42	12	1	1	18	10,10	32,55	DUCTO	
0,6	10	22	1	1	18	10,10	10,59	DUCTO	
0,52	10	22	1	1	18	10,10	9,28	DUCTO	
0,55	21	12	1	2	24	4,69	5,03	DUCTO	PARQUEADERO 07
1,13	21	12	4	2	24	4,69	38,37	DUCTO	PARQUEADERO 08
0	21	12	1	1	24	4,69	0,95	TAPA	PARQUEADERO 08
0,13	20	10	1	2	24	4,69	1,57	ZAPATO	PARQUEADERO 08
0,13	15	10	1	2	24	4,69	1,31	ZAPATO	PARQUEADERO 08
0,4	15	10	1	2	24	4,69	2,92	DUCTO	PARQUEADERO 08
1,13	15	10	1	2	24	4,69	7,27	DUCTO	PARQUEADERO 08
0	15	10	1	1	24	4,69	0,60	TAPA	PARQUEADERO 08
0,175	20	10	2	1	24	4,69	3,14	CUELLO	PARQUEADERO 08
0,13	20	10	1	2	24	4,69	1,57	ZAPATO	PARQUEADERO 08
0,3	15	10	1	2	24	4,69	2,32	ZAPATO	PARQUEADERO 08
0,52	15	10	1	2	24	4,69	3,63	DUCTO	PARQUEADERO 08
1,13	15	10	4	2	24	4,69	29,07	DUCTO	PARQUEADERO 08
1,13	15	10	4	2	24	4,69	29,07	DUCTO	PARQUEADERO 08
0,8	10	20	2	2	24	4,69	12,72	DUCTO	PARQUEADERO 48
0,2	12	10	1	2	24	4,69	1,52	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,52	13,5	9	1	2	24	4,69	3,27	TRANSFORMACIÓN	ÁREA FUTURA COCINA
0,1	15	8	1	2	24	4,69	1,04	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,52	13,5	7,5	1	2	24	4,69	3,05	REDUCCIÓN	ÁREA FUTURA COCINA
0,65	12	7	1	2	24	4,69	3,35	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
1,12	12	7	3	2	24	4,69	16,43	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,52	12	7	1	2	24	4,69	2,76	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,82	12	7	1	2	24	4,69	4,12	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
52	9,5	7	1	2	24	4,69	204,77	REDUCCIÓN	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	10	7	2	2	24	4,69	9,88	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,5	10	7	1	2	24	4,69	2,39	CODO	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	10	7	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
1,07	10	7	1	2	24	4,69	4,70	DESVIO	ÁREA FUTURA COCINA
1,17	10	7	1	2	24	4,69	5,10	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
1,07	10	7	1	2	24	4,69	4,70	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,13	10	7	1	2	24	4,69	0,89	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,13	13	4	1	2	24	4,69	0,89	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
0,39	8	4	1	2	24	4,69	1,37	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	8	4	1	2	24	4,69	3,49	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,405	8	4	1	2	24	4,69	1,42	CODO	ÁREA FUTURA COCINA
0,6	8	4	1	2	24	4,69	1,97	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0	8	4	1	1	24	4,69	0,26	TAPA	ÁREA FUTURA COCINA
0,15	11	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
0,17	6	4	1	2	24	4,69	0,62	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
0	6	4	1	1	24	4,69	0,22	TAPA	ÁREA FUTURA COCINA
0,385	6	4	1	2	24	4,69	1,13	CODO	ÁREA FUTURA COCINA
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,13	11	4	1	2	24	4,69	0,79	ZAPATO	ASEO
0,27	6	4	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	ASEO
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	ASEO
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	ASEO
0,4	9	5	1	2	24	4,69	1,63	REDUCCIÓN	BASURA 1 Y 2
0,415	8	4	1	2	24	4,69	1,44	CODO	BASURA 1 Y 2
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	BASURA 1 Y 2
0,13	14	5	1	2	24	4,69	1,00	ZAPATO	BASURA 1 Y 2
0,05	9	5	1	2	24	4,69	0,47	ZAPATO	BASURA 1 Y 2
0	8	4	1	2	24	4,69	0,26	TAPA	BASURA 1 Y 2
0,52	9	5	1	2	24	4,69	2,03	DUCTO	BASURA 1 Y 2
0	9	5	1	2	24	4,69	0,32	TAPA	BASURA 1 Y 2
0,13	11	4	1	2	24	4,69	0,79	ZAPATO	BASURA 3
0,07	6	4	1	2	24	4,69	0,38	ZAPATO	BASURA 3
0,52	6	4	1	2	24	4,69	1,45	DUCTO	BASURA 3
1,13	6	4	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	BASURA 3
0	6	4	1	2	24	4,69	0,22	TAPA	BASURA 3
0,13	13	4	1	2	24	4,69	0,89	ZAPATO	DEPOSITO 1 Y 2
0,07	8	4	1	2	24	4,69	0,46	ZAPATO	DEPOSITO 1 Y 2
0,7	8	4	1	2	24	4,69	2,26	DUCTO	DEPOSITO 1 Y 2
1,18	8	4	1	2	24	4,69	3,63	DUCTO	DEPOSITO 1 Y 2
0,13	13	4	1	2	24	4,69	0,89	ZAPATO	DEPOSITO 1 Y 2
0,07	8	4	1	2	24	4,69	0,46	ZAPATO	DEPOSITO 1 Y 2
0	8	4	2	2	24	4,69	0,53	TAPA	DEPOSITO 1 Y 2
0,52	8	4	1	2	24	4,69	1,74	DUCTO	DEPOSITO 1 Y 2
SISTEMA DE SUMINISTRO									
0,52	54	10	1	2	18	10,10	20,03	DUCTO	PARQUEADERO 26
0,66	54	10	4	2	18	10,10	98,51	SEMI CODO	PARQUEADERO 26
1,13	54	10	2	2	18	10,10	80,12	DUCTO	PARQUEADERO 26
0,84	54	10	1	2	18	10,10	30,54	DUCTO	PARQUEADERO 27
0,62	54	10	1	2	18	10,10	23,31	DUCTO	PARQUEADERO 27
1,13	54	10	3	2	18	10,10	120,18	DUCTO	PARQUEADERO 27
0,62	54	10	1	2	18	10,10	23,31	DESVIO	PARQUEADERO 33
1,13	54	10	7	2	18	10,10	280,43	DUCTO	PARQUEADERO DEL 33 AL 36
1,13	54	10	6	2	18	10,10	240,37	DUCTO	PARQUEO 36 A MURO EXTERIOR ARCHIVO
0,52	47	10	1	2	18	10,10	17,84	REDUCCIÓN	ARCHIVO
1,13	40	10	4	2	18	10,10	125,19	DUCTO	ARCHIVO
0,84	40	10	1	2	18	10,10	23,86	DUCTO	ARCHIVO
0,52	32	10	1	2	18	10,10	13,16	REDUCCIÓN	ARCHIVO
0,37	24	10	1	2	18	10,10	8,02	DUCTO	ARCHIVO
1,13	24	10	2	2	18	10,10	42,67	DUCTO	ARCHIVO
0,29	10	24	1	2	18	10,10	6,63	DESVIO	BODEGA FARMACIA
0,2	24	10	1	2	18	10,10	5,06	DUCTO	BODEGA FARMACIA
1,12	24	10	1	2	18	10,10	21,11	DUCTO	BODEGA FARMACIA
0	24	10	1	2	18	10,10	1,13	TAPA	BODEGA FARMACIA
0,13	19	10	1	2	24	4,69	1,52	ZAPATO	BODEGA FARMACIA
0,39	15	10	1	2	24	4,69	2,86	ZAPATO	BODEGA FARMACIA
1,13	15	10	2	2	24	4,69	14,53	DUCTO	BODEGA FARMACIA
0,52	15	10	1	2	24	4,69	3,63	DUCTO	BODEGA FARMACIA
0,52	13,5	8,5	1	2	24	4,69	3,20	REDUCCIÓN	BODEGA FARMACIA
0,12	17	7	1	2	24	4,69	1,20	ZAPATO	BODEGA FARMACIA
0,07	12	7	1	2	24	4,69	0,72	ZAPATO	BODEGA FARMACIA
0,52	12	7	1	2	24	4,69	2,76	DUCTO	BODEGA FARMACIA
0	12	7	1	1	24	4,69	0,50	TAPA	BODEGA FARMACIA
0,13	20	10	1	2	24	4,69	1,57	ZAPATO	BODEGA FARMACIA
0,17	15	10	1	2	24	4,69	1,55	ZAPATO	BODEGA FARMACIA
0,36	15	10	1	2	24	4,69	2,68	DUCTO	BODEGA FARMACIA
0,5	15	10	1	2	24	4,69	3,51	CODO	BODEGA FARMACIA
0,15	17	8	1	2	24	4,69	1,43	ZAPATO	ARCHIVO
0,37	12	8	1	2	24	4,69	2,19	ZAPATO	ARCHIVO
0,52	12	8	1	2	24	4,69	2,91	DUCTO	ARCHIVO
1,13	12	8	1	2	24	4,69	5,81	DUCTO	ARCHIVO
0,4	10,5	6,5	1	2	24	4,69	1,98	REDUCCIÓN	ARCHIVO
0,15	14	6	1	2	24	4,69	1,14	ZAPATO	ARCHIVO
0,15	9	6	1	2	24	4,69	0,86	ZAPATO	ARCHIVO
0,52	9	6	1	2	24	4,69	2,18	DUCTO	ARCHIVO
0	9	6	1	2	24	4,69	0,36	TAPA	ARCHIVO
0,15	20	10	1	2	24	4,69	1,72	ZAPATO	ARCHIVO
0,15	15	10	1	2	24	4,69	1,43	ZAPATO	ARCHIVO
0,52	15	10	1	2	24	4,69	3,63	DUCTO	ARCHIVO
0,52	13,5	8,5	1	2	24	4,69	3,20	REDUCCIÓN	ARCHIVO
0,52	12	7	1	2	24	4,69	2,76	DUCTO	ARCHIVO
0	9	4	1	2	24	4,69	0,29	TAPA	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	9	4	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,415	9	4	1	2	24	4,69	1,56	CODO	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	9	4	2	2	24	4,69	7,56	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,52	10,5	7,5	1	2	24	4,69	2,62	REDUCCIÓN	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,13	17	5	2	2	24	4,69	2,31	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,4	12	5	1	2	24	4,69	1,98	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	ÁREA FUTURA COCINA
0,13	17	5	1	2	24	4,69	1,15	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
0,41	12	5	1	2	24	4,69	2,03	ZAPATO	ÁREA FUTURA COCINA
1,13	12	5	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0,52	12	5	1	2	24	4,69	2,47	DUCTO	ÁREA FUTURA COCINA
0	12	5	1	2	24	4,69	0,40	TAPA	ÁREA FUTURA COCINA
0,43	12	10	1	2	24	4,69	2,73	DUCTO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
0,53	10	12	1	2	24	4,69	3,25	DESVIO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
1,13	12	10	1	2	24	4,69	6,39	DUCTO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
0,52	13	10	1	2	24	4,69	3,34	REDUCCIÓN	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
0,13	14	4	1	2	24	4,69	0,84	ZAPATO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
0,18	9	4	1	2	24	4,69	0,84	ZAPATO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
1,13	9	4	3	2	24	4,69	11,34	DUCTO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
0	9	4	1	2	24	4,69	0,29	TAPA	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
1,13	14	10	7	2	24	4,69	48,83	DUCTO	CIRCULACIÓN: FUTURA COCINA A ARCHIVO
FACHADA ORIENTAL									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1,13	20	12	8	2	24	4,69	74,41	DUCTO	ENTRE EJES G Y H
0,515	12	20	2	2	24	4,69	9,23	CODO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1,13	21	12	8	2	24	4,69	76,74	DUCTO	ENTRE EJES E Y F
0,515	12	21	2	2	24	4,69	9,51	CODO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
0,66	22	12	2	2	24	4,69	12,15	CODO	ENTRE EJES E - D
0,46	12	22	2	2	24	4,69	8,91	CODO	
1,13	22	12	6	2	24	4,69	59,30	DUCTO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0,46	21	12	2	2	24	4,69	8,65	CODO	ENTRE EJES C - B
1,13	21	12	7	2	24	4,69	67,14	DUCTO	
TERRAZA 5TO PISO									
1ER PISO: SISTEMA DE EXTRACCION - REGILLAS SOBREPUESTAS									
0,4	33	33	1	2	18	10,10	16,59	DUCTO	SUBE: BUITRON TERRAZA 5TO PISO
0,93	33	33	1	2	18	10,10	34,54	CODO	
1,13	33	33	1	2	18	10,10	41,31	DUCTO	
1,4	33	33	1	2	18	10,10	50,46	DESVIO	
0,52	33	33	1	2	18	10,10	20,66	DUCTO	
2DO PISO: SISTEMA DE EXTRACCION - REGILLAS SOBREPUESTAS									
1,13	48	20	1	2	18	10,10	42,57	DUCTO	SUBE: BUITRON TERRAZA 5TO PISO
1,13	48	20	1	2	18	10,10	42,57	DUCTO	
0,72	48	20	1	2	18	10,10	28,26	DUCTO	
1,2	48	20	1	2	18	10,10	45,01	CODO	
1,13	48	20	3	2	18	10,10	127,70	DUCTO	
3ER PISO: SISTEMA DE EXTRACCION - REGILLAS SOBREPUESTAS									
1,13	25	25	4	2	20	6,70	83,05	DUCTO	SUBE: DE TERRAZA 5TO A TERRAZA C. CALDERA
0,66	25	25	1	2	20	6,70	12,76	DUCTO	
0,755	25	25	1	2	20	6,70	14,38	CODO	
0,9	25	25	1	2	20	6,70	16,85	DESVIO	
1,13	25	25	1	2	20	6,70	20,76	DUCTO	
0	25	25	1	2	20	6,70	2,47	TAPA	
0,13	23	20	1	2	20	6,70	3,22	ZAPATO	
0,17	20	18	1	2	20	6,70	3,36	ZAPATO	
1,13	20	18	1	2	20	6,70	15,78	DUCTO	









0,482	18	20	1	2	20	6,70	7,40	CODO	
1,13	18	20	1	2	20	6,70	15,78	DUCTO	
3ER PISO: SISTEMA DE EXTRACCIÓN - HABITACION AISLADO 11 UCIP									
1,13	12	8	4	2	24	4,69	23,25	DUCTO	SUBE: UCIP HAB 11 A TERRAZA 5TO P
0,4	12	8	1	2	24	4,69	2,33	DUCTO	
0,46	12	8	2	2	24	4,69	5,24	CODO	
3ER PISO: SISTEMA DE RETORNO (2)									
1,13	28	12	6	2	24	4,69	69,76	DUCTO	SUBE: BUITRON 3ER P A TERRAZA C. CALDERAS
0,2	28	12	1	2	24	4,69	2,76	DUCTO	
1,13	28	12	2	2	24	4,69	23,25	DUCTO	
0,49	28	12	1	2	24	4,69	5,53	CODO	
0	28	12	1	2	24	4,69	1,48	TAPA	
2DO PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
0,23	23	12	1	2	24	4,69	2,67	DUCTO	VIENE PISO 2 A TERRAZA
0,695	23	12	1	2	24	4,69	6,55	CODO	
1,13	23	12	4	2	24	4,69	40,69	DUCTO	
0,57	23	12	1	2	24	4,69	5,50	DUCTO	
0,695	23	12	1	2	24	4,69	6,55	CODO	
0,52	23	12	1	2	24	4,69	5,09	DUCTO	
1,13	23	12	1	2	24	4,69	10,17	DUCTO	
2DO PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
0,25	22	12	1	2	24	4,69	2,75	DUCTO	VIENE PISO 2 A TERRAZA
0,685	22	12	1	2	24	4,69	6,28	CODO	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
0,56	22	12	1	2	24	4,69	5,27	DUCTO	
0,685	22	12	1	2	24	4,69	6,28	CODO	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
2DO PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (7)									
0,25	22	12	1	2	24	4,69	2,75	DUCTO	VIENE PISO 2 A TERRAZA
0,685	22	12	1	2	24	4,69	6,28	CODO	
1,13	22	12	1	2	24	4,69	9,88	DUCTO	
0,52	22	12	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,685	22	12	1	2	24	4,69	6,28	CODO	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
2DO PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (8)									
0,685	12	22	1	2	24	4,69	6,28	CODO	VIENE PISO 2 A TERRAZA
0,52	22	12	1	2	24	4,69	4,94	DUCTO	
0,685	12	22	1	2	24	4,69	6,28	CODO	
1,12	22	12	1	2	24	4,69	9,80	DUCTO	
0,93	22	12	1	2	24	4,69	8,26	DESVIO	
1,13	22	12	7	2	24	4,69	69,18	DUCTO	
1,38	12	22	1	2	24	4,69	11,91	DESVIO	
0,685	22	12	1	2	24	4,69	6,28	CODO	
1,13	22	12	2	2	24	4,69	19,77	DUCTO	
3ER PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1,13	18	14	3	2	24	4,69	27,90	DUCTO	SUBE: UCIP A TERRAZA 5TO PISO
0,515	14	18	1	2	24	4,69	4,61	CODO	
0,52	18	14	1	2	24	4,69	4,65	DUCTO	
0,6	18	14	1	2	24	4,69	5,26	DUCTO	
0,6	18	14	1	2	24	4,69	5,26	CODO	
3ER PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1,13	16	14	4	2	24	4,69	34,88	DUCTO	SUBE: UCIP A TERRAZA 5TO PISO
0,52	16	14	1	2	24	4,69	4,36	DUCTO	
0,512	16	14	1	2	24	4,69	4,30	CODO	
0,565	16	14	1	2	24	4,69	4,68	CODO	
0,7	16	14	1	2	24	4,69	5,65	DUCTO	
3ER PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
0,13	15	12	1	2	24	4,69	1,42	ZAPATO	SUBE: ROPA SUCIO UCIP A TERRAZA 5TO PISO
0,07	10	12	1	2	24	4,69	0,84	ZAPATO	
0,13	13	12	1	2	24	4,69	1,31	ZAPATO	
0,07	8	12	1	2	24	4,69	0,76	ZAPATO	
0,52	14	12	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,525	14	12	3	2	24	4,69	11,43	CODO	
0,525	12	14	3	2	24	4,69	11,43	CODO	
0,52	14	14	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
1,13	14	14	1	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
0,1	14	14	1	2	24	4,69	1,27	DUCTO	
0,52	14	12	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,455	12	14	1	2	24	4,69	3,38	CODO	
0,52	14	12	1	2	24	4,69	3,78	DUCTO	
0,515	14	12	1	2	24	4,69	3,75	CODO	
0,455	12	14	1	2	24	4,69	3,38	CODO	
1,13	14	12	2	2	24	4,69	15,11	DUCTO	
0,455	12	14	1	2	24	4,69	3,38	CODO	
0,515	14	12	1	2	24	4,69	3,75	CODO	
1,13	14	12	1	2	24	4,69	7,56	DUCTO	
0,515	14	12	1	2	24	4,69	3,75	CODO	
3ER PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
1,13	19	14	5	2	24	4,69	47,96	DUCTO	SUBE: LUDOTECA A TERRAZA 5TO P
0,52	19	14	1	2	24	4,69	4,80	DUCTO	
0,635	19	14	2	2	24	4,69	11,40	CODO	
0,9	19	14	1	2	24	4,69	7,78	DUCTO	
0,525	14	19	2	2	24	4,69	9,67	CODO	
3ER PISO: SISTEMA DE SUMINISTRO (9)									
0,565	16	12	1	2	24	4,69	4,37	CODO	SUBE: PASILLO LLEGADA A LUDOTECA A TERRAZA 5TO PISO
0,515	16	12	1	2	24	4,69	4,04	CODO	
0,52	16	12	1	2	24	4,69	4,07	DUCTO	
0,512	16	12	1	2	24	4,69	4,02	CODO	
1,13	16	12	4	2	24	4,69	32,55	DUCTO	
0,465	16	12	1	2	24	4,69	3,70	CODO	
1,13	16	12	2	2	24	4,69	16,28	DUCTO	
0,465	12	16	1	2	24	4,69	3,70	CODO	
1,13	12	16	1	2	24	4,69	8,14	DUCTO	
ESQUINEROS EN CALIBRE 20 - GENERAL									
			26576		20	0,04	1.063,04	ESQUINERO	EL PESO DE CADA UNIDADES DE 40 GRAMOS, EL TOTAL DE ELEMENTOS INSTALADOS QUE LLEVAN EL ESQUINERO ES DE 3168, Y CADA UNO SE LE INSTALAN 8 UNIDADES

OBSERVACIONES:

TOTAL	**20.170,49**	**Kilogramo**
ACUMULADO ANTERIOR	**17.426,05**	**Kilogramo**
PRESENTE ACTA	**2.744,44**	**Kilogramo**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	**FIRMA:**
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	**FIRMA:**

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE AHORRADOR DE AGUA Y ALTO PODER DE DESCARGA TIPO POWER MISTY O SIMILAR	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 4				
			1	100%	1,00	WC Habitacion 401
			1	100%	1,00	WC Habitacion 402
			1	100%	1,00	WC Habitacion 403
			1	100%	1,00	WC Habitacion 404
			1	100%	1,00	WC Habitacion 405
			1	100%	1,00	WC Habitacion 406
			1	100%	1,00	WC Habitacion 407
			1	100%	1,00	WC Habitacion 408
			1	100%	1,00	WC Habitacion 409
			1	100%	1,00	WC Habitacion 410
			1	100%	1,00	WC Habitacion 411
			1	100%	1,00	WC Habitacion 412
			1	100%	1,00	WC Habitacion 413
			1	100%	1,00	WC Habitacion 414
			1	100%	1,00	WC Habitacion 415
			1	100%	1,00	WC Habitacion 416
			1	100%	1,00	WC Habitacion 417
			1	100%	1,00	WC Habitacion 418
			1	100%	1,00	WC Habitacion 419
			1	100%	1,00	WC Habitacion 420
			1	100%	1,00	WC Habitacion 421
			1	100%	1,00	WC Habitacion 422
			1	100%	1,00	WC Habitacion 423
			1	100%	1,00	WC Habitacion 424
			1	100%	1,00	WC Habitacion 425
			1	100%	1,00	Descanso medico
		PISO 3				
			1	100%	1,00	WC Habitacion 301
			1	100%	1,00	WC Habitacion 302
			1	100%	1,00	WC Habitacion 303
			1	100%	1,00	WC Habitacion 304
			1	100%	1,00	WC Habitacion 305
			1	100%	1,00	WC Habitacion 306
			1	100%	1,00	WC Habitacion 307
			1	100%	1,00	WC Habitacion 308
			1	100%	1,00	WC Habitacion 309
			1	100%	1,00	WC Habitacion 310
			1	100%	1,00	WC Habitacion 311
			1	100%	1,00	WC Habitacion 312
			1	100%	1,00	WC Habitacion 313
			1	100%	1,00	WC Habitacion 314
			1	100%	1,00	WC Habitacion 315
			1	100%	1,00	WC Habitacion 316
			1	100%	1,00	WC Habitacion 317
			1	100%	1,00	WC Habitacion 318
			1	100%	1,00	WC Habitacion 319
			1	100%	1,00	WC Habitacion 320
			1	100%	1,00	WC Habitacion 321
			1	100%	1,00	WC Habitacion 322
			1	100%	1,00	WC Habitacion 323
			1	100%	1,00	WC Habitacion 324
			1	100%	1,00	WC Habitacion 325
			1	100%	1,00	Descanso medico

OBSERVACIONES:

TOTAL	52,00	Cantidad
ACUMULADO ANTERIOR	44,20	Cantidad
PRESENTE ACTA	7,80	Cantidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AUXILIAR BAÑO, PARA LAVAMANOS EN MADERA MELAIMINICA RH DIMENSIONES HASTA B=0.60, A=0.50, H=0.80 COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN) INCLUYE HERRAJES BISAGRAS Y SOPORTES	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 3				
			1	85%	0,85	Habitacion 1
			1	85%	0,85	Habitacion 2
			1	85%	0,85	Habitación 3
			1	85%	0,85	Habitacion 4
			1	85%	0,85	Habitacion 6
			1	85%	0,85	Habitacion 5
			1	85%	0,85	Habitacion 7
			1	85%	0,85	Habitacion 8
			1	85%	0,85	Habitacion 9
			1	85%	0,85	Habitacion 10
			1	85%	0,85	Hbaitacion 11
			1	85%	0,85	Habitacion 12
			1	85%	0,85	Habitacion 13
			1	85%	0,85	Habitacion 14
			1	85%	0,85	Habitacion 15
			1	85%	0,85	Habitacion 16
			1	85%	0,85	Habitacion 17
			1	85%	0,85	Habitacion 19
			1	85%	0,85	Habitacion 18
			1	85%	0,85	Habitacion 20
			1	85%	0,85	habitacion 21
			1	85%	0,85	Habitacion 23
			1	85%	0,85	Habitacion 22
			1	85%	0,85	Habitacion 24
			1	85%	0,85	Habitacion 25
		PISO 4				
			1	85%	0,85	Habitacion 1
			1	85%	0,85	Habitacion 2
			1	85%	0,85	Habitación 3
			1	85%	0,85	Habitacion 4
			1	85%	0,85	Habitacion 6
			1	85%	0,85	Habitacion 5
			1	85%	0,85	Habitacion 7
			1	85%	0,85	Habitacion 8
			1	85%	0,85	Habitacion 9
			1	85%	0,85	Habitacion 10
			1	85%	0,85	Hbaitacion 11
			1	85%	0,85	Habitacion 12
			1	85%	0,85	Habitacion 13
			1	85%	0,85	Habitacion 14
			1	85%	0,85	Habitacion 15
			1	85%	0,85	Habitacion 16
			1	85%	0,85	Habitacion 17
			1	85%	0,85	Habitacion 19
			1	85%	0,85	Habitacion 18
			1	85%	0,85	Habitacion 20
			1	85%	0,85	habitacion 21
			1	85%	0,85	Habitacion 23
			1	85%	0,85	Habitacion 22
			1	85%	0,85	Habitacion 24
			1	85%	0,85	Habitacion 25

OBSERVACIONES:

TOTAL	42,50	Cantidad
ACUMULADO ANTERIOR	0,00	Cantidad
PRESENTE ACTA	42,50	Cantidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE.	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 3				
	1,5	2,1	1	100%	3,15	INGRESO A LUD0TECA
	1,9	2,1	1	100%	3,99	INGRESO DE PASILLO UCI A LUDOTECA
	2	2,1	1	100%	4,20	INGRESO A LUDTECA
	2	2,1	1	100%	4,20	INGRESO DE HALL A PASILLO ADMIITRATIVO
	2	2,1	1	100%	4,20	INGRESO PRINCIPAL DE HALL A UCI P

OBSERVACIONES:


TOTAL	19,74	Cantidad
ACUMULADO ANTERIOR	0,00	Cantidad
PRESENTE ACTA	19,74	Cantidad


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 65	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PVC PROYECTANTE	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4						
	0,94	1,26	1	**100%**	**1,18**	Habitacion 401
	0,94	1,26	1	**100%**	**1,18**	Habitacion 410
	0,94	1,26	1	**100%**	**1,18**	Habitacion 416
PISO 3						
	0,94	1,26	1	**100%**	**1,18**	Habtacion 301
	0,94	1,26	1	**100%**	**1,18**	Habtacion 310
	0,94	1,26	1	**100%**	**1,18**	Habtacion 316

OBSERVACIONES:

TOTAL	**7,11**	**Cantidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**6,00**	**Cantidad**
PRESENTE ACTA	**1,11**	**Cantidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DWRAP, INCLUYE ZUNCHOS, GRAPAS, CINTA FOIL Y PEGA	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico























Dimensiones					Total (m2)	Observaciones	
L (m)	A (pulgadas)	h (pulgadas)	Cantidad	%		ELEMENTOS	UBICACIÓN
PISO 2							
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (1)							
0,425	10	12	1	100%	0,47	CODO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR DE QUIROFANO 1 Y 2
1,13	12	10	8	100%	10,10	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
0,7	10	12	1	100%	0,78	CODO (AISLADO)	
1,13	10	12	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 3
0,52	12	10	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,44	10	10	1	100%	0,45	CODO (AISLADO)	
0,52	11	10	1	100%	0,55	REDUCCIÓN (AISLADO)	
1,13	10	10	1	100%	1,15	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (2)							
1,13	12	10	2	100%	2,53	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR DESCANSO A DE QUIROFANO 1
0,52	12	10	1	100%	0,58	CODO (AISLADO)	
0,425	12	10	3	100%	1,42	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	2	100%	2,53	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0,52	11	10	1	100%	0,55	DUCTO (AISLADO)	
1,13	101	10	1	100%	6,37	DUCTO (AISLADO)	
0,2	10	10	1	100%	0,20	CODO (AISLADO)	
0,33	10	10	1	100%	0,34	DUCTO (AISLADO)	
1,13	10	10	1	100%	1,15	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	100%	0,00	TAPA (AISLADO)	
0,25	12	10	1	100%	0,28	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	100%	0,83	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
0,4	12	10	1	100%	0,45	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIROFANOS
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,6	12	10	1	100%	0,67	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,4	12	10	1	100%	0,45	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,52	12	10	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (3)							
1,13	12	10	2	100%	2,53	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO
0,52	12	10	1	100%	0,58	CODO (AISLADO)	
0,425	12	10	3	100%	1,42	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE DE QUIROFANO 1 A 2
1,13	12	10	2	100%	2,53	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0,52	11	10	1	100%	0,55	DUCTO (AISLADO)	
1,13	101	10	1	100%	6,37	DUCTO (AISLADO)	
0,2	10	10	1	100%	0,20	CODO (AISLADO)	
0,33	10	10	1	100%	0,34	DUCTO (AISLADO)	
1,13	10	10	1	100%	1,15	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	100%	0,00	TAPA (AISLADO)	
1,13	12	10	2	100%	2,53	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	100%	0,83	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
0,4	12	10	1			DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QIROFANOS
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (4)							
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTO 2
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	12	10	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	100%	0,83	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
0,52	12	10	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	EQUIPOS
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,67	12	10	1	100%	0,75	DUCTO (AISLADO)	
0,52	11	10	1	100%	0,55	REDUCCIÓN (AISLADO)	SALA PARTOS 2
1,13	10	10	1	100%	1,15	DUCTO (AISLADO)	
0,44	10	10	1	100%	0,45	CODO (AISLADO)	
1,13	10	10	1	100%	1,15	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	100%	0,00	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (5)							
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,52	10	10	1	100%	0,53	REDUCCIÓN (AISLADO)	
1,13	11	10	1	100%	1,21	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	7	100%	8,84	DUCTO (AISLADO)	
0,37	12	10	3	100%	1,24	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
1,13	10	12	2	100%	2,53	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	3	100%	3,79	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIROFANOS
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO UMA (1)							
1,13	12	10	13	100%	16,42	DUCTO (AISLADO)	FRENTE A QUIROFANOS 1 - 2 - 3
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	100%	0,83	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO
0,52	12	10	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	2	100%	0,98	CODO (AISLADO)	
0,32	12	10	1	100%	0,36	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	3	100%	3,79	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO UMA (2)							
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 1 (INTERNO)
1,13	10	12	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO AISLADO	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	100%	0,83	CODO AISLADO	
1,13	12	10	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO UMA (3)							
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 1 (INTERNO)
1,13	12	10	8	100%	10,10	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2 A SALA PARTO 1
0	12	10	1	100%	0,00	TAPA (AISLADO)	
1,13	12	10	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIRURGICO: SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
0,52	10	12	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	2	100%	0,83	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	6	100%	7,58	DUCTO (AISLADO)	
0,75	12	10	1	100%	0,84	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO QUIROFANOS
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,4	12	10	1	100%	0,45	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,35	12	10	1	100%	0,39	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	2	100%	2,53	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 2
0,8	12	10	1	100%	0,89	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO UMA (4)							
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2
0	12	10	1	100%	0,00	TAPA (AISLADO)	
0,37	12	10	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	EQUIPO (QUIRURGICO): SALE FACHADA NORTE
0,52	12	10	1	100%	0,58	DUCTO (AISLADO)	
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	7	100%	8,84	DUCTO (AISLADO)	
1,13	12	10	4	100%	5,05	DUCTO (AISLADO)	SALA DE PARTO 2
SISTEMA DE RETORNO UMA (5)							
1,13	10	12	1	100%	1,26	DUCTO (AISLADO)	EQUIPO (QUIRURGICO): SALE FACHADA NORTE
0,37	10	12	1	100%	0,41	CODO (AISLADO)	
1,13	12	10	7	100%	8,84	DUCTO (AISLADO)	
0,44	12	10	1	100%	0,49	CODO (AISLADO)	
0,87	12	10	1	100%	0,97	DUCTO (AISLADO)	

OBSERVACIONES:

TOTAL	255,69	Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	213,89	Metro cuadrado
PRESENTE ACTA	41,80	Metro cuadrado

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 84	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico








Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
TERRAZA						
1,30	0,20	0,20	27	**100%**	**1,40**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
1,55	0,20	0,20	18	**100%**	**1,12**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
1,00	1,00	0,20	5	**100%**	**1,00**	PEDESTAL RECTANGULAR QUIROFANO
1,22	1,40	0,20	3	**100%**	**1,02**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
1,52	1,80	0,20	2	**100%**	**1,09**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
1,20	1,40	0,20	1	**100%**	**0,34**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
2,05	2,05	0,20	1	**100%**	**0,84**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
0,90	0,90	0,20	2	**100%**	**0,32**	PEDESTAL EN TERRAZA PARA EQUIPOS HVAC
0,12	0,12	2,25	7	**100%**	**0,23**	BUITRON DUCTOS DE HVAC
PISO 1						
0,12	0,12	1,64	1	**100%**	**0,02**	ANTEPECHO FACHADA FARMACIA
0,12	0,12	2,60	1	**100%**	**0,04**	AUDITORIO
0,12	0,12	2,70	1	**100%**	**0,04**	PERSONAL ASISTENCIAL
0,12	0,12	2,55	5	**100%**	**0,18**	WC PERSONAL ASSTENCIAL
0,12	0,12	2,70	2	**100%**	**0,08**	CAFETERIA
PISO 3						
0,12	0,12	2,60	2	**100%**	**0,07**	MURO BUITRO - ORATORIO
0,12	0,12	2,10	1	**100%**	**0,03**	WC PRINCIPAL HALL
0,12	0,12	2,70	4	**100%**	**0,16**	MURO BUITRO - HAB 313
PISO 4						
0,12	0,12	2,70	2	**100%**	**0,08**	MURO BUITRO - HAB 413
0,12	0,12	2,10	2	**100%**	**0,06**	WC PRINCIPAL HALL
SOTANO						
0,12	0,12	2,77	4	**100%**	**0,16**	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
0,12	0,12	2,77	1	**100%**	**0,04**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
0,12	0,12	2,77	1	**100%**	**0,04**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
0,12	0,12	2,77	1	**100%**	**0,04**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
0,12	0,12	2,77	3	**100%**	**0,12**	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	**8,53**	**Cantidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**7,14**	**Cantidad**
PRESENTE ACTA	**1,39**	**Cantidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 85	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
2,66	0,12	0,12	1	**100%**	**0,04**	ANTEPECHO FARMACIA - FACHADA NOROCCIDENTAL
4,36	0,12	0,12	1	**100%**	**0,06**	AUDITORIO
3,15	0,12	0,12	1	**100%**	**0,05**	PERSONAL ASISTENCIAL
4,81	0,12	0,12	1	**100%**	**0,07**	PERSONAL ASISTENCIAL
3,60	0,12	0,12	1	**100%**	**0,05**	CAFETERIA
TERRAZA						
6,50	0,12	0,12	1	**100%**	**0,09**	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
1,77	0,12	0,12	1	**100%**	**0,03**	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
SOTANO						
6,96	0,12	0,12	2	**100%**	**0,20**	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
0,85	0,12	0,12	1	**100%**	**0,01**	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
0,46	0,12	0,12	1	**100%**	**0,01**	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
2,85	0,12	0,12	1	**100%**	**0,04**	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE
1,00	0,12	0,12	1	**100%**	**0,01**	SUBESTACIÓN: PUERTA
5,08	0,12	0,12	1	**100%**	**0,07**	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
1,24	0,12	0,12	1	**100%**	**0,02**	SUBESTACIÓN: MUROS FRENTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	**0,75**	**Metro cubico**
ACUMULADO ANTERIOR	**0,39**	**Metro cubico**
PRESENTE ACTA	**0,36**	**Metro cubico**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 87	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
		PISO 1				
	4,12	2,70	1	100%	11,12	AUDITORIO
	4,57	2,70	1	100%	12,34	WC PERSONAL ASISTENCIAL
	0,80	2,10	-2	100%	-3,36	DESCUENTO PUERTAS
	2,91	2,70	1	100%	7,86	PERSONAL ASISTENCIAL
	3,36	2,70	1	100%	9,07	CAFETERIA
	3,90	3,00	1	100%	11,70	RX - C. DISPARO
	2,42	1,00	1	100%	2,42	ANTEPECHO - FARMACIA COSTADO NOROCCIDENTAL
		PISO 3				
	1,00	2,60	1	100%	2,60	BUITRON COLINDANTE ORATORIO
	2,50	2,70	1	100%	6,75	BUITRON HABITACIÓN 313
		PISO 4				
	3,00	2,70	1	100%	8,10	BUITRON HABITACIÓN 413
		TERRAZA				
	10,21	2,23	1	100%	22,77	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
		SÓTANO				
	6,96	2,77	2	100%	38,56	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
	6,96	0,15	-2	100%	-2,09	DESCUENTO VIGUETA
	0,15	2,77	-4	100%	-1,66	DESCUENTO COLUMNETAS
	0,85	2,77	1	100%	2,35	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
	0,85	0,15	-1	100%	-0,13	DESCUENTO VIGUETA
	0,46	2,77	1	100%	1,27	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
	0,46	0,15	-1	100%	-0,07	DESCUENTO VIGUETA
	3,85	2,77	1	100%	10,66	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
	1,00	2,30	-1	100%	-2,30	DESCUENTO PUERTA
	2,85	0,15	-1	100%	-0,43	DESCUENTO VIGUETA
	0,15	2,77	-1	100%	-0,42	DESCUENTO COLUMNETA
	1,00	0,15	-1	100%	-0,15	DESCUENTO DINTEL
	5,08	2,77	1	100%	14,07	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
	5,08	0,15	-1	100%	-0,76	DESCUENTO VIGUETA
	0,15	2,77	-3	100%	-1,25	DESCUENTO COLUMNETAS
	1,24	2,77	1	100%	3,43	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
	1,24	0,15	-1	100%	-0,19	DESCUENTO VIGUETA

OBSERVACIONES:

TOTAL	152,29	Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	91,37	Metro cuadrado
PRESENTE ACTA	60,92	Metro cuadrado

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO PARA VARILLA 3/8" X 15 CM CON HILTI RE500V3 O SIMILAR. EL ACERO SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
URBANISMO						
N/A	N/A	N/A	26	100%	26,00	MURO CONCRETO - ENTRADA PARQUEADERO
N/A	N/A	N/A	27	100%	27,00	MURO CONCRETO - ENTRADA PARQUEADERO
N/A	N/A	N/A	13	100%	13,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	3	100%	3,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	10	100%	10,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	10	100%	10,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	11	100%	11,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	29	100%	29,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	40	100%	40,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	24	100%	24,00	MURO CONCRETO - JARDINERA EXTERIO AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	34	100%	34,00	MURO CONCRETO - EXTERIOR DEBAJO DE SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA
N/A	N/A	N/A	68	100%	68,00	MURO CONCRETO - ROTONDA ESTATUA ANDÉN
PISO 1						
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	COLUMNETA - ANTEPECHO FARMACIA (COSTADO NOROCCIDENTAL)
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	COLUMNETA - AUDITORIO
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	COLUMNETA - PERSONAL ASISTENCIA
N/A	N/A	N/A	10	100%	10,00	COLUMNETA - WC PERSONAL ASISTENCIA ASISTECIAL
N/A	N/A	N/A	4	100%	4,00	COLUMNETA - CAFETERIA
PISO 3						
N/A	N/A	N/A	4	100%	4,00	COLUMNETA - BUITRON ORATORIO
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	COLUMNETA - WC SOCIALES HOSPITALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	8	100%	8,00	COLUMNETA - HAB 313
PISO 4						
N/A	N/A	N/A	4	100%	4,00	COLUMNETA - WC SOCIALES HOSPITALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	4	100%	4,00	COLUMNETA - HAB 413
TERRAZA						
N/A	N/A	N/A	14	100%	14,00	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
N/A	N/A	N/A	357	100%	357,00	DADOS DE SOPORTE PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN: RECTANGULARES
N/A	N/A	N/A	28	100%	28,00	DADOS DE SOPORTE PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN: CUADRADOS
SOTANO						
N/A	N/A	N/A	8	100%	8,00	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
N/A	N/A	N/A	2	100%	2,00	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
N/A	N/A	N/A	6	100%	6,00	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	**756,00**	**Cantidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**736,00**	**Cantidad**
PRESENTE ACTA	**20,00**	**Cantidad**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 92	PAÑETE LISO MUROS 1:4	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



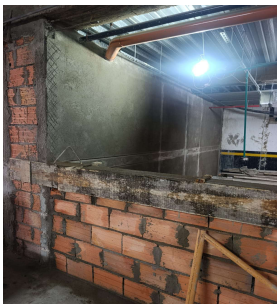

	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1							
		4,12	2,70	2	**100%**	**22,25**	AUDITORIO
		4,57	2,70	2	**100%**	**24,68**	WC PERSONAL ASISTENCIAL
		0,8	2,10	-4	**100%**	**-6,72**	DESCUENTO PUERTAS
		2,91	2,70	2	**100%**	**15,71**	PERSONAL ASISTENCIAL
		3,36	2,70	2	**100%**	**18,14**	CAFETERIA
		3,9	3,00	2	**100%**	**23,40**	RX - C. DISPARO
		2,42	1,00	2	**100%**	**4,84**	ANTEPECHO - FARMACIA COSTADO NOROCCIDENTAL
PISO 3							
		1,00	2,6	2	**100%**	**5,20**	BUITRON COLINDANTE ORATORIO
		2,50	2,7	2	**100%**	**13,50**	BUITRON HABITACIÓN 313
PISO 4							
		3,00	2,7	2	**100%**	**16,20**	BUITRON HABITACIÓN 413
TERRAZA							
		10,21	2,23	2	**100%**	**45,54**	BUITRON DUCTOS VENTILACIÓN
SOTANO							
		6,96	2,77	2	**100%**	**38,56**	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
		0,85	2,77	1	**100%**	**2,35**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
		0,46	2,77	1	**100%**	**1,27**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
		3,85	2,77	1	**100%**	**10,66**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE
		1,00	2,30	-1	**100%**	**-2,30**	DESCUENTO PUERTA
		5,08	2,77	1	**100%**	**14,07**	SUBESTACIÓN: MUROS LATERALES/DIVISORIOS
		1,24	2,77	1	**100%**	**3,43**	SUBESTACIÓN: MURO FRENTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	**250,80**	**Metro cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**182,74**	**Metro cuadrado**
PRESENTE ACTA	**68,06**	**Metro cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 104	CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28DIAS, ASENTAMIENTO 10 CM +/- 2.5CM (MR 36 NORMAL) (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
URBANISMO						
4,25	4,25	0,20	1	100%	**3,61**	LOSA 1
4,74	4,25	0,20	1	100%	**4,03**	LOSA 2
2,40	4,25	0,20	1	100%	**2,04**	LOSA 3
2,72	4,18	0,20	1	100%	**2,27**	LOSA 4
3,07	5,06	0,20	1	100%	**3,11**	LOSA 5
5,21	2,10	0,20	1	100%	**2,19**	LOSA 6
1,40	1,33	0,20	1	100%	**0,37**	LOSA 7
2,40	3,50	0,20	1	100%	**1,68**	LOSA 8
2,50	3,50	0,20	1	100%	**1,75**	LOSA 9
1,80	2,06	0,20	1	100%	**0,74**	LOSA 10
3,50	2,25	0,20	1	100%	**1,58**	LOSA 11
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 12
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 13
3,50	3,04	0,20	1	100%	**2,13**	LOSA 14
3,50	2,10	0,20	1	100%	**1,47**	LOSA 15
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 16
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 17
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 18
0,95	1,00	0,20	1	100%	**0,19**	LOSA 19
3,50	1,90	0,20	1	100%	**1,33**	LOSA 20
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 21
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 22
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 23
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 24
0,72	NA	0,20	-1	100%	**-0,08**	DESCUENTO MH
1,34	3,50	0,20	1	100%	**0,94**	LOSA 25
1,34	3,50	0,20	1	100%	**0,94**	LOSA 26
1,14	3,50	0,20	1	100%	**0,80**	LOSA 27
1,14	3,50	0,20	1	100%	**0,80**	LOSA 28
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 29
0,72	NA	0,20	-1	100%	**-0,08**	DESCUENTO MH
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 30
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 31
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 32
2,80	2,10	0,20	1	100%	**1,18**	LOSA 33
2,80	2,10	0,20	1	100%	**1,18**	LOSA 34
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 35
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 36
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 37
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 38
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 39
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 40
0,72	NA	0,20	-1	100%	**-0,08**	DESCUENTO MH
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 41
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 42
3,65	2,44	0,20	1	100%	**1,78**	LOSA 43
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,65	2,05	0,20	1	100%	**1,50**	LOSA 44
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
2,00	3,50	0,20	1	100%	**1,40**	LOSA 45
0,96	0,96	0,20	-1	100%	**-0,18**	DESCUENTO POR CAJA ELECTRICA
2,00	2,62	0,20	1	100%	**1,05**	LOSA 46
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 47
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 48
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 49
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 50
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 51
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 52
3,00	2,50	0,20	1	100%	**1,50**	LOSA 53
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 54
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 55
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 56
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 57
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 58
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 59
0,72	NA	0,20	-1	100%	**-0,08**	DESCUENTO MH
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 60
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 61
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 62
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 63
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 64
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 65
0,72	NA	0,20	-1	100%	**-0,08**	DESCUENTO MH
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 66
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 67
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 68
3,50	3,50	0,20	1	100%	**2,45**	LOSA 69
3,50	1,27	0,20	1	100%	**0,89**	LOSA 70 trapesoidal
3,50	2,37	0,20	1	100%	**1,66**	LOSA 71 trapesoidal
2,70	2,54	0,20	1	100%	**1,37**	LOSA 72
2,70	3,50	0,20	1	100%	**1,89**	LOSA 73
0,92	0,53	0,20	-1	100%	**-0,10**	DESCUENTO SUMIDERO
2,70	2,54	0,20	1	100%	**1,37**	LOSA 74
2,70	3,50	0,20	1	100%	**1,89**	LOSA 75
1,20	1,20	0,20	1	100%	**0,14**	LOSA 76 triangular

OBSERVACIONES:

TOTAL	**154,07**	**Metro cubico**
ACUMULADO ANTERIOR	**75,96**	**Metro cubico**
PRESENTE ACTA	**78,11**	**Metro cubico**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	Peso (kg/m2	Cantidad	%		
URBANISMO						
2,40	4,25	4,67	2	100%	95,34	LOSA 3
2,72	4,18	4,67	2	100%	106,28	LOSA 4
3,07	5,06	4,67	2	100%	145,21	LOSA 5
5,21	2,10	4,67	2	100%	102,27	LOSA 6
1,40	1,33	4,67	2	100%	17,41	LOSA 7
2,40	3,50	4,67	2	100%	78,52	LOSA 8
2,50	3,50	4,67	2	100%	81,79	LOSA 9
1,80	2,06	4,67	2	100%	34,66	LOSA 10
3,50	2,25	4,67	2	100%	73,61	LOSA 11
3,50	3,04	4,67	2	100%	99,46	LOSA 14
3,50	2,10	4,67	2	100%	68,70	LOSA 15
0,95	1,00	4,67	2	100%	8,88	LOSA 19
3,50	1,90	4,67	2	100%	62,16	LOSA 20
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 22
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 23
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 24
0,72	NA	4,67	-2	100%	-3,60	DESCUENTO MH
1,34	3,50	4,67	2	100%	43,84	LOSA 25
1,34	3,50	4,67	2	100%	43,84	LOSA 26
1,14	3,50	4,67	2	100%	37,30	LOSA 27
1,14	3,50	4,67	2	100%	37,30	LOSA 28
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 29
0,72	NA	4,67	-2	100%	-3,60	DESCUENTO MH
2,80	2,10	4,67	2	100%	54,96	LOSA 33
2,80	2,10	4,67	2	100%	54,96	LOSA 34
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 35
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 36
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 40
0,72	NA	4,67	-2	100%	-3,60	DESCUENTO MH
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 42
3,65	2,44	4,67	2	100%	83,25	LOSA 43
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,65	2,05	4,67	2	100%	69,94	LOSA 44
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
2,00	3,50	4,67	2	100%	65,43	LOSA 45
0,96	0,96	4,67	-2	100%	-8,61	DESCUENTO POR CAJA ELECTRICA
2,00	2,62	4,67	2	100%	48,98	LOSA 46
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 47
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 48
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 51
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,00	2,50	4,67	2	100%	70,11	LOSA 53
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 54
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 55
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 58
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 59
0,72	NA	4,67	2	100%	3,60	DESCUENTO MH
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 65
0,72	NA	4,67	-2	100%	-3,60	DESCUENTO MH
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 66
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	3,50	4,67	2	100%	114,51	LOSA 67
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
3,50	1,27	4,67	2	100%	41,55	LOSA 70 trapesoidal
3,50	2,37	4,67	2	100%	77,54	LOSA 71 trapesoidal
2,70	2,54	4,67	2	100%	64,11	LOSA 72
2,70	3,50	4,67	2	100%	88,33	LOSA 73
0,92	0,53	4,67	-2	100%	-4,56	DESCUENTO SUMIDERO
2,70	2,54	4,67	2	100%	64,11	LOSA 74
2,70	3,50	4,67	2	100%	88,33	LOSA 75
1,20	1,20	4,67	2	100%	6,73	LOSA 76 triangular

OBSERVACIONES:

TOTAL	3.988,25	Kilogramo
ACUMULADO ANTERIOR	1.933,34	Kilogramo
PRESENTE ACTA	2.054,91	Kilogramo

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	NP 117	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

















Dimensiones							Total (Un)	Observaciones
Longitud (m)	Ancho (m)	Peso x metro	Peso x m2	Peso x und	Cantidad (und)	(%)		
							394,41	FACHADA SUR OCCIDENTAL
								FAJA INTERNA SUPERIOR
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			8	100%	6,92	VERTICALES
0,55		3,09			7	100%	11,90	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			8	100%	6,92	VERTICALES
0,29		3,09			16	100%	14,34	SALIENTE
								FAJA INTERNA INTERNA
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			8	100%	6,92	VERTICALES
0,55		3,09			7	100%	11,90	DIAGONALES
								FAJA INTERNA EXTERNA
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,09		3,09			1	100%	12,64	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			8	100%	6,92	VERTICALES
0,29		3,09			16	100%	14,34	SALIENTE
								FAJA VERTICAL INTERNA
5,66		3,09			2	100%	34,98	VERTICALES
1,37		3,09			10	100%	42,33	HORIZANTALES
1,46		3,09			9	100%	40,60	DIAGONALES
								FAJA VERTICAL EXTERNA
5,66		3,09			2	100%	34,98	VERTIALES
1,37		3,09			10	100%	42,33	HORIZANTALES
0,29		3,09			20	100%	17,92	SALIENTE
							11,83	SOLDADURA (3%)
							110,50	FACHADA OCCIDENTAL TRAMO 1
								FAJA INTERNA SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL INFERIOR
0,15		3,09			11	100%	5,10	VERTICALES
0,36		3,09			10	100%	11,12	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL INFERIOR
0,14		3,09			22	100%	9,52	VERTICALES
0,13		3,09			11	100%	4,42	SALIENTE
							3,31	SOLDADURA (3%)
							232,65	FACHADA OCCIDENTAL TRAMO 1
								FAJA INTERNA SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			14	100%	12,11	VERTICALES
0,55		3,09			10	100%	17,00	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL SUPERIOR
6,5		3,09			1	100%	20,09	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			12	100%	10,38	VERTICALES
0,29		3,09			26	100%	23,30	SALIENTE
								FAJA VERTICAL INTERNA
4		3,09			2	100%	24,72	VERTICALES
0,28		3,09			8	100%	6,92	HORIZANTALES
0,55		3,09			7	100%	11,90	DIAGONALES
								FAJA VERTICAL EXTERNA
4		3,09			2	100%	24,72	VERTIALES
0,28		3,09			8	100%	6,92	HORIZANTALES
0,29		3,09			16	100%	14,34	SALIENTE
							6,98	SOLDADURA (3%)
							1.036,14	FACHADA OCCIENTAL TRAMO 3 FAJA SUPERIOR E INFERIOR
								FAJA INTERNA SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			44	100%	38,07	VERTICALES
0,55		3,09			40	100%	67,98	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			44	100%	38,07	VERTICALES
0,29		3,09			84	100%	75,27	SALIENTE
								FAJA VERTICAL DERECHA INTERNA
1,5		3,09			4	100%	18,54	VERTICALES
0,28		3,09			8	100%	6,92	HORIZANTALES
								FAJA VERTICAL DERECHA EXTERNA
1,5		3,09			4	100%	18,54	VERTIALES
0,28		3,09			6	100%	5,19	HORIZANTALES
0,29		3,09			16	100%	14,34	SALIENTE
								FAJA INTERNA SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL INFERIOR
0,18		3,09			44	100%	24,47	VERTICALES
0,48		3,09			40	100%	59,33	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL SUPERIOR
12		3,09			2	100%	74,16	LONGITUDINAL INFERIOR
0,18		3,09			44	100%	24,47	VERTICALES
0,19		3,09			88	100%	51,66	SALIENTE
							31,08	SOLDADURA (3%)
							168,40	FACHADA SUR
								FAJA INTERNA SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			9	100%	3,62	VERTICALES
0,55		3,09			6	100%	10,20	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			8	100%	3,21	VERTICALES
0,14		3,09			16	100%	6,92	SALIENTE
								FAJA INTERNA INFERIOR
4,59		3,09			1	100%	14,18	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,59		3,09			1	100%	14,18	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			10	100%	4,02	VERTICALES
0,55		3,09			7	100%	11,90	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA INFERIOR
4,59		3,09			1	100%	14,18	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,59		3,09			1	100%	14,18	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			10	100%	4,02	VERTICALES
0,14		3,09			20	100%	8,65	SALIENTE
0,2		4,7			12	100%	8,46	SOPORTERIA ANGULO
							5,05	SOLDADURA (3%)
							168,62	FACHADA OCCIDENTAL ZONA 4
								FAJA INTERNA SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			8	100%	3,21	VERTICALES
0,55		3,09			7	100%	11,90	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL SUPERIOR
4,1		3,09			1	100%	12,67	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			8	100%	3,21	VERTICALES
0,14		3,09			16	100%	6,92	SALIENTE
								FAJA INTERNA INFERIOR
5,05		3,09			1	100%	15,60	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,05		3,09			1	100%	15,60	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			10	100%	4,02	VERTICALES
0,55		3,09			8	100%	13,60	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA INFERIOR
5,05		3,09			1	100%	15,60	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,05		3,09			1	100%	15,60	LONGITUDINAL INFERIOR
0,13		3,09			10	100%	4,02	VERTICALES
0,14		3,09			20	100%	8,65	SALIENTE
							5,06	SOLDADURA (3%)
							519,24	FACHADA OCCIDENTAL ZONA 3
								FAJA INTERNA SUPERIOR
5,75		3,09			2	100%	35,54	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,75		3,09			2	100%	35,54	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			20	100%	17,30	VERTICALES
0,55		3,09			18	100%	30,59	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
5,75		3,09			2	100%	35,54	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,75		3,09			2	100%	35,54	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			22	100%	19,03	VERTICALES
0,29		3,09			44	100%	39,43	SALIENTE
								FAJA INTERNA INFERIOR
5,35		3,09			2	100%	33,06	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,35		3,09			2	100%	33,06	LONGITUDINAL INFERIOR
0,18		3,09			20	100%	11,12	VERTICALES
0,55		3,09			18	100%	30,59	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA INFERIOR
5,35		3,09			2	100%	33,06	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,35		3,09			2	100%	33,06	LONGITUDINAL INFERIOR
0,18		3,09			20	100%	11,12	VERTICALES
0,19		3,09			40	100%	23,48	SALIENTE
								FAJA VERTICAL INTERNA
2,18		3,09			2	100%	13,47	VERTICALES
0,28		3,09			10	100%	8,65	HORIZANTALES












								FAJA VERTICAL EXTERNA
2,18		3,09			2	100%	13,47	VERTIALES
0,28		3,09			10	100%	8,65	HORIZANTALES
0,29		3,09			20	100%	17,92	SALIENTE
							15,58	**SOLDADURA (3%)**
							611,20	**FACHADA OCCIDENTAL ZONA 5**
								FAJA INTERNA SUPERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL SUPERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			25	100%	21,63	VERTICALES
0,55		3,09			24	100%	40,79	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL SUPERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			25	100%	21,63	VERTICALES
0,29		3,09			50	100%	44,81	SALIENTE
								FAJA INTERNA INFERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL SUPERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			25	100%	21,63	VERTICALES
0,55		3,09			24	100%	40,79	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA INFERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL SUPERIOR
14,3		3,09			1	100%	44,19	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			25	100%	21,63	VERTICALES
0,29		3,09			50	100%	44,81	SALIENTE
							18,34	**SOLDADURA (3%)**
							260,23	**FACHADA OCCIDENTAL ZONA 6**
								FAJA INTERNA SUPERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			11	100%	9,52	VERTICALES
0,55		3,09			9	100%	15,30	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA SUPERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			11	100%	9,52	VERTICALES
0,29		3,09			22	100%	19,71	SALIENTE
								FAJA INTERNA INFERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			11	100%	9,52	VERTICALES
0,55		3,09			9	100%	15,30	DIAGONALES
								FAJA EXTERNA INFERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL SUPERIOR
5,75		3,09			1	100%	17,77	LONGITUDINAL INFERIOR
0,28		3,09			11	100%	9,52	VERTICALES
0,29		3,09			22	100%	19,71	SALIENTE
							7,51	**SOLDADURA (3%)**
							455,55	**ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO**
								COSTADO SUR ZONA 5 AL INTERIOR DE UCI NEONATAL
4,3		4,71			2	100%	40,51	LONGITUDINAL
6,7		4,71			2	100%	63,11	LONGITUDINAL
3,82		4,71			2	100%	35,98	LONGITUDINAL
2,65		4,71			2	100%	24,96	LONGITUDINAL
0,45		4,71			46	100%	97,50	TEE DE SALIDA A LA ESTRUCTURA
								COSTADO SUR ZONA 3 AL INTERIOR DE RECUPERACION QUIRURGICA
6,6		4,71			2	100%	62,17	LONGITUDINAL
0,9		4,71			2	100%	8,48	LONGITUDINAL
1,4		4,71			2	100%	13,19	LONGITUDINAL
0,45		4,71			18	100%	38,15	TEE DE SALIDA A LA ESTRUCTURA
5,34		4,71			2	100%	50,30	LONGITUDINAL
0,45		4,71			10	100%	21,20	TEE DE SALIDA A LA ESTRUCTURA
							13,67	**SOLDADURA (3%)**
							328,71	**COSTADO NORTE ZONA 3 AL INTERIOR DE UCI PEDIATRICA Y SOBRE CUBIERTA DE AMPLIACION**
16,54		4,71			1	100%	77,90	LONGITUDINAL
0,45		4,71			20	100%	42,39	TEE DE SALIDA A LA ESTRUCTURA
35,25		4,71			1	100%	166,03	LONGITUDINAL
0,45		4,71			20	100%	42,39	TEE DE SALIDA A LA ESTRUCTURA
							9,86	**SOLDADURA (3%)**
							350,89	**ESTRUCTURA PARA SUPERBOARD EN ACCESO PRINCIPAL**
6,45		9,36			1	100%	60,37	HORIZONTAL SUPERIOR
3,09		9,36			1	100%	28,92	VERTICAL 1
2,93		9,36			1	100%	27,42	VERTICAL 2
2,54		9,36			1	100%	23,77	VERTICAL 3
2		9,36			1	100%	18,72	VERTICAL 4
1,65		9,36			1	100%	15,44	VERTICAL 5
1,51		9,36			1	100%	14,13	VERTICAL 6
3,24		9,36			2	100%	60,65	INFERIOR TRAMO 1
3,45		9,36			2	100%	64,58	INFERIOR TRAMO 2
0,2		9,36			6	100%	11,23	ZAPATO SALIENTE
0,4		1,56			32	100%	19,97	ANCLAJE VARILLA ROSCADA 5/8"
1		0,06			64	100%	3,84	TUERCA
1		0,0264			64	100%	1,82	ARANDELA
							10,53	**SOLDADURA (3%)**
							694,28	**ENCAJONAMIENTO VENTILACION FACHADA NORTE**
8,75		3,09			8	100%	216,30	VERTICALES
5,87		3,09			18	100%	326,49	HORIZONTALES
0,47		3,09			2	100%	2,90	SALIENTE LATERAL DERECHO
0,95		3,09			1	100%	2,94	
1,3		3,09			5	100%	20,09	
0,85		3,09			16	100%	42,02	SALIENTE LATERAL IZQUIRDO
1		3,09			12	100%	37,08	
1,05		3,09			2	100%	6,49	CAJON INFERIOR IZQUIERDO
0,95		3,09			3	100%	8,81	
0,2		1,56			28	100%	8,74	ANCLAJE VARILLA ROSCADA 5/8"
1		0,06			28	100%	1,68	TUERCA
1		0,0264			28	100%	0,80	ARANDELA
0,3		4,75			14	100%	19,95	
							20,83	**SOLDADURA (3%)**
							7.187,45	**ESTRUCTRA DE PERGOLA**
0,8	0,8		125,51		2	100%	160,65	Platina de 40cm x 40cm de 5/8"
0,4		1,56			24	100%	14,98	Perno de 3/4" x 40 cm
				0,1	48	100%	4,80	Tuerca de 3/4"
				0,035	48	100%	1,68	Arandela de 3/4"
5,94		59,25			1	100%	351,95	Columna sur oriental de 10" x 10 mm
5,33		59,25			1	100%	315,80	Columna sur occidental de 10" x 10 mm
4,24		59,25			1	100%	251,22	Columna nororiental de 10" x 10 mm
4,21		59,25			1	100%	249,44	Columas noroccidental de 10" x 10 mm
9,45		19,11			1	100%	180,59	Angulo de 4" x 1/4"
0,6	0,4		70,61		6	100%	101,68	Platinas de soporte en parte superior de las columnas 9mm
2,78		24,71			1	100%	192,24	Platina frontal pergola sur 9mm
7,78		17,65			8	100%	1.098,54	platinas horizontales pergola sur 9mm
8,75		17,65			10	100%	1.544,38	platinas transversales pergola sur 9mm
6,7		24,71			1	100%	165,56	Platina frontal pergola norte 9mm
6,7		17,65			9	100%	1.064,30	platinas horizontales pergola norte 9mm
10,55		17,65			8	100%	1.489,66	platinas transversales pergola norte 9mm
							215,62	**SOLDADURA (3%)**
							167,87	**CARCAMO INGRESO A SOTANO**
4,6		3,53			2	100%	32,48	Marco longitudinal
0,5		3,53			2	100%	3,53	Marco transversal
0,5		2,235			118	100%	131,87	Rejilla intermedia
							5,04	**SOLDADURA (3%)**
							384,00	**PLATINAS DE SOPORTE DE LAMINAS HUNTER**
0,3		6,4			200	100%	384,00	Platina de 30 cm de largo de 2 1/2" de ancho por 1/2" de espesor
							11,52	**SOLDADURA (3%)**
							385,55	**ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TORRES DE VIDA**
0,55		12,17			4	100%	26,77	Tubular de 100 x 100 x 4 mm en UCI PEDIATRICA 1-3-5 Y 7
0,32		3,8			4	100%	4,86	Tubular de 50 x 50 x 2,5 mm. en UCI PEDIATRICA 1-3-5 Y 7
2,16		12,17			6	100%	157,72	Tubular de 100 x 100 x 4 mm en UCI PEDIATRICA 2-4-6-8-10 Y 12
0,9		3,8			12	100%	41,04	Tubular de 50 x 50 x 2,5 mm en UCI PEDIATRICA 2-4-6-8-10 Y 12
1,73		12,17			1	100%	21,05	Tubular de 100 x 100 x 4 mm en UCI PEDIATRICA 9
0,35		3,8			1	100%	1,33	Tubular de 50 x 50 x 2,5 mm. en UCI PEDIATRICA 9
2,21		12,17			1	100%	26,90	Tubular de 100 x 100 x 4 mm en UCI PEDIATRICA 11
0,1	0,2		49,79		4	100%	3,98	platina de soporte de 1/4" laterales
0,2	0,17		49,79		2	100%	3,39	platina de soporte de 1/4" inferior
0,92		7,7			1	100%	7,08	Tubular de 100 x 100 x 2.5 mm en UARO 1
0,85		3			1	100%	2,55	Tubular de 40 x 40 x 2.5 mm en UARO 1
0,1	0,2		49,79		16	100%	15,93	platina de soporte de 1/4" laterales
0,2	0,17		49,79		8	100%	13,54	platina de soporte de 1/4" inferior
1,04		7,7			4	100%	32,03	Tubular de 100 x 100 x 2.5 mm en UARO 2-3-4-5
0,85		3			4	100%	10,20	Tubular de 40 x 40 x 2.5 mm en UARO 2-3-4-5
0,1	0,2		49,79		4	100%	3,98	platina de soporte de 1/4" laterales
0,2	0,17		49,79		2	100%	3,39	platina de soporte de 1/4" inferior
0,94		7,7			1	100%	7,24	Tubular de 100 x 100 x 2.5 mm en UARO6
0,85		3			1	100%	2,55	Tubular de 40 x 40 x 2.5 mm en UARO 6
							11,57	**SOLDADURA (3%)**

OBSERVACIONES:

TOTAL	**13.849,05**	**Kilogramo**
ACUMULADO ANTERIOR	**4.765,33**	**Kilogramo**
PRESENTE ACTA	**9.083,72**	**Kilogramo**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 119	MURO UNA CARA DE E = 0.10 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA NOR OCCIDENTAL						
5,66	1,37		1	**100%**	**7,75**	VÓLUMEN ENTRE 2DO Y 3ER PISO
FACHADA NORTE						
5,97	8,74		1	**100%**	**52,18**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
0,95	8,74		1	**100%**	**8,30**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
0,95	8,74		1	**100%**	**8,30**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
5,97	0,95		1	**100%**	**5,67**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
5,97	0,95		1	**100%**	**5,67**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4

OBSERVACIONES:

TOTAL	**87,88**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**7,75**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**80,13**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 120	FAJA HASTA 60 CM MURO UNA CARA DE E = 0.10 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM EN FACHADA MAYOR A 3 METROS	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	Cant (und)	# Caras (und)	%		
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
1,10		5	2	100%	11,00	VERTICAL: TAPAS LATERALES
2,22		4	1	100%	8,88	HORIZONTAL: TAPA FRENTE
2,22		6	1	100%	13,32	HORIZONTAL: TAPA SUPERIOR E INFERIOR
1,10		2	1	100%	2,20	HORIZONTAL: TAPA SUPERIOR E INFERIOR
0,40		2	1	100%	0,80	VERTICAL: TAPAS LATERALES
FACHADA OCCIDENTAL						
2,15		2	3	100%	12,90	ENTRE EJES: A - A' (HORIZONTAL: SUPERIOR - PEQUEÑA)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: HORZONTAL SUPERIOR)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: HORIZONTAL INFERIOR)
1,28		2	3	100%	7,68	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: VERTICAL IZQUIERDA)
1,51		1	3	100%	4,53	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: VERTICAL DERECHA)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: HORZONTAL SUPERIOR)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: HORIZONTAL INFERIOR)
1,28		2	3	100%	7,68	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: VERTICAL IZQUIERDA)
1,51		1	3	100%	4,53	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: VERTICAL DERECHA)
0,80		1	3	100%	2,40	ENTRE EJES: D - E (HORIZONTAL SUPERIOR)
2,15		3	3	100%	19,35	
2,40		1	3	100%	7,20	EJE E: VERTICAL
2,15		1	3	100%	6,45	
2,15		3	3	100%	19,35	ENTRE EJES: E - F (HORIZONTAL: SUPERIOR - PEQUEÑA)
2,22		7	3	100%	46,62	ENTRE EJES: F - H (HORIZONTAL: SUPERIOR)
2,22		7	3	100%	46,62	ENTRE EJES: F - H (HORIZONTAL: INFERIOR)
1,51		4	3	100%	18,12	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: VERTICALES INTERNOS)
1,51		4	3	100%	18,12	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: VERTICALES INTERNOS)
1,37		3	3	100%	12,33	EJE A: SOBRE ESCALERAS DE EMERGENCIAS QUE VIENE DE 3R P (DIAGONAL)
1,64		3	3	100%	14,76	
1,64		3	3	100%	14,76	
FACHADA SUR						
1,95		3	3	100%	17,55	ENTRE EJES: 8 - 9 (HORIZONTAL: SUPERIOR)
1,95		3	3	100%	17,55	ENTRE EJES: 8 - 9 (HORIZONTAL: INFERIOR)
0,40		2	1	100%	0,80	ENTRE EJES: 8 (HORIZONTAL: SUPERIOR E INFERIOR)
FACHADA NORTE						
1,80		3	3	100%	16,20	EJE 9: SOBRE ESCALERAS DE EMERGENCIAS QUE VIENE DE 3R P (DIAGONAL)
1,58		3	3	100%	14,22	
1,13		3	3	100%	10,17	
4,60		1	3	100%	13,80	ENTRE EJES 4-7
4,00		1	3	100%	12,00	ENTRE EJES 4-8

OBSERVACIONES:

TOTAL	**608,29**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**501,78**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**106,51**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 121	CONSTRICCIÓN DE DILATACION EN C, INCLUYE SELLO CON TEXJOINT JUNTAS O SIMILAR	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	Cant (und)	# Caras (und)	%		
FACHADA OCCIDENTAL						
0,40		6	3	100%	7,20	ENTRE EJES: F - H (HORIZONTAL: SUPERIOR)
0,40		6	3	100%	7,20	ENTRE EJES: F - H (HORIZONTAL: INFERIOR)
0,40		7	3	100%	8,40	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN PISO 3: HORIZONTAL SUPERIOR)
0,29		7	3	100%	6,09	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN PISO 3: HORIZONTAL INFERIOR)
0,40		1	3	100%	1,20	EJE: A' (SECCIÓN PISO 3: VERTICAL)
0,40		7	3	100%	8,40	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN PISO 2: HORIZONTAL SUPERIOR)
0,29		7	3	100%	6,09	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN PISO 2: HORIZONTAL INFERIOR)
0,40		1	3	100%	1,20	EJE: A' (SECCIÓN PISO 2: VERTICAL)
0,30		2	3	100%	1,80	ENTRE EJES: A - A' (TRAMO DIAGONAL)
0,30		1	3	100%	0,90	ENTRE EJES: A - A' (TRAMO TRAMO SUPERIOR)
0,40		3	3	100%	3,60	ENTRE EJES: D - E (TRAMO SUPERIOR)
0,40		1	3	100%	1,20	EJE: E (TRAMO VERTICAL)
0,30		2	3	100%	1,80	ENTRE EJE: E - F (TRAMO SUPERIOR)
FACHADA SUR						
0,40		2	3	100%	2,40	ENTRE EJES: 8 - 9 (HORIZONTAL: SUPERIOR)
0,40		2	3	100%	2,40	ENTRE EJES: 8 - 9 (HORIZONTAL: INFERIOR)
FACHADA NORTE						
8,74		3	1	100%	26,22	VÓLUMEN DE DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
5,97		3	1	100%	17,91	VÓLUMEN DE DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
0,95		2	5	100%	9,50	VÓLUMEN DE DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
0,30		1	3	100%	0,90	ENTRE EJES: 8-9 (TRAMO SUPERIOR)
0,39		1	2	100%	0,78	ENTRE EJES: 8-9 (TRAMO SUPERIOR - ESQUINA)
0,30		2	3	100%	1,80	ENTRE EJES: 8-9 (TRAMO SUPERIOR)
FACHADA NOROCCIDENTAL						
0,40		1	3	100%	1,20	ENTRE EJES: 8 - 9 (TRAMO SUPERIOR)
0,56		1	2	100%	1,12	ENTRE EJES: 8 - 9 (TRAMO SUPERIOR - ESQUINA)
0,40		1	3	100%	1,20	ENTRE EJES: 8 - 9 (TRAMO INFERIOR)
0,56		1	2	100%	1,12	ENTRE EJES: 8 - 9 (TRAMO INFERIOR - ESQUINA)
1,37		6	1	100%	8,22	ENTRE EJES: 8 - 9 (TRAMO VERTICAL)
0,40		6	2	100%	4,80	ENTRE EJES: 8 - 9 (TRAMO VERTICAL - LATERALES)

OBSERVACIONES:

TOTAL	**134,65**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**79,15**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**55,50**	**Metro lineal**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA NOR OCCIDENTAL						
5,66	1,37		1	**100%**	**7,75**	VÓLUMEN ENTRE 2DO Y 3ER PISO
FACHADA NORTE						
5,97	8,74		1	**60%**	**31,31**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
0,95	8,74		1	**60%**	**4,98**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
0,95	8,74		1	**60%**	**4,98**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
5,97	0,95		1	**60%**	**3,40**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4
5,97	0,95		1	**60%**	**3,40**	VÓLUMEN PARA DUCTOS: ENTRE EJE 3-4

OBSERVACIONES:

TOTAL	**55,83**	**Cantidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**4,65**	**Cantidad**
PRESENTE ACTA	**51,18**	**Cantidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAJA HASTA 60 CM EN ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
1,10		5	2	100%	11,00	VERTICAL: TAPAS LATERALES
2,22		4	1	100%	8,88	HORIZONTAL: TAPA FRENTE
2,22		6	1	100%	13,32	HORIZONTAL: TAPA SUPERIOR E INFERIOR
1,10		2	1	100%	2,20	HORIZONTAL: TAPA SUPERIOR E INFERIOR
0,40		2	1	100%	0,80	VERTICAL: TAPAS LATERALES
FACHADA OCCIDENTAL						
2,15		2	3	100%	12,90	ENTRE EJES: A - A' (HORIZONTAL: SUPERIOR - PEQUEÑA)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: HORZONTAL SUPERIOR)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: HORIZONTAL INFERIOR)
1,28		2	3	100%	7,68	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: VERTICAL IZQUIERDA)
1,51		1	3	100%	4,53	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: VERTICAL DERECHA)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: HORZONTAL SUPERIOR)
2,15		8	3	100%	51,60	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: HORIZONTAL INFERIOR)
1,28		2	3	100%	7,68	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: VERTICAL IZQUIERDA)
1,51		1	3	100%	4,53	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: VERTICAL DERECHA)
0,80		1	3	100%	2,40	ENTRE EJES: D - E (HORIZONTAL SUPERIOR)
2,15		3	3	100%	19,35	
2,40		1	3	100%	7,20	EJE E: VERTICAL
2,15		1	3	100%	6,45	
2,15		3	3	100%	19,35	ENTRE EJES: E - F (HORIZONTAL: SUPERIOR - PEQUEÑA)
2,22		7	3	100%	46,62	ENTRE EJES: F - H (HORIZONTAL: SUPERIOR)
2,22		7	3	100%	46,62	ENTRE EJES: F - H (HORIZONTAL: INFERIOR)
1,51		4	3	100%	18,12	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN A: VERTICALES INTERNOS)
1,51		4	3	100%	18,12	ENTRE EJES: A' - D (SECCIÓN B: VERTICALES INTERNOS)
1,37		3	3	100%	12,33	EJE A: SOBRE ESCALERAS DE EMERGENCIAS QUE VIENE DE 3R P (DIAGONAL)
1,64		3	3	100%	14,76	
1,64		3	3	100%	14,76	
FACHADA SUR						
1,95		3	3	100%	17,55	ENTRE EJES: 8 - 9 (HORIZONTAL: SUPERIOR)
1,95		3	3	100%	17,55	ENTRE EJES: 8 - 9 (HORIZONTAL: INFERIOR)
0,40		2	1	100%	0,80	ENTRE EJES: 8 (HORIZONTAL: SUPERIOR E INFERIOR)
FACHADA NORTE						
1,80		3	3	100%	16,20	EJE 9: SOBRE ESCALERAS DE EMERGENCIAS QUE VIENE DE 3R P (DIAGONAL)
1,58		3	3	100%	14,22	
1,13		3	3	100%	10,17	
4,60		1	3	100%	13,80	ENTRE EJES 4-7
4,00		1	3	100%	12,00	ENTRE EJES 4-8

OBSERVACIONES:

TOTAL	**608,29**	**Cantidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**255,49**	**Cantidad**
PRESENTE ACTA	**352,80**	**Cantidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA RH COLOR A ELECCIÓN	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL


Registro fotográfico







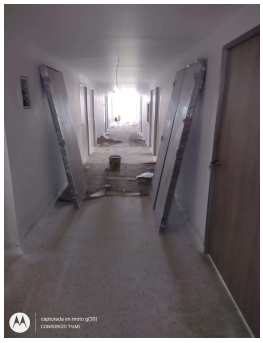

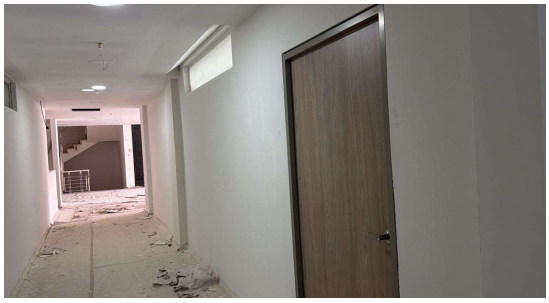

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
	0,9	2,1	1	100%	**1,89**	baño discapacitados sala de espera
	0,9	2,1	1	100%	**1,89**	baño mixto sala espera
	0,9	2,1	1	100%	**1,89**	Control imagenologia
	1	2,1	1	100%	**2,10**	personal asistencial
	0,8	2,1	1	100%	**1,68**	Baño 1 personal asistencial
	0,8	2,1	1	100%	**1,68**	Baño 2 personal asistencial
	0,8	2,1	1	100%	**1,68**	Descanso internos
	0,9	2,1	1	100%	**1,89**	Sonido y UPS
	0,8	2,1	1	100%	**1,68**	Baño mixto cafeteria
	0,9	2,1	1	100%	**1,89**	Baño discapacitados cafeteria
PISO 3						
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 1
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 2
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitación 3
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 4
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño Habitacion 6
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitación 5
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 7
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 8
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Equipos
	0,70	2,10	1	**100%**	**1,47**	Ropa limpia
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 9
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 10
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 11
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 12
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 13
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 14
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 15
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habiatcion 16
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 17
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 19
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habiytacion 18
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 20
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 21
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 23
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 22
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 24
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño habitacion 25
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Trabajo sucio
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Trabajo limpio
	0,75	2,10	1	**100%**	**1,58**	Ropa sucia
	0,75	2,10	1	**100%**	**1,58**	Residuos ordinarios
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Residuos peligrosos
	1,00	2,10	1	**100%**	**2,10**	Baño mujeres
	0,70	2,10	1	**100%**	**1,47**	Baño hombres
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Witron
	1,40	2,10	1	**100%**	**2,94**	Procedimeintos
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Aseo
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Deposito de insumos
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Descanso vestier
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño vestier
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Baño adultos ludoteca
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Baño niños ludoteca
	0,70	2,10	1	**100%**	**1,47**	Cuarto aseo
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Bodega
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Ingreso filtro
	0,80	2,10	1	**100%**	**1,68**	Deposito insumos
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Informacion familiares
	1,28	2,10	1	**100%**	**2,69**	Circulacion a descanso
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Coordinacion UCI pediatria
	0,70	2,10	1	**100%**	**1,47**	Baño coordinacion UCI PEDIATRIA
	0,70	2,10	1	**100%**	**1,47**	Baño coordinacio pediatria
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Coordinacion Pediatria
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Descanso medico
	0,90	2,10	1	**100%**	**1,89**	Descanso enfermeria



PISO 4						
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 1
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 2
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitación 3
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 4
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño Habitacion 6
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitación 5
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 7
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 8
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Equipos
	0,7	2,1	1	100%	1,47	Ropa limpia
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 9
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 10
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 11
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 12
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 13
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 14
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 15
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habiatcion 16
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 17
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 19
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habiytacion 18
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 20
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 21
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 23
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 22
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 24
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño habitacion 25
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Trabajo sucio
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Trabajo limpio
	0,75	2,1	1	100%	1,58	Ropa sucia
	0,75	2,1	1	100%	1,58	Residuos ordinarios
	0,75	2,1	1	100%	1,58	Residuos peligrosos
	1	2,1	1	100%	2,10	Baño mujeres
	0,7	2,1	1	100%	1,47	Baño hombres
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Witron
	1,4	2,1	1	100%	2,94	Procedimeintos
	0,8	2,1	1	100%	1,68	Aseo
	0,9	2,1	1	100%	1,89	decanso y vestier
	0,9	2,1	1	100%	1,89	Baño descanso vestier

OBSERVACIONES:


TOTAL	**190,32**	**Cantidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**183,02**	**Cantidad**
PRESENTE ACTA	**7,30**	**Cantidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA RH ESTRUCTURA INTERNA REFORZADA COLOR A ELECCIÓN	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

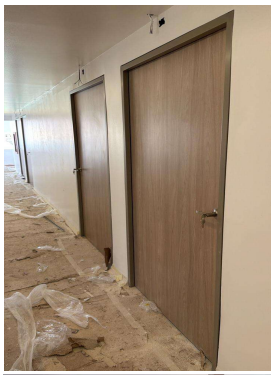







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 3				
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 1
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 2
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitación 3
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 4
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 6
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 5
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 7
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 8
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 9
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 10
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Hbaitacion 11
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 12
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 13
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 14
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 15
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 16
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 17
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 19
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 18
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 20
	1,2	2,1	1	100%	2,52	habitacion 21
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 23
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 22
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 24
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 25
		PISO 4				
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 1
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 2
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitación 3
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 4
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 6
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 5
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 7
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 8
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 9
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 10
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Hbaitacion 11
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 12
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 13
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 14
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 15
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 16
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 17
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 19
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 18
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 20
	1,2	2,1	1	100%	2,52	habitacion 21
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 23
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 22
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 24
	1,2	2,1	1	100%	2,52	Habitacion 25

OBSERVACIONES:

TOTAL	126,00	Cantidad
ACUMULADO ANTERIOR	100,80	Cantidad
PRESENTE ACTA	25,20	Cantidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

CONSORCIO TERMINACION UMI
NIT 901.919.277-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: (604) 4883991
Medellín - Colombia
retencionesdelafuente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 8

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja		
NIT	891.800.231-0	**Teléfono**	(608) 7405030
Dirección	Carrera 11 27 27	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 09:50
Expedición	12/02/2026, 09:50
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 345 DE 2025	1.00	1,163,124,912.00
2	AIU	1.00	348,937,474.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Mil quinientos doce millones sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 1,512,062,386.00

Total Bruto	1,512,062,386.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,512,062,386.00

Observaciones:
Valor total ejecutado presente acta parcial #7 (1 de al 30 de noviembre 2025)
$ 1.498.209.681

Favor consignar en la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No 0371 0009 3436 a nombre de CONSORCIO TERMINACION UMI Nit. 901.919.277-7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090657101 aprobado en 20250318 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 2cd642deb15e5a60230b7e7a187dbb3a18143390073bf6402c7831c10678036f3a450c0f1550aea470b348e7606c8660

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

Banco Davivienda S.A certifica que el **CONSORCIO TEMINACION UMI** con Nit **901.919.277-7** tiene con el Banco la siguiente cuenta de ahorros Persona Jurídica:

Cuenta de Ahorros	**0371 0009 3436**
Fecha de Apertura	**05/06/2025**

Se expide por solicitud del cliente a los 05 días del mes de Junio del año 2025 dirigida **A QUIEN INTERESE**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0371 - OFICINA SANTA TERESITA

FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señores,
E.S.E. Hospital Universitario San
Rafael de Tunja Carrera 11 No 27-27
Tunja, Departamento de Boyacá

Asunto: Certificación de pago de seguridad social y aportes legales.

Cordial saludo,

Yo, Estefanía Carvajal Henao, identificada con C.C. 1.037.630.191, en mi condición de Representante Legal, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a paz y salvo en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 202 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025.

La presente certificación se expide en Tunja a los 11 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

NOVIEMBRE 2025

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 01:52:47 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82246035

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 16/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TERMINACION UMI		
Documento	NI901919277	**Dirección**	AV 51 #51 - 60 AVENIDA UNIVERSITARIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2621938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CARVAJAL HENAO ESTEFANIA	**Identificación**	CC 1037630191
Total Afiliados	46	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002329251	SERGIO ANDRES URIAN BAUTISTA	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF10) COMFABOY	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 1002364930	DEYVIT STEVEN ACERO MENDOZA	01	00	X																0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.333.334	$ 53.400	6,960	$ 1.333.334	$ 92.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100
CC 1006002201	DUBER HERNANDO BERNAL RODRIGUEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 0	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1006002201	DUBER HERNANDO BERNAL RODRIGUEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	6,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 1010016703	JONATHAN FABIAN CASTILLO RUBIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1016033129	EMILIO JOSE SILVA PACHECO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.334	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 59.334	$ 0	0,000	$ 59.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 1016033129	EMILIO JOSE SILVA PACHECO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.720.667	$ 275.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.720.667	$ 68.900	6,960	$ 1.720.667	$ 119.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 1026160645	DAVID LEANDRO GIL ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1037630191	ESTEFANIA CARVAJAL HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1049610366	ANDERSON ESTEBAN VANEGAS RACHE	01	00		X															0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 901.550	$ 144.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF10) COMFABOY	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 1049612358	OSCAR MAURICIO RATIVA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 1049612648	JOEL FERNANDO AUNTA MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049613738	JUAN DIEGO RIVERA MARTINEZ	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.091.350	$ 174.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.091.350	$ 43.700	6,960	$ 1.091.350	$ 76.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.100
CC 1049619098	YEISSON ALEXANDER RATIVA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 1049637057	FABIO ANDRES HURTADO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049642651	MARCO ANTONIO MOLINA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 118.667	$ 14.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 118.667	$ 0	0,000	$ 118.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 118.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.661.334	$ 265.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.661.334	$ 66.500	6,960	$ 1.661.334	$ 115.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.661.334	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 16/12/2025 **Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI** **Planilla Nro: 82246035** **Periodo Cotización: noviembre de 2025** **Periodo Servicio: diciembre de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049652578	EDWIN YESID CASTILLO RUBIO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 5.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.700
CC 1049652578	EDWIN YESID CASTILLO RUBIO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.376.050	$ 220.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.376.050	$ 55.100	6,960	$ 1.376.050	$ 95.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200
CC 1049656819	ANDRES FELIPE LOPEZ PINZON	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF10) COMFABOY	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 1049662404	RICARDO DANIEL LOPEZ CASTELLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1050090863	LUIS MIGUEL FORERO YANQUEN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1050096499	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1051590681	CRISTIAN ALEXANDER JIMENEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1053329226	LUIS ARCADIO RUBIANO SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1056074885	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1056802565	CESAR AURELIO TEJEDOR PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1082479583	JAIR ROBERTO VILLARREAL RANGEL	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 1082479583	JAIR ROBERTO VILLARREAL RANGEL	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 205.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.281.150	$ 51.300	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.800
CC 1096202957	CINDY JOHANNA SUAREZ SERRANO	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 480.000	$ 76.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 480.000	$ 19.200	6,960	$ 480.000	$ 33.500	(CCF10) COMFABOY	$ 480.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.700
CC 1096951661	JULIAN DAVID SALGUERO SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 23284683	YASMIN CECILIA DIAZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 4061382	VICENTE BURGOS MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 4252509	MARIO ALIPIO CAMACHO BETANCOUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 43429459	MARGOTH ELENA MEDINA RIVERA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.300
CC 52443156	DORIS LOBATON TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 52865922	LAURA ROCIO SANCHEZ VACCA	01	00		X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 996.450	$ 159.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF10) COMFABOY	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 7120249	ERLIS ANTONIO RIVERA HUERFANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 7164375	LUIS EDUARDO VALENZUELA CASTIBLANCO	01	00												X					0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 712.000	$ 114.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 712.000	$ 28.500	0,000	$ 712.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 712.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.500
CC 7164375	LUIS EDUARDO VALENZUELA CASTIBLANCO	01	00																	0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.068.000	$ 170.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.068.000	$ 42.800	6,960	$ 1.068.000	$ 74.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.068.000	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.900
CC 71677387	JORGE ELIECER CORTES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 7181307	JAIRO HERNANDO VANEGAS PANADERO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 7181307	JAIRO HERNANDO VANEGAS PANADERO	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.376.050	$ 220.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.376.050	$ 55.100	6,960	$ 1.376.050	$ 95.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200
CC 7181812	ROBERT MACIAS DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 72249576	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.667	$ 47.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 296.667	$ 0	0,000	$ 296.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 296.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 72249576	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.483.334	$ 237.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.483.334	$ 59.400	6,960	$ 1.483.334	$ 103.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.483.334	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.500
CC 79791276	GERMAN ALONSO GUTIERREZ BONILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 86049770	EIDER GUSTAVO REINA SIEMPIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 88002047	JESUS ALFONSO RIVERA BASTO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.334	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 59.334	$ 0	0,000	$ 59.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 88002047	JESUS ALFONSO RIVERA BASTO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.720.667	$ 275.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.720.667	$ 68.900	6,960	$ 1.720.667	$ 119.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 9526256	CARLOS SAMUEL YEPES TORRES	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.300
CC 98563499	NORBER RAMIRO CORTES GONZALEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 59.334	$ 9.500	(EPS010) EPS SURA	$ 59.334	$ 0	0,000	$ 59.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 98563499	NORBER RAMIRO CORTES GONZALEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.720.667	$ 275.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.720.667	$ 68.900	6,960	$ 1.720.667	$ 119.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 68.691.139	$ 72.371.139	$ 72.371.139	$ 72.371.139	$ 10.985.700	$ 2.865.300	$ 4.924.800	$ 2.831.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.606.900	$ 0	$ 21.606.900

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 7 CONTRATO DE OBRA No 345 DE 2025.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente nos permitimos certificar acta parcial No 6 del contrato de obra 345 de 2025 "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Técnico.
Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.

El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

Ambiental.

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.
Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

Que se verificaron cada una de las actividades del Plan de Manejo ambiental definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de las mismas en el periodo de la presente acta.

Seguridad Salud En El Trabajo

Informe a seguimiento mensual obra civil.
Indicadores clave de desempeño.
Cumplimiento normativo formación y capacitación.
Evaluación de la efectividad de la formación.

Lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Atentamente,



BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el Consorcio Terminación UMI identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025.

Atentamente,



BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista Consorcio Terminación UMI en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista Consorcio Terminación UMI para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025
