COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		INFORME DE VISITA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS Y CONTRATOS			SIGME		
					CÓDIGO		
FONDO	FAZNI				FECHA		VERSIÓN
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO					Formato: FV01		

Fecha de Visita (Desde-Hasta):	**09/03/2026**	**10/03/2026**	**1**	**CONTRATO FAZNI-GGC-1355-2024**
Ente Administrador-OR	**DISPAC S.A. E.S.P.**		**Supervisor de Apoyo DEE:**	**LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA**

Objeto la Visita :

Mesa técnica entre DISPAC S.A. E.S.P., Consejo Consejo Comunitario de Cacarica y Ministerio de Minas y Energía con el objetivo de solucuinar la problemática que ha impedido el avance de las obras del proyecto, por desacuerdos entre el consejo y el contratista de obra.

Objeto Contrato :

Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto ""INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento

Plazo Contrato (Meses)	**24**	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	**23/05/2025**	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	**4/02/2025**	**Fecha de finalización (dd/mm/aa)**	**14/02/2027**
		Suspensiones en meses		**Prorrogas en meses**	**0**	**Fecha finalización vigente (dd/mm/aa)**	**14/02/2027**

Valor del Contrato:	**$ 5.754.355.083,00**	**Valor adición:**	**$ 0,00**	**Valor Total:**	**$ 5.754.355.083,00**
Código Proyectos visitados:	**N/A**	**Nombre del proyecto:**	INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"		

VALOR INVERSION PROGRAMADO A LA FECHA	VR. INVERSION EJECUTADA A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	ATRASO %
$ 5.754.355.083	**$ 5.754.355.083**	**52%**	**33%**	**19%**

Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	**No se ha recibido formalmente**	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	**No se ha recibido formalmente**		

Numero de usuarios aprobados tipo 1 (110 v)	**211**	**Numero de usuarios retirados tipo 1 (110 v)**	**0**	**Numero de usuarios nuevos tipo 1 (110 v)**	**0**	**Total usuarios tipo 1 (110 v)**	
Numero de usuarios aprobados tipo 2 (220 v)		**Numero de usuarios retirados tipo 2 (220 v)**	**0**	**Numero de usuarios nuevos tipo 2 (220 v)**	**0**	**Total usuarios tipo 2 (220)**	

Concepto sobre dificultades encontradas en la socializacion,numero de usuarios, Servidumbres, Permisos de paso ,Concepto sobre dificultades encontradas en Licencias de ambientales, permisos y planes de aprovechamiento forestal y certificaciones de zonas de alto riesgo y Resumen estado de avance físico y financiero actual del contrato y problemas encontrados .

Problemática presentada entre el consejo comunitario de la comunidad de Cacarica referente a las instalaciones de los SSFV y el transporte de los mismos.

Recomendaciones sobre la continuidad del contrato y la forma de solucionar inconvenientes observados

Se pacta mesa técnica entre DISPAC S.A. E.S.P., Consejo Consejo Comunitario de Cacarica y Ministerio de Minas y Energía para revisión y concertación de la problemática

Logros y dificultades aspectos administrativos jurídicos, técnicos o financieros o de liquidación de los contratos (solo mencione aquellos en los que hayan aspectos relevantes):
Falta el último desembolso, se debe suscribir el acta de recibo y entrega para tramitar tal desembolso
Logros y dificultades encontradas para la Certificación conformidad del RETIE, Actas de entrega a usuarios, Acta de recibo de infraestructura y Acta de entrega al AOM:
Después de la discusión sostenida entre las partes, se acordó que el Consejo de Cacarica no intervendrá en los temas relacionados con la instalación ni con el transporte de materiales y equipos, responsabilidades que recaerán exclusivamente en el contratista de obra. No obstante, el Consejo ejercerá labores de veeduría durante la ejecución del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, manifestaron que no se obstaculizará el ingreso ni el tránsito del personal vinculado a la ejecución del proyecto y que no será necesaria la intervención de la Junta para la contratación de personal local que cumpla con los perfiles requeridos y desee vincularse con el contratista. Finalmente, se establecieron los compromisos correspondientes entre las partes y se levantó la respectiva acta.
Anexos: Acta de energización NO certificado de permanencia NO
FIRMAS

NOMBRE: Lina J. Bernal Niampira CC: 1022328066
SUPERVISOR DE APOYO


NOMBRE: José León CC: 79899475
REPRESENTANTE OR-ADMINISTRADOR QUE ATENDIO LA VISITA

El Proyecto presenta un desarrollo:	Normal	x	Anormal		Crítico	

	SUPERVISOR DE APOYO	REPRESENTANTE OR-ADMINISTRADOR
Nombre		José León
Dirección		Av. Calle 26 No 69 D 91, en el Centro Empresarial Arrecife, Torre 1, oficina 804-Bogotá
teléfono fijo		(601) 4672203 / (601) 4672203.
Celular		313 3407475
email		jleon@dispac.com.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO



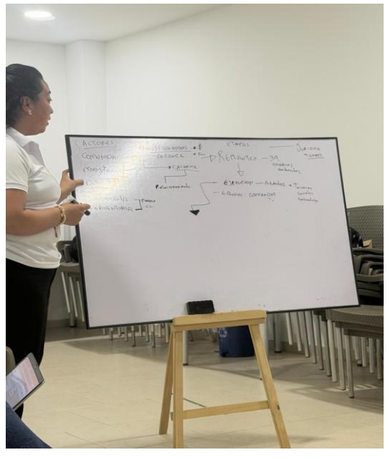

ARCHIVO FOTOGRÁFICO No. 1 Ubicación del Proyecto



ARCHIVO FOTOGRÁFICO No.2 Mesa técnica



ARCHIVO FOTOGRÁFICO No. 3 Mesa técnica

ARCHIVO FOTOGRÁFICO No. 4 Mesa técnica



ARCHIVO FOTOGRÁFICO No. 5 Mesa técnica
