"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA"

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA 02

CONTRATO LP- OBRA-432-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA

TENJO, CUNDINAMARCA

15 DE DICIEMBRE 2025 AL 20 DE FEBRERO 2026

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 GENERALIDADES 3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL 4
2.2.1 USOS DEL SUELO 7
2.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 9
2.4 ANTECEDENTES JURIDICOS Y TECNICOS DEL CONTRATO 9
2.5 PÓLIZAS GENERADAS 10
3 ASPECTO TÉCNICO 11
3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 11
3.2 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 12
3.3 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 14
3.4 ASPECTO FINANCIERO 15
4 AVANCE TIEMPO 1
5 ACTIVIDADES EJECUTADAS 1
6 CONCLUSIONES 2

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Contrato LP-OBRA-432-2025, suscrito entre el Municipio de Tenjo como entidad contratante y la firma CONSORCIO SANTA MARTA. como contratista desarrollará la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA”.

Dentro del alcance del contrato, se contempla la intervención mediante la construcción de muros de contención en sectores identificados como críticos, con el objetivo de mitigar riesgos asociados a movimientos en masa, garantizar la estabilidad del terreno y proteger la infraestructura existente, contribuyendo así a la seguridad de la población y a la reducción de la vulnerabilidad en el municipio de Tenjo.

2 GENERALIDADES

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA** se contempla la ejecución de actividades preliminares y de obra, necesarias para la correcta construcción de los muros de contención, las cuales se desarrollan conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa vigente aplicable. Estas actividades incluyen, entre otras, las siguientes:

- **PREINVERSIÓN**
    - AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA (FASE III). LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS PRIORIZADOS, PERFORACIONES DE VERIFICACIÓN, ENSAYOS DE LABORATORIO (LÍMETES DE ATTERBERG, PESO UNITARIO, RESISTENCIA AL CORTE), ESTUDIOS DE SUELOS INDIVIDUAL CON RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES Y EL AJUSTE AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS MUROS DE

CONTENIÓN POR GRAVEDAD A CONSTRUIR. MEMORIAS TÉCNICAS + MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.


- **OBRA**

  - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN
  - DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M
  - EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
  - EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
  - TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
  - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
  - PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI
  - MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M
  - ANCLAJE 5/8" L=70CM
  - ACERO FIGURADO 60000 PSI
  - BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
  - ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI (CAISSONS)
  - ACERO FIGURADO 60000 PSI

2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL

El municipio de Tenjo se encuentra ubicado en la sabana centro del Departamento de Cundinamarca al Noreste de la ciudad de Bogotá (37 Km), localizado a los 4 º 52' 1"de latitud Norte y a los 74° 9' 0" de longitud Oeste, meridiano de Greenwich, en una altitud media de 2587 msnm. Limita con los siguientes municipios; por el Occidente con Subachoque y Madrid; por el Suroccidente con Funza; por el Oriente con Cota y al Norte con Chía y Tabio. (Concejo Municipal de Tenjo, 2014). El área del municipio es equivalente a 114 km2, lo que lo ubica en el puesto 45 de los municipios más pequeños del departamento de Cundinamarca, representando el 0.51% de la superficie del departamento (Tenjo A. m., 2018).


Ilustración 1 Plano localización genera del municipio

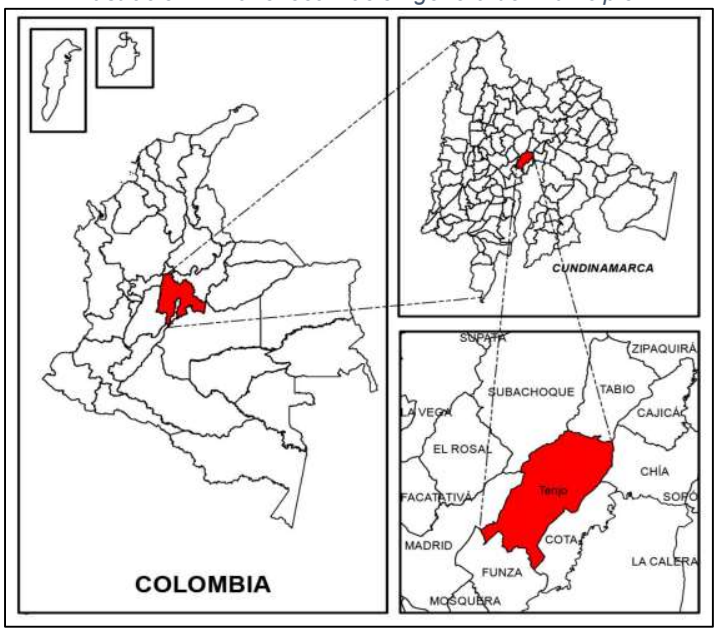

Fuente: Adaptado de: POT Tenjo (2014)

Las obras de reforzamiento contempladas en este proyecto se localizarán en las veredas Churuguaco (sector Alto) y Chinché, pertenecientes al municipio de Tenjo, Cundinamarca. Estas zonas corresponden a áreas de ladera con altas pendientes, donde se han identificado condiciones de inestabilidad estructural y habitacional asociadas a procesos de inestabilidad geotécnica, inducidos por factores hidrometeorológicos y topográficos propios del terreno.

Ilustración 2 Plano división veredal municipio de Tenjo

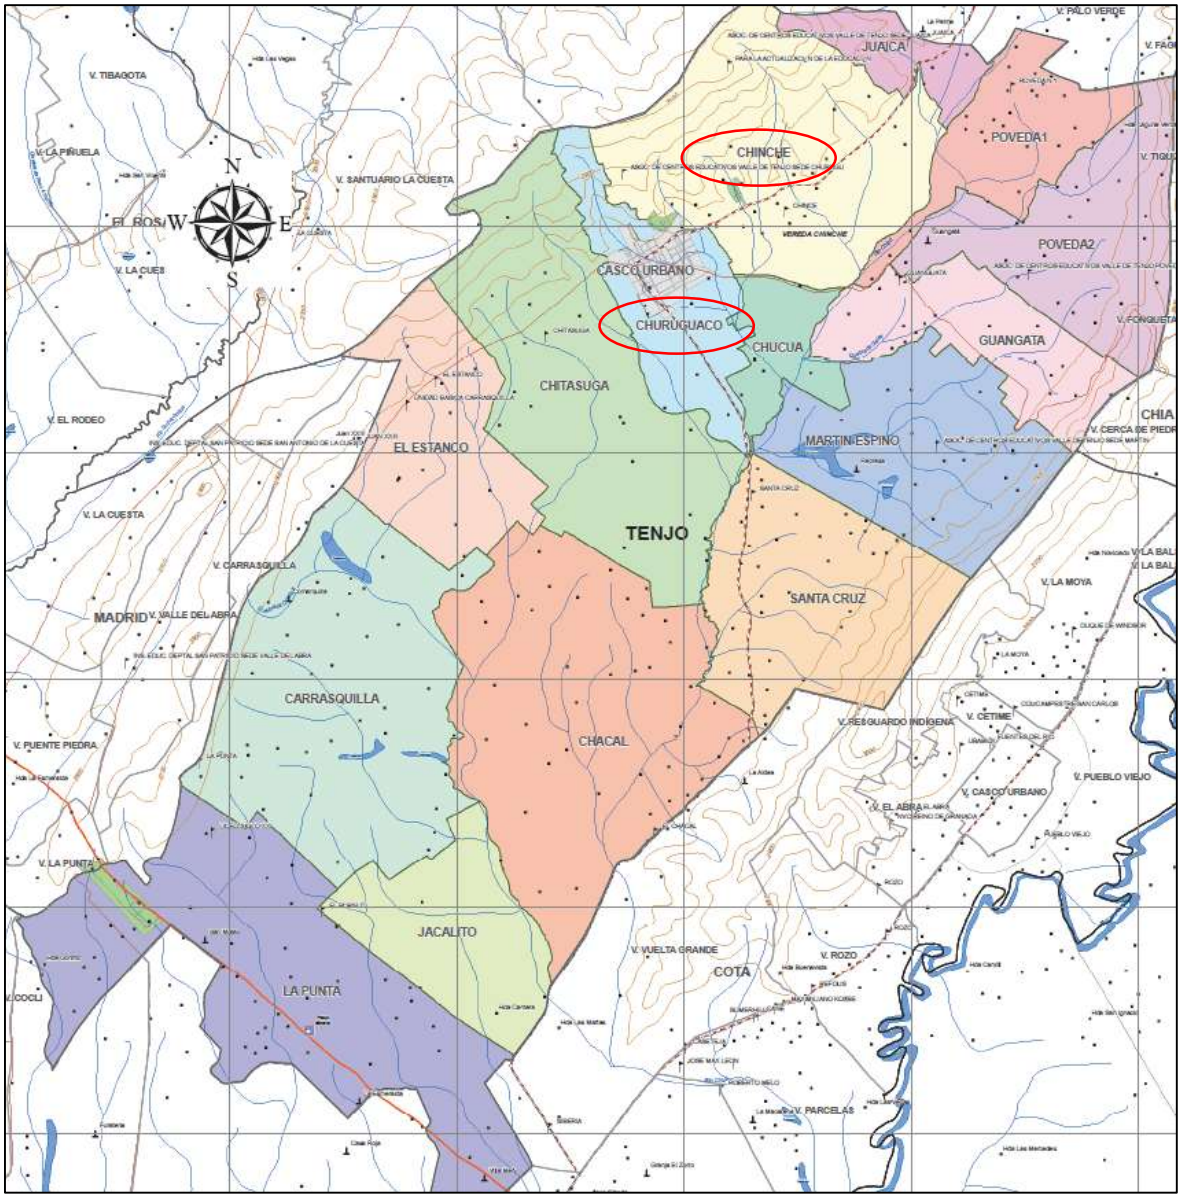


Fuente: Tomado del Mapa base del municipio de Tenjo de la gobernación de Cundinamarca – secretaria de planeación.

Las precipitaciones estacionales, características de la zona de influencia, han incrementado progresivamente los niveles de escorrentía superficial, afectando negativamente la estabilidad de los taludes naturales y favoreciendo la aparición de fenómenos de remoción en masa de magnitud significativa.

Como respuesta a estas condiciones de inestabilidad y al riesgo que representan para las viviendas y la infraestructura local, el proyecto contempla la construcción de muros de contención en las veredas Churuguaco (Alto) y Chinché. Estas obras se diseñan como medidas de mitigación geotécnica orientadas a controlar los procesos de remoción en masa, reducir la presión ejercida por los taludes inestables y mejorar la seguridad estructural y habitacional de la zona intervenida.

Ilustración 3 Localización del área de intervención de las obras de mitigación

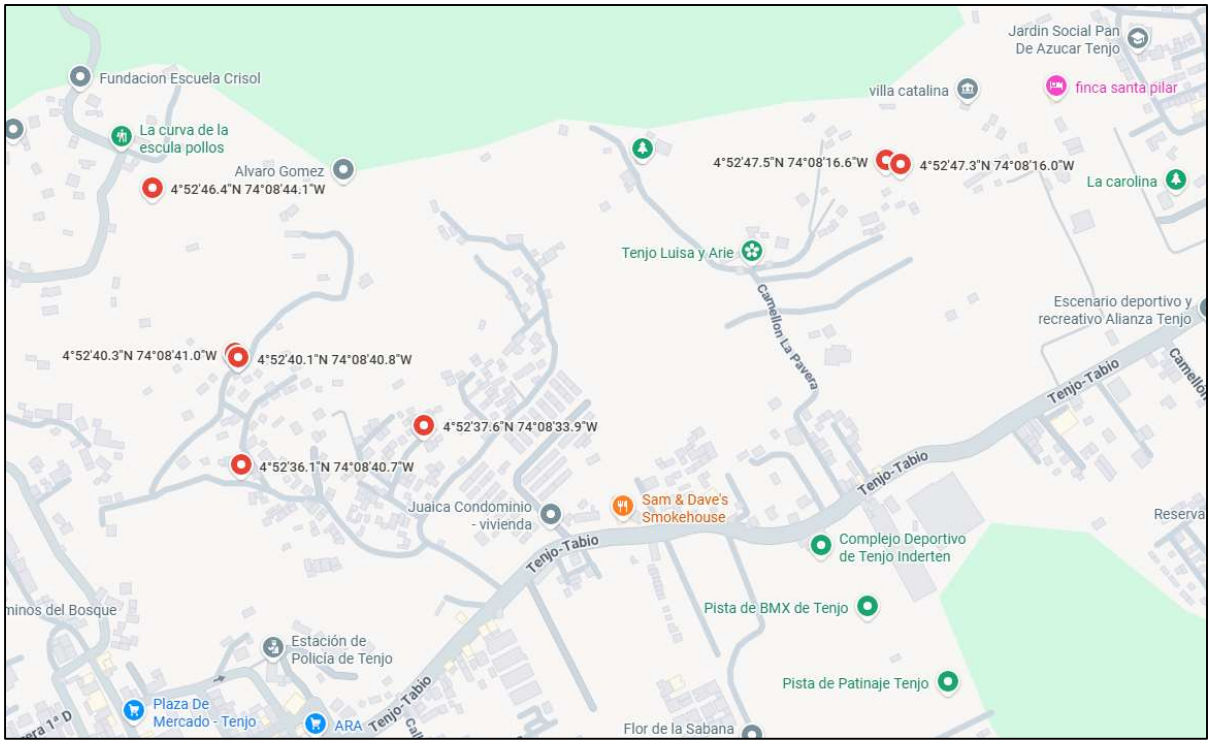

Fuente: Elaboración Propia


2.2.1 USOS DEL SUELO

Con base en el Mapa de Uso Propuesto del Suelo del Municipio de Tenjo, elaborado por la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Planeación, se realiza la identificación de los usos del suelo presentes en el área de intervención del proyecto. El análisis de este plano permite reconocer la distribución territorial de las principales categorías de uso, entre las que se encuentran: suelo rural, áreas de protección ambiental, zonas agrícolas, áreas de conservación, zonas de ladera, así como cuerpos hídricos y rondas asociadas.

La interpretación del mapa evidencia que los sectores correspondientes a las veredas Churuguaco (Alto) y Chinché se encuentran principalmente dentro de

zonas clasificadas como suelo rural, con presencia significativa de áreas de ladera con pendientes fuertes, así como franjas identificadas como áreas de protección ambiental y forestal, debido a su susceptibilidad a procesos erosivos y de inestabilidad geotécnica.

Ilustración 4 Mapa uso del suelo Tenjo – Cundinamarca

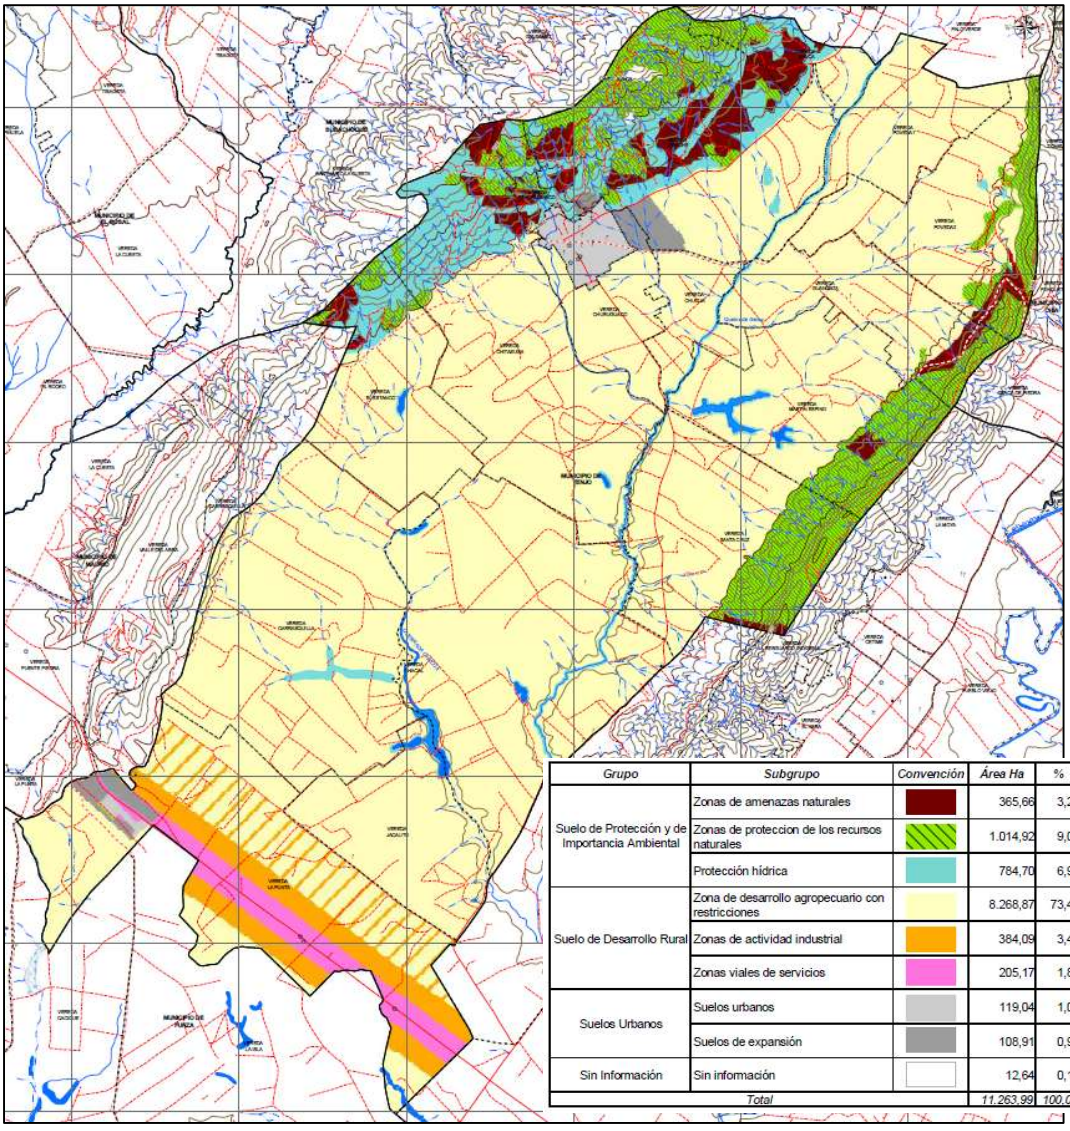

Grupo	Subgrupo	Convención	Área Ha	%
Suelo de Protección y de Importancia Ambiental	Zonas de amenazas naturales		365,66	3,25
	Zonas de proteccion de los recursos naturales		1.014,92	9,01
	Protección hídrica		784,70	6,97
Suelo de Desarrollo Rural	Zona de desarrollo agropecuario con restricciones		8.268,87	73,41
	Zonas de actividad industrial		384,09	3,41
	Zonas viales de servicios		205,17	1,82
Suelos Urbanos	Suelos urbanos		119,04	1,06
	Suelos de expansión		108,91	0,97
Sin Información	Sin información		12,64	0,11
	Total		11.263,99	100,00

Fuente: Mapa de uso elaborado por la gobernación de Cundinamarca

2.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

Tabla 1 Generalidades del Proyecto

CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	KELY YICELA QUITIAN CHILA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.
No. DE CONTRATO:	LP-OBRA-432-2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TENJO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CM-INT-433-2025
INTERVENTOR EXTERNO	CONSORCIO INTER MUROS TENJO
NIT	901.998.297-1
REPRESENTANTE LEGAL	MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA
ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE FEBRERO DEL 2026
PRORROGA No. 1 Y MODIFICATORIO 01	16 DE FEBRERO DEL 2026
TERMINO PRÓRROGA No. 01	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MARZO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($623.678.469) M/CTE

Fuente: elaboración Propia

2.4 ANTECEDENTES JURIDICOS Y TECNICOS DEL CONTRATO

- El día 14 de octubre de 2025, se firmó el contrato de obra No. LP-OBRA-432-2025 Cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA”., se firmó entre el municipio de TENJO y el consorcio SANTA MARTA
- El día 17 de octubre se firmó, el acta de inicio por el termino de cuatro (04) meses.

- El valor del contrato es de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($623.678.469) M/CTE.
- El contrato tiene como intervención realizar la CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.
- El día 16 de febrero se firma PRÓRROGA No. 01 Y MODIFICATORIO No. 01 al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-OBRA-432-2025, el cual tiene por objeto: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA LA MITIGACION DE RIESGOS, EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA., por el término de UN (01) MES.

2.5 PÓLIZAS GENERADAS

A continuación, se relacionan las pólizas referentes al contrato.

Tabla 2 Pólizas según contrato

AMPARO	NÚMERO DE PÓLIZA	ANEXO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO	NB - 100411425	0	$374.207.081,40	14/10/2025 14/02/2031	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD	NB - 1001084558	0	$284.700.000,00	14/10/2025 14/02/2026	SEGUROS MUNDIAL
CUMPLIMIENTO	NB - 100411425	2	$374.207.081,40	17/10/2025 17/02/2031	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD	NB - 1001084558	2	$284.700.000,00	17/10/2025 17/02/2026	SEGUROS MUNDIAL
CUMPLIMIENTO	NB - 100411425	3	$374.207.081,40	17/10/2025 17/03/2031	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD	NB - 1001084558	3	$284.709.221,00	17/10/2025 17/03/2026	SEGUROS MUNDIAL

Fuente: elaboración Propia,

3 ASPECTO TÉCNICO

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento del Contrato de Obra No. LP-OBRA-432-2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO – CUNDINAMARCA", se adelanta actualmente la ejecución de las actividades correspondientes a la preinversión (estudios y diseños), y obra civil para los muros de contención localizados en las veredas Churuguaco y Chincé.

- **PREINVERSIÓN – ESTUDIOS Y DISEÑOS**
  Para cada uno de los muros de contención se ejecutan los ajustes a los estudios y diseños a nivel de detalle de ingeniería (Fase III), los cuales incluyen:

  - Levantamiento topográfico de precisión en cada punto priorizado.
  - Perforaciones de verificación y ejecución de ensayos de laboratorio (límites de Atterberg, peso unitario y resistencia al corte).
  - Estudio geotécnico con sus respectivas recomendaciones y conclusiones.
  - Diseño estructural de cada muro de contención por gravedad a construir.
  - Elaboración de memorias técnicas.
  - Planos de Diseño detallados por muro.

- **OBRA CIVIL**
  En desarrollo de la fase constructiva, y de acuerdo con las particularidades de cada muro de contención, se ejecutan las siguientes actividades:

  - Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión.
  - Excavaciones varias a máquina sin clasificar y excavación manual en conglomerado, incluyendo el retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
  - Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
  - Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, préstamos, sobre acarreo y derrumbes.
  - Relleno en recebo común compactado mecánicamente

- Placa base concreto 0.15 2500 psi
- Suministro, figurado y colocación de acero de refuerzo de 60.000 psi.
- Muro de contención en concreto 3500 psi, h=2.0 m
- Zapatas en concreto 3500 psi (CAISSONS)

Las actividades descritas anteriormente se desarrollan de manera independiente para cada muro de contención**,** conforme a los ítems contractuales definidos, las condiciones geotécnicas del sitio y los diseños aprobados, garantizan la correcta ejecución de las obras para la mitigación del riesgo por movimientos en masa en los sectores intervenidos.

3.2 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES

A continuación, se presenta la relación de las herramientas, equipos y materiales requeridos para la ejecución de las diferentes actividades constructivas contempladas en el proyecto. La tabla detalla los recursos asignados a cada operación, diferenciando entre los equipos empleados y los materiales necesarios, lo que permite evidenciar la planificación técnica y logística prevista para el desarrollo de las obras.

Tabla 3 Relación de herramientas, equipos y materiales.

ACTIVIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MATERIALES
Ajustes a estudios y diseños a nivel de detalle de ingeniería (Fase III)	• Equipos topográficos (estación total, nivel, GPS) • Equipo de perforación para exploración geotécnica • Herramientas manuales de apoyo	• Estacas de madera • Material de marcación
Levantamiento topográfico de puntos priorizados	• Estación total • Jalones	• Estacas • Material de señalización
Perforaciones de verificación y ensayos de laboratorio	• Equipo de perforación manual o mecánica • Herramientas de muestreo	• Muestras de suelo
Estudios de suelos y diseño estructural	• Software especializado • Equipos de cómputo	• Sin materiales de obra
Memorias técnicas y memoriales de responsabilidad	• Equipos de cómputo	• Papelería y medios digitales

ACTIVIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MATERIALES
Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	• Equipos topográficos • Herramientas menores (cintas, estacas, hilo)	• Estacas de madera • Cal o pintura
Demolición de placa piso 0.10 m	• Retroexcavadora • Herramientas manuales (barras, martillos, palas) • Volqueta	• Sin materiales propios (Producto: escombros)

Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes < 5 km)	• Retroexcavadora • Volqueta	• Sin materiales propios (Producto: material excavado)
Excavación manual en conglomerado H = 0.0 – 2.0 m	• Herramientas manuales (picas, palas, carretillas) • Volqueta	• Sin materiales propios
Transporte de materiales de explanación, canales, préstamos y derrumbes	• Volquetas	• Material proveniente de excavación
Relleno en recebo común compactado mecánicamente	• Compactador mecánico • Herramientas manuales	• Recebo común
Placa base en concreto 0.15 m – 2500 PSI	• Trompo mezclador • Formaleta • Vibrador • Herramientas manuales	• Arena • Grava • Cemento • Agua
Muro de contención en concreto 3500 PSI, H = 2.0 m	• Trompo mezclador • Formaleta • Vibrador • Herramientas manuales	• Arena • Grava • Cemento • Agua
Anclaje 5/8” L = 70 cm	• Taladro • Herramientas manuales	• Pernos/anclajes de acero
Acero figurado 60.000 PSI	• Herramientas de corte y doblado • Equipos de amarre	• Varillas de acero (de acuerdo a la normatividad vigente) • Alambre de amarre
Base en concreto pobre 1500 PSI	• Trompo mezclador • Herramientas manuales	• Arena • Grava • Cemento • Agua

ACTIVIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MATERIALES
Zapatas en concreto 3500 PSI	• Trompo mezclador • Formaleta • Vibrador • Herramientas manuales	• Arena • Grava • Cemento • Agua
Acero figurado 60.000 PSI	• Herramientas de corte y doblado • Equipos de amarre	• Varillas de acero (de acuerdo a la normatividad vigente) • Alambre de amarre

Fuente: elaboración Propia.

3.3 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un equipo de profesionales y auxiliares que cumplen funciones específicas de carácter técnico y administrativo. La siguiente tabla presenta la relación del personal asignado, indicando su identificación y el cargo o rol que desempeña dentro de la obra.

Tabla 4 personal Técnico

NO.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	KELY YICELA QUITIAN CHILA	DIRECTOR DE OBRA	30%
2	FABIO HERMES DAVID PINZÓN RODRÍGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	WILSON ANDRES VASQUEZ ROMERO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	10%
4	JAIR ANTONIO CARDENAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	10%
5	INGRID JHOANA RINCON	SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50%

Fuente: elaboración Propia.

Tabla 5 personal de obra

N.º	Nombre completo	Cargo / Rol
1	DIEGO ALEXANDER SOCHE MORALES	AUXILIAR DE OBRA
2	JIMMY RODRIGUEZ SOCHE	AUXILIAR DE OBRA
3	DAGOBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR DE OBRA
4	EDUAR DAVID OSPINA CAÑON	AUXILIAR DE OBRA
5	ALEXANDER HERNANDEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OBRA
6	EYEZID ROJAS MONCADA	AUXILIAR DE OBRA
7	DIEGO MAURICIO ROZO GONZALEZ	AUXILIAR DE OBRA
8	YONATHAN JAVIER AVELLA SASTOQUE	AUXILIAR DE OBRA
9	NELSON ARMANDO CALDERO MORALES	AUXILIAR DE OBRA
10	ELKIN JACINTO BAUTISTA GARCIA	AUXILIAR DE OBRA
11	LUIS ENRIQUE CARO IBAÑEZ	AUXILIAR DE OBRA
12	JOSE MANUEL VARGAS BONILLA	AUXILIAR DE OBRA
13	RAUL BOTON CUERVO	AUXILIAR DE OBRA

Fuente: elaboración Propia.

3.4 ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se presenta la relación de costos correspondientes al proyecto, discriminados por actividades, ítems no previstos, costos directos e indirectos, hasta conformar el valor total del contrato.

Tabla 5 Relación de costos Acta de recibido

VALOR INICIAL DEL CONTACTO	$623.678.469,00
VALOR ADICIONAL	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$623.678.469,00
VALOR ACTA 01	$60.544.925,00
VALOR ACTA 02	$489.566.777,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$550.111.702,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$73.566.767,00
% PAGADO ACUMULADO	9,71%-
% TOTAL EJECUTADO	88,20%

Fuente: elaboración Propia.


3.4.1 CRONOGRAMA DE OBRA

El Cronograma de obra corresponde a la planificación temporal de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto de construcción de los muros de contención de las veredas Churuguaco Alto y Chincé en Municipio de Tenjo. Este cronograma se elaboró con el fin de establecer el orden lógico y la duración estimada de cada una de las etapas del proceso constructivo, garantizando una adecuada coordinación entre recursos humanos, materiales y equipos.

3.4.2 CURVA S

Se presenta la Curva S del proyecto, donde se refleja la programación financiera y el avance previsto en el tiempo.

Iustración 5 Cronograma de obra

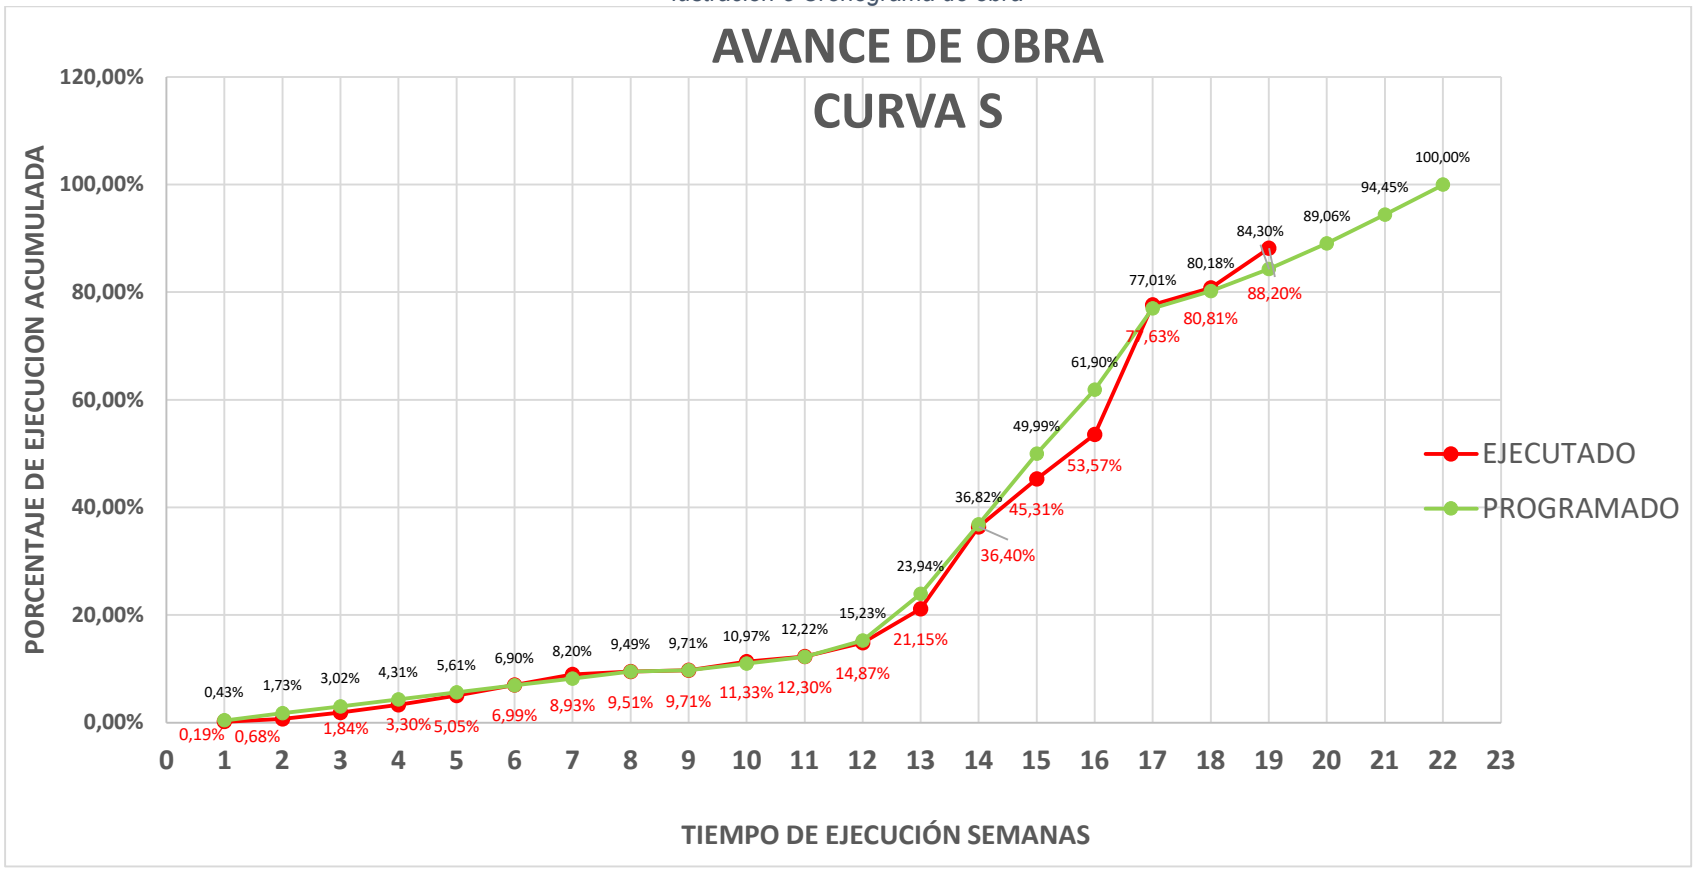

Fuente: elaboración Propia.

4 AVANCE TIEMPO

A continuación, se relaciona tabla de Avance de tiempo Transcurrido y Faltante en el proyecto.

Tabla7 Avance T Faltante y Transcurrido

AVANCE DE TIEMPO				
PLAZO TOTAL	TIEMPO TRANSCURRIDO DÍAS	TIEMPO FALTANTE DÍAS	% T TRANSCURRIDO	% T FALTANTE
150	126	24	88,20%	11,80%

Fuente: elaboración Propia.

5 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento del Contrato de Obra No. LP-OBRA-432-2025, se adelanta actualmente la ejecución de las actividades correspondientes a la fase de preinversión (estudios y diseños) y obra civil para los muros de contención localizados en las veredas Churuguaco y Chincé. Las actividades se desarrollan conforme al cronograma contractual, a los estudios técnicos aprobados y a las especificaciones técnicas vigentes.

5.1 Objetivo de la Intervención

El objetivo principal del proyecto es mitigar el riesgo por movimientos en masa y posibles deslizamientos, mediante la construcción de muros de contención por gravedad que permitan estabilizar los taludes intervenidos, proteger la infraestructura existente y salvaguardar la integridad de los habitantes del sector. Adicionalmente, el proyecto busca mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de las áreas intervenidas, garantizando soluciones técnicas acordes con las condiciones geotécnicas y topográficas de cada punto priorizado.

5.2 Actividades Ejecutadas

- **Preinversión – Estudios y Diseños:** Para cada uno de los muros de contención proyectados, se ejecutan los ajustes a los estudios y diseños a nivel de ingeniería de detalle (Fase III), los cuales comprenden las siguientes actividades:
    - **Levantamiento topográfico de precisión**, con el fin de definir las condiciones geométricas reales del terreno y establecer las cotas y alineamientos de diseño.
    - **Perforaciones de verificación y ejecución de ensayos de laboratorio**, incluyendo límites de Atterberg, peso unitario y resistencia al corte, para la adecuada caracterización del suelo.

- **Elaboración del estudio geotécnico**, con análisis de estabilidad, recomendaciones técnicas y conclusiones específicas para cada sitio.
- **Diseño estructural de los muros de contención por gravedad**, considerando las cargas actuantes, condiciones del suelo y factores de seguridad requeridos.
- **Elaboración de memorias de cálculo y memorias técnicas**, que sustentan las soluciones estructurales propuestas.
- **Producción de planos de diseño detallados**, correspondientes a cada muro de contención, los cuales sirven como base para la ejecución de la obra civil.

- **Obra Civil:** En desarrollo del contrato y conforme a los diseños estructurales aprobados, se han adelantado actividades constructivas en cinco (5) frentes de trabajo correspondientes a los muros de contención identificados como Muro 3, Muro 5, Muro 4, Muro 1 y Muro 2. Las actividades ejecutadas por cada frente se describen a continuación:
  - ✓ Localización y replanteo de las cimentaciones mediante el uso de equipos y elementos de precisión.
  - ✓ Excavaciones varias a máquina sin clasificar, incluyendo el retiro y transporte de material sobrante a una distancia menor a 5 km.
  - ✓ Excavación manual en material conglomerado, en profundidades entre 0,0 y 2,0 m, con retiro de sobrantes.
  - ✓ Transporte de materiales provenientes de actividades de explanación, excavación, sobreacarreos y derrumbes.
  - ✓ Relleno en recebo común compactado mecánicamente.
  - ✓ Construcción de placa base en concreto de 2.500 psi con espesor de 0,15 m.
  - ✓ Ejecución de zapatas en concreto estructural de 3.500 psi. (CAISSONS)
  - ✓ Instalación de acero de refuerzo figurado grado 60.000 psi.
  - ✓ Construcción del muro de contención en concreto estructural de 3.500 psi.

Este avance se ha ejecutado bajo la supervisión del personal técnico del proyecto y cumpliendo con los lineamientos establecidos en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y especificaciones técnicas contractuales**.**

6 CONCLUSIONES

- Las actividades correspondientes a las fases de estudios, diseños y ejecución de obra civil se han venido desarrollando de conformidad con la programación contractual, evidenciándose avances en cinco (5) frentes de



trabajo correspondientes a los muros de contención 1, 2, 3, 4 y 5, con un avance físico general acorde con el cronograma establecido.

- Se destaca el avance significativo en los muros, en los cuales se han ejecutado actividades de cimentación y estructura del sistema de contención.
- Las labores ejecutadas se han desarrollado cumpliendo con los lineamientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la entrega de elementos de protección personal, la realización de capacitaciones, inspecciones de seguridad y la implementación de los protocolos correspondientes, garantizando condiciones seguras para el personal y la comunidad.
- Si bien se han presentado eventos climáticos asociados a lluvias, lo cual genero ciertas restricciones temporales en la ejecución de algunas actividades, se adoptaron medidas de planificación y control que permitieron mitigar su impacto, evitando afectaciones significativas en el avance general del proyecto.
- A partir de las excavaciones y verificaciones realizadas en campo, se ratifica la importancia de dar estricto cumplimiento a las recomendaciones geotécnicas y estructurales definidas en los estudios y diseños aprobados, con el fin de garantizar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de los muros de contención y de las obras ejecutadas.

Control de cambios:

VERSIÓN N°	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	RESPONSABLE
1	14-12-2021	Emisión primera versión	KELY YICELA QUITIAN CHILA

Este documento hace parte integral de la empresa; por lo tanto, tiene un alto grado de confidencialidad y queda prohibida su reproducción y/o distribución parcial y/o total.

Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 20-02-2026	Fecha: 20-02-2026	Fecha: 20-02-2026
Nombre: MARÍA FERNANDA DÍAZ	Nombre: JEAN PAUL RINCON	Nombre: KELY YICELA QUITIAN
COORDINADORA DE PROYECTO	GERENTE TÉCNICO	R/L CONSORCIO SANTA MARTA
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

ANEXO No. 1 DISEÑOS DE MEZCLA CONCRETOS

RESISTENCIA 2500 PSI	MUNICIPIO DE TENJO	FECHA DE ENSAYO 9-dic-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

DOSIFICACIÓN DISEÑO DE MEZCLA 2500 PSI

CONSORCIO SANTA MARTA

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

RESISTENCIA 2500 PSI	MUNICIPIO DE TENJO	FECHA DE ENSAYO 9-dic-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

	ARENA	GRAVA
1. MODULO DE FINURO	2.3	…
2. TAMAÑO NOMINAL	…	3/4"
3. TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL		1/2"
4. CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA	0.00	…
5. ABSORCIÓN	3.023	4.312
6. PESO ESPECIFICO APARENTE SECO	2.054	2.123
7. PESO ESPECIFICO	2.153	2.243
8. PESO UNITARIO SUELTO	1.165	1.285
9. PESO UNITARIO APISONADO	1.378	1.135

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INTEGRANTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	**PESO SECO**	**PESO ESPECIFICO**	**VOLUMEN ABSOLUTO**
	Kg/m3	**g/m3**	**l/m3**
Cemento	312	3.01	101
Agua	143	1.00	143
Grava	900	2.576	341
Agregado fino	893	2.519	340
TOTAL	2248		925

REVISO
ING. NATHALIE JOYA

APROBÓ
ING. DANIEL JOYA

RESISTENCIA 2500 PSI	MUNICIPIO DE TENJO	FECHA DE ENSAYO 9-dic-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

PARA MEDIR LAS CANTIDADES SE PODRÁN UTILIZAR CAJONES DE MADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS INTERIORES:(POR BULTO DE CEMENTO)

GRAVA	0,41X0,41X0,53
AGREGADO FINO	0,41X0,41X0,48

PARA MEDIR LAS CANTIDADES SE PODRÁN UTILIZAR BALDES NEGROS PARA CONSTRUCCIÓN DE 10 LITROS

PROPORCIONES EN BALDES NEGROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA UN CEMENTO DE ARGOS DE 50 Kg

GRAVA = 8 BALDES RASOS
ARENA = 11 BALDES RASOS
AGUA = 1,9 BALDES

NOTAS:
1 SI LA HUMEDAD DE LOS AGREGADOS ES SUPERIOR A LA ABSORCIÓN, SIGNIFICA QUE ESTOS CONTIENEN AGUA LIBRE, EN TAL CASO EL AGUA DE MEZCLADO DEBE REDUCIR EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA HUMEDAD LIBRE QUE CONTIENEN LOS AGREGADOS

2. AL PESAR LOS AGREGADOS PARA DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS DEBE TENERSE EN CUENTA LA HUMEDAD DE ESTOS AUMENTÁNDOLE AL PESO EL PORCENTAJE DE AGUA QUE CONTENGA.

3. SE DEBEN ELABORAR CILINDROS DE PRUEBA EN OBRA ANTES DE INICIAR LA PRODUCCIÓN DEL CONCRETO EN SERIE

REVISO
ING. NATHALIE JOYA

APROBÓ
ING. DANIEL JOYA

RESISTENCIA 3500 PSI	MUNICIPIO DE TENJO	FECHA DE ENSAYO 9-dic-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

DOSIFICACION DISEÑO DE MEZCLA 3500 PSI

CONSORCIO SANTA MARTA

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

RESISTENCIA 3500 PSI	MUNICIPIO DE TENJO	FECHA DE ENSAYO 9-dic-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

	ARENA	GRAVA
1. MODULO DE FINURO	2.6	…
2. TAMAÑO NOMINAL	…	3/4"
3. TAMAÑO MAXIMO NOMINAL		1/2"
4. CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA	0.00	…
5. ABSORCIÓN	3.114	4.432
6. PESO ESPECIFICO APARENTE SECO	2.396	2.337
7. PESO ESPECIFICO	2.589	2.607
8. PESO UNITARIO SUELTO	1.598	1.456
9. PESO UNITARIO APISONADO	1.752	1.536

PESO SECO Y VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS INTEGRANTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

INGREDIENTE	**PESO SECO**	**PESO ESPECIFICO**	**VOLUMEN ABSOLUTO**
	Kg/m3	**g/m3**	**l/m3**
Cemento	382	3.10	123
Agua	187	1.00	187
Grava	912	2.607	350
Agregado fino	880	2.589	340
TOTAL	2361		1000

REVISO
ING. NATHALIE JOYA

APROBO
ING. DANIEL JOYA

RESISTENCIA 3500 PSI	MUNICIPIO DE TENJO	FECHA DE ENSAYO 9-dic-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

PARA MEDIR LAS CANTIDADES SE PODRAN UTLIZAR CAJONES DE MADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS INTERIORES:(POR BULTO DE CEMENTO)

GRAVA	0,39X0,39X0,54
AGREGADO FINO	0,39X0,39X0,48

PARA MEDIR LAS CANTIDADES SE PODRAN UTLIZAR BALDES NEGROS PARA CONSTRUCCION DE 10 LITROS

PROPORCIONES EN BALDES NEGROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA UN CEMENTO DE ARGOS DE 50 Kg

GRAVA = 8,2 BALDES RASOS
ARENA = 7,2 BALDES RASOS
AGUA = 2,5 BALDES

NOTAS:
1 SI LA HUMEDAD DE LOS AGREGADOS ES SUPERIOR A LA ABSORCION, SIGNIFICA QUE ESTOS CONTIENEN AGUA LIBRE, EN TAL CASO EL AGUA DE MEZCLADO DEBE REDUCIR EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA HUMEDAD LIBRE QUE CONTIENEN LOS AGREGADOS

2. AL PESAR LOS AGREGADOS PARA DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS DEBE TENERSE EN CUENTA LA HUMEDAD DE ESTOS AUMENTANDOLE AL PESO EL PORCENTAJE DE AGUA QUE CONTENGA.

3. SE DEBEN ELABORAR CILINDROS DE PRUEBA EN OBRA ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION DEL CONCRETO EN SERIE

INCILAB S.A.S. NIT. 900747935 – 2

REVISO
ING. NATHALIE JOYA

APROBO
ING. DANIEL JOYA

ANEXO No. 2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA MAYORES Y MENORES CANTIDAD CONTRATO LP-OBRA-432-2025

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA"

CONTRATO LP- OBRA-432-2025

MUNICIPIO: TENJO – CUNDINAMARCA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico tiene como finalidad sustentar y justificar las variaciones en las cantidades de obra (mayores y menores) identificadas durante la ejecución del contrato cuyo objeto es la mitigación del riesgo mediante la construcción de muros de contención en diferentes sectores del municipio de Tenjo.

Durante el desarrollo del proyecto, y como resultado del seguimiento técnico en campo, se evidenció la necesidad de ajustar las cantidades inicialmente contratadas, en función de las condiciones reales del terreno, accesibilidad a los frentes de obra y requerimientos estructurales para garantizar la estabilidad de las obras ejecutadas.

2. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempló la construcción de muros de contención en los siguientes sectores:

- **Muro 1:** Localizado en el costado Nor-oriental de la via del sector cementerio en el predio del señor José Ledes Campos.

- **Muro 2:** Localizado en el costado Nor-occidental de la via del sector cementerio en el predio de la señora Luz Aida Rodriguez

- **Muro 3:** localizado en el costado sur de la vía del sector cementerio la terminal en el predio del señor Raul Ladino.

- **Muro 4:** localizado en el predio del señor Jose Abel Triviño, vereda Churuguaco alto finca el Carmen.

- **Muro 5:** localizado en el predio del señor José del Carmen Triana, vereda Churuguaco sector cementerio.

Cada uno de estos puntos presenta condiciones particulares de topografía, acceso y geotecnia, lo cual incidió directamente en la ejecución de las actividades constructivas.

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta:

- Revisión del presupuesto contractual inicial
- Análisis del balance de obra ejecutada
- Verificación de cantidades en campo
- Seguimiento a procesos constructivos
- Análisis de limitaciones operativas y logísticas

Las variaciones se clasificaron en mayores (+) y menores (-) cantidades, de acuerdo con su comportamiento frente al presupuesto inicial.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CONDICIONES DE OBRA

4.1. Condiciones de accesibilidad

Uno de los factores más determinantes en la variación de cantidades fue la dificultad de acceso a los frentes de obra, principalmente en los muros ubicados en el costado Nor-oriental de la via del sector cementerio y en la vereda Churuguaco alto finca el Carmen.

Se evidenció que:

- Los accesos existentes corresponden a vías no pavimentadas o de geometría reducida.
- No fue posible el ingreso de maquinaria pesada en algunos frentes.
- Se requirió transporte manual o con equipos menores para materiales.

Esto generó un impacto directo en:

- Incremento del ítem de transporte (m^3-km)
- Mayor uso de mano de obra
- Disminución de eficiencia en actividades mecanizadas

4.2. Condiciones geotécnicas del terreno

Durante la excavación se identificó la presencia de:

- Materiales conglomerados
- Estratos con contenido rocoso
- Condiciones no homogéneas del suelo

Estas condiciones generaron:

- Incremento en volúmenes de excavación
- Necesidad de excavación manual en zonas específicas
- Mayor tiempo de ejecución
- Ajustes en las dimensiones de cimentación

4.3. Limitaciones constructivas

Debido a la combinación de factores de acceso y geotecnia:

- Se sustituyeron procesos mecanizados por manuales
- Se requirió mayor control en la conformación de excavaciones
- Se ajustaron procedimientos constructivos en sitio

Esto impactó directamente los rendimientos y las cantidades finales de obra.

5. JUSTIFICACIÓN DE MAYORES CANTIDADES

5.1. Excavaciones

Se presenta un incremento significativo en:

- Excavación manual en conglomerado (Ítem 16.5)
- Excavación a máquina (Ítem 16.2) (en algunos muros)

Justificación técnica: Las condiciones reales del terreno exigieron mayores volúmenes de excavación y el uso de métodos manuales, debido a la presencia de material rocoso y restricciones de acceso para maquinaria.

5.2 Transporte de materiales

El ítem Transporte de materiales (Ítem 1.6) presenta incremento generalizado.

Justificación técnica:

- Mayor distancia efectiva de acarreos
- Uso de medios manuales o no convencionales
- Reubicación de puntos de acopio

5.3 Rellenos

El relleno en recebo (Ítem 16.8)

Justificación técnica:

- Ajustes en la geometría de las excavaciones debido a las condiciones del terreno
- Necesidad de mejorar condiciones de soporte
- Adecuación del terreno para garantizar estabilidad

5.4 Cimentaciones

Incremento en:

- Zapata en concreto 3500 PSI (Ítem 2.8)
- Acero en cimentación (Ítem 4.22) *

Justificación técnica: Se requirió reforzar la cimentación debido a las condiciones geotécnicas encontradas, garantizando la capacidad portante y estabilidad global del sistema.

6. JUSTIFICACIÓN DE MENORES CANTIDADES

6.1. Eliminación de actividades

Se evidencia la no ejecución de:

- Anclajes (Ítem 5.55)
- Base en concreto pobre (Ítem 4.29)
- Demolición de placa (Ítem 1.26)

Justificación técnica: Cambios en la solución constructiva adoptada y condiciones reales del sitio que hicieron innecesaria su ejecución.

6.2. Sustitución de actividades

En el Muro M-4:

- Se elimina excavación mecánica
- Se incrementa excavación manual

Justificación técnica: Condiciones del terreno y acceso que impidieron el uso de maquinaria.

7. ANÁLISIS GLOBAL DEL COMPORTAMIENTO DEL PROYECTO

El balance de obra evidencia un comportamiento técnico caracterizado por:

- Incremento en actividades asociadas a:
  - Mano de obra
  - Transporte
  - Cimentaciones
- Disminución en:
  - Actividades no necesarias

Esto demuestra una adaptación técnica del proyecto, priorizando la estabilidad estructural y la viabilidad constructiva.

8. CONCLUSIONES

- Las variaciones en cantidades obedecen a condiciones reales de obra no previsibles en fase de diseño.
- Se garantizó la estabilidad de los muros mediante ajustes en procesos constructivos.
- Las limitaciones de acceso fueron un factor determinante en el incremento de costos indirectos y cantidades.
- El balance no modifica el objeto contractual, sino que optimiza su ejecución.

ACTA PARCIAL No.2
"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA."

CONSORCIO SANTA MARTA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER MUROS TENJO	PLAZO TOTAL	5 MESES	VALOR DEL CONTRATO	$ 623,678,462.00
No. CONTRATO	LP-OBRA-431-2025	No. CONTRATO INTERVENTORIA	CM-INT-433-2025	FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026	VALOR DE ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 60,544,925.00
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA	FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACION	16 de marzo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 469,566,777.00
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DE COBRO	15 DICIEMBRE 2025 AL 20 DE FEBRERO 2026	PENDIENTE POR COBRAR	73,566,767.00
		PRÓRROGA No.1	1 MES			FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026

		CONDICION CONTRATUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1)		ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL
	MURO DE CONTENCIÓN (M-1), SECTOR VEREDAS CHURUGUACO Y CHINCÉ, MUNICIPIO DE TENJO (CUND.)												
1	PRELIMINARES												
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 11,157,818.00		$ 11,157,818.00		$ 11,157,818.00		$ -		$ -
	ANTES ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA (FASE III), LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS PRIORIZADOS, PERFORACIONES DE VERIFICACIÓN, ENSAYOS DE LABORATORIO (LÍMITES DE ATTERBERG, PESO UNITARIO, RESISTENCIA AL CORTE), ESTUDIOS DE SUELOS INDIVIDUAL CON RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES Y EL AJUSTE AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR GRAVEDAD A CONSTRUIR. MEMORIAS TÉCNICAS + MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.	GL	1.00	$ 9,376,318.00	$ 9,376,318.00	1.00	$ 9,376,318.00	1.00	$ 9,376,318.00				
	IVA 19%	19%			$ 1,781,500.00		$ 1,781,500.00		$ 1,781,500.00		$ -		$ -
2	OBRA CIVIL												
					$ 64,997,978.81		$ 64,979,222.97				$ 26,513,433.41		$ 38,565,789.56
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBJETOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	19.21	$ 12,885.00	$ 247,568.00	85.00	$ 955,725.00			66.00	$ 333,725.00		$ -
1,76	DEMOLICIÓN PLACA PISO E 10CM	M2	4.00	$ 23,537.00	$ 94,148.00	-	$ -			-	$ -		$ -
18,2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICACION, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO MENOR DE 5 KM)	M3	58.01	$ 20,509.00	$ 1,165,136.00	75.98	$ 1,691,228.76			76.98	$ 1,691,228.76		$ -
18,5	EXCAVACION MANUAL EN COYA 2 OMPACTADO H=0.6-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	34.03	$ 78,685.00	$ 2,644,250.00	74.07	$ 5,843,672.26			74.07	$ 5,843,672.26		$ -
1,9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DESPERDICIOS	M3-KM	2,430.03	$ 1,658.00	$ 4,085,800.00	3,209.30	$ 5,321,617.72			3,209.30	$ 5,321,617.72		$ -
18,6	RELLENO EN RECEBO CONSIN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	37.05	$ 102,752.00	$ 3,807,924.01	80.85	$ 8,262,656.22				$ -	80.15	$ 8,262,656.22
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	14.03	$ 107,461.00	$ 2,041,759.00	21.70	$ 2,654,296.70			24.70	$ 2,654,296.70		$ -
4,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.60M	M3	34.03	$ 978,293.00	$ 33,565,580.01	58.65	$ 37,791,521.20			8.65	$ 8,457,394.86	9.51	$ 8,991,186.34
6,55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	21.03	$ 40,354.00	$ 847,434.01	-	$ -			-	$ -	-	$ -
4,32	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,338.04	$ 7,659.00	$ 25,561,277.97	1,398.42	$ 10,710,512.11			1,398.42	$ 10,710,512.11	-	$ -
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2.03	$ 423,900.00	$ 847,800.00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
	CAISSONS				$ 11,828,253.31		$ 23,572,485.67				$ 22,572,485.67	-	$ -
7,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	4.01	$ 812,927.00	$ 3,313,643.01	85.21	$ 12,356,244.18			15.21	$ 12,356,244.18	-	$ -
4,22'	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	441.05	$ 7,559.00	$ 8,714,615.00	1,333.68	$ 10,716,151.49			1,333.68	$ 10,716,151.49	-	$ -
				Subtotal	$ 76,916,234.03	Subtotal	$ 76,854,834.64				$ 58,085,845.08	Subtotal	$ 16,565,769.56
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				$ 76,916,234.03		$ 76,854,834.64		$ -		$ 58,085,845.08		$ 16,565,769.56
	AIU 31,674%				$ 24,229,414.09		$ 24,431,942.00		$ -		$ 90,514,282.00		$ 5,917,660.00
	COMPONENTES (PMT + SOCIAL)				$ 4,569,974.03		$ 4,569,995.00		$ -		$ 3,485,181.80		$ 1,113,947.99
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO				$ 104,925,622.03		$ 105,852,674.64		$ -		$ 80,085,278.08		$ 25,597,399.56
	SUB-TOTAL ESTUDIOS & DISEÑOS				$ 11,157,818.00		$ 11,157,818.00		$ 11,157,818.00		$ -		$ -
	TOTAL CONSTRUCCIÓN MURO				$ 115,964,440.03		$ 115,849,492.64		$ 11,157,818.00		$ 80,085,278.08		$ 25,597,399.56
					VALOR CONTRACTUAL OBRA		CONDICIÓN FINAL		CONDICION ACTA 1		CONDICION ACTA ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR

ACTA PARCIAL No.2

"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA."

CONSORCIO SANTA MARTA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER MUROS TENJO	PLAZO TOTAL	5 MESES	VALOR DEL CONTRATO	$ 625,673,469.00
No. CONTRATO	LP-OBRA-432-2025	No. CONTRATO INTERVENTORIA	CM-INT-433-2025	FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026	VALOR DE ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 60,544,925.00
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA	FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACION	16 de marzo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 499,568,777.00
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DE COBRO	15 DICIEMBRE 2025 AL 20 DE FEBRERO 2026	PENDIENTE POR COBRAR	73,566,767.00
		PRÓRROGA No.1	1 MES			FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026

		CONDICION CONTRATUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1)		ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
	MURO DE CONTENCIÓN (M-2), SECTOR VEREDAS CHURUGUACO Y CHINCÉ, MUNICIPIO DE TENJO (CUND.)												
I	PRELIMINARES				6,578,929.03		6,578,929.03		6,578,929.03		-		-
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				6,578,929.03		6,578,929.03		6,578,929.03		-		-
	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA, BASE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS PRIORIZADOS, PERFORACIONES DE VERIFICACIÓN, ENSAYOS DE LABORATORIO (LÍMITES DE ATTERBERG, FIELD UNIT WEI, PRESENCIA AL CORTE), ESTUDIO DE SUELOS INDIVIDUAL CON RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES Y EL AJUSTE AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS PROPUESTOS DE CONTENCIÓN POR CALICHO A CONSTRUIR, MEMORIAS TÉCNICAS + MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.	GL	1.00	5,523,268.00	5,523,268.00	1.00	5,523,268.00	1.00	5,523,268.00			-	-
	IVA 19	19%			1,055,661.03		1,055,661.03		1,055,661.03			-	-
II	OBRA CIVIL				37,652,225.94		44,654,142.97				29,633,534.04		15,018,691.93
0,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	12.69	13,565.00	157,521.00	55.00	724,075.00			53.61	724,175.10	-	-
0,2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2.69	23,527.00	47,054.00	-	-			-	-	-	-
2,2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	31.68	20,905.00	722,230.00	65.12	1,354,026.72			61.13	1,354,356.77	-	-
2,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	31.64	78,685.00	2,465,425.00	61.40	4,818,816.70			58.31	4,812,913.73	-	-
2,6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCAVACIONES, ESCOMBROS, PRESTAMOS, SOBRACANTES Y DERRUMBES	M3/KM	1,493.64	1,680.00	2,533,761.00	2,682.15	4,508,028.25			2,683.16	4,510,028.29	-	-
3,5	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	23.85	102,752.00	2,261,256.00	73.82	7,585,427.84				-	73.82	7,585,427.84
13,64	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	12.68	107,481.00	1,361,972.00	20.00	2,149,934.80			21.91	2,245,954.67	-	-
4,15	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI H=2.0 M	M3	14.44	978,539.00	9,782,691.00	15.80	15,820,772.27			7.32	7,155,257.15	3.65	6,474,615.09
5,55	ANCLAJE 5/8" L=700M	UN	13.63	40,354.00	524,602.00	-	-			-	-	-	-
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	MS	2,311.63	7,468.00	17,722,106.00	3,001.89	7,879,611.16			1,001.89	2,678,511.24	-	-
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	1.00	423,901.00	423,901.00	-	-			-	-	-	-
	CUSSEROS			-	8,923,934.01		15,741,988.37				11,791,988.52		-
7,5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.50	382,627.00	4,061,325.00	11.40	9,267,183.14			11.41	9,765,539.14	-	-
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	MS	241.08	7,550.00	2,224,761.00	810.15	6,474,805.23			841.16	6,474,810.73	-	-
				SUBTOTAL	44,231,129.03	SUBTOTAL	60,252,431.34		-		44,052,428.91	SUBTOTAL	15,018,691.93
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				$ 44,231,129.03		$ 60,252,431.34		$ -		$ 44,052,428.91		$ 15,018,691.93
	AIU 31,974%				$ 14,117,354.00		$ 19,264,850.00		$ -		$ 14,062,226.00		$ 5,122,134.00
	COMPONENTES (PMT + SOCIAL)				$ 2,557,469.00		$ 3,815,149.00		$ -		$ 2,659,849.00		$ 964,197.00
	SUB- TOTAL PRESUPUESTO				$ 61,905,951.03		$ 83,972,437.34		$ -		$ 60,916,183.91		$ 23,105,273.93
	SUB-TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 6,579,929.03		$ 6,579,929.00		$ 6,579,929.00		$ -		$ -
	TOTAL CONSTRUCCIÓN MURO				$ 67,945,783.00		$ 89,952,266.34		$ 6,579,929.00		$ 60,916,183.91		$ 22,156,273.93
					VALOR CONTRACTUAL OBRA		CONDICIÓN FINAL		CONDICION ACTA 1		CONDICION ACTA ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR

ACTA PARCIAL No.2

"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA."

CONSORCIO SANTA MARTA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER MUROS TENJO	PLAZO TOTAL	5 MESES	VALOR DEL CONTRATO	$ 625,676,460.00
No. CONTRATO	LP-OBRA-432-2025	No. CONTRATO INTERVENTORIA	CM-INT-433-2025	FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026	VALOR DE ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 60,544,925.00
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA	FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACION	16 de marzo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 469,568,777.00
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DE COBRO	15 DICIEMBRE 2025 AL 20 DE FEBRERO 2026	PENDIENTE POR COBRAR	74,568,757.00
		PRÓRROGA No.1	1 MES			FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICION CONTRATUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1)		ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
I	MURO DE CONTENCION (M-3), SECTOR VEREDAS CHURUGUACO Y CHINCE												
	PRELIMINARES												
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				$7,956,825.00		$7,956,825.00		$7,956,825.00				
	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS MUROS PROPUESTOS, PERFORACIONES DE VERIFICACIÓN, ENSAYOS DE LABORATORIO (LÍMITES DE ATTERBERG, PESO UNITARIO, PRESENCIA AL CORTE, ESTUDIOS DE SUELOS INDIVIDUAL CON RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES Y EL AJUSTE AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR CRAVEDAD A CONSTRUIR, MEMORIAS TÉCNICAS + HOJAS PDF DE RESPONSABILIDAD.	GL	1.00	15,005,725.00	15,005,725.00	1.00	15,005,725.00	1.00	15,005,725.00				
	IVA 19%	19%			2,951,093.00		2,951,093.00		2,951,093.00				
II	OBRA CIVIL												
					$461,708,478.84		$87,263,754.62				$87,263,754.62		
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	310.70	$3,155.00	354,550.00	77.50	1,020,267.50			77.50	1,020,267.50		
1,75	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	6.80	29,527.00	161,222.00	-	-			-	-		
10,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	86.80	20,500.00	1,779,516.00	85.00	1,534,750.00			81.00	1,664,582.10		
10,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	79.10	79,555.00	6,753,000.00	88.05	8,722,346.64			84.05	6,749,248.64		
6,8	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, DE EXCAVACIÓN, CANALES, ENTIBADOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3,748.80	1,650.00	6,182,200.00	3,304.80	8,382,217.32			3,304.80	6,382,217.32		
10,5	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	80.00	802,752.00	6,002,760.00	109.57	11,259,911.31			109.57	11,259,911.31		
7,3,14	PLACA DE CONCRETO D 15 2500 PSI	M2	38.10	117,405.00	2,223,550.00	23.05	3,205,561.81			29.38	3,204,581.69		
4,15	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	24.10	978,298.00	23,282,166.00	22.53	23,115,737.32			23.65	23,115,737.02		
5,55	ANCLAJES 3/8" L=7.00 M	UN	22.10	60,764.00	1,321,692.00	-	-			-	-		
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,285.78	7,558.00	46,317,756.00	1,801.92	13,647,793.26			1,781.93	13,647,791.26		
4,29	BASE EN CONCRETO PCREC 3500 PSI	M3	2.10	429,900.00	902,790.00	-	-			-	-		
	CAISSONES				$5,784,813.00		24,879,148.27				23,278,166.27		
2,5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	13.50	812,927.00	10,968,791.00	85.31	12,256,244.12			33.31	12,256,244.12		
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	674.00	7,558.00	5,095,962.00	1,802.60	8,622,902.01			1,111.61	8,322,922.15		
				Subtotal	$414,568,462.00	Subtotal	88,242,934.30				88,242,934.30	Subtotal	

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	$ 119,501,491.00	$ 85,242,934.30	$ -	$ 88,242,988.30	$ -
AIU 31,874%	$ 38,109,812.00	$ 26,128,542.00	$ -	$ 26,128,542.00	$ -
COMPONENTES (PMT + SOCIAL)	$ 7,173,540.00	$ 5,294,574.00	$ -	$ 5,294,574.00	$ -
SUB-TOTAL PRESUPUESTO	$ 164,344,218.00	$ 121,664,916.30	$ -	$ 121,664,916.30	$ -
SUB-TOTAL ESTUDIOS & DISEÑOS	$ 17,956,825.00	$ 17,956,825.00	$ 17,956,825.00	$ -	$ -
TOTAL CONSTRUCCIÓN MURO	$ 182,301,035.00	$ 139,620,841.30	$ 17,956,825.00	$ 121,664,916.30	$ -
	VALOR CONTRACTUAL OBRA	CONDICIÓN FINAL	CONDICION ACTA 1	CONDICION ACTA ACTUAL	VALOR POR EJECUTAR

ACTA PARCIAL No.2
"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA."

CONSORCIO SANTA MARTA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMUROS TENJO	PLAZO TOTAL	6 MESES	VALOR DEL CONTRATO	$ 623,673,469.00
No. CONTRATO	LP-OBRA-432-2025	No. CONTRATO INTERVENTORIA	CM-INT-433-2025	FECHA PRESENTE ACTA	28 de febrero de 2026	VALOR DE ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 90,544,925.00
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA	FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACION	16 de marzo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 489,668,777.00
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	PLAZO FISCAL	4 MESES	PERIODO DE COBRO	15 DICIEMBRE 2025 AL 20 DE FEBRERO 2026	PENDIENTE POR COBRAR	73,568,767.00
		PRÓRROGA No.1	1 MES			FECHA PRESENTE ACTA	28 de febrero de 2026

		CONDICION CONTRATUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1)		ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL
	MURO DE CONTENCIÓN (M-4), SECTOR VEREDAS CHUNGUACO Y CHINCÉ, MUNICIPIO DE TENJO (CUND.)												
I	PRELIMINARES												
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				9,616,593.00		9,616,593.00		9,616,593.00		-		-
	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL RECOMENDABLE DE INGENIERÍA (FASE II). LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS PROGRAMADOS, PERFORACIONES DE VERIFICACIÓN, ENSAYOS DE LABORATORIO (LIMITES DE ATTERBERG, PESO UNITARIO, RESISTENCIA AL CORTE), ESTUDIOS DE SUELOS RUTINEUIL CON RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES Y EL AUSSE AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR GRAVEDAD A CONSTRUIR. MEMORIAS TÉCNICAS + MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.	GL	1.00	9,616,593.00	9,616,593.00	1.00	9,616,593.00	1.00	9,616,593.00		-		-
	AVISO	UN			1,535,422.00		1,535,422.00		1,535,422.00		-		-
II	OBRA CIVIL												
					54,587,520.00		85,412,659.00				57,037,254.48		8,364,834.52
3.46	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CAMPO TOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	1300	13,185.00	223,905.00	48.00	633,520.00			45.00	631,020.00	-	-
3.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M	M2	3.00	23,537.00	70,611.00	-	-				-	-	-
55.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	44.00	20,005.00	1,715,454.00	-	-				-	-	-
10.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADOS H=3.0-2.0H (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	44.00	78,805.00	2,400,560.00	160.52	2,712,121.74			111.52	8,713,151.74	-	-
6.8	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCAVACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREOS Y DESPERDICIOS	M3-KM	2,112.00	1,000.00	2,582,160.00	2,949.50	3,545,478.71			2,141.51	3,845,478.71	-	-
69.5	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	33.00	102,752.00	3,390,816.00	84.44	8,384,834.52				-	33.45	8,384,834.52
23.64	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	17.00	107,481.00	1,826,277.00	30.40	3,266,314.40			31.40	3,266,314.40	-	-
4.15	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI, H=2.0M	M3	13.00	978,233.00	25,531,042.00	25.84	26,021,895.36			25.84	26,021,895.36	-	-
5.56	ANCLAJE 5/8" L=7.00M	UN	14.00	40,351.00	788,726.00	-	-			-	-	-	-
4.27	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,214.00	7,659.00	24,215,191.00	1,881.84	14,412,974.27			1,881.84	14,412,974.27	-	-
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 3500 PSI	M3	1.00	423,900.00	423,900.00	-	-				-	-	-
	CAISSONS				8,691,691.00	-	28,918,676.49				28,903,676.49	-	-
2.5	CAMPAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	7.00	812,027.00	5,592,191.00	49.03	35,446,705.31			39.03	15,446,385.23	-	-
4.27*	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	344.00	7,659.00	2,321,053.00	2,486.72	11,463,971.27			1,486.72	11,453,971.27	-	-
				Sub Vol.	54,847,813.00	Subtotal	92,313,765.79				89,345,930.97	Subtotal	8,364,834.52

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	$ 54,847,813.00	$ 92,313,765.79	$ -	$ 83,945,930.97	$ 8,364,834.52
AIU 31,874%	$ 29,839,528.00	$ 29,423,131.00	$ -	$ 28,758,926.00	$ 2,666,207.00
COMPONENTES (PMT + SOCIAL)	$ 3,000,337.00	$ 5,538,649.00	$ -	$ 5,036,726.00	$ 501,892.00
SUB- TOTAL PRESUPUESTO	$ 89,407,998.00	$ 127,272,544.79	$ -	$ 115,739,812.97	$ 11,532,931.52
SUB-TOTAL ESTUDIOS & DISEÑOS	$ 9,616,593.00	$ 9,616,593.00	$ 9,616,593.00	$ -	$ -
TOTAL CONSTRUCCIÓN MURO	$ 99,024,591.00	$ 135,889,137.79	$ 9,616,593.00	$ 115,739,812.97	$ 11,532,931.52
	VALOR CONTRACTUAL OBRA	CONDICIÓN FINAL	CONDICION ACTA #	CONDICION ACTA ACTUAL	VALOR POR EJECUTAR

ACTA PARCIAL No.2
"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA."

CONSORCIO SANTA MARTA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER MUROS TENJO	PLAZO TOTAL	5 MESES	VALOR DEL CONTRATO	$ 623,673,450.00
No. CONTRATO	LP-OBRA-432-2025	No. CONTRATO INTERVENTORIA	CM INT-433-2025	FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026	VALOR DE ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 60,544,925.00
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA	FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACION	15 de marzo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 489,568,777.00
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DE COBRO	15 DICIEMBRE 2025 AL 20 DE FEBRERO 2026	PENDIENTE POR COBRAR	73,560,767.00
		PRÓRROGA No.1	1 MES			FECHA PRESENTE ACTA	20 de febrero de 2026

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIÓN CONTRATUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1)		ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
		UNID	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOAL	CANTIDAD	SUB TOTOAL	CANTIDAD	SUB TOTOAL	CANTIDAD	SUB TOTOAL
	MURO DE CONTENCIÓN (H-5), SECTOR VEREDAS CHURUGUACO Y CHINCE, MUNICIPIO DE TENJO (CUND.)												
1	PRELIMINARES												
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				16,333,061.83		16,333,061.83		16,333,061.83		-		-
	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA, FASE III, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS TRATADOS, PERFORACIONES DE VERIFICACIÓN, ENSAYOS DE LABORATORIO, LINEAMIENTOS DE ADECUADO, PREDIMENSIONAL DEL CORTE, ESTUDIOS DE SUELOS INCLUIDOS, ACTA RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Y EL AVANCE AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL, PARA CADA UNO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR GRAVEDAD Y ESTRUCTURA, MEMORIAS TÉCNICAS + PLANOS DE RESPONSABILIDAD.	GL	1.00	12,536,597.00	12,536,597.00	1.00	12,536,597.00	1.00	12,536,597.00	-	-	-	-
	IMPREVISTOS	19%			2,448,263.83		2,448,263.83		2,448,263.83		-		-
II	OBRA CIVIL				84,327,910.00		63,158,122.77				62,758,723.17		19,357,486.83
1,41	LOCALIZACIÓN Y PERFILAMIENTO DE TERRENOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	2,400	19,185.00	242,291.00	75.00	527,373.00			25.00	397,373.00	-	-
1,26	DEMOLICIÓN PLACA P=0.25CM	M2	7.00	29,537.00	117,525.00	-	-			-	-	-	-
18,7	EXCAVACIONES MANUALES (I) CLASIFICACIÓN EXCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	3.00	20,305.00	1,521,444.00	52.00	1,241,572.00			52.00	1,147,572.00	-	-
18,5	EXCAVACIÓN MANUAL (II) - CON CONTENIDO H=5.5 CON RETIRO DE SOBRANTES HASTA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	91.00	78,855.00	5,441,055.00	169.00	8,822,045.37			85.50	6,673,345.37	-	-
8,8	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, DE EXPLANACIÓN, DRAGAS, PRESTAMOS, SOBRANTES Y DERRUMBES	M3-KM	3,550.00	5,490,090.00	19,490,090.00	1,726.34	6,260,343.73			1,726.34	6,260,343.73	-	-
16,6	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	3,100	102,750.00	6,241,352.01	1,082.99	10,357,411.49			-	-	1,100.00	10,357,411.49
13,14	PLACA BASE CONCRETO H 35 2500PSI	M2	26.00	107,451.00	2,791,926.00	28.50	3,062,682.50			25.00	3,037,678.50	-	-
4,15	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500PSI, H=2.0M	M3	284.00	978,598.00	29,370,671.00	20.79	20,931,092.49			21.26	20,811,892.49	-	-
5,55	ANCLAJE 5/8" L=7.00M	UN	23.00	40,351.00	1,170,266.00	-	-			-	-	-	-
4,22	ACERO FIJADO 60000PSI	KG	1,400.00	7,665.00	22,981,565.01	1,395.99	33,111,363.23			1,436.69	15,811,762.55	-	-
4,29	BASE EN CONCRETO PEDRIZO 3500PSI	M3	2.00	423,000.00	846,000.00	-	-			-	-	-	-
	CAISSONS	-	-	-	18,396,488.01		37,319,354.36				27,924,834.36	-	-
7,5	CAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	111.00	812,527.00	8,928,997.00	116.00	74,445,315.23			39.00	13,445,315.23	-	-
4,22	ACERO FIJADO 60000PSI	KG	549.00	7,653.00	4,467,570.01	1,315.99	12,321,541.16			1,436.69	12,781,549.16	-	-
			SubTotal		167,754,243.01	SubTotal	91,982,977.15				69,925,576.55	SubTotal	10,357,486.83

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	$ 193,724,243.18	$ 93,982,977.15	$ -	$ 69,925,576.55	$ 10,357,486.83
AIU 31,874%	$ 53,051,865.99	$ 25,999,914.00	$ -	$ 25,648,595.00	$ 3,301,210.00
COMPONENTES (PAT + SOCIAL)	$ 5,723,455.03	$ 5,458,973.03	$ -	$ 4,837,535.00	$ 621,444.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO	$ 143,938,783.03	$ 125,441,979.15	$ -	$ 100,061,705.55	$ 14,280,154.83
SUB-TOTAL ESTUDIOS & DISEÑOS	$ 15,333,353.03	$ 15,333,353.03	$ 15,333,353.03	$ -	$ -
TOTAL CONSTRUCCIÓN MURO	$ 159,342,823.03	$ 140,775,753.15	$ 15,333,353.03	$ 100,061,705.55	$ 14,280,154.83
	VALOR CONTRACTUAL OBRA	CONDICIÓN FINAL	CONDICION ACTA 1	CONDICION ACTA ACTUAL	%VALOR POR EJECUTAR

ACTA PARCIAL No.2
"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA."

CONSORCIO SANTA MARTA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMUROS TENJO	PLAZO TOTAL	5 MESES	VALOR DEL CONTRATO	$ 625,576,469.00
No. CONTRATO	LP-OBRA-432-2025	No. CONTRATO INTERVENTORIA	CI-INT-433-2025	FECHA PRESENTE ACTA	28 de febrero de 2026	VALOR DE ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 60,544,925.00
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARTA	FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	16 de marzo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 469,566,777.00
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DE COBRO	15 DICIEMBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	PENDIENTE POR COBRAR	73,566,767.00
		PRÓRROGA No.1	1 MES			FECHA PRESENTE ACTA	28 de febrero de 2026

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICION CONTRATUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1)		ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL	CANTIDAD	SUB TOTOTAL
CONSOLIDADO FINANCIERO													
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL MUROS				$ 438,449,710.00		$ 438,449,710.00		$ -		$ 355,092,741.00		$ 53,357,969.00
	AIU 31,574%				$ 138,186,391.00		$ 138,186,391.00		$ -		$ 113,179,971.00		$ 17,937,209.00
	COMPONENTES (P&T + SOCIAL) MUROS				$ 24,508,443.00		$ 24,508,443.00		$ -		$ 21,334,965.00		$ 3,251,478.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO MUROS				$ 563,133,544.00		$ 563,133,544.00		$ -		$ 469,566,777.00		$ 73,566,767.00
	SUB-TOTAL ESTUDIOS & DISEÑOS MUROS				$ 62,544,925.00		$ 62,544,925.00		$ 60,544,925.00		$ -		$ -
	TOTAL CONSTRUCCIÓN MUROS				$ 625,678,469.00		$ 625,678,469.00		$ 60,544,925.00		$ 469,566,777.00		$ 73,566,767.00
					VALOR CONTRACTUAL OBRA		CONDICIÓN FINAL		ACTA PARCIAL 1		CONDICION ACTA ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR

ING. NELLY PINZÓN CASTILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA MARTA
CONTRATISTA

ING. MYRIAM ALEJANDRA CAMARGO MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERMUROS TENJO
INTERVENTORIA

ING. JUAN CARLOS AGUILAR SIERRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
SUPERVISOR
CONTRATANTE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2062892912	9497598629	E	2026/01/05	2026/01/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$6,900,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 1. PHVA- BOG (12 Afiliados)						$19,964,137	$3,194,600			$24,234,637	$970,000			$24,234,637	$970,000			$24,234,637	$457,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.1. PHVA-ADMI (7 Afiliados)						$14,839,537	$2,374,500			$19,110,037	$764,800			$19,110,037	$764,800			$19,110,037	$100,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$14,839,537	$2,374,500			$19,110,037	$764,800			$19,110,037	$764,800			$19,110,037	$100,300		$0	$0
1	CC	20970804	CHILA ROSALBA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1014294484	DIAZ MARIA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
3	CC	39703584	GOYENECHE ANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	93237133	PERDOMO IVAN		0	$0	$0	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1023876148	QUITIAN KELY	230301	30	$5,038,380	$806,200	EPS010	30	$5,038,380	$201,600	CCF22	30	$5,038,380	$201,600	14-23	30	$5,038,380	$26,400	30	$0	$0
6	CC	1016017769	RINCON INGRID	230301	30	$1,962,777	$314,100	EPS017	30	$1,962,777	$78,600	CCF22	30	$1,962,777	$78,600	14-23	30	$1,962,777	$10,300	30	$0	$0
7	CC	80804710	RINCON JEAN	230301	30	$5,038,380	$806,200	EPS008	30	$5,038,380	$201,600	CCF22	30	$5,038,380	$201,600	14-23	30	$5,038,380	$26,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.2. PHVA-OBRA (5 Afiliados)						$5,124,600	$820,100			$5,124,600	$205,200			$5,124,600	$205,200			$5,124,600	$356,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$5,124,600	$820,100			$5,124,600	$205,200			$5,124,600	$205,200			$5,124,600	$356,900		$0	$0
8	CC	1077035751	CABRERA EDISSON	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1019604225	CARDENAS KEINER	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
10	CC	79062603	CARO LUIS	230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
11	CC	80386672	VARGAS JOSE	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
12	CC	1077034525	VELANDIA LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA 1 (11 Afiliados)						$4,223,050	$676,000			$4,223,050	$169,100			$4,091,318	$163,900			$4,223,050	$294,800		$0	$0
Centro de Trabajo: F-C-SOCHE (11 Afiliados)						$4,223,050	$676,000			$4,223,050	$169,100			$4,091,318	$163,900			$4,223,050	$294,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$4,223,050	$676,000			$4,223,050	$169,100			$4,091,318	$163,900			$4,223,050	$294,800		$0	$0
13	CC	1007160234	AVELLA YONATHAN	230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
14	CC	1010035129	GAITAN RAUL	230201	12	$569,400	$91,200	EPS008	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
15	CC	1076625111	GUTIERREZ DAGOBERTO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
16	CC	92447619	HERNANDEZ ALEXANDER	230201	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
17	CC	1055952407	OSPINA EDUAR	230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
18	CC	1078370025	RODRIGUEZ JIMMY	230201	16	$759,200	$121,500	EPS008	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
19	CC	11235342	ROJAS EYEZID	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
20	CC	1076626436	ROZO DIEGO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
21	CC	1004006330	SOCHE DIEGO	230201	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
22	CC	3230184	SOCHE EDGAR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
23	CC	3230558	SOCHE WILSON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$24,187,187	$3,870,600			$28,457,687	$1,139,100			$28,325,955	$1,133,900			$28,457,687	$752,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2062892912	9497598629	E	2026/01/05	2026/01/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$6,900,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$3,870,600	$2,500	$0	$3,873,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$200	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$243,000	$200	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,777,000	$1,700	$0	$2,778,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$622,800	$400	$0	$623,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$752,000	$500	$0	$752,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$752,000	$500	$0	$752,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,133,900	$700	$0	$1,134,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	$1,133,900	$700	$0	$1,134,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$1,139,100	$1,100	$0	$1,140,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$256,700	$200	$0	$256,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$201,600	$200	$0	$201,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$466,100	$300	$0	$466,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$87,400	$100	$0	$87,500
TOTAL				**23**	**$6,895,600**	**$4,800**	**$0**	**$6,900,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	33692833	9499154996	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,607,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 1. PHVA- BOG (11 Afiliados)																						**$16,940,627**	**$2,711,100**			**$22,193,342**	**$888,700**			**$21,538,532**	**$862,500**			**$22,193,342**		**$245,200**		**$0**	**$0**		**$4,707,500**
Centro de Trabajo: 1.1. PHVA-ADMI (7 Afiliados)																						**$14,839,539**	**$2,374,700**			**$20,092,254**	**$804,300**			**$19,437,444**	**$778,100**			**$20,092,254**		**$98,800**		**$0**	**$0**		**$4,055,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						**$14,839,539**	**$2,374,700**			**$20,092,254**	**$804,300**			**$19,437,444**	**$778,100**			**$20,092,254**		**$98,800**		**$0**	**$0**		**$4,055,900**
1	CC	20970804	CHILA ROSALBA						X												0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$149,400
2	CC	1014294484	DIAZ MARIA																	230301	25	$2,333,334	$373,400	EPS017	25	$2,333,334	$93,400	CCF22	25	$2,333,334	$93,400	14-23	25	$2,333,334	0.522%	$12,200	25	$0	$0	Si	$572,400
3	CC	1014294484	DIAZ MARIA												X					230301	5	$466,667	$74,700	EPS017	5	$466,667	$18,700	CCF22	5	$466,667	$18,700	14-23	5	$466,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$112,100
4	CC	39703584	GOYENECHE ANA																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$136,300
5	CC	93237133	PERDOMO IVAN																		0	$0	$0	MINO01	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$136,300
6	CC	1023876148	QUITIAN KELY																	230301	30	$5,038,380	$806,200	EPS010	30	$5,038,380	$201,600	CCF22	30	$5,038,380	$201,600	14-23	30	$5,038,380	0.522%	$26,400	30	$0	$0	Si	$1,235,800
7	CC	1016017769	RINCON INGRID																	230301	18	$1,177,667	$188,500	EPS017	18	$1,177,667	$47,200	CCF22	18	$1,177,667	$47,200	14-23	18	$1,177,667	0.522%	$6,200	18	$0	$0	Si	$289,100
8	CC	1016017769	RINCON INGRID												X					230301	12	$785,111	$125,700	EPS017	12	$785,111	$31,500	CCF22	12	$785,111	$31,500	14-23	12	$785,111	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$188,700
9	CC	80804710	RINCON JEAN																	230301	30	$5,038,380	$806,200	EPS008	30	$5,038,380	$201,600	CCF22	30	$5,038,380	$201,600	14-23	30	$5,038,380	0.522%	$26,400	30	$0	$0	Si	$1,235,800
Centro de Trabajo: 1.2. PHVA-OBRA (4 Afiliados)																						**$2,101,088**	**$336,400**			**$2,101,088**	**$84,400**			**$2,101,088**	**$84,400**			**$2,101,088**		**$146,400**		**$0**	**$0**		**$651,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						**$2,101,088**	**$336,400**			**$2,101,088**	**$84,400**			**$2,101,088**	**$84,400**			**$2,101,088**		**$146,400**		**$0**	**$0**		**$651,600**
10	CC	1069583472	BOTON RAUL	X																230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
11	CC	79062603	CARO LUIS	X																230301	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
12	CC	1078371850	SANCHEZ URIEL	X																230301	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
13	CC	80386672	VARGAS JOSE	X																25-14	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA 1 (13 Afiliados)																						**$15,699,784**	**$2,512,600**			**$15,699,784**	**$628,800**			**$15,688,870**	**$628,300**			**$15,699,784**		**$1,093,300**		**$0**	**$0**		**$4,863,000**

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$5,242,500	$0	$0	$5,242,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$18,800	$0	$0	$18,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$84,100	$0	$0	$84,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,906,700	$0	$0	$3,906,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,232,900	$0	$0	$1,232,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,346,700	$0	$0	$1,346,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$1,346,700	$0	$0	$1,346,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,495,600	$0	$0	$1,495,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	26	$1,495,600	$0	$0	$1,495,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$1,522,300	$0	$0	$1,522,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$376,900	$0	$0	$376,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$201,600	$0	$0	$201,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$702,800	$0	$0	$702,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$98,400	$0	$0	$98,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$2,400	$0	$0	$2,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**26**	**$9,607,100**	**$0**	**$0**	**$9,607,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	108525554	9500880401	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,293,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 1. PHVA- BOG (11 Afiliados)						$17,174,080	$2,748,400			$22,426,795	$897,900			$21,771,985	$871,700			$22,426,795	$267,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.1. PHVA-ADMI (7 Afiliados)						$14,839,538	$2,374,600			$20,092,253	$804,200			$19,437,443	$778,000			$20,092,253	$104,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$14,839,538	$2,374,600			$20,092,253	$804,200			$19,437,443	$778,000			$20,092,253	$104,900		$0	$0
1	CC	20970804	CHILA ROSALBA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1014294484	DIAZ MARIA	230301	1	$93,334	$15,000	EPS017	1	$93,334	$3,800	CCF22	1	$93,334	$3,800	14-23	1	$93,334	$0	1	$0	$0
3	CC	1014294484	DIAZ MARIA	230301	29	$2,706,667	$433,100	EPS017	29	$2,706,667	$108,300	CCF22	29	$2,706,667	$108,300	14-23	29	$2,706,667	$14,200	29	$0	$0
4	CC	39703584	GOYENECHE ANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	93237133	PERDOMO IVAN		0	$0	$0	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1023876148	QUITIAN KELY	230301	30	$5,038,380	$806,200	EPS010	30	$5,038,380	$201,600	CCF22	30	$5,038,380	$201,600	14-23	30	$5,038,380	$26,400	30	$0	$0
7	CC	1016017769	RINCON INGRID	230301	30	$1,962,777	$314,100	EPS017	30	$1,962,777	$78,600	CCF22	30	$1,962,777	$78,600	14-23	30	$1,962,777	$10,300	30	$0	$0
8	CC	80804710	RINCON JEAN	230301	30	$5,038,380	$806,200	EPS008	30	$5,038,380	$201,600	CCF22	30	$5,038,380	$201,600	14-23	30	$5,038,380	$26,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.2. PHVA-OBRA (4 Afiliados)						$2,334,542	$373,800			$2,334,542	$93,700			$2,334,542	$93,700			$2,334,542	$162,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$2,334,542	$373,800			$2,334,542	$93,700			$2,334,542	$93,700			$2,334,542	$162,700		$0	$0
9	CC	1069583472	BOTON RAUL	25-14	21	$1,225,634	$196,200	EPS041	21	$1,225,634	$49,100	CCF22	21	$1,225,634	$49,100	14-23	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0
10	CC	79062603	CARO LUIS	230301	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
11	CC	1078371850	SANCHEZ URIEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
12	CC	80386672	VARGAS JOSE	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA 1 (13 Afiliados)						$11,322,522	$1,812,400			$11,322,522	$453,700			$11,322,522	$453,700			$11,322,522	$788,500		$0	$0
Centro de Trabajo: F-C-SOCHE (13 Afiliados)						$11,322,522	$1,812,400			$11,322,522	$453,700			$11,322,522	$453,700			$11,322,522	$788,500		$0	$0
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)						$11,322,522	$1,812,400			$11,322,522	$453,700			$11,322,522	$453,700			$11,322,522	$788,500		$0	$0
13	CC	1007160234	AVELLA YONATHAN	230201	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
14	CC	1003878686	BAUTISTA ELKIN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1078369970	CALDERON NELSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
16	CC	1078366130	FELACIO MIGUEL	230201	8	$466,908	$74,800	EPS041	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-23	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
17	CC	1010035129	GAITAN RAUL	230201	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
18	CC	1076625111	GUTIERREZ DAGOBERTO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
19	CC	1055952407	OSPINA EDUAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
20	CC	1077063124	PALMAR LUIS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
21	CC	1078370025	RODRIGUEZ JIMMY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
22	CC	11235342	ROJAS EYEZID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
23	CC	1076626436	ROZO DIEGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
24	CC	1022356124	SAENZ CRISTHIAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
25	CC	1004006330	SOCHE DIEGO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$28,496,602	$4,560,800			$33,749,317	$1,351,600			$33,094,507	$1,325,400			$33,749,317	$1,056,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	108525554	9500880401	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,293,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$4,560,800	$0	$0	$4,560,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$224,300	$0	$0	$224,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,402,300	$0	$0	$3,402,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$934,200	$0	$0	$934,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,056,100	$0	$0	$1,056,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$1,056,100	$0	$0	$1,056,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,325,400	$0	$0	$1,325,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	$1,325,400	$0	$0	$1,325,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	$1,351,600	$0	$0	$1,351,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$276,500	$0	$0	$276,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$201,600	$0	$0	$201,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$658,300	$0	$0	$658,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,500	$0	$0	$72,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$67,800	$0	$0	$67,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$2,400	$0	$0	$2,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$0	$0	$2,400
TOTAL				24	$8,293,900	$0	$0	$8,293,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244605	1	BLOCK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CONJUNTO PALMAS DEL ROSARIO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	99536262	9499536262	E	2026/01/05	2026/02/11	BANCO AV VILLAS	37	$652,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$1,988,155	$318,200			$3,739,060	$149,700			$3,739,060	$149,700			$3,739,060	$19,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
1	CC	79865018	NUÑEZ JUAN		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	11227356	PINZON FABIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 4 (1 Afiliados)						$237,250	$38,000			$237,250	$9,500			$237,250	$9,500			$237,250	$1,300		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$237,250	$38,000			$237,250	$9,500			$237,250	$9,500			$237,250	$1,300		$0	$0
3	CC	1070619339	BELTRAN PAOLA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0
Total Afiliados(3)						$1,988,155	$318,200			$3,739,060	$149,700			$3,739,060	$149,700			$3,739,060	$19,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244605	1	BLOCK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CONJUNTO PALMAS DEL ROSARIO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	99536262	9499536262	E	2026/01/05	2026/02/11	BANCO AV VILLAS	37	$652,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$318,200	$7,400	$0	$325,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$38,000	$900	$0	$38,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$6,500	$0	$286,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$19,700	$500	$0	$20,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$19,700	$500	$0	$20,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$149,700	$3,500	$0	$153,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$149,700	$3,500	$0	$153,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$149,700	$3,600	$0	$153,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$1,700	$0	$71,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$79,600	$1,900	$0	$81,500
TOTAL				3	$637,300	$15,000	$0	$652,300

2026/02/11 03:46 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244605	1	BLOCK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CONJUNTO PALMAS DEL ROSARIO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	99536843	9499536843	E	2026/02/03	2026/02/11	BANCO AV VILLAS	8	$582,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
1	CC	79865018	NUÑEZ JUAN		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	11227356	PINZON FABIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244605	1	BLOCK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CONJUNTO PALMAS DEL ROSARIO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	99536843	9499536843	E	2026/02/03	2026/02/11	BANCO AV VILLAS	8	$582,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$100	$0	$18,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$100	$0	$18,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$800	$0	$141,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$140,200	$800	$0	$141,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$800	$0	$141,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$400	$0	$70,500
TOTAL				2	$579,000	$3,200	$0	$582,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244605	1	BLOCK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CONJUNTO PALMAS DEL ROSARIO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	99860718	9499860718	E	2026/03/03	2026/03/13	BANCO AV VILLAS	10	$583,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
1	CC	79865018	NUÑEZ JUAN		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	11227356	PINZON FABIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901244605	1	BLOCK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CONJUNTO PALMAS DEL ROSARIO	RICAURTE-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	99860718	9499860718	E	2026/03/03	2026/03/13	BANCO AV VILLAS	10	$583,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$200	$0	$18,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$200	$0	$18,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,000	$0	$141,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$140,200	$1,000	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$1,000	$0	$141,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$500	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$500	$0	$70,600
TOTAL				2	$579,000	$4,100	$0	$583,100

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	118523255	9501140334	E	2026/01/05	2026/03/06	BANCO DAVIVIENDA	60	$181,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION																SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$113,900						$28,500	
																				$113,900						$28,500	
																				$113,900						$28,500	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	15	$711,750	16%	SIN RIESGO	$113,900	$0	$0	$0	$0	$0	$113,900		SANITAS	15	$711,750	4%	$28,500	
																				$113,900						$28,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$28,500						$28,500						$3,800				$0		$0		$0		$0	
	$28,500						$28,500						$3,800				$0		$0		$0		$0	
	$28,500						$28,500						$3,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$28,500		COLSUBSIDIO	15	$711,750	4%	$28,500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	15	$711,750	0.522%	1	$3,800	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$28,500						$28,500						$3,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	134161442	9501349221	E	2026/02/03	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA		$426,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 1. PHVA- BOG (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.1. PHVA-ADMI (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 80161326	VASQUEZ WILSON	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$286,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$286,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$58,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$58,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$71,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$71,800
TOTAL				**1**	**$416,500**	**$0**	**$426,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386607	1	PHVA CONSTRUCTORES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1. PHVA- BOG	CALLE16I#103A-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4876680	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	134173177	9501349264	E	2026/03/03	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA		$419,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 1. PHVA- BOG (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.1. PHVA-ADMI (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 80161326	VASQUEZ WILSON	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$281,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$70,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$70,600
TOTAL				**1**	**$416,500**	**$0**	**$419,200**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARDENAS RAMIREZ JAIR ANTONIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79545503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35637615
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35637615
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 384.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.600	$ 12.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600	$ 696.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARDENAS RAMIREZ JAIR ANTONIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79545503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-03
FECHA DE PAGO:	2026-02-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35888837
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35888837
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARDENAS RAMIREZ JAIR ANTONIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79545503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-03
FECHA DE PAGO:	2026-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36207287
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36207287
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

BLOCK INGENIERIA SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

FABIO HERMES DAVID PINZON RODRIGUEZ, identificado con CC 11.227.356, en mi condición de representante legal de BLOCK INGENIERIA SAS identificada con el NIT 901.244.605-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Girardot, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de Febrero de 2026



FABIO HERMES DAVID PINZON RODRIGUEZ
Cc 11.227.356

PHVA
Constructores S.A.S.
NIT. 900386607-1

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

NESTOR RAUL GALINDO ROJAS, identificado con CC 19.388.026, y con tarjeta profesional 22077-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de PHVA CONSTRUCTORES SAS identificada con el NIT 900.386.607-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de febrero de 2026

NESTOR RAUL GALINDO ROJAS
Cc 19.388.026
Tp 22077-t



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.388.026

GALINDO ROJAS
APELLIDOS

NESTOR RAUL
NOMBRES

FIRMA

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1960
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

02-AGO-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500113-45136173-M-0019388026-20051104 02719 05308O 03 180452425

Como Notario Dieciocho del Círculo de Bogotá, hago constar que esta FOTOCOPIA coincide con su original que he tenido a la vista

22 MAR. 2012

NOTARÍA DIECIOCHO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JOSE MIGUEL RUBIO PINEROS
NOTARIO 18 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

ESPACIO EN BLANCO
NOTARIA 18 DEL CIRCULO
DE BOGOTA D.C.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22077-T



NESTOR RAUL
GALINDO ROJAS
C.C. 19388026
RESOLUCION INSCRIPCION 2508 FECHA 19/10/1988
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 29733

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 2149

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

Como Notario Dieciocho del Círculo de Bogotá, hago constar que esta FOTOCOPIA coincide con su original que he tenido a la vista

22 MAR. 2012

NOTARÍA DIECIOCHO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JOSE MIGUEL ROJAS PIÑEROS
NOTARIO 18 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

ESPACIO EN BLANCO
NOTARIA 18 DEL CIRCULO
DE BOGOTA D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A81F7DE6BF680C3E2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NESTOR RAUL GALINDO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19388026 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22077-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO SANTA MARTA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

KEL YICELA QUITIAN CHILA, identificado con CC 1.023.876.148, en mi condición de representante legal del CONSORCIO SANTA MARTA identificado con el NIT 901.985.516-3, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de Febrero de 2026

KELY YICELA QUITIAN CHILA
Cc 1.023.876.148

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A

CERTIFICA:

Por medio de la presente hacemos constar que CONSORCIO SANTA MARTA identificado con NIT. No. 9019855163

Posee en el banco Davivienda:

	Cuenta de Ahorros
Número	550006400775596
Subproducto	CUENTA DE AHORROS
Tipo de Manejo	Individual
Fecha de apertura	22 de Diciembre de 2025
Dirección Registrada	
Saldo a la fecha	
Fecha de Cancelación	
Estado de Cuenta	VIGENTE

La presente certificación se expide en Bogotá, 22 de Diciembre de 2025, a solicitud del titular de la cuenta.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

DAVIVIENDA
0004 - OFICINA NZA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
398363e2bdbe4dcebb47efea584108346919334b9decc15e7ffd5b7dccd80717036c7f85407bcd5adecb77f4ffeb991c

Número de Factura: FVCS-4
Fecha de Emisión: 01/04/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO SANTA MARTA
Nombre Comercial: CONSORCIO SANTA MARTA
Nit del Emisor: 901985516
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 16 I # 103 A - 67 P 2
Teléfono / Móvil: 3229242952
Correo: consorciomuros2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENJO MUNICIPIO DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 No. 3-86
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@tenjo-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	ACTA PARCIAL No.2 DEL CONTRATO DE OBRA LP-OBRA-432-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. PARA EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE L 2025 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026	NIU	1,00	$ 355.082.741,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 355.082.741,00
2	AIU	AIU 31,874%	94	1,00	$ 113.179.071,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.179.071,00
3	3	COMPONENTES (PMT + SOCIAL) MUROS	94	1,00	$ 21.304.965,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.304.965,00

Notas Finales

CONSORCIO SANTA MARTA NIT 901985516-3 INTEGRANTES % NIT PHVA CONSTRUCTORES SAS 90% 900386607-1 BLOCK INGENIERIA SAS 10% 9 01244605-1
Linea de negocio: DETALLE

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2026 09:54:35
Documento validado por la DIAN:
01/04/2026 09:54:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		489566777
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		489566777
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		489566777
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 489566777

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		489.566.777,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		489.566.777,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		489.566.777,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$489.566.777,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103302021 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-12-18
