| SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>PROYECTO - SUBDIRECCIÒN DE BARRIOS<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | CODIGO No. | |
|---|---|---|
| | VERSIÓN: | V-0 |
| | FECHA: | febrero-26 |
| | PÁGINA: | 1 de 1 |

| 1. FECHA ELABORACIÓN | 27 | 2 | 2026 | 2. INFORME No. | 1 | 3. SEMANA No. | 1-2-3 | 4. PERIODO | 4 | FEBRERO | AL | 27 | FEBRERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERVENTORES BYC | 6. NIT | 902015554-6 |
|---|---|---|---|

| 7. CONTRATO No: | 1334-2025 | 8. FECHA CONTRATO: | 3/12/2025 | 9. VALOR CONTRATO: | $ 1.524.725.316,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. FECHA ACTA INICIO: | 4/02/2026 | 11. FECHA DE TERMINACIÓN: | 3/09/2027 | 12. PLAZO: | 19 MESES |

| 13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2” |
|---|---|

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

| 15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA | CONSORCIO HÁBITAT URBANO | 16. NIT | 902.005.-704-1 |
|---|---|---|---|

| 17. CONTRATO No: | 1267-2025 | 18. FECHA CONTRATO: | 29/10/2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 12.061.455.003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 4/02/2026 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 3/09/2027 | 22. PLAZO: | 19 MESES |

| 23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | “REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.” (Grupo 2) |
|---|---|

## 24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - OBRA

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 12.061.455.003,00 | Valor Inicial | $ 1.524.725.316,00 |
| Valor Adicional 1 | $ - | Valor Adicional 1 | $ - |
| valor Adicional 2 | $ - | valor Adicional 2 | $ - |
| Valor Actualizado | $ 12.061.455.003,00 | Valor Actualizado | $ 1.524.725.316,00 |
| Plazo Inicial | 19 MESES | Plazo Inicial | 19 MESES |
| Plazo Prórroga 1 | | Plazo Prórroga 1 | |
| Plazo Actualizado | | Plazo Actualizado | |
| Fecha de Iniciación | | Fecha de Iniciación | |
| Fecha de suspensión No.1 | | Fecha de suspensión No.1 | |
| Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 | | Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 | |
| Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 | | Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 | |
| Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 | | Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 | |
| Fecha de reinicio No.1 | | Fecha de reinicio No.1 | |
| Fecha de Terminación Inicial | 3/09/2027 | Fecha de Terminación Inicial | 3/09/2027 |
| Fecha de Terminación Actual | | Fecha de Terminación Actual | |

## 25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

### CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA

VR. CONTRATO 0% $ 12.061.455.003,00

| No. Acta | Valor del Acta | VR. Deducciones | Fecha Acta |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | $ - | $ - | |
| Acta No. 2 | $ - | $ - | |
| Acta No. 3 | $ - | $ - | |
| Acta No. 4 | $ - | $ - | |
| Acta No. 5 | $ - | $ - | |
| Acta No. 6 | $ - | $ - | |
| Acta No. 7 | $ - | $ - | |
| Acta No. 8 | $ - | $ - | |
| Acta No. 9 | $ - | $ - | |

| VALOR EJECUTADO | $ - | % Avc. | 0,00% |
|---|---|---|---|
| VALOR POR EJECUTAR | $ 12.061.455.003,00 | % Falt. | 100,00% |
| VALOR RETEGARANTIA | $ 603.072.750,15 | % Avc. | 5,00% |
| VALOR POR DEDUCCIÓN | $ - | % Falt. | 0,00% |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO 0% $ 1.524.725.316,00


| No. Acta | Valor Acumulado | VR. Deducciones | Fecha Acta |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | $ - | $ - | |
| Acta No. 2 | $ - | $ - | |
| Acta No. 3 | $ - | $ - | |
| Acta No. 4 | $ - | $ - | |
| Acta No. 5 | $ - | $ - | |
| Acta No. 6 | $ - | $ - | |
| Acta No. 7 | $ - | $ - | |
| Acta No. 8 | $ - | $ - | |
| Acta No. 9 | $ - | $ - | |

| VALOR EJECUTADO | $ - | % Avc. | 0,00% |
|---|---|---|---|
| VALOR POR EJECUTAR | $ 1.524.725.316,00 | % Falt. | 100,00% |
| VALOR POR DEDUCCIÓN | $ - | % Falt. | 0,00% |

## 26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado Anterior | 5,61% | 6,46% | -0,85% |
| Durante la Semana | 2,54% | 2,28% | 0,26% |
| **Actual Acumulado** | 8,15% | 8,74% | -0,59% |

| EJECUCIÓN | SEMAMA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 2,28% | 8,74% |
| Valor de la Obra Programada | $16.753.913,81 | $ 64.223.336,26 |

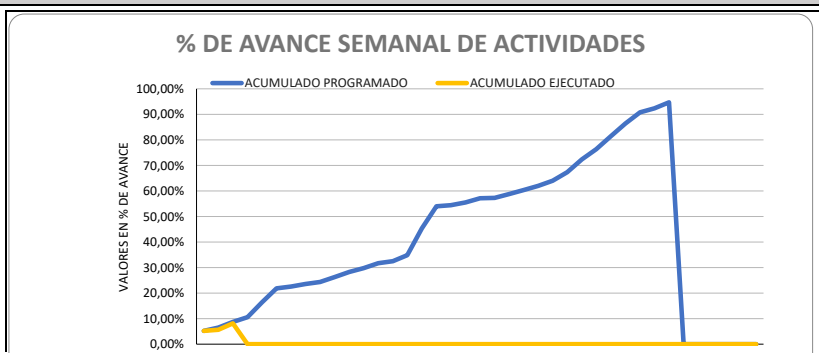

| EJECUCIÓN | SEMAMA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 2,54% | 8,15% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 18.664.447,84 | $ 59.887.893,65 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SEMANAS

**27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO**

CIV: N/A Presente informe
Avance Programado del CIV: N/A Presente informe
Avance Ejecutado del CIV: N/A Presente informe

**Actividades realizadas:**

- El 04 de febrero se firman actas de inicio de los contratos de interventoría NO. 1334-2025 GRUPO 2 y contratista NO. 1267-2025 GRUPO 2
- El 04 de febrero mediante comunicado 2-2026-6939 se recibe por parte del SDHT Aprobación Hojas De Vida Interventoría - CONTRATO NO. 1334-2025 -PROYECTO POLIGONOS GRUPO 2.
- El 05 de febrero mediante comunicado CE-CHU-0030-2026 el contratista remite propuesta de modificación, balance y justificación para el cambio de sectores contractuales. Adicionalmente se recibe con los comunicado CE-CHU-0034-2026 entrega relación documental solicitada a corte del 05 de febrero de 2026, CE-CHU-0035-2026 Entrega Cronograma Inicial y con el comunicado CE-CHU-0037-2026 Documentación Equipo Mínimo De Trabajo. Entrega Plan De Calidad V1.
- El 06 de febrero se asiste a reunion con la comunidad, la SDHT y la interventoría.
- El 09 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0011-0268-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0036-2026. Revisión plan de Calidad V1, con el comunicado C-302-0012-0269-26 se envía Solicitud Programa de Gerencia de Proyectos-Plan de Ejecución BIM y Actualización de Pólizas Contrato De Obra No. 1267-2025, adicionalmente se remite comunicado C-302-0013-0270-26 Respuesta al Comunicado CE-CHU-0035-2026 – Entrega de cronograma inicial.
- El 10 de febrero se realiza Comité No.1 presencial en la SDHT, se presentaron los objetivos, alcances de los contratos y se revisó la propuesta de modificación, balance y justificación para el cambio de sectores contractuales remitida por el contratista y se remite a la entidad con el comunicado C-302-0014-0279-26 se remite la actualización de las Garantías de cumplimiento de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio.
- El 11 de febrero se reciben los comunicados CE-CHU-0040-2026 Entrega PEB Inicial.
- El 12 de febrero se realiza reunión virtual junto con el contratista para revisar el Plan de Trabajo de Topografía, se presenta la empresa que realizará los trabajos de topografía. Adicionalmente se reciben comunicados CE-CHU-0043-2026 Respuesta Comunicado C-302-0013-0270-26. Entrega De Cronograma Inicial y CE-CHU-0046-2026 Pólizas Y Garantías.
- El 13 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0017-0308-26 Apremio Entrega Actualización de Pólizas Contrato De Obra No. 1267-2025.
- El 16 de febrero la arquitecta apoyo a la supervisión compartió carpeta caja de herramientas. Se remite con el comunicado C-302-0021-0329-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0034-2026. Entrega Relación Documental Solicitada A Corte Del 05 De Febrero De 2026. Adicionalmente se remite a la entidad con el comunicado C-302-0022-0330-26 soporte pago Impuesto de Timbre – Contrato No. 1334 de 2025.
- El 17 de febrero se remite al contratista comunicado C-302-0024-0345-26 Concepto de aprobación del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) - Etapa 1 –Contrato de Obra 1267-2025. Comunicado CE-CHU-0038-2026 y posteriormente, se remite a la entidad la aprobación con el comunicado del PDT con el comunicado C-302-0025-0346-26. Se realiza comité No.2 virtual (Revisión de compromisos acta anterior y avances de los componentes).
- El 18 de febrero se recibe por parte del contratista comunicado CE-CHU-0048-2026 Entrega Documentación Complementaria Componente Topográfico.
- El 20 de febrero se recibe por parte del contratista con los comunicados CE-CHU-0054-2026 Entrega Plan De Gerencia V1 Y Documentación Del Gerente De Proyectos –Contrato No. 1267-2025.
- El 20 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0030-0370-26 Revisión Entrega Documentación Complementaria Componente Topográfico Comunicado CE-CHU-0048-2026.
- El 23 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0033-0393-26 Respuesta comunicado CE-CHU-0040-2026. Aprobación Plan de Ejecución BIM; con el comunicado C-302-0034-0394-26 se emite Respuesta Comunicado CE-CHU-0054-2026. Revisión Programa de Gerencia de Proyectos.
- El 25 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0037-0404-26 Solicitud remisión soporte pago Impuesto de Timbre – Comunicado SDHT 2-2026-8265.
- El 27 de febrero ser recibe por parte de la Supervisión el comunicado 2-2026-12440 RESPUESTA A RADICADO NO. 1-2026-6586 DEL 13 DE FEBRERO DE 2026-CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN CONTRATO NO. 1267-2025.

ACTIVIDADES CONTRATISTA
- Se realizaron las primeras visitas técnicas de reconocimiento al Parque Santa Sofía, con el objetivo de verificar el estado actual del espacio público y recopilar información base para el proceso de diseño; en dichas visitas se efectuó inspección visual de las áreas duras y blandas, mobiliario existente, condiciones del arbolado, redes visibles y estado general de la infraestructura, permitiendo identificar posibles problemáticas, restricciones técnicas y consideraciones preliminares que deberán ser tenidas en cuenta en la formulación de la propuesta de intervención.
- Se realizaron visitas técnicas de reconocimiento en el Parque San Felipe y su área de influencia, con el propósito de verificar el estado actual del espacio público y validar en campo los polígonos preliminarmente definidos para intervención; durante el recorrido se inspeccionaron andenes, vías, zonas duras, mobiliario urbano y condiciones generales del entorno, considerando además la dinámica comercial y gastronómica característica del sector, lo cual permitió identificar condicionantes técnicas y sociales relevantes para la estructuración y ajuste del diseño proyectado.
- Se realizó el primer acercamiento topográfico en el sector del Parque San Felipe, con el fin de adelantar el levantamiento planimétrico y altimétrico del área de intervención, mediante la toma de puntos georreferenciados con equipos GPS y tecnología especializada, operados por el personal técnico correspondiente; adicionalmente, se efectuó el levantamiento de puntos tridimensionales (3D) a escala de barrio en el sector de San Felipe, con el propósito de obtener una base cartográfica precisa que permita soportar el desarrollo del diseño y el análisis técnico del proyecto.

**28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL**

- El 10 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0010-0256-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0037-2026. Revisión Documentación Personal Contrato De Obra No. 1267-2025. Por otra parte, se remite al contratista el Manual de indumentaria y uso de marco v.3

- El 11 de febrero se recibe por parte del contratista comunicado CE-CHU-0039-2026 Respuesta Comunicado C-302-0010-0256-26. Revisión Documentación Personal Contrato De Obra No. 1267-2025. y el comunicado CE-CHU-0038-2026 Entrega Cronograma Especifico De Cada Una De Las Áreas Sst, Ambiental Y Social. Posteriormente, se remite a la entidad con el comunicado C-302-0015-0285-26 los Documentos de Ingreso del personal de Interventoría.

- El 16 de febrero se realizo el primer comité presencial Ambiental /SST en terreno (Visita de reconocimiento)- Parque Juan XXIII (Santa Sofía) y Barrio Vital San Felipe, en esta reunión se realizo reconocimiento en áreas que serán intervenidas en el proyecto, se verificaron los productos a entregar y se estableció contacto con juntas de acción comunal y actores del área de estudio desde el componente social. Adicionalmente se remite el comunicado C-302-0020-0327-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0038-2026. Observaciones cronograma componente ambiental

- El 17 de febrero se recibe por parte del contratista comunicado CE-CHU-0047-2026 Actualización Hojas De Vida (Cambio De Personal); la interventoría emite observaciones con el comunicado C-302-0023-0343-26 dando Respuesta al Comunicado CE-CHU-0039-2026. Revisión Documentación Personal V2.

- El 18 de febrero Se remite al contratista con el comunicado C-302-0026-0351-26 Revisión Hojas de Vida – Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025.

- El 19 de febrero se recibe por parte del contratista comunicado CE-CHU-0051-2026 Respuesta Comunicado C-302-0020-0356-26. Respuesta Comunicado CE-CHU-0038-2026. Revisión cronograma específico SST. Adicionalmente, se recibe comunicado CE-CHU-0050-2026 Respuesta Comunicado C-302-0020-0327-26. Entrega de Cronograma Ambiental y con el comunicado CE-CHU-0052-2026 Respuesta Comunicado C-302-0023-0343-26 – Revisión Documentación Personal Contrato De Obra No. 1267-2025 (Actualización V4).

- El 19 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0027-0356-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0038-2026. Revisión cronograma específico SST y se remite con el comunicado C-302-0028-0362-26 Respuesta comunicado CE-CHU-0050-2026. Aprobación de cronograma de actividades ambientales Etapa 1 (8 meses).

- El 20 de febrero se recibe por parte del contratista con el comunicado CE-CHU-0053-2026 Entrega Línea Base Ambiental V1 – Contrato De Obra No. 1267-2025. Adicionalmente, se remite al contratista con el comunicado C-302-0029-0368-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0051-2026. Aprobación Cronograma SST V2 Contrato de Obra No. 1267-2025. Posteriormente, con el comunicado C-302-0031-0375-26 se emite Reiteración Oficio C-302-0018-0309-26 del 13.02.2026. Solicitud Cumplimiento Entregables Componente Social y con el comunicado C-302-0032-0377-26 se emite Reiteración C-302-0023-0343-26. Solicitud Atención Observaciones Documentos Personal.

- El 23 de febrero con el comunicado C-302-0035-0398-26 se emite Respuesta comunicado CE-CHU-0053-2026. Observaciones documento línea Base Ambiental preliminar.

- El 24 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0036-0403-26 Requerimiento de presentación Diagnóstico y Contexto del Proyecto – Componente SST; con el comunicado C-302-0038-0407-26 se emite Respuesta comunicado CE-CHU-0055-2026. Observaciones documento “Identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto.”

- El 27 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0042-0469-26 Revisión Hojas de Vida – Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025 (Estados de Aprobación). Adicionalmente, se remite a la Sec

## 29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

| ESTADO DE ACTAS DE VECINDAD | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 0 | % DE AVANCE |
| REALIZADAS | 0 | % |
| POR REALIZAR | 0 | % |

- El 6 de febrero se asiste a recorrido inicial programado por la SDH con el fin de realizar la presentación del contrato a la comunidad de los sectores San Felipe y Santa Sofia.
- El 11 de febrero se realiza reunión virtual con la profesional social del contratista de validar entrega de preliminares y actividades a ejecutar.
- El 13 de febrero se asiste a reunión virtual convocada por la supervisión a fin de validar entrega de preliminares y realizar contextualización sobre las actividades del contrato.
- El 13 de febrero se remite con el comunicado C-302-0018-0309-26 Solicitud Cumplimiento Entregables Componente Social, el cual es reiterado mediante oficio C-302-0031-0375-26 de fecha 20 de febrero de 2026
- El 16 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0019-0324-26 Respuesta oficio CE-CHU-0038-2026 asociado a observaciones a cronograma propuesto desde el componente social, asimismo se asiste a
- El 17 de febrero se realiza reunión virtual con la profesional social del contratista con el objetivo de validar incorporacion de observaciones al cronograma.
- El 18 de febrero se recibe con el comunicado con el comunicado CE-CHU-0049-2026 Respuesta Comunicado C-302-0019-0324-26. Entrega De Cronograma Social.
- El 25 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0039-0414-26 Respuesta Oficio CE-CHU-0049-2026 Asociado A Cronograma Propuesto Desde El Componente Social V2. Adicionalmente se remite con
- El 26 de febrero se recibe comunicado CE-CHU-0062-2026 respuesta comunicado c-302-0041-0430-26 – Alcance comunicado c-302-0040-0428-26. Apremio entrega componte social-imposición de multa por incumplimiento en presentación de plan de gestión social.
- El 27 de febrero se remite al contratista con el comunicado C-302-0044-0477-26 Solicitud funcionamiento PAC Contrato 1267-2025

## 30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

N/A para el periodo del presente informe

| REPORTE DE OBRA | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | No. DE CASOS |
| CASOS (+) | |
| EN AISLAMIENTO | |

| REPORTE DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | No. DE CASOS |
| CASOS (+) | |
| EN AISLAMIENTO | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PERSONAL OBRA ADM | |
| TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA | |

## 31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

**N/A**

| 32. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORÍA | | 32. PERSONAL DE OBRA | | 33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA | | | 34. ESTADO DEL TIEMPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANT. | CARGO | CANT. | EQUIPO / MAQUINARÍA | CANT. | UBICACIÓN (CIV/TRAMO) | DIA | HORAS DE LLUVIA | ESTADO |
| DIRECTOR INTERVENTORIA | 1 | DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA | 1 | | | | LUNES | | |
| ESP. PAISAJISMO | 1 | ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | 1 | | | | MARTES | | |
| ESPECIALISTA DISEÑO ARQUITECTONICO | 1 | ESPECIALISTA EN PAISAJISMO | 1 | | | | MIÉRCOLES | | |
| ESPECIALISTA URBANISMO | 1 | ESPECIALISTA EN VÍAS | 1 | | | | JUEVES | | |
| ESPECIALISTA EN VIAS | 1 | ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD | 1 | | | | VIERNES | | |
| ESPECIALISTA EN TRANSITO Y MOVILIDAD | 1 | ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS Y ENERGÍA SOLAR | 1 | | | | SÁBADO | | |
| ESPECIALISTA REDES ELECTRICAS Y ENERGIA SOLAR | 1 | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS. SUDS Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1 | | | | DOMINGO | | |
| ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS SUDS Y SANEAMIENTO | 1 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1 | | | | **TOTAL DE Hr.** | 0,00 Hr/semana | |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 | | | | | | |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | 1 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL (CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE) | 1 | | | | | | |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | INGENIERO FORESTAL | 1 | | | | | | |
| ESPECIALISTA FORESTAL | 1 | ARQUEÓLOGO | 1 | | | | | | |
| ARQUEOLOGO | 1 | PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES, PROGRAMACIÓN Y APUS | 1 | | | | | | |
| PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS ESPECIFICACIONES CANTIDADES PROGRAMACION | 1 | PROFESIONAL SST | 1 | | | | | | |
| PROFESIONAL SST | 1 | PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL | 1 | | | | | | |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1 | ESPECIALISTA EN NORMATIVIDAD | 1 | | | | | | |
| ING. CATASTRAL | 1 | ESPECIALISTA DERECHO URBANO | 1 | | | | | | |
| ESPECIALISTA DERECHO URBANO | 1 | TÉCNICO EN MANEJO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO | 1 | | | | | | |
| TOPOGRAFO | 1 | PROFESIONAL DE SOPORTE SIG | 1 | | | | | | |
| CADENERO | 1 | MODELADOR BIM (ARQUITECTURA) | 1 | | | | | | |

**ESTADO**

**LLUVIOSO (L)**
**FAVORABLE (F)**
**SOLEADO (S)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MODELADOR BIM (ESTRUCTURAS) | | | | | |
| | | MODELADOR BIM (MEP) | 1 | | | | |
| | | COORDINADOR BIM | 1 | | | | |
| | | INGENIERO TOPÓGRAFO | 1 | | | | |
| | | OPERARIO DRON | 1 | | | | |
| | | CADENERO 1 | 1 | | | | |
| | | CADENERO 2 | 1 | | | | |
| | | VIGILANTE | 1 | | | | |
| | | AFORADOR 1 PARA ESTUDIO DE MOVILIDAD | 1 | | | | |
| | | AFORADOR 2 PARA ESTUDIO DE MOVILIDAD | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL DE PERSONAL** | **19** | **TOTAL DE PERSONAL** | **29** | **TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO** | **0** | | |

**35 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

| FECHA DELCOMPROMISO | COMPROMISO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| **27/02/2025** | -Remitir oficio justificando el traslado de los polígonos-andenes y | CONTRATISTA | **INTERVENTORIA** |
| **27/02/2025** | -Remitir Hoja de vida cambio profesional Social y contestar oficios | CONTRATISTA | |
| **27/02/2025** | - Atender observaciones Documentos Ambientales Línea base ambiental | CONTRATISTA | |
| **27/02/2025** | - Atender observaciones Documentos profesionales | CONTRATISTA | |
| | | | |
| | | | |

**36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**37. OBSERVACIONES**

El atraso presentado se debe a la demora en entrega de los documentos sociales que estan pendientes. Se adjunta PDT relacionando lo ejecutado a la fecha del presente informe
Se hace un llamado de atención al contratista para que cumpla con las entregas pendientes y cumpla con las fechas programadas.

**39. RECOMENDACIONES**

**JOHN JAIRO SORIANO ESPINOSA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO INTERVENTORES BYC**

| | SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA | CODIGO No. | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | V-0 |
| | | FECHA: | febrero-26 |
| | | PÁGINA: | 1 de 1 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento
Fecha: 06/02/2026




Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento
Fecha: 06/02/2026




Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento
Fecha: 06/02/2026





Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento
Fecha: 06/02/2026




Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento
Fecha: 06/02/2026




Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento
Fecha: 06/02/2026

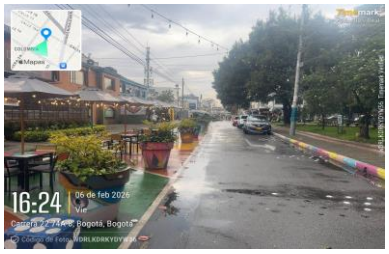


## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

Tramo: Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Visita Reconocimiento Ambiental y SST
Fecha: 16/02/2026




Tramo: Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Visita Reconocimiento Ambiental y SST
Fecha: 16/02/2026




Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento Ambiental y SST
Fecha: 16/02/2026





Tramo: Barrio Vital San Felipe
Descripción: Visita Reconocimiento Ambiental y SST
Fecha: 16/02/2026




Tramo: Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Visita Reconocimiento Ambiental y SST
Fecha: 16/02/2026




Tramo: Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Visita Reconocimiento Ambiental y SST
Fecha: 16/02/2026




Descripción: EQUIPO TOPOGRAFIA



Descripción: EQUIPO TOPOGRAFIA



Descripción: EQUIPO TOPOGRAFIA










**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL**


Tramo: Barrio Vital San Felipe- Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Asistencia Reunión Programada por la SDHT
Fecha: 06/02/2026



Tramo: Barrio Vital San Felipe- Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Asistencia Reunión Programada por la SDHT
Fecha: 06/02/2026




Tramo: Barrio Vital San Felipe- Parque Juan XXIII (Santa Sofia)
Descripción: Asistencia Recorrido ambiental - SST - social
Fecha: 16/02/2026

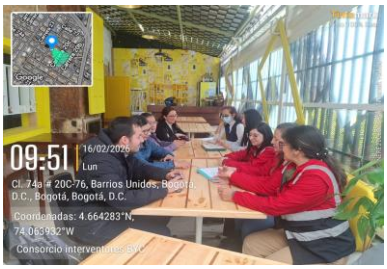


Tramo: Barrio Vital San Felipe-
Descripción: Acompañamiento en acercamiento con comunidad
Fecha: 16/02/2026




Tramo: Barrio Santa Sofía
Descripción: Verficación punto propuesto para atención a la comunidad
Fecha: 16/02/2026




**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD (NO APLICA)**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA- COMPONENTE PMT (NO APLICA)**
